**ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA**

**SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

**NIT: 892-115-155-4**

FECHA ELABORACIÓN:

**12/07/2024**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

***CONTRATO DE OBRA:*** [ x ] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [ X ] ***INFORME FINAL:*** [ ]

## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR Moti98121513242

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:** | **DÍA** 12 | **MES** 07 | **AÑO** 2024 | **PERIÓDO DE SEGUIMIENTO:** | **Desde el día** 12 de junio de 2024, **hasta el día** 12 de julio de 2024. | **INFORME:** | 001 |
| **RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN:** | 1- **FABIAN JOSE BRIEVA IGUARAN.** Interventor Municipal. | | | | | | |
| | **Fecha de designación de la Supervisión Actualizada:** | | 11 de junio de 2024. | | **Fecha de designación de la Supervisión Inicial:** | | 11 de junio de 2024. |

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| **No. Proceso** | **NOMBRE DEL PROYECTO** | **VIGENCIA DE RECURSOS** | **FUENTE DE FINACIACIÓN** |
|---|---|---|---|
| IMC 008 DEL 2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. | 2023 | Recursos Propios. |

| **PLAZO** | | |
|---|---|---|
| Cuarenta y cinco (45) días. | **DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO:** | El Municipio de Uribia es una entidad territorial dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado en virtud del artículo 311 de la Constitución Nacional, de prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo territorial dentro del ámbito de su jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.<br><br>La baja calidad y pertinencia en todos los niveles educativos sigue siendo una problemática presente en la educación en el municipio de Uribia, limitando la formación y el desarrollo de competencias para el trabajo y para la vida. La población estudiantil del MUNICIPIO DE URIBÍA ha ido aumentando ocasionando un hacinamiento en muchas de las instituciones educativas del casco urbano y rural, donde los estudiantes no caben en las aulas de clases.<br><br>Aspectos como la baja apropiación social de los programas y proyectos educativos, el bajo desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras acordes a la vocación de las regiones, la insuficiente infraestructura y el reducido acceso a la educación media en zonas rurales, se convierten en elementos críticos para consolidar una formación de calidad e integral en todos los niveles y a lo largo de la vida. A esta problemática se suma la debilidad de escenarios recreativos y deportivos para realizar actividades de educación física. Así mismo, esto genera un aumento en la deserción escolar y en la calidad de la educación en la región.<br><br>Por eso es necesario que la población escolarizada (niños, niñas, jóvenes y adolescentes) cuente con espacios de calidad adecuados para la formación que reciben en las instituciones educativas.<br><br>El proyecto consiste en la construcción de SEIS (06) aulas y adecuaciones generales en nueve (9) instituciones, en el CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU se realizara la construcción de dos (02) aulas, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI se realizara la construcción de dos (02) aulas y en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA la construcción de dos (02) aulas, Las dos (02) aulas escolares cuentan con un área de 65m2 y capacidad para 40 estudiantes cada una, se realizaran adecuaciones generales por el mal estado de la infraestructura educativa en nueve (09) de ellas las cuales son, CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA, CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDA – SEDE: WAAI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ – SEDE WARRERAPU #1, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE SUKULUWOU y CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES - SEDE WALAKALIT #1. Estos nuevos espacios ofrecerán a los estudiantes mejores condiciones para su educación y estadía en las instituciones, ya que se serán espacios que cumplen con las especificaciones técnicas de construcción obedeciendo a las NSR-10 y los lineamientos del ministerio de educación nacional, remplazando aquellos espacios que se han construido con materiales de la región que no cuentan con la capacidad de durabilidad en el tiempo y no ofrecen confort y seguridad.<br><br>El proyecto tiene como objetivo principal la construcción de seis aulas y la realización de adecuaciones generales en nueve instituciones educativas. Estas acciones se llevarán a cabo en tres ubicaciones específicas:<br><br>CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU: En esta institución, se construirán dos aulas escolares nuevas. Cada aula tendrá un área de 65 metros cuadrados y capacidad para albergar a 40 estudiantes. Estas aulas proporcionarán espacios adicionales para la educación de los alumnos. |

| | | |
|---|---|---|
| | | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI: En esta sede, también se llevará a cabo la construcción de dos aulas escolares nuevas, con las mismas dimensiones y capacidad que las mencionadas anteriormente. Estas aulas contribuirán a mejorar las instalaciones educativas de la institución.<br><br>INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA: En esta institución, se realizará la construcción de otras dos aulas escolares nuevas, con las mismas características en términos de tamaño y capacidad que las mencionadas anteriormente. Estas nuevas aulas permitirán a la institución ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para sus estudiantes.<br>el proyecto se enfoca en la construcción de aulas escolares en tres instituciones diferentes, dos aulas por institución, con el propósito de proporcionar espacios adecuados y cómodos para la educación de los estudiantes. Además de estas nuevas construcciones, se realizarán adecuaciones generales en nueve instituciones educativas para mejorar la infraestructura existente y garantizar un entorno de aprendizaje seguro y propicio.<br><br>Las adecuaciones generales por el mal estado de la infraestructura educativa en las nueve instituciones mencionadas buscan mejorar y renovar las condiciones de las instalaciones existentes para garantizar un entorno de aprendizaje seguro, funcional y adecuado. A continuación, se describe el alcance general de estas adecuaciones:<br><br>*CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA:*<br>• *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.*<br>• *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.*<br>• *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.*<br>• *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.*<br><br>*CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN:*<br>• *Adecuación y reparación de aulas y espacios comunes.*<br>• *Reacondicionamiento de sistemas de ventilación.*<br>• *Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida.*<br><br>*INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES:*<br>• *Reforzamiento estructural.*<br>• *Sustitución de instalaciones sanitarias obsoletas.*<br>• *Modernización de sistemas de fontanería.*<br><br>*INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA:*<br>• *Renovación de áreas de aulas escolares.*<br>• *Implementación de medidas de seguridad mejoradas.*<br>• *Rehabilitación de espacios para actividades al aire libre.*<br><br>*CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK:*<br>• *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.*<br>• *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.*<br>• *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.*<br>• *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.*<br><br>*CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHÍA HONDA – SEDE: WAAI:*<br>• *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.*<br>• *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.*<br>• *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.*<br>• *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.*<br><br>*INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNÁNDEZ – SEDE WARRERAPU #1:*<br>• *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.*<br>• *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.*<br>• *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.*<br>• *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.*<br><br>*CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES - SEDE SUKULUWOU:*<br>• *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.*<br>• *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.*<br>• *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.*<br>• *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.*<br><br>*CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES - SEDE WALAKALIT #1:*<br>• *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.*<br>• *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.*<br>• *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.*<br>• *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.*<br><br>Estas adecuaciones generales se llevarán a cabo siguiendo las normas de seguridad y calidad establecidas, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes y el personal educativo un entorno más propicio para el aprendizaje y el desarrollo. Además, se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de la región, como las altas temperaturas, para garantizar un ambiente confortable y adecuado para la educación.<br><br>Las estructuras estarán soportadas por cimentaciones aisladas tipo zapatas en concreto reforzado de 3000 psi, con un sistema aporticado de columna y vigas también en concreto reforzado de 3000 psi, los muros están diseñados en mampostería con bloque de cemento unidos con mortero de pega |

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

1:4 y acabado con pañete allanado 1:4, estuco y pintura para exteriores tipo Koraza. Se tiene en cuenta la inclusión de personas con movilidad reducida y discapacidades varias.
Así mismo, las condiciones ambientales también deben ser tenidas en cuenta. La temperatura, ruido, iluminación o calidad del aire pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño y las actitudes de la población estudiantil. El clima también influye en gran medida en nuestro bienestar ya que nos encontramos en una región donde las altas temperaturas han alcanzado hasta 42 °C. Debido a lo anterior, la infraestructura contemplada para el CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI y en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA, se tiene previsto el suministro e instalación de cubierta tipo sándwich deck o similar, que cuenta con un relleno interior de poliuretano que garantiza el aislamiento térmico por cuenta de los rayos solares.

Las instituciones CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI y en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA carecen de espacios para albergar a los estudiante, afectando con ello a la población estudiantil que no está en condiciones de trasladarse a otras instituciones.

Así mismo, las instituciones CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA, CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDA – SEDE: WAAI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ – SEDE WARRERAPU #1, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE SUKULUWOU y CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE WALAKALIT #1.

Según los resultados obtenidos en las Prueba Saber 11, la clasificación para los planteles del municipio los ubica en categoría D, siendo esta la peor clasificación, pues indica que la mayoría de los estudiantes se encuentran en los resultados inferiores o muy inferior de las pruebas de estado.
La clasificación muy inferior obtenida para los planteles educativos se debe a los escasos recursos para invertir en calidad, el tema de la intervención que actualmente tiene el municipio, que frena y dilata procesos educativos, y las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, que con bajos resultados obtenidos en las pruebas, afectan la clasificación de las instituciones educativas del municipio.

Es así como en el banco de programas y proyectos del Municipio de Uribia se encuentra inscrito el proyecto con código No. 2023448470003 de objeto ***Implementación de proyectos, actividades y servicios para el mejoramiento de la calidad educativa, bienestar docente y funcionamiento de la secretaría de educación como estrategia de fortalecimiento del sector educativo vigencia 2023 en Uribia,*** dentro del cual se encuentra incluido el componente de Construcción, ampliación, adecuación y mantenimiento de infraestructura educativa (incluye internados).
Es por ello que resulta necesario contar con una persona jurídica o natural que atendiendo la necesidad expuesta, pueda ejecutar las obras que se requieren. Así, se requiere celebrar un contrato para la ejecución del objeto referenciado.

**ESTRUCTURA DEL PROYECTO**

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Dificultad de conseguir los recursos financieros y la disponibilidad presupuestal | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Retraso en la contratación del proyecto | Retraso en la contratación del proyecto |
| 2-Componente (Productos) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Retraso en la contratación del proyecto | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Retraso en el cronograma de la obra | Ejecutar el proyecto ante de que se avecine la segunda ola invernal en la región (Octubre – Diciembre) |
| 3-Actividad | De mercado | Accidentes en la obra | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 3. Moderado | Lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | Señalización preventiva en el sitio de la obra y uso de elementos de seguridad en la obra. |

***Tabla 1. Estructura Del Proyecto***

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN:** | **Departamento:** | La Guajira | **N° de Beneficiarios** | **CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** |
| | **Municipio:** | Uribia | | | |
| | **Corregimiento:** | Si. Aplica | 3.705 | Sí | Recursos Propios. |

El proyecto se llevará a cabo en el Municipio de Uribia, La Guajira, específicamente en la zona rural dispersa en los diferentes corregimientos. Como se evidencia en la Ilustración Nº 1, el objetivo principal es la construcción de seis aulas y la realización de adecuaciones generales en nueve instituciones educativas.

| GEORREFERENCIACIÓN | | |
|---|---|---|
| **SEDE** | **LATITUD** | **LONGITUD** |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU (CONTRUCCION DE AULA) | 11°59'28.18"N | 71°56'28.40"O |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI (CONTRUCCION DE AULA) | 11°62'76.57"N | 72°37'77.86"O |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA (CONTRUCCION DE AULA) | 12°0'49.65"N | 72°4'24.84"O |
| CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA | 12°32'09.39"N | 71°32'61.55"O |
| CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN | 12°26'22.61"N | 71°51'71.28"O |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES | 12°27'26.95"N | 71°41'60.86"O |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA | 12°17'45.21"N | 71°26'46.11"O |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK | 12°16'06.21"N | 71°14'1.21"O |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDA – SEDE: WAAI | 12°28'50.75"N | 71°80'23.79"O |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ – SEDE WARRERAPU #1 | 11°43'21"N | 72°14'47"O |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE SUKULUWOU | 11°33'24"N | 72°09'14"O |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE WALAKALIT #1 | 11°68'43.81"N | 72°21'30.23"O |

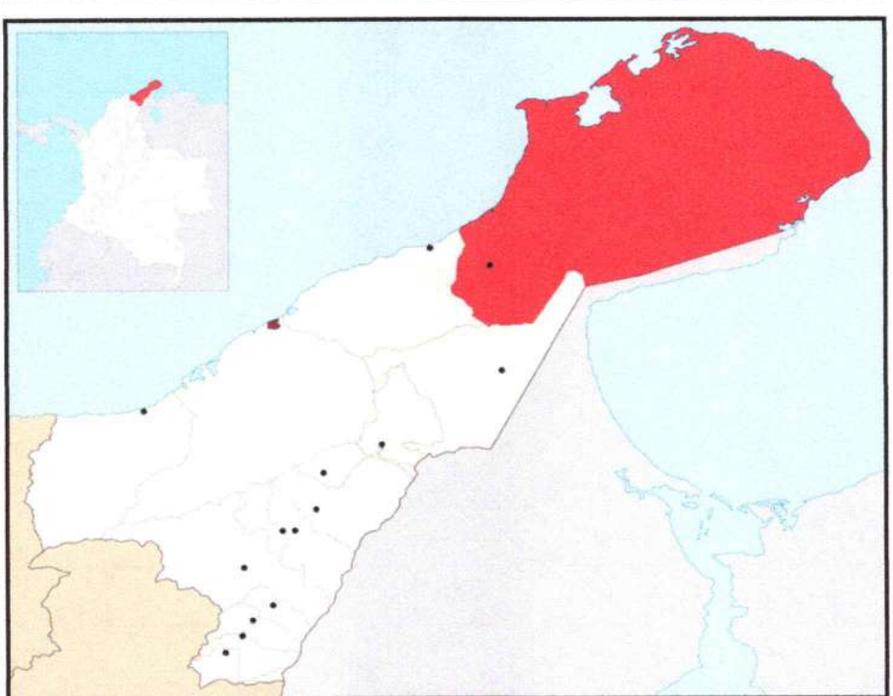


***Ilustración 1. Localización Del Proyecto***

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | x | ***CONVENIO:*** | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | X | ***INFORME FINAL:*** | |

| AVANCE DE EJECUCIÓN | % | FASE | ÁREA DE INFLUENCIA | | ALERTAS NO SUBSANADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| **FÍSICO** | 49,78% | Ejecución | **URBANO** | | - |
| **FINANCIERO** | 49,78% | | **RURAL** | X | - |

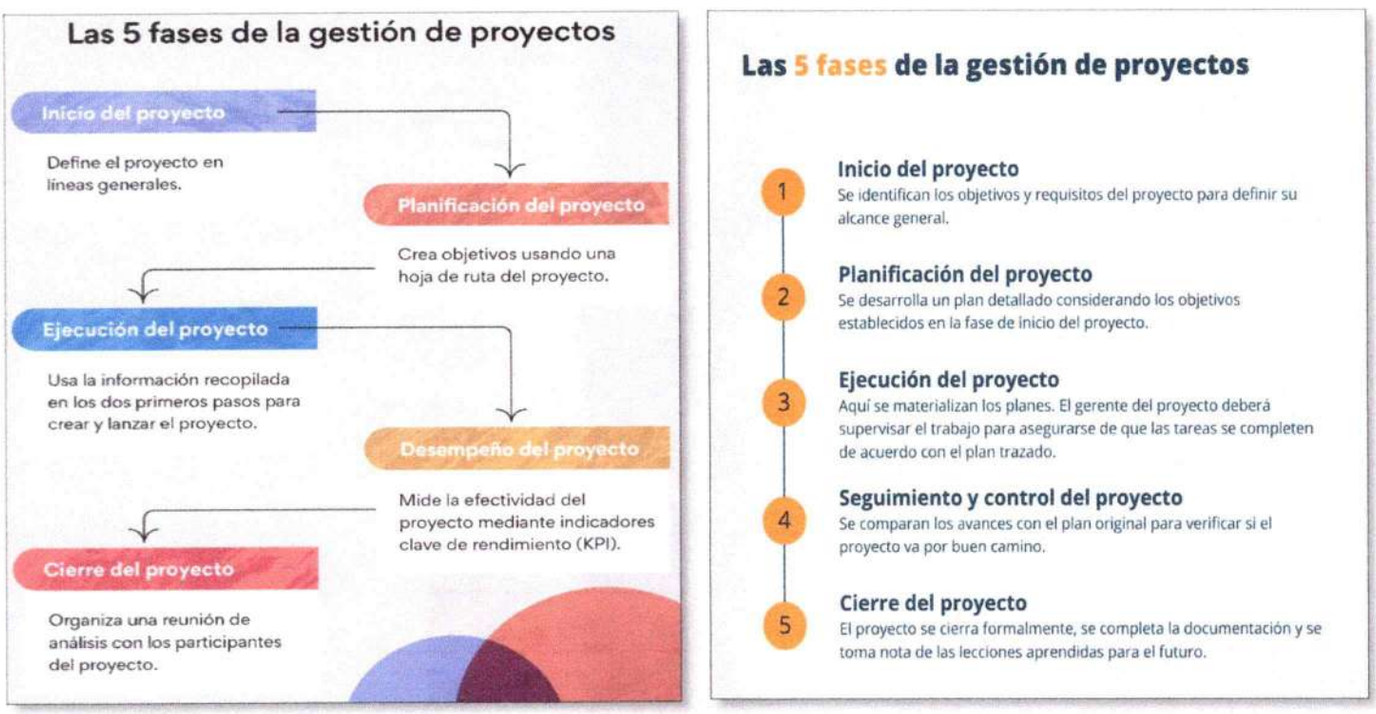



***Ilustración 2. Fases De La Gestión De Proyectos.***

**RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO**

| CONTRATO N° | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| 008 DE 2024. | 04 De Junio De 2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. |

**3. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Obra N°:** | 008 | **De FECHA** | 04/06/ 2024 | **Modalidad de Contratación:** | Mínima Cuantía | | **Mínima Cuantía N°:** | IMC 008 DEL 2023 | |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE URIBIA | | | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERAULAS 2024 | | | **NIT:** | 901.837.680-1 |
| **Representante Legal:** | LUIS HERNÁN LOAIZA GIL | | | **C.C:** | 84.025.804 Expedida en Riohacha. | | **EMAIL:** | Construhabitarq2024@gmail.com | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. | | | **Contratante:** | MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. | | **VALOR:** | TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($31.998.814,00) M/CTE MONEDA CORRIENTE. | |

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO INCIAL DEL CONTRATO:** | SESENTA (60) DIAS. | **PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:** | No. Aplica | **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:** | SESENTA (60) DIAS. |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO:** | TREINTA Y UNO (31) DIAS. | **ACTA DE INCIO:** | Doce (12) de junio del 2024. | **VALOR Y FECHA DEL ANTICIPO 40%:** | $ 12.799.525,00 M/CTE<br>12/06/2024 |
| **SUPERVISOR:** | FABIAN JOSE BRIEVA IGUARAN | **FORMA DE PAGO:** | el municipio pagara un 40% del valor resultante del contrato a través de un anticipo y el restante mediante actas parciales y acta final. | **VALOR Y FECHA DEL ACTA PARCIAL 001:** | **No Aplica** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 31.998.814,00 M/CTE | **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PROYECTADA:** | Once (11) de agosto del 2024. | **FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | Once (11) de agosto del 2024. |

| **ACTAS DE SUSPENSIÓN:** | **NUMERO** | **FECHA** | **ACTAS DE REINICIO:** | **NUMERO** | **FECHA** |
|---|---|---|---|---|---|
| | No. Aplica | No. Aplica | | No. Aplica | No. Aplica |

| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** | | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **ACTAS PARCIALES SUSCRITAS** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programada** | **Ejecutada** | **Programada** | **Ejecutada** | **N°** | **Valor del Acta y Fecha** | **Valor a Pagar Amortizado** |
| 60% | 49,78% | 60% | 49,78% | ANTICIPO 40% | NO APLICA DEBIDO A QUE NO HUBO ACTAS PARCIALES | $ 12.799.525,00 M/CTE<br>12/06/2024 |
| | | | | | **Total Valor Pagado:** | $ 12.799.525,00 M/CTE |
| | | | | | **Saldo por Pagar:** | $ 19.199.289,00 M/CTE |

| **CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (DP):** | | | **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (RP):** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **N°** | 313 | | **N°** | 604 |
| | **Valor** | $ 39.991.792,00 | | **Valor** | $ 31.998.814,00 |
| | **Fecha** | 13/03/2024 | | **Fecha** | 04/06/2024 |

| | |
|---|---|
| **RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S):** | **2.3.2.02.02.09** SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES **($ 31.998.814,00)** |

## 3.2 LOCALIZACIÓN

| **UBICACIÓN GENERAL** | **ESPECIFICA** |
|---|---|
| **REGION:** CARIBE<br>**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA<br>**MUNICIPIO:** URIBIA<br>**CENTRO POBLADO:** ZONA RURAL<br>**RESGUARDO:** ALTA Y MEDIA GUAJIRA | DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN |

***Tabla 2. Localización Del Proyecto***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | x | ***CONVENIO:*** | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | **X** | ***INFORME FINAL:*** | |

### 3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

LIDERÉ AL EQUIPO DE TRABAJO, SIENDO UNA PER LA **SUPERVISIÓN** FUE LA OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULAR AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA **MINIMA CUANTIA**, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS ESTABLECIDOS. ENTRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES COMO SUPERVISORA, PUEDO DESTACAR QUE:

- SONA EN QUIEN EL EQUIPO CONFIÓ Y NO FUI DE TEMER PARA LOS DEMÁS COMPAÑEROS.
- COORDINE LAS TAREAS DEL PERSONAL.
- GARANTICE EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.
- TOMÉ DECISIONES PARA LA OBRA.
- EVALUÉ EL TRABAJO DEL PERSONAL.
- CONVOQUE COMITÉ DE OBRA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES.

EL SUPERVISOR ES UN LIDER, QUE MANEJA TODAS LAS ÁREAS DEL PROYECTO. SERÁ EL ENCARGADO DE ALINEAR, DARLE ORDEN A UNA EMPRESA PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO CONCRETO DE LA ORGANIZACIÓN. SOMOS QUIENES NOS ENCARGAMOS DE ASESORAR A TODOS LOS TRABAJADORES QUE LO NECESITEN EN ALGÚN MOMENTO.

### 3.4 ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS

EL CONTRATO DE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN ESTADO DE EJECUCIÓN, TIENE UNA DURACIÓN DE SESENTA (60) DÍAS, LLEVANDO HASTA LA FECHA **EL 49,78% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**, TOMANDO COMO FECHA DE INICIACIÓN EL DÍA **DOCE (12) DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**, Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL EL **ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**.

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

## 3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONTRATOS

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIF. GRAL. | ESPECIF. PART. | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES** | | | | |
| | | | | **CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU** | | | | |
| | | | | **1. PRELIMINARES** | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL CON RETIRO | M2 | 0,00 | $ 36.201,00 | $ - |
| | 1,2 | | 1,2 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 0,00 | $ 6.429,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| | | | | **2. EXCAVACIONES Y CIMENTACION** | | | | |
| | 2,1 | | 2,1 | EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO DE 0,4 X 0,4 Mt | M3 | 0,00 | $ 84.912,00 | $ - |
| | 2,2 | | 2,2 | CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 0,00 | $ 1.086.070,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| | | | | **3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | |
| | 3,1 | | 3,1 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25X0,25 MT | ML | 0,00 | $ 148.681,00 | $ - |
| | 3,2 | | 3,2 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,25 X 0,25 MT | ML | 0,00 | $ 203.617,00 | $ - |
| | 3,3 | | 3,3 | ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2 | KG | 0,00 | $ 15.564,00 | $ - |
| | 3,4 | | 3,4 | COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MT | ML | 0,00 | $ 122.578,00 | $ - |
| | 3,5 | | 3,5 | COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,15 MT | ML | 0,00 | $ 147.764,00 | $ - |
| | 3,6 | | 3,6 | VIGA AMARRE SOBRE MURO, CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 X 0,25 MT | ML | 0,00 | $ 171.344,00 | $ - |
| | 3,7 | | 3,7 | VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,15 | ML | 0,00 | $ 128.313,00 | $ - |
| | 3,8 | | 3,8 | ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 MT E: 0,1 MT | ML | 0,00 | $ 106.636,00 | $ - |
| | 3,9 | | 3,9 | SILLAS EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI DE 0,5 MT H: 0,3 MT | M2 | 0,00 | $ 481.274,00 | $ - |
| | 3,10 | | 3,10 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,1 MT | ML | 0,00 | $ 60.754,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| | | | | **4. MAMPOSTERIA** | | | | |
| | 4,1 | | 4,1 | MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO SPLIT DE UNA CARA 0.15X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA | M2 | 0,00 | $ 129.784,00 | $ - |
| | 4,2 | | 4,2 | MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO CALADO - MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO | M2 | 0,00 | $ 113.809,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| | | | | **5. PAÑETES** | | | | |
| | 5,1 | | 5,1 | PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 | M2 | 0,00 | $ 37.975,00 | $ - |
| | 5,2 | | 5,2 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 0,00 | $ 15.318,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| | | | | **6. PISOS** | | | | |
| | 6,1 | | 6,1 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO | M3 | 0,00 | $ 104.704,00 | $ - |
| | 6,2 | | 6,2 | PISO EN CONCRETO 1,2,3 ESP 0,07 M | M2 | 0,00 | $ 112.663,00 | $ - |
| | 6,3 | | 6,3 | PISO EN TABLON VITRIFICADO | M2 | 0,00 | $ 129.383,00 | $ - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,4 | | 6,4 | ZOCALOS EN PIEDRA CHINA | ML | 0,00 | $ 86.741,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **7. CUBIERTA** | | | | | | | | |
| | 7,1 | | 7,1 | LAMINA ONDULADA DE AC | M2 | 0,00 | $ 112.373,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **8. ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | |
| | 8,1 | | 8,1 | CERCHA DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE 2" | ML | 0,00 | $ 986.162,00 | $ - |
| | 8,2 | | 8,2 | CERCHA DE ESTRUC MET. ANGULO DE 1", VARILLAS DE 1/2" | ML | 0,00 | $ 527.602,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **9. CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | |
| | 9,1 | | 9,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 18 CON MARCO , SIN PROTECTOR | M2 | 0,00 | $ 765.825,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **10. PINTURAS Y ACABADOS** | | | | | | | | |
| | 10,1 | | 10,1 | ESTUCO PARA MUROS INTERIORES | M2 | 0,00 | $ 37.133,00 | $ - |
| | 10,2 | | 10,2 | PINTURA EN VINILO TIPO 1, DOS MANOS, MUROS Y CALADOS | M2 | 0,00 | $ 23.857,00 | $ - |
| | 10,3 | | 10,3 | LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES | GL | 0,00 | $ 1.971.368,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **VALOR CONSTRUCCION 1 AULA** | | | | | | | | $ - |
| **VALOR CONSTRUCCION 2 AULAS** | | | | | | | | $ - |
| **CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI** | | | | | | | | |
| **1. PRELIMINARES** | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL CON RETIRO | M2 | 0,00 | $ 36.201,00 | $ - |
| | 1,2 | | 1,2 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 0,00 | $ 6.429,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **2. EXCAVACIONES Y CIMENTACION** | | | | | | | | |
| | 2,1 | | 2,1 | EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO DE 0,4 X 0,4 Mt | M3 | 0,00 | $ 84.912,00 | $ - |
| | 2,2 | | 2,2 | CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 0,00 | $ 1.086.070,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | |
| | 3,1 | | 3,1 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25X0,25 MT | ML | 0,00 | $ 148.681,00 | $ - |
| | 3,2 | | 3,2 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,25 X 0,25 MT | ML | 0,00 | $ 203.617,00 | $ - |
| | 3,3 | | 3,3 | ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2 | KG | 0,00 | $ 15.564,00 | $ - |
| | 3,4 | | 3,4 | COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MT | ML | 0,00 | $ 122.578,00 | $ - |
| | 3,5 | | 3,5 | COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,15 MT | ML | 0,00 | $ 147.764,00 | $ - |
| | 3,6 | | 3,6 | VIGA AMARRE SOBRE MURO, CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 X 0,25 MT | ML | 0,00 | $ 171.344,00 | $ - |
| | 3,7 | | 3,7 | VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,15 | ML | 0,00 | $ 128.313,00 | $ - |
| | 3,8 | | 3,8 | ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 MT E: 0,1 MT | ML | 0,00 | $ 106.636,00 | $ - |
| | 3,9 | | 3,9 | SILLAS EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI DE 0,5 MT H: 0,3 MT | M2 | 0,00 | $ 481.274,00 | $ - |
| | 3,10 | | 3,10 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,1 MT | ML | 0,00 | $ 60.754,00 | $ - |

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **4. MAMPOSTERIA** | | | | | | | | |
| | 4,1 | | 4,1 | MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO SPLIT DE UNA CARA 0.15X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO | M2 | 0,00 | $ 129.784,00 | $ - |
| | 4,2 | | 4,2 | MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO CALADO - MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO | M2 | 0,00 | $ 113.809,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **5. PAÑETES** | | | | | | | | |
| | 5,1 | | 5,1 | PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 | M2 | 0,00 | $ 37.975,00 | $ - |
| | 5,2 | | 5,2 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 0,00 | $ 15.318,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **6. PISOS** | | | | | | | | |
| | 6,1 | | 6,1 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO | M3 | 0,00 | $ 104.704,00 | $ - |
| | 6,2 | | 6,2 | PISO EN CONCRETO 1,2,3 ESP 0,07 M | M2 | 0,00 | $ 112.663,00 | $ - |
| | 6,3 | | 6,3 | PISO EN TABLON VITRIFICADO | M2 | 0,00 | $ 129.383,00 | $ - |
| | 6,4 | | 6,4 | ZOCALOS EN PIEDRA CHINA | ML | 0,00 | $ 86.741,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **7. CUBIERTA** | | | | | | | | |
| | 7,1 | | 7,1 | LAMINA ONDULADA DE AC | M2 | 0,00 | $ 112.373,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **8. ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | |
| | 8,1 | | 8,1 | CERCHA DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE 2" | ML | 0,00 | $ 986.162,00 | $ - |
| | 8,2 | | 8,2 | CERCHA DE ESTRUC MET. ANGULO DE 1", VARILLAS DE 1/2" | ML | 0,00 | $ 527.602,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **9. CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | |
| | 9,1 | | 9,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 18 CON MARCO , SIN PROTECTOR | M2 | 0,00 | $ 765.825,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **10. PINTURAS Y ACABADOS** | | | | | | | | |
| | 10,1 | | 10,1 | ESTUCO PARA MUROS INTERIORES | M2 | 0,00 | $ 37.133,00 | $ - |
| | 10,2 | | 10,2 | PINTURA EN VINILO TIPO 1, DOS MANOS, MUROS Y CALADOS | M2 | 0,00 | $ 23.857,00 | $ - |
| | 10,3 | | 10,3 | LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES | GL | 0,00 | $ 1.971.368,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **VALOR CONSTRUCCION 1 AULA** | | | | | | | | $ - |
| **VALOR CONSTRUCCION 2 AULAS** | | | | | | | | $ - |
| **CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA** | | | | | | | | |
| **1. PRELIMINARES** | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL CON RETIRO | M2 | 0,00 | $ 36.201,00 | $ - |
| | 1,2 | | 1,2 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 0,00 | $ 6.429,00 | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ - |
| **2. EXCAVACIONES Y CIMENTACION** | | | | | | | | |
| | 2,1 | | 2,1 | EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO DE 0,4 X 0,4 Mt | M3 | 0,00 | $ 84.912,00 | $ - |
| | 2,2 | | 2,2 | CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 0,00 | $ 1.086.070,00 | $ - |

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | | | | $ - |
| **3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | |
| | 3,1 | | 3,1 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25X0,25 MT | ML | 0,00 | $ 148.681,00 | $ | - |
| | 3,2 | | 3,2 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,25 X 0,25 MT | ML | 0,00 | $ 203.617,00 | $ | - |
| | 3,3 | | 3,3 | ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2 | KG | 0,00 | $ 15.564,00 | $ | - |
| | 3,4 | | 3,4 | COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MT | ML | 0,00 | $ 122.578,00 | $ | - |
| | 3,5 | | 3,5 | COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,15 MT | ML | 0,00 | $ 147.764,00 | $ | - |
| | 3,6 | | 3,6 | VIGA AMARRE SOBRE MURO, CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 X 0,25 MT | ML | 0,00 | $ 171.344,00 | $ | - |
| | 3,7 | | 3,7 | VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,15 | ML | 0,00 | $ 128.313,00 | $ | - |
| | 3,8 | | 3,8 | ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 MT E: 0,1 MT | ML | 0,00 | $ 106.636,00 | $ | - |
| | 3,9 | | 3,9 | SILLAS EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI DE 0,5 MT H: 0,3 MT | M2 | 0,00 | $ 481.274,00 | $ | - |
| | 3,10 | | 3,10 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,1 MT | ML | 0,00 | $ 60.754,00 | $ | - |
| Subtotal | | | | | | | | $ | - |
| **4. MAMPOSTERIA** | | | | | | | | | |
| | 4,1 | | 4,1 | MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO SPLIT DE UNA CARA 0.15X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO | M2 | 0,00 | $ 129.784,00 | $ | - |
| | 4,2 | | 4,2 | MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO CALADO - MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO | M2 | 0,00 | $ 113.809,00 | $ | - |
| Subtotal | | | | | | | | $ | - |
| **5. PAÑETES** | | | | | | | | | |
| | 5,1 | | 5,1 | PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 | M2 | 0,00 | $ 37.975,00 | $ | - |
| | 5,2 | | 5,2 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 0,00 | $ 15.318,00 | $ | - |
| Subtotal | | | | | | | | $ | - |
| **6. PISOS** | | | | | | | | | |
| | 6,1 | | 6,1 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO | M3 | 0,00 | $ 104.704,00 | $ | - |
| | 6,2 | | 6,2 | PISO EN CONCRETO 1,2,3 ESP 0,07 M | M2 | 0,00 | $ 112.663,00 | $ | - |
| | 6,3 | | 6,3 | PISO EN TABLON VITRIFICADO | M2 | 0,00 | $ 129.383,00 | $ | - |
| | 6,4 | | 6,4 | ZOCALOS EN PIEDRA CHINA | ML | 0,00 | $ 86.741,00 | $ | - |
| Subtotal | | | | | | | | $ | - |
| **7. CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| | 7,1 | | 7,1 | LAMINA ONDULADA DE AC | M2 | 0,00 | $ 112.373,00 | $ | - |
| Subtotal | | | | | | | | $ | - |
| **8. ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | | |
| | 8,1 | | 8,1 | CERCHA DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE 2" | ML | 0,00 | $ 986.162,00 | $ | - |
| | 8,2 | | 8,2 | CERCHA DE ESTRUC MET. ANGULO DE 1", VARILLAS DE 1/2" | ML | 0,00 | $ 527.602,00 | $ | - |
| Subtotal | | | | | | | | $ | - |
| **9. CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | |
| | 9,1 | | 9,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 18 CON MARCO , SIN PROTECTOR | M2 | 0,00 | $ 765.825,00 | $ | - |
| Subtotal | | | | | | | | $ | - |
| **10. PINTURAS Y ACABADOS** | | | | | | | | | |
| | 10,1 | | 10,1 | ESTUCO PARA MUROS INTERIORES | M2 | 0,00 | $ 37.133,00 | $ | - |
| | 10,2 | | 10,2 | PINTURA EN VINILO TIPO 1, DOS MANOS, MUROS Y CALADOS | M2 | 0,00 | $ 23.857,00 | $ | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10,3 | | 10,3 | LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES | GL | 0,00 | $ 1.971.368,00 | $ | - |
| Subtotal | | | | | | | | $ | - |
| VALOR CONSTRUCCION 1 AULA | | | | | | | | $ | - |
| VALOR CONSTRUCCION 2 AULAS | | | | | | | | $ | - |
| SUBTOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | $ | - |
| ADECUACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES GENERALES | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 132,00 | $ 12.655,00 | $ | 1.670.460,00 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 96,00 | $ 28.541,00 | $ | 2.739.936,00 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 40,00 | $ 17.813,00 | $ | 712.520,00 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 28,00 | $ 17.813,00 | $ | 498.764,00 |
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 2,00 | $ 39.134,00 | $ | 78.268,00 |
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 36,00 | $ 14.334,00 | $ | 516.024,00 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 24,00 | $ 195.433,00 | $ | 4.690.392,00 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 20,00 | $ 45.788,00 | $ | 915.760,00 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 28,00 | $ 83.949,00 | $ | 2.350.572,00 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 36,00 | $ 66.359,00 | $ | 2.388.924,00 |
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 24,00 | $ 8.331,00 | $ | 199.944,00 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 372,00 | $ 15.564,00 | $ | 5.789.808,00 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 40,00 | $ 24.918,00 | $ | 996.720,00 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 40,00 | $ 136.060,00 | $ | 5.442.400,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 28,00 | $ 136.060,00 | $ | 3.809.680,00 |
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 132,00 | $ 48.199,00 | $ | 6.362.268,00 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 96,00 | $ 113.240,00 | $ | 10.871.040,00 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 304,00 | $ 39.286,00 | $ | 11.942.944,00 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 304,00 | $ 29.833,00 | $ | 9.069.232,00 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 192,00 | $ 29.833,00 | $ | 5.727.936,00 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 110,00 | $ 15.081,00 | $ | 1.658.910,00 |
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 16,00 | $ 113.227,00 | $ | 1.811.632,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 14,00 | $ 218.517,00 | $ | 3.059.238,00 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 2,00 | $ 848.757,00 | $ | 1.697.514,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ 886.192,00 | $ | 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | $ | 85.887.078,00 |
| ADECUACIONES CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES GENERALES | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 66,00 | $ 12.655,00 | $ | 835.230,00 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 48,00 | $ 28.541,00 | $ | 1.369.968,00 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 40,00 | $ 17.813,00 | $ | 712.520,00 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 28,00 | $ 17.813,00 | $ | 498.764,00 |

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 1,00 | $ 39.134,00 | $ | 39.134,00 |
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 22,00 | $ 14.334,00 | $ | 315.348,00 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 12,00 | $ 195.433,00 | $ | 2.345.196,00 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 10,00 | $ 45.788,00 | $ | 457.880,00 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 28,00 | $ 83.949,00 | $ | 2.350.572,00 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 22,00 | $ 66.359,00 | $ | 1.459.898,00 |
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 12,00 | $ 8.331,00 | $ | 99.972,00 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 186,00 | $ 15.564,00 | $ | 2.894.904,00 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 40,00 | $ 24.918,00 | $ | 996.720,00 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 40,00 | $ 136.060,00 | $ | 5.442.400,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 28,00 | $ 136.060,00 | $ | 3.809.680,00 |
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 66,00 | $ 48.199,00 | $ | 3.181.134,00 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 48,00 | $ 113.240,00 | $ | 5.435.520,00 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 152,00 | $ 39.286,00 | $ | 5.971.472,00 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 152,00 | $ 29.833,00 | $ | 4.534.616,00 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 96,00 | $ 29.833,00 | $ | 2.863.968,00 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 55,00 | $ 15.081,00 | $ | 829.455,00 |
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 8,00 | $ 113.227,00 | $ | 905.816,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 8,00 | $ 218.517,00 | $ | 1.748.136,00 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 1,00 | $ 848.757,00 | $ | 848.757,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ 886.192,00 | $ | 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$** | **50.833.252,00** |
| **ADECUACIONES INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES** | | | | | | | | | |
| **ADECUACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 202,11 | $ 12.655,00 | $ | 2.557.702,05 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 290,10 | $ 28.541,00 | $ | 8.279.744,10 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 132,00 | $ 17.813,00 | $ | 2.351.316,00 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 84,00 | $ 17.813,00 | $ | 1.496.292,00 |
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 12,00 | $ 39.134,00 | $ | 469.608,00 |
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 108,36 | $ 14.334,00 | $ | 1.553.232,24 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 79,38 | $ 195.433,00 | $ | 15.513.471,54 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 82,15 | $ 45.788,00 | $ | 3.761.484,20 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 77,00 | $ 83.949,00 | $ | 6.464.073,00 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 108,36 | $ 66.359,00 | $ | 7.190.661,24 |
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 63,00 | $ 8.331,00 | $ | 524.853,00 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 937,44 | $ 15.564,00 | $ | 14.590.316,16 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 132,00 | $ 24.918,00 | $ | 3.289.176,00 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 132,00 | $ 136.060,00 | $ | 17.959.920,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 84,00 | $ 136.060,00 | $ | 11.429.040,00 |

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 527,80 | $ | 48.199,00 | $ 25.439.432,20 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 290,10 | $ | 113.240,00 | $ 32.850.924,00 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 528,10 | $ | 39.286,00 | $ 20.746.936,60 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 528,10 | $ | 29.833,00 | $ 15.754.807,30 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 581,70 | $ | 29.833,00 | $ 17.353.856,10 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 291,90 | $ | 15.081,00 | $ 4.402.143,90 |
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 32,00 | $ | 113.227,00 | $ 3.623.264,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 55,50 | $ | 218.517,00 | $ 12.127.693,50 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 9,00 | $ | 848.757,00 | $ 7.638.813,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ | 886.192,00 | $ 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 238.254.952,13** |
| **ADECUACIONES IINSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA** | | | | | | | | | |
| **ADECUACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 74,60 | $ | 12.655,00 | $ 944.063,00 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 115,45 | $ | 28.541,00 | $ 3.295.058,45 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 40,00 | $ | 17.813,00 | $ 712.520,00 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 28,00 | $ | 17.813,00 | $ 498.764,00 |
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 4,00 | $ | 39.134,00 | $ 156.536,00 |
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 43,30 | $ | 14.334,00 | $ 620.662,20 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 33,00 | $ | 195.433,00 | $ 6.449.289,00 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 35,00 | $ | 45.788,00 | $ 1.602.580,00 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 28,00 | $ | 83.949,00 | $ 2.350.572,00 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 43,30 | $ | 66.359,00 | $ 2.873.344,70 |
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 25,20 | $ | 8.331,00 | $ 209.941,20 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 372,00 | $ | 15.564,00 | $ 5.789.808,00 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 40,00 | $ | 24.918,00 | $ 996.720,00 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 40,00 | $ | 136.060,00 | $ 5.442.400,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 28,00 | $ | 136.060,00 | $ 3.809.680,00 |
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 74,60 | $ | 48.199,00 | $ 3.595.645,40 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 115,45 | $ | 113.240,00 | $ 13.073.558,00 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 377,22 | $ | 39.286,00 | $ 14.819.464,92 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 377,22 | $ | 29.833,00 | $ 11.253.604,26 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 310,00 | $ | 29.833,00 | $ 9.248.230,00 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 232,20 | $ | 15.081,00 | $ 3.501.808,20 |
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 16,00 | $ | 113.227,00 | $ 1.811.632,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 25,30 | $ | 218.517,00 | $ 5.528.480,10 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 7,00 | $ | 848.757,00 | $ 5.941.299,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ | 886.192,00 | $ 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 105.411.852,43** |
| **ADECUACIONES CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK** | | | | | | | | | |

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADECUACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 118,80 | $ | 12.655,00 | $ 1.503.414,00 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 86,40 | $ | 28.541,00 | $ 2.465.942,40 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 40,00 | $ | 17.813,00 | $ 712.520,00 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 28,00 | $ | 17.813,00 | $ 498.764,00 |
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 2,00 | $ | 39.134,00 | $ 78.268,00 |
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 32,40 | $ | 14.334,00 | $ 464.421,60 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 21,00 | $ | 195.433,00 | $ 4.104.093,00 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 20,00 | $ | 45.788,00 | $ 915.760,00 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 28,00 | $ | 83.949,00 | $ 2.350.572,00 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 32,40 | $ | 66.359,00 | $ 2.150.031,60 |
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 24,00 | $ | 8.331,00 | $ 199.944,00 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 334,00 | $ | 15.564,00 | $ 5.198.376,00 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 40,00 | $ | 24.918,00 | $ 996.720,00 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 40,00 | $ | 136.060,00 | $ 5.442.400,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 28,00 | $ | 136.060,00 | $ 3.809.680,00 |
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 118,80 | $ | 48.199,00 | $ 5.726.041,20 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 86,40 | $ | 113.240,00 | $ 9.783.936,00 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 264,00 | $ | 39.286,00 | $ 10.371.504,00 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 264,00 | $ | 29.833,00 | $ 7.875.912,00 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 163,00 | $ | 29.833,00 | $ 4.862.779,00 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 110,00 | $ | 15.081,00 | $ 1.658.910,00 |
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 16,00 | $ | 113.227,00 | $ 1.811.632,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 14,00 | $ | 218.517,00 | $ 3.059.238,00 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 2,00 | $ | 848.757,00 | $ 1.697.514,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ | 886.192,00 | $ 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 78.624.564,80** |
| **ADECUACIONES CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDA – SEDE: WAAI** | | | | | | | | | |
| **ADECUACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 145,20 | $ | 12.655,00 | $ 1.837.506,00 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 105,60 | $ | 28.541,00 | $ 3.013.929,60 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 40,00 | $ | 17.813,00 | $ 712.520,00 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 28,00 | $ | 17.813,00 | $ 498.764,00 |
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 4,00 | $ | 39.134,00 | $ 156.536,00 |
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 39,60 | $ | 14.334,00 | $ 567.626,40 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 26,40 | $ | 195.433,00 | $ 5.159.431,20 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 22,00 | $ | 45.788,00 | $ 1.007.336,00 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 28,00 | $ | 83.949,00 | $ 2.350.572,00 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 39,60 | $ | 66.359,00 | $ 2.627.816,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 26,40 | $ | 8.331,00 | $ 219.938,40 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 409,20 | $ | 15.564,00 | $ 6.368.788,80 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 40,00 | $ | 24.918,00 | $ 996.720,00 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 40,00 | $ | 136.060,00 | $ 5.442.400,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 28,00 | $ | 136.060,00 | $ 3.809.680,00 |
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 145,20 | $ | 48.199,00 | $ 6.998.494,80 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 105,60 | $ | 113.240,00 | $ 11.958.144,00 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 334,40 | $ | 39.286,00 | $ 13.137.238,40 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 334,40 | $ | 29.833,00 | $ 9.976.155,20 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 211,20 | $ | 29.833,00 | $ 6.300.729,60 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 121,00 | $ | 15.081,00 | $ 1.824.801,00 |
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 16,00 | $ | 113.227,00 | $ 1.811.632,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 14,00 | $ | 218.517,00 | $ 3.059.238,00 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 4,00 | $ | 848.757,00 | $ 3.395.028,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ | 886.192,00 | $ 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 94.117.217,80** |
| **ADECUACIONES INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ – SEDE WARRERAPU #1** | | | | | | | | | |
| **ADECUACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 189,40 | $ | 12.655,00 | $ 2.396.857,00 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 164,42 | $ | 28.541,00 | $ 4.692.711,22 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 144,60 | $ | 17.813,00 | $ 2.575.759,80 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 96,20 | $ | 17.813,00 | $ 1.713.610,60 |
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 5,00 | $ | 39.134,00 | $ 195.670,00 |
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 46,20 | $ | 14.334,00 | $ 662.230,80 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 48,20 | $ | 195.433,00 | $ 9.419.870,60 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 34,00 | $ | 45.788,00 | $ 1.556.792,00 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 96,20 | $ | 83.949,00 | $ 8.075.893,80 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 46,20 | $ | 66.359,00 | $ 3.065.785,80 |
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 37,00 | $ | 8.331,00 | $ 308.247,00 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 841,00 | $ | 15.564,00 | $ 13.089.324,00 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 144,60 | $ | 24.918,00 | $ 3.603.142,80 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 144,60 | $ | 136.060,00 | $ 19.674.276,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 96,20 | $ | 136.060,00 | $ 13.088.972,00 |
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 234,10 | $ | 48.199,00 | $ 11.283.385,90 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 164,42 | $ | 113.240,00 | $ 18.618.920,80 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 605,10 | $ | 39.286,00 | $ 23.771.958,60 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 605,10 | $ | 29.833,00 | $ 18.051.948,30 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 308,84 | $ | 29.833,00 | $ 9.213.623,72 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 205,00 | $ | 15.081,00 | $ 3.091.605,00 |

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 19,00 | $ | 113.227,00 | $ 2.151.313,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 24,00 | $ | 218.517,00 | $ 5.244.408,00 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 5,00 | $ | 848.757,00 | $ 4.243.785,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ | 886.192,00 | $ 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 180.676.283,74** |
| **ADECUACIONES CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE SUKULUWOU** | | | | | | | | | |
| **ADECUACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 149,30 | $ | 12.655,00 | $ 1.889.391,50 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 230,90 | $ | 28.541,00 | $ 6.590.116,90 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 210,50 | $ | 17.813,00 | $ 3.749.636,50 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 123,10 | $ | 17.813,00 | $ 2.192.780,30 |
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 7,00 | $ | 39.134,00 | $ 273.938,00 |
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 86,60 | $ | 14.334,00 | $ 1.241.324,40 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 63,00 | $ | 195.433,00 | $ 12.312.279,00 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 65,20 | $ | 45.788,00 | $ 2.985.377,60 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 123,10 | $ | 83.949,00 | $ 10.334.121,90 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 86,60 | $ | 66.359,00 | $ 5.746.689,40 |
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 45,20 | $ | 8.331,00 | $ 376.561,20 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 743,63 | $ | 15.564,00 | $ 11.573.850,91 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 210,50 | $ | 24.918,00 | $ 5.245.239,00 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 210,50 | $ | 136.060,00 | $ 28.640.630,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 123,10 | $ | 136.060,00 | $ 16.748.986,00 |
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 377,22 | $ | 48.199,00 | $ 18.181.626,78 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 230,90 | $ | 113.240,00 | $ 26.147.116,00 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 377,22 | $ | 39.286,00 | $ 14.819.464,92 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 377,22 | $ | 29.833,00 | $ 11.253.604,26 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 461,80 | $ | 29.833,00 | $ 13.776.879,40 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 232,20 | $ | 15.081,00 | $ 3.501.808,20 |
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 16,00 | $ | 113.227,00 | $ 1.811.632,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 25,30 | $ | 218.517,00 | $ 5.528.480,10 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 7,00 | $ | 848.757,00 | $ 5.941.299,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ | 886.192,00 | $ 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 211.749.025,27** |
| **ADECUACIONES CCENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE WALAKALIT #1** | | | | | | | | | |
| **ADECUACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| | 1,1 | | 1,1 | PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO | M2 | 65,00 | $ | 12.655,00 | $ 822.575,00 |
| | 1,2 | | 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 32,50 | $ | 28.541,00 | $ 927.582,50 |
| | 1,3 | | 1,3 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO | M2 | 30,00 | $ | 17.813,00 | $ 534.390,00 |
| | 1,4 | | 1,4 | DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO | M2 | 12,00 | $ | 17.813,00 | $ 213.756,00 |
| | 1,5 | | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 1,00 | $ | 39.134,00 | $ 39.134,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,6 | | 1,6 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE | M2 | 15,00 | $ | 14.334,00 | $ 215.010,00 |
| | 1,7 | | 1,7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 9,00 | $ | 195.433,00 | $ 1.758.897,00 |
| | 1,8 | | 1,8 | PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15 | ML | 10,00 | $ | 45.788,00 | $ 457.880,00 |
| | 1,9 | | 1,9 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION | ML | 24,00 | $ | 83.949,00 | $ 2.014.776,00 |
| | 1,10 | | 1,10 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM | M2 | 15,00 | $ | 66.359,00 | $ 995.385,00 |
| | 1,11 | | 1,11 | FILOS DE MUROS | ML | 10,00 | $ | 8.331,00 | $ 83.310,00 |
| | 1,12 | | 1,12 | ACERO DE REFUERZO A-60 | KG | 148,00 | $ | 15.564,00 | $ 2.303.472,00 |
| | 1,13 | | 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM | M2 | 30,00 | $ | 24.918,00 | $ 747.540,00 |
| | 1,14 | | 1,14 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | M2 | 30,00 | $ | 136.060,00 | $ 4.081.800,00 |
| | 1,15 | | 1,15 | ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI | M2 | 24,00 | $ | 136.060,00 | $ 3.265.440,00 |
| | 1,16 | | 1,16 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS | M2 | 65,00 | $ | 48.199,00 | $ 3.132.935,00 |
| | 1,17 | | 1,17 | CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 32,50 | $ | 113.240,00 | $ 3.680.300,00 |
| | 1,18 | | 1,18 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 109,00 | $ | 39.286,00 | $ 4.282.174,00 |
| | 1,19 | | 1,19 | PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M | M2 | 109,00 | $ | 29.833,00 | $ 3.251.797,00 |
| | 1,20 | | 1,20 | PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M | M2 | 265,00 | $ | 29.833,00 | $ 7.905.745,00 |
| | 1,21 | | 1,21 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO | ML | 39,00 | $ | 15.081,00 | $ 588.159,00 |
| | 1,22 | | 1,22 | SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES | ML | 6,00 | $ | 113.227,00 | $ 679.362,00 |
| | 1,23 | | 1,23 | PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS | M2 | 7,00 | $ | 218.517,00 | $ 1.529.619,00 |
| | 1,24 | | 1,24 | SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS | UND | 1,00 | $ | 848.757,00 | $ 848.757,00 |
| | 1,25 | | 1,25 | LIMPIEZA GENERAL | GL | 1,00 | $ | 886.192,00 | $ 886.192,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | **$ 45.245.987,50** |
| | | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS DE ADECUACION** | **$ 1.090.800.213,67** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL COSTO DEL PROYECTO (INCLUYE A.I.U)** | **$ 1.090.800.213,67** |

***Tabla 3. Presupuesto Detallado***

## 3.6 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y/O CONTRATO

Durante la ejecución del contrato, surgieron varias dificultades que requirieron soluciones efectivas, al momento de iniciar los trabajos se realizaron reuniones con los diferentes rectores y maestros para de manera articulada con los ya nombrados, organizando la entrega de las diferentes aulas a intervenir para así lograr el menor de los inconvenientes al momento de utilizar las aulas de clases para desarrollar las diferentes actividades del contrato sin que se viera afectada el normal funcionamiento de la institución.

debido al inicio del periodo de vacaciones de mitad de año, la empresa contratista de la obra logro realizar de manera eficiente las actividades contratadas ya que con la ausencia de los estudiantes, profesores y personal administrativos se pudieron ejecutar los trabajos sin restricciones.

## 4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

| ETAPA | ENTIDAD | TIPO DE ENTIDAD | TIPO DE RECURSOS | PERIODO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN | URIBIA | MUNICIPIOS | PROPIOS | 1 | $ 1.090.800.213,67 |
| | TOTAL, INVERSIÓN | | | TOTAL | $ 1.090.800.213,67 |
| TOTAL | | | | | **$ 1.090.800.213,67** |

***Tabla 4. Inversiones***

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

## POLIZAS DEL CONTRATO – POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** bcJB9gE+ZC3R645dRTjQGQ==

**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-D001

| No. PÓLIZA | BQ-100086831 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 28175191 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/06/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BARRANQUILLA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 04/06/2024 | 24:00 Horas Del | 04/02/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO INTERAULAS 2024 | No. DOC. IDENTIDAD | 901.837.680-1 |
| DIRECCIÓN | CL 12A N9-80 | TELÉFONO | 3005376494 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE URIBIA | No. DOC. IDENTIDAD | 892.115.155-4 |
| DIRECCIÓN | CALLE 12 NO. 8 - 61 | TELÉFONO | 777110 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE URIBIA | No. DOC. IDENTIDAD | 892.115.155-4 |
| DIRECCIÓN | CALLE 12 NO. 8 - 61 | TELÉFONO | 777110 |

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR LA CORRECCION EN EL OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES, ADECUACION , HABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA L GUAJIRA
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN SIN MODIFICACION
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.008 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y DORMITORIOS EN EL INTERNADO INDIGENA KASUTALAIN SEDE ALUATACHON DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 04/06/2024 | 24:00 Horas Del 04/02/2025 | 3.199.881,40 | 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 04/06/2024 | 24:00 Horas Del 04/02/2025 | 12.799.525,60 | 0,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 04/06/2024 | 24:00 Horas Del 04/02/2025 | 3.199.881,40 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 19.199.288,40 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| JOSE BLANCO MENDOZA | AGENTES | 100,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

**CONVENIO DE PAGO** DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/06/2024

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNOZ VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Hernan Zoaiza Gil
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.
HOJA No.
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - ANIF

***Ilustración 3. Póliza Según Acta De Inicio Anexo 1.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | *x* | ***CONVENIO:*** | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | ***X*** | ***INFORME FINAL:*** | |

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**
**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**
**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001**

| No. PÓLIZA | 8Q-100086831 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 28375191 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/06/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BARRANQUILLA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DIAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 04/06/2024 | 24:00 Horas Del | 04/02/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

**CONDICIONES PARTICULARES**

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901438268 - ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS (PART. 50%)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900292086- CONSTRUHABITARQ SAS (PART. 50%)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERAULAS 2024)

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111955"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFIANZADO A LA CARAVANA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - FASE A/A

*Ilustración 4. Póliza Según Acta De Inicio Anexo 1.*

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100086831** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERAULAS 2024** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE URIBIA / MUNICIPIO DE URIBIA ,** expedida por la Compañía en **11/06/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BARRANQUILLA** a los **11** dias del mes **JUNIO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

*Ilustración 5. Póliza Según Acta De Inicio Anexo 1.*

***CONTRATO DE OBRA:*** [x] ***CONVENIO:*** [ ]

***INFORME PARCIAL:*** [X] ***INFORME FINAL:*** [ ]

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

DEPARTAMENTO GUAJIRA

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA - LA GUAJIRA**

**HACIENDA**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

VIGENCIA FISCAL - 2024

| INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE REGISTRO | 604001 | FECHA DE EXPEDICIÓN | 04 DE JUNIO DEL 2024 |
| NÚMERO DE CDP | 313002 | FECHA DE EMISIÓN | 13 DE MARZO DEL 2024 |
| DOCUMENTO DE CONTROL | 0009 - MÍNIMA CUANTÍA | NUMERO CONTRATO | 008 |
| BENEFICIARIO | 901.837.680 - CONSORCIO INTERAULAS 2024 | | |
| CONCEPTO DEL REGISTRO | INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES,ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAFÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA,LA GUAJIRA | | |
| VALOR TOTAL DEL REGISTRO | $ 31.998.814,00 | SON: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L | |

| PROYECTO DE INVERSION | |
|---|---|
| SECCION | SECRETARIA DE EDUCACION |
| DEPENDENCIA | EDUCACIÓN |
| SECTOR | EDUCACIÓN |
| PROGRAMA | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2201) |
| SUBPROGRAMA | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN |
| PROYECTO | 2024448470028 - APOYO AL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA- 22 - EDUCACIÓN- 2201 - CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2201) |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| OBJETO DEL GASTO | 2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales |
| FUENTE O RECURSO | 1-RECURSOS PROPIOS ICLD |
| PRODUCTO MGA | 2201019 - Infraestructura educativa construida-2201019 |
| PRODUCTO CPC | 91121 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN |
| VALOR FUENTE | $ 31.998.814,00 |

FIRMA RESPONSABLE

FECHA IMPRESIÓN: JUN 12 2024 IP: 191.95.17.163 IMPRIMIÓ: dquintero ELABORÓ:

Página 1 de 1

***Ilustración 6. Registro Presupuestal***

**4.1 ANTICIPO**

| CONTRATO CON ANTICIPO | VALOR DE ANTICIPO | PORCENTAJE DE ANTICIPO | ORDEN DE PAGO Nº | FECHA DE COMPROBANTES DE EGRESO DE ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|
| SI | $ 12.799.525,00 M/CTE | 40% | 711006 | 12/07/2024 |

**ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA**

**SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

**NIT: 892-115-155-4**

FECHA ELABORACIÓN:

**12/07/2024**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | x | ***CONVENIO:*** | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | X | ***INFORME FINAL:*** | |

| | |
|---|---|
| **4.2 PRORROGA Y ADICIONES** | NO |

## 5. ASPECTOS TÉCNICOS Y GENERALES DEL CONTRATO

### ACTA DE INICIO

Busca

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

| | |
|---|---|
| CODIGO:700-06.06.02 | VERSION: 2.024 |
| COMUNICACIONES OFICIALES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |

**ACTA DE INICIO**

| | |
|---|---|
| **INVITACIÓN PUBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº:** | 008 DEL 4 DE JUNIO DE 2.024. |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. |
| **CÓDIGO BPIN:** | 2024448470028 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERAULAS 2.024. |
| **NIT:** | 901.837.680-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | LUIS HERNAN LOAIZA GIL. |
| **CEDULA DE CIUDADANIA Nº:** | 84.025.804 expedida en Riohacha. |
| **DIRECCIÓN:** | Calle 12ª Nº 9-80 en la ciudad de Riohacha. |
| **TELÉFONO:** | 3005374494 |
| **EMAIL:** | construhabitarq2024@gmail.com |
| **VALOR:** | TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS **($31.998.814,00)** |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | DOS (02) MESES. |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** (Objeto del Gasto y Fuente o Recurso): | 2.3.2.02.02.009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales.<br>1-RECURSOS PROPIOS ICLD. |
| **SECTOR:** | EDUCACIÓN. |
| **CERT. DISP. PRESUPESTAL Nº:** | 313002 del 13 de marzo del 2.024. |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL Nº:** | 604001 del 4 de junio del 2.024. |
| **GARANTIA DEL CONTRATO:** | **Póliza de Seguro de Cumplimiento Nº BQ-100086831**, expedida el 11 de junio de 2.024, con la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS:** | DOCE (12) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2.024). |
| **FECHA DEL ACTO MODIFICATORIO Nº 001:** | ONCE (11) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2.024). |

En el Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira, a los **doce (12) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2.024)**, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Uribia, el Arquitecto **FABIAN JOSE BRIEVA IGUARÁN**, como Supervisor, y el Señor **LUIS HERNAN LOAIZA GIL**, identificado con la cedula de ciudadanía **C.C. Nº 84.025.804** expedida en Riohacha, representante legal del **CONSORCIO INTERAULAS 2.024, con NIT. 901.837.680-1**, como el **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio a la **Invitación Pública de Mínima Cuantía Nº 008 DEL 2.024**, cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.**

**CONSIDERACIONES:**

**1.** Qué, entre **EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA**, se celebró la **Invitación Pública de Mínima Cuantía Nº 008 DEL 2.024**, de conformidad con los plazos, valores, condiciones y demás estipulaciones que se pactaron en el respectivo vínculo contractual, el cual tiene por objeto la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES**

Calle 12 No. 8 – 61
contactenos@uribia-laguajira.gov.co
alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

| | |
|---|---|
| CODIGO:700-06.06.02 | VERSION: 2.024 |
| COMUNICACIONES OFICIALES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |

**ACTA DE INICIO**

**EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA**", por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($31.998.814,00)**, por un término de **DOS (02) MESES**, dicha Oferta se suscribió bajo la modalidad de **Invitación Pública de Mínima Cuantía**, adjudicado a la **CONSORCIO INTERAULAS 2.024.**, identificado con **NIT. 901.837.680-1.**

**2.** Qué, a la Oferta en mención, se le constituyó la **Póliza de Seguro de Cumplimiento Nº BQ-100086831**, expedida el 11 de junio de 2.024, con la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

**3.** Qué, se expidió el **Registro Presupuestal Nro.** 604001 del 4 de junio del 2.024.

**4.** Qué, El Municipio de Uribia hará entrega del recurso que en este estudio se dispone así: **Pacto de Anticipo:** Las partes pactan un anticipo del 40% del valor del contrato, esto es, la suma de **DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($12.799.525,00)**.

**5.** Qué, en la **CLÁUSULA PRIMERA** del Modificatorio Nº 001 se cita lo siguiente: **Supervisión:** La supervisión del contrato será ejercida por el Profesional Universitario adscrito a la Secretaría de Obras Municipal, que ostenta el cargo de INTERVENTOR MUNICIPAL, quien tendrá como función la supervisión de la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del presente negocio jurídico. **Parágrafo primero:** Para ejercicio de las labores técnicas de supervisión podrá apoyarse en el personal profesional vinculado por medio de contrato de prestación de servicios para estos propósitos. **Parágrafo segundo:** En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero.

**6.** Qué, en virtud de las consideraciones anteriores, las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Dar inicio a la **Invitación Pública de Mínima Cuantía Nº 008 DEL 2.024**, con las características y condiciones señaladas en el Cuadro de la Referencia.

**SEGUNDO:** Fecha de Inicio y Terminación de la Oferta: Téngase como las fechas de inicio y terminación del contrato suscrito y debidamente señalado, lo siguiente:

**Fecha de Inicio:** Doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2.024).

**Fecha de Terminación:** Once (11) de agosto de dos mil veinticuatro (2.024).

Para constancia, se firma por los que en la presente acta intervienen. Dada en Uribia, La Guajira, Capital Indígena de Colombia, a los Doce (12) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2.024).

**POR EL CONTRATISTA:**

Luis Hernan Loaiza Gil

**LUIS HERNAN LOAIZA GIL.**
C.C. Nº 84.025.804 expedida en Riohacha.
Representante Legal.
**CONSORCIO INTERAULAS 2.024.**
Interventor.

**POR EL MUNICIPIO:**

Fabian Brieva

**FABIAN JOSE BRIEVA IGUARÁN.**
Supervisor.

Calle 12 No. 8 – 61
contactenos@uribia-laguajira.gov.co
alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

***Ilustración 7. Acta De Inicio***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | x | ***CONVENIO:*** | | | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | X | ***INFORME FINAL:*** | | | |

## 5.1 ANALISIS TÉCNICOS

- **Selección del Nuevo Espacio:**

La decisión de reubicar la bodega en dos oficinas abandonadas en el segundo piso del Palacio Municipal fue motivada por la necesidad de liberar el área de esparcimiento en el primer piso y optimizar el uso del espacio disponible. Estas oficinas, aunque obsoletas, ofrecían el potencial de ser acondicionadas adecuadamente para el almacenamiento de documentos y materiales.

- **Adecuación y Mejoras**

Para convertir las oficinas en una bodega funcional, se realizarán varias adecuaciones. Se instalará una puerta de comunicación de 1x2 metros en el espacio intermedio entre las dos oficinas para facilitar el acceso interno. También se añadirá una ventana de 0.4x2 metros para garantizar una adecuada ventilación e iluminación natural. Estas mejoras no solo optimizan la funcionalidad del área de almacenamiento, sino que también aseguran un ambiente de trabajo adecuado y respetan el espacio de esparcimiento de los funcionarios.

- **Desafíos y Soluciones**

Uno de los principales desafíos fue lograr el consenso entre las distintas dependencias de la Alcaldía respecto a la reubicación de la bodega. La solución se encontró mediante acuerdos que permitieron liberar las oficinas abandonadas en el segundo piso para su adecuación, mostrando una gestión eficiente y colaborativa entre las dependencias.

- **Impacto Durante la Construcción**

La construcción del cerramiento y la adecuación de la bodega pueden interferir temporalmente con el funcionamiento normal de la Secretaría de Educación y otras áreas del Palacio Municipal. Para mitigar estos impactos, se implementarán medidas de seguridad y planificación de actividades de construcción fuera del horario laboral, minimizando las molestias para los funcionarios y el público.

- **Conclusión:**

El análisis técnico del proyecto demuestra que la construcción del cerramiento perimetral y la reubicación de la bodega no solo resolverán problemas actuales de privacidad, seguridad y orden, sino que también mejorarán las condiciones laborales y la estética del entorno. La correcta ejecución del proyecto contribuirá al bienestar general de los funcionarios y al adecuado funcionamiento de la Secretaría de Educación y otras dependencias municipales, optimizando el uso del espacio en el Palacio Municipal y asegurando un entorno más funcional y agradable.

## 5.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan algunas recomendaciones y elementos de protección personal que deben tener en cuenta los trabajadores involucrados en este contrato para garantizar su seguridad y bienestar durante la ejecución del proyecto.

**Recomendaciones de Seguridad:**

- Todos los trabajadores deben recibir capacitación en salud y seguridad ocupacional antes de iniciar las actividades. Esta formación debe incluir el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP), medidas de prevención de riesgos y procedimientos de emergencia.
- Realizar inspecciones diarias del sitio de trabajo para identificar y corregir posibles riesgos o condiciones inseguras.
- Colocar señalización adecuada en las áreas de trabajo para alertar sobre riesgos específicos, como zonas de construcción, acceso restringido, materiales peligrosos, y salidas de emergencia.
- Limitar el acceso al sitio de construcción solo al personal autorizado para prevenir accidentes y garantizar la seguridad.
- Desarrollar y comunicar un plan de emergencia que incluya procedimientos para evacuaciones, primeros auxilios y comunicación con servicios de emergencia.

1. **Casco**

Un pintor debe usar casco un casco tipo B o tipo C, de forma permanente ya que brinda protección contra riesgos de golpes, impactos y salpicaduras de sustancias ígneas. Los cascos de seguridad se construyen con materiales resistentes a la acción del fuego, de solventes, a los impactos, abrasión y que posean baja conductividad. Algunos de los materiales utilizados con mayor frecuencia son plásticos laminados de alta resistencia y fibras de vidrio impregnadas en resina.

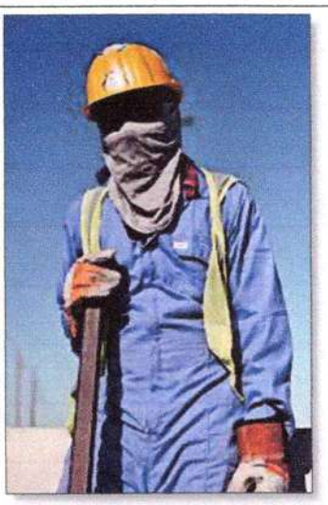


*Ilustración 8. Protección Casco*

**2. Gafas de seguridad**

Son lentes con protección lateral, transparente para interiores y oscuros para exteriores. Se usan para la operación de herramientas manuales, ya que para las herramientas eléctricas se debe sumar un protector facial.



*Ilustración 9. Protección Para La Vista*

**3. Ropa de seguridad**

Los overoles brindan protección, básicamente para aislar al cuerpo del contacto directo con el polvo, pinturas y solventes, además de algunos riesgos mecánicos como la abrasión, pinchazos y https://www.homecenter.com.co/static/landing/guiasdecompra/Guias_de_compra_2/img/que-riesgos-debe-prevenir-un-pintors.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | x | ***CONVENIO:*** | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | X | ***INFORME FINAL:*** | |



***Ilustración 10. Protección Overol***

**4. Productor auditivo**

Cuando se pinte con compresor y pistola hay que usar tapones elaborados en espuma, hule o silicona. Se caracterizan por ser blandos y la mayoría permiten ser moldeados por el usuario para adaptarlos de mejor manera al insertarlos en el canal auditivo. Los hay desechables y reutilizables. Su adecuado uso permite disminuir el ruido en hasta 15 dB (decibeles).

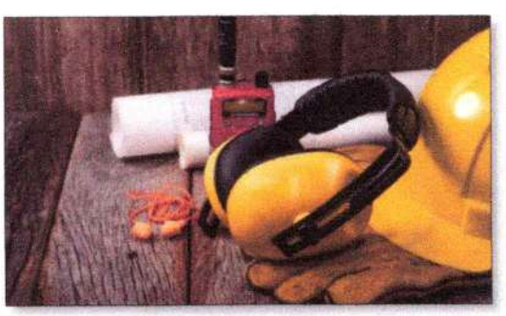


***Ilustración 11. Protección Oidos***

**5. Guantes**

**Cuero Descarne:** Son de cuero grueso y de uso mayoritario en diversas actividades pesadas. Protegen contra la abrasión intensa, https://www.homecenter.com.co/static/landing/guiasdecompra/Guias_de_compra_2/img/que-riesgos-debe-prevenir-un-pintors, fricción y raspaduras. Son adecuados para el manejo de herramientas y trabajo de piezas mecánicas. Es recomendable usarlo en ambientes secos, si se mojan pueden ser traspasados por sustancias irritantes. Hay de puño corto, largo y de estilo? mosquetero?. Pueden incluir refuerzos.

**PVC o caucho:** Utilizados en labores con manipulación de sustancias químicas, aceites y solventes. Brindan protección ante agentes químicos agresivos, detergentes y desengrasantes industriales.



***Ilustración 12. Protección Para Manos***

**6. Zapatos de seguridad**

El calzado de seguridad tiene por objetivo proteger los pies del riesgo de sufrir lesiones por golpes, aplastamientos, https://www.homecenter.com.co/static/landing/guiasdecompra/Guias_de_compra_2/img/que-riesgos-debe-prevenir-un-pintors y daños por la acción de sustancias corrosivas. Un pintor debe usar en forma permanente un zapato con puntera de seguridad.



***Ilustración 13. Protección Para Pies***

**7. <u>Arnés o cinturón de seguridad</u>**

Cuando el carpintero realiza trabajos en altura debe usar un arnés de seguridad de cuerpo entero y otros elementos para, que en caso de accidente, se pueda detener la caída.



***Ilustración 14. Protección Para Trabajos En Altura***

**8. <u>Protección respiratoria</u>**

El pintor debe usar mascarilla para evitar respirar el polvo cuando lija, o los solventes químicos de barnices y pinturas.



***Ilustración 15. Protección Para Pintores***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | x | ***CONVENIO:*** | | | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | X | ***INFORME FINAL:*** | | | |

## 6. CONTROL DE CALIDAD

**FUNCIONES DEL SUPERVISOR**

Entre las principales **funciones** que se destacan entre lo **que hace un Supervisor** se encuentra:


- Planificar, dirigir y controlar la **producción.**
- Implementación, desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de calidad para garantizar el cumplimiento de las políticas, así como la satisfacción del cliente por medio de la **interventoría**.
- Realizar inspecciones, pruebas, mediciones de los materiales, productos e instalaciones para verificar si cumplen con las especificaciones requeridas.
- Velar por el cumplimiento de las **normas ISO 9001**, así como los parámetros establecidos en el sistema de gestión de calidad adoptado por la empresa.
- Calificar aquellos productos que tengan detalles y cuál es la razón de la falla.
- Proponer acciones de mejora referentes a las metodologías de trabajo y las compensaciones de carga laboral entre los trabajadores.
- Revisar los requisitos del cliente y asegurarse de que el producto satisfaga lo requerido.
- **Supervisar** que los procesos de producción cumplan con las normas de calidad establecidas.
- Monitorear las operaciones de producción que estén acordes al cumplimiento de las normativas de calidad.
- Recopilar datos relevantes para la producción de informes estadísticos.
- Hacer seguimiento y control de los reclamos realizados por los clientes, así como garantizar que sean aplicados los mecanismos para la mejora de la producción y la satisfacción del cliente inconforme


Utilizar herramientas de calidad, además de asegurarse de que el personal cumpla con los estándares de calidad requeridos en cada uno de sus **procesos**.


## 8. SEGURIDAD SOCIAL

| TIPO DE APORTE | Nº PLANILLA | MES AL QUE CORRESPONDE |
|---|---|---|
| Salud | 9487728578 | Junio de 2024 |


## 10. ANEXOS:

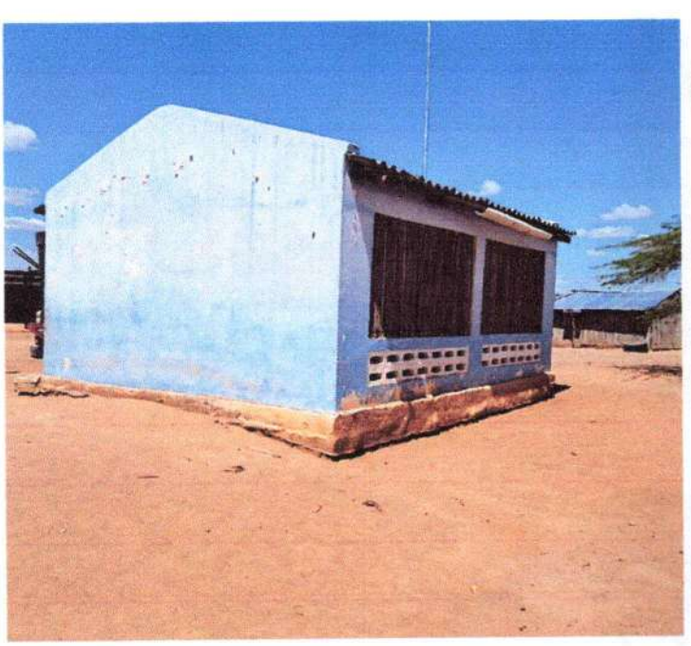


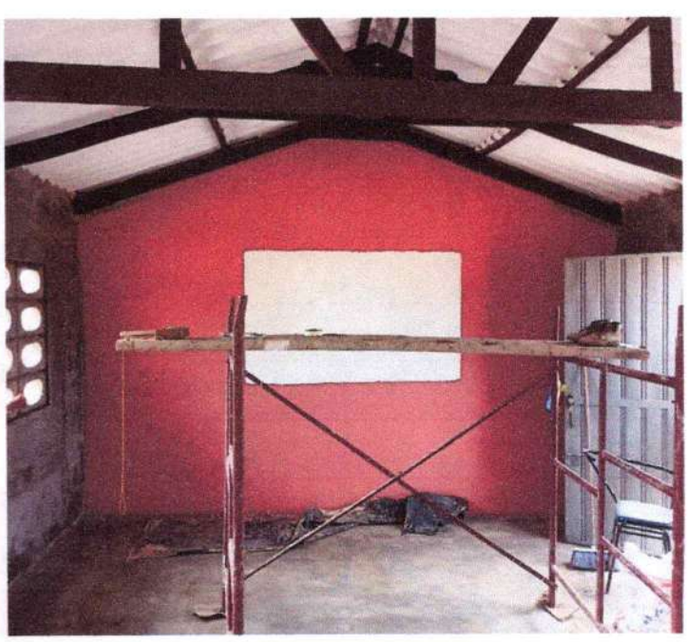


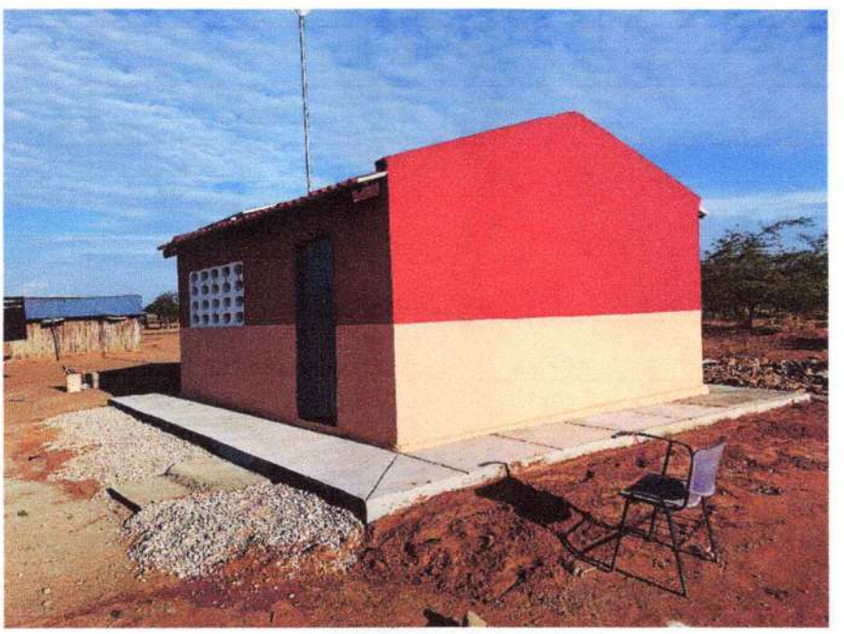

**EVIDENCIAS WALAKALIT #1**

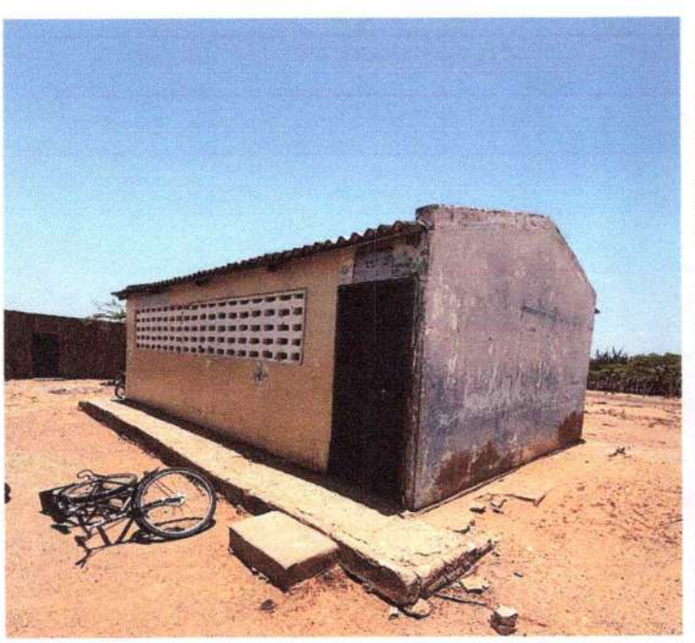

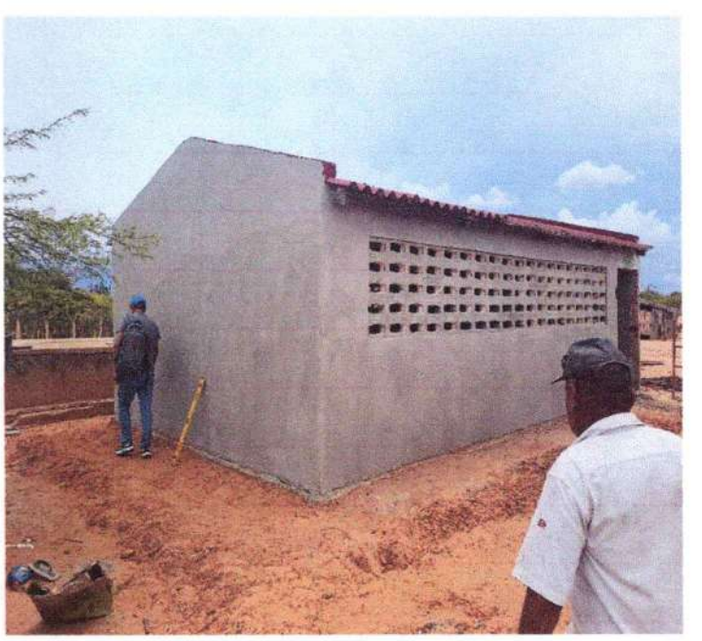

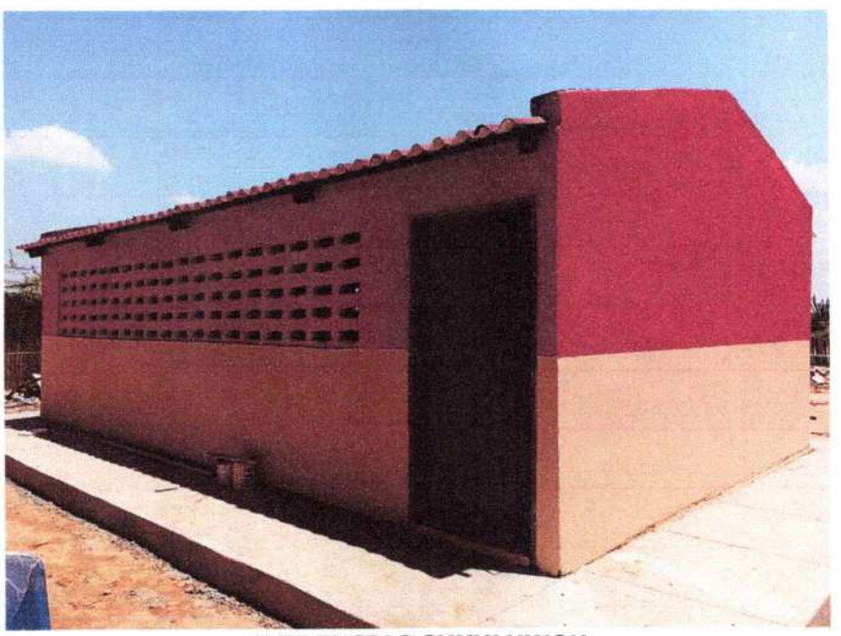


**EVIDENCIAS SUKULUWOU**







**EVIDENCIAS WARRERAPU #1**

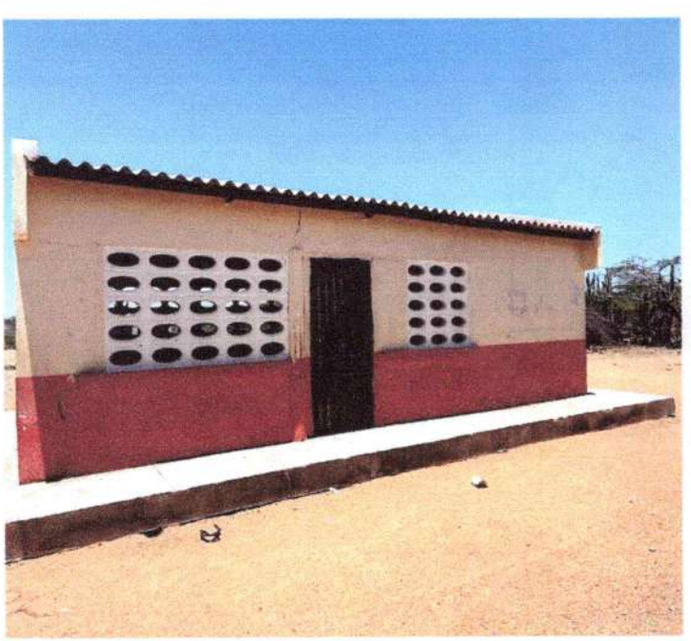





| | | | |
|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | x | ***CONVENIO:*** | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | X | ***INFORME FINAL:*** | |




**EVIDENCIAS WAAI**

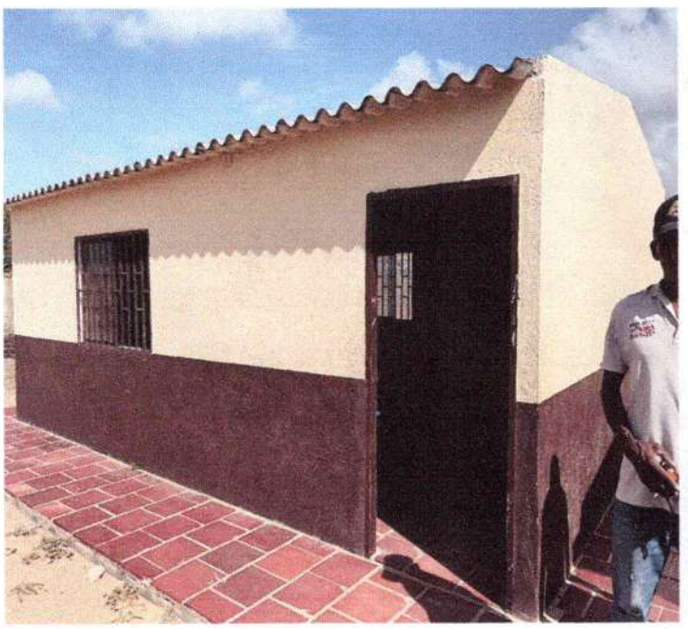


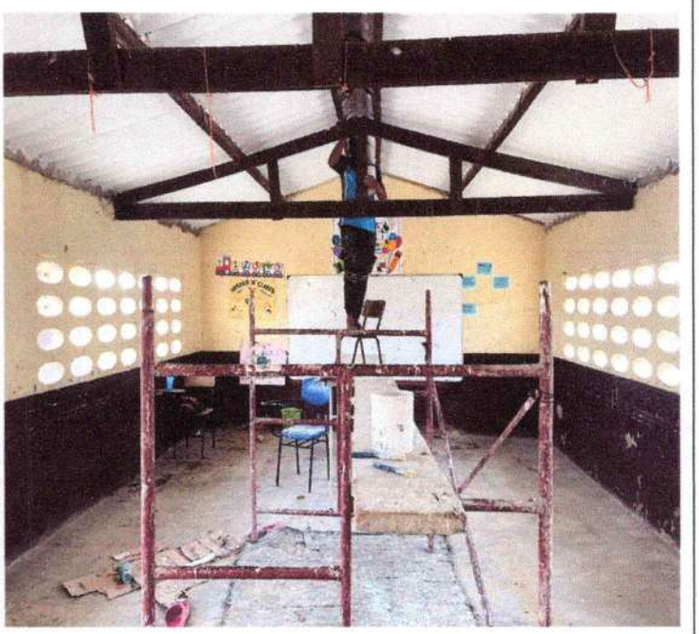



**EVIDENCIAS BUENOS AIRES**

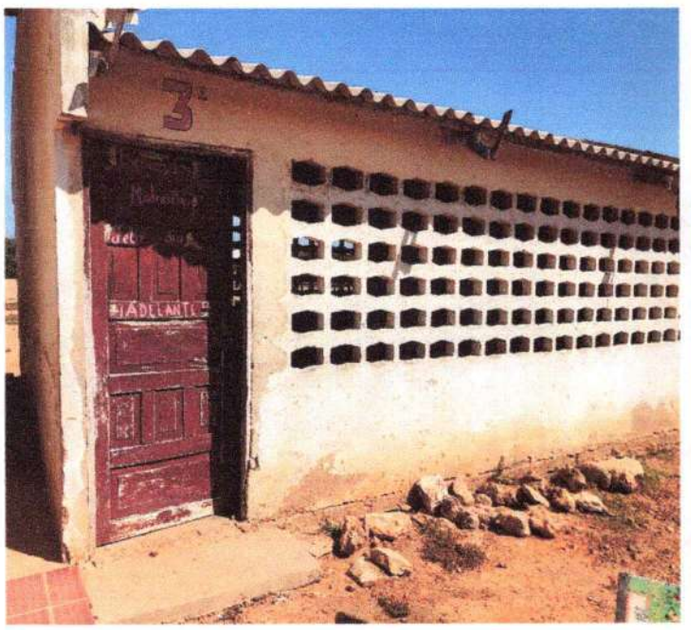

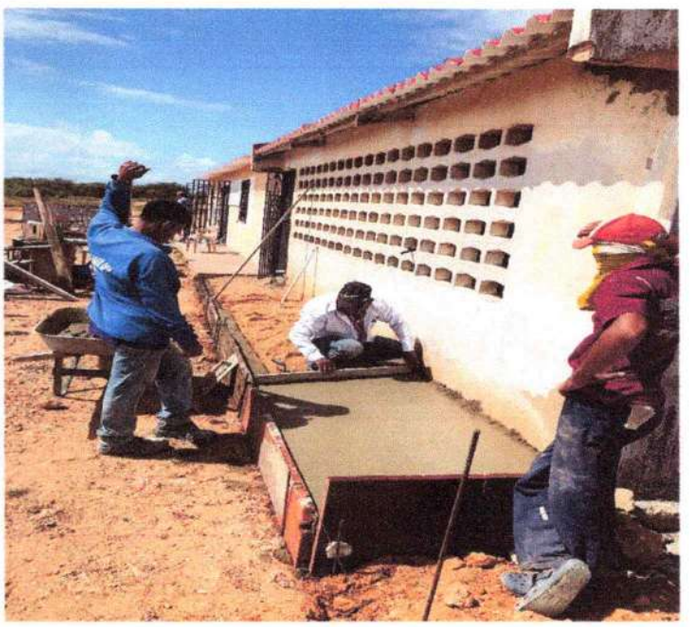

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONTRATO DE OBRA:*** | x | ***CONVENIO:*** | | | |
| ***INFORME PARCIAL:*** | X | ***INFORME FINAL:*** | | | |



**EVIDENCIAS NUEVA YORK**

| | |
|---|---|
| **11. Firma y visto bueno de la supervisión:**<br><br>**FABIAN JOSE BRIEVA IGUARAN.**<br>Interventor Municipal. | |
