ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

NIT: 892-115-155-4

FECHA ELABORACIÓN:

12/12/2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR Moti98121513242

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	**DÍA** 12	**MES** 12	**AÑO** 2024	**PERIÓDO DE SEGUIMIENTO:**	**Desde el día** 03 de diciembre de 2024**, hasta el día** 12 de diciembre de 2024**.**	**INFORME:**	FINAL
RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN:	1- **FABIAN JOSE BRIEVA IGUARAN.** Interventor Municipal.						
	Fecha de designación de la Supervisión Actualizada:		11 de junio de 2024.		**Fecha de designación de la Supervisión Inicial:**		11 de junio de 2024.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

No. Proceso	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**VIGENCIA DE RECURSOS**	**FUENTE DE FINACIACIÓN**
IMC 008 DEL 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.	2023	Recursos Propios.

PLAZO		
Seis (06) meses	**DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO:**	El Municipio de Uribia es una entidad territorial dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado en virtud del artículo 311 de la Constitución Nacional, de prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo territorial dentro del ámbito de su jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes. La baja calidad y pertinencia en todos los niveles educativos sigue siendo una problemática presente en la educación en el municipio de Uribia, limitando la formación y el desarrollo de competencias para el trabajo y para la vida. La población estudiantil del MUNICIPIO DE URIBÍA ha ido aumentando ocasionando un hacinamiento en muchas de las instituciones educativas del casco urbano y rural, donde los estudiantes no caben en las aulas de clases. Aspectos como la baja apropiación social de los programas y proyectos educativos, el bajo desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras acordes a la vocación de las regiones, la insuficiente infraestructura y el reducido acceso a la educación media en zonas rurales, se convierten en elementos críticos para consolidar una formación de calidad e integral en todos los niveles y a lo largo de la vida. A esta problemática se suma la debilidad de escenarios recreativos y deportivos para realizar actividades de educación física. Así mismo, esto genera un aumento en la deserción escolar y en la calidad de la educación en la región. Por eso es necesario que la población escolarizada (niños, niñas, jóvenes y adolescentes) cuente con espacios de calidad adecuados para la formación que reciben en las instituciones educativas. El proyecto consiste en la construcción de DIEZ (10) aulas y adecuaciones generales en ONCE (11) instituciones, en el CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU se realizara la construcción de dos (02) aulas, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI se realizara la construcción de dos (02) aulas y en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA la construcción de dos (02) aulas, Las dos (02) aulas escolares cuentan con un área de 65m2 y capacidad para 40 estudiantes cada una, se realizaran adecuaciones generales por el mal estado de la infraestructura educativa en once (11) de ellas las cuales son, CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA, CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDA – SEDE: WAAI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ – SEDE WARRERAPU #1, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE SUKULUWOU y CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES - SEDE WALAKALIT #1. Estos nuevos espacios ofrecerán a los estudiantes mejores condiciones para su educación y estadía en las instituciones, ya que se serán espacios que cumplen con las especificaciones técnicas de construcción obedeciendo a las NSR-10 y los lineamientos del ministerio de educación nacional, remplazando aquellos espacios que se han construido con materiales de la región que no cuentan con la capacidad de durabilidad en el tiempo y no ofrecen confort y seguridad. El proyecto tiene como objetivo principal la construcción de seis aulas y la realización de adecuaciones generales en nueve instituciones educativas. Estas acciones se llevarán a cabo en tres ubicaciones específicas: CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU: En esta institución, se construirán dos aulas escolares nuevas. Cada aula tendrá un área de 65 metros cuadrados y capacidad para albergar a 40 estudiantes. Estas aulas proporcionarán espacios adicionales para la educación de los alumnos.

CONTRATO DE OBRA:		x	***CONVENIO:***		
INFORME PARCIAL:			***INFORME FINAL:***		x

		INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI: En esta sede, también se llevará a cabo la construcción de dos aulas escolares nuevas, con las mismas dimensiones y capacidad que las mencionadas anteriormente. Estas aulas contribuirán a mejorar las instalaciones educativas de la institución. INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA: En esta institución, se realizará la construcción de otras dos aulas escolares nuevas, con las mismas características en términos de tamaño y capacidad que las mencionadas anteriormente. Estas nuevas aulas permitirán a la institución ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para sus estudiantes. CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JASHAINAP: En esta institución, se realizará la construcción de otras dos aulas escolares nuevas, con las mismas características en términos de tamaño y capacidad que las mencionadas anteriormente. Estas nuevas aulas permitirán a la institución ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para sus estudiantes. CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JISENTIRRA: En esta institución, se realizará la construcción de otras dos aulas escolares nuevas, con las mismas características en términos de tamaño y capacidad que las mencionadas anteriormente. Estas nuevas aulas permitirán a la institución ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para sus estudiantes. el proyecto se enfoca en la construcción de aulas escolares en tres instituciones diferentes, dos aulas por institución, con el propósito de proporcionar espacios adecuados y cómodos para la educación de los estudiantes. Además de estas nuevas construcciones, se realizarán adecuaciones generales en nueve instituciones educativas para mejorar la infraestructura existente y garantizar un entorno de aprendizaje seguro y propicio. Las adecuaciones generales por el mal estado de la infraestructura educativa en las nueve instituciones mencionadas buscan mejorar y renovar las condiciones de las instalaciones existentes para garantizar un entorno de aprendizaje seguro, funcional y adecuado. A continuación, se describe el alcance general de estas adecuaciones: *CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA:* • *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.* • *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.* • *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.* • *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.* *CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN:* • *Adecuación y reparación de aulas y espacios comunes.* • *Reacondicionamiento de sistemas de ventilación.* • *Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida.* *INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES:* • *Reforzamiento estructural.* • *Sustitución de instalaciones sanitarias obsoletas.* • *Modernización de sistemas de fontanería.* *INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA:* • *Renovación de áreas de aulas escolares.* • *Implementación de medidas de seguridad mejoradas.* • *Rehabilitación de espacios para actividades al aire libre.* *CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK:* • *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.* • *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.* • *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.* • *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.* *CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHÍA HONDA – SEDE: WAAI:* • *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.* • *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.* • *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.* • *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.* *INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNÁNDEZ – SEDE WARRERAPU #1:* • *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.* • *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.* • *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.* • *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.* *CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES - SEDE SUKULUWOU:* • *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.* • *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.* • *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.* • *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.* *CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES - SEDE WALAKALIT #1:* • *Reparación de techos, paredes y suelos dañados.* • *Actualización de sistemas eléctricos y de iluminación.* • *Reemplazo de ventanas y puertas en mal estado.* • *Pintura interior y exterior para renovar la apariencia.*

Estas adecuaciones generales se llevarán a cabo siguiendo las normas de seguridad y calidad establecidas, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes y el personal educativo un entorno más propicio para el aprendizaje y el desarrollo. Además, se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de la región, como las altas temperaturas, para garantizar un ambiente confortable y adecuado para la educación.

Las estructuras estarán soportadas por cimentaciones aisladas tipo zapatas en concreto reforzado de 3000 psi, con un sistema aporticado de columna y vigas también en concreto reforzado de 3000 psi, los muros están diseñados en mampostería con bloque de cemento unidos con mortero de pega 1:4 y acabado con pañete allanado 1:4, estuco y pintura para exteriores tipo Koraza. Se tiene en cuenta la inclusión de personas con movilidad reducida y discapacidades varias.
Así mismo, las condiciones ambientales también deben ser tenidas en cuenta. La temperatura, ruido, iluminación o calidad del aire pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño y las actitudes de la población estudiantil. El clima también influye en gran medida en nuestro bienestar ya que nos encontramos en una región donde las altas temperaturas han alcanzado hasta 42 °C. Debido a lo anterior, la infraestructura contemplada para el CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI y en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA, se tiene previsto el suministro e instalación de cubierta tipo sándwich deck o similar, que cuenta con un relleno interior de poliuretano que garantiza el aislamiento térmico por cuenta de los rayos solares.

Las instituciones CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI y en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA carecen de espacios para albergar a los estudiante, afectando con ello a la población estudiantil que no está en condiciones de trasladarse a otras instituciones.

Así mismo, las instituciones CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA, CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDA – SEDE: WAAI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ – SEDE WARRERAPU #1, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE SUKULUWOU y CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE WALAKALIT #1.

Según los resultados obtenidos en las Prueba Saber 11, la clasificación para los planteles del municipio los ubica en categoría D, siendo esta la peor clasificación, pues indica que la mayoría de los estudiantes se encuentran en los resultados inferiores o muy inferior de las pruebas de estado.
La clasificación muy inferior obtenida para los planteles educativos se debe a los escasos recursos para invertir en calidad, el tema de la intervención que actualmente tiene el municipio, que frena y dilata procesos educativos, y las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, que con bajos resultados obtenidos en las pruebas, afectan la clasificación de las instituciones educativas del municipio.

Es así como en el banco de programas y proyectos del Municipio de Uribia se encuentra inscrito el proyecto con código No. 2023448470003 de objeto ***Implementación de proyectos, actividades y servicios para el mejoramiento de la calidad educativa, bienestar docente y funcionamiento de la secretaría de educación como estrategia de fortalecimiento del sector educativo vigencia 2023 en Uribia,*** dentro del cual se encuentra incluido el componente de Construcción, ampliación, adecuación y mantenimiento de infraestructura educativa (incluye internados).
Es por ello que resulta necesario contar con una persona jurídica o natural que atendiendo la necesidad expuesta, pueda ejecutar las obras que se requieren. Así, se requiere celebrar un contrato para la ejecución del objeto referenciado.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Dificultad de conseguir los recursos financieros y la disponibilidad presupuestal	**Probabilidad**: 3. Moderado **Impacto**: 4. Mayor	Retraso en la contratación del proyecto	Retraso en la contratación del proyecto
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Retraso en la contratación del proyecto	**Probabilidad**: 4. Probable **Impacto**: 4. Mayor	Retraso en el cronograma de la obra	Ejecutar el proyecto ante de que se avecine la segunda ola invernal en la región (Octubre – Diciembre)
3-Actividad	De mercado	Accidentes en la obra	**Probabilidad**: 4. Probable **Impacto**: 3. Moderado	Lesiones físicas o pérdida de vidas humanas	Señalización preventiva en el sitio de la obra y uso de elementos de seguridad en la obra.

Tabla 1. Estructura Del Proyecto

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

LOCALIZACIÓN:			**Nº de Beneficiarios**	**CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN**	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**
	Departamento:	La Guajira			
	Municipio:	Uribia			
	Corregimiento:	Si. Aplica	3.705	Sí	Recursos Propios.

El proyecto se llevará a cabo en el Municipio de Uribia, La Guajira, específicamente en la zona rural dispersa en los diferentes corregimientos. Como se evidencia en la Ilustración Nº 1, el objetivo principal es la construcción de diez (10) aulas y la realización de adecuaciones generales en once (11) instituciones educativas.

GEORREFERENCIACIÓN		
SEDE	**LATITUD**	**LONGITUD**
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU (CONTRUCCION DE AULA)	11°59'28.18"N	71°56'28.40"O
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI (CONTRUCCION DE AULA)	11°62'76.57"N	72°37'77.86"O
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA (CONTRUCCION DE AULA)	12°0'49.65"N	72°4'24.84"O
CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA	12°32'09.39"N	71°32'61.55"O
CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN	12°26'22.61"N	71°51'71.28"O
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	12°27'26.95"N	71°41'60.86"O
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA	12°17'45.21"N	71°26'46.11"O
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK	12°16'06.21"N	71°14'1.21"O
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDA – SEDE: WAAI	12°28'50.75"N	71°80'23.79"O
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ – SEDE WARRERAPU #1	11°43'21"N	72°14'47"O
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE SUKULUWOU	11°33'24"N	72°09'14"O
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE WALAKALIT #1	11°68'43.81"N	72°21'30.23"O
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JASHAINAP	11°68,99.66"N	72°34,40.56"O
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JISENTIRRA	11°74,02.69"N	72°26,01.77"O
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ISABEL JUSAYU	11°69,17.23"N	72°33,87.99"O
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL LOS OLIVOS	11°81,92.56"N	72°21,76.03"O

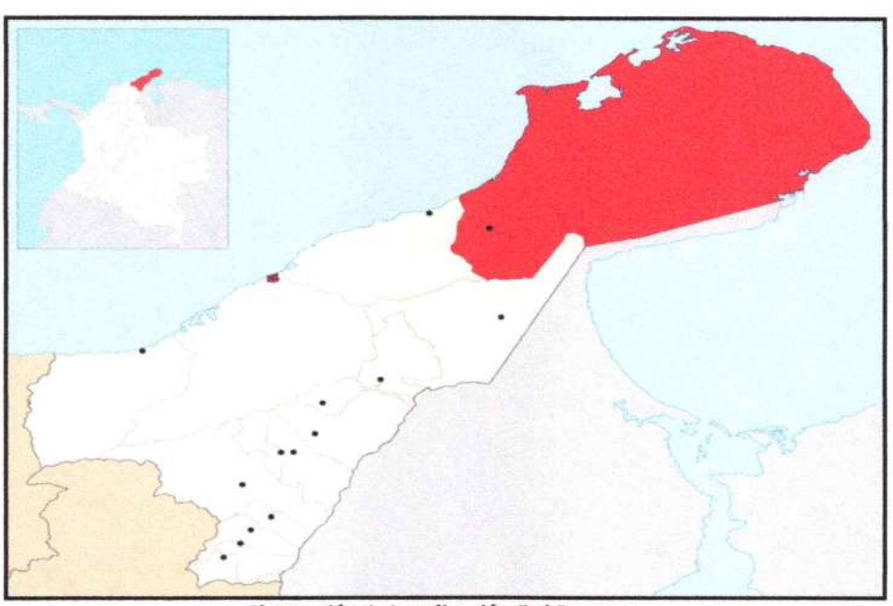


Ilustración 1. Localización Del Proyecto

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	X

AVANCE DE EJECUCIÓN	%	FASE	ÁREA DE INFLUENCIA		ALERTAS NO SUBSANADAS
FÍSICO	100%	Final	**URBANO**		-
FINANCIERO	100%		**RURAL**	X	-





Ilustración 2. Fases De La Gestión De Proyectos.

RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO

CONTRATO N°	FECHA	OBJETO
008 DE 2024.	04 De Junio De 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato de Obra N°:	008	**De FECHA**	04/06/ 2024	**Modalidad de Contratación:**	Mínima Cuantía	**Mínima Cuantía N°:**	IMC 008 DEL 2023
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE URIBIA			**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INTERAULAS 2024	**NIT:**	901.837.680-1
Representante Legal:	LUIS HERNÁN LOAIZA GIL			**C.C:**	84.025.804 Expedida en Riohacha.	**EMAIL:**	Construhabitarq2024@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.			**Contratante:**	MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($31.998.814,00) M/CTE. MONEDA CORRIENTE.
						VALOR ADICIONAL 01 DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CON CERO PESOS ($ 7.819.000,00) M/CTE. MONEDA CORRIENTE.
						VALOR ADICIONAL 02 DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CERO PESOS ($ 48.817.814,00) M/CTE.

ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

NIT: 892-115-155-4

FECHA ELABORACIÓN:

12/12/2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA: [x] ***CONVENIO:*** [ ]

INFORME PARCIAL: [ ] ***INFORME FINAL:*** [x]

PLAZO INCIAL DEL CONTRATO:	SESENTA (60) DIAS.	**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:**	CUATRO (4) MESES (0) DIAS	**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:**	SEIS (6) MESES.
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) DIAS.	**ACTA DE INCIO:**	Doce (12) de junio del 2024.	**VALOR Y FECHA DEL ANTICIPO 40%:**	$ 12.799.525,00 M/CTE 12/06/2024
SUPERVISOR:	FABIAN JOSE BRIEVA IGUARAN	**FORMA DE PAGO:**	el municipio pagara un 40% del valor resultante del contrato a través de un anticipo y el restante mediante actas parciales y acta final.	**VALOR Y FECHA DEL ACTA PARCIAL 001:**	**No Aplica**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	($ 31.998.814,00) M/CTE	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PROYECTADA:**	Once (11) de agosto del 2024.	**FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**	Doce (12) de diciembre del 2024.
VALOR ADICIONAL 01 DEL CONTRATO:	($ 7.819.000,00) M/CTE.				
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	($ 39.817.814,00) M/CTE.				
VALOR ADICIONAL 02 DEL CONTRATO:	($ 9.000.000,00) M/CTE.				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	($ 48.817.814,00) M/CTE.				

ACTAS DE SUSPENSIÓN:	**NUMERO**	**FECHA**	**ACTAS DE REINICIO:**	**NUMERO**	**FECHA**
	No. Aplica	No. Aplica		No. Aplica	No. Aplica

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**		**ACTAS PARCIALES SUSCRITAS**		
Programada	**Ejecutada**	**Programada**	**Ejecutada**	**N°**	**Valor del Acta y Fecha**	**Valor a Pagar Amortizado**
100%	100%	100%	100%	ANTICIPO 40%	NO APLICA DEBIDO A QUE NO HUBO ACTAS PARCIALES	$ 12.799.525,00 M/CTE 12/06/2024
					Total Valor Pagado:	$ 12.799.525,00 M/CTE
					Saldo por Pagar:	$ 36.018.289,00 M/CTE

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP INICIAL):	**N°**	313	**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (RP INICIAL):**	**N°**	604
	Valor	$ 39.991.792,00		**Valor**	$ 31.998.814,00
	Fecha	13/03/2024		**Fecha**	04/06/2024
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP ADICION 01):	**N°**	722	**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (RP ADICION 01):**	**N°**	725
	Valor	$ 7.992.978,00		**Valor**	$ 7.819.000,00
	Fecha	22/07/2024		**Fecha**	25/07/2024
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP ADICION 02):	**N°**	924	**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (RP ADICION 02):**	**N°**	924
	Valor	$ 9.000.000,00		**Valor**	$ 9.000.000,00
	Fecha	24/09/2024		**Fecha**	24/09/2024

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S):	**2.3.2.02.02.09** SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES **($ 31.998.814,00)** **2.3.2.02.02.09** SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES **($ 7.819.000,00)** **2.3.2.02.02.09** SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES **($ 9.000.000,00)**

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

3.2 LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN GENERAL	ESPECIFICA
REGION: CARIBE **DEPARTAMENTO:** GUAJIRA **MUNICIPIO:** URIBIA **CENTRO POBLADO:** ZONA RURAL **RESGUARDO:** ALTA Y MEDIA GUAJIRA	DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Tabla 2. Localización Del Proyecto

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

LIDERÉ AL EQUIPO DE TRABAJO, SIENDO UNA PER LA **SUPERVISIÓN** FUE LA OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULAR AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA **MINIMA CUANTIA**, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS ESTABLECIDOS. ENTRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES COMO SUPERVISORA, PUEDO DESTACAR QUE:

- SONA EN QUIEN EL EQUIPO CONFIÓ Y NO FUI DE TEMER PARA LOS DEMÁS COMPAÑEROS.
- COORDINE LAS TAREAS DEL PERSONAL.
- GARANTICE EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.
- TOMÉ DECISIONES PARA LA OBRA.
- EVALUÉ EL TRABAJO DEL PERSONAL.
- CONVOQUE COMITÉ DE OBRA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES.

EL SUPERVISOR ES UN LIDER, QUE MANEJA TODAS LAS ÁREAS DEL PROYECTO. SERÁ EL ENCARGADO DE ALINEAR, DARLE ORDEN A UNA EMPRESA PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO CONCRETO DE LA ORGANIZACIÓN. SOMOS QUIENES NOS ENCARGAMOS DE ASESORAR A TODOS LOS TRABAJADORES QUE LO NECESITEN EN ALGÚN MOMENTO.

3.4 ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS

EL CONTRATO DE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN ESTADO DE EJECUCIÓN, TIENE UNA DURACIÓN DE SESENTA (60) DÍAS, LLEVANDO HASTA LA FECHA **EL 80,11% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**, TOMANDO COMO FECHA DE INICIACIÓN EL DÍA **DOCE (12) DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**, Y CON FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL EL **ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024),** CON UN PLAZO ADICIONAL 01 DE **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS**, TENIENDO COMO FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA EL **VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024),** CON UN PLAZO ADICIONAL 02 DE **(02) MESES Y QUINCE (15) DIAS DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)** TENIENDO COMO FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA EL **DOCE (12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024.**

CONTRATO DE OBRA: [x] ***CONVENIO:*** [ ]

INFORME PARCIAL: [ ] ***INFORME FINAL:*** [x]

3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONTRATOS

CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES, ADECUACION, HABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIF. GRAL.	ESPECIF. PART.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES				
				CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU				
				1. PRELIMINARES				
	1,1		1,1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL CON RETIRO	M2	104,00	$ 36.201,00	$ 3.764.904,00
	1,2		1,2	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	104,00	$ 6.429,00	$ 668.616,00
Subtotal								**$ 4.433.520,00**
				2. EXCAVACIONES Y CIMENTACION				
	2,1		2,1	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO DE 0,4 X 0,4 Mt	M3	7,68	$ 84.912,00	$ 652.124,16
	2,2		2,2	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	7,68	$ 1.086.070,00	$ 8.341.017,60
Subtotal								**$ 8.993.141,76**
				3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
	3,1		3,1	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25X0,25 MT	ML	46,00	$ 148.681,00	$ 6.839.326,00
	3,2		3,2	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,25 X 0,25 MT	ML	21,00	$ 203.617,00	$ 4.275.957,00
	3,3		3,3	ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2	KG	1.407,36	$ 15.564,00	$ 21.904.154,72
	3,4		3,4	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MT	ML	17,50	$ 122.578,00	$ 2.145.115,00
	3,5		3,5	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,15 MT	ML	14,00	$ 147.764,00	$ 2.068.696,00
	3,6		3,6	VIGA AMARRE SOBRE MURO, CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 X 0,25 MT	ML	39,00	$ 171.344,00	$ 6.682.416,00
	3,7		3,7	VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,15	ML	39,00	$ 128.313,00	$ 5.004.207,00
	3,8		3,8	ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 MT E: 0,1 MT	ML	10,00	$ 106.636,00	$ 1.066.360,00
	3,9		3,9	SILLAS EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI DE 0,5 MT H: 0,3 MT	M2	3,00	$ 481.274,00	$ 1.443.822,00
	3,10		3,10	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,1 MT	ML	28,00	$ 60.754,00	$ 1.701.112,00
Subtotal								**$ 53.131.165,72**
				4. MAMPOSTERIA				
	4,1		4,1	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO SPLIT DE UNA CARA 0.15X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA	M2	96,50	$ 129.784,00	$ 12.524.156,00
	4,2		4,2	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO CALADO - MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	19,52	$ 113.809,00	$ 2.221.551,68
Subtotal								**$ 14.745.707,68**
				5. PAÑETES				
	5,1		5,1	PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4	M2	96,50	$ 37.975,00	$ 3.664.587,50
	5,2		5,2	FILOS Y DILATACIONES	ML	83,32	$ 15.318,00	$ 1.276.309,70
Subtotal								**$ 4.940.897,20**
				6. PISOS				
	6,1		6,1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	39,00	$ 104.704,00	$ 4.083.456,00
	6,2		6,2	PISO EN CONCRETO 1,2,3 ESP 0,07 M	M2	95,00	$ 112.663,00	$ 10.702.985,00
	6,3		6,3	PISO EN TABLON VITRIFICADO	M2	95,00	$ 129.383,00	$ 12.291.385,00

	6,4		6,4	ZOCALOS EN PIEDRA CHINA	ML	43,00	$	86.741,00	$ 3.729.863,00
Subtotal									**$ 30.807.689,00**
7. CUBIERTA									
	7,1		7,1	LAMINA ONDULADA DE AC	M2	102,00	$	112.373,00	$ 11.462.046,00
Subtotal									**$ 11.462.046,00**
8. ESTRUCTURAS METALICAS									
	8,1		8,1	CERCHA DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE 2"	ML	8,00	$	986.162,00	$ 7.889.296,00
	8,2		8,2	CERCHA DE ESTRUC MET. ANGULO DE 1", VARILLAS DE 1/2"	ML	33,00	$	527.602,00	$ 17.410.866,00
Subtotal									**$ 25.300.162,00**
9. CARPINTERIA METALICA									
	9,1		9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 18 CON MARCO , SIN PROTECTOR	M2	5,87	$	765.825,00	$ 4.493.652,51
Subtotal									**$ 4.493.652,51**
10. PINTURAS Y ACABADOS									
	10,1		10,1	ESTUCO PARA MUROS INTERIORES	M2	96,50	$	37.133,00	$ 3.583.334,50
	10,2		10,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1, DOS MANOS, MUROS Y CALADOS	M2	96,50	$	23.857,00	$ 2.302.200,50
	10,3		10,3	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES	GL	1,00	$	1.971.368,00	$ 1.971.368,00
Subtotal									**$ 7.856.903,00**
VALOR CONSTRUCCION 1 AULA									**$ 166.164.884,87**
VALOR CONSTRUCCION 2 AULAS									**$ 332.329.769,74**
CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN - SEDE: ANAI									
1. PRELIMINARES									
	1,1		1,1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL CON RETIRO	M2	104,00	$	36.201,00	$ 3.764.904,00
	1,2		1,2	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	104,00	$	6.429,00	$ 668.616,00
Subtotal									**$ 4.433.520,00**
2. EXCAVACIONES Y CIMENTACION									
	2,1		2,1	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO DE 0,4 X 0,4 Mt	M3	7,68	$	84.912,00	$ 652.124,16
	2,2		2,2	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	7,68	$	1.086.070,00	$ 8.341.017,60
Subtotal									**$ 8.993.141,76**
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
	3,1		3,1	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25X0,25 MT	ML	46,00	$	148.681,00	$ 6.839.326,00
	3,2		3,2	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,25 X 0,25 MT	ML	21,00	$	203.617,00	$ 4.275.957,00
	3,3		3,3	ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2	KG	1.407,36	$	15.504,00	$ 21.904.154,72
	3,4		3,4	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MT	ML	17,50	$	122.578,00	$ 2.145.115,00
	3,5		3,5	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,15 MT	ML	14,00	$	147.764,00	$ 2.068.696,00
	3,6		3,6	VIGA AMARRE SOBRE MURO, CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 X 0,25 MT	ML	39,00	$	171.344,00	$ 6.682.416,00
	3,7		3,7	VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,15	ML	39,00	$	128.313,00	$ 5.004.207,00
	3,8		3,8	ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 MT E: 0,1 MT	ML	10,00	$	106.636,00	$ 1.066.360,00
	3,9		3,9	SILLAS EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI DE 0,5 MT H: 0,3 MT	M2	3,00	$	481.274,00	$ 1.443.822,00
	3,10		3,10	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,1 MT	ML	28,00	$	60.754,00	$ 1.701.112,00

Subtotal								$	53.131.165,72
4. MAMPOSTERIA									
	4,1		4,1	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO SPLIT DE UNA CARA 0.15X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	96,50	$ 129.784,00	$	12.524.156,00
	4,2		4,2	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO CALADO - MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	19,52	$ 113.809,00	$	2.221.551,68
Subtotal								$	14.745.707,68
5. PAÑETES									
	5,1		5,1	PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4	M2	96,50	$ 37.975,00	$	3.664.587,50
	5,2		5,2	FILOS Y DILATACIONES	ML	83,32	$ 15.318,00	$	1.276.309,70
Subtotal								$	4.940.897,20
6. PISOS									
	6,1		6,1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	39,00	$ 104.704,00	$	4.083.456,00
	6,2		6,2	PISO EN CONCRETO 1,2,3 ESP 0,07 M	M2	95,00	$ 112.663,00	$	10.702.985,00
	6,3		6,3	PISO EN TABLON VITRIFICADO	M2	95,00	$ 129.383,00	$	12.291.385,00
	6,4		6,4	ZOCALOS EN PIEDRA CHINA	ML	43,00	$ 86.741,00	$	3.729.863,00
Subtotal								$	30.807.689,00
7. CUBIERTA									
	7,1		7,1	LAMINA ONDULADA DE AC	M2	102,00	$ 112.373,00	$	11.462.046,00
Subtotal								$	11.462.046,00
8. ESTRUCTURAS METALICAS									
	8,1		8,1	CERCHA DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE 2"	ML	8,00	$ 986.162,00	$	7.889.296,00
	8,2		8,2	CERCHA DE ESTRUC MET. ANGULO DE 1", VARILLAS DE 1/2"	ML	33,00	$ 527.602,00	$	17.410.866,00
Subtotal								$	25.300.162,00
9. CARPINTERIA METALICA									
	9,1		9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 18 CON MARCO , SIN PROTECTOR	M2	5,87	$ 765.825,00	$	4.493.652,51
Subtotal								$	4.493.652,51
10. PINTURAS Y ACABADOS									
	10,1		10,1	ESTUCO PARA MUROS INTERIORES	M2	96,50	$ 37.133,00	$	3.583.334,50
	10,2		10,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1, DOS MANOS, MUROS Y CALADOS	M2	96,50	$ 23.857,00	$	2.302.200,50
	10,3		10,3	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES	GL	1,00	$ 1.971.368,00	$	1.971.368,00
Subtotal								$	7.856.903,00
VALOR CONSTRUCCION 1 AULA								$	166.164.884,87
VALOR CONSTRUCCION 2 AULAS								$	332.329.769,74
CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA									
1. PRELIMINARES									
	1,1		1,1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL CON RETIRO	M2	104,00	$ 36.201,00	$	3.764.904,00
	1,2		1,2	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	104,00	$ 6.429,00	$	668.616,00
Subtotal								$	4.433.520,00
2. EXCAVACIONES Y CIMENTACION									
	2,1		2,1	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO DE 0,4 X 0,4 Mt	M3	7,68	$ 84.912,00	$	652.124,16

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA: [x] ***CONVENIO:*** [ ]

INFORME PARCIAL: [ ] ***INFORME FINAL:*** [x]

	2,2		2,2	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	7,68	$ 1.086.070,00	$	8.341.017,60
Subtotal								**$**	**8.993.141,76**
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
	3,1		3,1	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25X0,25 MT	ML	46,00	$ 148.681,00	$	6.839.326,00
	3,2		3,2	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,25 X 0,25 MT	ML	21,00	$ 203.617,00	$	4.275.957,00
	3,3		3,3	ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2	KG	1.407,36	$ 15.564,00	$	21.904.154,72
	3,4		3,4	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MT	ML	17,50	$ 122.578,00	$	2.145.115,00
	3,5		3,5	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,15 MT	ML	14,00	$ 147.764,00	$	2.068.696,00
	3,6		3,6	VIGA AMARRE SOBRE MURO, CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 X 0,25 MT	ML	39,00	$ 171.344,00	$	6.682.416,00
	3,7		3,7	VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,15	ML	39,00	$ 128.313,00	$	5.004.207,00
	3,8		3,8	ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 MT E: 0,1 MT	ML	10,00	$ 106.636,00	$	1.066.360,00
	3,9		3,9	SILLAS EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI DE 0,5 MT H: 0,3 MT	M2	3,00	$ 481.274,00	$	1.443.822,00
	3,10		3,10	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,1 MT	ML	28,00	$ 60.754,00	$	1.701.112,00
Subtotal								**$**	**53.131.165,72**
4. MAMPOSTERIA									
	4,1		4,1	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO SPLIT DE UNA CARA 0.15X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	96,50	$ 129.784,00	$	12.524.156,00
	4,2		4,2	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO CALADO - MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	19,52	$ 113.809,00	$	2.221.551,68
Subtotal								**$**	**14.745.707,68**
5. PAÑETES									
	5,1		5,1	PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4	M2	96,50	$ 37.975,00	$	3.664.587,50
	5,2		5,2	FILOS Y DILATACIONES	ML	83,32	$ 15.318,00	$	1.276.309,70
Subtotal								**$**	**4.940.897,20**
6. PISOS									
	6,1		6,1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	39,00	$ 104.704,00	$	4.083.456,00
	6,2		6,2	PISO EN CONCRETO 1,2,3 ESP 0,07 M	M2	95,00	$ 112.663,00	$	10.702.985,00
	6,3		6,3	PISO EN TABLON VITRIFICADO	M2	95,00	$ 129.383,00	$	12.291.385,00
	6,4		6,4	ZOCALOS EN PIEDRA CHINA	ML	43,00	$ 86.741,00	$	3.729.863,00
Subtotal								**$**	**30.807.689,00**
7. CUBIERTA									
	7,1		7,1	LAMINA ONDULADA DE AC	M2	102,00	$ 112.373,00	$	11.462.046,00
Subtotal								**$**	**11.462.046,00**
8. ESTRUCTURAS METALICAS									
	8,1		8,1	CERCHA DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE 2"	ML	8,00	$ 986.162,00	$	7.889.296,00
	8,2		8,2	CERCHA DE ESTRUC MET. ANGULO DE 1", VARILLAS DE 1/2"	ML	33,00	$ 527.602,00	$	17.410.866,00
Subtotal								**$**	**25.300.162,00**
9. CARPINTERIA METALICA									
	9,1		9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 18 CON MARCO , SIN PROTECTOR	M2	5,87	$ 765.825,00	$	4.493.652,51
Subtotal								**$**	**4.493.652,51**
10. PINTURAS Y ACABADOS									

	10,1		10,1	ESTUCO PARA MUROS INTERIORES	M2	96,50	$ 37.133,00	$ 3.583.334,50
	10,2		10,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1, DOS MANOS, MUROS Y CALADOS	M2	96,50	$ 23.857,00	$ 2.302.200,50
	10,3		10,3	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES	GL	1,00	$ 1.971.368,00	$ 1.971.368,00
Subtotal								**$ 7.856.903,00**
				VALOR CONSTRUCCION 1 AULA				**$ 166.164.884,87**
				VALOR CONSTRUCCION 2 AULAS				**$ 332.329.769,74**
				CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JASHAINAP				
				1. PRELIMINARES				
	1,1		1,1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL CON RETIRO	M2	104,00	$ 36.201,00	$ 3.764.904,00
	1,2		1,2	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	104,00	$ 6.429,00	$ 668.616,00
Subtotal								**$ 4.433.520,00**
				2. EXCAVACIONES Y CIMENTACION				
	2,1		2,1	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO DE 0,4 X 0,4 Mt	M3	7,68	$ 84.912,00	$ 652.124,16
	2,2		2,2	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	7,68	$ 1.086.070,00	$ 8.341.017,60
Subtotal								**$ 8.993.141,76**
				3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
	3,1		3,1	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25X0,25 MT	ML	46,00	$ 148.681,00	$ 6.839.326,00
	3,2		3,2	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,25 X 0,25 MT	ML	21,00	$ 203.617,00	$ 4.275.957,00
	3,3		3,3	ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2	KG	1.407,36	$ 15.564,00	$ 21.904.154,72
	3,4		3,4	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MT	ML	17,50	$ 122.578,00	$ 2.145.115,00
	3,5		3,5	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,15 MT	ML	14,00	$ 147.764,00	$ 2.068.696,00
	3,6		3,6	VIGA AMARRE SOBRE MURO, CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 X 0,25 MT	ML	39,00	$ 171.344,00	$ 6.682.416,00
	3,7		3,7	VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,15	ML	39,00	$ 128.313,00	$ 5.004.207,00
	3,8		3,8	ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 MT E: 0,1 MT	ML	10,00	$ 106.636,00	$ 1.066.360,00
	3,9		3,9	SILLAS EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI DE 0,5 MT H: 0,3 MT	M2	3,00	$ 481.274,00	$ 1.443.822,00
	3,10		3,10	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,1 MT	ML	28,00	$ 60.754,00	$ 1.701.112,00
Subtotal								**$ 53.131.165,72**
				4. MAMPOSTERIA				
	4,1		4,1	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO SPLIT DE UNA CARA 0.15X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	96,50	$ 129.784,00	$ 12.524.156,00
	4,2		4,2	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO CALADO - MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	19,52	$ 113.809,00	$ 2.221.551,68
Subtotal								**$ 14.745.707,68**
				5. PAÑETES				
	5,1		5,1	PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4	M2	96,50	$ 37.975,00	$ 3.664.587,50
	5,2		5,2	FILOS Y DILATACIONES	ML	83,32	$ 15.318,00	$ 1.276.309,70
Subtotal								**$ 4.940.897,20**
				6. PISOS				
	6,1		6,1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	39,00	$ 104.704,00	$ 4.083.456,00
	6,2		6,2	PISO EN CONCRETO 1,2,3 ESP 0,07 M	M2	95,00	$ 112.663,00	$ 10.702.985,00
	6,3		6,3	PISO EN TABLON VITRIFICADO	M2	95,00	$ 129.383,00	$ 12.291.385,00

	6,4		6,4	ZOCALOS EN PIEDRA CHINA	ML	43,00	$ 86.741,00	$ 3.729.863,00
Subtotal								**$ 30.807.689,00**
7. CUBIERTA								
	7,1		7,1	LAMINA ONDULADA DE AC	M2	102,00	$ 112.373,00	$ 11.462.046,00
Subtotal								**$ 11.462.046,00**
8. ESTRUCTURAS METALICAS								
	8,1		8,1	CERCHA DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE 2"	ML	8,00	$ 986.162,00	$ 7.889.296,00
	8,2		8,2	CERCHA DE ESTRUC MET. ANGULO DE 1", VARILLAS DE 1/2"	ML	33,00	$ 527.602,00	$ 17.410.866,00
Subtotal								**$ 25.300.162,00**
9. CARPINTERIA METALICA								
	9,1		9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 18 CON MARCO , SIN PROTECTOR	M2	5,87	$ 765.825,00	$ 4.493.652,51
Subtotal								**$ 4.493.652,51**
10. PINTURAS Y ACABADOS								
	10,1		10,1	ESTUCO PARA MUROS INTERIORES	M2	96,50	$ 37.133,00	$ 3.583.334,50
	10,2		10,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1, DOS MANOS, MUROS Y CALADOS	M2	96,50	$ 23.857,00	$ 2.302.200,50
	10,3		10,3	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES	GL	1,00	$ 1.971.368,00	$ 1.971.368,00
Subtotal								**$ 7.856.903,00**
VALOR CONSTRUCCION 1 AULA								**$ 166.164.884,87**
VALOR CONSTRUCCION 2 AULAS								**$ 332.329.769,74**
CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JISENTIRRA								
1. PRELIMINARES								
	1,1		1,1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL CON RETIRO	M2	104,00	$ 36.201,00	$ 3.764.904,00
	1,2		1,2	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	104,00	$ 6.429,00	$ 668.616,00
Subtotal								**$ 4.433.520,00**
2. EXCAVACIONES Y CIMENTACION								
	2,1		2,1	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO DE 0,4 X 0,4 Mt	M3	7,68	$ 84.912,00	$ 652.124,16
	2,2		2,2	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	7,68	$ 1.086.070,00	$ 8.341.017,60
Subtotal								**$ 8.993.141,76**
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
	3,1		3,1	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25X0,25 MT	ML	46,00	$ 148.681,00	$ 6.839.326,00
	3,2		3,2	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,25 X 0,25 MT	ML	21,00	$ 203.617,00	$ 4.275.957,00
	3,3		3,3	ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2	KG	1.407,36	$ 15.564,00	$ 21.904.154,72
	3,4		3,4	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MT	ML	17,50	$ 122.578,00	$ 2.145.115,00
	3,5		3,5	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,15 MT	ML	14,00	$ 147.764,00	$ 2.068.696,00
	3,6		3,6	VIGA AMARRE SOBRE MURO, CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 X 0,25 MT	ML	39,00	$ 171.344,00	$ 6.682.416,00
	3,7		3,7	VIGA CORONA CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,15	ML	39,00	$ 128.313,00	$ 5.004.207,00
	3,8		3,8	ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 MT E: 0,1 MT	ML	10,00	$ 106.636,00	$ 1.066.360,00
	3,9		3,9	SILLAS EN CONCRETO PULIDO DE 3000 PSI DE 0,5 MT H: 0,3 MT	M2	3,00	$ 481.274,00	$ 1.443.822,00

	3,10		3,10	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,1 MT	ML	28,00	$ 60.754,00	$	1.701.112,00
Subtotal								$	**53.131.165,72**
4. MAMPOSTERIA									
	4,1		4,1	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO SPLIT DE UNA CARA 0.15X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	96,50	$ 129.784,00	$	12.524.156,00
	4,2		4,2	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO CALADO - MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	19,52	$ 113.809,00	$	2.221.551,68
Subtotal								$	**14.745.707,68**
5. PAÑETES									
	5,1		5,1	PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4	M2	96,50	$ 37.975,00	$	3.664.587,50
	5,2		5,2	FILOS Y DILATACIONES	ML	83,32	$ 15.318,00	$	1.276.309,70
Subtotal								$	**4.940.897,20**
6. PISOS									
	6,1		6,1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	39,00	$ 104.704,00	$	4.083.456,00
	6,2		6,2	PISO EN CONCRETO 1,2,3 ESP 0,07 M	M2	95,00	$ 112.663,00	$	10.702.985,00
	6,3		6,3	PISO EN TABLON VITRIFICADO	M2	95,00	$ 129.383,00	$	12.291.385,00
	6,4		6,4	ZOCALOS EN PIEDRA CHINA	ML	43,00	$ 86.741,00	$	3.729.863,00
Subtotal								$	**30.807.689,00**
7. CUBIERTA									
	7,1		7,1	LAMINA ONDULADA DE AC	M2	102,00	$ 112.373,00	$	11.462.046,00
Subtotal								$	**11.462.046,00**
8. ESTRUCTURAS METALICAS									
	8,1		8,1	CERCHA DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE 2"	ML	8,00	$ 986.162,00	$	7.889.296,00
	8,2		8,2	CERCHA DE ESTRUC MET. ANGULO DE 1", VARILLAS DE 1/2"	ML	33,00	$ 527.602,00	$	17.410.866,00
Subtotal								$	**25.300.162,00**
9. CARPINTERIA METALICA									
	9,1		9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CALIBRE 18 CON MARCO , SIN PROTECTOR	M2	5,87	$ 765.825,00	$	4.493.652,51
Subtotal								$	**4.493.652,51**
10. PINTURAS Y ACABADOS									
	10,1		10,1	ESTUCO PARA MUROS INTERIORES	M2	96,50	$ 37.133,00	$	3.583.334,50
	10,2		10,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1, DOS MANOS, MUROS Y CALADOS	M2	96,50	$ 23.857,00	$	2.302.200,50
	10,3		10,3	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES	GL	1,00	$ 1.971.368,00	$	1.971.368,00
Subtotal								$	**7.856.903,00**
VALOR CONSTRUCCION 1 AULA								$	**166.164.884,87**
VALOR CONSTRUCCION 2 AULAS								$	**332.329.769,74**
SUBTOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULAS								$	**1.661.648.848,72**
ADECUACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS									
ADECUACIONES CEIR VILLA FATIMA – SEDE: KALALUMANA									
ADECUACIONES GENERALES									
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	132,00	$ 12.655,00	$	1.670.460,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA: [x] ***CONVENIO:*** [ ]

INFORME PARCIAL: [ ] ***INFORME FINAL:*** [x]

	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	96,00	$	28.541,00	$ 2.739.936,00
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	80,00	$	17.813,00	$ 1.425.040,00
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	56,00	$	17.813,00	$ 997.528,00
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	2,00	$	39.134,00	$ 78.268,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	36,00	$	14.334,00	$ 516.024,00
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	24,00	$	195.433,00	$ 4.690.392,00
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	20,00	$	45.788,00	$ 915.760,00
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	56,00	$	83.949,00	$ 4.701.144,00
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	36,00	$	66.359,00	$ 2.388.924,00
	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	24,00	$	8.331,00	$ 199.944,00
	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	372,00	$	15.564,00	$ 5.789.808,00
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	80,00	$	24.918,00	$ 1.993.440,00
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	80,00	$	136.060,00	$ 10.884.800,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	56,00	$	136.060,00	$ 7.619.360,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	132,00	$	48.199,00	$ 6.362.268,00
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	96,00	$	113.240,00	$ 10.871.040,00
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	304,00	$	39.286,00	$ 11.942.944,00
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	304,00	$	29.833,00	$ 9.069.232,00
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	192,00	$	29.833,00	$ 5.727.936,00
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	110,00	$	15.081,00	$ 1.658.910,00
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	16,00	$	113.227,00	$ 1.811.632,00
	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	14,00	$	218.517,00	$ 3.059.238,00
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	2,00	$	848.757,00	$ 1.697.514,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$	886.192,00	$ 886.192,00
Subtotal									**$ 99.697.734,00**
ADECUACIONES CEIR VILLA FATIMA – SEDE: ISHIICHEN									
ADECUACIONES GENERALES									
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	66,00	$	12.655,00	$ 835.230,00
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	48,00	$	28.541,00	$ 1.369.968,00
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	40,00	$	17.813,00	$ 712.520,00
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	28,00	$	17.813,00	$ 498.764,00
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	1,00	$	39.134,00	$ 39.134,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	22,00	$	14.334,00	$ 315.348,00
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	12,00	$	195.433,00	$ 2.345.196,00
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	10,00	$	45.788,00	$ 457.880,00
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	28,00	$	83.949,00	$ 2.350.572,00
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	22,00	$	66.359,00	$ 1.459.898,00
	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	12,00	$	8.331,00	$ 99.972,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA: [x] ***CONVENIO:*** [ ]

INFORME PARCIAL: [ ] ***INFORME FINAL:*** [x]

	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	186,00	$	15.564,00	$ 2.894.904,00
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	40,00	$	24.918,00	$ 996.720,00
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	40,00	$	136.060,00	$ 5.442.400,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	28,00	$	136.060,00	$ 3.809.680,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	66,00	$	48.199,00	$ 3.181.134,00
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	48,00	$	113.240,00	$ 5.435.520,00
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	152,00	$	39.286,00	$ 5.971.472,00
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	152,00	$	29.833,00	$ 4.534.616,00
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	96,00	$	29.833,00	$ 2.863.968,00
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	55,00	$	15.081,00	$ 829.455,00
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	8,00	$	113.227,00	$ 905.816,00
	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	8,00	$	218.517,00	$ 1.748.136,00
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	1,00	$	848.757,00	$ 848.757,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$	886.192,00	$ 886.192,00
Subtotal									**$ 50.833.252,00**
ADECUACIONES INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: ESCUELA BUENOS AIRES									
ADECUACIONES GENERALES									
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	202,11	$	12.655,00	$ 2.557.702,05
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	290,10	$	28.541,00	$ 8.279.744,10
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	264,60	$	17.813,00	$ 4.713.319,80
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	154,70	$	17.813,00	$ 2.755.671,10
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	12,00	$	39.134,00	$ 469.608,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	108,36	$	14.334,00	$ 1.553.232,24
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	79,38	$	195.433,00	$ 15.513.471,54
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	82,15	$	45.788,00	$ 3.761.484,20
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	154,70	$	83.949,00	$ 12.986.910,30
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	108,36	$	66.359,00	$ 7.190.661,24
	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	63,00	$	8.331,00	$ 524.853,00
	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	937,44	$	15.564,00	$ 14.590.316,16
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	264,60	$	24.918,00	$ 6.593.302,80
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	264,60	$	136.060,00	$ 36.001.476,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	154,70	$	136.060,00	$ 21.048.482,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	527,80	$	48.199,00	$ 25.439.432,20
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	290,10	$	113.240,00	$ 32.850.924,00
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	528,10	$	39.286,00	$ 20.746.936,60
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	528,10	$	29.833,00	$ 15.754.807,30
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	581,70	$	29.833,00	$ 17.353.856,10
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	291,90	$	15.081,00	$ 4.402.143,90
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	32,00	$	113.227,00	$ 3.623.264,00

CONTRATO DE OBRA: [x] ***CONVENIO:*** [ ]

INFORME PARCIAL: [ ] ***INFORME FINAL:*** [x]

	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	55,50	$ 218.517,00	$ 12.127.693,50
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	9,00	$ 848.757,00	$ 7.638.813,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$ 886.192,00	$ 886.192,00
Subtotal								**$ 279.364.297,13**
ADECUACIONES IINSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA – SEDE: JAYAPA								
ADECUACIONES GENERALES								
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	74,60	$ 12.655,00	$ 944.063,00
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	115,45	$ 28.541,00	$ 3.295.058,45
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	105,00	$ 17.813,00	$ 1.870.365,00
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	61,55	$ 17.813,00	$ 1.096.390,15
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	4,00	$ 39.134,00	$ 156.536,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	43,30	$ 14.334,00	$ 620.662,20
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33,00	$ 195.433,00	$ 6.449.289,00
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	35,00	$ 45.788,00	$ 1.602.580,00
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	61,55	$ 83.949,00	$ 5.167.060,95
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	43,30	$ 66.359,00	$ 2.873.344,70
	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	25,20	$ 8.331,00	$ 209.941,20
	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	372,00	$ 15.564,00	$ 5.789.808,00
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	105,00	$ 24.918,00	$ 2.616.390,00
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	105,00	$ 136.060,00	$ 14.286.300,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	61,55	$ 136.060,00	$ 8.374.493,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	74,60	$ 48.199,00	$ 3.595.645,40
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	115,45	$ 113.240,00	$ 13.073.558,00
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	377,22	$ 39.286,00	$ 14.819.464,92
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	377,22	$ 29.833,00	$ 11.253.604,26
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	310,00	$ 29.833,00	$ 9.248.230,00
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	232,20	$ 15.081,00	$ 3.501.808,20
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	16,00	$ 113.227,00	$ 1.811.632,00
	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	25,30	$ 218.517,00	$ 5.528.480,10
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	7,00	$ 848.757,00	$ 5.941.299,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$ 886.192,00	$ 886.192,00
Subtotal								**$ 125.012.195,53**
ADECUACIONES CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH - SEDE: NUEVA YORK								
ADECUACIONES GENERALES								
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	118,80	$ 12.655,00	$ 1.503.414,00
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	86,40	$ 28.541,00	$ 2.465.942,40
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	80,00	$ 17.813,00	$ 1.425.040,00
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	50,40	$ 17.813,00	$ 897.775,20
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	2,00	$ 39.134,00	$ 78.268,00

CONTRATO DE OBRA: [x] ***CONVENIO:*** [ ]

INFORME PARCIAL: [ ] ***INFORME FINAL:*** [x]

	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	32,40	$ 14.334,00	$ 464.421,60
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	21,00	$ 195.433,00	$ 4.104.093,00
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	20,00	$ 45.788,00	$ 915.760,00
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	50,40	$ 83.949,00	$ 4.231.029,60
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	32,40	$ 66.359,00	$ 2.150.031,60
	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	24,00	$ 8.331,00	$ 199.944,00
	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	334,00	$ 15.564,00	$ 5.198.376,00
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	80,00	$ 24.918,00	$ 1.993.440,00
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	80,00	$ 136.060,00	$ 10.884.800,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	50,40	$ 136.060,00	$ 6.857.424,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	118,80	$ 48.199,00	$ 5.726.041,20
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	86,40	$ 113.240,00	$ 9.783.936,00
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	264,00	$ 39.286,00	$ 10.371.504,00
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	264,00	$ 29.833,00	$ 7.875.912,00
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	163,00	$ 29.833,00	$ 4.862.779,00
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	110,00	$ 15.081,00	$ 1.658.910,00
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	16,00	$ 113.227,00	$ 1.811.632,00
	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	14,00	$ 218.517,00	$ 3.059.238,00
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	2,00	$ 848.757,00	$ 1.697.514,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$ 886.192,00	$ 886.192,00
Subtotal								**$ 91.103.417,60**
ADECUACIONES CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDA – SEDE: WAAI								
ADECUACIONES GENERALES								
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	145,20	$ 12.655,00	$ 1.837.506,00
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	105,60	$ 28.541,00	$ 3.013.929,60
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	88,00	$ 17.813,00	$ 1.567.544,00
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	61,60	$ 17.813,00	$ 1.097.280,80
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	4,00	$ 39.134,00	$ 156.536,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	39,60	$ 14.334,00	$ 567.626,40
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	26,40	$ 195.433,00	$ 5.159.431,20
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	22,00	$ 45.788,00	$ 1.007.336,00
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	61,60	$ 83.949,00	$ 5.171.258,40
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	39,60	$ 66.359,00	$ 2.627.816,40
	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	26,40	$ 8.331,00	$ 219.938,40
	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	409,20	$ 15.564,00	$ 6.368.788,80
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	88,00	$ 24.918,00	$ 2.192.784,00
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	88,00	$ 136.060,00	$ 11.973.280,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	61,60	$ 136.060,00	$ 8.381.296,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	145,20	$ 48.199,00	$ 6.998.494,80

	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	105,60	$ 113.240,00	$	11.958.144,00
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	334,40	$ 39.286,00	$	13.137.238,40
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	334,40	$ 29.833,00	$	9.976.155,20
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	211,20	$ 29.833,00	$	6.300.729,60
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	121,00	$ 15.081,00	$	1.824.801,00
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	16,00	$ 113.227,00	$	1.811.632,00
	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	14,00	$ 218.517,00	$	3.059.238,00
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	4,00	$ 848.757,00	$	3.395.028,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$ 886.192,00	$	886.192,00
Subtotal								**$**	**110.690.005,00**
ADECUACIONES INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ – SEDE WARRERAPU #1									
ADECUACIONES GENERALES									
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	189,40	$ 12.655,00	$	2.396.857,00
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	164,42	$ 28.541,00	$	4.692.711,22
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	144,60	$ 17.813,00	$	2.575.759,80
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	96,20	$ 17.813,00	$	1.713.610,60
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	5,00	$ 39.134,00	$	195.670,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	46,20	$ 14.334,00	$	662.230,80
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	48,20	$ 195.433,00	$	9.419.870,60
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	34,00	$ 45.788,00	$	1.556.792,00
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	96,20	$ 83.949,00	$	8.075.893,80
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	46,20	$ 66.359,00	$	3.065.785,80
	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	37,00	$ 8.331,00	$	308.247,00
	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	841,00	$ 15.564,00	$	13.089.324,00
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	144,60	$ 24.918,00	$	3.603.142,80
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	144,60	$ 136.060,00	$	19.674.276,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	96,20	$ 136.060,00	$	13.088.972,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	234,10	$ 48.199,00	$	11.283.385,90
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	164,42	$ 113.240,00	$	18.618.920,80
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	605,10	$ 39.286,00	$	23.771.958,60
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	605,10	$ 29.833,00	$	18.051.948,30
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	308,84	$ 29.833,00	$	9.213.623,72
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	205,00	$ 15.081,00	$	3.091.605,00
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	19,00	$ 113.227,00	$	2.151.313,00
	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	24,00	$ 218.517,00	$	5.244.408,00
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	5,00	$ 848.757,00	$	4.243.785,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$ 886.192,00	$	886.192,00
Subtotal								**$**	**180.676.283,74**
ADECUACIONES CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE SUKULUWOU									

ADECUACIONES GENERALES									
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	149,30	$	12.655,00	$ 1.889.391,50
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	230,90	$	28.541,00	$ 6.590.116,90
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	210,50	$	17.813,00	$ 3.749.636,50
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	123,10	$	17.813,00	$ 2.192.780,30
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	7,00	$	39.134,00	$ 273.938,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	86,60	$	14.334,00	$ 1.241.324,40
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	63,00	$	195.433,00	$ 12.312.279,00
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	65,20	$	45.788,00	$ 2.985.377,60
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	123,10	$	83.949,00	$ 10.334.121,90
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	86,60	$	66.359,00	$ 5.746.689,40
	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	45,20	$	8.331,00	$ 376.561,20
	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	743,63	$	15.564,00	$ 11.573.850,91
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	210,50	$	24.918,00	$ 5.245.239,00
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	210,50	$	136.060,00	$ 28.640.630,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	123,10	$	136.060,00	$ 16.748.986,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	377,22	$	48.199,00	$ 18.181.626,78
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	230,90	$	113.240,00	$ 26.147.116,00
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	377,22	$	39.286,00	$ 14.819.464,92
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	377,22	$	29.833,00	$ 11.253.604,26
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	461,80	$	29.833,00	$ 13.776.879,40
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	232,20	$	15.081,00	$ 3.501.808,20
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	16,00	$	113.227,00	$ 1.811.632,00
	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	25,30	$	218.517,00	$ 5.528.480,10
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	7,00	$	848.757,00	$ 5.941.299,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$	886.192,00	$ 886.192,00
Subtotal									**$ 211.749.025,27**
ADECUACIONES CCENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES -SEDE WALAKALIT #1									
ADECUACIONES GENERALES									
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	65,00	$	12.655,00	$ 822.575,00
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	32,50	$	28.541,00	$ 927.582,50
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	30,00	$	17.813,00	$ 534.390,00
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	12,00	$	17.813,00	$ 213.756,00
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	1,00	$	39.134,00	$ 39.134,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	15,00	$	14.334,00	$ 215.010,00
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	9,00	$	195.433,00	$ 1.758.897,00
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	10,00	$	45.788,00	$ 457.880,00
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	24,00	$	83.949,00	$ 2.014.776,00
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	15,00	$	66.359,00	$ 995.385,00

	1,11		1,11	FILOS DE MUROS	ML	10,00	$	8.331,00	$ 83.310,00
	1,12		1,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	148,00	$	15.564,00	$ 2.303.472,00
	1,13		1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X15 X 7 MM	M2	30,00	$	24.918,00	$ 747.540,00
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	30,00	$	136.060,00	$ 4.081.800,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	24,00	$	136.060,00	$ 3.265.440,00
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	65,00	$	48.199,00	$ 3.132.935,00
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	32,50	$	113.240,00	$ 3.680.300,00
	1,18		1,18	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	109,00	$	39.286,00	$ 4.282.174,00
	1,19		1,19	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	109,00	$	29.833,00	$ 3.251.797,00
	1,20		1,20	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	265,00	$	29.833,00	$ 7.905.745,00
	1,21		1,21	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	39,00	$	15.081,00	$ 588.159,00
	1,22		1,22	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	6,00	$	113.227,00	$ 679.362,00
	1,23		1,23	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	7,00	$	218.517,00	$ 1.529.619,00
	1,24		1,24	SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS	UND	1,00	$	848.757,00	$ 848.757,00
	1,25		1,25	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$	886.192,00	$ 886.192,00
Subtotal									**$ 45.245.987,50**
ADECUACIONES CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL LOS OLIVOS									
ADECUACIONES GENERALES									
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	94,45	$	12.655,00	$ 1.195.264,75
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	152,50	$	28.541,00	$ 4.352.502,50
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	166,48	$	17.813,00	$ 2.965.508,24
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	71,20	$	17.813,00	$ 1.268.285,60
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	3,00	$	39.134,00	$ 117.402,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	82,37	$	14.334,00	$ 1.180.691,58
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	45,72	$	195.433,00	$ 8.935.196,76
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	38,19	$	45.788,00	$ 1.748.643,72
	1,9		1,9	VIGA SOBRE MURO DE 0,10X0,20 MT EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	24,50	$	45.315,00	$ 1.110.217,50
	1,10		1,10	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	71,20	$	83.949,00	$ 5.977.168,80
	1,11		1,11	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	117,42	$	66.359,00	$ 7.791.873,78
	1,12		1,12	MURO EN CALADO 10X20X40 CM	M2	20,10	$	59.850,00	$ 1.202.985,00
	1,13		1,13	FILOS DE MUROS	ML	35,90	$	8.331,00	$ 299.082,90
	1,14		1,14	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	975,45	$	15.564,00	$ 15.181.903,80
	1,15		1,15	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	202,59	$	136.060,00	$ 27.564.395,40
	1,16		1,16	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	71,20	$	136.060,00	$ 9.687.472,00
	1,17		1,17	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	328,45	$	48.199,00	$ 15.830.961,55
	1,18		1,18	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	152,50	$	113.240,00	$ 17.269.100,00
	1,19		1,19	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	ML	41,35	$	113.227,00	$ 4.681.936,45
	1,20		1,20	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	564,30	$	39.286,00	$ 22.169.089,80
	1,21		1,21	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	564,30	$	29.833,00	$ 16.834.761,90

	1,22		1,22	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	M2	436,15	$	29.833,00	$ 13.011.662,95
	1,23		1,23	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	355,30	$	15.081,00	$ 5.358.279,30
	1,24		1,24	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	M2	30,55	$	218.517,00	$ 6.675.694,35
	1,25		1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	UND	5,00	$	848.757,00	$ 4.243.785,00
	1,26		1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS	UND	2,00	$	650.000,00	$ 1.300.000,00
	1,27		1,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVA MANOS	UND	2,00	$	590.000,00	$ 1.180.000,00
	1,28		1,28	PUNTOS SANITARIOS DE 2"	UND	2,00	$	36.250,00	$ 72.500,00
	1,29		1,29	PUNTOS SANITARIOS DE 4"	UND	2,00	$	54.411,46	$ 108.822,92
	1,30		1,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA DE 4X4 DE 3 MT	ML	24,00	$	60.400,00	$ 1.449.600,00
	1,31		1,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA DE 4X4 DE 4 MT	ML	8,00	$	83.875,18	$ 671.001,44
	1,32		1,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA DE 2X3 DE 3 MT	ML	47,40	$	25.837,12	$ 1.224.679,49
	1,33		1,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA DE 2X4 DE 3 MT	ML	50,60	$	35.125,14	$ 1.777.332,08
	1,34		1,34	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$	886.192,00	$ 886.192,00
Subtotal									**$ 205.323.993,56**
ADECUACIONES CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ISABEL JUSAYU									
ADECUACIONES GENERALES									
	1,1		1,1	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	M2	96,25	$	12.655,00	$ 1.218.043,75
	1,2		1,2	DESMONTE DE CUBIERTA A.C INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	128,85	$	28.541,00	$ 3.677.507,85
	1,3		1,3	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO CON RETIRO	M2	40,00	$	17.813,00	$ 712.520,00
	1,4		1,4	DEMOLICION DE ANDEN PERIMETRAL EN MAL ESTADO	M2	80,00	$	17.813,00	$ 1.425.040,00
	1,5		1,5	DESMONTE DE PUERTAS	UND	4,00	$	39.134,00	$ 156.536,00
	1,6		1,6	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE	M2	65,28	$	14.334,00	$ 935.723,52
	1,7		1,7	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	22,20	$	195.433,00	$ 4.338.612,60
	1,8		1,8	PISA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,15	ML	25,22	$	45.788,00	$ 1.154.773,36
	1,9		1,9	CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL PARA ANDEN DE 0,15X0,0,25M INCLUYE EXCAVACION	ML	80,32	$	83.949,00	$ 6.742.783,68
	1,10		1,10	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10X19X40CM	M2	65,28	$	66.359,00	$ 4.331.915,52
	1,11		1,11	MURO EN CALADO 10 X20X40CM	ML	25,45	$	59.850,00	$ 1.523.182,50
	1,12		1,12	FILOS DE MUROS	KG	45,35	$	8.331,00	$ 377.810,85
	1,13		1,13	ACERO DE REFUERZO A-60	M2	820,15	$	15.564,00	$ 12.764.814,60
	1,14		1,14	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	M2	40,00	$	136.060,00	$ 5.442.400,00
	1,15		1,15	ANDEN CONCRETO 10CM DE 3000 PSI	M2	80,32	$	136.060,00	$ 10.928.339,20
	1,16		1,16	PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMIABILIZADOS	M2	96,25	$	48.199,00	$ 4.639.153,75
	1,17		1,17	CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	128,85	$	113.240,00	$ 14.590.974,00
	1,18		1,18	SUMINISTRO INSTALACION DE CABALLETES	M2	25,23	$	113.227,00	$ 2.856.717,21
	1,19		1,19	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	1.054,13	$	39.286,00	$ 41.412.551,18
	1,20		1,20	PINTURA MUROS (TIPO 1) 3M	M2	1.054,13	$	29.833,00	$ 31.447.860,29
	1,21		1,21	PINTURA TECHO (TIPO 1) 3M	ML	693,56	$	29.833,00	$ 20.690.856,15
	1,22		1,22	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL DE LA ESTRUCTURA DE TECHO	ML	493,52	$	15.081,00	$ 7.442.775,12
	1,23		1,23	ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA LINEAL DE TECHO	M2	106,00	$	15.081,00	$ 1.598.586,00

Tabla 3. Presupuesto Detallado

	1,24		1,24	PROTECTOR EN MARCO DE ALUMINIO CON MALLA PARA EVITAR ENTRADA DE MURCIELAGOS	UND	50,50	$	218.517,00	$ 11.035.108,50
	1,25		1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	GL	2,00	$	848.757,00	$ 1.697.514,00
	1,26		1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS	M2	4,00	$	650.000,00	$ 2.600.000,00
	1,27		1,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA DE 4X4 DE 3 MT	ML	15,45	$	60.400,00	$ 933.180,00
	1,28		1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA DE 4X4 DE 4 MT	ML	8,00	$	83.875,18	$ 671.001,44
	1,29		1,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA DE 2X3 DE 3 MT	ML	20,87	$	25.837,12	$ 539.220,69
	1,30		1,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA DE 2X4 DE 3 MT	ML	35,00	$	35.125,14	$ 1.229.379,90
	1,34		1,31	LIMPIEZA GENERAL	GL	1,00	$	886.192,29	$ 886.192,29
Subtotal									**$ 200.001.073,95**
								SUBTOTAL OBRAS DE ADECUACION	**$ 1.599.697.265,28**
								TOTAL COSTO DEL PROYECTO (INCLUYE A.I.U)	**$ 3.261.346.114,00**

3.6 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y/O CONTRATO

Durante la ejecución del contrato, surgieron varias dificultades que requirieron soluciones efectivas, al momento de iniciar los trabajos se realizaron reuniones con los diferentes rectores y maestros para de manera articulada con los ya nombrados, organizando la entrega de las diferentes aulas a intervenir para así lograr el menor de los inconvenientes al momento de utilizar las aulas de clases para desarrollar las diferentes actividades del contrato sin que se viera afectada el normal funcionamiento de la institución.

debido al inicio del periodo de vacaciones de mitad de año, la empresa contratista de la obra logro realizar de manera eficiente las actividades contratadas ya que con la ausencia de los estudiantes, profesores y personal administrativos se pudieron ejecutar los trabajos sin restricciones.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

ETAPA	ENTIDAD	TIPO DE ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	PERIODO	VALOR
INVERSIÓN	URIBIA	MUNICIPIOS	PROPIOS	5	$ 3.261.346.114,00
	TOTAL, INVERSIÓN			TOTAL	$ 3.261.346.114,00
TOTAL					**$ 3.261.346.114,00**

Tabla 4. Inversiones

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

POLIZAS DEL CONTRATO – POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.18 13:54:31 -05:00

Código de Seguridad: RosTORkxtDA8OsmwZ8hfVw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1117-0-05-05GUC3500000005-0007

No. PÓLIZA	BQ-100086831	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	28392192	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/06/2024	24:00 Horas Del	25/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERAULAS 2024	No. DOC. IDENTIDAD	901.837.680-1
DIRECCIÓN	CL 12A N9-80	TELÉFONO	3005374494
ASEGURADO	MUNICIPIO DE URIBIA	No. DOC. IDENTIDAD	892.115.155-4
DIRECCIÓN	CALLE 12 NO. 8 - 61	TELÉFONO	777110
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE URIBIA	No. DOC. IDENTIDAD	892.115.155-4
DIRECCIÓN	CALLE 12 NO. 8 - 61	TELÉFONO	777110

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA SE REALIZA ADICION Y PRORROGA SEGUN ADCIONAL NO 02 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.008 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y DORMITORIOS EN EL INTERNADO INDIGENA KASUTALAIN SEDE ALUATACHON DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/09/2024	24:00 Horas Del 25/09/2025	4.881.781,40	27.351,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 24/09/2024	24:00 Horas Del 25/09/2025	15.927.125,60	19.270,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 24/09/2024	24:00 Horas Del 25/03/2025	4.881.781,40	22.779,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.690.688,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JOSE BLANCO MENDOZA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	69.400,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	69.400,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	13.186,00
TOTAL A PAGAR	$	82.586,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/03/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Luis Hernán Lozano G.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Ilustración 3. Póliza Según Acta De Inicio Anexo 1.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	8Q-100086831	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	28392192	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/06/2024	24:00 Horas Del	25/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901438268 - ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS (PART. 50%)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900292086- CONSTRUHABITARQ SAS (PART. 50%)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERAULAS 2024)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

GILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

Ilustración 4. Póliza Según Acta De Inicio Anexo 1.

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100086831** y endoso, 4 cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERAULAS 2024** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE URIBIA / MUNICIPIO DE URIBIA** , expedida por la Compañía en **18/11/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **18** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Ilustración 5. Póliza Según Acta De Inicio Anexo 1.

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

REGISTRO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO GUAJIRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA - LA GUAJIRA

HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL			
NÚMERO DE REGISTRO	604001	FECHA DE EXPEDICIÓN	04 DE JUNIO DEL 2024
NÚMERO DE CDP	313002	FECHA DE EMISIÓN	13 DE MARZO DEL 2024
DOCUMENTO DE CONTROL	0009 - MÍNIMA CUANTÍA	NUMERO CONTRATO	008
BENEFICIARIO	901.837.680 - CONSORCIO INTERAULAS 2024		
CONCEPTO DEL REGISTRO	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES,ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAFÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA,LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	$ 31.998.814,00	SON: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	SECRETARIA DE EDUCACION
DEPENDENCIA	EDUCACIÓN
SECTOR	EDUCACIÓN
PROGRAMA	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2201)
SUBPROGRAMA	INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN
PROYECTO	2024448470028 - APOYO AL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA- 22 - EDUCACIÓN- 2201 - CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2201)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE O RECURSO	1-RECURSOS PROPIOS ICLD
PRODUCTO MGA	2201019 - Infraestructura educativa construida-2201019
PRODUCTO CPC	91121 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN
VALOR FUENTE	$ 31.998.814,00

FIRMA RESPONSABLE

FECHA IMPRESIÓN: JUN 12 2024 IP: 191.95.17.163 IMPRIMIÓ: dguerrero ELABORÓ:

Página 1 de 1

Ilustración 9. Registro Presupuestal (Inicial)

DEPARTAMENTO GUAJIRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA - LA GUAJIRA

HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL			
NÚMERO DE REGISTRO	725010	FECHA DE EXPEDICIÓN	25 DE JULIO DEL 2024
NÚMERO DE CDP	722001	FECHA DE EMISIÓN	22 DE JULIO DEL 2024
DOCUMENTO DE CONTROL	0009 - MÍNIMA CUANTÍA	NUMERO CONTRATO	008
BENEFICIARIO	901.837.680 - CONSORCIO INTERAULAS 2024		
CONCEPTO DEL REGISTRO	ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 008 DEL 2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	$ 7.819.000,00	SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	SECRETARIA DE EDUCACION
DEPENDENCIA	EDUCACIÓN
SECTOR	EDUCACIÓN
PROGRAMA	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2201)
SUBPROGRAMA	INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN
PROYECTO	2024448470028 - APOYO AL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA- 22 - EDUCACIÓN- 2201 - CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2201)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE O RECURSO	1-RECURSOS PROPIOS ICLD
PRODUCTO MGA	2201019 - Infraestructura educativa construida-2201019
PRODUCTO CPC	91121 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN
VALOR FUENTE	$ 7.819.000,00

FIRMA RESPONSABLE

FECHA IMPRESIÓN: NOV 15 2024 IP: 181.78.19.25 IMPRIMIÓ: dguerrero ELABORÓ:

Ilustración 9. Registro Presupuestal (Adición 01)

CONTRATO DE OBRA: [x] ***CONVENIO:*** [ ]

INFORME PARCIAL: [ ] ***INFORME FINAL:*** [x]

DEPARTAMENTO GUAJIRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA - LA GUAJIRA

HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL			
NÚMERO DE REGISTRO	924004	FECHA DE EXPEDICIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
NÚMERO DE CDP	924001	FECHA DE EMISIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
DOCUMENTO DE CONTROL	0009 - MÍNIMA CUANTÍA	NUMERO CONTRATO	008
BENEFICIARIO	901.837.680 - CONSORCIO INTERAULAS 2024		
CONCEPTO DEL REGISTRO	ADICIONAL NO. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 008 DEL 2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	$ 9.000.000,00	SON: NUEVE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA	EDUCACIÓN
SECTOR	EDUCACIÓN
PROGRAMA	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2201)
SUBPROGRAMA	INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN
PROYECTO	2024448470028-1 - APOYO AL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDU- 22 - EDUCACIÓN- 2201 - CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2201)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE O RECURSO	1-RECURSOS PROPIOS ICLD
PRODUCTO MGA	2201019 - Infraestructura educativa construida-2201019
PRODUCTO CPC	91121 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN
VALOR FUENTE	$ 9.000.000,00

FIRMA RESPONSABLE

FECHA IMPRESIÓN: NOV 15 2024 IP: 181.78.19.25 IMPRIMÓ: dguerrero ELABORÓ:

Ilustración 9. Registro Presupuestal (Adición 02)

4.1 ANTICIPO

CONTRATO CON ANTICIPO	VALOR DE ANTICIPO	PORCENTAJE DE ANTICIPO	ORDEN DE PAGO Nº	FECHA DE COMPROBANTES DE EGRESO DE ANTICIPOS
SI	$ 12.799.525,00 M/CTE	40%	711006	12/07/2024

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

4.2 PRORROGA Y ADICIONES	SI CUATRO (04) MESES Y (0) DIAS

5. ASPECTOS TÉCNICOS Y GENERALES DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

CODIGO:700-06.06.02	VERSION: 2.024
COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE INICIO

INVITACIÓN PUBLICA DE MINIMA CUANTIA N°:	008 DEL 4 DE JUNIO DE 2.024.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
CÓDIGO BPIN:	2024448470028
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERAULAS 2.024.
NIT:	901.837.680-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS HERNAN LOAIZA GIL.
CEDULA DE CIUDADANIA N°:	84.025.804 expedida en Riohacha.
DIRECCIÓN:	Calle 12ª Nº 9-80 en la ciudad de Riohacha.
TELÉFONO:	3005374494
EMAIL:	construhabitarq2024@gmail.com
VALOR:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS **($31.998.814,00)**
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES.
IMPUTACION PRESUPUESTAL (Objeto del Gasto y Fuente o Recurso):	2.3.2.02.02.009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales. 1-RECURSOS PROPIOS ICLD.
SECTOR:	EDUCACIÓN.
CERT. DISP. PRESUPESTAL N°:	313002 del 13 de marzo del 2.024.
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	604001 del 4 de junio del 2.024.
GARANTIA DEL CONTRATO:	**Póliza de Seguro de Cumplimiento N° BQ-100086831**, expedida el 11 de junio de 2.024, con la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS:	DOCE (12) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2.024).
FECHA DEL ACTO MODIFICATORIO N° 001:	ONCE (11) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2.024).

En el Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira, a los **doce (12) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2.024)**, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Uribia, el Arquitecto **FABIÁN JOSÉ BRIEVA IGUARÁN**, como Supervisor, y el Señor **LUIS HERNÁN LOAIZA GIL**, identificado con la cedula de ciudadanía **C.C. N° 84.025.804** expedida en Riohacha, representante legal del **CONSORCIO INTERAULAS 2.024, con NIT. 901.837.680-1**, como el **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio a la **Invitación Pública de Mínima Cuantía N° 008 DEL 2.024**, cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.**

CONSIDERACIONES:

1. Qué, entre **EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA**, se celebró la **Invitación Pública de Mínima Cuantía N° 008 DEL 2.024**, de conformidad con los plazos, valores, condiciones y demás estipulaciones que se pactaron en el respectivo vínculo contractual, el cual tiene por objeto la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA**", por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($31.998.814,00)**, por un término de **DOS (02) MESES**, dicha Oferta se suscribió bajo la modalidad de **Invitación Pública de Mínima Cuantía**, adjudicado a la **CONSORCIO INTERAULAS 2.024.**, identificado con **NIT. 901.837.680-1.**

2. Qué, a la Oferta en mención, se le constituyó la **Póliza de Seguro de Cumplimiento N° BQ-100086831**, expedida el 11 de junio de 2.024, con la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

3. Qué, se expidió el **Registro Presupuestal Nro.** 604001 del 4 de junio del 2.024.

4. Qué, El Municipio de Uribia hará entrega del recurso que en este estudio se dispone así: **Pacto de Anticipo:** Las partes pactan un anticipo del 40% del valor del contrato, esto es, la suma de **DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($12.799.525,00)**.

5. Qué, en la **CLÁUSULA PRIMERA** del Modificatorio Nº 001 se cita lo siguiente: **Supervisión:** La supervisión del contrato será ejercida por el Profesional Universitario adscrito a la Secretaría de Obras Municipal, que ostenta el cargo de INTERVENTOR MUNICIPAL, quien tendrá como función la supervisión de la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del presente negocio jurídico. **Parágrafo primero:** Para ejercicio de las labores técnicas de supervisión podrá apoyarse en el personal profesional vinculado por medio de contrato de prestación de servicios para estos propósitos. **Parágrafo segundo:** En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero.

6. Qué, en virtud de las consideraciones anteriores, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar inicio a la **Invitación Pública de Mínima Cuantía N° 008 DEL 2.024**, con las características y condiciones señaladas en el Cuadro de la Referencia.

SEGUNDO: Fecha de Inicio y Terminación de la Oferta: Téngase como las fechas de inicio y terminación del contrato suscrito y debidamente señalado, lo siguiente:

Fecha de Inicio: Doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2.024).

Fecha de Terminación: Once (11) de agosto de dos mil veinticuatro (2.024).

Para constancia, se firma por los que en la presente acta intervienen. Dada en Uribia, La Guajira, Capital Indígena de Colombia, a los Doce (12) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2.024).

POR EL CONTRATISTA:

Luis Hernan Loaiza Gil

LUIS HERNÁN LOAIZA GIL.
C.C. Nº 84.025.804 expedida en Riohacha.
Representante Legal.
CONSORCIO INTERAULAS 2.024.
Interventor.

POR EL MUNICIPIO:


FABIÁN JOSÉ BRIEVA IGUARÁN.
Supervisor.

Calle 12 No. 8 - 61
contactenos@uribia-laguajira.gov.co
alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

Ilustración 10. Acta De Inicio

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

ADICION 01 DEL CONTRATO

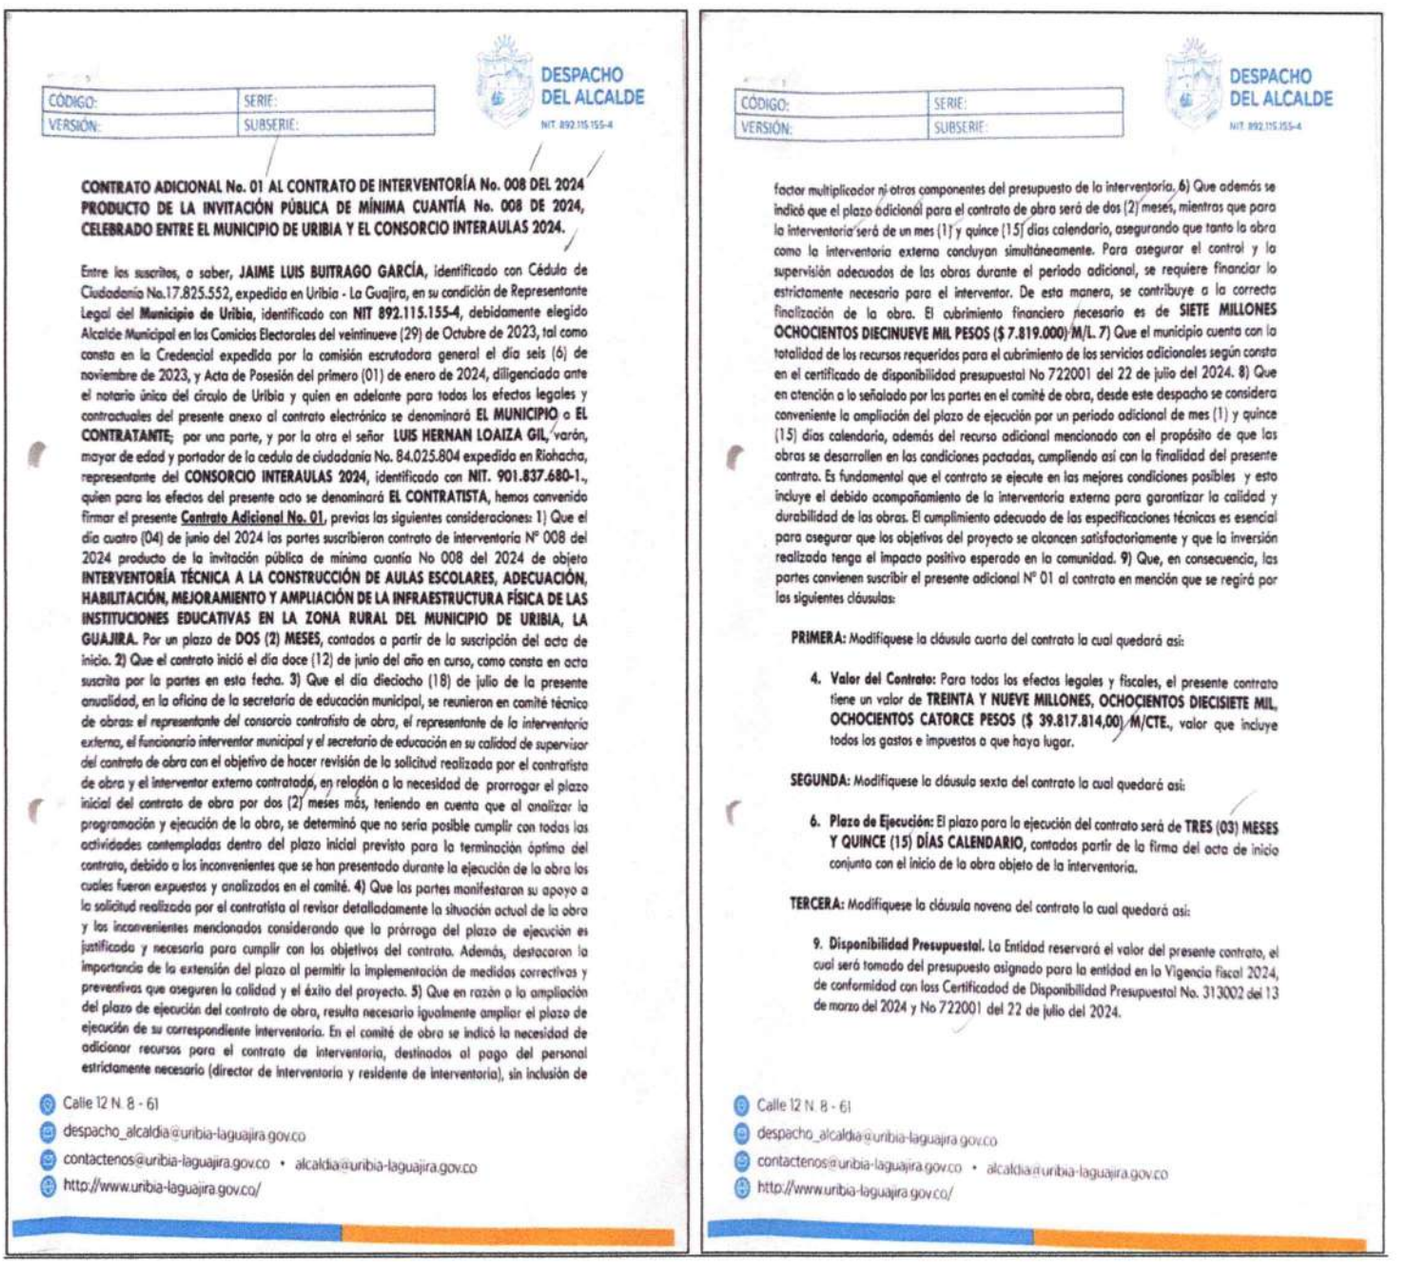

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:

DESPACHO DEL ALCALDE
NIT. 892.115.155-4

CONTRATO ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 008 DEL 2024 PRODUCTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. 008 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE URIBIA Y EL CONSORCIO INTERAULAS 2024.

Entre los suscritos, a saber, **JAIME LUIS BUITRAGO GARCÍA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.825.552, expedida en Uribia - La Guajira, en su condición de Representante Legal del **Municipio de Uribia**, identificado con **NIT 892.115.155-4**, debidamente elegido Alcalde Municipal en los Comicios Electorales del veintinueve (29) de Octubre de 2023, tal como consta en la Credencial expedida por la comisión escrutadora general el día seis (6) de noviembre de 2023, y Acta de Posesión del primero (01) de enero de 2024, diligenciada ante el notario único del círculo de Uribia y quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente anexo al contrato electrónico se denominará **EL MUNICIPIO** o **EL CONTRATANTE**; por una parte, y por la otra el señor **LUIS HERNAN LOAIZA GIL**, varón, mayor de edad y portador de la cedula de ciudadanía No. 84.025.804 expedida en Riohacha, representante del **CONSORCIO INTERAULAS 2024**, identificado con **NIT. 901.837.680-1.**, quien para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido firmar el presente **Contrato Adicional No. 01**, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el día cuatro (04) de junio del 2024 las partes suscribieron contrato de interventoría N° 008 del 2024 producto de la invitación pública de mínima cuantía No 008 del 2024 de objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.** Por un plazo de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **2)** Que el contrato inició el día doce (12) de junio del año en curso, como consta en acta suscrita por la partes en esta fecha. **3)** Que el día dieciocho (18) de julio de la presente anualidad, en la oficina de la secretaria de educación municipal, se reunieron en comité técnico de obras: el representante del consorcio contratista de obra, el representante de la interventoria externa, el funcionario interventor municipal y el secretario de educación en su calidad de supervisor del contrato de obra con el objetivo de hacer revisión de la solicitud realizada por el contratista de obra y el interventor externo contratado, en relación a la necesidad de prorrogar el plazo inicial del contrato de obra por dos (2) meses más, teniendo en cuenta que al analizar la programación y ejecución de la obra, se determinó que no sería posible cumplir con todas las actividades contempladas dentro del plazo inicial previsto para la terminación óptima del contrato, debido a los inconvenientes que se han presentado durante la ejecución de la obra los cuales fueron expuestos y analizados en el comité. **4)** Que las partes manifestaron su apoyo a la solicitud realizada por el contratista al revisar detalladamente la situación actual de la obra y los inconvenientes mencionados considerando que la prórroga del plazo de ejecución es justificada y necesaria para cumplir con los objetivos del contrato. Además, destacaron la importancia de la extensión del plazo al permitir la implementación de medidas correctivas y preventivas que aseguren la calidad y el éxito del proyecto. **5)** Que en razón a la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra, resulta necesario igualmente ampliar el plazo de ejecución de su correspondiente interventoría. En el comité de obra se indicó la necesidad de adicionar recursos para el contrato de interventoría, destinados al pago del personal estrictamente necesario (director de interventoría y residente de interventoría), sin inclusión de

Calle 12 N. 8 - 61
despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:

DESPACHO DEL ALCALDE
NIT. 892.115.155-4

factor multiplicador ni otros componentes del presupuesto de la interventoría. **6)** Que además se indicó que el plazo adicional para el contrato de obra será de dos (2) meses, mientras que para la interventoría será de un mes (1) y quince (15) días calendario, asegurando que tanto la obra como la interventoría externa concluyan simultáneamente. Para asegurar el control y la supervisión adecuados de las obras durante el periodo adicional, se requiere financiar lo estrictamente necesario para el interventor. De esta manera, se contribuye a la correcta finalización de la obra. El cubrimiento financiero necesario es de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($ 7.819.000) M/L. 7)** Que el municipio cuenta con la totalidad de los recursos requeridos para el cubrimiento de los servicios adicionales según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No 722001 del 22 de julio del 2024. **8)** Que en atención a lo señalado por las partes en el comité de obra, desde este despacho se considera conveniente la ampliación del plazo de ejecución por un periodo adicional de mes (1) y quince (15) días calendario, además del recurso adicional mencionado con el propósito de que las obras se desarrollen en las condiciones pactadas, cumpliendo así con la finalidad del presente contrato. Es fundamental que el contrato se ejecute en las mejores condiciones posibles y esto incluye el debido acompañamiento de la interventoría externa para garantizar la calidad y durabilidad de las obras. El cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas es esencial para asegurar que los objetivos del proyecto se alcancen satisfactoriamente y que la inversión realizada tenga el impacto positivo esperado en la comunidad. **9)** Que, en consecuencia, las partes convienen suscribir el presente adicional N° 01 al contrato en mención que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Modifíquese la cláusula cuarta del contrato la cual quedará así:

4. **Valor del Contrato:** Para todos los efectos legales y fiscales, el presente contrato tiene un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL, OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($ 39.817.814,00) M/CTE.**, valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

SEGUNDA: Modifíquese la cláusula sexta del contrato la cual quedará así:

6. **Plazo de Ejecución:** El plazo para la ejecución del contrato será de **TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, contados partir de la firma del acta de inicio conjunta con el inicio de la obra objeto de la interventoría.

TERCERA: Modifíquese la cláusula novena del contrato la cual quedará así:

9. **Disponibilidad Presupuestal.** La Entidad reservará el valor del presente contrato, el cual será tomado del presupuesto asignado para la entidad en la Vigencia fiscal 2024, de conformidad con loss Certificadod de Disponibilidad Presupuestal No. 313002 del 13 de marzo del 2024 y No 722001 del 22 de julio del 2024.

Calle 12 N. 8 - 61
despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

Ilustración 11. Adición 01 Del Contrato

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:

DESPACHO DEL ALCALDE
NIT. 892.115.155-4

CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única de cumplimiento y póliza anexa de responsabilidad civil extracontractual, teniendo en cuenta el plazo y el recurso adicionado al contrato, mediante el presente acuerdo. **QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** El presente acuerdo, se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para mayor constancia de lo pactado, se firma el presente contrato en el Municipio de Uribia, a los veinticinco (25) días del mes de julio del 2024.

JAIME LUIS BUITRAGO GARCÍA
Alcalde Municipal
Contratante

LUIS HERNÁN LOAIZA GIL
Representante Legal **CONSORCIO INTERAULAS 2024**
Contratista

Proyectó: Andrea Beatriz Molino Villegas - Profesional Especializado de Apoyo Oficina Contratación Municipal
Revisó: Asunción del C. Julio Bello. Profesional Especializado de Apoyo Oficina Contratación
Aprobó: José Ramón Curvelo Uriana - Jefe Oficina de Contratación

Calle 12 N. 8 - 61
despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

Ilustración 11. Adición 01 Del Contrato

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA:		x	***CONVENIO:***		
INFORME PARCIAL:			***INFORME FINAL:***		x

ADICION 02 DEL CONTRATO

CODIGO: 100.06.06.01	SERIE: 2013
MINUTA DE RESPALDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRONICO	DESPACHO DEL ALCALDE

DESPACHO DEL ALCALDE
NIT. 892.115.155-4

CONTRATO ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 008 DEL 2024 PRODUCTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. 008 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE URIBIA Y EL CONSORCIO INTERAULAS 2024

Entre los suscritos, a saber, **JAIME LUIS BUITRAGO GARCÍA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.17.825.552, expedida en Uribia - La Guajira, en su condición de Representante Legal del **MUNICIPIO DE URIBIA**, identificado con **NIT 892.115.155-4**, debidamente elegido Alcalde Municipal en los Comicios Electorales del veintinueve (29) de Octubre de 2023, tal como consta en la Creciencial expedida por la comisión escrutadora general el día seis (6) de noviembre de 2023, y Acta de Posesión del primero (01) de enero de 2024, diligenciada ante el notaria única del circulo de Uribia y quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales se denominará **EL MUNICIPIO** o **EL CONTRATANTE**; por una parte, y por la otra el señor **LUIS HERNAN LOAIZA GIL**, varón, mayor de edad y portador de la cedula de ciudadanía No. 84.025.804 expedida en Riohacha, representante del **CONSORCIO INTERAULAS 2024**, identificado con **NIT. 901.837.680-1**., quien para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido firmar el presente **Contrato Adicional No. 02**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el día cuatro (04) de junio del 2024 las partes suscribieron contrato de interventoria N° 008 del 2024 producto de la invitación pública de mínima cuantía No 008 del 2024 de objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA** por un plazo de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **2)** Que el contrato inició el día doce (12) de junio del año en curso, como consta en acta suscrita por las partes en esta fecha y mediante contrato adicional No. 01 de fecha 25 de Julio del 2024 se amplió el plazo a **tres (3) meses y quince (15) días calendario.** **3)** Que mediante Acto de Comité de obras del cuatro (4) de septiembre del 2024 se evidenció la necesidad de realizar mayores intervenciones en obras al contrato objeto de vigilancia, así como realizar algunas otras descripciones adicionales en aras de poder dar solución a la siguiente problemática especifica existente, asociadas y complementarias a los procesos constructivos que se adelantan, tales como:

1. ***Deficiencia en Espacios Educativos:*** *Muchos centros carecen de aulas adecuadas y suficientes, resultando en hacinamiento y condiciones de aprendizaje deficientes.*
2. ***Necesidad de Mejoras en Infraestructuras Existentes;*** *presentan instalaciones deterioradas, con problemas estructurales, eléctricos, de plomería y mobiliario obsoleto.*

4) Que se requiere así de intervención en las siguientes infraestructuras educativas (centros etnoeducativos rurales del municipio de Uribia):

1. ***Centro Etnoeducativo Rural Jashainap:*** Construcción de aulas
2. ***Centro Etnoeducativo Rural Jisentirra:*** Construcción de aulas
3. ***Centro Etnoeducativo Rural Los Olivos:*** Adecuaciones y mejoras en sus instalaciones.
4. ***Centro Etnoeducativo Rural Isabel Jusayu:*** Adecuaciones y renovaciones en su infraestructura.

Calle 12 N. 8 - 61
despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

CODIGO: 100.06.06.01	SERIE: 2013
MINUTA DE RESPALDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRONICO	DESPACHO DEL ALCALDE

DESPACHO DEL ALCALDE
NIT. 892.115.155-4

5) Que para la ejecución de las obras adicionales es necesario ampliar el plazo en 2.5 meses, como quedó consignado en el acta de comité de obras, siendo fundamental que el contrato se ejecute en las mejores condiciones posibles para garantizar la calidad y durabilidad de las obras. El cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas es esencial para asegurar que los objetivos del proyecto se alcancen satisfactoriamente y que la inversión realizada tenga el impacto positivo esperado en la comunidad. **6)** Que en razón a la ampliación en recursos y plazo al contrato de obra, resulta necesario igualmente ampliar el plazo de ejecución de su correspondiente interventoria. En el comité de obra se indicó la necesidad de adicionar recursos la suma de nueve millones de pesos ($ 9.000.000,oo) para el contrato de interventoria, destinocios al pago del personal estrictamente necesario (director de interventoria y residente de interventoria), sin inclusión de factor multiplicador ni otros componentes del presupuesto de la interventoria. **7)** Que el municipio cuenta con la totalidad de los recursos requeridos para el cubrimiento de los servicios adicionales según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No 924001 del 24 de Septiembre del 2024. **8)** Que, en consecuencia, las partes convienen suscribir el presente adicional N° 02 al contrato en mención que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Modifiquese la cláusula cuarta del contrato la cual quedará así:

4. **Valor del Contrato:** Para todos los efectos legales y fiscales, el presente contrato tiene un valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($ 48.817.814,00) M/CTE.**., valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

SEGUNDA: Modifiquese la cláusula sexta del contrato la cual quedará así:

6. **Plazo de Ejecución:** El plazo para la ejecución del contrato será de **SEIS (6) MESES**, contados partir de la firma del acta de inicio conjunta con el inicio de la obra objeto de la interventoria.

TERCERA: Modifiquese la cláusula novena del contrato la cual quedará así:

9. **Disponibilidad Presupuestal.** La Entidad reservará el valor del presente contrato, el cual será tomado del presupuesto asignado para la entidad en la Vigencia fiscal 2024, de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 313002 del 13 de marzo del 2024, No 722001 del 22 de julio del 2024 y 924001 del 24 de Septiembre del 2024.

CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única de cumplimiento, teniendo en cuenta el plazo y el recurso adicionado al contrato, mediante el presente acuerdo. **QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** El presente acuerdo, se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Calle 12 N. 8 - 61
despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

Ilustración 12. Adición 02 Del Contrato

CODIGO: 100.06.06.01	SERIE: 2013
MINUTA DE RESPALDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRONICO	DESPACHO DEL ALCALDE

DESPACHO DEL ALCALDE
NIT. 892.115.155-4

Para mayor constancia de lo pactado, se firma el presente contrato en el Municipio de Uribia, a los veinticuatro (24) días del mes de Septiembre del 2024.

JAIME LUIS BUITRAGO GARCÍA
Alcalde Municipal
Contratante

LUIS HERNÁN LOAIZA GIL
Representante Legal **CONSORCIO INTERAULAS 2024**
Contratista

Proyectó: Andrea Beatriz Molino Villegas - Profesional Especializado de Apoyo Oficina Contratación Municipal
Revisó: Asunción del C. Julio Bello. Profesional Especializado de Apoyo Oficina Contratación
Aprobó: José Ramón Curvelo Uriana – Jefe Oficina de Contratación

Calle 12 N. 8 - 61
despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

Ilustración 12. Adición 02 Del Contrato

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

5.1 ANALISIS TÉCNICOS

- **Selección del Nuevo Espacio:**

La decisión de reubicar la bodega en dos oficinas abandonadas en el segundo piso del Palacio Municipal fue motivada por la necesidad de liberar el área de esparcimiento en el primer piso y optimizar el uso del espacio disponible. Estas oficinas, aunque obsoletas, ofrecían el potencial de ser acondicionadas adecuadamente para el almacenamiento de documentos y materiales.

- **Adecuación y Mejoras**

Para convertir las oficinas en una bodega funcional, se realizarán varias adecuaciones. Se instalará una puerta de comunicación de 1x2 metros en el espacio intermedio entre las dos oficinas para facilitar el acceso interno. También se añadirá una ventana de 0.4x2 metros para garantizar una adecuada ventilación e iluminación natural. Estas mejoras no solo optimizan la funcionalidad del área de almacenamiento, sino que también aseguran un ambiente de trabajo adecuado y respetan el espacio de esparcimiento de los funcionarios.

- **Desafíos y Soluciones**

Uno de los principales desafíos fue lograr el consenso entre las distintas dependencias de la Alcaldía respecto a la reubicación de la bodega. La solución se encontró mediante acuerdos que permitieron liberar las oficinas abandonadas en el segundo piso para su adecuación, mostrando una gestión eficiente y colaborativa entre las dependencias.

- **Impacto Durante la Construcción**

La construcción del cerramiento y la adecuación de la bodega pueden interferir temporalmente con el funcionamiento normal de la Secretaría de Educación y otras áreas del Palacio Municipal. Para mitigar estos impactos, se implementarán medidas de seguridad y planificación de actividades de construcción fuera del horario laboral, minimizando las molestias para los funcionarios y el público.

- **Conclusión:**

El análisis técnico del proyecto demuestra que la construcción del cerramiento perimetral y la reubicación de la bodega no solo resolverán problemas actuales de privacidad, seguridad y orden, sino que también mejorarán las condiciones laborales y la estética del entorno. La correcta ejecución del proyecto contribuirá al bienestar general de los funcionarios y al adecuado funcionamiento de la Secretaría de Educación y otras dependencias municipales, optimizando el uso del espacio en el Palacio Municipal y asegurando un entorno más funcional y agradable.

5.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan algunas recomendaciones y elementos de protección personal que deben tener en cuenta los trabajadores involucrados en este contrato para garantizar su seguridad y bienestar durante la ejecución del proyecto.

Recomendaciones de Seguridad:

- Todos los trabajadores deben recibir capacitación en salud y seguridad ocupacional antes de iniciar las actividades. Esta formación debe incluir el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP), medidas de prevención de riesgos y procedimientos de emergencia.
- Realizar inspecciones diarias del sitio de trabajo para identificar y corregir posibles riesgos o condiciones inseguras.
- Colocar señalización adecuada en las áreas de trabajo para alertar sobre riesgos específicos, como zonas de construcción, acceso restringido, materiales peligrosos, y salidas de emergencia.
- Limitar el acceso al sitio de construcción solo al personal autorizado para prevenir accidentes y garantizar la seguridad.
- Desarrollar y comunicar un plan de emergencia que incluya procedimientos para evacuaciones, primeros auxilios y comunicación con servicios de emergencia.

1. **Casco**

Un pintor debe usar casco un casco tipo B o tipo C, de forma permanente ya que brinda protección contra riesgos de golpes, impactos y salpicaduras de sustancias ígneas. Los cascos de seguridad se construyen con materiales resistentes a la acción del fuego, de solventes, a los impactos, abrasión y que posean baja conductividad. Algunos de los materiales utilizados con mayor frecuencia son plásticos laminados de alta resistencia y fibras de vidrio impregnadas en resina.

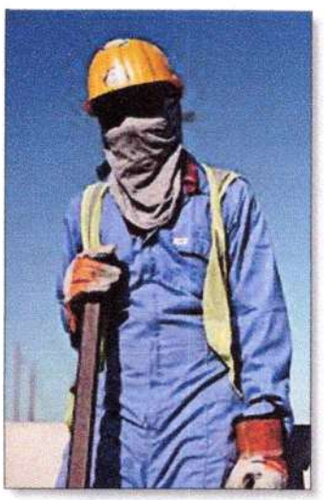


Ilustración 11. Protección Casco

2. <u>Gafas de seguridad</u>

Son lentes con protección lateral, transparente para interiores y oscuros para exteriores. Se usan para la operación de herramientas manuales, ya que para las herramientas eléctricas se debe sumar un protector facial.



Ilustración 12. Protección Para La Vista

3. <u>Ropa de seguridad</u>

Los overoles brindan protección, básicamente para aislar al cuerpo del contacto directo con el polvo, pinturas y solventes, además de algunos riesgos mecánicos como la abrasión, pinchazos y https://www.homecenter.com.co/static/landing/guiasdecompra/Guias_de_compra_2/img/que-riesgos-debe-prevenir-un-pintors.

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***			
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***		x	



Ilustración 13. Protección Overol

4. <u>Productor auditivo</u>

Cuando se pinte con compresor y pistola hay que usar tapones elaborados en espuma, hule o silicona. Se caracterizan por ser blandos y la mayoría permiten ser moldeados por el usuario para adaptarlos de mejor manera al insertarlos en el canal auditivo. Los hay desechables y reutilizables. Su adecuado uso permite disminuir el ruido en hasta 15 dB (decibeles).

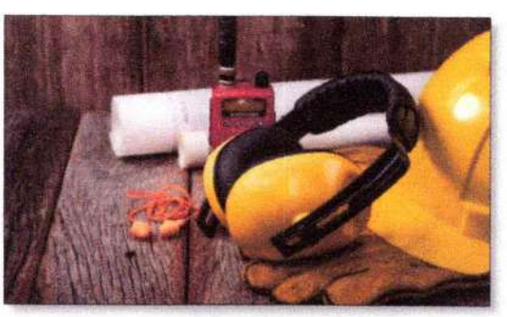


Ilustración 14. Protección Oidos

5. <u>Guantes</u>

Cuero Descarne: Son de cuero grueso y de uso mayoritario en diversas actividades pesadas. Protegen contra la abrasión intensa, https://www.homecenter.com.co/static/landing/guiasdecompra/Guias_de_compra_2/img/que-riesgos-debe-prevenir-un-pintors, fricción y raspaduras. Son adecuados para el manejo de herramientas y trabajo de piezas mecánicas. Es recomendable usarlo en ambientes secos, si se mojan pueden ser traspasados por sustancias irritantes. Hay de puño corto, largo y de estilo? mosquetero?. Pueden incluir refuerzos.

PVC o caucho: Utilizados en labores con manipulación de sustancias químicas, aceites y solventes. Brindan protección ante agentes químicos agresivos, detergentes y desengrasantes industriales.



Ilustración 15. Protección Para Manos

6. <u>Zapatos de seguridad</u>

El calzado de seguridad tiene por objetivo proteger los pies del riesgo de sufrir lesiones por golpes, aplastamientos, https://www.homecenter.com.co/static/landing/guiasdecompra/Guias_de_compra_2/img/que-riesgos-debe-prevenir-un-pintors y daños por la acción de sustancias corrosivas. Un pintor debe usar en forma permanente un zapato con puntera de seguridad.



Ilustración 16. Protección Para Pies

7. Arnés o cinturón de seguridad

Cuando el carpintero realiza trabajos en altura debe usar un arnés de seguridad de cuerpo entero y otros elementos para, que en caso de accidente, se pueda detener la caída.



Ilustración 17. Protección Para Trabajos En Altura

8. Protección respiratoria

El pintor debe usar mascarilla para evitar respirar el polvo cuando lija, o los solventes químicos de barnices y pinturas.



Ilustración 18. Protección Para Pintores

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***	
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***	x

6. CONTROL DE CALIDAD

FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Entre las principales **funciones** que se destacan entre lo **que hace un Supervisor** se encuentra:


- Planificar, dirigir y controlar la **producción.**
- Implementación, desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de calidad para garantizar el cumplimiento de las políticas, así como la satisfacción del cliente por medio de la **interventoría**.
- Realizar inspecciones, pruebas, mediciones de los materiales, productos e instalaciones para verificar si cumplen con las especificaciones requeridas.
- Velar por el cumplimiento de las **normas ISO 9001**, así como los parámetros establecidos en el sistema de gestión de calidad adoptado por la empresa.
- Calificar aquellos productos que tengan detalles y cuál es la razón de la falla.
- Proponer acciones de mejora referentes a las metodologías de trabajo y las compensaciones de carga laboral entre los trabajadores.
- Revisar los requisitos del cliente y asegurarse de que el producto satisfaga lo requerido.
- **Supervisar** que los procesos de producción cumplan con las normas de calidad establecidas.
- Monitorear las operaciones de producción que estén acordes al cumplimiento de las normativas de calidad.
- Recopilar datos relevantes para la producción de informes estadísticos.
- Hacer seguimiento y control de los reclamos realizados por los clientes, así como garantizar que sean aplicados los mecanismos para la mejora de la producción y la satisfacción del cliente inconforme


Utilizar herramientas de calidad, además de asegurarse de que el personal cumpla con los estándares de calidad requeridos en cada uno de sus **procesos**.

8. SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE APORTE	Nº PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONDE
Salud	9487728525	Diciembre de 2024

10. ANEXOS:

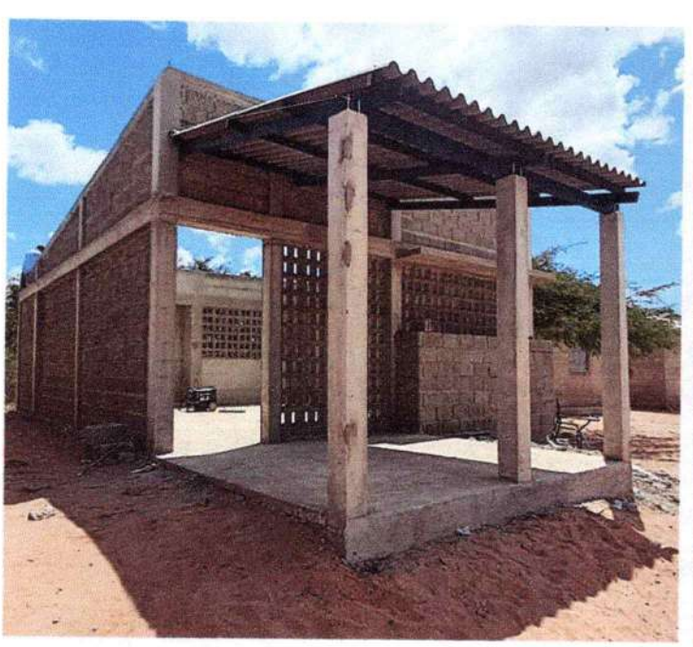

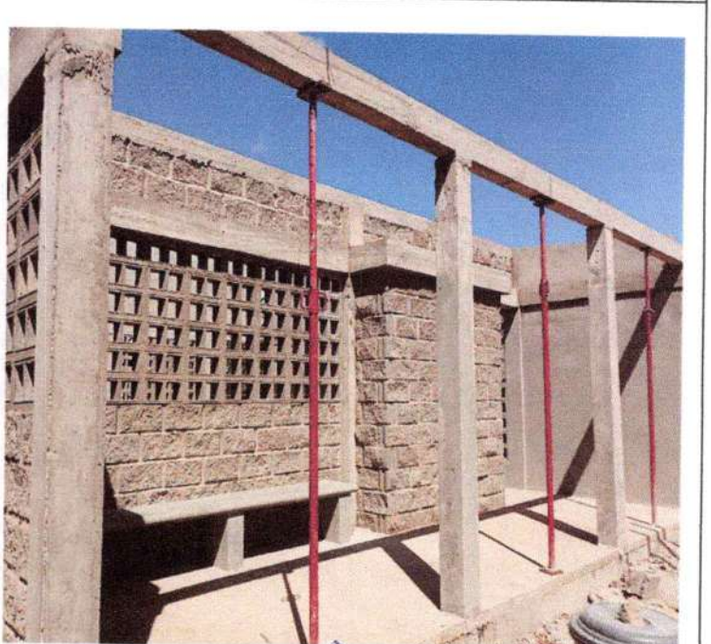

ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

NIT: 892-115-155-4


FECHA ELABORACIÓN:

12/12/2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 892.115.155-4

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA:	x	***CONVENIO:***			
INFORME PARCIAL:		***INFORME FINAL:***		x	

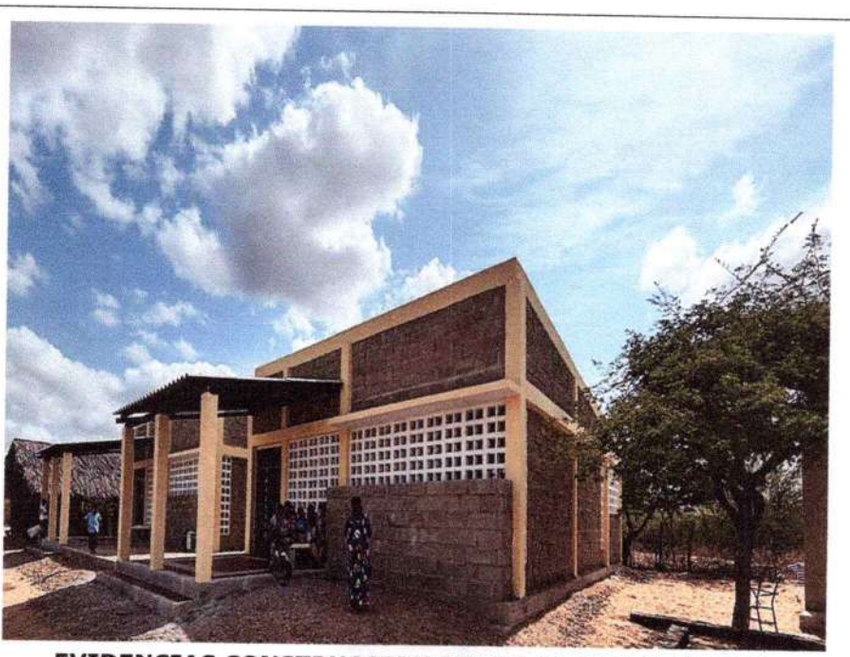

EVIDENCIAS CONSTRUCCION DE AULAS EN JISENTIRRA

11. Firma y visto bueno de la supervisión: **FABIAN JOSE BRIEVA IGUARAN.** Interventor Municipal.	
