CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME

Fecha: 27 DE JUNIO DE 2025

PARA: GOBERNACION DE BOYACA

DE: JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO.
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

ASUNTO: INFORME DE INTERVENTORIA N° 18

PERIODO: 18 DE MAYO DE 2025 AL 17 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA: 001 DE 2023 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTALAFECTADA PORTEMPORADA DELLUVIAS ENMUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2567 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Yo, JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1010200976, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE identificada con Nit 901719548-1 en calidad de interventor del contrato de obra N° 001 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.", celebrado entre el Departamento de Boyacá y NYS CONSTRUCOL S.A.S, PRESENTO el informe de interventoria N° 18 del periodo 18 de Mayo de 2025 al 17 de Junio de 2025 y CERTIFICO que toda la información contenida en este informe y los documentos soporte del mismo, es veraz y corresponde al seguimiento de las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato de obra N° 001 de 2023.

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
C.C 1.010.200.976

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
OSVALDO ENRIQUE SANCHEZ BOLIVAR
Fecha: 15/07/2025

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**18**		FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025			
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

CONTRATO No:	**1**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**N.A.**

OBJETO:

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

Provincias del Departamento de Boyacá en los Municipios de:

1. Viracacha 2. Chitaraque
3.Campohermoso 4. Paez
5. San Mateo 6. San Eduardo
7. Santa Maria 8. El Cocuy

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

CONECTIVIDAD SEGURA PARA UN BOYACÁ GRANDE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
N&S CONSTRUCOL S.A.S	**JHONATAN BRAYAN MENESES SÁNCHEZ**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE R.L JUAN FRANCISCO PACHON	**JAVIER IVAN BARRETO PINTO**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1	N/A	OCHO (8) MESES
2	PRORROGA No. 2	N/A	CINCO (5) MESES
3.	PRORROGA No. 3	N/A	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			DIECIOCHO (18) MESES Y 26 DÍAS

VALOR INICIAL:	$ 1.259.433.527,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 1.259.433.527,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	21	de	JULIO	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	21	de	JULIO	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**95,25%**	% DE AVANCE DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**95,2%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**95,2%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

No PÓLIZA	14-44-101171029	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd mm aa	16/06/2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del Contrato	6	9	2023	1	2	2026	$ 188.915.029,05
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	6	9	2023	21	7	2025	$ 377.830.058,10
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	6	9	2023	21	1	2029	$ 188.915.029,05
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 3 años, 0 meses y 1 día						$ 251.886.705,40

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual									
No PÓLIZA	14-40-101052221	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							16/06/2025		

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Predios Labores y Operaciones	6	9	2023	21	7	2025	$ 284.700.000,00
Contratistas y Subcontratistas	6	9	2023	21	7	2025	$ 284.700.000,00
Vehiculos propios y no propios	6	9	2023	21	7	2025	$ 284.700.000,00

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: El presente informe, que abarca el periodo del 18 de mayo de 2025 al 17 de junio de 2025, se llevaron a cabo actividades de Obra en el municipio de San Eduardo. Durante el periodo reciente ha predominado un clima lluvioso en la zona, con precipitaciones de intensidad moderada que han dificultado el desarrollo normal de las actividades constructivas, en particular la instalación de tubería y la fundida de concretos.

Ante esta situación, se han implementado medidas de encauzamiento temporal de aguas con el fin de permitir la continuidad de los trabajos desde ambos costados de la intervención, minimizando el impacto de la escorrentía sobre el área de obra.

No obstante, las condiciones climáticas adversas y las medidas adoptadas para mitigar sus efectos han generado una disminución en los rendimientos programados, afectando parcialmente el ritmo de ejecución establecido inicialmente.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	6	9	2023
ACTA DE SUSPENSION 1	28	12	2023
ACTA DE REINICIO 1	18	4	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
1. MUNICIPIO DE VIRACACHA -SECTOR SECTOR PUERTO GENARO, VÍA CIENEGA	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
2. MUNICIPIO DE CHITARAQUE	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 6`` PERFORADA	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TECDREN	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
3. MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL-CAMPOHERMOSO-PAEZ	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W** **5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W** **5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
4. MUNICIPIO DE PAEZ	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**5°05'43,9'' N, 73°03'29,4'' W** **5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	**5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**5°05'43,9'' N, 73°03'29,4'' W** **5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**5°05'43,9'' N, 73°03'29,4'' W** **5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**5°05'43,9'' N, 73°03'29,4'' W** **5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	**5°05'43,9'' N, 73°03'29,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	**5°05'43,9'' N, 73°03'29,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**5°05'43,9'' N, 73°03'29,4'' W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**5°05'39,5'' N, 73°03'50,5'' W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**5°05'43,9'' N, 73°03'29,4'' W**
5. MUNICIPIO DE SAN MATEO	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**6°23'37,95'' N, 72°33'30,3'' W**

6. MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE D=2,5 M	**5°13'33.5"N 73°06'09.2"W**
7. MUNICIPIO DE SANTA MARIA	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
8. MUNICIPIO DE EL COCUY	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Revisión y verificación de planillas de Seguridad Social y Parafiscales del contratista del mes de mayo de 2025.	N/A
Verificar que el consultor ejecute las actividades de obra conforme a las normas generales y las especificaciones técnicas vigentes aplicables al proyecto.	N/A
Se elabora el informe mensual No. 17 del contrato de Interventoría correspondiente al periodo entre el 18 de mayo de 2025 al 17 de junio de 2025.	N/A
Se verificó el cumplimiento de las condiciones de trabajo seguro, mediante la utilización obligatoria de los equipos de protección personal por parte del personal de obra	N/A
La interventoría realizó el acompañamiento, supervisión y asesoramiento de las actividades de obra ejecutadas por el contratista	N/A

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
MEZCLADORA SAN EDUARDO	Se utiliza para la fundida de concretos	15%	N/A
VIBRADOR SAN EDUARDO	Se utiliza para la fundida de concretos	15%	N/A

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO		
GRAVILLA	CANTERA EL PERICO	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARENA DE RÍO	CANTERA EL PERICO	CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACERO	DISTRIACERO NACIONAL S.A.S	CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289
TUBERÍA METALICA DE 2,5 M	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ASTM A 653 GRADO 5(
CEMENTO	HOLCIM	CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
VEHICULO	TRANSPORTE DE PERSONAL	20%	ALQUILER DE VEHÍCULO
LABORATORIO	SERVICIO DE LABORATORIO	2%	DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				$ 377.830.058,10
ACTA PARCIAL No. 1	17	2	2025	$ 667.094.629,60
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 1.044.924.687,70**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				N.A.
ACTA PARCIAL No. 1	13	5	2025	$ 53.792.499,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**N.A.**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
19/05/2023	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-123 Remisiòn de polizas de obra por prorroga No. 3	Radicado Vía Correo Electrónico
19/05/2023	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-124 Remisiòn de polizas interventoria por prorroga No. 3	Radicado Vía Correo Electrónico
23/05/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	Correo - Remision de cuenta de cobro para acta parcial Interventoria	Radicado Vía Correo Electrónico

30/05/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	Correo - Remision de ajuste de cuenta de cobro acta parcial No. 1 Obra	Radicado Vía Correo Electrónico
11/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-125 Entrega Informe Mensual N 17	Radicado Vía Correo Electrónico
12/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-126 Informes Semanales No. 26, 27 y 28	Radicado Via Correo Electronico
16/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-127 Informes Semanales No. 29	Radicado Via Correo Electronico
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
19/05/2025	N&S CONSTRUCOL SAS R/L JHONATAN MENESES SANCHEZ	G.B.-C.O.-2024-061 Solicitud de intervención para limpieza, adecuación y verificación de condiciones en zona de vía intervenida	Radicado Via Correo Electronico
19/05/2025	N&S CONSTRUCOL SAS R/L JHONATAN MENESES SANCHEZ	G.B.-C.O.-2024-062 Polizas actualizadas por Prorroga No. 3	Radicado Via Correo Electronico
22/05/2025	JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernacion de Boyacá	Correo Remisión Acta Parcial de Interventoría.	Radicado Via Correo Electronico
28/05/2025	JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernacion de Boyacá	Correo Devolucion de cuenta de cobro acta parcial No. 1 obra	Radicado Via Correo Electronico

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
Isduar Humberto Paez Ramos	C.C 4.158.923	X	X	X	18	5	2025	17	6	2025
Sonia Malena Marín Sotelo	C.C 1.053.340.500	X	X	X	18	5	2025	17	6	2025
Víctor Hugo Diaz Herrera	C.C 79.383.126	X	X	X	18	5	2025	17	6	2025
Jimmy Vergara Silva	C.C 74.321.878	X	X	X	18	5	2025	17	6	2025
Iván Ferley Canon Paez	C.C 7.314.941	X	X	X	18	5	2025	17	6	2025

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Obra	Isduar Humberto Paez Ramos	C.C 4.158.923
Residente de Obra	Sonia Malena Marín Sotelo	C.C 1.053.340.500
Geólogo	Víctor Hugo Diaz Herrera	C.C 79.383.126
Asesor en Geotecnia Vial	Jimmy Vergara Silva	C.C 74.321.878
Asesor en Estructuras	Jimmy Vergara Silva	C.C 74.321.878
Asesor Hidráulico	Iván Ferley Canon Paez	C.C 7.314.941

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Interventoría	Juan Francisco Pachon Roncancio	C.C 1.010.200.976
Residente de Interventoría	Laura Yaneth Rodriguez Berdugo	C.C 1.057.589.899

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)**
MANEJO DE RESIDUOS	FRENTE ACTIVO
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	FRENTE ACTIVO
PROTECCIÓN DE MATERIALES EN LUGARES DE OBRA	FRENTE ACTIVO
RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO	FRENTE ACTIVO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
INSPECCIÓN DE OBRA	FRENTES ACTIVOS
REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	FRENTES ACTIVOS
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PERMISOS Y CERTIFICACIONES DE CANTERAS UTILIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA	FRENTES ACTIVOS
REVISIÓN RECOLECCIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	FRENTES ACTIVOS

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA DE VACIADO			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia a la Compresión	13	6	2025	A espera de edad de falla (11 de Julio de 2025)

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	**FECHA DE VACIADO**			**OBSERVACIÓN**
	dd	**mm**	**aaaa**	
Resistencia a la Compresión	13	6	2025	A espera de edad de falla (11 de Julio de 2025)

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO			
GRAVILLA	CANTERA EL PERICO	15 KM	MIRAFLORES
ARENA DE RIO	CANTERA EL PERICO	15 KM	MIRAFLORES
ACERO	DISTRIACERO NACIONAL	242 KM	BOGOTÁ D.C/ CALLE 8D # 82B-20
CEMENTO	HOLCIM	156 KM	NOBSA
TUBERÍA METALICA DE 2,5 M	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	1012 KM	SABANAGRANDRE - ATLANTICO

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité de Obra para seguimiento de ejecucion de obra San Eduardo	6	6	2025	Seguimiento a la ejecucion y avance de la obra
Comité de Obra para seguimiento de ejecucion de obra San Eduardo	16	6	2025	Seguimiento a la ejecucion y avance de la obra

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0	N/A			N/A			Informe previo al acta de Inicio.
Informe de Interventoría No. 1	6	9	2023	5	10	2023	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 2	6	10	2023	5	11	2023	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 3	6	11	2023	5	12	2023	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 4	6	12	2023	27	12	2023	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 5	18	4	2024	17	5	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 6	18	5	2024	17	6	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 7	18	6	2024	17	7	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 8	18	7	2024	17	8	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 9	18	8	2024	17	9	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños

Informe de Interventoría No. 10	18	9	2024	17	10	2024	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 11	18	10	2024	17	11	2024	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 12	18	11	2024	17	12	2024	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 13	18	12	2024	17	1	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 14	18	1	2025	17	2	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 15	18	2	2025	17	3	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 16	18	3	2025	17	4	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 17	18	4	2025	17	5	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 18	18	5	2025	17	6	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe, se han completado las actividades contractuales de obra para los municipios de Viracachá, Chitaraque, Campohermoso – Corredor Macanal – Campohermoso – Páez, San Mateo, Páez, Santa María, El Cocuy; actualmente se esta trabajando en las actividades para la construccion de alcantarilla de 2,5 metros en el municipio de San Eduardo con un avance de 84,75%.

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	114-125
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	RADICADAS	69-88
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	-
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	25-27
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	217-227
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	40
Amortización del anticipo	N.A.	-
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	N.A.	-
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	-
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	275
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	N.A.	-
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	-
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	233-239
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	ANEXO A
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	136-182
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	110
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	323-376
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	SI	294-309
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	373-375
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	281-309
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	N.A.	358-371
Generales		
Registro fotográfico	SI	228-232
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	ANEXO F

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE: JUAN FRANCISCO PACHON

INFORME MENSUAL No. 18

PERIODO 18 DE MAYO -17 DE JUNIO 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO No. 2567 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA".



JUAN FRANCISCO PACHON
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
INTERVENTORIA

INFORME No. 18

JUNIO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1. Antecedentes. 5

2.2. Localización general 5

2.3. Ejecución del proyecto. 6

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8

3.1. Información general del contrato 8

3.2. Alcance e impacto del proyecto 9

3.3. Proceso Contractual. 9

3.4. Aspectos Financieros contrato de Obra 10

3.5. Aspectos legales y revisión de pólizas. 13

3.6. Relación de personal del contrato de obra. 14

3.7. Descripción de las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe. 17

3.8. Estados de Avance. 27

3.9. Estado general del tiempo. 28

3.10. Relación de Actas de Comité. 28

3.11. Pruebas de calidad y ensayos de laboratorio 28

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30

4.1. Información general del contrato de interventoría 30

4.2. Proceso contractual 31

4.3. Estado financiero del contrato de interventoría 32

4.4. Relación de personal de interventoría. 33

4.5. Aspectos legales y revisión de pólizas de interventoría. 34

4.6. Descripción de los trabajos realizados en el mes por la interventoría. 35

5. RELACION DE CORRESPONDENCIA 37

5.1 Correspondencia 37
6. CONCLUSIONES 39
7. ANEXOS 41

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las obligaciones del contrato No. 2567 de 2023, de presentar informes mensuales, el objeto del contrato de realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra pública No. 001 de 2023, y las obligaciones generales de realizar un reconocimiento técnico y detallado del contrato actual. En el presente informe se describe el control y seguimiento que se realizará durante el plazo contractual, con el fin de cumplir el objeto previsto en el alcance.

El documento se desarrolla de la siguiente manera: En primer lugar, se describe la localización del proyecto, estado inicial del sitio de implantación, así como las características técnicas del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y estructural.

Posteriormente, se presenta la información general del contrato de obra, que incluye el presupuesto inicial, las garantías contractuales, la descripción de las actividades que se van a ejecutar. De igual manera se presenta la información del contrato de interventoría con las mismas especificaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Antecedentes.

El Gobernador de Boyacá, por medio del decreto 000400 de 04 de mayo de 2022 declara la situación de calamidad pública en parte del territorio del departamento de Boyacá, prorrogada mediante decreto 0660 de 01 de septiembre de 2022 y ampliada por el decreto 1696 del 26 de octubre de 2022, lo anterior en uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas por los artículos 2,209 y 305 de la constitución política, la ley 2200 de 2022 y artículos 57 y siguientes de la ley 1523 de 2012.

Mediante Circular CDGRD-003-2022, del 02 de marzo de 2022, la UAEGRD lanzó un plan de contingencia frente a la primera temporada de lluvias de 2022, atendiendo los métodos de pronóstico (IDDEAM-IRI), que advertían que los volúmenes de precipitación estaban en aumento, razón por la cual era necesario realizar una serie de recomendaciones, entre otros, con el propósito de alertar a la comunidad con el fin de adelantarse y tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier situación de desastre.

2.2. Localización general

El proyecto con objeto "CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA" fue suscrito entre la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ y N&S CONSTRUCOL S.A.S., y se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia. Tiene como finalidad atender las emergencias producto de la fuerte temporada de lluvias se presentaron afectaciones en los siguientes municipios:

- VIRACACHÁ
- SAN EDUARDO

- PÁEZ
- CAMPOHERMOSO
- SANTA MARÍA
- EL COCUY
- SAN MATEO
- CHITARAQUE

2.3. Ejecución del proyecto.

Durante el período cubierto por el presente informe, se realizaron diversas actividades asociadas con la ejecución de la obra en los municipios estipulados en el Contrato de Obra No. 001 de 2023. Cabe resaltar que, durante este lapso, fue indispensable atender puntos críticos que demandaron el acompañamiento técnico especializado y de la supervisión puntual del contrato.

Adicionalmente, se exponen los acuerdos alcanzados en los comités de obra, en estricto cumplimiento con los requerimientos técnicos establecidos, asegurando así el desarrollo óptimo y adecuado del proyecto.

A continuación, se presenta un resumen por punto que describe el tipo de obra a ejecutar. Cada apartado incluye una breve explicación del alcance y características de los trabajos para una mayor claridad.

N.	Municipio	Obra	Coordenadas
1	Viracachá	Se construirá la caja de encole en concreto de forma convencional, instalando un tubo pvc novaloc de 36" y en el descole se emplean bolsas de rellenas de concreto además de realizar la construcción de un filtro drenante para realizar una conducción efectiva de las aguas subsuperficiales como medidas efectivas debido a la condición de inestabilidad de la zona a causa de la humedad	5° 25 '20.5 " 73° 16 '51.4 "
2	Chitaraque	Muro en concreto reforzado y elementos de drenaje que contribuyan con la estabilidad de la zona. Esta medida tiene como objetivo contener la banca y asegurar la transitabilidad de manera efectiva.	6° 02 '53.1 " 73° 26 '34.2 "

N.	Municipio	Obra	Coordenadas
3	Campo-Hermoso	Recuperación de la placa superior un box culvert existente, construcción del disipador de energía, además de realizar un apuntalamiento de vigas ipd en la parte superior con el fin de generar un soporte para construir una placa de steel deck para recuperar la sección transversal de la vía.	5° 04 ’38.6 ″ 73° 04 ’32.7 ″
4	Campo-Hermoso	Reforzamiento de una de las aletas de otro box culvert mediante el uso de muro en tierra armada.	5° 03 ’02,6 ″ 73° 05 ’27.1″
5	Páez	Construcción de un box culvert en concreto reforzado con sección 2.50 m x 2.50 m.	5° 03 ’02,6 ″ 73° 05 ’27.1″
6	Páez	Construcción de muro en tierra armada para la recuperación de una aleta de otro box culvert existente.	5° 05 ’39.5 ″ 73° 03 ’50.5″
7	San mateo	Construcción de una alcantarilla con pocetas convencionales, pero con descoles en una estructura flexible con bolsas rellenas de concreto teniendo en cuenta la inestabilidad del terreno además de la construcción de filtros drenantes en la parte del talud, y la recuperación de la vía mediante una estructura con pedraplen y afirmado.	4° 49 ’56.8 ″ 73° 15 ’37.7″
8	San eduardo	Construcción de una alcantarilla con cabezales de entrada y salida y una tubería con un diámetro de 2.50 metros con la finalidad de que le capacidad hidráulica de la alcantarilla se encuentre en rangos admisibles ante la solicitación de drenaje del cuerpo de agua que la atraviesa	5° 13 ’33.4 ″ 73° 06 ’ 09.5″
9	Santa maría	Construcción de alcantarilla tipo INVIAS de 36″	4° 49 ’56.8 ″ 73° 15 ’37.7″
10	Santa maría	Construcción de alcantarilla tipo INVIAS de 36″	4° 49 ’47.62″ 73° 15 ’33.98″
11	Santa maría	Construcción de un box culvert de sección interna de 2.00 x 2.00 metros.	4° 48 ’21.5″ 73° 15 ’52.2″
12	El cocuy	Construcción de un box culvert de sección de 2.50 x 2.50 metros para realizar un correcto manejo de aguas en la zona de intervención.	6° 20 ’13.2″ 72° 27 ’57.4″

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT.	891.800.498-1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	001 DEL 04 DE ENERO DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA	N&S CONSTRUCOL S.A.S. NIT. 901.306.824-9 R/L JHONATAN BRAYAN MENESES
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1,259,433,527.00).
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MES Y VEINTISEIS (26) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1	18 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA 1	20 DE ABRIL DE 2024 - OCHO (8) MESES
PRORROGA 2	16 DE DICIEMBRE DE 2024 - CINCO (5) MESES
PRORROGA 3	19 DE MAYO DE 2025 – DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21 DE JULIO DE 2025
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO	“Conectividad Segura Para Un Boyacá Grande”

3.2. Alcance e impacto del proyecto

El alcance del proyecto se fundamenta en los resultados de los estudios y diseños previamente realizados, los cuales han requerido modificaciones debido a cambios en las condiciones iniciales, ajustes técnicos necesarios y actualizaciones en los requisitos normativos y operativos, con el fin de asegurar la viabilidad y efectividad del proyecto en su fase de ejecución final.

El objeto del contrato de obra es realizar la construcción de diferentes obras de mitigación sobre la red vial de las provincias de Centro, Norte, Gutiérrez, Lengupá, Ricaurte y Neira del departamento de Boyacá, localizadas en ocho municipios del departamento, los cuales se ha visto afectados por la temporada de lluvias, por ende, se deberán atender las necesidades urgentes y garantizar la protección de las estructuras a intervenir.

3.3. Proceso Contractual.

- El día 04 de enero de 2023, se firmó virtual el Contrato de Obra Pública No. 001 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA."

- El día 06 de septiembre del 2023 se suscribe acta de inicio del contrato.

- El día 31 de octubre del 2023 se suscribe modificatorio No 1 al contrato de obra donde se modifica la cláusula 5 correspondiente a la forma de pago en la sección correspondiente al anticipo.

- El día 28 de diciembre de 2023 se realiza suspensión No 1 al contrato.

- El día 18 de abril de 2024 se da reinicio No 1 al contrato.

- El día 20 de abril de 2024 se suscribe adicional en tiempo No 1 por un periodo de ocho (8) meses más.

- El día 13 de septiembre de 2024 se suscribe el modificatorio No 2 al contrato de obra donde se modifica la cláusula No 1 correspondiente al objeto contractual, permitiendo el ajuste del presupuesto de la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas producto de los Estudios y Diseños.

- El día 14 de noviembre de 2024 se suscribe el Modificatorio No. 3 y Aclaratorio No. 1 al contrato de obra, mediante el cual se realiza la aclaración de fecha de terminación del contrato modificando la cláusula 6.

- El día 16 de diciembre de 2024 se suscribe adicional en tiempo No 2 por un periodo de cinco (5) meses más.

- El 23 de abril de 2025, se deja en firme modificatorio de cantidades por mayores y menores cantidades y cambio de tubería de 1.5 metros a 2.5metros para la alcantarilla en el Municipio de san Eduardo.

- El día 19 de mayo de 2025 se suscribe adicional en tiempo No 3 por un periodo de dos (2) meses más.

3.4. Aspectos Financieros contrato de Obra

Forma de Pago

El Departamento, cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

a) El treinta por ciento (30%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, previo perfeccionamiento del mismo.

b) El sesenta por ciento (60%) se cancelará de acuerdo a las actas de recibo parcial de las obras aprobadas por el supervisor delegado y con Vo. Bo del director de desarrollo de la infraestructura vial.

c) El diez (10%) restante, correspondiente al último pago, que se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación.

FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA				
PAGO	**COMPONENTE**	**FORMA DE PAGO**	**PORCENTAJE**	**VALOR A PAGAR**
1	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	ANTICIPO	30%	$ 377.830.058,10
2		ACTAS DE RECIBO PARCIAL	60%	$ 755.660.116,20
3		ACTA DE LIQUIDACIÓN	10%	$ 125.943.352,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA				$ 1.259.433.527,00

De acuerdo con la forma de pago, se desembolsó al contratista el anticipo correspondiente al 30 % del valor total del contrato, equivalente a trescientos setenta y siete millones ochocientos treinta mil cincuenta y ocho pesos con diez centavos ($377.830.058,10).

Con fecha 17 de febrero de 2025, se realiza presentación de acta parcial No. 1 por valor de $ 952.992.328,00 la cual es aprobada por el área de contratación de la Gobernación el 28 de abril de 2024.

En el siguiente cuadro se adjunta relación financiera del contrato:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 1.259.433.527,00	-
Amortización Anticipo	$ -	$ 285.897.698,40
Valor a pagar de la presente acta	$ -	$ 667.094.629,60
Valor Total actas pagadas	$ -	
Saldo por ejecutar	$ -	$ 306.441.199,00
Sumas iguales	$ 1.259.433.527,00	$ 1.259.433.527,00

Aspecto contable de obra - seguimiento al Anticipo

- Se realizó la verificación y seguimiento a la inversión del anticipo.

- A la fecha se han aprobado las siguientes ordenes de giro de acuerdo al anticipo Otorgado:

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Orden de Giro 1	29-nov-23	CONSTRUCCIONES V&P SAS.	$ 340.047.052,29	Materiales
Orden de Giro 2	11-dic-23	CONSTRUCCIONES V&P SAS.	$ 37.783.005,81	Materiales

- A la fecha se cuenta con la devolución de rendimientos financieros a la gobernación de Boyacá de acuerdo a lo siguiente:

VALOR RECURSOS Gobernación	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
$ 3.005.937,64	Nov-23 y Dic-23	11/12/2023	$ 3.005.937,64

- El Fideicomiso se encuentra liquidado ante la Superintendencia Financiera de Colombia desde Diciembre del 2023, como consta en la certificación emitida por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.., en su condición de vocera del **FIDEICOMISO ANTICIPO NYS CONSTRUCOL** de fecha 01 de octubre de 2024

- A la fecha con el trámite del acta parcial No. 1 se realiza amortización del anticipo:

Valor Anticipo	$ 377.830.058,1
Sumatoria Amortizaciones acta parcial No. 1	$ 285.897.698,4
Saldo por Amortizar	$ 91.932.359,70

Con la presentación y trámite del Acta Parcial No. 1, se amortiza el 75.67% del valor otorgado a título de anticipo, en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula 4 del Contrato de Obra Pública No. 2542-2023, la cual establece que el anticipo será amortizado con cargo a las actas parciales de obra. En tal sentido, queda un 24.33% pendiente por amortizar para dar por cumplida la obligación contractual relacionada con el buen manejo y correcta inversión del anticipo.

3.5. Aspectos legales y revisión de pólizas.

El contrato de obra pública No. 001 de 2023 del 04 de enero de 2023 en su CLÁUSULA DECIMA SEXTA "GARANTÍAS", establece que el contratista debe presentar garantía de cumplimiento para cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, de igual manera debe contar con un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual, con las siguientes especificaciones:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL ANTICIPO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ES DECIR POR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE ESTE.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.	EL VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE PORCIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
EL AMPARO DEBE PROTEGER AL DEPARTAMENTO DE EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE SURJA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE SU CONTRATISTA; IGUALMENTE DEBE CUBRIR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE SURJAN DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS O EN SU DEFECTO, QUE ACREDITE QUE EL SUBCONTRATISTA CUENTA CON UN SEGURO PROPIO CON EL MISMO OBJETO Y QUE LA ENTIDAD ESTATAL SEA EL ASEGURADO	IGUAL AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EL VALOR ES EQUIVALENTE A 200 SMMLV

Las pólizas de cumplimiento No. 14-44-101171029 ANEXO 7., y de responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101052221 ANEXO 8 expedidas el día 19 de mayo de 2025 por la compañía de SEGUROS DEL ESTADO, se encuentran aprobadas de Acta de Aprobación de fecha 16 de junio de 2025, por parte de la secretaria de contratación del Departamento de Boyacá. Esta información puede ser verificada en la plataforma SECOP II.

3.6. Relación de personal del contrato de obra.

Durante la ejecución del contrato se referencia el personal de obra que estará presente:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	PROFESIÓN
DIRECTOR DE OBRA	ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS	No. 4.158.923 DE MARIPÍ – BOYACÁ	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	SONIA MALENA MARÍN SOTELO	No. 1.053.340.500 DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ	INGENIERO CIVIL
GEÓLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	C.C. No. 79´383.126 DE BOGOTÁ D.C.	GÉOLOGO
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	JIMMY VERGARA SILVA	No. 79´383.126 DE BOGOTÁ D.C.	INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS)
ASESOR EN ESTRUCTURAS	JIMMY VERGARA SILVA	No. 79´383.126 DE BOGOTÁ D.C.	INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS)
ASESOR HIDRÁULICO O HIDROLÓGICO	IVÁN FERLEY CAÑÓN PÁEZ	No. 7.314.941 DE CHIQUINCUIRÁ - BOYACÁ	INGENIERO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE SISTEMAS HIDRICOS URBANOS

Las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto contratado se adjuntarán mes a mes de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de obra.

Sin embargo se aclara que en el desarrollo de las actividades contractuales correspondientes a los meses de febrero y mayo de 2025, se anexan las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del personal mínimo requerido, así como del personal especialista y operativo, quienes participaron en la coordinación y ejecución efectiva de las actividades constructivas, de acuerdo con sus respectivos roles dentro del contrato de obra.

Se aclara que durante los meses de marzo y abril de 2025 no se realizaron actividades de obra en campo, debido a que el contrato se encontraba en espera de la definición del Modificatorio No. 2, en el cual se evaluaba el ajuste de cantidades y la inclusión de un ítem no previsto correspondiente a tubería de 2,5 metros de diámetro, requerido para el municipio de San Eduardo.

Por tal motivo, no fue necesaria la presencia de personal operativo ni especialistas durante ese período, ya que no se ejecutaron labores constructivas en sitio. No

obstante, se adjuntan las planillas correspondientes al director y residente de obra, quienes continuaron al frente de las gestiones técnicas y administrativas del contrato durante dichos meses.

Para el caso de los aportes parafiscales del Representante Legal de la empresa contratista, en el marco de la ejecución del contrato de obra, es importante manifestar que de conformidad con el marco normativo vigente, la exigencia de acreditar el pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral aplica exclusivamente respecto del personal vinculado de manera directa a la ejecución del objeto contractual. Esta disposición se encuentra respaldada por las siguientes normas:

1. **Ley 789 de 2002, artículo 50**, que dispone que los contratistas deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y aportes parafiscales en relación con el personal vinculado directamente al contrato.
2. **Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.1.3.1**, el cual establece:
   "La certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales se exigirá únicamente respecto del personal vinculado directamente con la ejecución del contrato."
3. **Ley 100 de 1993, artículo 182**, complementada por el **Decreto 1703 de 2002**, el **Decreto 510 de 2003**, y las **Leyes 797 y 828 de 2003**, que regulan el deber de afiliación y pago de aportes por parte de empleadores o contratistas exclusivamente respecto de los trabajadores o contratistas subordinados o con funciones directamente relacionadas con el objeto contractual.

Bajo este marco, se informa que, a partir del 1 de abril de 2025, el Representante Legal de la empresa no ha participado en actividades técnicas, operativas ni administrativas asociadas directamente a la ejecución del contrato. Su rol se ha limitado al cumplimiento de las funciones inherentes a la representación legal de la entidad contratista, sin que ello configure una relación contractual en el marco del objeto del contrato de obra.

Por tanto, no existe obligación legal ni contractual de presentar planillas de aportes parafiscales asociadas al Representante Legal, dado que no se configura el supuesto jurídico de vinculación directa a la ejecución del contrato, conforme a las normas citadas.

3.7. Descripción de las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe.
En el marco del Contrato de Obra No. 001-2023, se han llevado a cabo diversas actividades en los municipios Contractuales.

A continuación, se detallan las principales actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo mencionado:

- **Actividades Ejecutadas por el Contratista de Obra.**

Durante el periodo del presente Informe se realizan las siguientes actividades de obra:

MUNICIPIO DE VIRACACHÁ.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	70,28	0	70,28
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	113,3	0	113,3
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Metro Cúbico	41,06	0	41,06
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	1633,08	0	1633,08
ITEMS COMPLEMENTARIOS				
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	136,09	0	136,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	0,65	0	0,65
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Metro Cúbico	3,07	0	3,07
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	188,04	0	188,04
ITEMS NO PREVISTOS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	Metro Lineal	6,5	0	6,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	Metro Cúbico	105,71	0	105,71
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cúbico	4,42	0	4,42
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	Metro Lineal	120	0	120

MUNICIPIO DE CHITARAQUE

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
ESTRUCTURA DE CONTENCION, DISIPADORES Y FILTROS				
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	135,98	24.67	160,65
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	12,66	0	12,66
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	Metro Cuadrado	15	0	15,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (soldados)	Metro Cúbico	4,27	0	4,27
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	30,45	0	30,45
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Metro Cúbico	38,22	0	38,22
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Metro Cúbico	10,18	0	10,18
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	6502,04	0	6502,04
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	212,63	0	212,63
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	6081,22	0	6081,22
ITEMS NO PREVISTOS				
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 6`` PERFORADA	Metro Lineal	21	0	21,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TECDREN	Metro Cuadrado	71,4	0	71,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	Metro Lineal	15,75	0	15,75

MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL - CAMPOHERMOSO-PAEZ.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
PONTON Y OBRAS DE CONTENCION				
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	134,75	0	134,75
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	7,56	0	7,56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	2,93	0	2,93
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	275,14	0	275,14
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	6045,43	0	6045,43
ITEMS COMPLEMENTARIOS				
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	134,75	0	134,75
ITEMS NO PREVISTOS BOX				
DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	Metro Cúbico	13,78	0	13,78
PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	21,06	0	21,06
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro Cúbico	19,5	0	19,50
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	385,65	0	385,65
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	321,11	0	321,11
PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	Metro Cuadrado	10,8	0	10,80
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	Unidad	1	0	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	Metro Cuadrado	363	0	363,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro Cuadrado	66	0	66,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Metro Lineal	40,9	0	40,90
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	Metro Lineal	5	0	5,00

MUNICIPIO DE PAEZ

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	112,5	0	112,50
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	16,73	0	16,73
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	Metro Cúbico	21	0	21,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	Metro Cúbico	2,39	0	2,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	12.23	0	12,23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Metro Cúbico	18.56	0	18,56
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	3671.34	0	3671,34
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	4910,06	0	4910,06
ITEMS COMPLEMENTARIOS				
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	130,5	0	130,50
ITEMS NO PREVISTOS ALETA				
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	Metro Cuadrado	223,2	0	223,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro Cuadrado	43,2	0	43,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Metro Lineal	26,2	0	26,20
PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	13,49	0	13,49
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	UND	1	0	1,00
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	Metro Lineal	4	0	4,0

MUNICIPIO DE SAN MATEO



ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	245,72	0	245,72
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	65,21	0	65,21
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Metro Cúbico	24.73	0	24,73
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	188.04	0	188,04
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	6160,63	0	6160,63
ITEMS COMPLEMENTARIOS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	0.65	0	0,65
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Metro Cúbico	3.07	0	3,07
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	106,09	0	106,09
ITEMS NO PREVISTOS				
PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	111,6	0	111,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	Metro Lineal	6,50	0	6,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	Metro Cúbico	79,67	0	79,67
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cúbico	4,42	0	4,42
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	Metro Lineal	60,00	0	60,00

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA 36"				
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	0	81,59	81,59
EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	Metro Cúbico	0	14,64	14,64
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	0	6,70	6,70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	0	18,23	18,23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Metro Cuadrado	0	4,90	4,90
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0	2234,54	2234,54
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	0	113,41	113,41
ITEMS COMPLEMENTARIOS				
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	0	0,00	0,00
ITEMS NO PREVISTOS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cúbico	0	1,34	1,34
PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	0	10,31	10,31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE D=2,5 M	Metro Lineal	0	7,00	7,00

Registro Fotográfico.

	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA
	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS

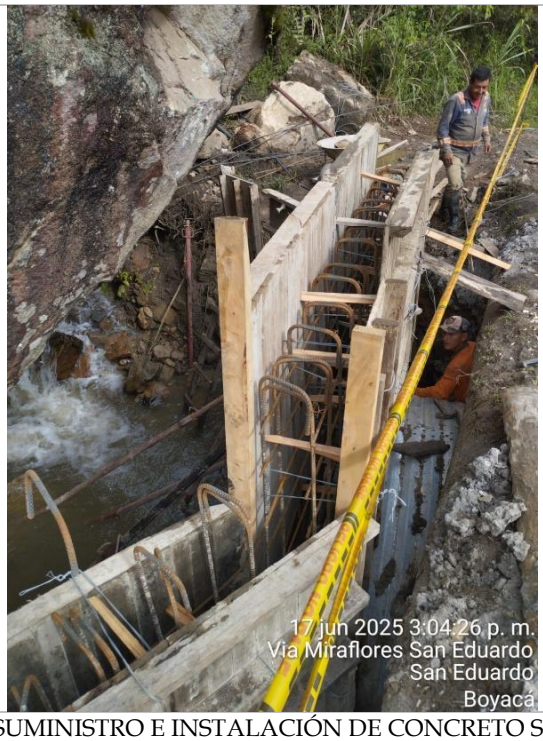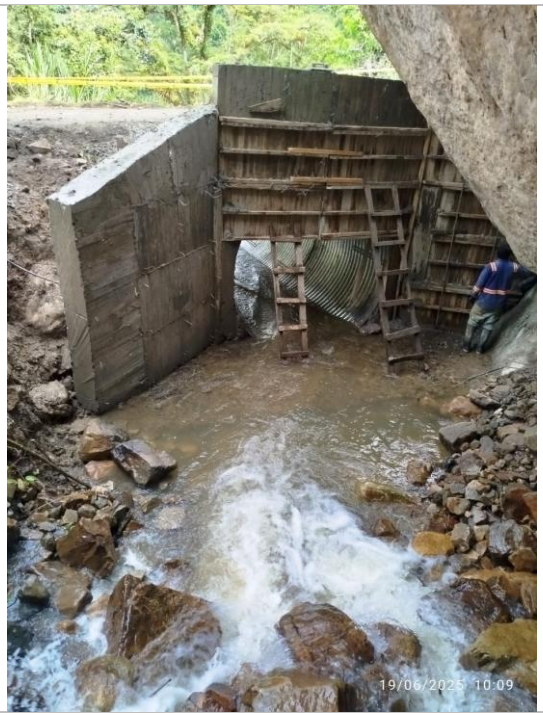	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	
	
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	






SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA





TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE D=2,5 M

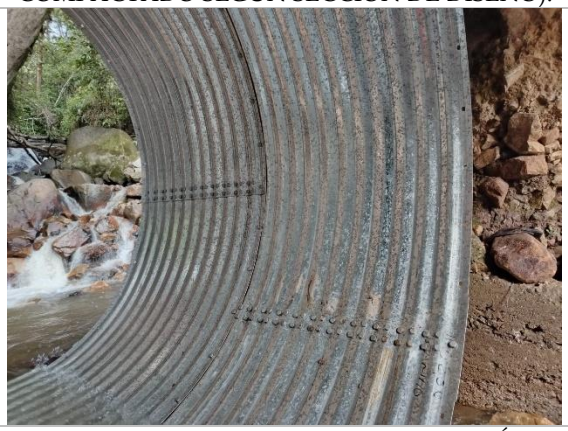



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE D=2,5 M

SANTA MARIA

Se realiza la construcción de las dos alcantarillas propuestas para este municipio en un 100 % y se terminan los trabajos para la construcción del punto del box culvert.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	164,62	272,90	437,52
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	18,37	0	18,37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	14,2	0	14,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Metro Cúbico	26,71	0	26,71
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	3566,1	0	3566,10
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	2164,82	0	2164,82
ITEMS COMPLEMENTARIOS				
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	47,18	0	47,18
ITEMS NO PREVISTOS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	Metro Lineal	13	0	13,00
PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	12,13	0	12,13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cúbico	10,83	0	10,83

MUNICIPIO DE EL COCUY

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	28,8	0	28,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	16,73	0	16,73
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	3671,34	0	3671,34

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	986,41	0	986,41
ITEMS COMPLEMENTARIOS				
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Metro Cúbico	43,2	0	43,20
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	Metro Cúbico	21,52	0	21,52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	Metro Cúbico	17,91	0	17,91
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Metro Cúbico	12,23	0	12,23
ITEMS NO PREVISTOS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro Cúbico	2,39	0	2,39
PEDRAPLEN COMPACTO	Metro Cúbico	13,49	0	13,49
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	Unidad	1	0	1,0

3.8. Estados de Avance.

Avance Porcentual

El porcentaje de avance reportado hasta la fecha se detalla a continuación:

- Porcentaje (%) de avance de tiempo transcurrido **= 95.20 %**
- Porcentaje (%) de avance estudios **= 100 %**
- Porcentaje (%) de avance ejecutado **= 95.20 %**
- Porcentaje (%) de avance programado **= 95.20 %**

Es importante destacar que el Modificatorio N.2 se tramitó, con lo cual se pudo dar inicio a la ejecución de las obras en el municipio de San Eduardo en el cual ya se cuenta con un avance de 84.75% quedando pendiente la ejecución de la losa de descole y aletas de descole, rellenos de tubería y el solado lateral de tubería.

3.9. Estado general del tiempo.

Durante el periodo cubierto por el presente informe se lleva a cabo el estado general de tiempo, del cual se adjunta diligencia al presente informe en el Anexo Bitácora. En este hapredominado un clima lluvioso en la zona, con precipitaciones de intensidad moderada que han dificultado el desarrollo normal de las actividades constructivas, en particular la instalación de tubería y la fundida de concretos.

Ante esta situación, se han implementado medidas de encauzamiento temporal de aguas con el fin de permitir la continuidad de los trabajos desde ambos costados de la intervención, minimizando el impacto de la escorrentía sobre el área de obra.

No obstante, las condiciones climáticas adversas y las medidas adoptadas para mitigar sus efectos han generado una disminución en los rendimientos programados, afectando parcialmente el ritmo de ejecución establecido inicialmente.

3.10. Relación de Actas de Comité.

Se adjunta el acta del comité realizada en el periodo del presente informe:

Avance de obra: 06 de Junio de 2025
16 de Junio de 2025

Las actas mencionadas se incorporan como anexo en el informe.

3.11. Pruebas de calidad y ensayos de laboratorio

- **Pruebas de calidad**

  Durante el periodo reportado, las actividades ejecutadas han estado enfocadas en excavaciones (manuales, mecánicas y en conglomerado), instalación de pedraplén, tubería corrugada de 2.5 metros de diámetro, instalación de aceros de refuerzo y concretos de encole.

En cuanto al control de calidad, se realizaron los ensayos correspondientes a la resistencia a la compresión del concreto, con muestras tomadas el día 13 de junio de 2025. Sin embargo, a la fecha de emisión del presente informe, los resultados aún no están disponibles, ya que se encuentran a la espera del cumplimiento de la edad de falla establecida (11 de julio de 2025), conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Se tiene previsto que en el próximo periodo se reciban y analicen dichos resultados, a fin de verificar el cumplimiento de las resistencias exigidas para los elementos estructurales ejecutados.

- **Certificados de Calidad**

De acuerdo con las actividades ejecutadas durante el periodo, las cuales comprenden excavaciones (manuales, mecánicas y en conglomerado), instalación de pedraplén, colocación de tubería corrugada de 2.5 metros de diámetro y armado de aceros de refuerzo, al corte del presente informe se remiten los certificados de calidad de los materiales utilizados en dichas labores.

Entre los documentos anexos se incluyen:
- Certificados de conformidad y ficha técnica de la tubería corrugada
- Certificados de calidad de los aceros de refuerzo.

Estos documentos respaldan el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el contrato y permiten hacer seguimiento al control de calidad de la obra. Todos los soportes se relacionan en el Anexo: Certificados de Materiales.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información general del contrato de interventoría

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT.	891.800.498-1
CONTRATO DE INTERVENTORIA	2567 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
NIT.	901.719.548-1
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 71.088.277) M/CTE.
FECHA FIRMA CONTRATO	07 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MES Y VEINTISEIS (26) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	18 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No. 1	20 DE ABRIL DE 2024 OCHO (8) MESES
PRORROGA No. 2	16 DE DICIEMBRE DE 2024 CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 2	19 DE MAYO DE 2025 DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21 DE JULIO DE 2025

4.2. Proceso contractual

El día 07 de junio de 2023, se firmó virtualmente el Contrato de Interventoría No. 2567 del 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA". Entre CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE.

- El día 06 de septiembre contrato se suscribe acta de inicio del contrato.
- El día 28 de diciembre de 2023 se realiza suspensión No 1 al contrato.
- El día 18 de abril de 2024 se da reinicio No 1 al contrato.
- El día 20 de abril se suscribe adicional en tiempo No 1 por un término de ocho (08) meses.
- El día 14 de noviembre de 2024 se emite el Modificatorio No. 1 y el Aclaratorio No. 1 del contrato de Interventoría.
- El día 16 de diciembre de 2024 se suscribe adicional en tiempo No 2 por un término de cinco (5) meses más.
- El dia 19 de Mayo de 2025 se suscribe adicional en tiempo No 3 por un término de dos (2) meses más.

FORMA DE PAGO

El valor del contrato será cancelado al INTERVENTOR de la manera que se detalla a continuación:

La forma de pago es por precio GLOBAL, la oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica.

Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. Así mismo deberá presentar los de informes de avance, cuadro de cantidades, memorias de cálculo al supervisor y/o interventor; lo anterior previamente radicados en la Secretaría de Contratación.

4.3. Estado financiero del contrato de interventoría

FORMA DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA				
PAGO	**COMPONENTE**	**FORMA DE PAGO**	**PORCENTAJE**	**VALOR A PAGAR**
1	INTERVENTORIA	ACTAS PARCIALES	90%	$ 63.979.449,30
2		ACTA DE LIQUIDACIÓN	10%	$ 7.108.827,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DEINTERVENTORÍA				$ 71.088.277,00

A la fecha del presente Informe se dio trámite al acta parcial No.1 por valor de $ 53.792.499,00

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 71.088.277,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 53.792.499,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo por ejecutar		$ 17.295.778,00
Sumas iguales	$ 71.088.277,00	$ 71.088.277,00

4.4. Relación de personal de interventoría.

Durante la ejecución del contrato, se hace referencia al personal de interventoría que estará asignado y presente

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	PROFESIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO	C.C. No. 1.010.200.976 DE BOGOTÁ D.C.	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	LAURA YANETH RODRIGUEZ BERDUGO	C.C. No. 1.057.589.899 DE SOGAMOSO	INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

Las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto contratado se adjuntarán mes a mes de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de interventoría.

Durante el desarrollo del contrato, se presentó un periodo de espera asociado a la definición y aprobación del modificatorio de obra, el cual incluía ajustes por mayores y menores cantidades, así como la autorización del cambio en el diámetro de la tubería corrugada, pasando de 1.5 a 2.5 metros. Una vez se recibió el concepto favorable por parte del área de contratación de la Gobernacion, el contratista manifestó la necesidad de un tiempo prudencial para la fabricación de la nueva tubería y su posterior traslado al sitio de obra, lo cual generó un periodo de inactividad operativa o tiempos muertos en la ejecución.

Durante este intervalo, solo se mantuvo la presencia del director de obra, quien asumió la responsabilidad de las gestiones técnicas y administrativas necesarias para garantizar la continuidad y el cumplimiento del contrato. Para el 01 junio y una vez iniciadas de manera efectiva las labores constructivas en el municipio de San Eduardo, se reintegró la ingeniera residente, quien actualmente se encuentra a cargo de la supervisión directa de las actividades en campo.

4.5. Aspectos legales y revisión de pólizas de interventoría.

El contrato de interventoría No. 2567 de 2023 en su CLÁUSULA NOVENA "GARANTÍAS", establece que el oferente y el contratista se obliga a constituir, a favor del Departamento de Boyacá garantía única que ampare lo siguiente:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CALIDAD DEL SERVICIO	VIGENCIA POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y CINCO (05) AÑOS MÁS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.	EL VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según contrato de interventoría.

Pólizas actualizadas de acuerdo a la prórroga No. 3. Expedidas por la compañía aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) el día 19 de mayo de 2025, cuentan con aprobación por parte de la secretaria de contratación de la gobernación de Boyacá del día 04 de Junio de 2025.

A continuación, se presenta la información de las últimas pólizas expedidas.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA		**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	
POLIZA No. 14-44-101186064		**ANEXO 6**	
FECHA DE EXPEDICIÓN		**19/05/2025**	
CONCEPTO	**VIGENCIAS (FECHAS)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2023	06/03/2026	$ 14.217.655,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2023	06/09/2028	$ 14.217.655,40
CALIDAD DE SERVICIO	06/09/2023	21/07/2030	$ 14.217.655,40

La información previamente descrita puede verificarse en la plataforma SECOP II.

4.6. Descripción de los trabajos realizados en el mes por la interventoría.

Para el presente informe que comprende desde el 18 mayo al 17 de junio de 2025, se describen las actividades desarrolladas:

Aspectos técnicos:

- Se realizó el informe mensual No. 17 de interventoría correspondiente a la etapa de ejecución de Obra.
- Se proporcionó el acompañamiento necesario para garantizar el desarrollo adecuado y eficiente de la ejecución de la obra, velando por el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- Se reportaron los estados de avance semanales del contrato de obra, lo cual permite una supervisión constante y detallada de los progresos alcanzados.
- Se expidió el certificado de cumplimiento de las obligaciones de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social por parte del contratista de Obra. Constatando así que el contratista cumple con sus responsabilidades laborales y de seguridad social.
- Se presentó el respectivo informe de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
- Se realizó la revisión de los certificados de calidad remitidos por el contratista de la obra. Esta revisión tiene como objetivo garantizar que los materiales utilizados

cumplan con los estándares de calidad establecidos y que el desarrollo del contrato se ajuste a las especificaciones técnicas y normativas aplicables.
- Se realizó el respectivo informe mensual en el cual se realiza el estado del proyecto en donde se establece el avance de la ejecución del convenio, lo que permite una evaluación constante del progreso y continuidad del proyecto.
- Se hace evaluación y seguimiento a la radicación del acta parcial No. 1 del contratista de obra.

4.7. Estados de Avance Contrato de Interventoría

A la fecha del presente informe con corte al día 17 de Junio de 2025 se reportan los siguientes estados de Avance correspondientes.

- Avance de Tiempo Transcurrido: **95.20** % de acuerdo a Prórroga 3.

Durante el periodo comprendido entre el 18 de mayo al 17 de junio de 2025 del presente año, se realizó seguimiento de actividades de obra en el municipio de:

- **SAN EDUARDO**

5. RELACION DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona el listado de correspondencia presentada durante el mes del presente informe.

5.1 Correspondencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
19/05/2023	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-123 Remisión de pólizas de obra por prorroga No. 3	Radicado Vía Correo Electrónico
19/05/2023	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-124 Remisión de pólizas interventoría por prorroga No. 3	Radicado Vía Correo Electrónico
23/05/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	Correo - Remision de cuenta de cobro para acta parcial Interventoria	Radicado Vía Correo Electrónico
30/05/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	Correo - Remision de ajuste de cuenta de cobro acta parcial No. 1 Obra	Radicado Vía Correo Electrónico
11/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-125 Entrega Informe Mensual N 17	Radicado Vía Correo Electrónico
12/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-126 Informes Semanales No. 26, 27 y 28	Radicado Vía Correo Electrónico
16/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-127 Informes Semanales No. 29	Radicado Vía Correo Electrónico

19/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	Correo - Remisión de ajuste de cuenta de cobro acta parcial No. 1 Obra	Radicado Vía Correo Electrónico
24/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	Correo - Remisión de ajuste de cuenta de cobro acta parcial No. 1 Obra	Radicado Vía Correo Electrónico
25/06/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría/Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-128 Informes Semanales No. 30	Radicado Vía Correo Electrónico

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
19/05/2025	N&S CONSTRUCOL SAS R/L JHONATAN MENESES SANCHEZ	G.B.-C.O.-2024-061 Solicitud de intervención para limpieza, adecuación y verificación de condiciones en zona de vía intervenida	Radicado Vía Correo Electrónico
19/05/2025	N&S CONSTRUCOL SAS R/L JHONATAN MENESES SANCHEZ	G.B.-C.O.-2024-062 Pólizas actualizadas por Prorroga No. 3	Radicado Vía Correo Electrónico
22/05/2025	JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernación de Boyacá	Correo Remisión Acta Parcial de Interventoría.	Radicado Vía Correo Electrónico
28/05/2025	JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernación de Boyacá	Correo Devolución de cuenta de cobro acta parcial No. 1 obra	Radicado Vía Correo Electrónico

6. CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido entre el 18 de mayo al 17 de junio, el contratista presenta un avance ejecutado del 95.20% de acuerdo al cronograma de obra actualizado con la prórroga No.3.

- Se reitera la importancia que el contratista elabore el manual de mantenimiento correspondiente para cada obra terminada, con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento, preservación y sostenibilidad a largo plazo.

- A la fecha del presente informe, el avance de tiempo transcurrido del proyecto es del 95.25%.

- Una vez surtido el trámite administrativo correspondiente al modificatorio de obra, incluyendo la aprobación del ajuste en cantidades y el cambio de la tubería corrugada de 1.5 a 2.5 metros de diámetro y finalizado el proceso de fabricación y llegada de dicho material a obra, se dio inicio efectivo a las actividades constructivas en el municipio de San Eduardo, con la socialización a la comunidad con presencia del municipio, supervisor de la gobernación, contratista e interventoría.

- Este avance refleja el reinicio formal de las obras en campo, permitiendo retomar el cronograma previsto y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto, con impacto positivo en el desarrollo de la infraestructura vial del municipio.

- Luego de surtirse el trámite del modificatorio de obra, que incluyó la aprobación del ajuste en cantidades y el cambio de la tubería corrugada de 1.5 a 2.5 metros de diámetro, y considerando el tiempo requerido para la fabricación y entrega de la nueva tubería, se presentaron demoras mayores a las inicialmente previstas. Estos trámites tomaron más tiempo del estimado, lo cual generó la necesidad de solicitar una prórroga de dos (2) meses al plazo contractual, con el fin de contar con el tiempo suficiente para la ejecución efectiva de las obras en el municipio de San Eduardo. Dicha prórroga fue otorgada mediante otro si a los contratos de obra e interventoría emitidos el 19 de mayo de 2025, lo que permitió, además, la

actualización de las pólizas contractuales, garantizando así la continuidad técnica, jurídica y financiera del contrato. Con este ajuste, se asegura el desarrollo y finalización de las actividades proyectadas para este municipio.

- A la fecha se encuentran terminadas las obras en los municipio de Viracachá, Chitaraque, Campohermoso – Corredor Macanal – Campohermoso – Páez, San Mateo, Páez, Santa María, El Cocuy y en este periodo se está adelantando actividades en el municipio de San Eduardo con un adelanto en las labores de excavación, instalación de pedraplén, colocación de tubería y preparación de elementos estructurales de encole y descole, lo cual representa un avance físico-financiero del 84.75% en la ejecución del contrato.

ANEXOS

INFORMACION GENERAL

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

1. INFORMACION GENERAL

1.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	FECHA DE SUSCRIPCION:	PLAZO:	VALOR:
001 DE 2023	**4/01/2023**	**TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS**	**$ 1.259.433.527,00**

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:				REPRESENTANTE LEGAL:			
NYS CONSTRUCOL S.A.S				**JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ**			
Teléfono:	**3112847686**	Dirección:	Cra 2 MZ A CA 16 Coper	Teléfono:	3114778252	Dirección:	Coper

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO N°:	FECHA DE SUSCRIPCION:	PLAZO:	VALOR:
2567 DE 2023	**7/06/2023**	**TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS**	**$ 71.088.277,00**

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:				REPRESENTANTE LEGAL:			
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE				**JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO**			
Teléfono:	**3143501710**	Dirección:	Cra 4 # 7 - 53 P 3 Chiquinquirá	Teléfono:	3222186323	Dirección:	Chiquinquirá

1.3 REGISTRO DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE DE LA MODIFICACION
1	MODIFICATORIO N° 1	31/10/2023	Modificación cláusula 5 Forma de pago
2	MODIFICATORIO N° 2	13/09/2024	Modificación cláusula 1 Objeto del contrato
3	MODIFICATORIO N° 3 Y ACLARATORIO No 1	14/11/2024	Modificación cláusula 6 Plazo del contrato
4	MODIFICATORIO N° 4 Y ACLARATORIO No 2	29/05/2025	Aclaracion Plazo del contrato

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE DE LA MODIFICACION
1	MODIFICATORIO N° 1 Y ACLARATORIO No 1	14/11/2024	Modificación cláusula 6 Plazo del contrato

1.4 ADICIONALES Y PRORROGAS

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adicional en plazo No. 1	$ 0,00	OCHO (8) MESES
2	Adicional en plazo No. 2	$ 0,00	CINCO (5) MESES
3	Adicional en plazo No. 3	$ 0,00	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	DIECIOCHO (18) MESE Y 26 DIAS

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adicional en plazo No. 1	$ 0,00	OCHO (8) MESES
2	Adicional en plazo No. 2	$ 0,00	CINCO (5) MESES
3	Adicional en plazo No. 3	$ 0,00	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	DIECIOCHO (18) MESE Y 26 DIAS

1.5 FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	6	9	2023	6	9	2023
PLAZO INICIAL	3 MESES Y 26 DÍAS			3 MESES Y 26 DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2023	31	12	2023
TOTAL Adicionales en plazo	QUINCE (15) MESES			QUINCE (15) MESES		
PLAZO TOTAL (Inicial + Adiciones)	18 MESES Y 26 DÍAS			18 MESES Y 26 DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)	21	7	2025	21	7	2025

1.6 DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS (POR UNIDAD FUNCIONAL)

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA	LOCALIZACION	UNIDAD	META	AVANCE INFORME ANTERIOR	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE
	1. MUNICIPIO DE VIRACACHA -SECTOR SECTOR PUERTO GENARO, VÍA CIENEGA						
2,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	70,28	0,00	70,28	100%
2,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	113,30	0,00	113,30	100%
2,4	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	41,06	0,00	41,06	100%
2,9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3-KM	1633,08	0,00	1633,08	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	136,09	0,00	136,09	100%
C-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	0,65	0,00	0,65	100%
C-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	3,07	0,00	3,07	100%
C-4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	KG	188,04	0,00	188,04	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

INP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	ML	6,50	0,00	6,50	100%
INP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	105,71	0,00	105,71	100%
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	4,42	0,00	4,42	100%
INP - 4	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	ML	120,00	0,00	120,00	100%
	2. MUNICIPIO DE CHITARAQUE						
N°	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA**	**LOCALIZACION**	**UNIDAD**	**META**	**AVANCE INFORME ANTERIOR**	**AVANCE ACUMULADO**	**% AVANCE**
4,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	135,98	0,00	135,98	100%
4,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	12,66	0,00	12,66	100%
4,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M2	15,00	0,00	15,00	100%
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (soldados)	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	4,27	0,00	4,27	100%
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	30,45	0,00	30,45	100%
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	38,22	0,00	38,22	100%
4,8	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	10,18	0,00	10,18	100%
4,11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	KG	6502,04	0,00	6502,04	100%
4,16	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	212,63	0,00	212,63	100%
4,17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3-KM	6081,22	0,00	6081,22	100%
INP - 5	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 6`` PERFORADA	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	ML	21,00	0,00	21,00	100%
INP - 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TECDREN	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M2	84,00	0,00	71,40	85,0%
INP - 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	ML	19,60	0,00	15,75	80,36%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

3. MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL-CAMPOHERMOSO-PAEZ

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA	LOCALIZACION	UNIDAD	META	AVANCE INFORME ANTERIOR	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE
6,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	M3	134,75	0,00	134,75	100%
6,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	M3	7,56	0,00	7,56	100%
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	2,93	0,00	2,93	100%
6,10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	5°03'02,6'' N 73°05'27,1''W MURO TIERRA ARMADA	KG	275,14	0,00	275,14	100%
6,14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	5°03'02,6'' N 73°05'27,1''W MURO TIERRA ARMADA 5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3-KM	6045,43	0,00	6045,43	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	5°03'02,6'' N 73°05'27,1''W MURO TIERRA ARMADA 5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	134,75	0,00	134,75	100%
INP - 9	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	13,78	0,00	13,78	100%
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	21,06	0,00	21,06	100%
INP - 11	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	19,50	0,00	19,50	100%
INP - 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	KG	385,65	0,00	385,65	100%
INP - 14	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	KG	321,11	0,00	321,11	100%
INP - 15	PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M2	10,80	0,00	10,80	100%
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	UND	1,00	0,00	1,00	100%
INP - 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	5°03'02,6'' N 73°05'27,1''W MURO TIERRA ARMADA	M2	363,00	0,00	363,00	100%
INP - 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	M2	66,00	0,00	66,00	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

INP - 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	ML	40,90	0,00	40,90	100%
INP - 20	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	ML	5,00	0,00	5,00	100%

4. MUNICIPIO DE PAEZ

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA	LOCALIZACION	UNIDAD	META	AVANCE INFORME ANTERIOR	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE
8,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA 5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	112,50	0,00	112,50	100%
8,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	16,73	0,00	16,73	100%
8,3	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	21,00	0,00	21,00	100%
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	2,39	0,00	2,39	100,00%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	12,23	0,00	12,23	100,00%
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	18,56	0,00	18,56	100,00%
8,10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA 5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	KG	3671,34	0,00	3671,34	100,00%
8,14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA 5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3-KM	4910,06	0,00	4910,06	100,0%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA 5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	130,50	0,00	130,50	100,00%
INP - 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA	M2	223,20	0,00	223,20	100%
INP - 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA	M2	43,20	0,00	43,20	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

INP - 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA	ML	26,20	0,00	26,20	100%
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	13,49	0,00	13,49	100%
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	UND	1,00	0,00	1,00	100%
INP - 4	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA	ML	4,00	0,00	4,00	100%

5. MUNICIPIO DE SAN MATEO

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA	LOCALIZACION	UNIDAD	META	AVANCE INFORME ANTERIOR	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE
	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	245,72	0,00	245,72	100,00%
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	65,21	0,00	65,21	100,00%
	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	24,73	0,00	24,73	100,00%
	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	ML	188,04	0,00	188,04	100,00%
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	6160,63	0,00	6160,63	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	0,65	0,00	0,65	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	3,07	0,00	3,07	100,00%
	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	106,09	0,00	106,09	100,00%
	PEDRAPLEN COMPACTO	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	111,60	0,00	111,60	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	ML	6,50	0,00	6,50	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	79,67	0,00	79,67	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	4,42	0,00	4,42	100,00%
	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	ML	60,00	0,00	60,00	100,00%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

6. MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA	LOCALIZACION	UNIDAD	META	AVANCE INFORME ANTERIOR	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE
	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		M3	81,59	0,00	81,59	100,00%
	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA		M3	14,64	0,00	14,64	100,00%
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO		M3	6,70	0,00	6,70	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES		M3	18,23	0,00	18,23	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS		M3	9,78	0,00	4,90	50,10%
	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA		KG	2234,54	0,00	2234,54	100,00%
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)		M3-KM	773,52	0,00	113,41	14,66%
	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM		M3	60,01	0,00	0,00	0,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES		M3	15,88	0,00	1,34	8,44%
	PEDRAPLEN COMPACTO		M3	10,31	0,00	10,31	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE D=2,5 M		ML	7,00	0,00	7,00	100,00%

7. MUNICIPIO DE SANTA MARIA

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA	LOCALIZACION	UNIDAD	META	AVANCE INFORME ANTERIOR	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE
14,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	437,52	272,9	437,52	100%
14,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	18,37	0,00	18,37	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

14,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	4°49'36,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	14,20	0,00	14,20	100%
14,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	4°49'36,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	26,71	0,00	26,71	100%
14,10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	4°49'36,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	KG	3566,10	0,00	3566,10	100%
14,12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	4°49'36,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3-KM	2164,82	0,00	2164,82	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	4°49'36,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	47,18	0,00	47,18	100%
INP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	4°49'36,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	ML	13,00	0,00	13,00	100%
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	4°49'36,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	12,13	0,00	12,13	100%
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	4°49'36,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	10,83	0,00	10,83	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

8. MUNICIPIO DE EL COCUY

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA	LOCALIZACION	UNIDAD	META	AVANCE INFORME ANTERIOR	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE
16,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	28,80	0,00	28,80	100%
16,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	16,73	0,00	16,73	100%
16,6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	KG	3671,34	0,00	3671,34	100%
16,10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3-KM	986,41	0,00	986,41	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	43,20	0,00	43,20	100%
C-5	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	21,52	0,00	21,52	100%
C-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	17,91	0,00	17,91	100%
C-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	12,23	0,00	12,23	100%
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	2,39	0,00	2,39	100%
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	13,49	0,00	13,49	100%
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	UND	1,00	0,00	1,00	100%

LOCALIZACION

DEPARTAMENTO:	BOYACÁ	MUNICIPIO:	VIRACACHÁ
SECTOR:	PUERTO GENARO VÍA CIENAGA		

COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°25'20,5''N	LONGITUD	73°16'51,4''W	LATITUD	5°25'20,5''N	LONGITUD	73°16'51,4''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	**1**	**DE**	**2023**	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**18**	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025		
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	CHITARAQUE			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	6°02'53,1''N	LONGITUD	73°26'34,2''W	LATITUD	6°02'53,1''N	LONGITUD	73°26'34,2''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	CAMPOHERMOSO			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°04'38,6''N	LONGITUD	73°04'32,7''W	LATITUD	5°04'38,6''N	LONGITUD	73°04'32,7''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	CAMPOHERMOSO			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°03'02,6''N	LONGITUD	73°05'27,1''W	LATITUD	5°03'02,6''N	LONGITUD	73°05'27,1''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	PAEZ			
SECTOR:	BOYACÁ							
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°05'43,9''N	LONGITUD	73°03'29,4''W	LATITUD	5°05'43,9''N	LONGITUD	73°03'29,4''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	**1**	**DE**	**2023**	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**18**	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025		
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	PAEZ			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°05'39,5''N	LONGITUD	73°03'50,5''W	LATITUD	5°05'39,5''N	LONGITUD	73°03'50,5''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SAN MATEO			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	6°23'37,95''N	LONGITUD	72°33'30,3'' W	LATITUD	6°23'37,95''N	LONGITUD	72°33'30,3'' W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025


LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SANTA MARIA			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	4°49'47,62''N	LONGITUD	73°15'33,98''W	LATITUD	4°49'47,62''N	LONGITUD	73°15'33,98''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SAN EDUARDO			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°13'33.5"N	LONGITUD	73°06'09.2"W	LATITUD	5°13'33.5"N	LONGITUD	73°06'09.2"W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA

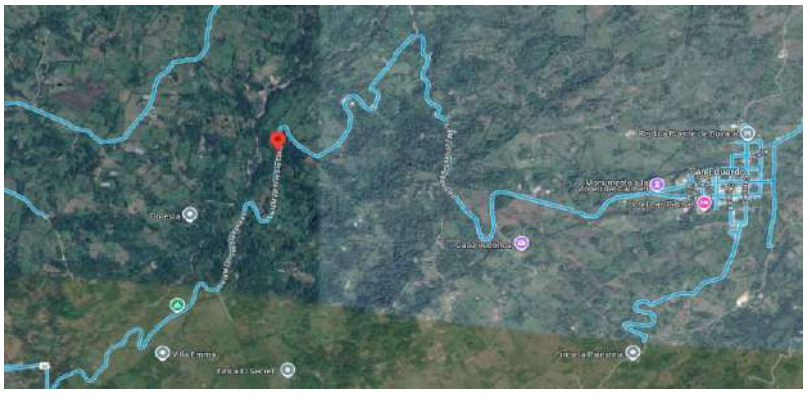

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SANTA MARIA			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	4°49'56,8''N	LONGITUD	73°15'37,7''W	LATITUD	4°49'56,8''N	LONGITUD	73°15'37,7''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SANTA MARIA			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	4°48'21.5"N	LONGITUD	73°15'52.2"W	LATITUD	4°48'21.5"N	LONGITUD	73°15'52.2"W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	EL COCUY			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	6°20'13,2''N	LONGITUD	72°27'57,4''W	LATITUD	6°20'13,2''N	LONGITUD	72°27'57,4''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



1.8 RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de obra 06 de Junio de 2025	6	6	2025	Revision de avance del contrato
Acta de Comité de obra 16 de Junio de 2025	16	6	2025	Revision de avance del contrato

1.9 RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe ejecutivo de interventoría semanal No.26	19	5	2025	25	5	2025	No se presentan novedades en la ejecución de la obra
Informe ejecutivo de interventoría semanal No.27	26	5	2025	1	6	2025	No se presentan novedades en la ejecución de la obra
Informe ejecutivo de interventoría semanal No.28	2	6	2025	8	6	2025	No se presentan novedades en la ejecución de la obra
Informe ejecutivo de interventoría semanal No.29	9	6	2025	15	6	2025	No se presentan novedades en la ejecución de la obra
Informe ejecutivo de interventoría semanal No.30	16	6	2025	22	6	2025	No se presentan novedades en la ejecución de la obra

* Adjuntar copia de Actas de comité generadas en el periodo

GARANTIAS CONTRACTUALES

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 17 DE ENERO DE 2025

2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

2.1 SEGUIMIENTO A PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	ANEXO No.	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACIÓN CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa)	MOTIVO DE LA ACTUALIZACION
14-44-101171029	7	19/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A	16/06/2025	PRORROGA 3
14-40-101052221	8	19/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A	16/06/2025	PRORROGA 3

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS POLIZA VIGENTE	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6	9	2023	1	2	2026	$ 188.915.029,05
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	6	9	2023	21	7	2025	$ 377.830.058,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6	9	2023	21	1	2025	$ 188.915.029,05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍA						$ 251.886.705,40
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	6	9	2023	21	7	2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	6	9	2023	21	7	2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	6	9	2023	21	7	2025	$ 284.700.000,00

2.1 SEGUIMIENTO A PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	ANEXO No.	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACIÓN CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa)	MOTIVO DE LA ACTUALIZACION
14-44-101186064	6	19/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A	4/06/2025	PRORROGA 3

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS POLIZA VIGENTE	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6	9	2023	6	3	2026	$ 14.217.655,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6	9	2023	6	9	2028	$ 14.217.655,40
CALIDAD DEL SERVICIO	6	9	2023	21	7	2030	$ 14.217.655,40

* Adjuntar copia de la aprobación de las polizas vigentes

* Adjuntar copia de actualización de polizas en el evento que se genere en el periodo.

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

GARANTIAS CONTRACTUALES ACTUALIZADAS POR PRORROGA No. 3 - Contrato de Obra

EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Reconoce y aprueba el **Anexo 7** de la **Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101171029**, de fecha 19 de Mayo del 2025 y el **anexo No 8** de la **Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No** 14-40-101052221 de la misma fecha, expedida por la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, para amparar el **Contrato de Obra Pública No. 001 de 2023, Proceso: PE-GB-023-2022,** suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** y **NYS CONSTRUCOL SAS**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.",** con un valor de **$1.259.433.527,00 M/CTE**

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2023	01/02/2026	$188.915.029,05
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	06/09/2023	21/07/2025	$377.830.058,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2023	21/01/2029	$188.915.029,05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS *		$251.886.705,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06/09/2023	21/07/2025	$284.700.000,00

NOTA: * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE L POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGÚN PRORROGA EN PLAZO No 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 001 DE 2023 SUSCRITO EL 1970572025 SE PRORROGA EL PLAZO EN 2 MESES MAS ASI COMO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO.
Nota Aclaratoria: El Anexo No 7 de la presente póliza de Responsabilidad civil extracontractual fue objeto de Rechazo por cuanto no se encontrar conforme a lo exigido por el contrato.

Asimismo, se deja constancia que la verificación en línea de la póliza la realizó Juan Manuel Guio (previa aprobación o rechazo) a efectos de verificar la validez, idoneidad, existencia y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan al contrato (se anexa reporte de verificación en página).


Dada en Tunja a los dieciseis (16) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025)

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS
Secretario de Contratación.

SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Vo.Bo. Directora Administrativa de Procesos de Selección

proyectó: Juan Manuel Guio- Profesional C
Revisó: Camilo Ortiz S. – Profesional C.

Verificación póliza Cumplimiento.

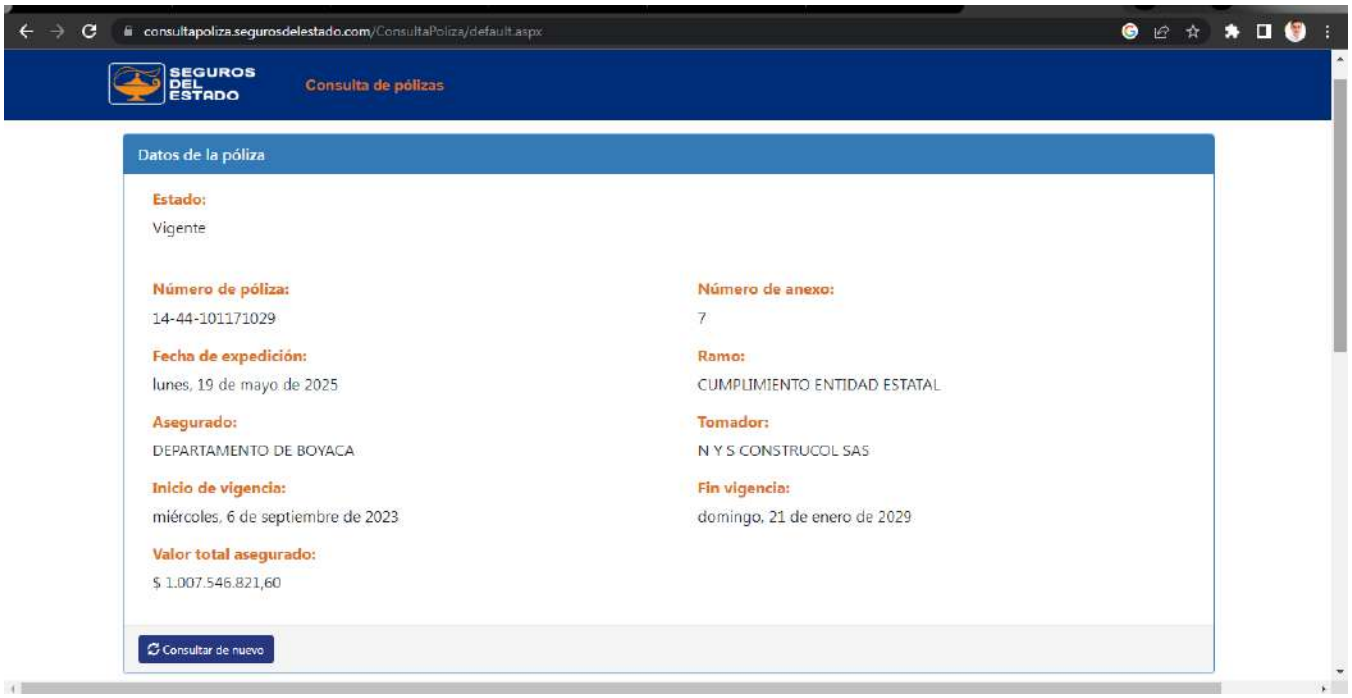

Verificación Póliza de responsabilidad civil extracontractual.



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101052221	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
N Y S CONSTRUCOL SAS	NIT: 901.306.834-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 35 NRO. 5 - 11 APTO 1	CHIQUINQUIRA, BOYACA	3166925077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 NRO. 9 - 90	TUNJA, BOYACA	7420150

BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS A TERCEROS POR LA EJECUCION EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.001 DE 04/01/2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASEGURADOS: N Y S CONSTRUCOL SAS NIT.901.306.834-9 Y/O DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT. 891.800.498-1.

BENEFICIARIOS: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT. 891.800.498-1 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/09/2023	21/07/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/09/2023	21/07/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/09/2023	21/07/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN PRORROGA EN PLAZO No.3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.001 DE 2023 SUSCRITO EL 19/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO EN 2 MESES MAS ASI COMO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****118,949.00	$ *******3,000.00	$ ******23,170.00	$ **********145,120.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101052221

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101052221	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	N Y S CONSTRUCOL SAS		**NIT: 901.306.834-9**
DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 5 - 11 APTO 1	**CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3166925077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE BOYACA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 891.800.498-1**
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7420150

BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/09/2023	21/07/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/09/2023	21/07/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/09/2023	21/07/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101052221

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF963337B 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101052221	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
N Y S CONSTRUCOL SAS	NIT: 901.306.834-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 35 NRO. 5 - 11 APTO 1	CHIQUINQUIRA, BOYACA	3166925077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 NRO. 9 - 90	TUNJA, BOYACA	7420150

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****118,949.00	$ *******3,000.00	$ ******23,170.00	$ **********145,120.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002117567916 (3900) 000000145120 (96) 20240905

REFERENCIA PAGO:

1100211756791-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101052221	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	N Y S CONSTRUCOL SAS		**NIT: 901.306.834-9**
DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 5 - 11 APTO 1	**CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3166925077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE BOYACA		**NIT: 891.800.498-1**
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7420150


BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.



14-40-101052221

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF963337B 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101171029	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	01	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
N Y S CONSTRUCOL SAS	NIT: 901.306.834-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 35 NRO. 5 - 11 APTO 1	CHIQUINQUIRA, BOYACA	3166925077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 NRO. 9 - 90	TUNJA, BOYACA	7420150

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.001 DE 04/01/2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2023	01/02/2026	$188,915,029.05	$188,915,029.05
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/09/2023	21/07/2025	$377,830,058.10	$377,830,058.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2023	21/01/2029	$188,915,029.05	$188,915,029.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$251,886,705.40	$251,886,705.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN PRORROGA EN PLAZO No.3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.001 DE 2023 SUSCRITO EL 19/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO EN 2 MESES MAS ASI COMO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****278,973.00	$ *******8,000.00	$ ******54,524.00	$ **********341,498.00	$ ****1,007,546,821.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101171029

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101171029	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	01	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	N Y S CONSTRUCOL SAS	NIT: 901.306.834-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 35 NRO. 5 - 11 APTO 1	CHIQUINQUIRA, BOYACA	3166925077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 20 NRO. 9 - 90	TUNJA, BOYACA	7420150

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****278,973.00	$ *******8,000.00	$ ******54,524.00	$ **********341,498.00	$ ****1,007,546,821.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002117568867 (3900) 000000341498 (96) 20240905

REFERENCIA PAGO:

1100211756886-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101171029	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	01	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	N Y S CONSTRUCOL SAS		**NIT: 901.306.834-9**
DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 5 - 11 APTO 1	**CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3166925077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE BOYACA		**NIT: 891.800.498-1**
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7420150

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101171029

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101171029, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de MAYO de 2025

14-44-101171029

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

GARANTIAS CONTRACTUALES ACTUALIZADAS POR PRORROGA No. 3 - Contrato de Interventoria

EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Reconoce y aprueba el **Anexo 6** de la **Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101186064,** de fecha 19 de Mayo de 2025, expedida por la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, para amparar el **Contrato de Interventoría No. 2567-2023, Proceso: SMC-GB-021-2023,** suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** y **CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE**, cuyo objeto es **"NTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DECENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA",** con un Valor de **$71.088.277,00 M/CTE.**

AMPAROS	**VIG. DESDE**	**VIG. HASTA**	**V/R ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2023	06/03/2026	$14.217.655,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALESINDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2023	06/09/2028	$14.217.655,40
CALIDAD DEL SERVICIO *	06/09/2023	21/07/2030	$14.217.655,40

(*) LA CALIDAD DEL SERVICIO ES POR EL PLAZO Y CINCO AÑOS.

NOTA: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGÚN PRORROGA EN PLAZO No 03 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2567 DE 2023, SUSCRITO EL 19/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO EN 2 MESES MAS ASI COMO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO.

Asimismo, se deja constancia que la verificación en línea de la póliza la realizó Juan Manuel Guio (previa aprobación o rechazo) a efectos de verificar la validez, idoneidad, existencia y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan al contrato (se anexa reporte de verificación en página).

Dada en Tunja, a los cuatro (4) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025)

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS
Secretario de Contratación.

SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Vo.Bo. Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Juan Manuel Guio - Profesional C
Revisó: Camilo Ortiz S. – Profesional C.

Verificación póliza de cumplimiento



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101186064	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE	NIT: 901.719.548-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 7 - 53 TERCER PISO	CHIQUINQUIRA, BOYACA	3143501710

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 20 NRO. 9 - 90	TUNJA, BOYACA	(8)7424341

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 2567-2023, PROCESOS SMC 021-2023, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA C LAUSULA PENAL PECUNIRAI DEL CONTRATO, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
NOTA : LA CALIDAD DEL SERVICIO ES : POR EL PLAZO Y CINCO AÑOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2023	06/03/2026	$14,217,655.40	$14,217,655.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2023	06/09/2028	$14,217,655.40	$14,217,655.40
CALIDAD DEL SERVICIO	06/09/2023	21/07/2030	$14,217,655.40	$14,217,655.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN PRORROGA EN PLAZO No.3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2567 DE 2023 SUSCRITA EL 19/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO EN 2 MESES MAS ASI COMO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,286.00	$ *******4,000.00	$ *******3,854.00	$ **********24,140.00	$ *******42,652,966.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101186064

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101186064	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE	NIT: 901.719.548-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 7 - 53 TERCER PISO	CHIQUINQUIRA, BOYACA	3143501710

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 20 NRO. 9 - 90	TUNJA, BOYACA	(8)7424341

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,286.00	$ *******4,000.00	$ *******3,854.00	$ ***********24,140.00	$ *******42,652,966.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002117569819 (3900) 000000024140 (96) 20240905

REFERENCIA PAGO:

1100211756981-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101186064	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2025	06	09	2023	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE		**NIT: 901.719.548-1**
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 7 - 53 TERCER PISO	**CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3143501710

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE BOYACA		**NIT: 891.800.498-1**
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	(8)7424341

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	901064286-2	50.00
QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	901565963-0	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101186064

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101186064, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de MAYO de 2025

14-44-101186064

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



AVANCE DE OBRA

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	FECHA:

3. AVANCE DE OBRA


CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

3.1 AVANCE DE EJECUCIÓN

PLAZO ACTUAL (DIAS)	536	TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS)	502	TIEMPO RESTANTE (DIAS)	34
% PROGRAMADO CTO DE OBRA	95,2%	% DE AVANCE CTO DE OBRA	95,2%	% RETRASO	0,0%

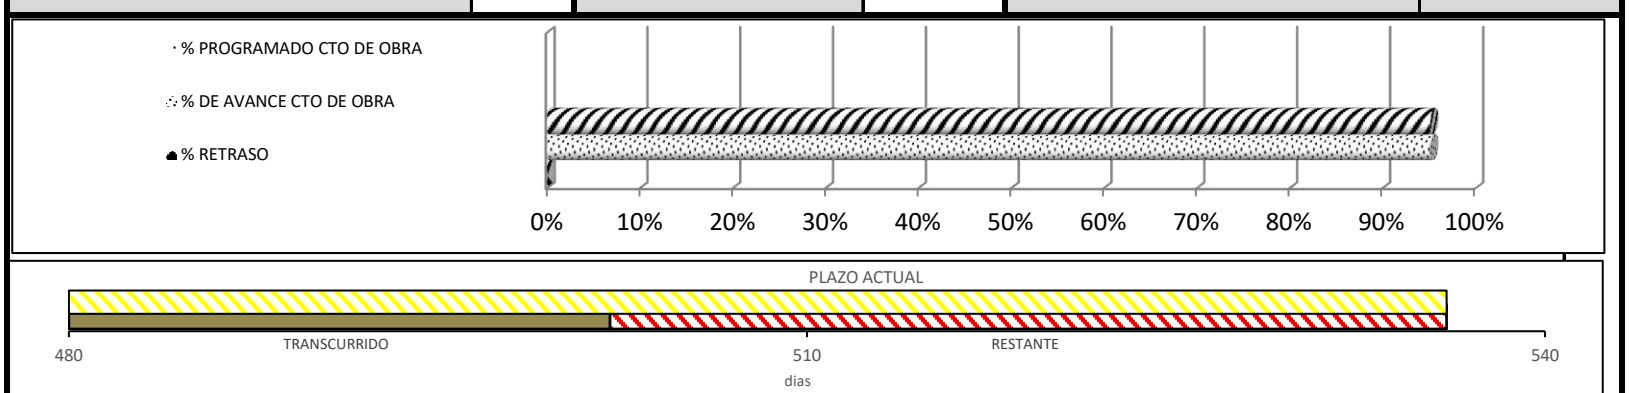

CAUSALES DEL RETRASO DE LAS OBRAS:

El contratista se encuentra a corde al porcentaje programado

3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD S/PRESUPUESTO ACTUALIZADO	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUTADO ACUMULADO
1. MUNICIPIO DE VIRACACHA -SECTOR SECTOR PUERTO GENARO, VÍA CIÉNEGA						
2,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	70,28	70,28	70,28	100%
2,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	113,30	113,30	113,30	100%
2,4	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	41,06	41,06	41,06	100%
2,9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	1633,08	1633,08	1633,08	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	136,09	136,09	136,09	100%
C-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	0,65	0,65	0,65	100%

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA												FECHA:
3. AVANCE DE OBRA												
CONTRATO No:	1	DE	2023									
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025				
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025	

C-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**3,07**	**3,07**	**3,07**	**100%**
C-4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**188,04**	**188,04**	**188,04**	**100%**
INP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**ML**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**100%**
INP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	**M3**	**105,71**	**105,71**	**105,71**	**100%**
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	**4,42**	**4,42**	**4,42**	**100%**
INP - 4	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**ML**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**100%**
2. MUNICIPIO DE CHITARAQUE						
4,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**160,65**	**160,65**	**160,65**	**100%**
4,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**12,66**	**12,66**	**12,66**	**100%**
4,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	**M2**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**100%**
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (soldados)	**M3**	**4,27**	**4,27**	**4,27**	**100%**
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**30,45**	**30,45**	**30,45**	**100%**
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**38,22**	**38,22**	**38,22**	**100%**
4,8	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**M3**	**10,18**	**10,18**	**10,18**	**100%**
4,11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**6502,04**	**6502,04**	**6502,04**	**100%**
4,16	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**212,63**	**212,63**	**212,63**	**100%**
4,17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**6081,22**	**6081,22**	**6081,22**	**100%**
INP - 5	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 6`` PERFORADA	**ML**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**100%**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA							FECHA:
3. AVANCE DE OBRA							
CONTRATO No:	1	DE	2023				
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		FECHA:	27	de	JUNIO	de 2025
PERIODO: DEL	18	de MAYO	de 2025	AL	17	de JUNIO	de 2025

INP - 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TECDREN	**M2**	**71,40**	**71,40**	**71,40**	**100%**
INP - 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	**ML**	**15,75**	**15,75**	**15,75**	**100%**
3. MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL-CAMPOHERMOSO-PAEZ						
6,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**134,75**	**134,75**	**134,75**	**100%**
6,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**7,56**	**7,56**	**7,56**	**100%**
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**2,93**	**2,93**	**2,93**	**100%**
6,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**275,14**	**275,14**	**275,14**	**100%**
6,14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**6045,43**	**6045,43**	**6045,43**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**134,75**	**134,75**	**134,75**	**100%**
INP - 9	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	**M3**	**13,78**	**13,78**	**13,78**	**100%**
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	**21,06**	**21,06**	**21,06**	**100%**
INP - 11	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	**M3**	**19,50**	**19,50**	**19,50**	**100%**
INP - 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	**KG**	**385,65**	**385,65**	**385,65**	**100%**
INP - 14	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	**KG**	**321,11**	**321,11**	**321,11**	**100%**
INP - 15	PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	**M2**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**100%**
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**UND**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100%**
INP - 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	**M2**	**363,00**	**363,00**	**363,00**	**100%**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA							FECHA:
3. AVANCE DE OBRA							
CONTRATO No:	1	DE	2023				
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		FECHA:	27	de	JUNIO	de 2025
PERIODO: DEL	18	de MAYO	de 2025	AL	17	de JUNIO	de 2025

INP - 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	**M2**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**100%**
INP - 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**ML**	**40,90**	**40,90**	**40,90**	**100%**
INP - 20	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**ML**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**100%**
4. MUNICIPIO DE PAEZ						
8,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**112,50**	**112,50**	**112,50**	**100%**
8,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**16,73**	**16,73**	**16,73**	**100%**
8,3	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**M3**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**100%**
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	**M3**	**2,39**	**2,39**	**2,39**	**100%**
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**12,23**	**12,23**	**12,23**	**100%**
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**18,56**	**18,56**	**18,56**	**100%**
8,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**3671,34**	**3671,34**	**3671,34**	**100%**
8,14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**4910,06**	**4910,06**	**4910,06**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**130,50**	**130,50**	**130,50**	**100%**
INP - 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	**M2**	**223,20**	**223,20**	**223,20**	**100%**
INP - 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	**M2**	**43,20**	**43,20**	**43,20**	**100%**
INP - 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**ML**	**26,20**	**26,20**	**26,20**	**100%**
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	**13,49**	**13,49**	**13,49**	**100%**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA												FECHA:
3. AVANCE DE OBRA												
CONTRATO No:	1	DE	2023									
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025				
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025	

INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**UND**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100%**
INP - 4	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**ML**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**100%**
7. MUNICIPIO DE SAN MATEO						
10,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**245,72**	**245,72**	**245,72**	**100%**
14,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**65,21**	**65,21**	**65,21**	**100%**
14,3	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**M3**	**24,73**	**24,73**	**24,73**	**100%**
14,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**M3**	**188,04**	**188,04**	**188,04**	**100%**
14,9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3**	**6160,63**	**6160,63**	**6160,63**	**100%**
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**KG**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**100%**
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3-KM**	**3,07**	**3,07**	**3,07**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**106,09**	**106,09**	**106,09**	**100%**
INP - 1	PEDRAPLEN COMPACTO	**ML**	**111,60**	**111,60**	**111,60**	**100%**
INP - 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**M3**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**100%**
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	**M3**	**79,67**	**79,67**	**79,67**	**100%**
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	**4,42**	**4,42**	**4,42**	**100%**
10,2	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**M3**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**100%**
6. MUNICIPIO DE SAN EDUARDO						
12.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	81,59	0,00	81,59	100%

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA											FECHA:
3. AVANCE DE OBRA											
CONTRATO No:	1	DE	2023								
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025			
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

12.2	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	**M3**	14,64	0,00	14,64	100%
12.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	6,70	0,00	6,70	100%
12,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	18,23	0,00	18,23	100%
12,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	9,78	0,00	4,90	50%
12,9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	2234,54	0,00	2234,54	100%
12,14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	773,52	0,00	113,41	15%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	60,01	0,00	0,00	0%
INP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	15,88	0,00	1,34	8%
INP-10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	10,31	0,00	10,31	100%
INP-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE D=2,5 M	**ML**	7,00	0,00	7,00	100%
7. MUNICIPIO DE SANTA MARIA						
14,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**437,52**	**164,62**	**437,52**	**100%**
14,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**18,37**	**18,37**	**18,37**	**100%**
14,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**14,20**	**14,20**	**14,20**	**100%**
14,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**26,71**	**26,71**	**26,71**	**100%**
14,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**3566,10**	**3566,10**	**3566,10**	**100%**
14,12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**2164,82**	**2164,82**	**2164,82**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**47,18**	**47,18**	**47,18**	**100%**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA												FECHA:
3. AVANCE DE OBRA												
CONTRATO No:	1	DE	2023									
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025				
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025	

INP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**ML**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**100%**
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	**12,13**	**12,13**	**12,13**	**100%**
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	**10,83**	**10,83**	**10,83**	**100%**
8. MUNICIPIO DE EL COCUY						
16,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**28,80**	**28,80**	**28,80**	**100%**
16,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**16,73**	**16,73**	**16,73**	**100%**
16,6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**3671,34**	**3671,34**	**3671,34**	**100%**
16,10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**986,41**	**986,41**	**986,41**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**43,20**	**43,20**	**43,20**	**100%**
C-5	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**M3**	**21,52**	**21,52**	**21,52**	**100%**
C-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**17,91**	**17,91**	**17,91**	**100%**
C-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**12,23**	**12,23**	**12,23**	**100%**
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	**2,39**	**2,39**	**2,39**	**100%**
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	**13,49**	**13,49**	**13,49**	**100%**
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**UND**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100%**

* Insertar las filas que sean requeridas de acuerdo a los Items del presupuesto.


* Adjuntar informe detallado de las actividades desarrolladas en el periodo y sabana de cantidades contratadas y ejecutadas.

FIRMA:	
NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°:	25202098884-CND

FIRMA:	
NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo programado	Comienzo real	Variación de Comienzo	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Cantidad
1		<Tareas nuevas>	209 días	71%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	$ 859.851.989,00	mar 1/10/24	vie 18/07/25		
2		**1. MUNICIPIO DE VIRACACHA -SECTOR SECTOR PUERTO GENARO, VIA CIENEGA**	**1 día**	**100%**	**jue 12/12/24**	**vie 15/11/24**	**0 días**	**$ 117.744.371,00**	**jue 12/12/24**	**jue 12/12/24**		
25		2. MUNICIPIO DE CHITARAQUE	172 días	94%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	$ 148.936.404,00	mar 1/10/24	mié 28/05/25		
52		3. MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL-CAMPOHERMOSO-PAEZ	60 días	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	$ 73.484.304,00	vie 1/11/24	jue 23/01/25		
84		4. MUNICIPIO DE PAEZ	64,58 días	52%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	$ 99.866.494,00	dom 1/12/24	vie 28/02/25		0.00
113		5. MUNICIPIO DE SAN MATEO	41 días	0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días	$ 122.088.063,00	sáb 25/01/25	lun 24/03/25		
138		6. MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	40 días	0%	lun 26/05/25	NOD	0 días	$ 118.997.605,00	lun 26/05/25	vie 18/07/25		135.41
139		**PRELIMINARES**	**0 días**	**0%**	**lun 26/05/25**	**NOD**	**0 días**	**$ 0,00**	**lun 26/05/25**	**lun 26/05/25**		
140		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	0 días	0%	lun 26/05/25	NOD	0 días	$ 0,00	lun 26/05/25	lun 26/05/25		0
141		**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA 36"**	**40 días**	**0%**	**lun 26/05/25**	**NOD**	**0 días**	**$ 45.436.799,00**	**lun 26/05/25**	**vie 18/07/25**		
142		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	15 días	0%	lun 26/05/25	NOD	0 días	$ 1.331.569,00	lun 26/05/25	vie 13/06/25	140CC	81.91
143		EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	10 días	0%	lun 26/05/25	NOD	0 días	$ 2.054.790,00	lun 26/05/25	vie 6/06/25	142CC	34.47
144		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	5 días	0%	lun 26/05/25	NOD	0 días	$ 464.990,00	lun 26/05/25	vie 30/05/25	140CC	5.73
145		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (aclados)	0 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00				0
146		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	4 días	0%	lun 23/06/25	NOD	0 días	$ 13.862.127,00	lun 23/06/25	jue 26/06/25	159	22.69
147		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	15 días	0%	lun 30/06/25	NOD	0 días	$ 9.621.630,00	lun 30/06/25	vie 18/07/25	163	6.43
148		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	0 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00				0
149		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	0 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00				0
150		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	21 días	0%	jue 19/06/25	NOD	0 días	$ 16.820.550,00	jue 19/06/25	jue 17/07/25	146CC-2 días	2181.41
151		DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	0 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00				0
152		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	0 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00				0
153		CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	0 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00				0
154		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (")	0 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00				0
155		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	3 días	0%	lun 30/06/25	NOD	0 días	$ 1.281.143,00	lun 30/06/25	mié 2/07/25	163	903.10
156		**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	**10 días**	**0%**	**jue 3/07/25**	**NOD**	**0 días**	**$ 4.946.821,00**	**jue 3/07/25**	**mié 16/07/25**		
157		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	10 días	0%	jue 3/07/25	NOD	0 días	$ 4.946.821,00	jue 3/07/25	mié 16/07/25	155	70.45
158		**ITEMS NO PREVISTOS**	**86 días**	**0%**	**sáb 1/03/25**	**NOD**	**0 días**	**$ 68.613.985,00**	**sáb 1/03/25**	**lun 30/06/25**		
159		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	3 días	0%	jue 26/06/25	NOD	0 días	$ 7.983.986,00	jue 26/06/25	lun 30/06/25	163FC-2 días	11.64
160		CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C40P	1 día	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00	sáb 1/03/25	sáb 1/03/25		1.86
161		PEDRAPLEN COMPACTO	2 días	0%	lun 16/06/25	NOD	0 días	$ 915.462,00	lun 16/06/25	mar 17/06/25	142	11.65
162		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA NOVAFORT CON ALMA DE ACERO D=1.5 M	0 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	$ 0,00	sáb 1/03/25	sáb 1/03/25		7
163		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE D=2,5 M	8 días	0%	mié 18/06/25	NOD	0 días	$ 59.714.537,00	mié 18/06/25	vie 27/06/25	161	
164		7. MUNICIPIO DE SANTA MARIA	60 días	98%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	$ 300.655.572,00	jue 28/11/24	mié 19/02/25		12.66
188		8. MUNICIPIO DE EL COCUY	30 días	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	$ 78.099.176,00	jue 5/12/24	mié 15/01/25		15.00

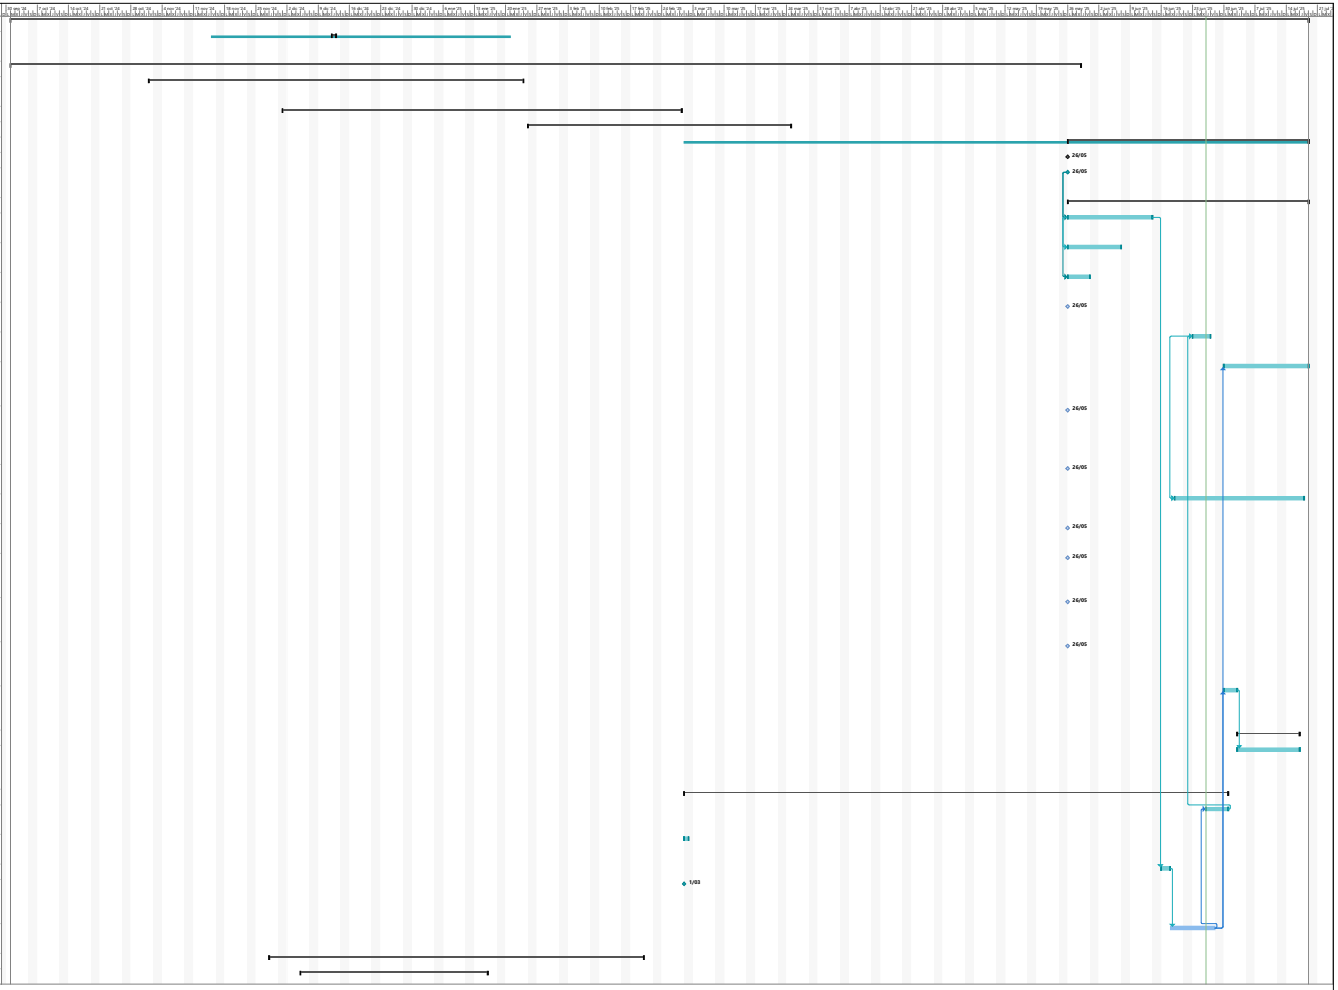

Proyecto: CRONOGRAMA NOR

CONTROL DE PLAZOS OBRA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	FECHA:

5.1 CONTROL DE PLAZOS OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

	FECHA		PLAZO				
			AÑOS	MESES	DIAS		
ACTA DE INICIO	06/09/2023	PLAZO		3	26	FECHA TERMINACION SEGUN CONTRATO	31/12/2023

SUSPENSIONES							
			ANOS	MESES	DIAS		FECHA
SUSPENSION 1	28/12/2023	TIEMPO		3	20	REINICIO 1	18/04/2024
SUSPENSION 2		TIEMPO				REINICIO 2	
SUSPENSION 3		TIEMPO				REINICIO 3	
SUSPENSION 4		TIEMPO				REINICIO 4	
SUSPENSION 5		TIEMPO				REINICIO 5	
SUSPENSION 6		TIEMPO				REINICIO 6	
SUSPENSION 7		TIEMPO				REINICIO 7	
SUSPENSION 8		TIEMPO				REINICIO 8	
SUSPENSION 9		TIEMPO				REINICIO 9	
SUSPENSION 10		TIEMPO				REINICIO 10	
			ANOS	MESES	DIAS		
TOTAL SUSPENSIONES		**TIEMPO**	**0**	**3**	**20**		

ADICIONES EN PLAZO							
			ANOS	MESES	DIAS		FECHA
ADICION 1	20/04/2024	TIEMPO		8		PARA VERIFICAR SI ES (HASTA FECHA ?)	20/12/2024
ADICION 2	16/12/2024	TIEMPO		5		PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	16/05/2025
ADICION 3	19/05/2025	TIEMPO		2		PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	19/07/2025
ADICION 4		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 5		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 6		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 7		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 8		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 9		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 10		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
			ANOS	MESES	DIAS		
TOTAL ADICIONES EN PLAZO		**TIEMPO**	**0**	**15**	**0**		

	AÑOS	MESES	DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**0**	**18**	**26**

FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	21/07/2025
	lunes, 21 de julio de 2025

CONTROL DE PLAZOS
INTERVENTORIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	FECHA:

5.2 CONTROL DE PLAZOS INTERVENTORIA

CONTRATO No:	2567	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

	FECHA		PLAZO				
			AÑOS	MESES	DIAS		
ACTA DE INICIO	06/09/2023	PLAZO		3	26	FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO	31/12/2023

SUSPENSIONES							
			ANOS	MESES	DIAS		FECHA
SUSPENSION 1	28/12/2023	TIEMPO		3	20	REINICIO 1	18/04/2024
SUSPENSION 2		TIEMPO				REINICIO 2	
SUSPENSION 3		TIEMPO				REINICIO 3	
SUSPENSION 4		TIEMPO				REINICIO 4	
SUSPENSION 5		TIEMPO				REINICIO 5	
SUSPENSION 6		TIEMPO				REINICIO 6	
SUSPENSION 7		TIEMPO				REINICIO 7	
SUSPENSION 8		TIEMPO				REINICIO 8	
SUSPENSION 9		TIEMPO				REINICIO 9	
SUSPENSION 10		TIEMPO				REINICIO 10	
			ANOS	**MESES**	**DIAS**		
TOTAL SUSPENSIONES		**TIEMPO**	**0**	**3**	**20**		

ADICIONES EN PLAZO							
			ANOS	**MESES**	**DIAS**		**FECHA**
ADICION 1	20/04/2024	TIEMPO		8		PARA VERIFICAR SI ES (HASTA FECHA ?)	20/12/2024
ADICION 2	16/12/2024	TIEMPO		5		PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	16/05/2025
ADICION 3	19/05/2025	TIEMPO		2		PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	19/07/2025
ADICION 4		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 5		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 6		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 7		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 8		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 9		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 10		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
			ANOS	**MESES**	**DIAS**		
TOTAL ADICIONES EN PLAZO		**TIEMPO**	**0**	**15**	**0**		

	AÑOS	**MESES**	**DIAS**
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**0**	**18**	**26**

FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	**21/07/2025**
	lunes, 21 de julio de 2025

SEGUIMIENTO FINANCIERO

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	FECHA:

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

6.1 CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR
1	CONDICIONES INICIALES	3 meses y 26 días	$ 1.259.433.527,00
2	ADICIONAL EN PLAZO 1	8 meses	
3	ADICIONAL EN PLAZO 2	5 meses	
4	ADICIONAL EN PLAZO 3	2 meses	
	VALOR TOTAL		$ 1.259.433.527,00

6.2 DESEMBOLSOS Y/O PAGOS CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA			AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	VALOR PAGADO
ANTICIPO	11	12	2023		$ 377.830.058,10	
ACTA PARCIAL No. 1	17	2	2025	$ 285.897.698,40	$ 91.932.359,70	$ 952.992.328,00
ACTA PARCIAL No. 2						
ACTA PARCIAL No. 3						
TOTAL PAGOS CONTRATO DE OBRA						**$ 952.992.328,00**
SALDO DEL CONTRATO DE OBRA						$ 306.441.199,00

6.3 CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR
1	CONDICIONES INICIALES	3 meses y 26 días	$ 71.088.277,00
2	ADICIONAL EN PLAZO 1	8 meses	
3	ADICIONAL EN PLAZO 2	5 meses	
4	ADICIONAL EN PLAZO 3	2 meses	
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 71.088.277,00

6.4 DESEMBOLSOS Y/O PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA			AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	VALOR PAGADO
ANTICIPO						
ACTA PARCIAL No. 1	13	5	2025	N.A.	N.A.	$ 53.792.499,00
ACTA PARCIAL No. 2						
ACTA PARCIAL No. 3						
TOTAL PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORIA						**$ 53.792.499,00**
SALDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA						$ 17.295.778,00

FIRMA:



NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

*Anexar copia de actas generadas en el periodo

CONTROL DEL PERSONAL OBRA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

9.1 CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27 de JUNIO de 2025				
PERIODO:	DEL 18 de MAYO de 2025	AL	17 de JUNIO de 2025				

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

N°	PERSONAL (CARGO - NOMBRE)	IDENTIFICACION	may-25														jun-25															
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
1	DIRECTOR DE OBRA ISDUAR HUMERTO PAEZ RAMOS	4.158.923											X		X						X						X						
2	RESIDENTE DE OBRA SONIA MALENA MARIN SOTELO	1.053.340.500									X	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
3	GEOLOGO VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79.383.126													X						X							X	X				X
4	ASESOR EN GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS JIMMY VERGARA SILVA	74.321.878												X						X							X					X	
5	ASESOR HIDRAULICO IVÁN FERLEY CAÑÓN	7.314.941												X							X	X				X			X				
6	CORDINADOR JUAN CARLOS VELAZQUEZ	80.217.561									X		X			X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
7	AYUDANTE ALVARO ZAMIR BENITEZ MENDOZA	1030690187									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
9	AYUDANTE JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
10	AYUDANTE ILBAR FERNANDO CASALLAS ROBAYO	1055963752									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	

* Adjuntar soportes de acciones realizadas por el personal profesional especializado requerido en el contrato (Actas de visita, conceptos emitidos, informes realizados, etc)

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°	25202274731-CND

CONTROL DEL PERSONAL INTERVENTORIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

9.2 CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No:	**2567**	DE	**2023**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**18**	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025		
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

CONTROL DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

N°	PERSONAL (CARGO - NOMBRE)	IDENTIFICACION	may-25														jun-25															
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
1	JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO	1.010.200.976		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X								
2	LAURA YANETH RODRIGUEZ BERDUGO	1.057.589.899																X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	

* Adjuntar soportes de acciones realizadas por el personal profesional especializado requerido en el contrato (Actas de visita, conceptos emitidos, informes realizados, etc) en el anexo correspondiente.

FIRMA:

NOMBRE:	LAURA YANETH RODRIGUEZ BERDUGO
CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA Nº	01115-10800

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA Nº	25202274731-CND

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.200.976, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE identificado con Nit 901.719548-1 en calidad de interventor del contrato de obra N° 001 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA REDVIAL DEPARTAMENTALAFECTADA PORTEMPORADA DELLUVIAS ENMUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", celebrado entre el Departamento de Boyacá y NYS CONSTRUCOL S.A.S, certifico que durante el periodo del presente informe, la empresa NYS CONSTRUCOL S.A.S identificada con Nit 901306834-9, ha realizado las afiliaciones de personal y el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes durante el periodo comprendido desde el 18 de mayo de 2025 al 17 de junio de 2025 .

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Chiquinquirá Boyacá, a los 17 días del mes de junio de 2025.

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

NIT. 901.306.834-9

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.053.324.568 de Chiquinquirá, Boyacá y con Tarjeta Profesional No. 186579-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de NYS CONSTRUCOL S.A.S. identificada con NIT 901.306.834-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el 18 de mayo de 2025 al 17 de junio de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa NYS CONSTRUCOL SAS se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (artículo *3 Decreto 1047 de 1983)* se realizará en cuanto se obtenga el acta de recibo final.

En constancia, se firma en Chiquinquirá, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2025.

JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS
CONTADOR PÚBLICO

NYS CONSTRUCOL S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



186579-T

JULIAN CAMILO
RAMIREZ CASTELLANOS
C.C. 1053324568
RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

FECHA 12/02/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

195673

187143

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8CEA696AEB4482B4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053324568 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 186579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

10.1 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023
INFORME DE INTERVENTORIA No:	18	FECHA:	27 de JUNIO de 2025
PERIODO: DEL	18 de MAYO de 2025	AL	17 de JUNIO de 2025

8.1.1 REPRESENTANTE LEGAL Y CONSORCIADOS

(Debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada por el contratista de obra)

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	CARGO	TIPO VINCULACIÓN	TIPO RIESGO (I,II,III,IV,V)	ASIGNACIÓN BASICA MENSUAL	BASE COTIZACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PARAFISCALES (CCF, SENA, ICBF)	PERIODO COTIZADO		
												MES COTIZADO	DIAS	PLANILLA N°
JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ	1.053.341.203	10/05/2011	Representante legal	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					N.A.		N.A.

8.1.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CONTRATO DE OBRA

(Debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada por el contratista de obra)

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	CARGO	TIPO VINCULACIÓN	TIPO RIESGO (I,II,III,IV,V)	ASIGNACIÓN BASICA MENSUAL	BASE COTIZACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PARAFISCALES (CCF, SENA, ICBF)	PERIODO COTIZADO		
												MES COTIZADO	DIAS	PLANILLA N°
ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	4.158.923	19/05/1995	Director	CONTRATO	I	1.423.500	1.423.500	X	X	X	X	MAYO		33458702
SONIA MALENA MARIN SOTELO	1.053.340.500	23/12/2010	Residente	CONTRATO	V	1.423.500	1.423.500	X	X	X	X	MAYO		87168563
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79.383.126	26/06/1984	Especialista	CONTRATO	V	1.423.500	1.423.500	X	X	X	X	MAYO		7971181626
JIMMY VERGARA SILVA	74.321.878	3/12/1999	Especialista	CONTRATO	I	1.423.500	1.423.500	X	X	X	X	MAYO		9486870309
IVAN FERLEY CAÑON	7.314.941	19/02/1996	Especialista	CONTRATO	I	2.400.000	2.400.000	X	X	X	X	MAYO		9487126486

8.1.3 PERSONAL MANO DE OBRA

(Debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada por el contratista de obra)

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	CARGO	TIPO VINCULACIÓN	TIPO RIESGO (I,II,III,IV,V)	ASIGNACIÓN BASICA MENSUAL	BASE COTIZACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PARAFISCALES (CCF, SENA, ICBF)	PERIODO COTIZADO		
												MES COTIZADO	DIAS	PLANILLA N°
VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	80.217.561		Cordinador	CONTRATO	V	1.423.500	1.423.500	X	X	X	X	MAYO		87168563
ALVARO ZAMIR BENÍTEZ MENDOZA	1.030.690.187	12/09/2016	Ayudante N°1	CONTRATO	V	1.423.500	1.423.500	X	X	X	X	MAYO		87167746
CASALLAS ROBAYO ILBAR FERNANDO	1.055.963.752	21/01/2015	Ayudante N°2	CONTRATO	V	1.423.500	1.423.500	X	X	X	X	MAYO		87167746
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1.053.328.390	8/11/2021	Ayudante N°3	CONTRATO	V	1.423.500	1.423.500	X	X	X	X	MAYO		87167746

NOTAS:

* Adjuntar copia de los contratos de trabajo del personal que no este incluido en la nomina del contratista

* Adjuntar certificados de afiliación (ARL y EPS), y copia de las planillas de pago

* El personal debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada

* Si se incluyó personal profesional nuevo en el periodo se debe adjuntar la hoja de vida y certificado de aprobación de interventoría, previo al ingreso del personal.

* El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

* El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los aportes legales y seguridad social del personal vinculado al contrato de obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

* El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
M.P N°:	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P N°	25202274731-CND

RAZÓN SOCIAL :	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-4158923
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-09
FECHA DE PAGO:	2025-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33458702
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33458702
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/07/2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87168563	$3.173.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	576.000	0	0	0	0	0	0		576.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.064.000	0	0	0	0	0	0		1.064.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	713.500				713.500	0	0	713.500			7.135	713.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	410.000	0	0	410.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	410.000	410.000
Pensión	2	1.640.000	1.640.000
Riesgos Laborales	1	713.500	713.500
CCF	1	410.000	410.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.173.500	3.173.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87168563	$3.173.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001272279	ROCHA TORRES ANA MARIA	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.300	CCF10	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	1053340500	MARIN SOTELO SONIA MALENA	1	0			S																	230201	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-4	3.600.000	5	250.600	CCF10	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
3	CC	80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	4.750.000	760.000	0	0	0	0	EPS017	4.750.000	190.000	14-4	4.750.000	5	330.600	CCF10	4.750.000	190.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79383126
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR HUGO DIAZ HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 45 # 75SUR-81 APTO.1201	TELÉFONO:	5505231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7971181626**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1539044427

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 0**	**$ 416.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
SUBTOTALES:													**$ 325.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 181.000	$ 181.000	$ 0	$ 0	$ 181.000
SUBTOTALES:									**$ 181.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 181.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 79383126	DIAZ HERRERA VICTOR HUGO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.600.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	79383126	$ 181.000	30	$ 2.600.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 974.000

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74321878		VERGARA SILVA JIMMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 # 7 - 06	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7263604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1533176839	9486870309	I	2025/06/19	2025/06/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	74321878	VERGARA SILVA JIMMY																		230301	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74321878		VERGARA SILVA JIMMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 # 7 - 06	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7263604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1533176839	9486870309	I	2025/06/19	2025/06/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7314941		CAÑON PAEZ IVAN FERLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 # 7-19	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7264400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1528098482	9487126486	I	2025/06/11	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$503,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,735,344	$277,700			$1,735,344	$217,000			$0	$0			$1,735,344		$9,100		$0	$0		$503,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,735,344	$277,700			$1,735,344	$217,000			$0	$0			$1,735,344		$9,100		$0	$0		$503,800
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,735,344	$277,700			$1,735,344	$217,000			$0	$0			$1,735,344		$9,100		$0	$0		$503,800
1	CC	7314941	CAÑON IVAN							X		X								25-14	30	$1,735,344	$277,700	EPS005	30	$1,735,344	$217,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,735,344	0.522%	$9,100	0	$0	$0	No	$503,800
Total		**Afiliados(1)**																				$1,735,344	$277,700			$1,735,344	$217,000			$0	$0			$1,735,344		$9,100		$0	$0		$503,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7314941		CAÑON PAEZ IVAN FERLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 # 7-19	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7264400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1528098482	9487126486	I	2025/06/11	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$503,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$277,700	$0	$0	$277,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$277,700	$0	$0	$277,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,000	$0	$0	$217,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$217,000	$0	$0	$217,000
TOTAL				**1**	**$503,800**	**$0**	**$0**	**$503,800**

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 7314941		CAÑON PAEZ IVAN FERLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 # 7-19	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7264400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2025-05**	Periodo Salud	**2025-05**
Fecha límite de pago	**2025/06/11**	Fecha de pago	**2025/06/24**
Dias de mora	**13**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$192,800**
Intereses de mora	**$1,700**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$194,500**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9487669576**
Clave de pago	**1574537693**
Banco	**BANCOLOMBIA**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901306834-9	NYS CONSTRUCOL SAS	CARRERA 2B 42A 32	3202680071	nysconstrucol.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87167746	$1.127.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.100	0		0		0	0	0	0	55.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	675.800	0	0	0	0	0	0		675.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	113.800				113.800	0	0	113.800			1.138	113.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	169.100	0	0	169.100	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	169.100	169.100
Pensión	1	675.800	675.800
Riesgos Laborales	1	113.800	113.800
CCF	1	169.100	169.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.127.800	1.127.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901306834-9	NYS CONSTRUCOL SAS		CARRERA 2B 42A 32	3202680071	nysconstrucol.contable@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87167746	$1.127.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030690187	BENITEZ MENDOZA ALVARO ZAMIR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1053328390	POVEDA CASTRO JEHISSON EDGARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1055963752	CASALLAS ROBAYO ILBAR FERNANDO	1	0			S	X																230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS037	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	1	7.200	CCF10	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0

PAGADA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Objeto: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA”

Asunto: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mediante la presente Yo, JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.200.976, en mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE identificada con Nit 901719548-1, de acuerdo con los estados financieros certifico el pago de aportes de seguridad social, pensión, salud y riesgos Laborales, así como el pago de aportes parafiscales durante el periodo del 18 de mayo al 17 de junio de 2025.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2007

En constancia de lo anterior, se firma a los veinte (20) días del mes junio de 2025.

R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-EMERGENCIAS NORTE

CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE
NIT. 901.719.548-1

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA identificada con Cédula de Ciudadanía No 1.053.322.012 de Chiquinquirá, Boyacá y con Tarjeta Profesional No. 326628-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE identificado con NIT. 901.719.548-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañia en el periodo del 18 de mayo al 17 de junio de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo50 de la ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que el CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2025



NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA
CONTADOR PUBLICO
TP –326628-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

326628-T

NELSY JAKELINE
RIVERA ROCHA
C.C. 1053322012
RES. INSCRIPCION 266 DEL 21/05/2024
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

377004 386610

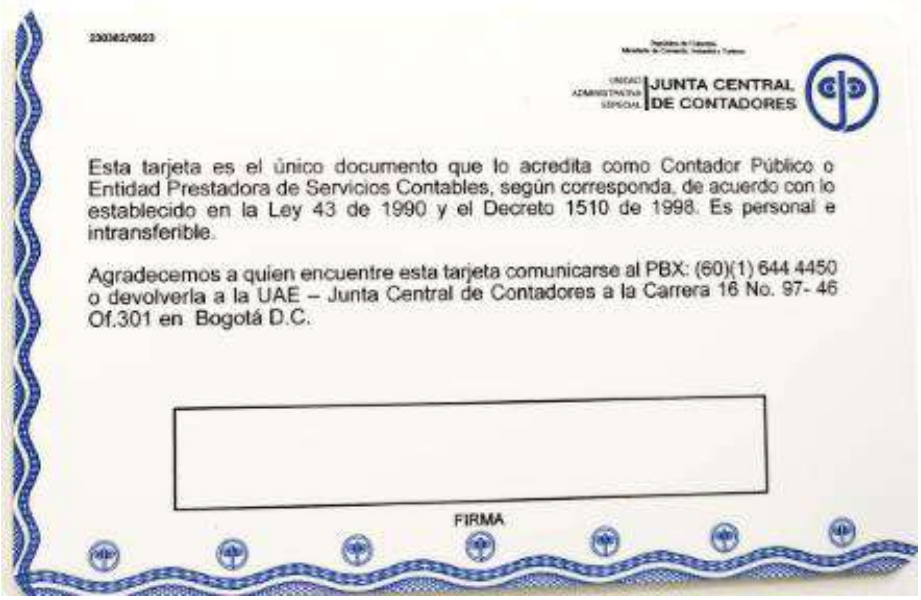

230362/0623

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C6221064210D5EF40

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053322012 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 326628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

10.2 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES INTERVENTORIA

CONTRATO No:	**2567**	DE	**2023**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**18**		FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025			
PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

8.2.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(Debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada por el interventor)

NOBRES Y APELLIDOS	CARGO	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA COMP, SENA, ICBF	PERIODO	
							MES	PLANILLA N°
JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO	Director	1.010.200.976	X	X	X	X	MAYO	9486845828

NOTAS:

* Adjuntar certificados de afiliación (ARL y EPS), y copia de las planillas de pago

* El personal debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada


* Si se incluyó personal profesional nuevo en el periodo se debe adjuntar la hoja de vida y certificado de aprobación del supervisor, previo al ingreso del personal.

* El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

* El Supervisor realiza la verificación del pago de los aportes legales y seguridad social del personal vinculado al contrato de interventoría, así como el cumplimiento de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique, basado en la documentación presentada y en virtud del principio de buena fé sobre la veracidad de dicha información

* El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la supervisión la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

FIRMA:



NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

FIRMA:



NOMBRE:	JAVIER IVAN BARRETO PINTO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
	SUPERVISOR

ACLARACIÓN SOBRE LAS PLANILLAS DE APORTES PARAFISCALES DE LA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Durante la ejecución del contrato, se presentó un periodo de espera derivado del proceso de revisión, definición y aprobación del modificatorio de obra, el cual contemplaba ajustes por mayores y menores cantidades de obra, así como la autorización del cambio en el diámetro de la tubería corrugada, pasando de 1.5 a 2.5 metros. Este trámite exigía concepto favorable por parte del área de contratación de la Gobernación, el cual fue recibido en su momento.

Una vez aprobado dicho modificatorio, el contratista manifestó la necesidad de un tiempo prudencial para la fabricación de la nueva tubería con el diámetro autorizado y su respectivo traslado hasta el sitio de obra. Esta situación generó un periodo de inactividad operativa (tiempos muertos) en la ejecución de actividades constructivas en campo.

Durante este lapso, y con el fin de optimizar recursos, únicamente se mantuvo la presencia del director de obra, quien asumió las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la coordinación y continuidad del contrato. En consecuencia, no se reportaron planillas de aportes parafiscales correspondientes a la residente de interventoría durante dicho periodo, dado que su participación en campo fue suspendida temporalmente.

A partir del 01 de junio, una vez reanudadas formalmente las labores constructivas en el municipio de San Eduardo, se reintegró la ingeniera residente, quien actualmente lidera la supervisión directa de las actividades en obra, con la correspondiente reactivación de su vinculación contractual y sus obligaciones parafiscales.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010200976		PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 18 7 28	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3222186	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1533119538	9486845828	I	2025/06/19	2025/06/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1010200976	PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO																		230301	30	EPS037	30		0	14-11	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010200976		PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 18 7 28	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3222186	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1533119538	9486845828	I	2025/06/19	2025/06/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

CERTIFICADOS DE MATERIALES

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

11. MATERIALES DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025			
PERIODO: DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

9. MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

MATERIAL	PROVEEDOR	UBICACIÓN / DIRECCION / COORDENADAS	DISTANCIA DE FUENTE A SITIO DE OBRA
GRAVILLA	AGREGADOS EL PERICO S.A.S	MIRAFLORES	15 KM
ARENA DE RIO	AGREGADOS EL PERICO S.A.S	MIRAFLORES	15 KM
TUBERÍA METALICA DE 2,5 M	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	SABANAGRANDRE - ATLANTICO	1012 KM
ACERO	DISTRIACERO NACIONAL S.A.S	BOGOTÁ D.C/ CALLE 8D # 82B-20	242 KM
CEMENTO	HOLCIM	NOBSA	156 KM

* Adjuntar copia de la Certificacion de los materiales.

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°:	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 2003:2022 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.

No. TOC-78555

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 21/05/2025

CLIENTE	DISTRIACERO NACIONAL S.A.S.	**DESTINO**	VILLAVICENCIO	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	33754
		PLACA	LUX 143	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	33784
						FACTURA No.	111987

						ENSAYOS FÍSICOS				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 5	12	20251216	3	864	✔	471.2	613.7	15.2	1.30	0.26	1.21	0.0168	0.024	0.19	0.20	0.09	0.12	0.018	0.00070	0.0024	0.48	1.506	1.110	10.560	72.7	1.980
		20251219	4		✔	474.5	622.2	16.2	1.31	0.26	1.19	0.0136	0.028	0.19	0.22	0.08	0.11	0.016	0.00071	0.0018	0.48	1.502	1.200	10.430	72.7	2.170
		20251217	1		✔	467.7	611.2	16.1	1.31	0.27	1.15	0.0136	0.024	0.19	0.17	0.07	0.09	0.013	0.00064	0.0018	0.48	1.502	1.110	10.560	72.7	2.030
R - No. 7	12	20251317	4	280	✔	467.3	642.2	13.8	1.37	0.28	1.02	0.0132	0.024	0.18	0.21	0.07	0.08	0.014	0.00056	0.0017	0.46	2.921	1.470	14.600	71.3	3.050
		20251316	1		✔	474.6	640.4	13.6	1.35	0.27	1.01	0.0125	0.026	0.18	0.21	0.07	0.08	0.013	0.00078	0.0016	0.46	2.926	1.520	14.600	71.3	2.880
R - No. 8	12	0586/24	3	210	✔	481.9	632.6	14.4	1.31	0.26	1.07	0.016	0.021	0.21	0.27	0.10	0.10	0.017	0.00400	0.0030	0.46	3.873	1.420	16.550	70.7	4.330
		0480/24	1		✔	490.9	656.1	14.0	1.34	0.26	1.02	0.026	0.034	0.20	0.26	0.10	0.13	0.02	0.00400	0.0020	0.45	3.879	1.420	16.550	70.7	4.330
		0366/24	1		✔	475.2	627.5	14.1	1.32	0.26	1.08	0.015	0.019	0.21	0.30	0.13	0.10	0.02	0.00400	0.0050	0.46	3.862	1.450	16.550	70.7	4.330
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Ing. Sandra Cabrera
DIRECTOR CONTROL CALIDAD

CCA-FOR-13 Versión. 05 24/01/2025

Enviado: distriaceronacional@gmail.com;distriaceronacional-supervisiondespachos@hotmail.com

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 2003:2022 Barra corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.

No. TOC-78491

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 20/05/2025

CLIENTE	DISTRIACERO NACIONAL S.A.S.	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	33728
		PLACA	LUX 143	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	33758
						FACTURA No.	111893

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
R - No. 4	12	8958890501	1	1680	✔	479.9	612.2	17.2	1.28	0.28	1.07	0.028	0.018	0.20	0.03	0.03	0.08	0.013	-	0.0040	0.47	0.965	0.820	8.470	71.7	1.400
		20243936	6		✔	488.9	634.8	15.4	1.30	0.26	1.16	0.0195	0.034	0.20	0.22	0.10	0.16	0.019	0.00050	0.0019	0.48	0.959	0.900	8.590	71.3	1.810
		8958901801	1		✔	488.6	620.2	17.3	1.27	0.28	1.07	0.028	0.014	0.19	0.04	0.04	0.07	0.019	0.00100	0.0050	0.47	0.978	0.880	8.470	71.7	1.520
		20243937	2		✔	493.1	650.5	15.4	1.32	0.26	1.18	0.0206	0.025	0.22	0.21	0.08	0.15	0.018	0.00050	0.0020	0.48	0.968	0.910	8.590	71.3	1.920
R - No. 8	12	20242619	2	336	✔	463.9	634.7	13.0	1.37	0.28	1.00	0.0141	0.030	0.18	0.19	0.07	0.13	0.017	0.00039	0.0018	0.46	3.871	1.700	16.630	70.0	4.000
		20242625	4		✔	470.0	622.9	13.7	1.33	0.27	0.98	0.0156	0.024	0.20	0.20	0.07	0.08	0.013	0.00048	0.0018	0.45	3.844	1.650	16.630	70.0	4.020
		20242603	1		✔	472.2	630.4	13.0	1.34	0.27	0.99	0.0114	0.032	0.19	0.20	0.07	0.08	0.02	0.00064	0.0017	0.45	3.843	1.670	16.630	70.0	4.010
		20242602	1		✔	472.2	625.4	13.3	1.32	0.27	1.01	0.0138	0.033	0.21	0.20	0.07	0.09	0.02	0.00020	0.0018	0.45	3.843	1.670	16.630	70.0	4.050
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Ing. Sandra Cabrera
DIRECTOR CONTROL CALIDAD

CCA-FOR-13 Versión. 05 24/01/2025

Enviado: distriaceronacional@gmail.com;distriaceronacional-supervisiondespachos@hotmail.com

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131577643

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIACERO NACIONAL SAS	**9007668947/10**	**OC 6052025**	**11047309/000010**	**NTC 2289**	**33.215**

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1726887601	GR 60	0,27	0,94	0,009	0,026	0,14	0,21	0,11	0,12	0,02	0,003	0,036	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1726887901	GR 60	0,27	0,98	0,012	0,041	0,15	0,24	0,15	0,14	0,03	0,003	0,036	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS — **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacl	Altura	Separa	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1726887601	3	475	648	1,36	16,5	0,543	OK	6,58	0,53	2,21	62	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1726887901	3	462	655	1,42	17,4	0,543	OK	6,52	0,58	2,11	52	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	45,0 - 70,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 15.05.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131578148

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIACERO NACIONAL SAS	9007669420/10	oc 14052025	11050225/000010	NTC 2289	34.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726902301	GR 60	0,28	1,06	0,010	0,039	0,19	0,24	0,11	0,11	0,02	0,003	0,002	0,48
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726906701	GR 60	0,28	1,03	0,017	0,022	0,15	0,24	0,13	0,14	0,03	0,002	0,002	0,48
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726906801	GR 60	0,28	1,02	0,011	0,029	0,15	0,21	0,10	0,13	0,02	0,003	0,002	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacl	Altura	Separa	Ángulo
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726902301	6	456	612	1,34	18,9	2,135	OK	12,80	1,19	3,63	63
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726906701	6	486	633	1,30	18,7	2,140	OK	12,80	1,21	3,72	63
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726906801	6	485	616	1,27	18,6	2,143	OK	12,80	1,21	3,60	63
Rangos de referencia según norma				420,0 - 640,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm	mín 45,0 deg

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 16.05.2025

PAOLA KATHERIN MATEUS

N&S CONSTRUCOL S.A.S

TUBERÍA CORRUGADA PARA BOX COULVERT

ORDEN DE PRODUCCIÓN No 3403

BOGOTÁ D.C – MAYO DE 2025

ÍNDICE

1. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.
2. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES.
3. REGISTRO DE CONTRÓL DIMENSIONAL.
4. REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO

1. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

itm®	INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA	F-OPEP-14 Versión No. 1 Vigencia: 31 de julio de 2024

PROVEEDOR: ACESCO

RECIBIDO EN:	ALMACEN PROYECTO: ☐ TALLER: ☒	CON DESTINO A: ACMACEN	FABRICACION EN: OBRA ☐ TALLER ☒	O.C: FECHA: ABRIL 16 DE 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANT. MUESTRA	REMISIÓN / FACTURA	DIMENSIONES (mm) Min. Max.		No CERTIFICADO	COLADA	TRAZABILIDAD	ACEPTACIÓN (SI) Ó (NO)
1	LÁMINA GALVANIZADA A653 - GRADO 50 3mm * 1220mm * 2440mm	Kg	2200	2,2 Kg	8000469753	3mm 1220mm 2440mm	3mm 1224mm 2444mm	8000469753	0011406310		SI

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA:
Los materiales deben estar en condiciones aceptables, con dimensiones adecuadas, con orden de pedido y en corcondancia con los certificados, según norma ASTM o aplicable.

CONTROL CALIDAD	ALMACEN
FIRMA:	
NOMBRES: JEQUAMY SALAZAR	
CARGO: ANALISTA CALIDAD	
FECHA: ABRIL 16 - 2025	

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000469753
CLIENTE: ITMCOL SAS

FECHA 16.04.2025

MATERIAL: 312913 - Lam 3.00-1220x2440 Z275 Gr50 Galv.
NORMA DE CALIDAD: ASTM A 653 GRADO 50

LOTE No COLADA No PESO	0011406310 240913001 2.200 kg				
PORCENTAJE DE CARBONO	0,172 %				
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,490 %				
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,014 %				
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,004 %				
PORCENTAJE DE ALUMINIO	%				
ANCHO	1222 mm				
LONGITUD	2441 mm				
CUADRATURA	1,0 mm				
PLANITUD	0 mm				
COMBADURA	0 mm				
RECUBRIMIENTO Z275	275,0 g/m2				

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000469753
CLIENTE: ITMCOL SAS

FECHA 16.04.2025

MATERIAL: 312913 - Lam 3.00-1220x2440 Z275 Gr50 Galv.
NORMA DE CALIDAD: ASTM A 653 GRADO 50

LOTE No	0011406310				
COLADA No	240913001				
PESO	2.200 kg				
LÍMITE ELÁSTICO PROV	472 MPa				
RESISTENCIA MÁXIMA PROV	558 MPa				
ELONGACIÓN PROV	22 %				

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

NINGBO FOURWAY CO.,LTD.

TEST CERTIFICATES

(ACCORDING TO EN 10204 3.1)

ORDER NO. FW-TR062 TEST DATE: 06TH DEC.2024

PAYMENT TERMS:T/T CERTIFICATE NO. DH-245761206325

DESCRIPTION OF PARTS: INVOICE NO. 24FW-576

ITEM NO.	QUANTITY	DIMENSION	STANDARD	MARKING
POSITION	MPCS			
1	100,955	1/2"-13UNC X 1-1/2"	ASTM A325 TYPE 1,HOT DIP GALVANIZED	FW A325 165

RESULT OF TESTS:

ITEM NO. POSITION	TENSILE STRENGTH MIN.120ksi	YIELD STRENGTH MIN.92ksi	ELONGATION >14%	REDUCE >35%	TEMPERING	QUENCHING	HARDNESS 25-34HRC
1	128	97	17	38	510	890	30,0

THE MACRO ETCH RESULTS FOR SURFACE:

ITEM NO.	DIVISION	SURFACE CONDITION	RANDAM CONDITION	CENTER CONDITION	SPEC.OF
POSITION	SPECIFIED	S4	R4	C4	TEST METHOD
1	RESULTS	S3	R1	C2	ASTM E381-2017

VISUAL INSPECTION(HEAD BURSTS) AND DIMENSIONAL AND THREAD CHECK: OK

CHEMICAL ANALYSIS: CK35

ANALY NO.	C	Si	Mn	P	S		HEAT NR
POSITION	%	%	%	%	%		
REQUIRED VALUE	0.30-0.52	0.15-0.30	>=0.60	<=0.035	<=0.04		
TEST VALUE							
1	0,35	0,15	0,69	0,018	0,007		22212165

WE HEREBY VERIFY THAT THE OUTCOMES OF TEST, CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH ASTM F3125-15a PROPERTY GRADO A325 TYPE 1 SPECIFICATIONS, TRUE AND CORRECT IN EVERY ASPECTS AND DETAILS.


CHEMICAL ANALYSIS AND MECHANICAL TEST RESULTS IN CONFORMITY WITH ASTM REQUIREMENTS

STATEMENTS:
STEEL HEATS"ELEMENTS BISMUTH, SELENIUM, TELLURIUM,
AND LEAD"HAVE NOT INTENTIONALLY ADDED AND USED.

THE RESULTS OF TESTS ARE SATISFACTORY

NINGBO FOURWAY CO.,LTD,

WORK INSPECTOR: 李照



Quality Certificate (质检书)

ORDER NO.:	TSS24002-2
Date(日期):	JUN. 24, 2024
Customer (客户名称)	TORNIRAP S.A.S
Poducer (生产商):	XINMAO HARDWARE INDUSTRY CO., LTD
Commodity (商品名):	FALT WASHER ZINC PLATED/HOT DIP GALVANIZED

Size (尺寸):	5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2"	Quantity (数量):	5PCS/SIZE

INSPECITON CERTIFICATE ACC.TO DIN50049/EN10204-3.1B
(检测证书根据什么标准出示的)

We hereby cetify that the washers in question are made acc.to: (我们特此证明以下):	NONE STANDARD (采用标准)
Mechanical properties (机械性质):	ISO898-19 (根据什么标准)

Zinc plated (镀锌) /HOT DIP GALVANIZED (热镀锌): acc.to ISO4042 (根据什么标准)

Mechanical property (机械性质)

Test on Manufatured goods (生产产品检测)	Standard标准 Min. 最小	Standard标准 Max. 最大	Test result Min. 最小	Test result Max. 最大	Samples 取样数	Remarks 备注说明
Hardness (HV) 硬度	100		115		60	PASS (检测通过)

Material and Heat treating 材料和热处理

Prescribed material/ 规定的材料	Q235	Supplier Material/ 供应商的材料	Q235

Material Anlysis-Chemmical Composition:

Batch No./GH0806批号	Size	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Cu
4485073	5/32"	0.1	0.2	0.36	0.028	0.029	/	/	/
8931953	3/16"	0.1	0.19	0.38	0.024	0.026	/	/	/
6641561	1/4"	0.07	0.21	0.36	0.025	0.025	/	/	/
4227384	5/16"	0.09	0.19	0.37	0.029	0.026	/	/	/
5770040	3/8"	0.08	0.2	0.34	0.024	0.026	/	/	/
5208906	7/16"	0.09	0.22	0.39	0.025	0.025	/	/	/
6389196	1/2"	0.1	0.19	0.38	0.025	0.027	/	/	/
9523677	5/8"	0.09	0.22	0.37	0.028	0.025	/	/	/
9626004	1-1/8"	0.08	0.2	0.33	0.024	0.025	/	/	/
7697266	1-1/4"	0.1	0.22	0.38	0.024	0.024	/	/	/
9123026	1-3/8"	0.09	0.25	0.39	0.024	0.025	/	/	/
8286609	1-1/2"	0.08	0.25	0.34	0.027	0.028	/	/	/

The product described above has been tested and complies with the terms/conditions of

Quality Control Dept.

HISENER INDUSTRIAL CO.,LTD

No.1,Gushan Road,Changqiangshan Industrial Park,Ganpu,Haiyan City,314300,Zhejiang,China

MILL TEST CERTIFICATION

Certification Conforms to EN10204 3.1

Supplier: HISENER INDUSTRIAL CO.,LTD
Certificate No.: MTC23SL030490727010
Buyer: TORNIRAP SAS
Invoice No.: 23SL03049F
Quality System: ISO9001:2015 Certified 2022-12
PO. NO.:

Product Description: SAE J995 GRADE 5 HEX NUTS UNC PER ASME B18.2.2
Product Size: 1/2"-13
Surface: HDG Oversized
Shipped Q'ty: 80,330 MPCS
Part No.: TCAAOSGI08490
Quality Acceptance: ASME B18.18/ASTM F 470
Lot No.: L23SL030490526010
Manufacturing Date: 2023.06.10
D/C No.:

RAW MATERIAL Q195 **Heat No.:** G290007458

Elemen:	C	Si	Mn	S	P	Ni	Cr	Cu
Spec.	0.06 ~ 0.12	max 0.30	0.25 ~ 0.50	max 0.050	max 0.045			
Result	0.07	0.[illegible]	0.36	0.025	0.023			

Raw material used for the products is from China of origin

SURFACE & THREAD

Test Item	Spec.	Standard	Remark	Test Item	Spec.	Standard	Remark
Appearance	Flawless	ASTM F812	OK	Go gauge	2B	ASME B1.1	OK
Coating	HDG Oversized	ASTM F2329	OK	NO Go gauge	2B		OK

DIMENSION MEASUREMENT(UNIT: MM) **According to :** ASME B18.2.2

Test Item	Spec.	Sampling	Remark	NOTE
INNER DIAMETER (d1)	10.69 ~ 11.02	10	OK	
WIDTH ACROSS FLATS (s)	18.69 ~ 19.05	10	OK	
WIDTH ACROSS CORNERS (e)	21.34 ~ 22	10	OK	
HEIGHT (m)	10.85 ~ 11.38	10	OK	

MACHANICAL PROPERTIES **According to :** SAE J995 (UNC,8UN) HFH

Test Item	Spec.	Sampling	Remark	NOTE
PROOF LOAD STRESS (Mpa/Ksi)	120 Ksi	10	OK	
HARDNESS (HR/HV)	max 32 HRC	10	OK	


We hereby certify that all the above material were manufactured , sampled, tested, and inspected in accordance with the relevant specification and any supplementary requirements or other requirements designated in the purchase order and was found to meet those requirements.

浙江海盛实业有限公司
HISENER INDUSTRIAL CO.,LTD.


Inspector: QC **Inspc. Date:** 2023.07.27

2. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES


TUERCA HEXAGONAL SAE GRADOS 5 - 8



Grado 8



Grado 5



D Diámetro		Hilos por Pulg. R.O.	R.F.	F Distancia Entre Caras	H Altura de la Cabeza
1/4	.250	20	28	7/16	7/32
5/16	.312	18	24	1/2	17/64
3/8	.375	16	24	9/16	21/64
7/16	.437	14	20	5/8	3/32
1/2	.500	13	20	3/4	7/16
9/16	.562	12	18	13/16	31/64
5/8	.625	11	18	15/16	35/64
3/4	.750	10	16	1 1/8	41/32
7/8	.875	9	14	1 5/16	3/4
1	1.000	8	14	1 1/2	55/64
1 1/8	1.125	7	12	1 11/16	31/32
1 1/4	1.250	7	12	1 7/8	1 1/16
1 1/2	1.500	6	12	2 1/4	1 9/32


Características				
Grado de Resistencia	Material	Dureza Rockwell	Carga de Prueba UNC	Carga de Prueba UNF
5	Acero de bajo o medio Carbono	C 32 Máx	120 000 lbs/pulg$^{2(psi)}$	109 000 lbs/pulg$^{2(psi)}$
8	Acero de bajo o medio Carbono Tratado Termicamente	C 24 A C 36	150 000 lbs/pulg$^{2(psi)}$	150 000 lbs/pulg$^{2(psi)}$

ESPECIFICACIO-

Grado 5: Las tuercas grado 5, son perfectas para unir superficies en estructuras que requieran gran resistencia, poseen forma externa hexagonal y están fabricadas con acero de medio carbono y es tratado térmicamente para ofrecer una excelente resistencia en la operación.


Grado 8: son muy sensibles a la fragilización por hidrógeno y están fabricados en acero medio carbono tratado térmicamente, tiene una gran aplicación para efectuar operaciones de unión es que requieran alta resistencia a la tensión, corte y puede estar sometido en ambientes con temperaturas de hasta 480°C

TORNILLOS HEXAGONAL SAE GRADO 5

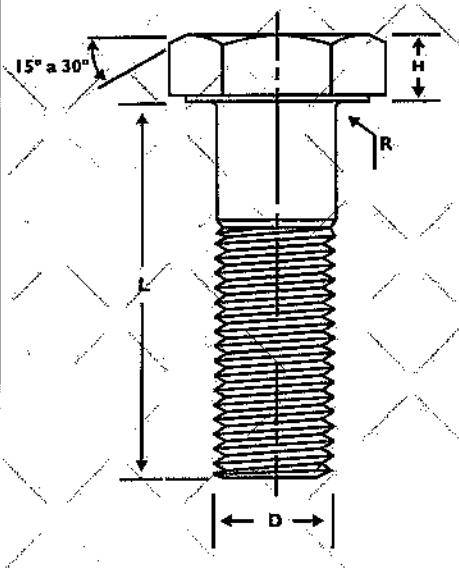

D Diámetro		Hilos por Pulg. R.O.	Hilos por Pulg. R.F.	F Distancia entre caras	H Altura de la cabeza
1/4	.250	20	28	7/16	5/32
5/16	.312	18	24	1/2	13/64
3/8	.375	16	24	9/16	15/64
7/16	.437	14	20	5/8	9/32
1/2	.500	13	20	3/4	5/16
5/8	.625	11	18	15/16	25/64
3/4	.750	10	16	1 1/8	15/32
7/8	.875	9	14	1 5/16	35/64
1	1.000	8	14	1 1/2	39/64

Características						
Grado de Resistencia	Diámetro	Material	Dureza Rockwell Min.	Dureza Rockwell Max.	Carga de Prueba	Resistencia Mínima a la tracción
5	1/4" a 1"	Acero de medio carbono tratado	C 25	C 34	85 000 lbs/pulg^2 (psi)	120 000 lbs/pulg^2 (psi)
	Mayor a 1"		C 19	C 30	74 000 lbs/pulg^2 (psi)	105 000 lbs/pulg^2 (psi)




USO

- **Los tornillos Grado 5 usados usualmente en la industria, son tornillos de resistencia media de acero al carbono o aleación media. a través de un proceso de tratamiento térmico que está destinado a aplicaciones de ingeniería general.**

ARANDELA PLANA
DIMENSIONAL: ASME B18.22.1

A Diámetro	B Diámetro Exterior Promedio MM	C Espesor Promedio MM
1/8	10,00	1,00
5/32	14,00	1,00
3/16	17,00	1,20
1/4	21,00	1,50
5/16	24,50	1,50
3/8	27,80	1,80
7/16	30,70	2,00
1/2	35,70	2,50
9/16	39,00	2,50
5/8	44,00	3,00
3/4	47,00	3,00
7/8	55,00	3,50
1	60,00	3,50

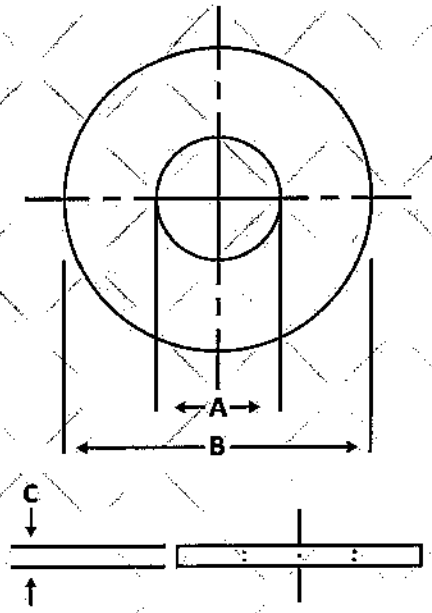

FUNCIONES

- Repartir de forma homogénea la fuerza de apriete en la superficie.
- Proteger las superficies de contacto contra ralladuras o daños producidos por el tornillo o la tuerca en el montaje.
- Distribuir la fuerza de apriete a zonas diferentes de las zonas de la cabeza del tornillo o tuercas (agujeros sobredimensionados).
- Evitar el recalcado de la cabeza del tornillo o la tuerca.
- Reducir el riesgo de que la unión atornillada se afloje, aumentando el coeficiente de fricción sobre el tornillo o tuerca con elementos estriados o dentados.

Acabados - Negro, Zincado, Bicromatizado, Galvanizado en Caliente (HDG)

ACESCO

Ficha Técnica
Acero Recubierto, Galvanizado, Metalum y Pintado



acesco.com.co

Ficha Técnica Acero Galvanizado

Descripción

La lámina de acero galvanizada por inmersión en caliente en calidad comercial y estructural, es un producto que combina las características de resistencia mecánica del acero y la resistencia a la corrosión generada por el zinc. Se utiliza como materia prima en la industria de refrigeración, construcción, automotriz y metalmecánica en general.

Se presenta en bobinas hasta 12 toneladas o en láminas cortadas a la medida, en espesores de 0.20mm hasta 3.00mm y anchos desde 914mm hasta 1220mm.


Propiedades Mecánicas

Norma : NTC 4011 – ASTM A653

Calidad Comercial CS*	Fluencia YP Mínima	Resistencia Máxima-Mínima	Elongación Mínima
	MPa	MPa	%
	205/380	----	⩾ 20

Calidad Estructural SS	GRADO	Fluencia YP Mínima	Resistencia Máxima-Mínima	Elongación Mínima
		MPa	MPa	%
	33	230	310	20
	37	255	360	18
	40	275	380	16
	50	340	450	12

*La Norma no obliga a reportar propiedades mecánicas típicas para la designación de productos planos de calidad comercial CS, si se requiere especificarlas deben solicitarse en la orden de pedido y tendrá un costo adicional. Los valores en las tablas son solo de referencia.

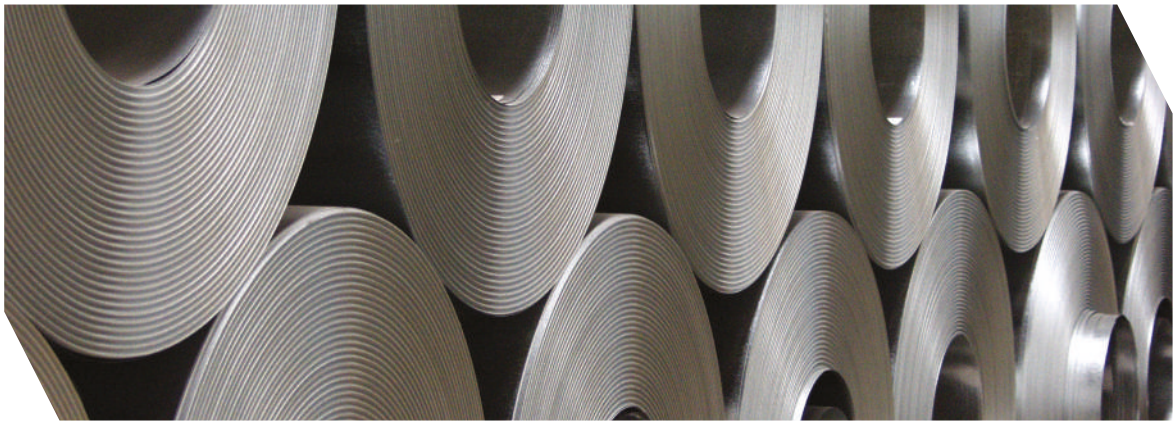

Especificación Técnica capa de Recubrimiento


Norma: NTC 4011 - ASTM A653M - Método de Triple Punto

Designación	Recubrimiento Mínimo [g/m²]
Z90 [G30]	90
Z120 [G40]	120
Z180 [G60]	180
Z275 [G90]	275




Rollos Acero Galvanizado

Espesor [mm]	Ancho Bobinas [mm]
2.50 y 3.00	1220
1.40 a 2.00	1000, 1220
0.35 a 1.20	914, 1000, 1220
0.30	914, 1000



Láminas Acero Galvanizado

Espesor [mm]	Ancho [mm]	Longitud [mm]
2.50 y 3.00	1220	2440
1.40 a 2.00	1000, 1220	2000, 2440
0.35 a 1.20	914, 1000, 1220	2000, 2440
0.30	914, 1000	2000

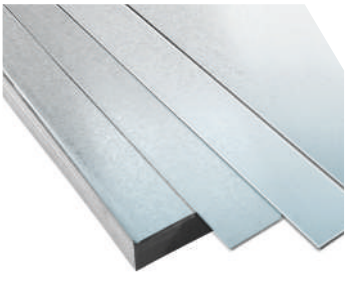

Nota:

- Para pedidos especiales se pueden producir longitudes mínimas de corte 1500mm.

Normatividad

Calidad Comercial y Estructural

Normas de Fabricación: NTC 4011, ASTM A653
Normas Dimensionales: NTC 3940, ASTM A924
Acabado: La superficie presentará aspecto homogéneo, Flor regular. Con o sin skin-pass. Superficie no aceitada
Recubrimientos: Z90 [G30], Z120 [G40], Z180 [G60], Z275 [G90]

Ficha Técnica Acero METALUM

Descripción

La lámina de acero METALUM por inmersión en caliente, es un producto que combina las características de resistencia mecánica del acero y la resistencia a la corrosión generada por una mezcla poderosa de Aluminio (55%) + Zinc (43.5%)+ Silicio (1.5%). Producido en espesores 0.17mm, 0.20mm, 0.23mm, 0.36mm y 0.45mm. Se utiliza como materia prima en la industria de refrigeración, construcción, automotriz y metalmecánica en general.

Propiedades Mecánicas

Calidad del Acero	Fluencia YP Mínima (MPa)	Resistencia Máxima-Mínima (MPa)	Elongación Mínima (%)
Calidad Estructural SS Grado 80 Clase 1	550	570	----**

**La Norma no obliga a reportar propiedades mecánicas típicas para la designación de productos, si se requiere especificarlas deben solicitarse en la orden de pedido y tendrá un costo adicional. Los valores en las tablas son solo de referencia.

Rollos Acero Metalum

Espesor (mm)	Ancho Bobinas (mm)
0.17 a 0.45	914 - 1000 - 1220



Normatividad

Calidad Full Hard (Calidad dura), Estructural Grado 80

Normas de Fabricación: NTC 4015, ASTM A792
Normas de Dimensionales: NTC 3940, ASTM A924
Acabado: La superficie presentará aspecto homogéneo, Flor regular. Con o sin skin-pass. Superficie no aceitada, Protección Anti huellas.
Recubrimientos: AZ70, AZM100, AZM120, AZM150



Ficha Técnica Acero Pintado

Descripción

La lámina de acero pintada producida bajo especificaciones de la norma ASTM A755, es un producto versátil con ventajas técnicas y económicas, el cual combina las propiedades del acero galvanizado con la protección de un recubrimiento orgánico adicional, de ahí su alta participación en el desarrollo de la industria.

El acero pintado está presente en todos los sectores industriales como en el sector mobiliario metálico, elementos para calefacción, ventilación, aire acondicionado. En el sector construcción para la fabricación de cubierta y fachadas.

Propiedades Mecánicas

Calidad	Fluencia (MPa)	Resistencia (MPa)	Elongación Mínima (%)
Comercial CS*	205/380	----	≥ 20
SS Grado 40	275	380	16

Nota:

*La Norma no obliga a reportar propiedades mecánicas típicas para la designación de productos planos de calidad comercial CS, si se requiere especificarlas deben solicitarse en la orden de pedido y tendrá un costo adicional. Los valores en las tablas son solo de referencia.

Especificación Técnica capa de Recubrimiento

ZINC	Recubrimiento Pintura (Poliéster y Superpoliéster)		
	Cara	Primer	Acabado
180 g/m²	Superior	5 - 7 micras	18 - 20 micras
	Inferior	5 - 7 micras	8 - 10 micras

Propiedades Recubrimiento Orgánico

Propiedad	Magnitud de Referencia	Norma
Dureza Lápiz	F - 2H	ASTM D3363
Adherencia	5B	ASTM D3359
Resistencia a solventes (MEC)	> 100	ASTM D5402
Impacto Indirecto (kg-cm)	Mínimo 60	ASTM D2794
Doblado - T	Máximo	ASTM D4145
Brillo	20 - 60	ASTM D523
Variación de Color	Máximo 1.5	ASTM D2244

Rollos Acero Pintado

Espesor Acero (mm)	Ancho Bobinas (mm)
0.35 a 0.80	914, 1000, 1220

Nota:
*El espesor del acero pre pintado , según Norma ASTM A755, se refiere al espesor del acero galvanizado. Los espesores de la pintura son adicionales.



Etapas Convencionales del Proceso de Pintado

- **Sustrato (Acero Galvanizado):** El Acero Pintado se fabrica a partir del Acero Galvanizado por inmersión en caliente (Sustrato) bajo norma ASTM A653, al cual se le aplica un sistema de recubrimiento orgánico.
- **Pre tratado:** El sustrato es sometido a un tratamiento químico aplicado antes del primer que mejora la adhesión, inhibe la corrosión y aumenta la durabilidad de los acabados de pintura.
- **Primer:** El recubrimiento de primer asegura la adherencia y la elasticidad entre el sustrato tratado y la capa de pintura del acabado, también brinda resistencia a la corrosión.
- **Pintado (Capa Superior e Inferior):** La Capa de Pintura aporta las características superficiales requeridas, tales como el acabado (color, textura, brillo, aspecto, etc.), la dureza, la resistencia a la abrasión y a la radiación ultravioleta bajo norma ASTM A755.

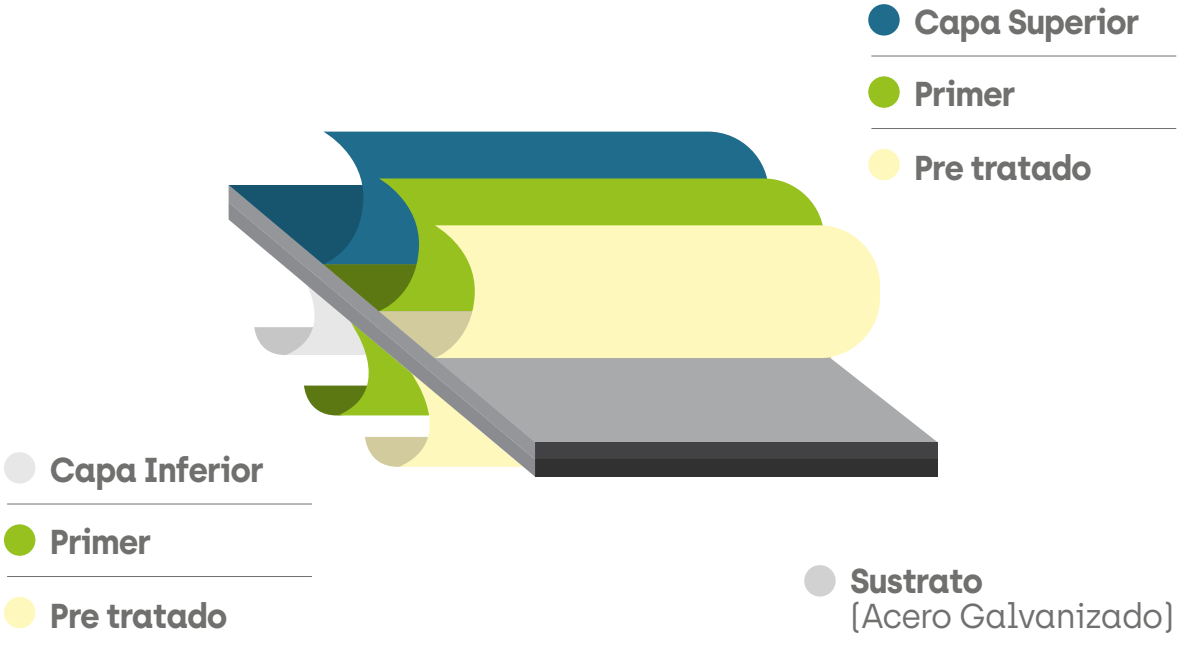


Tabla de Colores

Colores Estándar:

BLANCO
RAL 9016
SRI: 85
SR: 0.72

BLANCO
RAL 9002
SRI: 75
SR: 0.65

GRIS GLACIAL
SRI: 50
SR: ---

GRIS TRÁFICO
RAL 7043
SRI: ---
SR: ---

NEGRO
SRI: -1.0
SR: 0.04

AZUL
RAL 5005
SRI: 25
SR: 0.30

VERDE
RAL 6005
SRI: 3
SR:0.08

ROJO GRANATE
SRI: 34
SR: 0.26

ROJO ESCARLATA
SRI: 36
SR: 0.39

CAFÉ CAPUCCINO
SRI: 40
SR: 0.4

AZUL ALTO BRILLO
INDUSTRIA REFRIGERACIÓN

BLANCO ALTO BRILLO
INDUSTRIA REFRIGERACIÓN

GRIS
RAL 7035
Cara Inferior (Backer)

Colores Bajo Pedido:

COBRE
SRI: 38
SR: 0.36

GRIS OCASO
SRI: 18
SR: ---

AZUL BERMUDA
SRI: 15
SR: ---

VERDE ORGÁNICO
SRI: 44
SR: ---

SRI: Índice de Reflectancia Solar (Solar Reflectance Index) es una medida de la capacidad que un techo posee para rechazar el calor solar. Con un SRI alto se disminuye el calentamiento del material.
SR: Reflectancia Solar (Solar Reflectance) es la proporción de la radiación solar reflejada especialmente en fachadas.

Nota:
- Los colores, renders e imágenes presentados en esta ficha y en piezas publicitarias son de carácter ilustrativo y pueden presentar modificaciones frente al producto físico. Solicite la muestra física del producto a su asesor.
- Es posible desarrollar cualquier color, bajo ciertas condiciones de volumen mínimo y tiempo de entrega.
- Disponibilidad de colores bajo código RAL Internacional, con previa solicitud.

Tecnología de Pintura de Acuerdo al Tipo de Ambiente (ISO 12944-2)

Categorías de Corrosividad Atmosférica ISO 12944-2		Tecnología de Pinturas			
Agresividad	**Descripción**	**Protec Estándar**	**Protec Super**	**Protec Master**	**Protec Master Duo**
C1: Muy bajo	Interiores	✓	✓	✓	✓
C2: Bajo	Atmósferas con bajo nivel de polución,principalmente áreas rurales	!	✓	✓	✓
C3: Medio	Atmósferas Urbanas e Industriales, polución moderada. Áreas costeras de baja salinidad.	✗	✓	✓	✓
C4: Alto	Áreas industriales y costeras con moderada salinidad	✗	!	✓	✓
C5-I: Muy alta industrial	Áreas industriales con alta humedad y atmósfera agresiva	✗	✗	✓	✓
C5-M: Muy alta marina	Áreas costeras con alta salinidad	✗	✗	✓	✓

✓ Recomendado ✗ No Recomendado ! Con Restricciones

Nota:
- Para ambientes C1 a C3: se recomienda Recubrimientos de Galvanizado Z180 y Metalum AZM120.
- Para ambientes C4 a C5-M: se recomienda Recubrimientos de Galvanizado Z275 y Metalum AZM150.
- Consultar términos y condiciones en PO807 - Política de garantía:
https://www.acesco.com.co/descargas/politica-garantias-acesco.pdf

Tecnología de Pintura

Nuestros proveedores de pinturas son reconocidos a nivel mundial y certificados con altos estándares de calidad; nos suministran los siguientes tipos de tecnología de pinturas para nuestros productos:

Protec Estándar (Poliéster):

Producto formulado para aplicaciones en ambientes interiores donde el alto desempeño y costo competitivo son factores diferenciales.

- **Color (Poliéster)** (18 a 20 Micras)
- **Primer** (5 a 7 Micras)
- **Sustrato** Galvanizado Z 180 (180g/m²) METALUM AZM120 (120g/m²)



- **Backer (Poliéster)** (8 a 10 Micras)
- **Primer** (5 a 7 Micras)

Protec Super (Superpoliéster):

Poliéster de ingeniería Súper durable. Productos formulados para aplicaciones interiores y exteriores donde el alto desempeño y costo competitivo son factores diferenciales.

- **Color (Superpoliéster)** (18 a 20 Micras)
- **Primer** (5 a 7 Micras)
- **Sustrato** Galvanizado Z 180 (180g/m²) METALUM AZM120 (120g/m²)



- **Backer (Superpoliéster)** (8 a 10 Micras)
- **Primer** (5 a 7 Micras)

Protec Master (PVDF Poli Vinilo de Fluoruro + CLEAR):

Sistema de tres capas que consiste en una imprimación inhibidora de la corrosión, una capa final de fluoropolímero y una capa final de Barniz.



Protec Master Duo (PVDF Poli Vinilo de Fluoruro + CLEAR):

Sistema de tres capas que consiste en una imprimación inhibidora de la corrosión, una capa final de fluoropolímero y una capa final de Barniz. Esto aplica para la cara superior (Top) y la cara inferior (Backer).



Nota:

- Después de pintado el material, se recomienda formar en un período no mayor a 6 meses.
- El material con foil, se recomienda retirar después de formado el producto.
- El material con foil, no puede ser almacenado en lugares con temperaturas superiores a 38°C.
- El material pintado no puede exponerse a temperaturas superiores a 70°C.
- Aunque se intente reproducir el mismo aspecto estético en cada bobina, Acesco no puede garantizar la consistencia visual de un lote a otro. En consecuencia, se debe considerar realizar un solo pedido para un mismo proyecto o edificación.


Sostenibilidad

Acesco en su interés de ofrecerle al mercado productos sostenibles ha revisado su **Ciclo de Vida (CVP)** para identificar, cuantificar y evaluar los impactos que tienen nuestros productos en el medio ambiente durante todas las etapas de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el fin de su vida útil.

Como resultado se cuenta con **Autodeclaración Ambiental de Producto (DAP)** para Rollos y Láminas de Acero Galvanizado y Rollos de Acero Pintados. Estas autodeclaraciones aportan beneficios en la obtención de certificaciones de edificaciones sostenibles como Leed.

El material de empaque utilizado en cada uno de los productos es reciclable y puede ser enviado a aprovechamiento a través de gestores debidamente autorizados.

Toda la información anterior puede ser consultada en nuestra página web.

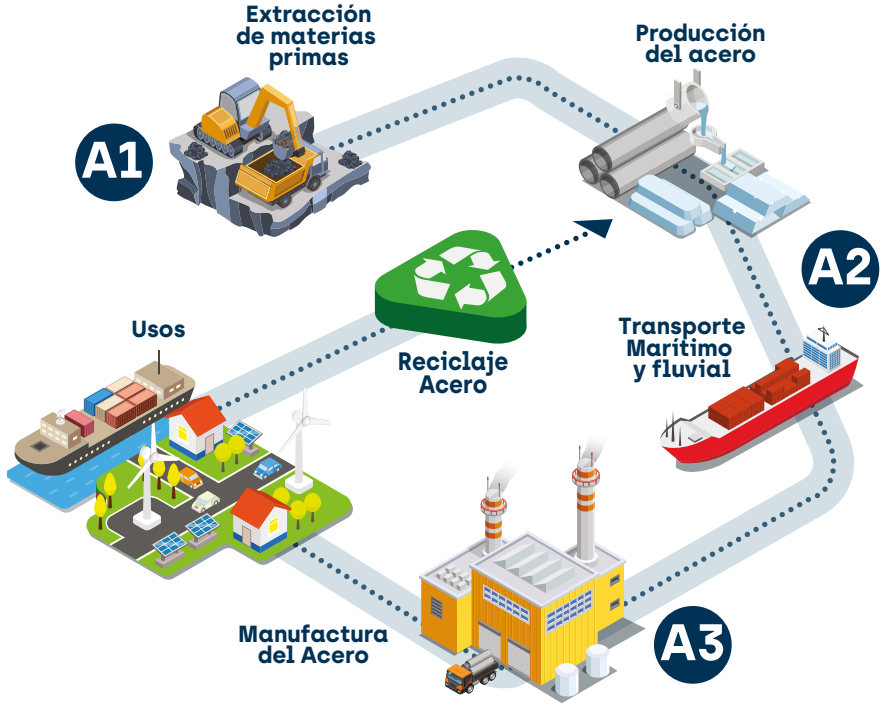


Certificaciones

NTC 4011: 2021 Lámina de acero galvanizada

SC 553-1

SA-CER285096


Almacenamiento, Manipulación y Transporte

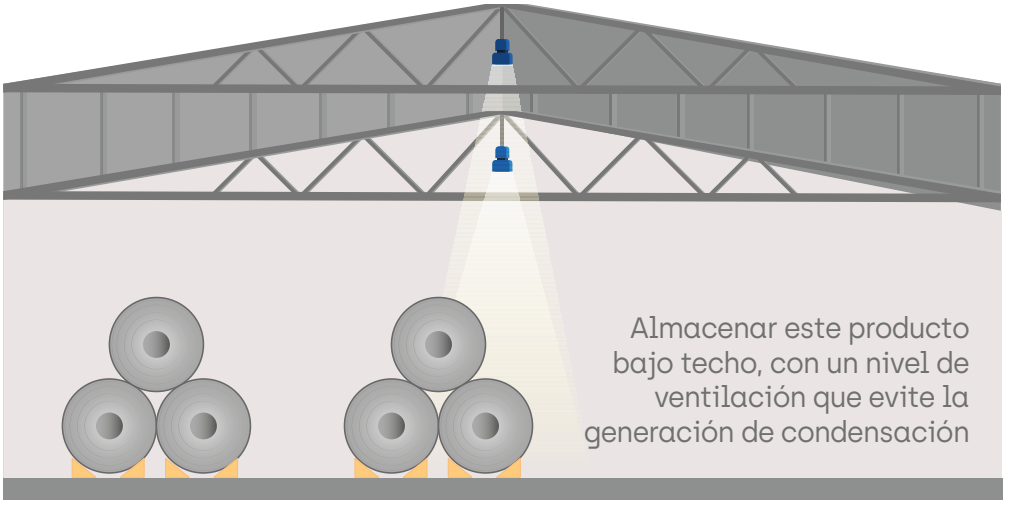


Almacenar este producto bajo techo, con un nivel de ventilación que evite la generación de condensación



Utilizar los elementos adecuados en el cargue y descargue de los productos.

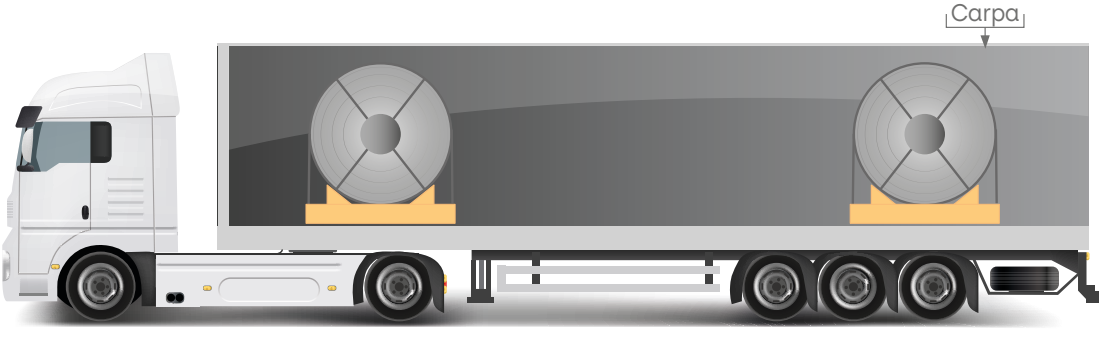

Cuando se transporten rollos en camión, se debe utilizar estibas de madera y proteger las superficies con protectores plásticos, los rollos deben estar debidamente soportados para evitar deslizamiento de cargas.

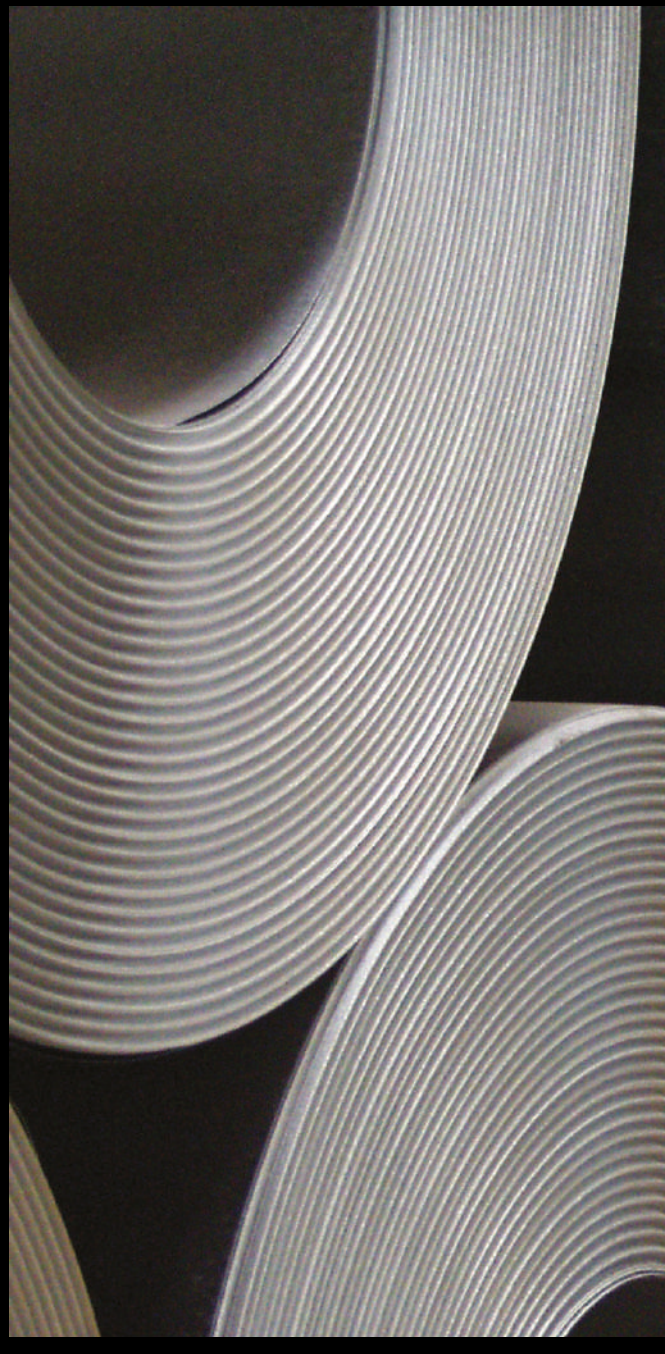

ACESCO


Última actualización: No. 11 - Agosto 2023
Acesco se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente pieza técnica. Dichas modificaciones se publicarán en la página web de Acesco.

PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO PIMSA
MALAMBO, ATLÁNTICO • COLOMBIA
Servicio al cliente: 6053718100 • 01 8000 514 514
Email: servicioalcliente@acesco.com
Síguenos en:
www.acesco.com.co

3. REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL

itm®	REGISTRO CONTROL DIMENSIONAL	F-OPEP-12 Versión No. V1 Vigencia: 31 de julio de 2024

Proyecto:	TUBERÍA CORRUGADA PARA BOX COULVERT					OP:	3403
Cantidad:	4	Revisión:	R0	Elemento:	LAMINA No1	Plano No:	250505_LAM_L1_2,5_V1
Cliente:	CONSTRUCTORA PAÍS					Proceso:	PUNZONADO

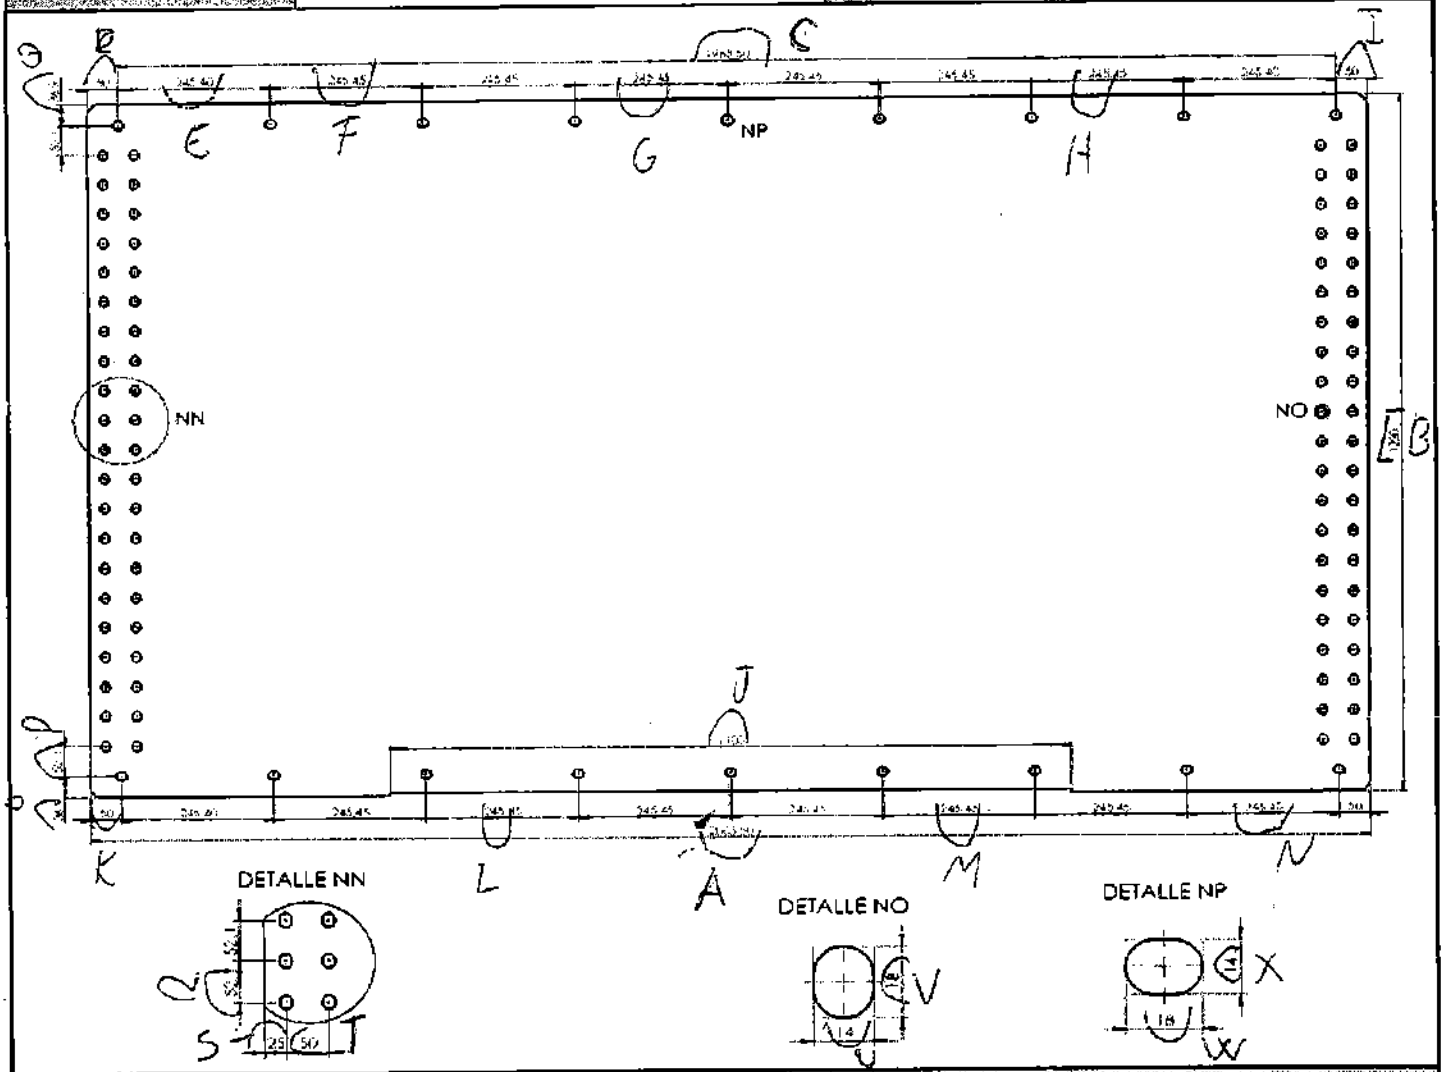

TRAZABILIDAD DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	ESPESOR	CALIDAD	LOTE	CANTIDAD	MTR
LAMINA GALVANIZADA CAL. 3 mm	3,0 mm	GRADO 50	0041406310	4	

CONFORMIDAD DEL MATERIAL

LIMPIEZA DE MATERIAL	✓	CAMBER	✓	SWEEP	X	PERPENDICULAIDAD	✓	PARALELISMO	✓


Dimensión		Dimensión		Dimensión		Dimensión	
Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
A 2063.50	2063	G 245.40	245	M 245.45	245	S 25	25
B 1220	1224	H 245.40	245	N 245.45	245	T 50	50
C 1963.50	1963	I 50	50	O 36.9	37	U 14	14
D 50	50	J 1900	1900	P 52.1	52	V 18	18
E 245.40	245	K 50	50	Q 36.9	37	W 18	18
F 245.40	245	L 245.45	245	R 52.1	52	X 14	14

OBSERVACIONES:

FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025
NOMBRE: JOSE A HERRERA	NOMBRE: JUAN ESPITIA	NOMBRE:
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO CONTROL DIMENSIONAL	F-OPEP-12 Versión No. V1 Vigencia: 31 de julio de 2024

Proyecto	TUBERÍA CORRUGADA PARA BOX COULVERT					OP	3403
Cantidad	4	Revisión	R0	Elemento	LAMINA No2	Plano No.	250505_LAM_L2_2,5_V1
Cliente	CONSTRUCTORA PAÍS					Proceso	PUNZONADO

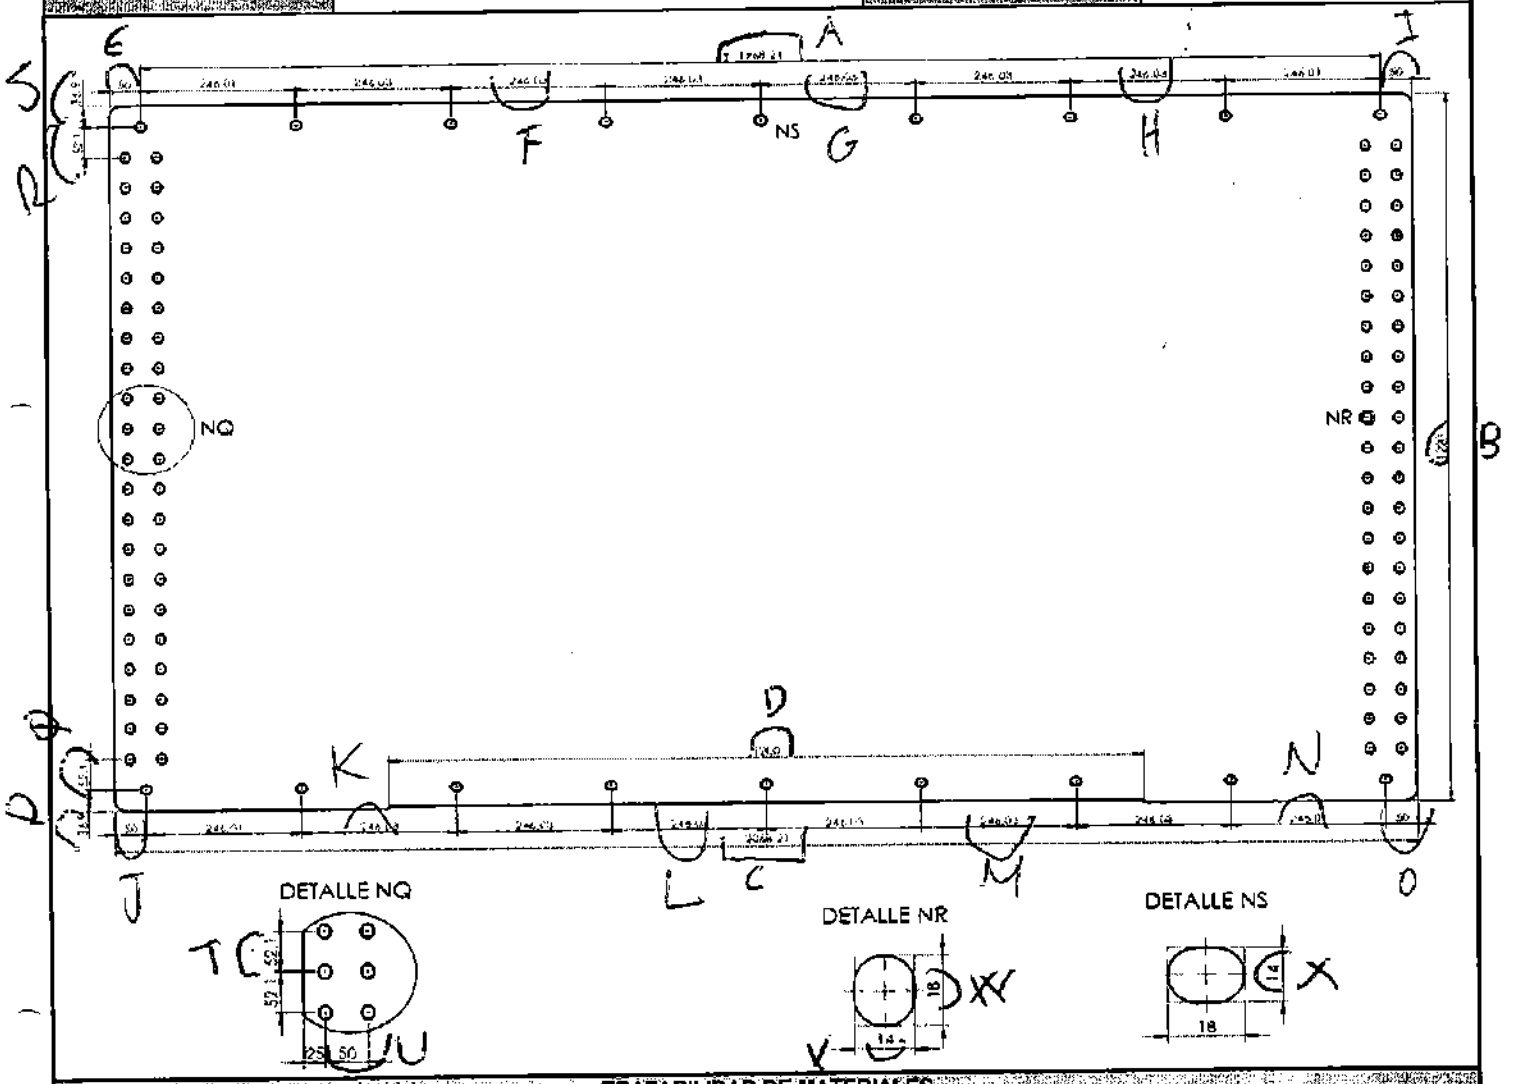

TRAZABILIDAD DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	ESPESOR	CALIDAD	LOTE	CANTIDAD	MTR
LAMINA GALVANIZADA CAL. 3 mm	3,0 mm	GRADO 50	0011406310	4	

CONFORMIDAD DEL MATERIAL

LIMPIEZA DE MATERIAL	✓	CAMBER	✓	SWEEP	X	PERPENDICULAIDAD	✓	PARALELISMO	✓


Dimensión		Dimensión		Dimensión		Dimensión	
Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
A 1968.21	1968	G 246.03	246	M 246.03	246	S 36.9	37
B 1220	1223	H 246.03	246	N 246.03	246	T 52.7	52.1
C 2068.21	2068	I 50	50	O 50	50	U 50	50
D 1200	1200	J 50	50	P 36.9	37	V 14	14
E 50	50	K 246.03	246	Q 52.1	52	W ~~18~~	18
F 246.03	246	L 246.03	246	R 52.1	52	X 14	14

OBSERVACIONES:

FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025
NOMBRE: JOSE A HERRERA	NOMBRE: Juan Espitia	NOMBRE:
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO CONTROL DIMENSIONAL	F-OPEP-12 Versión No. V1 Vigencia: 31 de julio de 2024

Proyecto:	TUBERÍA CORRUGADA PARA BOX COULVERT					OP:	3403
Cantidad:	4	Revisión	R0	Elemento	LAMINA No3	Plano No:	250505_LAM_L3_2,5_V1
Cliente:	CONSTRUCTORA PAÍS			Proceso:			PUNZONADO

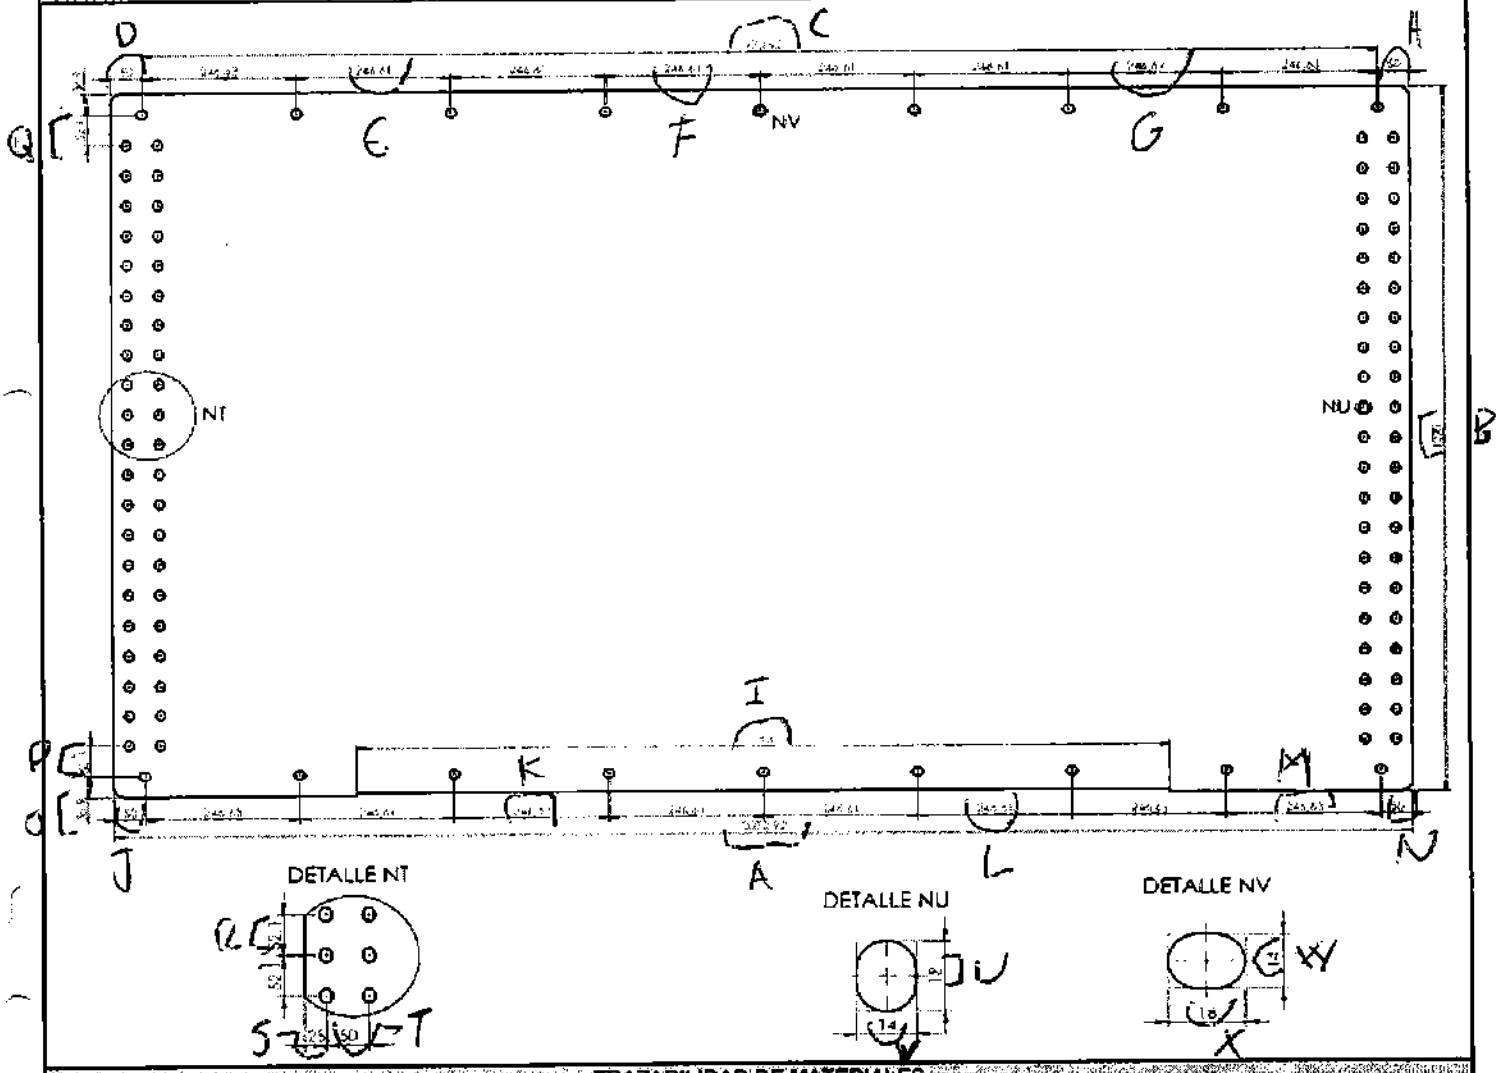

TRAZABILIDAD DE MATERIALES

DESCRIPCION DE MATERIAL	ESPESOR	CALIDAD	LOTE	CANTIDAD	MTR
LAMINA GALVANIZADA CAL. 3 mm	3,0 mm	GRADO 50	0014063S0	4	

CONFORMIDAD DEL MATERIAL

LIMPIEZA DE MATERIAL	✓	CAMBER	✓	SWEEP	X	PERPENDICULAIDAD	✓	PARALELISMO	✓


Dimensión				Dimensión				Dimensión			
	Nominal	Real		Nominal	Real		Nominal	Real		Nominal	Real
A	2072.92	2073	G	246.7	246	M	246.63	246	S	25	25
B	1220	1223	H	50	50	N	50	50	T	50	50
C	1972.92	1973	I	1300	1300	O	36.9	37	U	18	18
D	50	50	J	50	50	P	52.1	52	V	14	14
E	246.67	246	K	246.67	246	Q	52.1	52	W	14	14
F	246.67	246	L	246.67	246	R	52.1	52	X	18	18

OBSERVACIONES:

FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025
NOMBRE: JOSE A HERRERA	NOMBRE: JUAN ESPITIA	NOMBRE:
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO CONTROL DIMENSIONAL	F-OPEP-12 Versión No. V1 Vigencia: 31 de julio de 2024

Proyecto	TUBERÍA CORRUGADA PARA BOX COULVERT					OP	3403
Cantidad:	4	Revisión	R0	Elemento	LAMINA No4	Plano No:	250505_LAM_L4_2.5_V1
Cliente:	CONSTRUCTORA PAÍS					Proceso:	PUNZONADO

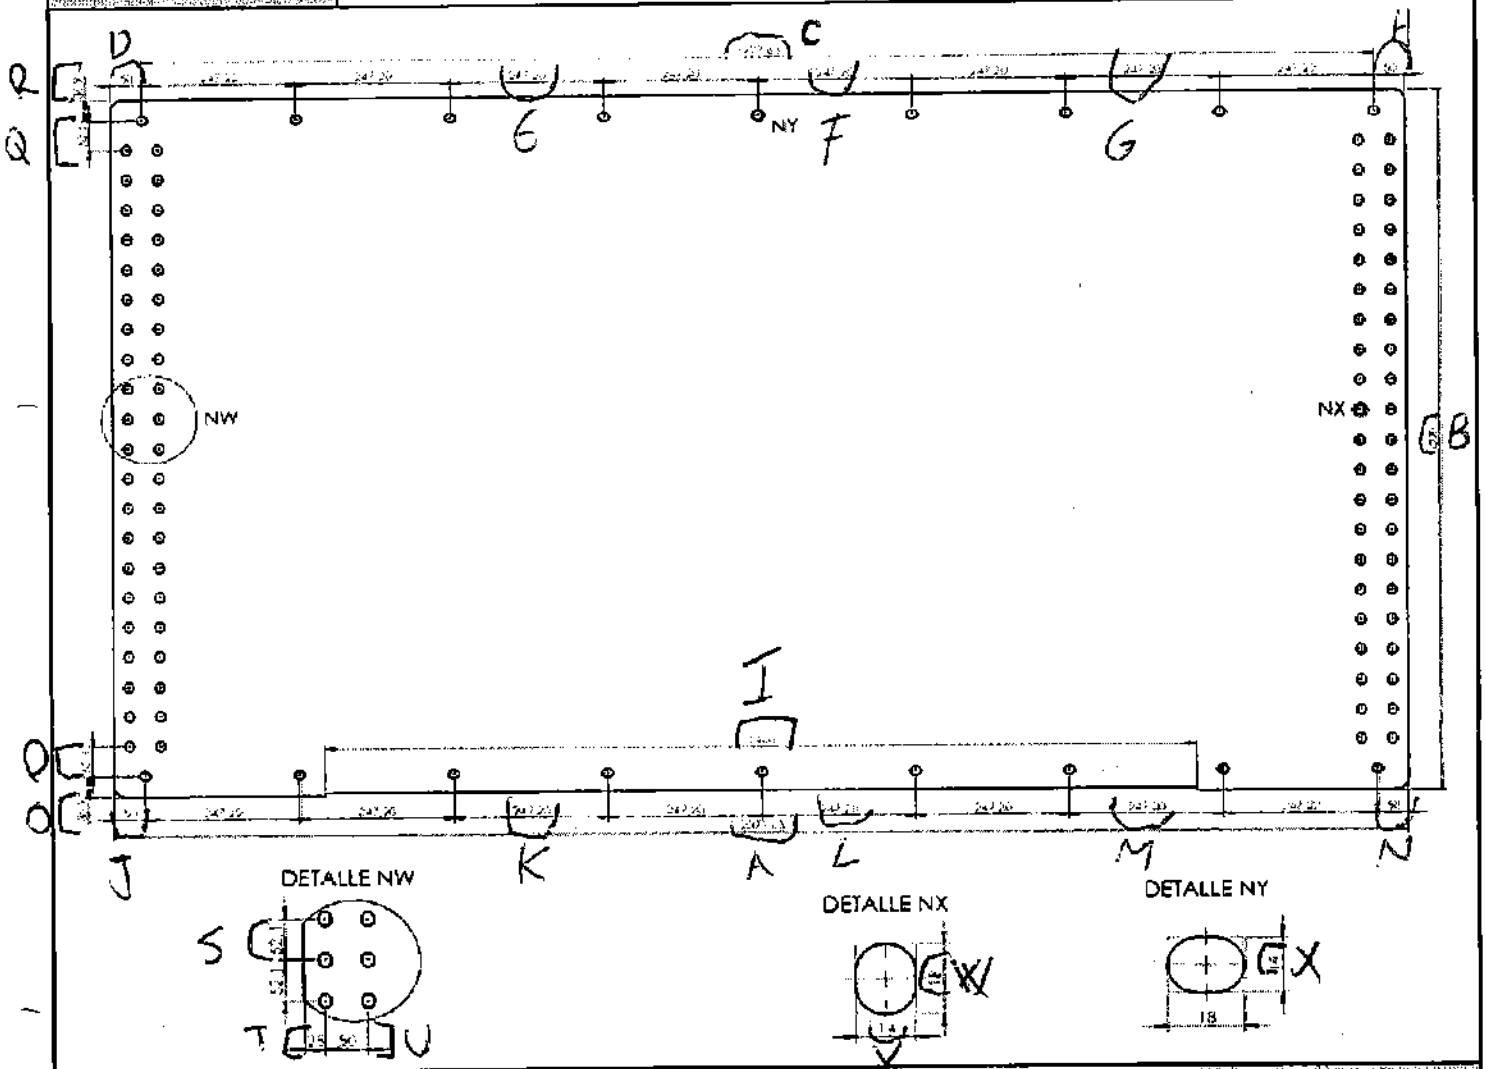

TRAZABILIDAD DE MATERIALES

DESCRIPCION DE MATERIAL	ESPESOR	CALIDAD	LOTE	CANTIDAD	MTR
LAMINA GALVANIZADA CAL. 3 mm	3.0 mm	GRADO 50	0011406310	4	

CONFORMIDAD DEL MATERIAL

LIMPIEZA DE MATERIAL	✓	CAMBER	✓	SWEEP	X	PERPENDICULAIDAD	✓	PARALELISMO	✓


Dimensión		Dimensión		Dimensión		Dimensión	
Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
A 2077.63	2077	G 247.2	247	M 247.2	247	S 52.1	52
B 1220	1223	H 50	50	N 50	50	T 25	25
C 1977.63	1977	I 1400	1400	O 36.9	37	U 50	50
D 50	50	J 50	50	P 52.1	52	V 14	14
E 247.2	247	K 247.2	247	Q 52.1	52	W 18	18
F 247.2	247	L 247.2	247	R 36.9	37	X 14	14

OBSERVACIONES:

FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025
NOMBRE: JOSE A HERRERA	NOMBRE: IVAN GOPIAN	NOMBRE:
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCION

itm®	REGISTRO CONTROL DIMENSIONAL	F-OPEP-12 Versión No. V1 Vigencia: 31 de Julio de 2024

Proyecto:	TUBERÍA CORRUGADA PARA BOX COULVERT					OP:	3403
Cantidad:	4	Revisión:	R0	Elemento:	LAMINA No5	Plano No:	250505_LAM_L5_2,5_V1
Cliente:	CONSTRUCTORA PAÍS					Proceso:	PUNZONADO

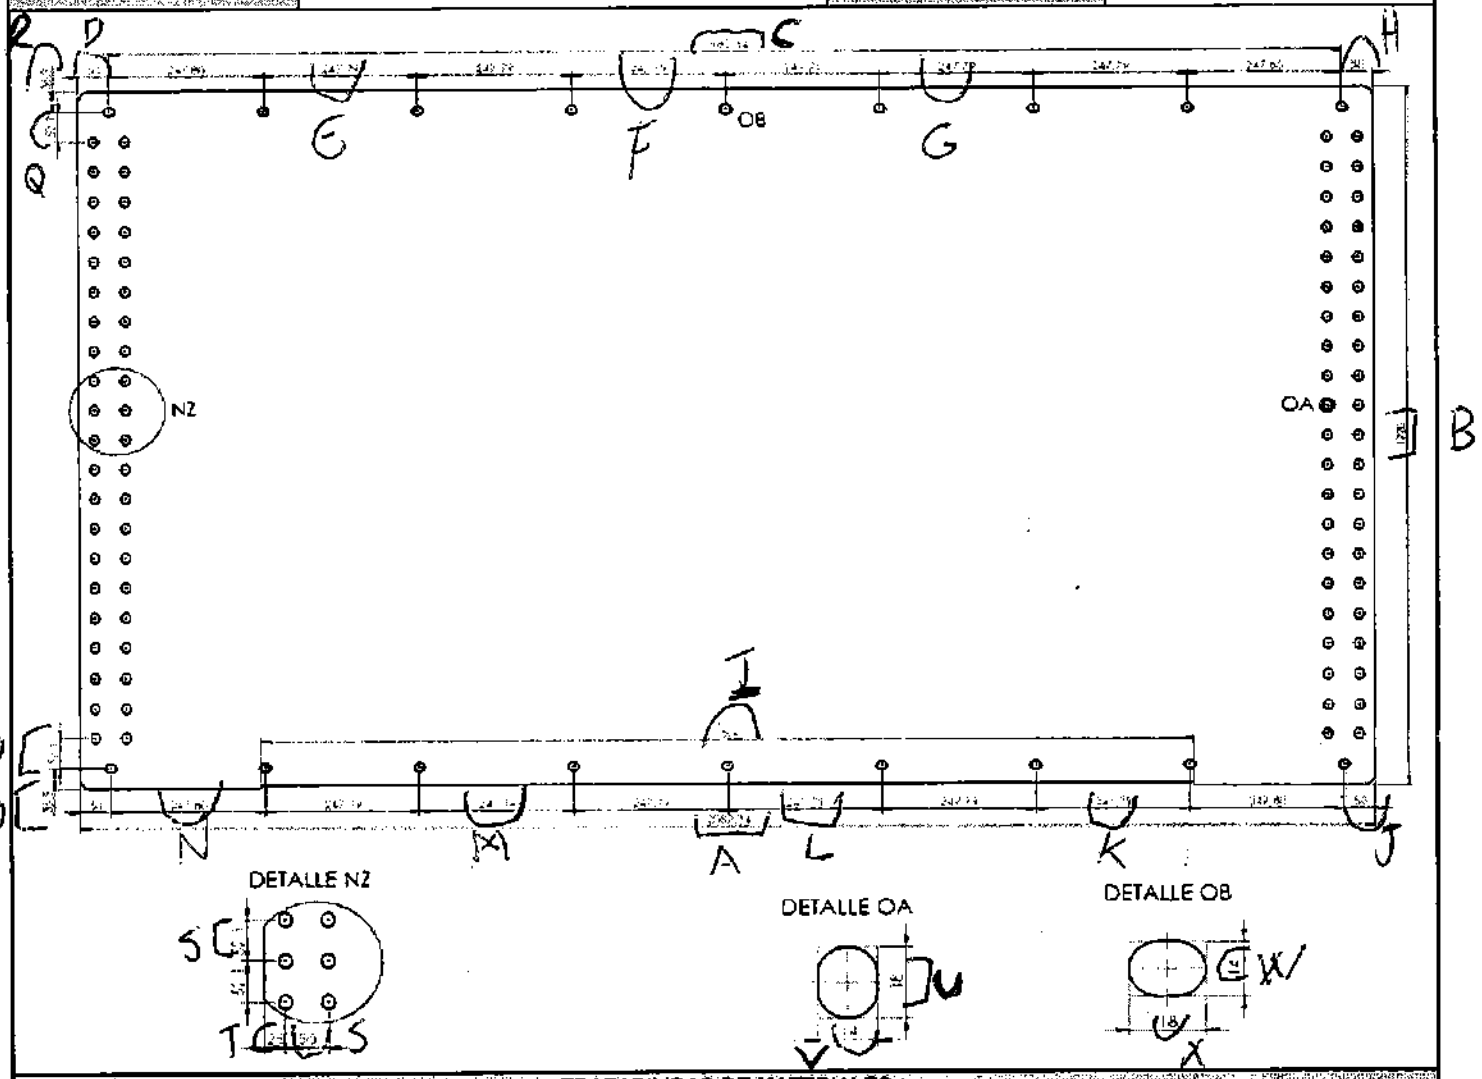

TRAZABILIDAD DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	ESPESOR	CALIDAD	LOTE	CANTIDAD	MTR
LAMINA GALVANIZADA CAL. 3 mm	3,0 mm	GRADO 50	0011406310	4	

CONFORMIDAD DEL MATERIAL

LIMPIEZA DE MATERIAL	✓	CAMBER	✓	SWEEP	X	PERPENDICULAIDAD	✓	PARALELISMO	✓


Dimensión		Dimensión		Dimensión		Dimensión	
Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
A 2032.34	2082	G 247.79	248	M 247.79	248	S 52.9	52
B 1220	1223	H 50	50	N 247.80	248	T 25	25
C 1982.34	1982	I 1500	1500	O 36.9	37	U 50	50
D 50	50	J 50	50	P 52.1	52	V 14	14
E 247.79	248	K 247.79	248	Q 52.1	52	W 18	18
F 247.79	248	L 247.79	248	R 36.9	37	X 14	14

OBSERVACIONES:

FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025
NOMBRE: JOSE A VILLEGAS	NOMBRE: Iván Bolaños	NOMBRE:
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO CONTROL DIMENSIONAL	F-OPEP-12 Versión No. V1 Vigencia: 31 de Julio de 2024

Proyecto:	TUBERÍA CORRUGADA PARA BOX COULVERT					OP:	3403
Cantidad:	4	Revisión:	R0	Elemento:	LAMINA No6	Plano No:	250505_LAM_L6_2,5_V1
Cliente:	CONSTRUCTORA PAÍS			Proceso:	PUNZONADO		

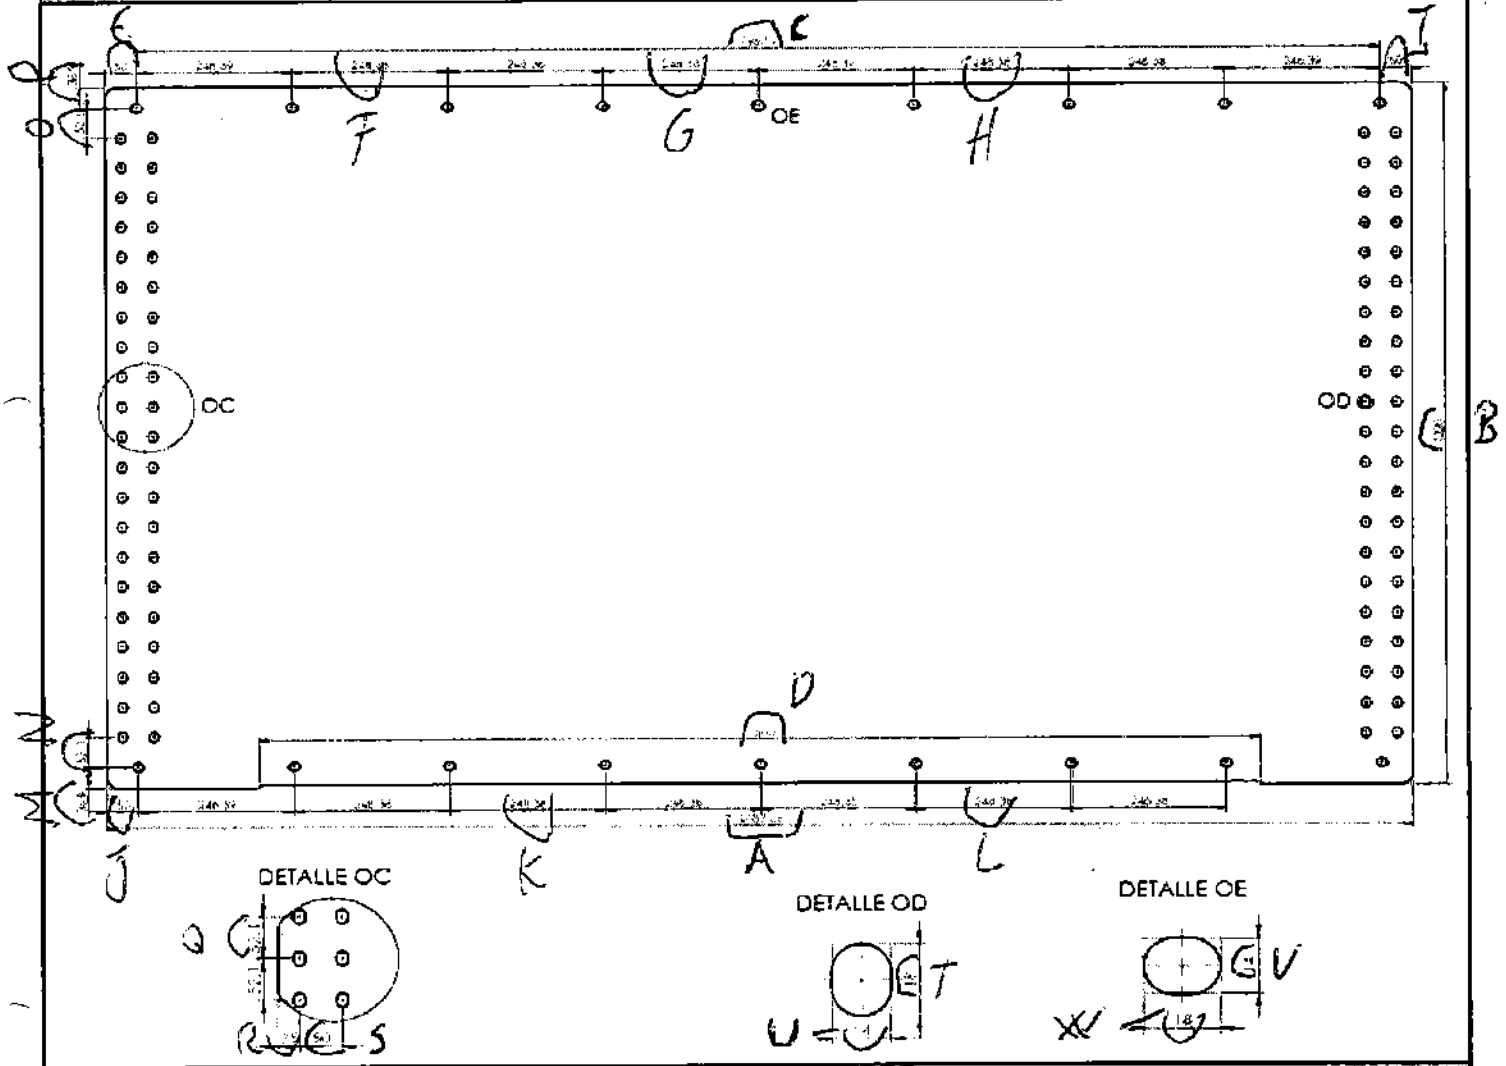

TRAZABILIDAD DE MATERIALES

DESCRIPCION DE MATERIAL	ESPESOR	CALIDAD	LOTE	CANTIDAD	MTR
LAMINA GALVANIZADA CAL. 3 mm	3,0 mm	GRADO 50	0011406310	4	

CONFORMIDAD DEL MATERIAL

LIMPIEZA DE MATERIAL	✓	CAMBER	✓	SWEEP	X	PERPENDICULAIDAD	✓	PARALELISMO	✓


Dimensión		Dimensión		Dimensión		Dimensión	
Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
A 2084.34	2037	G 248.38	248	M 36.9	37	S 50	50
B 1220	1223	H 248.32	248	N 52.1	52	T 18	18
C 1987.1	1987	I 50	50	O 52.1	52	U 74	74
D 1600	1600	J 50	50	P 36.9	37	V 74	74
E 60	50	K 248.38	248	Q 52.1	52	W 18	18
F 248.38	248	L 248.38	248	R 25	25	X	

OBSERVACIONES:


FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025
NOMBRE: JOSE F HERRERA	NOMBRE: Juan GOMEZ	NOMBRE: Jorge Ballesteros
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCION

itm®	REGISTRO CONTROL DIMENSIONAL	F-OPEP-12 Versión No. V1 Vigencia: 31 de julio de 2024


Proyecto	TUBERÍA CORRUGADA PARA BOX COULVERT					OP	3403
Cantidad:	4	Revisión	R0	Elemento	LAMINA No7	Plano No:	250505_LAM_L7_2,5_V1
Cliente:	CONSTRUCTORA PAÍS					Proceso:	PUNZONADO

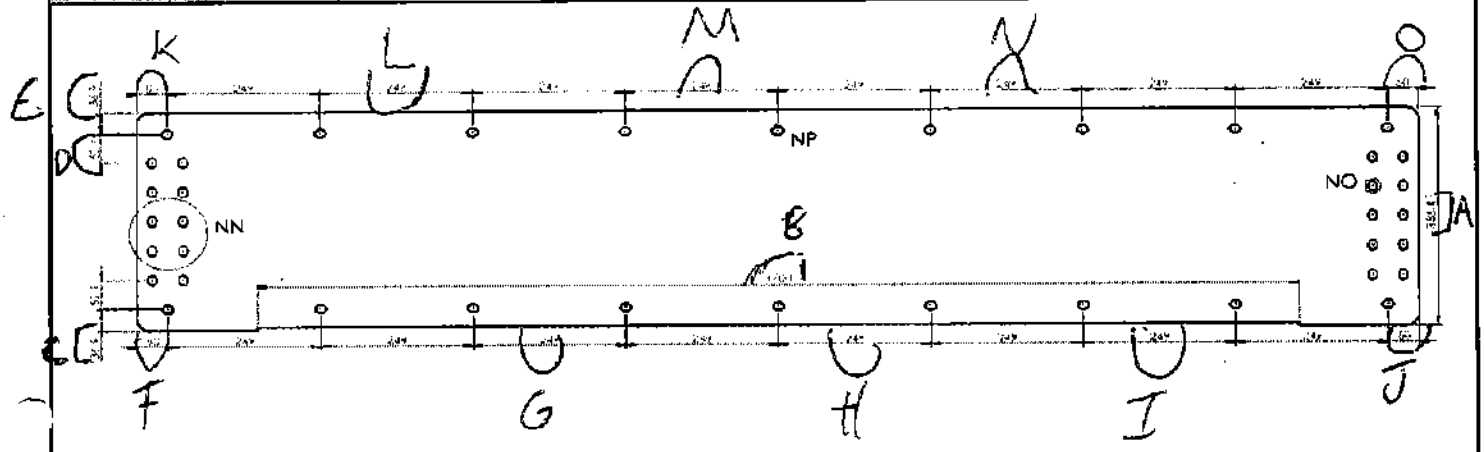


DETALLE NN



DETALLE NO



DETALLE NP



TRAZABILIDAD DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	ESPESOR	CALIDAD	LOTE	CANTIDAD	MTR
LAMINA GALVANIZADA CAL. 3 mm	3,0 mm	GRADO 50	0011406310	4	

CONFORMIDAD DEL MATERIAL

LIMPIEZA DE MATERIAL	✓	CAMBER	✓	SWEEP	X	PERPENDICULAIDAD	✓	PARALELISMO	✓

Dimensión		Dimensión		Dimensión		Dimensión	
Nominal	Real	Nominal	Real	Nomina	Real	Nominal	Real
A 386.4	386	G 249	249	M 249	249	S 18	14
B 1700	1700	H 249	249	N 249	249	T 14	14
C 36.9	37	I 249	249	O 50	50	U 14	14
D 52.7	52	J 50	50	P 52.7	52	V 18	18
E 36.9	37	K 50	50	Q 25	25	W	
F 50	50	L 249	249	R 50	50	X	

OBSERVACIONES:

FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025	FECHA: 12/05/2025
NOMBRE: JOSE A HERRERA	NOMBRE: JUAN ESPITIA	NOMBRE:
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN


4. REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO

itm®	REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO	F-OPEP-08 Versión No. 1 Vigencia: 31 de julio de 2024

Proyecto:	TUBERIA CORRUGADA Ø 250					OP:	3403
Plano:	240827_LAM_LIR_V1	Revisión:	V1	Proceso:	ROLADO DE LAMINA	Cliente:	CONSTRUCTORA PAZ

POSICIÓN	ESPESOR	DESCRIPCION DE MATERIAL			NOMINAL 1	REAL 1	NOMINAL 2	REAL 2	C1	REAL	C2	Real
LAMINA	5.0 GTO	LAM. G	X	LAM. HR	1.837	1.837	1.837	1.837	1.180	1.180	1.180	1.180
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								

CUERDA 1.837

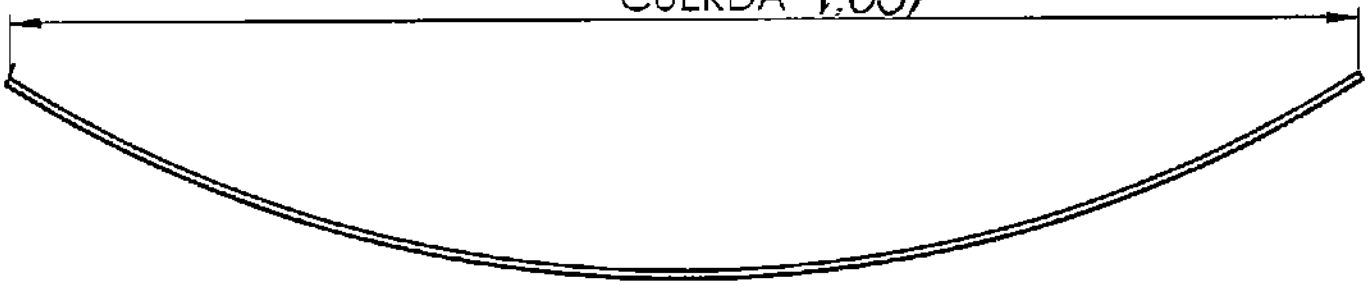

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1	3	2340	2230	1983
2	4	2340	2980	2176
3	5	2340	3720	2270
4	6	2340	4470	2320
5	7	2340	5210	2352
6	8	2340	5960	2373
7	9	2340	6700	2386
8	10	2340	7450	2396
9	11	2340	8190	2404
10	12	2340	8940	2410
11	13	2340	9680	2414
12	14	2340	1043	2418
13	15	2340	1117	2420
14	16	2340	1192	2423
15	17	2340	1266	2425
16	18	2340	1341	2427
17	19	2340	1415	2428
18	20	2340	1490	2429

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1	3	2290	2190	1942
2.1	4	2290	2920	2131
3.1	5	2290	3640	2222
4.1	6	2290	4370	2272
5.1	7	2290	5100	2303
6.1	8	2290	5830	2324
7.1	9	2290	6560	2337
8.1	10	2290	7290	2347
9.1	11	2290	8020	2368
10.1	12	2290	8750	2371
11.1	13	2290	9480	2373
12.1	14	2290	1021	2375
13.1	15	2290	1093	2376
14.1	16	2290	1166	2378
15.1	17	2290	1239	2379
16.1	18	2290	1312	2430
17.1	19	2290	1385	2431
18.1	20	2290	1458	2432

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1.1	3	2250	2190	1910
2.1.1	4	2250	2920	2095
3.1.1	5	2250	3640	2185
4.1.1	6	2250	4370	2235
5.1.1	7	2250	5100	2265
6.1.1	8	2250	5830	2285
7.1.1	9	2250	6560	2298
8.1.1	10	2250	7290	2308
9.1.1	11	2250	8020	2315
10.1.1	12	2250	8750	2321
11.1.1	13	2250	9480	2325
12.1.1	14	2250	1021	2329
13.1.1	15	2250	1093	2331
14.1.1	16	2250	1166	2333
15.1.1	17	2250	1239	2335
16.1.1	18	2250	1312	2337
17.1.1	19	2250	1385	2338
18.1.1	20	2250	1458	2339

El material rolado es inspeccionado contra la Tabla De Muestreo IIA (**Plan de muestreo singular para inspecciones normales**) descrito en la ANSI Z1.4 y la tabla (**Límite De Calidad De Aceptación**) descrita en la ANSI Z1.9.


OBSERVACIONES:

FECHA: 12-05-25	FECHA: 13/05/2025	FECHA: 14/05/2025
NOMBRE: Leonardo Prado	NOMBRE: Juan Espitia	NOMBRE: Jorge Contreras
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO	F-OPEP-08
		Versión No. 1
		Vigencia: 31 de Julio de 2024

Proyecto:	TUBERIA CORRUGADA - Ø2.50					OP:	3403
Plano:	240827_LAM_LIR_V1	Revisión:	V1	Proceso:	ROLADO DE LAMINA	Cliente:	CONSTRUCTORA PAIS

POSICIÓN	ESPESOR	DESCRIPCION DE MATERIAL		NOMINAL 1	REAL 1	NOMINAL 2	REAL 2	C1	REAL	C2	Real
2 ANILLO	3.0650	LAM. G X	LAM. HR	1.841	1.841	1.841	1.841	1.180	1.180	1.180	1.180
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								
		LAM. G	LAM. HR								

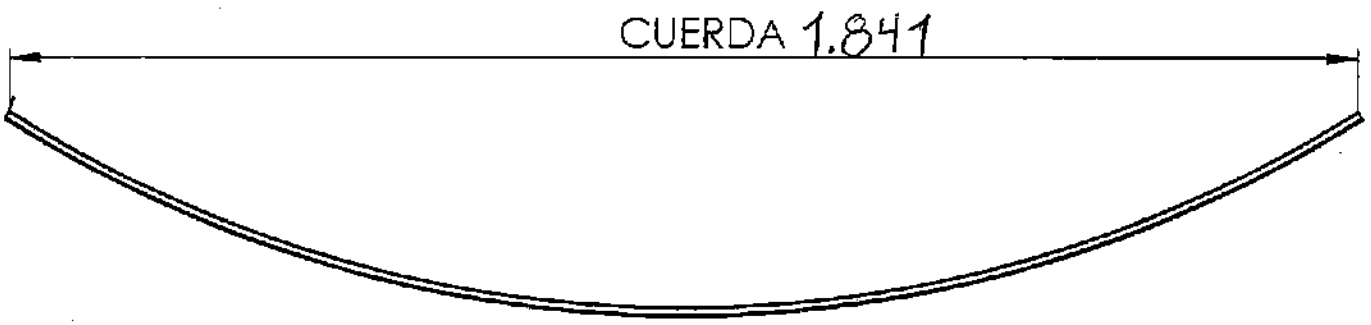

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1	3	2340	2230	1983
2	4	2340	2980	2176
3	5	2340	3720	2270
4	6	2340	4470	2320
5	7	2340	5210	2352
6	8	2340	5960	2373
7	9	2340	6700	2386
8	10	2340	7450	2396
9	11	2340	8190	2404
10	12	2340	8940	2410
11	13	2340	9680	2414
12	14	2340	1043	2418
13	15	2340	1117	2420
14	16	2340	1192	2423
15	17	2340	1266	2425
16	18	2340	1341	2427
17	19	2340	1415	2428
18	20	2340	1490	2429

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1	3	2290	2190	1942
2.1	4	2290	2920	2131
3.1	5	2290	3640	2222
4.1	6	2290	4370	2272
5.1	7	2290	5100	2303
6.1	8	2290	5830	2324
7.1	9	2290	6560	2337
8.1	10	2290	7290	2347
9.1	11	2290	8020	2368
10.1	12	2290	8750	2371
11.1	13	2290	9480	2373
12.1	14	2290	1021	2375
13.1	15	2290	1093	2376
14.1	16	2290	1166	2378
15.1	17	2290	1239	2379
16.1	18	2290	1312	2430
17.1	19	2290	1385	2431
18.1	20	2290	1458	2432

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1.1	3	2250	2190	1910
2.1.1	4	2250	2920	2095
3.1.1	5	2250	3640	2185
4.1.1	6	2250	4370	2235
5.1.1	7	2250	5100	2265
6.1.1	8	2250	5830	2285
7.1.1	9	2250	6560	2298
8.1.1	10	2250	7290	2308
9.1.1	11	2250	8020	2315
10.1.1	12	2250	8750	2321
11.1.1	13	2250	9480	2325
12.1.1	14	2250	1021	2329
13.1.1	15	2250	1093	2331
14.1.1	16	2250	1166	2333
15.1.1	17	2250	1239	2335
16.1.1	18	2250	1312	2337
17.1.1	19	2250	1385	2338
18.1.1	20	2250	1458	2339

El material rolado es inspeccionado contra la Tabla De Muestreo IIA (**Plan de muestreo singular para inspecciones normales**) descrito en la ANSI Z1 4 y la tabla (**Límite De Calidad De Aceptación**) descrita en la ANSI Z1.9.


OBSERVACIONES:

FECHA: 13-05-25	FECHA: 13/05/2025	FECHA: 14/05/2025
NOMBRE: LEANDRO DORAN	NOMBRE: JUAN ESPINAL	NOMBRE: [illegible]
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO	F-OPEP-08 Versión No. 1 Vigencia. 31 de julio de 2024

Proyecto:	TUBERIA CORRUGADA - Ø 2.50					OP:	3403
Plano:	240827_LAM_LIR_V1	Revisión:	V1	Proceso:	ROLADO DE LAMINA	Cliente:	CONSTRUCTORA PAIS

POSICIÓN	ESPESOR	DESCRIPCION DE MATERIAL			NOMINAL 1	REAL 1	NOMINAL 2	REAL 2	C1	REAL	C2	Real
3 ANILLO	3.0950	LAM. G	X	LAM. HR	1.845	1.845	1.845	1.845	1.180	1.180	1.180	1.180
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								

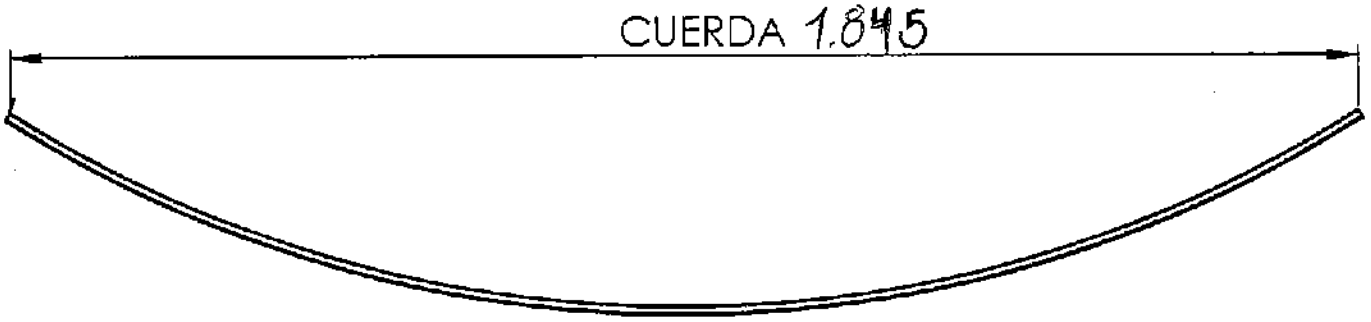

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1	3	2340	2230	1983
2	4	2340	2980	2176
3	5	2340	3720	2270
4	6	2340	4470	2320
5	7	2340	5210	2352
6	8	2340	5960	2373
7	9	2340	6700	2386
8	10	2340	7450	2396
9	11	2340	8190	2404
10	12	2340	8940	2410
11	13	2340	9680	2414
12	14	2340	1043	2418
13	15	2340	1117	2420
14	16	2340	1192	2423
15	17	2340	1266	2425
16	18	2340	1341	2427
17	19	2340	1415	2428
18	20	2340	1490	2429

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1	3	2290	2190	1942
2.1	4	2290	2920	2131
3.1	5	2290	3640	2222
4.1	6	2290	4370	2272
5.1	7	2290	5100	2303
6.1	8	2290	5830	2324
7.1	9	2290	6560	2337
8.1	10	2290	7290	2347
9.1	11	2290	8020	2358
10.1	12	2290	8750	2371
11.1	13	2290	9480	2373
12.1	14	2290	1021	2375
13.1	15	2290	1093	2376
14.1	16	2290	1166	2378
15.1	17	2290	1239	2379
16.1	18	2290	1312	2430
17.1	19	2290	1385	2431
18.1	20	2290	1458	2432

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1.1	3	2250	2190	1910
2.1.1	4	2250	2920	2095
3.1.1	5	2250	3640	2185
4.1.1	6	2250	4370	2235
5.1.1	7	2250	5100	2265
6.1.1	8	2250	5830	2285
7.1.1	9	2250	6560	2298
8.1.1	10	2250	7290	2308
9.1.1	11	2250	8020	2315
10.1.1	12	2250	8750	2321
11.1.1	13	2250	9480	2325
12.1.1	14	2250	1021	2329
13.1.1	15	2250	1093	2331
14.1.1	16	2250	1166	2333
15.1.1	17	2250	1239	2335
16.1.1	18	2250	1312	2337
17.1.1	19	2250	1385	2338
18.1.1	20	2250	1458	2339

El material rolado es inspeccionado contra la Tabla De Muestreo IIA (**Plan de muestreo singular para Inspecciones normales**) descrito en la ANSI Z1.4 y la tabla (**Límite De Calidad De Aceptación**) descrita en la ANSI Z1.9.


OBSERVACIONES:

FECHA: 13-05-25	FECHA: 13/05/2025	FECHA: 14/05/2025
NOMBRE: LEANDRO DUGAN	NOMBRE: IVAN COPIDO	NOMBRE: JORGE CONTRERAS
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO	F-OPEP-08 Versión No. 1 Vigencia: 31 de Julio de 2024

Proyecto:	TUBERIA CORRUGADA - ø 2.50					OP:	3405
Plano:	240827_LAM_LIR_V1	Revisión:	V1	Proceso:	ROLADO DE LAMINA	Cliente:	CONSTRUCTORA PAIS

POSICIÓN	ESPESOR	DESCRIPCION DE MATERIAL			NOMINAL 1	REAL 1	NOMINAL 2	REAL 2	C1	REAL	C2	Real
4 ANILLO	3.0950	LAM. G	X	LAM. HR	1,849	1,849	1.849	1,849	1.180	1.180	1,180	1,180
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								

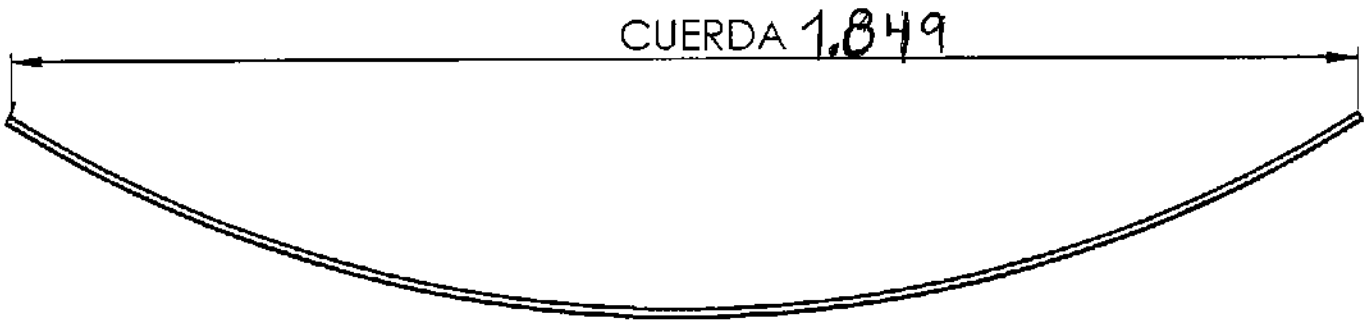

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1	3	2340	2230	1983
2	4	2340	2980	2176
3	5	2340	3720	2270
4	6	2340	4470	2320
5	7	2340	5210	2352
6	8	2340	5960	2373
7	9	2340	6700	2386
8	10	2340	7450	2396
9	11	2340	8190	2404
10	12	2340	8940	2410
11	13	2340	9680	2414
12	14	2340	1043	2418
13	15	2340	1117	2420
14	16	2340	1192	2423
15	17	2340	1266	2425
16	18	2340	1341	2427
17	19	2340	1415	2428
18	20	2340	1490	2429

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1	3	2290	2190	1942
2.1	4	2290	2920	2131
3.1	5	2290	3640	2222
4.1	6	2290	4370	2272
5.1	7	2290	5100	2303
6.1	8	2290	5830	2324
7.1	9	2290	6560	2337
8.1	10	2290	7290	2347
9.1	11	2290	8020	2368
10.1	12	2290	8750	2371
11.1	13	2290	9480	2373
12.1	14	2290	1021	2375
13.1	15	2290	1093	2376
14.1	16	2290	1166	2378
15.1	17	2290	1239	2379
16.1	18	2290	1312	2430
17.1	19	2290	1385	2431
18.1	20	2290	1458	2432

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1.1	3	2250	2190	1910
2.1.1	4	2250	2920	2095
3.1.1	5	2250	3640	2185
4.1.1	6	2250	4370	2235
5.1.1	7	2250	5100	2265
6.1.1	8	2250	5830	2285
7.1.1	9	2250	6560	2298
8.1.1	10	2250	7290	2308
9.1.1	11	2250	8020	2315
10.1.1	12	2250	8750	2321
11.1.1	13	2250	9480	2325
12.1.1	14	2250	1021	2329
13.1.1	15	2250	1093	2331
14.1.1	16	2250	1166	2333
15.1.1	17	2250	1239	2335
16.1.1	18	2250	1312	2337
17.1.1	19	2250	1385	2338
18.1.1	20	2250	1458	2339

El material rolado es inspeccionado contra la Tabla De Muestreo IIA (Plan de muestreo singular para inspecciones normales) descrito en la ANSI Z1.4 y la tabla (Límite De Calidad De Aceptación) descrita en la ANSI Z1.9.

OBSERVACIONES:


FECHA: 13-05-25	FECHA: 14/05/2025	FECHA: 14/05/2025
NOMBRE: LEANDRO DURAN	NOMBRE: JUAN CORREA	NOMBRE: JORGE CASTAÑEDA
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO	F-OPEP-08 Versión No. 1 Vigencia: 31 de julio de 2024

Proyecto:	TUBERIA CORRUGADA - Ø 2,50					OP:	3403
Plano:	240827_LAM_LIR_V1	Revisión:	V1	Proceso:	ROLADO DE LAMINA	Cliente:	CONSTRUCTORA PAIS

POSICION	ESPESOR	DESCRIPCION DE MATERIAL			NOMINAL 1	REAL 1	NOMINAL 2	REAL 2	C1	REAL	C2	Real
5 ANILLO	3,0650	LAM. G	X	LAM. HR	1,854	1,854	1,854	1,854	1,180	1,180	1,180	1,180
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								

CUERDA 1,854

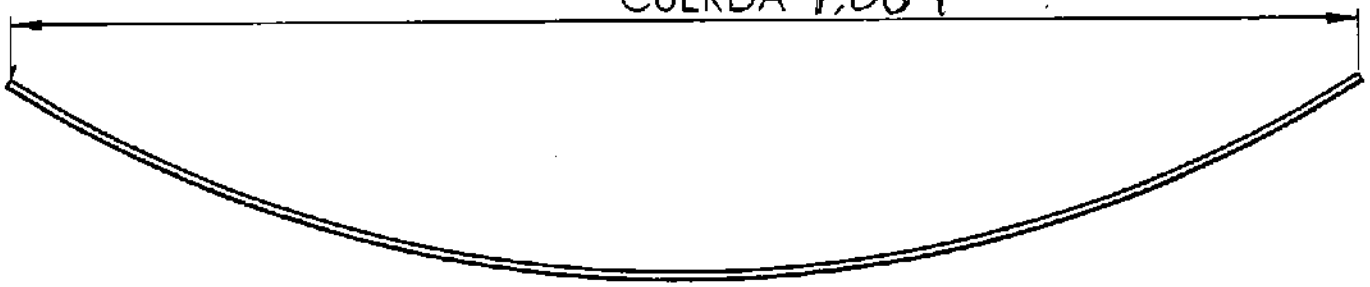

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1	3	2340	2230	1983
2	4	2340	2980	2176
3	5	2340	3720	2270
4	6	2340	4470	2320
5	7	2340	5210	2352
6	8	2340	5960	2373
7	9	2340	6700	2386
8	10	2340	7450	2396
9	11	2340	8190	2404
10	12	2340	8940	2410
11	13	2340	9680	2414
12	14	2340	1043.	2418
13	15	2340	1117	2420
14	16	2340	1192	2423
15	17	2340	1266	2425
16	18	2340	1341	2427
17	19	2340	1415	2428
18	20	2340	1490	2429

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1	3	2290	2190	1942
2.1	4	2290	2920	2131
3.1	5	2290	3640	2222
4.1	6	2290	4370	2272
5.1	7	2290	5100	2303
6.1	8	2290	5830	2324
7.1	9	2290	6560	2337
8.1	10	2290	7290	2347
9.1	11	2290	8020	2368
10.1	12	2290	8750	2371
11.1	13	2290	9480	2373
12.1	14	2290	1021	2375
13.1	15	2290	1093	2376
14.1	16	2290	1166	2378
15.1	17	2290	1239	2379
16.1	18	2290	1312	2430
17.1	19	2290	1385	2431
18.1	20	2290	1458	2432

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1.1	3	2250	2190	1910
2.1.1	4	2250	2920	2095
3.1.1	5	2250	3640	2185
4.1.1	6	2250	4370	2235
5.1.1	7	2250	5100	2265
6.1.1	8	2250	5830	2285
7.1.1	9	2250	6560	2298
8.1.1	10	2250	7290	2308
9.1.1	11	2250	8020	2315
10.1.1	12	2250	8750	2321
11.1.1	13	2250	9480	2325
12.1.1	14	2250	1021	2329
13.1.1	15	2250	1093	2331
14.1.1	16	2250	1166	2333
15.1.1	17	2250	1239	2335
16.1.1	18	2250	1312	2337
17.1.1	19	2250	1385	2338
18.1.1	20	2250	1458	2339

El material rolado es inspeccionado contra la Tabla De Muestreo IIA (**Plan de muestreo singular para inspecciones normales**) descrito en la ANSI Z1.4 y la tabla (**Límite De Calidad De Aceptación**) descrita en la ANSI Z1.9


OBSERVACIONES:

FECHA: 13-05-25	FECHA: 13/05/2025	FECHA: 14/05/2025
NOMBRE: LEONARDO DURAN	NOMBRE: JUAN ESPINOZA	NOMBRE: Jorge Gutierrez
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCION

itm®	REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO	F-OPEP-08 Versión No. 1 Vigencia: 31 de Julio de 2024

Proyecto:	TUBERIA CORRUGADA - Ø 2.50					OP:	3403
Plano:	240827_LAM_LIR_V1	Revisión:	V1	Proceso:	ROLADO DE LAMINA	Cliente:	CONSTRUCTORA PAIS

POSICIÓN	ESPESOR	DESCRIPCION DE MATERIAL			NOMINAL 1	REAL 1	NOMINAL 2	REAL 2	C1	REAL	C2	Real
6 ANILLO	3.0650	LAM. G	X	LAM. HR	1.858	1.858	1.858	1.858	1.180	1.180	1.180	1.180
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								

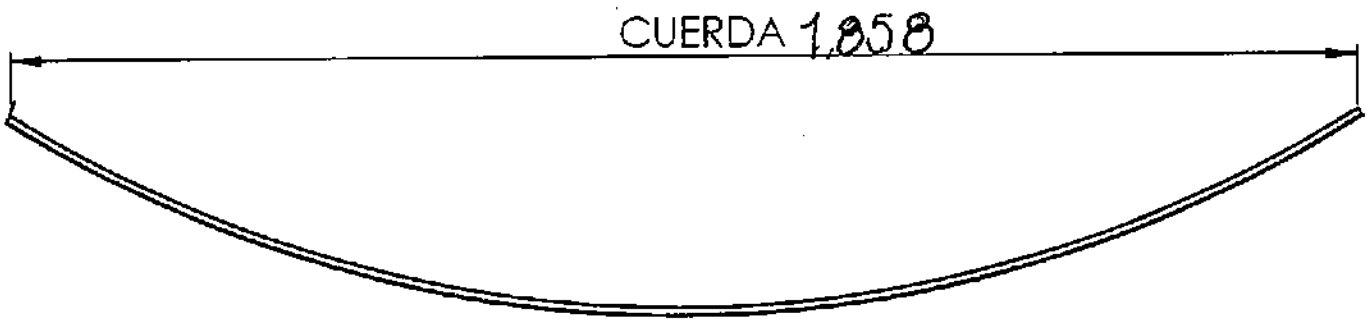

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1	3	2340	2230	1983
2	4	2340	2980	2176
3	5	2340	3720	2270
4	6	2340	4470	2320
5	7	2340	5210	2352
6	8	2340	5960	2373
7	9	2340	6700	2386
8	10	2340	7450	2396
9	11	2340	8190	2404
10	12	2340	8940	2410
11	13	2340	9680	2414
12	14	2340	1043	2418
13	15	2340	1117	2420
14	16	2340	1192	2423
15	17	2340	1266	2425
16	18	2340	1341	2427
17	19	2340	1415	2428
18	20	2340	1490	2429

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1	3	2290	2190	1942
2.1	4	2290	2920	2131
3.1	5	2290	3640	2222
4.1	6	2290	4370	2272
5.1	7	2290	5100	2303
6.1	8	2290	5830	2324
7.1	9	2290	6560	2337
8.1	10	2290	7290	2347
9.1	11	2290	8020	2368
10.1	12	2290	8750	2371
11.1	13	2290	9480	2373
12.1	14	2290	1021	2375
13.1	15	2290	1093	2376
14.1	16	2290	1166	2378
15.1	17	2290	1239	2379
16.1	18	2290	1312	2380
17.1	19	2290	1385	2431
18.1	20	2290	1458	2432

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1.1	3	2250	2190	1910
2.1.1	4	2250	2920	2095
3.1.1	5	2250	3640	2185
4.1.1	6	2250	4370	2235
5.1.1	7	2250	5100	2265
6.1.1	8	2250	5830	2285
7.1.1	9	2250	6560	2298
8.1.1	10	2250	7290	2308
9.1.1	11	2250	8020	2315
10.1.1	12	2250	8750	2321
11.1.1	13	2250	9480	2325
12.1.1	14	2250	1021	2329
13.1.1	15	2250	1093	2331
14.1.1	16	2250	1166	2333
15.1.1	17	2250	1239	2335
16.1.1	18	2250	1312	2337
17.1.1	19	2250	1385	2338
18.1.1	20	2250	1458	2339

El material rolado es inspeccionado contra la Tabla De Muestreo IIA (Plan de muestreo singular para inspecciones normales) descrito en la ANSI Z1.4 y la tabla (Límite De Calidad De Aceptación) descrita en la ANSI Z1.9.


OBSERVACIONES:

FECHA: 13-05-25	FECHA: 13/05/2025	FECHA: 14/05/2025
NOMBRE: LEANDRO DURAN	NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCIÓN

itm®	REGISTRO DIMENSIONAL DE ROLADO	F-OPEP-08 Versión No. 1 Vigencia: 31 de julio de 2024

Proyecto:	TUBERIA CORRUGADA - Ø 2.50						OP:	3403
Plano:	240827_LAM_LIR_V1	Revisión:	V1	Proceso:	ROLADO DE LAMINA	Cliente:	CONSTRUCTORA	OAIS

POSICIÓN	ESPESOR	DESCRIPCION DE MATERIAL			NOMINAL 1	REAL 1	NOMINAL 2	REAL 2	C1	REAL	C2	Real
7 ANILLO	3.0650	LAM. G	X	LAM. HR	1862	1.862	1.852	1.852	1.180	1.180	1.180	1.180
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								
		LAM. G		LAM. HR								

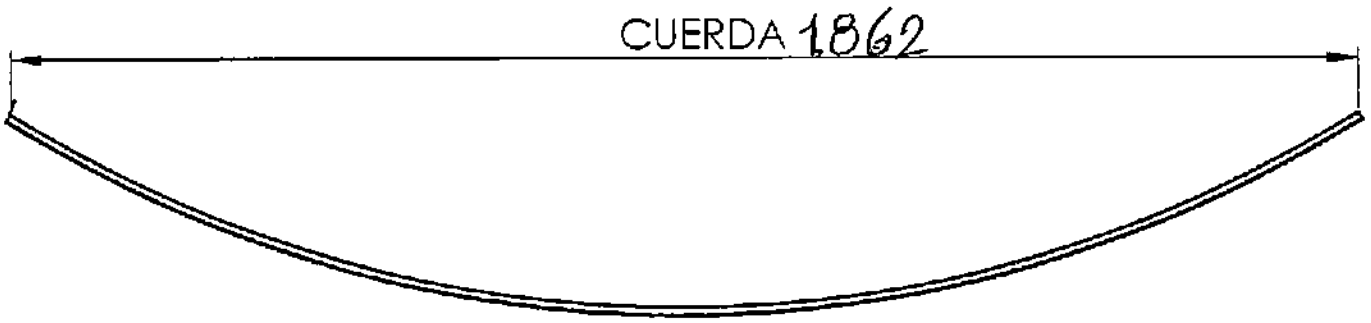

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1	3	2340	2230	1983
2	4	2340	2980	2176
3	5	2340	3720	2270
4	6	2340	4470	2320
5	7	2340	5210	2352
6	8	2340	5960	2373
7	9	2340	6700	2386
8	10	2340	7450	2396
9	11	2340	8190	2404
10	12	2340	8940	2410
11	13	2340	9680	2414
12	14	2340	1043	2418
13	15	2340	1117	2420
14	16	2340	1192	2423
15	17	2340	1266	2425
16	18	2340	1341	2427
17	19	2340	1415	2428
18	20	2340	1490	2429

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1	3	2290	2190	1942
2.1	4	2290	2920	2131
3.1	5	2290	3640	2222
4.1	6	2290	4370	2272
5.1	7	2290	5100	2303
6.1	8	2290	5830	2324
7.1	9	2290	6560	2337
8.1	10	2290	7290	2347
9.1	11	2290	8020	2368
10.1	12	2290	8750	2371
11.1	13	2290	9480	2373
12.1	14	2290	1021	2375
13.1	15	2290	1093	2376
14.1	16	2290	1166	2378
15.1	17	2290	1239	2379
16.1	18	2290	1312	2430
17.1	19	2290	1385	2431
18.1	20	2290	1458	2432

ITEM	No. LAMINAS	CENTRO	Ø	CUERDA
1.1.1	3	2250	2190	1910
2.1.1	4	2250	2920	2095
3.1.1	5	2250	3640	2185
4.1.1	6	2250	4370	2235
5.1.1	7	2250	5100	2265
6.1.1	8	2250	5830	2285
7.1.1	9	2250	6560	2298
8.1.1	10	2250	7290	2308
9.1.1	11	2250	8020	2315
10.1.1	12	2250	8750	2321
11.1.1	13	2250	9480	2325
12.1.1	14	2250	1021	2329
13.1.1	15	2250	1093	2331
14.1.1	16	2250	1166	2333
15.1.1	17	2250	1239	2335
16.1.1	18	2250	1312	2337
17.1.1	19	2250	1385	2338
18.1.1	20	2250	1458	2339

El material rolado es inspeccionado contra la Tabla De Muestreo IIA (Plan de muestreo singular para inspecciones normales) descrito en la ANSI Z1.4 y la tabla (Límite De Calidad De Aceptación) descrita en la ANSI Z1.9.

OBSERVACIONES:

FECHA: 13-05-25	FECHA: 14/05/2025	FECHA: 14/05/2025
NOMBRE: LEANDRO DURAN	NOMBRE: JUAN CARLOS	NOMBRE:
TRABAJADOR	CONTROL CALIDAD	JEFE PRODUCCION



CONTROL EQUIPO DE OBRA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

12.1 CONTROL DEL EQUIPO DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

CONTROL DE EQUIPO

N°	DESCRIPCION DEL EQUIPO	FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO	may-25													jun-25																	
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
2	VIBRADOR SAN EDUARDO																												X				
3	MEZCLADORA SAN EDUARDO																												X				
5	VOLQUETA SAN EDUARDO										X	X																					
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	

* Adjuntar lista de chequeo soporte de controles PRE-OPERACIONALES del Equipo, avaladas por la Interventoría
* Verificar cumplimiento del equipo exigido en el pliego de condiciones y ofertado porel contratista

En la casilla respectiva indicar A: Activo I: Inactivo R: Reparación

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°	25202274731-CND



SEGUIMIENTO ESTADO DEL TIEMPO

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

14. SEGUIMIENTO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO No:	1	DE	2023
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		
FECHA:	27 de JUNIO de 2025		
PERIODO: DEL	18 de MAYO de 2025	AL	17 de JUNIO de 2025

SEGUIMIENTO DEL TIEMPO

N°	DESCRIPCION	may-25														may-25																
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
1	SECO									20	24	24	24	21	24			24	24	16	24	16		14	17	24	24	24	20		24	19
2	LLUVIAS LEVES									4				3						3		3		4	4				1			2
3	LLUVIAS MODERADAS																			5		5		6	3				3			3
4	LLUVIAS INTENSAS																															
5	OTRO (Cual)																															
6																																
7																																

En la casilla respectiva indicar el numero de horas de duración. Ej: 2, 24

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°:	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATO DE OBRA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

13.1 ENSAYOS DE LABORATORIO OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORIA No:	18		FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025		
PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

LABORATORIO:	DIRECCION:	TELEFONO:	CERTIFICADO N°:

ENSAYOS DE LABORATORIO

N°	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE MUESTRA	NORMA	MATERIAL	LOCALIZACION	N° MUESTRA	RANGO CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	OBSERVACION		
									CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIDA CORRECTIVA (Si se requiere)
1	Resistencia a la Compresión	13/06/2025	I.N.V.E-410-13	Concreto	Encole alcantarilla, piso y aletas	3	3000 PSI				A espera de edad de falla (11 de Julio de 2025)

* Adjuntar copia de la certificación de calidad del laboratorio
* Adjuntar copia de los resultados y/o informes de laboratorio firmados
* Adjuntar informe de seguimiento al PLAN DE CALIDAD avalado por la interventoria

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATO DE INTERVENTORIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

13.2 ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA

CONTRATO No:	1	DE	2023
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		
FECHA:	27 de JUNIO de 2025		
PERIODO:	DEL 18 de MAYO de 2025	AL	17 de JUNIO de 2025

LABORATORIO:	DIRECCIÓN:	TELEFONO:	CERTIFICADO N°:

ENSAYOS DE LABORATORIO

N°	TIPO DE ENSAYO	FECHA	NORMA	MATERIAL	LOCALIZACION	N° MUESTRA	RANGO CUMPLIMIENTO	VALOR OBTENIDO	OBSERVACIÓN		
									CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIDA CORRECTIVA (Si se requiere)
1	Resistencia a la Compresión	13/06/2025	I.N.V.E-410-13	Concreto	Encole alcantarilla, piso y aletas	2	3000 PSI				A espera de edad de falla (11 de Julio de 2025)

* Adjuntar copia de los resultados y/o informes de laboratorio firmados por el laboratorio en el anexo correspondiente.

* Adjuntar copia de la certificación del laboratorio

* Ajuntar certificación de aprobación de los ensayos reportados en el perido.

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

16. SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA

CONTRATO No:	1	DE	2023
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18		

FECHA:	27	de	JUNIO	de	2025						
PERIODO:	DEL	18	de	MAYO	de	2025	AL	17	de	JUNIO	de	2025

N°	FECHA RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
	19/05/2025	N&S CONSTRUCOL SAS R/L JHONATAN MENESES SANCHEZ	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	G.B.-C.O.-2024-061 Solicitud de intervención para limpieza, adecuación y verificación de condiciones en zona de vía intervenida	Radicado Via Correo Electronico
	19/05/2025	N&S CONSTRUCOL SAS R/L JHONATAN MENESES SANCHEZ	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	G.B.-C.O.-2024-062 Polizas actualizadas por Prorroga No. 3	Radicado Via Correo Electronico
	22/05/2025	JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernacion de Boyacá	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Correo Remisión Acta Parcial de Interventoría.	Radicado Via Correo Electronico
	28/05/2025	JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernacion de Boyacá	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Correo Devolucion de cuenta de cobro acta parcial No. 1 obra	Radicado Via Correo Electronico
CORRESPONDENCIA ENVIADA					
	19/05/2023	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-123 Remisiòn de polizas de obra por prorroga No. 3	Radicado Vía Correo Electrónico
	19/05/2023	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-124 Remisiòn de polizas interventoria por prorroga No. 3	Radicado Vía Correo Electrónico
	23/05/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	Correo - Remision de cuenta de cobro para acta parcial Interventoria	Radicado Vía Correo Electrónico
	30/05/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	Correo - Remision de ajuste de cuenta de cobro acta parcial No. 1 Obra	Radicado Vía Correo Electrónico

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

16. SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	18	FECHA:	27 de JUNIO de 2025			
PERIODO: DEL	18 de MAYO de 2025	AL	17 de JUNIO de 2025			

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

N°	FECHA RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
	11/06/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-125 Entrega Informe Mensual N 17	Radicado Vía Correo Electrónico
	12/06/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-126 Informes Semanales No. 26, 27 y 28	Radicado Via Correo Electronico
	16/06/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-127 Informes Semanales No. 29	Radicado Via Correo Electronico
	19/06/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	Correo - Remision de ajuste de cuenta de cobro acta parcial No. 1 Obra	Radicado Vía Correo Electrónico
	24/06/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	Correo - Remision de ajuste de cuenta de cobro acta parcial No. 1 Obra	Radicado Vía Correo Electrónico
	25/06/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-128 Informes Semanales No. 30	Radicado Via Correo Electronico

* Adjuntar copia de la correspondencia generada (enviada y recibida) en el periodo en el anexo correspondiente.

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°:	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Chiquinquirá, 19 de Mayo de 2025

C.I.P-2567-2024-123

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

C.C.

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto Supervisor
Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá.

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: ENTREGA DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS A PRÓRROGA No. 3 - CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL 2023

Cordial saludo,

Esta Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones en el marco del contrato de la referencia y con el objeto de respaldar los amparos de acuerdo a los estipulado en el contrato ***“ En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato deberán modificarse las correspondientes garantías. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.”*** Por lo anterior, esta interventoría revisa aprueba y hace entrega de las pólizas actualizadas del contrato de Obra No. 001 de 2023, Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101052221 (Anexo 8) y Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101171029 (Anexo 7) actualizada de acuerdo a la prórroga No.3.

Se adjunta registro de cargue de las pólizas en plataforma secop

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.17125006	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	21/07/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.17124089	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	1.007.546.821,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	21/01/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que pueda surgir.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

Chiquinquirá, 19 de Mayo de 2025

C.I.P-2567-2024-124

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: ENTREGA DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS A PRÓRROGA No. 3 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2567 DEL 2023

Cordial saludo,

Esta interventoría en cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el objeto de respaldar los amparos de acuerdo al contrato de interventoría No. 2567 del 2023me permito entregar pólizas actualizadas de acuerdo a la prorroga No. 3

Se adjunta registro de cargue de las pólizas en plataforma secop

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.17125113	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	42.652.966,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	21/07/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE


Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

Re: CONTRATO 2567 DE 2023 - CUENTA COBRO ACTA PARCIAL No. 1

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 30 de mayo de 2025, 11:38 a.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen dia Ing

Adjunto PDF con acta parcial No. 1 Ajusta de acuerdo a las observaciones generadas, a la factura y se incluye la cédula del Representante legal, sobre el plan de pagos ya se realizó el cargue a plataforma secop para dar continuidad al trámite de aprobación y radicación

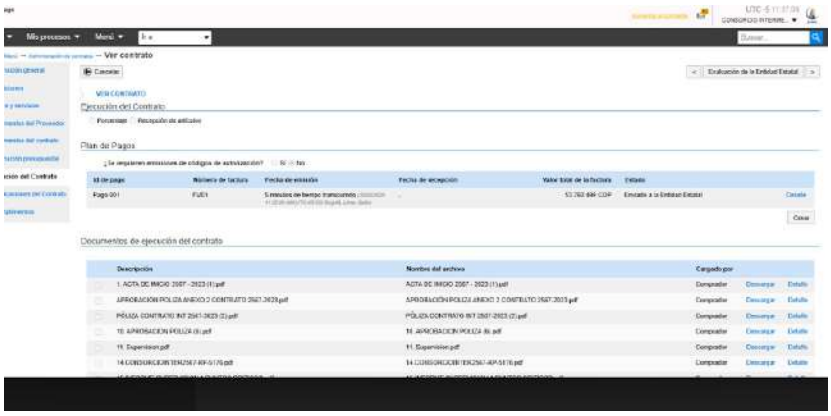

El mié, 28 may 2025 a la(s) 3:33 p.m., JAVIER IVAN BARRETO PINTO (ivan.barreto@boyaca.gov.co) escribió:

> Buenas tardes,
>
> De central de cuentas, devolvieron la cuenta, favor realizar los ajustes que correspondan, para volver a radicar.
>
> Atentamente
> ***JAVIER IVAN BARRETO PINTO***
> *Profesional Especializado*
> *Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial*
>
> *El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.*
>
> ---
>
> **De:** CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
> **Enviado:** miércoles, 28 de mayo de 2025 15:22
> **Para:** JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>
> **Asunto:** RV: CONTRATO 2567 DE 2023 - CUENTA COBRO ACTA PARCIAL No. 1

Subdirección Central de Cuentas
Dirección financiera y fiscal
Secretaria de Hacienda
Gobernación de Boyacá

Página web: www.boyaca.gov.co
PBX: (57) 8 7420150
Dirección: Calle 20 # 9 - 90
Tunja - BOYACÁ

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co

---

De: CAMILO ANDRES LOPEZ PEÑA <camilo.lopez@boyaca.gov.co>
Enviado: miércoles, 28 de mayo de 2025 2:34 p. m.
Para: CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
Asunto: RE: CONTRATO 2567 DE 2023 - CUENTA COBRO ACTA PARCIAL No. 1

DEVOLUCION

De: CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 17:05
Para: CAMILO ANDRES LOPEZ PEÑA <camilo.lopez@boyaca.gov.co>
Asunto: RV: CONTRATO 2567 DE 2023 - CUENTA COBRO ACTA PARCIAL No. 1

Subdirección Central de Cuentas
Dirección financiera y fiscal
Secretaria de Hacienda
Gobernación de Boyacá

Página web: www.boyaca.gov.co
PBX: (57) 8 7420150
Dirección: Calle 20 # 9 - 90
Tunja - BOYACÁ

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co

---

De: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 11:25 a. m.
Para: CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
Asunto: CONTRATO 2567 DE 2023 - CUENTA COBRO ACTA PARCIAL No. 1

Señores
CENTRAL DE CUENTAS
SECETARIA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE BOYACA

Por medio del presente envió el archivo magnético del paquete de documentos según la lista de cheque de la Constancia de Radicación Pago Parcial de la Cuenta de Cobro del Acta Parcial N° 1 del Contrato de Interventoría N°2567 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA”, lo anterior para el trámite correspondiente.

Quedo pendiente a cualquier inquietud.

Atentamente;

JAVIER IVAN BARRETO PINTO
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de Interventoria No. 2567 - 2023
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



contactenos@boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co
+(57)6087420150
Calle 20 #9-90

www.boyaca.gov.co

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co"

contactenos@boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co
+(57)6087420150
