CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032

INFORME DE INTERVENTORÍA No.8 - Final
CONTRATO No. 699-2023-CMA (99056)

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA E REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME"

CONTRATISTA
CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032

29 DE ENERO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


TÍTULO DOCUMENTO		INFORME DE INTERVENTORÍA No.08	
APROBADO	RESPONSABLE POR REVISIÓN.	NOMBRE	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
		CARGO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE INTERVENTORÍA
		FIRMA	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 8
2.1. ANTECEDENTES 8
2.2. LOCALIZACIÓN 8
2.3. ALCANCE DEL CONTRATO 10
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 10
3.1. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA 11
3.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.2.1. Forma de pago 12
3.2.2. Imputación presupuestal 12
3.3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA 13
3.4. ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO OBRA 17
3.4.1. PERSONAL APROBADO DEL CONTRATISTA 17
3.5. CONTROL DE EQUIPO 17
3.6. COMITÉ DE OBRA 18
3.7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 20
3.7.1. Informe mensual de Gestión Social 20
3.7.2. Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 20
3.7.3. Actividades de obra. 20
3.7.3.1. ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE 20
3.7.3.2. Acueducto Asogualinda Chiguaza 25
3.7.3.3. Acueducto Asopicos Andes 28
3.8. CONTROL DE EJECUCIÓN DE PROGRAMACIÓN 33
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 34
4.1. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 35
4.1.1. RELACIÓN DE PÓLIZA 35
4.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 35
4.3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 36
4.3.1. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 36
4.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 36
4.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA: 36

4.4.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA: 38
4.4.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA: 40
4.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 41
4.5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO REPORTADO 41
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61

TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 10
Tabla 2. Documentos legales del contrato de obra 11
Tabla 3. Relación de Pólizas del contrato de Obra 12
Tabla 4. Información financiera del contrato 12
Tabla 5. Disponibilidad presupuestal 13
Tabla 6. Avance general de la facturación 13
Tabla 7. Avance de facturación Acueducto Aguas Claras Olarte 13
Tabla 8. Avance de facturación Acueducto Asopicos Andes 14
Tabla 9. Avance de facturación Acueducto Asogualinda Chiguaza 14
Tabla 10. Resumen de facturación 15
Tabla 11. Resumen de facturación 16
Tabla 12. Control del personal 17
Tabla 13. Equipo empleado en el periodo 17
Tabla 14. Actas de comité de obra 18
Tabla 21. Avance físico del contrato 33
Tabla 22. Información del contrato de Interventoría 34
Tabla 23. Información del contrato de Interventoría 35
Tabla 24. Relación de Pólizas del contrato de Obra 35
Tabla 25. Información financiera del contrato de interventoría 35
Tabla 26. Personal dispuesto por parte de la Interventoría 36
Tabla 27. Control de personal de interventoría 36
Tabla 28. Correspondencia enviada por la interventoría 41
Tabla 29. Correspondencia recibida 57

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de la localidad de Usme 9
Ilustración 2. localización del proyecto.....9

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Interventoría en el cumplimiento del contrato No. 699-2023-CMA (99056) cuyo objeto es: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA E REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME*". Desde el 1 al 29 de febrero 2024, realizando el seguimiento al contrato de obra No. 676- 2023-LP (96548) objeto es *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME".*

El informe incluye la información el seguimiento técnico, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, de igual manera se anexan los documentos soporte de lo actuado en cumplimiento de los compromisos contractuales de la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

2.1. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta información presentada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME en el Anexo técnico 1 de las condiciones y términos de referencia, se conoce que La Localidad de Usme cuenta con infraestructura que permite el abastecimiento de agua potable contando con 10 acueductos veredales a saber así: Asocristalina Curubital, Aguas claras Olarte, El Destino, Corinto Cerro redondo, Aguas Doradas, Acuamarg, Soches, Asopicos Boca grande, Aguas lindas Chiguaza y Arrayanes Argentina, los cuales se encuentran operando hace más de 15 años, lapso de tiempo en que la cobertura en el área rural se ha incrementado en cantidad de usuarios, generando una demanda del recurso mayor, así mismo la falta de mantenimiento de las estructuras existentes, como el deterioro de las redes por temporadas invernales en los últimos años.

Bajo este contexto, los objetivos principales están dirigidos a atender las necesidades sentidas de la comunidad transmitidas a la Alcaldía Local de Usme en los encuentros ciudadanos en cumplimiento del Plan de Desarrollo Local de Usme, denominado: "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI " adoptado mediante Acuerdo local No. 002 del 04 de octubre de 2020, a fin de mejorar y optimizar el sistema de acueducto incluyendo la realización de estudios y diseños, obras nuevas, mantenimiento, optimización y demás intervenciones requeridas de la infraestructura existente, que para la vigencia 2023, se establece la ejecución de los acueductos ASOAGUALINA CHIGUAZA, AGUAS CLARAS OLARTE y ASOPICOS ANDES.

Por esta razón, el presente contrato comprende la interventoría a la intervención de los 3 acueductos veredales, cuyas obras a ejecutar serán establecidas teniendo en cuenta los diagnósticos, presupuesto y programación realizados por el contratista de obra.

2.2. LOCALIZACIÓN

La localidad de Usme se encuentra situada en el suroriente de Bogotá, limita al norte con las localidades San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (18) y Tunjuelito (6); al oriente con los municipios de Chipaque y Une; al sur con la localidad de Sumapaz (20); y al occidente con la localidad Ciudad Bolívar (19), con el Río Tunjuelo de por medio y los municipios de Pasca y Soacha.



Ilustración 1. Localización de la localidad de Usme

El contrato será ejecutado en la Localidad de Usme, en la Vereda Olarte, Vereda Chiguaza, Veredas Andes y Unión y como se ilustra a continuación:

- ACUEDUCTO ASOAGUALINDA CHIGUAZA – Vereda Chiguaza
- AGUAS CLARAS OLARTE – Vereda Olarte
- ASOPICOS ANDES – Veredas Andes y Unión

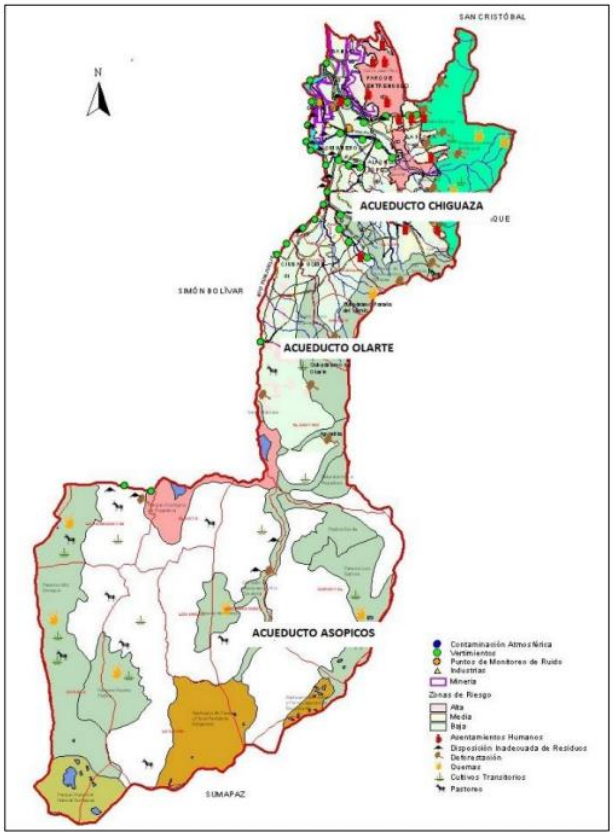


Ilustración 2. localización del proyecto

Fuente Anexo Técnico FDLU

2.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato consiste en la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y SST al contrato de obra para la conservación y obras requeridas para la optimización y mejoramiento de los tres acueductos veredales de la localidad de Usme, en donde el contratista de obra realizará la identificación de las necesidades y elaborará un diagnóstico por cada acueducto para que junto con la matriz de necesidades establecido en el anexo técnico del contrato de obra se determinen las actividades a ejecutar.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se realiza la verificación de la información general del contrato de obra adjudicado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme, a través de la invitación publica FDLU-LP-018-2023 (96548) y el contrato de obra No. 676-2023-LP (96548), el cual tiene por objeto: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME". A continuación, se presenta la información más relevante del contrato.

Tabla 1. Información general del contrato

TIPO DE CONTRATO	OBRA
No. CONTRATO	676-2023-LP (96548)
OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME NIT:899999061-9 R.L. ANA ISABEL HORTUA SALCEDO C.C. . 20.483.753 De Choachí/Cundinamarca DIRECCIÓN: CL. 137 SUR #3A-44, BOGOTÁ
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO USME 2023 NIT: 901784770-5 R.L. OSMAR FABIAN PINZON ACOSTA C.C. . 80.545.787 DE ZIPAQUIRÁ DIRECCIÓN: CRA 16 # 80 – 11 BOGOTÁ D.C TEL: 3106807496 – 3218027069 – 3002955104

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	NOVECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($913.500.000.oo)
CONTRATISTA DEI INTERVENTORIA	CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032 NIT: 901785936-5 R.L. MIGUEL JOVEN GRAFE C.C. 77.134.442 DE PITAL DIRECCIÓN: CR 7 16A 29 NEIVA – HUILA TEL. 311 8353226 - 313 3768996
NUMERO DE CONTRATO	699-2023-CMA (99056)
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA E REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($101.500.000.oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	ARQ. EDWIN ANDRES LOPEZ AMAYA

3.1. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan los documentos de carácter legal que el contrato desde su inicio ha presentado.

Tabla 2. Documentos legales del contrato de obra

No.	DOCUMENTO	FECHA DE FIRMA
1	Contrato de obra No. 676-2023-LP (96548)	29/12/2023
2	Acta de inicio	29/01/2024
3	Prorroga en tiempo (1 mes) desde el 29 de agosto hasta el 28 de septiembre de 2024	28/08/2024

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato las cuales se encuentran actualizadas con el acta de inicio suscrita el día 29 de enero de 2024, aprobadas el 26 de febrero de 2024.

Tabla 3. Relación de Pólizas del contrato de Obra

PÓLIZA DE SEGURO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. B-100044241 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	$ 274.050.000	29/01/2024	28/03/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 91.350.000	29/01/2024	29/09/2027
	ESTABILIDAD DE OBRA	$ 274.050.000	29/08/2024	29/09/2029
RCE No. B-100011653 ANEXO 2	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	$ 232.000.000	29/01/2024	28/09/2024
	PATRONAL	$69.000.000	29/01/2024	28/09/2024
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	$69.000.000	29/01/2024	28/09/2024
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$69.000.000	29/01/2024	28/09/2024
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			

3.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA

3.2.1. Forma de pago

La forma de pago por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme, según términos y condiciones, se especifica en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pago contra liquidación del contrato.

Tabla 4. Información financiera del contrato

DESCRIPCIÓN DE VALORES	TOTAL
COSTO DIRECTO	$ 699.624.722,37
ADMINISTRACIÓN	$ 181.902.427,82
IMPREVISTO	$ 6.996.247,22
UTILIDAD	$ 20.988.741,67
IVA	$ 3.987.860,92
VALOR TOTAL	$ 913.500.000,00

3.2.2. Imputación presupuestal

El Contrato de Obra 676-2023-LP (96548) se encuentra registrado con el Certificado de Registro Presupuestal No.1401 del 20 de octubre de 2023:

Tabla 5. Disponibilidad presupuestal

NÚMERO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA	FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1401	20 de octubre 2023	$913.500.000

3.2.3. Anticipo

Para el presente contrato, el Fondo de Desarrollo Local de Usme no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

3.3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la facturación a la fecha:

Tabla 6. Avance general de la facturación

FACTURA NO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	VALOR DESEMBOLSO
FACTURA NO 1	01 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	$ 74.311.240	$ 6.138.108	$ 68.173.132
FACTURA NO 2	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	$ 258.637.908	$ 21.363.491	$ 237.274.417
FACTURA NO 3	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	$ 222.537.330	$ 18.381.583	$ 204.155.747
FACTURA NO 4	01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO	$ 265.430.900	$ 21.924.592	$ 243.506.308
FACTURA NO 5	1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE	$ 92.582.622	$ 7.647.325	$ 84.935.297
TOTALES		$ 913.500.000	$ 67.807.775	$ 753.109.603

Tabla 7. Avance de facturación Acueducto Aguas Claras Olarte

# ACTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR FACTURADO	% PAGADO TOTAL	VALOR DE RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 45.414.134	4,97%	$ 3.751.207	$ 41.662.927
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 239.975.238	26,27%	$ 19.821.955	$ 220.153.284
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 85.889.243	9,40%	$ 7.094.451	$ 78.794.792
5	ACTA PARCIAL No.5 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AGOSTO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 67.839.012	7,43%	$ 5.603.502	$ 62.235.510
TOTAL ACUEDUCTO AGUAS CLARAS			**$ 439.117.627**	**48%**	**$ 36.271.116**	**$ 402.846.511**

Tabla 8. Avance de facturación Acueducto Asopicos Andes

# ACTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR FACTURADO	% PAGADO TOTAL	VALOR DE RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 11.536.203	1,26%	$ 952.890	$ 10.583.313
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 10.479.807	1,15%	$ 865.632	$ 9.614.175
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 222.537.329	24,36%	$ 18.381.583	$ 204.155.746
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 2.951.754	0,32%	$ 243.815	$ 2.707.939
5	ACTA PARCIAL No.5 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AGOSTO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 23.818.210	2,61%	$ 1.967.384	$ 21.850.826
TOTAL ACUEDUCTO ASOPICOS			**$ 271.323.303**	**30%**	**$ 22.411.305**	**$ 248.911.998**

Tabla 9. Avance de facturación Acueducto Asogualinda Chiguaza

# ACTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR FACTURADO	% PAGADO TOTAL	VALOR DE RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 17.360.903,00	1,90%	$ 1.434.011	$ 15.926.892
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 8.182.863	0,90%	$ 675.904	$ 7.506.959
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 176.589.904	19,33%	$ 14.586.326	$ 162.003.578
5	ACTA PARCIAL No.5 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AGOSTO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 925.400	0,10%	$ 76.438	$ 848.962
TOTAL ACUEDUCTO ASOGUALINDA			**$ 203.059.070**	**22%**	**$ 16.772.679**	**$ 186.286.391**

Tabla 10. Resumen de facturación

ITEM	PERIODO	ACUEDUCTO	VALOR EJECUTADO
1	01 FEBRERO AL 31 DE MARZO	ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	$ 45.414.134
		ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 11.536.203
		ACUEDUCTO ASOAGULINDA CHIGUAZA	$ 17.360.903
VALOR EJECUTADO MES 1 Y 2			$ 74.311.240
2	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	$ 239.975.238
		ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 10.479.807
		ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	$ 8.182.863
VALOR EJECUTADO MES 3			$ 258.637.908
3	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 222.537.329
VALOR EJECUTADO MES 4			$ 222.537.329
4	01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO	ACUEDUCTOR AGUAS CLARAS OLARTE	$ 85.889.243
		ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	$ 176.589.904
		ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 2.951.754
VALOR EJECUTADO MES 5 Y 6			$ 265.430.900
5	1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE	ACUEDUCTOR AGUAS CLARAS OLARTE	$ 67.839.012
		ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	$ 925.400
		ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 23.818.210
VALOR EJECUTADO MES 7 Y 8			$ 92.582.622
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			**$ 913.500.000**

Tabla 11. Resumen de facturación

# ACTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR FACTURADO	% PAGADO TOTAL	VALOR DE RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 45.414.134	4,97%	$ 3.751.207	$ 41.662.927
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 239.975.238	26,27%	$ 19.821.955	$ 220.153.284
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 85.889.243	9,40%	$ 7.094.451	$ 78.794.792
5	ACTA PARCIAL No.5 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AGOSTO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 67.839.012	7,43%	$ 5.603.502	$ 62.235.510
TOTAL ACUEDUCTO AGUAS CLARAS			**$ 439.117.627**	**48%**	**$ 36.271.116**	**$ 402.846.511**
# ACTA	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO**	**VALOR FACTURADO**	**% PAGADO TOTAL**	**VALOR DE RETENCIONES**	**VALOR NETO A PAGAR**
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 11.536.203	1,26%	$ 952.890	$ 10.583.313
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 10.479.807	1,15%	$ 865.632	$ 9.614.175
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 222.537.329	24,36%	$ 18.381.583	$ 204.155.746
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 2.951.754	0,32%	$ 243.815	$ 2.707.939
5	ACTA PARCIAL No.5 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AGOSTO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 23.818.210	2,61%	$ 1.967.384	$ 21.850.826
TOTAL ACUEDUCTO ASOPICOS			**$ 271.323.303**	**30%**	**$ 22.411.305**	**$ 248.911.998**
# ACTA	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO**	**VALOR FACTURADO**	**% PAGADO TOTAL**	**VALOR DE RETENCIONES**	**VALOR NETO A PAGAR**
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 17.360.903,00	1,90%	$ 1.434.011	$ 15.926.892
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 8.182.863	0,90%	$ 675.904	$ 7.506.959
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 176.589.904	19,33%	$ 14.586.326	$ 162.003.578
5	ACTA PARCIAL No.5 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AGOSTO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 925.400	0,10%	$ 76.438	$ 848.962
TOTAL ACUEDUCTO ASOGUALINDA			**$ 203.059.070**	**22%**	**$ 16.772.679**	**$ 186.286.391**
TOTAL PROYECTO			**$ 913.500.000**	**100%**	**$ 75.455.100**	**$ 838.044.900**

3.4. ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO OBRA

3.4.1. PERSONAL APROBADO DEL CONTRATISTA

En la tabla 12, se relaciona el listado de personal (mínimo requerido administrativo) para la ejecución del contrato de acuerdo con los pliegos del contrato de obra.

Tabla 12. Control del personal

CARGO	NOMBRE	CEDULA	DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO
DIRECTOR DE OBRA	ANDRÉS MORENO POSADA	80827088	20%	29/01/2024
RESIDENTE DE OBRA	YEISON EDUARDO BENITEZ IBAGUE	1018461423	100%	17/04/2024
RESIDENTE SST	ANGIE LORENA ESPINEL GARNICA	1057598604	20%	29/01/2024
RESIDENTE AMBIENTAL	ANGIE LORENA ESPINEL GARNICA	1057598604	20%	29/01/2024
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	OMAR FÉLIX ALMEIDA ROSERO	11225826	30%	29/01/2024
RESIDENTE SOCIAL	MARIA CAMILA CAMARGO FIGUEREDO	1018489013	20%	26/04/2024
INSPECTORA DE OBRA	MARÍA ALEJANDRA MÉNDEZ GARCÍA	1007806778	50%	29/01/2024
TOPÓGRAFO	MIGUEL ANGEL RAMIREZ FARFAN	79889006	20%	29/01/2024

3.5. CONTROL DE EQUIPO

En la siguiente tabla se relaciona la maquinaria y vehículos utilizados en el periodo.

Tabla 13. Equipo empleado en el periodo

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS
CAMIONETA CAMPERO	1	PLACA GLL932 MARCA: MAZDA MODELO: 2020
VOLQUETA SENCILLA	1	PLACA FUD182 MARCA: CHEVROLET MODELO: 1985
FURGÓN	1	PLACA: LPL148

		MARCA: JMC MODELO: 2023
PORTATIL	1	MARCA: LENOVO CORE I5 GEN RAM 8GB-SSD

3.6. COMITÉ DE OBRA

En el transcurso del presente mes se llevó a cabo una reunión con la presencia de la supervisión y contratista, en los cuales se trataron aspectos técnicos, administrativos, ambientales y sociales pertinentes al contrato, dichas reuniones se llevaron a cabo vía virtual y presencial.

Tabla 14. Actas de comité de obra

FECHA	***TEMAS TRATADOS***
14/03/2024	- Avance de los diagnósticos realizados. Presupuesto de cada uno de los acueductos desglosado.
02/04/2024	- Programaciones profesionales sociales. - Aprobación de los diagnósticos. - Elaboración de acta de ítems no previstos e informe mensual
08/04/2024	Socialización con representante de cada uno de los acueductos, la interventoría y la supervisión
18/04/2024	- Visita a cada uno de los puntos a intervenir con la interventoría y la supervisión, verificando alineamiento y priorización.
25/04/2024	Seguimiento de actividades pendientes (Cronograma de obra, informes mensuales, Apus, Inicio de actividades etc).
02/05/2024	- Seguimiento en campo de obras ejecutadas. - Informes mensuales y actas de pago a radicar por parte de contratista e interventoría. - Entrega de programación y flujo de caja por parte del contratista. Revisión de acta de Nps por parte de la supervisión.
06/05/2024	- Revisión de las actas de pago parcial del contratista y la interventoría por parte de la supervisión. - Aprobación de acta de Nps por parte de la supervisión. - Entrega de ficha técnica por parte de la interventoría semanalmente. Adelantar acciones frente al PMT por parte del contratista
14/05/2024	- Remisión de análisis de precios unitarios por parte del contratista. - Aprobación de acta de Nps por parte de la supervisión. - Solicitud de adición y aprobación de subcontratista por parte del contratista. - Requerimiento de pin ambiental por parte del contratista.

20/05/2024	- Remisión de análisis de precios unitarios por parte del contratista. - Aprobación de acta de Nps por parte de la supervisión. Remisión de valla publicitaria por parte de la interventoría.
28/05/2024	- Remisión de análisis de precios unitarios por parte de la interventoria. - Aprobación de acta de Nps por parte de la supervisión. - Revisión finca el arrayan acueducto Asogualiva Chiguaza. - Tramite de licencia de excavación y Pmt por parte del contratista. Socialización con representante acueducto Asopicos – Andes.
04/06/2024	- Recorrido de obra en Ptap Asopicos Andes para evaluación de actividades a realizar para optimización de planta.
24/06/2024	- Autorización de propietario predio el Arrayan. - Inicio de obras a ejecutar en el predio el Arrayan perteneciente al sistema de acueducto veredal Asopicos Andes.
27/06/2024	- Estado del contrato (Físico y financiero), socialización junto con contratista, interventoría, supervisión, representantes de los acueductos y entidades secretaria de hábitat y Acueducto de Bogotá.
10/07/2024	- Reunión con Ediles de la localidad de Usme informando y explicando, estado general del contrato (alcance, presupuesto y cronograma) junto con la interventoría la supervisión y presidentes de los sistemas de acueducto veredales.
27/08/2024	- Se realiza reunión con el administrador del predio El Arrayan en la cual se a la autorización para la intervención en los últimos 100 metros.
30/08/2024	Se realiza reunión la interventoría y la supervisión para tratar avance de obra y solicitud de adición y prorroga contratos de obra e interventoría.
12/09/2024	- Se realiza reunión con los presidentes de los acueductos de Chiguaza y Aguas Claras Olarte, para realizar las pruebas hidrostáticas.

25/09/2024	- Se realiza reunión la interventoría y la supervisión para tratar avance de obra y solicitud de adición y prorroga contratos de obra e interventoría.

3.7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

3.7.1. Informe mensual de Gestión Social

Teniendo en cuenta el Plan de Gestión Social aprobado por parte de la interventoría, elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos en el "Apéndice H Diálogo Ciudadano FDLU-LP-018-2023" y "Anexo 1- Anexo Técnico FDLU-LP-018-2023", el cual buscó garantizar la participación activa para la apropiación ciudadana y la sostenibilidad social de la obra y establecer medidas de manejo para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos de la obra; el CONSORCIO USME 2023 realizó las actividades programadas para el desarrollo del contrato No.676- 2023-LP (96548) en el cual se ejecutaron actividades enfocadas en potencializar la comunicación con los líderes de las veredas Aguas Claras Olarte, Asopicos Andes y Chiguaza, entre ellas, reuniones, socializaciones de los trabajos constructivos que se realizaron en la obra, recorridos rurales entre los profesionales del Consorcio, los lideres de las veredas y la comunidad interesada en conocer más acerca del proyecto e iniciar con el registro fotográfico de las zonas intervenidas. Así mismo, crear y ejecutar estrategias de sostenibilidad, corresponsabilidad y control social al desarrollo del proyecto.

3.7.2. Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, fue radicado y aprobado mediante radicado CE-CU23-018, por parte de la interventoría, el cual declara su compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), mejoramiento continuo y desarrollo de las actividades de prevención, y promoción de la salud, que permitan proteger la salud de todos los trabajadores directos, e indirectos, evaluando, valorando y controlando los riesgos existentes en la empresa, destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del plan de SST, actuando con la convicción de preservar los recursos naturales y propender por la conservación del medio ambiente.

3.7.3. Actividades de obra.

3.7.3.1. ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE

En el acueducto Aguas Claras Olarte se intervinieron dos tramos de la red de distribución de acueducto; estos tramos fueron los ubicados en el predio el durazno en el cual se realizó la renovación de red de 1000 metros en tubería pead Pn 16 de

2” y el predio de los Gómez en donde se realizó la renovación de 300 metros en tubería pead Pn 16 de 2”, en cada uno de los tramos se realizaron las actividades que se mencionan a continuación:

- **Transporte de materiales.**

Se realizó transporte de materiales a sitio, tanto materiales necesarios para la señalización, como materiales pétreos (arena, recebo) y la tubería, así mismo se tuvo que realizar por diferentes medios tractor, carretilla y transporte mular el transporte de los materiales desde el punto de acceso vehicular hasta el frente de obra para poder realizar las actividades correspondientes.









- **Replanteo y señalización de áreas de trabajo.**

Se realizó instalación de campamento y señalización para dar seguridad a la excavación a realizar.



- **Excavación.**

Se realiza excavación de los 1300 metros de acuerdo con diseño aprobado, el cual consta de un ancho de 0,7 m y una profundidad promedio de 1,16 m.



- **Instalación de cama de arena.**

Se realiza instalación de arena de peña para realizar la cama de protección de la tubería. Esta cama tiene un ancho de 0,7m y un espesor de cama de 10cm, la actividad se realizó en los 1300 metros.




- **Suministro e instalación de tubería.**

Se realiza suministro e instalación de1300 metros de tubería pead Pn 16 de 63mm (2”).






- **Relleno con recebo compactado y con material del sitio seleccionado.**

Se realiza relleno con recebo 50 cm encima de cota clave de la tubería para protección de esta, y el material restante fue instalado el material procedente de la excavación de acuerdo a los diagnósticos aprobados.



- **Relleno con material del sitio**

Una vez se aplica la capa de recebo sobre la tubería para protegerla, se instala material del sitio seleccionado y compactado hasta el nivel de la rasante y de esta manera dejar la zona intervenida en las mismas condiciones que las encontradas inicialmente, el resto de material procedente de excavación y reemplazado por recebo y/o arena es transportado a un sitio de disposición autorizado.



3.7.3.2. Acueducto Asogualinda Chiguaza

En el acueducto Asoagulinda Chiguaza se intervino un tramo de la red de distribución de acueducto; este tramo fue el ubicado en el predio el arrayan en el cual se intervino una longitud de 570 en una tubería pead Pn 16 de 1 1/2", en este tramo se realizaron las siguientes actividades:

- **Señalización de áreas de trabajo.**

Se realiza el alistamiento de las áreas de trabajo tanto en el tramo del predio el Arrayan la cual tuvo una longitud de intervención de 570m.



- **Excavación.**

Se realiza la excavación en una longitud de 570 metros en el predio el Arrayan, se resalta que se realizó con una profundidad de excavación de 1m hasta la cota clave de la tubería y un ancho de 0,7m.





- **Suministro e instalación de arena de peña.**

Se realiza el suministro e instalación de una cama de arena de peña con un espesor de 10 cm la longitud anteriormente mencionada.





- **Suministro e instalación de tubería Pead PN 16.**

Se realiza el suministro e instalación de tubería Pead PN 16 de 1-1/2” en una longitud de570 metros.




- **Suministro e instalación de recebo compactado Mecánicamente.**

Se realiza el suministro e instalación de recebo sobre para proteger la tubería, esta capa de recebo tiene una un espesor aproximado de 55 cm, la capa se instaló en la longitud intervenida en el predio el arrayan.





- **Relleno con material del sitio**

Una vez se aplica la capa de recebo sobre la tubería para protegerla, se instala material del sitio seleccionado y compactado hasta el nivel de la rasante y de esta manera dejar la zona intervenida en las mismas condiciones que las encontradas

inicialmente, el resto de material procedente de excavación y reemplazado por recebo y/o arena es transportado a un sitio de disposición autorizado.





3.7.3.3. Acueducto Asopicos Andes

En el acueducto Asopicos Andes se intervinieron tres tramos de la red de distribución de acueducto; estos tramos fueron los ubicados en el predio del señor Omar Bohórquez en el cual se realizó la renovación de red de 480 metros en tubería pead Pn 16 de 1 1/2" , en el predio del señor Vicente Ávila en el cual se realizó la renovación de red en 100m en tubería pead Pn 16 de 1 ½ y el predio de la señora Beatriz Gómez en el cual se realizó la renovación de red de 150 metros en tubería pead Pn 16 de 1 1/2" ", en cada uno de los tramos se realizaron las actividades que se mencionan a continuación:

- **Transporte de materiales.**

Se realizó transporte de materiales a sitio, tanto materiales necesarios para la señalización, como materiales pétreos (arena, recebo) y la tubería, así mismo se tuvo que realizar por diferentes medios tractor, carretilla y transporte mular el transporte de los materiales desde el punto de acceso vehicular hasta el frente de obra para poder realizar las actividades correspondientes.





- **Replanteo y señalización.**

Se realizó instalación de campamento y señalización para dar seguridad a la excavación a realizar.





- **Excavación.**

Se realiza excavación de 730 metros de acuerdo con diseño aprobado.



- **Instalación de cama de arena.**

Se realiza instalación de arena de peña para realizar la cama de protección de la tubería, de acuerdo con diseño aprobado.



- **Suministro e instalación de tubería.**

Se realiza suministro e instalación de 730 metros de tubería pead Pn 16 de 1 ½”.



- **Relleno con recebo compactado y con material del sitio seleccionado.**

Se realiza relleno con recebo encima de cota clave de la tubería para protección de esta de acuerdo con diseño aprobado, y el material restante fue instalado el material procedente de la excavación de acuerdo a los diagnósticos aprobados.




En el acueducto asopicos andes además de los tres tramos intervenidos se realizó intervención en la planta de tratamiento de agua potable en la cual se realizaron las siguientes actividades:

- **Ptap Asopicos Andes**

En la ptap del sistema de acueducto Asopicos Andes se realiza mantenimiento de los tanques de filtrado, se realiza el suministro e instalación de 2 filtros de anillos, 5 válvulas tipo mariposa de 3”, 1 manómetro,tubería pvc de 3”. 1 válvula de cierre, así

como el suministros de accesorios tales como 5 kits de válvulas ventosas y 2 válvulas de cierre.



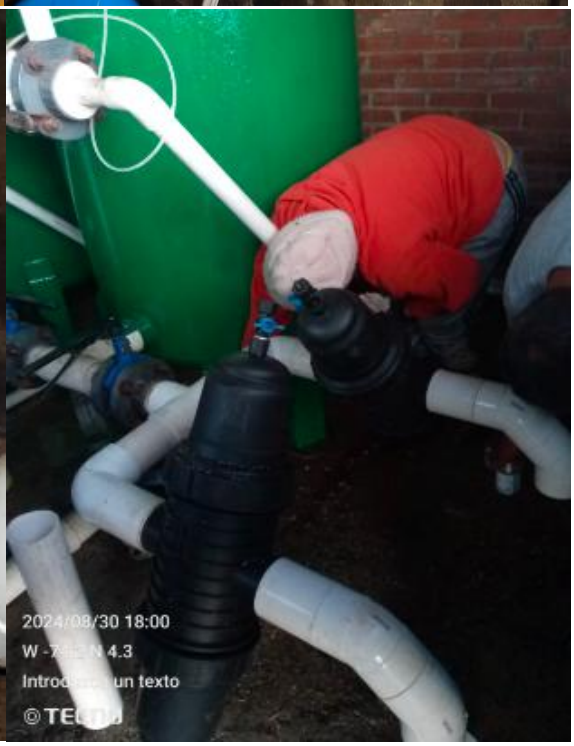



3.8. CONTROL DE EJECUCIÓN DE PROGRAMACIÓN

A continuación, se relaciona el avance ejecutado del contrato:

Tabla 15. Avance físico del contrato

AVANCE FISICO FINANCIERO DEL CONTRATO						
PERIODO	MES	AVANCE FISICO EJECUTADO	AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE TIEMPO
0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01-02-2024 A 29-02-2024	1	8,13%	8,13%	0,00%	0,00%	12,50%
01-03-2024 A 31-03-2024	2	0,00%	8,13%	0,00%	0,00%	25,00%
01-04-2024 A 30-04-2024	3	28,31%	36,45%	16,67%	16,67%	37,50%
01-05-2024 A 31-05-2024	4	24,36%	60,81%	16,67%	33,33%	50,00%
01-06-2024 A 30-06-2024	5	0,28%	61,09%	16,67%	50,00%	62,50%
01-07-2024 A 31-07-2024	6	28,78%	89,87%	16,67%	66,67%	75,00%
01-08-2024 A 31-08-2024	7	7,57%	97,43%	16,67%	83,33%	87,50%
01-09-2024 A 28-09-2024	8	2,57%	100,00%	16,67%	100,00%	100,00%

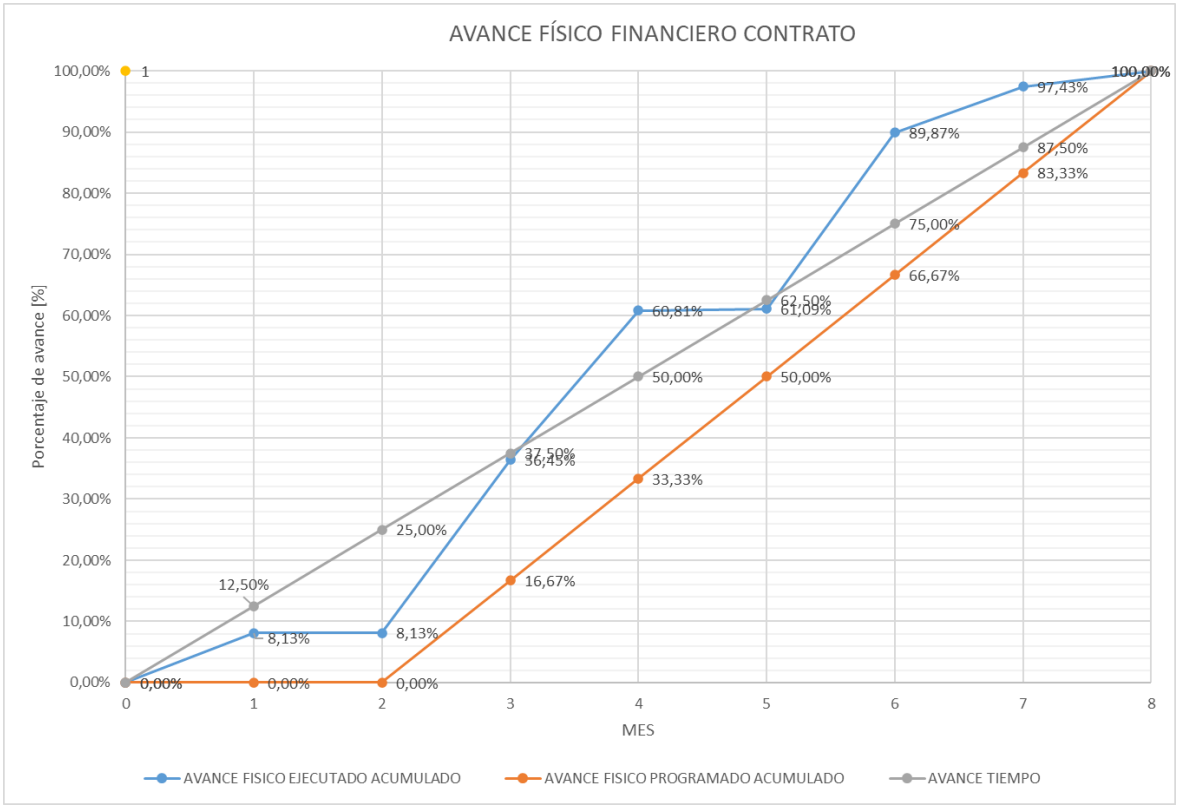

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 16. Información del contrato de Interventoría

TIPO DE PROCESO	Concurso de Méritos Abierto No. FDLU-CMA-032-2023 (99556)
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
LOCALIDAD EJECUCIÓN	Usme
No. CONTRATO	699-2023-CMA (99056)
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y SST al contrato de obra pública cuyo objeto es: realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y hasta monto agotable, la conservación y las obras requeridas para la optimización y mejoramiento de los acueductos veredales en la localidad de Usme
VALOR DEL CONTRATO	Ciento Un Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Corriente ($101.500.000.oo)
PORCENTAJE ANTICIPO	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032
NIT DEL CONTRATISTA	901785936-5
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA	CR 7 # 16 A – 29, Neiva
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Eduardo Joven Grafe
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de diciembre de 2023
PLAZO EJECUCIÓN	8 meses
FECHA INICIO	29 de enero de 2024
FECHA TERMINACIÓN	28 de septiembre de 2024

4.1. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan los documentos de carácter legal que el contrato desde su inicio ha presentado.

Tabla 17. Información del contrato de Interventoría

No.	DOCUMENTO	FECHA DE FIRMA
1	Contrato de obra No. 699-2023-CMA (99056)	29/12/2023
2	Acta de inicio	29/01/2024
3	Prorroga de un mes	28/08/2024

4.1.1. RELACIÓN DE PÓLIZA

El contrato de interventoría No. 699-2023-CMA (99056) cuenta con la póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 100036010 y la de responsabilidad civil No. 100005976, expedida por la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL tu compañía de seguros.

Tabla 18. Relación de Pólizas del contrato de Obra

PÓLIZA DE SEGURO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 96-44-101187700 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	$ 10.150.000	29/01/2024	30/09/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.075.000	29/01/2024	28/09/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 30.450.000	29/08/2024	21/11/2029
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.			

4.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 19. Información financiera del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
CONDICIONES CONTRACTUALES - FORMA DE PAGO			Acumulado Anterior	Presente Acta	Acumulado	Saldo
Concepto	%	Valor				
a) Pagos por avance de obra	95%	$ 81.029.412	$ 76.649.615	$ 8.644.503	$ 85.294.118	-$ 4.264.706
b) Pago contra liquidación	5%	$ 4.264.706	$ -			$ 4.264.706
SUBTOTAL	100%	$ 85.294.118	$ 76.649.615	$ 8.644.503	$ 85.294.118	$ -
IVA	19%	$ 16.205.882	$ 14.563.427	$ 1.642.455	$ 16.205.882	$ -
VALOR A COBRAR		**$ 101.500.000**	$ 91.213.042	$ 10.286.958	$ 101.500.000	$ -

4.3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.3.1. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En la siguiente tabla, se relaciona el listado de personal (mínimo requerido administrativo) para la ejecución del contrato de acuerdo con los pliegos del contrato de obra.

Tabla 20. Personal dispuesto por parte de la Interventoría

CARGO	PROFESIONAL	CEDULA	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE	7.713.442	50%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOURDAN YALID MARIN HURTADO	1.030.627.623	20% MES 1 100% MES 2 AL MES 7
ESPECIALISTA EN AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO	VICTOR ALFONSO MANRIQUE ANDRADE	80.751.278	20% MES 1 AL MES 3 10% MES 4 AL MES 7

Tabla 21. Control de personal de interventoría

PERSONAL DE INTERVENTORÍA EN EL MES DE FEBRERO			
PROFESIONAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ESPECIALISTA EN AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
DEDICACIÓN	50%	100%	20%

4.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

- El día 2 de abril mediante el oficio No. CE-CU23-028, radicado bajo consecutivo 2024-551-003888-2 la interventoría realizó la entrega del informe de interventoría de los diagnósticos a la entidad.

- El día 2 de abril mediante el oficio No. CE-CU23-029, la interventoría realizó la entrega de la información estadística sociales del contrato de interventoría y obra.

- El día 2 de abril mediante el oficio No. CE-CU23-030, la interventoría solicita todos los documentos contractuales al contratista de obra.

- El día 9 de abril mediante el oficio No. CE-CU23-031, radicado bajo consecutivo 2024-551-004307-2, la interventoría presenta el acta de los Np para aprobación de la supervisión según la información del contratista.

- El día 10 de abril mediante el oficio No. CE-CU23-032, radicado bajo consecutivo 2024-551-004871-2, la interventoría traslada la solicitud del supervisor ambiental y SST.

- El día 17 de abril mediante el oficio No. CE-CU23-033, radicado bajo consecutivo 2024-551-004900-2 la interventoría aprueba y traslada la hoja de vida del profesional residente de obra propuesto por el contratista.

- El día 26 de abril mediante el oficio No. CE-CU23-034, radicado bajo consecutivo 2024-551-005444-2 la interventoría aprueba y traslada la hoja de vida del profesional residente social propuesto por el contratista.

- El día 6 de junio mediante el oficio No. CE-CU23-045, radicado bajo consecutivo 2024-551-008326-2 la interventoría realizó el traslado del acta parcial de pago No 3 de obra.

- El día 6 de junio mediante el oficio No. CE-CU23-046, radicado bajo consecutivo 2024-551-008325-2 la interventoría realizó la entrega el acta parcial de pago No 3 de interventoría.

- El día 7 de junio mediante el oficio No. CE-CU23-047, la interventoría realizó la entrega del informe mensual de obra No 4 bajo consecutivo 2024-551-008323-2.

- El día 7 de junio mediante el oficio No. CE-CU23-048, la interventoría realizó la entrega del informe mensual de interventoría No 4 bajo consecutivo 2024-551-008322-2.

- El día 27 de junio mediante el oficio No. CE-CU23-049, la interventoría realizó el traslado una vez realizado la revisión de los ítems No previstos No 2 bajo consecutivo 2024-551-009507-2.

- El día 27 de junio mediante el oficio No. CE-CU23-050, la interventoría realizó el traslado una vez realizado la revisión de la solicitud de modificación contractual por adición No 1, bajo consecutivo 2024-551-009508-2.

- El día 16 de julio mediante el oficio No. CE-CU23-051, radicado bajo consecutivo 2024-551-011010-2 la interventoría realizó el traslado de solicitud de pago inmediato del contrato de obra.

- El día 16 de julio mediante el oficio No. CE-CU23-052, radicado bajo consecutivo 2024-551-011009-2 la interventoría realizó el traslado de la solicitud de suspensión del contrato de obra.

- El día 25 de julio mediante el oficio No. CE-CU23-053, la interventoría realizó el traslado del oficio del contratista cuya solicitud fue reiteración solicitud de suspensión bajo consecutivo 2024-551-011573-2.

- El día 13 de agosto mediante el oficio No. CE-CU23-055, radicado bajo consecutivo 2024-551-012677-2 la interventoría realizó el traslado de solicitud de modificación contractual prorroga en tiempo de contrato de obra

- El día 13 de agosto mediante el oficio No. CE-CU23-056, radicado bajo consecutivo 2024-551-012675-2 la interventoría radico la solicitud de modificación contractual prorroga en tiempo contrato de interventoria.

- El día 28 de agosto mediante el oficio No. CE-CU23-057, la interventoría realizó la revisión y traslado del acta de pago No 4 bajo consecutivo 2024-551-013340-2.

- El día 30 de agosto mediante oficios No. CE-CU23-058 y No. CE-CU23-059, la interventoría realizó la revisión y traslado del acta de los informes mensuales No 5 y 6 de obra bajo consecutivos 2024-551-013513-2 y 2024-551-013514-2

4.4.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo de ejecución del contrato la interventoría realizó el acompañamiento en el área social del contratista a las siguientes actividades:

- El día 02 de mayo, en recorrido de reconocimiento, inspección y verificación de las labores constructivas que se realizaron en el acueducto Aguas Claras Olarte y en el acueducto Asopicos Andes con la participaron de los representantes del contratista, interventoría y supervisión.

- El día 06 de mayo, en recorrido de reconocimiento, inspección y verificación de las labores realizadas en el acueducto Aguas Claras

Olarte y en el acueducto Asopicos Andes con la participaron de los representantes del contratista, interventoría y supervisión.

- El día 20 de mayo, recorrido de reconocimiento y verificación de las labores constructivas ejecutadas en el acueducto Asopicos Andes y Chiguaza más exactamente en el predio del señor Omar Bohórquez.

- El día 28 de mayo, se realiza reunión presencial en las oficinas de la Alcaldía de Usme, con representantes de los acueductos, secretaria de hábitat, contratista y supervisión donde se exponen avances del proyectos, observaciones y preocupaciones de las partes.

- Se realiza revisión y tramite de acta parcial No 2 presentada por el contratista junto con todos los soportes.

- Se realiza revisión y se da el trámite respectivo a documentación presentada por el contratista (solicitud de subcontratista, análisis de precios unitarios, informe mensual y Diseño de valla).

- Se realiza acompañamiento al contratista en obra para ejecutar el predio de los Gómez.

- Se realiza acompañamiento para la instalación del Pmt en el predio de los Gómez.

- El día 06 de junio, en recorrido de reconocimiento, inspección y verificación de las alternativas de solución para la intervención en la Ptap del sistema de acueducto Asopicos Andes con la participaron de los representantes del contratista, interventoría, secretaria de hábitat y supervisión.

- El día 27 de junio, se realiza acompañamiento en las instalaciones de la alcaldía local de Usme con contratista, supervisión, representantes de los acueductos veredales, representantes de las EAAB y de la secretaria de hábitat, tratando temas relacionados con el alcance y avance del contrato.

- El día 24 de junio, se realiza acompañamiento al predio El Arrayan en donde se logra la autorización por parte del propietario para la intervención en el predio.

- El día 10 de julio, se realiza acompañamiento en las instalaciones de la alcaldía local de Usme con el contratista, la supervisión, representantes de los acueductos veredales, de la secretaria de hábitat y de la EAAB.

- Se realiza acompañamiento al contratista en obra para retomar actividades en los predios el durazno del acueducto Aguas Claras Olarte y el predio El Arrayan del sistema de acueducto Asogualinda Chiguaza.

- Se realiza revisión y tramite de acta parcial No 3 presentada por el contratista junto con todos los soportes.

- Se realiza revisión y se da el trámite respectivo a documentación presentada por el contratista (análisis de precios unitarios No 2, informe mensual y Solicitud de adición).

4.4.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

Las actividades SSTMA ejecutadas en el periodo del presente informe fueron las siguientes:

- Se verifican las inducciones Ambientales y SST al personal.
- Se realiza seguimiento al cronograma de actividades SSTMA
- Se verifica campamento móvil para los trabajadores con instalación de kit de emergencias, punto ecológico.
- Se realizo revisión y aprobación de los informes mensuales del componente SST y ambiental.

4.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

4.5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO REPORTADO

Tabla 22. Correspondencia enviada por la interventoría

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DESTINATARIO	ANEXOS	OBSERVACIONES
1/2/2024	CE-CU23-001	NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL.	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Modificatorio No.1 del Acuerdo Consorcial y el RUT.	Radicado en fisico 2024-551-002164-2 14/02/24
2/2/2024	CE-CU23-002	CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co consorciousme2023.676@gmail.com	N/A	Radicado en fisico 2024-551-002167-2 14/02/24
5/2/2024	CE-CU23-003	OBLIGACIONES CONTRATISTA DE OBRA	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	N/A	
6/2/2024	CE-CU23-004	SOLICITUD DE FORMATOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y HOJAS DE VIDA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	N/A	Radicado en fisico 2024-551-002165-2 14/02/24
7/2/2024	CE-CU23-005	ENTREGA DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Acuerdo de Confidencialidad	Radicado en fisico 2024-551-002162-2 14/02/24
8/2/2024	CE-CU23-006	ENTREGA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO AJUSTADA AL ACTA DE INICIO	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Polizas Anexo 1 y 2, certificado de pago	Radicado en fisico 2024-551-002161-2 14/02/24
9/2/2024	CE-CU23-007	TRASLADO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO USME 2023	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Oficio del Consorcio Usme 2023 Canales de comunicación	Radicado en fisico 2024-551-001910-2 12/02/24
9/2/2024	CE-CU23-008	TRASLADO DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Oficio del Consorcio Usme 2023 Acuerdo de	Radicado en fisico 2024-551-001911-2 12/02/24

		CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO USME 2023		confidencialidad	
9/2/2024	CE-CU23-009	TRASLADO Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS AJUSTADAS AL ACTA DE INICIO DE CONTRATISTA DE OBRA CONSOSRCIO USME 2023	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Polizas de cumplimiento anexo 2 y Responsabilidad Civil anexo 2	Radicado en fisico 2024-551-001912-2 12/02/24
13/2/2024	CE-CU23-010	TRASLADO Y APROBACIÓN DEL INFORME SEMANA 29/01/2024 – 03/02/2024 DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO USME 2023	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Informe semana 29/01/2024 – 03/02/2024 del Consorcio Usme 2023	Radicado en fisico 2024-551-002158-2 14/02/24
13/2/2024	CE-CU23-011	TRASLADO Y APROBACIÓN DEL INFORME SEMANA 05/02/2024 – 10/02/2024 DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO USME 2023	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Informe semana 05/02/2024 – 10/02/2024 del Consorcio Usme 2024	Radicado en fisico 2024-551-002159-2 14/02/24
20/2/2024	CE-CU23-012	REVISIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PRESENTADO Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Revision hojas de vida contratista de obra	
28/2/2024	CE-CU23-013	ENTREGA HOJAS DE VIDA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Hojas de vida del personal	Radicado en fisico 2024-551-002819-2 29/02/24
4/03/2024	CE-CU23-014	REITERADA SOLICITUD DE ENTREGA DE HOJAS DEL PERSONAL MINIMO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	N/A	

		CONTRACTUAL			
6/3/2023	CE-CU23-015	SOLICITUD APROBACIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Hoja de vida del residente de interventoria	Radicado en fisico 2024-551-003034-2 6/03/2024
7/3/2023	CE-CU23-016	APROBACIÓN Y TRASLADO HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA DE OBRA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Formato aprobacion y Hojas de vida del personal de obra	Radicado en fisico 2024-551-003085-2 7/03/2024
11/3/2024	CE-CU23-017	ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y ACTA DE REUNIÓN	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y ACTA DE REUNIÓN	Radicado en fisico 2024-552-007059-2 11/03/2024
11/3/2024	CE-CU23-018	TRASLADO Y APROBACIÓN DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA.	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	1, Equipos requeridos 2. Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo Consorcio Usme 2023 3. Manual Ambiental de Obra 4. Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demoliciones. 5. Plan de Gestión social 6. Plan de Calidad	Radicado en fisico 2024-552-007061-2 11/03/2024
14/3/2024	CE-CU23-019	OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO Y DIAGNÓSTICOS	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co		

15/3/2023	CE-CU23-020	SOLICITUD APROBACIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA DEL ESPECIALISTA HIDRÁULICO INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Hoja de vida del especialista hidraulico	Radicado en fisico 2024-551-003472-2 15-03-2024
19/3/2024	CE-CU23-021	TRASLADO Y APROBACIÓN DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTO Y MEMORIAS DE CALCULO	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	1. Diagnostico 2. Justificación 3.Memorias de calculo 4. Presupuesto	Radicado en fisico 2024-551-003579-2 19/03/24
21/3/2024	CE-CU23-022	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co		
21/3/2024	CE-CU23-023	OBSERVACIONES AL ACTA PARCIAL DE PAGO	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co		
22/3/2024	CE-CU23-024	ACTA PARCIAL DE PAGO No.1	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-003769-2 26/03/2024
22/3/2024	CE-CU23-025	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MENSUAL DE OBRA CON SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-003861-2 02/04/2024
22/3/2024	CE-CU23-026	TRASLADO ACTA DE PAGO No. 1 DE OBRA	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE OBRA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-003770-2 26/03/2024
22/3/2024	CE-CU23-027	INFORME MENSUAL DE INTREVENTORÍA No.1	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MESUAL DE INTERVENTORÍA	Radicado en fisico 2024-551-003771-2 26/03/2024
2/4/2024	CE-CU23-028	INFORME DE INTERVENTORÍA DE LOS DIAGNÓSTICOS	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME DE INTERVENTORÍA DE LOS DIAGNÓSTICOS	Radicado en fisico 2024-551-003888-2 02/04/2024

2/4/2024	CE-CU23-029	ENTREGA INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS SOCIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	CUADRO INFORMACIÓN ESTADISTICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
2/4/2024	CE-CU23-030	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	consorciousme2023.676@gmail.com edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co		
9/4/2023	CE-CU23-031	SOLICITUD DE ACTA DE NO PREVISTOS	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE NO PREVISTOS NP, LISTA DEE PRECIOS DE REFERENCIA Y COTIZACIONES	Radicado en fisico 2024-551-004307-2 09/04/2024
10/4/2023	CE-CU23-032	TRASLADO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SUPERVISOR AMBIENTAL Y SST	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	OFICIO DE OBRA	Radicado en fisico 2024-551-004871-2 17/04/2024
17/4/2024	CE-CU23-033	TRASLADO Y APROBACIÓN CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	HOJA DE VIDA CON SOPORTES DEL RESIDENTE DE OBRA	Radicado en fisico 2024-551-004900-2 17/04/2024
26/4/2024	CE-CU23-034	TRASLADO Y APROBACIÓN CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	HOJA DE VIDA CON SOPORTES DEL RESIDENTE SOCIAL	Radicado en fisico 2024-551-005444-2 26/04/2024
7/5/2024	CE-CU23-035	INFORME MENSUAL DE INTREVENTORÍA No.2	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MESUAL DE INTERVENTORÍA No 2	Radicado en fisico 2024-551-006008-2 07/05/2024
7/5/2024	CE-CU23-036	INFORME MENSUAL DE INTREVENTORÍA No.3	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MESUAL DE INTERVENTORÍA No 3	Radicado en fisico 2024-551-006006-2 07/05/2025
7/5/2024	CE-CU23-037	ACTA PARCIAL DE PAGO No.2 DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE OBRA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-006002-2 07/05/2025

7/5/2024	CE-CU23-038	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.2	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MENSUAL DE OBRA CON SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-006009-2 07/05/2025
7/5/2024	CE-CU23-039	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.3	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MENSUAL DE OBRA CON SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-006010-2 07/05/2025
8/5/2024	CE-CU23-040	TRASLADO Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA, PROGRAMA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, FLUJO DE CAJA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	PROGRAMA DE OBRA, PROGRAMA DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y FLUJO DE CAJA	Radicado en fisico 2024-551-0060206-2 08/05/2026
7/5/2024	CE-CU23-041	TRASLADO ACTA DE PAGO No. 2 DE OBRA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE OBRA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-006020-2 07/05/2024
31/05/024	CE-CU23-042	TRASLADO SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTA.	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD Y SOPORTE SUBCONTRATISTA	Radicado en fisico 2024-551-007429-2 31/05/2024
31/5/2024	CE-CU23-043	RADICADO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	APUS	Radicado en fisico 2024-551-007431-2 31/05/2024
31/05/025	CE-CU23-044	REITERACIÓN APROBACIÓN NPS	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD CONTRATISTA	Radicado en fisico 2024-551-007430-2 31/05/2024
7/6/2024	CE-CU23-045	TRASLADO ACTA DE PAGO No. 3 DE OBRA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE OBRA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-007430-2 07/06/2024
7/6/2024	CE-CU23-046	ACTA PARCIAL DE PAGO No.3 DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-008325-2 07/06/2024

7/6/2024	CE-CU23-047	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.4	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MENSUAL DE OBRA CON SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-008323-2 07/06/2024
7/6/2024	CE-CU23-048	INFORME MENSUAL DE INTREVENTORÍA No.4	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MESUAL DE INTERVENTORÍA No 4	Radicado en fisico 2024-551-008322-2 07/06/2024
27/6/2024	CE-CU23-049	APROBACIÓN Y TRASLADO DE ITEMS NO PREVISTOS No 2 (NP´S)	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DE CONTRATISTA, APUS Y SOPORTES	Radicado en fisico 2024-551-009507-2 27/06/2024
27/6/2024	CE-CU23-050	APROBACIÓN Y TRASLADO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE ADICIÓN CONTRATO DE OBRA No. 676-2023-LP (96548)	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DE CONTRATISTA Y SOPORTES	Radicado en fisico 2024-551-009508-2 27/06/2024
16/7/2024	CE-CU23-051	TRAMITE OFICIO CUYO ASUNTO “SOLICITUD DE PAGO INMEDIATO CONTRATO DE OBRA No 676-2023-LP (96548)” A TRAVES DE LA COMUNICACIÓN CU23-029.24	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DE CONTRATISTA Y SOPORTES	Radicado en fisico 2024-551-011010-2 16/07/2024
16/7/2024	CE-CU23-052	TRAMITE A OFICIO CUYO ASUNTO ES “SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA CONTRATO DE OBRA No 676-2023-LP (96548)” A TRAVES DE COMUNICACIÓN CU23-031.24	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DE CONTRATISTA Y SOPORTES	Radicado en fisico 2024-551-011009-2 16/07/2024

25/7/2024	CE-CU23-053	TRAMITE A OFICIO CUYO ASUNTO ES “REITERACIÓN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA CONTRATO DE OBRA No 676-2023- LP (96548)” A TRAVES DE COMUNICACIÓN CU23-034.24	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DE CONTRATISTA Y SOPORTES	Radicado en fisico 2024-551-011573-2 25/07/2024
	CE-CU23-054	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 699-2023-CMA (99056)	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co		
13/8/2024	CE-CU23-055	“SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PRORROGA EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA No 676-2023-LP (96548)” A TRAVES DE COMUNICACIÓN CU23-037.24	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DEL CONTRATISTA	Radicado en fisico 2024-551-012677-2 13/08/2024
13/8/2024	CE-CU23-056	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 699-2023-CMA (99056)	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DEL CONTRATISTA	Radicado en fisico 2024-551-012677-2 13/08/2024
28/8/2024	CE-CU23-057	TRASLADO ACTA DE PAGO NO 4 DE OBRA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE OBRA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-013340-2 28/08/2024
30/8/2024	CE-CU23-058	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No 5.	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MENSUAL DE OBRA CON SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-013513-2 30/08/2024

30/8/2024	CE-CU23-059	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No 6.	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MENSUAL DE OBRA CON SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-013514-2 30/08/2025
2/9/2024	CE-CU23-060	ENTREGA DE PÓLIZAS INTEVENTORIA Y OBRA AJUSTADAS A MODIFICACION CONTRACTUAL (PRORROGA).	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	POLIZAS ACTUALIZADAS OBRA E INTERVENTORIA	Vía correo electronico 02/09/2024
3/9/2024	CE-CU23-061	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MESUAL DE INTERVENTORÍA No 5	Radicado en fisico 2024-551-0140702-2 06/09/2024
3/9/2024	CE-CU23-062	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.6	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MESUAL DE INTERVENTORÍA No 6	Radicado en fisico 2024-551-0140642-2 06/09/2024
5/9/2024	CE-CU23-063	APROBACIÓN Y TRASLADO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE ADICIÓN Y PRORROGA DE DOS MESES CONTRATO DE OBRA No. 676-2023-LP (96548)	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DEL CONTRATISTA	VIA CORREO ELECTRONICO 5/9/2024
5/9/2024	CE-CU23-064	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE ADICIÓN Y PRORROGA DE DOS MESES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 699-2023-CMA (99056)	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	n/A	VIA CORREO ELECTRONICO 5/9/2024

10/9/2024	CE-CU23-065	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.7	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MESUAL DE INTERVENTORÍA No 7	Radicado en fisico 2024-551-0140289-2 06/09/2024
10/9/2024	CEP-066	ACTA PARCIAL DE PAGO No.4 DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-014288-2 11/09/2024
13/9/2024	CEP-067	TRASLADO Y APROBACIÓN CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD CONTRATISTA	VIA CORREO ELECTRONICO 17/9/2024

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DESTIN
1/2/2024	CE-CU23-001	NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL.	edwin.lopez@gobi
2/2/2024	CE-CU23-002	CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN	edwin.lopez@gobi consorciousme202
5/2/2024	CE-CU23-003	OBLIGACIONES CONTRATISTA DE OBRA	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
6/2/2024	CE-CU23-004	SOLICITUD DE FORMATOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y HOJAS DE VIDA	edwin.lopez@gobi
7/2/2024	CE-CU23-005	ENTREGA DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	edwin.lopez@gobi
8/2/2024	CE-CU23-006	ENTREGA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO AJUSTADA AL ACTA DE INICIO	edwin.lopez@gobi
9/2/2024	CE-CU23-007	TRASLADO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO USME 2023	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
9/2/2024	CE-CU23-008	TRASLADO DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO USME 2023	consorciousme202 edwin.lopez@gobi

9/2/2024	CE-CU23-009	TRASLADO Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS AJUSTADAS AL ACTA DE INICIO DE CONTRATISTA DE OBRA CONSOSRCIO USME 2023	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
13/2/2024	CE-CU23-010	TRASLADO Y APROBACIÓN DEL INFORME SEMANA 29/01/2024 – 03/02/2024 DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO USME 2023	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
13/2/2024	CE-CU23-011	TRASLADO Y APROBACIÓN DEL INFORME SEMANA 05/02/2024 – 10/02/2024 DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO USME 2023	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
20/2/2024	CE-CU23-012	REVISIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PRESENTADO Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
28/2/2024	CE-CU23-013	ENTREGA HOJAS DE VIDA	edwin.lopez@gobi
4/03/2024	CE-CU23-014	REITERADA SOLICITUD DE ENTREGA DE HOJAS DEL PERSONAL MINIMO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
6/3/2023	CE-CU23-015	SOLICITUD APROBACIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobi
7/3/2023	CE-CU23-016	APROBACIÓN Y TRASLADO HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA DE OBRA	edwin.lopez@gobi
11/3/2024	CE-CU23-017	ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y ACTA DE REUNIÓN	consorciousme202 edwin.lopez@gobi

11/3/2024	CE-CU23-018	TRASLADO Y APROBACIÓN DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA.	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
14/3/2024	CE-CU23-019	OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO Y DIAGNÓSTICOS	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
15/3/2023	CE-CU23-020	SOLICITUD APROBACIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA DEL ESPECIALISTA HIDRÁULICO INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobi
19/3/2024	CE-CU23-021	TRASLADO Y APROBACIÓN DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTO Y MEMORIAS DE CALCULO	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
21/3/2024	CE-CU23-022	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
21/3/2024	CE-CU23-023	OBSERVACIONES AL ACTA PARCIAL DE PAGO	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
22/3/2024	CE-CU23-024	ACTA PARCIAL DE PAGO No.1	edwin.lopez@gobi
22/3/2024	CE-CU23-025	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
22/3/2024	CE-CU23-026	TRASLADO ACTA DE PAGO No. 1 DE OBRA	consorciousme202 edwin.lopez@gobi

22/3/2024	CE-CU23-027	INFORME MENSUAL DE INTREVENTORÍA No.1	edwin.lopez@gobi
2/4/2024	CE-CU23-028	INFORME DE INTERVENTORÍA DE LOS DIAGNÓSTICOS	edwin.lopez@gobi consorciousme202
2/4/2024	CE-CU23-029	ENTREGA INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS SOCIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobi
2/4/2024	CE-CU23-030	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	consorciousme202 edwin.lopez@gobi
9/4/2023	CE-CU23-031	SOLICITUD DE ACTA DE NO PREVISTOS	edwin.lopez@gobi
10/4/2023	CE-CU23-032	TRASLADO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SUPERVISOR AMBIENTAL Y SST	edwin.lopez@gobi
17/4/2024	CE-CU23-033	TRASLADO Y APROBACIÓN CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA	edwin.lopez@gobi
26/4/2024	CE-CU23-034	TRASLADO Y APROBACIÓN CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL	edwin.lopez@gobi
7/5/2024	CE-CU23-035	INFORME MENSUAL DE INTREVENTORÍA No.2	edwin.lopez@gobi
7/5/2024	CE-CU23-036	INFORME MENSUAL DE INTREVENTORÍA No.3	edwin.lopez@gobi

7/5/2024	CE-CU23-037	ACTA PARCIAL DE PAGO No.2 DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobi
7/5/2024	CE-CU23-038	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.2	edwin.lopez@gobi
7/5/2024	CE-CU23-039	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.3	edwin.lopez@gobi
8/5/2024	CE-CU23-040	TRASLADO Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA, PROGRAMA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, FLUJO DE CAJA	edwin.lopez@gobi
7/5/2024	CE-CU23-041	TRASLADO ACTA DE PAGO No. 2 DE OBRA	edwin.lopez@gobi
31/05/024	CE-CU23-042	TRASLADO SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTA.	edwin.lopez@gobi
31/5/2024	CE-CU23-043	RADICADO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	edwin.lopez@gobi
31/05/025	CE-CU23-044	REITERACIÓN APROBACIÓN NPS	edwin.lopez@gobi
7/6/2024	CE-CU23-045	TRASLADO ACTA DE PAGO No. 3 DE OBRA	edwin.lopez@gobi
7/6/2024	CE-CU23-046	ACTA PARCIAL DE PAGO No.3 DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobi

7/6/2024	CE-CU23-047	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.4	edwin.lopez@gobi
7/6/2024	CE-CU23-048	INFORME MENSUAL DE INTREVENTORÍA No.4	edwin.lopez@gobi
27/6/2024	CE-CU23-049	APROBACIÓN Y TRASLADO DE ITEMS NO PREVISTOS No 2 (NP´S)	edwin.lopez@gobi
27/6/2024	CE-CU23-050	APROBACIÓN Y TRASLADO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE ADICIÓN CONTRATO DE OBRA No. 676-2023-LP (96548)	edwin.lopez@gobi
16/7/2024	CE-CU23-051	TRAMITE OFICIO CUYO ASUNTO "SOLICITUD DE PAGO INMEDIATO CONTRATO DE OBRA No 676-2023-LP (96548)" A TRAVES DE LA COMUNICACIÓN CU23-029.24	edwin.lopez@gobi
16/7/2024	CE-CU23-052	TRAMITE A OFICIO CUYO ASUNTO ES "SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA CONTRATO DE OBRA No 676-2023-LP (96548)" A TRAVES DE COMUNICACIÓN CU23-031.24	edwin.lopez@gobi
25/7/2024	CE-CU23-053	TRAMITE A OFICIO CUYO ASUNTO ES "REITERACIÓN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA CONTRATO DE OBRA No 676-2023-LP (96548)" A TRAVES DE COMUNICACIÓN CU23-034.24	edwin.lopez@gobi
	CE-CU23-054	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 699-2023-CMA (99056)	edwin.lopez@gobi
13/8/2024	CE-CU23-055	"SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PRORROGA EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA No 676-2023-LP (96548)" A TRAVES DE COMUNICACIÓN CU23-037.24	edwin.lopez@gobi

13/8/2024	CE-CU23-056	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 699-2023-CMA (99056)	edwin.lopez@gobi
28/8/2024	CE-CU23-057	TRASLADO ACTA DE PAGO NO 4 DE OBRA	edwin.lopez@gobi
30/8/2024	CE-CU23-058	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No 5.	edwin.lopez@gobi
30/8/2024	CE-CU23-059	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No 6.	edwin.lopez@gobi
2/9/2024	CE-CU23-060	ENTREGA DE PÓLIZAS INTEVENTORIA Y OBRA AJUSTADAS A MODIFICACION CONTRACTUAL (PRORROGA).	edwin.lopez@gobi
3/9/2024	CE-CU23-061	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5	edwin.lopez@gobi
3/9/2024	CE-CU23-062	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.6	edwin.lopez@gobi
5/9/2024	CE-CU23-063	APROBACIÓN Y TRASLADO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE ADICIÓN Y PRORROGA DE DOS MESES CONTRATO DE OBRA No. 676-2023-LP (96548)	edwin.lopez@gobi
5/9/2024	CE-CU23-064	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE ADICIÓN Y PRORROGA DE DOS MESES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 699-2023-CMA (99056)	edwin.lopez@gobi
10/9/2024	CE-CU23-065	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.7	edwin.lopez@gobi

10/9/2024	CEP-066	ACTA PARCIAL DE PAGO No.4 DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobi
13/9/2024	CEP-067	TRASLADO Y APROBACIÓN CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL	edwin.lopez@gobi

En la siguiente tabla, se relaciona la correspondencia recibida por la interventoría.

Tabla 23. Correspondencia recibida

FECHA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	REMITENTE	ANEXOS
2/02/2024	C-CU23-002.24	Canales oficiales de comunicación	CONSORCIO USME 2023 consorciousme2023.676@gmail.com	N/A
6/2/2024		Actas de reunion	Edwin Andres Lopez Amaya edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Enlace de las actas de reunión
6/2/2024		Formato acuerdo de confidencialidad	Edwin Andres Lopez Amaya edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Formato acuerdo de confidencialidad
6/2/2024		Escaner Contratos anteriores Acueductos Veredales	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Contratos anteriores escaneados
8/2/2024		Solicitud de Información COP-676-2023 INT 699-2023	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	
8/2/2024	C-CU23-001.24	C-CU23-001.24 ENTREGA PÓLIZAS CTO 676-2023-LP (96548)	consorciousme2023.676@gmail.com	Polizas ajustadas al acta de inicio
8/2/2024		C-CU23-003.24 ENTREGA FORMATO HOJA DE VIDA TIPO FDLU	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Formato relacion experiencia
8/2/2024	C-CU23-004.24	C-CU23-004.24 - ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	consorciousme2023.676@gmail.com	Acuerdo de confidencialidad del contratista de obra
12/2/2024		INFORME SEMANA 29/01/2024 - 03/02/2024	consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME SEMANA 29/01/2024 - 03/02/2024
12/2/2024		INFORME SEMANA 5/02/2024 - 10/05/2024	consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME SEMANA 5/02/2024 - 10/05/2024
13/02/2024		Designación apoyo a la supervisión 699-2023 Edwin Lopez	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Designacion del supervisor del contrato

13/02/2024	C-CU23-005.24	ENTREGA HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL, EQUIPOS Y PLANES DE GESTIÓN	consorciousme2023.676@gmail.com	1. Hojas de Vida 2. Equipos 3. SST 4. MAO 5. PG-RCD 6. Plan de gestion social 7. Plan de calidad
26/02/2024		Diagnósticos Acueductos Veredales COP-607-2023 INT 699-2023	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Diagnostico Acueductos Veredales
28/02/2024		Acta de aprobacion de Hojas de Vida para firma	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Formato Acta de aprobacion de Hojas de Vida
29/02/2024		Manual Indumentaria equipo de obra COP-676-2023 INT-699-2023	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Manual Indumentaria equipo de obra Instituto de Desarrollo Urbano
5/03/2024	C-CU23-006.24	SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL	consorciousme2023.676@gmail.com	Hoja de vida del: Director de Obra Residente de Obra Especialista hidraulico
7/03/2024		APROBACIÓN HV INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Acta de aprobacion de las hojas de vida Acta de reunion entrega de HV
11/03/2024		APROBACIÓN POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	1. APROBACIÓN POLIZAS INICILAES CU Y RCE OBRA 3. APROBACIÓN POLIZA INICIAL CTO INTERVENTORIA 4. APROBACION POLIZA ACTA DE INICIO CTO INTERVENTORIA 2. -APROBACIÓN POLIZAS ACTA DE INICIO CU Y RCE OBRA
13/03/2024	C-CU23-007.24	ENTREGA DIAGNÓSTICOS ACUEDUCTOS RURALES	consorciousme2023.676@gmail.com	1. Tres diagnosticos 2. Justificacion 3. Memorias de calculo 4. Presupuesto
14/03/2024		ACTA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE OBRA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Acta de aprobación de las hojas de vida del personal de obra

15/03/2024	C-CU23-008.24	SUBSANE OBSERVACIONES ENTREGA DE DIAGNÓSTICOS Y PRESUPUESTO.	consorciousme2023.676@gmail.com	1. Daiganosticos de cada acueducto 2. Justificación 3. Memorias de calculo 4. Presupuesto
20/03/2024	C-CU23-009.24	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.1 y ANEXOS	consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME MENSUAL DE OBRA Y ANEXOS
20/03/2024	C-CU23-010.24	ENTREGA ACTA No: 1 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	consorciousme2023.676@gmail.com	ACTA DE PAGO No.1 DE OBRA Y ANEXOS
22/03/2024	C-CU23-011.24	CORRECCIÓN OBSERVACIONES ENTREGA ACTA No: 1 PARCIAL DE OBRA	consorciousme2023.676@gmail.com	ACTA DE PAGO No.1 DE OBRA Y ANEXOS
22/03/2024	C-CU23-012.24	CORRECCIONES INFORME MENSUAL DE OBRA No.1 y ANEXOS	consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME MENSUAL DE OBRA Y ANEXOS
1/04/2024		OBSERVACIONES AL ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	OBSERVACIONES AL ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA
2/04/2024	C-CU23-013.24	ESTADISTICAS DE EMPLEO	consorciousme2023.676@gmail.com	
9/04/2024	C-CU23-015.24	Solicitud información Supervisor Ambiental y SST	consorciousme2023.676@gmail.com	
12/04/2024		Solicitud de Autorización para Uso de Formatos - Componente Social	consorciousme2023.676@gmail.com	Formato acta de vecindad
12/04/2024		Aprobacion para el uso del formato acta de vecindad	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Formato acta de vecindad
15/04/2024		OBSERVACIONES AL ACTA DE NO PREVISTOS	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Observaciones al acta NP No.1
15/04/2024		INFORMACION DE CONTACTO DEL PROFESIONAL PIGA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Nombre y numero de telefono del profesional PIGA de la Alcaldia
16/04/2024	C-CU23-016.24	Solicitud de aprobación del profesional para el cargo residente de obra	consorciousme2023.676@gmail.com	Hoja de vida y soportes del profesional
17/04/2024		APROBACIÓN CAMBIO DE HOJA DE VIDA PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATO NO 699 DE 202	yeimy.rozo@gobiernobogota.gov.co	Oficio aprobacion hoja de vida del residente de interventoria
17/04/2024		APROBACIÓN CAMBIO DE HOJA DE VIDA PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATO NO 699 DE 2023	yeimy.rozo@gobiernobogota.gov.co	Oficio aprobacion hoja de vida del especialista
23/04/2024		INFORMACION DE CONTACTO DEL NUEVO PROFESIONAL PIGA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	Nombre y numero de telefono del profesional PIGA de la Alcaldia
26/04/2024	C-CU23-017.24	Solicitud de aprobación del profesional para el cargo residente social	consorciousme2023.676@gmail.com	Hoja de vida y soportes del profesional
30/04/2024	C-CU23-018.24	ENTREGA INFORME MENSUAL No.2	consorciousme2023.676@gmail.com	Informe mensual No. 2 con sus anexos
2/05/2024	C-CU23-019.24	ENTREGA ACTA No: 2 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.	consorciousme2023.676@gmail.com	ACTA DE PAGO No.2 DE OBRA Y ANEXOS
3/05/2024	C-CU23-020.24	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.3 y ANEXOS.	consorciousme2023.676@gmail.com	Informe mensual No. 3 con sus anexos
3/05/2024	C-CU23-021.24	ENTREGA PROGRAMA DE OBRA, PROGRAMA DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y FLUJO DE CAJA	consorciousme2023.676@gmail.com	Programa de obra. Programa de suministro de insumos y flujo de caja

14/05/2024	C-CU23-022.24	SOLICITUD APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTA.	consorciousme2023.676@gmail.com	SOPORTES DE EXPERIENCIA
17/05/2024	C-CU23-023.24	REMISIÓN CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TUBERIA	consorciousme2023.676@gmail.com	CERTIFICADO DE CALIDAD
20/05/2024	C-CU23-024.24	REMISIÓN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	consorciousme2023.676@gmail.com	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
29/05/2024	C-CU23-025.24	REITERACION APROBACION NPS Y SOLICITUD MODIFICACION	consorciousme2023.676@gmail.com	1,OFICIO CE-CU23-018 RADICADO 2024-551-003579-2 DERIVADO DE C-CU23-008.24 Y C-CU23-007-24 2. OFICIO CE-CU23-031 RADICADO 2024-551-004307-2 DERIVADO DE C-CU23-014.24 3. ACTAS DE COMITÉ 6-7-8-9-10 (2 MAYO- 6 MAYO – 14 MAYO - 20 MAYO – 28 MAYO)
1/06/2024	C-CU23-026.24	ENTREGA ACTA No: 3 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.	consorciousme2023.676@gmail.com	ACTA DE PAGO PARCIAL NO 3 Y ANEXOS
4/06/2024	C-CU23-027.24	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.4 y ANEXOS.	consorciousme2023.676@gmail.com	Informe mensual No. 4 con sus anexos
18/06/2024	C-CU23-028.24	Radicación de presupuesto Optimización Ptap Asopicos Andes, Análisis de precios unitarios (APU`S), NO previstos (NP) No 2. para el contrato de referencia.	consorciousme2023.676@gmail.com	Analisis de precios unitarios No 2.
20/06/2024	C-CU23-029.24	Solicitud inmediata pago de actas parciales	consorciousme2023.676@gmail.com	Anexo 1: Radicado Acta parcial No 2. Anexo 2 Radicado Acta parcial No 3.
20/06/2024	C-CU23-030.24	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (ADICION EN RECURSOS)	consorciousme2023.676@gmail.com	N/a
20/06/2024	C-CU23-031.24	Solicitud suspensión inmediata del contrato de obra No. 676-2023-LP (96548)	consorciousme2023.676@gmail.com	Anexo 1: Radicado solicitud de Aprobación de ítems No previstos. Anexo 2: Radicado Reiteración Solicitud de Nps y Modificación del contrato. Anexo 3. Radicado Solicitud de pago Inmediato.
16/07/2024	C-CU23-032.24	REITERACION APROBACION ITEMS NO PREVISTOS NO 1 Y NO 2.	consorciousme2023.676@gmail.com	1. OFICIO C-CU23-025.24-REITERACIÓN APROBACIÓN NPS. 2. OFICIO C-CU23-028.24- Radicación de presupuesto Optimización Ptap Asopicos Andes, Análisis de precios unitarios (APU`S), NO previstos (NP) No 2. para el contrato de referencia.

24/07/2024	C-CU23-034.24	Reiteración Solicitud suspensión inmediata del contrato de obra No. 676-2023-LP (96548)	consorciousme2023.676@gmail.com	Anexo 1: Radicado solicitud de Aprobación de ítems No previstos. Anexo 2: Radicado Reiteración Solicitud de Nps y Modificación del contrato. Anexo 3. Radicado Solicitud de pago Inmediato. Anexo 4. Radicado Solicitud de suspensión inmediata.
9/08/2024	C-CU23-037.24	Solicitud Modificación contractual (Prorroga en tiempo) del contrato de obra No. 676-2023-LP (96548)	consorciousme2023.676@gmail.com	N/a
13/08/2024	C-CU23-038.24	ENTREGA ACTA No: 4 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.	consorciousme2023.676@gmail.com	ACTA PARCIAL DE OBRA Y SUS ANEXOS
13/08/2024	C-CU23-039.24	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.5 y ANEXOS.	consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME MENSUAL DE OBRA Y ANEXOS
13/08/2024	C-CU23-040.24	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.6 y ANEXOS.	consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME MENSUAL DE OBRA Y ANEXOS
2/09/2024	C-CU23-041.24	Entrega de pólizas acorde a la modificación contractual (prorroga) del contrato 676-2023-LP (96548).	consorciousme2023.676@gmail.com	Polizas emitidas por la entidad aseguradora
3/09/2024	C-CU23-042.24	ALCANCE AL RADICADO No 2024-551-009508-2 SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (ADICION EN RECURSOS Y PRORROGA EN TIEMPO DE DOS MESES).	consorciousme2023.676@gmail.com	Acta de reunion No 10, Diagnosticos, matriz de necesidades
4/09/2024	C-CU23-043.24	INCONVENIENTES EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	consorciousme2023.676@gmail.com	N/a
11/09/2024	C-CU23-044.24	Solicitud de aprobación del profesional para el cargo de residente del área social.	consorciousme2023.676@gmail.com	SOPORTES DE EXPERIENCIA

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato 676-2023-LP (96548) se ejecutó un avance físico ejecutado del 100% con respecto al valor contratado, distribuido en los tres acueductos veredales, en donde se invirtieron en obra en el Acueducto Aguas Claras Olarte un total de $439.117.627 en el acueducto de Asoagualinda Chiguaza $203.059.070 y en Asopicos Andes $271.323.303 para un total de $913.500.000

- Durante la ejecución del contrato no se presentaron accidentes ni incidentes laborales

- Las obras ejecutadas se recibieron a satisfacción por los representantes de los acueductos veredales, la interventoría y la supervisión.

- Una vez terminado el contrato se cuenta con una avance financiero del contrato de obra del 100% y un avance financiero del contrato de interventoría de 89.97% quedado un saldo por pagar del 10,13% que corresponde a $10.286.958 (Diez millones, doscientos ochenta y seis mil, novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte.
