SGC-CP-17115-25
Neiva, julio 16 de 2025

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor

Ref.: Contrato interventoría No.485 de 2024
Asunto: Informe de interventoría No.6.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 30 de junio de 2025, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.6
2. Informes semanales del periodo
3. Acta de comité
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA 6

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	6	Periodo comprendido entre el :	1 de junio de 2025	y el:	30 de junio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."			Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		
Contrato Nº:	485 DE 2024			Contrato Nº:	490 DE 2024		
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	C.C:	79.142.300	Contratista:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	Nit.:	901898260-0
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES			Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES		
Plazo adicional 1:	N/A			Plazo adiciona 1:	N/A		
Plazo total:	OCHO (8) MESES			Plazo total:	OCHO (8) MESES		
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2024			Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2024		
Fecha de Terminación:	27 de agosto de 2025			Fecha de Terminación:	27 de agosto de 2025		
Fecha Suspensión 1:	N/A			Fecha de Suspensión:	N/A		
Fecha Reinicio 1:	N/A			Fecha de Reinicio:	N/A		
Valor Inicial:	$		68.352.127,00	Valor Inicial:	$		615.192.918,00
Valor adicional 1:	$		-	Valor adicional 1:	$		-
Valor total:	$		68.352.127,00	Valor total:	$		615.192.918,00
Valor pagado:	$		29.951.901,96	Valor pagado:	$		269.589.948,00
Valor por pagar:	$		38.400.225,04	Valor por pagar:	$		345.602.970,00
Nombre Supervisor:	JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ			Nombre Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/12/2024	5/03/2026	$ 20.505.638,10
Prestaciones sociales	30/12/2024	31/08/2028	$ 6.835.212,70
Calidad del servicio	31/08/2025	31/08/1930	$ 20.505.638,10

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30/12/2024	2/03/2026	$ 184.557.875,40
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.laborales	30/12/2024	30/08/2028	$ 61.519.291,80
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses		$ 246.077.167,20
Responsabilidad civil extracontractual	30/12/2024	30/08/2025	$ 260.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de interventoría No.1		$ 29.951.901,96
Acta parcial de interventoría No.2	N/A	$ 38.400.225,04

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de obra No.1	28/05/2025	$ 269.589.948,00
Acta parcial de obra No.2		$ 345.602.970,00

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	55,35%	18,99%	74,34%
% Ejecutado	79,99%	20,01%	100,00%
Diferencia	24,63%	1,02%	25,66%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 340.537,62	$ 116.825,37	$ 457.362,99	74,34%
% Ejecutado	$ 492.080,15	$ 123.112,77	$ 615.192,92	100,00%
Diferencia	$ 151.542,53	$ 6.287,40	$ 157.829,93	25,66%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El contratista en este periodo realizó: Tres (3) secaderos de café, cinco (5) campos de infiltración, siete (7) sistemas sépticos de aguas residuales domésticas, un (1) sistema septico de aguas residuales no domesticas, finalizando el alcance contractual.

2. PERSONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA


PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	2		100,00%	0,00%	2
TÉCNICO			0,00%	0,00%	0
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	2	0	100,00%	0,00%	2
TOTALES	2		100,00%		






CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	0	3	0,00%	17,65%	3
TÉCNICO	1	2	5,88%	11,76%	3
M.O.N.C.	5	6	29,41%	35,29%	11
TOTAL	6	11	35,29%	64,71%	17
TOTALES	17		100,00%		

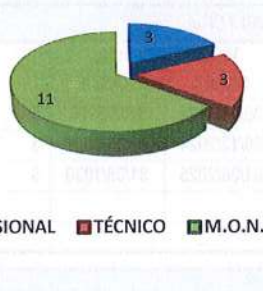


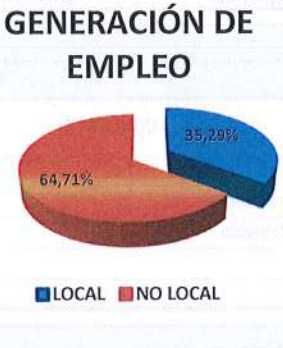

CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA**	**6**

Ingeniería & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

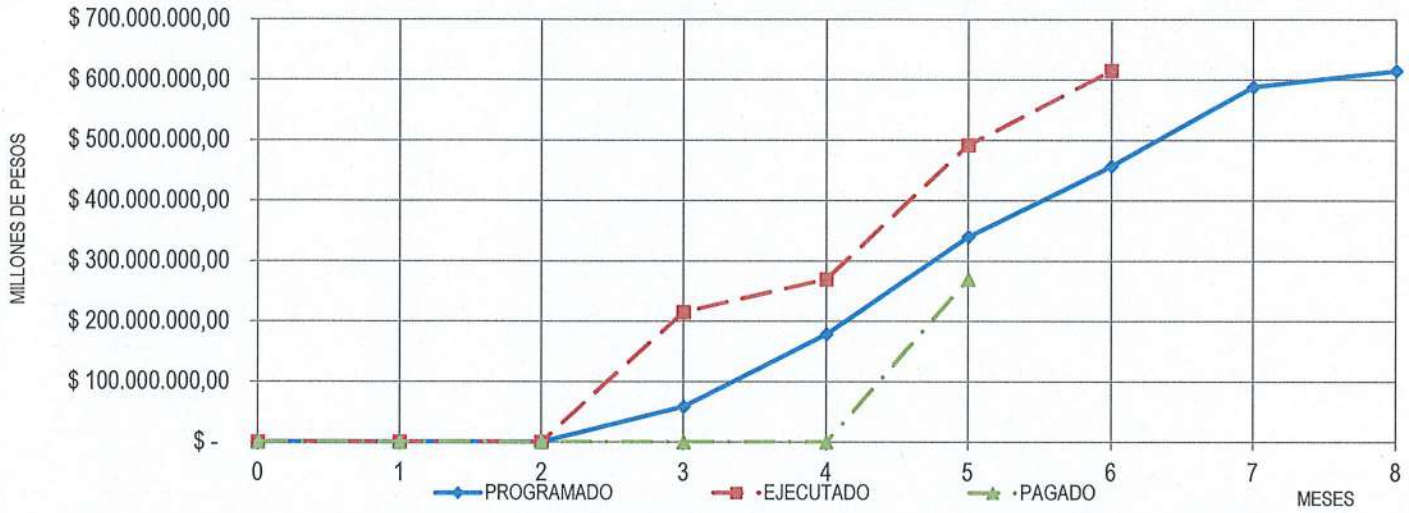

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría en este periodo realizó seguimiento y control a las actividades ejecutadas por el contratista, las cuales se realizaron de acuerdo a las especificaciones técnicas.
En el presente período informado, el contratista finalizó las obras objeto del contrato de obra pública No.490 de 2024, asi como los 5 talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: WILLIAM PARRA OLAYA Cargo: Residente de Interventoria	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Cargo: Contratista Interventor	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Cargo: Contratista Interventor

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

6

Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	490 DE 2024			Contratista:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
Periodo:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025	Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN			Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	200,00	$ 8.809,00	$ 1.761.800,00	125,00	75,00	200,00	$ 1.101.125,00	$ 660.675,00	$ 1.761.800,00		
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,80	$ 23.031,00	$ 110.548,80	3,00	1,80	4,80	$ 69.093,00	$ 41.455,00	$ 110.548,00		
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 846.760,00	$ 5.419.264,00	4,00	2,40	6,40	$ 3.387.040,00	$ 2.032.224,00	$ 5.419.264,00		
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS	UND	8,00	$ 3.738.767,00	$ 29.910.136,00	5,00	3,00	8,00	$ 18.693.835,00	$ 11.216.301,00	$ 29.910.136,00		
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÀNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	8,00	$ 3.045.982,00	$ 24.367.856,00	5,00	3,00	8,00	$ 15.229.910,00	$ 9.137.946,00	$ 24.367.856,00		
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	8,00	$ 1.287.485,00	$ 10.299.880,00	5,00	3,00	8,00	$ 6.437.425,00	$ 3.862.455,00	$ 10.299.880,00		
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA	UND	64,00	$ 522.873,00	$ 33.463.872,00	40,00	24,00	64,00	$ 20.914.920,00	$ 12.548.952,00	$ 33.463.872,00		
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	8,00	$ 700.000,00	$ 5.600.000,00	8,00		8,00	$ 5.600.000,00	$ -	$ 5.600.000,00		
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	64,00	$ 70.000,00	$ 4.480.000,00	64,00		64,00	$ 4.480.000,00	$ -	$ 4.480.000,00		
2	Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.												
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	125,00	$ 8.809,00	$ 1.101.125,00	125,00		125,00	$ 1.101.125,00	$ -	$ 1.101.125,00		
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	3,00	$ 23.031,00	$ 69.093,00	3,00		3,00	$ 69.093,00	$ -	$ 69.093,00		
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 846.760,00	$ 3.387.040,00	4,00		4,00	$ 3.387.040,00	$ -	$ 3.387.040,00		
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO DE CERRAMIETNO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS	UND	5,00	$ 3.855.389,00	$ 19.276.945,00	5,00		5,00	$ 19.276.945,00	$ -	$ 19.276.945,00		
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÀNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	5,00	$ 3.045.982,00	$ 15.229.910,00	5,00		5,00	$ 15.229.910,00	$ -	$ 15.229.910,00		
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	5,00	$ 1.287.485,00	$ 6.437.425,00	5,00		5,00	$ 6.437.425,00	$ -	$ 6.437.425,00		
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA	UND	40,00	$ 522.873,00	$ 20.914.920,00	40,00		40,00	$ 20.914.920,00	$ -	$ 20.914.920,00		
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	5,00		5,00	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00		
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	40,00	$ 70.000,00	$ 2.800.000,00	40,00		40,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ 2.800.000,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"**												
3,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.	UND	16,00	$ 647.288,00	$ 10.356.608,00	16,00		16,00	$ 10.356.608,00	$ -	$ 10.356.608,00		
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00		3,00	$ 2.100.000,00	$ -	$ 2.100.000,00		
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00		10,00	$ 700.000,00	$ -	$ 700.000,00		
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"**												
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA	UND	16,00	$ 522.873,00	$ 8.365.968,00	16,00		16,00	$ 8.365.968,00	$ -	$ 8.365.968,00		
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00		3,00	$ 2.100.000,00	$ -	$ 2.100.000,00		
4,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00		10,00	$ 700.000,00	$ -	$ 700.000,00		
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**												
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156,00	$ 8.809,00	$ 1.374.204,00	156,00		156,00	$ 1.374.204,00	$ -	$ 1.374.204,00		
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,00	$ 23.031,00	$ 138.186,00	6,00		6,00	$ 138.186,00	$ -	$ 138.186,00		
5,3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	12,00	$ 711.531,00	$ 8.538.372,00	12,00		12,00	$ 8.538.372,00	$ -	$ 8.538.372,00		
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.	UND	12,00	$ 1.785.674,00	$ 21.428.088,00	12,00		12,00	$ 21.428.088,00	$ -	$ 21.428.088,00		
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	12,00	$ 2.515.300,00	$ 30.183.600,00	12,00		12,00	$ 30.183.600,00	$ -	$ 30.183.600,00		
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA	UND	12,00	$ 239.422,00	$ 2.873.064,00	12,00		12,00	$ 2.873.064,00	$ -	$ 2.873.064,00		
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00		6,00	$ 4.200.000,00	$ -	$ 4.200.000,00		
5,8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	96,00	$ 70.000,00	$ 6.720.000,00	96,00		96,00	$ 6.720.000,00	$ -	$ 6.720.000,00		
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**												
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**												
6,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	84,00	$ 8.809,00	$ 739.956,00	56,00	28,00	84,00	$ 493.304,00	$ 246.652,00	$ 739.956,00		
6,1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	151,80	$ 23.031,00	$ 3.496.106,00	94,08	57,72	151,80	$ 2.166.756,00	$ 1.329.349,00	$ 3.496.106,00		
6,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	302,19	$ 123.119,00	$ 37.205.331,00	201,46	100,73	302,19	$ 24.803.554,00	$ 12.401.777,00	$ 37.205.331,00		
6,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	1.140,30	$ 9.168,00	$ 10.454.270,00	760,20	380,10	1.140,30	$ 6.969.514,00	$ 3.484.757,00	$ 10.454.270,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
6,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	83,37	$ 90.189,00	$ 7.519.057,00	55,58	27,79	83,37	$ 5.012.705,00	$ 2.506.352,00	$ 7.519.057,00		
6,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 85.998,00	$ 7.223.832,00	56,00	28,00	84,00	$ 4.815.888,00	$ 2.407.944,00	$ 7.223.832,00		
6,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	UND	21,00	$ 266.204,00	$ 5.590.284,00	14,00	7,00	21,00	$ 3.726.856,00	$ 1.863.428,00	$ 5.590.284,00		
6,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	14,28	$ 144.237,00	$ 2.059.704,00	9,52	4,76	14,28	$ 1.373.136,00	$ 686.568,00	$ 2.059.704,00		
6,1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	21,00	$ 92.161,00	$ 1.935.381,00	14,00	7,00	21,00	$ 1.290.254,00	$ 645.127,00	$ 1.935.381,00		
6,1,10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"	ML	228,34	$ 39.291,00	$ 8.971.627,00	85,00	143,34	228,34	$ 3.339.735,00	$ 5.631.892,00	$ 8.971.626,86		
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**												
6,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	14,91	$ 8.809,00	$ 131.342,00	9,94	4,97	14,91	$ 87.561,00	$ 43.781,00	$ 131.342,00		
6,2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	8,19	$ 23.031,00	$ 188.624,00	6,16	2,03	8,19	$ 141.871,00	$ 46.753,00	$ 188.624,00		
6,2,3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 640.442,00	$ 13.449.282,00	14,00	7,00	21,00	$ 8.966.188,00	$ 4.483.094,00	$ 13.449.282,00		
6,2,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	14,00	7,00	21,00	$ 1.570.072,00	$ 785.036,00	$ 2.355.108,00		
6,3	**5,33**												
6,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	8,61	$ 8.809,00	$ 75.845,00	3,28	5,33	8,61	$ 28.894,00	$ 46.952,00	$ 75.845,00		
6,3,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	5,00	$ 23.031,00	$ 115.155,00	2,00	3,00	5,00	$ 46.062,00	$ 69.093,00	$ 115.155,00		
6,3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	21,00	$ 434.293,00	$ 9.120.153,00	14,00	7,00	21,00	$ 6.080.102,00	$ 3.040.051,00	$ 9.120.153,00		
6,3,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1,00	$ 112.148,00	$ 112.148,00	1,00		1,00	$ 112.148,00	$ -	$ 112.148,00		
6,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".	ML	126,00	$ 33.253,00	$ 4.189.878,00	84,00	42,00	126,00	$ 2.793.252,00	$ 1.396.626,00	$ 4.189.878,00		
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**												
6,4,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100,80	$ 8.809,00	$ 887.947,00	67,20	33,60	100,80	$ 591.964,80	$ 295.982,00	$ 887.947,00		
6,4,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	33,60	$ 23.031,00	$ 773.842,00	22,40	11,20	33,60	$ 515.894,00	$ 257.947,00	$ 773.842,00		
6,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	168,00	$ 36.312,00	$ 6.100.416,00	112,00	56,00	168,00	$ 4.066.944,00	$ 2.033.472,00	$ 6.100.416,00		
6,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	21,00	$ 234.319,00	$ 4.920.699,00	14,00	7,00	21,00	$ 3.280.466,00	$ 1.640.233,00	$ 4.920.699,00		
6,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	17,85	$ 700.000,00	$ 12.495.000,00	17,85		17,85	$ 12.495.000,00	$ -	$ 12.495.000,00		
6,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	126,00	$ 70.000,00	$ 8.820.000,00	126,00		126,00	$ 8.820.000,00	$ -	$ 8.820.000,00		
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**												
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	57,60	$ 8.809,00	$ 507.398,40	33,60	24,00	57,60	$ 295.982,00	$ 211.416,00	$ 507.398,00		
7,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	19,20	$ 23.031,00	$ 442.195,20	11,20	8,00	19,20	$ 257.947,00	$ 184.248,00	$ 442.195,00		
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	96,00	$ 36.312,00	$ 3.485.952,00	56,00	40,00	96,00	$ 2.033.472,00	$ 1.452.480,00	$ 3.485.952,00		
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	12,00	$ 234.319,00	$ 2.811.828,00	7,00	5,00	12,00	$ 1.640.233,00	$ 1.171.595,00	$ 2.811.828,00		
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00		6,00	$ 4.200.000,00	$ -	$ 4.200.000,00		
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	48,00	$ 70.000,00	$ 3.360.000,00	48,00		48,00	$ 3.360.000,00	$ -	$ 3.360.000,00		
8	**Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**												
8,1	**SISTEMA SÉPTICO**												
8,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20,00	$ 8.809,00	$ 176.180,00	16,00	4,00	20,00	$ 140.944,00	$ 35.236,00	$ 176.180,00		
8,1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	19,28	$ 23.031,00	$ 444.038,00	15,42	3,86	19,28	$ 355.138,02	$ 88.900,00	$ 444.038,00		
8,1,3	MURO EN.LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	44,00	$ 123.119,00	$ 5.417.236,00	35,20	8,80	44,00	$ 4.333.788,80	$ 1.083.447,20	$ 5.417.236,00		
8,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	228,70	$ 9.168,00	$ 2.096.721,60	182,96	45,74	228,70	$ 1.677.377,28	$ 419.344,32	$ 2.096.722,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
8,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	18,60	$ 90.189,00	$ 1.677.515,00	14,88	3,72	18,60	$ 1.342.012,32	$ 335.503,00	$ 1.677.515,00		
8,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	18,60	$ 85.998,00	$ 1.599.563,00	14,88	3,72	18,60	$ 1.279.650,24	$ 319.913,00	$ 1.599.563,00		
8,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS	UND	5,00	$ 323.524,00	$ 1.617.620,00	4,00	1,00	5,00	$ 1.294.096,00	$ 323.524,00	$ 1.617.620,00		
8,1,8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"	ML	28,40	$ 39.291,00	$ 1.115.864,00	22,40	6,00	28,40	$ 880.118,40	$ 235.746,00	$ 1.115.864,40		
8,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	1,50	$ 171.725,00	$ 257.588,00	1,20	0,30	1,50	$ 206.070,00	$ 51.518,00	$ 257.588,00		
8,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0,85	$ 166.575,00	$ 141.588,75	0,68	0,17	0,85	$ 113.271,00	$ 28.317,75	$ 141.588,75		
8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC**												
8,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2,00	$ 8.809,00	$ 17.618,00	1,60	0,40	2,00	$ 14.094,40	$ 3.524,00	$ 17.618,00		
8,2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	1,58	$ 23.031,00	$ 36.388,98	1,10	0,48	1,58	$ 25.334,10	$ 11.054,88	$ 36.388,98		
8,2,3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA	UND	5,00	$ 563.956,00	$ 2.819.780,00	4,00	1,00	5,00	$ 2.255.824,00	$ 563.956,00	$ 2.819.780,00		
8,3	**FOZA DE INFILTRACION: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE**												
8,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	16,62	$ 8.809,00	$ 146.406,00	15,80	0,82	16,62	$ 139.182,20	$ 7.223,00	$ 146.406,00		
8,3,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,69	$ 23.031,00	$ 154.004,00	5,29	1,40	6,69	$ 121.833,99	$ 32.170,00	$ 154.004,00		
8,3,3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"	ML	22,80	39.291,00	$ 895.835,00	14,80	8,00	22,80	$ 581.506,80	$ 314.328,00	$ 895.834,80		
8,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	4,00	171.725,00	$ 686.900,00	3,20	0,80	4,00	$ 549.520,00	$ 137.380,00	$ 686.900,00		
8,4	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2,50	$ 700.000,00	$ 1.750.000,00	1,50	1,00	2,50	$ 1.050.000,00	$ 700.000,00	$ 1.750.000,00		
8,5	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	30,00	$ 70.000,00	$ 2.100.000,00	23,00	7,00	30,00	$ 1.610.000,00	$ 490.000,00	$ 2.100.000,00		
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 474.797.111,00**				**$ 381.753.412,00**	**$ 93.043.699,00**	**$ 474.797.111,00**		**$ -**
				ADMINISTRACIÓN 12%	$ 56.975.653,00				$ 45.810.409,00	$ 11.165.244,00	$ 56.975.653,00		$ -
				IMPREVISTOS 5%	$ 23.739.856,00				$ 19.087.671,00	$ 4.652.185,00	$ 23.739.856,00		$ -
				UTILIDAD 10%	$ 47.479.711,00				$ 38.175.341,00	$ 9.304.370,00	$ 47.479.711,00		$ -
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$ 9.021.145,00				$ 7.253.315,00	$ 1.767.830,00	$ 9.021.145,00		$ -
				TOTAL COSTOS DE EQUIPAMIENTO RURALES	**$ 612.013.476,00**				**$ 492.080.148,00**	**$ 119.933.328,00**	**$ 612.013.476,00**		**$ -**
B	SENSIBILIZACIÓN SOCIAL COMUNITARIO				$ -				$ -	$ -	$ -		
10	Talleres de sensibilización social comunitario	TALLER		$ 730.000,00	$ -				$ -	$ -	$ -		
				TOTAL COSTOS DIRECTOS JORNADA SENSIBILIZACIÓN	**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
				ADMINISTRACIÓN 12%	$ -				$ -	$ -	$ -		$ -
				UTILIDAD 10%	$ -				$ -	$ -	$ -		$ -
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$ -				$ -	$ -	$ -		$ -
				TOTAL COSTOS JORNADA SENSIBILIZACIÓN	**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
	NUEVO ITEM												
9	Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.	TALLER	5,00	$ 534.360,00	$ 2.671.800,00		5,00	5,00		$ 2.671.800,00	$ 2.671.800,00		$ -
				IVA 19%	$ 507.642,00					**$ 507.642,00**	**$ 507.642,00**		$ -
				TOTAL COSTOS TALLERES	**$ 3.179.442,00**				$ -	$ 3.179.442,00	$ 3.179.442,00		$ -
				TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL DE CONTRATACIÓN	**$ 615.192.918,00**				**$ 492.080.148,00**	**$ 123.112.770,00**	**$ 615.192.918,00**		**$ -**
											100,00%		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor

RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 615.192.918,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 615.192.918,00

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: N/A
% RETE GARANTÍA:

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de recibo parcial de obra No.1	CORF-1	28/05/2025	$ 269.589.948,00		$ -		$ 269.589.948,00	$ 345.602.970,00	43,82%
2	Acta de recibo parcial de obra No.2			$ 345.602.970,00		$ -		$ 345.602.970,00	$ -	56,18%
						$ -		$ -	$ -	
	TOTAL			$ 615.192.918,00		$ -		$ 345.602.970,00	$ -	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 68.352.127,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 68.352.127,00

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: N/A
% RETE GARANTÍA:

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de recibo parcial de obra No.1	FVE-84		$ 29.951.901,96		$ -		$ 29.951.901,96	$ 38.400.225,04	43,82%
2	Acta de recibo parcial de obra No.2	N/A		$ 38.400.225,04		$ -		$ 38.400.225,04	$ -	56,18%
						$ -		$ -	$ -	
	TOTAL			$ 68.352.127,00		$ -		$ 38.400.225,04	$ -	100,00%

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

6

Ingenieria & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato Nº:	490 DE 2024			**Contratista:**	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
Periodo:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN			**Residente de Interventoría:**	WILLIAM PARRA OLAYA

CLÁUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
A	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA		%
1	Cumplir oportunamente el objeto contractual, no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella, según la disposición del artículo 1603 del Código Civil y artículo 863 y 871 del Código de Comercio.	El contratista de obra durante el periodo ha dado cumplimiento oportuno al objeto contractual.	100
2	Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, los y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.	El contraista de obra ejecuta y entregará la obra conforme a los criterios de calidad y las especificaciones técnicas de construcción.	100
3	Realizar las obras a ejecutar en las cantidades y sitios indicados en Neiva, Paicol, Acevedo y Elías (Consultar anexo listado de beneficiarios)	El contratista de obra ejecuta en cantidades y sitios indicados en el contrato.	100
4	Realizar tres (3) talleres de sensibilización social comunitaria en área de la Cuenca del río Las Ceibas relacionadas en el cuadro 1.	El contratista de obra a la fecha no ha realizado los talleres de sensibilización social comunitaria en área de la Cuenca del río Las Ceibas.	100
5	Ejecutar las actividades contratadas conforme a lo dispuesto en el cronograma de actividades.	El contratista de obra durante el periodo realizó las visitas diagnóstico, por lo cual deberá presentar el cronograma de actividades para su ejecución en el plazo dispuesto en el contrato.	100
6	Utilizar materiales y/o productos de acuerdo a las características y/o especificaciones técnicas exigidos por LA CORPORACIÓN.	El contratista de obra una vez inicie actividades constructivas utilizará materiales y/o productos de acuerdo a las características y/o especificaciones técnicas exigidos.	100
7	Solicitar a LA CORPORACIÓN los archivos en formato DWG de las obras a realizar.	El contratista de obra solicitó a la Corporación los archivos en formato DWG de las obras a realizar.	100
8	Presentar acta de recibo de cada obra, suscrita a satisfacción por el beneficiario y avalado por el Interventor.	El contratista de obra cuando termine cada obra, presentará el acta de recibo suscrita a satisfacción por el beneficiario y avalado por el Interventor.	100
9	Velar por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato;	El contratista de obra veló por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato.	100
10	Retirar y disponer de forma adecuada cualquier tipo de residuo generado, tales como bolsas plásticas, bolsas de cemento, etc.	El contratista de obra una vez ejecute las actividades de obra, retirará y dispondrá de forma adecuada cualquier tipo de residuo genrado en el proceso constructivo.	100
11	Vincular al personal que requiera y utilice para dar alcance al objeto contractual;	El contratista de obra vinculó al personal requerido para dar alcance al objeto contractual.	100
12	No causar daños a personas y bienes de terceros o de LA CORPORACIÓN; y responder por los daños eventuales que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o a sus trabajadores.	El contratista de obra no ha causado daños a personas y bienes de terceros o de la Corporación.	100
13	Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad industrial y bioseguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades.	El contratista de obra dotó a sus trabajadores de los elementos de protección personal, necesarios para el buen desempeño de las actividades.	100
14	Vincular a todo el personal en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.	El contratista de obra vinculó al personal previo al inicio de labores al sistema integral de seguridad social.	100
15	Actualizar las pólizas con las actas que haya a lugar, tales como el acta de inicio, actas de reinicio y/o acta de recibo final.	El contratista de obra actualizó las pólizas requeridas.	100
16	Presentar al Supervisor informes de ejecución física y financiera cada mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio y un informe final consolidado. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Interventoria;	El contratista de obra presentó al Supervisor informe mensual de ejecución física y financiera.	100
17	Mantener indemne a LA CORPORACIÓN ante cualquier reclamación laboral o civil de sus dependientes;	El contratista de obra mantuvo indemne a la Corporación ante cualquier reclamación laboral o civil.	100
18	Acreditar el cumplimiento en el pago de sus aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión, ARP) y parafiscales, según lo establecido en el artículo 1 del parágrafo 2 de la Ley 828 del 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	El contratista de obra acreditó el pago de sus aportes al sistea integral de seguridad social (salud, pensión, ARL) y parafiscales.	100
19	Aplicar los protocolos de bioseguridad según lo establecido por el Ministerio de Salud en la normatividad legal vigente, para el desarrollo de las actividades propias del contrato.	El contratista de obra aplicó los protocolos de bioseguridad de acuerdo a lo establecido actualmente por el Ministerio de Salud y la normatividad legal vigente.	100

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

6

Ingenieria & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato Nº:	490 DE 2024			**Contratista:**	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
Periodo:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN			**Residente de Interventoría:**	WILLIAM PARRA OLAYA

CLÁUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
20	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita. Justificación: Está orientado de acuerdo con la disposición del ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, el cual fomentó a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	El contratista de obra para la contratación de la mano de obra local tendrá en cuenta lo requerido en el presente numeral.	100
B	**OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**		**%**
1	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por LA CORPORACIÓN, el Supervisor o de los organismos de control.	El contratista de obra atendió y absolvió las observaciones y requerimientos formulados por la Corporación.	100
2	Presentar informes mensuales y finales que contengan como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Supervisor.	El contratista presentó el informe mensual de obra No.2	100
3	Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá llevar una Bitácora (libro) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Supervisor, en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente de EL CONTRATISTA y del Supervisor. Los responsables de mantener al día este diario serán los residentes de obra.	El contratista de obra una vez inicie actividades constructivas llevará una bitácora conforme a los requerimientos del presente numeral.	79,99
4	Presentar a la Interventoría contratada, los informes conforme lo requieran LA CORPORACIÓN, para cada pago parcial que se efectúe y uno al final de la ejecución del contrato. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Interventoría;	A la fecha no se han realizado pagos, por lo cual el contratista una vez solicite pagos, entregará los informes parciales conforme lo requiere la Corporación.	79,99
5	Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.	Cuando se requiera el contratista de obra juntamente con el interventor, elaborará, las actas de entrega parcial, final y liquidación.	79,99
6	El contratista deberá publicar todos los documentos derivados de la ejecución contractual, a través de la plataforma transaccional del SECOP II.	El contratista de obra publicó los documentos correspondientes al periodo derivados de la ejecución contractual en la plataforma Secop II.	100
7	Nota: La aprobación por parte de LA CORPORACIÓN de algún procedimiento o método utilizado por EL CONTRATISTA, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte de LA CORPORACIÓN. EL CONTRATISTA es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	El contratista de obra tuvo la responsabiliad por el cumplimiento de sus obligaciones	100
C	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**		
1	Dar estricto y cabal cumplimiento a las actividades y cantidades enunciadas en las condiciones técnicas exigidas y contempladas en el análisis técnico del presente documento, y con las especificaciones y lugares allí enunciados.	El contratista dio cumplimiento a las actividades y cantidades establecidas en las condiciones técnicas.	100
2	Presentar informes: a. De ejecución, el cual se computa desde la suscripción del acta de inicio. b. De ejecución para cuando solicite pago parcial o el pago final y publicar dicho documento con los respectivos soportes en la plataforma del SECOP II. c. De avance de obra ejecutada para cuando le sea solicitado por la interventoría o la supervisión. Dicho informe estará soportado con registros fotográficos, actas, entre otros que se puedan anexar.	El constratista de obra presentó el informe mensual correspondiente al periodo ejecutado.	100
3	De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, EL CONTRATISTA deberá cumplir con la facturación electrónica si a ello estuviere obligado conforme la reglamentación vigente.	Una vez se requiera el contratista de obra dará cumplimiento con la facturación electrónica.	100
4	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a LA CORPORACIÓN o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	Cuando haya lugar El contratista de obra responderá ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Corporación o a terceros.	100

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

6

Ingeniería & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato Nº:	490 DE 2024			**Contratista:**	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
Periodo:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN			**Residente de Interventoría:**	WILLIAM PARRA OLAYA

CLÁUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra LA CORPORACIÓN, por causa o con ocasión del contrato.	A la fecha no se ha presentado ningún tipo de reclamación.	100
6	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, según cronograma.	El contratista de obra programó las actividades a desarrollar para el cumplimiento contractual.	100
7	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y/o la Interventoría contratada para tal fin.	El contratista de obra acató las instrucciones durante el desarrollo de las actividades en el presente periodo.	100
8	Notificar a LA CORPORACIÓN en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	El contratista de obra no cedió los derechos económicos, societarios o de cualquier índole del contrato.	100
9	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	El contratista de obra asumió los riesgos previsibles de la ejecución del contrato.	100
10	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	El contratista de obra mantuvo las condiciones exigidas en su oferta durante el periodo.	100
11	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor o Supervisor.	El contratista de obra presentó los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante la Interventoría.	100
12	Coordinar el equipo interdisciplinario solicitado en el acápite 5.1.8 "PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO", garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el presente estudio previo.	El contratista de obra coordinó el equipo de trabajo, garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el contrato.	100
13	Ante la necesidad de prescindir de los servicios profesionales de alguno de los integrantes del equipo técnico propuesto en la oferta técnica, deberá informar por escrito a LA CORPORACIÓN y reemplazarlo por otro que cumpla las mismas características a las exigidas en el Pliego de Condiciones, anexando hoja de vida con los respectivos soportes, tanto de formación académica como los de experiencia, para revisión y aprobación de la interventoría y presentar la respectiva vinculación al sistema de seguridad social una vez haya sido verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por LA CORPORACIÓN en el Pliego de Condiciones. De igual forma deberá vincular el personal adicional que requiera necesario para dar cumplimiento al objeto contractual dentro del término establecido.	El contratista de obra informó por escrito a la Corporación a través de la Interventoría el reemplazo del residente de obra y del tecnólogo en obra civil, entregando los soportes que garantizaron el cumplimiento de características a las exigidas en el Pliego de Condiciones.	100
14	Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.	El contratista de obra durante el periodo no causó daños a terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato.	100
15	El hospedaje de obreros, alimentación de los mismos, sitio de campamentos, vigilancia de equipos y demás gastos a que incurra en la ejecución del objeto contractual, serán asumidos en su totalidad por parte de EL CONTRATISTA y mantendrá indemne a LA CORPORACIÓN ante cualquier reclamación por este aspecto.	El contratista de obra asumió el hospedaje del personal de obra, alimentación y demás gastos incurridos durante el periodo ejecutado.	100
16	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de 2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	El contratista de obra dio cumplimiento a los establecido en la Ley relacionado con los pagos al sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales.	100
17	EL CONTRATISTA deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación, generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, LA CORPORACIÓN, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita. Justificación: Está orientado de acuerdo a la disposición del ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, el cual fomentó a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	El contratista de obra para la contratación de la mano de obra local tendrá en cuenta lo requerido en el presente numeral.	100

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

6

Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Contratista:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA
Fecha del registro fotográfico:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025

FOTOGRAFÍA No.1	FOTOGRAFÍA No.2	FOTOGRAFÍA No.3
		
EXCAVACION PARA DADOS DE CNCRETO SECADERO DE CAFÉ	FUNDICION DADO DE CONCRETO	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA SECADERO DE CAFÉ
FOTOGRAFÍA No.4	**FOTOGRAFÍA No.5**	**FOTOGRAFÍA No.6**
		
CONSTRUCCION DE PASERAS PARA SECADERO DE CAFÉ	INSTALACION DE PASERAS PARA SECADERO DE CAFÉ	SECADERO DE CAFÉ TERMINADO

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

6

Ingeniería & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Contratista:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA
Fecha del registro fotográfico:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025

FOTOGRAFÍA No.7




NIVELACION DE TERRENO PARA INSTALACION DE ESTUCTURA TANQUE AUSTRALIANO

FOTOGRAFÍA No.8

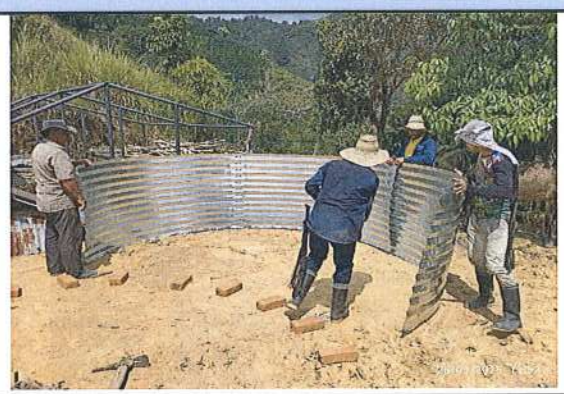

INICIO INSTALACION TANQUE AUSTRALIANO

FOTOGRAFÍA No.9

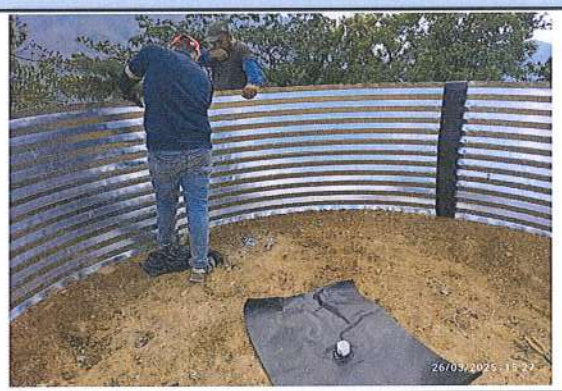

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TANQUE AUSTRALIANO

FOTOGRAFÍA No.10




INSTALACION DE PLASTICO EN TANQUE AUSTRALIANO

FOTOGRAFÍA No.11



INSTALACION DE VALVULA DE LAVADO

FOTOGRAFÍA No.12

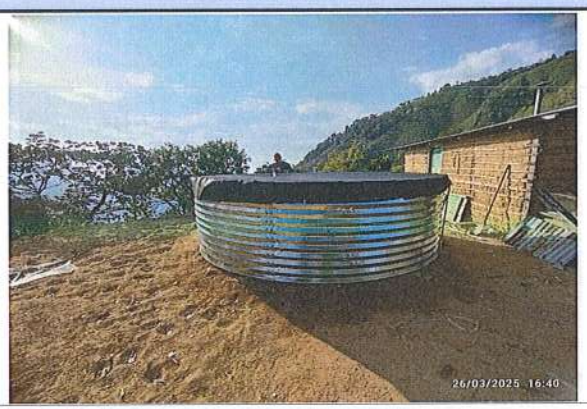

TANQUE AUSTRALIANO TERMINADO

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

6

Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA
Fecha del registro fotográfico:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025

FOTOGRAFÍA No.13



EXCAVACION PARA FOSA DE INFILTRACION ARND

FOTOGRAFÍA No.14




INSTALACION DE GRAVA PARA FOSA DE INFILTRACION ARND

FOTOGRAFÍA No.15



CONSTRUCCION DE CAJILLA ARND

FOTOGRAFÍA No.16

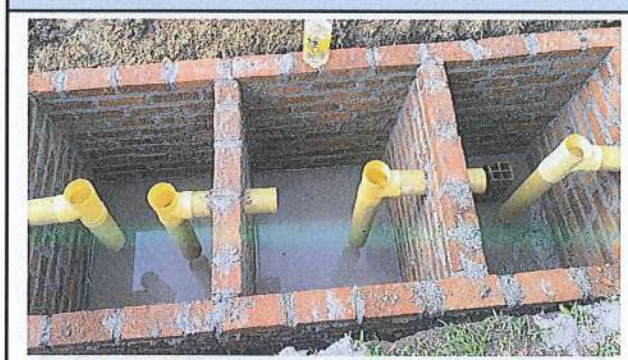

PEGA DE MURO E INSTALACION DE ACCESORIOS ARND

FOTOGRAFÍA No.17



FUNDICION DE TAPAS EN CONCRETO ARND

FOTOGRAFÍA No.18



SISTEMA SEPTICO TERMINADO ARND

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

6

Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Contratista:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA
Fecha del registro fotográfico:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025

FOTOGRAFÍA No.19



EXCAVACION PARA DADOS DE CNCRETO SECADERO DE CACAO

FOTOGRAFÍA No.20



FUNDICION DADO DE CONCRETO

FOTOGRAFÍA No.21



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA SECADERO DE CACAO

FOTOGRAFÍA No.22



CONSTRUCCION DE PASERAS PARA SECADERO DE CACAO

FOTOGRAFÍA No.23



INSTALACION DE PASERAS PARA SECADERO DE CACAO

FOTOGRAFÍA No.24



SECADERO DE CACAO TERMINADO

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

6

Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Contratista:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA
Fecha del registro fotográfico:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025

FOTOGRAFÍA No.25	FOTOGRAFÍA No.26	FOTOGRAFÍA No.27
		
PEGA DE LADRILLO POZO ARD	FUNDICION DE TRAMPA GRASA ARD	CAJILLAS TERMINADAS ARD
FOTOGRAFÍA No.28	**FOTOGRAFÍA No.29**	**FOTOGRAFÍA No.30**
		
INSTALACION DE TUBERIA SISTEMA SEPTICO ARD	INSTALACION DE ACCESORIOS SISTEMA SEPTICO ARD	SISTEMA SEPTICO TERMINADO ARD
FOTOGRAFÍA No.31	**FOTOGRAFÍA No.32**	**FOTOGRAFÍA No.33**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA
Fecha del registro fotográfico:	1 de junio de 2025	al	30 de junio de 2025



PASERAS FIJAS Y MOVILES



PASERAS FIJAS Y MOVILES



PASERAS FIJAS Y MOVILES

FOTOGRAFÍA No.34



CAMPOS DE INFILTRACION

FOTOGRAFÍA No.35



CAMPOS DE INFILTRACION

FOTOGRAFÍA No.36



CAMPOS DE INFILTRACION

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**									
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO						
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**		
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES						
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025				**FECHA ACTA**	**11/06/2025**	
	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 40x20 mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2", paseras en tabla nogal o pino apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16" y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**											
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	200,00	$ 8.809,00	$ 1.761.800,00	200,00	$ 1.761.800,00	0,00	$ -	200,00	$ 1.761.800,0	
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 23.031,00	$ 147.398,40	6,40	$ 147.398,40	-1,60	$ (36.849,60)	4,80	$ 110.548,8	
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 846.760,00	$ 5.419.264,00	6,40	$ 5.419.264,00	0,00	$ -	6,40	$ 5.419.264,0	
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	8,00	$ 3.738.767,00	$ 29.910.136,00	8,00	$ 29.910.136,00	0,00	$ -	8,00	$ 29.910.136,0	
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	8,00	$ 3.045.982,00	$ 24.367.856,00	8,00	$ 24.367.856,00	0,00	$ -	8,00	$ 24.367.856,0	
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	8,00	$ 1.287.485,00	$ 10.299.880,00	8,00	$ 10.299.880,00	0,00	$ -	8,00	$ 10.299.880,0	
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	64,00	$ 522.873,00	$ 33.463.872,00	64,00	$ 33.463.872,00	0,00	$ -	64,00	$ 33.463.872,0	
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	8,00	$ 700.000,00	$ 5.600.000,00	8,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 5.600.000,0	
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	64,00	$ 70.000,00	$ 4.480.000,00	64,00	$ 4.480.000,00	0,00	$ -	64,00	$ 4.480.000,0	
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**											
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	125,00	$ 8.809,00	$ 1.101.125,00	125,00	$ 1.101.125,00	0,00	$ -	125,00	$ 1.101.125	

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**										
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**					
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00							
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES							
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025		**FECHA ACTA**		**11/06/2025**			
	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**		
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 23.031,00	$ 92.124,00	4,00	$ 92.124,00	-1,00	$ (23.031,00)	3,00	$ 69.093,0		
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 846.760,00	$ 3.387.040,00	4,00	$ 3.387.040,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.387.040,0		
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	5,00	$ 3.855.389,00	$ 19.276.945,00	5,00	$ 19.276.945,00	0,00	$ -	5,00	$ 19.276.945,0		
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	5,00	$ 3.045.982,00	$ 15.229.910,00	5,00	$ 15.229.910,00	0,00	$ -	5,00	$ 15.229.910,0		
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	5,00	$ 1.287.485,00	$ 6.437.425,00	5,00	$ 6.437.425,00	0,00	$ -	5,00	$ 6.437.425,0		
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	40,00	$ 522.873,00	$ 20.914.920,00	40,00	$ 20.914.920,00	0,00	$ -	40,00	$ 20.914.920,0		
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	5,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.500.000,0		
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	40,00	$ 70.000,00	$ 2.800.000,00	40,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ -	40,00	$ 2.800.000,0		
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x 1/8"**												

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**									
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**	
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00					
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES					
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025				**FECHA ACTA**	**11/06/2025**

	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vertices de las paseras. Dos por vertices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diametro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera sóldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de ppuesrta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV,HUECO TIPO ROMBO QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	UND	16,00	$ 647.288,00	$ 10.356.608,00	16,00	$ 10.356.608,00	0,00	$ -	16,00	$ 10.356.608,0
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000,0
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 700.000,0
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x1/8"**										
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90°, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO A LOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	16,00	$ 522.873,00	$ 8.365.968,00	16,00	$ 8.365.968,00	0,00	$ -	16,00	$ 8.365.968,0
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000,0
4,3	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 700.000,0
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**										
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156,00	$ 8.809,00	$ 1.374.204,00	156,00	$ 1.374.204,00	0,00	$ -	156,00	$ 1.374.204,0
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	6,00	$ 23.031,00	$ 138.186,00	6,00	$ 138.186,00	0,00	$ -	6,00	$ 138.186,0

	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"								
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024	
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00			
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES			
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025		FECHA ACTA	11/06/2025

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1		MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	12,00	$ 711.531,00	$ 8.538.372,00	12,00	$ 8.538.372,00	0,00	$ -	12,00	$ 8.538.372,0
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	UND	12,00	$ 1.785.674,00	$ 21.428.088,00	12,00	$ 21.428.088,00	0,00	$ -	12,00	$ 21.428.088,0
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	12,00	$ 2.515.300,00	$ 30.183.600,00	12,00	$ 30.183.600,00	0,00	$ -	12,00	$ 30.183.600,0
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	UND	12,00	$ 239.422,00	$ 2.873.064,00	12,00	$ 2.873.064,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.873.064,0
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 4.200.000,0
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	96,00	$ 70.000,00	$ 6.720.000,00	96,00	$ 6.720.000,00	0,00	$ -	96,00	$ 6.720.000,0
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**										
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**						$ -				
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	84,00	$ 8.809,00	$ 739.956,00	84,00	$ 739.956,00	0,00	$ -	84,00	$ 739.956,0
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	140,70	$ 23.031,00	$ 3.240.462,00	140,70	$ 3.240.462,00	11,10	$ 255.644,00	151,80	$ 3.496.106,0
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	298,20	$ 123.119,00	$ 36.714.086,00	298,20	$ 36.714.086,00	3,99	$ 491.245,00	302,19	$ 37.205.331,0
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	1.050	$ 9.168,00	$ 9.626.400,00	1.050,00	$ 9.626.400,00	90,30	$ 827.870,00	1140,30	$ 10.454.270,0
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 90.189,00	$ 7.575.876,00	84,00	$ 7.575.876,00	-0,63	$ (56.819,00)	83,37	$ 7.519.057,0
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 85.998,00	$ 7.223.832,00	84,00	$ 7.223.832,00	0,00	$ -	84,00	$ 7.223.832,0
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	21,00	$ 266.204,00	$ 5.590.284,00	21,00	$ 5.590.284,00	0,00	$ -	21,00	$ 5.590.284,0
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	14,70	$ 144.237,00	$ 2.120.284,00	14,70	$ 2.120.284,00	-0,42	$ (60.580,00)	14,28	$ 2.059.704,0
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	21,00	$ 92.161,00	$ 1.935.381,00	21,00	$ 1.935.381,00	0,00	$ -	21,00	$ 1.935.381,0
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	126,00	$ 39.291,00	$ 4.950.666,00	126,00	$ 4.950.666,00	102,34	$ 4.020.961,00	228,34	$ 8.971.627,0
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**										
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	13,44	$ 8.809,00	$ 118.393,00	13,44	$ 118.393,00	1,47	$ 12.949,00	14,91	$ 131.342,0
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	10,75	$ 23.031,00	$ 247.629,00	10,75	$ 247.629,00	-2,56	$ (59.005,00)	8,19	$ 188.624,0
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 640.442,00	$ 13.449.282,00	21,00	$ 13.449.282,00	0,00	$ -	21,00	$ 13.449.282,0

	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"								
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024			
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00					
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES					
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025		FECHA ACTA	11/06/2025		

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1		MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	21,00	$ 2.355.108,00	0,00	$ -	21,00	$ 2.355.108,0
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**						$ -				$ -
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3,36	$ 8.809,00	$ 29.598,00	3,36	$ 29.598,00	5,25	$ 46.247,00	8,61	$ 75.845,0
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,02	$ 23.031,00	$ 46.430,00	2,02	$ 46.430,00	2,98	$ 68.725,00	5,00	$ 115.155,0
6.3.3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 434.293,00	$ 9.120.153,00	21,00	$ 9.120.153,00	0,00	$ -	21,00	$ 9.120.153,0
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	21,00	$ 2.355.108,00	-20,00	$ (2.242.960,00)	1,00	$ 112.148,0
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	ML	126,00	$ 33.253,00	$ 4.189.878,00	126,00	$ 4.189.878,00	0,00	$ -	126,00	$ 4.189.878,0
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**										
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100,80	$ 8.809,00	$ 887.947,00	100,80	$ 887.947,00	0,00	$ -	100,80	$ 887.947,0
6.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	33,60	$ 23.031,00	$ 773.842,00	33,60	$ 773.842,00	0,00	$ -	33,60	$ 773.842,0
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	168,00	$ 36.312,00	$ 6.100.416,00	168,00	$ 6.100.416,00	0,00	$ -	168,00	$ 6.100.416,0
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	21,00	$ 234.319,00	$ 4.920.699,00	21,00	$ 4.920.699,00	0,00	$ -	21,00	$ 4.920.699,0
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	17,85	$ 700.000,00	$ 12.495.000,00	17,85	$ 12.495.000,00	0,00	$ -	17,85	$ 12.495.000,0
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	126,00	$ 70.000,00	$ 8.820.000,00	126,00	$ 8.820.000,00	0,00	$ -	126,00	$ 8.820.000,0
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**										
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	57,60	$ 8.809,00	$ 507.398,40	57,60	$ 507.398,40	0,00	$ -	57,60	$ 507.398,40
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19,20	$ 23.031,00	$ 442.195,20	19,20	$ 442.195,20	0,00	$ -	19,20	$ 442.195,20
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	96,00	$ 36.312,00	$ 3.485.952,00	96,00	$ 3.485.952,00	0,00	$ -	96,00	$ 3.485.952,0
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	12,00	$ 234.319,00	$ 2.811.828,00	12,00	$ 2.811.828,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.811.828,0
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 4.200.000,0
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	48,00	$ 70.000,00	$ 3.360.000,00	48,00	$ 3.360.000,00	0,00	$ -	48,00	$ 3.360.000,0
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**										
8,1	**SISTEMA SÉPTICO**										
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20,00	$ 8.809,00	$ 176.180,00	20,00	$ 176.180,00	0,00	$ -	20,00	$ 176.180,0
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	38,00	$ 23.031,00	$ 875.178,00	38,00	$ 875.178,00	-18,72	$ (431.140,00)	19,28	$ 444.038,0
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	55,00	$ 123.119,00	$ 6.771.545,00	55,00	$ 6.771.545,00	-11,00	$ (1.354.309,00)	44,00	$ 5.417.236,0
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	250,00	$ 9.168,00	$ 2.292.000,00	250,00	$ 2.292.000,00	-21,30	$ (195.278,00)	228,70	$ 2.096.722,0
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 90.189,00	$ 1.803.780,00	20,00	$ 1.803.780,00	-1,40	$ (126.265,00)	18,60	$ 1.677.515,0
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 85.998,00	$ 1.719.960,00	20,00	$ 1.719.960,00	-1,40	$ (120.397,00)	18,60	$ 1.599.563,0
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	UND	5,00	$ 323.524,00	$ 1.617.620,00	5,00	$ 1.617.620,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.617.620,0
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	30,00	$ 39.291,00	$ 1.178.730,00	30,00	$ 1.178.730,00	-1,60	$ (62.866,00)	28,40	$ 1.115.864,0
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	2,00	$ 171.725,00	$ 343.450,00	2,00	$ 343.450,00	-0,50	$ (85.863,00)	1,50	$ 257.587,00
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	1,50	$ 166.575,00	$ 249.862,50	1,50	$ 249.862,50	-0,65	$ (108.273,75)	0,85	$ 141.588,75
8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC**										
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2,00	$ 8.809,00	$ 17.618,00	2,00	$ 17.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 17.618,0

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**										
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**			
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00						
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES						
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025			**FECHA ACTA**		**11/06/2025**	
	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
8.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,10	$ 23.031,00	$ 25.334,10	1,10	$ 25.334,10	0,48	$ 11.054,88	1,58	$ 36.388,98	
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	UND	5,00	$ 563.956,00	$ 2.819.780,00	5,00	$ 2.819.780,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.819.780,0	
8,3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**											
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	24,00	$ 8.809,00	$ 211.416,00	24,00	$ 211.416,00	-7,38	$ (65.010,00)	16,62	$ 146.406,0	
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	8,00	$ 23.031,00	$ 184.248,00	8,00	$ 184.248,00	-1,31	$ (30.244,00)	6,69	$ 154.004,0	
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	40,00	$ 39.291,00	$ 1.571.640,00	40,00	$ 1.571.640,00	-17,20	$ (675.805,20)	22,80	$ 895.834,8	
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	4,00	$ 171.725,00	$ 686.900,00	4,00	$ 686.900,00	0,00	$ -	4,00	$ 686.900,0	
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2,50	$ 700.000,00	$ 1.750.000,00	2,50	$ 1.750.000,00	0,00	$ -	2,50	$ 1.750.000,0	
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	30,00	$ 70.000,00	$ 2.100.000,00	30,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	30,00	$ 2.100.000,0	
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 474.797.111,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 474.797.111,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 474.797.111,00**	
	ADMINISTRACION 12% =				$ 56.975.653,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 56.975.653,00	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	$ 56.975.653,00	
	IMPREVISTOS 5% =				$ 23.739.856,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 23.739.856,00	IMPREVISTOS 5% =	$ -	IMPREVISTOS 5% =	$ 23.739.856,00	
	UTILIDAD 10% =				$ 47.479.711,00	UTILIDAD 10% =	$ 47.479.711,00	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	$ 47.479.711,00	
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 9.021.145,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.021.145,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.021.145,00	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 137.216.365,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 137.216.365,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 137.216.365,00**	
	TOTAL COSTOS EQUIPAMENTO RURAL (Directos + Indirectos)				**$ 612.013.476,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 612.013.476,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ -**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 612.013.476,00**	
B	SENCIBILIZACION SOCIAL COMUNITARIO											
	Talleres de sencibilizacion social comunitario	TALLER	3	$ 730.000,00	$ 2.190.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
	ADMINISTRACION 12% =				$ 262.800,00	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =		
	UTILIDAD 10% =				$ 219.000,00	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =		
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 507.642,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =		
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENCIBILIZACION					**$ 3.179.442,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	NUEVO ITEM											
9	Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.	TALLER		$ 534.360,00		5,00	$ 2.671.800,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.671.800,00	
	I.V.A. (19%)				$ -		$ 507.642,00		$ -	I.V.A. (19%)	$ 507.642,00	
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENSIBILIZACION					**$ -**		**$ 3.179.442,00**		**$ -**		**$ 3.179.442,00**	
	TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION				**$ 615.192.918,00**		**$ 615.192.918,00**		**$ -**		**$ 615.192.918,00**	
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 615.192.918,00**		**$ -**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 615.192.918,00**	

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
RL. CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES** N/A	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,2	ANAIS VILLAREAL	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARIA RUTH PEREZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARITZA NINCO ROJAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	ALBA LUZ MOLANO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
						TOTAL	**4,80**

TOTAL	**4,80**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,80**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,2	JOEL DIAZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JOSE ONÍÍAS TOVAR	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	ASPROCAECO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JAIRO LOZANO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
						TOTAL	**3,00**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.1.2	LUCILA MENDEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE GOMEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE BENITO SANCHEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	FLOR ALBENIS SALINAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	KERLY JOHANA BONILLA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,20	0,36	1,00	**0,36**
	LUZ DARY ESCOBAR	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	30,00	0,30	0,20	1,80	1,00	**1,80**
	MARIA RUTH PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,20	0,15	1,00	**0,15**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,30	0,23	1,00	**0,23**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,30	1,30	0,30	1,29	1,00	**1,29**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	13,00	0,30	0,30	1,17	1,00	**1,17**
	SAUL PULIDO TELLO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	22,00	0,40	0,70	6,16	1,00	**6,16**
	JHON PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	ABIGAIL MONTIEL	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YORLADIS PASINGA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	8,00	0,30	0,30	0,72	1,00	**0,72**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	7,80	0,30	0,30	0,70	1,00	**0,70**
						TOTAL	**151,80**





TOTAL	151,80
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	151,80



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.3	LUCILA MENDEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE GOMEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE BENITO SANCHEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	FLOR ALBENIS SALINAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	KERLY JOHANA BONILLA	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	LUZ DARY ESCOBAR	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**302,19**





TOTAL	302,19
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	302,19



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
6.1.4	LUCILA MENDEZ				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE GOMEZ				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE ALDEMAR TIQUE				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE BENITO SANCHEZ				54,30	1,00	**54,30**
	FLOR ALBENIS SALINAS				54,30	1,00	**54,30**
	KERLY JOHANA BONILLA				54,30	1,00	**54,30**
	LUZ DARY ESCOBAR				54,30	1,00	**54,30**
	MARIA RUTH PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JHON JAIRO PASCUAS				54,30	1,00	**54,30**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES				54,30	1,00	**54,30**
	SAUL PULIDO TELLO				54,30	1,00	**54,30**
	YENI ANDREA PERDOMO				54,30	1,00	**54,30**
	JHON FAIBER MANRIQUE				54,30	1,00	**54,30**
	JHON PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	ABIGAIL MONTIEL				54,30	1,00	**54,30**
	YORLADIS PASINGA				54,30	1,00	**54,30**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO				54,30	1,00	**54,30**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	RAFAEL BECERRA VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
						TOTAL	**1.140,30**





TOTAL	**1.140,30**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1.140,30**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.5	LUCILA MENDEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE GOMEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE BENITO SANCHEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	FLOR ALBENIS SALINAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	KERLY JOHANA BONILLA	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
						TOTAL	**83,37**





TOTAL	**83,37**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**83,37**

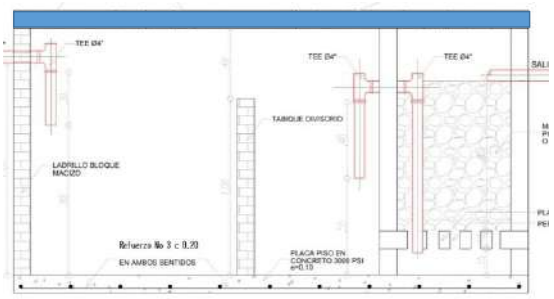

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.1.8	LUCILA MENDEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE GOMEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE BENITO SANCHEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	FLOR ALBENIS SALINAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	KERLY JOHANA BONILLA	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	LUZ DARY ESCOBAR	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	MARIA RUTH PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON JAIRO PASCUAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	SAUL PULIDO TELLO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENI ANDREA PERDOMO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON FAIBER MANRIQUE	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ABIGAIL MONTIEL	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YORLADIS PASINGA	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
						TOTAL	**14,28**



TOTAL	**14,28**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,28**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.1.10	LUCILA MENDEZ	15,00				1,00	**15,00**
	JOSE GOMEZ	16,00				1,00	**16,00**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	14,00				1,00	**14,00**
	JOSE BENITO SANCHEZ	12,00				1,00	**12,00**
	FLOR ALBENIS SALINAS	25,04				1,00	**25,04**
	KERLY JOHANA BONILLA	6,00				1,00	**6,00**
	LUZ DARY ESCOBAR	22,00				1,00	**22,00**
	MARIA RUTH PEREZ	2,50				1,00	**2,50**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	2,50				1,00	**2,50**
	JHON JAIRO PASCUAS	6,50				1,00	**6,50**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	13,00				1,00	**13,00**
	SAUL PULIDO TELLO	6,00				1,00	**6,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	6,00				1,00	**6,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	22,00				1,00	**22,00**
	JHON PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	ABIGAIL MONTIEL	6,00				1,00	**6,00**
	YORLADIS PASINGA	14,00				1,00	**14,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	14,00				1,00	**14,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	7,80				1,00	**7,80**
						TOTAL	**228,34**



TOTAL	**228,34**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**228,34**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.2.1	LUCILA MENDEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE GOMEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
						TOTAL	**14,91**





TOTAL	**14,91**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,91**

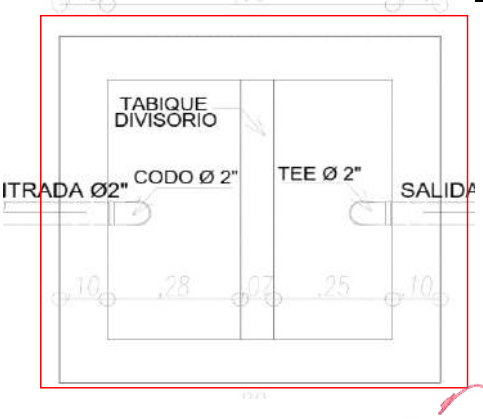

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.2.2	LUCILA MENDEZ	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84	0,6	0,42	1,00	**0,42**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
						TOTAL	**8,19**

TOTAL	**8,19**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,19**



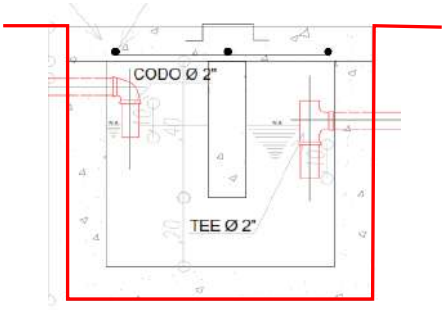

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL:	$ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL:	$ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO:	$ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.3.1	LUCILA MENDEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE GOMEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
						TOTAL	**8,61**



TOTAL	**8,61**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,61**

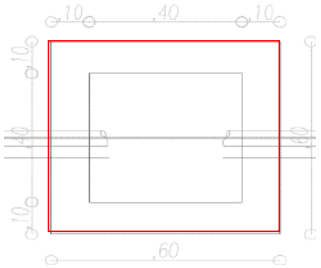

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.3.2	LUCILA MENDEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE GOMEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
						TOTAL	**5,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**5,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: **FECHA DE REINICIO 3:**	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE SUSPENSION 4: **FECHA DE REINICIO 4:**	**11/06/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.3.4	FLOR ALBENIS SALINAS					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.2	HERMES SUNCE TOVAR	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	HERMES- TUBERÍA ENTERRADA	2,50	0,30	0,5	0,38	1,00	**0,38**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	JOSE ANTONIO-TUBERÍA ENTERRADA	0,50	0,30	0,5	0,08	1,00	**0,08**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	ELCIAS YAGUE-tubería conexión	9,00	0,20	0,2	0,36	1,00	**0,36**
	BEATRIS BAUTISTA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	6,50	0,20	0,2	0,26	1,00	**0,26**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	5,00	0,20	0,2	0,20	1,00	**0,20**
						TOTAL	**19,28**

TOTAL	**19,28**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**19,28**

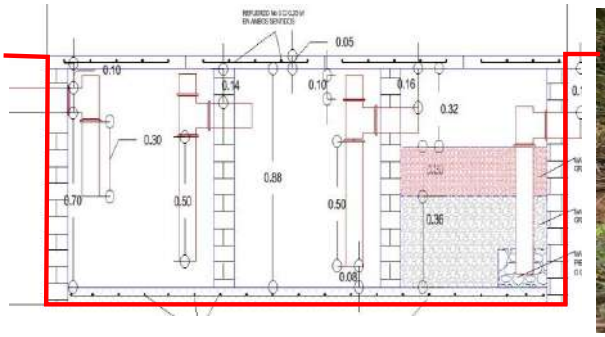



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00		**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00		**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.3	HERMES SUNCE TOVAR	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	BEATRIS BAUTISTA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	JUAN CARLOS POLOCHE	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
						TOTAL	**44,00**

TOTAL	**44,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**44,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00		**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00		**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
8.1.4	HERMES SUNCE TOVAR				45,74	1,00	**45,74**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA				45,74	1,00	**45,74**
	ELCIAS YAGUE RIVERA				45,74	1,00	**45,74**
	BEATRIS BAUTISTA				45,74	1,00	**45,74**
	JUAN CARLOS POLOCHE				45,74	1,00	**45,74**
						TOTAL	**228,70**

TOTAL	**228,70**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**228,70**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00		**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00		**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.5	HERMES SUNCE TOVAR	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**18,60**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**18,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00		**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00		**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.6	HERMES SUNCE TOVAR	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**18,60**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**18,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.1.8	HERMES SUNCE TOVAR	5,00				1,00	**5,00**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	1,00				1,00	**1,00**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	10,40				1,00	**10,40**
	BEATRIS BAUTISTA	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	6,00				1,00	**6,00**
						TOTAL	**28,40**



TOTAL	**28,40**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**28,40**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.9	HERMES SUNCE TOVAR	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
						TOTAL	**1,50**

TOTAL	**1,50**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,50**



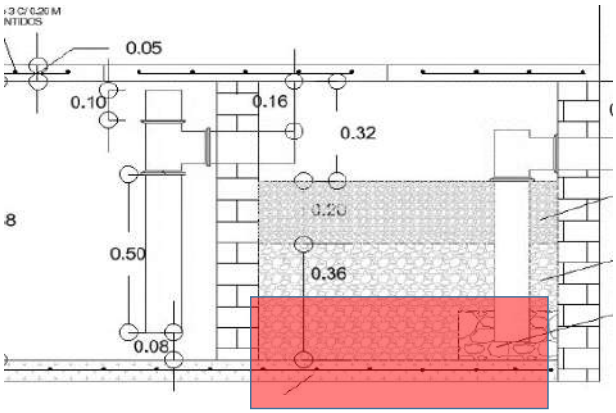

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.10	HERMES SUNCE TOVAR	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
						TOTAL	**0,85**

TOTAL	**0,85**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,85**



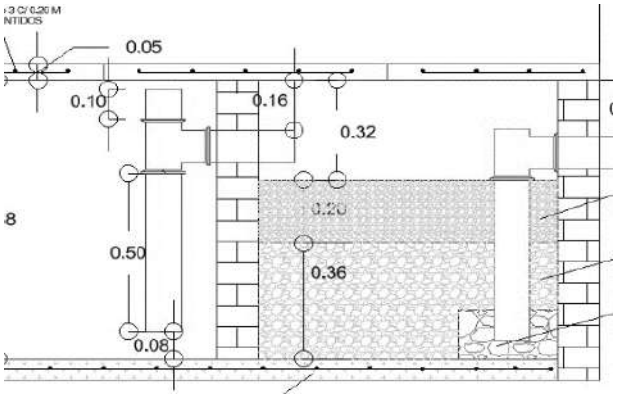

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.3.1	HS_FOSA INFILTRACIÓN	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	HS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,45		0,45	1,00	**0,45**
	JAS_FOZA INFILTRACIÓN	1,50	1,10		1,65	1,00	**1,65**
	JAS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,50	0,45		0,68	1,00	**0,68**
	ELCIAS YAGUE-FOSA	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	ELCIAS YAGUE-PVC-S 4"	4,00	0,45		1,80	1,00	**1,80**
	BEATRIS BAUTISTA	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
						TOTAL	**16,62**

TOTAL	**16,62**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**16,62**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.3.2	HS_FOZA INFILTRACIÓN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	HS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,37	0,20	0,08	1,00	**0,08**
	JAS_FOZA INFILTRACIÓN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JAS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,37	0,20	0,08	1,00	**0,08**
	ELCIAS YAGUE-FOSA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ELCIAS YAGUE-PVC-S 4"	4,00	0,40	0,20	0,32	1,00	**0,32**
	BEATRIS BAUTISTA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,60	1,00	**0,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,60	1,00	**0,60**
						TOTAL	**6,68**

TOTAL	**6,68**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,68**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.3.3	HERMES SUNCE TOVAR	1,30				1,00	**1,30**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	1,50				1,00	**1,50**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	4,00				1,00	**4,00**
	BEATRIS BAUTISTA	8,00				1,00	**8,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**22,80**

TOTAL	**22,80**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**22,80**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	2 de junio de 2025	PERIODO No.	22	DEL	26/05/2025	AL	1/06/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	485 DE 2024				CONTRATO No.:	490 DE 2024			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			
NIT / C.C.:	79.142.300				NIT / C.C.:	901898260-0			
PLAZO INICIAL:	8	MESES			PLAZO INICIAL:	8	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024				FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	-	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	87				DÍAS POR EJECUTAR	87			
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025			
PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	153	DIAS	EQUIVALE AL	63,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	153	DIAS	EQUIVALE AL	63,8%
VALOR INICIAL :	$	68.352.127,00			VALOR INICIAL :	$	615.192.918,00		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	68.352.127,00			VALOR ACTUALIZADO:	$	615.192.918,00		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	68.352.127,00			VALOR POR PAGAR:	$	615.192.918,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras móviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado

4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 5 mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión de 2", acometida hidráulica en tubería PVC presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5,3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5,8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tubería de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8,1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado

8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC.**			no iniciado
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA.			no iniciado
8,3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 388.421.037,51	63,14%	16,85%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 492.080.148,00	79,99%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93.399.584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1.110.544.123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26.968.272	Psicóloga social
Miguel Ángel López Cleves	1.004.074.969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93.020.393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1.110.175.094	Oficial de obra
Jhon Jairo Rada Conda	93.021.822	Ayudante de obra
Kristian Alonso Solano Gallego	1.109.415.938	Ayudante de obra
Jairo Lozano Cuellar	12.160.094	Ayudante de obra
Jhon Fredy Yate Vélez	93.021.279	Ayudante de obra
Gerson Caleño	1.109.419.087	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,00%	27,27%	3
	TECNICO	3	0	27,27%	0,00%	3
	M.O/N.C	0	5	0,00%	45,45%	5
	TOTALES	**3**	**8**	**27,27%**	**72,73%**	**11**
	TOTAL	**11**		**100%**		

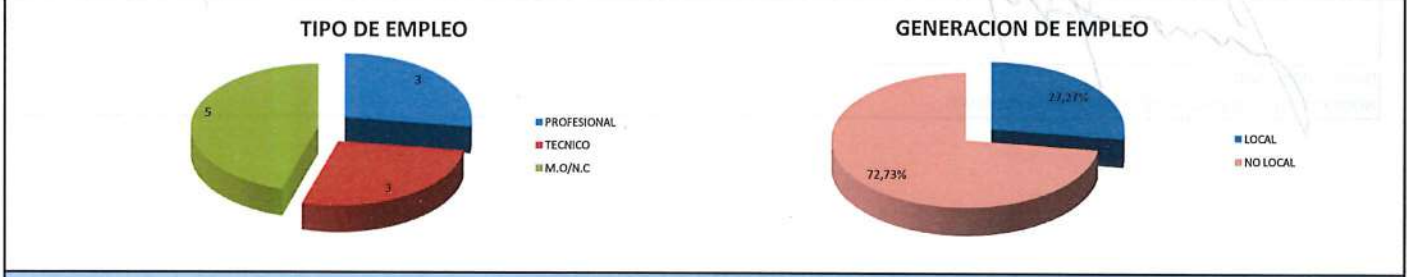

4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista en este periodo se continuó actividades de ejecución en el municipio de Neiva; se terminaron 1 tanque australiano, se terminó la construcción de un sistema séptico de aguas residuales no domésticas, un sistema de aguas residuales domésticas y dos campos de infiltración. Se inició la construcción de los sistemas sépticos de aguas residuales domésticas en los municipios de Paicol Elias y Acevedo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



INICIO PROCESO CONSTRUCTIVO TANQUE AUSTRALIANO



SECADERO SOLAR DE CAFÉ TERMINADO



PROCESO CONSTRUCTIVO SISTEMA SEPTCIO ARD



VISTA INTERIOR SECADERO SOLAR DE CAFÉ

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	9 de junio de 2025	PERIODO No.	23	DEL	2/06/2025	AL	8/06/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	485 DE 2024			CONTRATO No.:	490 DE 2024		
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		
NIT / C.C.:	79.142.300			NIT / C.C.:	901898260-0		
PLAZO INICIAL:	8	MESES		PLAZO INICIAL:	8	MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
PLAZO ADICIONAL:		MESES		PLAZO ADICIONAL:	-	MESES	
DÍAS POR EJECUTAR	80			DÍAS POR EJECUTAR	80		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS	
PLAZO TRANSCURRIDO:	160	DIAS	EQUIVALE AL 66,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	160	DIAS	EQUIVALE AL 66,7%
VALOR INICIAL :	$	68.352.127,00		VALOR INICIAL :	$	615.192.918,00	
VALOR ADICION(ES):	$	-		VALOR ADICION(ES):	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	68.352.127,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	615.192.918,00	
VALOR PAGADO:	$	-		VALOR PAGADO:	$	-	
VALOR POR PAGAR:	$	68.352.127,00		VALOR POR PAGAR:	$	615.192.918,00	

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras móviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado

4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 5 mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión de 2", acometida hidráulica en tubería PVC presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5,3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5,8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tubería de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8,1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado

8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC.**			no iniciado
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA.			no iniciado
8,3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 398.950.302,42	64,85%	19,62%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 519.652.216,58	84,47%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93.399.584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1.110.544.123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26.968.272	Psicóloga social
Miguel Ángel López Cleves	1.004.074.969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93.020.393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1.110.175.094	Oficial de obra
Yimmy Lozano Bonilla	7.705.681	Ayudante de obra
Jorge Eliecer Perdomo Valderrama	7.709.840	Maestro de obra
Edgar Rodriguez	12.133.526	Ayudante de obra
Carlos Augusto Moreno Mendez	140.112.364	Ayudante de obra
Herminso Caviche	79.720.528	Ayudante de obra
Jhon Edinson Laiseca Valencia	1.003.863.978	Ayudante de obra
Arles Andres Portela Trujillo	1.075.218.468	Ayudante de obra
Deiver Fabian Tovar Saldaña	1.075.235.146	Ayudante de obra
Jose Faibran Parra Mora	1.075.254.878	Ayudante de obra
Kevin Santiago Rojas Vanegas	1.076.904.489	Ayudante de obra
Jhon Faiver Manrique Ochoa	1.079.510.034	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,00%	17,65%	3
	TECNICO	3	0	17,65%	0,00%	3
	M.O/N.C	5	6	29,41%	35,29%	11
	TOTALES	**8**	**9**	**47,06%**	**52,94%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista en este periodo se continuó actividades de ejecución en el municipio de Neiva; Se terminó un secadero de cafe y un campo de infiltracion. Ademas se terminaron los sistemas sépticos de aguas residuales domésticas en el municipio de Paicol y uno en el municipio de Elias.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



CAMPO DE INFILTRACION



SECADERO SOLAR DE CAFÉ - ALBA LUZ MOLANO - NEIVA



SISTEMA SEPTICO ARD - PAICOL



SISTEMA SEPTICO ARD - ELIAS

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

*VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	19 de junio de 2025	PERIODO No.	24	DEL	9/06/2025	AL	15/06/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	485 DE 2024				CONTRATO No.:	490 DE 2024			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			
NIT / C.C.:	79.142.300				NIT / C.C.:	901898260-0			
PLAZO INICIAL:	8	MESES			PLAZO INICIAL:	8	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024				FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	-	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	73				DÍAS POR EJECUTAR	73			
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025			
PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	167	DIAS	EQUIVALE AL	69,6%	PLAZO TRANSCURRIDO:	167	DIAS	EQUIVALE AL	69,6%
VALOR INICIAL :	$	68.352.127,00			VALOR INICIAL :	$	615.192.918,00		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	68.352.127,00			VALOR ACTUALIZADO:	$	615.192.918,00		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	68.352.127,00			VALOR POR PAGAR:	$	615.192.918,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras móviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado

5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 5 mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión de 2", acometida hidráulica en tubería PVC presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5,3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5,8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mamposteria de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tubería de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8,1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado
8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC.**			no iniciado
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA.			no iniciado

8,2	CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC.			no iniciado
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA.			no iniciado
8,3	FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 446.833.722,09	72,63%	19,54%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 567.055.298,94	92,18%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93.399.584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1.110.544.123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26.968.272	Psicóloga social
Miguel Ángel López Cleves	1.004.074.969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93.020.393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1.110.175.094	Oficial de obra
Yimmy Lozano Bonilla	7.705.681	Ayudante de obra
Jorge Eliecer Perdomo Valderrama	7.709.840	Maestro de obra
Edgar Rodriguez	12.133.526	Ayudante de obra
Carlos Augusto Moreno Mendez	140.112.364	Ayudante de obra
Herminso Caviche	79.720.528	Ayudante de obra
Jhon Edinson Laiseca Valencia	1.003.863.978	Ayudante de obra
Arles Andres Portela Trujillo	1.075.218.468	Ayudante de obra
Deiver Fabian Tovar Saldaña	1.075.235.146	Ayudante de obra
Jose Faibran Parra Mora	1.075.254.878	Ayudante de obra
Kevin Santiago Rojas Vanegas	1.076.904.489	Ayudante de obra
Jhon Faiver Manrique Ochoa	1.079.510.034	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,00%	17,65%	3
	TECNICO	3	0	17,65%	0,00%	3
	M.O/N.C	5	6	29,41%	35,29%	11
	TOTALES	**8**	**9**	**47,06%**	**52,94%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista en este periodo se continuó actividades de ejecución en el municipio de Neiva; Se terminó un secadero de cafe. Ademas se terminaron los sistemas sépticos de aguas residuales domésticas en el municipio de Elias y uno en el municipio de Acevedo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SISTEMA SEPTICO ARD - ELIAS



SISTEMA SEPTICO ARD - ELIAS



SISTEMA SEPTICO ARD - ACEVEDO



SECADERO SOLAR DE CAFÉ - LEIDY OLAYA - NEIVA

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN:	23 de junio de 2025	PERIODO No.	25	DEL	16/06/2025	AL	22/06/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	485 DE 2024			CONTRATO No.:	490 DE 2024		
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		
NIT / C.C.:	79.142.300			NIT / C.C.:	901898260-0		
PLAZO INICIAL:	8	MESES		PLAZO INICIAL:	8	MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
PLAZO ADICIONAL:		MESES		PLAZO ADICIONAL:	-	MESES	
DÍAS POR EJECUTAR	66			DÍAS POR EJECUTAR	66		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS	
PLAZO TRANSCURRIDO:	174	DIAS	EQUIVALE AL 72,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	174	DIAS	EQUIVALE AL 72,5%
VALOR INICIAL :	$	68.352.127,00		VALOR INICIAL :	$	615.192.918,00	
VALOR ADICION(ES):	$	-		VALOR ADICION(ES):	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	68.352.127,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	615.192.918,00	
VALOR PAGADO:	$	-		VALOR PAGADO:	$	-	
VALOR POR PAGAR:	$	68.352.127,00		VALOR POR PAGAR:	$	615.192.918,00	

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras móviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado

4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 5 mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión de 2", acometida hidráulica en tubería PVC presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5,3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5,8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tubería de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8,1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado

8,3	FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 457.362.987,00	74,34%	25,14%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 612.013.476,00	99,48%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93.399.584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1.110.544.123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26.968.272	Psicóloga social
Miguel Ángel López Cleves	1.004.074.969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93.020.393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1.110.175.094	Oficial de obra
Yimmy Lozano Bonilla	7.705.681	Ayudante de obra
Jorge Eliecer Perdomo Valderrama	7.709.840	Maestro de obra
Edgar Rodriguez	12.133.526	Ayudante de obra
Carlos Augusto Moreno Mendez	140.112.364	Ayudante de obra
Herminso Caviche	79.720.528	Ayudante de obra
Jhon Edinson Laiseca Valencia	1.003.863.978	Ayudante de obra
Arles Andres Portela Trujillo	1.075.218.468	Ayudante de obra
Deiver Fabian Tovar Saldaña	1.075.235.146	Ayudante de obra
Jose Faibran Parra Mora	1.075.254.878	Ayudante de obra
Kevin Santiago Rojas Vanegas	1.076.904.489	Ayudante de obra
Jhon Faiver Manrique Ochoa	1.079.510.034	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,00%	17,65%	3
	TECNICO	3	0	17,65%	0,00%	3
	M.O/N.C	5	6	29,41%	35,29%	11
	TOTALES	**8**	**9**	**47,06%**	**52,94%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista en este periodo se continuó actividades de ejecución en el municipio de Neiva; Se terminó un secadero de cafe y un campo de infiltracion. Se realizó un sistema septico de aguas no residuales en el municipio de Rivera. Ademas se terminaron los sistemas sépticos de aguas residuales domésticas en el municipio de Acevedo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SISTEMA SEPTICO ARD - ACEVEDO



SISTEMA SEPTICO ARD - ACEVEDO



SISTEMA SEPTICO ARND - RIVERA



SECADERO SOLAR DE CAFÉ - MARIA RUTH OLIVEROS - NEIVA

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR ENCARGADO
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	1 de julio de 2025	PERIODO No.	26	DEL	23/06/2025	AL	30/06/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	485 DE 2024			CONTRATO No.:	490 DE 2024		
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		
NIT / C.C.:	79.142.300			NIT / C.C.:	901898260-0		
PLAZO INICIAL:	8	MESES		PLAZO INICIAL:	8	MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
PLAZO ADICIONAL:		MESES		PLAZO ADICIONAL:	-	MESES	
DÍAS POR EJECUTAR	58			DÍAS POR EJECUTAR	58		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS	
PLAZO TRANSCURRIDO:	182	DIAS	EQUIVALE AL 75,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	182	DIAS	EQUIVALE AL 75,8%
VALOR INICIAL :	$	68.352.127,00		VALOR INICIAL :	$	615.192.918,00	
VALOR ADICION(ES):	$	-		VALOR ADICION(ES):	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	68.352.127,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	615.192.918,00	
VALOR PAGADO:	$	-		VALOR PAGADO:	$	-	
VALOR POR PAGAR:	$	68.352.127,00		VALOR POR PAGAR:	$	615.192.918,00	

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agricola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras móviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado

4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 5 mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión de 2", acometida hidráulica en tubería PVC presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5,3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5,8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tubería de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8,1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado

8,3	FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 502.170.066,65	81,63%	18,37%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 615.192.918,00	100,00%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93.399.584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1.110.544.123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26.968.272	Psicóloga social
Miguel Ángel López Cleves	1.004.074.969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93.020.393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1.110.175.094	Oficial de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,00%	17,65%	3
	TECNICO	3	0	17,65%	0,00%	3
	M.O/N.C	5	6	29,41%	35,29%	11
	TOTALES	**8**	**9**	**47,06%**	**52,94%**	**17**
	TOTAL	17		100%		



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista finaliza los 5 talleres de sensibilización social-comunitario a los beneficiarios del proyecto, igualmente subsanó observaciones realizadas por la interventoría.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y contractuales.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



TALLERES DE SENSIBILIZACION



TALLERES DE SENSIBILIZACION



TALLERES DE SENSIBILIZACION



TALLERES DE SENSIBILIZACION

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR ENCARGADO
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	5 de mayo de 2025	PERIODO No.	18	DEL	28/04/2025	AL	4/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	485 DE 2024				CONTRATO No.:	490 DE 2024			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			
NIT / C.C.:	79,142,300				NIT / C.C.:	901898260-0			
PLAZO INICIAL:	8		MESES		PLAZO INICIAL:	8		MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024				FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:			MESES		PLAZO ADICIONAL:	-		MESES	
DÍAS POR EJECUTAR	115				DÍAS POR EJECUTAR	115			
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025			
PLAZO ACTUALIZADO:	240		DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	240		DIAS	
PLAZO TRANSCURRIDO:	125	DIAS	EQUIVALE AL	52.1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	125	DIAS	EQUIVALE AL	52.1%
VALOR INICIAL :	$			68,352,127.00	VALOR INICIAL :	$			615,192,918.00
VALOR ADICION(ES):	$			-	VALOR ADICION(ES):	$			-
VALOR ACTUALIZADO:	$			68,352,127.00	VALOR ACTUALIZADO:	$			615,192,918.00
VALOR PAGADO:	$			-	VALOR PAGADO:	$			-
VALOR POR PAGAR:	$			68,352,127.00	VALOR POR PAGAR:	$			615,192,918.00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado

4.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tuberia pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5.3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5.8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mamposteria de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6.4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mamposteria de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8.1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado

8.2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC.**			no iniciado
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA.			no iniciado
8.3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 241,775,922.17	39.30%	9.52%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 300,360,172.19	48.82%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchan	93,399,584	Director de obra
Ricardo Hernandez Guzman	1,110,544,123	Residente de obra
Maria Sorley Hernandez Barragan	26,968,272	Psicologa social
Miguel Angel López Cleves	1,004,074,969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93,020,393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1,110,175,094	Oficial de obra
Jhon Jairo Rada Conda	93,021,822	Ayudante de obra
Kristian Alonso Solano Gallego	1,109,415,938	Ayudante de obra
Jairo Lozano Cuellar	12,160,094	Ayudante de obra
Jhon Fredy Yate Velez	93,021,279	Ayudante de obra
Gerson Caleño	1,109,419,087	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0.00%	27.27%	3
	TECNICO	3	0	27.27%	0.00%	3
	M.O/N.C	0	5	0.00%	45.45%	5
	TOTALES	**3**	**8**	**27.27%**	**72.73%**	**11**
	TOTAL	**11**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista en este periodo entregó materiales a los beneficiarios de Neiva y continuó actividades de ejecución en el municipio de Neiva; se terminó 1 sistema séptico de aguas residuales domésticas, 1 secadero de café y 2 campos de infiltración.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



ARD - LUZ DARY BAHAMON - MUNICIPIO DE NEIVA



ARD - LUZ DARY BAHAMON - MUNICIPIO DE NEIVA



SECADERO DE CAFÉ - ANAIS VILLAREAL - NEIVA



CAMPO DE INFILTRACIÓN - MARTHA PIEDAD CASTRO - NEIVA

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	12 de mayo de 2025	PERIODO No.	19	DEL	5/05/2025	AL	11/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	485 DE 2024			CONTRATO No.:	490 DE 2024		
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		
NIT / C.C.:	79,142,300			NIT / C.C.:	901898260-0		
PLAZO INICIAL:	8	MESES		PLAZO INICIAL:	8	MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
PLAZO ADICIONAL:		MESES		PLAZO ADICIONAL:	-	MESES	
DÍAS POR EJECUTAR	108			DÍAS POR EJECUTAR	108		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS	
PLAZO TRANSCURRIDO:	132	DIAS	EQUIVALE AL 55.0%	PLAZO TRANSCURRIDO:	132	DIAS	EQUIVALE AL 55.0%
VALOR INICIAL :	$		68,352,127.00	VALOR INICIAL :	$		615,192,918.00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		68,352,127.00	VALOR ACTUALIZADO:	$		615,192,918.00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		68,352,127.00	VALOR POR PAGAR:	$		615,192,918.00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras móviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado

4.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 5 mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión de 2", acometida hidráulica en tubería PVC presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5.3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5.8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6.4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tubería de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8.1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado

8.2	CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC.			no iniciado
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA.			no iniciado
8.3	FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 267,215,060.16	43.44%	10.38%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 331,042,759.72	53.81%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchan	93,399,584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1,110,544,123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26,968,272	Psicóloga social
Miguel Ángel López Cleves	1,004,074,969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93,020,393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1,110,175,094	Oficial de obra
Jhon Jairo Rada Conda	93,021,822	Ayudante de obra
Kristian Alonso Solano Gallego	1,109,415,938	Ayudante de obra
Jairo Lozano Cuellar	12,160,094	Ayudante de obra
Jhon Fredy Yate Vélez	93,021,279	Ayudante de obra
Gerson Caleño	1,109,419,087	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0.00%	27.27%	3
	TECNICO	3	0	27.27%	0.00%	3
	M.O/N.C	0	5	0.00%	45.45%	5
	TOTALES	**3**	**8**	**27.27%**	**72.73%**	**11**
	TOTAL	**11**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista en este periodo continuó con la entrega de materiales a los beneficiarios de Neiva y con actividades de ejecución en el municipio de Neiva; se terminó 1 sistema séptico de aguas residuales domésticas, un secadero de café y 2 campos de infiltracion.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



ARD - MARIA RUTH PEREZ - MUNICIPIO DE NEIVA



SECADERO DE CAFÉ - MARIA RUTH PEREZ - MUNICIPIO DE NEIVA



CAMPOS DE INFILTRACIÓN - HUMBERTO POLANIA - NEIVA



CAMPO DE INFILTRACIÓN - FEDERICO RAMIREZ - NEIVA

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	19 de mayo de 2025	PERIODO No.	20	DEL	12/05/2025	AL	18/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	485 DE 2024	CONTRATO No.:	490 DE 2024
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT / C.C.:	79,142,300	NIT / C.C.:	901898260-0
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
PLAZO ADICIONAL:	MESES	PLAZO ADICIONAL:	- MESES
DÍAS POR EJECUTAR	101	DÍAS POR EJECUTAR	101
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	240 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:	240 DIAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	139 DIAS EQUIVALE AL 57.9%	PLAZO TRANSCURRIDO:	139 DIAS EQUIVALE AL 57.9%
VALOR INICIAL :	$ 68,352,127.00	VALOR INICIAL :	$ 615,192,918.00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 68,352,127.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 615,192,918.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 68,352,127.00	VALOR POR PAGAR:	$ 615,192,918.00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado

4.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tuberia pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5.3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5.8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mamposteria de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tuberia de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6.4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mamposteria de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8.1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado

8.2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC.**			no iniciado
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA.			no iniciado
8.3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 330,008,352.92	53.64%	6.09%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 367,443,784.14	59.73%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchan	93,399,584	Director de obra
Ricardo Hernandez Guzman	1,110,544,123	Residente de obra
Maria Sorley Hernandez Barragan	26,968,272	Psicologa social
Miguel Angel López Cleves	1,004,074,969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93,020,393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1,110,175,094	Oficial de obra
Jhon Jairo Rada Conda	93,021,822	Ayudante de obra
Kristian Alonso Solano Gallego	1,109,415,938	Ayudante de obra
Jairo Lozano Cuellar	12,160,094	Ayudante de obra
Jhon Fredy Yate Velez	93,021,279	Ayudante de obra
Gerson Caleño	1,109,419,087	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0.00%	27.27%	3
	TECNICO	3	0	27.27%	0.00%	3
	M.O/N.C	0	5	0.00%	45.45%	5
	TOTALES	**3**	**8**	**27.27%**	**72.73%**	**11**
	TOTAL	**11**		**100%**		



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista en este periodo se continuó actividades de ejecución en el municipio de Neiva; se terminaron un secadero de café y dos sistemas sépticos de aguas residuales domésticas.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas. El 16 de mayo de 2025 se aprobó el otrosí al contrato de obra por parte de la Entidad.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SECADERO DE CAFÉ - MARITZA NINCO - NEIVA



SSARD - CAROLINA ROJAS VANEGAS - NEIVA



SECADERO DE CAFÉ - MARITZA NINCO - NEIVA



SSARD - EDUARDO QUINO QUIÑONES - NEIVA

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024

FECHA REALIZACIÓN:	26 de mayo de 2025	PERIODO No.	21	DEL	19/05/2025	AL	25/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva, Acevedo, Elías y Paicol - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	485 DE 2024				CONTRATO No.:	490 DE 2024			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			
NIT / C.C.:	79,142,300				NIT / C.C.:	901898260-0			
PLAZO INICIAL:	8	MESES			PLAZO INICIAL:	8	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024				FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2024			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	-	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	94				DÍAS POR EJECUTAR	94			
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de agosto de 2025			
PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	146	DIAS	EQUIVALE AL	60.8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	146	DIAS	EQUIVALE AL	60.8%
VALOR INICIAL :	$	68,352,127.00			VALOR INICIAL :	$	615,192,918.00		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	68,352,127.00			VALOR ACTUALIZADO:	$	615,192,918.00		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	68,352,127.00			VALOR POR PAGAR:	$	615,192,918.00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/12/2024	30/12/2024	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	2/01/2025	2/01/2025	0
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	24/03/2025	2/05/2025	-39
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**	28/04/2025	3/03/2025	56
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
2.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS.			no iniciado
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.			no iniciado
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	27/03/2025	88
3.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR.			no iniciado
3.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
3.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2".**	23/06/2025	1/04/2025	83
4.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA.			no iniciado

4.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
4.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tuberia pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv.**	24/02/2025	3/03/2025	-7
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
5.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
5.3	INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, I ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR.			no iniciado
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INTERIOR DEL TANQUE RECUBIERTO CON GEOMENBRANA CALIBRE 40000 POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SELLADA CON TERMOFUSIÓN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE MANGUERA 1" SOBRE LA LÁMINA EN EL DIAMETRO SUPERIOR DEL TANQUE y LA BRIDA.			no iniciado
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALAMCENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3,5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS EN GEOMEBRANA. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO.			no iniciado
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.			no iniciado
5.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
5.8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mamposteria de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**	17/03/2025	3/03/2025	14
6.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD.**			no iniciado
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS.			no iniciado
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA.			no iniciado
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT.			no iniciado
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
6.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80.**			no iniciado
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI.			no iniciado
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40.**			no iniciado
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
6.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
6.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA.			no iniciado
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL.			no iniciado
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2".			no iniciado
6.4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
6.4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante.**	21/04/2025	4/04/2025	17
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			no iniciado
7.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3			no iniciado
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA.			no iniciado
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10).			no iniciado
7.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
7.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mamposteria de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	14/04/2025	3/03/2025	42
8.1	**SISTEMA SÉPTICO.**			no iniciado
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M.			no iniciado
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.			no iniciado
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL.			no iniciado
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS.			no iniciado
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4"			no iniciado
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1".			no iniciado

8.2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC.**			no iniciado
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA.			no iniciado
8.3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**			no iniciado
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.			no iniciado
8.3.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.			no iniciado
8.3.3	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4".			no iniciado
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2".			no iniciado
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES.			no iniciado
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES.			no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 340,537,617.83	55.35%	12.41%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 416,878,612.20	67.76%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchan	93,399,584	Director de obra
Ricardo Hernandez Guzman	1,110,544,123	Residente de obra
Maria Sorley Hernandez Barragan	26,968,272	Psicologa social
Miguel Angel López Cleves	1,004,074,969	Tecnólogo en obras civiles
Nemesio Urueña Palma	93,020,393	Maestro de obra
Wilson Danobis Ascencio Yate	1,110,175,094	Oficial de obra
Jhon Jairo Rada Conda	93,021,822	Ayudante de obra
Kristian Alonso Solano Gallego	1,109,415,938	Ayudante de obra
Jairo Lozano Cuellar	12,160,094	Ayudante de obra
Jhon Fredy Yate Velez	93,021,279	Ayudante de obra
Gerson Caleño	1,109,419,087	Ayudante de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0.00%	27.27%	3
	TECNICO	3	0	27.27%	0.00%	3
	M.O/N.C	0	5	0.00%	45.45%	5
	TOTALES	**3**	**8**	**27.27%**	**72.73%**	**11**
	TOTAL	**11**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista en este periodo se continuó actividades de ejecución en el municipio de Neiva; se terminaron 1 secadero de café y un secadero de cacao. Se realizó la construcción de un sistema séptico de aguas residuales domésticas y dos campos de infiltración.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría realizó control y seguimiento a las actividades realizadas en el periodo, con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SSARD - JHON JAIRO PASCUAS - MUNICIPIO DE NEIVA



SSARD - JHON JAIRO PASCUAS - MUNICIPIO DE NEIVA



SECADERO DE CAFÉ - CAROLINA ROJAS VANEGAS - NEIVA



SECADERO DE CACAO - JOSE BENITO SANCHEZ - NEIVA

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

SGC-CP-17113-25
Neiva, junio 04 de 2025

Señores
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Representante Legal

Ref.: Contrato obra No.490 de 2024

Asunto: Solicitud programación de los "Talleres de sensibilización"

Cordial saludo.

Para el desarrollo y cumplimiento del ítem No.9 del presupuesto contractual "*Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural*", se solicita que sea enviado a esta interventoría la programación de dicha actividad, la cual contenga fecha, hora y sitios donde se ejecutará cada taller; además, el material que será presentado y entregado a la comunidad.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33874231	I	2025-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	260.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33874231	2025-07-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	2.000.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	3	260.500	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33874231	I	2025-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	260.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33874231	2025-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.000.000	2.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	0	10.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.500	0	0	0	10.500
Gran Total					260.500	0	0	0	260.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33986955	E	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.390.400	7.800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	33986955	2025-07-02	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
2	CC 12108510	VASQUEZ ALVARADO EZEQUIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
3	CC 12123533	QUIZA CAMACHO HUMBERTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
4	CC 12123891	PARRA OLAYA WILLIAM	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
5	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	1.598.700	F		X														0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	692.770	110.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	692.770	27.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	692.770	27.800	692.770	48.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	214.800	S	5711001
6	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	213.100	S	5711001
7	CC 1082157578	SARRIA TRUJILLO ADOLFO	1.423.500	F		X														0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	616.850	98.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	616.850	24.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	616.850	24.700	616.850	43.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	191.100	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33986955	E	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.390.400	7.800	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	33986955	2025-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.003.620	8.427.120	8.427.120	8.427.120	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.120.800	0	3.700	0	1.124.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	800	0	228.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	683.400	0	2.200	0	685.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	209.600	0	700	0	210.300
EPS(Administradoras: 2)				7	337.500	0	1.100	0	338.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	223.500	0	700	0	224.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	114.000	0	400	0	114.400
ARP(Administradoras: 1)				7	586.800	0	1.900	0	588.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	586.800	0	1.900	0	588.700
CCF(Administradoras: 1)				7	337.500	0	1.100	0	338.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	337.500	0	1.100	0	338.600
Gran Total					2.382.600	0	7.800	0	2.390.400
