ASPROMA

Ocaña, 14 de julio de 2025.

Ingeniero:
GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda
Ciudad

REF. SOLICITUD DE PAGO PERIODO 29 ABRIL AL 7 DE JULIO DE 2025– CONTRATO DE OBRA No. LP - SVIV 001 DEL 2024, CUYO OBJETO "CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGUIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

Cordal Saludo

Por medio del presente me permito allegar a usted la documentación relacionada para la solicitud de pago del **CONTRATO DE OBRA No. LP - SVIV 001 DEL 2024**. El periodo comprendido del 29 de abril al 7 de julio de 2025, la cual corresponde al periodo señalado en la referencia, por un valor de **TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE ($309.810.902) M/CTE.**

Para efectos de esta, se adjuntan los siguientes documentos en el orden señalado a continuación:

1. Acta de recibo parcial 1 con sus memorias
2. Informe de cumplimiento y/o actividades
3. Factura electrónica
4. Soporte de planilla de seguridad social
5. Aportes parafiscales actualizados, certificados por un contador público autorizado
6. Certificación bancaria
7. Rut (actualizado)
8. Informe de supervisión final

Agradezco su atención,

ING. MARIA CANDELARIA DURAN VEGA
Representante Legal ASPROMA
Contratista

ASPROMA NIT: 807.002.080-6
Dirección: Cra 11 No 15-440 Barrio san Antonio - Ocaña N. de S.
TELEFAX: 5694794- Celular 3142866691-3144066961
Email: asproma@gmail.com

Bancolombia

Ocaña, 13 de junio de 2025

Señores
A quien pueda interesar
Ciudad

BANCOLOMBIA, se permite informar que **ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL,** identificada con NIT número **807.002.080**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco el siguiente producto:

PRODUCTO	NUMERO	FECHA APERTURA	ESTADO
Cuenta de Ahorros	318-896897-17	2012/10/26	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 5610388 Ext. 130 de Ocaña, o en nuestra sucursal 318 Ocaña ubicada en la calle 11 #12-48 centro.

Cordialmente,

MILER FABIAN GARCIA CLAVIJO
Ejecutivo Senior Pyme
Zona Norte de Santander
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Nit:807.002.080
CRA 11 No 15 - 440 Barrio San Antonio
Ocaña Norte de Santander
aspromao22@gmail.com
Tel 7-5694794 Cel:3142866691-3118971326

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AS-160

FECHA Y HORA EMISION 15/07/2025 - 11:59:19 a. m.
NIT ó C.C: 890501102-2
CLIENTE: MUNICIPIO DE OCAÑA
TEL: 5636300
DIRECCION: CRA 12 #10-42 PALACIO MUNICIPAL
CIUDAD: Ocaña
EMAIL: contabilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
FORMA DE PAGO: CREDITO - 30 dias
Fecha Vencimiento: 14/08/2025

CUFE:e1e28788d74eab77a79bd928a63b8bc0f245a8eab9a81231f8627b650e7a860d0ec09439f3bcbdfaed88ec7dd52e2efe

CANT.	DESCRIPCION	UND	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	COSTO DE OBRA ACTA PARCIAL No.01 DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	UND	0	309,810,902.00	309,810,902.00

SON : TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

OBSERVACIONES : FAVOR REALIZAR LA CONSIGNACION A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°31889689717 A NOMBRE DE ASPROMA

SUBTOTAL	309,810,902.00
IVA	0.00
TOTAL	**309,810,902.00**

ATENTAMENTE:

FIRMA ACEPTADA:

C.C O NIT / FECHA

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN N° 18764078046788. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL AS 144 HASTA AS 500 FECHA 27/08/2024 VIGENCIA 12 MESES 27/08/2025

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 774 del Codigo de Comercio. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia aqui descrita.

ASPROMA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo, **LINA FERNANDA ASCANIO DELGADO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.064.837.264 expedida en Rio de Oro, y con Tarjeta Profesional No.180721-T SI de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la "**ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL "ASPROMA"** Identificada con Nit. 807.002.080-6 debidamente inscrito en la Cámara de Ocaña , Norte de Santander y luego de examinar los pagos de seguridad social de la entidad de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por ASPROMA en el periodo comprendido entre el veintinueve (29) de abril de 2025 al siete(7) de julio 2025 .

La presente Certificación se expide a solicitud de la entidad contratista con destino al MUNICIPIO DE OCAÑA, para el cumplimiento de requisitos del cobro del ACTA PARCIAL 1 dentro del CONTRATO DE OBRA No. LP - SVIV 001 DEL 2024, cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGUIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**.

Suscrita en Ocaña, el siete (7) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

LINA FERNANDA ASCANIO DELGADO
C.C. No 1.064.837.264 de Rio de Oro
Revisor Fiscal "ASPROMA"
NIT 807.002.080-6
Tarjeta Profesional No 180721-T SI

ASPROMA

ACTA RECIBO PARCIAL

ASPROMA NIT: 807.002.080-6
Dirección: cra 11 Nro 15-446 Barrio San Antonion - Ocaña N. de S.
Celular 3142866691
Email: aspromaapm2025@gmail.com

Alcaldía de Ocaña · ASPROMA · UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N°1**

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**		**CONTROL DE POLIZA (Nuevo)**
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**		
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:**	**FECHA DE REINICIO:**	
	PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES	**PLAZO FINAL:**	
INTERVENTOR	**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025		
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00		
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA:** 24 DE JUNIO DE 2025		

Cobertura	V/r Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 140.805.824,50	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/12/2025
Salario y Prestaciones	$ 281.611.649,00	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/08/2025
Estabilidad	$ 422.417.473,50	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 29/08/2030
Responsabilidad civil	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 29/08/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 7 de Julio del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA N°1** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				ITEM
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES(+) MENORES (-)	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA												
1,1	**PRELIMINARES**											**1,1**
1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	767,62	$ 5.351,00	$ 4.107.535,00			767,15	$ 4.105.020,00	767,15	$ 4.105.020,00	1,1,1
1,1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (CUBIERTA)	M3	9,36	$ 91.182,00	$ 853.464,00			7,37	$ 672.103,00	7,37	$ 672.103,00	1,1,2
1,1,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN	M3	111,09	$ 16.646,00	$ 1.849.204,00			100,51	$ 1.673.089,00	100,51	$ 1.673.089,00	1,1,3
1,1,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (CUBIERTA)	M3	77,29	$ 82.654,00	$ 6.388.162,00			33,65	$ 2.781.679,00	33,65	$ 2.781.679,00	1,1,4
1,1,5	RETIRO DE ESCOMBROS, excavaciones estructura de cubierta	M3	144,54	$ 42.911,00	$ 6.202.356,00			129,46	$ 5.555.138,00	129,46	$ 5.555.138,00	1,1,5
				VR. PARCIAL	**$ 19.400.721,00**			***VR. PARCIAL***	**$ 14.787.029,00**	***VR. PARCIAL***	**$ 14.787.029,00**	
1,2	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**											**1,2**
1,2,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E:0,05M PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	74,06	$ 104.142,00	$ 7.712.757,00			43,29	$ 4.508.307,00	43,29	$ 4.508.307,00	1,2,1
1,2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUEBIERTA	M3	37,03	$ 1.486.590,00	$ 55.048.428,00			23,81	$ 35.388.275,00	23,81	$ 35.388.275,00	1,2,2
1,2,3	PEDESTALES EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M3	2,27	$ 1.486.600,00	$ 3.371.609,00			2,43	$ 3.612.438,00	2,43	$ 3.612.438,00	1,2,3
1,2,4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUIBIERTA	M3	7,31	$ 1.486.600,00	$ 10.864.073,00			4,37	$ 6.493.469,00	4,37	$ 6.493.469,00	1,2,4
1,2,5	CONCRETO CICLOPEO 60/40 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M3	29,62	$ 891.542,00	$ 26.411.040,00			27,24	$ 24.288.724,00	27,24	$ 24.288.724,00	1,2,5
1,2,6	COLUMNAS EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M3	15,50	$ 1.508.488,00	$ 23.378.547,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,2,6

Alcaldía de Ocaña · ASPROMA · UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N°1**
CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**	**CONTROL DE POLIZA (Nuevo)**
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**	
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:** — **FECHA DE REINICIO:**	
	PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES — **PLAZO FINAL:**	
INTERVENTOR	**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025	
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00	
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA:** 24 DE JUNIO DE 2025	

Cobertura	V/r Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 140.805.824,50	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/12/2025
Salario y Prestaciones	$ 281.611.649,00	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/08/2025
Estabilidad	$ 422.417.473,50	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 29/08/2030
Responsabilidad civil	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 29/08/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 7 de Julio del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA N°1** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				ITEM
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES(+) MENORES (-)	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1,2,7	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M3	7,31	$ 1.508.385,00	$ 11.023.278,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,2,7
1,2,8	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	KG	11.945,01	$ 12.628,00	$ 150.841.586,00			5720,48	$ 72.238.187,00	5720,48	$ 72.238.187,00	1,2,8
				VR. PARCIAL	**$ 288.651.318,00**			*VR. PARCIAL*	**$ 146.529.400,00**	*VR. PARCIAL*	**$ 146.529.400,00**	
1,3	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**											1,3
1,3,1	ESTRUCTURA METALICA DE CERCHAS PARABOLICAS PARA CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO, INCLUYE: CERCHAS, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA PARA APOYOS. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	10.999,63	$ 31.702,00	$ 348.710.324,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,3,1
1.3.2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	27,00	$ 86.266,00	$ 2.329.182,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1.3.2
1.3.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL. 22	ML	63,80	$ 90.108,00	$ 5.748.890,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1.3.3
1.3.4	SUM E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA	M2	816,00	$ 126.871,00	$ 103.526.990,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1.3.4
				VR. PARCIAL	**$ 460.315.386,00**			*VR. PARCIAL*	**$ -**	*VR. PARCIAL*	**$ -**	
	2. CONSTRUCCION DE CANCHA											
2,1	**PRELIMINARES**											2,1
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (CANCHA)	M3	74,22	$ 91.182,00	$ 6.767.658,00			74,04	$ 6.750.997,00	74,04	$ 6.750.997,00	2,1,1
2,1,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (CANCHA)	M3	19,39	$ 82.654,00	$ 1.602.766,00			19,00	$ 1.570.426,00	19,00	$ 1.570.426,00	2,1,2
2,1,3	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO CANCHA EXISTENTE	M2	452,81	$ 31.998,00	$ 14.488.989,00			452,81	$ 14.488.989,00	452,81	$ 14.488.989,00	2,1,3

Alcaldía de Ocaña — ASPROMA — UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**		
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**		
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:**	**FECHA DE REINICIO:**	
	PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES	**PLAZO FINAL:**	
INTERVENTOR	**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025		
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00		
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA:** 24 DE JUNIO DE 2025		

CONTROL DE POLIZA (Nuevo)

Cobertura	V/r Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 140.805.824,50	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/12/2025
Salario y Prestaciones	$ 281.611.649,00	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/08/2025
Estabilidad	$ 422.417.473,50	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 29/08/2030
Responsabilidad civil	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 29/08/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 7 de Julio del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA N°1** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				ITEM
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES(+) MENORES (-)	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
2,1,4	RETIRO DE ESCOMBROS, adecuacion cancha	M3	143,40	$ 42.911,00	$ 6.153.558,00			98,43	$ 4.223.937,00	98,43	$ 4.223.937,00	2,1,4
				VR. PARCIAL	$ 29.012.971,00			*VR. PARCIAL*	$ 27.034.349,00	*VR. PARCIAL*	$ 27.034.349,00	
2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO											2,2
2,2,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E:0,05M PARA MURO	M2	10,24	$ 104.142,00	$ 1.066.414,00			6,24	$ 649.534,00	6,24	$ 649.534,00	2,2,1
2,2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	M3	3,07	$ 1.207.060,00	$ 3.708.088,00			3,00	$ 3.621.180,00	3,00	$ 3.621.180,00	2,2,2
2,2,3	PEDESTALES EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	M3	1,44	$ 1.172.120,00	$ 1.687.853,00			0,90	$ 1.054.908,00	0,90	$ 1.054.908,00	2,2,3
2,2,4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	M3	6,14	$ 1.172.120,00	$ 7.201.505,00			5,11	$ 5.990.823,00	5,11	$ 5.990.823,00	2,2,4
2,2,5	CONCRETO CICLOPEO 60/40 PARA MURO	M3	2,55	$ 891.542,00	$ 2.272.362,00			2,50	$ 2.228.855,00	2,50	$ 2.228.855,00	2,2,5
2,2,6	COLUMNAS EN CONCRETO 3500PSI,PARA MURO	M3	2,00	$ 1.229.147,00	$ 2.458.294,00			1,41	$ 1.728.488,00	1,41	$ 1.728.488,00	2,2,6
2,2,7	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	M3	1,77	$ 1.194.049,00	$ 2.113.467,00			1,30	$ 1.551.517,00	1,30	$ 1.551.517,00	2,2,7
2,2,8	LOSAS DE CONCRETO E:0,08 M PARA ANDEN, Incluye malla Electrosoldada	M2	28,18	$ 109.538,00	$ 3.087.022,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,2,8
2,2,9	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DEL MURO	KG	1.402,85	$ 12.628,00	$ 17.715.155,00			1337,15	$ 16.885.517,00	1337,15	$ 16.885.517,00	2,2,9
2,2,10	MURO EN LADRILLO DOBLE e=0,25 M	M2	67,97	$ 135.179,00	$ 9.187.846,00			28,07	$ 3.794.001,00	28,07	$ 3.794.001,00	2,2,10
2,2,11	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO	M2	63,72	$ 58.149,00	$ 3.705.254,00			37,31	$ 2.169.655,00	37,31	$ 2.169.655,00	2,2,11
2,2,12	PINTURA PARA EXTERIORES VINILTEX O SIMILAR	M2	132,60	$ 25.183,00	$ 3.339.266,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,2,12
2,2,13	PISO PLACA CONCRETO E=10CMS. SUMINISTRO Y VACIADO DE PLACA DE PISO E=10CMS., EN CONCRETO DE 3000 PSI., VIBRADO Y CURADO, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	767,62	$ 156.742,00	$ 120.318.294,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,2,13
				VR. PARCIAL	$ 177.860.820,00			*VR. PARCIAL*	$ 39.674.478,00	*VR. PARCIAL*	$ 39.674.478,00	

Alcaldía de Ocaña · ASPROMA · UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N°1**

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**		
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**		
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:**	**FECHA DE REINICIO:**	
	PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES	**PLAZO FINAL:**	
INTERVENTOR	**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025		
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00		
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA:** 24 DE JUNIO DE 2025		

CONTROL DE POLIZA (Nuevo)

Cobertura	V/r Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 140.805.824,50	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/12/2025
Salario y Prestaciones	$ 281.611.649,00	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/08/2025
Estabilidad	$ 422.417.473,50	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 29/08/2030
Responsabilidad civil	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 29/08/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 7 de Julio del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA N°1** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				ITEM
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES(+) MENORES (-)	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
2,3	**VARIOS**											2
2,3,1	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES. Parte posterior arquerias a 5,00 m de altura	M2	281,35	$ 533.960,00	$ 150.229.646,00			116,60	$ 62.259.736,00	116,60	$ 62.259.736,00	2,3,1
2,3,2	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES. Parte lateral a 2,50 m de altura	M2	141,40	$ 452.105,00	$ 63.927.647,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,3,2
				VR. PARCIAL	**$ 214.157.293,00**			***VR. PARCIAL***	**$ 62.259.736,00**	***VR. PARCIAL***	**$ 62.259.736,00**	
2,4	**ACABADOS DE LA CANCHA**											2
2,4,1	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHA MULTIFUNCIONAL	M2	671,43	$ 122.373,00	$ 82.164.903,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,4,1
2,4,2	DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCIONAL	ML	417,75	$ 37.564,00	$ 15.692.361,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,4,2
2,4,3	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERÍA MICRO-FUTBOL, TABLERO DE BALONCESTO E IMPLEMENTOS DE VOLEIBOL. Tipo INDER	UND	2,00	$ 5.393.230,00	$ 10.786.460,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,4,3
				VR. PARCIAL	**$ 108.643.724,00**			***VR. PARCIAL***	**$ -**	***VR. PARCIAL***	**$ -**	
	3. REDES ELECTRICAS DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL											
3,1	**ACOMETIDA ELECTRICA**											3,1
3,1,1	SISTEMA DE MEDIDA BIFASICO TRIFILAR	UND	1,00	$ 2.869.170,00	$ 2.869.170,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,1
3,1,2	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFAASICO CON TOTALIZADOR 2X 40 AMP X 12 SALIDAS INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	1,00	$ 1.794.102,00	$ 1.794.102,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,2
3,1,3	ACOMETIDA BIFASICA 2F#10+1#10T DUCTO ¾ +1UND	ML	45,08	$ 127.480,00	$ 5.746.798,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,3
3,1,4	ACOMETIDA BIFASICA #12 2F+1T 3 X 14	ML	50,76	$ 125.864,00	$ 6.388.857,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,4
3,1,5	SALIDAS TOMACORRIENTE MONOFASICO CON POLO A TIERRA	UND	10,00	$ 168.854,00	$ 1.688.540,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,5

Alcaldía de Ocaña · ASPROMA · UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N°1**

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**		
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**		
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:**	**FECHA DE REINICIO:**	
	PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES	**PLAZO FINAL:**	
INTERVENTOR	**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025		
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00		
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA:** 24 DE JUNIO DE 2025		

CONTROL DE POLIZA (Nuevo)

Cobertura	V/r Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 140.805.824,50	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/12/2025
Salario y Prestaciones	$ 281.611.649,00	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/08/2025
Estabilidad	$ 422.417.473,50	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 29/08/2030
Responsabilidad civil	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 29/08/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 7 de Julio del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA N°1** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				ITEM
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES(+) MENORES (-)	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
3,1,6	SISTEMA DE PUESTA TIERRA GENERAL	UND	1,00	$ 1.423.735,00	$ 1.423.735,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,6
3,1,7	CAJA DE DISTRIBUCION BT 40X40 CON MARCO METALICO	UND	6,00	$ 749.685,00	$ 4.498.110,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,7
3,1,8	REFLECTOR LED MULTIVOLTAJE 200 WAT	UND	12,00	$ 1.476.821,00	$ 17.721.852,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,8
3,1,9	SISTEMA DE EQUIPOTENCIALIZACION DE ESTRUCTURA O CUBIERTA	UND	1,00	$ 12.972.195,00	$ 12.972.195,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,1,9
				VR. PARCIAL	$ 55.103.359,00			*VR. PARCIAL*	$ -	*VR. PARCIAL*	$ -	
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				**$ 1.353.145.592,00**				**$ 290.284.992,00**		**$ 290.284.992,00**	
	VALOR IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA				**$ 39.051.820,00**				**$ 19.525.910,00**		**$ 19.525.910,00**	
	VALOR LEGALIZACION PROYECTO ELECTRICO				**$ 15.860.833,00**				**$ -**		**$ -**	
	ADMINISTRACION - A (24%)											
	IMPREVISTOS - I (1%)											

Alcaldía de Ocaña / ASPROMA / UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N°1**

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**		
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**		
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:**	**FECHA DE REINICIO:**	
	PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES	**PLAZO FINAL:**	
INTERVENTOR	**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025		
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00		
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA:** 24 DE JUNIO DE 2025		

CONTROL DE POLIZA (Nuevo)

Cobertura	V/r Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 140.805.824,50	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/12/2025
Salario y Prestaciones	$ 281.611.649,00	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 29/08/2025
Estabilidad	$ 422.417.473,50	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 29/08/2030
Responsabilidad civil	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 29/08/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 7 de Julio del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA N°1** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				ITEM
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES(+) MENORES (-)	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
	UTILIDAD - U (5%)											
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 1.408.058.245,00				$ 309.810.902,00		$ 309.810.902,00	

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 309.810.902,00**
SON: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE	

Firman los que en ella intervienen a los 7 dias del mes de Julio del 2025;

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda
Supervisor

MARIA CANDELARIA DURAN VEGA
R.L./ ASPROMA
Contratista

FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
R.L./ UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS
Interventor

ASPROMA

MEMORIA DE CANTIDADES

ASPROMA NIT: 807.002.080-6
Dirección: cra 11 Nro 15-446 Barrio San Antonion - Ocaña N. de S.
Celular 3142866691
Email: aspromaapm2025@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 28 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD 7	MM 7	AA 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA			CONTRATISTA

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,3	VARIOS	ITEM	2,3,1	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES. Parte posterior arquerías a 5,00 m de altura	UNID.	M2	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Cerramiento zona norte	23,32		5,00	1,00	116,60
Cerramiento zona sur	22,95		5,00		0,00
Cerramiento lateral	2,50		5,00		0,00
				Subtotal	116,60
				TOTAL	116,60

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 27 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO							CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RESPONSABLE							ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — CONTRATISTA

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,11	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO	UNID.	M2	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Cara frontal muro		23,32	1,60	1,00	37,31
Cara laretal muro		11,10	1,00		0,00
				Subtotal	37,31
				TOTAL	37,31

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER						CONTRATISTA
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA						

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,10	MURO EN LADRILLO DOBLE e=0,25 M	UNID.	M2	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Cara frontal muro		2,31	1,35	9,00	28,07
Cara laretal muro		2,46	0,45	8,00	
				Subtotal	28,07
				TOTAL	28,07

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS
		FECHA DE EMISION: 07/07/2025
		PAG: 25 28 — VERSION: 1


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD 7	MM 7	AA 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			CONTRATISTA
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA			

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,9	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DEL MURO	UNID.	KG	UBICACIÓN	



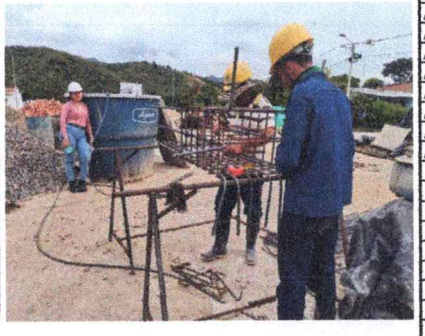

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Kg/ml	Cant.		
Acero Viga de aerea					
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	9,60	1,560	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	9,10	1,560	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	6,20	1,560	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	10,20	1,560	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	8,85	1,560	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	5,85	1,560	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	11,30	1,560	4,00		0,00
Acero Transversal Varilla 3/8"	0,81	0,560	275,00		0,00
				Subtotal	0,00
				TOTAL	1.337,15

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD 7	MM 7	AA 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCANA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
RESPONSABLE	ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA				CONTRATISTA	

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,9	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DEL MURO	UNID.	KG	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Kg/ml	Cant.		
Acero Zapatas					
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	1,59	1,000	4,00	9,00	57,24
Acero Transversal Varilla 5/8"	1,59	1,000	4,00	9,00	57,24
Acero Pedestales y Columnas					
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	1,50	1,560	4,00	9,00	84,24
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	1,50	1,560	4,00	9,00	84,24
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	1,00	1,560	8,00	9,00	112,32
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	1,89	1,560	4,00	9,00	106,14
Acero Transversal Varilla 3/8"	1,01	0,560	25,00	9,00	127,26
Acero Transversal Varilla 3/8"	0,81	0,560	32,00	9,00	130,64
Acero Viga de cimentacion					
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	9,60	1,560	2,00	1,00	29,95
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	9,10	1,560	2,00	1,00	28,39
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	6,20	1,560	2,00	1,00	19,34
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	10,20	1,560	2,00	1,00	31,82
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	8,85	1,560	2,00	1,00	27,61
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	5,85	1,560	2,00	1,00	18,25
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	11,30	1,560	4,00	2,00	141,02
Acero Transversal Varilla 3/8"	1,01	0,560	385,00	1,00	217,76
				Subtotal	1.273,48
				TOTAL	1.273,48

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 23 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO							CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RESPONSABLE							ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — CONTRATISTA

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,7	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Viga aerea Tipo cara frontal	2,31	0,25	0,25	9,00	1,30
Viga aerea Tipo cara lateral	2,46	0,25	0,25	0,00	0,00
				Subtotal	1,30
				TOTAL	1,30

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD 7	MM 7	AA 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			CONTRATISTA
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA			

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,6	COLUMNAS EN CONCRETO 3500PSI,PARA MURO	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Columna Tipo cara frontal	2,25	0,25	0,25	10,00	1,41
Columna Tipo cara lateral	2,25	0,25	0,25		0,00
				Subtotal	1,41
				TOTAL	1,41

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 21 28 VERSION: 1


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO							CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RESPONSABLE							ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — CONTRATISTA

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,5	CONCRETO CICLOPEO 60/40 PARA MURO	UNID.	M3	UBICACIÓN	



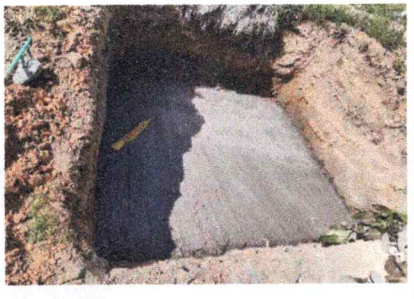

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Zapata Tipo cara frontal N°1	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°2	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°3	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°4	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°5	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°6	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°7	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°8	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°9	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara frontal N°10	1,00	1,00	0,25		0,25
Zapata Tipo cara lateral N°1	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°2	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°3	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°4	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°5	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°6	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°7	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°8	1,00	1,00			0,00
				Subtotal	2,50
			TOTAL		2,50

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNIÓN TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 20 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO							CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RESPONSABLE							ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — CONTRATISTA

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Viga de cimentación muro frontal	2,31	0,30	0,30	9,00	1,87
Viga de cimentación muro lateral	2,46	0,30	0,30	0,00	0,00
Viga de cimentacion cerramiento	89,70	0,30	0,30		0,00
Viga de anclaje cerramiento	0,30	0,30	1,00	36,00	3,24
				Subtotal	5,11
				TOTAL	5,11

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 19 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO							CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RESPONSABLE							ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — CONTRATISTA

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,3	PEDESTALES EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Pedestal Tipo cara frontal N°1	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°2	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°3	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°4	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°5	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°6	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°7	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°8	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°9	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara frontal N°10	0,30	0,30	1,00		0,09
Pedestal Tipo cara lateral N°1	0,30	0,30			0,00
Pedestal Tipo cara lateral N°2	0,30	0,30			0,00
Pedestal Tipo cara lateral N°3	0,30	0,30			0,00
Pedestal Tipo cara lateral N°4	0,30	0,30			0,00
Pedestal Tipo cara lateral N°5	0,30	0,30			0,00
Pedestal Tipo cara lateral N°6	0,30	0,30			0,00
Pedestal Tipo cara lateral N°7	0,30	0,30			0,00
Pedestal Tipo cara lateral N°8	0,30	0,30			0,00
				Subtotal	0,90
				TOTAL	0,90

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	


CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 18 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
RESPONSABLE	ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA				CONTRATISTA	

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	UNID.	M3	UBICACIÓN	

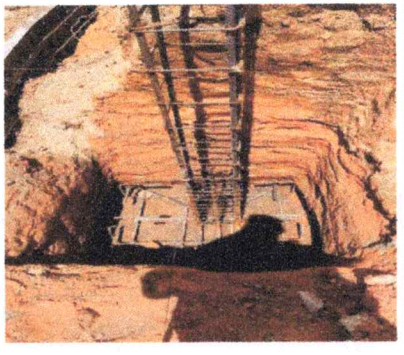



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Zapata Tipo cara frontal N°1	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°2	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°3	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°4	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°5	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°6	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°7	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°8	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°9	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara frontal N°10	1,00	1,00	0,30		0,30
Zapata Tipo cara lateral N°1	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°2	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°3	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°4	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°5	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°6	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°7	1,00	1,00			0,00
Zapata Tipo cara lateral N°8	1,00	1,00			0,00
				Subtotal	3,00
				TOTAL	3,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 17 28 VERSION: 1


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD 7	MM 7	AA 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA			CONTRATISTA

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	2,2,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E:0,05M PARA MURO	UNID.	M2	UBICACIÓN	



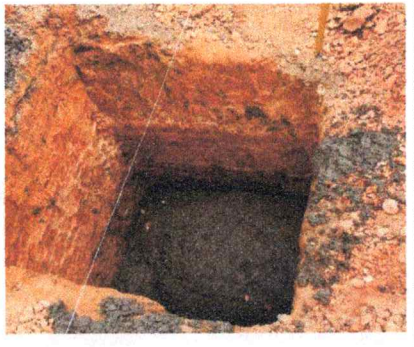

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Viga de cimentación muro frontal	2,31	0,30		9,00	6,24
Viga de cimentación muro lateral	2,46	0,30		0,00	0,00
				Subtotal	6,24
				TOTAL	6,24

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 16 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO							CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RESPONSABLE							ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — CONTRATISTA

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,1	PRELIMINARES	ITEM	2,1,4	RETIRO DE ESCOMBROS, adecuacion cancha	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Volumen Excavacion Manual					74,04
Volumen demolicon losa					45,28
Porcentaje de expansión					1,20
				Subtotal	143,18
				TOTAL	143,18

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 15 28 VERSION: 1


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA				CONTRATISTA	

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,1	PRELIMINARES	ITEM	2,1,3	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO CANCHA EXISTENTE	UNID.	M2	UBICACIÓN	



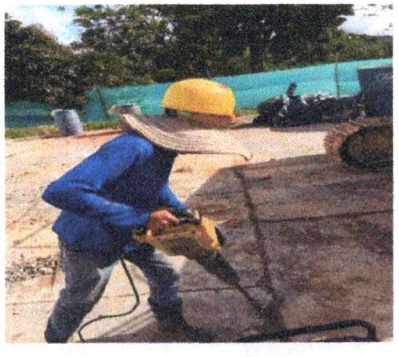

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Largo	28,23				452,81
Ancho	16,04				
				Subtotal	452,81
				TOTAL	452,81

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 14 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025		
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER							
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA						CONTRATISTA	

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,1	PRELIMINARES	ITEM	2,1,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (CANCHA)	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Volumen Excavado Manual					36,75
Volumen Excavado Maquina					0,00
Mejoramiento Ciclopeo					2,50
Concreto Solado					6,24
Concreto Zapatas					3,00
Concreto Pedestales					0,90
Concreto Vigas					5,11
				Subtotal	19,00
				TOTAL	19,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD 7	MM 7	AA 2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	CONTRATISTA	

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

SUB-CAPITULO	2,1	PRELIMINARES	ITEM	2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (CANCHA)	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Excavacion Zapatas					
Zapata Tipo cara frontal N°1	1,00	1,00	1,30	1,00	1,30
Zapata Tipo cara frontal N°2	1,00	1,00	1,60	1,00	1,60
Zapata Tipo cara frontal N°3	1,00	1,00	1,40	1,00	1,40
Zapata Tipo cara frontal N°4	1,00	1,00	1,70	1,00	1,70
Zapata Tipo cara frontal N°5	1,00	1,00	1,75	1,00	1,75
Zapata Tipo cara frontal N°6	1,00	1,00	1,60	1,00	1,60
Zapata Tipo cara frontal N°7	1,00	1,00	1,55	1,00	1,55
Zapata Tipo cara frontal N°8	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50
Zapata Tipo cara frontal N°9	1,00	1,00	1,25	1,00	1,25
Zapata Tipo cara frontal N°10	1,00	1,00	1,15	1,00	1,15
Zapata Tipo cara lateral N°1	1,00	1,00	1,30	1,00	1,30
Zapata Tipo cara lateral N°2	1,00	1,00	1,30		0,00
Zapata Tipo cara lateral N°3	1,00	1,00	1,30		0,00
Zapata Tipo cara lateral N°4	1,00	1,00	1,30		0,00
Zapata Tipo cara lateral N°5	1,00	1,00	1,30		0,00
Zapata Tipo cara lateral N°6	1,00	1,00	1,30		0,00
Zapata Tipo cara lateral N°7	1,00	1,00	1,30		0,00
Zapata Tipo cara lateral N°8	1,00	1,00	1,30		0,00
Viga de cimentación muro frontal	2,31	0,30	0,70	9,00	4,37
Viga de cimentación muro lateral	2,46	0,30	0,70		0,00
Viga de cimentacion cerramiento	89,70	0,30	0,55		0,00
Anden	15,00	0,95	0,30		0,00
Talud zona muro	23,32	1,70	1,20	1,00	47,57
Talud carrera 5	5,00	0,80	1,50	1,00	6,00
				Subtotal	74,04
			TOTAL		74,04

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

RESPONSABLE: ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — **CONTRATISTA**

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	1,2,8	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	UNID.	KG	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Kg/ml	Cant.		
Continuacion Acero Viga de cimentacion					
Acero Transversal Varilla 3/8"	1,30	0,560	228,00	2,00	331,97
Acero Viga Aerea					
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	4,00	1,552	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	5,05	1,552	10,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	2,30	1,552	10,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	3,70	1,552	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	2,65	1,552	2,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	5,90	1,552	10,00		0,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	4,75	1,552	2,00		0,00
Acero Transversal Varilla 3/8"	1,30	0,560	228,00		0,00
Desperdicio del 5%					
				Subtotal	331,97
				TOTAL	5.455,34

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA				CONTRATISTA	

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	1,2,8	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	UNID.	KG	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Kg/ml	Cant.		
Acero Zapatas					
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	2,85	1,560	20,00	14,00	1.244,88
Acero Transversal Varilla 5/8"	2,82	1,560	20,00	14,00	1.231,78
Acero Pedestales y Columnas					
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	1,90	1,560	6,00	6,00	106,70
Acero Longitudinal Varilla 1/2"	1,75	1,000	12,00	6,00	126,00
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	3,65	1,560	6,00	6,00	204,98
Acero Longitudinal Varilla 1/2"	3,45	1,000	12,00	6,00	248,40
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	2,41	1,560	6,00	6,00	135,35
Acero Longitudinal Varilla 1/2"	2,41	1,000	12,00	6,00	173,52
Acero Transversal Varilla 3/8"	1,91	0,560	84,00	6,00	539,08
Acero Transversal Varilla 3/8"	0,54	0,560	84,00	6,00	152,41
Acero Transversal Varilla 3/8"	0,69	0,560	84,00	6,00	194,75
Acero Viga de cimentacion					
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	4,00	1,560	2,00	2,00	24,96
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	5,05	1,560	10,00	2,00	157,56
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	2,30	1,560	10,00	2,00	71,76
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	3,70	1,560	2,00	2,00	23,09
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	2,35	1,560	2,00	2,00	14,66
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	5,90	1,560	10,00	2,00	184,08
Acero Longitudinal Varilla 5/8"	4,75	1,560	2,00	2,00	29,64
				Subtotal	4.863,60
			TOTAL		4.863,60

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025					
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER										
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA						CONTRATISTA				

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	1,2,5	CONCRETO CICLOPEO 60/40 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Zapata A1	2,30	2,30	0,45		2,38
Zapata B1	2,30	2,30	0,80		4,23
Zapata C1	2,30	2,30	0,80		4,23
Zapata D1	2,30	2,30			0,00
Zapata E1	2,30	2,30			0,00
Zapata F1	2,30	2,30			0,00
Zapata G1	2,30	2,30			0,00
Zapata A2	2,30	2,30	0,40		2,12
Zapata B2	2,30	2,30	0,40		2,12
Zapata C2	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata D2	2,30	2,30	0,60		3,17
Zapata E2	2,30	2,30	0,60		3,17
Zapata F2	2,30	2,30	0,60		3,17
Zapata G2	2,30	2,30			0,00
				Subtotal	27,24
			TOTAL		27,24

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA				CONTRATISTA	

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	1,2,4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUIBIERTA	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Viga de cimentación Eje 1	4,55	0,30	0,40	4,00	2,18
Viga de cimentación Eje 2	4,55	0,30	0,40	4,00	2,18
				Subtotal	4,37
			TOTAL		4,37

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS
		FECHA DE EMISION: 07/07/2025
		PAG: 8 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA				CONTRATISTA	

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	1,2,3	PEDESTALES EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Pedestal A1	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal B1	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal C1	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal D1	0,45	0,60			0,00
Pedestal E1	0,45	0,60			0,00
Pedestal F1	0,45	0,60			0,00
Pedestal G1	0,45	0,60			0,00
Pedestal A2	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal B2	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal C2	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal D2	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal E2	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal F2	0,45	0,60	1,00		0,27
Pedestal G2	0,45	0,60			0,00
				Subtotal	2,43
				TOTAL	2,43

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD 7	MM 7	AA 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA			CONTRATISTA		

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	1,2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUEBIERTA	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Zapata A1	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata B1	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata C1	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata D1	2,30	2,30			0,00
Zapata E1	2,30	2,30			0,00
Zapata F1	2,30	2,30			0,00
Zapata G1	2,30	2,30			0,00
Zapata A2	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata B2	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata C2	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata D2	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata E2	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata F2	2,30	2,30	0,50		2,65
Zapata G2	2,30	2,30			0,00
				Subtotal	23,81
				TOTAL	23,81

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 6 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER						
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA						CONTRATISTA

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ITEM	1,2,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E:0,05M PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	UNID.	M2	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Viga de cimentación Eje 1	4,55	0,30		6,00	8,19
Viga de cimentación Eje 2	4,55	0,30		6,00	8,19
Viga de cerramiento linea 1	33,50	0,30		1,00	10,05
Viga de cerramiento linea 2	33,60	0,30		1,00	10,08
Viga de cerramiento costado iglesia	22,60	0,30		1,00	6,78
				Subtotal	43,29
				TOTAL	43,29

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 5 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025		
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER							
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA						CONTRATISTA	

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,1	PRELIMINARES	ITEM	1,1,5	RETIRO DE ESCOMBROS, excavaciones estructura de cubierta	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Volumen Excavado Manual					7,37
Volumen Excavado Maquina					100,51
Porcentaje de expansión					1,20
				Subtotal	129,46
				TOTAL	129,46

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 4 28 VERSION: 1


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO							CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RESPONSABLE							ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — CONTRATISTA

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,1	PRELIMINARES	ITEM	1,1,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (CUBIERTA)	UNID.	M3	UBICACIÓN	



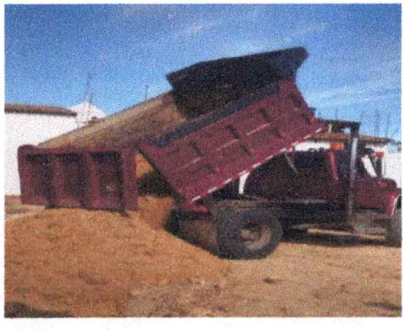

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Volumen Excavado Manual					7,37
Volumen Excavado Maquina					100,51
Mejoramiento Ciclopeo					27,24
Concreto Solado					16,38
Concreto Zapatas					23,81
Concreto Pedestales					2,43
Concreto Vigas					4,37
				Subtotal	33,65
				TOTAL	33,65

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACION PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 3 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA				CONTRATISTA	

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,1	PRELIMINARES	ITEM	1,1,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN	UNID.	M3	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Zapata A1	2,30	2,30	2,30		12,17
Zapata B1	2,30	2,30	2,30		12,17
Zapata C1	2,30	2,30	2,30		12,17
Zapata D1	2,30	2,30			0,00
Zapata E1	2,30	2,30			0,00
Zapata F1	2,30	2,30			0,00
Zapata G1	2,30	2,30			0,00
Zapata A2	2,30	2,30	1,90		10,05
Zapata B2	2,30	2,30	1,90		10,05
Zapata C2	2,30	2,30	2,00		10,58
Zapata D2	2,30	2,30	2,10		11,11
Zapata E2	2,30	2,30	2,10		11,11
Zapata F2	2,30	2,30	2,10		11,11
Zapata G2	2,30	2,30			0,00
				Subtotal	100,51
			TOTAL		100,51

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	


CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 2 28 VERSION: 1


MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD 7	MM 7	AA 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			
RESPONSABLE	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA		CONTRATISTA	

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,1	PRELIMINARES	ITEM	1,1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (CUBIERTA)	UNID.	M3	UBICACIÓN	

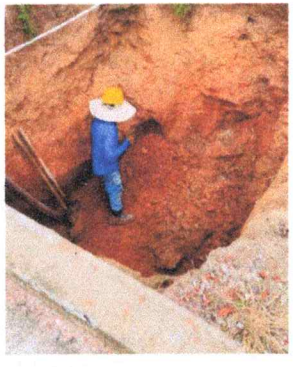

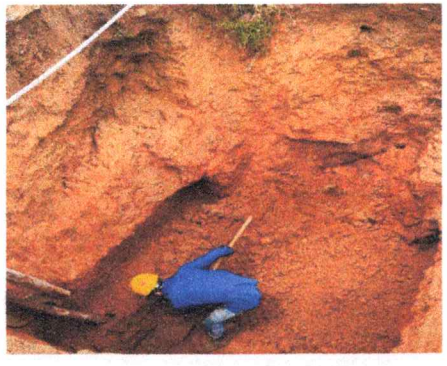

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Viga de cimentación Eje 1	4,55	0,30	0,45	6,00	3,69
Viga de cimentación Eje 2	4,55	0,30	0,45	6,00	3,69
				Subtotal	7,37
				TOTAL	7,37

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Alcaldía de Ocaña — ASPROMA	UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS FECHA DE EMISION: 07/07/2025 PAG: 1 28 VERSION: 1

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	7	MM	7	AA	2025	
NOMBRE DEL PROYECTO							CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RESPONSABLE							ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL R/L MARIA CANDELARIA DURAN VEGA — CONTRATISTA

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA

SUB-CAPITULO	1,1	PRELIMINARES	ITEM	1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNID.	M2	UBICACIÓN	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
EJES A-G	33,50				767,15
EJES 1-2	22,90				
				Subtotal	767,15
				TOTAL	767,15

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTOR	
MARIA CANDELARIA DURAN VEGA R/L ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIO AMBIENTAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON R/L UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	

ASPROMA

INFORME DE OBRA

ASPROMA NIT: 807.002.080-6
Dirección: cra 11 Nro 15-446 Barrio San Antonion - Ocaña N. de S.
Celular 3142866691
Email: aspromaapm2025@gmail.com

INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA

ACTA PARCIAL N° 1

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGUIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

ASPROMA
NIT. 807.002.080-6
Ing. MARIA CANDELARIA DURAN VEGA
CONTRATO DE OBRA No. LP - SVIV 001 DEL 2024
CONTRATISTA DE OBRA

SECRETARIO DE VIAS, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
GUSTAVO CASTILLA VERGEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

PERIODO DE INFORME: DEL 29 DE ABRIL AL 7 DE JULIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
2025

CONTENIDO

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. Ubicación

1.2. Objetivos

1.3. Alcance

1.4. Valor Total, Forma de Pago, Financiación y Plazo del Contrato

1.5. Control de Garantías para la Ejecución del Contrato

II. DESCRIPCION TECNICA Y EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. Descripción Detallada de la Ejecución por Actividades.

LISTA DE TABLAS

Tabla N° 1	Ejecución Económica del Contrato
Tabla N° 2	Cuadro de Control de Pólizas de Cumplimiento Anexo 0
Tabla N° 3	Cuadro de Control de Pólizas de Responsabilidad Civil Anexo 0
Tabla N° 4	Cuadro de Control de Pólizas de Cumplimiento Anexo 2
Tabla N° 5	Cuadro de Control de Pólizas de Responsabilidad Civil Anexo 2

LISTA DE IMÁGENES

Imagen N° 1	Localización General del Proyecto
Imagen N° 2	Ubicación Específica de la cancha a intervenir

III. OBSERVACIONES

3.1. Descripción de comité de obra que se realizó el 24 de junio de 2025

INTRODUCCION

El presente contrato, identificado con el número **LP-SVIV 001 del 2024**, tiene como objeto principal la **construcción de una cancha multifuncional en el corregimiento de Aguas Claras, municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander**. Este proyecto se enmarca dentro de los planes de desarrollo e inversión social del ente contratante, con el propósito de mejorar la infraestructura deportiva y recreativa de la comunidad, fomentando así la integración social, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

La ejecución de esta obra responde a las necesidades identificadas en el corregimiento de Aguas Claras, y busca contribuir al bienestar y desarrollo integral de sus habitantes, especialmente de niños, jóvenes y deportistas. En virtud de lo anterior, y conforme a las disposiciones legales vigentes, se suscribe el presente contrato entre las partes intervinientes, quienes se obligan a cumplir con las condiciones, términos y especificaciones establecidas.

En tal sentido y teniendo en cuenta lo anterior el presente documento contiene el INFORME PARCIAL No. 1 DE ACTIVIDADES, correspondiente al periodo comprendido entre el veintisiete (29) de abril a 7 de julio de 2025; este es realizado por la entidad contratista

Este documento se formula como cumplimiento de las responsabilidades que tiene el contratista en la ejecución del Contrato **LP-SVIV 001 del 2024**

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. UBICACIÓN.

El proyecto se desarrolla en el Municipio de Ocaña norte de Santander específicamente en el corregimiento de aguas claras en el sector donde se ubica la cancha, El centro poblado de Aguas Claras, se ubica en la entrada al sector del Catatumbo, sobre la transversal del Catatumbo, vía que comunica desde el Municipio Ocaña hasta el Municipio Convención, El Tarra y Tibú. Comunica además con el Municipio de Teorama. El escenario recreo deportivos, localizado en la zona céntrica del centro poblado, detrás de la iglesia católica. En la siguiente dirección C 8 4 49 que tiene como actividad específica el mejoramiento y adecuación de las áreas que componen estas instalaciones, realizando la CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL. en la siguiente imagen aparece una descripción detallada de la ubicación especifica del Contrato.

Imagen 1. Localización General del Proyecto



1.2. OBJETIVOS.

Presentar el informe parcial No. 1 detallado de Ejecución de actividades efectuadas del periodo comprendido entre el (29) de abril de 2025 al mes de julio de 2025 para el Contrato No. LP-SVIV 001 DEL 2024 cuyo objeto está encaminado a la CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGUIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

1.3. ALCANCE.

1.Se plantea la construcción de cubierta metálica, con un área de 816 metros cuadrados, incluye estructuras en concreto, estructura metálica de soporte, bajantes de aguas lluvias.

2. Construcción de placa deportiva y andenes perimetrales internos, con un área de 671,43 metros cuadrados. Incluye recubrimiento sintético cancha multifuncional, demarcación cancha multifuncional, y estructuras integradas portería microfutbol, tablero de baloncesto e implementos de voleibol. tipo INDER

3. Redes eléctricas de la cancha multifuncional, incluye un (1) sistema de medida bifásico trifilar, un (1) tablero de distribución bifásico con totalizador 2x 40 amp x 12; salidas incluye totalizador y protecciones; 45,08 metros lineales de acometida bifásica 2f#10+1#10t ducto %; 50,76 metros de acometida bifásica #12 2f+1t 3 x 14; 10 salidas tomacorriente monofásico con polo a tierra; sistema de puesta tierra general; 6 cajas de distribución bt 40x40 con marco metálico; 12 reflectores led multivoltaje 200 wat; 77 metros lineales de acometida bifásica #12 2f+lt para lámparas de emergencia; suministroe instalación de lámparas de emergencia 5 vatiosund 8,00 y 1 sistema de equipo tencializacion de estructura o cubierta.

1.4. VALOR TOTAL, FORMA DE PAGO, Y PLAZO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO El valor del Contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.408.058.245), equivalentes a 989,15 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER, pagará al CONTRATISTA, el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que efectivamente el contratista haya ejecutado. Los pagos se determinarán por el sistema de precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: El tipo de obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del contrato manifestando su recibo a satisfacción. b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografía, en formato JPG. c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d Que el interventor del contrato emita la respectiva certificación de entrega parcial de obra o final, según sea el caso. e) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista. El último pago, correspondiente al saldo del diez por ciento (10%) del valor total de las actas mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, se pagará una vez se haya conseguido la terminación total de las obras, acta de liquidación del contrato y con el recibo a satisfacción por parte del supervisor asignado por la entidad. Previa aprobación por parte del supervisor del acta de entrega a satisfacción firmada por la comunidad y aportada por EL CONTRATISTA. donde se certifique la entrega de los bienes, y las copias de los documentos que acrediten el pago mensual de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema integral de seguridad social conforme a la Ley. Para cada uno de los pagos el supervisor y EL CONTRATISTA, deberán de manera previa a los mismos, elaborar un informe de avance de la obra contratada de acuerdo con los formatos suministrados por la entidad con su respectivo registro fotográfico. El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El último pago estará sujeto a la suscripción de la correspondiente acta de recibo final a satisfacción. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las

condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

PLAZO DEL CONTRATO el plazo del contrato estimado para la ejecución del Contrato será de CUATRO MESES contados a partir de fecha de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Tabla 1. Cuadro de Ejecución económica del contrato

CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	VALOR	PORCENTAJE
Valor Total del Contrato	21 de abril de 2025	$ $1.408.058.245	100%
Anticipo		$ 0,00	0%
Adicional		$ 0,00	0%
Valor Final del Contrato	20 de agosto de 2025	$ $1.408.058.245)	100%
Presente Acta Parcial 1	14 de julio de 2025		22.11%
Valor total Acumulado Ejecutado por el Contratista		$ 311.465.195	
Valor Por Ejecutar del Contratista		$ 1.096.593.050	77.89%
Sumas Totales		$1.408.058.245	**100,00%**

1.5. CONTROL DE GARANTIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista constituyo como GARANTIA, Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil de acuerdo a lo estipulado en el contrato de la siguiente manera

El contratista presenta el anexo 0 a la póliza de cumplimiento de entidades estatales N.° 56-44-101010064, expedido el día (23) de abril de 2025, por SEGUROS DEL ESTADO S.A

Tabla Nº 2. Cuadro de Control de Pólizas de cumplimiento Anexo 0.

AMPARO	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 140.805.824.50	21/04/2025	21/12/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 422.417.473.50	21/08/2025,	21/08/2030
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 37.920.605,05	21/04/2025	21/08/2028

De igual forma el Contratista presenta el Anexo 0 a la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 56-40-101004335 expedido el día (23) de abril de 2025, por SEGUROS DEL ESTADO S.A donde se ajustan las vigencias de los amparos según acta contractual de fecha veintitrés (23) de abril de 2025, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N.º 3. Cuadro de Control de Pólizas de Responsabilidad Civil Anexo 0.

AMPARO	VALOR	DESDE	HASTA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000,00	21/04/2025	21/08/2025

El contratista presenta el anexo 2 a la póliza de extracontractual derivada de cumplimiento Nº 56-40-101004335, expedido el día (19) de mayo de 2025, por SEGUROS DEL ESTADO S.A tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla Nº 4. Cuadro de Control de Pólizas de cumplimiento Anexo 2.

AMPARO	VALOR	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$284.700.000,00	29/04/2025	29/08/2025

II. DESCRIPCION TECNICA Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente informe técnico tiene como finalidad describir las características generales y técnicas del contrato LP-SVIV 001 del año 2024, cuyo objeto principal es la construcción de una cancha multifuncional en el corregimiento de Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander

Este proyecto se enmarca en las políticas de mejoramiento de la infraestructura deportiva y social, promovidas por la administración municipal con el objetivo de fomentar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre por parte de la comunidad.

Imagen 2. Ubicación Especifica de la cancha a intervenir.



Como se menciona en el presente informe está comprendido desde el 29 de abril del 2025 hasta el 7 de julio del 2025, tiempo dentro del cual se ejecutaron las siguientes actividades

LOCALIZACION Y REPLANTEO:

La actividad de localización y replanteo topográfico constituye una etapa fundamental en el proceso constructivo, ya que permite trasladar con precisión al terreno las dimensiones, niveles y alineaciones establecidas en los planos del proyecto para la construcción de la cancha multifuncional en el corregimiento de Aguas Claras.

El objetivo de esta actividad es Definir con exactitud la ubicación, geometría y cotas del área de intervención, conforme a los planos arquitectónicos y estructurales aprobados, garantizando que las obras se ejecuten de acuerdo con los diseños técnicos.









Localización y replanteo topográfico (nuevamente):

Se realizó una nueva verificación y ajuste del trazado topográfico, asegurando la correcta ubicación de los elementos estructurales del proyecto conforme a los planos aprobados. Esta etapa fue clave para corregir posibles desviaciones detectadas en la primera semana y garantizar una base precisa para las siguientes actividades.









Localización y replanteo para la cimentación de la cubierta:

Se procedió al marcaje específico de los puntos de cimentación correspondientes a la estructura de la cubierta. Esta actividad permitió establecer los ejes y niveles requeridos para la instalación de la cimentación que soportará dicha estructura.











Excavación mecánica y manual para la cimentación de la estructura de cubierta: Se llevaron a cabo excavaciones mediante medios manuales y maquinaria, adecuándose a las condiciones del terreno y a las dimensiones especificadas en los planos estructurales. Esta labor tuvo como propósito preparar el terreno para recibir la cimentación de la cubierta.

En esta actividad encontramos alto nivel freático que hizo mayor las excavaciones, tema a tratarse en el comité realizado

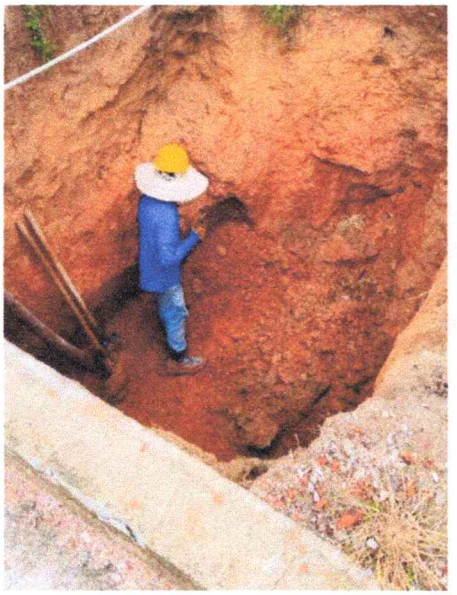





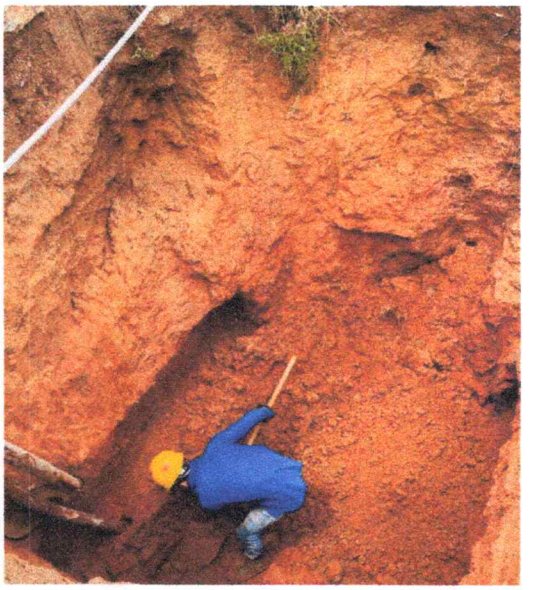


Retiro de escombros o material de excavación: Como parte del orden y limpieza del área de trabajo, se realizó el retiro y disposición adecuada del material excedente producto de las excavaciones. Esta labor es esencial para mantener condiciones seguras y operativas en la zona de obra.







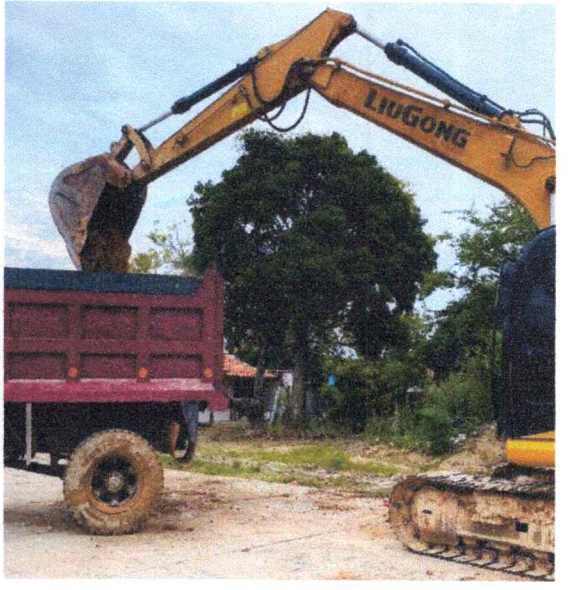

CONCRETO DE LIMPIEZA E:0,05M PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Colocación de concreto de limpieza con espesor de 5 cm (0,05 m), sobre la superficie de la estructura de cubierta, con el objetivo de generar una base limpia, nivelada y libre de impurezas, que permita la correcta ejecución de las siguientes capas del sistema constructivo









ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUEBIERTA

Construcción de zapatas aisladas o corridas en concreto estructural con resistencia f'c = 3500 psi (≈ 245 kg/cm²), destinadas a recibir columnas metálicas o de concreto que forman parte del sistema estructural de cubierta.

Las zapatas fueron ejecutadas según planos estructurales, con dimensiones, ubicación, profundidad y armaduras definidas por el diseño estructural, garantizando una transmisión adecuada de cargas hacia el terreno.

Hasta el momento solo se ha intervenido el costado norte del escenario debido a las mayores profundidades en las excavaciones y que deben ser autorizadas









PEDESTALES EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Ejecución de pedestales verticales de concreto estructural con resistencia f'c = 3500 psi (≈ 245 kg/cm²), ubicados en la parte superior de la edificación, como elementos de apoyo para columnas, vigas metálicas, cerchas o sistemas estructurales de cubierta.

Los pedestales fueron construidos conforme a planos estructurales, respetando dimensiones, ubicación y altura especificadas. Se empleó concreto premezclado o dosificado en obra, con asentamiento adecuado para facilitar el vaciado y garantizar la calidad del elemento.

Las principales actividades incluyeron:

- Colocación y nivelación de formaletas verticales bien alineadas y resistentes.
- Armado de acero de refuerzo conforme a diseño, con recubrimientos mínimos y ganchos adecuados.
- Vaciado de concreto con vibrado mecánico para asegurar compactación y evitar vacíos.
- Nivelación precisa de la parte superior del pedestal para recibir placas base, anclajes o conexiones metálicas.
- Curado continuo durante mínimo 7 días, utilizando métodos apropiados para garantizar el desarrollo de resistencia y evitar fisuras por retracción.

Los pedestales actúan como interfaz entre la estructura de cubierta y los elementos de apoyo inferior (losa, viga, o zapata), por lo que su correcta ejecución garantiza la estabilidad estructural del sistema









VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUIBIERTA

Ejecución de vigas de cimentación construidas en concreto estructural con resistencia f'c = 3500 psi (≈ 245 kg/cm²), destinadas a interconectar zapatas o pedestales y distribuir las cargas provenientes de la estructura de cubierta hacia el terreno. Estas vigas contribuyen a mejorar el comportamiento estructural ante cargas verticales y horizontales, proporcionando rigidez al sistema de cimentación










CONCRETO CICLOPEO 60/40 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Este tipo de concreto se emplea comúnmente para rellenos de pedestales, bases de apoyo, muros bajos, rigidización de elementos no sometidos a cargas estructurales altas, o para mejorar el reparto de cargas hacia los cimientos.

En esta actividad debido a las excavaciones mayores que surgieron fue necesario solicitar su intervención en la zona sur ya que excedían sus cantidades. (tema solicitado en los comités)

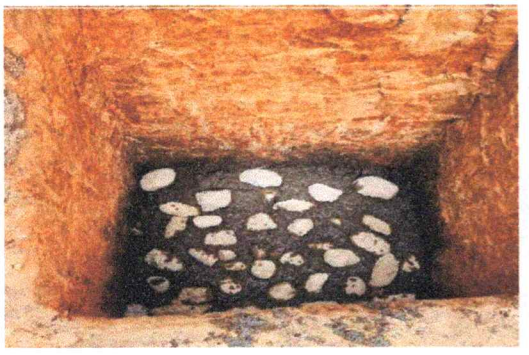








ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Suministro, corte, doblado, armado y colocación de acero de refuerzo de alta adherencia, con límite de fluencia Fy = 420 MPa (≈ 4,200 kg/cm²), conforme a las especificaciones del diseño estructural para la estructura de cubierta.



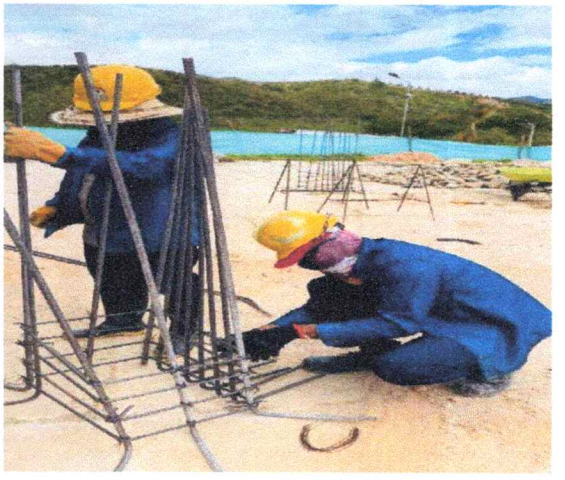






EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (CANCHA)

Ejecución de excavación manual en material común (cancha), realizada con herramientas manuales como picos, palas, barretas y carretillas según lo especificado en los planos de obra civil.




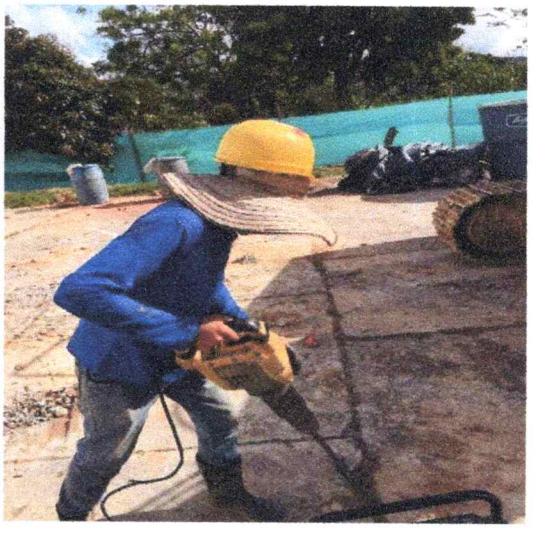




RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (CANCHA)

El relleno para estructuras con material seleccionado es el proceso de colocación y compactación de suelo previamente clasificado y aprobado (libre de material orgánico, escombros o elementos contaminantes), utilizado para mejorar el nivel de apoyo y estabilidad de elementos estructurales como zapatas, losas de cimentación, pedestales o muros de contención.

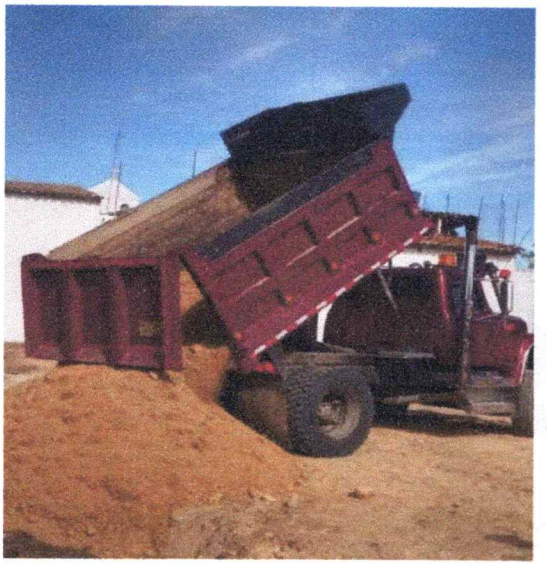

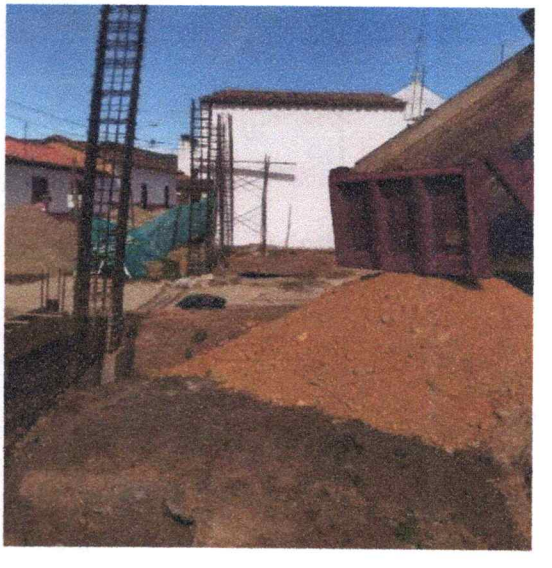





RETIRO DE ESCOMBROS, adecuación cancha


Trabajo que comprende el retiro manual y/o mecánico de escombros sueltos (fragmentos de concreto, ladrillo, tierra, restos de demolición u otros materiales no estructurales), así como la demolición y retiro de la loza existente en la zona de cancha, para permitir la ejecución de nuevas obras estructurales o de mejora.

El proceso incluyó:

- Limpieza general del área para liberar la zona de trabajo.
- Corte y demolición de la loza existente (de concreto simple o armado), utilizando herramientas manuales o maquinaria ligera (rompedora, martillo eléctrico, cortadora).
- Retiro y carguío de los materiales demolidos y su disposición en zona de acopio temporal o evacuación a botadero autorizado.
- Adecuación del terreno ("cancha"), consistente en la nivelación, descompactación y/o relleno con material seleccionado si fue necesario, para dejar la superficie lista para nuevas estructuras o trabajos de cimentación.

Todo el trabajo se realizó respetando las normas de seguridad en obra, con el uso de EPP adecuados y asegurando la no afectación de estructuras adyacentes o servicios existentes



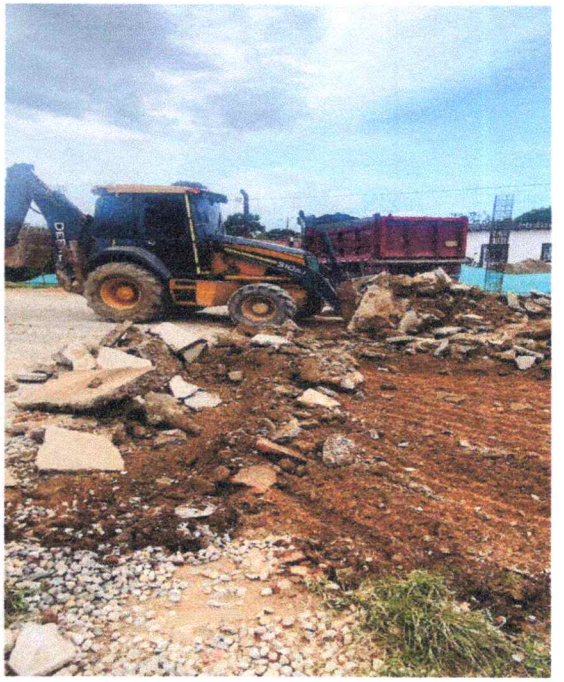


CONCRETO DE LIMPIEZA E:0,05M PARA MURO

Ejecución de concreto de limpieza con espesor de 0.05 m (5 cm), colocado como base nivelada y libre de impurezas para la construcción de muros de concreto armado, muros de contención o muros de albañilería, según los planos estructurales del proyecto.



Este concreto tiene como función principal:

- Proporcionar una superficie limpia, regular y seca para el armado y vaciado del muro.
- Evitar el contacto directo del concreto estructural con el terreno natural, mejorando las condiciones de adherencia y durabilidad.
- Facilitar el trabajo de trazado y nivelación en la base del muro

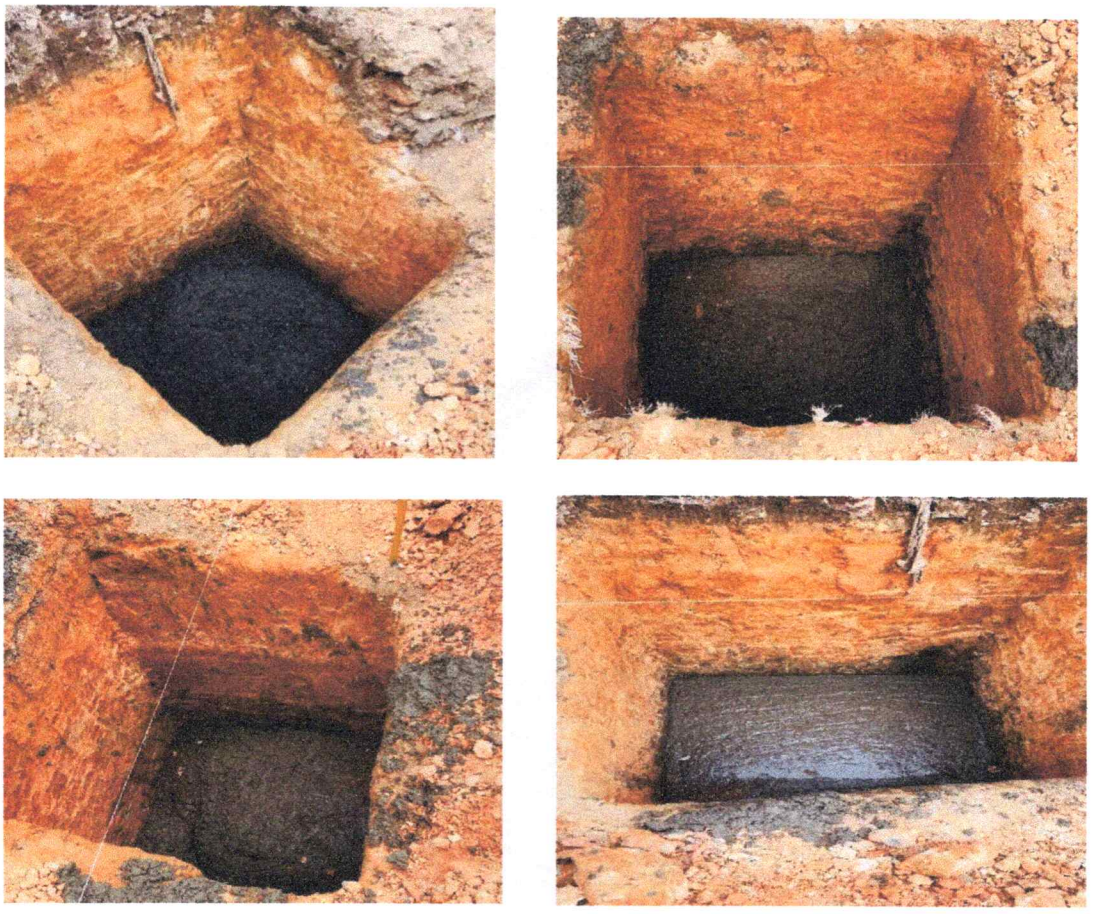

ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO

Las zapatas en concreto 3500 psi para muro son elementos de cimentación superficial construidos en concreto estructural con una resistencia característica f'c = 3500 psi (≈ 245 kg/cm²), cuya función principal es distribuir las cargas verticales y laterales generadas por el muro (ya sea de concreto armado, albañilería o bloque estructural) hacia el terreno natural o compactado, evitando asentamientos diferenciales.

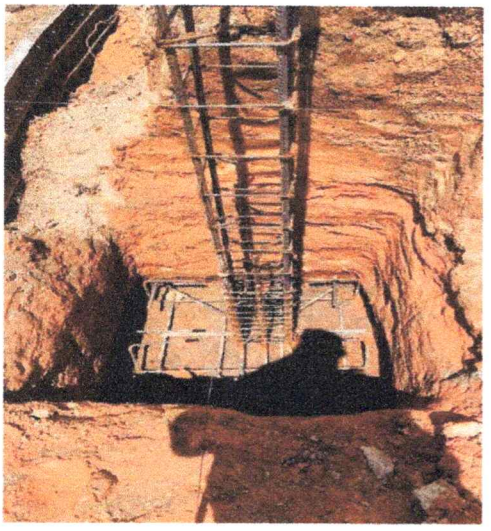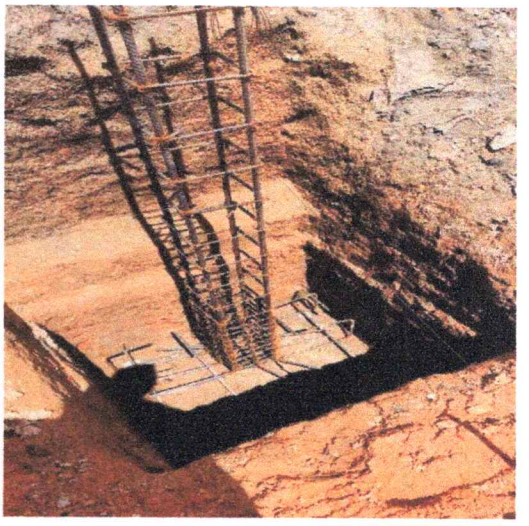

PEDESTALES EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO

Las zapatas en concreto 3500 psi para muro son elementos de cimentación superficial construidos en concreto estructural con una resistencia característica f'c = 3500 psi (≈ 245 kg/cm²), cuya función principal es distribuir las cargas verticales y laterales generadas por el muro (ya sea de concreto armado, albañilería o bloque estructural) hacia el terreno natural o compactado, evitando asentamientos diferenciales.




VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO

Las vigas de cimentación en concreto 3500 psi para muro son elementos estructurales horizontales construidos con concreto armado de resistencia f'c = 3500 psi (≈ 245 kg/cm²), que tienen como función principal distribuir las cargas del muro hacia las zapatas o directamente al terreno, así como brindar rigidez y continuidad a la cimentación.

Estas vigas se ubican generalmente bajo muros de carga o de contención, y trabajan junto con las zapatas para resistir esfuerzos de flexión, compresión, corte y momentos generados por cargas verticales y horizontales (incluyendo cargas sísmicas)





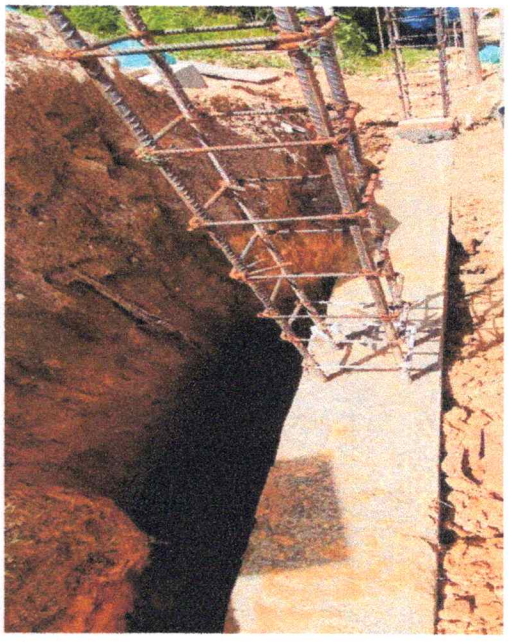


COLUMNAS EN CONCRETO 3500PSI, PARA MURO

Las columnas en concreto 3500 psi para muro son elementos verticales de concreto armado con una resistencia característica de f'c = 3500 psi (≈ 245 kg/cm²), cuya función es brindar soporte estructural, resistencia y rigidez a los muros, así como transmitir cargas verticales hacia la cimentación







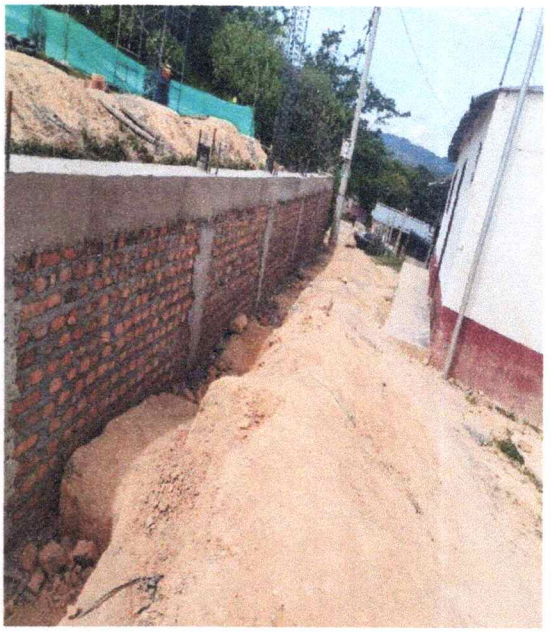

VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO

Las vigas aéreas en concreto 3500 psi para muro son elementos estructurales horizontales construidos Con concreto armado de resistencia f'c = 3500 psi (≈ 245 kg/cm²), ubicadas por encima del nivel del terreno o entre columnas, cuya función principal es conectar, soportar y confinar los muros estructurales, además de transmitir cargas verticales y horizontales a otros elementos de la estructura.









MURO EN LADRILLO DOBLE e=0,25 M, ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DEL MURO


El muro en ladrillo doble con espesor de 0.25 m es un elemento constructivo vertical ejecutado con ladrillo cerámico macizo o perforado de formato doble, colocado con mortero de asentado, que cumple funciones estructurales o de cerramiento, dependiendo del diseño del proyecto.

El acero de refuerzo Fy = 420 MPa (megapascales) es un tipo de acero corrugado de alta adherencia, utilizado en la estructura del muro para resistir esfuerzos de tracción, compresión y corte, y brindar estabilidad, ductilidad y capacidad sísmica al sistema estructural.







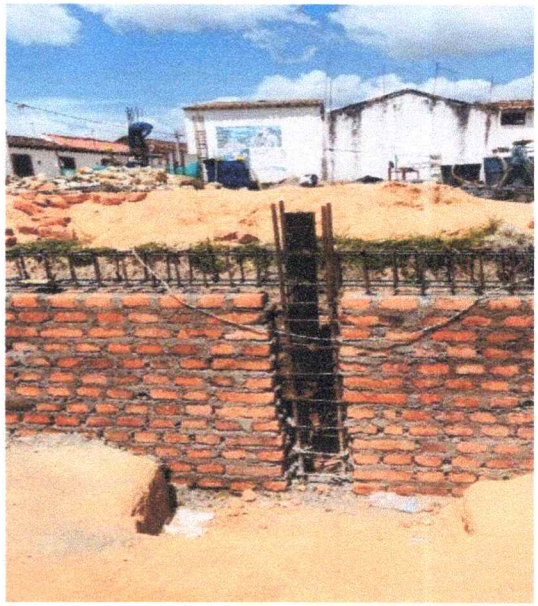

PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO

El pañete impermeabilizado sobre muro es una capa de mortero cementicio aplicada sobre superficies verticales con el fin de nivelar, proteger y sellar el muro contra la humedad, tanto en interiores como en exteriores.

Esta solución constructiva combina las funciones del pañete tradicional con propiedades impermeables, ya sea mediante la adición de aditivos hidrófugos en la mezcla o la aplicación de capas impermeabilizantes posteriores (cementicias o acrílicas).









CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES. Parte posterior arquerías a 5,00 m de altura

Ejecución de cerramiento vertical de protección contra impacto, ubicado en la parte posterior de las arquerías y con una altura de 5.00 metros, construido según los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Este cerramiento tiene como función principal proteger el entorno, las instalaciones y a los usuarios de posibles impactos de balones u objetos lanzados desde el área de juego, garantizando seguridad, resistencia y durabilidad.





III OBSERVACIONES

El día 3 y 24 de junio de 2025 se llevó a cabo la conformación del Comité Técnico de Obra relacionado con el contrato identificado como Obra No. LP-SVIV-001 del 2024. Durante esta sesión se abordaron los siguientes temas principales:

1. Análisis y correcciones al balance de mayores y menores
2. Socialización del acta de modificación definitiva.

Como resultado de lo tratado en el comité, se estableció el compromiso por parte de la entidad contratante de realizar el trámite correspondiente para la aprobación de un adicional presupuestal, el cual es necesario para la ejecución del contrato. El valor de dicho adicional asciende a CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($46.324.511,00).

IV CONCLUSIONES

Con base a La ejecución se ha desarrollado conforme al cronograma aprobado y bajo los estándares técnicos y de calidad exigidos en el contrato. Las actividades ejecutadas se encuentran disponibles para verificación en campo por parte de la supervisión e interventoría.

En conclusión, El contratista solicita, de manera formal, el pago por un monto de **TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE ($309.810.902) M/CTE** equivalentes al 22,00 % de ejecución del contrato, en concordancia con lo previsto contractualmente

MARIA C. DURAN VEGA
Rep. Legal CONTRATISTA

INGEOCIMYC
LABORATORIO DE GEOTECNIA Y CONCRETOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC 673 / INV E 410-13


GM-F04 VERSION 2.0 2/06/2025

Fecha de ultima actualización: 02 de Junio de 2025

SOLICITANTE:	ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL ASPROMA	FECHA INFORME	8 de julio de 2025
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	TIPO DE CEMENTO	CEMEX ESTRUCTURAL
		CEMENTO	**ARENA** / **TRITURADO**
LOCALIZACION	CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS , OCAÑA NORTE DE SANTANDER		

ELEMENTO	CILINDRO	RESIST. DISEÑO	FECHAS		ASENT	EDAD	Ø	L	REL (L/D)	F. CORREC	AREA	MASA	CARGA	RESISTENCIA REAL			TIPO DE FALLA	RES. PROYEC 28 DIAS	R. REAL/ R DISEÑO
	(Número)	(f'_c)	Toma	Rotura	(cm)	(dias)	(mm)	(mm)			(mm2)	(gr)	(kN)	MPa	Kg/cm^2	Psi		Psi	%
ZAPATAS	1	3000	19-may-25	26-may-25		7	151.00	304.00	2.01	1.00	17907.905	13155	266.39	14.88	151.69	2158	6		71.9%
ZAPATAS	2	3000	19-may-25	16-jun-25		28	152.00	306.00	2.01	1.00	18145.882	13147	375.96	20.72	211.27	3005	6		100.2%
ZAPATAS	3	3000	19-may-25	16-jun-25		28	151.00	305.00	2.02	1.00	17907.905	13052	394.44	22.03	224.60	3195	5		106.5%
ZAPATAS	1.1	3000	23-may-25	6-jun-25		14	151.00	308.00	2.04	1.00	17907.905	13420	338.50	18.90	192.75	2742	6		91.4%
ZAPATAS	2.1	3000	23-may-25	20-jun-25		28	151.00	310.00	2.05	1.00	17907.905	13560	390.60	21.81	222.42	3164	6		105.5%
PEDESTALES	3.1	3000	28-may-25	4-jun-25		7	151.00	308.00	2.04	1.00	17907.905	13562	268.66	15.00	152.98	2176	5		72.5%
PEDESTALES	3.2	3000	28-may-25	25-jun-25		28	151.00	307.00	2.03	1.00	17907.905	13405	384.57	21.47	218.98	3115	6		103.8%
PEDESTALES	4.1	3000	10-jun-25	8-jul-25		28	151.00	310.00	2.05	1.00	17907.905	13552	411.18	22.96	234.14	3330	2		111.0%
PEDESTALES	4.2	3000	10-jun-25	8-jul-25		28	151.00	308.00	2.04	1.00	17907.905	13543	448.68	25.05	255.49	3634	2		121.1%

TIPOS DE FALLA



TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 6

Equipo: Prensa doble rango Marca: PINZUAR
Modelo: PC-42D-22 Serie: 314

VELOCIDAD DE ENSAYO 0.25 Mpa/s

Observaciones: MUESTRA TOMADA POR LABORATORISTA EN SITIO

CERT. DE CALIBRACION : No 1132 Realizado por SIMIN SAS de fecha 09 -DIC-2024

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Laboratorio de Geotecnia y concretos INGEOCIMYC

Elaboró:

Firma:
Nombre: Fernando Ojeda Jaime
Cargo: Laboratorista

Aprobó:

Firma:
Nombre: Elder Lopez Angarita
MP. 54202- 269141 NTS
Cargo: Ing. Civil -Esp. Geotecnia Ambiental

FIN DEL INFORME

301-351-7044 coordinador@ingeocimyc.com.co www.ingeocimyc.com.co Calle 2 No 10a -117 Barrio Juan XXIII Ocaña, Norte de santander

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807002080
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL ASPROMA NORTE DE SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	569794
DIRECCIÓN:	CRA 11 15 - 446 B/ SAN ANTONIO	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Publicidad
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	001 - PRINCIPAL
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7977167005			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1604397170

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 683.400**	**$ 0**	**$ 683.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													**$ 171.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 171.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 297.300	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 297.300
SUBTOTALES:									**$ 297.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 297.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	3	$ 171.000	$ 0	$ 171.000
SUBTOTALES:			**$ 171.000**	**$ 0**	**$ 171.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN						SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	GOR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 37329615	DURAN VEGA MARIA CANDELARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 5035706	BOHORQUEZ VILLALBA YHON ADOLFO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 88136554	PEREZ QUINTERO RAMON DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.322.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807002080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL ASPROMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11 15 - 446 B/ SAN ANTONIO	TELÉFONO:	5694794
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	008 - CUBIERTA AGUASCLARAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7978447176	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1620726471

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.000	$ 0	$ 1.139.000
SUBTOTALES:										**$ 2.505.800**	**$ 0**	**$ 2.505.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000
SUBTOTALES:													**$ 627.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 627.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.090.100	$ 1.090.100	$ 0	$ 0	$ 1.090.100
SUBTOTALES:									**$ 1.090.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.090.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	11	$ 627.000	$ 0	$ 627.000
SUBTOTALES:			**$ 627.000**	**$ 0**	**$ 627.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES											
																												PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007391804	MAYA TRIGOS JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	100739180	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007539533	ALVAREZ ORTIZ JUAN FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	100753953	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007859038	GUERRERO PEREZ LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	100795903	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1064166068	CARRILLO CUETO YONIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	106416606	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1091653131	NAVARRO YOJAN LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	109165313	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1091681267	MANZANO LOPEZ MARIO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	109168128	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1092177284	BALLESTEROS GUERRERO FABIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	109217728	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1098737435	OSPINA GOMEZ SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	109873743	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1127918770	MONTAÑEZ ORTIZ MELWIN YOSID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	112791877	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 13363371	LOPEZ MORA ORLANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	13363371	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 37334983	MELO SANCHEZ OLGA YOJANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	37334983	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.849.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807002080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL ASPROMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11 15 - 446 B/ SAN ANTONIO	TELÉFONO:	5684794
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	008 - CUBIERTA AGUASCLARAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7974214851	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1541738093

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 485.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.000	$ 0	$ 486.000
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.047.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.800	$ 0	$ 1.047.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 539.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.100	$ 0	$ 539.100
SUBTOTALES:										**$ 2.072.900**	**$ 0**	**$ 2.072.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 98.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.800	$ 0	$ 0	$ 98.800
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 49.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 43.700
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 155.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.800	$ 0	$ 0	$ 155.800
SUBTOTALES:													**$ 518.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 518.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 902.100	$ 902.100	$ 0	$ 0	$ 902.100
SUBTOTALES:									**$ 902.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 902.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	12	$ 518.700	$ 0	$ 518.700
SUBTOTALES:			**$ 518.700**	**$ 0**	**$ 518.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807002080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL ASPROMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11 15 - 446 B/ SAN ANTONIO	TELÉFONO:	5694794
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	008 - CUBIERTA AGUASCLARAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7974214851	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1541738093

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
12	CC 37334983	MELO SANCHEZ OLGA YOANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	37334983	$ 99.190	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.012.400

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807002080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL ASPROMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11 15 - 446 B/ SAN ANTONIO	TELÉFONO:	5694794
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	008 - CUBIERTA AGUASCLARAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7974204015			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO 2025	
DIAS DE MORA:	20						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1541705375		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 15.200	$ 200	$ 15.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 227.800	$ 3.000	$ 230.800
SUBTOTALES:										**$ 243.000**	**$ 3.200**	**$ 246.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 3.800	$ 100	$ 0	$ 3.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 57.000	$ 800	$ 0	$ 57.800
SUBTOTALES:													**$ 60.800**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 61.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 105.800	$ 105.800	$ 1.400	$ 0	$ 107.200
SUBTOTALES:									**$ 105.800**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 107.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	2	$ 60.800	$ 800	$ 61.600
SUBTOTALES:			**$ 60.800**	**$ 800**	**$ 61.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1098737435	DISPINA GOMEZ SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	29																
2	CC 37334983	VELO SANCHEZ OLGA YOANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900	109873743	$ 6.700	2	$ 94.900	CCF37-COMFANORTE	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	37334983	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 476.700

INFORME DE ACTIVIDADES

Tipo de Informe:	Final		Parcial	X	Pago No: 1 (UNO)

Número del contrato: LP - SVIV 001 DEL 2024	**Fecha del contrato:** 21 DE ABRIL DEL 2025	**Fecha de Iniciación:** 29 DE ABRIL DEL 2025	**Fecha de Terminación final:** 28 DE AGOSTO DEL 2025
Nombre del Contratista: ASPROMA R/L MARIA CANDELARIA DURAN		**Identificación del Contratista:** NIT: 807.002.080-6 C.C. R/L:37.329.615	
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGUIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			
Nombre del Supervisor: ING. GUSTAVO CASTILLA VERGEL		**Cargo del Supervisor:** SECRETARIO DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	**Dependencia:** Área de VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): 22.00%			
VALOR A PAGAR: **TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE ($309.810.902) M/CTE** Cuenta de ahorro No. 318-896897-17 DEL BANCO DE BANCOLOMBIA			

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado**
1) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, análisis del sector, presupuesto oficial y demás soportes del proceso.	Cumplí con el objeto del contrato de la referencia, como consta en el acta parcial n°1 presentada a fecha de 14 de julio del 2025
2) Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual, atendiendo las orientaciones definidas por el Municipio.	El contrato se esta ejecutando con autonomia técnica y administrativa el objeto contractual.
3) Hacer seguimiento permanente sobre la ejecución del contrato que se celebra como resultado del proceso de selección que se adelante	Como contratista de obra ASPROMA, mantengo el personal de seguimiento durante la ejecución del contrato.
4) Mantenerse paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a caja de compensación Familiar, al ICBF y al	ASPROMA realiza el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a caja de compensación

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Modificado por el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, si hay lugar a ello.	Familiar, al ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
5) Informar de manera inmediata al Municipio, cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato que se celebra como resultado del proceso de selección que se adelanta.	No hay ocurrencia de hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato, porque a la fecha no se presentó ningún suceso
6) Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que se impartan por parte del Municipio, durante el desarrollo del contrato que se celebra.	El supervisor impartió recomendaciones para la ejecución del contrato de obra, que fueron acatados por el contratista ASPROMA
7) Cumplir con las obligaciones que se generan a su cargo y que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen.	Como contratista cumplo con las obligaciones que se generaron a su cargo y que se derivaron de la naturaleza del contrato. Aportó los documentos que así lo demuestran.
8) No acceder a peticiones o amenazas que tengan por fin obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho e informar inmediatamente al Municipio y demás autoridades competentes.	Durante este avance de obra no reporta peticiones o amenazas que tengan por fin obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho relacionado con la ejecución del contrato.
9) Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención de riesgos de lavados de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la Circular básica jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que el futuro la adicionen o modifiquen.	Durante la ejecución no reporta ninguna información relacionada con lavado de activos que afecte al contratista de obra
10) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos injustificados.	Como contratista durante la ejecución que llevo a cabo del contrato actúe con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales

11) Corregir de forma inmediata cualquier falla o dificultad que se cometa en la ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado del proceso de selección que se adelanta.	No se presentaron fallas o dificultades durante esta fecha de ejecución del contrato de obra, que debieran ser informadas al Municipio
12) Presentarse al Municipio en el momento que sea requerido para suscripción de la correspondiente acta de liquidación del contrato.	El supervisor requerirá al contratista para la firma de la liquidación el día que sea terminado el contrato de obra
13) Suministrar oportunamente la información solicitada por el Supervisor del contrato.	Presenté a el informe que reflejan la ejecución del contrato de obra, con evidencias fotográficas.
14) Asumir los costos y demás gastos ocasionados con los suministros que se indican	Como contratista de obra asumí los costos y gastos en que se incurre durante la ejecución el contrato de obra
15) Ejecutar el objeto del presente contrato en el lugar y los plazos establecidos, con pleno cumplimiento de las especificaciones esenciales, las condiciones económicas y financieras estipuladas.	La ejecución del contrato de obra se desarrolla dentro del plazo contractual, entre el 29 de abril de 2025 y el 28 de agosto de 2025.
16) Informar al supervisor del contrato cualquier novedad, las observaciones y cambios necesarios relacionados con el objeto de la contratación.	Se informó sobre la necesidad de ejecutar mayores y menores cantidades de obras
17) Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	Con el informe de obra aportó el pago al Sistema General de Seguridad Social y aportes Parafiscales
18) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.	No se han recibido demandas o reclamos o procesos instauradas por el personal que participa en la ejecución del contrato de obra.
19) Suscribir las correspondientes actas y documentos que correspondan en virtud del presente contrato.	Como contratista suscribió el acta parcial N°1 con fecha de 7 de julio de 2025

20) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	No aplica

Otras actividades realizadas

El día 3 y 24 de junio de 2025 se llevó a cabo el Comité Técnico de Obra donde se trataron los siguientes temas principales:

1. Análisis y correcciones al balance de mayores y menores cantidades.
2. Socialización del acta de modificación definitiva.

Como resultado de lo tratado en el comité, se estableció el compromiso por parte de la entidad contratante de realizar el trámite correspondiente para la aprobación de un adicional presupuestal, el cual es necesario para la ejecución del contrato. El valor de dicho adicional asciende a **CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($46.324.511,00).**

La documentación de las actividades requeridas para este informe hace parte de los archivos de la secretaria de vías, infraestructura y vivienda, en el cual lo sustenta la revisión que hacen la secretaria y a la satisfacción de las entregas,

MARIA CANDELARIA DURAN
R/L ASPROMA
C.C. 37.329.615

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas para el trámite del acta final.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos de aportes al Régimen de Seguridad Social integral para dicho periodo.


Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de obra pública No. No. LP - SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534) del 21 de abril del 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de vías, infraestructura y vivienda
Supervisor


REGISTRO FOTOGRÁFICO





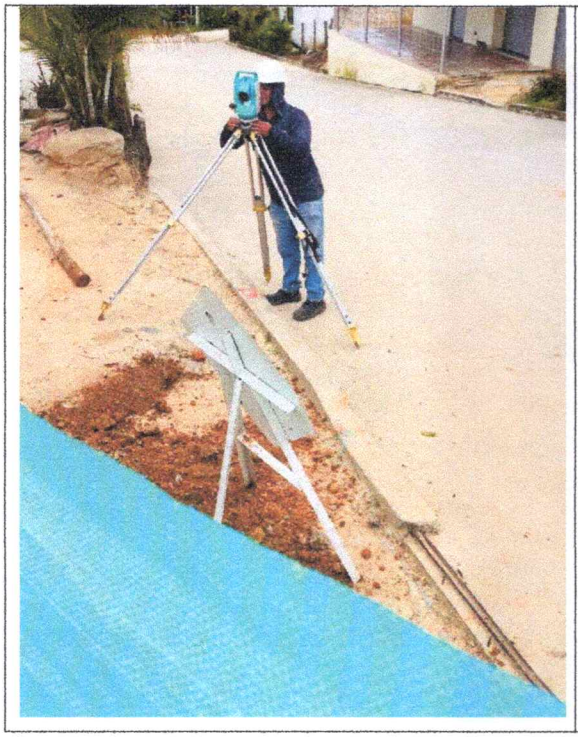




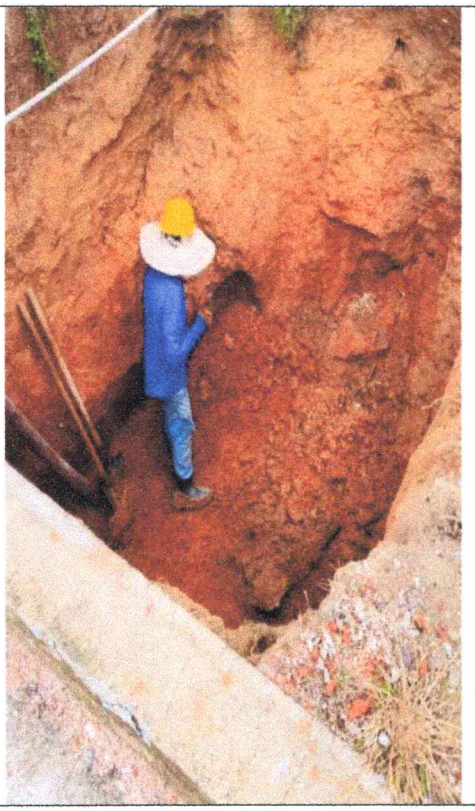








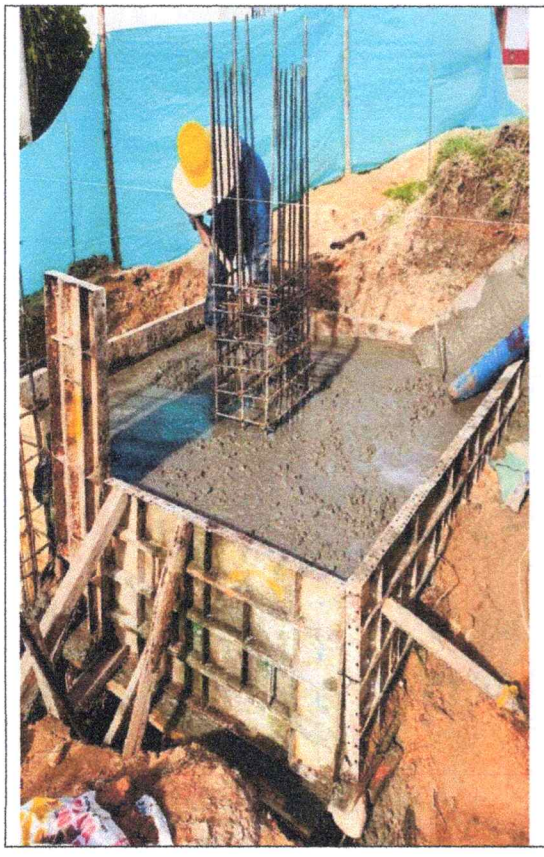






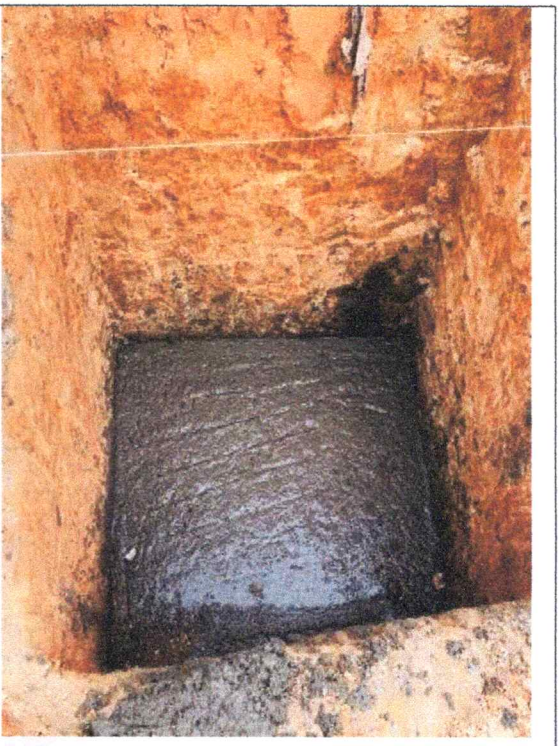








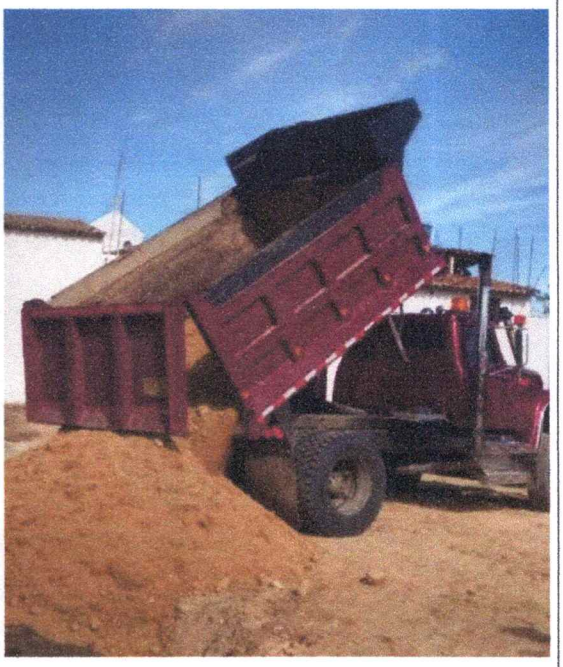


DEERE



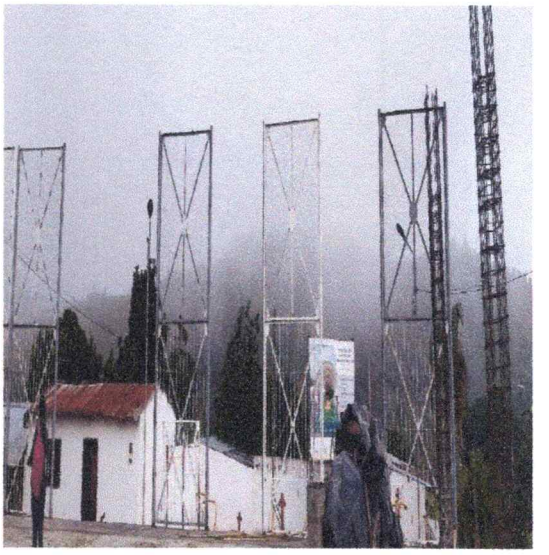





DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141123182340

(415)7707212489984(8020) **000014112318234 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 7 0 0 2 0 8 0	6	Impuestos de Cúcuta	7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ASPROMA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Ocaña 4 9 8

41. Dirección principal
CR 11 154 40 BRR SAN ANTONIO

42. Correo electrónico aspromafe@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 6 9 4 7 9 4	3 1 4 2 8 6 6 6 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	1 9 9 6 1 0 2 8	7 1 1 2	1 9 9 6 1 0 2 8		4 2 9 0	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DURAN VEGA MARIA CANDELARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO
