Villavicencio, julio 16 de 2025

Señores
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PUERTO CARREÑO VICHADA
Att. DR. YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA – Supervisor del Contrato de Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023

REF: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023** cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO"

ASUNTO: Solicitud trámite de cobro de Acta Parcial No. 09 del Contrato De Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023.

Cordial saludo,


Por medio de la presente hago entrega de los documentos para el trámite del cobro del Acta Parcial No. 09 al Contrato de obra de la referencia, de acuerdo con la cláusula Cuarta del contrato y una vez cumplidas a satisfacción por el contratista las obligaciones contractuales exigidas por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO.

No.	Documento	SI	NO
1	Informe de Avance de Obra	X	
2	Pago de Seguridad Social	X	
3	Factura de Cobro	X	
4	Certificación de Cuenta Bancaria	X	
5	Certificación de Cumplimiento	X	
6	Informe de Interventoría avalando el pago	X	

Se anexan 213 folios contenidos en 1 carpeta.

Agradezco su atención.

Cordialmente,



ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal Consorcio San Rafael

Anexo: Documentos requeridos.

CONSORCIO SAN RAFAEL **NIT 901783691-7**

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

C E R T I F I C A

Que el contratista CONSORCIO HDC identificado con NIT 901783555-3, representado legalmente por JUAN SEBASTIAN SERNA ARÍAS identificado con C.C. 86.072.395 de Villavicencio, en desarrollo del objeto del Contrato de Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023 del 28 de diciembre de 2023, cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO" cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE PUERTO CARREÑO, acorde a lo pactado en la respectiva minuta, para realizar el noveno pago parcial correspondiente con la CLAÚSULA CUARTA del contrato.

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí los documentos por parte del contratista para el trámite del noveno pago parcial de obra, los cuales se remitieron a la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA del contrato, para ser revisados, incorporados a la respectiva carpeta contractual y trasladada al área financiera para su respectivo pago.

La presente certificación se expide para efectos del **NOVENO PAGO PARCIAL** que corresponde a un porcentaje de ejecución de obra del 3.41%, por valor bruto de **SETECIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($711.865.954,00)** realizando una amortización por concepto de anticipo por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($355.932.977,00),** quedando un valor neto de pago por **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($355.932.977,00).**

El pago se debe abonar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 522-000025-05 de la empresa CONSORCIO HDC.

Se expide el presente certificado en Puerto Carreño – Vichada, el 16 de Julio de 2025.

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal Consorcio San Rafael
Interventor del contrato

Asesorías Contables

El suscrito **CONTADOR PÚBLICO**

CERTIFICA

Que el **CONSORCO HDC** identificado con Nit. 901.783.555-3, a la fecha ha cumplido con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligan el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARP y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual a la fecha se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los 16 días del mes de julio del año 2025.

Cordialmente,

Asesorías Contables

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
T.P. 189521-T
CONTADOR PÚBLICO

CALLE 21 No 43C - 24 BARRIO BUQUE
LANCHEROS_CANTY@HOTMAIL.COM
VILLAVICENCIO – META
CEL. 3157967886

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 9 B 5 7 1 0 4 8 C A 5 C 7 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Consorcio HDC

039-24

Puerto Carreño, 16 de julio de 2025

Señores
CONSORCIO SAN RAFAEL
Atn.: Javier Francisco Sabogal
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: Entrega informe parcial de obra No. 9 - Contrato HDSJDD-CP-2374-2023

Objeto:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS – SEDE CUMARIBO.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, el Consorcio HDC desea hacer entrega del acta parcial n°9 correspondiente al contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS
CC.: 86.072.395 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO HDC

RECIBIDO
16-JUL-2025

consorciohdc23@gmail.com
Calle 23 No. 6 – 35 – Cel.: 313 420 66 05
Puerto Carreño - Vichada

CONSORCIO HDC

NIT 901783555-3
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764069134294
Fecha 17/04/2024 - 17/04/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEHD1 al FEHD100
Email: contabilidadconsorciohdc@gmail.com
Teléfono: 322 3088617

Departamento	Fecha		
Vichada	16	07	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEHD11

Razón Social:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE PUERTO CARREÑO	**NIT:**	842000004	**Fecha de firmado:**	16/07/2025 11:28:57
Dirección:	Calle 18 No. 10-43	**Departamento:**	Vichada	**Teléfono:**	6085654009
Email:	alvarocardozoc@gmail.com	**Método de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	11:28:53-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACT9	1,00	ACTA PARCIAL No.9 Contrato de Obra Pública No. HDSJDD-CP-2374-2023 Cuyo Objeto es Contrato de Obra Pública No. HDSJDD-CP-2374-2023 Cuyo Objeto es OBRA CIVIL	WSD				$711.865.954,00	$711.865.954,00

Notas:
Amortización de anticipo $ 355.932.977,00

SON: (setecientos once millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos)
CUFE: a34b987232e62f45baba9a8792e1c47eae90dda69a7cb97bc8f83810df672c03e09b0831b4802888b8192c6bd3616739

Subtotal:	$711.865.954,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$711.865.954,00

Firma Digital: CnliUHGhrDorqSnF603fWoSjTLiAsJ7SS6fYjOMUaJ+rQseymd9xzncMwkGaRPL8
Vq+zjLzFaw7dmBTq6p55inrKeTYtYX/x7jMQq5LSlMyrCSSQ8w
pbvYd85ynjvU07 6NGoFF/VOOj1Z4K3gTkS/1861bcOnNR3NP8d2i7uNsDQIF4WCNruvE5SN6+oZSQT h/tvRpSYzR+eFrndJ4bfrAnDr8ETAEDWPcn
qWuT0NznhdkFS2SNMfwFx/XY/9lTz 4784jAGuwDWidRozGSheFATrUWBiUa4gzuiE0l5VmlTc9Txd4SEPQtjbxPAAreQd 1/rK6AQCsY1jiJdH77dq
bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Puerto Carreño, 13 de Agosto de 2024.

Señores

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO HDC identificado(a) con NIT No. 901783555 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	52200002505	2024/01/22	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

INFORME PARCIAL OBRA N° 9

CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO

CONTRATISTA:

CONSORCIO HDC

R/L: ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS



INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN RAFAEL

R/L JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2025 – 16 DE JULIO DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETO DEL INFORME 4
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 5
1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 5
1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS) 6
1.2.1. INICIAL 6
1.2.2. AJUSTE 6
1.2.3. ACTA DE INICIO 7
1.2.4. PRORROGA N°1 7
1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 8
2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 11
2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 11
2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO: 12
2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA ACTA PARCIAL No. 7 12
2.3. CUADRO DE AVANCE 22
2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES 23
2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO 23
2.6. CLIMATOLOGIA 25
2.7. COMPROMISOS LABORALES 26
2.8. PERSONAL 26
2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL 26
2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO 26
2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 29
2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 29
2.11. MAQUINARIA 31
3. FINANCIERO 31
3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO 32
3.2. AVANCE FINANCIERO 36
3.3. CONTROL PRESUPUESTAL 37
4. INFORMACION LEGAL 38
4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS 38
5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO. 38
6. CONCLUSIONES 39
7. ANEXOS 41

INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende el periodo del **10 DE JUNIO DE 2025 – 16 DE JULIO DE 2025** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023** con fecha de firma el 28 de diciembre de 2023, acta de inicio el día 16 de enero de 2024 y licencia de construcción **SPIM-05-2023** de fecha 11 de diciembre de 2023 la cual fue prorrogada el 5 de diciembre de 2024 mediante resolución No 013 expedida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Cumaribo - Vichada, celebrado entre **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO Y CONSORCIO HDC** identificado con **NIT. 901.783.555-3** el cual se encuentra representada legalmente por **JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS,** cuyo objeto es. "**REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** Por la suma de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE ($20,856,846,224.00).** El presente informe contiene la descripción de las actividades ejecutadas durante el periodo en mención. En este mismo periodo, se elaboró y fue aprobada por la Interventoría, el 14 de julio de 2025, el Acta Modificatoria N°2, correspondiente a mayores y menores cantidades de obra.

OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las diferentes actividades técnicas, administrativas, ambientales y financieras desarrolladas en el periodo del **10 DE JUNIO DE 2025 – 16 DE JULIO DE 2025** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023.**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	E.S.E. Hospital Departamental San Juan De Dios de Puerto Carreño
Interventor:	Consorcio San Rafael
Objeto del Contrato:	Reposición De La Infraestructura Del Hospital Departamental San Juan De Dios, E.S.E. Sede Cumaribo
Contrato No:	HDSJDD-CP-2374-2023
Contratista:	Consorcio HDC
Representante Legal:	Ing. Juan Sebastián Serna Arias
Valor del Contrato:	$ 20,856,846,224.00
Valor del Anticipo (50%):	$ 10,428,423,112.00
Fecha desembolso anticipo:	13/02/2023
Plazo de ejecución:	Quince (15) Meses
Fecha de inicio:	16 de enero de 2024
Fecha de terminación inicial:	15 de abril de 2025
Prorroga N°1:	Ocho (8) meses
Fecha de terminación prorroga N°1:	15 de diciembre de 2025
Fecha modificación N°1	16 de julio de 2024
Fecha modificación N°2	14 de julio de 2025
INFORMACION FINANCIERA PAGOS PARCIALES	
Presente Acta parcial:	$ 711,865,954.00
Acumulado:	$ 7,930,488,951.00
Amortización Acta parcial:	$ 355,932,977.00
Pendiente por amortizar:	$ 6,463,178,636.50

1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

1.2.1. INICIAL

CONDICIONES INICIALES (ANEXO 0)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-03-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	28-03-2023	28-03-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	28-12-2023	28-03-2025	$1.042.842.311,00

1.2.2. AJUSTE

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 1)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-09-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-03-2028	$1.042.842.311,20

ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	28-03-2023	28-03-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	28-12-2023	28-06-2025	$1.042.842.311,00

1.2.3. ACTA DE INICIO

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 2)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-08-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-10-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-04-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-04-2024	15-04-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	16-01-2024	15-07-2025	$1.042.842.311,00

1.2.4. PRORROGA N°1

CONDICIONES SEGÚN PRORROGA N°1 (ANEXO 3)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-04-2026	$10.428.423.112,00

CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-06-2026	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-12-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-12-2025	15-12-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	07-04-2025	15-03-2026	$1.042.842.311,00

1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

La E.S.E Hospital San Juan de Dios, es una entidad descentralizada del Orden Departamental; se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Carreño del departamento del Vichada y sedes ubicadas en centros urbanos que, en el marco de la organización de red del departamento, prestan los servicios de baja y mediana complejidad para la población vichadense.

La división del territorio para la prestación de los servicios de salud, se realiza por subregiones y microrregiones que se definen a partir de la agrupación de municipios según la ubicación geográfica, las comunidades indígenas y la dispersión de la población, para organizarla de forma funcional y operativa, facilitando la articulación, gestión e integralidad de la misma, según la capacidad instalada de las IPS, las vías de acceso que facilitan en el tiempo de invierno el transporte fluvial, (ríos Meta, Vichada y Guaviare) y en verano las vías terrestres que cruzan de igual forma cada subregión.

La función primordial de la E.S.E. radica en la atención de salud, en cumplimiento de principios constitucionales que orientan la prestación del servicio público de salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía de la calidad del servicio y de su efectiva prestación, para lo cual debe contar con una infraestructura apropiada y dotación acorde con el nivel de servicios ofertados.

La demanda de servicios de salud de la E.S.E. proviene de la zona urbana y rural, debido a que el mercado actual está dado en su mayor parte por las EPS del Régimen Subsidiado, seguida de las EPS de Régimen Contributivo y por último régimen especial y particular Se ha presentado un incremento en la población perteneciente al régimen subsidiado en razón a la población desplazada que llega de otros municipios, desde Venezuela y al crecimiento propio poblacional.

La E.S.E ha realizado una distribución de sus servicios en las diferentes sedes de tal forma que se garantiza una adecuada, optima y oportuna atención a dichos usuarios, con base a los principios de calidad y eficiencia, que le permita ser autosuficiente y sostenible en el tiempo como Empresa Social del Estado para cumplir con los requerimientos que le exige el Ministerio de salud y protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, a pesar de los diferentes esfuerzos efectuados por la entidad, en donde se ha dotado de equipos biomédicos de última generación, ampliado el personal especializado para la atención de pacientes y una progresiva ampliación de servicios, es evidente que la infraestructura física de la entidad resulta insuficiente y vetusta de cara a la normatividad constructiva y hospitalaria, generando consigo riesgos frente a la atención de usuarios y trabajadores de la entidad.

Ha de recordarse que la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, Vichada, fue creada como Empresa Social del Estado a través de la Ordenanza 048 del 22 d noviembre de 1994. Previo a su nacimiento, la institución hospitalaria prestaba sus servicios a cargo de la dirección seccional de salud en el Departamento del Vichada, en la misma infraestructura física.

Revisando el archivo histórico de la entidad, se colige que la infraestructura física data de alrededor de 40 años de construcción y en la actualidad no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10, ni de habilitación hospitalaria, pese a que se han efectuado adecuaciones para tratar de acompasar la edificación frente a las modificaciones normativas.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causas directas: infraestructura hospitalaria mayor a 40 años de construcción, la cual no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10 y de habilitación hospitalaria, Resolución 3100 de 2019.

Causas indirectas: Deficiente prestación de los Servicios de Salud a la población, en la ESE Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño y sus sedes.

EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

Efectos directos: Riesgo en la prestación del servicio de salud e incremento de los usuarios y baja calidad en la prestación de los servicios de salud.

Efectos indirectos: Disminución de la calidad del Servicio de Salud en el Departamento del Vichada.

Por esta razón y bajo el entendiendo que parte esencial de la calidad de la prestación del servicio de salud es la infraestructura física hospitalaria, desde la gerencia de la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios, junto con el acompañamiento de la Secretaría Departamental de Salud, se presentó un proyecto de modernización de la infraestructura física ante el Ministerio de Salud Protección Social.

Por lo anterior, la ESE Departamental Hospital San juan de Dios de Puerto Carreño, junto con la Administración Departamental presento ante el Ministerio de Salud y Protección Social la iniciativa para la **" REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social dio concepto de viabilidad técnica al proyecto (Resolución No. 1353 de 2023), a efectos de lograr la financiación de los recursos necesarios para sufragar los costos del proyecto.

En respuesta a las diferentes gestiones administrativas, mediante documento del 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud comunica viabilidad técnica, financiera del proyecto, determinando una financiación de la entidad nacional por valor de $22.164.988.792,00.

Resultado de lo anterior, y acorde con el Plan de Desarrollo **"TRABAJO PARA TODO VICHADA 2020- 2023"** , línea Estratégica 2. Desarrollo Social Integral Para Vida Digna, Programa 5. Salud y protección social para el Vichada; 4.3.1.3 Subprograma 7. Prestación de servicios de salud OBJETIVO 8. Garantizar el cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada.

Por tal razón, **LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**, contemplo llevar a cabo el proceso de selección de un contratista que cumpla con los requerimientos legales, técnicos y financieros, necesarios para la **REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO**.

2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La ubicación de la ejecución de la obra física es Cumaribo – Vichada



El proyecto se ubica en un lote esquinero entre la calle 6 y la carrera 15 de Cumaribo Vichada, comprende la construcción Hospital San Juan de Dios Sede Cumaribo. El propósito es mejorar la calidad de la atención de la E.S.E departamental a las personas.

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA ACTA PARCIAL No. 7

ITEM 3.7. Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO.

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se realizó el vertido de concreto impermeabilizado con una resistencia de 3000 psi para la construcción de los muros del tanque subterráneo de suministro del hospital. En esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

Esta actividad se incluye y se relaciona en el presente periodo, de conformidad con el Acta Modificatoria N°2 de balance de mayores y menores cantidades, aprobada el 14 de julio de 2025.

ITEM 3.10. Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi.

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se realizó el vertido de concreto con una resistencia de 3000 psi para la construcción de las viguetas de 0.25 x 0.60 metros para las vigas aéreas del nivel +4.03m del hospital. En esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

Esta actividad se incluye y se relaciona en el presente periodo, de conformidad con el Acta Modificatoria N°2 de balance de mayores y menores cantidades, aprobada el 14 de julio de 2025.

ITEM 3.11. Viga aérea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi.

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se realizó el vertido de concreto con una resistencia de 3000 psi para la construcción de las viguetas de 0.30 x 0.60 metros para las vigas aéreas del nivel +4.03m del hospital. En esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

Esta actividad se incluye y se relaciona en el presente periodo, de conformidad con el Acta Modificatoria N°2 de balance de mayores y menores cantidades, aprobada el 14 de julio de 2025.

ITEM 3.17. Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y crucetas).

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de armado de formaleta, que sirve como plataforma para el montaje del hierro de vigas y viguetas del entrepiso, con el fin de proceder posteriormente a la fundición de estas mismas vigas. En esta actividad se utilizaron parales, camillas, cerchas, crucetas y camillas.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

ITEM 3.18. Acero de Refuerzo Grado 60.

Se realizó, como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, el amarrado y figurado de acero de refuerzo grado 60 para las vigas aéreas de la rampa, vigas adicionales en cubierta, losa de la rampa, escaleras y elementos no estructurales. Para esta actividad se emplearon bichiroques, alambre negro.




Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

Esta actividad se incluye y se relaciona en el presente periodo, de conformidad con el Acta Modificatoria N°2 de balance de mayores y menores cantidades, aprobada el 14 de julio de 2025.

ITEM 3.19. Malla electrosoldada.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de colocación y adecuación de la malla electrosoldada para la totalidad de la placa de contrapiso. Para esta tarea se emplearon bichiroques, alambre y pulidora de mano con disco de corte de metal.

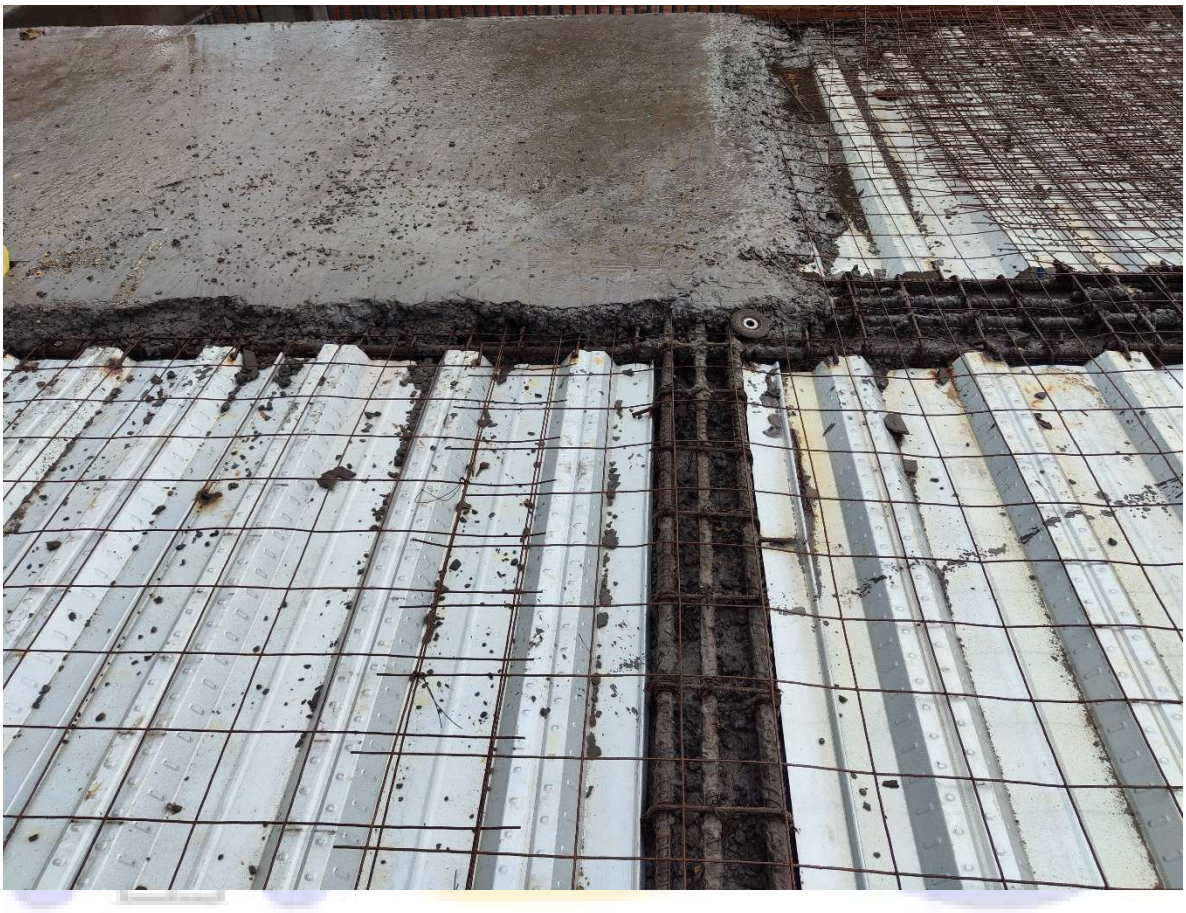

Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

ITEM 3.20. Losa maciza elevada para entrepiso.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de verter concreto para losa maciza elevada para entrepiso con una resistencia de 3000 psi. Para esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas, baldes, bomba de concreto pluma y vibrador para concreto.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

ITEM 3.27. Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterráneo.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de verter concreto para placa de tanque subterráneo con una resistencia de 3000 psi. Para esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

Esta actividad se incluye y se relaciona en el presente periodo, de conformidad con el Acta Modificatoria N°2 de balance de mayores y menores cantidades, aprobada el 14 de julio de 2025.

ITEM 3.28. Concreto de 3000 Psi para muro pantalla.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de verter concreto para inicio de muros pantalla con una resistencia de 3000 psi. Para esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

ITEM 4.4. Estructura metálica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje).

Se realizó, como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, el suministro y preparación de correas metálicas en acero ASTM – 500 para cubierta. Para esta actividad se emplearon equipo de soldadura, pulidora con disco de pulir y corte, pintura antioxidante.




Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 10 de junio de 2025 – 16 de julio de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 9 de obra.

Esta actividad se incluye y se relaciona en el presente periodo, de conformidad con el Acta Modificatoria N°2 de balance de mayores y menores cantidades, aprobada el 14 de julio de 2025.

2.3. CUADRO DE AVANCE

AVANCE FISICO				
INFORME N°	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.97%	0.97%	0.00%	0.00%
4	3.27%	4.24%	4.31%	4.31%
5	1.96%	6.20%	2.28%	6.59%
6	1.53%	7.73%	1.16%	7.75%
7	1.51%	9.24%	3.10%	10.85%
8	1.81%	11.05%	4.79%	15.64%
9	2.50%	13.55%	0.36%	16.00%
10	4.50%	18.05%	2.06%	18.06%
11	0.86%	18.91%	6.29%	24.35%
12	0.87%	19.78%	0.71%	25.06%
13	1.55%	21.33%	2.98%	28.04%
14	7.95%	29.28%	1.24%	29.28%
15	0.92%	30.19%	0.91%	30.19%
16	1.12%	31.31%	1.67%	31.86%
17	1.12%	32.43%	1.67%	33.53%
18	1.12%	33.55%	1.12%	34.65%
PRESENTE ACTA PARCIAL	0.56%	34.11%	3.37%	38.02%
19	1.12%	34.67%		
20	2.22%	36.89%		
21	8.93%	45.81%		
22	13.21%	59.02%		
23	17.97%	76.99%		
24	23.01%	100.00%		

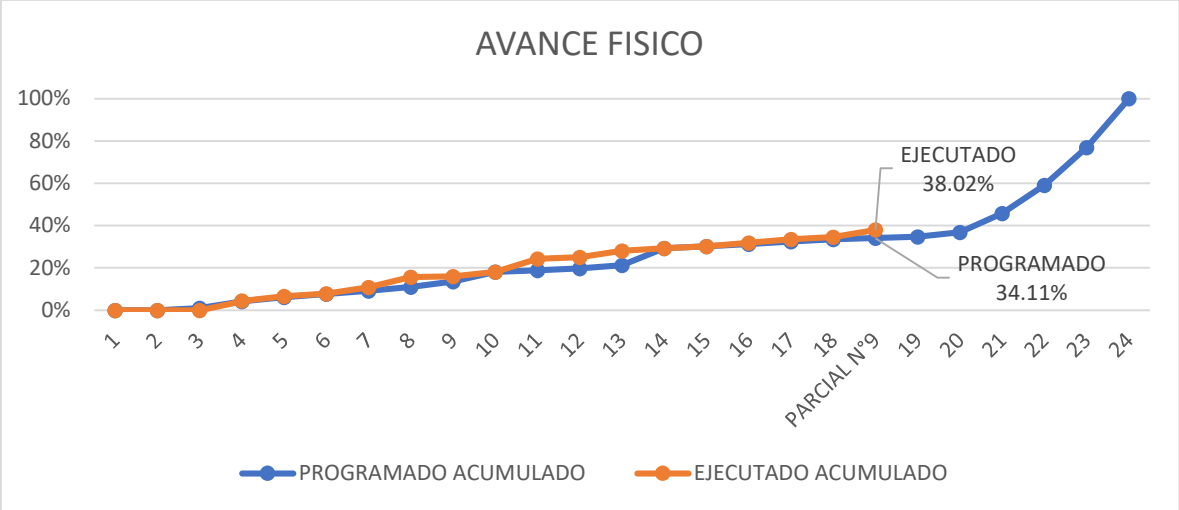

Nota: el avance de obra plasmado en la anterior tabla corresponde a lo registrado en la sabana de control de avance del presente informe, la aritmética de la tabla se puede alterar debido a decimales ocultos por el formato anteriormente mencionado.

Los porcentajes presentados en el avance físico programado y programado acumulado van de acuerdo al quinto ajuste a la programación de obra aprobada por interventoría el 7 de abril de 2025 correspondiente a la prórroga solicitada.

2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Para el presente periodo se utilizaron los siguientes materiales en los cuales se adjunta el correspondiente certificado de calidad:

- Cemento hidráulico tipo UG marca Fortecem.
- Acero grado 60
- Malla electrosoldada
- Acero ASTM-500

2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo actual, se llevaron a cabo actividades de construcción que involucraron el uso de concreto. Como parte del control de calidad, se extrajeron cilindros de laboratorio de los elementos fundidos hasta la fecha. Estos cilindros serán enviados al laboratorio Ingegar Ingeniería S.A.S. para realizar las pruebas de compresión correspondientes. Posteriormente, el laboratorio nos enviará un informe con los resultados.



En las siguientes tablas se relacionarán las tomas de muestra que están pendientes de resultados por parte del laboratorio, los cuales se entregaran en los siguientes informes de obra.

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi PARA COLUMNA			
ITEM: 3,5 Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m			
FECHA	**FECHA DE FALLO**	**COLUMNA TIPO**	**EJE DE LOCALIZACIÓN**
7/04/2025	05/05/2025	C-1	D-13
14/04/2025	12/05/2025	C-5	E-9

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi PARA COLUMNA			
ITEM: 3,5 Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m			
FECHA	**FECHA DE FALLO**	**COLUMNA TIPO**	**EJE DE LOCALIZACIÓN**
20/05/2025	17/06/2025	C-6	D-4
21/04/2025	10/05/2025	C-3	J-4

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi PARA VIGA AREA N+8.05			
ITEM: 3,9 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m			
FECHA	**FECHA DE FALLO**	**UBICACION**	**EJE DE LOCALIZACIÓN**
3/06/2025	01/07/2025	N +8.05	E-I / 13-11
4/06/2025	02/07/2025	N +8.05	A-C / 11-9

2.6. CLIMATOLOGIA

A partir del periodo comprendido entre el 10 DE JUNIO DE 2025 – 16 DE JULIO DE 2025 el estado del clima fue el siguiente:

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE JUNIO 2025

1	2	3	4	5	6
	Nublado	Nublado-Lluvioso	Nublado-Soleado	Nublado-Soleado	Nublado-Lluvioso
7	8	9	10	11	12
Nublado-Lluvioso		Nublado-Lluvioso	Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso
13	14	15	16	17	18
Lluvioso	Lluvioso		Nublado	Lluvioso	Lluvioso
19	20	21	22	23	24
Soleado-Lluvioso	Lluvioso	Lluvioso			Lluvioso
25	26	27	28	29	30
Nublado-Lluvioso	Lluvioso	Lluvioso	Soleado-Lluvioso		
31					

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE JULIO 2025

1	2	3	4	5	6
Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Soleado	
7	8	9	10	11	12
Soleado	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso
13	14	15	16	17	18
	Nublado-Lluvioso	Nublado	Nublado-Lluvioso		
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					

2.7. COMPROMISOS LABORALES

Durante el periodo no se generaron compromisos laborales por parte de la entidad contratante hacia el contratista de obra.

2.8. PERSONAL

Para el presente periodo se contó con la siguiente relación de personal profesional y operativo.

2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL

JUNIO DE 2025

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

JULIO DE 2025

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO

JUNIO DE 2025

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
YESID CAMILO CESPEDES MORA	CONDUCTOR

ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
ORLANDO FONSECA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	AYUDANTE DE OBRA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
LEYDY KATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
BILCEN REINA GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	AYUDANTE DE OBRA
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	AYUDANTE DE OBRA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	AYUDANTE DE OBRA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO AMAYA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
GUILLERMO RIOS GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	AYUDANTE DE OBRA
ELBER RODRIGUEZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
DARWIN LAMEC SALCEDO CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
JAIME NOE PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON ANDRES PIÑA GALLARDO	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ALVARO GARZON PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
EDWIN ANDRES NOVOA PULIDO	AYUDANTE DE OBRA

JULIO DE 2025

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
YESID CAMILO CESPEDES MORA	CONDUCTOR
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
ORLANDO FONSECA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	AYUDANTE DE OBRA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
LEYDY KATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
BILCEN REINA GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	AYUDANTE DE OBRA
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	AYUDANTE DE OBRA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	AYUDANTE DE OBRA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO AMAYA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
GUILLERMO RIOS GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	AYUDANTE DE OBRA
ELBER RODRIGUEZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
DARWIN LAMEC SALCEDO CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA

JAIME NOE PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON ANDRES PIÑA GALLARDO	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ALVARO GARZON PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
EDWIN ANDRES NOVOA PULIDO	AYUDANTE DE OBRA
ELEAZAR OBDULIO REINA RIVAS	AYUDANTE DE OBRA
NELSON RODRIGUEZ MORALES	AYUDANTE DE OBRA
BRIAN FARID VARGAS SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA
JAVIER ELOI ARIANO RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA
DAMIAN ENRIQUE ANGULO ACERO	TECNICO ELECTRICISTA

2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MAYO DE 2025

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	No PLANILLA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	ASESOR ESTRUCTURAL	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA	9486478360 9487386029
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	ARQUITECTO	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	COORDINADORA DE LOGISTICA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9487505010

2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MAYO DE 2025

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	No PLANILLA
YESID CAMILO CESPEDES MORA	1.121.870.352	CONDUCTOR	CAPITAL SALUD	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
JOSE ENRIQUE PONARE	5.722.870	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010

CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
ORLANDO FONSECA GOMEZ	1.127.382.860	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	1.124.991.167	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	ALMACENISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9487505010
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	1.125.002.345	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
JAIRO GAITAN GALINDO	1.006.950.328	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	1.124.990.520	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	AUXILIAR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
BILCEN REINA GALINDO	6.848.517	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	1.124.990.631	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	1.006.951.188	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	AYUDANTE DE OBRA	CAJA COPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	CELADOR	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	SOLDADOR	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	1.127.923.922	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9487505010
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	1.121.944.520	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	1.125.004.538	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	1.124.991.490	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
SANTIAGO AMAYA GAITAN	1.124.991.155	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9487505010
GUILLERMO RIOS GAITAN	17.316.132	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	1.125.001.121	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	1.119.890.549	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	7.243.305	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	1.124.990.027	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9487505010
WILSON PONARE PONARE	1.124.996.599	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	1.121.850.548	OPERADOR MAQUINARIA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9487505010


ELBER RODRIGUEZ CHIPIAJE	1,124,990,559	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
DARWIN LAMEC SALCEDO CHIPIAJE	1,124,994,854	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
JAIME NOE PONARE PONARE	6,848,155	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
JOSE ALVARO GARZON PEREZ	80,795,043	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
WILSON ANDRES PIÑA GALLARDO	1,125,007,842	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010
EDWIN ANDRES NOVOA PULIDO	1,124,990,124	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9487505010

2.11. MAQUINARIA

Para el presente periodo se utilizó mezcladora para concreto de bulto y medio de cemento y bomba de concreto para fundir placa en concreto de 3000 psi, retroexcavadora y camión doble troque para suministro de agregados necesarios para el concreto.

3. FINANCIERO

En el presente periodo el Consorcio HDC cuenta con Diez Mil Cuatrocientos Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Ciento Doce pesos M/CTE ($10,428,423,112.00) entregados por la entidad contratante Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. Sede Puerto Carreño por concepto de anticipo del cual se ha amortizado Tres mil seiscientos nueve millones trescientos once mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con cincuenta M/CTE ($ 3,609,311,498.50) para un valor pendiente por amortizar de Seis mil ochocientos diecinueve millones ciento once mil seiscientos trece pesos con cincuenta M/CTE ($ 6,819,111,613.50).

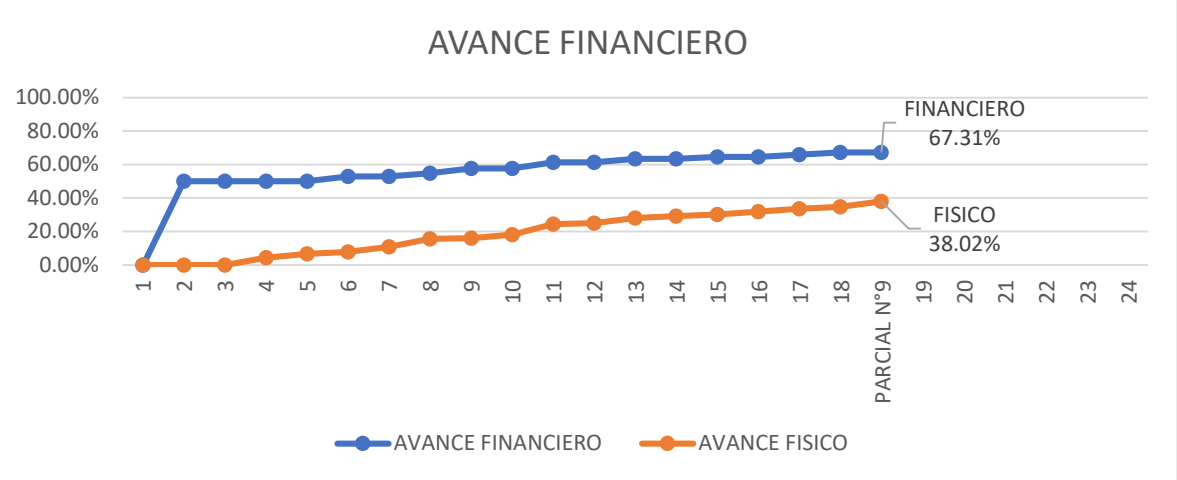

El Consorcio HDC hasta el momento del presente informe a tramitado ante la entidad ocho (8) actas parciales por un valor Siete mil doscientos dieciocho millones seiscientos veintidós mil novecientos noventa y siete pesos M/CTE. ($ 7,218,622,997.00) las cuales serán discriminadas a continuación:

Acta parcial N°1: $ 1,202,976,129.00
Acta parcial N°2: $ 842,463,948.00
Acta parcial N°3: $ 1,160,249,543.00
Acta parcial N°4: $ 1,644,084,729.00
Acta parcial N°5: $ 713,207,603.00
Acta parcial N°6: $ 536,259,859.00
Acta parcial N°7: $ 537,301,176.00
Acta parcial N°8: $ 582,080,010.00

3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

Para el presente periodo se elaboraron órdenes de pago los cuales fueron invertidos de acuerdo a los rubros relacionados en el plan de inversión del anticipo previamente presentado, a continuación, se relacionan las ordenes de pagos emitidas a la fecha:

Orden	1. Pago de personal	2. Compra de equipos y repuestos	3. Transporte y alquiler de maquinaria	4. Compra de materiales y accesorios.	Estado
N° 1	$ 500,000,000.00				APROBADA
N° 2			$ 1,169,965.00		**ANULADA**
N° 3			$ 110,240,000.00		APROBADA
N° 4				$ 99,000,000.00	APROBADA
N° 5				$ 78,750,000.00	APROBADA
N° 6			$ 560,000,000.00		APROBADA
N° 7			$ 99,840,000.00		APROBADA
N° 8	$ 350,000,000.00				APROBADA
N° 9			$ 33,636,482.00		APROBADA
N° 10				$ 5,375,000.00	**ANULADA**
N° 11				$ 24,434,807.02	APROBADA
N° 12				$ 98,736,000.00	APROBADA
N° 13				$ 219,768,800.00	APROBADA
N° 14		$ 37,115,000.00			APROBADA
N° 15				$ 209,625,000.00	APROBADA
N° 16				$ 952,756,550.00	APROBADA
N° 17				$ 30,870,000.00	APROBADA
N° 18				$ 129,121,600.00	APROBADA
N° 19				$ 8,000,000.00	APROBADA
N° 20				$ 219,163,200.00	APROBADA
N° 21	$ 683,246,500.00				APROBADA
N° 22					**ANULADA**
N° 23				$ 137,500,000.00	APROBADA
N° 24				$ 15,040,000.00	APROBADA
N° 25				$ 39,481,373.00	APROBADA
N° 26				$ 36,745,470.00	APROBADA
N° 27				$ 284,722,200.00	APROBADA
N° 28				$ 1,120,500.00	APROBADA
N° 29				$ 270,000,000.00	APROBADA
N° 30			$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 31			$ 13,320,000.00		APROBADA
N° 32			$ 47,521,408.00		APROBADA
N° 33			$ 40,000,000.00		APROBADA
N° 34			$ 294,367,000.00		APROBADA
N° 35				$ 439,270,000.00	APROBADA
N° 36				$ 25,683,000.00	APROBADA
N° 37				$ 6,500,504.00	APROBADA
N° 38			$ 10,320,000.00		APROBADA
N° 39			$ 16,320,000.00		APROBADA

N° 40			$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 41		$ 4,500,000.00			APROBADA
N° 42				$ 15,249,850.00	APROBADA
N° 43			$ 20,706,000.00		APROBADA
N° 44			$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 45			$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 46				$ 12,750,000.00	APROBADA
N° 47		$ 5,500,000.00			APROBADA
N° 48				$ 14,400,500.00	APROBADA
N° 49					**ANULADA**
N° 50			$ 14,574,000.00		APROBADA
N° 51			$ 4,560,000.00		APROBADA
N° 52				$ 1,040,000.00	APROBADA
N° 53				$ 3,022,147.00	APROBADA
N° 54					**ANULADA**
N° 55			$ 23,300,000.00		APROBADA
N° 56			$ 19,700,000.00		APROBADA
N° 57					**ANULADA**
N° 58				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 59			$ 20,400,000.00		APROBADA
N° 60					**ANULADA**
N° 61				$ 406,050.00	APROBADA
N° 62				$ 183,427,000.00	APROBADA
N° 63				$ 1,402,500.00	APROBADA
N° 64				$ 2,511,140.00	APROBADA
N° 65			$ 10,353,000.00		APROBADA
N° 66				$ 870,000.00	APROBADA
N° 67			$ 9,720,000.00		APROBADA
N° 68				$ 1,311,868.00	APROBADA
N° 69				$ 6,320,650.00	APROBADA
N° 70				$ 4,313,900.00	APROBADA
N° 71			$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 72			$ 3,045,000.00		APROBADA
N° 73			$ 26,227,600.00		APROBADA
N° 74				$ 25,201,300.00	APROBADA
N° 75			$ 1,134,000.00		APROBADA
N° 76				$ 3,618,901.00	APROBADA
N° 77				$ 19,611,300.00	APROBADA
N° 78				$ 11,502,500.00	APROBADA
N° 79				$ 11,281,720.00	APROBADA
N° 80			$ 39,951,500.00		APROBADA
N° 81			$ 22,664,000.00		APROBADA
N° 82			$ 13,113,800.00		APROBADA
N° 83				$ 175,430,235.00	APROBADA
N° 84				$ 4,976,180.00	APROBADA
N° 85			$ 3,600,000.00		APROBADA
N° 86			$ 75,832,000.00		APROBADA
N° 87	$ 1,700,000.00				APROBADA
N° 88					**ANULADA**
N° 89				$ 692,548.00	APROBADA
N° 90			$ 17,000,000.00		APROBADA
N° 91				$ 1,251,548.50	APROBADA
N° 92	$ 32,859,000.00				APROBADA
N° 93				$ 1,121,600.00	APROBADA
N° 94				$ 2,004,000.00	APROBADA
N° 95			$ 41,250,000.00		APROBADA
N° 96					**ANULADA**
N° 97				$ 2,523,100.00	APROBADA
N° 98				$ 5,304,000.00	APROBADA
N° 99				$ 23,500,000.00	APROBADA
N° 100			$ 3,030,000.00		APROBADA
N° 101			$ 4,860,000.00		APROBADA
N° 102	$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 103				$ 3,150,000.00	APROBADA
N° 104			$ 16,821,600.00		APROBADA

N° 105			$ 20,682,000.00		APROBADA
N° 106			$ 8,500,000.00		APROBADA
N° 107				$ 4,092,140.00	APROBADA
N° 108				$ 100,000,000.30	APROBADA
N° 109	$ 368,950,000.00				APROBADA
N° 110			$ 32,130,000.00		APROBADA
N° 111				$ 1,547,000.00	APROBADA
N° 112				$ 24,077,700.00	APROBADA
N° 113					**ANULADA**
N° 114			$ 1,884,500.00		APROBADA
N° 115					**ANULADA**
N° 116			$ 18,650,000.00		APROBADA
N° 117				$ 1,280,000.00	APROBADA
N° 118				$ 8,384,550.00	APROBADA
N° 119			$ 12,789,000.00		APROBADA
N° 120				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 121			$ 25,996,000.00		APROBADA
N° 122				$ 103,200,000.00	APROBADA
N° 123				$ 1,474,100.00	APROBADA
N° 124				$ 928,000.00	APROBADA
N° 125			$ 4,594,800.00		APROBADA
N° 126				$ 193,256,000.00	APROBADA
N° 127		$ 144,900,000.00			APROBADA
N° 128	$ 213,800,000.00				APROBADA
N° 129			$ 11,907,000.00		APROBADA
N° 130				$ 560,500.00	APROBADA
N° 131				$ 573,000.00	APROBADA
N° 132			$ 15,000,000.00		APROBADA
N° 133				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 134				$ 26,553,541.00	APROBADA
N° 135	$ 3,299,870.00				APROBADA
N° 136				$ 6,200,000.00	APROBADA
N° 137				$ 61,706,115.00	APROBADA
N° 138				$ 6,255,950.00	APROBADA
N° 139				$ 3,161,700.00	APROBADA
N° 140			$ 5,372,000.00		APROBADA
N° 141			$ 7,480,000.00		APROBADA
N° 142				$ 8,759,000.00	APROBADA
N° 143				$ 8,358,188.50	APROBADA
N° 144			$ 44,730,000.00		APROBADA
N° 145			$ 8,640,000.00		APROBADA
N° 146				$ 3,952,200.00	APROBADA
N° 147	$ 62,200,000.00				APROBADA
N° 148				$ 58,754,723.00	APROBADA
N° 149				$ 920,000.00	APROBADA
N° 150	$ 4,500,000.00				APROBADA
N° 151	$ 201,847,000.00				APROBADA
N° 152				$ 10,000,000.00	APROBADA
N° 153				$ 1,952,900.00	APROBADA
N° 154				$ 4,308,225.00	APROBADA
N° 155			$ 5,420,000.00		APROBADA
N° 156			$ 11,900,000.00		APROBADA
N° 157			$ 6,300,000.00		APROBADA
N° 158			$ 2,646,000.00		APROBADA
N° 159	$ 1,000,000.00				APROBADA
N° 160				$ 4,999,990.00	APROBADA
N° 161	$ 3,000,000.00				APROBADA
N° 162			$ 30,980,000.00		APROBADA
N° 163				$ 7,900,300.00	APROBADA
N° 164	$ 20,000,000.00				APROBADA
N° 165				$ 3,541,600.00	APROBADA
N° 166			$ 13,090,000.00		APROBADA
N° 167	$ 700,000.00				APROBADA
N° 168		$ 3,175,000.00			APROBADA
N° 169	$ 16,000,000.00				APROBADA

N° 170			$ 26,180,000.00		APROBADA
N° 171				$ 6,044,997.00	APROBADA
N° 172				$ 7,665,600.00	APROBADA
N° 173				$ 3,990,988.37	APROBADA
N° 174	$ 6,000,000.00				APROBADA
N° 175			$ 9,990,000.00		APROBADA
N° 176			$ 44,000,000.00		APROBADA
N° 177				$ 63,874,585.00	APROBADA
N° 178				$ 10,079,750.00	APROBADA
N° 179	$ 415,393,000.00				APROBADA
N° 180				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 181		$ 49,600,000.00			APROBADA
N° 182			$ 25,000,000.00		APROBADA
N° 183		$ 4,206,000.00			APROBADA
N° 184			$ 8,493,000.00		APROBADA
N° 185			$ 13,683,000.00		APROBADA
N° 186			$ 14,245,000.00		APROBADA
N° 187			$ 2,100,000.00		APROBADA
N° 188				$ 7,336,800.00	APROBADA
N° 189				$ 4,134,000.00	APROBADA
N° 190			$ 51,860,000.00		APROBADA
N° 191				$ 4,574,200.00	APROBADA
N° 192				$ 25,000,000.00	APROBADA
N° 193	$ 113,200,000.00			$ 48,960,000.00	APROBADA
N° 194				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 195				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 196				$ 20,012,757.00	APROBADA
N° 197				$ 25,129,474.00	APROBADA
N° 198	$ 119,400,000.00				APROBADA
N° 199			$ 41,280,000.00		APROBADA
N° 200			$ 7,500,000.00		APROBADA
N° 201			$ 5,000,000.00		APROBADA
N° 202			$ 5,000,000.00		APROBADA
N° 203				$ 2,452,000.00	APROBADA
N° 204				$ 1,050,000.00	APROBADA
N° 205	$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 206			$ 28,958,000.00		APROBADA
N° 207			$ 16,435,000.00		APROBADA
N° 208	$ 4,600,000.00		$ 5,000,000.00		APROBADA
SUB-TOTAL	$ 3,126,895,370.00	$ 248,996,000.00	$ 2,263,512,655.00	$ 4,786,861,115.69	
VALOR X RUBRO	$ 3,127,256,572.31	$ 248,996,000.00	$ 2,263,958,655.00	$ 4,788,211,884.69	
SALDO X RUBRO	$ 361,202.31	$ -	$ 446,000.00	$ 1,350,769.00	
SALDO				$ 2,157,971.31	

Es importante destacar que el 17 de octubre de 2024 se realizó un ajuste en los valores del plan de inversión del anticipo, modificando los montos por rubro presentados inicialmente por el Consorcio HDC. Los nuevos valores y porcentajes se detallan en la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 3,127,256,572.31	29.99%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 248,996,000.00	2.39%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 2,263,958,655.00	21.71%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 4,788,211,884.69	45.92%

TOTALES	$ 10,428,423,112.00	100.00%

A continuación, se relacionan los saldos por rubro de acuerdo al plan de inversión del anticipo presentado:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 361,202.31	0.003%
2	Compra de equipos y repuestos	$ -	0.00%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 446,000.00	0.004%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 1,350,769.00	0.01%
	TOTALES	$ 2,157,971.31	0.02%

3.2. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se relaciona el cuadro de control presupuestal del contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 firmado con el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. de Puerto Carreño.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 20.856.846.224,00	28/12/2023		
VALOR GIRADO ANTICIPO	$ 10,428,423,112.00	13/02/2024		50%
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 1,202,976,129.00	29/05/2024	5.77%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 601,488,064.50	29/05/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 601,488,064.50		2.88%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 842,463,948.00	06/08/2024	4.04%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 421,231,974.00	06/08/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 421,231,974.00		2.02%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 1,160,249,543.00	05/09/2024	5.56%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 580,124,771.50	05/09/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 580,124,771.50		2.78%	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 1,644,084,729.00	22/11/2024	7.88%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 822,042,364.50	22/11/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 822,042,364.50		3.94%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 713,207,603.00	31/01/2025	3.42%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 356,603,801.50	31/01/2025		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 356,603,801.50		1.71%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 536,259,859.00	12/03/2025	2.57%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 268,129,929.50			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 268,129,929.50		1.29%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 537,301,176.00	12/05/2025	2.58%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 268,650,588.00			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 268,650,588.00		1.29%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 582,080,010.00	13/06/2025	2.79%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 291,040,005.00			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 291,040,005.00		1.40%	
TOTAL, AVANCE FINANCIERO	$ 14,037,734,610.50			67.31%

3.3. CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha se han generado los siguientes cobros de actas parciales de obra.

ACTA No	% EJECU	FECHA	EGRESO	VALOR ACTA PAGO MENSUAL	VALOR NETO PAGO
1	5.77%	29/05/2024	EOB 26508	$ 1,202,976,129.00	$ 601,488,064.50

2	4.04%	06/08/2024	EOB 28615	$ 842,463,948.00	$ 421,231,974.00
3	5.56%	05/09/2024	EOB 29563	$ 1,160,249,543.00	$ 580,124,771.50
4	7.88%	22/11/2024	EOB 31864	$ 1,644,084,729.00	$ 822,042,364.50
5	3.42%	31/01/2025	EOB	$ 713,207,603.00	$ 356,603,801.50
6	2.57%	12/03/2025	EOB	$ 536,259,859.00	$ 268,129,929.50
7	2.58%	12/05/2025	EOB	$ 537,301,176.00	$ 268,650,588.00
8	2.79%	13/06/2025	EOB	$ 582,080,010.00	$ 291,040,005.00
			TOTALES	$ 6,636,542,987.00	$ 3,318,271,493.50

4. INFORMACION LEGAL

4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS

El contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 cuenta con la licencia de construcción SPIM-05-2023, emitida el 11 de diciembre de 2023. Dicha licencia recibió una prórroga en tiempo hasta el 11 de diciembre de 2025, la cual fue otorgada el 5 de diciembre de 2024. La información correspondiente a esta licencia, junto con la prórroga, está debidamente expuesta en la valla informativa instalada por el consorcio HDC, en cumplimiento con las normativas vigentes. Asimismo, en la sección de anexos, se incluye el documento oficial que acredita la concesión de la prórroga.

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO.


Durante el desarrollo de las actividades de obra, se presentaron inconvenientes asociados a la temporada de lluvias, lo que generó retrasos en el vaciado de concreto y otras actividades programadas. Las precipitaciones frecuentes afectaron el acceso al casco urbano del municipio de Cumaribo, ya que la carretera de ingreso, al ser destapada, presenta condiciones de alta inaccesibilidad debido al ablandamiento y deterioro de la vía, dificultando el transporte de materiales y el cumplimiento del cronograma. Como medidas de mitigación, se realizaron ajustes en la programación de actividades, se priorizaron labores que pudieran ejecutarse en condiciones climáticas adversas y se implementaron jornadas laborales extendidas para recuperar los tiempos afectados.

Sin embargo, a pesar de las medidas de mitigación implementadas, fue imposible trabajar en los días que se detuvieron las labores, debido a que las lluvias


persistentes no permitieron la ejecución de ninguna actividad en el mes de junio y parcialmente en el mes de julio.

Adicionalmente, en los días en que fue posible avanzar parcialmente con las labores, también fue necesario suspender actividades durante ciertos periodos a causa de lluvias intermitentes. Esta situación afectó directamente el ritmo de ejecución de las actividades programadas, especialmente aquellas que dependían de condiciones climáticas secas, como el transporte de materiales, el trabajo en exteriores y el manejo de mezclas de concreto. Además, la saturación del terreno redujo la maniobrabilidad del equipo pesado y representó un riesgo para la seguridad del personal operativo.

Precipitación junio 2025

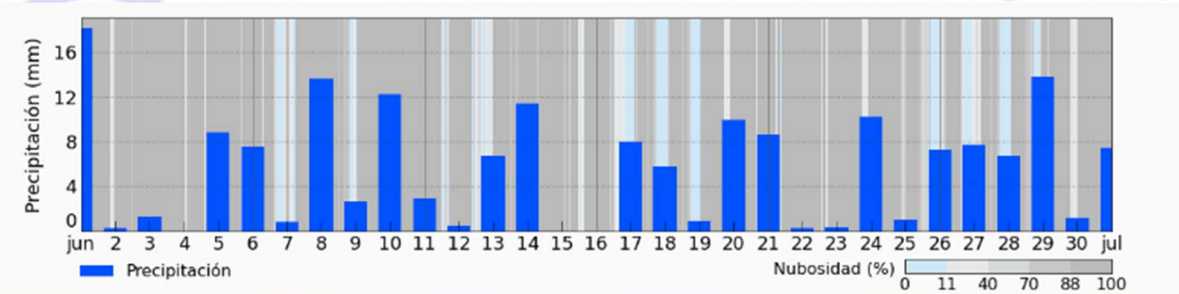

Precipitación julio 2025

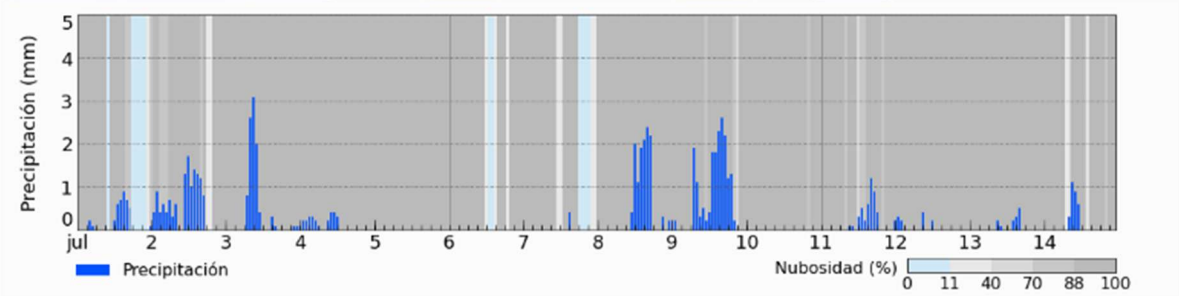

6. CONCLUSIONES

- Los trabajos se efectuaron siguiendo las especificaciones técnicas según los diseños y planos estructurales, según sus dimensiones, cuantías, así como las recomendaciones registradas en los estudios parte del proyecto.

- Se realizo la afiliación pertinente del personal operativo al sistema de seguridad social.


- En el presente periodo se presentan dificultades en el envió de materiales, por parte de las constantes lluvias, que agravan el mal estado de la vía hacia Cumaribo – Vichada.

- Para la presente acta parcial de obra No 9, se solicita el pago de obra ejecutada del 3.41%, correspondiente a un valor de Setecientos once millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos moneda corriente ($ 711,865,954.00).

- En la presente acta, el valor acumulado asciende al 38.02%, lo que equivale a Siete mil novecientos treinta millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y un pesos moneda corriente ($ 7,930,488,951.00).

- En el presente periodo, el avance de ejecución alcanzó el 38.02%, en comparación con el avance programado acumulado del 34.11%, lo que representa un avance del 3.91%

- Se incluyen y se relacionan actividades en el presente periodo, de acuerdo con el Acta Modificatoria N°2 de balance de mayores y menores cantidades, aprobada el 14 de julio de 2025.



ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consorcio HDC

7. ANEXOS

ACTA PARCIAL DE OBRA

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES COBRADAS EN ACTAS PARCIALES ANTERIORES		ACTIVIDADES COBRADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDADES COBRADAS ACUMULADAS EN ACTAS PARCIALES		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO MES ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO MES ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
1	DEMOLICIONES Y DESMONTE													
1,1	Desmonte Marcos y puertas con transporte.	m2	186.70	$ 11,075.00	$ 2,067,702.50		186.70	$ 2,067,702.50		$ 0.00	186.70	$ 2,067,702.50	0.01%	0.01%
1,2	Desmonte de Ventanas, con transporte.	m2	199.25	$ 7,666.00	$ 1,527,450.50		199.25	$ 1,527,450.50		$ 0.00	199.25	$ 1,527,450.50	0.01%	0.01%
1,3	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	50.00	$ 16,522.00	$ 826,100.00		50.00	$ 826,100.00		$ 0.00	50.00	$ 826,100.00	0.00%	0.00%
1,4	Desmonte de Cielo Raso con retiro.	m2	1,675.92	$ 12,411.00	$ 20,799,843.12		1675.92	$ 20,799,843.12		$ 0.00	1675.92	$ 20,799,843.12	0.10%	0.10%
1,5	Desmonte de Luminarias,con retiro.	und	102.00	$ 20,711.00	$ 2,112,522.00		102.00	$ 2,112,522.00		$ 0.00	102.00	$ 2,112,522.00	0.01%	0.01%
1,6	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0,5cm con retiro.	m2	1,189.70	$ 13,434.00	$ 15,982,429.80		1189.70	$ 15,982,429.80		$ 0.00	1189.70	$ 15,982,429.80	0.08%	0.08%
1,7	Desmonte Cubierta, con correas y transporte.	m2	1,493.37	$ 13,688.00	$ 20,441,248.56		1493.37	$ 20,441,248.56		$ 0.00	1493.37	$ 20,441,248.56	0.10%	0.10%
1,8	Demolición Mecánica de Edificaciones con Equipo Pesado.(Inc. Vigas columnas,muros,cimentación con Retro excavadora con martillos hidráulico,cargue mecánico y retiro de escombros hasta 6km).	m3	1,346.12	$ 328,158.00	$ 441,740,046.96	2.42%	1346.12	$ 441,740,046.96		$ 0.00	1346.12	$ 441,740,046.96	2.12%	2.12%
TOTAL CAPITULO					$ 505,497,343.44		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 505,497,343.44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 505,497,343.44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	2.42%
2	PRELIMINARES													
2,1	Cerramiento en teja de Zinc	ml	156.00	$ 55,862.00	$ 8,714,472.00		156.00	$ 8,714,472.00		$ 0.00	156.00	$ 8,714,472.00	0.04%	0.04%
2,2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	3,142.13	$ 5,734.00	$ 18,016,973.42		3142.13	$ 18,016,973.42		$ 0.00	3,142.13	$ 18,016,973.42	0.09%	0.09%
2,3	Excavacion manual en conglomerado	m3	257.40	$ 54,147.00	$ 13,937,437.80		257.40	$ 13,937,437.80		$ 0.00	257.40	$ 13,937,437.80	0.07%	0.07%
2,4	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	685.78	$ 20,081.00	$ 13,771,148.18		685.78	$ 13,771,148.18		$ 0.00	685.78	$ 13,771,148.18	0.07%	0.07%
2,5	Relleno en tierra negra abonada	m3	28.463	$ 93,409.00	$ 2,658,700.37			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
2,6	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.	m3	1,018.06	$ 133,049.00	$ 135,451,864.94	0.92%	1018.06	$ 135,451,864.94		$ 0.00	1018.06	$ 135,451,864.94	0.65%	0.65%
TOTAL CAPITULO					$ 192,550,596.71		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 189,891,896.34	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 189,891,896.34	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.91%
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
3,1	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi	m3	43.90	$ 1,253,553.00	$ 55,030,976.70		43.9	$ 55,030,976.70		$ 0.00	43.90	$ 55,030,976.70	0.26%	0.26%
3,2	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m3	159.31	$ 1,424,598.00	$ 226,952,707.38		159.31	$ 226,952,707.38		$ 0.00	159.31	$ 226,952,707.38	1.09%	1.09%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	124.33	$ 1,398,866.00	$ 173,921,009.78		124.33	$ 173,921,009.78		$ 0.00	124.33	$ 173,921,009.78	0.83%	0.83%
3,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m	m3	66.95	$ 1,600,704.00	$ 107,167,132.80		66.95	$ 107,167,132.80		$ 0.00	66.95	$ 107,167,132.80	0.51%	0.51%
3,5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	m3	47.87	$ 1,778,552.00	$ 85,139,284.24		47.87	$ 85,139,284.24		$ 0.00	47.87	$ 85,139,284.24	0.41%	0.41%
3,6	Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de 3000 Psi 9-12 m	ml	23.00	$ 189,936.00	$ 4,368,528.00			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.02%	0.00%
3,7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	m3	24.01	$ 1,721,705.00	$ 41,338,137.05		11.94	$ 20,557,157.70	12.07	$ 20,780,979.35	24.01	$ 41,338,137.05	0.20%	0.20%
3,8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	174.53	$ 1,830,947.00	$ 319,555,179.91		174.53	$ 319,555,179.91		$ 0.00	174.53	$ 319,555,179.91	1.53%	1.53%
3,9	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m	m3	131.39	$ 1,870,473.00	$ 245,761,447.47		60.92	$ 113,949,215.16		$ 0.00	60.92	$ 113,949,215.16	1.18%	0.55%
3,10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	398.22	$ 247,718.00	$ 98,646,261.96		353.85	$ 87,655,014.30	44.37	$ 10,991,247.66	398.22	$ 98,646,261.96	0.47%	0.47%
3,11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	185.06	$ 315,229.00	$ 58,336,278.74		171.3	$ 53,998,727.70	13.76	$ 4,337,551.04	185.06	$ 58,336,278.74	0.28%	0.28%
3,12	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psii 6-9 m	ml	145.93	$ 259,088.00	$ 37,808,711.84		36.98	$ 9,581,074.24		$ 0.00	36.98	$ 9,581,074.24	0.18%	0.05%

3.13	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi 6-9 m	ml	42.30	$ 319,663.00	$ 13,521,744.90			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.06%	0.00%
3.14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	ml	3,618.40	$ 40,167.00	$ 145,340,272.80		2041.60	$ 82,004,947.20		$ 0.00	2041.60	$ 82,004,947.20	0.70%	0.39%
3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	2,302.39	$ 41,783.00	$ 96,200,761.37	22.52%	1101.91	$ 46,041,105.53		$ 0.00	1101.91	$ 46,041,105.53	0.46%	0.22%
3.16	Viga canal concreto impermeabilizado de resistencia 3000 Psi	ml	77.40	$ 637,576.00	$ 49,348,382.40			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.24%	0.00%
3.17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	m2	2,935.20	$ 26,457.00	$ 77,656,586.40		1724.07	$ 45,613,719.99	849.34	$ 22,470,988.38	2573.41	$ 68,084,708.37	0.37%	0.33%
3.18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	144,295.35	$ 11,144.00	$ 1,608,027,380.40		115804.60	$ 1,290,526,462.40	23,157.06	$ 258,062,276.64	138961.66	$ 1,548,588,739.04	7.71%	7.42%
3.19	Malla electrosoldada	Kg	13,388.36	$ 10,215.00	$ 136,762,097.40		9387.9	$ 95,897,398.50	2,615.93	$ 26,721,724.95	12003.83	$ 122,619,123.45	0.66%	0.59%
3.20	Losa maciza elevada para entrepiso	m2	2,087.46	$ 128,715.00	$ 268,687,413.90		1677.60	$ 215,932,284.00	274.12	$ 35,283,355.80	1951.72	$ 251,215,639.80	1.29%	1.20%
3.21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2	2,143.37	$ 142,638.00	$ 305,726,010.06		2143.37	$ 305,726,010.06		$ 0.00	2143.37	$ 305,726,010.06	1.47%	1.47%
3.22	Dintel en concreto de 3000 psi 12 x 15 reforzado	ml	0.00	$ 65,910.00	$ 0.00			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	0.00%
3,23	Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	92.0265	$ 312,479.00	$ 28,756,348.69			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.14%	0.00%
3,24	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m2	92.0265	$ 75,479.00	$ 6,946,068.19			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.03%	0.00%
3,25	concreto viga de cimentacion cerramiento no incluye refuerzo	m3	44.54	$ 1,495,710.00	$ 66,618,923.40		35.89	$ 53,681,031.90		$ 0.00	35.89	$ 53,681,031.90	0.32%	0.26%
3,26	Concreto para escalera	m3	14.44	$ 1,910,522.00	$ 27,587,937.68			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.13%	0.00%
3,27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterraneo	m3	27.57	$ 1,721,705.00	$ 47,467,406.85		8.82	$ 15,185,438.10	18.75	$ 32,281,968.75	27.57	$ 47,467,406.85	0.23%	0.23%
3,28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3	38.91	$ 1,910,526.00	$ 74,338,566.66		22.76	$ 43,483,571.76	7.96	$ 15,207,786.96	30.72	$ 58,691,358.72	0.36%	0.28%
3,29	Losa para rampa en concreto de 3000 Psi	m3	33.29	$ 1,910,526.00	$ 63,601,410.54			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.30%	0.00%
3,30	Lamina metaldeck 2" Cal. 22 Suministro e Instal.	m2	1,677.60	$ 134,441.00	$ 225,538,221.60		1677.60	$ 225,538,221.60		$ 0.00	1677.60	$ 225,538,221.60	1.08%	1.08%
TOTAL CAPITULO					**$ 4,696,151,189.12**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 3,673,137,670.95**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 426,137,879.53**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 4,099,275,550.48**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**19.65%**
4	**CUBIERTA Y CIELORASO**													
4,1	suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	m2	1,405.74	$ 254,888.00	$ 358,306,257.12			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.72%	0.00%
4,2	tapas protectoras de remates para teja flanching y cumbrera calibre 26	ml	338.66	$ 80,901.00	$ 27,397,932.66			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
4,3	Cielo raso en lamina PVC 9 mm, incluye estructura	m2	3,218.4025	$ 131,627.00	$ 423,628,665.87			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.03%	0.00%
4,4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	16,436.78	$ 25,829.00	$ 424,545,590.62	7.08%	10112.9342	$ 261,206,977.45	4,702.13	$ 121,451,315.77	14815.0642	$ 382,658,293.22	2.04%	1.83%
4,5	acero estructural t astm a36 (incluye suministro montaje y pintura)	kg	135.00	$ 25,101.00	$ 3,388,635.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
4,6	suministro e instalacion de tubo 2" galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura	und	1,143.23529411765	$ 208,821.00	$ 238,731,537.35		888	$ 185,433,048.00		$ 0.00	888	$ 185,433,048.00	1.14%	0.89%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,475,998,618.62**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 446,640,025.45**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 121,451,315.77**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 568,091,341.22**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**2.72%**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**													
5,1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m2	5,198.85	$ 82,304.00	$ 427,886,150.40		2847.49	$ 234,359,816.96		$ 0.00	2847.49	$ 234,359,816.96	2.05%	1.12%
5,2	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4	m2	12,620.97	$ 36,808.00	$ 464,552,663.76		2847.48	$ 104,810,043.84		$ 0.00	2847.48	$ 104,810,043.84	2.23%	0.50%
5,3	Filos y dilataciones 1:4	ml	7,097.60	$ 12,396.00	$ 87,981,849.60	4.70%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.42%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 980,420,663.76**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 339,169,860.80**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 339,169,860.80**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**1.63%**
6	**PISOS Y ENCHAPES**													

6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	m2	3,263.6275	$ 36,852.00	$ 120,271,200.63		969.08	$ 35,712,536.16		$ 0.00	969.08	$ 35,712,536.16	0.58%	0.17%
6,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m2	2,720.9607	$ 172,550.00	$ 469,501,768.79			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.25%	0.00%
6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	ml	2,905.78	$ 38,562.00	$ 112,052,688.36			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.54%	0.00%
6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ml	2,905.78	$ 24,797.00	$ 72,054,626.66			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.35%	0.00%
6,5	Dilatacion palstica para mediacaña	ml	2,905.78	$ 4,160.00	$ 12,088,044.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
6,6	Enchape pared cerámica rectificada 30x60 cm brllante de 1a calidad instalada	m2	1,332.1053	$ 64,486.00	$ 85,902,142.38			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.41%	0.00%
6,7	Win media luna plastico	ml	370.70	$ 4,160.00	$ 1,542,112.00	5.16%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
6,8	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	269.3446	$ 41,535.00	$ 11,187,227.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
6,9	Piso en concreto estampado. Suministro e instal.	m2	826.29	$ 201,270.00	$ 166,307,388.30			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%
6,10	sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto 3,000 psi (fundido en sitio, mezcla en obra. incluye suministro, formaleta y construcción)	ml	153.55	$ 164,298.00	$ 25,227,957.90			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,076,135,157.77**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 35,712,536.16**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 35,712,536.16**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.17%**
7	**ESTUCO Y PINTURA**													
7,1	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11,794.5637	$ 27,240.00	$ 321,283,915.19			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.54%	0.00%
7,2	Estuco en filos y dilataciones	ml	7,097.60	$ 10,690.00	$ 75,873,344.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.36%	0.00%
7,3	Pintura exterior tipo koraza o similar 3 manos sobre muros	m2	1,700.676	$ 29,611.00	$ 50,358,717.04			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	m2	11,794.5637	$ 19,555.00	$ 230,642,693.15	3.25%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.11%	0.00%
7,5	Lineas de trafico de ancho 0.10 m, demarcacion	ml	59.44	$ 7,078.00	$ 420,716.32			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 678,579,385.70**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
8	**CARPINTERIA METALICA - MADERA**													
8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	521.4117	$ 462,017.00	$ 240,901,069.40			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.16%	0.00%
8,2	Puerta en RH incluye marco y chapa	m2	436.32	$ 767,518.00	$ 334,883,453.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.61%	0.00%
8,3	Puerta doble en RH con batiente incluye protector de acero y manija de seguridad	m2	115.20	$ 986,466.00	$ 113,640,883.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.54%	0.00%
8,4	Puerta en vidrio templado 10 mm, con zocalo, chapa e Instalada	m2	10.80	$ 1,967,605.00	$ 21,250,134.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
8,5	zocalo de proteccion	ml	649.88	$ 55,564.00	$ 36,109,932.32			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
8,6	Puerta en aluminio con marco y chapa	m2	4.32	$ 462,350.00	$ 1,997,352.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
8,7	Puerta doble en aluminio con marco y chapa	m2	3.60	$ 924,700.00	$ 3,328,920.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
8,8	Puerta Antipanico incluye accesorios	m2	13.20	$ 1,235,450.00	$ 16,307,940.00	4.35%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
8,9	Ventana aluminio tipo celosia o similar, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	127.21	$ 468,520.00	$ 59,600,429.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.29%	0.00%
8.10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ml	79.161794614264	$ 796,520.00	$ 63,053,952.65			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.30%	0.00%
8.11	Suministro e instalación de lamina en acero inoxidable pintada para fachada incluye accerios de anclaje	m2	57.3090650320641	$ 283,480.00	$ 16,245,973.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 907,320,040.28**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9,1	Sanitario discapacitados incluye griferia antivandalica	und	29.00	$ 1,654,305.00	$ 47,974,845.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.23%	0.00%
9,2	Lavamanos pedestal con griferia cromada	und	57.00	$ 299,325.00	$ 17,061,525.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
9,3	lavamanos de empotrar	und	26.00	$ 566,382.00	$ 14,725,932.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
9,4	Sanitario ecoclean instalado	und	28.00	$ 485,767.00	$ 13,601,476.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%

9,5	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada) con registro o valvula	und	25.00	$ 115,483.00	$ 2,887,075.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
9,6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridero y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	19.00	$ 260,685.00	$ 4,953,015.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
9,7	Lavaplatos acero inoxidable de sobreponer doble grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	10.00	$ 260,678.00	$ 2,606,780.00	0.62%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
9,8	Suministro e instalacion de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable L=1.5 mts	und	58.00	$ 273,940.00	$ 15,888,520.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
9,9	pasamanos en acero inoxidable cal.18 2" incluye soportes	und	25.00	$ 204,701.00	$ 5,117,525.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
9,10	Espejo 5 mm. Suministro e instal.	m2	75.60	$ 58,733.00	$ 4,440,214.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 129,256,907.80**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
10	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**													
10,1	Tubo presión RDE 21 PVC 1/2"	ml	309.00	$ 15,303.00	$ 4,728,627.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
10,2	Tubo presión RDE 21 PVC 3/4"	ml	139.00	$ 22,354.00	$ 3,107,206.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,3	Tubo presión RDE 21 PVC 1"	ml	299.00	$ 23,736.00	$ 7,097,064.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
10,4	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/4"	ml	159.00	$ 25,126.00	$ 3,995,034.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
10,5	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/2"	ml	109.20	$ 28,226.00	$ 3,082,279.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,6	Tubo presión RDE 21 PVC 2"	ml	42.00	$ 35,103.00	$ 1,474,326.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,7	Tubo presión RDE 21 PVC 2 1/2"	ml	25.00	$ 49,267.00	$ 1,231,675.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,8	Tubo presión RDE 21 PVC 3"	ml	47.00	$ 38,624.00	$ 1,815,328.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,9	Válvula de bola PVC 3/4" roscada	und	29.00	$ 22,081.00	$ 640,349.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,10	Válvula de bola PVC 1" roscada	und	62.00	$ 37,963.00	$ 2,353,706.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,11	Válvula de bola PVC 1 1/4" roscada	und	5.00	$ 42,686.00	$ 213,430.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,12	Válvula de bola PVC 3" roscada	und	3.00	$ 54,332.00	$ 162,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,13	suministro e instalacion de llave terminal (cuartos aseo)	und	45.00	$ 26,773.00	$ 1,204,785.00	0.20%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,14	suministro e instalacion de llave de paso	und	26.00	$ 22,737.00	$ 591,162.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,15	Camara de registro para medidor, diametro 1 1/2" (incluye caja en concreto, tapa metalica, registro de bola, filtro, medidor y acoples)	und	1.00	$ 536,449.00	$ 536,449.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,16	Punto hidráulico	und	285.00	$ 36,722.00	$ 10,465,770.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 42,700,186.20**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
11	**REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS**													
11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	300.50	$ 65,105.00	$ 19,564,052.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
11,2	aguas lluvias 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	$ 96,814.00	$ 1,549,024.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
11,3	aguas lluvias 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	$ 120,816.00	$ 1,933,056.00	0.11%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 23,046,132.50**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**													
	AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES													
12,1	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	262.15	$ 30,792.00	$ 8,072,122.80		106.33	$ 3,274,113.36		$ 0.00	106.33	$ 3,274,113.36	0.04%	0.02%
12,2	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	11.00	$ 50,310.00	$ 553,410.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,3	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	532.50	$ 77,689.00	$ 41,369,392.50		327.82	$ 25,468,007.98		$ 0.00	327.82	$ 25,468,007.98	0.20%	0.12%
12,4	Tuberia 6" A.N. (Incluye accesorios)	ml	49.50	$ 83,088.00	$ 4,112,856.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
12,5	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	82.00	$ 28,103.00	$ 2,304,446.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
12,6	sifon Sanitario PVC 3" 180° Suministro e Instal.	und	6.00	$ 32,697.00	$ 196,182.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%

12,7	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	$ 584,753.00	$ 3,508,518.00		6	$ 3,508,518.00		$ 0.00	6	$ 3,508,518.00	0.02%	0.02%
12,8	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	$ 669,407.00	$ 2,008,221.00		3	$ 2,008,221.00		$ 0.00	3	$ 2,008,221.00	0.01%	0.01%
12,9	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	$ 809,267.00	$ 809,267.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,10	Rejilla sifon	und	82.00	$ 24,127.00	$ 1,978,414.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS					0.47%								
12,11	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	148.00	$ 30,792.00	$ 4,557,216.00		109.32	$ 3,366,181.44		$ 0.00	109.32	$ 3,366,181.44	0.02%	0.02%
12,12	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	150.00	$ 50,310.00	$ 7,546,500.00		113.96	$ 5,733,327.60		$ 0.00	113.96	$ 5,733,327.60	0.04%	0.03%
12,13	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	56.50	$ 77,689.00	$ 4,389,428.50		53.39	$ 4,147,815.71		$ 0.00	53.39	$ 4,147,815.71	0.02%	0.02%
12,14	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	11.00	$ 28,103.00	$ 309,133.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,15	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	$ 584,752.00	$ 3,508,512.00		3	$ 1,754,256.00		$ 0.00	3	$ 1,754,256.00	0.02%	0.01%
12,16	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	$ 669,412.00	$ 2,008,236.00		1	$ 669,412.00		$ 0.00	1	$ 669,412.00	0.01%	0.00%
12,17	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	$ 809,272.00	$ 809,272.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,18	Rejilla sifon	und	11.00	$ 24,127.00	$ 265,397.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,19	tuberia ventilacion d=2"	ml	177.50	$ 39,790.00	$ 7,062,725.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
12,20	tuberia ventilacion d=3"	ml	42.00	$ 49,360.00	$ 2,073,120.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 97,442,368.80**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 49,929,853.09**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 49,929,853.09**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.24%**
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
	RED DE MEDIA TENSION													
13,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG.	und	1.00	$ 3,080,269.00	$ 3,080,269.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,2	Estructura de paso NC510	und	1.00	$ 679,537.00	$ 679,537.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,3	Estructura NC 730	und	1.00	$ 2,532,145.00	$ 2,532,145.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,4	Bajante de media Tension en Tubo IMC de 4"	und	1.00	$ 2,538,279.00	$ 2,538,279.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,5	Caja de paso CS 275	und	3.00	$ 1,789,897.00	$ 5,369,691.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,6	Canalizacion Subterranea de 2x4"; incluye excavacion	ml	19.00	$ 237,485.00	$ 4,512,215.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,7	CTS518-2 Celda para transformador tipo seco (Nivel 2) de 225 KVA	und	1.00	$ 7,794,891.00	$ 7,794,891.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,8	Instalacion transformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	$ 8,965,230.00	$ 8,965,230.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,9	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG COBRE	ml	45.00	$ 403,588.00	$ 18,161,460.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,10	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	$ 1,335,101.00	$ 1,335,101.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,11	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	$ 753,826.00	$ 753,826.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,12	Malla de puesta a tierra de la subestaciòn conformada por 8 varillas de cobre de 2.44m; 50m de cable desnudo 2/0, Soldadura exotermina y caja de inspeccion para SPT	und	1.00	$ 7,553,032.00	$ 7,553,032.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	TABLEROS DE DISTRIBUCION													
13,13	Tablero General de medida semidirecta en Baja Tension según Norma AE 319, con totalizador de 630A, 3 transformadores de corriente tipo barra pasante de 600/5 A, Calibrados y homologados, Bloque de pruebas y Medidor trifasico electronico de 220V; 10A.	und	1.00	$ 12,522,824.00	$ 12,522,824.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%

13,14	Tablero de Distribucion General del Sistema Normal. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con Barraje 3F+N+T de 800Amp, totallizador de 630Amp. Protecciones según diagrama unifilar. DPS calse I, II Elementos de Medida.	und	1.00	$ 31,239,059.00	$ 31,239,059.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,15	instalacion planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	$ 24,560,229.00	$ 24,560,229.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
13,16	Tablero de Distribucion General del Sistema Emergenca Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	$ 21,476,059.00	$ 21,476,059.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,17	Transferencia automatica motorizada de 600A-220 Vac	und	1.00	$ 23,637,686.00	$ 23,637,686.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,18	Transferencia automatica motorizada de 200A-220 Vac	und	1.00	$ 10,704,140.00	$ 10,704,140.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,19	Transferencia automatica motorizada de 100A-220 Vac	und	2.00	$ 4,967,946.00	$ 9,935,892.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,20	Tablero de Distribucion General Sistema Normal con suplencia Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	$ 23,629,289.00	$ 23,629,289.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,21	Tablero de Distribucion del Sistema Vital que contiene Totalizador de 3x100A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	2.00	$ 7,667,146.00	$ 15,334,292.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
13,22	Tablero de Distribucion del Sistema Critico que contiene Totalizador de 3x80A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar.	und	2.00	$ 7,989,135.00	$ 15,978,270.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
13,23	Tablero de Distribucion del Sistema Regulado que contiene Totalizador de 3x50A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	1.00	$ 4,668,036.00	$ 4,668,036.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,24	Tablero de Aire Acondicionado Central con totalizador de 500A; 2 protecciones de 260A, 2 de 63A y 4 de 32A	und	1.00	$ 24,046,534.00	$ 24,046,534.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
13,25	Tablero de Aire Acondicionado TAA1 y TAA2 ycompresores TCMP con totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A	und	3.00	$ 5,315,900.00	$ 15,947,700.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
13,26	Tablero de Ascensores 1 con Totalizador de 100A, 2 de 3x63A y 3x10A	und	1.00	$ 3,276,271.00	$ 3,276,271.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,27	Tablero de Ascensores 2 con 1 taco de 3x63A y 3x10A	und	1.00	$ 1,516,287.00	$ 1,516,287.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,28	Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA trifasica de 50A	und	1.00	$ 1,749,894.00	$ 1,749,894.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,29	Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 2,772,480.00	$ 5,544,960.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,30	instalacion UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 1,122,481.00	$ 2,244,962.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,31	Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	$ 682,481.00	$ 2,047,443.00	7.91%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,32	instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 554,496.00	$ 1,108,992.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,33	instalacion tablero Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	$ 654,896.00	$ 1,309,792.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS														
13,34	Caja de paso CS 275	und	1.00	$ 1,789,897.00	$ 1,789,897.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,35	Caja de Inspeccion CS 274	und	4.00	$ 1,633,489.00	$ 6,533,956.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

13,36	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+20ø2"; incluye excavacion	ml	20.00	$ 906,938.00	$ 18,138,760.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,37	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+12ø2"; incluye excavacion	ml	3.15	$ 635,105.00	$ 2,000,580.75		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,38	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+5ø2"; incluye excavacion	ml	5.50	$ 444,519.00	$ 2,444,854.50		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,39	Canalizacion Subterranea de 4x2"; incluye excavacion	ml	10.30	$ 280,256.00	$ 2,886,636.80		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,40	Canalizacion Subterranea de 2x4"8x2"; incluye excavacion	ml	20.53	$ 520,829.00	$ 10,692,619.37		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,41	Canalizacion Subterranea de 1x1"; incluye excavacion	ml	89.42	$ 39,719.00	$ 3,551,672.98		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,42	Canalizacion Subterranea de 1x2"; incluye excavacion	ml	44.16	$ 58,669.00	$ 2,590,823.04		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,43	Acometida Parcial en 2(3X250+1X250N)+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para TAAC	ml	167.35	$ 2,026,175.00	$ 339,080,386.25		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.63%	0.00%
13,44	Acometida Parcial en 3X250+1X250N+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para Banco de reactiva	ml	12.00	$ 1,039,597.00	$ 12,475,164.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,45	Acometida Parcial en 3X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	246.04	$ 337,699.00	$ 83,087,461.96		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.40%	0.00%
13,46	Acometida Parcial en 2X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	111.68	$ 273,916.00	$ 30,590,938.88		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,47	Acometida Parcial en 3X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	110.84	$ 201,526.00	$ 22,337,141.84		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,48	Acometida Parcial en 2X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	170.61	$ 132,156.00	$ 22,547,135.16		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,49	Acometida Parcial en 2X6+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	184.35	$ 121,579.00	$ 22,413,088.65		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,50	Acometida Parcial en 2X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	203.15	$ 64,403.00	$ 13,083,469.45		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,51	Acometida Parcial en 3X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	232.94	$ 88,000.00	$ 20,498,720.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,52	Tablero de 18 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	4.00	$ 1,085,293.00	$ 4,341,172.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,53	Tablero de 18 Circuitos bifasico	und	2.00	$ 743,874.00	$ 1,487,748.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,54	Tablero de 12 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	1.00	$ 879,174.00	$ 879,174.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,55	Tablero de 12 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	2.00	$ 571,515.00	$ 1,143,030.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,56	Tablero de 8 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	11.00	$ 330,878.00	$ 3,639,658.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,57	Interruptor Industrial 3x100A	und	5.00	$ 224,196.00	$ 1,120,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,58	Interruptor Industrial 3x80A	und	4.00	$ 224,196.00	$ 896,784.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,59	Interruptor enchufable 1x15A	und	90.00	$ 28,982.00	$ 2,608,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,60	Interruptor enchufable 1x20A	und	92.00	$ 28,982.00	$ 2,666,344.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	INSTALACIONES INTERNAS												
13,61	Salidas iluminación interior a 110v en tuberia PVC SCH40	und	482.00	$ 257,078.00	$ 123,911,596.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.59%	0.00%
13,62	Salidas iluminación de evacuacion y emergencia a 110v en tuberia PVC SCH40	und	140.00	$ 369,215.00	$ 51,690,100.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.25%	0.00%
13,63	Lámpara 60x60 tipo led de 53 W Mx-120Vac	und	172.00	$ 212,048.00	$ 36,472,256.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
13,64	Lámpara redonda de 8" tipo led de 24 W Mx- 120Vac	und	276.00	$ 110,073.00	$ 30,380,148.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,65	Lámpara aplique en pared tipo tortuga con bombillo LED de 12W- 120Vac	und	6.00	$ 116,673.00	$ 700,038.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,66	Lámpara de Evacuación Rectangular "SALIDA" Verde 120-130V	und	21.00	$ 230,523.00	$ 4,840,983.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,67	Lámpara de Emergencia R1LED 2x1,6W Unv.	und	87.00	$ 209,073.00	$ 18,189,351.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,68	Lámpara Rectangular Led 50W hermetica	und	27.00	$ 309,997.00	$ 8,369,919.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,69	Salida toma 120 V normal	und	565.00	$ 229,131.00	$ 129,459,015.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.62%	0.00%
13,70	Salida toma 120 V normal grado hospitalario	und	58.00	$ 230,781.00	$ 13,385,298.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%

13,71	Salida toma 120 V normal Naranja grado hospitalario	und	160.00	$ 256,356.00	$ 41,016,960.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
13,72	Salida toma 220 V A.A.	und	36.00	$ 382,438.00	$ 13,767,768.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
13,73	Salida de TV en Tuberia EMT de 3/4" y Cable Coaxial	und	16.00	$ 368,274.00	$ 5,892,384.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,74	Lámpara Highby de 100W	und	11.00	$ 426,646.00	$ 4,693,106.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,75	lampara wall pack LED de 100W	und	15.00	$ 443,247.00	$ 6,648,705.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRATRAYOS (SIPRA)												
13,76	Cable de cobre desnudo 2/0	und	215.26	$ 94,814.00	$ 20,409,661.64		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,77	Caja de inspeccion AP280	und	4.00	$ 244,226.00	$ 976,904.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,78	Varilla de cobre 2.44mx5/8"	und	4.00	$ 381,178.00	$ 1,524,712.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,79	Punto de soldadura exotermica	und	8.00	$ 155,428.00	$ 1,243,424.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,80	Alambron de aluminio de 8mm con accesorios de unio	ml	352.00	$ 66,690.00	$ 23,474,880.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,81	Punta captadora de 1.2m con base	und	42.00	$ 297,860.00	$ 12,510,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,82	Trancision Alambron- cable de cobre	und	4.00	$ 1,866,119.00	$ 7,464,476.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS												
13,83	Rack de telecomunicaciones, equipado	und	1.00	$ 28,965,499.00	$ 28,965,499.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
13,84	Salida de voz y datos aparateada C	und	37.00	$ 1,399,278.00	$ 51,773,286.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.25%	0.00%
13,85	Salida de datos aparateada categoria 6	und	23.00	$ 1,332,768.00	$ 30,653,664.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,86	Cable UTP categoria 6	ml	3,127.00	$ 9,711.00	$ 30,366,297.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 1,650,061,414.27**	**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
14						**INSTALACIONES ESPECIALES**							
	INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES												
14,1	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1/2" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	350.00	$ 78,890.00	$ 27,611,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
14,2	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 3/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	420.00	$ 90,903.00	$ 38,179,260.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
14,3	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	120.00	$ 176,295.00	$ 21,155,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
14,4	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1-1/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	90.00	$ 196,286.00	$ 17,665,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
14,5	Toma Tipo Amico, Chemetrón, Gentec ó similar, Quick Connect para Oxígeno	ml	53.00	$ 539,969.00	$ 28,618,357.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
14,6	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	12.00	$ 183,713.00	$ 2,204,556.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
14,7	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	3.00	$ 111,510.00	$ 334,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
14,8	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x3/4". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	5.00	$ 2,514,455.00	$ 12,572,275.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
14,9	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x1". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	1.00	$ 2,322,489.00	$ 2,322,489.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

14,10	PANEL DE CABECERA TROQUELADO COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE, PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO MEDICO PUNTO ELECTRICO REGULADO, NORMAL Y EMERGENCIA, DE 1,9MTS, CON TOMA DE OXIGENO Y VACIO, ATRIL SE SERVICIOS INTEGRADO DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE, CANASTA DE ACCESORIOS TROQUELADA CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	27.00	$ 7,899,998.00	$ 213,299,946.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.02%	0.00%
14,11	COLUMNA DE SERVICIOS PISO TECHO, INCLUYE SEIS TOMASDE OXIGENO,2DE VACIO 2 DE AIRE TIPO CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS, DOS DE ELLAS REGULADAS, CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	2.00	$ 29,899,997.00	$ 59,799,994.00	3.25%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.29%	0.00%
14,12	Alarma de Área para DOS señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	3.00	$ 8,899,998.00	$ 26,699,994.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
14,13	Central para Oxigeno, Control Automatico Amico o similar microcontrolado, Estructura para Manifold 3x3 con soportes,ángulos, colectores, válvulas de corte de alta presión por cilindro y Mangueras importadas.	und	1.00	$ 53,400,000.00	$ 53,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.26%	0.00%
14,14	Alarma de Maestra para central de Gases de 10 señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	1.00	$ 4,565,801.00	$ 4,565,801.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
14,15	Sistema de Vacio Duplex de 3 hp según cumplimiento de Norma NFPA 99, este sistema cuenta con Dos Bombas de Anillo liquido de 3 HP, con un Tanque Acomulador de 100 Galones, Tablero Electrico con selectores de Bomba Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo, Acople Flexible a la Unidad de Vacio y Drenaje Tanque Acumulador	und	1.00	$ 116,299,997.00	$ 116,299,997.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.56%	0.00%
LLAMADO DE ENFERMERIA													
14,16	CONSOLA de llamado de enfermeria, incluye display a bajo voltaje, comunicación bidireccional, incluye unidad master de control y receptor de meson	und	2.00	$ 12,999,998.00	$ 25,999,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
14,17	pulsador para llamado de enfermeria con altavoz, senaluminosa y a bajo voltaje	und	24.00	$ 320,000.00	$ 7,680,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
14,18	DISPLAY DOBLE SENTIDOS VISUALIZADOR TIPO LED	und	2.00	$ 4,799,998.00	$ 9,599,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
14,19	TABLERO PARA USO EN BAÑOS	und	21.00	$ 179,999.00	$ 3,779,979.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
14,20	Cable UTP categoria 6. Suministro e instalación.	ml	647.00	$ 9,042.00	$ 5,850,174.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

TOTAL CAPITULO					**$ 677,639,984.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
15	**RED CONTRAINCENDIOS**													
15,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	565.04	$ 87,539.00	$ 49,463,036.56			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
15,2	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	212.97	$ 113,768.00	$ 24,229,170.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
15,3	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	58.28	$ 151,691.00	$ 8,840,551.48			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
15,4	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	82.46	$ 189,614.00	$ 15,635,570.44			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
15,5	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	207.17	$ 227,542.00	$ 47,139,876.14			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.23%	0.00%
15,6	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	101.52	$ 262,847.00	$ 26,684,227.44			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
15,7	SOPORTE TIPO PERA 1"	und	141.00	$ 36,026.00	$ 5,079,666.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
15,8	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	und	46.00	$ 38,540.00	$ 1,772,840.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,9	SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13.00	$ 41,520.00	$ 539,760.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
15,10	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	und	18.00	$ 45,650.00	$ 821,700.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
15,11	SOPORTE TIPO PERA 3"	und	45.00	$ 48,752.00	$ 2,193,840.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,12	SOPORTE TIPO PERA 4"	und	22.00	$ 54,560.00	$ 1,200,320.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,13	STRAP 1"x1/2"	und	120.00	$ 92,731.00	$ 11,127,720.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
15,14	STRAP 1 1/2"x1/2"	und	170.00	$ 77,666.00	$ 13,203,220.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
15,15	ROCIADOR PENDENT - ACCION SUMINISTRO E INSTALACION	und	290.00	$ 289,021.00	$ 83,816,090.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.40%	0.00%
15,16	SOTACION DE CONTROL PARA RED	und	2.00	$ 4,683,605.00	$ 9,367,210.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
15,17	EXTINTOR CLASE BC SEGUN NTC	und	26.00	$ 186,940.00	$ 4,860,440.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
15,18		und	12.00	$ 165,840.00	$ 1,990,080.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,19	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	und	1.00	$ 1,425,620.00	$ 1,425,620.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,20	CUARTO DE BOMBAS RED INCENDIO	und	1.00	$ 6,545,230.00	$ 6,545,230.00	1.89%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
15,21	ESTACION DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL INDICADORA	und	1.00	$ 5,489,056.00	$ 5,489,056.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
	DETECCIÓN DE INCENDIOS													
15,22	Detector o sensor de humo certificado UL/FM. Suministro e Instal. O similar	und	86.00	$ 346,501.00	$ 29,799,086.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
15,23	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	11.00	$ 1,186,000.00	$ 13,046,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
15,24	Cableado de incendios (3x22 awg-3x16 awg) para dispositivos de entrada o salida . Incluye tuberia conduit EMT Ø 1" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	ml	845.00	$ 26,109.00	$ 22,062,105.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
15,25	Alarma automatica visual y sonora	und	19.00	$ 430,738.00	$ 8,184,022.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 394,516,438.02**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
16	**RED DE VENTILACION MECANICA**													
	CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS													
16,1	Conductos INTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion) 20 mm	m2	754.00	$ 220,000.00	$ 165,880,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%
16,2	Conductos EXTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)30 mm	m2	120.00	$ 280,000.00	$ 33,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.16%	0.00%
16,3	Conductos metalicos en lamina galvanizada calibre 24 (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)	m2	280.00	$ 150,000.00	$ 42,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
16,4	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 6"x6"	und	11.00	$ 125,000.00	$ 1,375,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,5	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 9"x9"	und	9.00	$ 186,000.00	$ 1,674,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,6	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 12"x12"	und	22.00	$ 284,000.00	$ 6,248,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

16,7	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 15"x12"	und	5.00	$ 340,000.00	$ 1,700,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,8	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 15"x9"	und	2.00	$ 270,000.00	$ 540,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,9	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 12"x9"	und	2.00	$ 230,000.00	$ 460,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,10	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 9"x6"	und	1.00	$ 145,000.00	$ 145,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,11	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 16"x16"	und	3.00	$ 420,000.00	$ 1,260,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,12	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 22"x22"	und	1.00	$ 740,000.00	$ 740,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,13	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 14"x14"	und	5.00	$ 340,000.00	$ 1,700,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,14	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 8"x8"	und	3.00	$ 150,000.00	$ 450,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,15	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 6"x6"	und	48.00	$ 110,000.00	$ 5,280,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,16	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 8"x8"	und	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,17	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 12"x12"	und	7.00	$ 260,000.00	$ 1,820,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,18	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 14"x12"	und	2.00	$ 300,000.00	$ 600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,19	Rejilla tipo louver con damper de 16"X12"	und	2.00	$ 380,000.00	$ 760,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,20	Rejilla tipo louver con damper de 12"X12"	und	1.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,21	Rejilla tipo louver con damper de 26"X18"	und	1.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,22	Rejilla tipo louver con damper de 20"X10"	und	1.00	$ 420,000.00	$ 420,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,23	Rejilla tipo louver con damper de 20"X16"	und	1.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,24	Rejilla tipo louver con damper de 20"X20"	und	1.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,25	Rejilla tipo louver con damper de 30"X24"	und	1.00	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA												
16,26	Tuberias hidronica aislada termicamente de 4" de diametro	ml	14.00	$ 580,000.00	$ 8,120,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,27	Tuberias hidronica aislada termicamente de 3" de diametro	ml	55.00	$ 470,000.00	$ 25,850,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,28	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2,5" de diametro	ml	60.00	$ 432,000.00	$ 25,920,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,29	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2" de diametro	ml	95.00	$ 370,000.00	$ 35,150,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
16,30	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,5" de diametro	ml	120.00	$ 205,000.00	$ 24,600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,31	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,25" de diametro	ml	82.00	$ 180,000.00	$ 14,760,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
16,32	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1" de diametro	ml	170.00	$ 135,000.00	$ 22,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
16,33	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,75" de diametro	ml	230.00	$ 118,000.00	$ 27,140,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
16,34	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,5" de diametro	ml	40.00	$ 105,000.00	$ 4,200,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,35	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 4"	und	3.00	$ 495,000.00	$ 1,485,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,36	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 3"	und	7.00	$ 250,000.00	$ 1,750,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,37	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2,5"	und	10.00	$ 180,000.00	$ 1,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,38	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2"	und	6.00	$ 138,000.00	$ 828,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%

16,39	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,5"	und	16.00	$ 95,000.00	$ 1,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,40	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,25"	und	18.00	$ 67,000.00	$ 1,206,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,41	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1"	und	18.00	$ 54,000.00	$ 972,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,42	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 4"	und	2.00	$ 420,000.00	$ 840,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,43	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 3"	und	12.00	$ 210,000.00	$ 2,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,44	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2,5"	und	8.00	$ 200,000.00	$ 1,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,45	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2"	und	18.00	$ 158,000.00	$ 2,844,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,46	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1,5"	und	12.00	$ 83,000.00	$ 996,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,47	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1"	und	40.00	$ 47,000.00	$ 1,880,000.00	3.90%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,48	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,75"	und	94.00	$ 38,000.00	$ 3,572,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,49	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,5"	und	16.00	$ 34,000.00	$ 544,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,50	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 4"	und	2.00	$ 694,000.00	$ 1,388,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,51	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 3"	und	6.00	$ 540,000.00	$ 3,240,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,52	Tuberia hidronica Eliminador de vibracion de 3"	und	6.00	$ 1,250,000.00	$ 7,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,53	Valvula triple servcio de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	$ 4,560,000.00	$ 9,120,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,54	Codo difusor con filtro de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	$ 2,850,000.00	$ 5,700,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,55	Tanque Separador de aire tangencial de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	1.00	$ 8,500,000.00	$ 8,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,56	Vaso de expansion cerrado grundfos tipo diafragma de 48 galones	und	1.00	$ 4,950,000.00	$ 4,950,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,57	Valvula en bronce tipo bola de 2 " aislada	und	6.00	$ 380,000.00	$ 2,280,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,58	Valvula en bronce tipo bola de 1,5 " aislada	und	2.00	$ 235,000.00	$ 470,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,59	Valvula en bronce tipo bola de 1 " aislada aislada	und	18.00	$ 120,000.00	$ 2,160,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,60	Valvula en bronce tipo bola de 0,75" aislada aislada	und	46.00	$ 72,000.00	$ 3,312,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,61	Valvula en bronce tipo bola de 0,5" aislada aislada	und	8.00	$ 60,000.00	$ 480,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,62	Valvula tipo mariposa metalica de 2,5 "	und	2.00	$ 250,000.00	$ 500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,63	Valvula tipo mariposa metalica de 3 "	und	6.00	$ 290,000.00	$ 1,740,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,64	Valvula tipo mariposa metalica de 4 "	und	2.00	$ 425,000.00	$ 850,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,65	Termometros bimetalico caratula de 3" con accesorios en polipropileno (UMA-01-02-03-04-05)	und	10.00	$ 250,000.00	$ 2,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,66	Termometros de mercurio tipo columna con accesorios en polipropileno para chiller	und	4.00	$ 350,000.00	$ 1,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,67	Manometros tipo bourdon en gliserina con accesorios	und	15.00	$ 120,000.00	$ 1,800,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,68	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,5 de diametro	und	4.00	$ 1,350,000.00	$ 5,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,69	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,75 de diametro	und	23.00	$ 1,450,000.00	$ 33,350,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.16%	0.00%
16,70	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1" de diametro	und	9.00	$ 1,650,000.00	$ 14,850,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%

16,71	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1,5" de diametro	und	1.00	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,72	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2" de diametro	und	3.00	$ 2,680,000.00	$ 8,040,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,73	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2,5" de diametro	und	1.00	$ 3,270,000.00	$ 3,270,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,74	Termostato tipo ambiente digital	und	5.00	$ 420,000.00	$ 2,100,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TABLERO ELECTRICO												
16,75	Tablero electrico de potencia y control (Incluye cofre, Breiker totalizadores para chiller y unidades manejadoras y extractoras de aire, arrancadores con bimetalico ajustable y muletillas de aranque y parada.	und	1.00	$ 13,500,000.00	$ 13,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
	MONTAJE DE EQUIPOS												
16,76	Montaje arranque y pruebas de operación de enfriadores de agua	und	2.00	$ 12,500,000.00	$ 25,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,77	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades manejadoras de aire	und	5.00	$ 4,500,000.00	$ 22,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
16,78	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades interiores tipo cassete y fancoil	und	36.00	$ 550,000.00	$ 19,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
16,79	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractoras de aire	und	5.00	$ 450,000.00	$ 2,250,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,80	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractora de aire tipo plafon	und	47.00	$ 90,000.00	$ 4,230,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,81	Balanceo distribucion de aire (130 difusores y rejillas)	und	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,82	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (compacta)	und	1.00	$ 65,000,000.00	$ 65,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.31%	0.00%
16,83	Instalacion ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	$ 16,452,630.00	$ 16,452,630.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
16,84	Instalacion ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	$ 21,546,200.00	$ 21,546,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
16,85	INSTALACION BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	1.00	$ 986,520.00	$ 986,520.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,86	Instalacion de equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	$ 2,145,620.00	$ 2,145,620.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,87	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 1,654,890.00	$ 1,654,890.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,88	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 2,054,200.00	$ 2,054,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

TOTAL CAPITULO				**$ 814,139,060.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**		
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 14,341,455,487.00**	**68.76%**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR**	**$ 5,239,979,186.00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	**$ 547,589,195.00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	**$ 5,787,568,381.00**	**%TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS**	**27.75%**		
A,I,U,						**A.I.U.**		**A.I.U.**		**A.I.U.**		**A.I.U.**			
ADMINISTRACION		**23%**		$ 3,298,534,762.00	15.82%	**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 1,205,195,213.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 125,945,515.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 1,331,140,728.00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	6.38%		
IMPREVISTOS		**2%**		$ 286,829,110.00	1.38%	**IMPREVISTOS ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 104,799,584.00	**IMPREVISTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	$ 10,951,784.00	**IMPREVISTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	$ 115,751,368.00	**%TOTAL EJECUTADO IMPREVISTOS**	0.55%		
UTILIDAD		**5%**		$ 717,072,774.00	3.44%	**UTILIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 261,998,959.00	**UTILIDAD EJECUTADA PERIODO**	$ 27,379,460.00	**UTILIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	$ 289,378,419.00	**%TOTAL EJECUTADO UTILIDAD**	1.39%		
TOTAL OBRA CIVIL				**$ 18,643,892,133.00**	**89.39%**	**TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	**$ 6,811,972,942.00**	**TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA PERIODO**	**$ 711,865,954.00**	**TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA ACUMULADA**	**$ 7,523,838,896.00**	**%TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL**	**36.07%**		
17	**EQUIPOS ESPECIALES**														
17,1	Ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	$ 135,000,000.00	$ 135,000,000.00		1	$ 135,000,000.00		$ 0.00	1	$ 135,000,000.00	0.65%	0.65%	
17,2	Ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	$ 167,409,500.00	$ 167,409,500.00		1	$ 167,409,500.00		$ 0.00	1	$ 167,409,500.00	0.80%	0.80%	
17,3	BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	2.00	$ 4,356,200.00	$ 8,712,400.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%	
17,4	Equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	$ 17,176,471.00	$ 17,176,471.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%	
17,5	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 12,373,000.00	$ 12,373,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,6	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 18,611,000.00	$ 18,611,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%	
17,7	Tansformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	$ 44,210,951.00	$ 44,210,951.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.21%	0.00%	
17,8	Planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	$ 246,934,782.00	$ 246,934,782.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.18%	0.00%	
17,9	UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 10,204,381.00	$ 20,408,762.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%	
17,10	UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 6,204,381.00	$ 12,408,762.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,11	UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	$ 3,887,946.00	$ 11,663,838.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,12	UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 5,953,600.00	$ 11,907,200.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,13	Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	$ 9,031,200.00	$ 18,062,400.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%	

17,14	Enfriador de agua tipo chiller de descarga vertical de 60 TR refrigerante R-410a 220 VAC trifasico, 220 vac PH-3 R-410a.	und	2.00	$ 198,000,000.00	$ 396,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.90%	0.00%
17,15	Electrobomba tipo dual vertical en linea caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.	und	2.00	$ 35,000,000.00	$ 70,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.34%	0.00%
17,16	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 286,000 Btu/h caudal 5330 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 56,000,000.00	$ 56,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.27%	0.00%
17,17	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 167,000 Btu/h caudal 2850 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 41,500,000.00	$ 41,500,000.00	7.80%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
17,18	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 220,000 Btu/h caudal 3440 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 46,800,000.00	$ 46,800,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.22%	0.00%
17,19	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 149,000 Btu/h caudal 3780 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 44,600,000.00	$ 44,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.21%	0.00%
17,20	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 92,000 Btu/h caudal 1980 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 28,500,000.00	$ 28,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
17,21	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 8000 Btu/hr	und	4.00	$ 4,500,000.00	$ 18,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
17,22	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 15000 Btu/hr	und	15.00	$ 5,200,000.00	$ 78,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.37%	0.00%
17,23	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 20000 Btu/hr	und	6.00	$ 6,200,000.00	$ 37,200,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
17,24	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 26000 Btu/hr	und	2.00	$ 6,500,000.00	$ 13,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,25	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 30000 Btu/hr	und	1.00	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
17,26	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 15000 Btu/hr	und	8.00	$ 4,800,000.00	$ 38,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
17,27	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1260 cfm, SP 0,6 in.c.a	und	1.00	$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,28	Unidad de extraccion centrifuga de aire 2120 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,29	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1450 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,30	Unidad de extraccion centrifuga de aire 850 cfm, SP 0,4 in.c.a	und	1.00	$ 2,700,000.00	$ 2,700,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,31	Unidad de extraccion centrifuga de aire 400 cfm, SP 0,3 in.c.a	und	1.00	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,32	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 160 cfm	und	5.00	$ 450,000.00	$ 2,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,33	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 80 cfm	und	34.00	$ 290,000.00	$ 9,860,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
17,34	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 60 cfm	und	8.00	$ 190,000.00	$ 1,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,627,009,066.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 302,409,500.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 302,409,500.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**1.45%**
18	**RETIE Y RETILAP**													
18,1	Certificacion RETIE de la Red de Media Tensio; Transformador, Subestacion y Uso Final	und	1.00	$ 15,890,000.00	$ 15,890,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
18,2	Certificacion de RETILAP	und	615.00	$ 15,000.00	$ 9,225,000.00	0.12%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%

ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO			**$ 25,115,000.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
	ADMINISTRACION	**13%**	$ 211,511,178.58	1.01%	**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 39,313,235.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 0.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 39,313,235.00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	0.19%
	IVA 19% EQUIPOS + ADMON	**19%**	$ 349,318,846.47	1.67%	**IVA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	$ 64,927,319.65	**IVA EJECUTADO EN EL PERIODO**	$ 0.00	**IVA EJECUTADO ACUMULADO**	$ 64,927,319.65	**%TOTAL EJECUTADO TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.**	0.31%
	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.		**$ 2,187,839,091.05**	**10.49%**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 406,650,055.00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 406,650,055.00**	**%TOTAL EJECUTADO + I.V.A.**	**1.95%**
VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP			**$ 20,856,846,224.00**	**100.00%**	**VALOR DEL CONTRATO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 7,218,622,997.00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 711,865,954.00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 7,930,488,951.00**	**%TOTAL EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO**	**38.02%**

PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO ANTERIOR	34.61%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	3.41%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO PERIODO	38.02%

VALOR PRESENTE ACTA	$ 711,865,954.00
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ 355,932,977.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 12,926,357,273.00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 6,463,178,636.50
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 7,930,488,951.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 355,932,977.00**

VALOR NETO A PAGAR:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Se firma la presente acta los dieciséis (16) dias del mes de julio de 2025

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consorcio HDC

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal
Consorcio San Rafael

CONVENCIONES	
	Items a cobrar en la presente acta parcial.

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	UNIDAD:	m3

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
Muro eje A Tanque red contra incendios	5.46	0.25	2.30			3.14
Muro eje B Tanque red contra incendios	5.45	0.25	2.30			3.13
Muro eje 1 Tanque red contra incendios	5.05	0.25	2.30			2.90
Muro eje 2 Tanque red contra incendios	5.05	0.25	2.30			2.90

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	12.07
TOTAL ÍTEM	12.07
CANTIDAD DE OBRA	12.07

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3.10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
del eje D al eje E, entre el eje 12 y 13	3.75				1.00	3.75
del eje F al eje G, entre el eje 1 y 3	4.05				1.00	4.05
del eje F al eje G, entre el eje 3 y 4	4.05				1.00	4.05
del eje F al eje G, entre el eje 4 y 5	3.63				1.00	3.63
del eje H al eje I, entre el eje 7 y 9	3.20				2.00	6.40
del eje H al eje I, entre el eje 9 y 10	3.50				2.00	7.00
del eje H al eje I, entre el eje 10 y 11	3.57				2.00	7.14
eje K, entre el eje 2 y 3	2.15				1.00	2.15
eje K, entre el eje 3 y 4	4.05				1.00	4.05
del eje K al eje L, entre el eje 2 y 3	2.15				1.00	2.15

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	44.37
TOTAL ÍTEM	**44.37**
CANTIDAD DE OBRA	**44.37**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3.11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
del eje D al eje E, en el eje 12	5.81					5.81
del eje E al eje H, en el eje 12	7.95					7.95

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	13.76
TOTAL ÍTEM	**13.76**
CANTIDAD DE OBRA	**13.76**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 2
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
NIVEL +8.05						
eje A, entre el eje 1 y 13	40.60	1.40				56.84
eje B, entre el eje 1 y 13	40.60	1.40				56.84
eje D, entre el eje 1 y 6	16.65	1.40				23.31
eje D, entre el eje 9 y 13	16.95	1.40				23.73
eje E, entre el eje 1 y 13	40.60	1.40				56.84
eje H, entre el eje 1 y 13	40.60	1.40				56.84
eje I, entre el eje 1 y 6	16.95	1.40				23.73
eje I, entre el eje 9 y 13	16.95	1.40				23.73
eje J, entre el eje 1 y 13	40.60	1.40				56.84
eje L, entre el eje 1 y 13	40.60	1.40				56.84
del eje A al eje L, en el eje 1	52.54	1.40				73.56
del eje A al eje L, en el eje 13	52.54	1.40				73.56
del eje B al eje D, en el eje 4	5.03	1.40				7.04
del eje B al eje D, en el eje 6	5.03	1.40				7.04
del eje B al eje D, en el eje 9	5.03	1.40				7.04
del eje B al eje D, en el eje 11	5.03	1.40				7.04
del eje D al eje E, en el eje 4	8.00	1.40				11.20
del eje D al eje E, en el eje 6	8.00	1.40				11.20
del eje D al eje E, en el eje 9	8.00	1.40				11.20
del eje D al eje E, en el eje 11	8.00	1.40				11.20
del eje E al eje H, en el eje 4	8.05	1.40				11.27
del eje E al eje H, en el eje 6	8.05	1.40				11.27
del eje E al eje H, en el eje 9	8.05	1.40				11.27
del eje E al eje H, en el eje 11	8.05	1.40				11.27
del eje H al eje I, en el eje 4	7.90	1.40				11.06
del eje H al eje I, en el eje 6	7.90	1.40				11.06
del eje H al eje I, en el eje 9	7.90	1.40				11.06
SUB TOTAL						733.88
PASAN A PAGINA 2						**733.88**

OBSERVACIONES:

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	**PAGINA:**	2 2
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL	**FECHA:**	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3.17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	**UNIDAD:**	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
del eje H al eje I, en el eje 11	7.90	1.40				11.06
del eje I al eje J, en el eje 4	8.00	1.40				11.20
del eje I al eje J, en el eje 6	8.00	1.40				11.20
del eje I al eje J, en el eje 9	8.00	1.40				11.20
del eje I al eje J, en el eje 11	8.00	1.40				11.20
del eje J al eje L, en el eje 4	7.93	1.40				11.10
del eje J al eje L, en el eje 6	7.93	1.40				11.10
del eje J al eje L, en el eje 9	7.93	1.40				11.10
del eje J al eje L, en el eje 11	7.93	1.40				11.10
del eje A al eje B, en el eje 4	4.46	1.40				6.24
del eje A al eje B, en el eje 6	4.46	1.40				6.24
del eje A al eje B, en el eje 9	1.94	1.40				2.72

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	115.46
VIENE PAGINA 1	733.88
TOTAL ÍTEM	**849.34**
CANTIDAD DE OBRA	**849.34**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 6
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	UNIDAD:	Kg

PLANO Y/O ESQUEMA

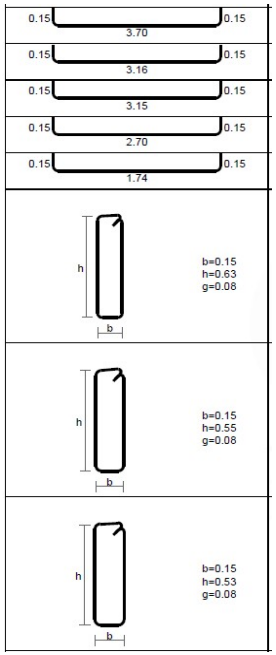

CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso nominal	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Cantidad	Producto	Long. (m)			
MUROS DE CONCRETO						
[52 En M-2].[52 En M-3].	104.00	#3	4.00	0.56	232.96	232.96
[104 En M-3].	104.00	#3	3.46	0.56	201.51	201.51
[104 En M-2].	104.00	#3	3.45	0.56	200.93	200.93
[56 En M-1].	56.00	#3	3.00	0.56	94.08	94.08
[56 En M-1].	56.00	#3	2.04	0.56	63.97	63.97
[52 En M-2].	52.00	#3	1.72	0.56	50.09	50.09
[52 En M-2].[52 En M-3].	104.00	#3	1.56	0.56	90.85	90.85
[56 En M-1]	56.00	#3	1.52	0.56	47.67	47.67

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	982.06
PASA PAGINA 2	982.06

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	2 6
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	UNIDAD:	Kg

PLANO Y/O ESQUEMA

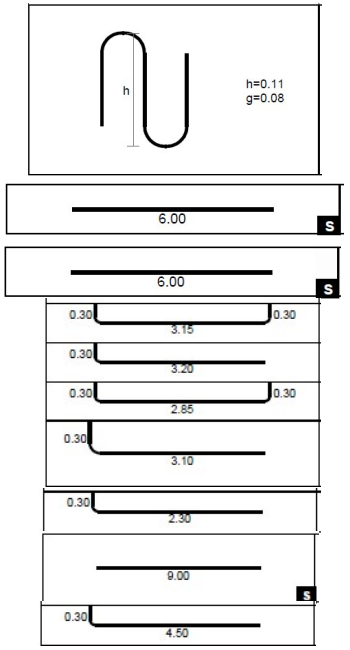

CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso nominal	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Cantidad	Producto	Long. (m)			
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES						
[14868 En COLUMNETA].[8467 En VIGA CINT A].	23,335.00	#2	0.27	0.25	1,575.11	1,575.11
[1410 En COLUMNETA].[847 En VIGA CINTA].	173.00000	#3	6.00	0.56	581.28	581.28
[2540 En GRAFIL].	2,540.00	4,0M	6.00	0.099	1,508.76	1,508.76
VIGAS AEREAS N+4.03						
[4 En VTA-8].[4 En VTA-9].	8.00	#6	3.75	2.25	67.50	67.50
[4 En VG-B].[2 En VG-D].	6.00	#6	3.50	2.25	47.25	47.25
[4 En VTA-29].	4.00	#6	3.45	2.25	31.05	31.05
[4 En VG-A].[4 En VG-L].[2 En VTA-12].[2 En VTA-23].[4 En VTA-24].[4 En VTA-25].[2 En VTA-26].	22.00	#6	3.40	2.25	168.30	168.30
[2 En VTA-27].	2.00	#6	2.60	2.25	11.70	11.70
[20 En VG-1].[24 En VG-6].[24 En VG-9].[20 En VG-13].[8 En VG-B].[12 En VG-E].[8 En VG-H].[6 En VG-J].[8 En VG-L].	130.00	#7	9.00	3.06	3,580.20	3,580.20
[4 En VG-1].[4 En VG-13].[3 En VTA-5].	11.00	#6	4.80	2.25	118.80	118.80

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	7,689.95
VIENE PAGINA 1	982.06
PASA PAGINA 3	**8,672.01**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	3 6
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL			FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	UNIDAD:	Kg

PLANO Y/O ESQUEMA

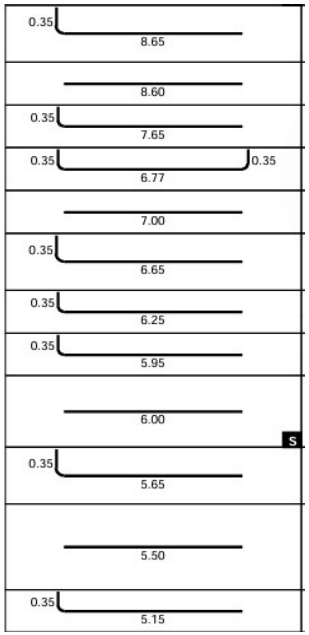

CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso nominal	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Cantidad	Producto	Long. (m)			
[4 En VG-4].[4 En VG-6].[4 En VG-9].[3 En VTA-5].	15.00	#7	9.00	3.06	413.10	413.10
[4 En VG-I].	4.00	#7	8.60	3.06	105.26	105.26
[4 En VG-D].[2 En VG-E].[2 En VG-H].	8.00	#7	8.00	3.06	195.84	195.84
[3 En VTA-1].	3.00	#7	7.47	3.06	68.57	68.57
[4 En VG-6].[4 En VG-9].[2 En VG-J].	10.00	#7	7.00	3.06	214.20	214.20
[4 En VG-4].[2 En VG-D].[2 En VG-D1].[2 En VG-E].[2 En VG-H].[2 En VG-I].[2 En VG-J].	16.00	#7	7.00	3.06	342.72	342.72
[3 En VTA-4].	3.00	#7	6.60	3.06	60.59	60.59
[4 En VG-6].[4 En VG-9].	8.00	#7	6.30	3.06	154.22	154.22
2 En VG-6].[2 En VG-9].[2 En VG-D].[2 En VG-D1].[6 En VG-E].[6 En VG-H].[6 En VG I].[5 En VG-J].	31.00	#7	6.00	3.06	569.16	569.16
[4 En VG-E].[4 En VG-H].[4 En VG-J].[2 En VTA-4].[2 En VTA-5].[2 En VTA-11].	18.00	#7	6.00	3.06	330.48	330.48
[2 En VG-D].[2 En VTA-12].[1 En VTA-15].[1 En VTA-16].[1 En VTA-18].[1 En VTA-20].[1 En VTA-21].[2 En VTA-23].[4 En VTA-24]. [4 En VTA-25].	19.00	#7	5.50	3.06	319.77	319.77
[4 En VG-4].	4.00	#7	5.50	3.06	67.32	67.32

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	2,841.23
VIENE PAGINA 2	8,672.01
PASA PAGINA 4	**11,513.24**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	4 6
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	UNIDAD:	Kg

PLANO Y/O ESQUEMA

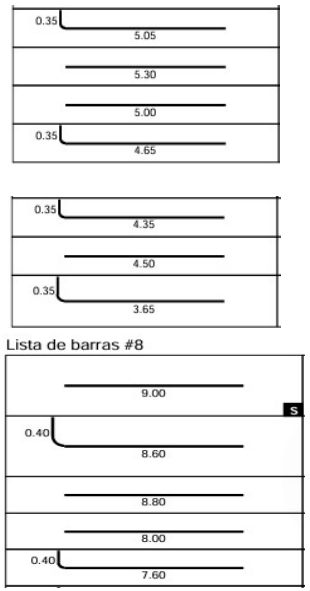

CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso nominal	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Cantidad	Producto	Long. (m)			
[4 En VG-4].	4.00	#7	5.40	3.06	66.10	66.10
2 En VG-D1].	2.00	#7	5.30	3.06	32.44	32.44
[3 En VTA-10].[3 En VTA-11].[1 En VTA-17]	7.00	#7	5.00	3.06	107.10	107.10
[4 En VG-D1].	4.00	#7	5.00	3.06	61.20	61.20
[4 En VG-6].[4 En VG-9].	8.00	#7	4.70	3.06	115.06	115.06
[2 En VG-E].[2 En VG-H].	4.00	#7	4.50	3.06	55.08	55.08
[2 En VG-E].[2 En VG-H].[2 En VG-I].[5 En VG-J].	11.00	#7	4.00	3.06	134.64	134.64
[32 En VG-4].[4 En VG-6].[4 En VG-9].[28 En VG-11].[20 En VG-E].[20 En VG-H].[28 E n VG-I].[32 En VG-J].	168.00	#8	9.00	4.00	6,048.00	6,048.00
[4 En VG-6].[4 En VG-9].[8 En VG-11].[4 E n VG-D].[4 En VG-E].[4 En VG-H].[4 En VG I].[4 En VG-J].	36.00	#8	9.00	4.00	1,296.00	1,296.00
[4 En VG-H].	4.00	#8	8.80	4.00	140.80	140.80
[4 En VG-D].[4 En VG-D1].	8.00	#8	8.00	4.00	256.00	256.00
[8 En VG-D1].	8.00	#8	8.00	4.00	256.00	256.00

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	8,568.42
VIENE PAGINA 3	11,513.24
PASA PAGINA 5	**20,081.66**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	5 6
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	UNIDAD:	Kg

PLANO Y/O ESQUEMA

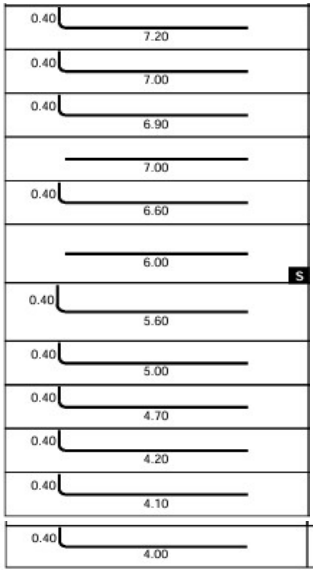


CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso nominal	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Cantidad	Producto	Long. (m)			
[4 En VG-H].[4 En VG-I].[4 En VG-J].	12.00	#8	7.60	4.00	364.80	364.80
[4 En VG-E].	4.00	#8	7.40	4.00	118.40	118.40
[4 En VG-11].	4.00	#8	7.30	4.00	116.80	116.80
[4 En VG-4].[4 En VG-11].[4 En VG-D1].	12.00	#8	7.00	4.00	336.00	336.00
[2 En VG-11].[3 En VTA-10].[3 En VTA-11].	8.00	#8	7.00	4.00	224.00	224.00
[10 En VG-4].[8 En VG-11].[4 En VG-D].[8 En VG-J].	30.00	#8	6.00	4.00	720.00	720.00
[4 En VG-D].[4 En VG-D1].[4 En VG-I].[4 En VG-J].	16.00	#8	6.00	4.00	384.00	384.00
[4 En VG-11].	4.00	#8	5.40	4.00	86.40	86.40
[4 En VG-D].	4.00	#8	5.10	4.00	81.60	81.60
[4 En VG-H].	4.00	#8	4.60	4.00	73.60	73.60
[4 En VG-I].[4 En VG-J].	8.00	#8	4.50	4.00	144.00	144.00
[4 En VG-E].	4.00	#8	4.40	4.00	70.40	70.40

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	2,720.00
VIENE PAGINA 4	20,081.66
PASA PAGINA 6	**22,801.66**



ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	**PAGINA:**	6 6
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL	**FECHA:**	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	**UNIDAD:**	Kg

PLANO Y/O ESQUEMA

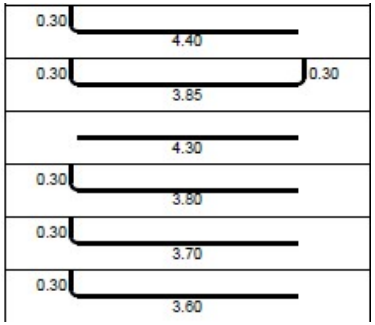

CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso nominal	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Cantidad	Producto	Long. (m)			
[4 En VG-1].[5 En VG-13].	9.00	#6	4.70	2.25	95.18	95.18
[7 En VTA-3].	7.00	#6	4.45	2.25	70.09	70.09
[6 En VG-I].	6.00	#6	4.30	2.25	58.05	58.05
[2 En VTA-16].[2 En VTA-18].[2 En VTA-21]	6.00	#6	4.10	2.25	55.35	55.35
[2 En VG-E].[2 En VG-H].[2 En VG-I].	6.00	#6	4.00	2.25	54.00	54.00
[2 En VTA-27].	2.00	#6	3.90	2.25	17.55	17.55
[1 En VTA-27].	1.00	#6	2.30	2.25	5.18	5.18

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	355.40
VIENE PAGINA 5	22,801.66
TOTAL ÍTEM	**23,157.06**
CANTIDAD DE OBRA	**23,157.06**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.19	Malla electrosoldada	UNIDAD:	kg

PLANO Y/O ESQUEMA





CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso nominal		TOTAL
Lugar /Elemento	Cantidad	Producto	Long. (m)			
[131 En ENTREPISO].	42.00	Q-3	2.35 X 6.00	23.7501		997.50
[42 En LOSA MACIZA].	24.5477	Q-7	2.35 X 6.00	65.93		1,618.43

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	2,615.93
TOTAL ÍTEM	2,615.93
CANTIDAD DE OBRA	2,615.93

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3.20	Losa maciza elevada para entrepiso	**UNIDAD:**	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso nominal		TOTAL
Lugar /Elemento	Cantidad	Producto	Long. (m)			
B-D / 12 - 11 Nivel +8.05	5.03	2.24				11.27
D-E / 12 - 11 Nivel +8.05	8.00	2.24				17.92
E-H / 12 - 11 Nivel +8.05	8.05	2.24				18.03
H-I / 12 - 11 Nivel +8.05	7.90	2.24				17.70
I-J / 12 - 11 Nivel +8.05	8.00	2.24				17.92
E-H / 11-9 Nivel +8.05	7.40	2.47				18.28
G-H / 9.-6 Nivel +8.05	6.10	7.50				45.75
B-D / 9-6 Nivel +8.05	6.58	6.10				40.14
B-C / 4-5 Nivel +8.05	2.38	3.64				8.66
B-C / 5-6 Nivel +8.05	2.39	3.64				8.70
C-D / 5-6 Nivel +8.05	2.39	3.64				8.70
D-E / 5-6 Nivel +8.05	7.51	3.64				27.34
E-F / 5-6 Nivel +8.05	2.54	3.64				9.25
F-G / 5-6 Nivel +8.05	2.54	3.64				9.25
G-H / 5-6 Nivel +8.05	2.425	3.64				8.83
C-D / 4-5 Nivel +8.05	1.754	3.64				6.38

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	274.12
TOTAL ÍTEM	**274.12**
CANTIDAD DE OBRA	**274.12**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 2
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterraneo	UNIDAD:	m3

PLANO Y/O ESQUEMA

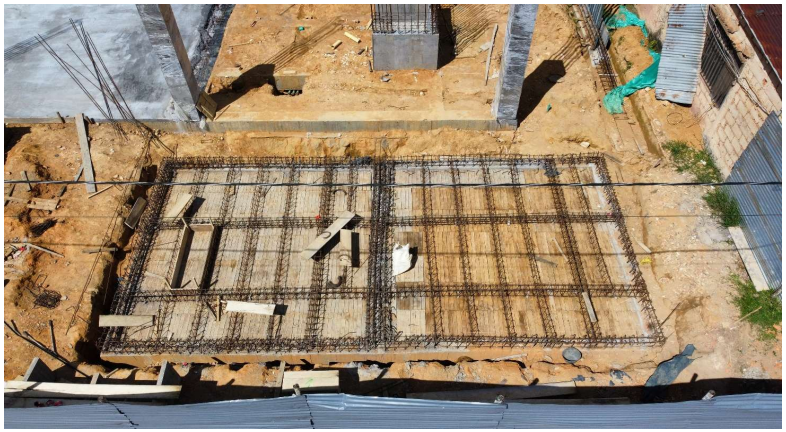

CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area trapesio	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
Losa tanque suministro	5.52	5.41	0.25		1.00	7.47
Media caña tanque suministro	20.40	0.25 - 0.45	0.20	0.07	1.00	1.43
Tanque suministro VTA-2 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	4.91	0.10	0.35		4.00	0.69
Tanque suministro VTA-3 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	4.91	0.20	0.35		1.00	0.34
Tanque suministro VTA-2 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	3.68	0.10	0.35		1.00	0.13
Tanque suministro R-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.52	0.10	0.35		1.00	0.02
Tanque suministro R-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.816	0.10	0.35		4.00	0.11
Tanque suministro R-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.50	0.10	0.35		2.00	0.04
Tanque suministro VTA-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.60	0.20	0.35		1.00	0.04
Tanque suministro VTA-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.62	0.20	0.35		4.00	0.17
Tanque suministro VTA-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	1.02	0.20	0.35		1.00	0.07
Tanque suministro VG-3 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	5.52	0.25	0.35		1.00	0.48
Tanque suministro VG-4 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	5.52	0.25	0.35		1.00	0.48
Tanque suministro VG-A del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	4.91	0.25	0.35		1.00	0.43
Tanque suministro VG-C del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	4.91	0.25	0.35		1.00	0.43
Losa entre piso tanque suministro	5.52	5.41	0.05		1.00	1.49
TANQUE RCI VG-C del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	4.91	0.25	0.35		1.00	0.43
Losa entre piso TANQUE RCI	5.52	5.41	0.05		1.00	1.49
TANQUE RCI VTA-2 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	4.91	0.10	0.35		4.00	0.69
TANQUE RCI VTA-3 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	4.91	0.20	0.35		1.00	0.34
TANQUE RCI VTA-2 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	3.68	0.10	0.35		1.00	0.13
TANQUE RCI R-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.52	0.10	0.35		1.00	0.02
TANQUE RCI R-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.85	0.10	0.35		4.00	0.12
TANQUE RCI R-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.50	0.10	0.35		2.00	0.04
TANQUE RCI VTA-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.60	0.20	0.35		1.00	0.04
TANQUE RCI VTA-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	0.62	0.20	0.35		4.00	0.17
TANQUE RCI VTA-1 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	1.02	0.20	0.35		1.00	0.07

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	17.36
PASAN A PAGINA 2	**17.36**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	2 2
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3.27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterraneo	**UNIDAD:**	m3

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area trapesio	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
TANQUE RCI VG-3 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	5.52	0.25	0.35		1.00	0.48
TANQUE RCI VG-4 del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	5.52	0.25	0.35		1.00	0.48
TANQUE RCI VG-A del eje 1 al 2, entre el eje A Y B	4.91	0.25	0.35		1.00	0.43

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	1.39
VIENE PAGINA 1	17.36
TOTAL ÍTEM	**18.75**
CANTIDAD DE OBRA	**18.75**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3.28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	**UNIDAD:**	m3

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
M2 del eje F al G, entre el eje 6 y 7 piso 2	2.80	0.20	0.50			0.28
M2 del eje F, entre el eje 6 y 8 piso 2	2.60	0.20	0.50			0.26
M2 del eje F, entre el eje 6 y 8 piso 2	3.75	0.20	3.62			2.72
M2 del eje F al G, entre el eje 6 y 7 piso 2	2.65	0.20	3.62			1.92
M2 del eje F al G, entre el eje 7 y 8 piso 2	2.65	0.20	3.62			1.92
M2 del eje G, entre el eje 6 y 7 piso 2	0.60	0.20	3.62			0.43
M2 del eje G, entre el eje 7 y 8 piso 2	0.60	0.20	3.62			0.43

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	7.96
TOTAL ÍTEM	**7.96**
CANTIDAD DE OBRA	**7.96**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	16 de julio de 2025

CAPÍTULO:	4	CUBIERTA Y CIELORASO	**ITEM:**	4.4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	**UNIDAD:**	kg

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso kg/m	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
PHR (160) del eje B al eje J, entre el eje 11 y 13	39.11			13.48	6.00	3,163.22
PHR (160) del eje H al eje J, entre el eje 4 y 6	16.58			13.48	4.06673	908.91

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	4,072.13
VIENE	
TOTAL ÍTEM	**4,072.13**
CANTIDAD DE OBRA	**4,072.13**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CERTIFICADOS DE CALIDAD



FICHA TÉCNICA CEMENTOS

USO GENERAL TIPO UG

FORTECEM
Buenas Obras

PARÁMETROS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121:2014 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2018	N/A	**4700 - 5200**
Autoclave Expansión (%)	NTC 107:2017	Máx. 0.8	**Máx. 0.2**
Fraguado inicial (min.)	NTC 118:2017	Mín. 45-Máx. 420	**220 - 250**
Fraguado final (min.)	NTC 118:2017	N/A	**300 - 380**
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2018	Máx. 0.02	**Máx. 0.015**
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2017	Máx. 12	**Máx. 8**
Peso específico (g/cm^3)	NTC 221:2017	N/A	**2.85 - 2.95**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121:2014 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
1 Día (MPa)	NTC 220:2017	N/A	**4-6**
3 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 8	**12-14**
7 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 15	**16-18**
28 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 24	**28-32**

Última actualización: 19-03-2019

USOS

- Estructuras de concreto: placas, columnas, escaleras y cimentaciones
- Morteros para pega de Mampostería estructural y no estructural
- Pañetes
- Grouting de relleno de celdas
- Afinado de pisos
- Andenes y pavimentos
- Prefabricados

Presentaciones: ■ 50 kg ■ 42,5 kg



Línea corporativa: (57-1) 869 7700 | Servicio al cliente: 01 8000 180 113
servicioalcliente@fortecem.net | @fortecem | www.fortecem.net

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página **1** de **1**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	21/04/2025
PRODUCTO	**Cemento Hidráulico Tipo UG**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2023(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2024	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107:2019	Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2025	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2024	N/A	4925,00
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,83
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107:2019	N/A	0,010
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	240
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	330
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2025	Máx. 0.02	0,001
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	5,35
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2022	N/A	0,490
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	6,56
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	12,85
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	16,74
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	26,57

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Marzo de 2025
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.

Jesu Andres Londoño Silva
Lider de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. FIG-59644

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 3/04/2024

CLIENTE	**SODIMAC COLOMBIA S.A. (VILLAVICENCIO)**	**DESTINO**	VILLAVICENCIO	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	CARRO 15	**GRADO**	420
				PEDIDO No.	TM8V

		ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.											RESULTADOS DIMENSIONALES				
		DOBLADO	RESULTADOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	**COLADA**		**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 4	20240663	✓	480.4	616.0	15.9	1.28	0.24	1.19	0.0108	0.034	0.20	0.28	0.11	0.07	0.022	0.00057	0.0020	0.46	0.967	0.890	8.420	72.3	2.020
R - No. 5	20240078	✓	492.8	625.7	17.1	1.27	0.26	1.19	0.01213	0.030	0.19	0.17	0.09	0.07	0.021	0.00063	0.0021	0.47	1.540	1.220	10.530	68.6	2.160
R - No. 6	20240316	✓	472.1	619.0	15.9	1.31	0.25	1.05	0.01133	0.031	0.21	0.17	0.07	0.07	0.019	0.00039	0.0022	0.44	2.174	1.380	13.040	70.6	2.640
	20240715	✓	463.0	613.6	15.5	1.33	0.28	1.03	0.01083	0.026	0.21	0.18	0.08	0.06	0.021	0.00049	0.0022	0.46	2.149	1.370	13.090	70.2	2.300
R - No. 7	20240470	✓	484.1	642.1	14.3	1.33	0.26	1.08	0.01367	0.032	0.22	0.25	0.10	0.05	0.014	0.00052	0.0022	0.46	2.925	1.420	14.820	69.7	3.170
R - No. 8	20240526	✓	453.1	612.0	14.2	1.35	0.26	0.96	0.0152	0.026	0.17	0.18	0.10	0.10	0.016	0.00062	0.0023	0.44	3.867	1.680	16.820	70.3	4.020
ESPECIFICACIONES DE NORMA																							
R - No. 4			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 5			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5
R - No. 8			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 02 CCA-FOR-017

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. FIG-59645

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 3/04/2024

CLIENTE	**SODIMAC COLOMBIA S.A. (TIENDA 18 VILLAVICENCIO FUNDADORES)**	**DESTINO**	VILLAVICENCIO	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	CARRO 15	**GRADO**	420
				PEDIDO No.	TM8W

		ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.											RESULTADOS DIMENSIONALES				
			RESULTADOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	**COLADA**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	20240715	✔	463.0	613.6	15.5	1.33	0.28	1.03	0.01083	0.026	0.21	0.18	0.08	0.06	0.021	0.00049	0.0022	0.46	2.149	1.370	13.090	70.2	2.300
R - No. 7	20240470	✔	484.1	642.1	14.3	1.33	0.26	1.08	0.01367	0.032	0.22	0.25	0.10	0.05	0.014	0.00052	0.0022	0.46	2.925	1.420	14.820	69.7	3.170
ESPECIFICACIONES DE NORMA																							
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5

OBSERVACIONES

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 02 CCA-FOR-017

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. FIG-59646

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 3/04/2024

CLIENTE	**SODIMAC COLOMBIA S.A. (TIENDA 18 VILLAVICENCIO FUNDADORES)**	**DESTINO**	VILLAVICENCIO	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	CARRO 15	**GRADO**	420
				PEDIDO No.	TM8Y

		ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.											RESULTADOS DIMENSIONALES				
			RESULTADOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	**COLADA**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	20233328	✔	485.3	633.6	15.1	1.31	0.26	1.08	0.00777	0.034	0.20	0.28	0.09	0.10	0.020	0.00076	0.0005	0.46	2.182	1.260	12.770	71.1	2.520
R - No. 7	20240469	✔	488.6	631.9	15.3	1.29	0.27	1.04	0.01023	0.030	0.21	0.22	0.13	0.05	0.017	0.00079	0.0021	0.46	2.935	1.490	14.780	69.7	3.220
ESPECIFICACIONES DE NORMA																							
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5

OBSERVACIONES

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 02 CCA-FOR-017

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru

4 MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO



Malla electrosoldada estándar o a medidas especiales

DEFINICIÓN

Es un arreglo bidireccional de alambres grafilados superpuestos en sentido longitudinal y transversal, los cuales forman ángulos rectos entre si e intersecciones unidas con soldaduras de contacto.

Se fabrica malla estándar de 2,35 m ancho x 6 m de largo en las diferentes referencias y malla especial teniendo en cuenta espacios mínimos establecidos, diámetros que no deben superar el 35% de diferencia entre ellos, y la cantidad mínima a fabricar.

Se utilizan grafiles para la elaboración de las mallas y/o uso en obras para refuerzo en construcciones, su superficie posee deformaciones, en bajo y alto relieve de manera que impide el movimiento longitudinal del alambre en dicha construcción de concreto. Presentación en barras de 6 m generalmente.

Elaboración de Ram o refuerzo para mampostería, elaborado con alambre grafilado según norma NTC 5806 (Alambre de acero liso y grafilado, mallas electrósoldadas para refuerzo de concreto) y NTC 2674 (Siderugia, empaque, rotulado y métodos de carga de productos de acero para despacho doméstico). Cada Ram está compuesto de grafiles longitudinales y transversales, los cuales llevan una separación según los estándares o las medidas que el cliente necesita.

USOS DE LAS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Pavimentos para carreteras, Calles de aeropuertos:

El objeto de reforzar losas de concreto para vías en general, con malla electrosoldada Concremalla, es controlar y evitar los agrietamientos que se presentan por esfuerzos y deformaciones de tensión, producidos por la acción de cargas y por la resistencia ejercida por la fricción al movimiento de la losa cuando trata de expandirse o contraerse.

Tubería de Concreto:

Por su gran resistencia, las mallas toleran grandes cargas concentradas, motivo por el cual se utilizan para reforzar tuberías de concreto.

Canales, Muros de Contención:

La malla tiene gran aplicación e importancia en obras civiles como son las canales, boxcoulvert y muros de contención, permitiendo continuidad del refuerzo, facilidad de colocación y una alta rapidez en ejecución de la obra.



Máquina para producción de Malla Electrosoldada

Edificios:

Por su enorme versatilidad la malla electrosoldada se utiliza en un gran porcentaje en las estructuras de edificios logrando economía en tiempo y materiales.

Vivienda Residencial:

En cimientos, paredes, techos, pisos para garaje, placas de cubierta.

Vivienda Multifamiliar:

La malla electrosoldada es la adecuada en construcción de vivienda prefabricada por permitir gran velocidad de trabajo.

Revestimiento de Túneles:

Si de controlar filtraciones de agua se trata o conservar y adecuar superficies para túneles, la malla electrosoldada es utilizada, por su eficiencia y economía.

la campana	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - PERLIN EN C		24/01/2018
	F-PC-001	VERSION 001	Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL					
Producto:	PERLIN EN C	**Espesor:**	1,90mm	**Dimensión Exterior:**	160x60
Metodo de Fabricación:	Rolado	**Cantidad:**	20	**No. de Certificado:**	P001072
Codigo de Producto:	PEH1.90UP160.60	**Peso Teorico:**	27,29Kg	**Longitud:**	6.000mm
Norma Materia Prima:	ASTM A36	**No. Bobina:**	1707441	**Numero de colada**	1891

Descripción: Elemento estructural abierto con sección geométrica en forma de "C" con pestañas, fabricado con lámina de acero calidad estructural 250MPa.

Norma: NTC 5685, perfiles estructurales de acero conformados en frío.

Composición Química:

C (Max)	Si (Min)	Mn (Max)	P (Max)	S (Max)
0,18%	0,03%	0,60%	0,035%	0,035%

Propiedades mecanicas:

Resistencia a la Tracción (Min)	Elongación (Min)	Resistencia a la Fluencia (Min)
400MPa (58000psi)	23%	250MPa (36000psi)

ENSAYOS FISICOS (C = Conforme / NC = No Conforme)

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	C	NC	MÉTODO
Inspección (Visual Directa)	Estado superficial del material libre de corrosioón, ralladuras, poros o golpes.	Las muestras inspeccionadas cumplen con las condiciones superficiales.	X		ASME sección V articulo 9
Dimensional (Variaciones permitidas)	Longitud: +10mm Espesor: + o - 5% Lados Externos: + o - 3mm	6000mm 1,90mm 160x60	X		NTC 7

Instrumentos empleados durante los ensayos dimensionales:
Calibrador pie de rey/ Marca: Stainless Hardened/ Rango: 6”/0-150mm/ Resolución estándar
Escuadra/ Marca: Stanley 46-536
Cinta métrica/ Marca: Lufkin/ Rango: 26/ 8m*1
Calibrador de puntas planas/ Marca: Igaging/ Rango: 0 – 1”/ Resolución: 0.00005” -0.001 mm

CONCEPTO					
Producto Terminado es:	APROBADO		RECHAZADO		HOJAS ANEXAS

Observaciones: Certificamos que el producto aquí descrito cumple con las especificaciones técnicas mencionadas y fue fabricado e inspeccionado de acuerdo a las normas descritas.

Fecha de Aprobación o Rechazo: **22/08/2024**

Realizado por:

Andres Tauta - Coordinador de Calidad

CENTRO DE SERVICIOS: Autopista Medellín Km 2.5 Vía Siberia - Bogotá, Parque Industrial los Nogales.
PBX: 601 - 8773700

www.lacampana.co

la campana	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - PERLIN EN C		24/01/2018
	F-PC-001	VERSION 001	Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL					
Producto:	PERLIN EN C	**Espesor:**	1,90mm	**Dimensión Exterior:**	203x67
Metodo de Fabricación:	Rolado	**Cantidad:**	155	**No. de Certificado:**	P001074
Codigo de Producto:	PEH1.90UP203.67	**Peso Teorico:**	32,21Kg	**Longitud:**	8050mm
Norma Materia Prima:	ASTM A36	**No. Bobina:**	E03602	**Numero de colada**	1891

Descripción: Elemento estructural abierto con sección geométrica en forma de "C" con pestañas, fabricado con lámina de acero calidad estructural 250MPa.

Norma: NTC 5685, perfiles estructurales de acero conformados en frío.

Composición Química:

C (Max)	Si (Min)	Mn (Max)	P (Max)	S (Max)
0,18%	0,03%	0,60%	0,035%	0,035%

Propiedades mecanicas:

Resistencia a la Tracción (Min)	Elongación (Min)	Resistencia a la Fluencia (Min)
400MPa (58000psi)	23%	250MPa (36000psi)

ENSAYOS FISICOS (C = Conforme / NC = No Conforme)

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	C	NC	MÉTODO
Inspección (Visual Directa)	Estado superficial del material libre de corrosioón, ralladuras, poros o golpes.	Las muestras inspeccionadas cumplen con las condiciones superficiales.	X		ASME sección V articulo 9
Dimensional (Variaciones permitidas)	Longitud: +10mm Espesor: + o - 5% Lados Externos: + o - 3mm	6000mm 1,90mm 203x67	X		NTC 7

Instrumentos empleados durante los ensayos dimensionales:
Calibrador pie de rey/ Marca: Stainless Hardened/ Rango: 6”/0-150mm/ Resolución estándar
Escuadra/ Marca: Stanley 46-536
Cinta métrica/ Marca: Lufkin/ Rango: 26/ 8m*1
Calibrador de puntas planas/ Marca: Igaging/ Rango: 0 – 1”/ Resolución: 0.00005” -0.001 mm

CONCEPTO					
Producto Terminado es:	APROBADO		RECHAZADO		HOJAS ANEXAS

Observaciones: Certificamos que el producto aquí descrito cumple con las especificaciones técnicas mencionadas y fue fabricado e inspeccionado de acuerdo a las normas descritas.

Fecha de Aprobación o Rechazo: 8/08/2024

Realizado por:

Andres Tauta - Coordinador de Calidad

CENTRO DE SERVICIOS: Autopista Medellín Km 2.5 Vía Siberia - Bogotá, Parque Industrial los Nogales.
PBX: 601 - 8773700

www.lacampana.co

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1558335872	9487505010	E	2025/06/13	2025/06/16	BANCOLOMBIA	3	$20,452,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1125004538	AGUDELO BONILLA ARIES GERMAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1121850548	AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	11280464	ALGARRA ALFONSO LUIS GERARDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1124993341	ALGARRA PEREZ NESTOR JHAIR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1124991155	AMAYA GAITAN SANTIAGO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1124993310	ARANGO CASTILLO CIRO JAIR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	35264916	BALLEN PARRADO ANDREA DEL PILAR							X											230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	1124994614	CARDONA RODRIGUEZ HOSMAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1124991490	CARIBAN DIAZ JHON FREDY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1121870352	CESPEDES MORA YESID CAMILO																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF68	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
11	CC	1127390922	CONSOLACION RODRIGUEZ ALEX																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1119890549	DASILVA FORERO JOSE ANTONIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1121958635	DIAZ CASTRO KAREN ASTRITH																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
14	CC	1127382860	FONSECA GOMEZ ORLANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1006950328	GAITAN GALINDO JAIRO		X																230301	16	$759,200	$121,500	EPSIC5	16	$759,200	$30,400	CCF68	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
16	CC	1124997772	GALVIZ BENJUMEA NOELLY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	80795043	GARZON PEREZ JOSE ALVARO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	PT	7243305	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	17588928	GRISALES RINCON JOHN JAIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
20	CC	1125010065	LARROSA GONZALEZ ARISTIDEZ HERNAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
21	CC	86062674	LEAL DIAZ WILSON ANDRES							X											230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
22	CC	1124991167	MENDEZ RIVAS RAFAEL ARCANGEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
23	CC	1124990124	NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF68	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,700
24	CC	40386963	PEÑA OLARTE JANETH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
25	CC	1125007842	PIÑA GALLARDO WILSON ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
26	CC	6848155	PONARE PONARE JAIME NOE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
27	CC	1124990027	PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
28	PT	5722870	PONARE JOSE ENRIQUE		X																25-14	21	$996,450	$159,500	EPS041	21	$996,450	$39,900	CCF68	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
29	CC	1124998948	PONARE PONARE LUIS EMIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
30	CC	1124996599	PONARE PONARE WILSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1558335872	9487505010	E	2025/06/13	2025/06/16	BANCOLOMBIA	3	$20,452,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				45	$10,423,200	$20,400	$0	$10,443,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,437,500	$4,800	$0	$2,442,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$6,742,300	$13,100	$0	$6,755,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,243,400	$2,500	$0	$1,245,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$4,646,000	$9,000	$0	$4,655,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	46	$4,646,000	$9,000	$0	$4,655,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$2,671,500	$5,200	$0	$2,676,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	46	$2,671,500	$5,200	$0	$2,676,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				46	$2,671,600	$5,400	$0	$2,677,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$137,000	$300	$0	$137,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	29	$1,628,800	$3,200	$0	$1,632,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$286,900	$600	$0	$287,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$96,900	$200	$0	$97,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$145,000	$300	$0	$145,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$377,000	$800	$0	$377,800
TOTAL				**46**	**$20,412,300**	**$40,000**	**$0**	**$20,452,300**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1557793432	9487386029	Y	2025/06/13	2025/06/16	BANCOLOMBIA	3	$99,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$99,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1557793432	9487386029	Y	2025/06/13	2025/06/16	BANCOLOMBIA	3	$99,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$200	$0	$99,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$200	$0	$99,300
TOTAL				1	$99,100	$200	$0	$99,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05		9486478360	I	2025/06/11			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																		231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$741,000
Total	**Afiliados(1)**																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$741,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05		9486478360	I	2025/06/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$741,000	$0	$0	$741,000

BITACORA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	10	6	2025
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**11**	**6**	**2025**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se detienen actividades por 6 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana y tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**12**	**6**	**2025**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se detienen actividades por 3 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana y tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**13**	**6**	**2025**
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	14	6	2025
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	16	6	2025
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funden vigacintas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**17**	**6**	**2025**
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	18	6	2025
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**19**	**6**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funden vigacintas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se detienen actividades por 3 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana y tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**20**	**6**	**2025**
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	21	6	2025
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	24	6	2025
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**25**	**6**	**2025**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se detienen actividades por 3 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana y tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	26	6	2025
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	27	6	2025
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA			
1	RESIDENTE DE OBRA 2			
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	28	6	2025
X		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se detienen actividades por 6 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana y tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	1	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se detienen actividades por 4 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana y tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**2**	**7**	**2025**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se detienen actividades durante el dia, debido a las intensas lluvias que estan sucediendo en el municipio de Cumaribo esto debido al frente frio que esta pasando por la region.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	3	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se detienen actividades por 3 horas por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	4	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se detienen actividades por 3 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	5	7	2025
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
31	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funden vigacintas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	7	7	2025
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
31	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza el vaciado de concreto para placa de servicio en la cubierta para el nivel N+8.05.


Se inicia el encofrado para posteriormente vaciar concreto en muros de concreto de segundo nivel.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	8	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se continua el encofrado para posteriormente vaciar concreto en muros de concreto de segundo nivel.

Se detienen actividades por 3 horas por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	9	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se continua el encofrado para posteriormente vaciar concreto en muros de concreto de segundo nivel.

Se detienen actividades por 4 horas por motivo de lluvia en las horas de mañana y tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**10**	**7**	**2025**
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
31	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza el vaciado de concreto para muro en concreto del segundo nivel

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funden vigacintas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	11	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se continua el encofrado para posteriormente vaciar concreto en muros de concreto de segundo nivel.

Se detienen actividades por 3 horas por motivo de lluvia en las horas de mañana y tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	12	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 6 y 1.

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se continua el encofrado para posteriormente vaciar concreto en muros de concreto de segundo nivel.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	14	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se continua el encofrado para posteriormente vaciar concreto en muros de concreto de segundo nivel.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	15	7	2025
	X				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
31	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se continua el encofrado para posteriormente vaciar concreto en muros de concreto de segundo nivel.

Se inicia el encofrado para escalera en concreto.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			FECHA		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	16	7	2025
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
31	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la actividad de encofrado y puesta de formaleta para vigas y placas de servicio de cubierta N+8.05m

Se continua la actividad de pañete para muros en bloque no4 del eje 13 y 6.

Se continua el encofrado para posteriormente vaciar concreto en muros de concreto de segundo nivel.

Se continua el encofrado para escalera en concreto.

Se inicia la actividad de puesta de tomacorrientes e interruptores

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funden vigacintas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en las horas de tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DISCRIMINACION DE NOMINAS

01 - 15 DE JUNIO DE 2025

#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	$ 766,414.62
2	1,124,993,310	CIRO ARANGO	$ 766,414.62
3	1,124,998,948	EMIRO PONARE	$ 766,414.62
4	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	$ 766,414.62
5	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	$ 754,810.00
6	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	$ 1,111,139.62
7	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	$ 790,139.62
8	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	$ -
9	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	$ 766,414.62
10	11,280,464	LUIS ALGARRA	$ 813,864.62
11	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	$ 766,414.62
12	8,190,705	FELIX SANCHEZ	$ 954,414.62
13	6,848,517	BILCEN REINA	$ 766,414.62
14	1,006,950,328	JAIRO GAITAN	$ 1,958,471.00
15	1,124,990,631	CHARLES REINA	$ 766,414.62
16	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	$ 882,139.62
17	17,588,928	JHON GRISALES	$ 1,959,604.62
18	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	$ 1,035,414.62
19	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	$ 766,414.62
20	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	$ 766,414.62
21	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	$ 766,414.62
22	1,124,991,490	JHON CARIBAN	$ 766,414.62
23	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	$ 766,414.62
24	17,316,132	GUILLERMO RIOS	$ 766,414.62
25	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	$ 766,414.62
26	1,119,890,549	JOSE DASILVA	$ 813,864.62
27	7,243,305	JAIRO GOMEZ	$ 766,414.62
28	1,136,278,055	YORMAN SOSA	$ 766,414.62
29	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	$ 754,810.00
30	1,124,996,599	WILSON PONARE	$ 754,810.00
31	1,124,989,222	YEINER PONARE	$ 766,414.62
32	1,121,850,548	DAVID AGUILERA	$ 845,068.18
33	1,124,990,559	ELBER RODRIGUEZ	$ 754,810.00
34	1,124,994,854	DARWIN SALCEDO	$ 766,414.62
35	6,848,155	NOE PONARE	$ 766,414.62
36	80,795,043	JOSE GARZON	$ 766,414.62
37	1,125,007,842	WILSON PIÑA	$ 766,414.62
38	1,124,990,124	EDWIN NOVOA	$ 766,414.62
39	1,125,000,272	OBDULIO REINA	$ 766,414.62

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003232381902	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003118754584	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052048706	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052029620	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	1.111.139,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	790.139,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003224056223	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HECTOR SANCHEZ	Documento:	000001006951188
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003202024917	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	813.864,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	954.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003503276308	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052081800	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GAITAN	Documento:	000001006950328
Valor:	1.958.471,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	882.139,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003227066773	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	1.959.604,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	1.035.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003112419831	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052043021	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052077218	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003212605041	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003138214723	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	813.864,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003248577148	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003223032422	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003212924679	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003244279947	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003203868681	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAVID AGUILERA	Documento:	000001121850548
Valor:	845.068,18	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	28900008515	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELBER RODRIGUEZ	Documento:	000001124990559
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	28900009306	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DARWIN SALCEDO	Documento:	000001124994854
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003112068447	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOE PONARE	Documento:	000000006848155
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052075495	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE GARZON	Documento:	000000080795043
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052081045	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PI A	Documento:	000001125007842
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003112930669	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EDWIN NOVOA	Documento:	000001124990124
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000485052069428	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	OBDULIO REINA	Documento:	000001125000272
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:24 AM

Número de cuenta:	00000003232378170	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY PAOLA	Documento:	000001192893913
Valor:	759.200,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Junio de 2025		

16 - 30 DE JUNIO DE 2025

#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	$ 1,566,560.00
2	1,124,993,310	CIRO ARANGO	$ 1,566,560.00
3	1,124,998,948	EMIRO PONARE	$ 1,566,560.00
4	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	$ 1,566,560.00
5	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	$ 1,566,560.00
6	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	$ 1,887,560.00
7	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	$ 1,589,769.24
8	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	$ 3,047,291.00
9	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	$ 1,566,560.00
10	11,280,464	LUIS ALGARRA	$ 1,661,460.00
11	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	$ 1,519,110.00
12	8,190,705	FELIX SANCHEZ	$ 1,754,560.00
13	6,848,517	BILCEN REINA	$ 1,566,560.00
14	1,124,990,631	CHARLES REINA	$ 1,566,560.00
15	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	$ 1,681,769.24
16	17,588,928	JHON GRISALES	$ 2,759,750.00
17	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	$ 1,835,560.00
18	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	$ 1,519,110.00
19	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	$ 1,516,239.33
20	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	$ 1,566,560.00
21	1,124,991,490	JHON CARIBAN	$ 744,104.00
22	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	$ 1,566,560.00
23	17,316,132	GUILLERMO RIOS	$ 1,566,560.00
24	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	$ 1,566,560.00
25	1,119,890,549	JOSE DASILVA	$ 1,566,560.00
26	7,243,305	JAIRO GOMEZ	$ 1,566,560.00
27	1,136,278,055	YORMAN SOSA	$ 1,566,560.00
28	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	$ 1,570,428.21
29	1,124,996,599	WILSON PONARE	$ 1,471,660.00
30	1,124,989,222	YEINER PONARE	$ 1,566,560.00
31	1,121,850,548	DAVID AGUILERA	$ 1,678,737.99
32	1,124,990,559	ELBER RODRIGUEZ	$ 1,219,311.00
33	1,124,994,854	DARWIN SALCEDO	$ 1,219,311.00
34	6,848,155	NOE PONARE	$ 1,219,311.00
35	80,795,043	JOSE GARZON	$ 1,219,311.00
36	1,125,007,842	WILSON PIÑA	$ 1,210,292.00
37	1,124,990,124	EDWIN NOVOA	$ 1,036,961.00
38	1,125,000,272	OBDULIO REINA	$ 867,553.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003232381902	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003118754584	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052048706	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052029620	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	1.887.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	1.589.769,24	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003114560221	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFREDO RODRIGUEZ	Documento:	000001124990520
Valor:	3.047.291,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003224056223	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HECTOR SANCHEZ	Documento:	000001006951188
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003202024917	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	1.661.460,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	1.519.110,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	1.754.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003503276308	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	1.681.769,24	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003227066773	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	2.759.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	1.835.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	1.519.110,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	1.516.239,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003112419831	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052043021	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	744.104,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052077218	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003212605041	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003138214723	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003248577148	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003223032422	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	1.570.428,21	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003212924679	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	1.471.660,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003244279947	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	1.566.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003203868681	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAVID AGUILERA	Documento:	000001121850548
Valor:	1.678.737,99	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	28900008515	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELBER RODRIGUEZ	Documento:	000001124990559
Valor:	1.219.311,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	28900009306	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DARWIN SALCEDO	Documento:	000001124994854
Valor:	1.219.311,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003112068447	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOE PONARE	Documento:	000000006848155
Valor:	1.219.311,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052075495	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE GARZON	Documento:	000000080795043
Valor:	1.219.311,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052081045	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PI A	Documento:	000001125007842
Valor:	1.210.292,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003112930669	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EDWIN NOVOA	Documento:	000001124990124
Valor:	1.036.961,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000485052069428	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	OBDULIO REINA	Documento:	000001125000272
Valor:	867.553,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Miércoles, 16 de julio de 2025 - 11:25 AM

Número de cuenta:	00000003232378170	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY PAOLA	Documento:	000001192893913
Valor:	1.523.500,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO PARCIAL DE OBRA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2375-2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO"

CONSORCIO SAN RAFAEL
RL. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"

CONSORCIO HDC
RL. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

PERIODO DEL 10 DE JUNIO DE 2025 AL 16 DE JULIO DE 2025

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta

TABLA DE CONTENIDO

	PORTADA	1
	TABLA DE CONTENIDO	2
1	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETO DEL INFORME	4
3.	INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	5
	INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA	5
	UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO	6
4.	INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO	8
	CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	8
5.	CUADRO LEGAL (POLIZAS VIGENTES) CONTRATO DE OBRA	16
6.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	20
7.	GRAFICA DE AVANCE Y CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA	23
8.	PERSONAL DE OBRA	42
9.	EQUIPO UTILIZADO POR OBRA	44
10.	ENSAYOS DE LABORATORIO	44
11.	INCONVENIENTES PRESENTADOS Y SOLUCIONES	45
12.	CONCLUSIONES	45
13.	ANEXOS	46 – 54

1. INTRODUCCION

El Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Puerto Carreño - Vichada, suscribió el contrato de interventoría de obra pública HDSJDD-CP-2375-2023 que tiene por objeto la "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO" con el propósito de realizar la interventoría al contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023 cuyo objeto es la "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO".

La construcción del nuevo Hospital para el municipio de Cumaribo – Vichada, contempla un proyecto de más de 4500 m^2 de área, en las cuales se prestarán servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, servicios generales, atención a partos, servicios de diagnóstico, entre otras, además de las áreas de administración y de circulación tanto internas como externas. Es un proyecto planificado inicialmente para ser construido en un término de 15 meses, extendido a 23 meses según prorroga No. 1 por ocho (08) meses firmada el 07 de abril de 2025, cuyas actividades y especificaciones precisas, se encuentran detalladas en la propuesta económica del contrato de obra objeto de esta interventoría.

En el presente informe se avalan y aprueban las cantidades de obra ejecutadas por el Consorcio HDC, contratista de obra, en el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2025 al 16 de julio de 2025, pertenecientes al pago parcial No.09 del contrato de obra, objeto de esta interventoría.

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo principal, plasmar el control y seguimiento de cada uno de los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y jurídicos, así como también avalar las cantidades de obra ejecutadas, durante el periodo comprendido del 10 de junio de 2025 al 16 de julio de 2025, del contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023 cuyo objeto es la "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO" para el pago parcial No. 9 del contrato de obra.


3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra pública
CONTRATO N°	HDSJDD-CP-2374-2023
FECHA DEL CONTRATO	28 de diciembre de 2023
OBJETO	"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"
CONTRATISTA	CONSORCIO HDC
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
FORMA DE PAGO	Anticipo del 50%, pagos parciales hasta el 95% y 5% para liquidación final.
FECHA DE INICIACIÓN	16 de enero de 2024
VALOR DEL CONTRATO	$20.856.846.224,00
VALOR ANTICIPO	$10.428.423.112,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1 DEL 29 DE MAYO DE 2024	$ 1,202,976,129.00
ACTA DE MODIFICACION No. 1 DEL 16 DE JULIO DE 2024	$20.856.846.224,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024	$842.463.948,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1.160.249.543,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	$1.644.084.729,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 5 DEL 31 DE ENERO DE 2025	$713.207.603,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 6 DEL 12 DE MARZO DE 2025	$ 536.259.859,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 7 DEL 12 DE MAYO DE 2025	$ 537.301.176,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 8 DEL 13 DE JUNIO DE 2025	$ 582.080.010,00
PLAZO DE EJECUCION	Quince (15) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de abril 2025
PRÓRROGA No. 1 DEL O7 DE ABRIL DE 2025	Ocho (8) meses
ACTA DE MODIFICACION No. 2 DEL 14 DE JULIO DE 2025	$20.856.846.224,00
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15 de Diciembre de 2025
SUPERVISOR	YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA – Subgerente Administrativo E.S.E

3.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE CUMARIBO – VICHADA

Cumaribo, municipio colombiano ubicado en el departamento del Vichada. Su jurisdicción tiene una extensión de 65.193 km², es el municipio de mayor extensión en Colombia, se ubica en el oriente de Colombia, en el departamento del Vichada. La cabecera municipal está localizada a 161 m s. n. m. y a 370 km por carretera de Puerto Carreño, la capital departamental. Limita por el norte con Puerto Carreño, y con los municipios de Santa Rosalía y La Primavera, siendo dicho límite demarcado por el río Tomo; por el sur limita con el Municipio de Barrancominas en el departamento del Guainía y también con el departamento de Guaviare, límite demarcado por el río Guaviare; al oriente limita con Venezuela, límite determinado por el río Orinoco, y por el occidente limita con el departamento del Meta.

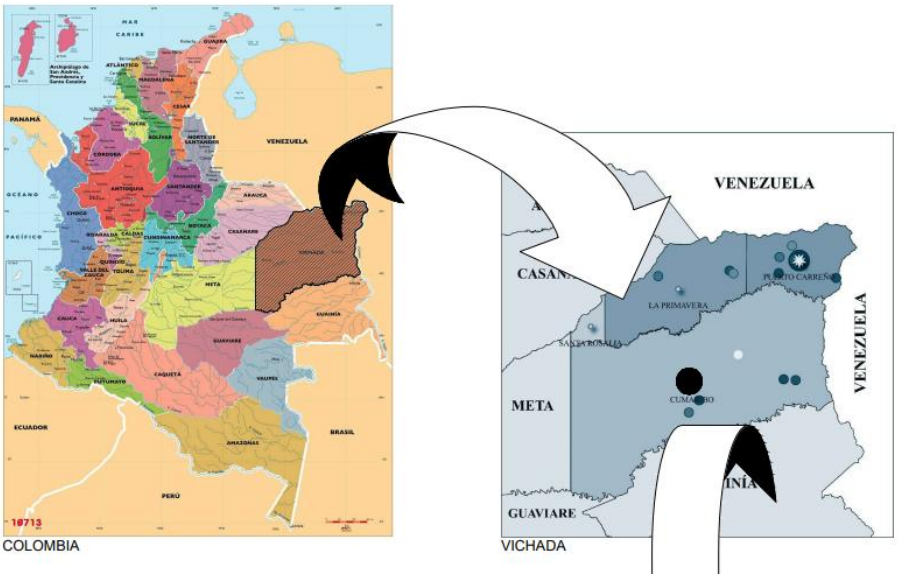

COLOMBIA VICHADA

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



El Hospital San Juan De Dios sede Cumaribo, está ubicado en la cabecera municipal de Cumaribo, en la calle 6 con carrera 15 esquina.

4. INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1 CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.856.846.224,00
VALOR DEL ANTICIPO	$10.428.423.112,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 1.202.976.129,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$ 842.463.948,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3	$1.160.249.543,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 4	$1.644.084.729,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 5	$ 713.207.603,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 6	$ 536.259.859,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 7	$ 537.301.176,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 8	$ 582.080.010,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9	$ 711.865.954,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9	$ 355.932.977,00
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	$ 7.930.488.951,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 12.926.357.273,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO	$ 3.965.244.475,50
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 6.463.178.636,50
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 9 DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO	$ 355.932.977,00
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO PERIODO	3,41%
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	38,02%

4.1.1 SEGUIMIENTO AL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

El día 13 de febrero de 2024 fue girado por el Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. el anticipo del contrato de obra. La Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria suscribió con Sercoin Ingeniería SAS, Ingearse SAS, JMP Ingeniería SAS, integrantes del Consorcio HDC NIT. 901783555-3 el Contrato de Fiducia Mercantil No. 17027 con nombre

Patrimonio Autónomo P.A. ANT CONSORCIO HDC para el manejo del anticipo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN EL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			
No.	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	Pago de salarios y jornales	$3,337,095,395.84	32%
2	Compra de equipos y repuestos	$312,852,693.36	3%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$2,085,684,622.40	20%
4	Compra de materiales y accesorios	$4,692,790,400.40	45%
	TOTALES	$10,428,423,112.00	100%

Con el propósito que la empresa contratista realice la compra de materiales, contratación de bienes y servicios, necesarios para la ejecución de la obra, esta interventoría ha autorizado al Consorcio HDC el pago de doscientos ocho (208) ordenes, las cuales se resumen a continuación así:

No. de Oden Girada	**RUBRO AFECTADO SEGÚN PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO**			
	1. Pago de personal	2. compra equipos y repuestos	3. Transporte y alquiler de maquinaria	4. Compra de materiales y accesorios
1	$500.000.000			
2				**ANULADA**
3			$110.240.000	
4				$99.000.000
5				$78.750.000
6			$560.000.000	
7			$99.840.000	
8	$350.000.000			
9			$33.636.482	
10				**ANULADA**
11				$24.575.412,43
12				$101.204.400
13				$225.922.326,4
14		$37.115.000		
15				$209.625.000,00





16				$952.756.550,00
17				$30.870.000,00
18				$129.121.600,00
19				$8.000.000,00
20				$219.163.200,00
21	$683.246.500,00			
22				**ANULADA**
23				$137.500.000,00
24				$15.040.000,00
25				$39.481.373,00
26				$36.745.470,00
27				$284.722.200,00
28				$1.120.500,00
29				$270.000.000,00
30			$16.320.000,00	
31			$ 13,320,000.00	
32			$ 47,521,408.00	
33			$ 40,000,000.00	
34			$ 294,367,000.00	
35				$ 439,270,000.00
36				$ 25,683,000.00
37				$ 6,500,504.00
38			$ 10,320,000.00	
39			$ 16,320,000.00	
40			$ 4,680,000.00	
41		$ 4,500,000.00		
42				$ 15,249,850.00
43			$ 20,706,000.00	

44			$ 4,680,000.00	
45			$ 12,920,000.00	
46				$ 12,750,000.00
47		$ 5,500,000.00		
48				$ 14,400,500.00
49				**ANULADA**
50			$ 14,574,000.00	
51			$ 4,560,000.00	
52				$ 1,040,000.00
53				$ 3,022,147.00
54				**ANULADA**
55			$ 23,300,000.00	
56			$ 19,700,000.00	
57				**ANULADA**
58				$ 5,000,000.00
59			$ 20,400,000.00	
60				**ANULADA**
61				$ 406,050.00
62				$ 183,427,000.00
63				$ 1,402,500.00
64				$ 2,511,140.00
65			$ 10,353,000.00	
66				$ 870,000.00
67			$ 9,720,000.00	
68				$ 1,311,868.00
69				$ 6,320,650.00
70				$ 4,313,900.00

71			$ 12,920,000.00	
72			$ 3,045,000.00	
73			$ 26,227,600.00	
74				$ 25,201,300.00
75			$ 1,134,000.00	
76				$ 3,618,901.00
77				$ 19,611,300.00
78				$ 11,502,500.00
79				$ 11,281,720.00
80			$ 39,951,500.00	
81			$ 22,664,000.00	
82			$ 13,113,800.00	
83				$ 175,430,235.00
84				$ 4,976,180.00
85			$ 3,600,000.00	
86			$ 75,832,000.00	
87	$ 1,700,000.00			
88				**ANULADA**
89				$ 692,548.00
90			$ 17,000,000.00	
91				$ 1,251,548.50
92	$ 32,859,000.00			
93				$ 1,121,600.00
94				$ 2,004,000.00
95			$ 41,250,000.00	
96				**ANULADA**
97				$ 2,523,100.00





98				$ 5,304,000.00
99				$ 23,500,000.00
100			$ 3,030,000.00	
101			$ 4,860,000.00	
102	$ 2,600,000.00			
103				$ 3,150,000.00
104			$ 16,821,600.00	
105			$ 20,682,000.00	
106			$ 8,500,000.00	
107				$ 4,092,140.00
108				$ 100,000,000.30
109	$ 368,950,000.00			
110			$ 32,130,000.00	
111				$ 1,547,000.00
112				$ 24,077,700.00
113				**ANULADA**
114			$ 1,884,500.00	
115				**ANULADA**
116			$ 18,650,000.00	
117				$ 1,280,000.00
118				$ 8,384,550.00
119			$ 12,789,000.00	
120				$ 5,000,000.00
121			$ 25,996,000.00	
122				$ 103,200,000.00
123				$ 1,474,100.00
124				$ 928,000.00





125			$ 4,594,800.00	
126				$ 193,256,000.00
127		$ 144,900,000.00		
128	$ 213,800,000.00			
129			$ 11,907,000.00	
130				$ 560,500.00
131				$ 573,000.00
132			$ 15,000,000.00	
133				$ 5,000,000.00
134				$ 26,553,541.00
135	$ 3,299,870.00			
136				$ 6,200,000.00
137				$ 61,706,115.00
138				$ 6,255,950.00
139				$ 3,161,700.00
140			$ 5,372,000.00	
141			$ 7,480,000.00	
142				$ 8,759,000.00
143				$ 8,358,188.50
144			$ 44,730,000.00	
145			$ 8,640,000.00	
146				$ 3,952,200.00
147	$ 62,200,000.00			
148				$ 58,754,723.00
149				$ 920,000.00
150	$ 4,500,000.00			
151	$ 201,847,000.00			
152				$ 10,000,000.00

153				$ 1,952,900.00
154				$ 4,308,225.00
155			$ 5,420,000.00	
156			$ 11,900,000.00	
157			$ 6,300,000.00	
158			$ 2,646,000.00	
159	$ 1,000,000.00			
160				$ 4,999,990.00
161	$ 3,000,000.00			
162			$ 30,980,000.00	
163				$ 7,900,300.00
164	$ 20,000,000.00			
165				$ 3,541,600.00
166			$ 13,090,000.00	
167	$ 700,000.00			
168		$ 3,175,000.00		
169	$ 16,000,000.00			
170			$ 26,180,000.00	
171				$ 6,044,997.00
172				$ 7,665,600.00
173				$ 3,990,988.37
174	$ 6,000,000.00			
175			$ 9,990,000.00	
176			$ 44,000,000.00	
177				$ 63,874,585.00
178				$ 10,079,750.00
179	$ 415,393,000.00			
180				$ 5,000,000.00
181		$ 49,600,000.00		
182			$ 25,000,000.00	
183		$ 4,206,000.00		
184			$ 8,493,000.00	
185			$ 13,683,000.00	
186			$ 14,245,000.00	
187			$ 2,100,000.00	
188				$ 7,336,800.00
189				$ 4,134,000.00
190			$ 51,860,000.00	
191				$ 4,574,200.00
192				$ 25,000,000.00
193	$ 113,200,000.00			$ 48,960,000.00
194				$ 5,000,000.00
195				$ 5,000,000.00
196				$ 20,012,757.00

197				$ 25,129,474.00
198	$ 119,400,000.00			
199			$ 41,280,000.00	
200			$ 7,500,000.00	
201			$ 5,000,000.00	
202			$ 5,000,000.00	
203				$ 2,452,000.00
204				$ 1,050,000.00
205	$ 2,600,000.00			
206			$ 28,958,000.00	
207			$ 16,435,000.00	
208	$ 4,600,000.00		$ 5,000,000.00	
TOTAL	**$ 3,126,895,370.00**	**$ 248,996,000.00**	**$ 2,263,512,655.00**	**$ 4,786,861,115.69**

5. POLIZAS

5.1 CUADRO DE GARANTIAS, POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA

Pólizas iníciales del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A., las cuales fueron aprobadas por la Oficina jurídica de la E.S.E. departamental.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 28 de diciembre de 2023.

Amparo	**Vigencia**		**Valor asegurado**	**Fecha de aprobación**
	Desde	**Hasta**		
Cumplimiento del Contrato	28/12/2023	28/07/2025	$2,085,684,622.40	09/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	28/12/2023	28/07/2025	$10,428,423,112.00	09/01/2024
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28/12/2023	28/03/2028	$1,042,842,311.20	09/01/2024
Estabilidad y Calidad de las obras	28/03/2025	28/03/2030	$2,085,684,622.40	09/01/2024
TOTAL ASEGURADO	$15,642,634,668.00			

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 28 de diciembre de 2023.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación
		Desde	Hasta		
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	$1,042,842,311.20	09/01/2024
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20	

Ajuste a las vigencias de las pólizas iníciales del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A. expedida el 16 de enero de 2024.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 16 de enero de 2024.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	28/12/2023	28/09/2025	$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	28/12/2023	28/07/2025	$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28/12/2023	28/03/2028	$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	28/03/2025	28/03/2030	$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 16 de enero de 2024.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20

Pólizas actualizadas según acta de inicio del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 17 de enero de 2024.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/01/2024	15/10/2025	$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	16/01/2024	15/08/2025	$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	15/04/2028	$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	15/04/2024	15/04/2030	$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 17 de enero de 2024.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20

Pólizas actualizadas según Prórroga No. 1 del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 07 de abril de 2025.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/01/2024	15/06/2026	$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	16/01/2024	15/04/2026	$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	15/12/2028	$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	15/12/2025	15/12/2030	$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 07 de abril de 2025.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la perdida – Mínimo: 5 SMMLV	07/04/2025	15/03/2026	$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				$1,042,842,311.20

6 CERTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR OBRA

Durante el presente período de pago se realizó el Acta de Modificación No. 2 al contrato de obra, donde se establecen las mayores y menores cantidades de obra, lo que permite realizar el cobro total de algunos ítems, que requirieron mayor cantidad a ejecutar, en la presente Acta de Pago Parcial No. 9. A continuación, se certifica la ejecución de las cantidades de obra que se han desarrollado, en el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2025 al 16 de julio de 2025, que obedece al pago parcial No.09, por cada actividad. Como podemos observar hay un avance ejecutado acumulado del 38,02% y un avance del periodo del 3,41%, el cual ha sido constatado por esta interventoría, que ha aprobado las cantidades aquí reflejadas, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas del Contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	m3

Se ha finalizado la construcción de los tanques subterráneos del proyecto, para lo cual se han ejecutado 12,07 m^3 de muro en concreto de resistencia 3000 PSI.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,10	Viga aérea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 psi	ML

Se han construido 44,37 ml de viga aérea de las especificaciones descritas en el ítem, en la estructura del nuevo edificio del hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,11	Viga aérea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 psi	ml

Han sido construidos 13,76 ml de viga aérea en concreto de 3000 PSI según especificaciones descritas en el ítem, para la estructura de la edificación del nuevo hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	M2

Han sido utilizados 849,34 m^2 de formaleta, para la construcción de la placa de entrepiso del tercer piso y las vigas aéreas de la nueva edificación del hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg

Se ha realizado la figuración e instalación de acero de refuerzo en la estructura del edificio del Hospital, según los planos de diseño estructural. Se han ejecutado 23157,06 Kg de acero de refuerzo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,19	Malla electrosoldada	Kg

Se ha realizado la instalación de 2615,93 Kg de malla electrosoldada en la construcción de la placa de contrapiso del nuevo edificio del hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,20	Losa maciza elevada para entrepiso	M2

Se ha ejecutado la construcción de 274,12 m^2 de losa maciza de entrepiso del nuevo edificio del hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterráneo	m3

18,75 m^3 de concreto de 3000 PSI de las losas del tanque subterráneo de suministro se han construido.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3


Se ha ejecutado la construcción de 7,96 m^3 de muro pantalla en concreto de 3000 PSI en la zona de ascensores y escaleras.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4	CUBIERTA Y CIELORASO	
4,4	Estructura metálica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	Kg

Se ha realizado el suministro de 4702,13 Kg de estructura metálica en Acero ASTM-500 C la cual se ha soldado, pintado y se encuentra lista para ser izada en la cubierta de la edificación del nuevo hospital.

7. GRAFICA DE AVANCE Y CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA PAGO PARCIAL No. 09

7.1 GRAFICA DE AVANCE DE OBRA Y VERIFICACION DE LA PROGRAMACIÓN

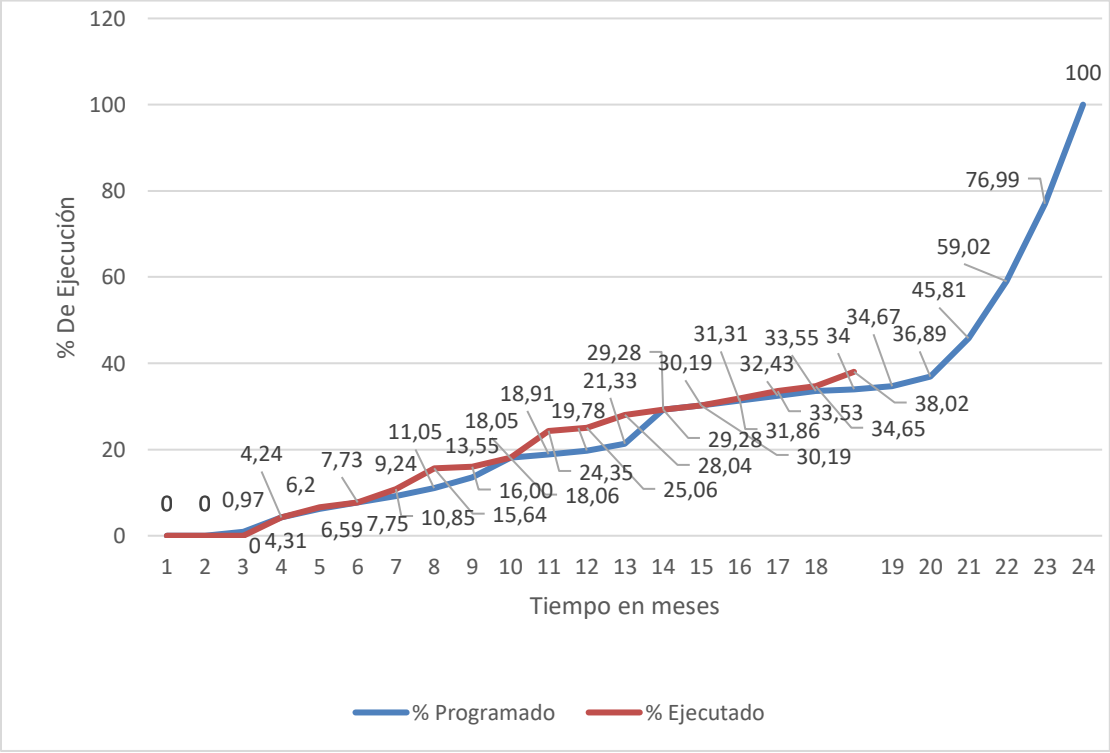

Según la gráfica de ejecución, en el presente periodo de pago se llegó a un avance del 38,02% de obras ejecutadas.



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA



NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
1	DEMOLICIONES Y DESMONTE													
1,1	Desmonte Marcos y puertas con transporte.	m2	186,70	$ 11.075,00	$ 2.067.702,50		186,70	$ 2.067.702,50		$ 0,00	186,70	$ 2.067.702,50	0,01%	0,01%
1,2	Desmonte de Ventanas, con transporte.	m2	199,25	$ 7.666,00	$ 1.527.450,50		199,25	$ 1.527.450,50		$ 0,00	199,25	$ 1.527.450,50	0,01%	0,01%
1,3	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	50,00	$ 16.522,00	$ 826.100,00		50,00	$ 826.100,00		$ 0,00	50,00	$ 826.100,00	0,00%	0,00%
1,4	Desmonte de Cielo Raso con retiro.	m2	1.675,92	$ 12.411,00	$ 20.799.843,12		1675,92	$ 20.799.843,12		$ 0,00	1675,92	$ 20.799.843,12	0,10%	0,10%
1,5	Desmonte de Luminarias,con retiro.	und	102,00	$ 20.711,00	$ 2.112.522,00		102,00	$ 2.112.522,00		$ 0,00	102,00	$ 2.112.522,00	0,01%	0,01%
1,6	Demolicion a mano de tableta piso,	m2	1.189,70	$ 13.434,00	$ 15.982.429,80		1189,70	$ 15.982.429,80		$ 0,00	1189,70	$ 15.982.429,80	0,08%	0,08%
1,7	Desmonte Cubierta, con correas y transporte.	m2	1.493,37	$ 13.688,00	$ 20.441.248,56		1493,37	$ 20.441.248,56		$ 0,00	1493,37	$ 20.441.248,56	0,10%	0,10%
1,8	Demolición Mecánica de Edificaciones con Equipo Pesado.(Inc. Vigas columnas,muros,cimentación con Retro excavadora con martillos hidráulico,cargue mecánico y retiro de escombros hasta 6km).	m3	1.346,12	$ 328.158,00	$ 441.740.046,96	2,42%	1346,12	$ 441.740.046,96		$ 0,00	1346,12	$ 441.740.046,96	2,12%	2,12%
TOTAL CAPITULO					$ 505.497.343,44		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 505.497.343,44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 505.497.343,44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	2,42%
2	PRELIMINARES													
2,1	Cerramiento en teja de Zinc	ml	156,00	$ 55.862,00	$ 8.714.472,00		156	$ 8.714.472,00		$ 0,00	156	$ 8.714.472,00	0,04%	0,04%
2,2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	3.142,13	$ 5.734,00	$ 18.016.973,42		3142,13	$ 18.016.973,42		$ 0,00	3142,13	$ 18.016.973,42	0,09%	0,09%
2,3	Excavacion manual en conglomerado	m3	257,40000	$ 54.147,00	$ 13.937.437,80		257,4	$ 13.937.437,80		$ 0,00	257,4	$ 13.937.437,80	0,07%	0,07%
2,4	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	685,78000	$ 20.081,00	$ 13.771.148,18		685,78	$ 13.771.148,18		$ 0,00	685,78	$ 13.771.148,18	0,07%	0,07%
2,5	Relleno en tierra negra abonada	m3	28,463	$ 93.409,00	$ 2.658.700,37	0,92%	0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
2,6	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.	m3	1.018,060	$ 133.049,00	$ 135.451.864,94		1018,06	$ 135.451.864,94		$ 0,00	1018,06	$ 135.451.864,94	0,65%	0,65%
TOTAL CAPITULO					$ 192.550.596,71		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 189.891.896,34	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 189.891.896,34	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,91%
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
3,1	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi	m3	43,9000	$ 1.253.553,00	$ 55.030.976,70		43,9	$ 55.030.976,70		$ 0,00	43,9	$ 55.030.976,70	0,26%	0,26%
3,2	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m3	159,3100	$ 1.424.598,00	$ 226.952.707,38		159,31	$ 226.952.707,38		$ 0,00	159,31	$ 226.952.707,38	1,09%	1,09%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	124,3300	$ 1.398.866,00	$ 173.921.009,78		124,33	$ 173.921.009,78		$ 0,00	124,33	$ 173.921.009,78	0,83%	0,83%
3,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m	m3	66,950000	$ 1.600.704,00	$ 107.167.132,80		66,95	$ 107.167.132,80		$ 0,00	66,95	$ 107.167.132,80	0,51%	0,51%
3,5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	m3	47,870	$ 1.778.552,00	$ 85.139.284,24		47,87	$ 85.139.284,24		$ 0,00	47,87	$ 85.139.284,24	0,41%	0,41%
3,6	Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de 3000 Psi 9-12 m	ml	23,00	$ 189.936,00	$ 4.368.528,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
3,7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	m3	24,01	$ 1.721.705,00	$ 41.338.137,05		11,94	$ 20.557.157,70	12,07	$ 20.780.979,35	24,01	$ 41.338.137,05	0,20%	0,20%
3,8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	174,5300	$ 1.830.947,00	$ 319.555.179,91		174,53	$ 319.555.179,91		$ 0,00	174,53	$ 319.555.179,91	1,53%	1,53%
3,9	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m	m3	131,3900	$ 1.870.473,00	$ 245.761.447,47		60,92	$ 113.949.215,16		$ 0,00	60,92	$ 113.949.215,16	1,18%	0,55%
3,10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	398,22	$ 247.718,00	$ 98.646.261,96		353,85	$ 87.655.014,30	44,37	$ 10.991.247,66	398,22	$ 98.646.261,96	0,47%	0,47%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
3,11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	185,06	$ 315.229,00	$ 58.336.278,74		171,3	$ 53.998.727,70	13,76	$ 4.337.551,04	185,06	$ 58.336.278,74	0,28%	0,28%
3,12	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psii 6-9 m	ml	145,93	$ 259.088,00	$ 37.808.711,84		36,98	$ 9.581.074,24		$ 0,00	36,98	$ 9.581.074,24	0,18%	0,05%
3,13	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi 6-9 m	ml	42,30	$ 319.663,00	$ 13.521.744,90		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
3,14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	ml	3.618,400	$ 40.167,00	$ 145.340.272,80		2041,6	$ 82.004.947,20		$ 0,00	2041,6	$ 82.004.947,20	0,70%	0,39%
3,15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	2.302,39	$ 41.783,00	$ 96.200.761,37	22,52%	1101,91	$ 46.041.105,53		$ 0,00	1101,91	$ 46.041.105,53	0,46%	0,22%
3,16	Viga canal concreto impermeabilizado de resistencia 3000 Psi	ml	77,40	$ 637.576,00	$ 49.348.382,40		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,24%	0,00%
3,17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	m2	2.935,20	$ 26.457,00	$ 77.656.586,40		1724,07	$ 45.613.719,99	849,34	$ 22.470.988,38	2573,41	$ 68.084.708,37	0,37%	0,33%
3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	144.295,35	$ 11.144,00	$ 1.608.027.380,40		115804,6	$ 1.290.526.462,40	23.157,06	$ 258.062.276,64	138961,66	$ 1.548.588.739,04	7,71%	7,42%
3,19	Malla electrosoldada	Kg	13.388,36	$ 10.215,00	$ 136.762.097,40		9387,9	$ 95.897.398,50	2.615,93	$ 26.721.724,95	12003,83	$ 122.619.123,45	0,66%	0,59%
3,20	Losa maciza elevada para entrepiso	m2	2.087,46	$ 128.715,00	$ 268.687.413,90		1677,6	$ 215.932.284,00	274,12	$ 35.283.355,80	1951,72	$ 251.215.639,80	1,29%	1,20%
3,21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2	2.143,37	$ 142.638,00	$ 305.726.010,06		2143,37	$ 305.726.010,06		$ 0,00	2143,37	$ 305.726.010,06	1,47%	1,47%
3,22	Dintel en concreto de 3000 psi 12 x 15 reforzado	ml	0,00	$ 65.910,00	$ 0,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,23	Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	92,0265	$ 312.479,00	$ 28.756.348,69		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
3,24	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m2	92,0265	$ 75.479,00	$ 6.946.068,19		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
3,25	concreto viga de cimentacion cerramiento no incluye refuerzo	m3	44,54000	$ 1.495.710,00	$ 66.618.923,40		35,89	$ 53.681.031,90		$ 0,00	35,89	$ 53.681.031,90	0,32%	0,26%
3,26	Concreto para escalera	m3	14,440000	$ 1.910.522,00	$ 27.587.937,68		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
3,27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterraneo	m3	27,57	$ 1.721.705,00	$ 47.467.406,85		8,82	$ 15.185.438,10	18,75	$ 32.281.968,75	27,57	$ 47.467.406,85	0,23%	0,23%
3,28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3	38,9100	$ 1.910.526,00	$ 74.338.566,66		22,76	$ 43.483.571,76	7,96	$ 15.207.786,96	30,72	$ 58.691.358,72	0,36%	0,28%
3,29	Losa para rampa en concreto de 3000 Psi	m3	33,290000	$ 1.910.526,00	$ 63.601.410,54		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,30%	0,00%
3,30	Lamina metaldeck 2" Cal. 22 Suministro e Instal.	m2	1.677,600	$ 134.441,00	$ 225.538.221,60		1677,6	$ 225.538.221,60		$ 0,00	1677,6	$ 225.538.221,60	1,08%	1,08%
TOTAL CAPITULO					$ 4.696.151.189,12		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 3.673.137.670,95	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 426.137.879,53	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 4.099.275.550,48	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	19,65%
4	CUBIERTA Y CIELORASO													
4,1	suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	m2	1.405,74	$ 254.888,00	$ 358.306.257,12			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,72%	0,00%
4,2	tapas protectoras de remates para teja flanching y cumbrera calibre 26	ml	338,66	$ 80.901,00	$ 27.397.932,66			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
4,3	Cielo raso en lamina PVC 9 mm, incluye estructura	m2	3.218,4025	$ 131.627,00	$ 423.628.665,87			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	2,03%	0,00%
4,4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	16.436,78	$ 25.829,00	$ 424.545.590,62	7,08%	10112,9342	$ 261.206.977,45	4.702,1300	$ 121.451.315,77	14815,0642	$ 382.658.293,22	2,04%	1,83%
4,5	acero estructural t astm a36 (incluye suministro montaje y pintura)	kg	135,00	$ 25.101,00	$ 3.388.635,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
4,6	suministro e instalacion de tubo 2" galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura	und	1.143,23529411765	$ 208.821,00	$ 238.731.537,35		888	$ 185.433.048,00		$ 0,00	888	$ 185.433.048,00	1,14%	0,89%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
TOTAL CAPITULO					$ 1.475.998.618,62		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 446.640.025,45	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 121.451.315,77	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 568.091.341,22	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	2,72%
5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES													
5,1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m2	5.198,8500	$ 82.304,00	$ 427.886.150,40		2847,49	$ 234.359.816,96		$ 0,00	2847,49	$ 234.359.816,96	2,05%	1,12%
5,2	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4	m2	12.620,970	$ 36.808,00	$ 464.552.663,76		2847,48	$ 104.810.043,84		$ 0,00	2847,48	$ 104.810.043,84	2,23%	0,50%
5,3	Filos y dilataciones 1:4	ml	7.097,60	$ 12.396,00	$ 87.981.849,60	4,70%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,42%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 980.420.663,76		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 339.169.860,80	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 339.169.860,80	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	1,63%
6	PISOS Y ENCHAPES													
6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	m2	3.263,6275	$ 36.852,00	$ 120.271.200,63		969,08	$ 35.712.536,16		$ 0,00	969,08	$ 35.712.536,16	0,58%	0,17%
6,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m2	2.720,9607	$ 172.550,00	$ 469.501.768,79			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	2,25%	0,00%
6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	ml	2.905,78	$ 38.562,00	$ 112.052.688,36			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,54%	0,00%
6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ml	2.905,78	$ 24.797,00	$ 72.054.626,66			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,35%	0,00%
6,5	Dilatacion palstica para mediacaña	ml	2.905,78	$ 4.160,00	$ 12.088.044,80			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
6,6	Enchape pared cerámica rectificada 30x60 cm brllante de 1a calidad instalada	m2	1.332,1053	$ 64.486,00	$ 85.902.142,38			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,41%	0,00%
6,7	Win media luna plastico	ml	370,70	$ 4.160,00	$ 1.542.112,00	5,16%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
6,8	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	269,3446	$ 41.535,00	$ 11.187.227,96			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
6,9	Piso en concreto estampado. Suministro e instal.	m2	826,29	$ 201.270,00	$ 166.307.388,30			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,80%	0,00%
6,10	sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto 3,000 psi (fundido en sitio, mezcla en obra. incluye suministro, formaleta y construcción)	ml	153,55	$ 164.298,00	$ 25.227.957,90			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 1.076.135.157,77		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 35.712.536,16	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 35.712.536,16	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,17%
7	ESTUCO Y PINTURA													
7,1	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11.794,5637	$ 27.240,00	$ 321.283.915,19			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,54%	0,00%
7,2	Estuco en filos y dilataciones	ml	7.097,60	$ 10.690,00	$ 75.873.344,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,36%	0,00%
7,3	Pintura exterior tipo koraza o similar 3 manos sobre muros	m2	1.700,676	$ 29.611,00	$ 50.358.717,04			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,24%	0,00%
7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	m2	11.794,5637	$ 19.555,00	$ 230.642.693,15	3,25%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,11%	0,00%
7,5	Lineas de trafico de ancho 0.10 m, demarcacion	ml	59,44	$ 7.078,00	$ 420.716,32			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 678.579.385,70		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
8	CARPINTERIA METALICA - MADERA													
8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	521,4117	$ 462.017,00	$ 240.901.069,40			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,16%	0,00%
8,2	Puerta en RH incluye marco y chapa	m2	436,32	$ 767.518,00	$ 334.883.453,76			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,61%	0,00%
8,3	Puerta doble en RH con batiente incluye protector de acero y manija de seguridad	m2	115,20	$ 986.466,00	$ 113.640.883,20			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,54%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
8,4	Puerta en vidrio templado 10 mm, con zocalo, chapa e Instalada	m2	10,80	$ 1.967.605,00	$ 21.250.134,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
8,5	zocalo de proteccion	ml	649,88	$ 55.564,00	$ 36.109.932,32			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,17%	0,00%
8,6	Puerta en aluminio con marco y chapa	m2	4,32	$ 462.350,00	$ 1.997.352,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
8,7	Puerta doble en aluminio con marco y chapa	m2	3,60	$ 924.700,00	$ 3.328.920,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
8,8	Puerta Antipanico incluye accesorios	m2	13,20	$ 1.235.450,00	$ 16.307.940,00	4,35%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
8,9	Ventana aluminio tipo celosia o similar, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	127,21	$ 468.520,00	$ 59.600.429,20			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,29%	0,00%
8,10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ml	79,16	$ 796.520,00	$ 63.053.952,65			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,30%	0,00%
8,11	Suministro e instalación de lamina en acero inoxidable pintada para fachada incluye accerios de anclaje	m2	57,3090650320641	$ 283.480,00	$ 16.245.973,76			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 907.320.040,28		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
9	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													
9,1	Sanitario discapacitados incluye griferia antivandalica	und	29,00	$ 1.654.305,00	$ 47.974.845,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,23%	0,00%
9,2	Lavamanos pedestal con griferia cromada	und	57,00	$ 299.325,00	$ 17.061.525,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
9,3	lavamanos de empotrar	und	26,00	$ 566.382,00	$ 14.725.932,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
9,4	Sanitario ecoclean instalado	und	28,00	$ 485.767,00	$ 13.601.476,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
9,5	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada) con registro o valvula	und	25,00	$ 115.483,00	$ 2.887.075,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
9,6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridero y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	19,00	$ 260.685,00	$ 4.953.015,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
9,7	Lavaplatos acero inoxidable de sobreponer doble grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	10,00	$ 260.678,00	$ 2.606.780,00	0,62%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
9,8	Suministro e instalacion de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable L=1.5 mts	und	58,00	$ 273.940,00	$ 15.888.520,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
9,9	pasamanos en acero inoxidable cal.18 2" incluye soportes	und	25,00	$ 204.701,00	$ 5.117.525,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
9,10	Espejo 5 mm. Suministro e instal.	m2	75,60	$ 58.733,00	$ 4.440.214,80			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 129.256.907,80		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
10	INSTALACIONES HIDRAULICAS													
10,1	Tubo presión RDE 21 PVC 1/2"	ml	309,00	$ 15.303,00	$ 4.728.627,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
10,2	Tubo presión RDE 21 PVC 3/4"	ml	139,00	$ 22.354,00	$ 3.107.206,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,3	Tubo presión RDE 21 PVC 1"	ml	299,00	$ 23.736,00	$ 7.097.064,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
10,4	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/4"	ml	159,00	$ 25.126,00	$ 3.995.034,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
10,5	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/2"	ml	109,20	$ 28.226,00	$ 3.082.279,20			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,6	Tubo presión RDE 21 PVC 2"	ml	42,00	$ 35.103,00	$ 1.474.326,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,7	Tubo presión RDE 21 PVC 2 1/2"	ml	25,00	$ 49.267,00	$ 1.231.675,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,8	Tubo presión RDE 21 PVC 3"	ml	47,00	$ 38.624,00	$ 1.815.328,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,9	Válvula de bola PVC 3/4" roscada	und	29,00	$ 22.081,00	$ 640.349,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,10	Válvula de bola PVC 1" roscada	und	62,00	$ 37.963,00	$ 2.353.706,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
10,11	Válvula de bola PVC 1 1/4" roscada	und	5,00	$ 42.686,00	$ 213.430,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,12	Válvula de bola PVC 3" roscada	und	3,00	$ 54.332,00	$ 162.996,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,13	suministro e instalacion de llave terminal (cuartos aseo)	und	45,00	$ 26.773,00	$ 1.204.785,00	0,20%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
10,14	suministro e instalacion de llave de paso	und	26,00	$ 22.737,00	$ 591.162,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,15	Camara de registro para medidor, diametro 1 1/2" (incluye caja en concreto, tapa metalica, registro de bola, filtro, medidor y acoples)	und	1,00	$ 536.449,00	$ 536.449,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
10,16	Punto hidráulico	und	285,00	$ 36.722,00	$ 10.465.770,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 42.700.186,20		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
11	REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS													
11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	300,50	$ 65.105,00	$ 19.564.052,50			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
11,2	aguas lluvias 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16,00	$ 96.814,00	$ 1.549.024,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
11,3	aguas lluvias 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16,00	$ 120.816,00	$ 1.933.056,00	0,11%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 23.046.132,50		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES														
12,1	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	262,15	$ 30.792,00	$ 8.072.122,80		106,33	$ 3.274.113,36		$ 0,00	106,33	$ 3.274.113,36	0,04%	0,02%
12,2	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	11,00	$ 50.310,00	$ 553.410,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,3	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	532,50	$ 77.689,00	$ 41.369.392,50		327,82	$ 25.468.007,98		$ 0,00	327,82	$ 25.468.007,98	0,20%	0,12%
12,4	Tuberia 6" A.N. (Incluye accesorios)	ml	49,50	$ 83.088,00	$ 4.112.856,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
12,5	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	82,00	$ 28.103,00	$ 2.304.446,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
12,6	sifon Sanitario PVC 3" 180° Suministro e Instal.	und	6,00	$ 32.697,00	$ 196.182,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,7	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6,00	$ 584.753,00	$ 3.508.518,00		6	$ 3.508.518,00		$ 0,00	6	$ 3.508.518,00	0,02%	0,02%
12,8	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3,00	$ 669.407,00	$ 2.008.221,00		3	$ 2.008.221,00		$ 0,00	3	$ 2.008.221,00	0,01%	0,01%
12,9	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1,00	$ 809.267,00	$ 809.267,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,10	Rejilla sifon	und	82,00	$ 24.127,00	$ 1.978.414,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS														
12,11	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	148,00	$ 30.792,00	$ 4.557.216,00	0,47%	109,32	$ 3.366.181,44		$ 0,00	109,32	$ 3.366.181,44	0,02%	0,02%
12,12	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	150,00	$ 50.310,00	$ 7.546.500,00		113,96	$ 5.733.327,60		$ 0,00	113,96	$ 5.733.327,60	0,04%	0,03%
12,13	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	56,50	$ 77.689,00	$ 4.389.428,50		53,39	$ 4.147.815,71		$ 0,00	53,39	$ 4.147.815,71	0,02%	0,02%
12,14	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	11,00	$ 28.103,00	$ 309.133,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,15	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6,00	$ 584.752,00	$ 3.508.512,00		3	$ 1.754.256,00		$ 0,00	3	$ 1.754.256,00	0,02%	0,01%
12,16	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3,00	$ 669.412,00	$ 2.008.236,00		1	$ 669.412,00		$ 0,00	1	$ 669.412,00	0,01%	0,00%
12,17	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1,00	$ 809.272,00	$ 809.272,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,18	Rejilla sifon	und	11,00	$ 24.127,00	$ 265.397,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
12,19	tuberia ventilacion d=2"	ml	177,50	$ 39.790,00	$ 7.062.725,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
12,20	tuberia ventilacion d=3"	ml	42,00	$ 49.360,00	$ 2.073.120,00		0	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 97.442.368,80		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 49.929.853,09	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 49.929.853,09	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,24%
13	INSTALACIONES ELECTRICAS													
RED DE MEDIA TENSION														
13,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG.	und	1,00	$ 3.080.269,00	$ 3.080.269,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,2	Estructura de paso NC510	und	1,00	$ 679.537,00	$ 679.537,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
13,3	Estructura NC 730	und	1,00	$ 2.532.145,00	$ 2.532.145,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,4	Bajante de media Tension en Tubo IMC de 4"	und	1,00	$ 2.538.279,00	$ 2.538.279,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,5	Caja de paso CS 275	und	3,00	$ 1.789.897,00	$ 5.369.691,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
13,6	Canalizacion Subterranea de 2x4"; incluye excavacion	ml	19,00	$ 237.485,00	$ 4.512.215,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,7	CTS518-2 Celda para transformador tipo seco (Nivel 2) de 225 KVA	und	1,00	$ 7.794.891,00	$ 7.794.891,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
13,8	Instalacion transformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1,00	$ 8.965.230,00	$ 8.965.230,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
13,9	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG COBRE	ml	45,00	$ 403.588,00	$ 18.161.460,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
13,10	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1,00	$ 1.335.101,00	$ 1.335.101,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,11	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1,00	$ 753.826,00	$ 753.826,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
13,12	Malla de puesta a tierra de la subestaciòn conformada por 8 varillas de cobre de 2.44m; 50m de cable desnudo 2/0, Soldadura exotermina y caja de inspeccion para SPT	und	1,00	$ 7.553.032,00	$ 7.553.032,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
TABLEROS DE DISTRIBUCION														
13,13	Tablero General de medida semidirecta en Baja Tension según Norma AE 319, con totalizador de 630A, 3 transformadores de corriente tipo barra pasante de 600/5 A, Calibrados y homologados, Bloque de pruebas y Medidor trifasico electronico de 220V; 10A.	und	1,00	$ 12.522.824,00	$ 12.522.824,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,14	Tablero de Distribucion General del Sistema Normal. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con Barraje 3F+N+T de 800Amp, totallizador de 630Amp. Protecciones según diagrama unifilar. DPS calse I, II Elementos de Medida.	und	1,00	$ 31.239.059,00	$ 31.239.059,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
13,15	instalacion planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1,00	$ 24.560.229,00	$ 24.560.229,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
13,16	Tablero de Distribucion General del Sistema Emergenca Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1,00	$ 21.476.059,00	$ 21.476.059,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
13,17	Transferencia automatica motorizada de 600A-220 Vac	und	1,00	$ 23.637.686,00	$ 23.637.686,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,18	Transferencia automatica motorizada de 200A-220 Vac	und	1,00	$ 10.704.140,00	$ 10.704.140,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
13,19	Transferencia automatica motorizada de 100A-220 Vac	und	2,00	$ 4.967.946,00	$ 9.935.892,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
13,20	Tablero de Distribucion General Sistema Normal con suplencia Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1,00	$ 23.629.289,00	$ 23.629.289,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,21	Tablero de Distribucion del Sistema Vital que contiene Totalizador de 3x100A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	2,00	$ 7.667.146,00	$ 15.334.292,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
13,22	Tablero de Distribucion del Sistema Critico que contiene Totalizador de 3x80A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar.	und	2,00	$ 7.989.135,00	$ 15.978.270,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
13,23	Tablero de Distribucion del Sistema Regulado que contiene Totalizador de 3x50A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	1,00	$ 4.668.036,00	$ 4.668.036,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,24	Tablero de Aire Acondicionado Central con totalizador de 500A; 2 protecciones de 260A, 2 de 63A y 4 de 32A	und	1,00	$ 24.046.534,00	$ 24.046.534,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
13,25	Tablero de Aire Acondicionado TAA1 y TAA2 ycompresores TCMP con totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A	und	3,00	$ 5.315.900,00	$ 15.947.700,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
13,26	Tablero de Ascensores 1 con Totalizador de 100A, 2 de 3x63A y 3x10A	und	1,00	$ 3.276.271,00	$ 3.276.271,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,27	Tablero de Ascensores 2 con 1 taco de 3x63A y 3x10A	und	1,00	$ 1.516.287,00	$ 1.516.287,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,28	Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA trifasica de 50A	und	1,00	$ 1.749.894,00	$ 1.749.894,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,29	Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 2.772.480,00	$ 5.544.960,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
13,30	instalacion UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 1.122.481,00	$ 2.244.962,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,31	Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3,00	$ 682.481,00	$ 2.047.443,00	7,91%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,32	instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 554.496,00	$ 1.108.992,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,33	instalacion tablero Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2,00	$ 654.896,00	$ 1.309.792,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS														
13,34	Caja de paso CS 275	und	1,00	$ 1.789.897,00	$ 1.789.897,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,35	Caja de Inspeccion CS 274	und	4,00	$ 1.633.489,00	$ 6.533.956,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
13,36	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+20ø2"; incluye excavacion	ml	20,00	$ 906.938,00	$ 18.138.760,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
13,37	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+12ø2"; incluye excavacion	ml	3,15	$ 635.105,00	$ 2.000.580,75			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,38	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+5ø2"; incluye excavacion	ml	5,50	$ 444.519,00	$ 2.444.854,50			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,39	Canalizacion Subterranea de 4x2"; incluye excavacion	ml	10,30	$ 280.256,00	$ 2.886.636,80			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,40	Canalizacion Subterranea de 2x4"8x2"; incluye excavacion	ml	20,53	$ 520.829,00	$ 10.692.619,37			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
13,41	Canalizacion Subterranea de 1x1"; incluye excavacion	ml	89,42	$ 39.719,00	$ 3.551.672,98			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,42	Canalizacion Subterranea de 1x2"; incluye excavacion	ml	44,16	$ 58.669,00	$ 2.590.823,04			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,43	Acometida Parcial en 2(3X250+1X250N)+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para TAAC	ml	167,35	$ 2.026.175,00	$ 339.080.386,25			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,63%	0,00%
13,44	Acometida Parcial en 3X250+1X250N+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para Banco de reactiva	ml	12,00	$ 1.039.597,00	$ 12.475.164,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,45	Acometida Parcial en 3X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	246,04	$ 337.699,00	$ 83.087.461,96			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,40%	0,00%
13,46	Acometida Parcial en 2X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	111,68	$ 273.916,00	$ 30.590.938,88			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
13,47	Acometida Parcial en 3X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	110,84	$ 201.526,00	$ 22.337.141,84			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,48	Acometida Parcial en 2X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	170,61	$ 132.156,00	$ 22.547.135,16			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,49	Acometida Parcial en 2X6+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	184,35	$ 121.579,00	$ 22.413.088,65			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,50	Acometida Parcial en 2X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	203,15	$ 64.403,00	$ 13.083.469,45			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,51	Acometida Parcial en 3X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	232,94	$ 88.000,00	$ 20.498.720,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
13,52	Tablero de 18 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	4,00	$ 1.085.293,00	$ 4.341.172,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,53	Tablero de 18 Circuitos bifasico	und	2,00	$ 743.874,00	$ 1.487.748,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,54	Tablero de 12 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	1,00	$ 879.174,00	$ 879.174,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
13,55	Tablero de 12 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	2,00	$ 571.515,00	$ 1.143.030,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,56	Tablero de 8 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	11,00	$ 330.878,00	$ 3.639.658,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,57	Interruptor Industrial 3x100A	und	5,00	$ 224.196,00	$ 1.120.980,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,58	Interruptor Industrial 3x80A	und	4,00	$ 224.196,00	$ 896.784,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
13,59	Interruptor enchufable 1x15A	und	90,00	$ 28.982,00	$ 2.608.380,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,60	Interruptor enchufable 1x20A	und	92,00	$ 28.982,00	$ 2.666.344,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
	INSTALACIONES INTERNAS													
13,61	Salidas iluminación interior a 110v en tuberia PVC SCH40	und	482,00	$ 257.078,00	$ 123.911.596,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,59%	0,00%
13,62	Salidas iluminación de evacuacion y emergencia a 110v en tuberia PVC SCH40	und	140,00	$ 369.215,00	$ 51.690.100,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,25%	0,00%
13,63	Lámpara 60x60 tipo led de 53 W Mx-120Vac	und	172,00	$ 212.048,00	$ 36.472.256,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,17%	0,00%
13,64	Lámpara redonda de 8" tipo led de 24 W Mx- 120Vac	und	276,00	$ 110.073,00	$ 30.380.148,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
13,65	Lámpara aplique en pared tipo tortuga con bombillo LED de 12W- 120Vac	und	6,00	$ 116.673,00	$ 700.038,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
13,66	Lámpara de Evacuación Rectangular "SALIDA" Verde 120-130V	und	21,00	$ 230.523,00	$ 4.840.983,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,67	Lámpara de Emergencia R1LED 2x1,6W Unv.	und	87,00	$ 209.073,00	$ 18.189.351,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
13,68	Lámpara Rectangular Led 50W hermetica	und	27,00	$ 309.997,00	$ 8.369.919,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
13,69	Salida toma 120 V normal	und	565,00	$ 229.131,00	$ 129.459.015,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,62%	0,00%
13,70	Salida toma 120 V normal grado hospitalario	und	58,00	$ 230.781,00	$ 13.385.298,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,71	Salida toma 120 V normal Naranja grado hospitalario	und	160,00	$ 256.356,00	$ 41.016.960,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,20%	0,00%
13,72	Salida toma 220 V A.A.	und	36,00	$ 382.438,00	$ 13.767.768,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
13,73	Salida de TV en Tuberia EMT de 3/4" y Cable Coaxial	und	16,00	$ 368.274,00	$ 5.892.384,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
13,74	Lámpara Highby de 100W	und	11,00	$ 426.646,00	$ 4.693.106,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
13,75	lampara wall pack LED de 100W	und	15,00	$ 443.247,00	$ 6.648.705,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRATRAYOS (SIPRA)													
13,76	Cable de cobre desnudo 2/0	und	215,26	$ 94.814,00	$ 20.409.661,64			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
13,77	Caja de inspeccion AP280	und	4,00	$ 244.226,00	$ 976.904,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
13,78	Varilla de cobre 2.44mx5/8"	und	4,00	$ 381.178,00	$ 1.524.712,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,79	Punto de soldadura exotermica	und	8,00	$ 155.428,00	$ 1.243.424,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
13,80	Alambron de aluminio de 8mm con accesorios de unio	ml	352,00	$ 66.690,00	$ 23.474.880,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
13,81	Punta captadora de 1.2m con base	und	42,00	$ 297.860,00	$ 12.510.120,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
13,82	Trancision Alambron- cable de cobre	und	4,00	$ 1.866.119,00	$ 7.464.476,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS													
13,83	Rack de telecomunicaciones, equipado	und	1,00	$ 28.965.499,00	$ 28.965.499,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
13,84	Salida de voz y datos aparateada	und	37,00	$ 1.399.278,00	$ 51.773.286,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,25%	0,00%
13,85	Salida de datos aparateada categoria 6	und	23,00	$ 1.332.768,00	$ 30.653.664,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
13,86	Cable UTP categoria 6	ml	3.127,00	$ 9.711,00	$ 30.366.297,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,15%	0,00%
	TOTAL CAPITULO				$ 1.650.061.414,27		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
14	INSTALACIONES ESPECIALES													
	INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES													
14,1	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1/2" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	350,00	$ 78.890,00	$ 27.611.500,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
14,2	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 3/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	420,00	$ 90.903,00	$ 38.179.260,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,18%	0,00%
14,3	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	120,00	$ 176.295,00	$ 21.155.400,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
14,4	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1-1/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	90,00	$ 196.286,00	$ 17.665.740,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
14,5	Toma Tipo Amico, Chemetrón, Gentec ó similar, Quick Connect para Oxígeno	ml	53,00	$ 539.969,00	$ 28.618.357,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
14,6	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	12,00	$ 183.713,00	$ 2.204.556,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
14,7	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	3,00	$ 111.510,00	$ 334.530,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
14,8	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x3/4". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	5,00	$ 2.514.455,00	$ 12.572.275,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
14,9	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x1". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	1,00	$ 2.322.489,00	$ 2.322.489,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
14,10	PANEL DE CABECERA TROQUELADO COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE, PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO MEDICO PUNTO ELECTRICO REGULADO, NORMAL Y EMERGENCIA, DE 1,9MTS, CON TOMA DE OXIGENO Y VACIO, ATRIL SE SERVICIOS INTEGRADO DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE, CANASTA DE ACCESORIOS TROQUELADA CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	27,00	$ 7.899.998,00	$ 213.299.946,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,02%	0,00%
14,11	COLUMNA DE SERVICIOS PISO TECHO, INCLUYE SEIS TOMASDE OXIGENO,2DE VACIO 2 DE AIRE TIPO CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS, DOS DE ELLAS REGULADAS, CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	2,00	$ 29.899.997,00	$ 59.799.994,00	3,25%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,29%	0,00%
14,12	Alarma de Área para DOS señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	3,00	$ 8.899.998,00	$ 26.699.994,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
14,13	Central para Oxigeno, Control Automatico Amico o similar microcontrolado, Estructura para Manifold 3x3 con soportes,ángulos, colectores, válvulas de corte de alta presión por cilindro y Mangueras importadas.	und	1,00	$ 53.400.000,00	$ 53.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,26%	0,00%
14,14	Alarma de Maestra para central de Gases de 10 señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	1,00	$ 4.565.801,00	$ 4.565.801,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
14,15	Sistema de Vacio Duplex de 3 hp según cumplimiento de Norma NFPA 99, este sistema cuenta con Dos Bombas de Anillo liquido de 3 HP, con un Tanque Acomulador de 100 Galones, Tablero Electrico con selectores de Bomba Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo, Acople Flexible a la Unidad de Vacio y Drenaje Tanque Acumulador	und	1,00	$ 116.299.997,00	$ 116.299.997,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,56%	0,00%
LLAMADO DE ENFERMERIA														
14,16	CONSOLA de llamado de enfermeria, incluye display a bajo voltaje, comunicación bidireccional, incluye unidad master de control y receptor de meson	und	2,00	$ 12.999.998,00	$ 25.999.996,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
14,17	pulsador para llamado de enfermeria con altavoz, senaluminosa y a bajo voltaje	und	24,00	$ 320.000,00	$ 7.680.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
14,18	DISPLAY DOBLE SENTIDOS VISUALIZADOR TIPO LED	und	2,00	$ 4.799.998,00	$ 9.599.996,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
14,19	TABLERO PARA USO EN BAÑOS	und	21,00	$ 179.999,00	$ 3.779.979,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
14,20	Cable UTP categoria 6. Suministro e instalación.	ml	647,00	$ 9.042,00	$ 5.850.174,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 677.639.984,00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%
15	RED CONTRAINCENDIOS													
15,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO E	ml	565,04	$ 87.539,00	$ 49.463.036,56			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,24%	0,00%
15,2	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2"	ml	212,97	$ 113.768,00	$ 24.229.170,96			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
15,3	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E	ml	58,28	$ 151.691,00	$ 8.840.551,48			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
15,4	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2"	ml	82,46	$ 189.614,00	$ 15.635.570,44			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
15,5	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO E	ml	207,17	$ 227.542,00	$ 47.139.876,14			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,23%	0,00%
15,6	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E	ml	101,52	$ 262.847,00	$ 26.684.227,44			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
15,7	SOPORTE TIPO PERA 1"	und	141,00	$ 36.026,00	$ 5.079.666,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
15,8	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	und	46,00	$ 38.540,00	$ 1.772.840,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,9	SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13,00	$ 41.520,00	$ 539.760,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
15,10	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	und	18,00	$ 45.650,00	$ 821.700,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
15,11	SOPORTE TIPO PERA 3"	und	45,00	$ 48.752,00	$ 2.193.840,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,12	SOPORTE TIPO PERA 4"	und	22,00	$ 54.560,00	$ 1.200.320,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,13	STRAP 1"x1/2"	und	120,00	$ 92.731,00	$ 11.127.720,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
15,14	STRAP 1 1/2"x1/2"	und	170,00	$ 77.666,00	$ 13.203.220,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
15,15	ROCIADOR PENDENT - ACCION	und	290,00	$ 289.021,00	$ 83.816.090,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,40%	0,00%
15,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	2,00	$ 4.683.605,00	$ 9.367.210,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
15,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	26,00	$ 186.940,00	$ 4.860.440,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
15,18	EXTINTOR CLASE BC SEGÚN NTC	und	12,00	$ 165.840,00	$ 1.990.080,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,19	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	und	1,00	$ 1.425.620,00	$ 1.425.620,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
15,20	CUARTO DE BOMBAS RED INCENDIO	und	1,00	$ 6.545.230,00	$ 6.545.230,00	1,89%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
15,21	ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE (	und	1,00	$ 5.489.056,00	$ 5.489.056,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
DETECCIÓN DE INCENDIOS														
15,22	Detector o sensor de humo certificado UL/FM. Suministro e Instal. O similar	und	86,00	$ 346.501,00	$ 29.799.086,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
15,23	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	11,00	$ 1.186.000,00	$ 13.046.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
15,24	Cableado de incendios (3x22 awg-3x16 awg) para dispositivos de entrada o salida . Incluye tuberia conduit EMT Ø 1" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	ml	845,00	$ 26.109,00	$ 22.062.105,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
15,25	Alarma automatica visual y sonora	und	19,00	$ 430.738,00	$ 8.184.022,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
TOTAL CAPITULO					**$ 394.516.438,02**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0,00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0,00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0,00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0,00%**
16	**RED DE VENTILACION MECANICA**													
CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS														
16,1	Conductos INTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion) 20 mm	m2	754,00	$ 220.000,00	$ 165.880.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,80%	0,00%
16,2	Conductos EXTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)30 mm	m2	120,00	$ 280.000,00	$ 33.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,16%	0,00%
16,3	Conductos metalicos en lamina galvanizada calibre 24 (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)	m2	280,00	$ 150.000,00	$ 42.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,20%	0,00%
16,4	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 6"x6"	und	11,00	$ 125.000,00	$ 1.375.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,5	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 9"x9"	und	9,00	$ 186.000,00	$ 1.674.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,6	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 12"x12"	und	22,00	$ 284.000,00	$ 6.248.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,7	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 15"x12"	und	5,00	$ 340.000,00	$ 1.700.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,8	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 15"x9"	und	2,00	$ 270.000,00	$ 540.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,9	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 12"x9"	und	2,00	$ 230.000,00	$ 460.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,10	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 9"x6"	und	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,11	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 16"x16"	und	3,00	$ 420.000,00	$ 1.260.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,12	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 22"x22"	und	1,00	$ 740.000,00	$ 740.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,13	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 14"x14"	und	5,00	$ 340.000,00	$ 1.700.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,14	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 8"x8"	und	3,00	$ 150.000,00	$ 450.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,15	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 6"x6"	und	48,00	$ 110.000,00	$ 5.280.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,16	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 8"x8"	und	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA



NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
16,17	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 12"x12"	und	7,00	$ 260.000,00	$ 1.820.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,18	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 14"x12"	und	2,00	$ 300.000,00	$ 600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,19	Rejilla tipo louver con damper de 16"X12"	und	2,00	$ 380.000,00	$ 760.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,20	Rejilla tipo louver con damper de 12"X12"	und	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,21	Rejilla tipo louver con damper de 26"X18"	und	1,00	$ 890.000,00	$ 890.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,22	Rejilla tipo louver con damper de 20"X10"	und	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,23	Rejilla tipo louver con damper de 20"X16"	und	1,00	$ 480.000,00	$ 480.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,24	Rejilla tipo louver con damper de 20"X20"	und	1,00	$ 780.000,00	$ 780.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,25	Rejilla tipo louver con damper de 30"X24"	und	1,00	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
	TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA													
16,26	Tuberias hidronica aislada termicamente de 4" de diametro	ml	14,00	$ 580.000,00	$ 8.120.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
16,27	Tuberias hidronica aislada termicamente de 3" de diametro	ml	55,00	$ 470.000,00	$ 25.850.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
16,28	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2,5" de diametro	ml	60,00	$ 432.000,00	$ 25.920.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
16,29	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2" de diametro	ml	95,00	$ 370.000,00	$ 35.150.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,17%	0,00%
16,30	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,5" de diametro	ml	120,00	$ 205.000,00	$ 24.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
16,31	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,25" de diametro	ml	82,00	$ 180.000,00	$ 14.760.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
16,32	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1" de diametro	ml	170,00	$ 135.000,00	$ 22.950.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
16,33	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,75" de diametro	ml	230,00	$ 118.000,00	$ 27.140.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,13%	0,00%
16,34	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,5" de diametro	ml	40,00	$ 105.000,00	$ 4.200.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,35	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 4"	und	3,00	$ 495.000,00	$ 1.485.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,36	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 3"	und	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,37	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2,5"	und	10,00	$ 180.000,00	$ 1.800.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,38	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2"	und	6,00	$ 138.000,00	$ 828.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,39	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,5"	und	16,00	$ 95.000,00	$ 1.520.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,40	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,25"	und	18,00	$ 67.000,00	$ 1.206.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,41	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1"	und	18,00	$ 54.000,00	$ 972.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,42	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 4"	und	2,00	$ 420.000,00	$ 840.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,43	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 3"	und	12,00	$ 210.000,00	$ 2.520.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,44	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2,5"	und	8,00	$ 200.000,00	$ 1.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,45	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2"	und	18,00	$ 158.000,00	$ 2.844.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
16,46	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1,5"	und	12,00	$ 83.000,00	$ 996.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,47	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1"	und	40,00	$ 47.000,00	$ 1.880.000,00	3,90%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,48	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,75"	und	94,00	$ 38.000,00	$ 3.572.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,49	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,5"	und	16,00	$ 34.000,00	$ 544.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,50	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 4"	und	2,00	$ 694.000,00	$ 1.388.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,51	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 3"	und	6,00	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,52	Tuberia hidronica Eliminador de vibracion de 3"	und	6,00	$ 1.250.000,00	$ 7.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
16,53	Valvula triple servcio de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2,00	$ 4.560.000,00	$ 9.120.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
16,54	Codo difusor con filtro de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2,00	$ 2.850.000,00	$ 5.700.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,55	Tanque Separador de aire tangencial de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	1,00	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
16,56	Vaso de expansion cerrado grundfos tipo diafragma de 48 galones	und	1,00	$ 4.950.000,00	$ 4.950.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,57	Valvula en bronce tipo bola de 2 " aislada	und	6,00	$ 380.000,00	$ 2.280.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,58	Valvula en bronce tipo bola de 1,5 " aislada	und	2,00	$ 235.000,00	$ 470.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,59	Valvula en bronce tipo bola de 1 " aislada aislada	und	18,00	$ 120.000,00	$ 2.160.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,60	Valvula en bronce tipo bola de 0,75" aislada aislada	und	46,00	$ 72.000,00	$ 3.312.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,61	Valvula en bronce tipo bola de 0,5" aislada aislada	und	8,00	$ 60.000,00	$ 480.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,62	Valvula tipo mariposa metalica de 2,5 "	und	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,63	Valvula tipo mariposa metalica de 3 "	und	6,00	$ 290.000,00	$ 1.740.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,64	Valvula tipo mariposa metalica de 4 "	und	2,00	$ 425.000,00	$ 850.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,65	Termometros bimetalico caratula de 3" con accesorios en polipropileno (UMA-01-02-03-04-05)	und	10,00	$ 250.000,00	$ 2.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,66	Termometros de mercurio tipo columna con accesorios en polipropileno para chiller	und	4,00	$ 350.000,00	$ 1.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,67	Manometros tipo bourdon en gliserina con accesorios	und	15,00	$ 120.000,00	$ 1.800.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,68	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,5 de diametro	und	4,00	$ 1.350.000,00	$ 5.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,69	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,75 de diametro	und	23,00	$ 1.450.000,00	$ 33.350.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,16%	0,00%
16,70	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1" de diametro	und	9,00	$ 1.650.000,00	$ 14.850.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,07%	0,00%
16,71	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1,5" de diametro	und	1,00	$ 1.950.000,00	$ 1.950.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,72	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2" de diametro	und	3,00	$ 2.680.000,00	$ 8.040.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
16,73	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2,5" de diametro	und	1,00	$ 3.270.000,00	$ 3.270.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,74	Termostato tipo ambiente digital	und	5,00	$ 420.000,00	$ 2.100.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
	TABLERO ELECTRICO													
16,75	Tablero electrico de potencia y control (Incluye cofre, Breiker totalizadores para chiller y unidades manejadoras y extractoras de aire, arrancadores con bimetalico ajustable y muletillas de aranque y parada.	und	1,00	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
	MONTAJE DE EQUIPOS													
16,76	Montaje arranque y pruebas de operación de enfriadores de agua	und	2,00	$ 12.500.000,00	$ 25.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,12%	0,00%
16,77	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades manejadoras de aire	und	5,00	$ 4.500.000,00	$ 22.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,11%	0,00%
16,78	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades interiores tipo cassete y fancoil	und	36,00	$ 550.000,00	$ 19.800.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
16,79	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractoras de aire	und	5,00	$ 450.000,00	$ 2.250.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,80	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractora de aire tipo plafon	und	47,00	$ 90.000,00	$ 4.230.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
16,81	Balanceo distribucion de aire (130 difusores y rejillas)	und	1,00	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
16,82	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (compacta)	und	1,00	$ 65.000.000,00	$ 65.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,31%	0,00%
16,83	Instalacion ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1,00	$ 16.452.630,00	$ 16.452.630,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
16,84	Instalacion ascensor camillero 2 paradas	und	1,00	$ 21.546.200,00	$ 21.546.200,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
16,85	INSTALACION BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	1,00	$ 986.520,00	$ 986.520,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
16,86	Instalacion de equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1,00	$ 2.145.620,00	$ 2.145.620,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,87	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1,00	$ 1.654.890,00	$ 1.654.890,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
16,88	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1,00	$ 2.054.200,00	$ 2.054.200,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TOTAL CAPITULO					**$ 814.139.060,00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0,00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0,00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0,00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0,00%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 14.341.455.487,00**	**68,76%**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR**	**$ 5.239.979.186,00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	**$ 547.589.195,00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	**$ 5.787.568.381,00**	**%TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS**	**27,75%**

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
A,I,U,							A.I.U.		A.I.U.		A.I.U.		A.I.U.	
ADMINISTRACION				23%	$ 3.298.534.762,00	15,82%	ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 1.205.195.213,00	ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO	$ 125.945.515,00	ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.331.140.728,00	%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION	6,38%
IMPREVISTOS				2%	$ 286.829.110,00	1,38%	IMPREVISTOS ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 104.799.584,00	IMPREVISTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO	$ 10.951.784,00	IMPREVISTOS EJECUTADOS ACUMULADOS	$ 115.751.368,00	%TOTAL EJECUTADO IMPREVISTOS	0,55%
UTILIDAD				5%	$ 717.072.774,00	3,44%	UTILIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 261.998.959,00	UTILIDAD EJECUTADA PERIODO	$ 27.379.460,00	UTILIDAD EJECUTADA ACUMULADA	$ 289.378.419,00	%TOTAL EJECUTADO UTILIDAD	1,39%
TOTAL OBRA CIVIL					$ 18.643.892.133,00	89,39%	TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	$ 6.811.972.942,00	TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA PERIODO	$ 711.865.954,00	TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.523.838.896,00	%TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL	36,07%
17	EQUIPOS ESPECIALES													
17,1	Ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1,00	$ 135.000.000,00	$ 135.000.000,00		1	$ 135.000.000,00		$ 0,00	1	$ 135.000.000,00	0,65%	0,65%
17,2	Ascensor camillero 2 paradas	und	1,00	$ 167.409.500,00	$ 167.409.500,00		1	$ 167.409.500,00		$ 0,00	1	$ 167.409.500,00	0,80%	0,80%
17,3	BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	2,00	$ 4.356.200,00	$ 8.712.400,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
17,4	Equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1,00	$ 17.176.471,00	$ 17.176.471,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
17,5	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1,00	$ 12.373.000,00	$ 12.373.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,6	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1,00	$ 18.611.000,00	$ 18.611.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
17,7	Tansformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1,00	$ 44.210.951,00	$ 44.210.951,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,21%	0,00%
17,8	Planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1,00	$ 246.934.782,00	$ 246.934.782,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,18%	0,00%
17,9	UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 10.204.381,00	$ 20.408.762,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,10%	0,00%
17,10	UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 6.204.381,00	$ 12.408.762,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,11	UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3,00	$ 3.887.946,00	$ 11.663.838,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,12	UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	$ 5.953.600,00	$ 11.907.200,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,13	Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2,00	$ 9.031.200,00	$ 18.062.400,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
17,14	Enfriador de agua tipo chiller de descarga vertical de 60 TR refrigerante R-410a 220 VAC trifasico, 220 vac PH-3 R-410a.	und	2,00	$ 198.000.000,00	$ 396.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	1,90%	0,00%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
17,15	Electrobomba tipo dual vertical en linea caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.	und	2,00	$ 35.000.000,00	$ 70.000.000,00	7,80%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,34%	0,00%
17,16	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 286,000 Btu/h caudal 5330 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 56.000.000,00	$ 56.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,27%	0,00%
17,17	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 167,000 Btu/h caudal 2850 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 41.500.000,00	$ 41.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,20%	0,00%
17,18	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 220,000 Btu/h caudal 3440 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 46.800.000,00	$ 46.800.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,22%	0,00%
17,19	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 149,000 Btu/h caudal 3780 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 44.600.000,00	$ 44.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,21%	0,00%
17,20	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 92,000 Btu/h caudal 1980 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	$ 28.500.000,00	$ 28.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,14%	0,00%
17,21	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 8000 Btu/hr	und	4,00	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,09%	0,00%
17,22	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 15000 Btu/hr	und	15,00	$ 5.200.000,00	$ 78.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,37%	0,00%
17,23	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 20000 Btu/hr	und	6,00	$ 6.200.000,00	$ 37.200.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,18%	0,00%
17,24	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 26000 Btu/hr	und	2,00	$ 6.500.000,00	$ 13.000.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,06%	0,00%
17,25	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 30000 Btu/hr	und	1,00	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,03%	0,00%
17,26	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 15000 Btu/hr	und	8,00	$ 4.800.000,00	$ 38.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,18%	0,00%
17,27	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1260 cfm, SP 0,6 in.c.a	und	1,00	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
17,28	Unidad de extraccion centrifuga de aire 2120 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
17,29	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1450 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1,00	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,02%	0,00%
17,30	Unidad de extraccion centrifuga de aire 850 cfm, SP 0,4 in.c.a	und	1,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
17,31	Unidad de extraccion centrifuga de aire 400 cfm, SP 0,3 in.c.a	und	1,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
17,32	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 160 cfm	und	5,00	$ 450.000,00	$ 2.250.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
17,33	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 80 cfm	und	34,00	$ 290.000,00	$ 9.860.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,05%	0,00%
17,34	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 60 cfm	und	8,00	$ 190.000,00	$ 1.520.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,01%	0,00%
TOTAL CAPITULO					$ 1.627.009.066,00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 302.409.500,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 302.409.500,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	1,45%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 2 DEL 14/JULIO/2025							ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
18	RETIE Y RETILAP													
18,1	Certificacion RETIE de la Red de Media Tensio; Transformador, Subestacion y Uso Final	und	1,00	$ 15.890.000,00	$ 15.890.000,00	0,12%		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,08%	0,00%
18,2	Certificacion de RETILAP	und	615,00	$ 15.000,00	$ 9.225.000,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,04%	0,00%
TOTAL CAPITULO					**$ 25.115.000,00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0,00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0,00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0,00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0,00%**
	ADMINISTRACION			**13%**	$ 211.511.178,58	1,01%	**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 39.313.235,00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 0,00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 39.313.235,00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	0,19%
	IVA 19% EQUIPOS + ADMON			**19%**	$ 349.318.846,47	1,67%	**IVA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	$ 64.927.319,65	**IVA EJECUTADO EN EL PERIODO**	$ 0,00	**IVA EJECUTADO ACUMULADO**	$ 64.927.319,65	**%TOTAL EJECUTADO TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.**	0,31%
	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.				**$ 2.187.839.091,05**	**10,49%**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 406.650.055,00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 0,00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 406.650.055,00**	**%TOTAL EJECUTADO + I.V.A.**	**1,95%**
VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP					**$ 20.856.846.224,00**	**100,00%**	**VALOR DEL CONTRATO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 7.218.622.997,00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 711.865.954,00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 7.930.488.951,00**	**%TOTAL EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO**	**38,02%**

PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO ANTERIOR	34,61%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	3,41%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO PERIODO	38,02%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com Villavicencio - Meta

8. VERIFICACION DE PAGOS DE SALUD Y ARL DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA

El Consorcio HDC, contratista de obra, cuenta para la ejecución del contrato de obra con el personal profesional y operativo relacionado a continuación, se ha realizado la verificación de los aportes al sistema general de seguridad social del presente periodo de ejecución, así:

Mayo 2025

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
DIRECTOR DE OBRA	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	$6.175.000	9487505010
RESIDENTE DE OBRA	WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	$3.500.000	9487505010
ASESOR ESTRUCTURAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	$6.175.000	9487505010
ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	$2.000.000	9487505010
COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	$1.423.500	9486478360 9487386029
ARQUITECTO	DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	$2.800.000	9487505010
COORDINADORA LOGISTICA	ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	$3.900.000	9487505010

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
AYUDANTE DE OBRA	ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	JOSE ENRIQUE PONARE	5.722.870	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	LUIS EMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	ORLANDO FONSECA GOMEZ	1.127.382.860	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	1.124.991.167	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	$1.423.500	9487505010

ALMACENISTA	LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	1.125.002.345	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	JAIRO GAITAN GALINDO	1.006.950.328	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	1.124.990.520	$1.423.500	9487505010
AUXILIAR SST	NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	BILCEN REINA GALINDO	6.848.517	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	CHARLES BRAYAN REINA CAPA	1.124.990.631	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	1.006.951.188	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	$1.423.500	9487505010
CELADOR	LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	$1.423.500	9487505010
SOLDADOR	JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	$1.423.500	9487505010
OFICIAL DE OBRA	ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	1.127.923.922	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	1.125.004.538	$1.423.500	9487505010
OPERADOR DE MAQUINARIA	AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	1.121.850.548	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	SANTIAGO AMAYA GAITAN	1.124.991.155	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	JHON FREDY CARIBAN DIAZ	1.124.991.490	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	CESPEDES MORA YESID CAMILO	1.121.870.352	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	1.119.890.549	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	JOSE ALVARO GARZON PEREZ	80.795.043	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	7.243.305	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	EDWIN ANDRES NOVOA PULIDO	1.124.990.124	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	WILSON ANDRES PIÑA GALLARDO	1.125.007.842	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	JAIME NOE PONARE PONARE	6.848.155	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	1.124.990.027	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	WILSON PONARE PONARE	1.124.996.599	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	$1.423.500	9487505010

AYUDANTE DE OBRA	GUILLERMO RIOS GAITAN	17.316.132	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	ELBER RODRIGUEZ CHIPIAJE	1.124.990.559	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	1.121.944.520	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	DARWIN LAMEC SALCEDO CHIPIAJE	1.124.994.854	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	DIOMEDEZ SILVA PEREZ	1.125.001.121	$1.423.500	9487505010
AYUDANTE DE OBRA	YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	$1.423.500	9487505010

9. EQUIPO UTILIZADO POR OBRA

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el presente período, han sido utilizados los siguientes equipos:

- Retroexcavadora de llantas
- Camión doble troque
- Mezcladoras de concreto
- Bomba de concreto
- Vibrador de concreto
- Herramienta menor

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

En el presente periodo se tomaron las muestras de cilindros de los concretos utilizados en la estructura para realizar las pruebas de resistencia en laboratorio, una vez se cumplan los tiempos de fraguado y los resultados de dichos ensayos sean entregados por el laboratorio serán adjuntados en los informes de ejecución.

11. INCONVENIENTES PRESENTADOS Y SOLUCIONES

La temporada invernal, que no da tregua en todo el territorio nacional, sigue siendo el desafío más importante que enfrenta la construcción del proyecto. Durante el presente periodo de pago, la empresa contratista de obra contabilizó más de 100 horas de trabajo que no se pudieron aprovechar, debido a la intensidad de las lluvias, situación que es constatada por el personal de interventoría que permanece en la obra. Las mismas precipitaciones que afectan el rendimiento de los trabajos en obra, deterioran aún más el estado de la vía de acceso al municipio de Cumaribo y complican la llegada de materiales oportunamente a la obra. Como se ha venido haciendo durante la ejecución del proyecto, se realiza reprogramación de actividades, muchas veces se trabaja en horarios extendidos para aprovechar al máximo las jornadas de tiempo seco, y de esta manera, alcanzar los objetivos de avance proyectados y dar cumplimiento al cronograma de obra.

12. CONCLUSIONES

- El contrato de obra presenta una ejecución física del 38,02% al 16 de julio de 2025.

- El pago parcial de Obra No. 9 tiene un valor de **SETECIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($711.865.954,00)** y corresponde al 3.41% de obra ejecutada**.**

- En el presente periodo de pago fue realizada el Acta de Modificación No. 2 firmada el 14 de julio de 2025 al contrato de obra, en la cual se establecieron mayores y menores cantidades de obra a ejecutar, manteniendo el contrato sin alteraciones en el valor ni en el término de ejecución.

- La empresa contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales que fueron las adquiridas en la suscripción del contrato de obra.

- El Consorcio HDC, contratista de obra, ha vinculado el personal operativo necesario para desarrollar las actividades en obra, y da cumplimiento a todas las responsabilidades laborales a que tiene lugar, como lo son, la vinculación al sistema de seguridad social integral, la entrega de dotación y elementos de protección y demás que lo obligue la legislación nacional vigente. Tanto en el presente informe de Pago Parcial de Obra No. 9, como en los informes entregados mensualmente se evidencia este cumplimiento. A su vez, se ha realizado la contratación de personal de la región, apoyando de esta manera la dinamización de la economía de la zona y brindando empleo que genera mejor calidad de vida a sus habitantes.


- Con los recursos girados por concepto de anticipo la empresa contratista ha adelantado la adquisición de materiales, bienes y servicios que han permitido el desarrollo de los trabajos en obra, contando con un importante acopio de materiales y disposición permanente de maquinaria y equipo.

- Esta interventoría Avala y Aprueba desde el punto técnico, administrativo, ambiental y jurídico el Pago Parcial No. 09 presentado por el Consorcio HDC, contratista de obra.

13 ANEXOS

1. Registro Fotográfico.

Elaboró.



ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Residente de Interventoría

Aprobó.



ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría

ANEXOS

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL DE OBRA No. 9

DEL 10 DE JUNIO DE 2025 AL 16 DE JULIO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	M3	12,07





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.10	Viga aérea 0.25 x 0.60 en concreto de resistencia 3000 psi	ML	44,37





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.11	Viga aérea 0.30 x 0.60 en concreto de resistencia 3000 psi	ML	13,76





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	M2	849,34






ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.18	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	23157,06





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.19	Malla electrosoldada	KG	2615,93

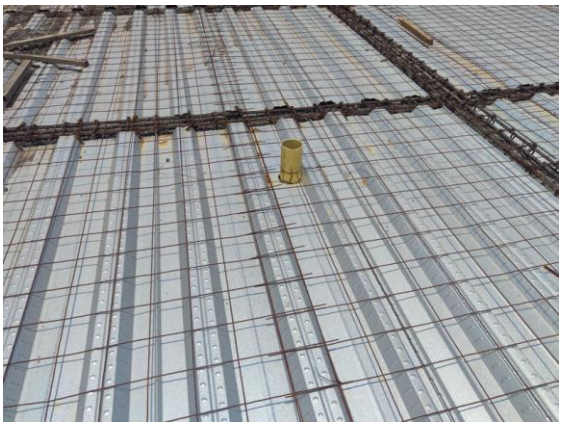



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.20	Losa maciza elevada para entrepiso	M2	274,12





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterráneo	M3	18,75





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	M3	7,96





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	CUBIERTA Y CIELORASO		
4.4	Estructura metálica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	KG	1423,74





TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETOS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA EN LABORATORIO
 

ACOPIO DE MATERIALES Y CAMPAMENTO DE OBRA
 
