Gmail **CONSORCIO ODESSA INTERVENTORIA ATLÁNTICO <contrato135inv@gmail.com>**

Resultado Radicación de Solicitud

1 mensaje

enviorespuestas@invias.gov.co <enviorespuestas@invias.gov.co> 8 de noviembre de 2024, 8:35
Para: contrato135inv@gmail.com

Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado vía correo electrónico: Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-112153 Remite: CONSORCIO ODESSA INTERVENTORIA ATLÁNTICO Fecha: 2024-11-07 19:53:57 Para: atencionciudadano@invias.gov.co Asunto: C T 135 391 2024 Informe mensual de Interventoria No. 9 Contrato 4805 2023 Octubre 2024 Adjunto a este correo se incluye la solicitud original con la información de radicación

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

C_T_135_391_2024_Informe_mensual_de_Interventoria_No._9_Contrato_4805_2023___Octubre_2024_1289054.pdf
14133K

Bogotá, D.C., 07 de noviembre del 2024

C-T-135-391-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn.: Ing. Diana María Vanegas Jaramillo
Directora Territorial Atlántico
La Ciudad

Referencia: **Contrato No. 4805 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1"**

Asunto: Informe mensual de Interventoría No. 9 Contrato 4805-2023 - Octubre 2024

Respetados señores:

Se remite para su revisión el informe mensual No. 9 de interventoría del contrato de la referencia, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, de acuerdo la estructura del Manual de Interventoría de Obra Pública y lista de chequeo de informe mensual MEPI-MN1-IN-15-FR-1. Se aclara que para el periodo de dicho informe las labores de interventoría se centraron en el seguimiento legal, técnico, ambiental y social de los contratos de obra derivados de los convenios 2220-2023 (Pondera – Atlántico) y 2221-2023 (Sabanagrande – Atlántico).

Atentamente,

JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
CONSORCIO ODESSA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios (336)	CD ( )	Tomos ( )	Carpeta Digital (01)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1. LP-001-2023 (Ponedera) / 2. SG-LP-OP-004-2023 (Sabanagrande) **Contratista:** 1. CONSORCIO LA GIRALDA / 2. CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

Contrato de Interventoría No. 4805 DE 2023 **Interventoría:** CONSORCIO ODESSA

Objeto Contrato de Obra:
1. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 01 al 31 de Octubre de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		10
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		19
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		22
2.4	Características técnicas del proyecto		23
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		25
3.1	Información general del contrato		27
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		34
3.3	Seguimiento Items no previstos		35
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		36
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		45
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	47
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	69
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	73
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		78
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	80
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		86
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	91
	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	N/A	
4.8	Otros documentos seguimiento mensual		110
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-2-FR-2	111
		N/A	
	• Seguimiento Programa de Obra	N/A	
	• Seguimiento Programa de Inversiones		117
		MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	120
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	143
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		172
5.1	Información general del contrato		174
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		175
5.3	Informes especialistas y profesionales		178
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		178
5.5	Informe matriz de riesgos.		178
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		179
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		179
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		271
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	274
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	277
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	279
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	281
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	286
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		289
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-3-FR-2	290
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN1-N-9-FR-2	306
	• Seguimiento al Plan de Cargas	N/A	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		309
8	**Anexos**		313
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		314
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		321
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		330
8.5	Informe de cuentas de los convenios de obra		363

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4694 de fecha Octubre de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31 octubre 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO INFORME 9 **PERIODO MES:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4805 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO: 1 de marzo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de julio de 2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACION: 14 de diciembre de 2024
PLAZO ACUMULADO: 8 MESES Y 14 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 12.460.000.000,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 12.460.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Pavimento rigido	Km	2,7
	Box culvert	Un	1,00
Mantenimiento	Conformación	Km	5,70

Nota: Las metas fisicas se han definidido según los estudios y diseños.

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Pavimento rigido	Km	0,00	0,00
	Box culvert	Un	0,00	0,00
Estructuras	Conformación	Km	0,00	0,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA DIRECTA	$ 12.196.043.125,30	$ 0,00	$ 12.196.043.125,30
PMT	$ 48.543.625,00	$ 0,00	$ 48.543.625,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 33.807.959,00	$ 0,00	$ 33.807.959,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 57.072.200,00	$ 10.843.718,00	$ 67.915.918,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 113.689.372,70	$ 0,00	$ 113.689.372,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.449.156.282,00**	**$ 10.843.718,00**	**$ 12.460.000.000,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRA DIRECTA	N/A	$ 0,00	N/A	$ 226.772.701,00
PMT	N/A	$ 0,00	N/A	$ 0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	N/A	$ 0,00	N/A	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	$ 0,00	N/A	$ 27.166.367,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	N/A	$ 0,00	N/A	$ 0,00
VALOR EJECUTADO	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 253.939.068,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 8.743.444.995,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 226.772.701,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,59%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADO: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo La Giralda - Santa Rita. Instalación de Geotextil Tejido - K0+300



Tramo La Giralda - Santa Rita. Explanaciones - K0+200

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

* Con respecto a la reprogramación No. 1 al programa de inversiones realizada para la prórroga No. 1, se presenta un atraso en programación imputable al contratista por las demoras en la aprobación de los estudios y diseños, no inicio oportuno de ejecución de las obras y bajos rendimientos en la ejecución de las obras. Respecto a los atrasos del contratista la interventoría mediante comunicación C-T-135-188- 2024 del 18/07/2024 recomienda al Municipio de Pondera la apertura de un proceso sancionatorio por incumplimientos en la aprobación de estudios y diseños y programación de obra. Posteriormente se actualiza el proceso sancionatorio mediante comunicación C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, en el que se reitera la necesidad de conminar al contratista de obra.

* En el periodo del presente informe la interventoría notifica los incumplimientos del contratista al Municipio de Ponedera mediante comunicaciones C-T-135-356-2024 del 17/10/2024, C-T-135-379-2024 del 31/10/2024.

Firma
Nombre 25202-27254 CND
R.L de Interventoría
Matrícula No. JOHN ANDRES ARIAS H.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	01 noviembre 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO INFORME 9 **PERIODO MES:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: SG-LP-OP-004-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4805 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

PLAZO INICIAL:	3 MESES			VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 6.542.182.495,26
FECHA DE INICIO	4 de marzo de 2024			VALOR ADICIÓNALES:	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			VALOR ACUMULADO:	$ 6.542.182.495,26
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A			ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 719.745.270,50
FECHA DE TERMINACION:	4 de diciembre de 2024			AMORTIZACION ANTICIPO:	$ 483.389.853,00
PLAZO ACUMULADO:	Nueve (9) meses				

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Pavimento Rigido	Km	2,0
	Rehabilitación	Km	0,00
Manteniemiento	Conformación y afirmado	Km	2,20

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Pavimento Rigido	Km	0,26	1,46
	Rehabilitación	Km	0,00	0,00
Manteniemiento	Conformación y afirmado	Km	0,00	0,00

Nota: Actualmente se desarrolla la etapa de ajustes y complementación de estudios y diseños con el fin de definiri las estructuras a ejecutar y precisar el el alcance del contrato.

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA DIRECTA	$ 6.215.826.029,36	$ 0,00	$ 6.215.826.029,36
PMT	$ 26.321.802,00	$ 0,00	$ 26.321.802,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 14.387.139,20	$ 0,00	$ 14.387.139,20
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31.638.500,00	$ 6.011.315,00	$ 37.649.815,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 247.997.709,70	$ 0,00	$ 247.997.709,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6.536.171.180,00**	**$ 6.011.315,00**	**$ 6.542.182.495,26**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRA DIRECTA	$ 634.201.737,00	$ 0,00	$ 634.201.737,00	$ 3.113.309.409,00
PMT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.119.852,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 25.368.069,00	$ 0,00	$ 25.368.069,00	$ 124.532.376,00
VALOR EJECUTADO	**$ 659.569.806,00**	**$ 0,00**	**$ 659.569.806,00**	**$ 3.267.961.637,00**

* Los avances son aproximados al mes y seran precisados con la suscripción del acta de recibo parcial de obra el 10 del siguiente mes.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	3.895.970.164,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	3.113.309.409,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	79,91%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	23
EMPLEOS INDIRECTOS GENERAD	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**31**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo Sabanagrande - Limites Polonuevo. Instalación de subbase k1+090



Tramo Sabanagrande - Limites Polonuevo. Instalación de concreto. K1+150

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

*La interventoría solicitó al contratista con copia al Municipio de Sabanagrande, mejorar los rendimientos de ejecución y la entrega de un plan de contingencia por los atrasos de obra presentados mediante comunicación C-T-135-373-2024 del 25/10/2024 y se advirtió que de no implementar acciones se recomendaría la entidad contratante las medidas sancionatorias pertinentes por atrasos que sean de imputabilidad del contratista.

Firma
Nombre 25202-27254 CND
Director de Interventoría JOHN ANDRES ARIAS H.
Matrícula No. 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

09

CONTRATO 4805 DE 2023

CONSORCIO ODESSA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 09

VERSIÓN 00

01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ELABORADO Y REVISADO POR

ING JOHN ANDRÉS ARIAS HUERTAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING RONALD MOLINARES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING OSCAR JAVIER GARZÓN DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL



INTRODUCCIÓN

1

OCTUBRE 2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual **No. 9** corresponde al periodo comprendido entre el **01 al 31 de OCTUBRE de 2024**, y contiene el seguimiento a las actividades realizadas por la interventoría ejercida mediante contrato 4805 DE 2023 suscrito entre el INVIAS y el CONSORCIO ODESSA que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1" para el seguimiento y control de los contratos de obra No. LP-001-2023 del 7 de noviembre de 2023 que tiene por objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y el contrato de obra No. SG-LP-OP-004-2023 del 29 de septiembre de 2023 que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

En el presente informe se relacionan las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental realizadas por la interventoría y los hechos más relevantes que han surgido para los contratos de obra posteriores a su fecha de suscripción e inicio, así mismo a los hechos que se han presentado en el desarrollo de los convenios interadministrativos No. 2220-2023 que tiene como objeto AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO y convenio No. 2221-2023 que tiene como objeto AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Para el periodo del presente informe se presenta el seguimiento a la ejecución de las obras en el Tramo de SABANAGRANDE – POLONUEVO del Municipio de Sabanagrande y LA GIRALDA – SANTA RITA del Municipio de Ponedera, se describe el seguimiento legal, técnico, ambiental y social y el seguimiento a la etapa de ajustes y complemento de estudios y diseños de los contratos de obra y demás documentos de seguimiento mensual como programación, APUS y presupuesto de obra.

Capítulo 2 Descripción del proyecto.

- Localización: se incluye un esquema claro y completo de ubicación de los sectores de intervención de la vía La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico) y la vía de Sabanagrande - Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico).
- Inventario y estado inicial de la vía: se hace una relación del estado de los sectores a cargo del contrato.
- Características técnicas del proyecto: En este acápite se relacionan los parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir, tipificación de los diferentes sectores.

Capítulo 3 Información contrato de obra.

- Información general del contrato: Se relaciona el número del proceso de selección, número del contrato, fecha de suscripción, objeto, Contratista, NIT, valor inicial, adiciones, valor acumulado del contrato, modificaciones, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación actual del contrato, dirección y número de teléfono.
- Se describen las actividades ejecutadas en el mes, con el avance en la ejecución del mes y el avance acumulado del proyecto; actividades desarrolladas por parte del Contratista, además del resumen ejecutivo de las gestiones realizadas, avance del proyecto.

Capítulo 4 Reportes ejecución mensual contrato de obra.

Los reportes corresponden a los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR de: Resumen mensual estado general del proyecto, Maquinaria y equipo del contrato de obra, Personal del contrato de obra, Informe financiero y presupuestal, Contrato de obra,

Estado general del tiempo, Resumen de ensayos de laboratorio, Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra, Informe de avance físico-financiero, Seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra.

Capítulo 5 Información Contrato de Interventoría.

- Información general del contrato: Se relaciona el número del proceso de selección, número del contrato, fecha de suscripción, objeto, Contratista, NIT, valor inicial, valor acumulado del contrato, modificaciones, aclaraciones, suspensiones, cesiones de participación contractual, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación actual del contrato, dirección y número de teléfono.
- Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría.
- Informes Especialistas.

- Informe del Programa Anual de Caja- PAC: Se presenta la programación mensual de los recursos a ejecutar para el contrato de obra y para el contrato de interventoría.
- Información sobre otros programas y aplicativos: Se presenta el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en el pliego de condiciones o solicitados por el INVIAS.

Capítulo 6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría.

Los reportes corresponden a los formatos MINFRA-MN-IN-15-FR de: Equipo contrato de interventoría, Personal contrato de interventoría, Informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría, Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría, seguimiento garantías contrato de interventoría seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría.

Capítulo 7 Conclusiones y recomendaciones.

En este capítulo se presentan las conclusiones relevantes sobre el estado del contrato de obra y de interventoría en cada una de las áreas de ejecución, técnica, ambiental.

Capítulo 8 Anexos.

En el presente capítulo se relaciona la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo, Registro fotográfico del avance de las obras. El contrato se encuentra en fase de complementación de estudios y diseños.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2

OCTUBRE 2024

CONTENIDO

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

2.4 Características técnicas del proyecto

CAPITULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a) Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

El proyecto comprende el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vía terciaria que se localizada al sur del municipio de Ponedera conectando los sectores de LA GIRALDA y SANTA RITA EL VIEJO en longitud de 9.6 Km.

De acuerdo con el contrato de obra en su cláusula tercera y anexo técnico, el Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica.

El contrato de obra comprende la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, siendo esta una actividad preliminar a la ejecución de obras que permitirán definir las intervenciones, estructuras y precisar el alcance en la ejecución de las obras.

Los presupuestos realizados para la suscripción del convenio 2220-2023 y contrato de obra LP-001-2023 proyectan una intervención de la siguiente manera:

- 3980 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido y obras de drenaje.
- 5850 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado.
- Se proyectan anchos de 5.50 m, los cuales será revisados en la etapa de estudios y diseños y dependerán del estudio de tránsito y diseño geométrico de la vía.

No obstante, es pertinente precisar que una vez aprobado el diseño de pavimento y teniendo en cuenta el diseño geométrico y estudio hidráulico presentado las metas definidas son las siguientes:

- 2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
- 5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

- 1 Box culvert

El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

b) Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El proyecto comprende el MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vía terciaria que se localizada al occidente del municipio de Sabanagrande, conectando los sectores de SABANANGRANDE a los límites con POLONUEVO en longitud de 5.1 Km.

De acuerdo con el contrato de obra en su cláusula tercera y anexo técnico, el Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica.

El contrato de obra comprende la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, siendo esta una actividad preliminar a la ejecución de obras que permitirán definir las intervenciones, estructuras y precisar el alcance en la ejecución de las obras.

Los presupuestos realizados para la suscripción del convenio 2221-2023 y contrato de obra SG-LP-OP-004-2023 proyectaban una intervención de la siguiente manera:

- 2150 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido y obras de drenaje.

- 3335 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada existente e instalación de afirmado.

- Se proyectan anchos de 5.50 m, los cuales será revisados en la etapa de estudios y diseños y dependerán del estudio de tránsito y diseño geométrico de la vía.

No obstante, es pertinente precisar que una vez aprobado el diseño de pavimento y teniendo en cuenta el diseño geométrico y estudio hidráulico presentado las metas definidas son las siguientes:

- 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.30 m (incluyendo bordillos de 0.15 m en ambos costados), teniendo en cuenta que el estudio de tránsito arrojo un alto flujo vehicular de todo tipo y

tránsito de camiones, siendo necesario garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008.

- 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.


Respecto al alcance de las intervenciones se aclara que el Municipio de Sabanagrande mediante modificatorio al contrato suscrito el 17/04/2024, decide excluir del alcance e intervención del contrato el Tramo entre el K2+000 al K2+850 con el fin de avanzar en este tramo con pavimento rígido a cargo de otro proceso de contratación por parte del Municipio de Sabanagrande.

Por lo anterior el alcance del proyecto se establece en los siguientes tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención).

2.1 Localización

a) Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

El corredor vial de 9.6 Km de longitud corresponde a una vía terciaria localizada en el Municipio de Ponedera – Departamento del Atlántico, entre el sector conocido como La Giralda específicamente en el Ferry para Salamina y transcurre por la rivera del rio Magdalena hasta conectar la vía principal de Ponedera a Puerto Giraldo en cercanías al corregimiento de Santa Rita.

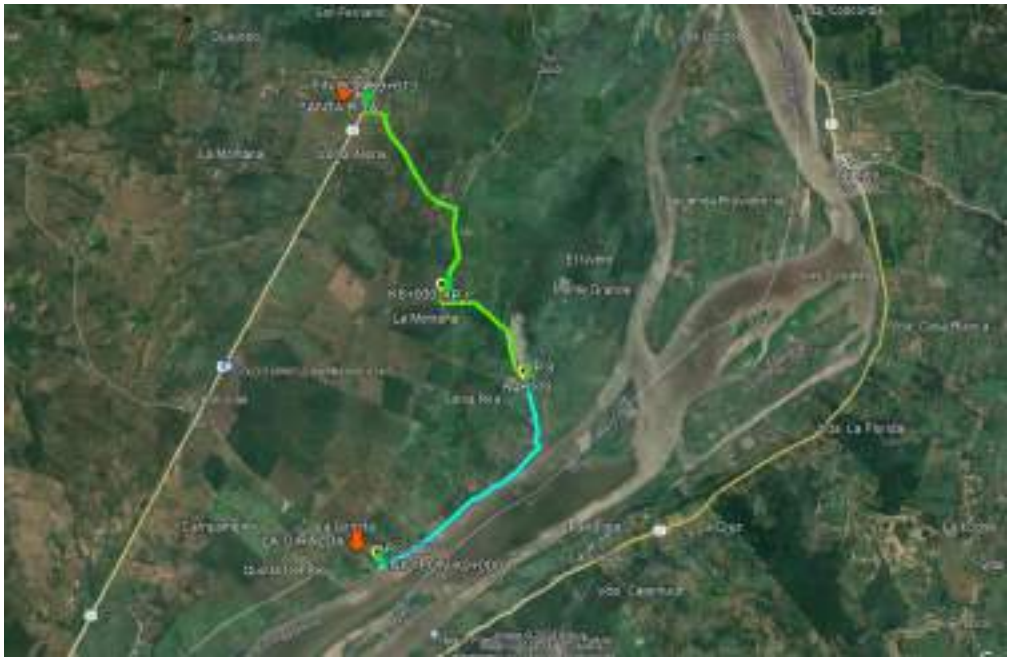

b) Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El corredor de 5.1 Km de longitud corresponde a una vía terciaria que se localiza en el Municipio de Sabanagrande – Departamento del Atlántico, entre la Glorieta de salida de Sabanagrande hasta los límites con el Municipio de Polonuevo.



Figura 1. Localización general del Proyecto LA GIRALDA – SANTA RITA (MUNICIPIO DE PONEDERA – ATLANTICO).

Vía La Giralda en el Ferry para Salamina por la rivera del rio Magdalena y conecta a la vía principal de Ponedera a Puerto Giraldo en el corregimiento de Santa Rita.

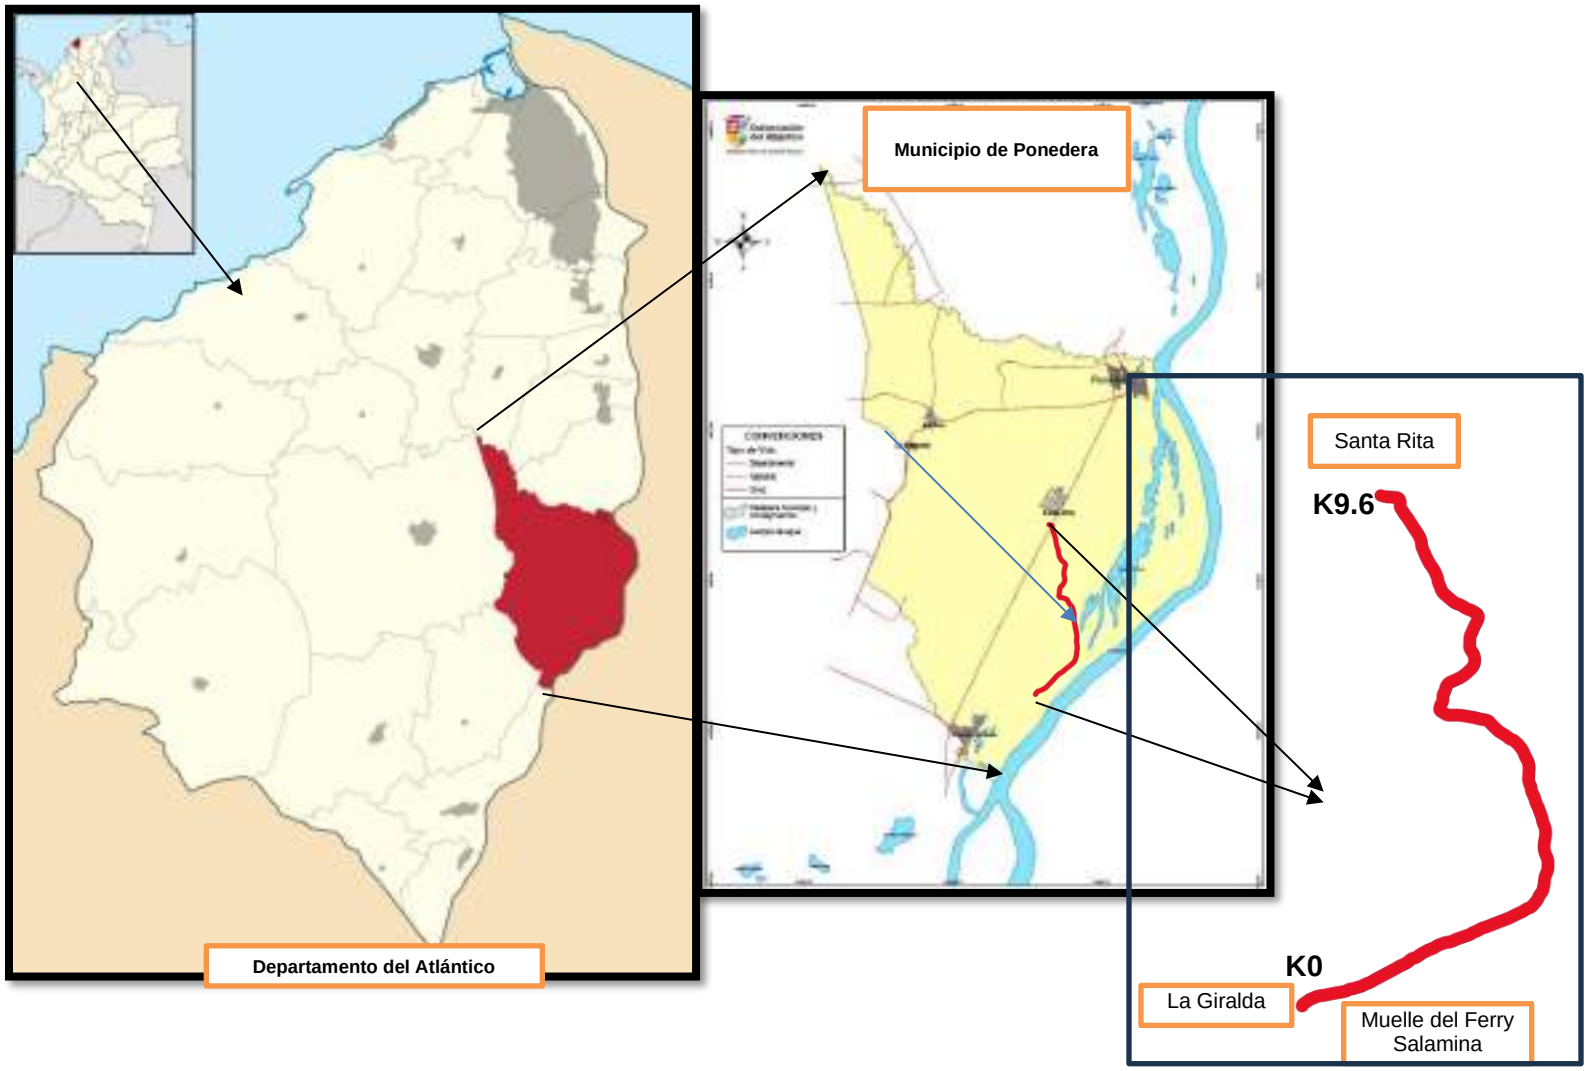


Figura 2 Localización general del Proyecto SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (MUNICIPIO DE SABANAGRANDE).

Vía terciaria que se localizada al occidente del municipio de Sabanagrande, conectando los sectores de SABANANGRANDE a los límites con POLONUEVO.

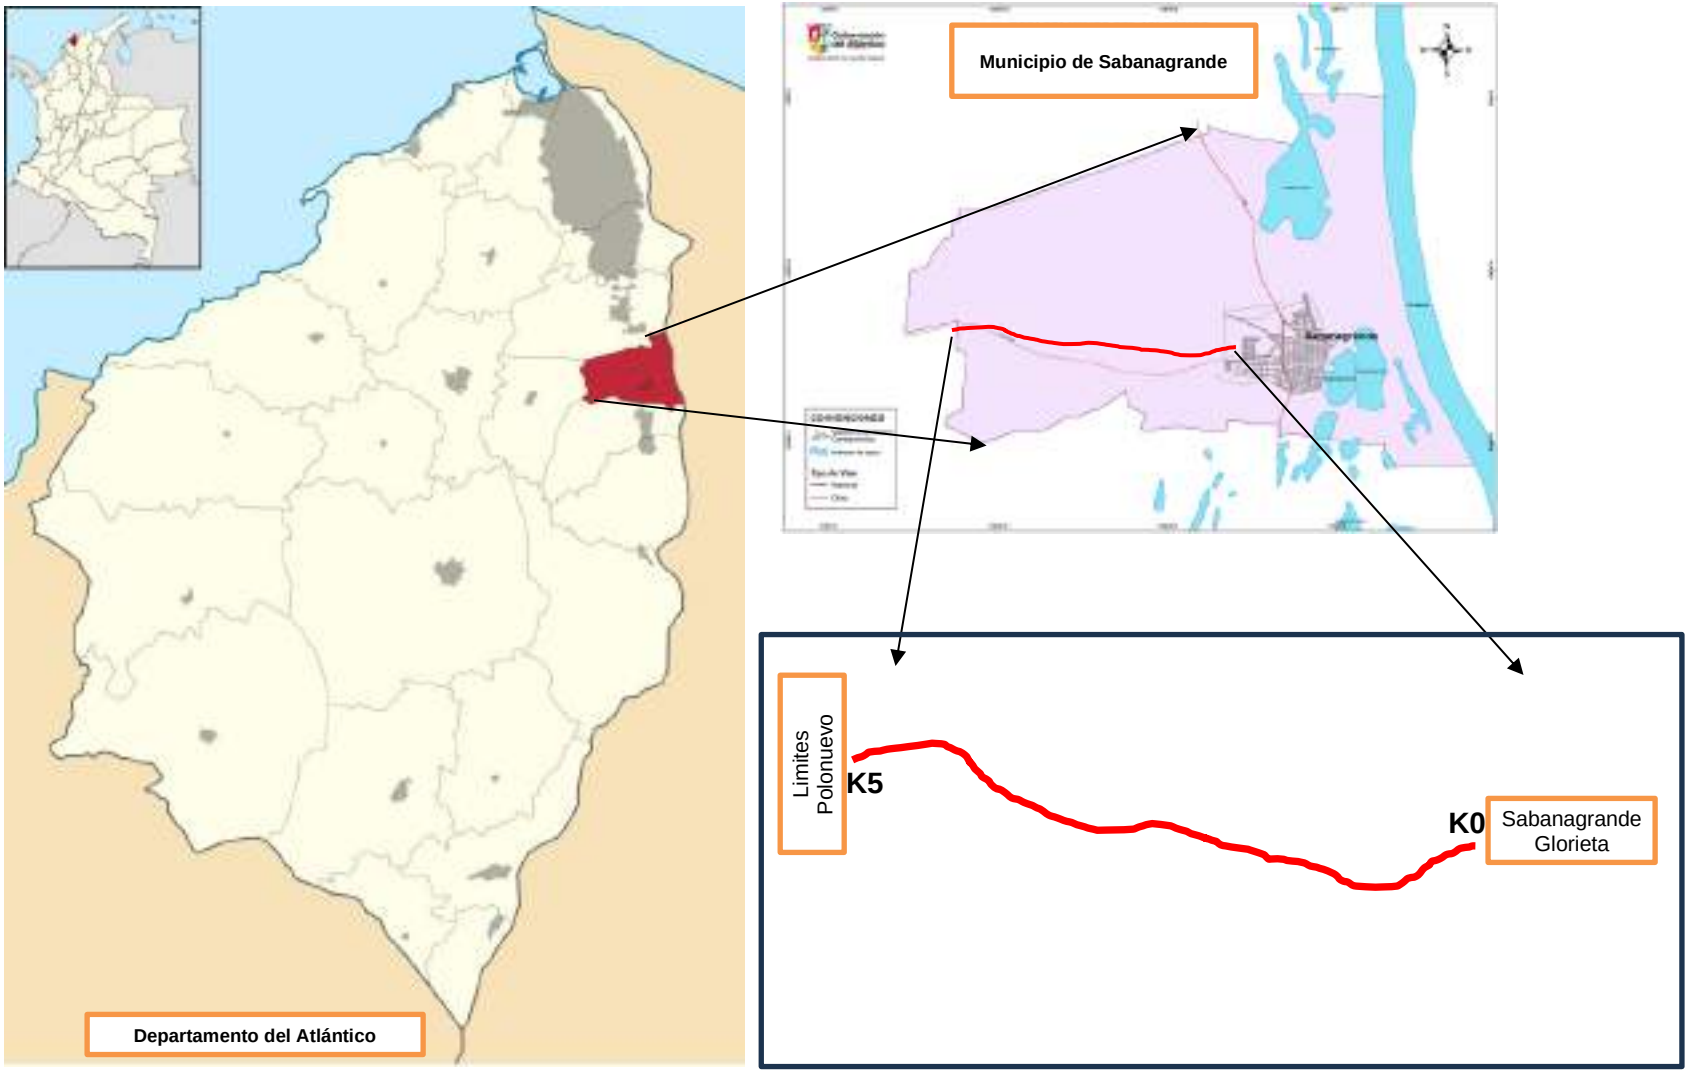


Gráfico No. 1. Esquema LA GIRALDA – SANTA RITA (MUNICIPIO DE PONEDERA – ATLANTICO).


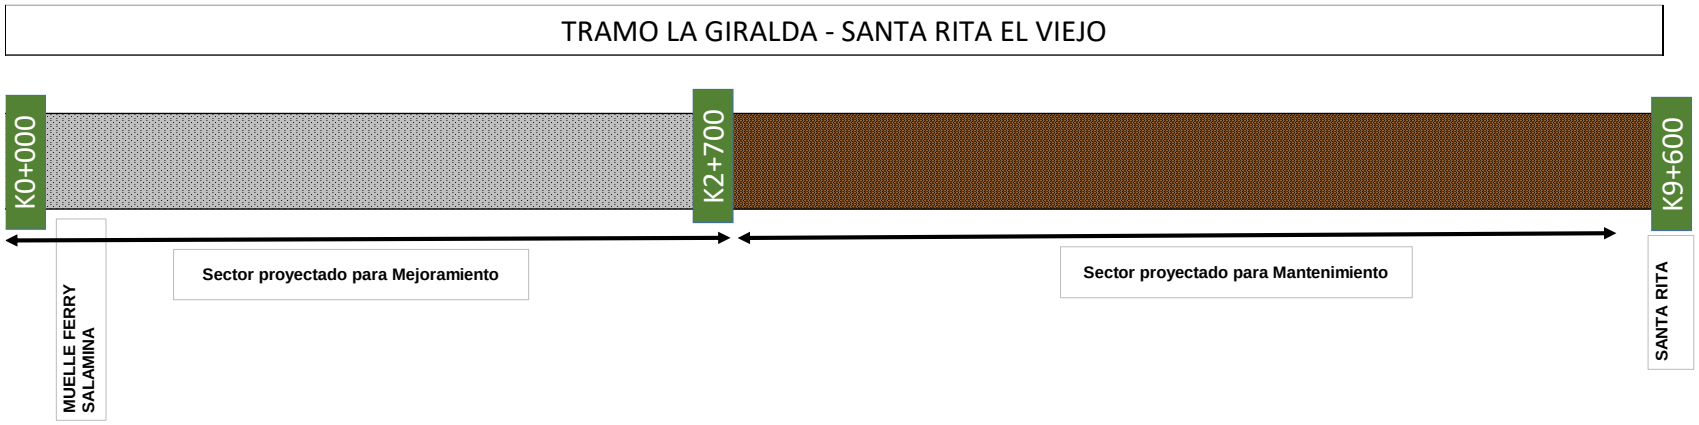


Gráfico No. 2. Esquema SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (MUNICIPIO DE SABANAGRANDE).

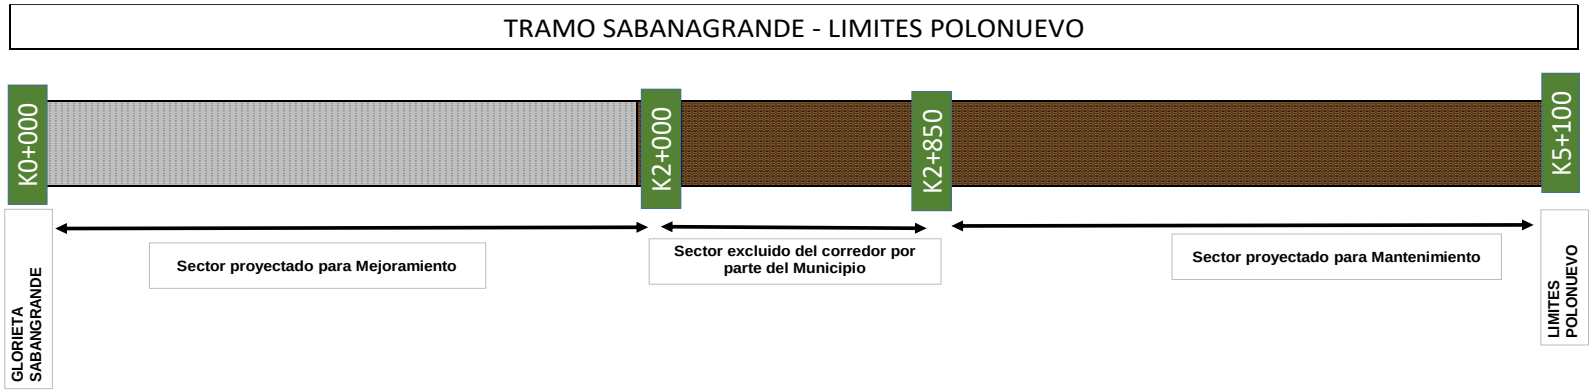

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

a) Proyecto La Giralda – Santa Rita (Ponedera)

El municipio que hace parte de la zona de influencia del proyecto, es el Municipio de PONEDERA y específicamente se verán beneficiados con la construcción del proyecto los corregimientos de Santa Rita y Puerto Giraldo, así como los vehículos que transitan desde el muelle del ferry de Salamina departamento de Magdalena hacia el departamento del Atlántico y viceversa.



Los beneficios por la construcción de pavimento rígido proyectado para esta vía terciaria son los siguientes:

- Facilitar la movilidad de las personas que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros, hecho que disminuirá los tiempos de viaje y el índice de accidentalidad.


- Mejorar la calidad de vida de los habitantes al ofrecer una superficie de rodadura en zonas criticas por las que por lo general se presentan dificultades en la transitabilidad y por ende genera mayor esfuerzo para su paso por parte de los usuarios y habitantes de la zona.

- Generar conexión vial, reducir la accidentalidad y mejorar la economía del sector al poder garantizar el tránsito de vehículos de carga de productos agropecuarios de la zona.

- Mejorar la capacidad vial del municipio de Ponedera.

b) Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande)

El municipio que hace parte de la zona de influencia del proyecto, es el Municipio de SABANAGRANDE y específicamente se verán beneficiados con la construcción del proyecto los municipios de Sabanagrande y Polonuevo.

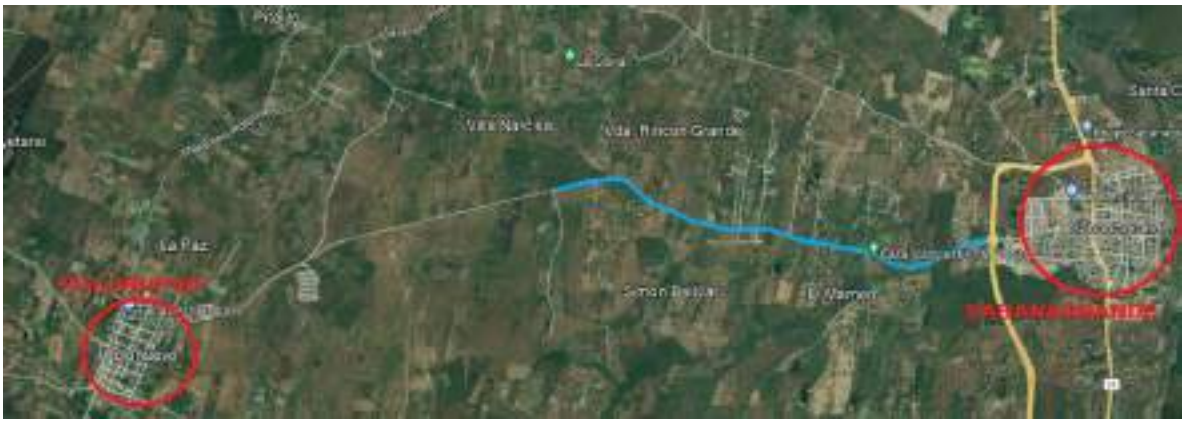

Los beneficios por la construcción de pavimento rígido proyectado para esta vía terciaria son los siguientes:

c) Facilitar la movilidad de las personas que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros, hecho que disminuirá los tiempos de viaje y el índice de accidentalidad.

d) Mejorar la calidad de vida de los habitantes al ofrecer una superficie de rodadura en zonas críticas por las que por lo general se presentan dificultades en la transitabilidad y por ende genera mayor esfuerzo para su paso por parte de los usuarios y habitantes de la zona.

e) Generar conexión vial, reducir la accidentalidad y mejorar la economía del sector al poder garantizar el tránsito de vehículos de carga de productos agropecuarios de la zona.

f) Mejorar la capacidad vial del municipio de Sabanagrande.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

a) Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

El corredor de 9.6 Km comprendido entre La Giralda (Muelle del Ferry Salamina) - Santa Rita, discurre en un tramo posicionado en su mayoría sobre un terraplén y con superficie en afirmado en mal estado y con bastantes deformaciones y hundimientos entre el K0+000 al K9+600, cuya ronda del rio Magdalena se encuentra en los tres primeros kilómetros (K0+000 al K3+000). Cuenta con obras hidráulicas en buenas condiciones. Las obras de drenaje existentes se encuentran entre en sector proyectado para mantenimiento por lo que su intervención obedecerá a las necesidades reales de mantenimiento en la etapa final del contrato.

En el marco de la ejecución de estudios y diseños que se desarrollan para los dos contratos de obra se han identificado las siguientes obras:

ABCSISADO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPECIFICACIÓN DE ALCANTARILLA		DIÁMETRO TUBERÍA (PULGADA)	DIÁMETRO DE CAJA (M)	ESTADO		
			BOX	TUBERÍA			MALA	REGULAR	BUENA
K6+960	4	4,75	X			4.7*1.0		X	
K7+280	7,12	2,56	X			2.5*1		X	
K7+420	4,87	1,2		X	36"		X		

En el siguiente informe se precisarán las abscisas y características de cada una de las obras.

b) Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El corredor vial de 5.1 Km se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre la Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro entre el K0 al K5+071 y con algunos sobrantes de asfalto en el primer kilómetro (K0+000 al K1+200) y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%. Corredor que es altamente transitado y por el alto crecimiento que se presenta en el corredor.

En el marco de la ejecución de estudios y diseños que se desarrollan se identifican las siguientes obras.

ABSCISADO	LONGITUD	ANCHO	ESPECIFICACION DE ALCANTARILLA		DIAMETRO TUBERIA (PULGADA)	DIAMETRO DE CAJA	ESTADO		
			BOX	TUBERIA			MALA	REGULAR	BUENA
K1+283.54	6,67	2,56	X			2*1.5			X
K2+210	7,08	2	X			2*1			X
K2+485	7,5	3	X			3*2			X
K3+155	6.72	1.86		X	36"			X	
K3+950				X	36"			X	
K4+700				X	36"			X	

2.4 Características técnicas del proyecto


2.4.1 PONEDERA:

El corredor comprendido entre La Giralda (Muelle del Ferry Salamina) - Santa Rita en longitud de 9.6 Km, transcurre en un tramo posicionado en su mayoría sobre un terraplén con un ancho promedio de 5.6 m y con superficie en afirmado en regular estado y con alto contenido de arcillas debajo de este, cuya ronda del rio Magdalena se encuentra cercana a la vía en los tres primeros kilómetros. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente requerirán actividades de mantenimiento.

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.

El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

La sección típica de la vía de acuerdo con el diseño geométrico y de pavimentos es la siguiente, con la aclaración del anterior párrafo:

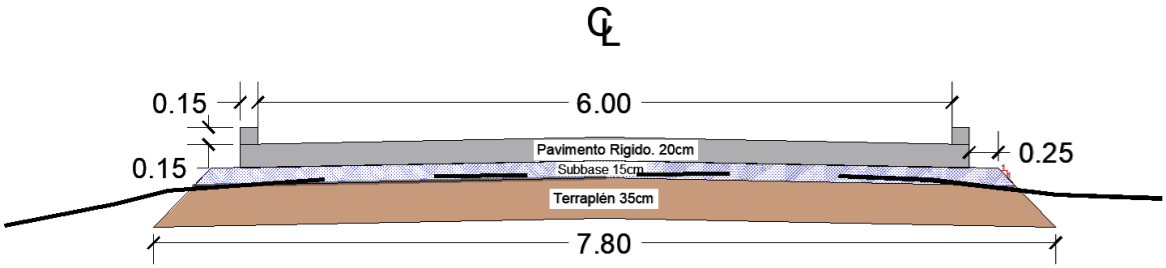

El proyecto se desarrollará bajo las especificaciones técnicas de construcción INVIAS 2022.

2.4.2 SABANAGRADE:


El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas. El Corredor

que es altamente transitado por vehículos de carga y automóviles por el alto crecimiento poblacional que se presenta en el corredor.

El alcance del proyecto se establece en los siguientes tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención).

Se proyecta la intervención de mejoramiento de vía mediante la construcción de pavimento rígido, con una meta física de 2 Km de pavimento rígido y 2.25 Km de mantenimiento vial, cuya intervención será precisado en la etapa final del contrato de acuerdo con las condiciones finales de la rasante y con el fin de garantizar la entrega a satisfacción de la capa de afirmado.

El ancho de calzada proyectado es de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico. Se presenta a continuación la sección típica.

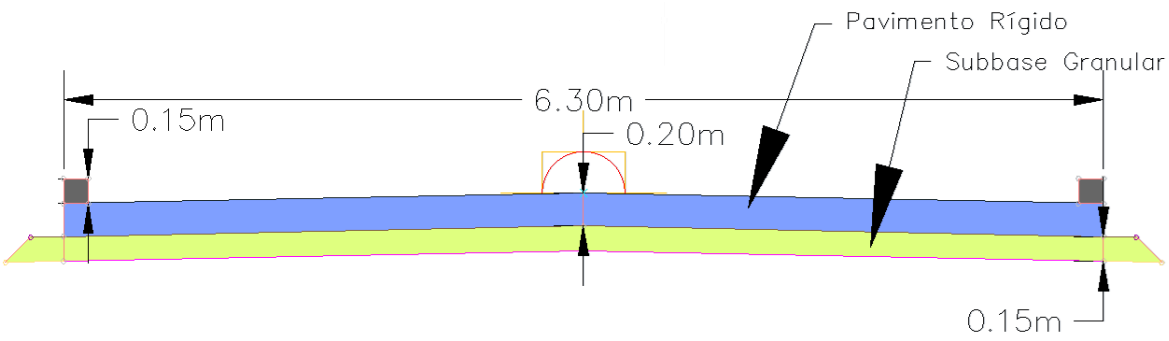

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
LOTE 1



INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3

OCTUBRE 2024

CONTENIDO

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA
3.1 Información general del contrato
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes
3.3 Seguimiento Ítems no previstos
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

CAPITULO 3 CONTRATO DE OBRA

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a) Información contrato Ponedera

Contrato de obra adjudicado mediante licitación pública No. LP-001-2023 con la siguiente información del convenio y contrato de obra:

Tabla 1 Información del convenio y contrato de obra

Convenio INVIAS No.	**2220-2023**
Fecha Convenio INVIAS No.	**21 de junio de 2023**
Objeto Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1 Convenio	Doce (12) meses
Fecha Prorroga No.1 Convenio	22 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2024
No. Proceso	LP-001-2023.
Contrato Nº:	**LP-001-2023**
Fecha suscripción Contrato	**7 de noviembre de 2023**
Aprobación Cesión	N/A
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Tramo	LA GIRALDA – SANTA RITA
Contratista:	CONSORCIO LA GIRALDA
Nit	901.770.166 - 5
Conformado por:	RK CONSTRUCTION GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1 LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9
Representante legal:	EDGAR JOSE TORRES MEJIA
Valor inicial:	**$ 12.460.000.000**
Valor adicional	N/A
Anticipo:	$ 6.230.000.000
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses
Fecha de Inicio:	1 de marzo de 2024
Fecha de terminación inicial:	1 de agosto de 2024
Prorroga No. 1	Tres (3) meses y catorce (14) días.
Fecha Prorroga No. 1	30 de agosto de 2024

Suspensión No. 1	29 julio de 2024 al 27 de agosto de 2024
Fecha reanudación No. 1	28 de agosto de 2024
Fecha de terminación Actual:	14 de diciembre de 2024

Como se pudo identificar en la tabla anterior el contrato de obra LP-001-2023 fue suscrito el 07 de noviembre de 2023, sin embargo, el plazo del contrato que era de cinco (5) meses excedía la vigencia del convenio 2220-2023 suscrito entre el municipio de Ponedera y el INVIAS, que tenía con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023 y la interventoría asignada para el contrato tenía como fecha de inicio el 19 de diciembre de 2023.

Posteriormente se realiza una suspensión No. 1 al contrato de interventoría entre el 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024 con el fin de alcanzar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta que las alcaldías/gobernaciones, se encontraban finalizando su proceso de empalme administrativo debido a la finalización e inicio de los periodos constitucionales de los respectivos mandatarios, razón por la cual no se había impartido para final de año, el inicio a los respectivos contratos de obra; entre otros, por que el cambio de administración implica el cambio de funcionarios, supervisores y personal de apoyo, lo cual afecta la capacidad operativa de los entes territoriales para conducir la correcta ejecución de los contratos. Es así como a su vez dicha suspensión permitió otorgar los tiempos necesarios para el estudio y aprobación de la prórroga No. 1 al contrato de interventoría 4805 DE 2023 suscrito entre el INVIAS y el CONSORCIO ODESSA; Prorroga No. 1 al contrato de interventoría, que se suscribe el 12 de febrero de 2024 por un término de 10 meses, contemplando como fecha de terminación del contrato de interventoría el 14 de diciembre de 2024.

Por lo anterior, se suscribe la prórroga No. 1 al convenio 2220-2023 suscrito entre el Municipio de Ponedera y el INVIAS, el cual tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que mediante la prórroga No. 1 al convenio 2220-2023 el 07 de diciembre de 2023, se amplía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Lo anterior finalmente permite garantizar los plazos del convenio e interventoría para la ejecución de las obras del contrato de obra.

Contrato, adiciones, prorrogas y modificaciones.

A la fecha no se han suscrito modificaciones, adiciones o prorrogas al contrato de obra.

Tabla 2 Modificaciones, adiciones y/o prorrogas PONEDERA

Descripción	Fecha	Causales
Modificatorio 1	5/04/2024	Modificación en la que se realiza una adición en plazo de cuatro meses y en la que se hace una aclaración en el valor final del contrato. Modificatorio que no fue consultado, ni avalado por la interventoría. La interventoría mediante comunicación C-T-135-239-2024 del 09/08/2024 emite observaciones a dicho documento. Posteriormente el Municipio mediante modificatorio No. 3 del 30/08/2024 hace aclaración a los plazos del contrato.
Modificatorio 2	16/04/2024	Modificación por solicitud de la interventoría, con el fin de dar cumplimiento a las GARANTIAS establecidas en el numeral 10 de los estudios previos del convenio 2220-2023 suscrito entre INVIAS y el MUNICIPIO DE PONEDERA del cual se deriva el contrato de obra LP-001-2023. Incluyendo el amparo de Calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras. Se establece el amparo de estabilidad de obra por un valor del 30% del valor del contrato.
Modificatorio 3 (Prorroga No. 1)	30/08/2024	Modificatorio en el que se realiza aclaración del plazo del contrato y se realiza prorroga No. 1 que amplía el plazo del contrato de obra hasta el 14 de diciembre de 2024, conforme al plazo del contrato de interventoría.

Tabla 3 Suspensiones PONEDERA

Descripción	Fecha	Causales
Suspensión No. 1	Del 29 de julio al 27 de agosto de 2024.	Se realiza suspensión del contrato, con el fin de que el Municipio de Ponedera gestione los desvíos necesarios y posible vía alterna, para la restricción del tráfico pesado por el corredor objeto del contrato. La restricción del tráfico se planteó como necesaria en el PMT, debido a que por los anchos de la vía y geometría, se imposibilita la ejecución de las obras paralelamente con actividades constructivas.

Estado de Garantías

Tabla 4 Seguimiento Pólizas PONEDERA

Amparo	Póliza N°	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento de contrato.	400052346	$ 1.246.000.000,00	1/3/2024	1/2/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	400052346	$ 6.230.000.000,00	1/3/2024	1/8/2025
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	400052346	$ 2.492.000.000,00	1/3/2024	1/8/2027
Estabilidad y de la Obra	400052346		No presenta	
Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños.				
Predios labores y operaciones, contratista y subcontratistas, vehículos propios y no propios.	400052345	$ 623.000.000,00	11/4/2024	1/8/2024

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento Garantías Contractuales, se presenta sin la firma de interventoría, teniendo en cuenta que el contratista no ha realizado la corrección y actualización las pólizas según observaciones realizadas por la interventoría y que tienen que ver con que no se incluye el amparo de Estabilidad de obra, no se incluye el amparo de estudios y diseños y no se actualizan las pólizas acorde al acta de inicio del 01/03/2024, modificación 02, suspensión 01 y modificación 03 al contrato de obra.

Al respecto la interventoría ha realizado los siguientes requerimientos:

Tabla 5 Requerimientos Interventoría – Pólizas PONEDERA.

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
C-T-135-055-2024	14 de mayo de 2024	PO - Reiterativo 1 - Solicitud Pólizas Acta de inicio del contrato de obra
C-T-135-096-2024	7 de junio de 2024	PO – ADVERTENCIA POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA
C-T-135-106-2024	11 de junio de 2024	PO – REITERACIÓN 2 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA
C-T-135-267-2024	28 de agosto del 2024	Se solicita la actualización de pólizas producto de la suspensión No. 1 al contrato de obra.
C-T-135-305-2024	26 de septiembre de 2024	Se informa que no se ha dado cumplimiento a la Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.
C-T-135-329-2024	2 de octubre de 2024	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos.
C-T-135-340-2024	9 de octubre de 2024	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos
C-T-135-356-2024	17 de octubre de 2024	PO- Incumplimiento de compromisos, atraso de obra y respuesta plan de contingencia.

Las pólizas no han sido corregidas y actualizadas por el contratista, situación que conllevo a la interventoría a recomendar dos procesos sancionatorios al Municipio

de Ponedera mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024. Los proesos sancionatorios no han sido iniciados por el Municipio de Ponedera.

A la fecha a pesar de los compromisos fijados en comités y que se han solicitado medidas sancionatorias al Municipio de Ponedera, el contratista no ha realizado la actualización y corrección de las polizas.

b) Información contrato Sabanagrande

Contrato de obra adjudicado mediante licitación pública No. SG-LP-OP-004-2023 con la siguiente información del convenio y contrato de obra:

Tabla 6 Información del convenio y contrato de obra SABANAGRANDE

Convenio INVIAS No.	**2221-2023**
Fecha Convenio INVIAS No.	**21 de junio de 2023**
Objeto Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1 Convenio	Doce (12) meses
Fecha Prorroga No.1 Convenio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2024
No. Proceso	SG-LP-OP-004-2023
Contrato Nº:	**SG-LP-OP-004-2023**
Fecha suscripción Contrato	**29 de septiembre de 2023**
Aprobación Cesión	17 de octubre de 2023
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Tramo	SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO
Contratista:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S
Nit	900.614.442-2
Conformado por:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S
Representante legal:	ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO
Valor inicial:	**$ 6.542.182.495,26**
Valor adicional	N/A
Anticipo:	$ 1.962.654.748,58
Plazo Inicial:	Tres (3) meses
Fecha de Inicio:	4 de marzo de 2024
Fecha de terminación inicial:	4 de junio de 2024
Prorroga No. 1	Seis (6) meses
Fecha Prorroga No. 1	9 de mayo de 2024
Suspensión No. 1	N/A
Fecha reanudación No. 1	N/A
Fecha de terminación Actual:	4 de diciembre de 2024

Como se pudo identificar en la tabla anterior el contrato de obra SG-LP-OP-004-2023 fue suscrito el 29 de septiembre de 2023, sin embargo, la interventoría solo suscribió el contrato hasta el 05 de diciembre de 2023 y orden de inicio del 19 de diciembre de 2023 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Posteriormente se realiza una suspensión No. 1 del contrato de interventoría entre el 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024 con el fin de alcanzar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta que las alcaldías/gobernaciones, se encontraban finalizando su proceso de empalme administrativo debido a la finalización e inicio de los periodos constitucionales de los respectivos mandatarios, razón por la cual no se había impartido para final de año, el inicio a los respectivos contratos de obra; entre otros, por que el cambio de administración implica el cambio de funcionarios, supervisores y personal de apoyo, lo cual afecta la capacidad operativa de los entes territoriales para conducir la correcta ejecución de los contratos. Es así que su vez dicha suspensión permite otorgar los tiempos necesarios para el estudio y aprobación de la prórroga No. 1 al contrato de interventoría 4805 DE 2023 suscrito entre el INVIAS y el CONSORCIO ODESSA; Prorroga No. 1 al contrato de interventoría, que se suscribe el 12 de febrero de 2024 por un término de 10 meses, contemplando como fecha de terminación del contrato de interventoría el 14 de diciembre de 2024.

De igual manera teniendo en cuenta el convenio 2221-2023 suscrito entre el Municipio de Sabanagrande y el INVIAS tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, se suscribe prorroga No. 1 al convenio 2221-2023 el 07 de diciembre de 2023, ampliado su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Lo anterior finalmente permite garantizar los plazos del convenio e interventoría para la ejecución de las obras del contrato de obra.

Contrato, adiciones, prorrogas y modificaciones.

A la fecha no se han suscrito modificaciones, adiciones o prorrogas al contrato de obra.

Tabla 7 Modificaciones, adiciones y prorrogas SABANAGRANDE.

Descripción	Fecha	Causales
Modificatorio 1		Modificatorio suscrito al parecer por el Municipio de Sabanagrande, sin conocimiento de la interventoría. Este ha sido solicitado por la interventoría, sin encontrar respuesta del Municipio. De igual manera no se encuentra en la plataforma SECOP.

Modificatorio 2	17/04/2024	Modificación por solicitud del Municipio de la cláusula 3 – ALCANCE DEL OBJETO, agregando el PARAGRAFO 1 con el fin de excluir de la intervención que se realizará en el corredor, el tramo comprendido entre el K2+000 al K2+850 debido a que este tramo será priorizado con otra intervención para pavimento por parte del Municipio de Sabanagrande. Se agrega el PARAGRAFO 2 que modifica una nota del formato de presupuesto en el sentido de permitir a las partes redistribuir los recursos destinados a la partida de mantenimiento vial, hacia la partida de mejoramiento con estructura de pavimento de acuerdo con las revisiones técnicas y necesidades del proyecto.
Modificatorio 3 (Prorroga No. 1)	9/05/2024	Prorroga por **seis (6) meses**, ampliando el plazo de ejecución a nueve (9) meses. Al respecto la interventoría no estuvo de acuerdo con el tiempo de dicha prorroga, ya que la interventoría otorgó aval únicamente por un término de tres (3) meses. El desacuerdo se manifestó al INVIAS y el Municipio de Sabanagrande mediante comunicado C-T-135-153-2024 del 02 de julio de 2024. Se actualiza el índice de ajustes de ICCP a ICOCIV.
Modificatorio 4	26/07/2024	Modificar la cláusula No. 8 FORMA DE PAGO, en la cual disminuye el porcentaje de anticipo del 30% al 11% de acuerdo con los desembolsos autorizados a la fecha. El saldo de los recursos de anticipo recursos fueron retornados a la cuenta del convenio el 11/09/2024.

Teniendo en cuenta la suscripción de la prórroga No. 1, la nueva fecha de terminación del contrato es el 04 de diciembre de 2024.

Estado Garantías

Tabla 8 Seguimiento Pólizas SABANAGRANDE.

Se presentan las pólizas actualizadas del contrato de obra SG-LP-OP-004-2023.

Amparo	Póliza N°	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato.	5-44-101124914	$ 654.218.249,53	4/3/2024	18/5/2025
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5-44-101124914	$ 1.308.436.499,05	4/3/2024	16/1/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	5-44-101124914	$ 1.962.654.748,58	4/3/2024	18/5/2025
Estabilidad y de la Obra	5-44-101124914	$ 1.962.654.748,58	5 años y 1 dias despues de terminación.	
Calidad del servicio	5-44-101124914	$ 11.294.944,50	18/5/2024	19/5/2029
Predios labores y operaciones, contratista y subcontratistas, vehiculos propios y no propios.	85-40-101057279	$ 464.000.000,00	4/3/2024	16/1/2025

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento Garantías Contractuales, se amplía la información.

3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes

a) Actividades Vía GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.

Debido a que el contratista no ha finalizado la etapa de estudios y diseños del contrato debido a que no se han atendido de forma oportuna y con la calidad requerida las observaciones de interventoría, se han adelantado actividades para complementar los estudios y diseños. Así mismo debido a que ya se cuenta con diseño de pavimento aprobado y se tiene el avala de 1 Km de diseño geométrico, el contratista dio inicio a las actividades de obra el 07 de octubre de 2024, por tanto, las actividades son las siguientes:

- ✓ Replanteo Topográfico
- ✓ Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al Estudio hidrológico e hidráulico
- ✓ Se realizan comités de obra con el objetivo socializar ajustes a los diseños y documentos de inicio de las obras.
- ✓ Mantenimiento de sitios críticos para mejorar vía de acceso.
- ✓ Explanaciones: Excavación e instalación de material de mejoramiento de subrasante del K0+090 al K0+670.

b) Actividades Vía SABANAGRANDE – POLONUEVO - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE.

En el presente periodo se realizan actividades de ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y actividades de obra, entre las que se encuentran:

- ✓ Ajustes del diseño geométrico y estudio hidráulico.
- ✓ Explanaciones entre el K0+950 al K1+500.
- ✓ Instalación de subbase del K1+000 al K1+550.
- ✓ Instalación de concreto MR 3.8 Mpa del K0+050 al K0+300.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos

a) Seguimiento ítems no previstos Vía GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA).

A la fecha de no se ha dado inicio a la ejecución de ítems no previstos para este contrato.

b) Seguimiento ítems no previstos Vía SABANAGRANDE – POLONUEVO (SABANAGRANDE).

Tabla 9 Seguimiento Ítems no previstos SABANAGRANDE.

No. DE ORDEN	GRAL.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
NP-01	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	$ 31.500,00	2.023,30	$ 63.733.950,00
NP-02	900.2.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con precio de mercado)	M3-KM	$ 2.210,00	11.078,00	$ 24.482.380,00
NP-03	672,3	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,15m)	ml	$ 48.495,75	-	
NP-04	220.2P	TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	m3	$ 22.204,95	70,80	$ 1.572.110,00
NP-05	663.3P	TUBERIA DE PVC CORRUGADA PERFORADA Ø 4"	ml	$ 22.547,14	-	
NP-06	673,1,1	Geotextil NT 2000	m2	$ 6.748,22	-	
NP-07	673,2	Material filtrante Grava de 3/4 a 3 pulgada	m3	$ 242.390,56	-	
				SUB-TOTAL		**$ 89.788.440,00**
				SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA		**$ 2.949.423.958,00**

Con corte al acta parcial de obra No. 3 del 10/10/2024, se tiene una ejecución en ítems no previstos de $ 89.788.440,00 que equivale 3.0% de la obra ejecutada.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

a) Estado de avance Vía GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.

El CONSORCIO ODESSA en cumplimiento de sus obligaciones, y de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública LP-001-2023 cuyo Objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", mediante comunicado C-A-135-005-2023 con fecha 20 de diciembre de 2023, informa al contratista que de acuerdo con el Subnumeral 8.1 se establecen los documentos que se deben entregar por parte del contratista al interventor para el seguimiento y control del contrato de obra, los cuales son indispensables antes del inicio los cuales se dividen en la entrega de la documentación inicial y la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños; información que ha sido entregada por el contratista y revisada por la interventoría. Así mismo la interventoría solicitó al Municipio de Ponedera los estudios y diseños del contrato sin encontrar respuesta, por tanto, el contratista ha presentado a interventoría estudios y diseños en el marco de sus obligaciones contractuales.

La interventoría estuvo suspendida entre el 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024, posteriormente desde el 01 de febrero de 2024 se ha surtido la revisión de interventoría y ajustes en los documentos por parte del contratista. Posteriormente y una vez surtidas reuniones con el INVIAS y Municipio de Ponedera se suscribe acta de inicio del contrato de obra con fecha del 01 de marzo de 2024. A partir de la fecha se han desarrollado recorridos de campo, comités de obra y se ha venido definiendo las intervenciones necesarias sobre el corredor.

- **Estado Estudios y diseños.**

A la fecha el contratista ya entrego los estudios y diseños necesarios para la intervención de las obras a excepción del diseño estructural para el cual se esta evaluando la necesidad de acuerdo con las obras de drenaje que se definan en el diseño hidráulico para intervención. Los documentos se encuentran siendo ajustados por el contratista de acuerdo con observaciones de la interventoría y sus especialistas.

Se presenta incumplimiento por parte del contratista en la no obtención de la aprobación del estudio hidráulico y diseño, geométrico. Mediante comunicación C-T-135-188- 2024 del 18/07/2024 se recomienda al Municipio de Pondera la apertura de un proceso sancionatorio por incumplimientos en la aprobación de estudios y diseños y programación de obra. Posteriormente se actualiza y se

reitera el proceso mediante comunicación C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, sin embargo, a la fecha el municipio no ha acogido la recomendación de la interventoría.

- **Estado Ejecución de obra,**

Respecto al avance de las obras, la interventoría informa que a la fecha se evidencian importantes atrasos en programación de obra por parte del CONSORCIO LA GIRALDA, que se deben principalmente lo siguiente:

- Posterior a la reanudación No. 1 del plazo del 28 de agosto de 2024, el contratista no realizó las actividades preliminares de obra y de estudios y diseños que se encuentran pendientes y que son necesarias para dar inicio a la ejecución de las obras. Al respecto la interventoría mediante comunicación C-T-135-267-2024 del 28/08/2024 requiere al contratista reanudar la ejecución de las actividades pendientes, mostrando este un avance escaso en cuanto al diseño geométrico, estudio hidráulico y actividades previas de obra, como implementación del PMT, documentación de maquinaria y personal de obra.

- Se identifica en el mes de septiembre de 2024, que los incumplimientos del contratista aumentan, entre los que se encuentran la no presencia del director de obra, residente de obra, profesional SST, informes ambientales, informes sociales, actualización de garantías y atrasos significativos en la obra, sin que se muestre por parte del contratista voluntad de cumplimiento en compromisos fijados en comités. Por tal razón la interventoría mediante comunicación C-T-135-312-2024 del 19/09/2024, solicita al municipio iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024 se han incrementado.

- El 07 de octubre de 2024 el contratista finalmente da inicio a las explanaciones e instalación de mejoramiento de subrasante en longitud de 470 m, entre el K0+090 al K0+670 que representa un avance de obra de 1.8% vs un programado de 72%, lo que representa un atraso del 70.2%, imputable al contratista de obra.

- **Estado de avance físico Ponedera.**

Actividad	Programado	Ejecutado Mes	Ejecutado acumulado	% meta física
Mejoramiento (Pavimento Rígido)	2,70 Km	0,00 Km	0,00 Km	0%

Mantenimiento (Conformación de calzada y afirmado) en sectores criticos.	5,70 Km	0,00 Km	0,00 Km	0%
Box culvert	1 Un	0,00 Km	O un	0%

- **Estado de avance financiero Ponedera**

A la fecha el presupuesto del contrato no ha sufrido modificaciones y no se han suscrito actas de recibo parcial.

Tabla 10 Estado financiero Contrato de obra – Ponedera

Descripción	Programado	Ejecutado
SECCIÓN 1 - ÍTEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	**$ 9.708.724.909,30**	**$ 226.772.701,00**
I. EXPLANACIONES PAVIMENTO RIGIDO	$ 2.077.662.740,00	$ 194.472.701,00
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT 1x1 L=6m	$ 29.803.499,00	$ 0,00
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	$ 6.279.450.409,30	$ 0,00
ITEMS NO PREVISTOS	$ 1.321.808.261,00	$ 32.300.000,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 2.487.318.216,00**	**$ 0,00**
I.EXPLANACIONES	$ 2.487.318.216,00	$ 0,00
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 12.196.043.125,30**	**$ 226.772.701,00**
PMT	$ 48.543.625,00	$ 0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 33.807.959,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 67.915.918,00	$ 27.166.367,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 113.689.372,70	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 12.460.000.000,00**	**$ 253.939.068,00**

El contrato de obra se encuentra en etapa de ajustes a los estudios y diseños y se registra un avance aproximado asignado a los estudios y diseños que encuentran aprobados que corresponden a estudio geotécnico y diseño de pavimentos.

A continuación, se presenta el estado de avance financiero de obra según el programa de inversiones, y teniendo en cuenta la totalidad de los avances ejecutados durante el desarrollo del contrato.

Tabla 11 Estado de avance financiero obra PONDERA.

MES CORTE	oct-24	
INVERSION	VALOR	%

EJECUTADO	$ 226.772.701,00	1,86%
PROGRAMADO	$ 8.743.444.995,67	71,69%
PROGRAMADO-EJECUTADO	-$ 8.516.672.294,67	-69,83%
RELACION E/P		0,03

Con corte al **31 de octubre de 2024** se tiene un avance ejecutado acumulado del **1.9%** y avance programado acumulado **71.7%** razón por la cual con respecto a la reprogramación No. 1 al programa de inversiones realizada para la prórroga No. 1, se presenta un atraso en programación imputable al contratista por las demoras en la aprobación de los estudios y diseños, el no inicio oportuno de las actividades de obra y bajos rendimientos en la ejecución posterior al inicio de obras en el mes de octubre de 2024, debido a que no se implementan la maquinaria, equipo, personal e ingreso de materiales necesarios para mitigar los atrasos en la programación de obra.

Respecto a los atrasos del contratista la interventoría mediante comunicación C-T-135-188- 2024 del 18/07/2024, recomendó al Municipio de Pondera la apertura de un proceso sancionatorio por incumplimientos en la aprobación de estudios y diseños y programación de obra.

Posteriormente se actualiza el proceso sancionatorio mediante comunicación C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, en el que se reitera la necesidad de conminar al contratista de obra y ante la nula ejecución de obra en el mes de septiembre de 2024 se recomienda apertura de proceso de caducidad del contrato mediante comunicación C-T-135-312-2024 del 19/09/2024.

En el presente mes se ha realizado requerimientos al contratista por la baja ejecución y atrasos en programación, por medio de comités se han establecido compromisos, los cuales no han sido cumplidos oportunamente por el contratista, lo que conlleva a la interventoría a realizar los siguientes requerimientos:

FECHA	CÓDIGO	ASUNTO
2 de octubre de 2024	C-T-135-329-2024	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos.
9 de octubre de 2024	C-T-135-340-2024	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos
17 de octubre de 2024	C-T-135-356-2024	PO- Incumplimiento de compromisos, atraso de obra y respuesta plan de contingencia.

Respecto al cierre del Tramo vial a intervenir y alternativas de desvío con el fin de dar cumplimiento al PMT y poder desarrollar las obras, el Municipio de Ponedera informó en comité del 05/09/2024 que solicitó el desplazamiento del ferry que comunica con el Municipio de Salamina (Magdalena) a los operadores, lo anterior permitirá disminuir considerablemente el tráfico y evitar desvíos y rutas alternas, para llevar a buen término la ejecución de las obras.

b) Estado de avance Vía SABANAGRANDE – POLONUEVO - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE.

El CONSORCIO ODESSA en cumplimiento de las obligaciones que atañe a esta interventoría, y de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública SG-LP-OP-004-2023 cuyo Objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", mediante comunicado C-A-135-006-2023 del 20 de diciembre de 2023, informa al contratista que de acuerdo con el Subnumeral 8.1 se establecen los documentos que se deben entregar por parte del contratista al interventor para el seguimiento y control del contrato de obra, los cuales son indispensables antes del inicio los cuales se dividen en la entrega de la documentación inicial y la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños; información que ha sido entregada por el contratista y revisada por parte de esta interventoría. Así mismo la interventoría solicitó al Municipio de Sabanagrande los estudios y diseños del contrato sin encontrar respuesta, por tanto, el contratista ha presentado a interventoría estudios y diseños en el marco de sus obligaciones contractuales.

La interventoría estuvo suspendida entre el 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024, posteriormente desde el 01 de febrero de 2024 se ha surtido la revisión de interventoría y ajustes en los documentos por parte del contratista. Posteriormente y una vez surtidas reuniones con el INVIAS y Municipio de Sabanagrande se suscribe acta de inicio del contrato de obra con fecha del 04 de marzo de 2024. A partir de la fecha se han desarrollado recorridos de campo, comités de obra y se ha venido definiendo las intervenciones necesarias sobre el corredor.

A la fecha el contratista ya entrego los estudios y diseños necesarios para la intervención de las obras. Los documentos de diseño geométrico y estudio hidráulico se encuentran siendo ajustados por el contratista de acuerdo con observaciones de la interventoría y sus especialistas, sin embargo, ya se han definido por interventoría y contratista el dimensionamiento de la estructura de pavimento y diseño geométrico de 2.0 Km, lo cual permitió dar inicio a las actividades de obra en el mes de mayo de 2024.

Para este corredor, aunque fue definido por el municipio como una vía terciaria, se identificó la presencia de redes de servicios públicos como agua y gas, lo cual ha requirió de tiempos adicionales en la etapa de estudios y diseños para verificar la ubicación y profundidades de dichas redes con el fin de proyectar adecuadamente el diseño geométrico. Como consecuencia las actividades adicionales para la identificación de redes, necesarias para la definición de estudios y diseños se ha suscrito prorroga No. 1 al contrato de obra.

Se han requerido gestiones con la empresa de servicio de acueducto Triple A y el Municipio de Sabanagrande, gestionando la realización de tuberías nuevas a borde vía y cruces de acometidas para las tuberías proyectadas, lo cual ha demandado de tiempos adicionales y que el contratista tenga que realizar la consecución de estas tuberías para proceder con la estructura de pavimento.

La empresa de acueducto Triple A se encuentra adelantando la instalación de una tubería nueva del K0+000 al K3+000 por margen derecho. Al respecto se ha verificado que se esta se instale por fuera del ancho de vía a excepción del K0+000 al K0+100 donde en algunos puntos por el espacio puede quedar debajo de bordillo. La interventoría y planeación notificaron la situación a la empresa Triple A, así como el diseño geométrico previamente y la empresa respondieron que se haría responsables de cualquier afectación en la estructura de pavimento si se llegase a requerir alguna reparación de las tuberías.

- **Estado de avance físico de obra.**

Una vez definido el diseño de pavimento y diseño geométrico se adelantan actividades de ejecución de la estructura de pavimento con la actividad de explanación, instalación de subbase e instalación de concreto MR 3.8 Mpa.

El avance físico a la fecha es el siguiente para cada una de las actividades de obra programadas para el contrato.

Tabla 12 Estado avance físico contrato de obra – Sabanagrande

Actividad	Programado	Ejecutado mes	Ejecutado acumulado	% avance físico
Mejoramiento (Pavimento Rígido)	2,0 Km	0,08 Km	1,48 Km	74,0%
Mantenimiento (Conformación de calzada y afirmado)	2,25 Km	0,00 Km	0,00 Km	0,0%

** La longitud de pavimento tiene pendiente la terminación de algunos tramos de carril y bordillo.*

- **Estado de avance financiero del contrato obra (Sabanagrande)**

A la fecha el presupuesto del contrato no ha sufrido modificaciones y con corte al 31 de octubre de 2024 el avance financiero en cada una de las partidas es el siguiente. Se aclara que el avance financiero es aproximado teniendo en cuenta que aún no se cuenta con el acta parcial No. 4 la cual será tramitada con corte al 10 de noviembre de 2024.

Tabla 13 Estado financiero contrato de obra – Sabanagrande

Descripción	Programado	Ejecutado
SECCION 1- ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	**$ 5.227.509.962,70**	**$ 3.113.309.409,00**
I. EXPLANACIONES	$ 0,00	$ 0,00
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT 1X1 L=6m	$ 60.076.163,00	$ 0,00
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO ANCHO CALZADA 5,5m	$ 4.654.859.040,70	$ 3.018.531.853,00
ÍTEM NO PREVISTOS	$ 512.574.759,00	$ 94.777.556,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 988.316.066,66**	**$ 0,00**
I. MANTENIMIENTO PERIODICO CON ADICION DE MATERIAL. CORREDOR VIAL	$ 988.316.066,66	$ 0,00
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 6.215.826.029,36**	**$ 3.113.309.409,00**
PMT	$ 26.321.802,00	$ 0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 14.387.139,20	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 37.649.815,00	$ 30.119.852,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 247.997.709,70	$ 124.532.376,00
VALOR TOTAL	**$ 6.542.182.495,26**	**$ 3.267.961.637,00**

A continuación, se presenta el estado de avance financiero de obra según el programa de inversiones, y teniendo en cuenta la totalidad de los avances ejecutados durante el desarrollo del contrato. El avance es aproximado y será precisado con el acta de recibo de obra que tiene corte el 10 del próximo mes.

Tabla 14 Estado de avance financiero obra SABANAGRANDE.

MES CORTE	oct-24	
INVERSION	**VALOR**	**%**
EJECUTADO	$ 3.113.309.409,00	50,09%
PROGRAMADO	$ 3.895.970.164,75	62,68%
PROGRAMADO-EJECUTADO	-$ 782.660.755,75	-12,59%
RELACION E/P		0,80

Con corte al **31 de octubre de 2024** y como consecuencia de la reprogramación No. 2 al programa de inversiones por el acta de modificación de cantidades No. 1**,** se tiene un avance ejecutado acumulado del **50.09%** y avance programado acumulado **62.68%** razón por la cual se presente un atraso de obra.

Al respecto la interventoría solicitó al contratista con copia al Municipio de Sabanagrande, mejorar los rendimientos de ejecución y la entrega de un plan de contingencia por los atrasos presentados mediante comunicación C-T-135-373-2024 del 25/10/2024 y se advirtió que de no implementar acciones se recomendaría la entidad contratante las medidas sancionatorias pertinentes por atrasos que sean de imputabilidad del contratista.

- **Estado del anticipo (Sabanagrande)**

Tabla 15 Estado de anticipo de obra SABANAGRANDE.

MES CORTE	oct-24	
VALOR ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR AMORTIZADO
$ 719.745.270,50	$ 719.745.270,50	$ 483.389.853,00
100%	100%	67%

* . El Contrasta de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23 de julio de 2024 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, manifestando que, a la fecha de su oficio, han recibido aproximadamente el 11% del valor pactado en el contrato como anticipo y manifestando la renuncia al pago del SALDO DEL ANTICIPO pactado en el contrato de la referencia y que se proceda a la devolución del saldo del ANTICIPO, no pagado y que se encuentra en la FIDUCIA, a la cuenta del convenio de la referencia

La interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30 de julio de 2024 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo manifestadas por el contrasta en comunicación del 23 de julio de 2024 indicando que no comparte los postulados del contrasta CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S y considera que el contrasta se encuentra en plena facultad de renunciar al anticipo de obra, así mismo informa al municipio que se

puede proceder con solicitud de cancelación del PATRIMONIO AUTONOMO a la entidad fiduciaria y realizar la devolución de los recursos a título de anticipo a la cuenta del convenio 2221-2023.

Por lo anterior el valor del anticipo del contrato pasó de **$ 1.962.654.748,58** a **$719.745.270,50** y el valor restante **($1.242.909.478,08)** fue devuelto de la cuenta de fiducia a la cuenta del convenio 2221-2023 el 11/09/2024.

Teniendo en cuenta el cambio del valor del anticipo bajo la relación del saldo por amortizar y el saldo de contrato, se calcula la amortización de anticipo.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4

OCTUBRE 2024

CONTENIDO

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	N/A
4.8	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
	• Seguimiento Programa de Obra	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1. INFORMES SEMANALES PONEDERA

FECHA: 3-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: 28 del 27-sep-24 al 3-oct-24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas fisicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1		
INTEGRANTES:	LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
SUSPENSIÓN 01	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 63,963,764.00
REINICIO 01	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 193,175,333.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30,248,266			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 12,429,751,734			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 644,254,137			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 885,723,491			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5,219,469,704.82	42.8%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5,219,469,704.82)	-42.8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 30,248,266.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5,219,469,704.82	42.8%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 30,248,266.00	0.2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5,189,221,438.82)	-42.5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 676,172,765.12	5.5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El contrato de obra se encuentra en etapa de estudios y diseños, por lo tanto a la fecha no se presentan valores ejecutados y programados de obra.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 619,014,647.60	40.46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25,239,489.50	1.65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25,239,489.50	100.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 100,957,958.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

	INDICADOR I/C
En el mes:	0.41
Acumulado:	20.46

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2023	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 63,963,764.00
Saldo $	$ 193,175,333.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 42.8% Avance o Atraso Físico % -42.4%
Meta Física Ejecutada % 0.4%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			90.0%	90.0%
					Ejec	53.0%			53.0%	53.0%
* Explanaciones (m)	m	2700			Prog	1155.503			1155.5	42.8%
					Ejec	50			50.0	1.9%
* Mejoramiento	m	2700			Prog	1155.503			1155.5	42.8%
					Ejec					
* Subbase	m	2700			Prog	1155.503			1155.5	42.8%
					Ejec					
* Pavimento rígido	m	2700			Prog	1155.503			1155.5	42.8%
					Ejec					
* Bordillos	m	5400			Prog	2311.007			2311.0	42.8%
					Ejec					
* Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador	1	1
Compactador	1	
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.
Mediante oficio C-T-135-326-2024 la Interventoría reitera al Contratista por el incumplimiento en la presentación de los informe s de seguimiento ambiental correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2024.
Mediante oficio C-T-135-330-2024 la Interventoría reitera al Contratista sobre la subsanación de las observaciones hechas por el INVIAS al documento PAGA y la actualización del mismo.
Mediante oficio C-T-135-331-2024 la Interventoría solicita al Contratista informar sobre el proveedor del afirmado que se viene instalando en la

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: El contratista entrega primera versión del documento PAGA el 2 marzo de 2024, documento que se encuentra en revisión ro parte de interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

OBSERVACIONES:
*27-09-2024. El contratista se encuentra en la firma y otros por parte de la dirección del contrato La Giralda de las actas de vecindad de inicio subsanadas de los formatos originales, está pendiente la entrega formal a la interventoría. *30 -09-2024. Se remite al contratista por parte de la interventoría comunicación C-T-135-325-2024-PO-Requerimiento entrega-Pendientes sociales. *01-10-2024 El área ambiental de interventoría remite al área social por WhatsApp (4) actas de compromisos con observaciones, se revisan por parte del área social y por el mismo medio se devuelven también con observaciones. *02-10-2024. Se remite correo a la gestora social de INVIAS ya que no se tiene respuesta de la entidad del informe trimestral social N° 01 del contrato de Ponedera, se envía comunicación y radicado en la entidad, la gestora remite remitiendo la respuesta de la entidad el 27 de julio de 2024. Se consulta a la gestora de INVIAS para programar comité social de seguimiento al contrato. *03 -10-2024. No se reportó información por parte del contratista. No se reportó atención a PQRSD. Interventoría está a la espera que el contratista reporte el personal vinculado al contrato del AIDP.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO
* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación especifica. A corte del presenmte semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

* Mediante comunicado C-T-135-329-2024 de fecha de 02/10/2024Se realiza llamado de atención al contratista, por los continuos atrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diferentes comités de obra, además de presentar un atraso del 37%

INTERVENTORÍA
* Se realiza adecuación de la via para el ingreso de materiales para la construcción de la misma por parte del contratista,
*Se continúa con localización y replanteo del eje y bordes de vía del diseño,
*Se realiza instalación de cortes de la sub rasante entre abcisas k0+300 al k0+600 calzada,
*Se realiza conformación de la vía entre el ferry y sanrarita entre abcisas k6+500 calzada,

CONTRATISTA


* Replanteo de corredor del Pimer kilomertro del diseño geometrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v9
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v4

NOTA: los estudios y diseño están en etapa de complementación de acuerdo a las revisiones adelantadas por parte de interventoría, dado que el municipio no suministra diseños completos para el desarrollo del contra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATISTA
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del volumen ajustado del Estudio de suelos
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega del diseño de pavimentos
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

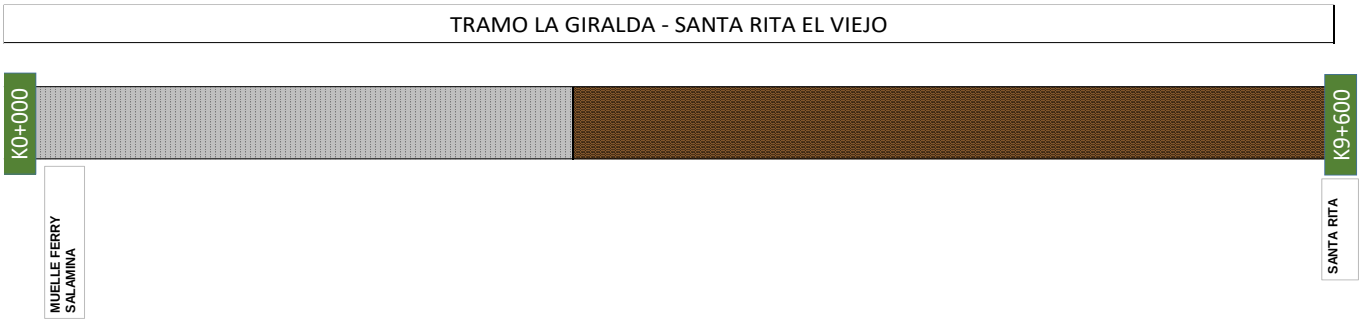

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


INSTALACIÓN DE MEJORAMIENTO K6+660


COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORAMIENTO K6+660


LIMPIEZA PARA INSTALACIÓN DE MATERIAL K8+200

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Revisión de la documentación inicial
* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio.
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRES ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: **29** del **4-oct-24** al **10-oct-24** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas físicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 63,963,764.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 193,175,333.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 50,248,266			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 12,409,751,734			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 662,845,752			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 867,131,876			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6,100,463,527.54	50.0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20,000,000.00	0.2%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6,080,463,527.54)	-49.9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 30,248,266.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6,100,463,527.54	50.0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50,248,266.00	0.4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6,050,215,261.54)	-49.6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 880,993,822.71	7.2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20,000,000.00	0.2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El contrato de obra se encuentra en etapa de estudios y diseños, por lo tanto a la fecha no se presentan valores ejecutados y programados de obra.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 640,930,200.00	41.89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 100,957,958.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Radicado con el comunicado C-A-135-029-2024 de fecha de 12-09-2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.41
Acumulado:	21.19

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2021	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 63,963,764.00
Saldo $	$ 193,175,333.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 50.0% Avance o Atraso Físico % -48.8%
Meta Física Ejecutada % 1.2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cant**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector (n)**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			90.0%	90.0%
					Ejec	53.0%			53.0%	53.0%
* Explanaciones (m)	m	2700			Prog	1350.541			1350.5	50.0%
					Ejec	160			160.0	5.9%
* Mejoramiento	m	2700			Prog	1350.541			1350.5	50.0%
					Ejec					
* Subbase	m	2700			Prog	1350.541			1350.5	50.0%
					Ejec					
* Pavimento rígido	m	2700			Prog	1350.541			1350.5	50.0%
					Ejec					
* Bordillos	m	5400			Prog	2701.081			2701.1	50.0%
					Ejec					
* Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador	1	1
Compactador	1	
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.
Mediante oficio C-T-135-326-2024 la interventoría reitera al Contratista por el incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento ambiental correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2024.
Mediante oficio C-T-135-330-2024 la interventoría reitera al Contratista sobre la subsanación de las observaciones hechas por el INVIAS al documento PAGA y la actualización del mismo.
Mediante oficio C-T-135-331-2024 la Interventoría solicita al Contratista informar sobre el proveedor delafirmado que se viene instalando en la

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	x	N/A
EMISIONES:	SI	NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: El contratista entrega primera versión del documento PAGA el 2 marzo de 2024, documento que se encuentra en revisión ro parte de interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

OBSERVACIONES:
*04-10-2024. Se proyecta comunicación de requerimiento por pendientes sociales y se remite para revisión del director. Se reporta por parte del área SST de interventoría recolección de hojas de vida de personas del AIDP e inducción a quienes ingresan por parte del SST del consorcio La Giralda. *05-10-2024. Interventoría remite al contratista la comunicación C-T-135-334-2024-PO requerimiento de pendientes sociales. *07-19-2024. Se revisa hoja de vida de profesional social del contrato de Ponedera, se solicita por correo al contratista formalizar los documentos en la interventoría. Se procedió a remitirle el documento PAGA por WhatsApp y el día de mañana se realizará reunió para aclarar inquietudes al respecto. *08-10-2024. Se realiza reunión revisión PAGA fichas sociales del contrato a la nueva profesional social de La Giralda. *0910-2024. Se remitió al correo del contratista el acta de la reunión de seguimiento social N °48 para revisión y firmas. Interventoría remite a la Ing. Paola Velandia al WhatsApp el ata de suspensión de obra y acta de prórroga del contrato. Se solicita nuevamente al correo del contratista radicar hoja de vida de la profesional social radicando comunicación igual a las actas de vecindad de inicio. *10-10-2024. Se reporta al área técnica de la interventoría los pendientes sociales para tratarlos en el comité de seguimiento social. El contratista remite a la interventoría por correo informe mensual social N° 4 del mes de junio del año 2024, es revisado por interventoría y se remiten observaciones por el mismo medio recibido. Se gestiona la firma del acta de reunión social N° 48.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gesti ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO
* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación especifica. A corte del presenmte semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

* Mediante comunicado C-T-135-329-2024 de fecha de 02/10/2024Se realiza llamado de atención al contratista, por los continuos atrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diferentes comités de obra, además de presentar un atraso del 37%
* Mediante comunicado C-T-135-340-2024 de fecha de 9/10/2024Se realiza llamado de atención al contratista, por los continuos atrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diferentes comités de obra, además de presentar un atraso del 50%

INTERVENTORÍA
* Se realiza adecuación de la vía para el ingreso de materiales para la construcción de la misma por parte del contratista,
*Se continúa con localización y replanteo del eje y bordes de vía del diseño,
*Se realiza instalación de cortes de la sub rasante entre abscisas k0+300 al k0+600 calzada,
*Se realiza conformación de la vía entre el ferry y sanTarita entre abscisas k6+500 calzada
*Se realiza instalación de señalización entre abscisas k0+000 al k0+090
*Se realiza descapoTE entre abscisas k0+090 al k0+430
*Se realiza corte de la sub rasante entre abscisas k0+090 al k0+190 de la calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abscisas k0+090 al k0+190 calzada,
*Se continúa el corte de la sub rasante entre abscisas k0+190 al k0+240 calzada, llegan a obra 20 rollos de geotextil


CONTRATISTA

* Replanteo de corredor del Primer kilometro del diseño geométrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v9
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v4

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico
OBRA
** Continuar con la explanación del k0+250 a k0+500
** Mejoramiento de la Subrasante: Dar inicio a la instalación de material del k0+090 al k0+250
** Subbase: Dar inicio a la instalación de subbase del k0+090 al k0+250

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

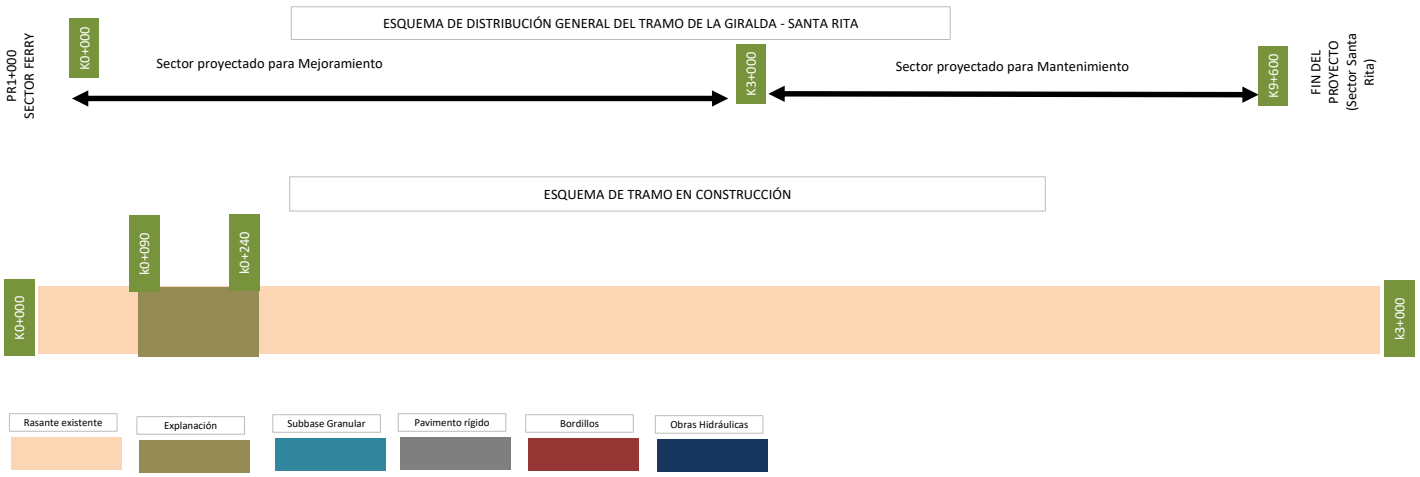

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


EXPLANACIÓN DEL K0+090 AL K0+250


EXPLANACIÓN DEL K0+090 AL K0+250


EXPLANACIÓN DEL K0+090 AL K0+250

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Revisión de la documentación inicial
* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio.
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: **30** del **11-oct-24** al **17-oct-24** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas físicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 63,963,764.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 193,175,333.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 124,734,712			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 12,335,265,288			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 684,761,305			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 845,216,323			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6,981,457,350.25	57.2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 97,568,345.00	0.8%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6,883,889,005.24)	-56.4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 27,166,367.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6,981,457,350.25	57.2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124,734,712.00	1.0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6,856,722,638.24)	-56.2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 880,993,822.71	7.2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 77,568,345.00	0.6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 662,845,752.40	43.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 100,957,958.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta de costos No7

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.41
Acumulado:	24.40

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2021	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 63,963,764.00
Saldo $	$ 193,175,333.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 57.2%
Meta Física Ejecutada % 2.2%
Avance o Atraso Físico % -55.0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cant**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector (n)**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			1	90.0%
					Ejec	47.6%			0	47.6%
* Explanaciones (m)	m	2700			Prog	1545.578			1546	57.2%
					Ejec	300			300	11.1%
* Mejoramiento	m	2700			Prog	1545.578			1546	57.2%
					Ejec					
* Subbase	m	2700			Prog	1545.578			1546	57.2%
					Ejec					
* Pavimento rígido	m	2700			Prog	1545.578			1546	57.2%
					Ejec					
* Bordillos	m	5400			Prog	3091.156			3091	57.2%
					Ejec					
* Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador	1	1
Compactador	1	1
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.
Mediante oficio C-T-135-326-2024 la Interventoría reitera al Contratista por el incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento ambiental correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2024.
Mediante oficio C-T-135-330-2024 la Interventoría reitera al Contratista sobre la subsanación de las observaciones hechas por el INVIAS al documento PAGA y la actualización del mismo.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-341-2024 la Interventoría aprobó los informes mensuales de seguimiento ambiental de los meses de junio y julio de 2024.
Mediante oficio C-T-135-353-2024 la Interventoría aprobó el informe mensual de seguimiento ambiental del mes de agosto de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
FICA MANUELA ISABEL. ATENCION DE 8:00am A 12:00m. Los días viernes

OBSERVACIONES:
*11-10-2024. Revisión por parte de la interventoría, del informe mensual social N° 4 del mes de junio de 2024 y aprobación con la comunicación C-T-135-342-2024. *12-10-2024. La profesional social reporta a la interventoría situación que están manifestando los propietarios de los predios anegados por los arroyos problemática que es recurrente en estos predios. se remiten fotos y videos se procede a remitir la información al director y residente técnico de la interventoría, actividad verificada ocurrió el 11.10.2024. *14-10-2024. Interventoría gestiona la entrega de los pendientes sociales. *15-10-2024. Se le solicita al contratista radicar formalmente la hoja de vida de la profesional social que postulan. Interventoría con la comunicación C-T-135-351-2024 emite concepto de aprobación. Se solita a la profesional social del contratista verificar en las visitas al sitio donde adelantan intervenciones por las obras no se generen afectaciones a cerca dos o infraestructura de los predios. Interventoría reporta el estado de pendientes sociales de este contrato. *16-10-2024. Se solicitó al contratista telefónicamente remitir para revisión los informes mensuales sociales pendient es el mismo día a las 7p.m. los remiten al correo social de la interventoría. Interventoría remite convocatoria a reunión de seguimiento social para el día jueves 17 de octubre. *17-10-2024. Interventoría revisa los informes mensuales sociales del contratista correspondientes a los meses de julio y agosto de 2024. Se remiten observaciones al correo de la profesional que elabora los informes del contratista, Se realiza reunión de seguimiento social al contrato, se levanta el acta de reunión N° 50 y se remite para firmas del contratista

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gesti ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO
* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación especifica. A corte del presenmte semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA. A corte del presente semanal el Municipio no ha dado respeuesta a la solicitudes.

* Mediante comunicado C-T-135-344-2024 de fecha de 12/10/2024 Se solicita dar cumplimiento con la entrega de los respectivos soportes de pago de seguridad social.
* Mediante comunicado C-T-135-356-2024 de fecha de 17/10/2024 Se realiza llamado de atención al contratista, por los continuos atrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diferentes comités de obra, además de presentar un atraso del 57%. de igual forma se le solicita ajustar el plan de contingencia.

INTERVENTORÍA
* Se realiza corte de la sub rasante entre abcisas k0+300 al k0+340 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+340 al k0+380 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante y céreo de la misma entre abcisas k0+090 al k0+250 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+250 al k0+300 calzada,
*Se realiza replanteo de ejes entre abcisas k0+100 al k0+180 calzada,
*Se recibe por topografía tramo de sub rasante entre abcisas k0+100 al k0+180 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+200 al k0+250 calzada,


CONTRATISTA

* Replanteo de corredor del Primer kilometro del diseño geométrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v13
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v4

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico
OBRA
** Continuar con la explanación del k0+250 a k0+500
** Mejoramiento de la Subrasante: Dar inicio a la instalación de material del k0+090 al k0+250
** Subbase: Dar inicio a la instalación de subbase del k0+090 al k0+250

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

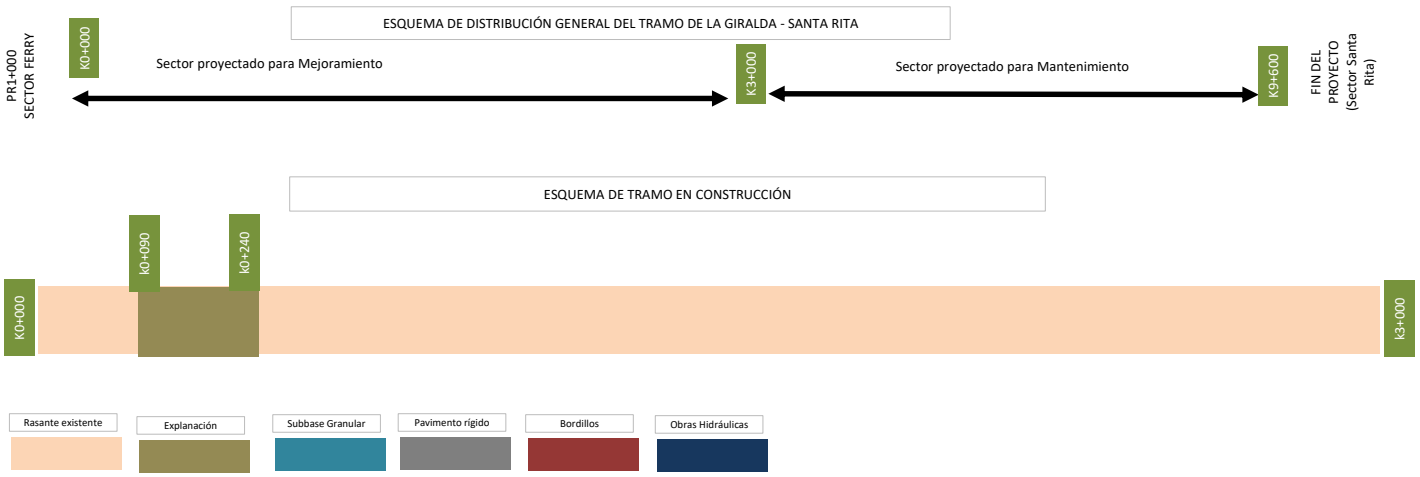

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



corte de la sub rasante k0+440



corte de la sub rasante del k0+250



corte de la sub rasante del k0+250

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Revisión de la documentación inicial
* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio.
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: **31** del **18-oct-24** al **24-oct-24** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas físicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 115,266,678.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 141,872,419.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 184,720,968			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 12,275,279,032			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 706,676,857			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 823,300,771			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7,862,451,172.96	64.5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 154,472,701.80	1.3%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7,707,978,471.15)	-63.2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 30,248,266.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7,862,451,172.96	64.5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184,720,967.80	1.5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7,677,730,205.15)	-63.0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 880,993,822.71	7.2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 56,904,356.80	0.5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El contrato de obra se encuentra en etapa de estudios y diseños, por lo tanto a la fecha no se presentan valores ejecutados y programados de obra.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 684,761,304.80	44.76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 93,923,796.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No8

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.41
Acumulado:	22.64

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2021	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 115,266,678.00
Saldo $	$ 141,872,419.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 64.5%
Meta Física Ejecutada % 3.7%
Avance o Atraso Físico % -60.8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			90.0%	90.0%
					Ejec	53.0%			53.0%	53.0%
* Explanaciones (m)	m	2700			Prog	1740.615			1740.6	64.5%
					Ejec	300			300.0	11.1%
* Mejoramiento	m	2700			Prog	1740.615			1740.6	64.5%
					Ejec	200			200.0	7.4%
* Subbase	m	2700			Prog	1740.615			1740.6	64.5%
					Ejec					
* Pavimento rígido	m	2700			Prog	1740.615			1740.6	64.5%
					Ejec					
* Bordillos	m	5400			Prog	3481.23			3481.2	64.5%
					Ejec					
* Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador	1	1
Compactador	1	1
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Carro tanque	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO x	N/A	
EMISIONES:	SI	NO x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-370-2024, Interventoría solicitó la entrega del informe de seguimiento mensual ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024.
Mediante oficio C-T-135-369-2024, Interventoría reiteró la actualización y atención a observaciones del documento PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

OBSERVACIONES:
*18-10-2024. Se participo en el comité de seguimiento N°28 del contrato. La profesional social del contratista se encuentra atendiendo el día de hoy el SAU, no se reportan novedades.Se remiten los contactos telefónicos de los líderes del tramo en intervención al director de La Interventoría para programar l a visita a los sitios y cumplir el compromiso de la reunión de inicio. La profesional social del contratista realiza contactos con habitantes de los predios para gestión a ctas de compromiso. *19-10-2024 Se gestionó firma del acta N°50 y se remitió firmada al correo de la interventoría. *21-10-2024 Se realizó reunión N° 51 mesa de trabajo revisión formatos INVIAS informe mensual de agosto/2024 y revisión de anexos que aplican en ese periodo. Interventoría organizo del mes de julio a octubre de 2024, registro fotográfic o para la elaboración del respectivo anexo de cada mes en los informes mensuales. También se remitió información datos del cont rato, para actualizar los datos en los formatos INVIAS que se reportan en los informes mensuales del contratista. *22-10-2024 Se revisan y complementan por interventoría los datos que le corresponden en los formatos INVIAS de los informes mensuales sociales del contratista de los meses de julio y agosto, se remiten al correo los formatos ajustados en excel y en PDF firmados, para que procedan a radicarlos en la interventoría. Se gestiona las firmas del acta de la reunión N° 51 mesa de trabajo revisión informes mensuales del contratista. El contratista informa a través de correo que realizará reunión de seguimiento del contrato el 31-10-2024, interventoría por el mismo medio le solicita el volante informativo y la presentación donde se dé a conocer los avances del contrato. *23-10-2024. Interventoría remite comunicación C-T-135-367-2024-PO-Requerimiento entrega de documentos Sociales pendientes. El contratista remite comunicación junto al informe mensual social N°5 del mes de julio del año en curso, interventoría remite comunicación con el concepto de aprobación. Se recibe del contratista, el acta N° 51, firmada de la mesa de trabajo revisión del informe de julio y se remite para los archivos de interventoría. *24-10-2024. Interventoría emite concepto de aprobación del informe mensual social N °5 de julio de 2024 con la comunicación C-T-135-371-2024. Se realiza reunión N° 52 de seguimiento social al contrato con la participación de las profesionales sociales del contratista e interventoría. El contratista consulta sobre solicitud de material se dan las indicaciones técnicas, ambientales y sociales y en caso que se realicen donaciones dejar claridad el uso, cantidades y levantar el acta de compromiso y registro formato PQRSD s i se procede. Se recibe correo remitiendo el volante informativo N°2 correspondiente a la invitación de la reunión de seguimiento con el CPC del contrato, interventoría emite concepto de aprobación por el medio recibido. El área técnica del contratista e interventoría realizan recorrido en la vía con habitantes de la comunidad para identificar puntos críticos. Se elabora y se remite el informe social de las actividades ejecutada en la semana.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gesti ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO

* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación especifica. A corte del presente semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

* Mediante comunicado C-T-135-366-2024 de fecha de 22/10/2024 Se Informa al INVIAS las dificultades que se tienen con el seguimiento al convenio por parte del Municipio de Ponedera

INTERVENTORÍA
* Se inicia instalación de material de mejoramiento entre abscisas k0+100 al k0+180 calzada, Instalación de geotextil para capas granulares entre abscisas k0+100 al k0+180 calzada, Se realiza céreo de la sub rasante entre abscisas k0+190 al k0+300 calzada, Se continúa con el corte de la sub rasante entre abscisas k0+500 al k0+570 calzada, Se realiza prueba de carga al tramo de sub rasante entre abscisas k0+180 al k0+280 calzada,
*Se recibe tramo de sub rasante entre abscisas k0+180 al k0+280 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abscisas k0+180 al k0+250 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abscisas k0+180 al k0+250 calzada,
*Se recibe por topografía tramo de sub rasante entre abscisas k0+280 al k0+360 calzada,
*Toma de densidades tramo de mejoramiento entre abscisas k0+100 al k0+200 calzada,
*Se realiza prueba de carga al tramo de sub rasante entre abscisas k0+280 al k0+360 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abscisas k0+250 al k0+300 calzada,
*Corte de la sub rasante entre abscisas k0+360 al k0+400 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abscisas k0+300 al k0+360 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abscisas k0+250 al k0+360 calzada
*Instalación de mejoramiento segunda capa entre abscisas k0+090 al k0+180 calzada,
*Corte de la sub rasante entre abscisas k0+360 al k0+420 calzada,
*toma de densidades tramo de mejoramiento entre abscisas k0+200 al k0+360 calzada,
*Se recibe por topografía primera capa de mejoramiento entre abscisas k0+210 al k0+360 calzada,
*Corte de sub rasante entre abscisas k0+480 al k0+550 calzada,
*Céreo de la sub rasante entre abscisas k0+360 al k0+470 calzada,
*Instalación de mejoramiento de la sub rasante entre abscisas k0+200 al k0+330 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abscisas k0+360 al k0+460 calzada,
*Se realiza recorrido de obra con el contratista e interventoría,


CONTRATISTA

* Replanteo de corredor del Primer kilometro del diseño geométrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v12
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v4

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico
OBRA
** Continuar con la explanación del k0+250 a k0+500
** Mejoramiento de la Subrasante: Dar inicio a la instalación de material del k0+090 al k0+250
** Subbase: Dar inicio a la instalación de subbase del k0+090 al k0+250

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

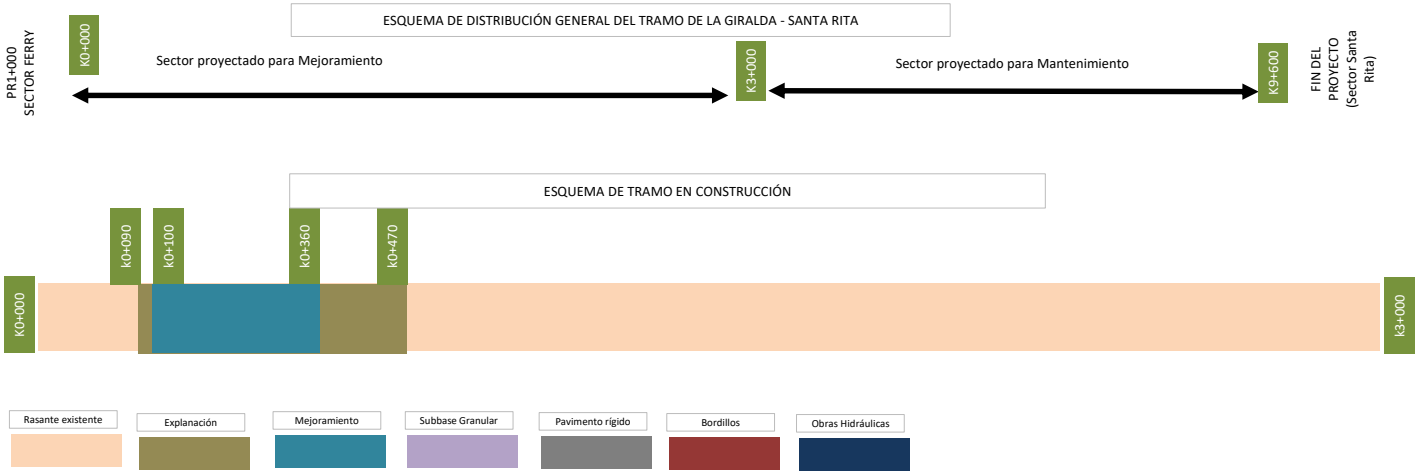

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Instalación de geotextil y mejoramiento k0+100 al k0+180


Céreo de sub rasante k0+180 al k0+280 calzada,


Instalación segunda capa k0+090 al k0+200 calzada,

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Revisión de la documentación inicial
* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio.
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-oct-24 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: **32** del **25-oct-24** al **31-oct-24** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas físicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 115,266,678.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 141,872,419.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 239,126,268			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 12,220,873,732			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 728,592,410			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 801,385,218			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8,743,444,995.67	71.7%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 208,878,002.40	1.7%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8,534,566,993.27)	-70.0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 30,248,266.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,743,444,995.67	71.7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 239,126,268.40	2.0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8,504,318,727.27)	-69.7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 880,993,822.71	7.2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54,405,300.60	0.4%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El contrato de obra se encuentra en etapa de estudios y diseños, por lo tanto a la fecha no se presentan valores ejecutados y programados de obra.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 706,676,857.20	46.19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 93,923,796.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No8

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.41
Acumulado:	23.36

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2021	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 115,266,678.00
Saldo $	$ 141,872,419.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 71.7%
Meta Física Ejecutada % 6.3%
Avance o Atraso Físico % -65.4%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			90.0%	90.0%
					Ejec	53.0%			53.0%	53.0%
* Explanaciones (m)	m	2700			Prog	1935.653			1935.7	71.7%
					Ejec	510			510.0	18.9%
* Mejoramiento	m	2700			Prog	1935.653			1935.7	71.7%
					Ejec	340			340.0	12.6%
* Subbase	m	2700			Prog	1935.653			1935.7	71.7%
					Ejec					
* Pavimento rígido	m	2700			Prog	1935.653			1935.7	71.7%
					Ejec					
* Bordillos	m	5400			Prog	3871.305			3871.3	71.7%
					Ejec					
* Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador		
Compactador	1	1
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Carro tanque	1	1
retro de oruga	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Se realizó reunión de avance de obra y recorrido de obra de donde se derivó el Acta de Reunión No. 57.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

OBSERVACIONES:
*25-10-2024. La profesional social adelanto la distribución del volante N °2 de invitación a la reunión de seguimiento y avance del contrato. Se brindo atención en el SAU, se reportó una PQRSD, por afectación a un cercado en un predio, se está adelanta gestión para localizar al propietario. *26-10-2024. Se recibe comunicación de radicación por parte del CONSORCIO LA GIRALDA del informe social mensual N° 6 del mes de agosto de 2024, Interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-374-2024. Se reciben soporte de planilla, fotos y correo de gestión entrega del volante N° 2 invitación a reunión de seguimiento del contrato con el CPC, Interventoría responde al correo recomendaciones organización del material y pendiente soportes de invitación a las entidades de ponederas competentes con el contrato. *28-10-2024. Se recuerda a la contratista previa a la reunión con el CPC gestionar y recordar telefónicamente la asistencia a la reunión informativa de siguiente al contrato y pendiente la entrega de la presentación para revisión de la Interventoria. *29-10-2024. Se solicita al contratista remitir la presentación de la reunión con el CPC. *30-10-2024. Interventoria remite la comunicación C -T-135-376-2024 requerimiento de entrega de pendientes sociales. Se realiza reunión de seguimiento social al contrato y se levanta el acta N° 54. Por correo, se le solicita al consorcio La Giralda la presentación para la reunión con el CPC. El contratista remite la presentación, es revisada y se emite concepto por parte de la interventoría de no aprobación y entrega unas horas antes de la reunión, con información incompleta yno actualizada sobre el proyecto. Con la comunicación C-T-135-378-2024 emite concepto de la presentación al contratista. *31-10-2024. Se realizó la reunión de seguimiento al contrato, donde se presentó un informe verbal a los asistentes que fueron residentes del AIDP. Asistieron 13 personas y se contó con el acompañamiento de profesionales del contratista e interventoría. Se remite correo al contratista, soportes para verificar los asistentes a la reunión de inicio de los integrantes del CPC inscritos en la reunión de inicio y los soportes de la convocatoria a estos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gesti ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO

* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación especifica. A corte del presente semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

* Mediante comunicado C-T-135-379-2024 de fecha de 31/10/2024 Se Informa al municipio el continuo incumplimiento del contratista de los compromisos planteados y el atraso de obra acumulativo

INTERVENTORÍA
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+360 l k0+460 calzada,
*Instalación de tacos de céreo del mjoramiento entre abcisas k0+090 al k0+190 calzada,
*Se realiza conformación de la vá para el ingreso de mateiales para la obra,
*Se realiza céreo de la sub rasante entre abcisas k0+480 al k0+510 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abcisas k0+460 al k0+510 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+380 al k0+460 calzada,
*Se recibe por topografía tramo de sub rasante entre abcisas k0+480 al k0+510 calzada,
Se realiza céreo del mejoramiento entre abcisas k0+090 al k0+190 calzada
*Se recibe por topografía tramo de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+360 al k0+470 calzada,
*Toma de densidades tramo de material de mejoramiento primera capa de la sub rasante entre abcisas k0+360 al k0+460 calzada,
*Céreo del mejoramiento de la sub rasante segunda capa entre abcisas k0+190 al k0+350 calzada,
*Corte de la sub rasante entre abcisas k0+580 al k0+650 calzada,


CONTRATISTA

* Replanteo de corredor del Primer kilometro del diseño geométrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v12
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v4

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico
OBRA
** Continuar con la explanación del k0+500 a k0+800
** Mejoramiento de la Subrasante: Dar inicio a la instalación de material del k0+090 al k0+250
** Subbase: Dar inicio a la instalación de subbase del k0+090 al k0+250

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

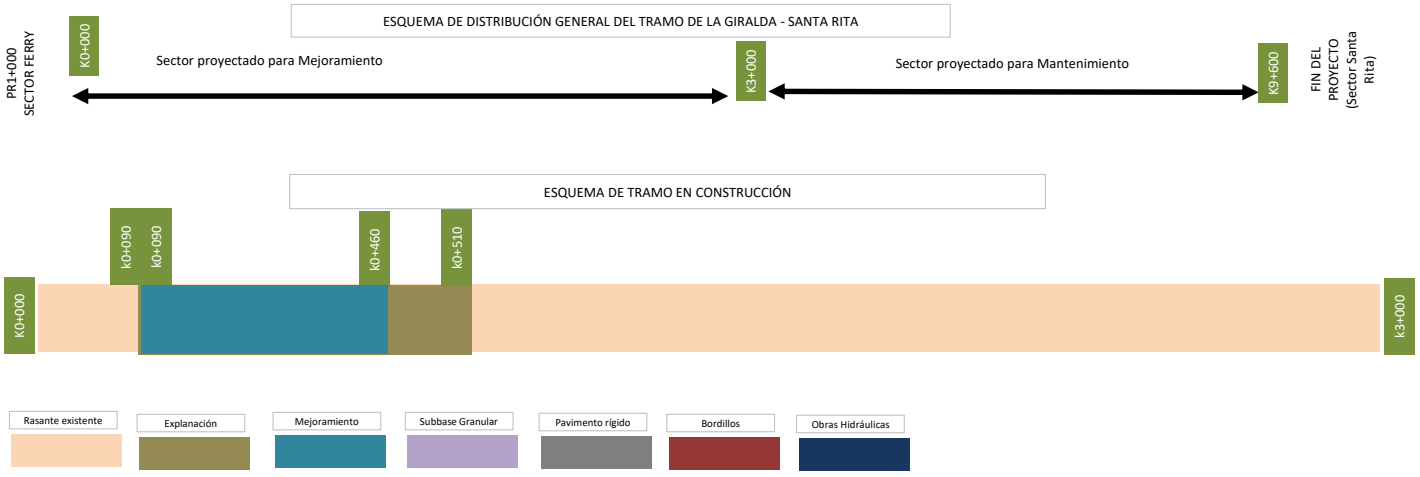

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



corte de la sub rasante k0+370 al k0+470



Instalación geotextil k0+370 al k0+460



Instalación de mejoramiento k0+190 al k0+350

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
* Revisión de la documentación inicial * Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra. * Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma * Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra. * Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo. * Seguimiento y revisión de los estudios y diseños * Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio. * La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.	FIRMA NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS** Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1. INFORMES SEMANALES SABANAGRANDE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 3-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 31 del 27-sep-24 al 3-oct-24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S
INTEGRANTES: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATO No. SG-LP-OP-004-2023
FECHA DE INICIO: 4/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 4/12/2024

VALOR INICIAL:	$ 6,542,182,495.26
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 6,542,182,495.26
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$ 1,962,654,748.58
VALOR AMORTIZADO:	$ (1,242,909,478.08)
SALDO POR EJECUTADO:	$ 719,745,270.50
VALOR AMORTIZADO:	$ 431,156,588.00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 288,588,682.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA
INTEGRANTES: CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)
CONTRATO No. 4805 de 2023
FECHA DE INICIO: 1/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024
SUSPENSIÓN 01 Del 19/12/2023 al 31/01/2024
REINICIO 01 1/02/2024

VALOR INICIAL:	$ 1,529,977,628.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ 257,139,097.00
VALOR AMORTIZADO:	$ 63,963,764.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 193,175,333.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6,542,182,495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,319,672,514			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4,222,509,981			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 619,014,648			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 910,962,980			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6,215,826,029.36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,586,374,000.00	41.6%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,287,670,171.57	36.8%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (298,703,828.43)	-4.8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 32,002,342.75	0.5%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,586,374,000.00	41.6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,319,672,514.32	37.3%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (266,701,485.68)	-4.3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 256,306,663.93	4.1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 132,226,366.47	2.1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1/7/24 a 10/09/24
VALOR FACTURA: $ 999,185,151.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No2**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 619,014,647.60	40.46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25,239,489.50	1.65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25,239,489.50	100.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 100,957,958.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719,745,270.50
Amortizado $	$ 431,156,588.00
Saldo $	$ 288,588,682.50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.17
Acumulado:	0.27

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2023	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 63,963,764.00
Saldo $	$ 193,175,333.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 42% Avance o Atraso Físico % 13%
Meta Física Ejecutada % 55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100.0%			100.0%	100.0%
					Ejec	85.0%			85.0%	85.0%
* Explanaciones (m)	m	2000	2000		Prog	832.2			832.2	41.6%
					Ejec	1350			1350.0	67.5%
* Subbase	m	2000	2000		Prog	832.2			832.2	41.6%
					Ejec	1300			1300.0	65.0%
* Pavimento rígido	m	2000	2000		Prog	832.2			832.2	41.6%
					Ejec	1093			1093.0	54.7%
* Bordillos	m	4000	4000		Prog	1664.4			1664.4	41.6%
					Ejec					

**Las metas físicas relacionadas corresponden a las intervenciones definidas en los estudios y diseños.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	BARANOA ATLANTICO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y LURUACO-ATLANTICO.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: se encuenta aprobada la cantera de CONSIPE y se tiene aprobado al proveedor de concreto hidraulico para elpavimento de CONCREMOVIL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-052944 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA. Por medio de comunicación C-T-135-290-2024, la Interventoría le solicitó al Contratista hacer la actualización del documento PAGA teniendo en cuenta las nuevos plazos para la terminación del proyecto.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-289-2024 la Interventoría aprobó los informes mensuales de seguimiento ambiental correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	29	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

OBSERVACIONES:
*27-09-2024. INVIAS remitió a la interventoría respuesta del oficio con radicado: 2024S-VBOG-069860, concepto favorable informe trimestral social N°2 de interventoría contrato Sabanagrande. Interventoría proyecto las comunicaciones de invitación a Veeduria "No más Silencio" como al contratista CRIVEN construcciones para que invite a curso dictado virtualmente y certificado por la Función pública haciéndolo extensivo al CPC. Se radicó con la comunicación C-T-135-321-2024-SG-Rta-Comunic-OBS-SOC-018-2024-devolución firmadas de (7) actas de vecindad de inicio Subsanadas. Se remite el acta N° 46 de reunión de seguimiento social firmada para los archivos de la Interventoria. *28-09-2024. Se remitieron las comunicaciones C-T-135-322-2024-SG y C-T-135-323-2024-SG dirigido a la veeduria y otro al contratista para que inviten a la capacitación al CPC. *30-09-2024. Se solicita al contratista remitir escaneada el acta con consecutivo N° 73, se adjuntó sin información la pag.5. *01-10-2024 se remite completando la información del del plano del acta N° 73. Con la comunicación OBS-SOC-019-2024 el contratista radica el acta de vecindad de inicio con el consecutivo N ° 74 completando la entrega del 100% de las actas iniciales programadas, documento revisado por la interventoría y pendiente firma del área técnica. El contratista remite al WhatsApp documento Word con entrega de copias de veinte actas de vecindad de inicio a través del mismo medio. Intervetoria continúa adelantando la elaboración del informe mensual social de septiembre. Se consulta a la gestora de INVIAS para programar comité social de seguimiento al contrato. *02-2024. Interventoría emite respuesta del acta de vecindad N° 74 con la comunicación C-T-135-327-2024-SG. Invias emite concepto revisión informes trimestrales sociales. *03-10-2024 No se reportó atención a PQRSD. Interventoría está a la espera que el contratista reporte el personal vinculado al c ontrato del AIDP.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INTERVENTORÍA
*Se inicia conformación de la sub base entre abcisas k0+300 al k0+240 costado izquierdo,
*Se continúa con la conformación de la sub base entre abcisas k0+300 al k0+240 costado izquierdo,
*Se recibe tramo de sub base por topografía entre abcisas k0+240 al k0+300 costado izquierdo,
*Se recibe tramo de formaleta para concreto entre abcisas k0+240 al k0+300 costado izquierdo,
Se realiza toma de densidades del tramo de sub base entre abcisas k0+240 al k0+300 costado izquierdo,
*Instalación de formaleta para concreto hidráulico mr38
*Se realiza instalación de concreto hidráulico mr 38 entre abcisas k0+240 al k0+300 costado izquierdo,
*Se recibe tramo de sub base por topografía entre abcisas k0+150 al k0+240 costado izquierdo,
*Se recibe tramo de formaleta por topografía entre abcisas k0+150 al k0+240 costado izquierdo,
*Se realiza toma de densidades del tramo de sub base entre abcisas k0+150 al k0+240 costado izquierdo,
*Se realiza instalación de concreto hidráulico mr38 entre abcisas k0+154 al k0+240 costado izquierdo,
*Se continúa con el céreo de la sub base entre abcisas k0+080 al k0+150 costado izquierdo,

CONTRATISTA
* Explanación: Continuar con la explanación entre el k01+300 al k01+500
* Subbase: Dar inicio de instalación de subbase del k0+900 al k1+5000
* Pavimento Rigido: Continuar con la inxtalación de pavimento rigido del k0+000 al k0+050 y del k0+500 al k0+850

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

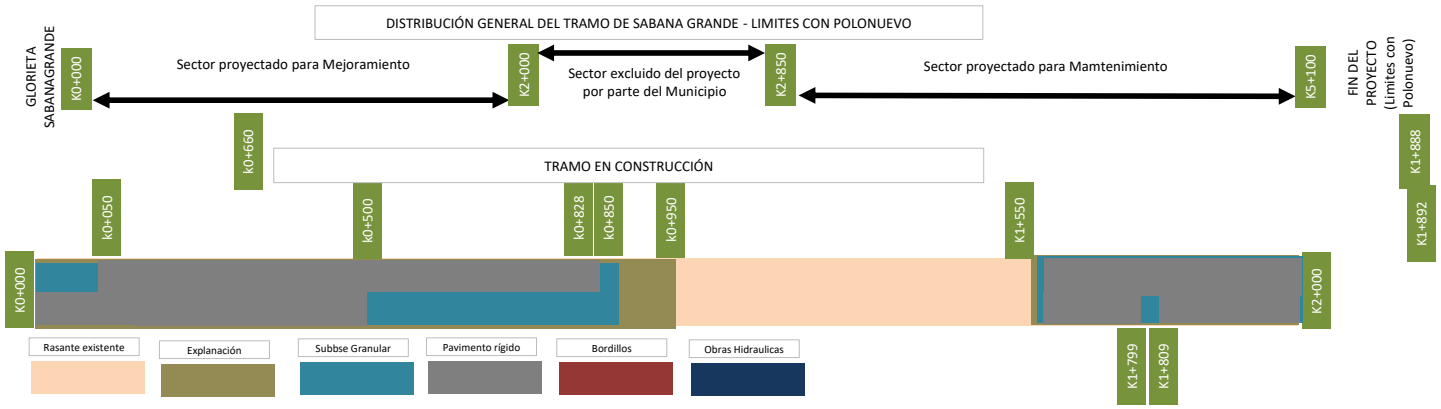

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


CEREO DE SUB BASE K0+150 AL K0+240 COSTADO IZQ,


INSTALACIÓN DE CONCRETO K0+240 AL K0+300 COSTADO IZQ,


INSTALACIÓN DE CANASTAS PARA CONCRETO K0+154 AL K0+240 IZQ,

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JHON ANDRÉS ARIAS
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 10-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 32 del 4-oct-24 al 10-oct-24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con un ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
INTEGRANTES:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
CONTRATO No.	SG-LP-OP-004-2023	VALOR INICIAL:	$ 6,542,182,495.26
FECHA DE INICIO:	4/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/06/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 6,542,182,495.26
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/12/2024	VALOR ANT 'O INICIAL:	$ 1,962,654,748.58
		VALOR AMCBOLSADO:	$ (1,242,909,478.08)
		SALDO PORECUTADO:	$ 719,745,270.50
		VALOR AMORTIZADO:	$ 431,156,588.00
		SALDO POR AMORTIZA	$ 288,588,682.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/02/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
SUSPENSIÓN 01	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 63,963,764.00
REINICIO 01	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 193,175,333.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6,542,182,495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,627,619,042			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,914,563,453			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 640,930,200			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 889,047,428			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6,215,826,029.36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,913,773,023.27	46.9%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,579,107,672.17	41.5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (334,665,351.10)	-5.4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 48,511,370.00	0.8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,913,773,023.27	46.9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,627,619,042.17	42.3%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (286,153,981.10)	-4.6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 327,399,023.27	5.3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 291,437,500.59	4.7%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1/7/24 a 10/09/24
VALOR FACTURA: $ 999,185,151.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No2**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 640,930,200.00	41.89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 100,957,958.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta de costos No7

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719,745,270.50
Amortizado $	$ 431,156,588.00
Saldo $	$ 288,588,682.50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

	INDICADOR I/C
En el mes:	0.17
Acumulado:	0.25

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-202	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	################
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	################

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 63,963,764.00
Saldo $	$ 193,175,333.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100.0%			100.0%	100.0%
						Ejec	85.0%			85.0%	85.0%
*	Explanaciones (m)	m	2150	2150		Prog	1007.8			1007.8	46.9%
						Ejec	1350			1350.0	62.8%
*	Subbase	m	2150	2150		Prog	1007.8			1007.8	46.9%
						Ejec	1300			1300.0	60.5%
*	Pavimento rígido	m	2150	2150		Prog	1007.8			1007.8	46.9%
						Ejec	1219			1219.0	56.7%
*	Bordillos	m	4300	4300		Prog	2015.7			2015.7	46.9%
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas que se modificaran de acuerdo con la complementación y ajuste de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	1
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	1
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	BARANOA-ATLANTICO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y LURUACO-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	

OBSERVACIONES: se encuentra aprobada la cantera de CONSIPE y se tiene aprobado al proveedor de concreto hidráulico para el pavimento de CONCREMOVIL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065009 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-338-2024 la Interventoría realizó observaciones al informe de seguimiento ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	29	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
KM2 SABANAGRANDE -POLONUEVO

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

OBSERVACIONES:
*04-10-2024. Se remite a Interventoría Informe mensual social de interventoría. se realiza comité de seguimiento social se levanta el acta N° 47, se remite para revisión y firma de la profesional social del contratista. *05-10-2024. El contratista remite por correo el acta de reunión social N° 47 firmada y se remite para archivo de la interventoría. *07-19-2024. Se remite correo al contratista recordando los compromisos del comité de seguimiento social para la semana del 7 al 12 de octubre del año en curso. El contratista remite al correo, documentos preliminares del informe mensual social N°07 del mes de septiembre del año en curso, fue revisado por interventoría y por el mismo medio se remitieron observaciones. *08-10-2024.La profesional social del contratista atiende en el Punto Móvil tienda La Cascada, sin ninguna PQRSD nuevas. Se revisan y firma los formatos del informe mensual social N°7 de septiembre de 2024, se devuelven al correo social. *09-10-2024. Se revisó por parte de Interventoría el informe mensual social N°7 del mes de septiembre de 2024 y se emitió concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-339-2024-SG. *10-10-2024. El contratista no reportó en este día actividades sociales a la interventoría.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuentaque la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INTERVENTORÍA
*Se recibe tramo de sub base por topografía entre abcisas k0+040 al k0+100 costado izquierdo,
*Se recibe tramo de formaleta por topografía entre abcisas k0+040 al k0+100 costado izquierdo,
*Se realiza toma de densidades tramo de sub base entre abcisas k0+040 al k0+100 costado izquierdo,
*Se realiza instalación de concreto hidráulico mr38 entre abcisas k0+041 al k0+100 costado izquierdo,
*Se recibe tramo de sub base por topografía entre abcisas k0+000 al k0+040 costado izquierdo,
*Se realia instalación de formaleta para concreto mr38 entre abcisas k0+000 al k0+015 y k0+027 al k0+032 costado izquierdo,
*Se recibe tramo de formaleta por topografá entre abcisas k0+000 al k0+015 y k0+027 al k0+032 costado izquierdo,
*Se realiza instalación de concreto hidráulico mr 38 entre abcisas k0+000 al k0+015 y k0+027 al k0+032 costado izquierdo,
*Se realiza instalación de concreto en la ventana entre abcisas k1+799 al k1+809 costado derecho,
*Se realiza céreo de l sub base entre abcisas k0+500 al k0+600 costado derecho,
*Se recibe tramo de sub base por topografía entre abcisas k0+500 al k0+600 costado derecho,
*Se recibe tramo de formaleta por topografía entre abcisas k0+500 al k0+580 costado derecho,
*Se realiza instalación de concreto hidráulico mr38 entre abcisas k0+499 al k0+575 costado derecho,
*Se continúa con el céreo de la sub base entre abcisas k0+600 al k0+680 costado derecho,
*Se recibe tramo de sub base por topografía entre abcisas k0+610 al k0+660 costado derecho,
*Se recibe tramo de formaleta por topografía entre abcisas k0+580 al k0+660 costado derecho,
*Se reliza instalación de concreto hidráulico mr 38 entre abcisas k0+575 al k0+656 costado derecho,
*Se continúa con el céreo de la sub base entre abcisas k0+660 al k0+760 costado derecho,

CONTRATISTA
* Explanación: Continuar con la explanación entre el k01+300 al k01+500
* Subbase: Dar inicio de instalación de subbase del k0+900 al k1+500
* Pavimento Rigido: Continuar con la inxtalación de pavimento rigido del k1+300 al k1+550

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

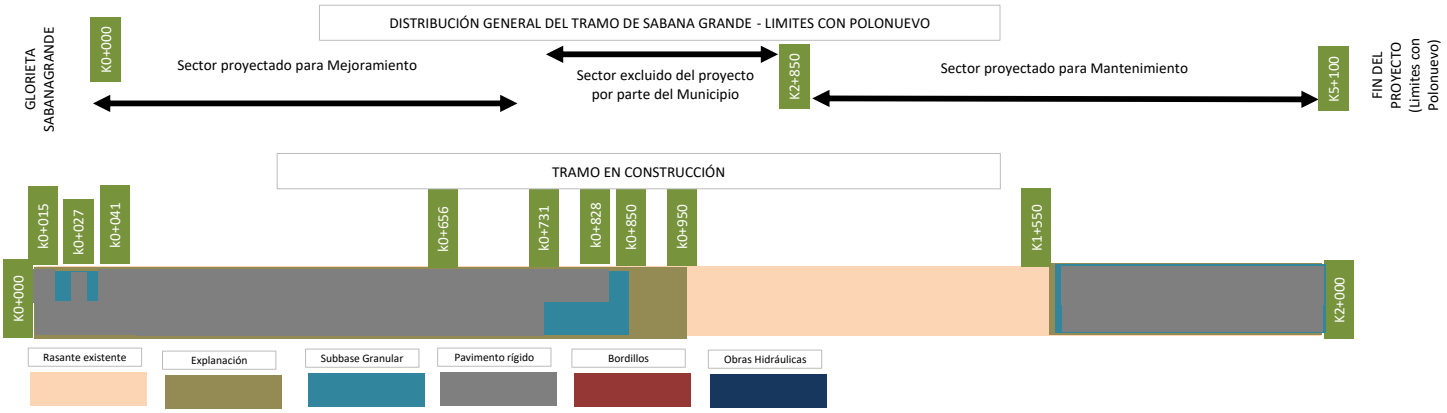

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


STALACIÓN DE CANASTAS K0+040 AL K0+1000 COSTADO I2


INSTALACIÓN DE CONCRETO K0+000 AL K0+032 COSTADO IZQ,


INSTALACIÓN DE CONCRETO K0+575 AL K0+656 COSTADO DER,

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro filmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**

Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 17-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 33 del 11-oct-24 al 17-oct-24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con un ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA	
INTEGRANTES:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)	
CONTRATO No.	SG-LP-OP-004-2023	VALOR INICIAL: $ 6,542,182,495.26	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:** $ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	4/03/2024	VALOR ADICIONES: $ -	**FECHA DE INICIO:**	1/02/2024	**VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/06/2024	VALOR ACUMULADO: $ 6,542,182,495.26	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/12/2024	VALOR ANTICIPO INICIAL: $ 1,962,654,748.58	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:** $ 257,139,097.00
		VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO: $ (1,242,909,478.08)	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:** $ 63,963,764.00
		VALOR ANTICIPO EJECUTADO: $ 719,745,270.50	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:** $ 193,175,333.00
		VALOR AMORTIZADO: $ 431,156,588.00			
		SALDO POR AMORTIZA $ 288,588,682.50			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6,542,182,495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,997,935,329			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,544,247,166			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 684,761,305			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 845,216,323			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6,215,826,029.36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3,241,172,046.53	52.1%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,949,423,959.12	47.5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (291,748,087.41)	-4.7%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 48,511,370.00	0.8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3,241,172,046.53	52.1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,997,935,329.12	48.2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (243,236,717.41)	-3.9%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 327,399,023.27	5.3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 370,316,286.95	6.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 01-08-24 A 10-09-24
VALOR FACTURA: $ 999,185,151.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No2**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 662,845,752.40	43.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 100,957,958.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta de costos No7

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719,745,270.50
Amortizado $	$ 431,156,588.00
Saldo $	$ 288,588,682.50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

	INDICADOR I/C
En el mes:	0.17
Acumulado:	0.22

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-202	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	################
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	################

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 63,963,764.00
Saldo $	$ 193,175,333.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100.0%			100.0%	100.0%
					Ejec	85.0%			85.0%	85.0%
* Explanaciones (m)	m	2150	2150		Prog	1121.1			1121.1	52.1%
					Ejec	1500			1500.0	69.8%
* Subbase	m	2150	2150		Prog	1121.1			1121.1	52.1%
					Ejec	1400			1400.0	65.1%
* Pavimento rígido	m	2150	2150		Prog	1121.1			1121.1	52.1%
					Ejec	1381			1381.0	64.2%
* Bordillos	m	4300	4300		Prog	2242.2			2242.2	52.1%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas que se modificaran de acuerdo con la complementación y ajuste de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	1
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	1
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	BARANOA-ATLANTICO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LURUACO-ATLANTICO.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	

OBSERVACIONES: se encuenta aprobada la cantera de CONSIPE y se tiene aprobado al proveedor de concreto hidraulico para elpavimento de CONCREMOVIL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065009 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-338-2024 la Interventoría realizó observaciones al informe de seguimiento ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	29	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

OBSERVACIONES:
*11-10-2024. El contratista gestiona telefónicamente con propietarios la entrega de copias de actas de vecindad de inicio y con la Secretaria de Transito, está pendiente respuesta apoyo campaña vial. *12-10-2024. Se continúa con la entrega de copias de actas de vecindad y atención en el SAU sin novedades. *15-10-2024. De reporta una nueva PQRSD corresponde a la N° 02, está pendiente que el contratista atienda con el área técnica la visita. *16-10-2024. Se realizó reunión de seguimiento social al contrato, se levantó el acta con consecutivo N° 49, se remitió a la profesional social del contratista para firma. *17-10-2024. El contratista entrega reporta alistamiento del material para la entrega del volante N° 2 del PMT para reforzando la respectiva divulgación con los actores viales. Se remite al correo social de la interventoria (6) certificaciones de residencia del personal vinculado al mes de septiembre de 2024 vinculados al contrato. El contratista remite al comité de participación comunitaria invitación a participar en curso virtual de la función pública sobre veedurías a través de carta, de igual forma gestiono también a través de carta con la Secretaria de Transito de Sabanagrande acompañamiento para realizar campaña de prevenc ión y seguridad vial para el 05 de noviembre de 2024.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuentaque la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INTERVENTORÍA
*Se recibe tramo de formaleta por topografía entre abcu¿isas k0+760 al k0+830 costado derecho,
*Se realiza instalación de concreto entre abcisas k0+731 al k0+778 y del k0+790 al k0+828 costado derecho,
*Céreo de la sub rasanrte entre abcisas k1+450 al k1+550 calzada,
*Se realiza toma de densidades tramo de sub base entre abcisas k0+750 al k0+830 costado derecho,
*Se recibe tramo de sub rasante por topografía entre abcisas k1+450 al k1+550 calzada,
*Se realiza instalación de sub base entre abcisas k1+480 al k1+550 calzada,
*Céreo de la sub base entre abcisas k1+480 al k1+550 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k1+350 al k1+450 calzada,
*Se recibe tramo de sub base por topografía entre abcisas k1+480 al k1+550 costado derecho,
*Instalación de formaleta para instalación de concreto entre abcisas k1+490 al k1+550 costado derecho,
*Se recibe tramo de formaleta por topografía entre abcisas k1+490 al k1+550 costado derecho,
*Se realiza toma de densidades tramo de sub base entre abcisas k1+480 al k1+550 costado derecho,
*Instalación de concreto hidráulico mr 38 entyre abcisas k1+490 al k1+511 y k1+521 al k1+553 costado derecho,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k1+350 al k1+450 calzada,
*Instalación de sub base entre abcisas k1+440 al k1+480 calzada,
*Se recibe tramo de sub base por topografía entre abcisas k1+390 al k1+450 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entyre abcisas k1+300 al k1+360 calzada,
*Instalación de sub base entre abcisas k1+400 al k1+440 calzada,
*Céreo de la sub base entre abcisas k1+400 al k1+480 costado derecho,
*Se recibe tram de sub base por topografía entre abcisas k1+420 al k1+480 costado derecho,

CONTRATISTA
* Explanación: Continuar con la explanación entre el k01+100 al k01+300
* Subbase: Dar inicio de instalación de subbase del k01+100 al k1+300
* Pavimento Rigido: Continuar con la inxtalación de pavimento rigido del k1+300 al k1+550

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

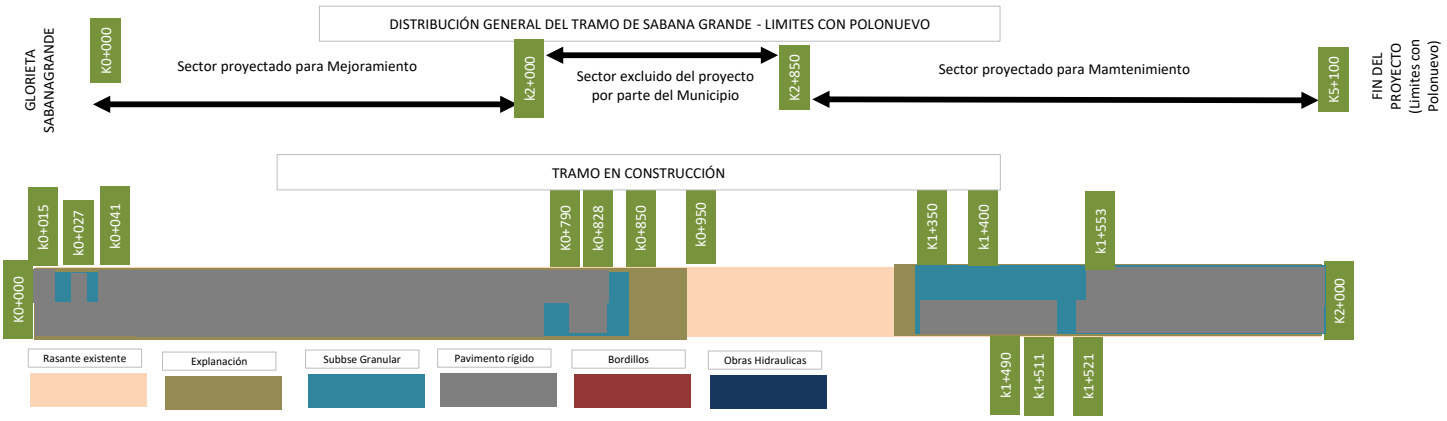

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE FORMALETA K0+660 AL K0+830 DER,



CORTE DE LA SUB RASANTE K1+450 AL K1+550 CALZADA,



INSTALACIÓN DE CONCRETO K1+490 al k1+553 COSTADO DER,

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro filmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**

Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 24-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 34 del 18-oct-24 al 24-oct-24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con un ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	SG-LP-OP-004-2023	VALOR INICIAL:	$ 6,542,182,495.26	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	4/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	1/02/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/06/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 6,542,182,495.26	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/12/2024	VALOR ANTICIPO INICIAL:	$ 1,962,654,748.58	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
		VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO:	$ (1,242,909,478.08)	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 115,266,678.00
		VALOR ANTICIPO EJECUTADO:	$ 719,745,270.50	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 141,872,419.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 483,389,853.00				
		SALDO POR AMORTIZA	$ 236,355,417.50				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6,542,182,495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3,051,779,520			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,490,402,975			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 706,676,857			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 823,300,771			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6,215,826,029.36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3,568,571,069.80	57.4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3,019,777,177.68	48.6%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (548,793,892.12)	-8.8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 32,002,342.75	0.5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3,568,571,069.80	57.4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,051,779,520.43	49.1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (516,791,549.37)	-8.3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 327,399,023.27	5.3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 70,353,218.56	1.1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 11-09-24 A 10-10-24
VALOR FACTURA: $ 793,980,154.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No3**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 684,761,304.80	44.76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 93,923,796.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No8

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719,745,270.50
Amortizado $	$ 483,389,853.00
Saldo $	$ 236,355,417.50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

	INDICADOR I/C
En el mes:	0.17
Acumulado:	0.23

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-202	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	################
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	################

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 115,266,678.00
Saldo $	$ 141,872,419.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 57.4% Avance o Atraso Físico % -7.6%
Meta Física Ejecutada % 49.8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100.0%			100.0%	100.0%
					Ejec	85.0%			85.0%	85.0%
* Explanaciones (m)	m	2150	2150		Prog	1234.3			1234.3	57.4%
					Ejec	1500			1500.0	69.8%
* Subbase	m	2150	2150		Prog	1234.3			1234.3	57.4%
					Ejec	1400			1400.0	65.1%
* Pavimento rígido	m	2150	2150		Prog	1234.3			1234.3	57.4%
					Ejec	1386			1386.0	64.5%
* Bordillos	m	4300	4300		Prog	2468.7			2468.7	57.4%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas que se modificaran de acuerdo con la complementación y ajuste de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	1
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	1
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	BARANOA-ATLANTICO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LURUACO-ATLANTICO.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	

OBSERVACIONES: se encuenta aprobada la cantera de CONSIPE y se tiene aprobado al proveedor de concreto hidraulico para elpavimento de CONCREMOVIL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065009 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-364-2024, Interventoría aprobó el informe mensual ambiental No. 7 correspondiente al mes de septiembre de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	29	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

OBSERVACIONES:
*18-10-2024. La profesional social del contratista reportó la entrega de 60 volantes del PMT reforzando la divulgación remitió planillas de entrega y registro fotográfico. Se brinda atención en el SAU, no se reportan novedades. Interventoría remite al correo del contratista los formatos de entrega del PMT firmados. *21-10-2024. Se remitió al correo del contratista requerimiento gestión respuesta del INCANH-MININTERIR Y CGC. Tener en cuenta esta información para el cierre social. Atender PQRSD revisión de fisuras iniciales en el predio de la Sra. DELLY HERDENIS POLO. Remitir soporte de la entrega de las copias las actas de vecindad de incio. Se remite por parte de interventoría al correo del contratista los datos del contrato, para que actualicen los formatos INVIAS, del informe mensual social próximo a entregar. Se ha recomendado revisar si requiere ajustes al PAGA y dar cumplimiento a las actividades sociales establecidas, teniendo en cuenta que el contrato va hasta el 14-12-2024. *22-10-2024.La profesional social reporta visita al predio de la reclamación de la PQRSD N°2, está pendiente realizar nuevamente gestión ya que en la verificación las grietas son las que se identificaron inicialmente en el acta de vecindad, sin embargo, la propietaria manifiesta que no está de acuerdo. Está pendiente realizar una nueva visita. Se reporta que hay propietarios que no se han localizado para la entrega de copia del acta de vecindad y se está adelantando la gestión para entregar copia física del acta. *23-10-2024. La profesional ambiental de interventoria remite al correo del área social documento PAGA actualizada versión 8, se remiten observaciones al correo de la profesional ambiental y de la interventoría. De remite al contratista por parte de la interventoría la comunicaciónC-T-135-368-2024-SG-Solicitud de programación social actividades sociales teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato es el 04-12-2024. *24-10-2024. Se realiza reunión N° 53 de seguimiento social al contrato. No se reportan nuevas PQRSD. Interventoria a través del área SST realiza a capacitación Psicosocial sobre salud mental, dirigida a todo el equipo de trabajo. Se elabora y se remite el informe social de las actividadesejecutada en la semana.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuentaque la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INTERVENTORÍA
*Se recibe tramo de formaleta por topografía entre abcisas k0+1+290 A K1+350 costado derecho,
*Se instala pavimento rigido de k0+1+290 A K1+350 costado derecho,
* Se instala subbase granular del k1+290 al k1+200

CONTRATISTA
* Explanación: Continuar con la explanación entre el k01+100 al k01+290
* Subbase: Dar inicio de instalación de subbase del k01+100 al k1+290
* Pavimento Rigido: Continuar con la inxtalación de pavimento rigido del k1+200 al k1+290

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

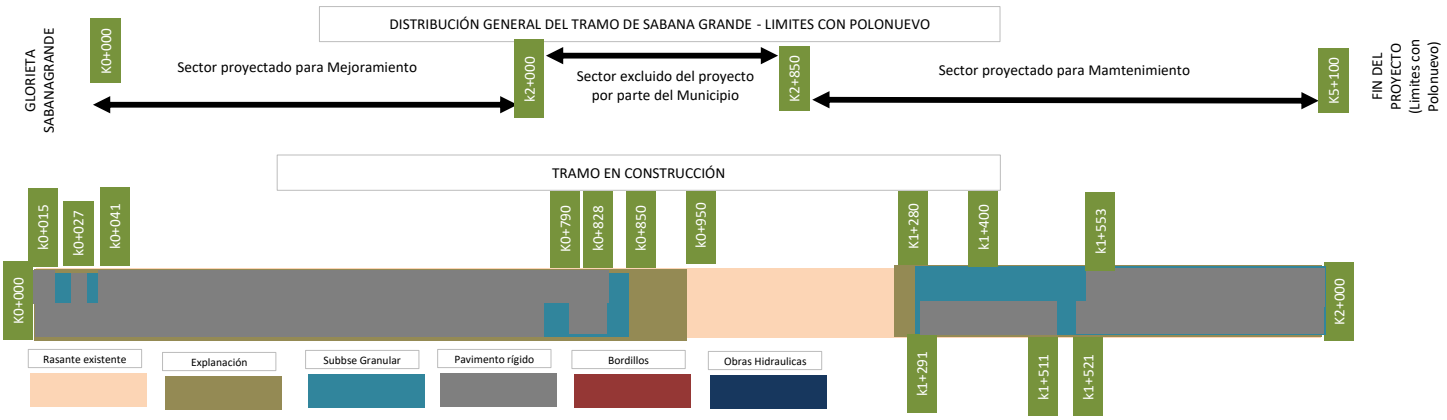

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO K0+290 AL K1+350



INSTALACIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO K0+290 AL K1+350



INSTALACIÓN DE SUBBASE K0+290 AL K1+350

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro filmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31-oct-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 35 del 25-oct-24 al 31-oct-24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con un ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA	
INTEGRANTES:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)	
CONTRATO No.	SG-LP-OP-004-2023	VALOR INICIAL: $ 6,542,182,495.26	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:** $ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	4/03/2024	VALOR ADICIONES: $ -	**FECHA DE INICIO:**	1/02/2024	**VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/06/2024	VALOR ACUMULADO: $ 6,542,182,495.26	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/12/2024	VALOR ANTICIPO INICIAL: $ 1,962,654,748.58	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:** $ 257,139,097.00
		VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO: $ (1,242,909,478.08)	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:** $ 115,266,678.00
		VALOR ANTICIPO EJECUTADO: $ 719,745,270.50	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:** $ 141,872,419.00
		VALOR AMORTIZADO: $ 483,389,853.00			
		SALDO POR AMORTIZA $ 236,355,417.50			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6,542,182,495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3,145,311,751			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,396,870,744			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 728,592,410			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 801,385,218			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6,215,826,029.36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3,895,970,093.07	62.7%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3,113,309,408.03	50.1%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (782,660,685.03)	-12.6%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 32,002,342.75	0.5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3,895,970,093.07	62.7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,145,311,750.78	50.6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (750,658,342.28)	-12.1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 327,399,023.27	5.3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 93,532,230.35	1.5%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 11-09-24 A 10-10-24
VALOR FACTURA: $ 793,980,154.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No3**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 706,676,857.20	46.19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 93,923,796.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No8

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719,745,270.50
Amortizado $	$ 483,389,853.00
Saldo $	$ 236,355,417.50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

	INDICADOR I/C
En el mes:	0.17
Acumulado:	0.23

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-202	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	################
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	################

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 115,266,678.00
Saldo $	$ 141,872,419.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62.7% Avance o Atraso Físico % -6.9%
Meta Física Ejecutada % 55.8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100.0%			100.0%	100.0%
					Ejec	85.0%			85.0%	85.0%
* Explanaciones (m)	m	2150	2150		Prog	1347.6			1347.6	62.7%
					Ejec	1600			1600.0	74.4%
* Subbase	m	2150	2150		Prog	1347.6			1347.6	62.7%
					Ejec	1738			1738.0	80.8%
* Pavimento rígido	m	2150	2150		Prog	1347.6			1347.6	62.7%
					Ejec	1462			1462.0	68.0%
* Bordillos	m	4300	4300		Prog	2695.2			2695.2	62.7%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas que se modificaran de acuerdo con la complementación y ajuste de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	1
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	1
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	BARANOA-ATLANTICO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LURUACO-ATLANTICO.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	

OBSERVACIONES: se encuenta aprobada la cantera de CONSIPE y se tiene aprobado al proveedor de concreto hidraulico para elpavimento de CONCREMOVIL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065009 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Se realizó recorrido de obra de donde se derivó el Acta de Reunión No. 56.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	29	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

OBSERVACIONES:
*25-10-2024. La profesional social del contratista informa que la campaña de prevención y seguridad vial con la Secretaria de Transito de Sabanagrande se realizará el día 8 de noviembre de 2024 y también se programará para esa fecha la reunión periódica con el CPC. No se reportan nuevas PQRSD en el SAU donde hoy se brindó atención. Se remite el acta N° 53 de la reunión de seguimiento social para firma de la profesional social del Contratista CRIVEN CONSTRUCCIONES. *26-10-2024. Se recibió acta social firmada por la profesional del contratista y se remitió al correo de la interventoria. *2810-2024. Se remite a la profesional social del contratista la relación de personal vinculado en el mes de octubre, para que verifique la información en la obra. Interventoría solicita los certificados de residencia del personal del AIDP. El contratista adelanta gestión para el sitio de reunión de seguimiento con el CPC. Se realiza evaluación de las actividades ejecutadas en el mes de octubre y los respectivos soportes, para que inicien la elaboración del informe mensual social de octubre. *29-10-2024. El área social realiza gestión con el director del proyecto para atender la PQRSD con la propietaria de predio donde hay fisuras previas al inicio del contrato, está pendiente la próxima semana la respuesta del área técnica. Interventoria remite al contratista archivos de correspondencia y actas para ir elaborando el informe mensual de octubre. *30-10-2024. El contratista continúa realizando gestión con los propietarios de predios pendientes de 7 predios para la entrega de copias de actas de vecindad de inicio. Interventoría, remitió el link de la reunión de seguimiento social. *31-10-2024. Se realizó reunión de seguimiento social al contrato y se elaboró el acta N ° 55. El contratista remitió a interventoria carta radicada el día de hoy a la Secretaria de Transito de Sabanagrande confirmando la fecha del 8 de noviembre del año en curso campaña de prevención y seguridad vial. Se recibieron también por WhatsApp las certificaciones de seis trabajadores residentes en el área de influencia directa al proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuentaque la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INTERVENTORÍA
*Se libera por topografía capa de sub base desde la k1+280 al k1+200
* Se recibe por topografía sub rasante desde la abscisa k1+190 al k1+090 también por prueba de carga
* Se realiza la excavación y demolición de cajas de la empresa triple A. k00+015 costado izq
* Se realiza la instalación y compactación de sub base granular entre las abscisas del k01+130 al k01+190 por entregar por parte del contratista.
* Se realiza el cargue del material proveniente del corte de la sub rasante
* Se recibe por topografía formaleta y sub base desde la abscisa k1+200 al k1+160
* Se continúa con la excavación y demolición de cajas de la empresa triple A. k00+018 costado izq
* De recibe la sub base granular entre el tramo del k01+200 al k01+160 por parte de la interventoría.
* Se realiza la instalación y compactación de sub base granular entre las abscisas del k01+090 al k01+160 por entregar por parte del contratista.
* Se realiza la instalación de concreto Mr entre el tramo del k01+163 al k01+207 costado derecho
* Se recibe .20 de afirmando desde la abscisa k0+370 al k0+470 por topografía
* Se recibe por topografías sub base y formaleta desde la abscisa k1+150 al k1+090
* Se continúa con la excavación y demolición de cajas de la empresa triple A. k00+018 costado izq
* Se recibe la sub base granular entre el tramo del k01+090 al k01+150 por parte de la interventoría y se realiza la instalación de acero para Pompeyano.
* Se realiza corte y explanacion entre las abscisas del k01+050 al k01+090 por entregar por parte del contratista.

CONTRATISTA
* Explanación: Continuar con la explanación entre el k01+000 al k01+090
* Subbase: Dar inicio de instalación de subbase del k01+000 al k1+090
* Pavimento Rigido: Continuar con la inxtalación de pavimento rigido del k1+000 al k1+090

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

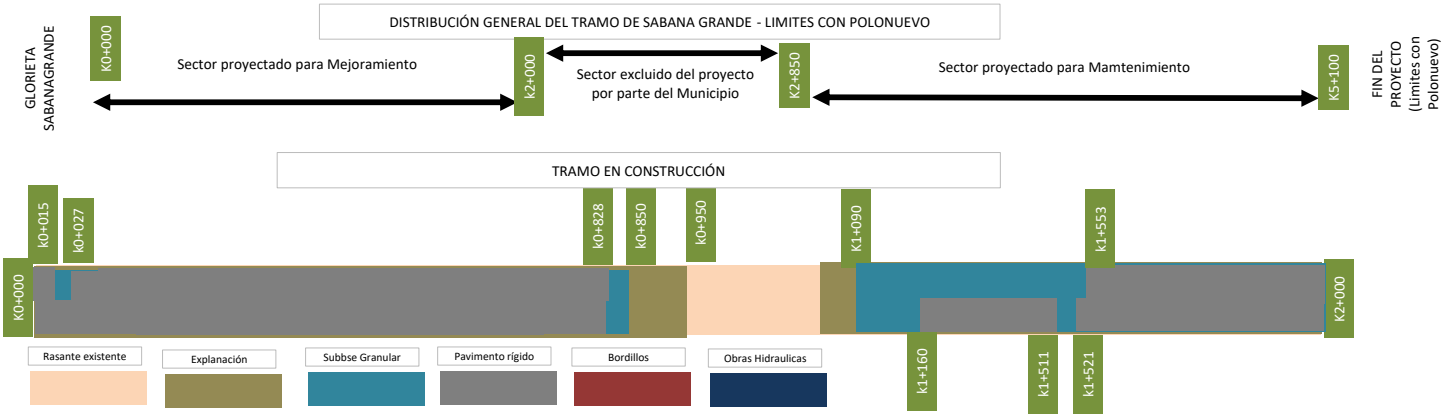

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR K1+090 AL K1+160



INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR K1+090 AL K1+160



INSTALACIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO K0+770 AL K0+760

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro filmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

PONEDERA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO/MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

CONTRATO DE OBRA N°: LP-001-2023.

CONTRATO INTERVENTORIA: 4805 DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ODESSA

SECTOR: LA GIRALDA - SANTA RITA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	JOHN DEERE	670B	PONEDERA	1R	1R	1I	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A
RETRO EXCAVADORA DE LLANTAS	JCB	214S	PONEDERA	1R	1R	1A																												
VOLQUETA			PONEDERA							1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1A	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I
VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL RAND		PONEDERA	1I	1I				1I	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1R	1R	1R	1A
RETRO EXCAVADORA DE LLANTAS	CATERPILLAR	416F2	PONEDERA				1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1I					
CARRO TANQUE	FORD		PONEDERA																	1A	1A	1I	1A	1I	1A	1I	1I	1I	1I	1I	1A	1A	1A	1A
RETRO DE ORUGA	CATERPILLAR	320CL	PONEDERA																															1A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL ACTIVO				0	0	1	2	2	0	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	3	4	0	4	3	4	2	0	0	2	2	2	4
TOTAL EN REPARACIÓN				2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
TOTAL INACTIVO				1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	1	2	1	5	1	1	1	3	4	4	1	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,0	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5,0	71
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1,0	14
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0,0	0

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: La interventoría ha solicitado incrementar la maquinaria, dado los atrasos de obra.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Contratista tiene pendientes para aprobar Residente.

Firma

Nombre: OMAR ENRIQUE RODRIGUEZ CAPELA
Residente de Obra
Matrícula No.: 08202-084074

Firma

Nombre: RONALD OSWALDO MOLINARES TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 25202-359958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 de octubre de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO/MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE OBRA N°: SG-LP-OP-004-2023

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO INTERVENTORIA: 4805-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ODESSA

SECTOR: VIAL RURAL SABANAGRANDE – POLONUEVO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	sabanagrande	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1I	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120H	sabanagrande	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
MINICARGADOR	NEW HOLLAND	L223	sabanagrande	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	NEW HOLLAND	B95B	sabanagrande	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1R	1R	1A	1I	1R	1R	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO	DINAPAC	CA150D	sabanagrande	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1A	1I	1I	1I	1I	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO	DINAPAC	CA250D	sabanagrande	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNETIONAL	UYX397	sabanagrande	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
CAMIONETA		HXK260	sabanagrande	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			TOTAL ACTIVO	5	5	5	5	5	1	5	5	5	4	4	6	1	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			TOTAL EN REPARACIÓN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			TOTAL INACTIVO	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	63
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	13
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	24

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS ARTURO AREVALO VARONA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-10465 ATL

Firma

Nombre: RONALD OSWALDO MOLINARES TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 25202-359958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PONEDERA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4805 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a VI)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE EDGAR TORRES EDGAR	8.717.014	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	9476711053	$ 162.500	COLPENSIONES	9476711053	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	OMAR ENRIQUE RODRIGUEZ CAPELA	72.210.357	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 260.000	$ 18.100	V	SURA	9477002220	$ 32.500	PORVENIR	9477002220	$ 41.600	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	
3	DANIS DANIEL GARCIA MUÑOZ	1.041.891.688	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 216.667	$ 15.100	V	NUEVA EPS	9477002220	$ 27.100	COLFONDOS	9477002220	$ 34.700	$ 8.700	$ 4.334	$ 6.500	
4	NATALY ARIZA CERVANTES	1.041.892.328	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 216.667	$ 15.100	V	NUEVA EPS M	9477002220	$ 27.100	PROTECCION	9477002220	$ 34.700	$ 8.700	$ 4.334	$ 6.500	
5	BRICEIDA MARIA BOLIVAR OROZCO	1.129.572.799	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000	X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 260.000	$ 18.100	V	SANITAS	9477002220	$ 32.500	COLFONDOS	9477002220	$ 41.600	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	
6	DILAN ALEXANDER UTRIA SANTIAGO	1.001.788.102	INSPECTOR SISO	$ 1.300.000	X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 260.000	$ 18.100	V	NUEVA EPS M	9477002220	$ 32.500	PORVENIR	9477002220	$ 41.600	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	
7	BRAHINER ANDRES DIAZ MENDOZA	1.143.256.480	TOPOGRAFO	$ -		CONSORCIO LA GIRALDA	$ -	$ -	V	0	0	$ -	PORVENIR	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACION DE INGRESO
8	ANDRES LUIZ DIAZ ALTAMAR	1.044.616.205	CADENERO	$ -		CONSORCIO LA GIRALDA	$ -	$ -	V	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACION DE INGRESO
9	CARLOS ARTURO MUÑOZ OLASCUAGAS	72.009.757	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	31294496	$ 68.000	PORVENIR	31294496	$ 272.000	$ 68.000	EXONERADO	EXONERADO	
10	ALBERTO PRIETO	19.535.335	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ -		CONSTRUCTORA RUMIE SAS	$ -	$ -	V	SANITAS	0	$ -	PORVENIR	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACIONES DE INGRESO
11	WILFREDO RAFAEL GARCIA HENRIQUEZ	12.590.007	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ -		CONSTRUCTORA RUMIE SAS	$ -	$ -	V	SANITAS	0	$ -	PORVENIR	0	$ -	$ -	$ -	$ -	AFILIACIONES DE INGRESO
12	JOSE LUIS MANOTAS BOSSIO	8.572.266	CADENERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	DELTA INGENIERIA	$ 1.300.000	90.600	V	COOSALUD	9476720692	162.600	COLFONDOS	9476720692	208.000	0	0	0	RETIRADO
13	LEIBER ENRIQUE MANOTAS BOSSIO	8.571.915	TOPOGRAFO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	DELTA INGENIERIA	$ 1.300.000	90.600	V	COOSALUD	9476720692	162.600	COLFONDOS	9476720692	208.000	0	0	0	RETIRADO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA AUN TIENE PLAZO PARA EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE ACUERDO CON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT, SEGÚN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 923 DEL 31 DE MAYO DEL 2017 ARTÍCULO 1°. MODIFICAR EL ARTÍCULO 3.2.2.1 DEL DECRETO NÚMERO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ASÍ: ARTÍCULO 3.2.2.1., EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO: FECHA DE PAGO DEL CONTRATISTA HASTA EL DÍA HÁBIL 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

NOTA: EL CONTRATISTA PRESENTA LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE - OCTUBRE EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

El contratista adiunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectuó por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Contratista no ha ingresado Director

Firma
Nombre: ERNESTO CAMILO PERTUZ VILLAMIL
Director de Obra
Contratista: CONSORCIO LA GIRALDA
Matrícula Profesional No.: 08202-73690 ATL

Firma
Nombre: JHON ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

SABANAGRANDE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4805 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS ADALBERTO FLOREZ SALGADO	10.778.771	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA P - F LTDA.	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	9475546842	$ 52.000	PROTECCION	9475546842	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
2	CARLOS ARTURO AREVALO VARONA	8.683.366	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	9474364437	$ 52.000	0	9474364437	$ -	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
3	EDGARDO RAFAEL AHUMADA	8.648.705	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	9474364437	$ 52.000	PORVENIR	9474364437	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
4	FRANCISCO ARRIETA PEREZ	1.002.183.010	INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRATIVO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SURA	9474364437	$ 80.000	COLPENSIONES	9474364437	$ 320.000	$ 80.000	Exonerado	Exonerado	
5	ROBERTO CABALLERO MARTELO	72.046.820	OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	$ 2.450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 2.450.000	$ 170.600	V	SALUD TOTAL	9474364437	$ 98.000	PROTECCION	9474364437	$ 392.000	$ 98.000	Exonerado	Exonerado	
6	ALBERTO RAMON CASTILLO CHLYS	7.474.161	VIGILANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS MUTUAL SER	9474364437	$ 52.000	0	9474364437		$ 52.000	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
7	MARIA ALEJANDRA CONTRERAS BARRANCO	1.143.443.933	PROFESIONAL SST	$ 1.838.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.838.000	$ 128.000	V	EPS SURA	9474364437	$ 73.600	COLFONDOS	9474364437	$ 294.100	$ 73.600	Exonerado	Exonerado	
8	EBRATT RODRIGUEZ JOHAN MARIO	8.567.571	VIGILANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.170.000	$ 81.500	V	MUTUALSER	9474364437	$ 46.800	COLFONDOS	9474364437	$ 182.700	$ 46.800	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
9	DAMARIS GUERRERO PAYARES	45.749.085	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.213.334	$ 84.500	V	SANITA	9474364437	$ 48.600	COLPENSIONES	9474364437	$ 194.200	$ 48.600	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
10	STEWEEN JOSE GUETTE MEJIA	1.047.231.217	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUALSER	9474364437	$ 52.000	PORVENIR	9474364437	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
11	ENRIQUE CARLOS EDUARDO RUIZ	8.699.073	ALMACENISTA	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	9474364437	$ 88.000	0	9474364437	$ -	$ 88.000	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
12	CARLOS ROBERTO PRINS DAGER	7.479.122	OPERADOR VIBRO COMPACRADOR	$ 1.339.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.339.000	$ 93.200	V	NUEVA E.P.S.	9474364437	$ 53.600	0	9474364437	$ -	$ 53.600	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
13	LEONEL ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ	72.149.926	CONDUCTOR	$ 1.339.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.339.000	$ 93.200	V	NUEVA E.P.S.	9474364437	$ 53.600	PORVENIR	9474364437	$ 214.300	$ 53.600	Exonerado	Exonerado	
14	PABLO EMILIO SOTO BORRERO	8.801.281	OPERADOR PAJARITA	$ 1.427.126	X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 856.276	$ 59.600	V	CAJACOPI	9474364437	$ 34.300	COLFONDOS	9474364437	$ 137.100	$ 34.300	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
15	CARLOS JESUS ESTEFANELL	1.143.262.859	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1.326.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.326.000	$ 92.300	V	SALUD TOTAL	9474364437	$ 53.100	PORVENIR	9474364437	$ 212.200	$ 53.100	Exonerado	Exonerado	
16	WILLIAM JOSE TORRES VALDES	72.237.353	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.387.254	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.387.254	$ 90.500	V	MUTUAL SER	9474364437	$ 52.000	PORVENIR	9474364437	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
17	LUIS GUILLERMO TRESPLACIOS	98.491.403	OPERADOR MAQUINARIA	$ 1.427.126	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.427.126	$ 99.400	V	SALUD TOTAL	9474364437	$ 57.100	0	9474364437	$ -	$ 57.100	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
18	MANUEL LUCIO ACOSTA	9.138.568	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	9474364437	$ 52.000	PORVENIR	9474364437	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
19	JESUS ARIZA FLOREZ	1.080.016.160	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAJACOPI	9474364437	$ 52.000	PORVENIR	9474364437	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
20	LEONEL GOMEZ TORRES	1.037.480.472	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	9474364437	$ 46.800	PORVENIR	9474364437	$ 182.700	$ 46.800	Exonerado	Exonerado	RETIRADO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA AUN TIENE PLAZO PARA EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE ACUERDO CON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT, SEGÚN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 923 DEL 31 DE MAYO DEL 2017 ARTÍCULO 1°. MODIFICAR EL ARTÍCULO 3.2.2.1 DEL DECRETO NÚMERO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; ASÍ: ARTÍCULO 3.2.2.1., EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO: FECHA DE PAGO DEL CONTRATISTA HASTA EL DÍA HÁBIL 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS ADALBERTO FLOREZ SALGADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-138800

Firma
Nombre: JHON ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CP/TV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4805 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
21	MARCOS TULIO OROZCO CASTRO	8.774.857	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUALSER	9474364437	$ 52.000	PROTECCION	9474364437	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
22	ALCIBIDES OVALLE ZULETA	77.022.170	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUALSER	9474364437	$ 52.000	0	9474364437	$ -	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
23	FREDDY ANTONIO PEÑA	1.046.872.076	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9474364437	$ 52.000	PROTECCION	9474364437	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
24	EDUARD VANEGAS	8.534.568	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	9474364437	$ 52.000	PORVENIR	9474364437	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
25	JOSE LUIS RIOS ZAMBRANO	1.042.355.641	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	9474364437	$ 46.800	PROTECCION	9474364437	$ 182.700	$ 46.800	Exonerado	Exonerado	INGRESO
26	DAISON JOSE CONRADO YEPEZ	1.042.998.843	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.083.334	$ 75.500	V	MUTUALSER	9474364437	$ 43.400	PORVENIR	9474364437	$ 173.400	$ 43.400	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
27	WILBER JESUS PEÑA BUJATO	1.046.873.313	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.040.000	$ 72.400	V	COOSALUD	9474364437	$ 41.600	PORVENIR	9474364437	$ 166.400	$ 41.600	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
28	DANILO JOSE CABALLERO CERVANTES	1.001.888.283	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 476.667	$ 33.200	V	NUEVA EPS	9474364437	$ 19.100	PORVENIR	9474364437	$ 76.300	$ 19.100	Exonerado	Exonerado	INGRESO
29	DIANA ROSA AHUMADA CABALLERO	32.855.561	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 130.000	$ 9.100	V	SALUD TOTAL	9474364437	$ 5.200	PORVENIR	9474364437	$ 20.800	$ 5.200	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
30	JESUS ANDRES REYES VENEGA	1.090.506.127	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 433.334	$ 30.200	V	NUEVA EPS	9474364437	$ 17.400	PORVENIR	9474364437	$ 69.400	$ 17.400	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
31	JORGE GOMEZ	72.096.423	CELADOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 130.000	$ 9.100	V	SALUD TOTAL	9474364437	$ 5.200	PORVENIR	9474364437	$ 20.800	$ 5.200	Exonerado	Exonerado	INGRESO
32	LOURDES TEOTISTA MUÑOZ GOMEZ	32.846.818	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUALSER	80987559	$ 162.500	COLPENSIONES	80987559	$ 208.000	0	Exonerado	Exonerado	
33	ANDRES FELIPE UCROS FABREGAS	1.042.453.771	INSPECTOR TOPOGRAFO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	73838108	$ 162.500	PORVENIR	73838108	$ 208.000	$ 7.800	Exonerado	Exonerado	
34	ANGEL DE JESUS SANTIAGO PEREZ	1.044.605.345	CADENERO	$ 1.300.000	X X X X	INDEPENDIENTE	$ 173.334	$ 12.100	V	MUTUALSER	73816257	$ 21.700	PROTECCION	73816257	$ 27.800	NINGUNA CCF	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
35	CHRISTIAM ANDRES DE LA HOZ VIGGIANI	1.143.262.374	CADENERO	$ -		INDEPENDIENTE	$ -	$ -	V	SALUD TOTAL	0	$ -	COLFONDOS	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACION DE INGRESO
36	ALEXANDER SARMIENTO PEREZ	1.042.354.143	AYUDANTE	$ -		INDEPENDIENTE	$ -	$ -	V	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACION DE INGRESO-ARL
37	CUENTAS BERDUGO OSCAR EMILIO	72.155.429	AYUDANTE	$ -		INDEPENDIENTE	$ -	$ -	V	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACION DE INGRESO-ARL
38	PEDRO ANTONIO RAMIREZ CARRANZA	1.042.350.687	AYUDANTE	$ -		INDEPENDIENTE	$ -	$ -	V	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACION DE INGRESO-ARL
39	EDER RAFAEL CARRILLO CARRILLO	1.048.265.447	AUXILIAR DE TRAFICO	$ -		INDEPENDIENTE	$ -	$ -	V	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACION DE INGRESO-ARL
40	DEIBY JADER RIVERA DOMINGUEZ	11.042.124	AUXILIAR DE TRAFICO	$ -		INDEPENDIENTE	$ -	$ -	V	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	AFILIACION DE INGRESO-ARL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA AUN TIENE PLAZO PARA EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO CON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT, SEGÚN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 923 DEL 31 DE MAYO DEL 2017 ARTÍCULO 1°. MODIFICAR EL ARTÍCULO 3.2.2.1 DEL DECRETO NÚMERO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; ASÍ: ARTÍCULO 3.2.2.1., EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO: FECHA DE PAGO DEL CONTRATISTA HASTA EL DÍA HÁBIL 07 DEL MES DE OCTUBRE 2024.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS ADALBERTO FLOREZ SALGADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-138800

Firma
Nombre: JHON ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CP/TV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

MUNICIPIO DE SABANAGRANDE
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900614442-2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO
FECHA 11/10/2024 (Día / Mes / Año)

MUNICIPIO: SABANAGRANDE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: 2221-2023

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-0P-004-2023
CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. NIT: 900614442-2

PERIODO: 11-09-24 a 10-10-24
PROYECTO: MEJORAMINETO DE LA VIA SABANAGRANDE POLONUEVO - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE . DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Saldo del Contrato Adjudicado	Saldo del CONVENIO	No. y Fecha de Radicación Cuentas En Municipio	Indicar pago según reporte CHEQUE		Observaciones
													SI	NO	
								$ 1,962,654,748.58	$ 6,586,000,000.00	$ 6,542,182,495.26	$ 6,586,000,000.00				
1	Obra	01-03-24 A 31-07-24	$ 1,156,258,653.00	$ -	$ 1,156,258,653.00	$ 346,877,596.00	$ 809,381,057.00	$ 1,615,777,152.58	$ 3,813,964,194.42	$ 5,385,923,842.26	$ 3,813,964,194.42	radicado CT-135-283-2024			
								-$ 1,242,909,478.08							DEVOLUCION DEL ANTICIPO **(Ver Nota)**
								$ 372,867,674.50							NUEVO SALDO DEL ANTICIPO **(Ver Nota)**
2	Obra	01-08-24 A 10-09-24	$ 999,185,151	$ -	$ 999,185,151.00	$ 69,173,619.00	$ 930,011,532.00	$ 303,694,055.50	$ 4,126,862,140.50	$ 4,386,738,691.26	$ 4,126,862,140.50	radicado CT-135-307-2024			
1	Ajuste	04-03-24 a 31-07-24	$ 50,351,244	$ -	$ 50,351,244.00	$ 15,105,373.00	$ 35,245,871.00	$ 288,588,682.50	$ 4,091,616,269.50	$ 4,336,387,447.26	$ 4,091,616,269.50	radicado CT-135-307-2024			
3	Obra	11-09-24 a 10-10-24	$ 793,980,154	$ -	$ 793,980,154.00	$ 52,233,265.00	$ 741,746,889.00	$ 236,355,417.50	$ 3,349,869,380.50	$ 3,542,407,293.26	$ 3,349,869,380.50				
TOTALES			**$ 2,999,775,202.00**	**$ -**	**$ 2,999,775,202.00**	**$ 483,389,853.00**	**$ 2,516,385,349.00**	**$ 236,355,417.50**	**$ 3,349,869,380.50**	**$ 3,542,407,293.26**	**$ 3,349,869,380.50**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	$ 2,949,423,958.00	$ -	**$ 2,949,423,958.00**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT			**$ -**
SECCIÓN 1: OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			**$ -**
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)			**$ -**
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50,351,244.00	$ -	**$ 50,351,244.00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 2,999,775,202.00	$ -	**$ 2,999,775,202.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

1. El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23 de julio de 2024 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, manifestando que, a la fecha de su oficio, han recibido aproximadamente el 11% del valor pactado en el contrato como anticipo y manifestando la renuncia al pago del SALDO DEL ANTICIPO pactado en el contrato de la referencia y que se proceda a la devolución del saldo del ANTICIPO, no pagado y que se encuentra en la FIDUCIA, a la cuenta del convenio de la referencia.
2. En mesa de trabajo PRESENCIAL, en la que participo El alcalde de Sabanagrande, secretario de Obras Públicas, un Representante de la Interventoría y Representante del Contratista, realizada el pasado 23 de julio de 2024 se le puso de presente a la interventoría la solicitud de renuncia del anticipo presentada por el contratista.
3. La interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30 de julio de 2024 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo manifestadas por el contratista en comunicación del 23 de julio de 2024 indicando que no comparte los postulados del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S y considera que el contratista se encuentra en plena facultad de renunciar al anticipo de obra, así mismo informa al municipio que se puede proceder con solicitud de cancelación del PATRIMONIO AUTÓNOMO a la entidad fiduciaria y realizar la devolución de los recursos a título de anticipo a la cuenta del convenio 2221-2023.
4. Que, como consecuencia de lo anterior el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7, obteniéndose el siguiente balance:
   VALOR INICIAL CONSIGNADO EN LA FIDUCIA **$ 1.962.654.748,58**
   VALOR PAGADO AL CONTRATISTA BAJO CONCEPTO DE ANTICIPO: **$ 719.745.270,50**
   SALDO POR RETORNAR A LA CUENTA DEL CONVENIO **$1.242.909.478,08**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **ITALA ESTEFANEL SANTIAGO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:
cc: 22341194

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

PONEDERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 31 de octubre de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITAEL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECTOR: **LA GIRALDA SANTA RITA**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DIAS DEL MES**																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	24	24	22	20	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	23	23	24	24	24	24	**732**
Lluvias moderadas			2	4							2		-												2	1	1					**12**
Lluvias intensas	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Aun no se encuentra aprobado el Residente.

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE RODRIGUEZ CAPELA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-084074

Firma
Nombre: RONALD OSWALDO MOLINARES TORRES
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 25202-359958 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTACION DE CONSULTA : PUERTO GIRALDO [29040300].

PERIODO DE: 1/10/2024 A 31/10/2024

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/10/2024 0:00	40	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/10/2024 0:00	78	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2024 0:00	20	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2024 0:00	10	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2024 0:00	0	50		900
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	10.50788889	-74.82227778	5	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Ponedera	15/09/1978 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2024 0:00	0	50		900

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

SABANAGRANDE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 de octubre de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

SECTOR: **VIAL RURAL SABANAGRANDE – POLONUEVO**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DIAS DEL MES**																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	24	24	24	20	24	24	24	23	24	23	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**736**
Lluvias moderadas		-			-	1		1		1		-	-		1	1													-	-		**5**
Lluvias intensas		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total	**24**	**24**	**24**	**20**	**24**	**25**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ARTURO AREVALO VARONA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-10465 ATL

Firma
Nombre: RONALD OSWALDO MOLINARES TORRES
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 25202-359958 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTACION DE CONSULTA : BARRANQUILLA SEDE [29040450]

PERIODO DE: 1/10/2024 A 31/10/2024

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/10/2024 0:00	0.1	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/10/2024 0:00	0.7	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/10/2024 0:00	39.9	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/10/2024 0:00	61.8	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/10/2024 0:00	68.6	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/10/2024 0:00	3	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2024 0:00	8.1	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2024 0:00	0.2	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2024 0:00	0.5	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2024 0:00	5.1	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2024 0:00	4.5	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2024 0:00	33.7	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/10/2024 0:00	1.2	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2024 0:00	2.2	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2024 0:00	0.4	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2024 0:00	0	50		900
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450	10.99761111	-74.79672222	12	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Atlantico	Barranquilla	1/11/2007 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2024 0:00	0	50		900

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO PONEDERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
ARTICULO 220-22 TERRAPLENES									
1	martes, 08 de octubre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	N/A	SI	N/A	
2	martes, 08 de octubre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 10	INV E-123	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	≤ 80	53.5	SI	
3	martes, 08 de octubre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 40	INV E-124	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	≤ 75	38.9	SI	
4	martes, 08 de octubre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 200	INV E-125	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	≤ 25	10.6	SI	
5	martes, 08 de octubre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	≤ 30	0.0	SI	
6	martes, 08 de octubre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	≤ 10	0.0	SI	
7	martes, 08 de octubre de 2024	Contenido de materia organica	INV E-121	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	≤ ,2	0.0	SI	
8	martes, 08 de octubre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	N/A	2.145	SI	
9	martes, 08 de octubre de 2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada	INV E-148	CANTERA A&T SOLUCIONES	1	≥ 5	17.3	SI	
10	lunes, 21 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+090 AL K00+180 TERRAPLEN 1 CAPA	5	≥ 95	98.3	SI	
11	miércoles, 23 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+180 AL K00+360 TERRAPLEN 1 CAPA	5	≥ 95	97.3	SI	
12	miércoles, 30 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+360 AL K00+460 TERRAPLEN 1 CAPA	5	≥ 95	97.5	SI	

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Contratista no ha cumplido con el Director de obra

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **01113-10647 CPITV**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO SABANAGRANDE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No.: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
ARTICULO 320-22 SUB BASE GRANULAR (SBG-38)									
1	miércoles, 02 de octubre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K00+200 CALZADA DERECHA	1	N/A	SI	N/A	
2	miércoles, 02 de octubre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K00+200 CALZADA DERECHA	1	≤ 25	0.0	SI	
3	miércoles, 02 de octubre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K00+200 CALZADA DERECHA	1	≤ 6	0.0	SI	
4	miércoles, 02 de octubre de 2024	Equivalente de arena, mínimo (%)	INV E-133	K00+200 CALZADA DERECHA	1	≥ 25	27%	SI	
5	miércoles, 02 de octubre de 2024	Terrones de arcillas y particulas deleznables	INV E-211	K00+200 CALZADA DERECHA	1	≤ 2	0.0	SI	
6	miércoles, 02 de octubre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K00+200 CALZADA DERECHA	1	N/A	2.256	SI	
7	martes, 01 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+240 AL K00+300 COSTADO IZQUIERDO.	3	≥ 95	98.5	SI	
8	miércoles, 02 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+150 AL K00+240 COSTADO IZQUIERDO.	3	≥ 95	97.8	SI	
9	viernes, 04 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+040 AL K00+100 COSTADO IZQUIERDO.	3	≥ 95	99.6	SI	
10	martes, 08 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+490 AL K00+580 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	97.3	SI	
11	miércoles, 09 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+580 AL K00+660 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	96.9	SI	
12	jueves, 10 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+660 AL K00+740 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	97.8	SI	
13	viernes, 11 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+740 AL K00+830 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	98.7	SI	
14	lunes, 14 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+490 AL K01+560 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	98.8	SI	
15	viernes, 18 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+420 AL K01+480 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	96.2	SI	
16	sábado, 19 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+350 AL K00+420 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	97.5	SI	
17	jueves, 24 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+290 AL K01+350 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	97.5	SI	
18	viernes, 25 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+200 AL K01+290 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	97.7	SI	
19	miércoles, 30 de octubre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+200 AL K01+150 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	97.5	SI	
ARTICULO 500-22 CONCRETO HIDRAULICO									
20	jueves, 3 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+000 AL K00+051 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	117.9	SI	MUESTRA No O22 28 DIAS
21	lunes, 7 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+499 AL K00+569 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	117.7	SI	MUESTRA No O23 28 DIAS
22	miércoles, 9 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+569 AL K00+660 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	113.0	SI	MUESTRA No O24 28 DIAS
23	viernes, 11 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+660 AL K00+707 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	109.8	SI	MUESTRA No O25 28 DIAS
24	lunes, 14 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+707 AL K00+762 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	116.2	SI	MUESTRA No O26 28 DIAS
25	miércoles, 16 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+762 AL K00+822 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	111.4	SI	MUESTRA No O27 28 DIAS
26	martes, 8 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+240 AL K00+300 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 70 (%)	78.3	SI	MUESTRA No O28 7 DIAS
27	martes, 29 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+240 AL K00+300 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	109.3	SI	MUESTRA No O28 28 DIAS
28	miércoles, 9 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+154 AL K00+240 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 70 (%)	76.3	SI	MUESTRA No O29 7 DIAS
29	miércoles, 30 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+154 AL K00+240 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	111.6	SI	MUESTRA No O29 28 DIAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No.: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
30	jueves, 10 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+100 AL K00+133 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 70 (%)	76.3	SI	MUESTRA No O30 7 DIAS
31	jueves, 31 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+100 AL K00+133 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	110.2	SI	MUESTRA No O30 28 DIAS
32	viernes, 11 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+041 AL K00+100 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 70 (%)	77.9	SI	MUESTRA No O31 7 DIAS
33	lunes, 14 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+143 AL K00+153 K00+000 AL K00+015 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 70 (%)	75.9	SI	MUESTRA No O32 7 DIAS
34	miércoles, 16 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+575 AL K00+656 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	77.1	SI	MUESTRA No O33 7 DIAS
35	jueves, 17 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+656 AL K00+731 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	79.1	SI	MUESTRA No O34 7 DIAS
36	martes, 22 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+490 AL K00+511 K01+521 AL K01+553 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	76.8	SI	MUESTRA No O35 7 DIAS
37	viernes, 25 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+420 AL K01+480 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	77.8	SI	MUESTRA No O36 7 DIAS
38	sábado, 26 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+358 AL K01+420 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	78.1	SI	MUESTRA No O37 7 DIAS
39	jueves, 31 de octubre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+291 AL K01+358 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	80.3	SI	MUESTRA No O38 7 DIAS

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: **ADALBERTO FLORES SALGADO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **08202-138800 ATL**

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **01113-10647 CPITV**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

PONEDERA

FECHA: 31 de octubre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

FECHA DE INICIO: 01 marzo 2024

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14-dic-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 12.460.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 12.460.000.000,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS : $ 67.915.918,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 67.915.918,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10,00%	$ 1.246.000.000,00	7 de noviembre de 2023	31 de diciembre de 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50,00%	$ 6.230.000.000,00	7 de noviembre de 2023	31 de diciembre de 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 2.492.000.000,00	7 de noviembre de 2023	31 de diciembre de 2026
Calidad de Estudios y Diseños	0,00%	$ -	Sin incluir por Municipio	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%		No se incluyó	
			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **400052346**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **NACIONAL DE SEGUROS**

NIT 860.002.527-9

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 623.000.000,00	7 de noviembre de 2023	31 de diciembre de 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **400052345** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **NACIONAL DE SEGUROS**

NIT 860.002.527-9

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/11/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** Sin actualizar **MODIFICACIÓN No.:** Sin actualizar **SUSPENSIÓN No.:** Sin actualizar

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10,00%	$ 1.246.000.000,00	7 de noviembre de 2023	1 de febrero de 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 6.230.000.000,00	7 de noviembre de 2023	1 de agosto de 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 2.492.000.000,00	7 de noviembre de 2023	1 de agosto de 2027
Calidad de Estudios y Diseños	30,00%	$ -	No se incluyó	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%		No se incluyó	No se incluyó
			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **400052346**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **NACIONAL DE SEGUROS**
NIT 860.002.527-9

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del S No se han corregido y por ende no se han aprobado por el Municipio de Pondera.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** Sin actualizar **MODIFICACIÓN No.:** Sin actualizar **SUSPENSIÓN No.:** Sin actualizar

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 623.000.000,00	7 de noviembre de 2023	1 de agosto de 2024
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **400052345** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **2**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **NACIONAL DE SEGUROS**
NIT 860.002.527-9

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: No se han corregido y por ende no se han aprobado por el Municipio de Pondera.

OBSERVACIONES:

Las pólizas no han sido corregidas y actualizadas por el contratista acorde al acta de inicio, modificatorio 2, suspensión 1, modificatorio 3 y prorroga No. 1, situación que conllevo a la interventoría ha recomendar dos proceso sancionatorios al Municipio de Ponedera mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

No se firma. Contratista no ha corregido y actualizado Polizas.

Firma

Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9

www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
160347	BOGOTA	11		15	400052345	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
11 / 4 / 2024	11 / 4 / 2024	00:00	1 / 8 / 2024	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5	TELÉFONO	3002025801
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	311.500.000,00	623,000,000.00	623.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	93.450.000,00	311,500,000.00	311.500.000,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	311.500.000,00	623,000,000.00	623.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	93.450.000,00	311,500,000.00	311.500.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	93.450.000,00	311,500,000.00	311.500.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 12/04/2024	901770166

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 623.000.000,00	SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
BROKER DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTORES DE SEGUR	40165	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

YVALBUENA

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052345	2	BOGOTA	Día - Mes - Año 11 4 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
11 4 2024	00:00	1 8 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5	TELÉFONO	3002025801
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS CUALES SON:

MUNICIPIO DE PONEDERA NIT 890.116.278-9 Y O INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01 MARZO DE 2024, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADQUIRIDA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA - SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA,DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONSORCIO LA GIRALDA ESTA CONFORMADO POR:
RK CONSTRUCTION GROUP SAS NIT 901514977-5 50%
BUNKER CONSTRUCCIONES SAS NIT 901460958-1 40%
LT BUILDINGS SAS NIT 900371384-9 10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400052345

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
12/04/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 11 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
161288	BOGOTA		11		30	400052346	3
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
29 / 4 / 2024	16 / 4 / 2024	00:00	2 / 8 / 2027	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO	3770600

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA Y SE ACTUALIZAN LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIN DEL ANTICIPO LOS CUALES VAN HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO:

- ASEGURADO-BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE PONEDERA NIR. 890.116.278-9 EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2
- LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA ES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 07 11 2023

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/04/2024	01/02/2025	1.246.000.000.00	2.512.482,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/04/2024	01/08/2027	2.492.000.000.00	0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/04/2024	01/02/2025	6.230.000.000.00	12.562.411,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 15.074.893,00	$ 0,00	$ 2.864.229,67	$ 17.939.122,67	Día - Mes - Año 30/04/2024	901770166

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 9.968.000.000,00	NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
BROKER DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTORES DE S	40165	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
YVALBUENA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052346	3	BOGOTA	29 /4 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 16 /4 /2024	00:00 Horas del 2 /8 /2027	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600

- LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE INICIO DE FECHA 01 03 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS CUALES SON:

MUNICIPIO DE PONEDERA NIT 890.116.278-9 Y O INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01 MARZO DE 2024, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA
GIRALDA - SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA,DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONSORCIO LA GIRALDA ESTA CONFORMADO POR:
RK CONSTRUCTION GROUP SAS NIT 901514977-5 50%
BUNKER CONSTRUCCIONES SAS NIT 901460958-1 40%
LT BUILDINGS SAS NIT 900371384-9 10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	17.939.123,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
30/04/2024	$ 17.939.122,67

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 29 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400052346, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO LA GIRALDA.
NIT : 901.770.166 - 5
Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 29 días del mes de Abril de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

SABANAGRANDE

FECHA: 1 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

FECHA DE INICIO: 04 marzo 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4-dic-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 6.542.182.495,26

VALOR ACUMULADO: $ 6.542.182.495,26 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS : $ 37.649.815,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.649.815,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10,00%	$ 654.218.249,53	17 de octubre de 2023	1 de mayo de 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30,00%	$ 1.962.654.748,58	17 de octubre de 2023	1 de mayo de 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 1.308.436.499,05	17 de octubre de 2023	31 de diciembre de 2026
Calidad de Estudios y Diseños	30,00%	$ 11.294.944,50	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 1.962.654.748,58	5 años y 0 dias despues de terminación.	5 años y 1 dias despues de terminación.
			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **5-44-101124914**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
NIT 860.009.578-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMV	$ 464.000.000,00	17 de octubre de 2023	31 de diciembre de 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **85-40-101057279** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
NIT 860.009.578-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10,00%	$ 654.218.249,53	4 de marzo de 2024	4 de abril de 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 1.962.654.748,58	4 de marzo de 2024	4 de abril de 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 1.308.436.499,05	4 de marzo de 2024	4 de diciembre de 2027
Calidad de Estudios y Diseños	30,00%	$ 11.294.944,50	18 de mayo de 2024	19 de mayo de 2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 1.962.654.748,58	5 años y 1 dias despues de terminación.	5 años y 1 dias despues de terminación.
			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **5-44-101124914**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT 860.009.578-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Sin aprobación por Municipio

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMV	$ 464.000.000,00	4 de marzo de 2024	4 de diciembre de 2024
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **85-40-101057279** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **Anexo 5**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT 860.009.578-6

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Sin aprobación del Municipio

OBSERVACIONES:

Las polizas se encuentra actualizadas según prorroga No. 1.
La interventoría ha solicitado al Municipio de Sabanagrande la aprobación de las polizas vigentes del contrato, sin embargo del Municipio no ha otorgado respuesta. La interventoría realizó solicitud mediante comunicación C-T-135-265-2024 del 27/08/2024.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101057279**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**05**	**2024**	**04**	**03**	**2024**	**00:00**	**04**	**12**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**
DIRECCIÓN: CL 78 NRO. 42 - 54	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO:	3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**
DIRECCIÓN: CL 78 NRO. 42 - 54	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3603110
BENEFICIARIO: 900614442 - CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	ADICIONAL:	ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS REFERENTE AL MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE - POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO DE OBRA SG-LP-OP-004-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COMUNICADO DE SOLICITUD DE CESION DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, ACTA DE CESION Y RESOLUCION No. 777 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023.

.
-CEDENTE: CONSORCIO SABANAGRANDE 2023, NIT: 901758762-6.
INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA P-F LTDA, 900210235-1, PART 50%.
CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ATLANTICO SAS, 901355791-1, PART 50%.
-CESIONARIO: CRIVEN CONSTRUTORES SAS, NIT 900614442-2.
.
TOMADOR: CRIVEN CONSTRUTORES SAS
ASEGURADO: CRIVEN CONSTRUTORES SAS Y MUNICIPIO DE SABANAGRANDE-ATLANTICO CON NIT 890115982-1.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**04/03/2024**	**04/12/2024**	**$464,000,000.00**	**$464,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**04/03/2024**	**04/12/2024**	**$464,000,000.00**	**$464,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**04/03/2024**	**04/12/2024**	**$464,000,000.00**	**$464,000,000.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA MODIFICANDO PLAZO DEL CONTRATO HASTA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN OTROSI MODIFICATORO 003 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024.
.
DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****930,542.00	$ *******3,000.00	$ *****177,373.00	$ *********1,110,915.00	$ ******464,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057279	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	05	2024	04	03	2024	00:00	04	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**
DIRECCIÓN: CL 78 NRO. 42 - 54	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**
DIRECCIÓN: CL 78 NRO. 42 - 54	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	3603110

BENEFICIARIO: 900614442 - CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101057279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DAVIDRAMBAO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057279	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	05	2024	04	03	2024	00:00	04	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110	

BENEFICIARIO: 900614442 - CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

OBJETO DE LA POLIZA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE SABANAGRANDE-ATLANTICO CON NIT 890115982-1.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101057279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DAVIDRAMBAO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101057279**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**05**	**2024**	**04**	**03**	**2024**	**00:00**	**04**	**12**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

BENEFICIARIO: ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****930,542.00	$ *******3,000.00	$ *****177,373.00	$ *********1,110,915.00	$ ******464,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609506358(3900)000001110915(96)20250304

REFERENCIA PAGO:

1101360950635-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057279	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	05	2024	04	03	2024	00:00	04	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

BENEFICIARIO: 900614442 - CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101057279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DAVIDRAMBAO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101124914**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**05**	**2024**	**04**	**03**	**2024**	**00:00**	**04**	**12**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 78 NRO. 42 - 54	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	**NIT: 890.115.982-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 7 NO. 5-10	SABANAGRANDE, ATLANTICO	8791216

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, REFERENTE AL MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE - POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO DE OBRA SG-LP-OP-004-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COMUNICADO DE SOLICITUD DE CESION DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, ACTA DE CESION Y RESOLUCION No. 777 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023.

.

-CEDENTE: CONSORCIO SABANAGRANDE 2023, NIT: 901758762-6.
INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA P-F LTDA, 900210235-1, PART 50%.
CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ATLANTICO SAS, 901355791-1, PART 50%.
-CESIONARIO: CRIVEN CONSTRUCTORES SAS, NIT 900614442-2.

.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SABANAGRANDE IDENTIFICADO CON NIT. 890115982-1 / e INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2024	04/04/2025	$654,218,249.53	$654,218,249.53
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/03/2024	04/12/2027	$1,308,436,499.05	$1,308,436,499.05
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/03/2024	04/04/2025	$1,962,654,748.58	$1,962,654,748.58
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$1,962,654,748.58	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/05/2024	19/05/2029	$11,294,944.50	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA MODIFICANDO PLAZO DEL CONTRATO HASTA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN OTROSI MODIFICATORO 003 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024.

.

DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,725,638.00	$ *******8,000.00	$ *****709,391.00	$ *********4,443,029.00	$ ****5,899,259,190.24	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101124914

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL .

4.8.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO 1 de 2	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4 **MES:** sep-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. P.A. 31117922 **DE** 2023 ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. **BANCO** SUCURSAL: Oficina Carrera 38 (Barranquilla)
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

ANTICIPO EJECUTADO: 11 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.962.654.748,58 (M/CTE)**

VALOR DE DEVOLUCIÓN ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.242.909.478,08 (M/CTE)**

VALOR DEL ANTICIPO EJECUTADO: **$ 719.745.270,50 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA DE VENTA	FEV281	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 10.329.165,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV282	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 11.207.883,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV283	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.460.844,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV284	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.282.082,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV286	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 29.462.268,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV287	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 27.078.975,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV288	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.240.725,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV289	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.413.720,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV298	30-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 15.864.963,00	2	Transporte de materiales*
FACTURA DE VENTA	FE71824	15-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 21.896.000,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE71825	15-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 21.622.300,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE71826	15-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 30.107.000,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE71928	17-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 21.622.300,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE71975	18-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 21.622.300,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72171	23-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 27.917.400,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72277	25-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 32.570.300,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72451	29-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 32.844.000,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72686	2-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 36.675.800,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72750	3-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 20.253.800,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72852	6-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 16.969.400,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73007	9-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 38.591.700,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73061	12-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 29.942.780,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73360	20-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 43.244.600,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73458	21-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 38.318.000,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73501	22-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 14.779.800,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73554	23-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 26.001.500,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73626	25-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 19.980.100,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73854	29-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 18.337.900,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE74034	2-sep-24	CONCREMOVIL SAS	$ 26.275.200,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE74034	2-sep-24	CONCREMOVIL SAS	$ 20.429.920,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL7322	12-jul-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 4.602.094,14	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL7381	16-jul-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 8.557.290,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL8419	21-ago-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 2.784.596,43	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL8564	27-ago-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 3.748.500,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL8577	27-ago-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 3.748.500,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL8632	29-ago-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 25.962.111,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL9123	16-sep-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 3.748.500,00	1	Compra de materiales
PROFORMA FACTURA	GL7737	29-jul-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 6.243,93	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FECA 7	26-sep-24	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ATLANTICO SAS	$ 7.244.710,00	2	Transporte de materiales
			TOTAL	**$ 719.745.270,50**		

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO (Ver Nota Observaciones) (B)	NUEVO SALDO DEL VALOR DEL ANTICIPO (C)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (D)	VALOR PRESENTE MES (E)	VALOR ACUMULADO ACTUAL F=(D+E)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (C-F)
1	compra de materiales	$ 1.457.654.748,58	$ 844.494.813,08	$ 613.159.935,50	$ 613.159.935,50	$ -	$ 613.159.935,50	$ -
2	transporte de materiales	$ 310.000.000,00	$ 203.414.665,00	$ 106.585.335,00	$ 106.585.335,00	$ -	$ 106.585.335,00	$ -
3	Mano de Obra	$ 195.000.000,00	$ 195.000.000,00	$ -		$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 1.962.654.748,58**	**$ 1.242.909.478,08**	**$ 719.745.270,50**	**$ 719.745.270,50**	**$ -**	**$ 719.745.270,50**	**$ -**

37%

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (AGOSTO-2024) : $ 117.898,67
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 737.066,47
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
115440375	$ 311.961,24	N/A	MAYO Y ABRIL 2024	26/06/2024	$ 311.961,24
118370531	$ 307.206,56	N/A	JUNIO Y JULIO 2024	22/08/2024	$ 619.167,80
118717111	$ 117.898,67	N/A	AGOSTO 2024,	11/09/2024	$ 737.066,47
TOTAL	**$ 737.066,47**				**$ 737.066,47**

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

1. El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23 de julio de 2024 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, manifestando que, a la fecha de su oficio, han recibido aproximadamente el 11% del valor pactado en el contrato como anticipo y manifestando la renuncia al pago del SALDO DEL ANTICIPO pactado en el contrato de la referencia y que se proceda a la devolución del saldo del ANTICIPO, no pagado y que se encuentra en la FIDUCIA, a la cuenta del convenio de la referencia.
2. En mesa de trabajo PRESENCIAL, en la que participo El alcalde de Sabanagrande, secretario de Obras Públicas, un Representante de la Interventoría y Representante del Contratista, realizada el pasado 23 de julio de 2024 se le puso de presente a la interventoría la solicitud de renuncia del anticipo presentada por el contratista.
3. La interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30 de julio de 2024 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo manifestadas por el contratista en comunicación del 23 de julio de 2024 indicando que no comparte los postulados del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S y considera que el contratista se encuentra en plena facultad de renunciar al anticipo de obra, así mismo informa al municipio que se puede proceder con solicitud de cancelación del PATRIMONIO AUTÓNOMO a la entidad fiduciaria y realizar la devolución de los recursos a título de anticipo a la cuenta del convenio 2221-2023.
4. Que, como consecuencia de lo anterior el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7, obteniéndose el siguiente balance:
VALOR INICIAL CONSIGNADO EN LA FIDUCIA **$ 1.962.654.748,58**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA BAJO CONCEPTO DE ANTICIPO: **$ 719.745.270,50**
SALDO POR RETORNAR A LA CUENTA DEL CONVENIO **$1.242.909.478,08**
VALOR BASE DE SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO: **$ 719.745.270,50**

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO
Representante Legal o Delegado
Contratista
CC No.: 22.431.194

Firma:
Nombre: OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
CC No. 79.296.441

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Bogotá D.C, jueves, 27 de junio de 2024

Operaciones celebradas por parte del negocio Fiduciario 31117922 Fideicomiso Criven Constructores P.A

Fecha de Pago	No. Fideicomiso	Nombre Fideicomiso	N. Orden de Pago	Identificación Tercero	Nombre Tercero Pago	Valor Neto	Tipo Cuenta Destino	Nro Cuenta Destino	Entidad Financiera Destino	Estado Reporte
26/6/2024	117922	31117922 FIDEICOMISO CRIVEN CONSTRUCTORES P. A	1	NIT - 899999090	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	$311.961	CTA CTE	50000249	2 - BANCO POPULAR S A	PROCESADO

Bogotá D.C, viernes, 23 de agosto de 2024

Operaciones celebradas por parte del negocio Fiduciario 31117922 Fideicomiso Criven Constructores P.A

Fecha de Pago	No. Fideicomiso	Nombre Fideicomiso	N. Orden de Pago	Identificación Tercero	Nombre Tercero Pago	Valor Neto	Tipo Cuenta Destino	Nro Cuenta Destino	Entidad Financiera Destino	Estado Reporte
22/8/2024	117922	31117922 FIDEICOMISO CRIVEN CONSTRUCTORES P. A	22082024	NIT - 899999090	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	$307.207	CTA CTE	61011094	0 - BANCO DE LA REPUBLICA	PROCESADO

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
NIT 800182281
REPORTE DE PAGOS

Fecha Causación	Fecha de Pago	No. Fideicomiso	Nombre Fideicomiso	Tipo Doc Tercero Causaci	Doc Tercero Causación	Nombre Tercero Causación	Tipo Doc Tercero Pago	Num Doc Tercero Pago	Nombre Tercero Pago	Tipo Cuenta Origen	Nro Cuenta Origen	Entidad Financiera Origen	Cuenta Financiera Cartera Origen	Tipo Cuenta Destino	Nro Cuenta Destino	Entidad Financiera Destino	Cuenta Financiera Cartera Destino	Transaccion	Forma Recaudo / Pago	N. Orden de Pago	Valor Bruto	Incrementos	Deducciones	Valor Neto	GMF	Observacion	Nro Hoja de Trabajo	N. Orden de Giro	N. CDP	N. RP	Estado	Anticipo
10/09/2024	11/09/2024	117922	31117922 FIDEICOMISO CRIVEN CONSTRUCTORES P.A	NIT	899999090	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	NIT	899999090	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	CTA AH	482800034662	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		CTA CTE	61011094	0 - BANCO DE LA REPUBLICA		PAGO TERCEROS - (APLICADO)	SEBRA	11092024	117,898.67	0.00	0.00	117,898.67	471.59	No.Orden Pago:11092024 Pago Rendimientos Financieros mes de Agosto 2024 Contrato: SG-LP-OP-004-2023. Se procede a girar los rendimientos de la siguiente manera. Banco: Banco de la República Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094 Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Código Portafolio: 270 Código de Transacción SEBRA: 137 Forma pago: SEBRA Novedad: 2007 - (21) NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:11871711 Retirado Hoja:3404762	3404763				APLICADO	N
11/09/2024	11/09/2024	117922	31117922 FIDEICOMISO CRIVEN CONSTRUCTORES P.A	NIT	890115982	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	NIT	890115982	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	CTA AH	482800034662	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		CTA CTE	024169996022	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		PAGO TERCEROS - (PROCESADO)	ACH	11092024	1,242,909,478.08	0.00	0.00	1,242,909,478.08	4,971,637.91	No.Orden Pago:11092024 DEVOLUCION SALDO A ENTIDAD CONTRATANTE, POR SOLICITUD DEL CLIENTE. Forma pago: ACH Novedad: 2010 - (21) NIIF TRASLADOS AL FIDEICO No.Referencia: 11887149 0000 - Proceso Exitoso	3406015				PROCESADO	N

4.8.2 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO

FORMATO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/08/2024 (Día / Mes / Año)

1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO **PROGRAMA DE INVERSIONES** [x]

CONVENIO: 2220 DE 2023 **OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP - 001 - 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRA 1/03/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/07/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 12,460,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A** $ 12,460,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 8 MESES 14 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/08/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Etapa Estudios y Diseños mar-24	2 Etapa Estudios y Diseños abr-24	3 Etapa de construcción may-24	4 Etapa de construcción jun-24	5 Etapa de construcción 01-jul-24 a 29-jul-24	29-jul-2024 a -27-ago-24	5 Etapa de construcción 28-ago-24 a 31-ago-24	6 Etapa de construcción sep-24	7 Etapa de construcción oct-24	8 Etapa de construcción nov-24	9 Etapa de construcción 14-dic-24
Explanaciones (E),	$240,447,900	1.97%		% P		5.10%	6.73%	0.27%	0.35%		0.00%	0.42%	1.25%	0.42%	0.00%
	$329,558,294.00	2.70%	$0	$ P		$621,829,500	$820,454,300	$32,955,829	$42,842,578		$0	$50,751,977	$152,255,932	$50,751,994	$0
				$ E											
				% E											
Sub-bases (SB),	$ 5,170,938,916.00	42.40%		% P		7.22%	0.11%	2.46%	3.20%		0.44%	10.26%	9.86%	8.51%	10.26%
	$5,487,340,589.00	44.99%	$0	$ P		$880,000,000	$13,374,237	$300,002,237	$390,003,908		$54,254,229	$1,251,052,755	$1,203,076,366	$1,037,368,034	$1,251,584,060
				$ E											
				% E											
Bases (B),	$ 0.00	0.00%		% P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$0	0.00%	$0	$ P		$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
				$ E											
				% E											
Pavimentos (P),	$ 6,756,282,072.20	55.40%		% P		0.00%	16.12%	4.82%	6.26%		2.58%	6.90%	19.14%	6.90%	1.56%
	$5,874,217,353.75	48.16%	$0	$ P			$1,966,108,800	$587,421,730	$763,648,256		$315,110,090	$841,607,454	$2,334,329,874	$841,607,454	$190,492,490
				$ E											
				% E											
Estructuras y Obras de Drenajes (OA),	$ 28,374,237.10	0.23%		% P		0.12%	0.00%	0.00%	0.24%		0.00%	0.44%	0.69%	0.31%	0.00%
	$227,858,002.30	1.87%	$0	$ P		$15,000,000	$0	$27,785,800	$29,621,540		$0	$53,449,087	$83,876,082	$38,125,492	$0
				$ E											
				% E											
Señalización y Control de Tránsito (SCT),	$0	0.00%		% P				0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$0	0.00%	$0	$ P				$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
				$ E											
				% E											
Obras Varias y de Mitigación Ambiental (OV)	$ 0.00	0.00%		% P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$0	0.00%	$0	$ P		$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
				$ E											
				% E											
Transportes (T) (solo los indicados en esta gran partida de pago, los demás transportes se agrupan en las actividades correspondientes)	$0	0.00%		% P				0.23%	0.30%		0.00%	0.35%	1.05%	0.35%	0.00%
	$277,068,886.25	2.27%	$0	$ P				$27,706,887	$36,019,953		$0	$42,668,606	$128,005,818	$42,668,606	$0
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS		0.00%		% P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		0.00%	$0	$ P		$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 12,196,043,125.30**	**100%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 12,196,043,125.30**	**100%**													

SUSPENSIÓN No1

Prorroga No1
Suspensión No1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	12.44%	22.96%	7.96%	10.35%		3.03%	18.36%	31.99%	16.49%	11.82%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0.00	$ 1,516,829,500.00	$ 2,799,937,337.10	$ 970,872,489.30	$ 1,262,134,236.10		$ 369,364,318.60	$ 2,239,529,879.66	$ 3,901,544,072.01	$ 2,010,521,579.55	$ 1,442,076,550.08
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	12.44%	35.39%	7.96%	18.31%		21.34%	39.70%	71.69%	88.18%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 1,516,829,500.00	$ 4,316,766,837.10	$ 970,872,489.30	$ 2,233,006,725.40		$ 2,602,371,044.00	$ 4,841,900,923.66	$ 8,743,444,995.67	$ 10,753,966,575.22	$ 12,196,043,125.30
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 67,915,918.00 / $ -	$ -	%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 33,807,959.00 / $ -	$ -	%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 48,543,625.00 / $ -	$ -	%
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 113,689,372.70 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 263,956,874.70	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 12,460,000,000.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 12,460,000,000.00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
PRORROGA 1		

OBSERVACIONES:
El contratista cuenta con dos (2) mes para la elaboración de los estudios y diseños, los cuales servirán de soporte para el ajuste de las cantidades y metas físicas definitivas del contrato de obra.

Aprueba Firma: EDGAR TORRES M.
Nombre: **EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA**
Representante legal del Contratista
No. Identificación: 8.717.014

Aprueba Firma:
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No. **25202-27254 CND**

Revisó Firma:
Nombre: **LUCY MARY MANOTAS PACHECO**
Supervisor del Contrato
Municipio de el PONEDERA (Atlantico)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **DE** 11-09-24 a 10-10-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 793,980,154.00 (3 de 26)

CONVENIO: 2220 DE 2023 **OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO **SEGUIMIENTO No.** 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP - 001 - 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/03/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6,542,182,495.26 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6,542,182,495.26

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA
Explanaciones (E),			1.1%
	$127,235,776.50	2.05%	$65,306,060
Sub-bases (SB),	$ 185,401,684.49	2.98%	7.2%
	$1,625,315,267.27	26.15%	$446,824,303
Bases (B),	$ 28,175,617.44	0.45%	0.0%
		0.00%	$0
Pavimentos (P),	$ 5,013,932,660.77	80.66%	38.8%
	$4,225,940,276.63	67.99%	$2,412,811,215
Estructuras y Obras de Drenajes (OA),			0.0%
	$194,196,434.77	3.12%	$0
Señalización y Control de Tránsito (SCT),			0.0%
			$0
Obras Varias y de Mitigación Ambiental (OV)	$ 988,316,066.66	15.90%	0.0%
			$0
Transportes (T) (solo los indicados en esta gran partida de pago, los demás transportes se agrupan en las actividades correspondientes)			0.4%
	$43,138,274.19	0.69%	$24,482,380
TOTAL OTROS ITEMS			0.0%
			$0
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 6,215,826,029.36**	**100%**	**47.45%**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 6,215,826,029.36**	**100%**	**$ 2,949,423,958.00**

% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Etapa Estudios y Diseños	2 Etapa de construcción	3 Etapa de construcción	4 Etapa de construcción	5 Etapa de construcción	6 Etapa de construcción	7 Etapa de construcción	8 Etapa de construcción	9 Etapa de construcción	10 Etapa de construcción
	4/mar/2024	abr-24	may-24	4-jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	4/dic/2024
% P				0.00%	0.10%	0.31%	0.31%	0.51%	0.80%	0.02%
$ P				0	$6,361,789	$19,085,366	$19,085,366	$31,808,944	$49,621,953	$1,272,358
$ E					$26,113,500	$29,439,900	$9,752,660	$0	$0	$0
% E					0.42%	0.47%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%
% P		2.98%	0.00%	4.39%	1.11%	3.32%	3.32%	5.53%	8.63%	0.22%
$ P		$185,401,684	$0	$250,194,082	$68,746,059	$206,238,357	$206,238,178	$343,730,296	$536,219,262	$13,749,212
$ E					$221,389,014	$63,296,075	$62,139,214	$0	$0	$0
% E					3.56%	2.63%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% P		0.21%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P		$12,793,091	$15,382,526	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
$ E						$0	$0	$0	$0	$0
% E					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% P		1.95%	78.71%	2.77%	3.27%	9.80%	9.80%	16.33%	25.41%	0.65%
$ P		$121,452,032	$4,892,480,629	$165,992,106	$203,007,409	$609,022,226	$609,022,226	$1,015,037,043	$1,583,257,786	$40,601,482
$ E					$899,920,559	$263,551,616	$719,339,040	$0	$0	$0
% E					14.48%	12.77%	11.57%	0.00%	0.00%	0.00%
% P				0.00%	0.16%	0.47%	0.47%	0.78%	1.22%	0.03%
$ P				0	$9,709,822	$29,129,465	$29,129,465	$48,549,109	$75,736,610	$1,941,964
$ E							$0	$0	$0	$0
% E					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% P										
$ P										
$ E										
% E										
% P		0.00%	14.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P		$0	$889,480,460	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
$ E						$0	$0	$0	$0	$0
% E					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% P				0.00%	0.03%	0.09%	0.10%	0.17%	0.27%	0.01%
$ P				0	$2,156,905	$6,470,714	$6,470,714	$10,784,524	$16,823,857	$431,381
$ E					$8,835,580	$2,882,400	$2,749,240	$0	$0	$0
% E					0.14%	0.21%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
% P										
$ P										
$ E										
% E										

47.45% $289,981,983 Prorroga 1 BALANCE

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	5.14%	93.27%	6.70%	4.67%	14.00%	14.00%	23.33%	36.39%	0.93%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0.00	$ 319,646,807.36	$ 5,797,347,615.00	$ 416,186,188.64	$ 289,981,983.08	$ 869,946,128.43	$ 869,945,949.23	$ 1,449,909,915.38	$ 2,261,859,467.99	$ 57,996,396.62
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	5.14%	98.41%	6.70%	11.36%	25.36%	39.35%	62.68%	99.07%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 319,646,807.36	$ 6,116,994,422.36	$ 416,186,188.64	$ 706,168,171.72	$ 1,576,114,300.15	$ 2,446,060,249.37	$ 3,895,970,164.75	$ 6,157,829,632.75	$ 6,215,826,029.36
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.60%	16.07%	12.77%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,156,258,653	$ 999,185,151	$ 793,980,154	$ 0	$ 0	$ 0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.68%	47.45%	47.45%	47.45%	47.45%	47.45%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,156,258,653.00	$ 2,155,443,804.00	$ 2,949,423,958.00	$ 2,949,423,958.00	$ 2,949,423,958.00	$ 2,949,423,958.00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 37,649,815.00 / $ -	$ -	%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 14,387,139.20 / $ -	$ -	%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 26,321,802.00 / $ -	$ -	%
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 247,997,709.70 / $ -	$ 50,351,244.00	20.3%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 326,356,465.90	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 6,542,182,495.26**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 2,999,775,202.00**	**45.9%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
INICIAL		
PRORROGA 1		
PRORROGA 2		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO**
Representante legal del Contratista
No. Identificación: 22,431,194

Aprueba Firma:
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202-27254 CND**

Revisó Firma:
Nombre: **BRUNO DE LA CRUZ CELY**
Supervisor del Contrato
Municipio de el SABANAGRANDE (Atlantico)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.8.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FORMATO MEPI-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 26
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se revisan el cumplimiento de compromisos con el seguimiento a cada uno de los componentes de diseño y documentos de inicio del contrato de obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Seguimiento de estudios y diseños
Seguimiento actividades de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de seguimiento SG-LP-OP-004-2023, para el cual se desarrollan actividades de estudios y diseños y actividades de obra.

VOLUMEN	ACCIONES NECESARIAS	GESTIÓN CONTRATISTA
DISEÑO GEOMÉTRICO	* Interventoría informa que entregó informe ajustado, el cual se encuentra en evaluación por parte de interventoría. * Realizar nivelación y contra nivelación del corredor del k2+850 al k3+350	* Contratista informa que el 12/10/24 procederá a realizar la toma de cotas y el lunes entrega el diseño de los 500m
DISEÑO PAVIMENTO	* Interventoría consulta sobre el avance del diseño geométrico del k2+850 al k3+350	* Contratista informa que el diseño lo entrega el Martes 15/10/2024
ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO HIDRÁULICO	* Interventoría informa que se remite observaciones al volumen, por lo cual se requiere que se ajuste de acuerdo a las observaciones remitidas. * Se solicita programar mesa de trabajo y recorrido de obra para identificar los ajustes solicitados. * La interventoría requiere de manera prioritaria la entrega definitiva del documento * Se solicita realizar rocería en las obras hidráulicas entre el k3 al k4, con la finalidad de evaluar las obras hidráulicas existentes	* Contratista se encuentra ajustando el documento y ajustando la fecha de programación del recorrido. * Contratista informa que el 12/10/24 realiza la rocería de las obras y el martes 15-10-24 se realiza recorrido para evaluar las obras
SOCIAL	* Interventoría informa que esta Pendiente coordinar el comité de participación comunitaria, la cual se tiene previsto para la primera semana de noviembre. Y se solicita para dicha reunión adelantar presentación. * Interventoría solicita continuar con la entrega de las copias de las actas de vecindad y suministrar el reporte final de la entrega	* Contratista informa que se encuentra en proceso de organizar la citación al comité de participación ciudadana y la elaboración de la presentación.
LABORATORIO	* Interventoría informa que entrega caracterización de material de subbase, en el que relaciona los meses de julio, agosto y septiembre. Por lo cual se precisa que los ensayos deben entregarse por mes	* Contratista informa que se encuentra en tramite de los resultados y entregará el 15/10/24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/10/2024 (Día / Mes / Año)

ANTICIPO	* Interventoría informa que se encuentra pendiente la entrega -Informes de julio a septiembre - Informe final de fiducia - Entrega de extracto del mes de septiembre	* Contratista informe que se encuentra en la gestión de los respectivos documentos. 15/10/24

VARIOS

* Interventoría solicita al contratista dar inicio con la construcción de los bordillos, ya que la falta de los mismos esta favoreciendo la acumulación de material sobre el pavimento construido y adicionalmente favorece el pulimiento prematuro de la superficie con la presencia del trafico. De igual manera solicita que se de ingreso a una cuadrilla independiente de construcción de bordillos.
* Contratista informa que se encuentra en proceso de búsqueda de la respectiva cuadrilla para dar inicio con la actividad. Teniendo proyectado el inicio de las actividades la próxima semana.

* interventoría solicita la entrega de las planillas de pago de la seguridad social del Personal de Topografía y de la Profesional Social.
* Contratista informa que el personal de topografía tiene fecha de pago hasta el 16 de cada mes, por lo cual el 17/10/2024 dará entrega de lo correspondiente. En relación a la Profesional Social, procederá a realizar el respectivo tramite.



* Interventoría informa que el contratista cuenta con un programado de 46.9% versus un ejecutado de 36,8% lo que representa un atraso de la ejecución de la obra de 10.1%. Por lo cual solicita al contratista incrementar el ritmo de trabajo y adelantar la construcción de la estructura de pavimento entre el k0+800 al k1+550.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Incido de construcción de Bordillos	martes, 15 de octubre de 2024	Contratista
Atención de observaciones del Estudio Hidráulico	Prioritario	Contratista
Recorrido de obra con el especialista Hidráulico	Prioritario	Contratista
Entrega de Planilla de pago de la Seguridad Social de Personal de topografía y del Área Social	jueves, 17 de octubre de 2024	Contratista
Entrega de Planilla de pago de la Seguridad Social de Personal del Área Social	Prioritario	Contratista
Entrega de ensayos de laboratorio de agosto - septiembre	martes, 15 de octubre de 2024	Contratista
Entrega de informes de fiducia y liquidación	martes, 15 de octubre de 2024	Contratista
Entrega de Diseño geométrico complementario entre el k2+850 al k3+350	lunes, 14 de octubre de 2024	Contratista
Entrega del Diseño de Pavimentos entre el k2+850 al k3+350	martes, 15 de octubre de 2024	Contratista
Rocería de las obras hidráulicas del k3+155 y del k3+950	sábado, 12 de octubre de 2024	Contratista
Recorrido para verificar el estado de las obras hidráulicas del k3+155 y del k3+950	martes, 15 de octubre de 2024	Contratista
FIDUCIA: Entrega del extracto del mes de septiembre de 2024	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
FIDUCIA: Entrega de los informes de junio a septiembre de 2024	Prioritario	Contratista
FIDUCIA: Entrega de informe final de la fiducia	Prioritario	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ADALBERTO FLORES	DIRECTOR DE OBRA	CRIVEN CONSTRUCTORES	
JOHN ARIAS H.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
RONALD MOLINARES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
FRANCISCO ARRIETA	ING AUXILIAR	CRIVEN CONSTRUCTORES	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	9/10/2024 (Día / Mes / Año)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CARLOS ARTURO ARÉVALO VARON	RESIDENTE DE OBRA	CRIVEN CONSTRUCTORES	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 27
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

* Se realiza el seguimiento compromisos con el desarrollo de los temas.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1 Seguimiento Estudios y diseños.
2 Alcance y metas físicas.
3 Balance de obra.
4 Avance Físico de obra.
5 Avance financiero de obra.
6 Plan de manejo de trafico.
7 Seguimiento a incumplimientos del contratista

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de seguimiento LP-001-2023 para el cual se hace el seguimiento al avance de la obra y a los compromisos.

1 Seguimiento Estudios y diseños.

Interventoría realiza la exposición del estado de avance de los estudios y diseños. los cuales se encuentran en el siguiente estado

Estudio de Geología y Geotecnia:Aprobado
Estudio de transito: Aprobado
Diseño de Pavimento:Aprobado
Diseño Geométrico: Con observaciones
Estudio Hidráulico para Obras de Drenaje: Con observaciones
Diseño de Estructuras:Según cartilla.
Diseño de concreto:Se trabajará con concretera
Documento PAGA:Con observaciones de INVIAS
Cantidades y Presupuesto:Entregado

2 Alcance y metas físicas.

Interventoría informa, que de acuerdo con los estudios diseño, se actualizaron las metas físicas del contrato. Teniendo en cuenta que el ancho de la vía inicial contemplada en el presupuesto del convenio contemplaba la sección típica de 5.6m y actualmente se mejora las condiciones en marco de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, de 6.3m

METAS FISICAS	INICIALES CONVENIO	ACTUALIZADAS - ESTUDIOS Y DISEÑOS
Actividad	Alcance	Alcance
Mejoramiento (Pavimento Rígido)	5,98 Km	2,70 Km
Mantenimiento (Conformación de calzada y afirmado)	5,70 Km	5,70 Km
Box culvert	1 Un	1 Un

3 Balance de obra.

Interventoría informa, que de acuerdo con los estudios diseño, se actualizaron las metas físicas del contrato. Teniendo en cuenta que el ancho de la vía inicial contemplada en el presupuesto del convenio contemplaba la sección típica de 5.6m y actualmente se mejora las condiciones en marco de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, de 6.3m

4 Avance Físico de obra.

Interventoría precisa que el contratista se encuentra en el proceso de explanación de la calzada, entre el k0+090 al k0+240. De igualmente aclara que los rendimientos no son los esperados, por lo cual solicita al contratista dar celeridad a las actividades constructivas.

5 Avance financiero de obra.

Interventoría informa que el contratista tiene un programado del 50% versus un ejecutado del 0.2%, lo cual representa un atraso de 49.8%. Estando muy por debajo de las inversiones programadas. Por lo tanto se reitera la necesidad de incrementar el ritmo de trabajo.

6 Plan de manejo de trafico.

Interventoría informa que Se solicitó la restricción del trafico pesado (Camiones C2, C3, C4 y C5) y el Municipio de Ponedera solicito a los operadores del Ferry que conecta con Salamina, su desplazamiento a otro del Rio Magdalena, dado que el Ferry es el origen y destino de casi la totalidad del trafico pensado. La solicitudes fueron aportadas por el municipio en reunión del 05 de septiembre de 2024. De igual forma se aclara que Se mantiene el transito de vehículos livianos con puestos de control y señalización. Además como medida informativa se instalaron pasacalles

7 Seguimiento a incumplimientos del contratista

Interventoría informa que el contratista continua con el incumplimiento de los compromisos pactados, por lo cual resalta que se debe dar cumplimiento a los mismos. Además resalta que a la fecha se ha informado al Municipio al respecto de dichos incumplimientos.
A continuación se presenta cada uno de los compromisos pendientes por cumplir por parte del contratista y se solicita dar respuesta e informar las nuevas fechas de reprogramación de cada uno de los compromisos.

COMPROMISOS	COMENTARIOS INTERVENTORÍA	COMENTARIOS CONTRATISTA
Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.	* Interventoría solicita la entrega de forma prioritaria	* Contratista informa que la aseguradora no ha dado respuesta sobre la solicitud de expedición de dichos documentos, y que al momento desconoce los motivos por los cuales no se han expedido. En tal sentido procederá a realizar nuevamente la solicitud y dara una respuesta a la interventoría el 11/10/2024.
Maquinaria en obra para inicio de obra.	* Interventoría solicita la entrega de forma prioritaria	* Contratista informa que se encuentra pendiente la disposición del minicargador. No obstante aclara que ha entregado la documentación correspondiente de los equipos disponibles en obra. Contando con una motoniveladora, un retro cargador y un vibro compactador.
Diseño Geométrico (entrega de 3 Km de ajuste de diseño geométrico).	* Interventoría solicita la entrega de forma prioritaria	* El contratista informa que el 12-10-24 hace entrega del diseño geométrico del km1 al km3 y el km restante para el 18-10-24
Materiales para explanaciones en obra.	* Interventoría informa que se debe suministrar el material que se evidenció en recorrido en la cantera, por lo cual se aclara que en caso de que el material no sea de las mismas características del que se tiene caracterizado, se procederá a rechazar.	* Contratista informa que hoy da inicio con el acopio del material.
Hoja de vida director de obra	* Interventoría requiere la presencia permanente del directo o entrega de hoja de vida del nuevo director de obra	* el contratista informa que hoy 10-10-24 procederá a enviar la hoja de vida de cambio de director.
Hoja de vida residente de obra	* Interventoría precisa que se enviaron observaciones a la hoja de vida. Y se esta a la espera de los soportes pertinentes para su aprobación.	* El contratista informa que se encuentra pendiente la entrega de los soportes de la hoja de vida. Hoy 10-10-24 dará entrega de la documentación
Plan de contingencia	* Interventoría recalca la pertenencia de entrega del plan de contingencia, ya que se desea conocer la forma como el contratista dará complicación a las obras. * Gestor INVIAS solicita un plan de contingencia con tiempos de ejecución hasta el 31/12/2024 y otro bajo tiempos que el contratista tenga proyectado. Lo anterior únicamente informativo con el fin de gestionar posibles acciones para continuidad de la interventoría y ante los atrasos de obra que se presentan. * La interventoría aclara que el seguimiento contractual seguira siendo en base a la reprogramación de la prorroga No. 1 y el contratista debe dar cumplimiento el plazo de ejecución actual.	* Contratista informa que el 11-10-24, hace entrega de lo correspondiente.
Gestión Social		

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

Informes de gestión social	* Interventoría informa que se encuentra pendiente la entrega de los informes de Junio a Septiembre de 2024. De igual forma aclara que se debe entregar los informes en aras de avanzar con la respectiva revisión, mientras se complementa los mismos con los respectivos soportes	* Contratista informa que los informes los tiene finalizados y el 10-10-24, dará entrega. * Contratista aclara que las actas de compromiso con los únicos documentos pendientes.
Firmas de Actas de Vecindad	* Interventoría solicita la respectiva entrega de los documentos de forma prioritaria	* Contratista informa que se encuentra pendiente la firma.
Actas de compromiso	* Interventoría solicita la respectiva entrega de los documentos	* Contratista informa que se encuentra en la consecución de las firmas correspondientes y el 12-10-24 entrega los documentos pertinentes. No obstante, informará si es posible la firma de los propietarios de los predios. Ya que los propietarios no permanecen en el lugar del predio.
Gestión Ambiental		
Informes de gestión Ambiental	* Interventoría informa que se encuentra pendiente la entrega de los informes del mes de junio, julio, agosto, septiembre.	* El contratista informa que los informes ya se encuentra adelantados. Y que el 10-10-24 hace entrega delos meses de junio, julio, agosto.
Atención a las observaciones del PAGA	* Atender observaciones realizadas mediante el comunicado C-T-135-234-2024 de fecha de 7/8/24	* Contratista informa que el 20-10-24 entrega las respectivas observaciones realizadas.

* Interventoría hace claridad de la pertinencia de la asistencia a los comités de obra del personal exigido en los pliegos de condiciones y notifica al representante legal del contratista que la interventoría ha adelantado 3 solicitudes de procesos sancionatorios y de incumplimiento ante la entidad contratante.
* Contratista informa que procederá a cambiar al director de obra y enviará la hoja de vida correspondiente para la evaluación por o parte de Interventoría.
* INVIAS precisa que nota falta de interés en la disposición de personal requerido en los documentos contractuales. Por lo cual solicita al contratista dar cumplimiento a sus obligaciones.

* INVIAS solicita que el seguimiento del contrato y de lo relacionado en el presente comité se realice cada 8 días, ya que es indispensable controlar el avance del contratista y el cumplimiento de cada uno de los compromisos.

* La interventoría solicita que para la realización de los comités se presente al Director de obra y residente de obra, ya que este es el personal contractualmente establecido y teniendo en cuenta que en pasado comité no asiste el representante legal.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.	viernes, 11 de octubre de 2024	Contratista
Ingreso del Minicargador	viernes, 11 de octubre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km3).	sábado, 12 de octubre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km3 a km4).	viernes, 18 de octubre de 2024	Contratista
Materiales de mejoramiento para inicio de la instalación de la estructura de pavimento	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
Hoja de vida del nuevo director de obra	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
Complementar hoja de vida del residente de obra	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
Entrega del Plan de Contingencia	viernes, 11 de octubre de 2024	Contratista
Informes de gestión social del mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2024	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
Entrega de Actas de Vecindad firmadas	Prioritario	Contratista
Entrega de las 4 Actas de compromiso	Prioritario	Contratista



FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

Hoja de vida del nuevo director de obra	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
Complementar hoja de vida del residente de obra	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
Entrega del Plan de Contingencia	viernes, 11 de octubre de 2024	Contratista
Entrega de Actas de Vecindad firmadas	Prioritario	Contratista
Entrega de las 4 Actas de compromiso	Prioritario	Contratista
Informes de gestión Social del mes de junio, julio y agosto 2024	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
Informes de gestión Ambiental del mes de junio, julio y agosto 2024	jueves, 10 de octubre de 2024	Contratista
Actualización documento PAGA: Atender observaciones realizadas mediante el comunicado C-T-135-234-2024 de fecha de 7/8/24	domingo, 20 de octubre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO LA GIRALDA	
BRICEIDA BOLÍVAR OROZCO	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO LA GIRALDA	
JIMMY CORREDOR CHINOME	GESTOR INVIAS	INVIAS	
JOHN ARIAS H.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
RONALD O MOLINARES TORRES	ING. RESIDENTE	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 28
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

* Se realiza el seguimiento compromisos con el desarrollo de los temas.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1 Seguimiento Estudios y diseños.
2 Alcance y metas físicas.
3 Balance de obra.
4 Avance Físico de obra.
5 Avance financiero de obra.
6 Plan de manejo de tráfico.
7 Seguimiento a incumplimientos del contratista

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de seguimiento LP-001-2023 para el cual se hace el seguimiento al avance de la obra y a los compromisos.

1 Seguimiento Estudios y diseños.

Interventoría realiza la exposición del estado de avance de los estudios y diseños. los cuales se encuentran en el siguiente estado

Estudio de Geología y Geotecnia:Aprobado
Estudio de tránsito: Aprobado
Diseño de Pavimento:Aprobado
Diseño Geométrico: Con observaciones
Estudio Hidráulico para Obras de Drenaje: Con observaciones
Diseño de Estructuras:Según cartilla.
Diseño de concreto:Se trabajará con concretera
Documento PAGA:Con observaciones de INVIAS
Cantidades y Presupuesto:Entregado

2 Alcance y metas físicas.

Interventoría informa, que de acuerdo con los estudios diseño, se actualizaron las metas físicas del contrato. Teniendo en cuenta que el ancho de la vía inicial contemplada en el presupuesto del convenio contemplaba la sección típica de 5.6m y actualmente se mejora las condiciones en marco de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, de 6.3m

METAS FISICAS	INICIALES - CONVENIO	ACTUALIZADAS - ESTUDIOS Y DISEÑOS
Actividad	Alcance	Alcance
Mejoramiento (Pavimento Rígido)	3,98 Km	3,70 Km
Mantenimiento (Conformación de calzada y afirmado)	5,70 Km	5,70 Km
Box culvert	1 Un	1 Un

3 Balance de obra.

Interventoría informa, que de acuerdo con los estudios diseño, se actualizaron las metas físicas del contrato. Teniendo en cuenta que el ancho de la vía inicial contemplada en el presupuesto del convenio contemplaba la sección típica de 5.6m y actualmente se mejora las condiciones en marco de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, de 6.3m

4 Avance Físico de obra.

Interventoría precisa que el contratista se encuentra en el proceso de explanación de la calzada con un avance de 300m, entre el k0+090 al k0+390 y hasta el 17/10/2024 dio inicio a la instalación de materiales granulares.

Se tiene un ritmo de ejecución de bajo, y el contratista no dispone de la maquinaria necesaria para incrementar el ritmo de ejecución de obra. Se presentan falencias de la comisión de topografía que generan escaso avance de las actividades.
Se solicita al contratista incrementar frentes adicionales de obra **(Con materiales, maquinaria, equipo y personal)**, dada la contingencia y atrasos presentados.

5 Avance financiero de obra.

Interventoría informa que el contratista tiene un programado del 67% versus un ejecutado del 0.5%, lo cual representa un atraso de 58,5%. Estando muy por debajo de las inversiones programadas. Por lo tanto se reitera la necesidad de incrementar el ritmo de trabajo.

La interventoría menciona que se debe ingresar maquinaria adecuada para la ejecución de las obras, dado que las excavaciones se esta realizando con motoniveladora, lo cual hace que el rendimiento sea bajo y que a su vez se genere afectación sobre las cercas de predios. Se solicita no intervenir ni afectar cercas ah no ser que se cuente con permiso por escrito. La interventoría no autoriza la ejecución de mas explanaciones con el procedimiento que viene realizando el contratista y por el momento solicita centrar labores en el tramo explanado de 300 m.

Contratista informa que el día de hoy ingresará una nueva comisión de topografía para reemplazar la que estaba e ingresara un retroexcavadora 320, con el fin de mejorar los rendimientos y evitar las afectaciones que menciona la interventoría.

7 Seguimiento a incumplimientos del contratista

Interventoría informa que el contratista continua con el incumplimiento de los compromisos pactados, por lo cual resulta que se debe dar cumplimiento a los mismos. Además resalta que a la fecha se ha informado al Municipio al respecto de dichos incumplimientos.
A continuación se presenta cada uno de los compromisos pendientes por cumplir por parte del contratista y se solicita dar respuesta e informar las nuevas fechas de reprogramación de cada uno de los compromisos.

COMPROMISOS	COMENTARIOS INTERVENTORÍA	COMENTARIOS CONTRATISTA
Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro sí No.2 y Otro sí No. 3 y suspensión No. 1.	* No cumplido	* Contratista informa que remitirá a la aseguradora comunicado en el cual se da claridad a los procesos sancionatorios sugeridos por parte de interventoría al Municipio y se espera que aun vez la aseguradora verifique la respectiva información, procederá a realizar las respectivas pólizas.
Incremento de la Maquinaria en obra.	* No cumplido	* Contratista informa que el 22/10/24 ingresa una Retro excavadora y 3 volquetas
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km2).	* No cumplido	* Contratista entrega hasta el km2 y se debe realizar la nivelación del terreno. Por lo cual el 19/10/24. * Contratista informa que el 21/10/24 entrega el diseño definitivo del km1 al km2.
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4).	* No cumplido	* Contratista informa que el 24/10/24 entrega el alineamiento y la nivelación 26/10/24. Entrega definitivo del diseño geométrico el 4/11/24
Materiales para explanaciones en obra.	* Se da inicio con el acopio el 16/10/24. Se solicitan ensayos del contratista. * Interventoría recomienda incrementar el acopio de material, ya que el material acopiado actual no es suficiente	* Contratista informa que 18/10/24 incrementa el acopio con el ingreso de 450 a 600m3
Hoja de vida director de obra	*No cumplido * Interventoría insiste en la presencia del Director de Obra	* Contratista informa que el 18/10/24 entrega la hoja de vida
Hoja de vida residente de obra	* No cumplido * Interventoría informa que no se cuenta con los soportes de la hoja de vida	* Contratista informa que el 18/10/24 entrega lo solicitado.
Estudio Hidráulico	* Interventoría solicita, entrega dando respuesta punto a punto de cada una de las observaciones.	* Contratista informa que el 21/10/24 entrega.

Plan de contingencia	Entregado el 15/10/24, y se solicita ajustes. La interventoría considera que el plan propuesto no incrementa recursos y no esta acorde a la situación actual de la obra. Mediante comunicado C-T-135-356-2024 se remiten las respectivas observaciones. Así mismo se manifiesta que no se plantea en dicho plan frentes adicionales y con los recursos que se tienen, la obra no terminaría ni siquiera el año que viene.	* Interventoría precisa que cada frente de obra debe ser independiente y se puede distribuir dentro del corredor de acuerdo a las necesidades.

* Invias (Ing. Diana Vanegas - Dirección Territorial Atlántico) ve con preocupación el poco avance del contrato, y se puede presumir un incumplimiento definitivo del contrato, y se aclara que la fecha de finalización del contrato no se puede extender después del 14/12/24 que es la fecha de finalización de interventoría. Por lo cual hace un llamado de atención al contratista y Municipio ya que no se cuenta a la fecha con las garantías de cumplimiento por parte del contratista.
* Desde INVIAS se socializarán medidas con el Municipio de Ponedera y su alcalde por la situación crítica del proyecto.

* Invias (InG Jimmy - Gestor Técnico) refiere que los avances del contrato no son significativos y nota con preocupación los rendimientos de obra reportados. Además se precisar que con el avance de las obras reportadas no da suficiente sustento para proceder a prorrogar el contrato de obra y de la interventoría mediante una posible sustitución de recursos.
* Contratista informa que la meta es de llegar al 50% de avance al corte del 30/11/24. Además esta tomando correctivos para incrementar el ritmo de trabajo y actualizará el Plan de Contingencia según las recomendaciones.

* Contratista informa que dispondrá de mas frentes de obra de la siguiente manera: Explanaciones, subbase, instalación de aceros y formaletas y concretos, para mejorar los rendimientos. A su vez informa que internamente se van tomar medidas para mejorar sustancialmente la ejecución de obra y tener un importante avance al 30 de noviembre de 2024 y que mas frentes de obra es difícil por los anchos de calzada. Aunado manifiesta que han tomado una serie de correctivos en cuanto a maquinaria y personal.

* Interventoría informa que difiere de los frentes de obra planteados por el contratista, ya que no se puede referir frentes de obra a la ejecución de una única actividad. Los frentes de obra deben contar con su personal, maquinaria, equipo y materiales para ejecutar por tramos la vía todas las actividades de la estructura de pavimento, ya que se tiene un disponibilidad de intervención de 2700 m y difiere de lo expuesto por el contratista con relación a los anchos de calzada, debido a que se puede trabajar realizando acopios de materiales por tramos.

Gestión Social		
Informes de gestión social	* Parcialmente cumplido. Entrega de junio de 2024, pendiente julio, agosto y septiembre * Interventoría solicita precisar los datos de personal, además solicita celeridad en el cumplimiento de los compromisos de la Gestión Social. * Interventoría solicita entrega de un plan de contingencia del área social.	* Contratista informa que se encuentra en elaboración de un plan de trabajo para dar cumplimiento a cada uno de los compromisos. * Contratista entrega el informe de julio 22/10/24 * Interventoría informa que se programa mesa de trabajo el 21/10/24 para informe de agosto * Contratista informa que el informe de septiembre lo entrega 25/10/24
Firmas de Actas de Vecindad	* No cumplido * Interventoría solicita la entrega inmediata de las actas de vecindad con el registro fotográfico y debidamente firmadas	* Contratista informa que el 19/10/24 entrega
Actas de compromiso	* Interventoría solicita la respectiva entrega de los documentos * Interventoría solicita la entrega inmediata de las actas de compromiso.	* Contratista entrega el 22/10/24
Gestión Ambiental		
Informes de gestión Ambiental	* Parcialmente cumplido. pendiente septiembre 2024 * Interventoría recalca La importancia de dar cumplimiento a cada uno de los programas establecidos en la implementación al documento PAGA y solicita cumplimento estricto al documento * Interventoría solicita realizar las respectivas adecuaciones en el ZODME. Previo al inicio de la disposición de material.	* Contratita informa que el 16/10/24 entrega el informe de septiembre
Atención a las observaciones del PAGA	* Atender observaciones realizadas mediante el comunicado C-T-135-334-2024 de fecha de 7/8/24. Pendiente para el 20/10/2024. Se solicita de forma Prioritaria	
Gestión SST		
SEÑALIZACIÓN	* se solicita al contratista realizar la señalización pendiente por instalar en obra, según como se describe en el PMT. * Se solicita de forma prioritaria	* Contratista informa que el 21/10/24 complementa la respectiva señalización
Aportes a la seguridad social	* Se recomienda la entrega según las recomendaciones indicadas en el comunicado C-T-135-344-2024. y los lineamientos de lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015	*

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

TEMAS MUNICIPIO DE PONEDERA		
RENDIMIENTOS	* Se solicita la consignación de forma prioritaria de los rendimientos e información sobre la restitución de los recursos faltantes en la cuenta por valor de 58 millones aprox.	* Invias (Gestor técnico) informa que llegó un auto fiscal sobre el tema de los recursos faltantes. Por lo cual se procederá a notificar para dar claridad de los recursos faltantes. Y solicita al Municipio de Ponedera que se restituya los recursos de forma inmediata.
ZODME	* Contratista solicita al municipio la entrega de la certificación del ZODME de acuerdo a lo requerido por la interventoría.	* Municipio informa que procederá a realizar el respectivo documento.
TRASLADO DEL FERRY	Interventoría informa al municipio que el ferry continua en operación y que parte del tráfico que normalmente circulaba por el tramo objeto del contrato, se encuentra desviándose por el barrio Giraldito, por lo cual se sugiere al municipio que tome las medidas correspondientes ante el no cumplimiento del traslado del ferry por parte de los operadores. Aun cuando la mayoría del tráfico antes de la obra ya circulaba por dicho barrio, se solicita al Municipio adoptar medidas debido a los desvíos que realizan los vehículos como consecuencia de la llegada y salida del Ferry.	* municipio informa que solicitó el traslado del ferry, sin embargo no obtuvieron respuesta de estos operadores.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.	Prioritario	Contratista
Incremento de la Maquinaria en obra.	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km2): Nivelación del tramo	sábado, 19 de octubre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km2): Entrega diseño definitivo	lunes, 21 de octubre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4): Entrega de alineamiento	jueves, 24 de octubre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4): Nivelación del corredor	sábado, 26 de octubre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4): Diseño geométrico definitivo	lunes, 4 de noviembre de 2024	Contratista
Acopio de material de mejoramiento	viernes, 18 de octubre de 2024	Contratista
hoja de vida del director	viernes, 18 de octubre de 2024	Contratista
hoja de vida del residente	viernes, 18 de octubre de 2024	Contratista
Plan de Contingencia ajustado	Inmediato	Contratista
Estudio Hidráulico	lunes, 21 de octubre de 2024	Contratista
Informes de gestión social de julio	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
Gestión Social: Mesa de trabajo para informe de agosto	lunes, 21 de octubre de 2024	Contratista
Informes de gestión social de septiembre	viernes, 25 de octubre de 2024	Contratista
Actas de vecindad	sábado, 19 de octubre de 2024	Contratista
Actas de compromiso	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
Informe ambiental de septiembre	sábado, 26 de octubre de 2024	Contratista
Entrega de PAGA	domingo, 20 de octubre de 2024	Contratista

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

FECHA: 18/10/2024 (Día / Mes / Año)

Señalización	lunes, 21 de octubre de 2024	Contratista
Entrega de Planillas de Seguridad Social	Prioritario	Contratista
Consignación de rendimientos de septiembre	Prioritario	Municipio de Ponedera
Certificado del ZODME	Prioritario	Municipio de Ponedera

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OMAR RODRÍGUEZ	ING. RESIDENTE	CONSORCIO LA GIRALDA	OMAR RODRIGUEZ
EDSON TAPIAS	COORDINADOR DE OBRA	CONSORCIO LA GIRALDA	Edson Jose Tapias Higuera
BRICEIDA BOLÍVAR OROZCO	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO LA GIRALDA	
JIMMY CORREDOR CHINOME	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
JOHN ARIAS H.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
RONALD O MOLINARES TORRES	ING. RESIDENTE	CONSORCIO ODESSA	
ROSIO FLORES	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO ODESSA	
LINA CARVAJAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO ODESSA	
LUCY MANOTAS	SECRETARIA DE PLANEACION	MUNICIPIO	
DIANA VANEGAS	DIRECTORA TERRITORIAL ATL	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/3

FECHA: 21/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 29
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se revisan el cumplimiento de compromisos con el seguimiento a cada uno de los componentes de diseño y documentos de inicio del contrato de obra.

	COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1	Inicio de construcción de Bentilva	martes, 15 de octubre de 2024	No cumplido
2	Atención de observaciones del estudio Hidráulico	Prioritario	No cumplido
3	Recorrido de obra con el especialista Hidráulico	Prioritario	No cumplido
4	Entrega de Planilla de pago de la Seguridad Social de Personal de topografía y del Área Social	jueves, 17 de octubre de 2024	Cumplido
5	Entrega de Planilla de pago de la Seguridad Social de Personal del Área Social	Prioritario	Cumplido
6	Entrega de ensayos de laboratorio de agosto - septiembre	martes, 15 de octubre de 2024	Cumplido
7	Entrega de Informes de fiducia y liquidación	martes, 15 de octubre de 2024	Cumplido
8	Entrega de Diseño geométrico complementario entre el k2+850 al k3+350	lunes, 14 de octubre de 2024	No cumplido
9	Entrega del Diseño de Pavimentos entre el k2+850 al k3+350	martes, 15 de octubre de 2024	No cumplido
10	Rocería de las obras hidráulicas del k3+155 y del k3+950	sábado, 12 de octubre de 2024	No cumplido
11	Recorrido para verificar el estado de las obras hidráulicas del k3+155 y del k3+950	martes, 15 de octubre de 2024	No cumplido
12	FIDUCIA: Entrega del extracto del mes de septiembre de 2024	jueves, 10 de octubre de 2024	Cumplido
13	FIDUCIA: Entrega de los informes de junio a septiembre de 2024	Prioritario	No cumplido
14	FIDUCIA: Entrega de informe final de la fiducia	Prioritario	Cumplido

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento de estudios y diseños

Seguimiento actividades de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de seguimiento SG-LP-OP-004-2023, para el cual se desarrollan actividades de estudios y diseños y actividades de obra.

VOLUMEN	ACCIONES NECESARIAS	GESTIÓN CONTRATISTA
DISEÑO GEOMÉTRICO	* Realizar nivelación y contra nivelación del corredor del k2+850 al k3+350	* Contratista informa que el 25/10/24 procederá a realizar la toma de cotas y el lunes entrega el diseño de los 500m
DISEÑO PAVIMENTO	* Interventoría consulta sobre el avance del diseño geométrico del k2+850 al k3+350	* Contratista informa que el diseño lo entrega el Martes 22/10/2024

Powered by CamScanner

FECHA: 21/10/2024 (Día / Mes / Año)

ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO HIDRÁULICO	* Interventoría informa que se remite observaciones al volumen, por lo cual se requiere que se ajuste de acuerdo a las observaciones remitidos. * Se solicita programar mesa de trabajo y recorrido de obra para identificar los ajustes solicitados. * La interventoría requiere de manera prioritaria la entrega definitiva del documento * Se solicita realizar rocería en las obras hidráulicas entre el k3 al k4, con la finalidad de evaluar las obras hidráulicas existentes	* Contratista se encuentra ajustando el documento y ajustando la fecha de programación del recorrido. * Contratista informa que el 21/10/24 realiza la rocería de las obras y el martes 22-10-24 se realiza recorrido para evaluar las obras
SOCIAL	* Interventoría solicita que se adelante las siguientes gestiones. - Terminar la entrega de las actas de vecindad - Programar la reunión de comité de participación comunitaria - Capacitación de la campaña de seguridad vial - Atención de PQR del km2 - Las gestiones ante el ICANH, Ministerio del Interior, y el Sistema geográfico colombiano.	* Contratista informa que la capacitación y la reunión se programan para la primera semana de noviembre. Los demás compromisos: - Atención de PQR: para el 28/10/24 - Gestiones con entidades del estado: 28/10/24
ANTICIPO	* Interventoría informa que se encuentra pendiente la entrega informes de julio a septiembre - Certificación expedida por parte de la entidad financiera donde conste la cancelación de la cuenta. - Certificación bancaria o de Entidad Fiduciaria donde conste el valor de los rendimientos financieros durante la vigencia de la cuenta	* Contratista informa que entrega lo correspondiente el 25/10/24

VARIOS

* Interventoría solicita al contratista dar inicio con la construcción de los bordillos, ya que la falta de los mismos esta favoreciendo la acumulación de material sobre el pavimento construido y adicionalmente favorece el pulimiento prematuro de la superficie con la presencia del trafico. De igual manera solicita que se de ingreso a una cuadrilla independiente de construcción de bordillos.
* Contratista informa que se encuentra en proceso de búsqueda de la respectiva cuadrilla para dar inicio con la actividad. Teniendo proyectado el inicio de las actividades la próxima semana. Contratista informa que el 28/10/24 da inicio a las actividades constructivas.

* Interventoría informa que el contratista cuenta con un programado de 52.1% versus un ejecutado de 47.5% lo que representa un atraso de la ejecución de la obra de 4.7%. Por lo cual solicita al contratista incrementar el ritmo de trabajo y adelantar la construcción de la estructura de pavimento. Además de ingresar el grupo de personal requerido para las obras adicionales como los bordillos, canal de desagüe y llenos detrás de bordillos.
* Se solicita la instalación de la pintura provisional de los resaltos.
* Se esta a la espera de que la empresa Triple A entregue las tapas, para continuar con las fundidas entre el k0+010 al k0+020. Por lo cual solicita realizar la respectiva gestión ante Triple A.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Inicio de construcción de Bordillos	lunes, 28 de octubre de 2024	Contratista
Atención de observaciones del Estudio Hidráulico	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
Recorrido de obra con el especialista Hidráulico	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
Construcción de canal	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
Entrega de Diseño geométrico complementario entre el k2+850 al k3+350	viernes, 25 de octubre de 2024	Contratista
Entrega del Diseño de Pavimentos entre el k2+850 al k3+350	viernes, 25 de octubre de 2024	Contratista
Rocería de las obras hidráulicas del k3+155 y del k3+950	viernes, 25 de octubre de 2024	Contratista
Recorrido para verificar el estado de las obras hidráulicas del k3+155 y del k3+950	viernes, 25 de octubre de 2024	Contratista
Soportes de Fiducia	viernes, 25 de octubre de 2024	Contratista
Cumplimiento de compromisos Sociales	lunes, 28 de octubre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3/3
		FECHA	21/10/2024 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADALBERTO FLORES	DIRECTOR DE OBRA	CRIVEN CONSTRUCTORES	
JOHN ARIAS H.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
RONALD MOLINARES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
FRANCISCO ARRIETA	ING AUXILIAR	CRIVEN CONSTRUCTORES	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CARLOS ARTURO ARÉVALO VARON	RESIDENTE DE OBRA	CRIVEN CONSTRUCTORES	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/3

FECHA: 25/10/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 30
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA, CON LA PRESENCIA DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA, CON LA FINALIDAD DE EVIDENCIAR LOS AVANCES DE LA OBRA Y TRATAR TEMAS RELACIONADOS CORRESPONDIENTES.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

NINGUNO

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

* INTERVENTORIA SOLICITA REPONER A LAS CONDICIONES ORIGINALES LAS CERCAS AFECTADAS, POR LA EXPLANACIÓN
* INTERVENTORIA NUEVAMENTE SOLICITA EL INGRESO DE LA RETROEXCAVADORA, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE OBRA Y EVITAR AFECTACIÓN EN LAS CERCAS
* INTERVENTORIA SOLICITA EL INGRESO DE LA SUBBASE.
* INTERVENTORIA SOLICITA CERTIFICACIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA.
* INTERVENTORIA SOLICITA NO REALIZAR DONACIONES DE MATERIAL HASTA TANTO NO SE VERIFIQUE LOS PREDIOS REGISTRADOS. SE SOLICITA EL MATERIAL DISPONER EN EL ZODME.
* CONTRATISTA PROPONE EL INGRESO DE MAQUINARIA, PARA MAÑANA
* CONTRATISTA ENTREGA MEJORAMIENTO EN SEGUNDA CAPA MAÑANA.
* EL AVANCE DE OBRA CORRESPONDE A EXPLANACIÓN K+580, EL MEJORAMIENTO, K+360 - K+090.
* SE SOLICITA INCREMENTAR FRENTES DE OBRA.
* SE SOLICITA ENTREGA DEL ESTUDIO HIDRAULICO, DE FORMA PRIORITARIA.
* SE SOLICITA ENTREGA DEL DISEÑO GEOMETRICO.
* INTERVENTORIA SOLICITA LA ENTREGA DE LOS SOPORTES DE LA HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE.

Powered by CamScanner

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OMAR E RODRIGUEZ	INGENIERO RESIDENT	CONSORCIO	
Edwin Zapata	Coordinador Obra	Consorcio	
Ronald D. Molinares T.	INGENIERO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
John Arias H	Director Interv.	Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/4

FECHA: 29/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 31
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Se hace el seguimiento con desarrollo de temas.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA, CONTANDO CON AUSENCIA DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

* SE REALIZA RECORRIDO Y SE VERIFICAN EL ESTADO DE LAS ALCANTARILLAS, POR LO CUAL SE SOLICITA INCLUIR EN EL ESTUDIO HIDRAULICO, ADEMAS REALIZAR LAS RESPECTIVAS APROVACIONES.
* ALCANTARILLA PR 3+150: (42") SE SOLICITA CONSTRUIR CABEZOTES.
* ALCANTARILLA PR 3+970: (42") SE SOLICITA CONSTRUIR CABEZOTES.
* ALCANTARILLA PR 4+700: (42") REALICE CUNETA AGUAS ARRIBA Y ALEJO ALCANTARILLA.

* CONTRATISTA INFORMA QUE EL ESTUDIO HIDRAULICO EL 2 DE NOVIEMBRE 2024.

* CONTRATISTA INFORMA QUE EL ESTUDIO GEOMETRICO LO ENTREGA EL 2 NOVIEMBRE 2024

* CONTRATISTA INFORMA QUE EL DISEÑO PAVIMENTO LO ENTREGA EL 2 NOVIEMBRE 2024.

* INTERVENTORIA REITERA LA IMPORTANCIA DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS.

* CONTRATISTA INFORMA QUE EL 5/11/24 DA INICIO CON LA INSTALACIÓN BORDILLO

* CONTRATISTA INFORMA QUE INICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CANAL EL 30/11/24.

* INTERVENTORIA SOLICITA ENTREGA DE CERTIFICACIÓN RENDIMIENTOS GENERADOS Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA, Y ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO FIDUCIARIO.

* CONTRATISTA INFORMA QUE EL 1/11/24 INICIA EL CANAL

* INTERVENTORIA SOLICITA PROGRAMAR LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- CONTRATISTA INFORMA QUE EL 8/11/24 SE REALIZA
- CONTRATISTA INFORMA QUE LAS ACTAS VECINDAD FALTA ENTREGA DE FISICO LAS ENTREGA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA SEMANA
- INTERVENTORIA INFORMA QUE SE CUENTA CON AVANCE DE OBRA DE 48,6% VERSUS UN PROGRAMADO DEL 57,4%, POR LO CUAL TIENE UN ATRASO DEL 8,8% POR LO CUAL SOLICITA INCREMENTAR RITMO DE TRABAJO.
- CONTRATISTA INFORMA QUE EL 30/11/24 ENTREGA EL PLAN DE CONTINGENCIA. INCLUIDO CON CUADRILLAS DE PAVIMENTO, CONSTRUCCIÓN BORDILLO, CANAL, ALETAS ALCANTARILLA.
- INTERVENTORIA INFORMA QUE EL 30/11/24 SE REALIZA RECORRIDO AMBIENTAL POR LO CUAL SOLICITA EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE CONTRATISTA.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4/4.

FECHA: 29/10/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ESTUDIO HIDRAULICO	2/11/24	CONTRATISTA
DISEÑO GEOMETRICO.	2/11/24	CONTRATISTA
DISEÑO PAVIMENTO	2/11/24	CONTRATISTA
CONSTRUCCIÓN BORDILLO	5/11/24	CONTRATISTA
CONSTRUCCIÓN CUNAL	30/11/24.	CONTRATISTA
REUNION SOCIAL	8/11/24	CONTRATISTA
PLAN DE CONTINGENCIA	30/10/24	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ESTUDIO HIDRAULICO			
John Arias H.	Director	Interventoría	
Adalberto Flores	Director	Civen	
Francisco Avilés P.	Ing. Residente	Civen	
Reinaldo Molinares T.	INC RESIDENTE	INTERVENTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

4.8.4 ACTAS DE REUNIÓN

FORMATO MEPI-MN-IN-14-FR-2

FECHA 4/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 47
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRIVEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Realizar seguimiento a las actividades del componente social del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra contratada:

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL
Subprograma 1. Atención a la comunidad
Subprograma 2. Información y Divulgación
Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria

5.INFORME MENSUAL SOCIAL N° 7 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 04 -10-2024, se llevó a cabo la reunión de seguimiento al componente social del contrato LP-OP-004-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con la participación de las profesionales del área social por parte del contratista CRIVEN Constructores y la Interventoria Consorcio Odessa.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL

Subprograma 1. Mano de obra contratada: Información del personal vinculado del AIDP y certificaciones correspondiente al mes de septiembre de 2024, información que se requiere para el informe mensual social N°7 del contratista e informe mensual que reporta Interventoria al INVIAS. La profesional social del contratista informa que en el mes de septiembre se reporta el ingreso de (7) personas nuevas al proyecto. (6) de ellas residen en el área de influencia directa del proyecto, para un total de (10) trabajadores residentes en el AIDP y (1) residente en Barranquilla. En la siguiente tabla se relaciona el personal:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	DIRECCION RESIDENCIA
1) JOHAN ERNATH RODRIGUEZ	8967371	Via Polonuevo km 2 finca
2) DAMARIS GUERRERO PAYARES	45749088	Calle # 11-27Barrio Galán/Sabanagrande
3) EDGAR AHUMADA	8958705	Via Polonuevo conj. Parcelas californias. Parcela la maria
4) DANILO CABALLERO CERVANTES	1001886283	Sabanagrande-Atlántico
5) DIANA AHUMADA CABALLERO	32855561	Via Polonuevo conj. Parcelas californias. Parcela la maria
6) JESUS REYES VENEGAS	1090506127	Sabanagrande-Atlántico
7) JESUS ARIZA FLOREZ	1080016180	Sabanagrande-Atlántico
8) DAISON CONRADO	1042996843	Sabanagrande-Atlántico
9) JOSE LUIS RIOS ZAMBRANO	1042355841	Sabanagrande-Atlántico
10) WILBER PEÑA BUSTO	1048873917	Municipio de barranquilla

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.

***Estado Actas de vecindad de inicio.** El día de 01-10-2024 con la comunicación OBS-SOC-019-2024 el contratista radicó a la interventoría el acta de vecindad N° 74 que estaba pendiente, entregando un total de 75 actas de vecindad de inicio subsanadas y con los respectivos registros fotográficos. Interventoría emitió respuesta y devolución del documento original del acta de vecindad de inicio N°74 con la comunicación C-T-135-327-2024-SG el 02-10-2024.

***Estado entrega copias de actas de compromisos a los propietarios:** La profesional social del contratista informa que se inició la entrega el día 30 de septiembre a través de WhatsApp a cada propietario, donde a la fecha se han remitido un total de 17 actas de vecindad de inicio en formatos PDF de los siguientes predios:

N° Consecutivo ACTA VECINDAD DE INICIO	FECHA ENVIO	N° Consecutivo ACTA VECINDAD DE INICIO	FECHA ENVIO
PREDIO 2	30/09/2024	PREDIO 33	30/09/2024
PREDIO 3	30/09/2024	PREDIO 37	30/09/2024
PREDIO 8	30/09/2024	PREDIO 55	30/09/2024
PREDIO 9	30/09/2024	PREDIO 56	30/09/2024
PREDIO 10	30/09/2024	PREDIO 58	30/09/2024
PREDIO 11	30/09/2024	PREDIO 64	30/09/2024
PREDIO 24	30/09/2024	PREDIO 65	30/09/2024
PREDIO 25	30/09/2024	PREDIO 68	30/09/2024
PREDIO 28	30/09/2024		

Se queda en el compromiso de entrega a los propietarios la totalidad de estas actas de vecindad de inicio que están pendientes por remitir copia a los propietarios y/o responsables de los predios el día viernes 11 de octubre de 2024.
***Actas de compromiso:** El contratista informa que durante la ejecución del proyecto se han levantando dos actas de compromiso con los consecutivos N° 01 y N° 02 correspondientes a los meses de julio y agosto, en septiembre no se levantaron nuevas actas de compromiso.

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL
Subprograma 1. Atención a la comunidad.
***Revisión de estado de nuevas PQRSD que se hayan recibido**. El Contratista informa que a la fecha solamente se ha recibido una (1) PQRSD la cual se encuentra atendida y cerrada. Interventoría nuevamente le solicita al contratista en cada informe mensual reportar dejando evidencia de los correos que el área social ha recibido como constancia que no se han reportado solicitudes por parte de la comunidad.
*Atención en el SAU: El contratista ratifica que la atención en la oficina del SAU se viene adelantando los días miércoles y jueves y de igual forma el área social realiza recorridos en los tramos e interactúa con la comunidad, quién manifiesta estar conforme con las obras.

Subprograma 2. Información y Divulgación: Se realizó consulta al área técnica del contratista quienes han manifestado esperar tener un avance significativo en las actividades de pavimentación en el mes de octubre para realizar reunión informativa al comité de Participación comunitaria. La profesional social de la Interventoría recomienda el alistamiento del volante de convocatorias y la presentación y/o informe que se presentará.
Reforzar la información del PMT con los actores viales: La profesional social del contratista informa que se realizara una actividad con los niños residentes en el área de influencia directa del proyecto, realizando actividades lúdico pedagógicas a través de las cuales los niños conozcan las señales de transito mas importantes y sean de mayor utilidad en el área en el que residen y transitan.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. La profesional social del contratista informa que el día 03-10-2024 realizó visita a la Alcaldía de Sabanagrande donde el objeto era realizar gestión directa con el secretario de Tránsito del municipio y por sepelio de una compañera de trabajo y reunión interna no fue posible, sin embargo, se remitió a través de WhatsApp una nota. Continúa pendiente realizar gestión para definir el tema de campaña de prevención vial. Interventoría recomienda que una vez confirmen deben proceder a la coordinación de la metodología y organización de la logística para el buen desarrollo de la actividad. Nuevamente se le enfatiza a la profesional social continuar con la gestión y/o definir con otra entidad el desarrollo de esta campaña.

4. Informes mensuales sociales. Interventoría nuevamente le solicita al contratista la entrega oportuna del informe N° 7 del mes de septiembre para que lo radiquen el día 05-10-2024. . El contratista informa: El informe se radicará a más tardar el día 7 de octubre del presente año

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Continuar con la entrega de las copias de las actas de vecindad de inicio pendientes a los propietarios	viernes, 11 de octubre de 2024	Contratista
2. Realizar nuevamente gestión en la Secretaria de Transito de Sabanagrande para campaña de seguridad vial	martes, 8 de octubre de 2024	Contratista
3. Reforzar el PMT con el volante inicial que se generó	miércoles, 9 de octubre de 2024	Contratista
4. Gestión consulta respuesta interna recibida por contratista del ICANH y MININTERIOR	martes, 8 de octubre de 2024	Contratista
5. Remitir a la Interventoría la comunicación de invitación al Comité de Participación comunitaria capacitación sobre el tema de veedurías ciudadana con la Función Pública.	martes, 8 de octubre de 2024	Contratista
6. Entrega del informe mensual social del mes de septiembre	lunes, 7 de octubre de 2024	Contratista

FECHA PROXIMA REUNION 10/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LOURDES MUÑOZ GÓMEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCIONES	
ROCÍO FLÓREZ	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 48
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento al componente de gestión social del contrato y socializar con la nueva profesional social del contratista los programas y actividades sociales de acuerdo a lo establecido en el documento PAGA revisado.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.Presentación de la profesional social del Contratista
2. Información de estado del componente social a la fecha e Identificación de pendientes sociales
3. Revisión del documento PAGA con la nueva profesional social para aclarar inquietudes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A las 2:30 p.m. se dio inicio a la reunión virtual de seguimiento a las actividades sociales del contrato tramo de la vía a terciaria en el municipio de Ponedera, donde participo la Ing. Paola Velandia encargada de la elaboración de los informes mensuales por parte del Consorcio La Giralda y la nueva Profesional social del contratista y la profesional social de la Intervetoria Rocío Flórez, por parte del Consorcio Odessa.
1.Presentación de la profesional social del Contratista. Participa en esta reunión la nueva profesional social Briseida Bolívar, quién informa que desde el 27 de septiembre del año en curso esta vinculada al contrato con una dedicación del 10%. Interventoria les solicita formalicen y radiquen la hoja de vida con comunicación para la respectiva respuesta y de acuerdo a los compromisos sociales pendiente revisen si requieren mayor dedicación para dar cumplimiento a los compromisos sociales pendientes y los que faltan ejecutar en el marco de lo establecido en el documento PAGA para el componente social del contrato, el cual se encuentra actualmente en la etapa de ejecución de las obras.
2.2. Información de estado del componente social a la fecha e Identificación de pendientes sociales. Por parte del contratista como de la interventoria se identifica que a la fecha se tienen los siguientes pendientes sociales: **a) <u>Informes mensuales sociales correspondientes a los periodos:</u>** *Informe N° 04 del mes de junio de 2024 se realizó reunión de revisión y a la fecha no se ha entregado. * Informe N° 05 del mes de julio de 2024 * Informe N° 06 del mes de agosto de 2024 *Informe N° 07 del mes de septiembre de 2024 (Se debía remitir a la interventoría el 05 de octubre del año en curso). En los compromisos se relacionaron las fechas de la entrega los informes mensuales. **<u>b) Entrega con comunicación de (72) actas de vecindad de inicio</u>** con los ajustes y correcciones solicitadas, debidamente firmadas por profesional del área técnica del Consorcio La Giralda. Esta pendiente que la profesional social . Interventoría nuevamente le recomienda al contratista tener en cuenta tanto para las actas de vecindad como de compromiso verificar los predios que se anegan, de acuerdo a lo manifestado por varios propietarios, arrendatarios y encargados de predios donde hay existencia de varias ciénagas aledañas a los predios y donde en diferentes épocas se han visto afectados con perdidas de cultivos aunque el río Magdalena esta en uno de los costados de la vía las inundaciones generalmente son generadas por arroyos y represamientos en los predios ubicados en la margen contraria al río. para que tengan en cuenta este tema en el caso de permisos u ocupación de predios u otras situaciones que puedan evidenciarse durante el desarrollo del proyecto.

c) Acta de reunión de Inicio. Entrega para revisión de interventoría el acta de la reunión de socialización de inicio de contrato que se llevó a cabo el día 19 de julio del año en curso con los respectivos soportes, donde se les recuerda implementar el formato establecido por el contratista, listado de asistentes, conformación del comité de participación comunitaria, registro fotográfico, presentación y los demás soportes.

d) Actas de compromiso levantadas. Incluyendo la del predio donde funciona el campamento de obra y oficina del SAU, sitios de disposición de material entre otros.

e) Remitir la información del personal vinculado a la fecha en el contrato. Incluyendo el personal del área de influencia directa del proyecto, con los respectivos certificados de residencia la información se debe adjuntar dando cumplimiento a lo establecido en PAGA y se requiere también la información para el reporte de informes que Interventoria debe remitir al INVIAS.

Interventoría recomienda dar cumplimiento al horario de atención en la oficina del SAU y considerar dejar un correo y línea telefónica específicamente para el componente social.

La Ing. Paola Velandia, le solicita el apoyo al área social del contratista de los documentos y soportes que están pendientes con el fin de dar cumplimiento la entrega de los informes sociales pendientes. Se acordó que la profesional social del contratista, el día viernes 10 de octubre, gestionará con el propietario del predio donde funciona el campamento la firma directamente con el teniendo en cuenta que inicialmente aparecía una administradora. Interventoría recomienda dejar levantamiento del registro fotográfico de las áreas a ocupar del campamento, incluir la información en el acta de compromiso y las demás recomendaciones y observaciones que se remitieron por parte del área ambiental y social de la interventoria.

Interventoría recomienda al contratista, revisar y ajustar los datos en los formatos INVIAS de reporte de actividades sociales, con respecto al periodo de suspensión del contrato y la nueva prorroga al mismo. La ing. Paola solicita a la interventoría estos documentos, la profesional social de Interventoría se compromete gestionar con el director de la interventoría y el día 09-10-2024 remitirá la información al WhatsApp. De igual forma verificar si se requiere ajustes al documento PAGA deben informar oportunamente la información a la Interterventoría.

3. Revisión del documento PAGA con la nueva profesional social para aclarar inquietudes. Las profesionales del área social del contratista e Interventoria proceden a la revisión para aclaraciones que tenga la nueva profesional social del contratista. Previamente a esta reunión el día lunes, 07-10-2024, Interventoría estableció contacto telefónico con la profesional social del Contratista Briseida Bolívar acordando que le remitiría el mismo día por medio del WhatsApp el documento PAGA con los respectivos formatos y documentos establecido, los cuales fueron remitidos por la profesional social de interventoria, con el fin de que previó a esta reunión de seguimiento social fueran conocidos y revisados por la nueva profesional social del contratista.

Se procedió a la revisión del documento PAGA Interventoría procedió a la presentación de las fichas sociales del paga que corresponden a los siguiente programas y subprogramas:
PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL
Subprograma 1. Mano de obra contratada con enfoque de genero de derechos y diferencias. Estado de esta actividad: esta pendiente que el contratista reporte la vinculación del personal que ha estado vinculado al contrato en los informes de junio, julio, agosto y septiembre del año en curso, reporte que debe relacionarse en los anexos de los informes junto con las certificaciones de residencia del personal del área de influencia directa del proyecto.
Se recomienda al contratista tener en cuenta e proceso de divulgación de las ofertas laborales y de los demás procesos establecidos en el documento PAGA.
Respecto a este programa se indaga a la nueva profesional social donde manifiesta que es clara la información y no tiene ninguna inquietud.

3. PROGRAMA 7. COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO, SITIOS DE INTERES SOCIO CULTURAL
Subprograma 1. Programa de arqueología preventiva Consulta ICANH.
Subprograma 2. Protección al patrimonio cultural -Consulta a la Dirección nacional de consulta previa- DANCP -MININTERIOR Y MINISTERIO DE CULTURA ARTES Y SABERES.
Subprograma 3. Protección al patrimonio geológico y paleontológico . Servicio Geológico Colombiano SGC.
Interventoria comenta que en este programa adelantó las consultas a las entidades y se recibieron las respuesta, de acuerdo a lo establecido se ha dado cumplimiento de la gestión por parte del contratista.

4. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos: Las actividades que se ejecutaran son el levantamiento de actas de las actas de vecindad de inicio que de acuerdo a la información del contratista se levantaron 72 actas de vecindad de inicio que están pendiente radicar la información para revisión y firma de interventoria, una vez se tengan estas actas formalizadas por interventoría deben proceder a la entrega de las copias a los propietarios. De igual forma deben levantar en los casos que se requiera actas de vecindad de seguimiento y actas de cierre una vez se tenga culminadas obras. Interventoría recomienda que en la medida que se finalicen obras se proceda a la programación de las actas de vecindad de cierre del proyecto. Interventoria informa que se implementó el formato de INIVIAS de actas de vecindad, adjunto a los formatos del PAGA. Se solicita por parte de la interventoria al contratista a la mayor brevedad radicar las actas de vecindad de inicio subsanadas.
Levantamiento de actas de Compromiso: De acuerdo a información preliminar que se encuentran en revisión y ajustes se han levantado (4) actas de compromiso que deben remitir a la mayor brevedad a la interventoría y de igual forma estas actas deben formalizar el cierre antes de la entrega definitiva y culminación de las actividades de obra. Respecto a este programa la profesional social del contratista manifestó que no tenia ninguna inquietud.

FECHA 8/10/2024
(Día / Mes / Año)

5. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 1. Atención a la comunidad: La atención en el SAU se brindará los días viernes en el horario de la mañana semanalmente y con disposición de atender a través del correo o línea telefónica las PQRSD que se reciban. Interventoría indaga sobre la disponibilidad de un correo del área social y manifiestan que es el del consorcio tiene reportado y recomienda establecer el correo explícitamente para el área social como también la línea telefónica. La profesional informa que una vez se establezca la nueva línea telefónica se reportará. Intervetoria recomienda que los datos que se cambien del SAU, deben ser publicados en el Pendón del SAU como en los volantes y piezas informativas que se generen durante la ejecución del contrato. A la fecha no se ha recibido ninguna PQRDS en el contrato. El contratista manifestó no tener inquietudes al respecto.

PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 2. Información y Divulgación: Interventoría informa que se tiene una plantilla para las presentaciones como para las piezas informativas como volantes, en caso de que se requieran para reuniones, volantes informativos, de convocatorias PMT deben implementarse, ajustándolas a las necesidades de la actividad a ejecutar de información y divulgación.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. Esta pendiente la programación del primer comité de seguimiento social al proyecto, Interventoría informa que en la reunión de inicio se conformo el Comité de Participación Comunitaria, donde se levantó la respectiva acta con los inscritos, a quienes se convocan a estas reuniones periódicamente. Deben verificar el cumplimiento y desarrollo de las actividades establecidas en el documento PAGA. Esta pendiente la ejecución de estas actividades. El contratista manifiesta no tener inquietudes al respecto.
Interventoria recomienda al contratista establecer un plan de contingencia para la entrega de los pendientes sociales, como también dar cumplimiento a lo establecido en el PAGA. Siendo las 3:30 p.m se finaliza la reunión.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Entrega formal del informe mensual social N°4 de junio de 2024	miércoles, 16 de octubre de 2024	Contratista
2. Entrega formal de los informe mensuales social N°5 de julio de 2024 N° 6 de agosto de 2024 y N° 7 de Septiembre de 2020	jueves, 17 de octubre de 2024	Contratista
3. Gestión firmas actas de compromiso	viernes, 11 de octubre de 2024	Contratista
4.Remitir acta de suspensión del contrato y acta de prorroga	miércoles, 9 de octubre de 2024	Interventoria


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 15/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paola Andrea Velandia	Profesional Ambiental y apoyo elaboración documentos	Consorcio La Giralda Contratista	
Briseida Bolívar	Profesional Social	Consorcio La Giralda Contratista	
Rocío Flórez	Profesional Social	Consorcio ODESSA - Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 49
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRIVEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Realizar seguimiento a las actividades del componente social del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra contratada:

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL
Subprograma 1. Atención a la comunidad
Subprograma 2. Información y Divulgación
Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria

4.INFORME MENSUAL SOCIAL N° 7 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 16 -10-2024, se llevó a cabo la reunión de seguimiento al componente social del contrato LP-OP-004-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con la participación de las profesionales del área social por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES y la Interventoria Consorcio Odessa.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL

Subprograma 1. Mano de obra contratada: Interventoria le recuerda y solicita al contratista las certificaciones del personal del área de influencia directa vinculado al contrato que están pendientes desde el corte del informe del mes de septiembre de 2024 que corresponde a la relación del personal del cuadro, de estos ya han sido entregado tres certificados a la interventoría, faltarían (7) certificaciones. La profesional social del contratista informa que el día 17 de octubre de 2024 remitirá las certificaciones de residencia pendientes, del personal vinculado al contrato al correo de la Interventoría.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	DIRECCION RESIDENCIA
1) JOHAN EBRATH RODRIGUEZ	8567571	Via Polonuevo km 2 finca
2) DAMARIS GUERRERO PAYARES	45749085	Calle 6 11-17Barrio Gaitán/Sabanagrande
3) EDGAR AHUMADA	8698705	Via Polonuevo conj. Parcelas californias. Parcela la Paeta
4) DANILO CABALLERO CERVANTES	1001882301	Sabanagrande Atlantico
5) DIANA AHUMADA CABALLERO	32855552	Via Polonuevo conj. Parcelas californias. Parcela la Paeta
6) JESUS REYES VERBOSA	1090082127	Sabanagrande Atlantico
7) JESUS AREVA FLOREZ	1090016266	Sabanagrande Atlantico
8) DAYRON CONRADO	1042998843	Sabanagrande atlantico
9) JOSE LUIS RUIZ ZAMBRANO	1042551641	Sabanagrande Atlantico
10) WILBER PEÑA BUSTO	1048071017	Municipio de barranquilla

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.

***Estado de la entrega de las copias de las actas de vecindad de inicio a los propietarios:** La profesional social del contratista informa que a la fecha se han entregado a través de WhatsApp a los propietario, un total de cincuenta y ocho (58) copias de actas de vecindad de inicio, se continúa adelantando la gestión, sin embargo hay propietarios que no cuentan con este servicio. La profesional social del contratista informa que procederá a realizar nuevamente gestión con los propietarios que están pendientes, como también, realizar visitas de acercamiento a los predios, para verificar la información de números telefónicos. Se estableció como compromiso que el día viernes 18 de octubre se remitirá al correo social de la interventoría los soportes de las copias de las actas de vecindad de inicio, entregadas a la fecha.

FECHA	16/10/2024
	(Día / Mes / Año)

*__Programación del levantamiento de las actas de vecindad de cierre en predios donde se hayan finalizado obras:__ Interventoría le solicita al contratista revisar si es pertinente iniciar el levantameinto de actas de vecindad de cierre en los tramos donde se ha realizado las obras. La profesional social del contratista, informa que esta pendiente la colocación de bordillos y adecuaciones frente a los accesos a los predios, razón por la cual no se ha iniciado esta actividad de actas de vecindad de cierre. Se consultará al área técnica con el fin de revisar la posibilidad de ir avanzando en esta actividad, considerando que el contrato tiene fecha de finalización el mes de diciembre de 2024.

***Actas de compromiso:** No se han levantado nuevas actas de compromiso por el momento están levantadas la N° 01 y N°02, las cuales se formalizará el cierre una vez el área técnica informe la entrega de las áreas ocupadas.

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 1. Atención a la comunidad.

***Revisión de estado de nuevas PQRSD que se hayan recibido**. El Contratista informa el día 15-10-2024 recibió por contacto telefónico de parte de la propietaria de un predio visita para revisión de unas fisuras que identifica en la fachada, el predio corresponde al acta de vecindad con el consecutivo N° 54, la profesional social del contratista se contacto con la señora el mismo día e inició el registro de la PQRSD, esta pendiente concertar una nueva visita con el área técnica, de acuerdo a lo manifestado al parecer son las mismas fisuras identificadas en el acta que se levantó. Sien embargo se acordó con la señora definir una nueva fecha de visita que depende de la fecha que ella establezca y tenga disponibilidad de estar en el predio ya que por una calamidad familiar se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Se recomendó por parte de Interventoría revisar los antecedentes iniciales registrados en el acta, fotos, videos y escuchar lo manifestado por la propietaria es importante que la visita sea realizada por parte del área técnica quién definirá al respecto y el área social realizará el apoyo y gestión que se requiera previamente concertando fecha y notificando oportunamente al área técnica tanto del contratista como de la interventoría. Disponer para el momento de la visita el formato de la PQRSD y registrar la evolución y descripción respectiva de la visita.

Subprograma 2. Información y Divulgación: estableció como fechas tentativas para la entrega y revisión de interventoria del volante de convocatoria al comité de participación ciudadana, para revisión de interventoria el día 22 de octubre de 2024 lo remitirá el contratista a la interventoría por correo junto con la presentación de la reunión del CPC.

Programación de próximo comité de Participación Comunitaria. Se tiene como fecha tentativa realizarlo el día 05 de noviembre del año 2024, esta pendiente coordinar con el área técnica. Se le recuerda al contratista preparar la presentación y actividades previas de convocatoria que se debe realizar con antelación de acuerdo a lo establecido en el documento PAGA.

Reforzar la información del PMT con los actores viales: Teniendo en cuenta que la semana anterior no se dio cumplimiento con el compromiso establecido, el contratista informa que el 17 de octubre del año en curso realizará entrega del volante informativo N° 2 del PMT que inicialmente se había aprobado.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. La profesional social del contratista informa que en el transcurso de esta semana envío mensaje al Secretario de Transito para que le confirme la ficha y poder radicar la comunicación, el día de hoy se volvió a realizar gestión y se acordó radicar la comunicación a la entidad donde se registra la fecha para el día 05 de noviembre del año en curso para realizar la campaña de prevención y seguridad vial, fue lo que se acordó. Se recomienda aclarar como será el desarrollo de la actividad y revisar que logística dispone la entidad y la que dispondrá el contratista y si es necesario el apoyo de la policía también proceder a realizar gestión oportunamente.

4. Informes mensuales sociales. Se le recuerda al contratista radicar el informe del mes de octubre el día 05 de noviembre del año en curso.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Remitir a la interventoría las certificaciones de residencia del personal del AIDP que está pendiente	viernes, 18 de octubre de 2024	Contratista
2. Remitir a la interventoría los soportes de la entrega de las copias de las actas de vecindad de inicio a los propietarios	viernes, 18 de octubre de 2024	Contratista
3. Realizar nuevamente gestión en la Secretaria de Transito de Sabanagrande para campaña de seguridad vial	viernes, 18 de octubre de 2024	Contratista
4. Reforzar la divulgación del PMT con el volante N° 2 con los diferentes actores viales.	jueves, 17 de octubre de 2024	Contratista
5. Remitir al correo de interventoria la invitación y presentación para el próximo comité de seguimiento social del contrato	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
6. Remitir al Comité de Participación comunitaria la comunicación invitándolos a la capacitación virtual, sobre el tema de veedurías ciudadana con la Función Pública.	jueves, 17 de octubre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 24/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LOURDES MUÑOZ GÓMEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCIONES	
ROCÍO FLÓREZ	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA 17/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 50
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento al componente de gestión social del contrato y socializar con la nueva profesional social del contratista los programas y actividades sociales de acuerdo a lo establecido en el documento PAGA revisado.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.INFORMES MENSUALES SOCIALES REVISADOS POR INTERENTORIA Y ESTADO ACTUAL DE INFORMES
2. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra Identificación de pendientes sociales
3. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
4. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
5. DOCUMENTO PAGA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a la reunión virtual el día 17 de octubre del año en curso, a las 2:00 p.m. con el fin de realizar el seguimiento a las actividades sociales del contrato tramo de la vía a terciaria en el municipio de Ponedera, donde participo la Ing. Paola Velandia encargada de la elaboración de los informes mensuales por parte del Consorcio La Giralda y la nueva Profesional social del contratista y la profesional social de la Intervetoria, Consorcio Odessa.
1.INFORMES MENSUALES SOCIALES REVISADOS POR INTERENTORIA Y ESTADO ACTUAL Interventoría informa que el realizó la revisión del informe mensual social N° 5 del mes de julio de 2024 remitido al correo social de la interventoria, el día de hoy remitió las observaciones al correo de la Ing. Paola Velandia, encargada de la elaboración del documento por parte del Consorcio La Giralda. Quién confirma el recibido y procederá a los ajustes y complementaciones. La profesional social de la interventoría presenta un recuento general de las observaciones de los formatos INVIAS del Balance Social, Acta de radicación y Matriz de compromiso, se identificaron los espacios pendientes por complementar información por parte del contratista y se registraron los comentarios y conceptos por parte de la interventoría. De igual forma identificaron observaciones en los anexos, complementación de algunos soportes faltantes. Revisar y ajustar los datos del contrato en el formato de acta de radicación, teniendo en cuenta la suspensión del contrato a finales del mes de julio y reactivación en el mes de agosto del año en curso, de igual forma ajustar los plazos del contrato que va hasta el mes de diciembre de 2024 según el otro si del mes de agosto.
Observaciones al informe mensual social N° 6 del me de agosto de 2024. Se recomienda al contratista con respecto al informe de agosto de 2024 tener en cuenta los ajustes a los formatos por la suspensión del contrato del 29 de julio al 29 de agosto de 2024, incluir los datos en el formato INVIAS del Acta de Radicación y los que se requieran en el formato del Balance social de ese periodo. Entre los anexos generados en ese periodo incluir: el acta de suspensión, acta del otro sí al contrato donde se levanta la suspensión y se debe continuar con la etapa de construcción de las obras, revisar también que otras actas se generaron durante la suspensión de visitas y reuniones técnicas con la Alcaldía y visitas al proyecto, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la reunión de inicio del contrato. Aprobado el informe del mes de julio tomar como referencia la información y acumulados de periodos anteriores. Incluir la correspondencia generada, Interventoría el día de hoy para agilizar el proceso remitirá los archivos de la correspondencia emitida en agosto por la interventoria al contratista.

Estado a la fecha de los informes mensuales sociales y compromisos:
1) Informe N° 04 del mes de junio de 2024. El 11-10-2024 fue aprobado por interventoria, con la comunicación C-T-135-342-2024-PO.
2) Informe N° 05 del mes de julio de 2024. Remitido al correo del área social de interventoría, fue revisado y se remiten observaciones por el mismo medio el 17-10-2024. El contratista informa que lo radicará formalmente el día martes 22 de octubre de 2024.
3) Informe N° 06 del mes de agosto de 2024. Se recibe el mismo día del informe de julio y se presentan las observaciones generales en esta reunión de seguimiento social del día de hoy. Se estableció realizar mesa de trabajo el día lunes 21 de octubre de 2024.
4) Informe N° 07 del mes de septiembre de 2024 Se debía remitir a la interventoría el 10-10-2024, continúa pendiente el compromiso, donde el contratista informe se compromete a radicarlo del día jueves 24 de octubre del 2024.

2. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra Identificación de pendientes sociales. Se solicita al contratista gestionar oportunamente con el contratista los soportes del personal que se vincula mensualmente, teniendo en cuenta que se evidencia retrasa en la entrega de los soportes y anexos de los informes.
Interventoría, recomienda, gestionar oportunamente los certificados de residencia del personal que se vincule del área de influencia directa donde se ejecuta el proyecto, teniendo en cuenta que en el territorio no hay Junta de acción comunal registrada, hay lideres comunitarios, por lo tanto deben realizar la consulta en la Alcaldía de Ponedera. La profesional Social Briceida Bolívar informa que en la indagación realizada se debe tramitar con la inspección de policía de Ponedera.

3. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS

1) Entrega de las (72) actas de vecindad de inicio subsanadas y firmadas. Interventoría hace un llamado de atención ya que desde el mes de julio se remitieron las observaciones, se hizo una entrega informal en el mes de septiembre de actas donde está pendientes firmas del contratista, a la fecha no se ha recibido la información, El área social informa que esta información esta en gestión del área técnica, por tanto no puede establecer el compromiso de la entrega. Interventoría procederá en el comité de seguimiento al contrato que se realice el día viernes a realizar el requerimiento.

2) Actas de Compromiso: Interventoría le informa al contratista que a la fecha el contratista no ha realizado la entrega, esta información se requiere tanto para los informes sociales como para soportes del documento PAGA.

El área social del contratista informa que esta información también depende del área técnica. No se establecido compromiso de entrega, Interventoría tratará el tema en el comité de seguimiento técnico del contrato. El viernes 11 de octubre/2024, la profesional social informa que realizó el levantamiento del registro fotográfico en el predio "Manuela Isabel del área donde se ubica la oficina del SAU y del baño que se presta para uso del personal vinculado a la obra, sin embargo por condiciones de lluvia y dificultades de transporte y condiciones de la vía, manifiesta, no pudo realizar gestión y vista para la información de la ubicación y registro de otros predios donde se ha considerado ocupar algunas área.

Se estableció que el día de mañana 18-10-2024 se proceda a verificar los PR o coordenadas con la ayuda de topografía de la ubicación de los predios donde se requieren formalizar las actas de compromiso y complementar el registro fotográfico y avanzar en la gestión de firmas con los propietarios.

4. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL
Subprograma 1. Atención a la comunidad. La profesional social ha informado que desde el 27 de septiembre de 2024 los días viernes ha realizado presencia en la oficina del SAU ubicada en la fina Manuela Isabel, en el horario de 8 a.m. a 12m. A la fecha no se han recibido PQRSD.

Subprograma 2. Información y Divulgación. Pendiente que el contratista elabore el acta de la reunión de inicio y se comprometen en reportar, reporte la información en el mes de julio. Para la próxima semana se proyecta entregar a la interventoría el volante informativo para divulgación del PMT a los diferentes actores viales a través de los medios que cuenta el contratista. Se proyectará también el volante de invitación a la reunión de seguimiento del contrato con el comité de participación comunitaria. De igual forma se avanzará en la elaboración de la presentación para esta reunión donde deben reportar los avances desde cada área de intervención. Revisar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la reunión de inicio.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. Pendiente que el contratista defina la realización de esta reunión de acuerdo a lo establecido en el última versión del documento PAGA. Interventoria les recuerda tener en cuenta invitar a cada uno de los inscritos en el acta donde se establecido los interesados en formar parte del CPC.

5. DOCUMENTO PAGA. La Ing. Paola Velandia informa que el documento no se a formalizado por documentos pendientes que dependen del área técnica y complementar información de las áreas que van a ocupar en los predios de las actas de compromiso, certificado permiso suministro de agua, por información que debe suministrar el área técnica no se ha complementado los documentos solicitados en el PAGA.

El área social de interventoría le solicita al contratista revisar los programas y actividades sociales que están pendientes por ejecutar y presentar un plan de contingencia en la próxima reunión de seguimiento social al contrato, establecer un cronograma con las actividades a ejecutar y revisar que acciones de mejora van a implementar, para dar cumplimiento a los pendientes del componente social, hablar con el contratista la posibilidad para considerar, mientras se superan las falencias presentadas en una mayor dedicación de tiempo a la profesional social.

FECHA 17/10/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Entrega formal del informe mensual social N°5 de julio de 2024	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
2. Mesa de trabajo revisión de informe mensuales social N°6 del mes de agosto de 2024	lunes, 21 de octubre de 2024	Contratista
3. Entrega del informe mensual social N° 7 del mes de septiembre de 2024	jueves, 24 de octubre de 2024	Contratista
4. Gestión firmas actas de compromiso	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
5.Remitir archivo de correspondencia del mes de agosto/2024	jueves, 17 de octubre de 2024	Interventoria
6.Remitir volante del PMT y volante de convocatoria CPC	jueves, 24 de octubre de 2024	Contratista
7.Gestión y recopilación información actas de compromiso	viernes, 18 de octubre de 2024	Contratista
8. Observaciones del informe mensual social N°5 de julio	jueves, 17 de octubre de 2024	Interventoria


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 24/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paola Andrea Velandia	Profesional Ambiental y apoyo elaboración documentos	Consorcio La Giralda Contratista	
Briceida Bolívar	Profesional Social	Consorcio La Giralda Contratista	
Rocío Flórez	Profesional Social	Consorcio ODESSA - Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 51
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Revisión de los formatos y anexos del informe mensual social N° 05 del mes de julio de 2024 y del Informe social N° 6 del mes de agosto de 2024.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. REVISIÓN DEL FORMATO INVIAS-MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL MES DE JULIO DE 2024
2. REVISIÓN DEL FORMATO INVIAS- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RADICACION- INFORME MES DE JULIO-2024
3.FORMATO INVIAS- MASPS-MN1-IN-2-FR-3- MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOCIAL INFORME MES DE JULIO 2024
4. ANEXOS DEL FORMATO DEL BALANCE DEL ESTADO SOCIAL
5. ANEXOS DEL FORMATO DEL ACTA DE RADICACIÓN
6. REVISIÓN DEL FORMATO INVIAS-MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024
7. REVISIÓN DEL FORMATO INVIAS- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RADICACION- INFORME MES DE AGIOSTO DE 2024
8.FORMATO INVIAS- MASPS-MN1-IN-2-FR-3- MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOCIAL INFORME MES DE AGOSTO DE 2024
9. ANEXOS DEL FORMATO DEL BALANCE DEL ESTADO SOCIAL
10. ANEXOS DEL FORMATO DEL ACTA DE RADICACIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a la reunión mesa de trabajo el día 21-10-2024 , a las 11:00 a.m. con el fin de realizar la revisión de los formatos INVIAS del informe mensual social del mes de julio y agosto del año en curso del contrato tramo de la vía a terciaria en el municipio de Ponedera, donde participo la Ing. Paola Velandia encargada de la elaboración de los informes mensuales por parte del Consorcio La Giralda y la Profesional social de la Intervetoria, Consorcio Odessa.
1. REVISIÓN DEL FORMATO INVIAS-MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL MES DE JULIO DE 2024. Interventoría le recomienda tener en cuanta ajusta la fecha de la entrega de o reporte del informe, revisar y ajustar los datos del personal, considerando que en la revisión inicial realizada se había reportado esa observación. La Ing. Paola informa que está pendiente que el contratista le remita la información que incluirá en ese anexo y con base en los datos que le remitan, procederá a realizar la actualización de la información del formato. Se le recuerda al contratista que para el día 22-10-2024 esta pendiente radicar formalmente este informe, el cual se encuentra aún en ajustes y complementaciones de datos y anexos. En el numeral 3.10. Reporte de avance otras fichas PMA y/o PAGA. Se recomienda al contratista revisar y actualizar los datos de acuerdo a la información ejecutada y con los soportes y anexos, verificar en la parte de los anexos de este formato relacionarlos y actualizar esta información. Pendiente remitir los formatos para actualizar la información y conceptos de la interventoria y se recomienda realizar los ajustes en los formatos revisados para no generar retrocesos en el proceso.
2. REVISIÓN DEL FORMATO INVIAS- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RADICACION- INFORME MES DE JULIO-2024 En el numeral 4. GESTIÓN SOCIAL APROBADA POR LA INTERVENTORÍA. Queda pendiente que el contratista actualice los datos pendiente y remita el formato para actualizar la información de acuerdo a lo ejecutado. En el numeral 6.2. Matriz de Identificación de Actores y Organizaciones Estratégicos Está pendiente verificar los listados de asistencia de los inscritos al comité de participación comunitaria, lideres y organizaciones y actualizar la información, de acuerdo a las evidencias de los soportes de quienes participaron en la reunión de inicio realizada el 19-07-2024. En el numeral 12. ANEXOS de este formato esta pendiente que el contratista verifique el numero de archivos y folios y los relacione de acuerdo a los soportes que se reportan en el informe. Y una vez ajustada la información reportarla a la Interventoría.
3. FORMATO INVIAS- MASPS-MN1-IN-2-FR-3- MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOCIAL INFORME MES DE JULIO 2024 Pendiente Modificar los datos de las actividades ejecutada relacionar lo ejecutado en el periodo como los acumulados a la fecha, pendiente remitir el formato complementado por el contratias a la interventoría para el registro de los conceptos y conclusiones.

4. ANEXOS DEL FORMATO DEL BALANCE DEL ESTADO SOCIAL

Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos. Tener en cuenta ajustar la fecha de entrega del informe en este formato como también en los otros dos. una vez complementada la información faltante, remitir a interventoría en PFF para las respectivas firmas.
Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales. Una vez complementado y ajustado remitir a Interventoría en PDF para las respectivas firmas.
Anexo 3. Actas de vecindad. En el archivo relacionan las actas de vecindad de inicio las cuales aún continúan pendientes por remitir con los ajustes y correcciones solicitados por la interventoria desde el mes de julio de 2024. Continua pendiente complementar los soportes de la pág. 5 del del acta de vecindad con consecutivo N° 46 del predio "Guayacanes".
Anexo 4. Formatos y soportes relacionado con PQRSD. NA
Anexos 5, 6 y 7. NA para este contrato.
Anexos 8 Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto. Se adjunta al anexo una vez se tenga la ultima versión del formato actualizado en excel y en PDF firmado por las partes.

Anexos 9. Se adjuntará carpeta del Programa 6. Relación de empleos generados en el periodo la cual esta a la espera sea remitió el soporte por parte del contratista. Programa 10. Se relacionaran los soportes generados en la reunión de inicio, volante de la convocatoria y planilla de la misma, Acta de reunión de socialización de inicio, donde el contratista esta en la elaboración del acta de la reunión de inicio a la cual deben adjuntar: Registro fotográfico, presentación, listado de asistencia y los demás soportes que correspondan a este programa incluyendo el acta de inscripción y conformación del comité de participación comunitaria que se levanto el día de la reunión de inicio.
Anexos 10 Actos administrativos Se incluye como soporte, la respuesta emitida por el Servicio Geológico Colombiano.
Anexos 11 Oficios generados por el contratista y la Interventoria. Falto relacionar la comunicación remitida el 02 de julio de 2024 con el consecutivo N° C-T-135-152-2024 correspondiente a incumplimientos.
Anexo 12. Se adjuntaron las acta de reuniones de seguimiento social al contrato correspondientes a los consecutivos N° 27-29 y 31. y se incluyó también el acta de suspensión del contrato y el, acta levantada por interventoria de la reunión de socialización de inicio del contrato, quedando completo estos soportes con los ajustes solicitados inicialmente por la interventoría.
Anexo 13. Otros, NA.

5. ANEXOS DEL FORMATO DEL ACTA DE RADICACIÓN

Anexo 1. Plano de localización. Se adjunta el plano inicial.
Anexo 2. Registro fotográfico: Esta pendiente que el contratista ajuste la información y no solo dejar los registros de la reunión de inicio
Anexo 3. Gestiones realizadas ante el MININTERIOR: Se adjunta la respuesta emitida por la entidad.
Anexo 4. Acta de protocolización NA
Anexo 5. Gestión ante ICANH: Se adjunta la respuesta emitida por la entidad.
Anexo 6. Plan de Manejo Arqueológico del ICANH: NA. Para el contrato.
Anexo 7. Plan de Trabajo – No se reporta información en este periodo.
Anexo 8. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales. Pendiente ajustes y una vez se tenga el archivo subsano se debe remitir a la interventoría para las ultima revisión y firmas.
Anexo 9. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social NA para el contrato

6. REVISIÓN DEL FORMATO INVIAS-MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024

Queda pendiente realizar los ajustes de acuerdo a las actividades que reporte en los anexos el contratista y proceder a actualizar fechas del formato proyectándola a la fecha que se entregue formalmente. Pendiente ajustar la infomacióndel contratista y remitir el formato en excel para el registro de la información y conceptos de interventoria. Se recomienda tener en cuenta que en este periodo el contrato ya se encontrara suspendido, por lo tanto verificar lo que corresponda y actualizar los datos a partir de los días de este mes que se encontró suspendido.

7. REVISIÓN DEL FORMATO INVIAS- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RADICACION- INFORME MES DE AGIOSTO DE 2024

Interventoría le recomienda al contratista actualizar los datos del contrato tenido en cuenta la suspensión y el otro sí del contrato, verificar la información. El mismo día Interventoría gestionó con el área técnica y se remitió al WhatsApp y al correo de la ing. Paola los datos vigentes del contrato donde la fecha de finalización, Suspensión del contrato 29 de julio de 2024, se reanudó el 29 de agosto de 2024 y fecha de terminación actual es el 14 de diciembre de 2024.

8. FORMATO INVIAS- MASPS-MN1-IN-2-FR-3- MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOCIAL INFORME MES DE AGOSTO DE 2024.

Se debe proceder a dejar los acumulados y de acuerdo a los soportes que relaciona el contratista se adjuntará el listado de personal que está pendiente lo remitan de parte del contratista a la Ing. Paola, se actualizaran los datos, de acuerdo a los soportes que se incluyan. Una vez complementado y ajustado debe remitir la información a la interventoría para los comentarios, conclusiones, en formato excel como en PDF.

9. ANEXOS DEL FORMATO DEL BALANCE DEL ESTADO SOCIAL.

Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos. Si aplica, una vez se actualice el formato se adjunta en excel y PDF.
Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales. Si aplica, una vez complementado y ajustado remitir a Interventoría en PDF para las respectivas firmas.
Anexo 3. Actas de vecindad. NA en este periodo, no se reportó ninguna información.
Anexo 4. Formatos y soportes relacionado con PQRSD. NA
Anexos 5, 6 y 7. NA para este contrato.
Anexos 8 Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto. Si aplica. Se debe adjuntar al anexo una vez se tenga la ultima versión del formato actualizado en excel y en PDF firmado por las partes.
Anexos 9. Se adjuntará carpeta del Programa 6. Relación de empleos generados en el periodo
Anexos 10 Actos administrativos Se incluirá el soporte, con la respuesta emitida por el Servicio Geológico Colombiano.
Anexos 11 Comunicaciones generados por la Interventoria. No se generaron comunicaciones por parte del contratista en agosto.
Anexo 12. NA para este periodo, no se realizaron reuniones de seguimiento social.
Anexo 13. Otros. Se adjuntaran las acta de: Suspensión del contrato y el otro sí del contrato..

10. ANEXOS DEL FORMATO DEL ACTA DE RADICACIÓN

Anexo 1. Plano de localización. Se adjunta el plano inicial.
Anexo 2. Registro fotográfico: Se actualizará la información con los registros fotográficos de visitas técnicas al sitio del proyecto, interventoría facilitará la información disponible.
Anexo 3. Gestiones realizadas ante el MININTERIOR: Se adjunta la respuesta emitida por la entidad.
Anexo 4. Acta de protocolización NA
Anexo 5. Gestión ante ICANH: Se adjunta la respuesta emitida por la entidad.
Anexo 6. Plan de Manejo Arqueológico del ICANH: NA. Para el contrato.
Anexo 7. Plan de Trabajo – No se reporta información en este periodo.
Anexo 8. Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales. se adjuntará el formato actualizado con los ajuste realizados por parte del contratista y los comentarios de la interventoría.
Anexo 9. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social NA para el contrato

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Entrega formal del informe mensual social N°5 de julio de 2024	martes, 22 de octubre de 2024	Contratista
2. Entrega formal del informe mensual social N°6 de agosto de 2024	miércoles, 23 de octubre de 2024	Contratista
3. Remitir datos actualizados del contrato	lunes, 21 de octubre de 2024	Interventoría
4. Remitir registros fotográficos de los meses de julio y agosto para actualizar la información de los anexos.	lunes, 21 de octubre de 2024	Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paola Andrea Velandia	Profesional Ambiental y apoyo elaboración documentos	Consorcio La Giralda Contratista	
Rocío Flórez	Profesional Social	Consorcio ODESSA - Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA 24/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 52
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento al componente de gestión social del contrato y socializar con la nueva profesional social del contratista los programas y actividades sociales de acuerdo a lo establecido en el documento PAGA .

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra Identificación de pendientes sociales
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4. INFORMES MENSUALES SOCIALES
5.OTROS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión se inicia a las 11:00 a.m. del día 24 de octubre del año en curso, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades sociales del contrato tramo de la vía a terciaria en el municipio de Ponedera, donde participaron las profesionales social del contratista y de la Intervetoria.
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra. De acuerdo a la información de la profesional social del contratista, a la fecha se encuentran vinculadas de forma directa nueve (9) personas, este grupo hay (2) trabajadores vinculados del área de influencia directa. Interventoria le recuerda tener en cuenta que para el informe mensual de octubre, deben proceder a gestionar las respectivas certificaciones de residencia. Interventoría indaga sobre el proceso de divulgación, recepción y contratación del personal. La profesional social del contratista informa que en las personas se acercan al SAU donde se les ha informado respecto a las vacantes disponibles y por este mismo medio se han recibido las hojas de vida, la profesional social de interventoría les recomienda revisar el proceso establecido en el PAGA y dar cumplimiento a lo que allí establecieron.
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS. Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos. **Actas de Vecindad de inicio subsanadas y actas de compromiso.** Interventoria informa que de acuerdo al compromiso establecido por el contratista CONSORCIO LA GIRALDA en el comité técnico de seguimiento al contrato el día sábado 19 de octubre del año en curso se comprometieron a radicar la información en la interventoría una vez fueran firmadas. La profesional social informa que ella no tiene conocimiento las razones por las cuales no han sido radicadas, se le solicita gestionar y recordarle al contratista el compromiso que es inmediato así como también la entrega de las actas de compromiso. Se recomienda a la profesional social del contratista que una vez se cuente con las actas de vecindad formalizadas y firmadas por todas las partes y con el concepto que emita interventoria de aprobación se debe proceder a realizar la entrega de las copias a los propietarios.

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Atención a la comunidad. El contratista informa que ha venido brindando atención en la oficina del SAU ubicada en la parcela Manuela Isabel los días viernes de 8 a.m. hasta las 12 m. Allí no se ha recibido PQRSD. Se manifiesta que algunos personas le han comentado al personal de obra la posibilidad que les donen materiales producto de las excavaciones, teniendo en cuenta que no hay solicitudes formales se recomendó en consulta adelantada por interventoría al área ambiental y técnica indagar sobre el uso que le darán al material, tener en cuenta la ubicación de este que no genere afectaciones a ninguna fuente hídrica o genere afectación a otros predios, en caso que se suministre material deben dejar claro también si la persona que lo solicita es el propietario del predio directamente, el área y cantidad de material, datos claros del predio y del propietario. Si estas donaciones pueden generar inconvenientes se recomienda no realizarse, para evitar problemas al contrato.

En el caso que el contratista las realice deben dejar registro en acta de compromiso (Implementar formato del contratista que esta en el PAGA como también registrar la información en el formato de solicitudes de PQRSD, debidamente diligenciados, firmados y con los respectivos registros fotográficos. Interventoría presentó el formato de PQRS y le indicó a la profesional social del contratista cada uno de los espacios como se debe diligenciar y con los respectivas descripciones y tener en cuenta que para el cierre debe estar debidamente firmados y con los soportes que se hayan generado durante la atención de las solicitudes.

Subprograma 2. Información y Divulgación.
Volante informativo. La reunión informativa de seguimiento del avance del contrato, quedo establecida para el día 31 de octubre a las 9:00 a.m. El día de hoy el contratista remitió al correo de la interventoría el volante N° 2 y este mismo día Interventoría, procederá a remitir respuesta al correo del CONSORCIO LA GIRALDA, una vez lo haya revisado y se tenga.
Presentación para la reunión. Se le solicita al área social tener en cuenta que para está reunión se debe realizar la presentación del avance del contrato donde debe presentarse lo que cada área ha ejecutado de julio de 2024 a la fecha de la reunión, se procede por parte de interventoria a proyectar lo presentado en la reunión de inicio, se explico desde cada área que información se debe presentar y se enfatizó en cada uno de los programas también del componente social y volver a presentar la información del PMT. Es pertinente que se realice gestión interna por parte del contratista con el área técnica, ambiental, SST para que aporten la información que se compilará con los avances sociales. se estableció que el 28-10-2024 se remitirá la presentación para revisión de la interventoria. Interventoría remitirá el día de hoy(24-10-2024) a la profesional social del contratista, la plantilla de la presentación que se implementó en la reunión inicial, para que procedan a realizar la actualización de la información de acuerdo al avance que cada área de intervención tiene durante la ejecución de la etapa de construcción del proyecto.
Convocatorias volante y cartas. Se recomienda entregar las invitaciones con anticipación, remitir las comunicaciones o cartas de invitación al Alcalde de Ponedera, Secretaria de Infraestructura y obras, Personería municipal y demás entes y autoridades que consideren de competencia del contrato, dejando la evidencia y soportes de la gestión que son insumos para los informes mensuales.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. Pendiente que el contratista remita a los integrantes del comité de participación comunitaria la invitación a la reunión programada para el 31 de octubre. La profesional social del contratista que una vez se tenga aprobado el volante se procederá a la entrega de las invitaciones.Internventoría recomienda al contratista que en esta reunión se debe levantar la respectiva acta de reunión, adjuntar la presentación, levantar el registro de asistencia y registro fotográfico e informar a los asistentes el cumplimiento de los compromisos establecidos en la reunión de inicio del contrato.

4..INFORMES MENSUALES SOCIALES
1. Informe mensual de julio de 2024. Interventoría informa que el día 23-10-2024 recibió el informe mensual social N° 5 del mes de julio remitido al correo de la interventoria, se reviso y el día 24-10-2024 interventoria emitió concepto de aprobación con la comunicación: C-T-135-371-2024-PO.
2. Informe mensual social N° 6 de agosto de 2024. Interventoría le solicita al contratista radicar el documento, el cual ya fueron revisados y ajustados los formatos, estaba pendiente completar algunos anexos. Sé le recuerda al contratista que este informe se tenía como compromiso radicarlo el día 21-10-2024. La profesional social del contratista manifiesta que no tiene conomiento de la fecha en la que se radicará, Interventoria solicita realizar gestión con el contratista para que procedan a radicarlo. Interventoria solicita lo radiquen el 25-10-2024.
3.Informe Mensual social N° 7 de septiembre de 2024. Se tenia establecido el compromiso de remitirlo el dá de hoy 24-10-2024. para que tengan en cuenta y cumplan con este compromiso contractual.
4. Informe mensual social N° 8 de octubre de 2024, se le solicita al contratista para evitar los atrasos que han presentado en los anteriores informes proceder a elaborarlo oportunamente y radicarlo el 5 de noviembre formalmente con comunicación a la interventora.

5.OTROS. Interventoría le recuerda al contratista presentar el plan de contingencia para cada uno de los programas y actividades sociales teniendo en cuenta los atrasos que tienen en los cumplimientos como también la programación de las actividades pendientes, considerando que el plazo actual de finalización el contrato es el 14 de diciembre del año en curso.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Remitir listado de personal vinculado al contrato y las certificaciones de residencia del personal vinculado del AIDP	jueves, 31 de octubre de 2024	Contratista
2. Entrega formal a la interventoria las actas de vecindad de inicio firmadas por el área técnica dl contratista	Compromiso inmediato	Contratista
3. Remitir a la interventoría las actas de compromiso levantadas	Compromiso inmediato	Contratista
4.Remitir a la profesional social del contratista plantilla de la presentación para relacionar información de la reunión con CPC	jueves, 24 de octubre de 2024	Interventoria

FECHA 24/10/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
5.Remitir a la interventoria la presentación de la reunión de seguimiento del contrato	lunes, 28 de octubre de 2024	Contratista
6.Revisión y concepto por parte de interventoría de la revisión del volante N°2-Invitación a reunión de seguimiento del contrato	jueves, 24 de octubre de 2024	Interventoria
7. Remitir a la interventoria el informe mensual social N°6 de agosto de 2024	Compromiso inmediato	Contratista
8. Entrega del informe mensual social N° 7 del mes de septiembre de 2024	jueves, 24 de octubre de 2024	Contratista


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 29/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Briceida Bolívar	Profesional Social	Consorcio La Giralda Contratista	
Rocío Flórez	Profesional Social	Consorcio ODESSA - Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 24/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 53
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRIVEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Realizar seguimiento a las actividades del componente social del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra contratada:
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4.INFORME MENSUAL SOCIAL N° 8 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.
5.ENTREGA DE CRONOGRAMA - PLAN DE CONTINGENCIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 24 -10-2024, se llevó a cabo la reunión de seguimiento al componente social del contrato LP-OP-004-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con la participación de las profesionales del área social por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES y la Interventoria Consorcio Odessa.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL
Subprograma 1. Mano de obra contratada: La profesional social del contratista informa que en este mes han ingresado al proyecto, dos personas del área de influencia directa, en el informe mensual de octubre se remitirán los respectivos anexos.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.
***Estado de la entrega de las copias de las actas de vecindad de inicio a los propietarios:** La profesional social del contratista informa que a la fecha se han entregado a través de WhatsApp a los propietario, un total de (67) copias de actas de vecindad de inicio, Informa que falta entregar (8) copias de estas actas donde han teléfonos que reportan fuera de servicio y otros no cuentan con el servicio de WhatsApp, se tiene programado el día de mañana 25-10-2024 establecer contactos personalizados en los predios y proceder ha realizar las entregas físicas en caso que en el área admirativa del contrato las faciliten considerando que para el componente social no se cuentan con recursos asignados. Interventoría sugiere que disponer de las actas en físico como en magnético para las visitas que se van a realizar y si hay algún medio sea correo o WhatsApp que el propietario autorice remitir por estos medios las copias, también informar a la personaría a través una comunicación el listado de los propietarios que en el SAU están disponibles estas actas para la entrega a cada propietario y/o personas autorizadas por estos.
***Actas de compromiso:** No se han levantado nuevas actas de compromiso en este periodo.

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL
Subprograma 1. Atención a la comunidad.
***Estado dePQRSD que se hayan recibido**. El contratista informa que continúa pendiente formalizar el cierre de la PQRSD donde se realizó visita y la propietarias dice que las fisuras que inicialmente estaban en los muros de la fachada se han ampliado y según lo informado no firma los documentos, se le solicita por parte del contratista revisar la gestión que deben adelantar para formalizar el respectivo proceso de cierre.

Subprograma 2. Información y Divulgación:
*** Elaboración del volante de invitación a reunión con el CPC.** La profesional social del contratista, informa que no remitió el volante de invitación a reunión de seguimiento con el comité de participación comunitaria considerando que la posibilidad de realizarla el (08) de noviembre de 2024. Interventoria le solicita al contratista remitir el 29 de octubre el volantes informativo

***Segunda entrega del volante del PMT:** El 18 de octubre/2024 se realizó la segunda entrega del PMT de forma personalizada a 64 actores viales, se remitieron para firma de interventoria los soportes de las planillas de entrega, las cuales también se verifica que fueron recibidas el mismo día por el área social del contratista.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. La profesional social del contratista informa la fecha del (08) de octubre del año en curos realizar la campaña de prevención y seguridad vial con los representantes de la Secretario de Tránsito de Sabanagrande, la próxima semana volverá a realizar gestión y confirmará a la Interventoría.

4. Informes mensuales sociales. Se le recuerda al contratista radicar el informe N° 8 del mes de octubre el día 05 de noviembre la interventoría.


5. 5.ENTREGA DE CRONOGRAMA - PLAN DE CONTINGENCIA. La profesional social de interventoría, le recuerda al contratista para la próxima semana deben remitir el cronograma y plan de contingencia para dar cumplimiento a las actividades sociales establecidas en cada uno de los programas del documento PAGA, donde deben tener en cuenta que el contrato de obra tiene plazo de ejecución hasta el 14 de diciembre del año en curso. La profesional social del contratista informa que recibió la comunicación remitida por Interventoria, de igual forma le comentó al área técnica la fecha que ella puede programar el cierre de las actas de vecindad, actas de compromiso y no definieron fechas, por tanto depende del área técnica para así programar las actividades sociales pendientes. Interventoría les solicita emitir respuesta a la comunicación C-T-135-368-2024-SG remitida el día 23 de octubre del año en curso.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Remitir las certificaciones de residencia del personal del AIDP vinculado en el mes de octubre.	martes, 5 de noviembre de 2024	Contratista
2. Remitir a la interventoría los soportes de la entrega de las copias de las actas de vecindad de inicio a los propietarios	martes, 5 de noviembre de 2024	Contratista
3. Realizar nuevamente gestión en la Secretaria de Transito de Sabanagrande para campaña de seguridad vial	lunes, 28 de octubre de 2024	Contratista
4. Remitir al correo de interventoria e volante de invitación y la presentación para el próximo comité de seguimiento social del contrato	jueves, 31 de octubre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LOURDES MUÑOZ GÓMEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCIONES	
ROCÍO FLÓREZ	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA 30/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 54
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento al componente de gestión social del contrato y socializar con la nueva profesional social del contratista los programas y actividades sociales de acuerdo a lo establecido en el documento PAGA .

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra Identificación de pendientes sociales
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4. INFORMES MENSUALES SOCIALES
5.OTROS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión se inicia a las 9:30 a.m. con e objeto de realizar el seguimiento a las actividades sociales del contrato tramo de la vía a terciaria en el municipio de Ponedera, donde participaron las profesionales social del contratista y de la Intervetoria.
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra. El contratista informa, que a la fecha se encuentran vinculadas de forma directa nueve (9) personas, de este grupo hay (2) trabajadores residentes en el área de influencia directa. Interventoría indaga sobre la gestión de los certificados de residencia, donde se informa por parte de la profesional social del contratista que la diligencia la tienen que realizar personalmente los trabajadores vinculados en la inspección de policía de Pondera, donde ya se acercaron y allí les indicaron a que dependencia de la Alcaldía deben presentar los soportes solicitados, se esta a la espera de que el tramite de la certificación sea entregados la próxima semana, al parecer tiene un costo igual se informa que el Ing. Edson esta también tramitando al respecto para que no les genere cobro. Interventoría, solicita que los soportes se remitan en el informe social mensual del mes de octubre del año en curso.
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS. Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos. **Actas de Vecindad de inicio subsanadas y actas de compromiso.** La profesional social informa que el coordinador del contrato Ing. Edson Tapias es el que esta a cargo de esta información, el área social de Interventoría que se han realizado varios requerimientos y solicita el cumplimiento de la entrega de esta información de manera inmediata para que coordinen internamente por parte del contratista.
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL. **Subprograma 1. Atención a la comunidad.** El contratista informa que ha venido brindando atención en la oficina del SAU ubicada en la parcela Manuela Isabel los días viernes de 8 a.m. hasta las 12 m. Se reporta una PQRSD, por parte de personal de interventoría en obra por afectación a una cerca del predio del Sr. Santander Cervantes, que no ha sido posible localizarlo ya que es un predio que no tiene vivienda. Interventoría le recomienda llevar el formato de la PQRSD el día 31-10-2024 a la reunión que se tiene programada con el CPC y realizar la visita y gestión al predio. Interventoría aclara que en los casos de solicitudes que se lleguen a recibir de donaciones, no se realizaran por las características del entorno donde cerca a los predios hay ciénagas, arroyos, humedales y el río Magdalena y para evitar afectaciones a estos ecosistemas se estableció no hacer este tipo de donaciones, directrices recibidas por parte de la dirección de interventoría.

FECHA 30/10/2024
(Día / Mes / Año)

Subprograma 2. Información y Divulgación.
Volante de invitación a reunión de seguimiento del contrato con el CPC. El día viernes 25 de octubre del año en cuerpo se llevó a cabo la entrega de los volantes de invitación a la reunión de seguimiento con el comité de participación comunitaria programada para el 31-10-2024.
Presentación para la reunión. Nuevamente se le solicita al área social tener en cuenta que para está reunión se debe realizar la presentación del avance del contrato donde debe presentarse lo que cada área ha ejecutado a partir del mes de julio a octubre de 2024 El área social informa que ella remitió al área técnica del contrato la información social para que complementen la información faltante. En este comité se procede a revisar la información social y se le recomienda a la profesional social del contratista complementarla relacionando las actividades sociales ejecutadas en cada uno de los programas y así aplica para las demás áreas (técnica, ambiental y SST). Es presentar los avances con los resultados del contrato.
Convocatorias a través de cartas a las entidades municipales. Se recomienda remitir a la interventoría los soportes de las cartas de invitación a la Alcalde de Ponedera, Secretaria de Infraestructura y obras, Personería municipal y demás entes y autoridades relacionadas con el contrato.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. Se recalca al contratista la entrega y soportes de la invitación a los integrantes de Participación Comunitaria inscritos en la reunión de inicio del contrato, para que un día antes de la reunión se les recuerde la asistencia a la reunión de seguimiento al contrato.

4..INFORMES MENSUALES SOCIALES
Continua pendiente la entrega del informe mensual social N° 7 de septiembre de 2024. Se tenia establecido el compromiso de remitirlo a la interventoría el 24-10-2024, donde a la fecha no se ha remitido y se solicita la entrega de forma inmediata.

El informe mensual social N° 8 de octubre de 2024, se le recuerda al contratista deben radicarlo formalmente con la respectiva comunicación el día 5 de noviembre del año en curso a la interventora.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Remitir listado de personal vinculado al contrato y las certificaciones de residencia del personal vinculado del AIDP	martes, 5 de noviembre de 2024	Contratista
2. Entrega formal a la interventoria las actas de vecindad de inicio firmadas por el área técnica dl contratista	Compromiso inmediato	Contratista
3. Remitir a la interventoría las actas de compromiso levantadas	Compromiso inmediato	Contratista
4.Remitir la presentación completa de la información de la reunión de seguimiento con CPC para revisión de Interventoria	Compromiso inmediato	Contratista

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
8. Entrega del informe mensual social N° 7 del mes de septiembre de 2024	Compromiso inmediato	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 7/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Briceida Bolívar	Profesional Social	Consorcio La Giralda Contratista	
Rocío Flórez	Profesional Social	Consorcio ODESSA - Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 55
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRIVEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Realizar seguimiento a las actividades del componente social del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra contratada:
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4.INFORME MENSUAL SOCIAL N° 8 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.
5.ENTREGA DE CRONOGRAMA - PLAN DE CONTINGENCIA
6.RESPUESTA DE LA GESTIÓN DEL ICANH Y MININTERIOR.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 31 -10-2024, se llevó a cabo la reunión de seguimiento al componente social del contrato LP-OP-004-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con la participación de las profesionales del área social por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES y la Interventoria Consorcio Odessa.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL

Subprograma 1. Mano de obra contratada: La profesional social del contratista informa que ya se tienen seis certificados de residencia de las personas vinculadas al contrato y el día de hoy remito al WhatsApp de la profesional social los respectivos soportes. Información corroborada por la interventoría.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.

***Estado de la entrega de las copias de las actas de vecindad de inicio a los propietarios:** La profesional social del contratista informa que a la fecha de hoy se han entregado a través de WhatsApp a los propietario, un total de (70) copias de actas de vecindad de inicio, quedan pendientes por entregar las copias de cinco actas de vecindad de incio correspondientes a los consecutivos N° 1-23-28-44 y 70. Se espera que el día 05 de noviembre de 2024 se haya culminado la entrega, el plan que se tiene establecido es realizar nuevamente la visita a los predios ya que en contactos faltantes en algunos de los teléfonos no contestan y en otros no tienen uso del WhatsApp. Para el reporte de esta actividad interventoría le recomienda al contratista generar un consolidado de la entrega de las copias de actas de vecindad de inicio con el nombre de la persona o propietario del predio, N° de consecutivo del acta, fecha de entrega de la copia, numero de contacto al que se remitió y observaciones, como los datos que el contratista considere relevante incluir.

***Programación del levantamiento de Actas de vecindad de cierre:** Interventoría nuevamente recalca al área social programar con el área técnica el levantamiento de las actas de vecindad de cierre teniendo en cuenta que en la primera semana del mes de diciembre del año en curso vence el plazo contractual del contrato y es una actividad que implica y gestión con los propietarios y/o responsable de los predios. El área social informa que el tema lo ha tratado con el área técnica y esta a la espera de la colección de bordillos y adecuación de accesos hacía los predios para iniciar la actividad que depende de estas actividades especialmente en los sitios donde se construyó con pavimento la vía. Interventoría solicita que para la próxima reunión de seguimiento al contrato se tenga definido ese tema y poder ir cerrando actividades del área de gestión social.

***Actas de compromiso:** La profesional social informa que a la fecha, no se han levantado nuevas actas de compromiso.

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL
Subprograma 1. Atención a la comunidad.
***Estado dePQRSD que se hayan recibido**. Interventoría le solicita al contratista atender y formalizar el cierre de la PQRSD N° 2 por inconformismo en fisuras en muros exteriores de predios. La profesional social del contratista informa que directamente le informó al director del contrato y se espera atender y dar por cerrada la solicitud la próxima semana.

Subprograma 2. Información y Divulgación:
*** Elaboración del volante de invitación a reunión con el CPC.** La profesional social del contratista, remitirá a la interventoria el volante informativo para revisión el día viernes 1 de noviembre para revisión de la Interventoría. Una vez aprobado interventoría solicita procedan a la entrega formal dejando los soportes correspondientes que evidencien la entrega con antelación a la reunión.

***Entrega de la presentación de la reunión de seguimiento al contrato con el CPC:** El 01 de noviembre/2024 remitirá la información correspondiente al componente social y también procederá a gestionar con el área técnica la información que deben actualizar las demás áreas. Interventoria solicita radicar completa la información completa a la mayor brevedad, para la respectiva revisión y concepto.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. La profesional social del contratista nuevamente informa la fecha del (08) de noviembre del año en curos realizar la reunión con el comité de participación comunitaria. taller pedagógico vial y la campaña de prevención y seguridad vial con los representantes de la Secretario de Tránsito de Sabanagrande.

4. Informes mensuales sociales. Se le recuerda al contratista radicar el informe N° 8 del mes de octubre el día 05 de noviembre la interventoría.

5. ENTREGA DE CRONOGRAMA - PLAN DE CONTINGENCIA. Interventoría le recuerda al contratista que esta pendiente la respuesta **a** la comunicación C-T-135-368-2024-SG remitida el día 23 de octubre del año en curso. La profesional social del contratista informa que ella ha realizado gestión con el área técnica por actividades que dependen de esta área como es el caso de las actas de vecindad y actas de compromiso y donde esta pendiente. Interventoría solicita que a más tardar la próxima semana deben radicar el Plan de contingencia.


6.GESTIÓN ICAN Y MININTERIOR. Interventoría le recuerda al contratista que esta pendiente la respuesta por parte de estas entidad y solicita información de la gestión adelantada, la profesional social del contratista informa que teniendo en cuenta su vinculación fue posterior a la gestión adelantada ante esas entidades, le comunicó al área administrativa que esta encargada de dar la respuesta y se están revisando los antecedentes iniciales, una vez se tenga respuesta se procederá a informar a la interventoria.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Remitir las certificaciones de residencia del personal del AIDP vinculado en el mes de octubre.	jueves, 31 de octubre de 2024	Contratista
2. Formalizar el cierre de la PQRSD N° 2	jueves, 7 de noviembre de 2024	Contratista
3. Remitir a la interventoría los soportes de la entrega de las copias de las actas de vecindad de inicio a los propietarios	martes, 5 de noviembre de 2024	Contratista
4. Realizar nuevamente gestión en la Secretaria de Transito de Sabanagrande para campaña de seguridad vial	jueves, 31 de octubre de 2024	Contratista
5. Remitir al correo de interventoria para revisión, el volante de invitación y la presentación del área social, de la reunión de seguimiento social del contrato	sábado, 2 de noviembre de 2024	Contratista
6. Remitir la presentación con la información de todas las áreas	martes, 5 de noviembre de 2024	Contratista
7. Entrega del volante de invitación de la reunión a los integrantes del CPC y veedores	martes, 5 de noviembre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LOURDES MUÑOZ GÓMEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCIONES	
ROCÍO FLÓREZ	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 30 / 10 / 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 56
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Recorrido conjunto de obra entre interventoria y contratista con el fin de ver la implementacion de los programas del PAGA en el proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Seguimiento a la implementación de los programas del PAGA

Consulta ICANH y Ministerio Interior como anexos del PAGA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia 30 de octubre de 2024 siendo las 15:00 horas se inicia el recorrido en el punto de encuentro, campamento del contratista en la abscisa 1+800 residente de obra del contratista y especialista ambiental de Interventoria.

Powered by CamScanner

Como observación general, el Contratista viene implementando los diferentes programas del PAGA de manera aceptable.
Se observó que el Contratista ha estado subsanando las recomendaciones hechas por la Interventoría en cuanto al dique de contención en el cuarto de acopio de sustancias químicas, así como la señalización de las áreas y las hojas de seguridad de las sustancias almacenadas.
El Contratista viene haciendo uso del pozo para el lavado de las mixers, se observó el plastico impermeabilizante en el mismo
Se identificaron acopios de acero para la obra, los cuales estaban protegidos con plásticos.

Se continuó con un recorrido por los tramos intervenidos desde la abscisa K1+000 al 0+000 en donde se pudo observar la implementación de la señalización vial y el trabajo de los controladores viales, al igual que la operación de maquinaria y equipos.

En general se observó el abandono de algunos plásticos a lo largo de la vía y la falta de paisajismo de material sobrante dispuesto para los hombros de la losa de concreto.

Desde el área ambiental de la Interventoría se solicita al Contratista de obra lo siguiente:

1 Realizar jornadas de orden y aseo a lo largo de los tramos intervenidos, especialmente la recolección de los plásticos abandonados.
2 Paisajear el material estéril o de excavación dispuesto como protección de la losa de concreto.
3 Solicitar y gestionar ante la administración municipal de Sabanagrande el certificado de donación de material de los meses de Septiembre y octubre o según como corresponda.
4 Hacer nuevamente la gestión ante el ICANH y Ministerio de Interior de la consulta pertinencia realización "programa arqueología preventiva" y la "consulta previa" según corresponda.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Jornada de orden y aseo	05/11/2024	Contratista
Paisajear materia l	Según avance	Contratista
Gestionar certificado alcaldía	01/11/2024	Contratista
Hacer consultas ICANH y Min Interior	01/11/2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Francisco Arrieta P.	Ing. Resid. Auxiliar	Criten SAS	
Lina P. Carvajal S.	Esp. Ambiental	Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 57
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Recorrido conjunto de obra entre Interventoría y Contratista con el fin de ver la implementación de los programas del PAGA en el proyecto
vial.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Seguimiento a la implementación de los programas del PAGA.
Asistencia y participación en reunión de avance del proyecto.
Seguimiento a las adecuaciones previas a ejecutar en el predio Villa San Diego para su adecuado como ZODME.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31/10/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El día 31 de octubre de 2024 sobre las 10:00 horas se realizó la reunión de avance del proyecto con la comunidad del área de influencia,
una vez finalizada, se inició con el recorrido por el frente de obra activo desde la abscisa 0+600 hacia menores. De parte del Contratista
estuvo el Coordinador y Residente de Obra, de la Interventoría el Director, Residente y Especialista Ambiental.
Durante el recorrido se pudo observar la ausencia del punto ecológico para el almacenamiento de los residuos sólidos convencionales
generados en la obra además, el Contratista no cuenta con un campamento o sitio para el resguardo de sus trabajadores, así como la
falta del equipo de emergencia (camilla, botiquín y extintor).
Se encontraron dos bahías para el retroceso de las volquetas, las cuales fueron conformadas con el material de excavación generado del
cajeo de la vía, estas intervenciones se hicieron en dos predios ubicado en las abscisas 0+420 y 0+600 respectivamente, el Contratista
informó que no cuenta con las actas de compromiso.
Se observó la maquinaria trabajando, el ingreso de volquetas transportando materiales de obra con el uso respectivo de la carpa,
señalización de obra instalada y la implementación de controladores viales.
En el predio Villa San Diego (ZODME), no se observaron las adecuaciones solicitadas por la Interventoría en el Acta de Reunión No. 40
del 28/08/2024, sin embargo, el Contratista ya ha dispuesto algunos viajes de material de excavación allí.
Desde el área ambiental de la Interventoría se solicita al Contratista de Obra lo siguiente:
. Implementar todos los programas propuestos y aprobados en el PAGA y sus respectivas actividades.
. Instalación del punto ecológico para el almacenamiento de los residuos sólidos convencionales.
. Implementación del campamento con el respectivo punto de hidratación y equipo de emergencia.
. La conformación de un pozo para el lavado de las mixer, una vez que se inicie la instalación de concreto. Este pozo no puede estar
cerca de zonas inundables ni cuerpos de agua y debe permanecer impermeabilizado.
. Se solicita al Contratista que, en los recibos del material transportado a la obra, se ponga la procedencia de dicho material, es decir, la
cantera que lo esta suministrando, además, de la presentación del certificado del proveedor en los informe mensuales, con las
respectivas cantidades suministradas.
. El Contratista informa que el agua para la obra esta siendo adquirida con la empresa Aguas de Malambo, se informa, que mes a mes se
debe presentar la certificación de dicha empresa, con la cantidad de agua adquirida.
. El Contratista debe presentar las actas de compromiso con los propietarios de los predios en donde se hicieron las bahías para las
volquetas, además, de las actas de compromiso para el uso del campamento, baño y ZODME, las cuales están pendientes desde hace
varios meses atrás.
. Realizar las adecuaciones al ZODME, descapote del área en donde se va a disponer el material de excavación, el cual debe ser en la
parte mas alta del predio con el fin de evitar problemas de inundación del mismo, demarcar y delimitar la zona a intervenir, acondicionar
el carreteable para el acceso de las volquetas e instalar la señalización sobre la vía en ambos sentidos, como mínimo, entrada y salida
de volquetas a 300m y 100m.
. Interventoría informa al Contratista que no esta autorizada la donación de material de excavación, debido a la complejidad ambiental del
área de influencia del proyecto, al ser una zona inundable.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Instalación del punto ecologíco	8/11/2024	Contratista
Implementación del campamento (equipo de emergencia)	8/11/2024	Contratista
Pozo para el lavado de las mixers	Antes del inicio de la instalación de concreto	Contratista
Procedencia del material en los recibos	1/11/2024	Contratista
Actas de compromiso	8/11/2024	Contratista
Adecuación del ZODME	8/11/2024	Contratista
Entrega de certificados de: materiales, agua y disposición final	Informes mensuales	Contratista
de residuos sólidos		




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Edson Tapias	Coordinador de Obra	Consorcio La Giralda	
Briceida Bolivar	Profesional Social	Consorcio La Giralda	
John Arias	Director de Interventoría	Consorcio ODESSA	
Ronald Molinares	Ingeniero Residente	Consorcio ODESSA	
Lina Carvajal	Profesional Ambiental	Consorcio ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5

OCTUBRE 2024

CONTENIDO

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

5.3 Informes especialistas y profesionales

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

5.5 Informe matriz de riesgos.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

CAPITULO 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

Tabla 1 Información del contrato de interventoría

No. Proceso	CMA-DEO-SVR-070-2023
Contrato Nº:	**4805 DE 2023**
Fecha suscripción Contrato	**5 de diciembre de 2023**
Aprobación Cesión	N/A
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1.
Contratos de obra objeto de seguimiento	Contrato No 1. LP-001-2023. LA GIRALDA – SANTA RITA Contrato No 2. SG-LP-OP-004-2023. SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO
Contratista:	CONSORCIO ODESSA
Nit	901.513.605-6.
Conformado por:	CGR S.A.S (95%) Nit. 830.076.603-9 CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. (5%) Nit. 900.804.544-0
Representante legal:	OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Valor inicial:	**$ 1.529.977.628,00**
Valor adicional	N/A
Anticipo:	$ 257.139.097,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No. 1	Diez (10) meses
Fecha Prorroga No. 1	12 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024
Fecha reanudación No. 1	1 de febrero de 2024
Fecha de terminación Actual:	14 de diciembre de 2024

5.1.1 Información de modificaciones, adiciones y prorrogas.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las prórrogas, adiciones y modificaciones al contrato principal.

Tabla 2 Modificaciones, adiciones y prorrogas.

Modificación No.	Fecha	Descripción de la Modificación
1 (Prorroga No. 1)	12/02/2024	Prorrogar el plazo del Contrato No. 4805 de 2024, desde el 14 de febrero de 2024 y hasta el 14 de diciembre de 2024.

En el presente mes se no se realizan modificaciones, prorrogas y adiciones al contrato de interventoría. La última prorroga suscrita se dio en el mes de febrero de 2024.

5.1.2 Información sobre las garantías contractuales

Tabla 3 Garantías contractuales

Amparo	Aseguradora	Póliza N°	Valor asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	Mundial de seguros S.A.	M-100217062	$ 152.997.762,80	23/01/2024	14/06/2025
Buen Manejo del Anticipo	Mundial de seguros S.A.	M-100217062	$ 257.139.097,10	23/01/2024	14/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Mundial de seguros S.A.	M-100217062	$ 305.995.525,60	23/01/2024	14/12/2027
Calidad del Servicio	Mundial de seguros S.A.	M-100217062	$ 458.993.288,40	14/12/2024	14/12/2029

Las Garantías Contractuales amparan el presente contrato y se encuentran registradas en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría.

Las pólizas del contrato de interventoría se encuentran actualizadas a la prórroga No. 1, suscrita el 12 de febrero de 2024, mediante anexo No. 5.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

La interventoría en el desarrollo de sus funciones de acuerdo con el contrato 4805 de 2023 y el Manual de interventoría obra pública 2022, ha realizado las siguientes actividades generales para la etapa de complementación de estudios y diseños de los contratos de obra y ejecución de actividades de obra.

- ✓ Se ha requerido al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el pliego de condiciones en cuanto a la documentación para el inicio de obra y etapa de estudios y diseños.
- ✓ Se han verificado las garantías del contrato de obra.
- ✓ Se realiza seguimiento a la inversión y buen manejo del anticipo para el Contrato del Municipio de Sabanagrande.
- ✓ Se han elaborado conceptos de revisión de la complementación de estudios y diseños del contrato. En el presente mes de elaboraron conceptos del componente de diseño geométrico, aprobando el diseño geometrico del Municipio de Sabanagrande.
- ✓ Se ha realizado la revisión de la programación de obra, programa de inversiones, plan de inversión del anticipo y análisis de precios unitarios.
- ✓ Seguimiento a los programas contemplados en el documento PAGA, así como la identificación si es el caso de los permisos ambientales que se deben tramitar ante las autoridades competentes para el desarrollo de las obras.
- ✓ Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en los documentos del convenio frente a los exigidos en los documentos que dieron origen a los contratos derivados y si es el caso solicitar los ajustes correspondientes a la administración municipal.
- ✓ Seguimiento a la ejecución de actividades de obra entre las que se encuentran explanaciones e instalación de subbase en el Municipio de Sabanagrande.
- ✓ Seguimiento a la ejecución de actividades de mantenimiento de la vía por parte del contratista para el ingreso de materiales en el Municipio de Ponedera.
- ✓ Revisión de actas de vecindad y actas de compromiso.
- ✓ Revisión y aprobación de actas de recibo parcial.
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

- **Actividades Administrativas**

✓ Elaboración de los siguientes informes semanales:

  - o Municipio de Sabanagrande: Informes semanales del 31 al 35.

- Municipio de Ponedera: Informe semanal 28 a 32.

✓ Elaboración de informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2024.

✓ Elaboración de actas de comité y acta de reunión de seguimiento a los dos contratos de obra.

Se presenta a continuación las actividades específicas realizadas en cada uno de los contratos en relación con el área técnica.

5.2.1 Actividades técnicas

a) Vía La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

✓ Remisión a municipio de requerimientos relacionados con cuentas bancarias de los convenios.

✓ Revisión y seguimiento a garantías del contrato.

✓ Seguimiento a actividades con presunto incumplimiento por parte del contratista de obra.

✓ Revisión de señalización de obra y PMT.

✓ Revisión de replanteo de diseño geométrico en campo.

✓ Seguimiento a ejecución de explanaciones e instalación de mejoramiento de subrasante del K0+090 al K0+650.

b) Vía Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

✓ Replanteo de topografía en campo y localización de eje

✓ Seguimiento y control para explanaciones e instalación de subbase.

✓ Seguimiento técnico a la instalación de concreto del pavimento rígido.

✓ Control de topografía a localización y replanteo del diseño geométrico, así como control de niveles de capas de la estructura de pavimento.

✓ Revisión de APUS y programación.

✓ Revisión de balance de obra con los diseños entregados hasta la fecha.

✓ Revisión y seguimiento a garantías del contrato.

✓ Realización de ensayos de laboratorio de los materiales empleados por el contratista para la ejecución de las obras.

5.3 Informes de especialistas y profesionales

5.3.1 Informes especialistas para Ponedera

Con relación a la etapa de estudios y diseños del contrato de obra, a continuación, nos permitimos relacionar los conceptos generados por los especialistas a los documentos enviados por el Contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

Tabla 4 Informes especialistas Interventoría – Pondera

VOLUMEN	CONCEPTO INTERVENTORÍA	FECHA
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Informe de la Gestión Ambiental del seguimiento al contrato de obra	Octubre 2024

5.3.2 Informes especialistas para Sabanagrande

Con relación a la etapa de estudios y diseños del contrato de obra, a continuación, nos permitimos relacionar los conceptos generados por los especialistas a los documentos enviados por el Contratista CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

Tabla 5 Informes especialistas Interventoría – Sabanagrande

VOLUMEN	OFICIO/CONCEPTO	FECHA
DISEÑO GEOMETRICO V7	Concepto AERO-VIASABANAPOLONUEVO-013-2024 (Aprobación del estudio)	7/10/2024
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Informe de la Gestión Ambiental del seguimiento al contrato de obra	Octubre 2024

Se presentan como anexo los informes del profesional social e informe SST.

5.4 Informe del programa anual de caja PAC.

No se requiere el informe anual de caja PAC.

5.5 Informe matriz de riesgos

No se ha materializado ningún riesgo de los estipulados en la matriz.

5.6 Información otros programas y aplicativos.

5.6.1 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

No se ha requerido dicha gestión dado que no han finalizado las obras y el ente contratante de las mismas son Municipios del Atlántico y no el INVIAS.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORMES ESPECIALISTAS

SEPTIEMBRE 2024

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL LOTE 1PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME EJECUTIVO AMBIENTAL

5.3

OCTUBRE 2024

CONTENIDO

5.3.1 GESTION AMBIENTAL - Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico).

Programa 1: Gestión del proyecto.

Programa 2: Manejo de las actividades constructivas.

Programa 3: Gestión Hídrica.

Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.

5.3.2 GESTION AMBIENTAL- Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico).

Programa 1: Gestión del proyecto.

Programa 2: Manejo de las actividades constructivas.

Programa 3: Gestión Hídrica.

Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.

5.3.1 GESTION AMBIENTAL - Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico).

Programa 1: Gestión del proyecto.

- Subprograma 1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental
- Subprograma 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra
- Subprograma 3. Cumplimiento de requerimientos legales

Subprograma 1. El grupo de gestión socio ambiental se encargó de mantener la señalización de la obra e instalaciones temporales, realizar las inducciones y capacitaciones al personal, supervisar la humectación de la vía, recibir y controlar los materiales pétreos de los proveedores autorizados, llevando registro del manejo adecuado de estos, atendiendo, además, observaciones en campo y documentales, elaborando los informes mensuales de cada área.

La Interventoría mediante comunicado C-T-135-338-2024 del 9 de octubre de 2024 realizó observaciones al informe mensual de seguimiento al PAGA correspondientes al mes de septiembre de 2024, posteriormente, el informe fue aprobado por medio de la comunicación C-T-135-364-2024 del 22 de octubre de 2024.





Equipo de gestión socio ambiental

Subprograma 2: El contratista realizó inducciones y capacitaciones al personal que ingresó a la obra, para dar cumplimiento a las actividades contractuales de obligatorio cumplimiento y establecidas dentro de los programas del PAGA.





Charlas al personal de obra

Subprograma 3: El contratista presenta a los inspectores de obra los recibos de las remisiones de los materiales con el fin de comprobar su procedencia y demostrar que están siendo adquiridos a los proveedores presentados en el PAGA. El Contratista viene presentando en los informes mensuales las diferentes certificaciones de los proveedores con la cantidad suministrada a la obra y el registro del agua en bloque adquirida para la obra.

Adicionalmente la Interventoría evidenció que el Contratista viene realizando el lavado de las mixers en el pozo acondicionando para esta labor dentro del predio que viene utilizando como campamento en el K1+800.





Utilización del pozo para el lavado de las mixers

Programa 2: Manejo de las actividades constructivas.

- Subprograma 1. Manejo integral de materiales de construcción
- Subprograma 2. Señalización para el manejo ambiental de frentes de obra y sitios temporales

- Subprograma 3. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.
- Subprograma 4. Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.

Subprograma 1: El contratista viene realizando la instalación de los materiales sobre un carril de la vía para que este sea extendido diariamente durante la jornada laboral, manteniendo la señalización y demarcación de los materiales y realizando el control del material particulado con el riego de agua para el control de las emisiones de polvo.




Instalación de materiales en obra

Subprograma 2: Durante el mes de octubre el Contratista mantuvo la señalización instalada en el tramo, al ir avanzando en los frentes de trabajo se fueron colocando señales preventivas e informativas, al igual que la demarcación con cintas de seguridad vial en las áreas de trabajo. Los auxiliares de tráfico permanecieron en los frentes de trabajo activos ayudando en el control de los transeúntes para evitar posibles accidentes.




Señalización en la vía

Subprograma 3: Parte del material de excavación y corte fue reutilizado por el Contratista para el mejoramiento de la subrasante y la conformación de los respaldos de los bordes de la vía.




Reutilización del material excavación para el respaldo del borde de la vía

Subprograma 4: El Contratista mantuvo un punto ecológico dentro del campamento para la separación y clasificación de los residuos sólidos que se generen en obra, como el campamento se encuentra ubicado dentro de la ruta de recolección de la empresa del servicio de aseo "Triple A", los residuos son recogidos los lunes, miércoles y viernes y llevados para su disposición final al relleno sanitario "Parque Ambiental Los Pocitos".




Gestión de residuos sólidos convencionales

Programa 3: Gestión Hídrica.

- Subprograma 1. Manejo de aguas superficiales

Subprograma 1: La empresa Aguas de Malambo viene suministrando al Contratista agua no tratada en bloque para las diferentes actividades de obra tales como:

humectación de la vía para el control de emisiones de material particulado, humectación de la subbase y del concreto. El agua es almacenada en un isotanque de un metro cubico y transportado en el platón de una camioneta, el cual tiene adaptado un tubo perforado que hace la función de flauta y ayuda a distribuir uniformemente el agua sobre la vía.




Riego de la vía para el control de material particulado

Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de: maquinaria y equipos.

- Subprograma 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.
- Subprograma 2: Manejo de maquinaria equipos y vehículos.

Subprograma 1: Durante el periodo de reporte el Contratista mantuvo el predio alquilado para el almacenamiento de materiales y sustancias químicas, acopio de herramientas y equipo, parqueo de maquinaria, pozo para el lavado de las mixers y el funcionamiento de la oficina – SAU de la obra. Dentro del campamento se encuentra dos baños para el servicio de los trabajadores, los cuales están conectados a un pozo séptico, además, se encuentra el botiquín y camilla de emergencia, punto ecológico.




Áreas del campamento del Contratista

Subprograma 2: El contratista presentó al área SST de la Interventoría, la documentación legal de la maquinaria y equipos trasladados al proyecto para su revisión y aprobación. Los operadores diariamente hacen los preoperacionales para verificar el adecuado funcionamiento de la maquinaria y equipos.



Maquinaria en obra

5.3.2 GESTION AMBIENTAL- Subprograma La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico).

Programa 1: Gestión del proyecto.

- Subprograma 1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental
- Subprograma 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra
- Subprograma 3. Cumplimiento de requerimientos legales

Subprograma 1: Consorcio La Giralda durante el mes de octubre continuo con el mantenimiento de la vía de acceso, actividades de topografía, corte de la subrasante, explanación, transporte e instalación de subbase…

Interventoría mediante comunicación C-T-135-326-2024 del 1 de octubre de 2024, envió reiteración de apremio al Contratista por presunto incumplimiento en la presentación de informes de seguimiento ambiental correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2024. El Contratista por medio de oficio enviado el 11 de octubre, radicó los informes de junio y julio, los cuales fueron aprobados posteriormente según comunicación C-T-135-341-2024. Posteriormente fue aprobado el informe correspondiente al mes de agosto de 2024 mediante comunicación C-T-135-353-2024.

Interventoría mediante comunicaciones C-T-135-330-2024 y C-T-135-369-2024 del 3 y 23 de octubre de 2024 respectivamente, envió reiteración de las observaciones realizadas por el INVIAS al documento PAGA y la solicitud de la actualización del mismo, las cuales siguen ser atendidas por el Contratista.

Interventoría mediante comunicaciones C-T-135-331-2024 del 3 de octubre de 2024 solicitó al Consorcio La Giralda informar y/o aclarar cuál cantera o fuente de materiales esta suministrando los diferentes materiales al proyecto.

Interventoría mediante comunicaciones C-T-135-370-2024 del 23 de octubre de 2024 solicitó al Contratista la entrega del informe de seguimiento mensual ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024.

INVIAS mediante comunicación 2024S-VBOG-078356 del 24 de octubre de 2024 dio visto bueno al Informe de Estado Ambiental No. 1.





Equipo de gestión socio ambiental

Subprograma 2: El contratista realizó inducciones y capacitaciones al personal que ingresó a la obra, para dar cumplimiento a las actividades contractuales de obligatorio cumplimiento y establecidas dentro de los programas del PAGA.




Charlas al personal de obra

Subprograma 3: El contratista presenta a los inspectores de obra los recibos de las remisiones de los materiales con el fin de comprobar su procedencia y demostrar que están siendo adquiridos a los proveedores presentados en el PAGA. Los materiales están siendo transportados por Saez Minería Suministros y JM Transporte del Caribe y suministrados por la Sociedad A&T Soluciones Integrales.




Transporte e instalación de materiales

Programa 2: Manejo de las actividades constructivas

- Subprograma 1. Manejo integral de materiales de construcción.
- Subprograma 3. Señalización para el manejo ambiental de frentes de obra y sitios temporales.
- Subprograma 4. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.
- Subprograma 5. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.
- Subprograma 6. Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales.

Subprograma 1: El contratista viene realizando la instalación de los materiales sobre un carril de la vía para que este sea extendido diariamente durante la jornada laboral, manteniendo la señalización y demarcación de los materiales y realizando el control del material particulado con el riego de agua para el control de las emisiones de polvo.





Manejo de materiales en el proyecto

Subprograma 3: Durante el mes de octubre el Contratista realizó la instalación de señalización en el tramo a intervenir, al ir avanzando en los frentes de trabajo se fueron colocando señales preventivas e informativas. Los auxiliares de tráfico permanecieron en los frentes de trabajo activos ayudando en el control de los transeúntes para evitar posibles accidentes.





Señalización instalada y auxiliar de tráfico

Subprograma 4: Inicialmente el Contratista acondicionó un par de bahías con el material de excavación del cajeo de la vía para que las volquetas puedan voltear y disponer los materiales que transportan.

El resto de los residuos de construcción y/o demolición (RCD) se estarán disponiendo en el zodme aprobado por Interventoría en el predio Villa San Diego en el municipio de Ponedera.



Bahías para el retroceso de las volquetas en el K0+420 y K0+600

Subprograma 5: Los residuos sólidos se vienen acopiando y almacenando en bolsas de colores, según el tipo de residuo, hasta el momento y por la poca cantidad generada, aún no se hace la primera entrega de residuos sólidos convencionales para su disposición final a la empresa de aseo del municipio. El Contratista realiza periódicamente jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo.



Orden y aseo en el frente de trabajo

Subprograma 6: No aplica, esta actividad se tiene contemplada en el PAGA en dado caso que se lleguen a presentar eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales.

Programa 3: Gestión Hídrica.

- Subprograma 1. Manejo de aguas superficiales.

Subprograma 1: Mediante un carro tanque se viene haciendo el transporte y distribución del agua necesaria para las actividades de obra, el proveedor de este servicio es la empresa Aguas de Malambo.





Transporte y distribución de agua en bloque

Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.

- Subprograma 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.
- Subprograma 3. Instalación, funcionamiento manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Subprograma 1: El contratista cuenta con un campamento ubicado en el predio "Manuela Isabel" en el PR 1+500 de la vía que conduce a la vereda Santa Rita y El Viejo, del municipio de Ponedera, allí se estará haciendo el acopio de materiales, así como el uso del baño para los trabajadores y funcionará la oficina de atención al usuario SAU.





Áreas del campamento del Contratista

Subprograma 3: El contratista presentó al área SST de la Interventoría, la documentación legal de la maquinaria y equipos trasladados al proyecto para su revisión y aprobación. Para el inicio de las actividades y el mantenimiento de vía, se contó con una motoniveladora, un retro cargador (pajarita) y un vibro compactador.





Maquinaria en obra

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico).

- El Contratista debe continuar con el seguimiento a los programas del PAGA y el cumplimiento de los indicadores planteados como lo ha estado haciendo hasta el momento.

- Es pertinente que el Contratista entregue a tiempo los informes mensuales de gestión ambiental con el fin de mantener actualizada la información y de esta manera poder presentar a tiempo los informes trimestrales al Invias.

- Se recomienda al Contratista implementar periódicamente jornadas de orden y aseo en los frentes de trabajo, así como paisajear el material que se viene dejando para la protección de los hombros del pavimento rígido.

Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico).

- El Contratista debe ponerse al día en la entrega de los informes mensuales de gestión ambiental, teniendo en cuenta que al no presentarlos incurre en un incumplimiento contractual y puede acarrear sanciones económicas.


- El Contratista debe continuar con la implementación de los programas del PAGA que aún no se han ejecutado, así como continuar con la aplicación de los que sí y el cumplimiento del cronograma de actividades planteado.

- Interventoría no autoriza donaciones de materiales en este proyecto, debido a la complejidad ambiental que presenta el área de influencia directa, teniendo en cuenta que es una zona inundable.

- Se recomienda la implementación de un pozo para el lavado de las mixers previo al inicio de la instalación del concreto en el proyecto, este pozo no puede estar cerca de zonas inundables ni de cuerpos de agua y debe permanecer impermeable.

- El Contratista debe presentar la subsanación de las observaciones hechas por el Invias al PAGA y la actualización del documento, como se ha estado solicitando reiterativamente por parte de la Interventoría.

- El contratista de obra debe realizar las adecuaciones necesarias para el funcionamiento adecuado del predio (Villa San Diego) que va a ser utilizado como zodme, según lo planteado en el Acta de Reunión No. 40 y 57.



LINA PATRICIA CARVAJAL SUÁREZ
Especialista Ambiental Interventoría

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL LOTE 1PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Comunidad ubicada en el área del proyecto de Ponedera



2° Jornada de divulgación PMT en contrato de Sabanagrande

INFORME EJECUTIVO SOCIAL

5.1

OCTUBRE 2024

CONTENIDO

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

5.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

5.2.1. Programa 6. Gestión Social – Mano de obra contratada
5.2.2. Programa 7. Comunidades étnicas, preservación del patrimonio socio cultural
5.2.3. Programa 8. Gestión social de Infraestructura de predios y servicios públicos
5.2.4. Programa 10. Participación, Gobernanza e inclusión social

5.3. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SOCIAL AL CONTRATO

5.3.1. Informes mensuales sociales del Contratista
5.3.2. Correspondencia
5.3.3. Reuniones de seguimiento social a los contratos
5.3.4. Informes trimestrales sociales de la Interventoría
5.3.5. Oficios recibidos de INVIAS

5. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES


5.1. Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El proyecto comprende el MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vía terciaria que se localizada al occidente del municipio de Sabanagrande, conectando los sectores de SABANANGRANDE a los límites con POLONUEVO en longitud de 5.1 Km.

El contrato de obra comprende la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, siendo esta una actividad preliminar a la ejecución de obras que permitirán definir las intervenciones, estructuras y precisar el alcance en la ejecución de las obras.

Los presupuestos realizados para la suscripción del convenio 2221-2023 y contrato de obra SG-LP-OP-004-2023 proyectan una intervención de la siguiente manera:

- 2150 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido y obras de drenaje.
- 3335 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada existente e instalación de afirmado.
- Se proyectan anchos de 5.50 m, los cuales será revisados en la etapa de estudios y diseños y dependerán del estudio de tránsito y diseño geométrico de la vía.

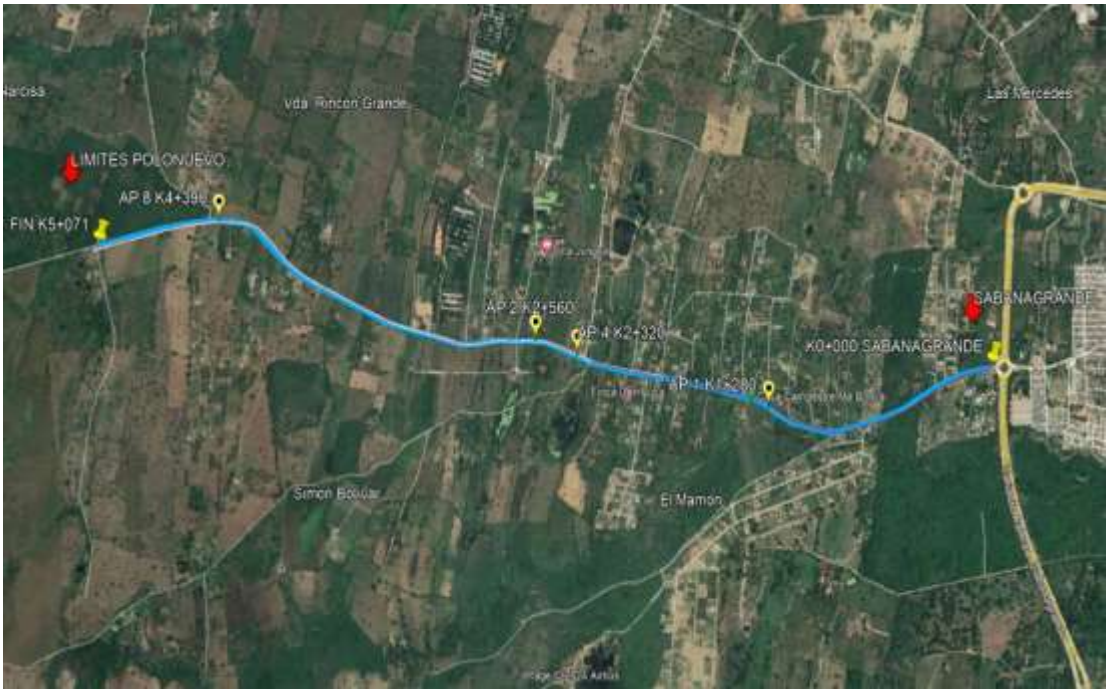

a) Localización Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El corredor de 5.1 Km de longitud corresponde a una vía terciaria que se localiza en el Municipio de Sabanagrande – Departamento del Atlántico, entre la Glorieta de salida de Sabanagrande hasta los límites con el Municipio de Polonuevo.

5.2. Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

El proyecto comprende el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vía terciaria que se localizada al sur del municipio de Ponedera conectando los sectores de LA GIRALDA y SANTA RITA EL VIEJO en longitud de 9.6 Km.


El contrato de obra comprende la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, siendo esta una actividad preliminar a la ejecución de obras que permitirán definir las intervenciones, estructuras y precisar el alcance en la ejecución de las obras.

Los presupuestos realizados para la suscripción del convenio 2220-2023 y contrato de obra LP-001-2023 proyectan una intervención de la siguiente manera:

- 3980 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido y obras de drenaje.
- 5850 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado.
- Se proyectan anchos de 5.50 m, los cuales será revisados en la etapa de estudios y diseños y dependerán del estudio de tránsito y diseño geométrico de la vía.

No obstante, es pertinente precisar que las metas físicas definitivas del contrato de obra, dependerán de la complementación de los estudios y diseños que viene adelantando el contratista, por lo cual las cantidades serán ajustadas una vez se surta la entrega y aprobación de cada uno de los volúmenes de diseño.

a) Localización Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

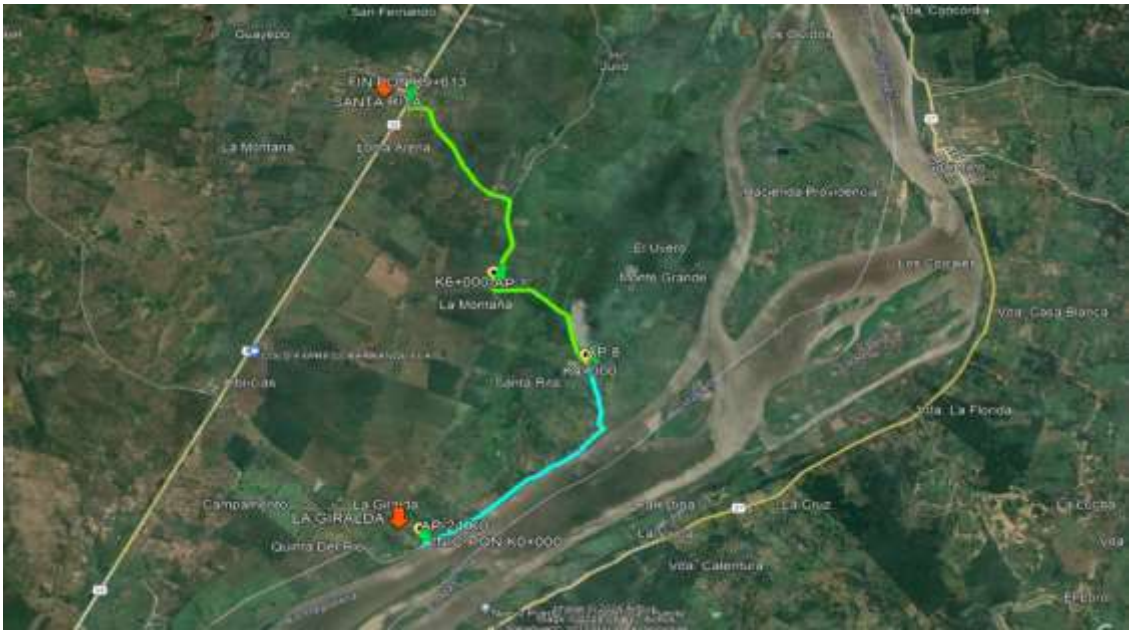

El corredor vial de 9.6 Km de longitud corresponde a una vía terciaria localizada en el Municipio de Ponedera – Departamento del Atlántico, entre el sector conocido como La Giralda específicamente en el Ferry para Salamina y transcurre por la rivera del rio Magdalena hasta conectar la vía principal de Ponedera a Puerto Giraldo en cercanías al corregimiento de Santa Rita.

5.2. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

5.2.1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL.

Proyecto Sabanagrande:

Subprograma 1. Mano de obra contratada con enfoque de género de derechos y diferencias.

Tabla N° 1. Mano de obra vinculada al proyecto de Sabanagrande

TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	INFORMACIÓN DEL PERIODO	
	N° EMPLEOS DEL PERIODO	ACUMULADO
MONC del AIP*	20	20
MONC foránea	3	10
MOC del AIP	0	0
MOC foránea	8	10
TOTAL, GENERAL	31	40

- Para este periodo, el contratista de Sabanagrande reporta un total de (31) personas vinculadas al contrato**.**
- El personal vinculado en el periodo por parte de la interventoría corresponde a (11) personas**.**

Proyecto Ponedera:

Tabla N° 2. Mano de obra vinculada al proyecto de Ponedera

TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	INFORMACIÓN DEL PERIODO	
	N° EMPLEOS DEL PERIODO	ACUMULADO
MONC del AIP*	**2**	2
MONC foránea	**2**	2
MOC del AIP	**0**	0
MOC foránea	**9**	9
TOTAL, GENERAL	**13**	**13**

- En este periodo el contrato reportó la vinculación de (13) personas.
- El personal vinculado en el periodo por parte de la interventoría corresponde a (11) personas**.**

5.2.2. PROGRAMA 7. COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO, SITIOS DE INTERES SOCIO CULTURAL

Las consultas adelantadas ante entidades se encuentran en el siguiente estado:

Proyecto Sabanagrande:

Subprograma 1. Programa de arqueología preventiva Consulta ICANH. El Contratista el 21 de mayo del año en curso remite a la entidad la comunicación OBR-SOC-014-2024, donde a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la entidad. Interventoría le ha solicitado al contratista realizar gestión para la respuesta de la entidad.

Subprograma 2. Protección al patrimonio cultural -Consulta a la Dirección nacional de consulta previa- DANCP -MININTERIOR. El Contratista el 21 de mayo del año en curso remite correo a la entidad, donde a la fecha no se ha recibido respuesta. Interventoría le ha solicitado al contratista realizar gestión para la respuesta de la entidad.

Proyecto Ponedera:

Subprograma 1. Programa de arqueología preventiva Consulta ICANH. En el mes de febrero del año 2024, con el radicado de entrada No. **Entrada** 2024184200027632, el contratista, realizó la consulta ante la entidad. El **ICANH** – remite respuesta el 05-04-2024 con el radicado 2024162000031181 informan: En virtud del anterior marco normativo, el proyecto "contrato de obra No. LP-001-2023, cuyo objeto es el de "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDASANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", localizado en el municipio de Ponedera departamento del Atlántico, **NO** se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad, dado que no requiere licencia ambiental ni la aprobación de un Plan de Manejo Ambiental. Así mismo, a la fecha, el proyecto **NO** se encuentra en la obligación de implementar medidas de manejo arqueológico.

Subprograma 2. Protección al patrimonio cultural. El contratista Consorcio La Giralda mediante el radicado 2024-1-004044-019912 ID 299748 del 15 de marzo de 2024, Consulta a la Dirección nacional de consulta previa- DANCP -MININTERIOR. La entidad, emite respuesta con la RESOLUCIÓN NÚMERO ST-0522 DE 14 MAY 2024. **RESUELVE:**
PRIMERO. Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA - EL VIEJO, DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". VÍA LA GIRALDA – SANTA RITA – EL VIEJO"",** localizado en jurisdicción

del municipio de Ponedera, en el departamento de Atlántico, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.
SEGUNDO. Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA - EL VIEJO, DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". VÍA LA GIRALDA – SANTA RITA – EL VIEJO""",** localizado en jurisdicción del municipio de Ponedera, en el departamento de Atlántico, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.
TERCERO. Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA - EL VIEJO, DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". VÍA LA GIRALDA – SANTA RITA – EL VIEJO""",** localizado en jurisdicción del municipio de Ponedera, en el departamento de Atlántico, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Subprograma 3. Protección al patrimonio geológico y paleontológico Servicio Geológico Colombiano SGC. El 16 de mayo de 2024 el contratista remitió a la entidad comunicación solicitando información sobre la presencia de hallazgos paleontológicos y fósiles en la zona del proyecto. El 11 de junio de 2024 la entidad emite respuesta dando recomendaciones en caso de hallazgos durante la ejecución del contrato.

5.2.3 PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Proyecto Sabanagrande:

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos

- **Actas de vecindad de inicio**

En el mes de octubre del año 2024 el contratista reportó a la interventoría el acta de vecindad de inicio con el consecutivo N° 74 completando un total de (75) actas de vecindad de inicio revisadas y firmadas por la interventoría.

Con la comunicación OBR-SOC-019-2024. El 01 de soctubre de 2024 el contratista remite a la interventoria (1) actas de vecindad de inicio con el consecutivo N° 74, el 02 de octubre de 2024, interventoría con la comunicación C-T-135-327-2024-SG, emite concepto de aprobación y devuelve el acta original finada por parte del área técnica. El acata revisada y aprobada se relaciona en el siguiente cuadro:

N°	Propietario y/o responsable	N° Consecutivo	Tramo	Margen
1	Marbelis Carbal Medina	74	II	Izquierda

- **Entrega de copias de las actas de vecindad de inicio**

Al 31 de octubre de 2024 el contratista reportó en la última reunión de seguimiento social la entrega de un total de setenta (70) actas de vecindad de inicio remitidas a los propietarios a través de WhatsApp, quedan pendiente cinco (5) actas por remitir a propietarios o encargados de predios donde no contestan en los teléfonos de registro que se tienen y otros no reportan servicio de WhatsApp. La profesional social del contratista procederá a realizar visita a los predios y entrega personalizada de la información. Se ha dejado como evidencia de la entrega los envíos realizados.

- **Actas de compromiso**

En periodos anteriores se levantaron dos actas relacionadas con los consecutivos N° 01 y N° 02, se encuentran abiertas por áreas ocupadas por el contratista para uso del campamento y del SAU y otro para maquinaria y materiales de la obra.

Proyecto Ponedera:

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos

- **Actas de vecindad de Inicio.**

Interventoria recibió en el mes de julio (72) actas de vecindad, las cuales fueron devueltas en el mismo mes para subsanaciones, a la fecha no han sido formalizada la entrega Interventoría ha remitido en reiteradas oportunidades comunicaciones como se evidencia en la correspondencia remitida tanto en periodos anteriores como en el mes de octubre reporte de este informe:

REQUERIMIENTOS DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA CONSORCIO LA GIRALDA POR DOCUMENTOS SOCIALES PENDIENTES				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	C-T-135-334-2024-PO	05-10-2024	Requerimiento entrega documentos sociales	CONSORCIO LA GIRALDA
2	C-T-135-367-2024-PO	23-10-2024	Requerimiento entrega documentos sociales	CONSORCIO LA GIRALDA
3	C-T-135-376-2024-PO	30-10-2024	Requerimiento entrega documentos sociales	CONSORCIO LA GIRALDA

- **Entrega de copias de las actas de vecindad de inicio**

Está pendiente esta actividad teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentran aprobadas por interventoría las actas de vecindad de inicio que se encuentran en subsanaciones por parte del contratista.

- **Actas de Compromiso**

Esta pendiente los ajustes y complementaciones de 4 actas de compromiso, se han realizado los respectivos requerimientos en correos, comunicaciones y en reuniones de seguimiento social y técnico al contratista donde no han dado cumplimiento.

5.2.4 PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Proyecto Sabanagrande:

Subprograma 1. Atención a la comunidad. A partir del 25 de mayo/24 el contratista inicio la atención en el SAU.

- Instalación del SAU: Se encuentra dispuesto en el campamento del contratista donde funciona y está identificado con el respectivo aviso informativo. El 8 de octubre el contratista instala de forma provisional un punto SAU satélite en comercio del área de influencia del proyecto, donde no se reportó ningún acercamiento y efectividad.





Ubicación: Carrera 7 Km 2. Al lado del Centro Recreacional El Pinar
Teléfono: 311 619 16 96
Horario de Atención: miércoles y jueves en horario de oficina
Correo: Constructorescrivensabanagrand@gmail.com

- **Registro de PQRSD**

El 15 de octubre del año en curso se recibe la PQRSD N° 2 en predio donde se evidencian fisuras que se evidenciaron antes de iniciar las obras, sin embargo, la propietaria del predio manifiesta que estas se incrementaron, se esta a la espera de una nueva concertación, se ha tenido inconvenientes ya que la propietaria no se encuentra en el predio por atender una calamidad familiar, esta a la espera de la concertación.



Subprograma 2. Información y Divulgación.

- Volante Informativo:

El 18 de octubre se distribuyó en una segunda jornada la entrega del volante informativo N° 2 volante PMT. Fortaleciendo el proceso de información a actores viales.



- **Reunión de inicio del contrato.**

Se realizó el 24 de mayo de 2024 se llevó a cabo la reunión informativa de inicio de contrato se contó con la asistencia de habitantes del área de influencia directa del proyecto, autoridades municipales y representantes de una veeduría que se encuentra registrada con resolución 036 emitida por la personería municipal con fecha del año 2021, representantes de esta veeduria se inscribieron al comité de participación comunitaria (CPC) y se levantó la respectiva acta de la conformación. Esta actividad se encuentra cumplida por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria.

Interventoría remitió comunicación a los integrantes de veeduria comunicación para que realicen el curso virtual sobre veeduría como alternativa de formación virtual en cualquier momento que se tenga disponibilidad a través del portal de la Función Pública y tengan el respectivo certificado de participación. De igual forma el contratista remitió comunicaciones con la misma información a los integrantes del comité de Participación comunitaria.

PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Proyecto Ponedera:

El 15 de octubre de 2024, el contratista remite hoja de vida de profesional social, la interventoría con la comunicación C-T-135-351-2024-PO emite concepto de aprobación.

Subprograma 1. Atención a la comunidad.

- **Atención en la oficina del SAU**



Ubicación: Parcela Manuela Isabel
Teléfono: 3016474188
Horario: viernes de 8:00 a 12m
Correo: Consorciolagiralda31@gmail.com

- **Atención de PQRSD.**

Pendiente la verificación de un predio donde se evidenció afectación de un cercado por movimiento de material con maquinaria de la obra, donde no se ha localizado al propietario.

Subprograma 2. Información y Divulgación.

- Volantes Informativos.

En este periodo, se aprobó por parte de interventoría el volante informativo N° 2 de invitación a reunión de seguimiento del contrato con el comité de participación comunitaria, el cual se distribuyó el 25-10-2024 como se puede apreciar en las siguientes fotos.





- Pasacalle

En octubre continúan instalados tres pasacalles informando las restricciones de no acceso a tractocamiones o de carga pesada en el tramo en intervención.



- **Reunión de inicio de contrato.**

Se realizó el 19 de julio de 2024 por parte de representantes del área técnica del contratista y con el apoyo de los profesionales de dirección, área técnica, SST y social de la interventoría. En el mes de agosto no se llevó a cabo ninguna actividad por parte del contratista, el contrato estaba suspendido a parir del 29 de julio a agosto de 2024.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria.

- **Reunión de seguimiento al contrato con el CPC.**

El 31 de octubre a las 9:30 a.m. se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento el contrato con el comité de participación comunitaria, asistieron 13 personas de la comunidad (4) representantes de la interventoria y (5) representantes del contratista.





5.3. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SOCIAL AL CONTRATO

5.3.1. Informes mensuales sociales del Contratista

Tabla N° 3. Relación y estado de los informes mensuales

N° DE INFORMES Y PERIODO	ESTADO DE LOS INFORMES SABANAGRANDE	ESTADO DE LOS INFORMES PONEDERA
N° 1 de marzo de 2024	Radicado y aprobado en mayo de 2024 con la comunicación C-T-135-086-2024 SG el 31-05-2024	Radicado y aprobado en junio 2024 con la comunicación C-T-135-123-2024-PO el 20-06-2024
N° 2 de abril de 2024	Radicado y aprobado en mayo de 2024 con la comunicación C-T-135-087-2024 SG el 01-Jun-2024	Radicado y aprobado en junio 2024 con la comunicación C-T-135-124-2024-PO el 20-06-2024
N° 3 de mayo de 2024	Radicado y aprobado en junio de 2024 con la comunicación C-T-135-115-2024-SG el 15-06-2024	El 09-09-2024 el contratista remite el informe la interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-299-2024-SG-el 11-09-2024.
N° 4 de junio de 2024	Radicado y aprobado en julio de 2024 con la comunicación C-T-135-191-2024-SG el 15-07-2024	El 11-10-2024 el contratista remite el informe, la interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-342-2024-SG-el 11-10-2024.
N° 5 de julio de 2024	Aprobado en agosto de 2024 con la comunicación C-T-135-246-2024-SG el 12-08-2024	El 23-10-2024 el contratista remite el informe, la interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-371-2024-SG-el 24-10-2024.
N° 6 de agosto de 2024	El 17-09-2024 el contratista remite el informe con la comunicación OBR-SOC-017-2024, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-308-2024-SG-el 18-09-2024.	El 26-10-2024 el contratista remite el informe, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-374-2024-SG-el 26-10-2024.
N° 7 de septiembre de 2024	El 09-10-2024 el contratista remite el informe con la comunicación OBR-SOC-020-2024, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-339-2024-SG-el 09-10-2024.	El contratista no ha radicado el informe de septiembre de 2024, se han remitido varias comunicaciones requiriendo la entrega de este y otros documentos pendientes. En los cuadros de correspondencia de este informe, se relacionan los requerimientos de entrega de pendientes sociales.

5.3.2. Correspondencia

A continuación, se relaciona la correspondencia remitida por interventoría durante este periodo, en cada uno de los contratos en ejecución.

Correspondencia contrato de Sabanagrande:

- Interventoría generó en este periodo la siguiente correspondencia.

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR INTERVENTORÍA OCTUBRE DE 2024 CONTRATO SABANAGRANDE				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	C-T-135-327-2024-SG	02-10-2024	Rta a la comunic-OBS-SOC-019-2024-AVI-N°74-Subsanada.	CRIVEN CONSTRUCTORES
2	C-T-135-339-2024-SG	09-10-2024	Rta a la comunicación OBR-SOC-020-2024-Aprobacióncnforme-Social N°7 de septiembre.	CRIVEN CONSTRUCTORES
3	C-T-135-368-2024-SG	23-10-2024	Solicitud de programación actividades sociales	CRIVEN CONSTRUCTORES

- Oficios remitidos por parte de la Subdirección de INVIAS a la Interventoría: En este periodo no se recibió información relacionada con el contrato de Sabanagrande por parte del instituto.

- El contratista CRIVEN CONSTRUCTORES, del contrato de Sabanagrande, generó en este periodo la siguiente correspondencia.

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR O EL CONTRATISA CONTRUCTORES CRIVEN - OCTUBRE- 2024 CONTRATO SABANAGRANDE				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	OBR-SOC-019-2024	01-10-2024	Remite acta de vecindad de inicio N° 74 Tramo II	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA
2	OBR-SOC-020-2024	09-109-2024	Remite informe mensual social N° 7 de mes de septiembre de 2024	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA
3	SIN CONSECUTIVIO	31-10-2024	Confirmar fecha de capacitación y campaña de prevención y seguridad vial el 08 de noviembre de 2024	SECRETARIA DE TRÁNSITO DE SABANAGRANDE

Correspondencia contrato de Ponedera:

- Interventoría generó en este periodo la siguiente correspondencia al contratista de Ponedera Atlántico:

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR INTERVENTORÍA EN OCTUBRE DE 2024 AL CONTRATO PONEDERA				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	C-T-135-334-2024-PO	05-10-2024	Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes	CONSORCIO LA GIRALDA
2	C-T-135-342-2024-PO	11-10-2024	Aprobación- informe social N° 4 de junio-2024.	CONSORCIO LA GIRALDA
3	C-T-135-351-2024-PO	15-10-2024	Aprobación HV de la Profesional social del contratista.	CONSORCIO LA GIRALDA
4	REMITIDA POR CORREO	17-10-2024	Observaciones de la revisión del informe Social-N° 5 de Julio de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA
5	C-T-135-367-2024-PO	23-10-2024	Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes.	CONSORCIO LA GIRALDA
6	C-T-135-371-2024-PO	24-10-2024	Aprobación del informe social N° 5 de julio-2024.	CONSORCIO LA GIRALDA
7	C-T-135-374-2024-PO	26-10-2024	Aprobación del informe social N° 6 de agosto-2024	CONSORCIO LA GIRALDA
8	C-T-135-374-2024-PO	26-10-2024	Aprobación- informe social N° 6 de agosto-2024.	CONSORCIO LA GIRALDA
9	C-T-135-376-2024-PO	30-10-2024	Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes.	CONSORCIO LA GIRALDA
10	C-T-135-378-2024-PO	30-10-2024	Respuesta de NO APROBACION-Presentación reunión-CPC.	CONSORCIO LA GIRALDA

- Oficios remitidos por parte de la Subdirección de INVIAS a la Interventoría:

CORRESPONDENCIA REMITIDA DE INVIAS - MES OCTUBRE DE 2024 CONTRATO SABANAGRANDE				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
1	**Radicado:** 2024S-VBOG-071697	02/10/2024	RESPUESTA DE INVIAS DEL INFORME TRIMESTRAL SOCIAL N°2-PONEDERA	INTERVENTORIA CONSORCIO ODESSA

Correspondencia emitida por el contratista – Ponedera.

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR O EL CONTRATISTA CONSORCIO LA GIRALDA - OCTUBRE- 2024 CONTRATO PONEDERA				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	SIN CONSECUTIVO	11-10-2024	Entrega del informe mensual social de junio de 2024.	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA
2	SIN CONSECUTIVO	23-10-2024	Entrega del informe mensual social de julio de 2024.	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA
3	SIN CONSECUTIVO	26-10-2024	Entrega del informe mensual social de agosto de 2024.	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA
4	SIN CONSECUTIVO	30-10-2024	Remiten presentación reunión CPC DEL 31-10-2024.	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA

5.3.3. Reuniones de seguimiento social a los contratos

En este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento social al contrato de Sabanagrande:

ACTAS DE REUNIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO SAGANAGRANDE			
Fecha	**Acta N°**	**Temas tratados**	**Participantes**
4/10/2024	N°47	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría
16/07/2024	N° 49	1.Revisar las observaciones del informe mensual social N°4 del mes de junio de 2024,	Profesionales del área social del contratista e interventoría
24/10/2024	N° 53	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría
31/10/2024	N° 55	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría

En este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento social al contrato de Ponedera:

ACTAS DE REUNIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO PONEDERA			
Fecha	**Acta N°**	**Temas tratados**	**Participantes**
08/10/2024	N°48	Realizar seguimiento al componente de gestión social del contrato y socializar con la nueva profesional social del contratista los programas y actividades sociales de acuerdo a lo establecido en el documento PAGA revisado.	Profesionales del área social del contratista e interventoría e Ing. Ambiental del contratista.
17/10/2024	N° 50	Realizar seguimiento al componente de gestión social del contrato y socializar con la nueva profesional social del contratista los programas y actividades sociales de acuerdo a lo establecido en el documento PAGA revisado.	Profesionales del área social del contratista e interventoría e Ing. Ambiental del contratista.
21/10/2024	N° 51	Revisión de formaos y anexos del informe mensual social N° 5 del mes de agosto de 2024	Profesional ambiental del contratista y profesional social de la interventoría
24/07/2024	N° 52	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría
30/10/2024	N° 54	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría

5.3.4. Informes trimestrales sociales de la Interventoría

- En este periodo NA esta actividad.

5.3.5. Oficios recibidos de INVIAS

- Oficios de respuesta por parte de INVIAS a la Interventoría Consorcio Odessa: El 2 de octubre de 2024 se recibe respuesta a la comunicación de interventoria C-T-135-287-2024 con el radicado INVIAS: 2024S-VBOG-071697, informando el recibieron del INFORME TRIMESTRAL SOCIAL N° 2 del contrato de Ponedera, el cual compila los formatos y anexos requeridos.

Alba Rocío Flórez
Profesional Social Interventoría



INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

5.3.3

OCTUBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1. A los contratos de obra - CONTRATO DE OBRA LP-001-2023 y CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023.

INTRODUCCIÓN

5.3.3 Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra.

5.3.3.1 Control de Señalización Frentes de Obra y Sitios Temporales

5.3.3.2 Registro de personal en obra

5.3.3.3 Reporte de Accidentes de Trabajo

5.3.3.4 Capacitaciones - Charlas en seguridad y Salud en el Trabajo SST

5.3.3.5 Entrega y Uso de Elementos de Protección Personal EPP

5.3.3.6 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo SST

5.3.3.7 Reporte de actos condiciones inseguras

5.3.3.8 Conclusiones

5.3.3.9 Recomendaciones

INTRODUCCION

En el presente informe se relaciona la gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST que se desarrolla desde la Interventoría, para el seguimiento a las actividades constructivas ejecutadas en los Contratos de mejoramiento y mantenimiento de Vías Terciarias en el Departamento del Atlántico, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Decreto 1072 del 2015 el cual regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la Resolución 0312 del 2019, la cual establece los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), las cuales permiten realizar la verificación de los documentos de obligatorio cumplimiento, con el objetivo de identificar, evaluar y controlar los riesgos que pueden desencadenar en accidentes de trabajo y enfermedades laborales, aplicando acciones preventivas y de mejora, con el fin de promocionar y establecer un ambiente seguro de trabajo al personal, se verifica la implementación de las actividades en seguridad y salud en el trabajo que se ejecuta por los contratistas en las obras, entre otras estrategias para mejorar el desempeño de ejecución en obra.

Por consiguiente, la implementación de las diversas actividades en prevención permite la disminución en el número de incapacidades, accidente y enfermedades laborales generan procesos más fluidos y continuos, reduce el ausentismo laboral y mejora la productividad. De tal manera que mediante los soportes y registros fotográficos suministrados de cada proyecto se evidencia la implementación de las actividades en seguridad y salud en el trabajo, donde se relaciona el seguimiento al control de personal en obra, inducciones de ingreso, verificación de los aportes a la seguridad social (ARL,EPS,AFP,CCF) del personal vinculado al proyecto exámenes ocupacionales, uso y entrega de elementos de protección personal EPP, así como también las actividades realizadas en capacitaciones y charlas de seguridad que permiten retroalimentar al personal sobre la prevención de riesgos y reforzar la seguridad y el autocuidado, igualmente las inspecciones de seguridad a herramientas, equipos, vehículos y maquinara amarilla son actividades que se implementan para dar seguimiento y controlar los riesgos de accidentalidad, así como también la instalación del esquema de señalización vial como parte de la información que permite a los usuarios del corredor vial estar informados de las actividades que se desarrollan en el tramo de intervención, como lo especifica el Manual de señalización vial del 2015 y el Plan de Manejo de Tráfico PMT elaborado para cada contrato.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas de cada proyecto.

CONSORCIO LA GIRALDA

CONTRATO DE OBRA
No. LP-001-2023



MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

INFORME MENSUAL

01 al 31 de octubre de 2024

PMT

A. PONEDERA – ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA: LP-001-2023 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

INTRODUCCION

En el presente informe se relacionan las actividades en seguridad y salud en el trabajo SST ejecutadas en el proyecto, CONTRATO DE OBRA: LP-001-2023 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, el proyecto contempla la intervención de mejoramiento de vía mediante la construcción de pavimento rígido.

Localización general del Proyecto se ubica en la Vía La Giralda en el Ferry para Salamina por la rivera del rio Magdalena y conecta a la vía principal del Municipio de Ponedera a Puerto Giraldo en el corregimiento de Santa Rita.

5.3.3.A Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra: En el presente informe se evidencia la implementación de las actividades del área de seguridad y salud en el trabajo SST, durante el desarrollo de las actividades constructivas en obra, las cuales se verificaron mediante los registros fotográficos anexos, como las inducciones al personal, inspecciones a equipos y maquinaria, la instalación de la señalización en el tramo de intervención, la verificación documental tanto de maquinaria y equipos como la verificación de los aportes a la seguridad social del personal vinculado al proyecto.



Ubicación del Proyecto

5.3.3.1 B CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CONSORCIO LA GIRALDA**	**CONTRATO No**	**No. LP-001-2023**
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DEL SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

SANTA RITA - PONEDERA





SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

KM	K9+600



SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

KM	K9+600



SEÑAL SR18 - PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS PESADOS O DE CARGA

KM	K9+060

5.3.3.1 B CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CONSORCIO LA GIRALDA**	**CONTRATO No**	**No. LP-001-2023**
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DE LA VIA POLONUEVO A SABANAGRANDE - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.





SEÑAL - SIO-02 INICIO DE OBRA

KM	K0+100



SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA

KM	K0+040



DELIMITACIÓN - INSTALACIÓN DE MALETINES O BARRERAS

KM	K0+050

5.3.3.1 B CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CONSORCIO LA GIRALDA**	**CONTRATO No**	**No. LP-001-2023**
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		


		
SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	DELIMITACIÓN - INSTALACIÓN DE MALETINES O BARRERAS
KM K0+040	**KM** K0+300	**KM** K0+080
		
DELIMITACIÓN - INSTALACIÓN DE MALETINES O BARRERAS	SEÑAL - SIO-02 INICIO DE OBRA	SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO
KM K0+040	**KM** K0+600	**KM** K0+550

OBSERVACIONES: Se registran las señales instaladas en el tramo de Intervención durante la ejecución de las actividades constructivas en el presente periodo.


5.3.3.1 B CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CONSORCIO LA GIRALDA**	**CONTRATO No**	**No. LP-001-2023**
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

REGISTRO DE LA SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

SEÑALIZACIÓN EN OBRA	CANTIDAD
SEÑALI - SIO-02 INICIO DE OBRA	2
SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA	
SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO	1
SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	2
SEÑAL SR 30 - MAXIMA VELOCIDAD	
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO	
SEÑAL SIO - 05 DESVIO	
SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	3
SEÑAL SRO 01 - VIA CERRADA	
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	
SEÑAL SR18 - PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS PESADOS O DE CARGA	1
DELINEADORES	
MALETINES VIALES	4
PARE y SIGA	2
BARRICADAS METALICAS	
CONOS	
TOTAL	15

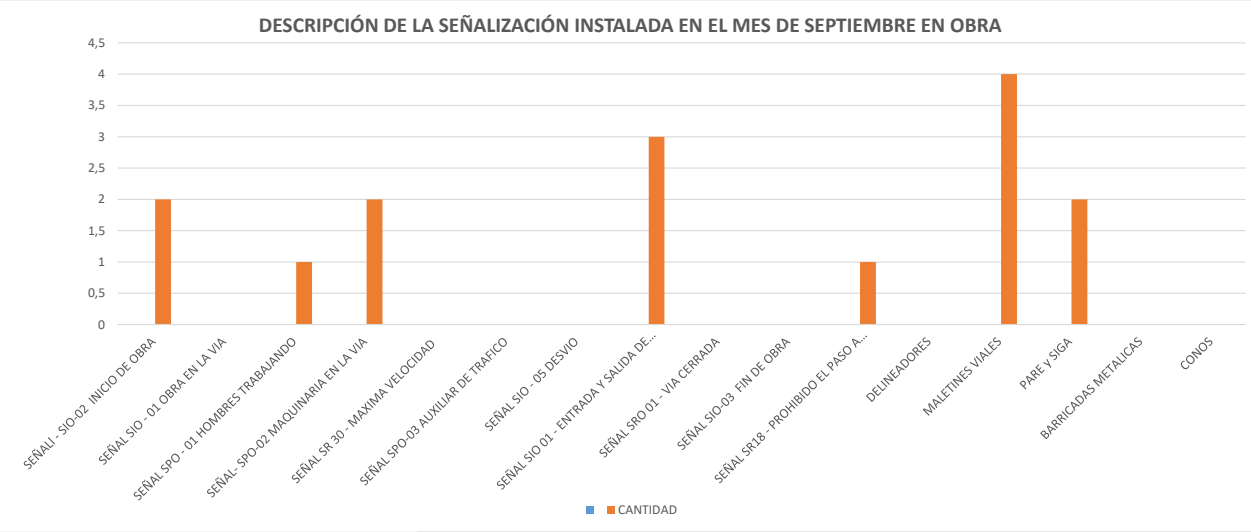

TOTAL DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA POR PERIODO	
SEPTIEMBRE	13
OCTUBRE	15
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0

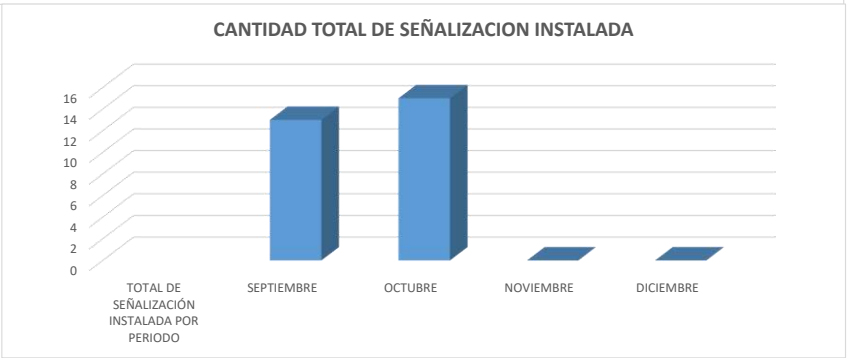

INDICADOR:

SENALIZACION= No. SENALIZACION INSTALADA EN EL FRENTE DE OBRA / No. SEÑALIZACIÓN DEL PMT ESTABLECIDO EN EL FRENTE DE OBRA *100%

SEÑALIZACION= No.15 SEÑALES INSTALADAS EN EL FRENTE DE OBRA / No. 15 SEÑALES REQUERIDAS EN OBRA *100%

SEÑALIZACION INSTALADA EN OBRA = No.15 / No. 15 *100%

SEÑALIZACION = 100%

5.3.3.2 B REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA


		
INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO
		
INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO

OBSERVACIONES: Se registra las inducciones de ingreso de personal de obra durante el periodo.

5.3.3.2 B REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE LAS INDUCCIONES REALIZADAS EN OBRA

INDUCCIONES EN OBRA	CANTIDAD
MAYO	5
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	9
OCTUBRE	4
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	18

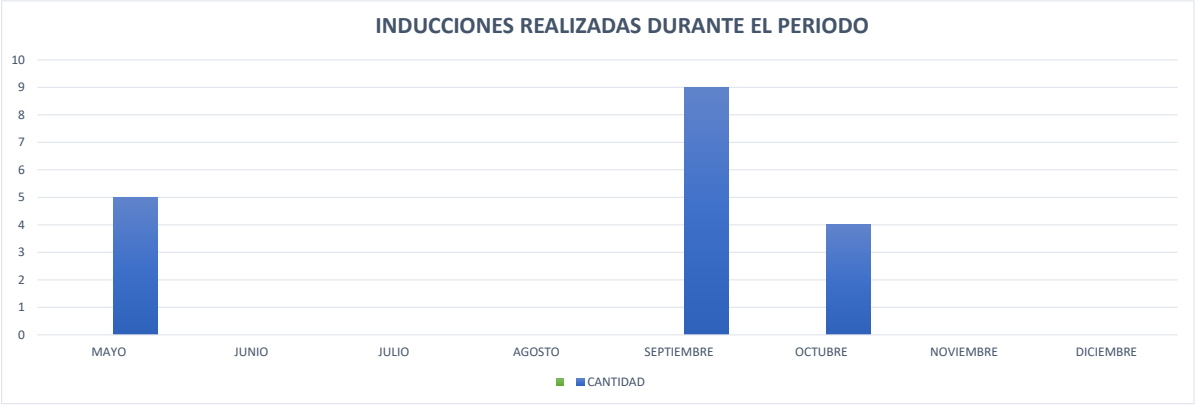

INDICADOR:

INDUCCIONES= No. TOTAL DE INDUCCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO / No. TOTAL DE TRABAJADORES DE INGRESO EN EL PERIODO *100%

INDUCCIONES = No. 4 / No. 4 *100%

INDUCCIONES= No. 4 INDUCCIONES REALIZADAS / No. 4 TOTAL DE TRABAJADORESDE INGRESO A OBRA *100%

CUMPLIMIENTO EN INDUCCIONES DE INGRESO A OBRA = 100%

MANO DE OBRA VINCULADA AL PROYECTO DE PONEDERA		
TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	INFORMACION DEL PERIODO	
	No. EMPLEOS DEL PERIODO	ACUMULADO
MONC DEL AIP	2	2
MONC FORANEA	1	2
MOC DEL AIP	0	1
MOC FORANEA	8	13
TOTAL GENERAL	11	18


OBSERVACION: PARA EL PRESENTE PERIODO, EL CONTRATISTA DE PONEDERA REPORTA UN TOTAL DE 11 PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATO. REPORTA 8 PERSONAS MOC Y SE ESTIMA 3 PERSONAS DE MONC.

TOTAL DE TRABAJADORES: 18 PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATO DE PONEDERA - ATLANTICO.

5.3.3.2 B REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE AUSENTISMO EN OBRA

AUSENTISMO EN OBRA	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

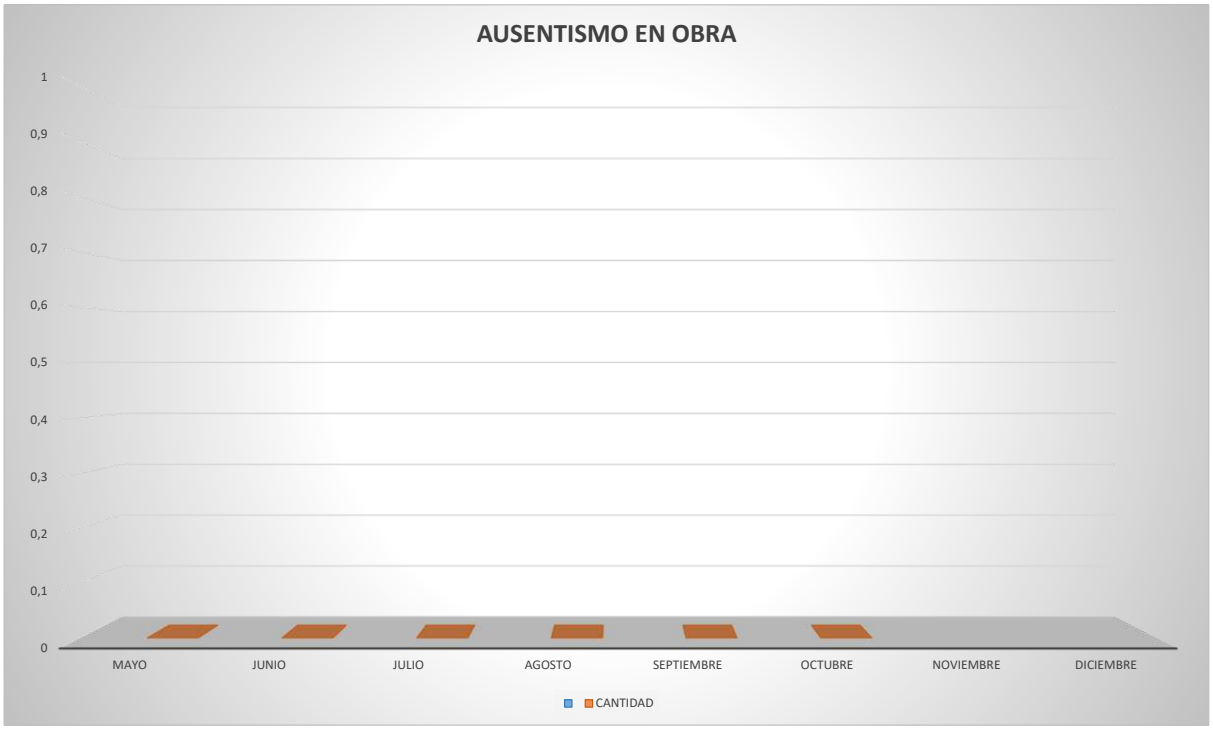

INDICADOR:


AUSENTISMO= No. TOTAL DE HORAS LABORADAS= / No. TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS *100%

AUSENTISMO= No. 0 ASUENTISMO EN OBRA = / (11 Trabajadores)*(8hrs)*(30 DIAS) *100%

AUSENTISMO= 0%

5.3.3.3 B REGISTRO DE ACCIDENTES EN OBRA
Observaciones: Durante el periodo del presente informe no se registran accidentes de trabajo.

ACCIDENTES DE TRABAJO	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

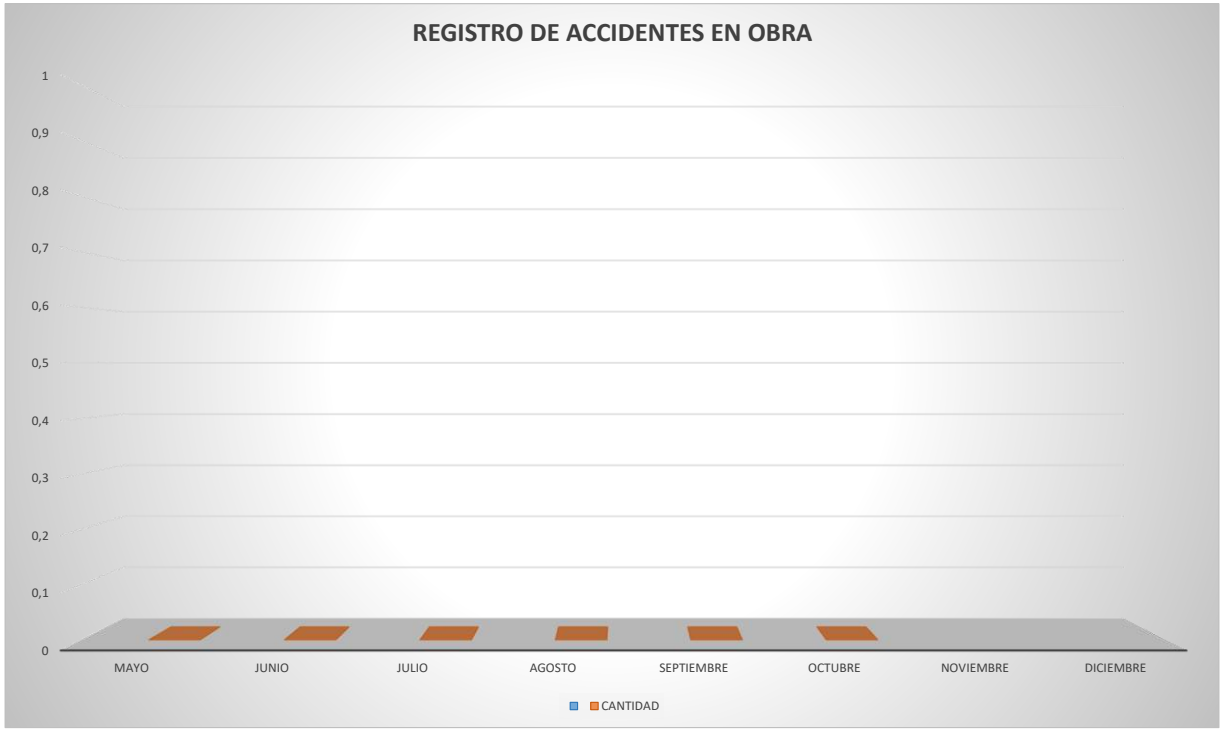

INDICADOR:

ACCIDENTE LABORAL= No. TOTAL ACCIDENTE LABORALES DURANTE EL PERIODO *100%
No. TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO

ACCIDENTE LABORAL= 0 *100%
11


ACCIDENTE LABORAL= 0%

CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA

		
CHARLAS DIARIAS	CHARLAS DIARIAS	CHARLAS DIARIAS


OBSERVACIONES: Se registra las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas en obra durante el periodo.

REGISTGRO DE LA CAPACITACION AL PERSONAL EN OBRA MES SEPTIEMBRE 2024			
ITEM	**TEMA DE LA CAPACITACION**	**ASISTENTES**	**FECHA**
1	Uso adecuado de EPP (Gafas, casco, guantes, botas con punteras)	4	27/09/2024
2	¿Que es un accidente laboral y que debo hacer en caso de accidente?	4	28/09/2024
3	¿Que es una enfermedad común y que es enfermedad laboral?	6	29/09/2024

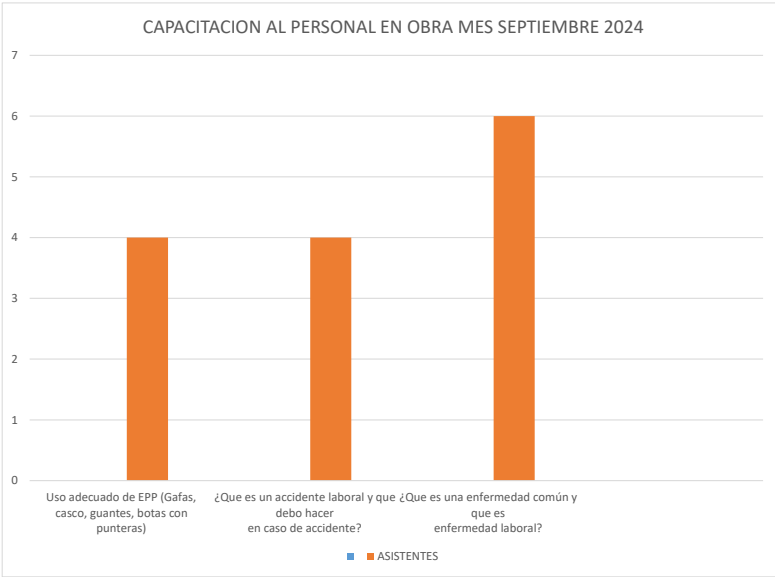

CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA


REGISTGRO DE LA CAPACITACION AL PERSONAL EN OBRA MES OCTUBRE 2024			
ITEM	**TEMA DE LA CAPACITACION**	**ASISTENTES**	**FECHA**
1	seguridad social en Colombia, según la Ley 100 de 1993 (ARL,EPS,AFP)	6	1/10/2024
2	Responsabilidades del empleador y responsabilidades de los empleados	9	2/10/2024
3	Primeros auxilios y cuales son los elementos? (Camilla, extintor, botiquín)	9	5/10/2024
4	Línea de fuego Motoniveladora	9	6/10/2024
5	Riesgo físico - Temperatura - Agotamiento por calor	9	7/10/2024
6	Higiene postural - Pausas activas	9	8/10/2024
7	¿Que es un ATS y cual es su importancia?	9	9/10/2024
8	Riesgo locativo - Orden y aseo en área de trabajo	9	10/10/2024
9	Riesgo locativo - Caídas a distinto y a mismo nivel	9	11/10/2024
10	Peligro biomecanico - Manejo manual de cargas	8	12/10/2024
11	Señalización y delimitación perimetral: ¿Por qué es importante la señalización?	8	15/10/2024
12	¿Que es un preoperacional y por qué es importante aplicarlo?	8	16/10/2024
13	Riesgo Biológico: Existencia de vectores	9	17/10/2024
14	Evidencia de entrega de Epp y por qué es importante?	9	18/10/2024
15	Riesgo mecánico: Uso adecuado y responsable de herramientas electromecánicas y menores	9	19/10/2024
16	Charlas de seguridad de 15 min, importancia	9	21/10/2024
17	Reporte de condiciones de salud, importancia a la hora de prevenir accidentes laborales	9	22/10/2024
18	Hidratación - ensolación-golpe de calor	9	23/10/2024
19	¿Quién es mi jefe inmediato?	9	24/10/2024
20	El ser humano y sus relaciones con el medio ambiente	9	25/10/2024

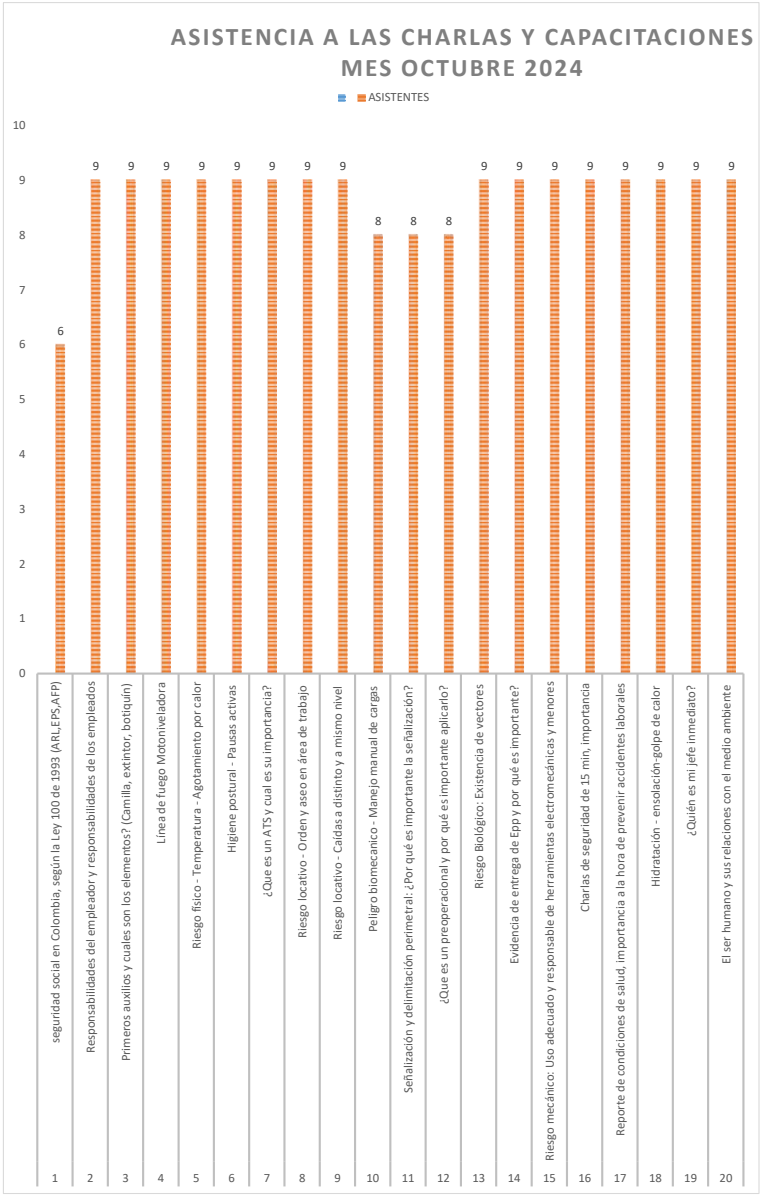

CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA

REGISTRO DE LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	3
OCTUBRE	20
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	23

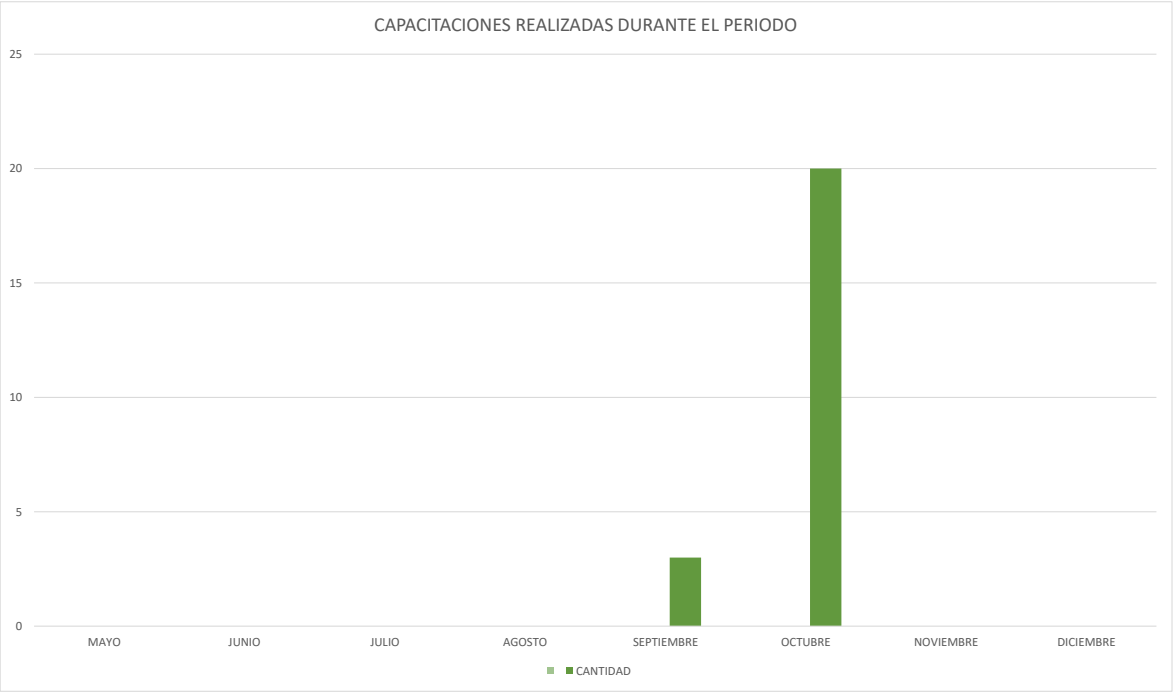

INDICADOR:

CHARLAS= No. CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO / No. TOTAL DE CHARLAS Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO *100%

CHARLAS Y CAPACITACIONES = No. 23 / DURANTE EL PROYECTO No. 23 *100%

CHARLAS = No. 23 CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS / No. 23 TOTAL DE CHARLAS Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100%

CUMPLIMIENTO EN CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL EN OBRA = 100%


ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA		
		
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SOPORTE DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
		
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

OBSERVACIONES: Se registro de las entregas de los elementos de protección personal a los trabajadores en obra durante el presente periodo.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA

ENTREGA DE EPP	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	2
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	2

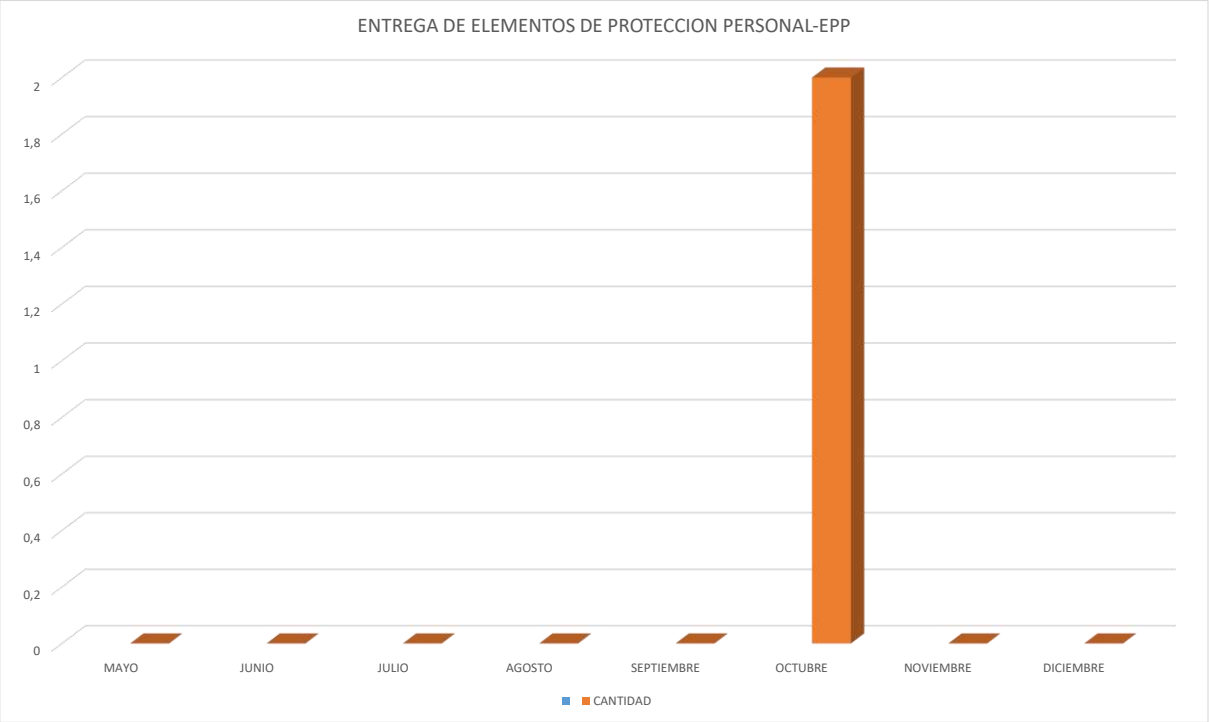

INDICADOR:

EPP= No.TRABAJADORES CON ENTREGA DE EPP EN EL PERIODO / No. TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PERIODO *100%

ENTREGA EPP = No. 2 / No. 11 *100%

EPP= No. 2 ENTREGAS DE EPP EN EL PROYECTO / No. 11 TOTAL DE TRABAJADORES EN OBRA *100%

ENTREGA DE EPP = 1%


SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA		
		
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	INSPECCION DE VOLQUETA
		
INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN VOLQUETA-EXTINTOR	INSPECCION DE EPP	INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN MAQUINARIA-EXTINTOR

SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA		
		
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE MAQUINARIA
		
INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE SEÑALIACION
OBSERVACIONES: Se registra el seguimiento a las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas en obra.		


SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA

REGISTRO DE LAS INSPECCIONES EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

INSPECCIONES EN OBRA	CANTIDAD
INSPECCIÓN DE USO DE EPP	2
INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	1
INSPECCION DE EXTINTOR	2
INSPECCION DE CAMILLA	1
INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	2
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACION	2
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA	4
TOTAL	14

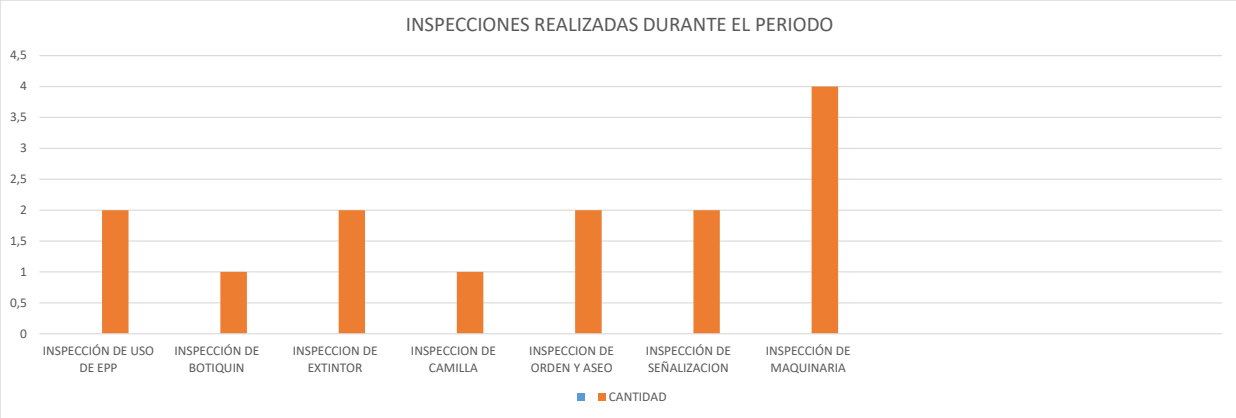

TOTAL DE INSPECCIONES DURANTE EL PERIODO	
SEPTIEMBRE	6
OCTUBRE	14
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	20

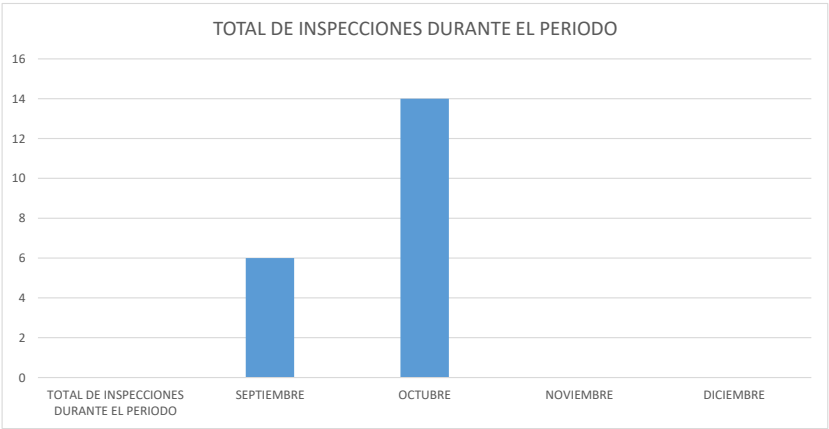

INDICADOR:

INSPECCIONES= No. TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO / No. TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO *100%

INSPECCIONES DURANTE EL PERIODO = No. 14 / No. 14 *100%=1

INSPECCIONES= No. 14 INSPECCIONES REALIZADAS / No. 14 INSPECCIONES PROGRAMADAS *100%

INSPECCIONES DURANTE EL PROYECTO = 20

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA



ANTES : Motociclistas que omiten los controles de trafico - Ingresando al tramo en contravía.



DESPUES: Instalación de señalización y puntos de control de trafico y radios de comunicación en los tramos de intervención.

OBSERVACIONES: Se registran los actos y condiciones inseguras en obra.

REGISTRO DE REPORTE DE LOS ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA

HALLAZGOS POR MES	CANTIDAD ABIERTAS	CANTIDAD CERRADAS
MAYO	0	0
JUNIO	0	0
JULIO	0	0
AGOSTO	0	0
SEPTIEMBRE	0	0
OCTUBRE	1	1
NOVIEMBRE	0	0
DICIEMBRE	0	0
TOTAL	1	1



INDICADOR:

A.C= No. HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL PERIODO *100%=
No. TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS DURANTE EL PERIODO *100%

A.C= 1 HALLAZGOS ABIERTOS DURANTE EL PERIODO *100%=
1 TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS EN EL PERIODO *100%

A.C= TOTAL HALLAZGOS CERRADOS DURANTE EL PROYECTO= 1

5.3.3.8.A Conclusiones

Se puede concluir que durante la ejecución de las actividades en el periodo del presente informe del "CONTRATO DE OBRA: LP-001-2023 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", el contratista continua con la implementación de las actividades en obra, reportando los documentos del personal y maquinaria, los cuales fueron verificados con el acompañamiento del inspector SST del contratista en obra.

Se evidencia las inducciones y charlas de seguridad al personal e instalación de señalización en obra, con el fin de implementar una cultura de autocuidado enfocados a la prevención de riesgos y la mejora continua.

5.3.3.9.A Recomendaciones

Por lo anterior, se realiza al contratista las siguientes recomendaciones:

Reforzar el esquema de señalización vial según lo establecido en el PMT y Mantener visible la señalización en obra, para lo cual debe realizar el mantenimiento periódico e inspecciones rutinarias, con el fin de mantener visible la información a los usuarios del corredor vial sobre las actividades que se encuentra ejecutando en la obra.

Realizar jornadas de orden y aseo para conservar las áreas limpias de trabajo y retirando los obstáculos que puedan representar riesgos y permita evitar accidentes en obra.

Reforzar las charlas y capacitaciones de seguridad, continuar la implementación de las actividades para mantener la cultura del autocuidado, solicita al inspector reforzar las actividades en obra, con el fin de promover la prevención de riesgos y accidentalidad.

Realizar la entrega de los elementos de protección individual al personal de ingreso a obra, personal directo del Consorcio La Giralda, soportando mediante registro fotográfico y firma de entrega la dotación de ingreso.

Realizar la entrega de los exámenes ocupacionales del personal de ingreso a obra, de acuerdo a la resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009.

Presentar las inducciones de ingreso con el soporte y registro fotográfico de la actividad.

Realizar la entrega de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de septiembre de 2024, con la relación del personal vinculado a obra.

CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS

CRIVEN

CONTRATO DE OBRA
No. SG-LP-OP-004-2023



MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE - POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".

INFORME MENSUAL

01 al 31 de octubre de 2024

PMT

B. SABANAGRANDE – ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".

INTRODUCCION

En el presente informe se relacionan las actividades en seguridad y salud en el trabajo SST presentadas por el CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", el proyecto contempla la intervención de mejoramiento de vía mediante la construcción de pavimento rígido, mantenimiento vial y obras de drenaje.

Localización general del Proyecto SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (MUNICIPIO DE SABANAGRANDE), es una vía terciaria que se localiza al occidente del municipio de Sabanagrande, conectando los sectores de SABANANGRANDE a los límites con POLONUEVO – ATLANTICO.

5.3.3.B Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra: En el presente informe se evidencia la implementación de las actividades del área de seguridad y salud en el trabajo SST durante la ejecución de las actividades constructivas en obra, las cuales se verificaron mediante los registros fotográficos anexos, inducciones, inspecciones, capacitaciones, señalización instalada en el tramo de intervención, documentos de equipos y maquinaria, la verificación de los aportes a la seguridad social del personal vinculado al proyecto.



Ubicación del Proyecto

5.3.3.1 A CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DEL SABANAGRANDE – POLONUEVO -MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.





SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA

TRAMO 1	K0+020



SEÑAL - SIO-02 INICIO DE OBRA

TRAMO 1	K0+000



SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO

TRAMO 1	K0+060


5.3.3.1 A CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

		
SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	SEÑAL SR 30 - MAXIMA VELOCIDAD	SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO
TRAMO 1 K0+130	**TRAMO 1** K0+200	**TRAMO 1** K0+260

		
SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA	SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO
TRAMO 1 k0+820	**TRAMO 1** k1+350	**TRAMO 1** k0+800

5.3.3.1 A CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DE LA VIA POLONUEVO A SABANAGRANDE - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

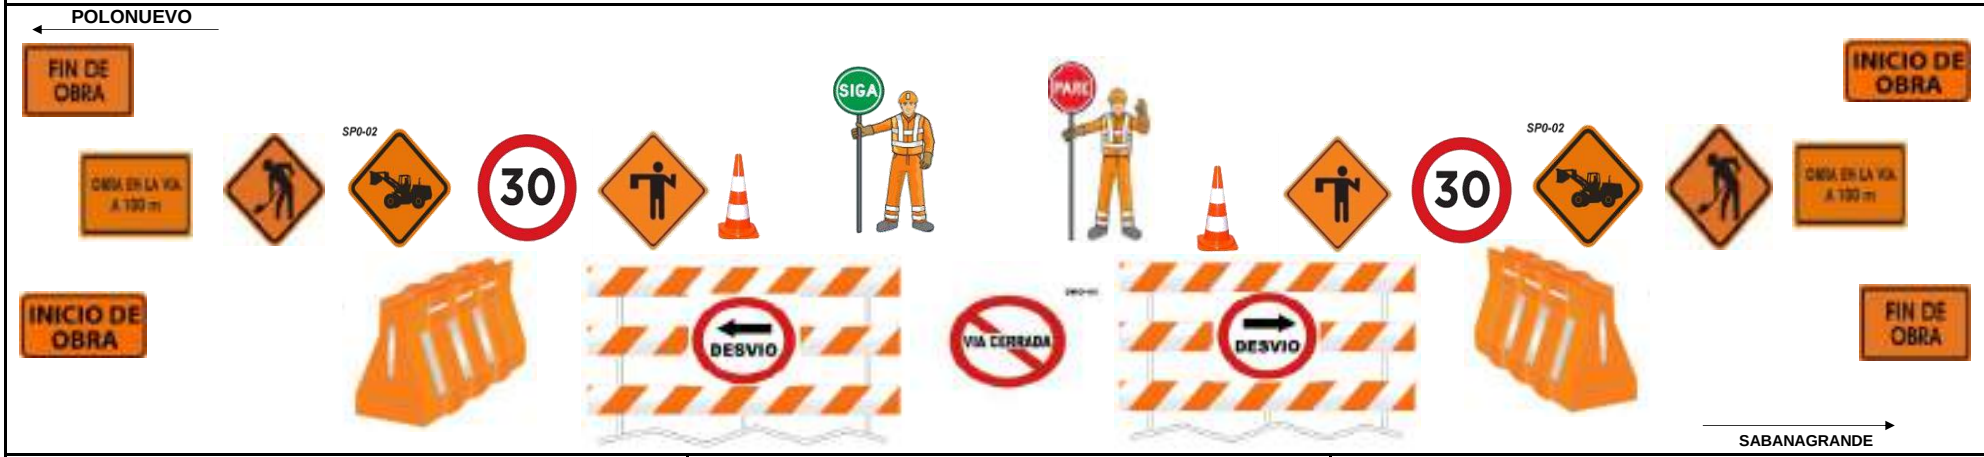



SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA

TRAMO 1	K1+980



SEÑAL - SIO-02 INICIO DE OBRA

TRAMO 1	K2+000



SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO

TRAMO 1	K1+900

5.3.3.1 A CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		



SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	
TRAMO 1	K1+800



DELIMITACIÓN - INSTALACIÓN DE MALETINES O BARRERAS	
TRAMO 1	K0+800



SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO	
TRAMO 1	K1+650



DELIMITACIÓN - INSTALACIÓN DE CINTA DE PELIGRO	
TRAMO 1	k0+300



DELIMITACIÓN - INSTALACIÓN DE MALETINES O BARRERAS	
TRAMO 1	k0+000




SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO	
TRAMO 1	K0+300

OBSERVACIONES: Se registran las señales instaladas en el tramo de Intervención durante la ejecución de las actividades constructivas en el presente periodo.


5.3.3.1 A CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

REGISTRO DE LA SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

SEÑALIZACIÓN EN OBRA	CANTIDAD
SEÑALI - SIO-02 INICIO DE OBRA	2
SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA	2
SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO	2
SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	4
SEÑAL SR 30 - MAXIMA VELOCIDAD	2
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO	2
SEÑAL SIO - 05 DESVIO	2
SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	1
SEÑAL SRO 01 - VIA CERRADA	0
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	2
DELINEADORES	47
MALETINES VIALES	6
PARE y SIGA	6
BARRICADAS METALICAS	5
CONOS	16
TOTAL	99

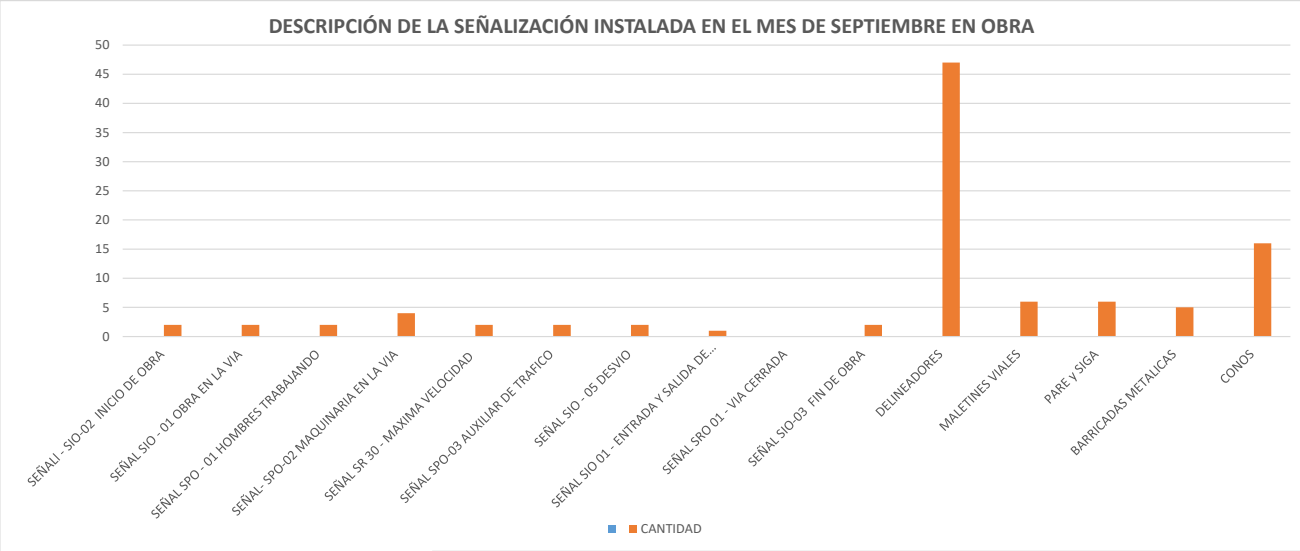

TOTAL DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA POR PERIODO	
SEPTIEMBRE	114
OCTUBRE	99
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0

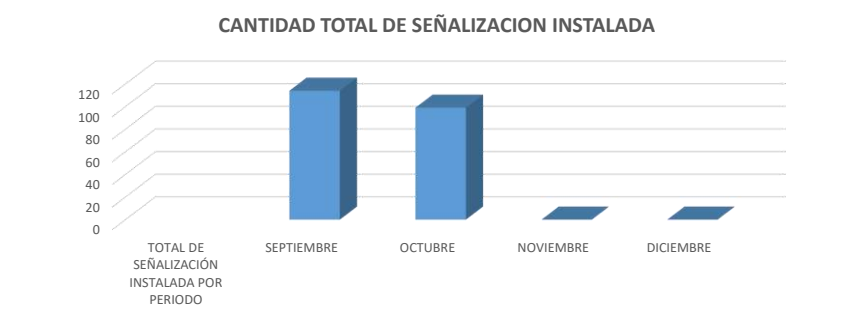


INDICADOR:

SENALIZACION= No. SENALIZACION INSTALADA EN EL FRENTE DE OBRA / No. SEÑALIZACIÓN DEL PMT ESTABLECIDO EN EL FRENTE DE OBRA *100%

SEÑALIZACION= No.99 SEÑALES INSTALADAS EN EL FRENTE DE OBRA / No. 99 SENALES REQUERIDAS EN OBRA *100%

SEÑALIZACION INSTALADA EN OBRA = No.99 / No. 99 *100%

SEÑALIZACION = 100%

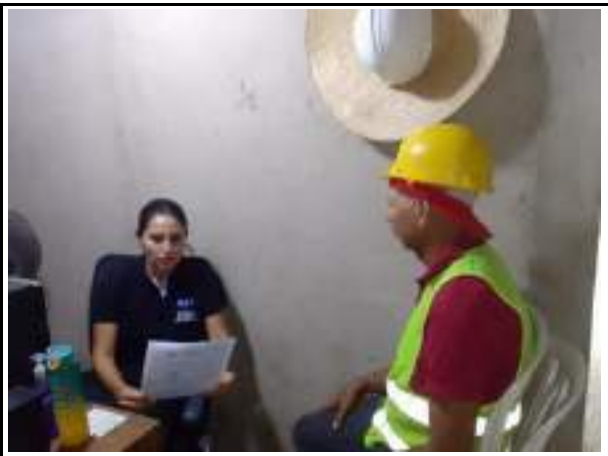
5.3.3.2 A REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA		
		
INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO
		
INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO

OBSERVACIONES: Se registra las inducciones de ingreso de personal de obra durante el periodo.

5.3.3.2 A REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE LAS INDUCCIONES REALIZADAS EN OBRA

INDUCCIONES EN OBRA	CANTIDAD
MAYO	17
JUNIO	1
JULIO	10
AGOSTO	4
SEPTIEMBRE	7
OCTUBRE	6
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	45

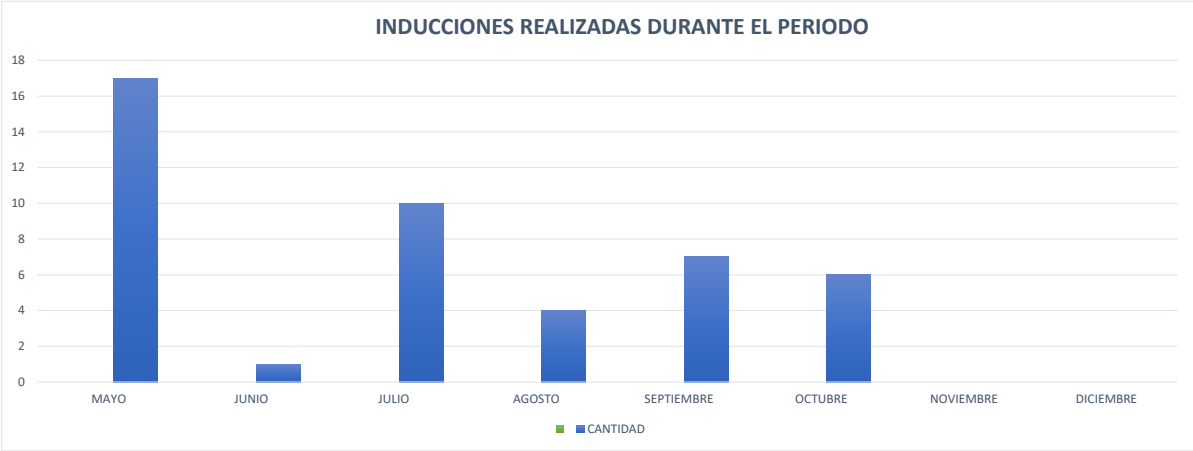

INDICADOR:

INDUCCIONES= No. TOTAL DE INDUCCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO *100%
No. TOTAL DE TRABAJADORES DE INGRESO EN EL PERIODO

INDUCCIONES = No. 45 *100%
No. 45

INDUCCIONES= No. 6 INDUCCIONES REALIZADAS *100%
No. 6 TOTAL DE TRABAJADORES DE INGRESO A OBRA

CUMPLIMIENTO EN INDUCCIONES DE INGRESO A OBRA = 100%

MANO DE OBRA VINCULADA AL PROYECTO DE SABANAGRANDE		
TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	INFORMACION DEL PERIODO	
	No. EMPLEOS DEL PERIODO	ACUMULADO
MONC DEL AIP	20	15
MONC FORANEA	3	9
MOC DEL AIP	0	0
MOC FORANEA	8	21
TOTAL GENERAL	31	45


OBSERVACION: PARA EL PRESENTE PERIODO, EL CONTRATISTA DE SABANAGRANDE REPORTA UN TOTAL DE 31 PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATO. REPORTA 8 PERSONAS MOC Y SE ESTIMA 23 PERSONAS DE MONC.

TOTAL DE TRABAJADORES: 45 PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO.

5.3.3.2 A REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE AUSENTISMO EN OBRA

AUSENTISMO EN OBRA	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

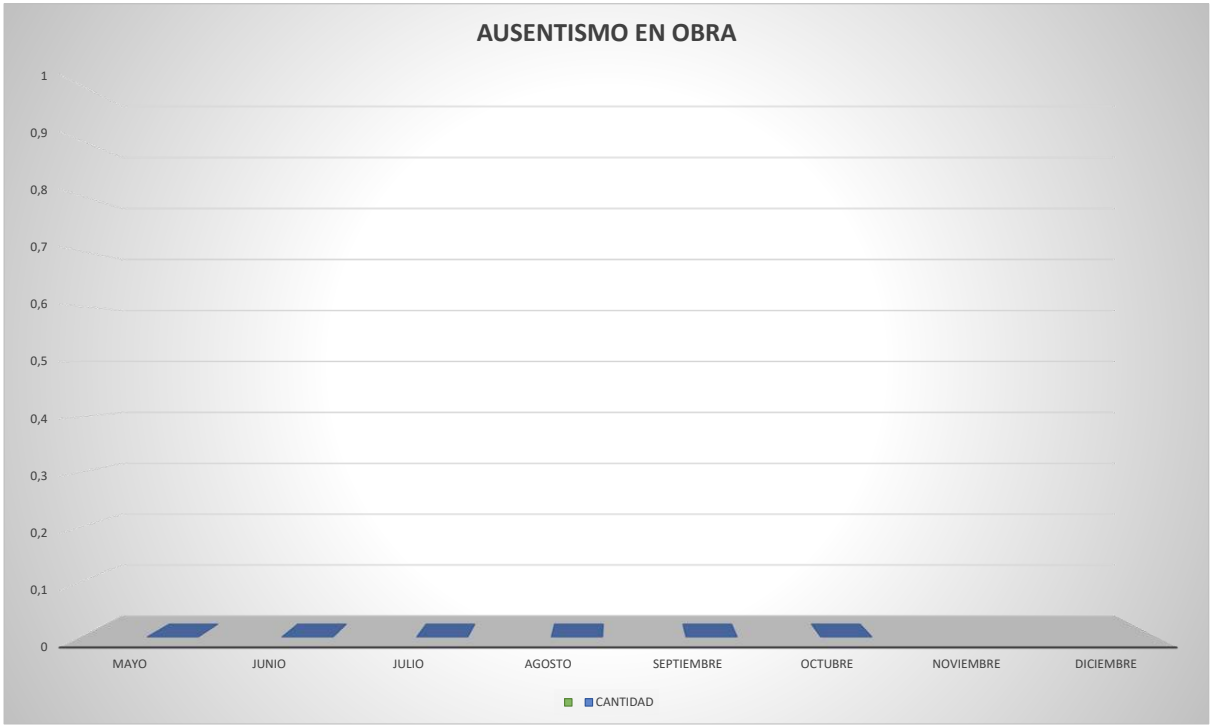

INDICADOR:

AUSENTISMO= No. TOTAL DE HORAS LABORADAS= *100%
No. TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS

AUSENTISMO= No. 0 ASUENTISMO EN OBRA = *100% AUSENTISMO= 0%
(45 Trabajadores)*(8hrs)*(30 DIAS)

5.3.3.3 A REGISTRO DE ACCIDENTES EN OBRA
Observaciones: Durante el periodo del presente informe no se registran accidentes de trabajo.

ACCIDENTES DE TRABAJO	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	1
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	1



INDICADOR:

$$\text{ACCIDENTE LABORAL} = \frac{\text{No. TOTAL ACCIDENTE LABORALES DURANTE EL PERIODO}}{\text{No. TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO}} * 100\%$$

$$\text{ACCIDENTE LABORAL} = \frac{1}{31} * 100\% \qquad \text{ACCIDENTE LABORAL} = 0{,}03\%$$

5.3.3.4 A CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA		
		
CHARLAS DIARIAS	CHARLAS DIARIAS	CHARLAS DIARIAS
		
CHARLAS DIARIAS	CHARLAS DIARIAS	CHARLAS DIARIAS

5.3.3.4 A CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA



CAPACITACIONES AL PERSONAL



CAPACITACIONES AL PERSONAL



CAPACITACIONES AL PERSONAL



CAPACITACIONES AL PERSONAL



CAPACITACIONES AL PERSONAL



CAPACITACIONES AL PERSONAL

OBSERVACIONES: Se registra las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas en obra durante el periodo.

5.3.3.4 A CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA


REGISTGRO DE LA CAPACITACION AL PERSONAL EN OBRA			
ITEM	**TEMA DE LA CAPACITACION**	**ASISTENTES**	**FECHA**
1	RIESGO BIOMECANICO	10	1/10/2024
2	LA IMPORTANCIA DE MANEJO DE HERRAMIENTAS	18	2/10/2024
3	PELIGROS EN LA CONDUCCION	18	8/10/2024
4	QUE ES EPS -IPS	19	9/10/2024
5	IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACION	15	10/10/2024
6	PROTECCION OCULAR -CUIDADO DE LA VISTA	14	11/10/2024
7	RIESGO PUBLICO	15	16/10/2024
8	QUE ES UN PASIVO AMBIENTAL	15	17/10/2024
9	TIPO DE CONTAMINACION	15	18/10/2024
10	RESIDUOS ORGANICOS RECICLABLES	23	24/10/2024
11	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	27	25/10/2024



5.3.3.4 A CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA

REGISTRO DE LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	CANTIDAD
MAYO	9
JUNIO	12
JULIO	14
AGOSTO	12
SEPTIEMBRE	12
OCTUBRE	11
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	70

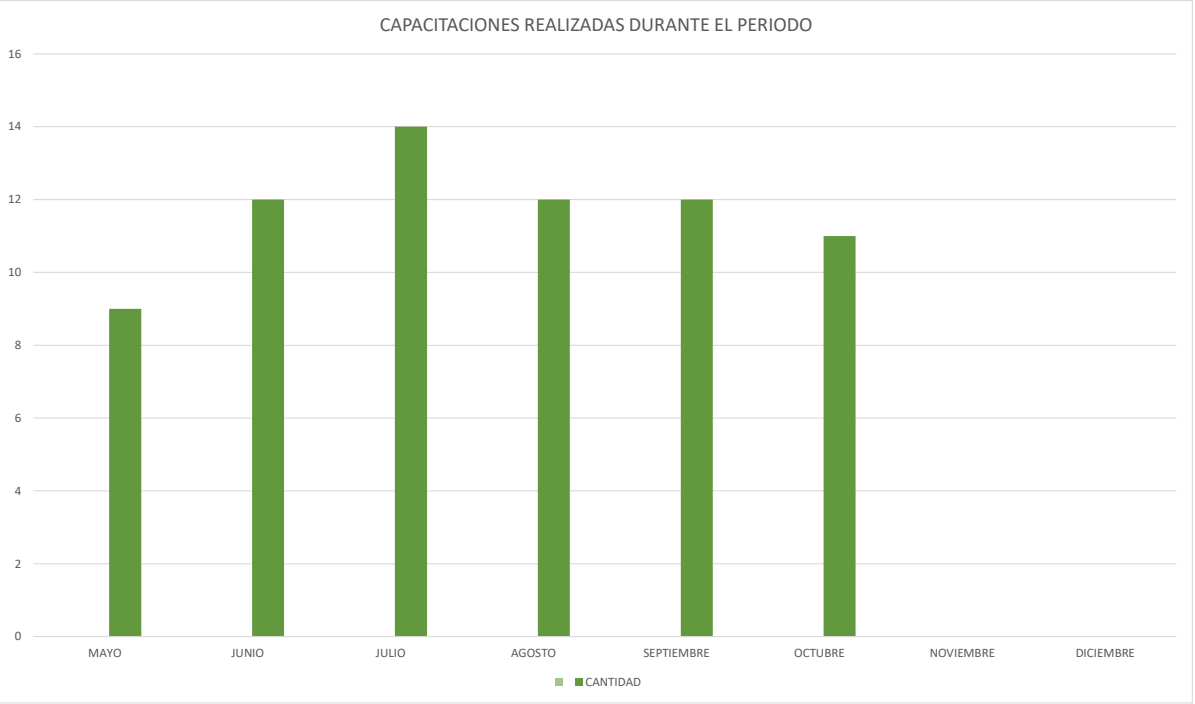

INDICADOR:

CHARLAS= No. CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO / No. TOTAL DE CHARLAS Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO *100%

CHARLAS Y CAPACITACIONES = No. 70 / DURANTE EL PROYECTO No. 70 *100%

CHARLAS = No. 11 CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS / No. 11 TOTAL DE CHARLAS Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100%

CUMPLIMIENTO EN CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL EN OBRA = 100%

5.3.3.5 A ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA		
		
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
		
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

5.3.3.5 A ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA		
		
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
		
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


5.3.3.5 A ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA		
		
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

OBSERVACIONES: Se registro de las entregas de los elementos de protección personal a los trabajadores en obra durante el presente periodo.

5.3.3.5 A ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA

INSPECCION DE USO Y ENTREGA DE EPP	CANTIDAD
MAYO	17
JUNIO	1
JULIO	10
AGOSTO	4
SEPTIEMBRE	7
OCTUBRE	28
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	67

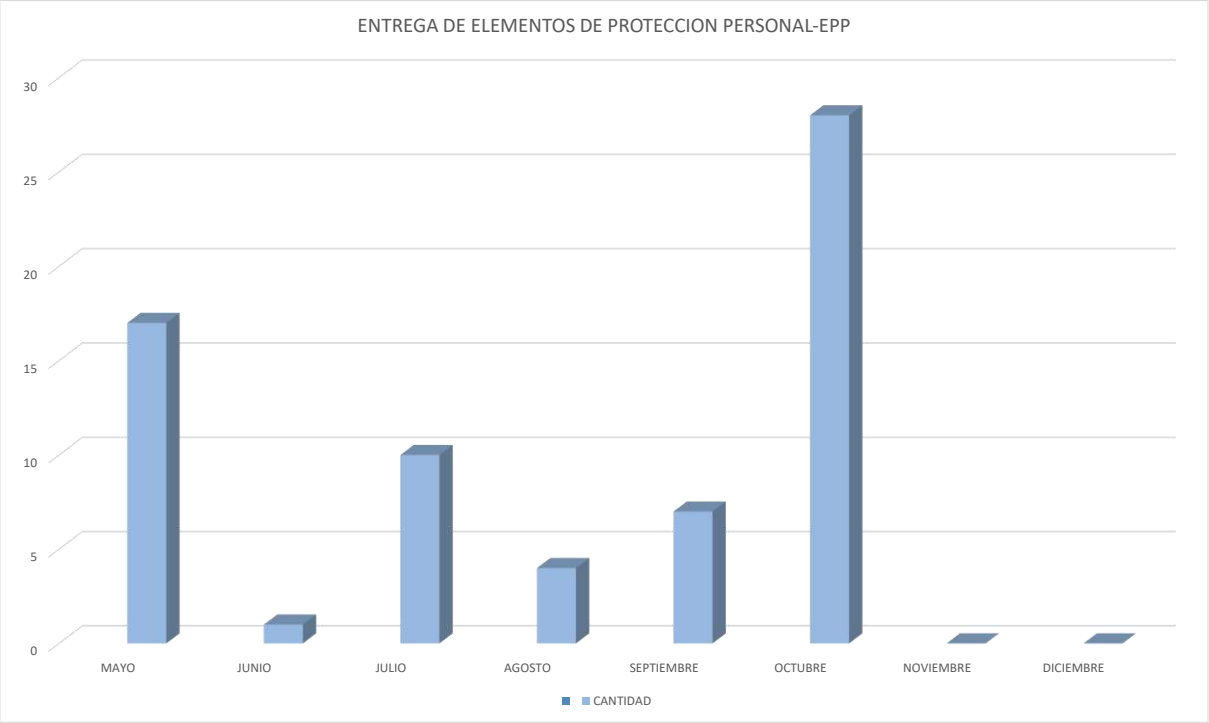

INDICADOR:

EPP= No.TRABAJADORES CON USO Y ENTREGA DE EPP EN EL PERIODO / No. TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PERIODO *100%

EPP= No. 28 TRABAJADORES CON USO Y ENTREGA DE EPP EN EL PERIODO / No. 31 TOTAL DE TRABAJADORES EN OBRA *100%

ENTREGA EPP = No. 28 *100%
DURANTE EL PERIODO No. 31

ENTREGA DE EPP = 90%

5.3.3.6 A SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA		
		
INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE VOLQUETAS	INSPECCION DE MAQUINARIA
		
INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN MAQUINARIA	INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN MAQUINARIA	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

5.3.3.6 A SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA

		
INSPECCION DE MAQUINARIA	DELIMITACION DE AREAS - LAVADO DE MIXER	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
		
SEÑALIZACIÓN DE AREAS - USO DE EPP	SEÑALIZACIÓN DE AREAS - USO DE EPP	INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA - CAMILLA DE EMERGENCIAS

5.3.3.6 A SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA		
		
INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS - EXTINTOR	INSPECCION DE PUNTO ECOLOGICO	INSPECCION DE EQUIPOS MENORES
		
SEÑALIZACIÓN DE AREAS EN OBRA	INSPECCION DE EQUIPOS MENORES	INSPECCION DE EQUIPOS MENORES

5.3.3.6 A SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA

		
INSPECCION DE PUNTO ECOLOGICO	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS
		
INSPECCION DE EQUIPOS MENORES	INSPECCION DE ACTIVIDADES EN OBRA	INSPECCION DE VOLQUETA

5.3.3.6 A SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA		
		
INSPECCION DE VOLQUETA	INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE MAQUINARIA
		
INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE PUNTOS DE ACOPIOS SEÑALIZADOS

5.3.3.6 A SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA		
		
INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE VOLQUETA	INSPECCION DE ACTIVIDADES EN OBRA
		
VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	PUNTO DE HIDRATACION


5.3.3.6 A SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA		
		
VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	INSPECCION DE VOLQUETA	INSPECCION DE MAQUINARIA
		
INSPECCION DE VOLQUETA	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	INSPECCION DE MAQUINARIA

OBSERVACIONES: Se registra el seguimiento a las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas en obra.


5.3.3.6 A SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA

REGISTRO DE LAS INSPECCIONES EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

INSPECCIONES EN OBRA	CANTIDAD
INSPECCIÓN DE USO DE EPP	28
INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	1
INSPECCION DE EXTINTOR	3
INSPECCION DE CAMILLA	1
INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS	5
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACION	4
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA	4
INSPECCION LOCATIVA Y DE ORDEN Y ASEO	12
PERMISOS DE TRABAJO	20
INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	8
TOTAL	86

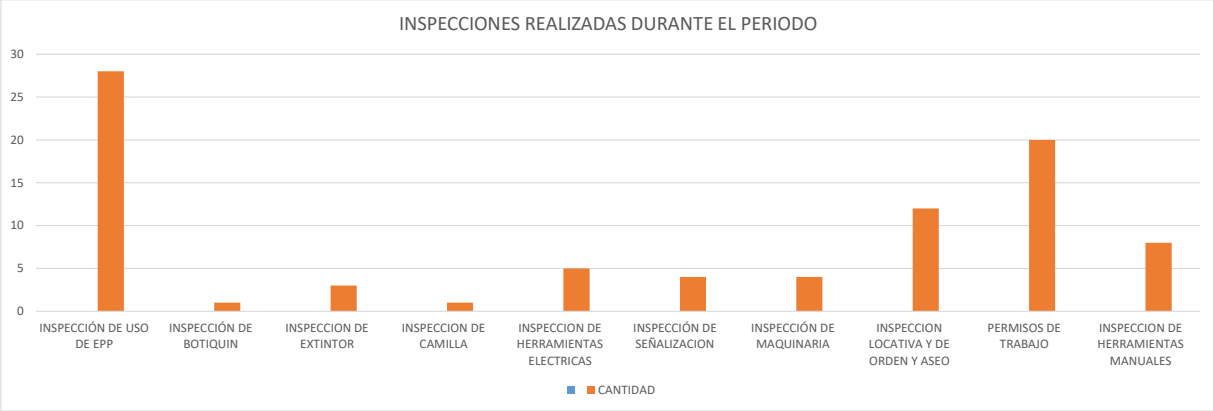

TOTAL DE INSPECCIONES DURANTE EL PERIODO	
SEPTIEMBRE	68
OCTUBRE	122
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	190

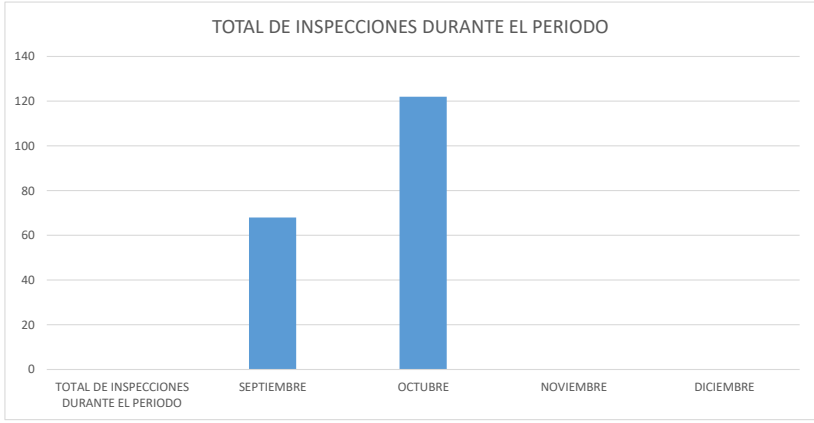

INDICADOR:

INSPECCIONES= No. TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO *100%
No. TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO

INSPECCIONES = No. 86 *100%
DURANTE EL PERIODO No. 86

INSPECCIONES= No. 86 INSPECCIONES REALIZADAS *100%
No. 86 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES DURANTE EL PROYECTO = 190

5.3.3.7 A REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA



ANTES : Vehículos que omiten los controles de trafico - Ingresando al tramo en contravía.



DESPUES: Instalación de señalización y puntos de control de trafico y radios de comunicación en los tramos de intervención.



ANTES : Se evidencia el colaborador sin uso de epp-guantes.




DESPUES: Se observa entrega de los elementos de protección personal epp al colaborador-guantes.

OBSERVACIONES: Se registran los actos y condiciones inseguras en obra.

5.3.3.7 A REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA

REGISTRO DE REPORTE DE LOS ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA

HALLAZGOS POR MES	CANTIDAD ABIERTAS	CANTIDAD CERRADAS
MAYO	0	0
JUNIO	1	1
JULIO	1	1
AGOSTO	1	1
SEPTIEMBRE	2	2
OCTUBRE	2	2
NOVIEMBRE	0	0
DICIEMBRE	0	0
TOTAL	7	7

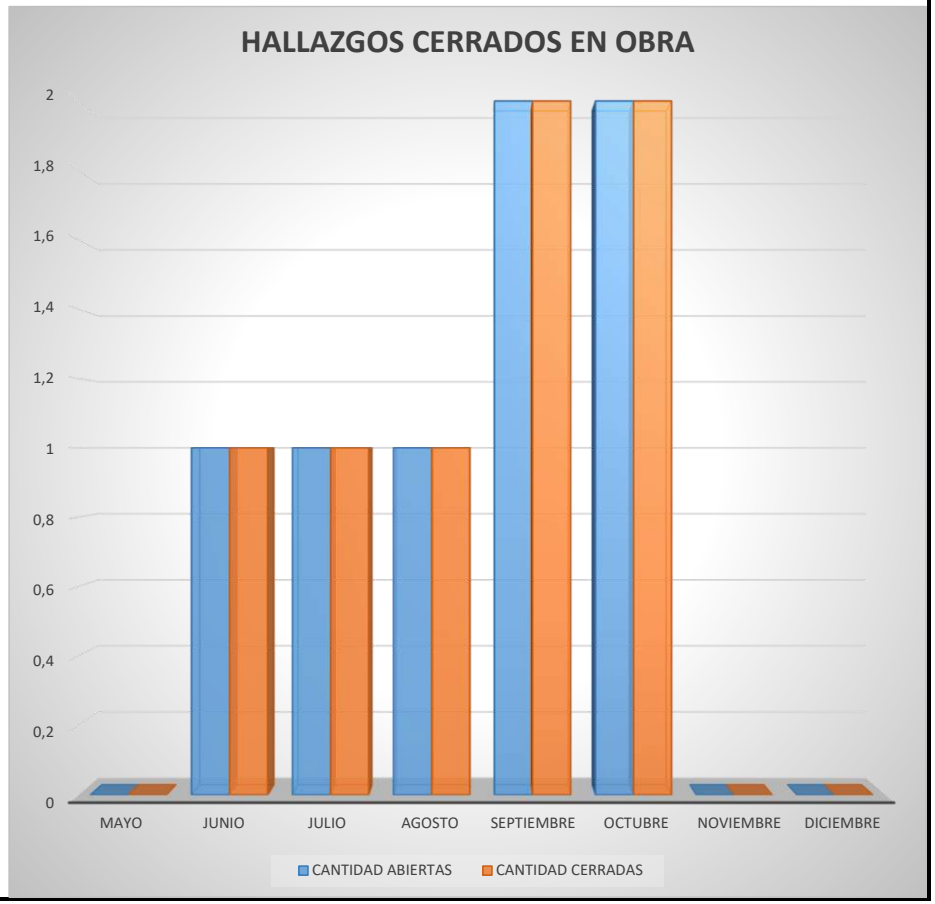

INDICADOR:

A.C= No. HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL PERIODO *100%= / No. TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS DURANTE EL PERIODO *100%

A.C= 2 HALLAZGOS ABIERTOS DURANTE EL PERIODO *100%= / 2 TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS EN EL PERIODO *100%

A.C= TOTAL HALLAZGOS CERRADOS DURANTE EL PROYECTO= 7

5.3.3.8.B Conclusiones

Durante la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía “MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, Con el objetivo de mantener y mejorar los estándares de seguridad y salud en la empresa, durante la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía, el resultado de las actividades implementadas en la prevención y la protección de la seguridad y la salud en el trabajo.

Cultura de prevención: La implementación de actividades continuas de capacitación, inspecciones regulares y el fomento de una mentalidad proactiva en materia de seguridad y salud, incentivaron una cultura donde la prevención de riesgos ha sensibilizado al personal en la mejora continua y el autocuidado.

Comunicación asertiva y colaboración efectiva: La interacción constante con los trabajadores y la comunidad local facilitó una comunicación asertiva con los usuarios del corredor vial y los trabajadores, se identificaron riesgos potenciales y se tomaron medidas preventivas de manera conjunta.

Adaptabilidad y respuesta proactiva: La capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del proyecto y responder rápidamente a los nuevos riesgos o desafíos emergentes fue una constante, la flexibilidad en la aplicación de medidas de seguridad demostró un enfoque proactivo y ágil.

Prevención de incidentes graves: La ausencia de incidentes graves o accidentes significativos a lo largo del proyecto es un indicativo del éxito en la gestión de SST. Esto refleja la eficacia de las medidas preventivas implementadas y el compromiso de todos los involucrados.

Control de tráfico en obra: se recibe el apoyo de las autoridades locales del sector para verificar la buena circulación de los usuarios del corredor vial, realizando el seguimiento en obra y fortaleciendo con el acompañamiento a los puntos de control, conservando el orden y que los usuarios acaten las indicaciones y/o recomendaciones de los auxiliares de tráfico en obra.

5.3.3.9.B Recomendaciones

Con el fin de mantener el objetivo y mejorar los estándares de seguridad y salud en la empresa, durante la ejecución del proyecto, se implementó una gestión proactiva de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), se derivan las siguientes recomendaciones:

Reforzar el esquema de señalización vial según lo establecido en el PMT y Mantener visible la señalización en obra, para lo cual debe realizar el mantenimiento periódico e inspecciones rutinarias, con el fin de mantener visible la información a

los usuarios del corredor vial sobre las actividades que se encuentra ejecutando en la obra.

Realizar jornadas de orden y aseo para conservar las áreas limpias de trabajo y retirando los obstáculos que puedan representar riesgos y permita evitar accidentes en obra.

Reforzar las capacitaciones o charlas diarias al personal, fomentar la cultura del autocuidado, el valor del estar sano y ser útil, el valor de tener un trabajo, el valor de la familia, influyen en las decisiones de los trabajadores para promover y prevenir los accidentes en obra.

Mantener el registro de los accidentes en cero, mediante la atención de los hallazgos que se observan en obra para la atención y cierre de los actos y condiciones inseguras.

Reforzar los tramos de intervención con personal para el control de tráfico, con el fin de fomentar la conciencia sobre seguridad vial y riesgos asociados a la comunidad del sector, el consorcio establece el contacto con los usuarios, realizando acercamiento a través de los puntos de control con el fin de salvaguardar la seguridad en la movilidad del sector.

Estas recomendaciones apuntan a consolidar y fortalecer los logros alcanzados en materia de SST durante el transcurso del proyecto, asegurando que los estándares de seguridad se mantengan y se continúe mejorando en la prevención de riesgos.



Inspector SISO: Mary Miranda E.

Bogotá, 07 de octubre de 2024

Señores
CONSORCIO ODESSA INTERVENTORIA ATLANTICO
Ing. Oscar Javier Garzón Díaz
Representante Legal

Referencia: Contrato SG-LP-OP-004-2023 cuyo objeto corresponde a "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE - POLONUEVO MUNICIPIO DE SABANAGRANDE"

Asunto: Diseño Geométrico Versión Final.

Cordial Saludo:

Se ha recibido por parte de ustedes, mediante correo eléctrico con fecha del 04 de octubre del año 2024, los siguientes archivos:

- DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL SABANAGRANDE POLONUEVO 01102024
- DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL SABANAGRANDE POLONUEVO 01102024
- DISEÑO DE VIA SABANAGRANDE POLONUEVO 26 DE AGOSTO
- REPORTE DE CURVAS VERTICALES DE VIA SABANAGRANDE POLONUEVO 26 DE AGOSTO
- DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL SABANAGRANDE POLONUEVO 01102024
- INFORME DE DIS GEOMETRICO VF

La revisión se realizará con base en los comentarios realizados en el comunicado AERO-VIASABANAPOLONUEVO-010-2024.

Para su revisión y comentarios a que haya lugar.

"…8 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN – SEGURIDAD VIAL…"

Observación 1: De acuerdo con las características del proyecto se determina cuales señales se implementarán en el proyecto y donde serán ubicadas, por lo que se debe determinar su cantidad, ubicación e implantación en plano del proyecto.

Comentario Final: Una vez analizada la información entregada**, se da la NO objeción al Diseño Geométrico Versión Final** enviado vía email el 04 de octubre de 2024, diseñado para el Contrato SG-LP-OP-004-2023 cuyo objeto corresponde a "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE - POLONUEVO MUNICIPIO DE SABANAGRANDE"

ALCANCE Y LIMITACIONES DEL CONCEPTO

Los conceptos que se manifiestan en el presente documento, se deben entender como recomendaciones de aporte hacia buen y debido desarrollo del Contrato.

La responsabilidad, la seguridad, estabilidad y garantía de los productos presentados por el Contratista, así como de los trabajos ejecutados y del cumplimiento de lo estipulado contractualmente, no se afectan ni se modifican por el contenido del presente Concepto.

Todos los productos de Consultoría y los procesos constructivos, deberán dar el debido cumplimiento en cuanto a materiales, procesos, controles y trazabilidad especificados por los especialistas del Contrato, durante todas las etapas de ejecución.

Atentamente;

DIANA PATRICIA APONTE LOZANO
Especialista En Geotecnia Vial y Pavimentos
cc Archivo
Elaboro: DPAL
Revisó: PJMG

PEDRO JOSÉ MORA G.
Especialista en Vías, Aeropuertos y Pavimentos
R/L AEROTYP INGENIEROS SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ELMEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

7

SEPTIEMBRE 2024

CONTENIDO

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.1. MAQUINARIA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 de noviembre de 2024 (Día) (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MES DE INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 **CONTRATO No.** 4805 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIA LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) VIA SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (SABANA GRANDE)

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ODESSA

SECTOR: VIA LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) VIA SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (SABANA GRANDE)

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Vehículo tipo camioneta	VOLSWAGEN AMAROK PLACAS GPO 496	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Vehículo tipo camioneta	SSANGYONG KYRON D20DT PLACAS RGM 639	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	MARCA AKT DE PLACAS UXJ82F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	MARCA VICTORY DE PLACAS GNU37G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	MARCA YAMAHA DE PLACAS KLI01E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Equipo de Oficina																															
Computador 1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Computador 2	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impresora 1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Camara Fotografica 1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cámara de video	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Equipo de Topografia																															
NIVEL AUTOMATICO	TOPCON REFERENCIA AT-B4A SERIAL WP061511	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ESTACION TOTAL ELECTRONICA	TOPCON GTS-229 SERIAL UP0714	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EP 0083 ESTACIÓN TOTAL - GTS-229 SERIAL UP0714 fecha de vencimiento de calibración el 4 de marzo de 2025.
EP 0250 NIVEL DE PRECISIÓN TOPCON REFERENCIA AT-B4A SERIAL WP061511 con fecha de vencimiento de calibración el 4 de marzo de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 de noviembre de 2024 (Día) (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MES DE INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 **CONTRATO No.** 4805 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIA LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) VIA SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (SABANA GRANDE)

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ODESSA

SECTOR: VIA LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) VIA SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (SABANA GRANDE)

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula No.: 01113-10647 CPITV

Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 0820251744 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 OCT 2024 AL 31 OCT 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No.: PONEDERA: LP-001-2023 SABANAGRANDE: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA SABANAGRANDE: CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO - CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOHN ANDRES ARIAS HUERTAS	1057185459	DIRECTOR	$ 6.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CGR S.A.S	$ 6.800.000	$ 473.300	V	NUEVA EPS	7947229510	$ 272.000	PORVENIR	7947229510	$ 1.156.000	$ 272.000			
2	RONALD OSWALDO MOLINARES	74377185	ING RESIDENTE	$ 5.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 5.100.000	$ 355.000	V	NUEVA EPS	7947416035	$ 204.000	PORVENIR	7947416035	$ 816.000	$ 204.000			
3	DANIEL ARTURO LEON ACOSTA	1018478900	ING RESIDENTE	$ 3.570.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70%	CGR S.A.S	$ 3.600.000	$ 250.600	V	NUEVA EPS	7943928414	$ 144.000	PROTECCION	7943928414	$ 576.000	$ 144.000			
4	ALBA ROCIO FLOREZ	51730932	PROF SOCIAL	$ 3.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 3.750.000	$ 130.500	V	SANITAS SA	7947416035	$ 75.000	COLPENSIONES	7947416035	$ 300.000	$ 75.000			
5	LINA PATRICIA CARVAJAL SUAREZ	37900092	ESP. AMBIENTAL	$ 3.050.000	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	50%	LINA PATRICIA C. S.	$ 3.050.000	$ 212.300	V	NUEVA EPS	31139382	$ 381.300	COLFONDOS	31139382	$ 488.000	$ -			
6	RITO ALBERTO BLANCO MONTAÑEZ	88157739	INSPECTOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 2.200.000	$ 153.200	V	SANITAS SA	7947416035	$ 88.000	PORVENIR	7947416035	$ 352.000	$ 88.000			
7	CESAR AUGUSTO LUNA GUTIERREZ	10180032	INSPECTOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CGR S.A.S	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	7947416035	$ 88.000	COLPENSIONES	7947416035	$ 352.000	$ 88.000			
8	MARY MIRANDA ERAZO	46646651	INSPECTOR SST	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	7947416035	$ 88.000	PORVENIR	7947416035	$ 352.000	$ 88.000			
9	LIZ DAYANNA PEREZ NORIEGA	1042353465	SECRETARIA	$ 1.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 1.300.000	$ 6.800	I	NUEVA EPS	7947416035	$ 52.000	PROTECCION	7947416035	$ 208.000	$ 52.000			
10																																															
11																																															
12																																															
13																																															
14																																															
N																																															
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 30.110.000																																											

El Interventor adiunta la certificación de fecha 5/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOHN ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES INFORME MENSUAL: 01 OCT 2024 AL 31 OCT 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No: PONEDERA: LP-001-2023 / SABANAGRANDE: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA / SABANAGRANDE: CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1354523	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 305.995.526	$ -
2023	1354523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.223.982.102	$ 778.482.941
			TOTAL			$ 1.529.977.628	$ 778.482.941

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.529.977.628**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**01 Feb 2024 - 29 Feb 2024**	$ -	$ -	**$ -**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.529.977.628	$ 1.529.977.628	4780 - 27/05/2024	
2	**01 Mar 2024 - 31 Mar 2024**	$ 55.125.120	$ 10.473.773	**$ 65.598.893**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.464.378.735	$ 1.464.378.735	4780 - 27/05/2024	
3	**01 Abr 2024 - 30 Abr 2024**	$ 58.416.120	$ 11.099.063	**$ 69.515.183**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.394.863.552	$ 1.394.863.552	6408 - 26/06/2024	
	ANTICIPO				**$ 257.139.097**			1354523 de 11/12/2023	**$ 1.137.724.455**		2866 - 18/04/2024	
4	**01 May 2024 - 31 May 2024**	$ 75.486.280	$ 14.342.393	**$ 89.828.673**	$ 15.097.256	**$ 74.731.417**	$ 242.041.841	1354523 de 11/12/2023	$ 1.062.993.038	$ 1.305.034.879	6520 - 27/06/2024	
5	**01 Jun 2024 - 30 Jun 2024**	$ 78.165.520	$ 14.851.449	**$ 93.016.969**	$ 15.633.104	**$ 77.383.865**	$ 226.408.737	1354523 de 11/12/2023	$ 985.609.173	$ 1.212.017.910	9446 - 22/08/2024	
6	**01 Jul 2024 - 31 Jul 2024**	$ 81.328.400	$ 15.452.396	**$ 96.780.796**	$ 16.265.680	**$ 80.515.116**	$ 210.143.057	1354523 de 11/12/2023	$ 905.094.057	$ 1.115.237.114	10287 - 04/09/2024	
7	**01 Ago 2024 - 31 Ago 2024**	$ 84.838.620	$ 16.119.338	**$ 100.957.958**	$ 16.967.724	**$ 83.990.234**	$ 193.175.333	1354523 de 11/12/2023	$ 821.103.823	$ 1.014.279.156		
8	**01 Sep 2024 - 30 Sep 2024**	$ 78.927.560	$ 14.996.236	**$ 93.923.796**	$ 51.302.914	**$ 42.620.882**	$ 141.872.419	1354523 de 11/12/2023	$ 778.482.941	$ 920.355.360		
9	**01 Oct 2024 - 31 Oct 2024**	$ 97.634.600	$ 18.550.574	**$ 116.185.174**	$ 19.526.920	**$ 96.658.254**	$ 122.345.499	1354523 de 11/12/2023	$ 681.824.687	$ 804.170.186		
	TOTALES	**$ 609.922.220**	**$ 115.885.222**	**$ 725.807.442**	**$ 134.793.598**		**$ 122.345.499**		**$ 681.824.687**	**$ 804.170.186**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 459.166.320	$ 87.241.601	$ 546.407.921
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 150.755.900	$ 28.643.621	$ 179.399.521
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 609.922.220**	**$ 115.885.222**	**$ 725.807.442**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOHN ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

FECHA DE INICIO: 19 de diciembre de 2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14 de diciembre de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.529.977.628,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.529.977.628,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 152.997.762,80	1	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	$ 257.139.097,10	1	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 305.995.525,60	1	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 458.993.288,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **M-100217062**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 152.997.762,80	19	12	2023	14	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 257.139.097,10	19	12	2023	14	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 305.995.525,60	19	12	2023	14	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 458.993.288,40	19	12	2023	14	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **M-100217062**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:
-

OBSERVACIONES:
Polizas actualizadas con la Porroga No. 1.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto

Firma
Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula No.: 01113-10647 CPITV

Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 0820251744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.21 14:35:30 -05:00

Código de Seguridad: 2ZIRAeIpVrrAZ7wD8329gQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 5 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2817220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 84-84-2022-1207-P-05-PP01270000000031-2005

No. PÓLIZA	9-1002217052	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14868951	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/12/2023	24:00 Horas Del	14/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ODESSA	No. DOC. IDENTIDAD	901.513.695-6
DIRECCIÓN	CL 150 N 16-56 OF 4001	TELÉFONO	6147590
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-1
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE PRORROGA LA VIGNEICA DEL CONTRATO HASTA EL 14/12/2024. SEGUN CONTRATO NÚMERO 4805 DE 2023
PRORROGA NÚMERO UNO (01) DE 2024.
-
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA NO SE MODIFICAN.
-
OBJETO:***
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4805-2023 , CUYO OBJETO ES: SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/01/2024	24:00 Horas Del 14/06/2025	152.997.702,80	319.618,61
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 23/01/2024	24:00 Horas Del 14/06/2025	257.139.897,10	537.176,14
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/01/2024	24:00 Horas Del 14/12/2027	305.995.525,60	637.581,37
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 14/12/2024	24:00 Horas Del 14/12/2029	458.993.288,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.175.125.673,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIESGOS Y SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.493.934,12
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.493.934,12
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	283.847,48
TOTAL A PAGAR	$	1.777.781,60

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADOS A LA CARÁTULA FOLIO NÚMERO DE LA NUMERACIÓN DE LA PÓLIZA Y FIRMA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000959-D001

No.PÓLIZA	P-100217062	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14866951	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/12/2023	24:00 Horas Del	14/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO 4805 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1."

.

QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

.

EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

.

LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

.

QUE EL CONSORCIO ODESSA CON NIT. 901.513.685-6 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, GARANTIZADO Y AFIANZADO.

.

QUE EL CONSORCIO ODESSA CON NIT. 901.513.685-6 ESTÁ INTEGRADO POR:
- CGR S.A.S CON NIT. 830.076.683-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 95%
- CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S CON NIT. 900.804.544-8 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 5%

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 830076683 (PART. 95,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900804544 (PART. 5,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ODESSA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PUGA - AMP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100217062** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ODESSA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2** , expedida por la Compañía en **21/02/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **21** días del mes **FEBRERO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO -MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

FECHA DE INICIO: 19 de diciembre de 2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 14 de diciembre de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2023 (Ponedera) SG-LP-OP-004-2023 (Sabanagrande) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. 00 FECHA DE VERSIÓN: 1/12/2023

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: diciembre-24

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 80 No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 82

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X N ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	1 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
Satisfacción del cliente = Calificación de los clientes	4,60	Meta: Lograr que la calificación de los clientes sea mayor o igual a 4,0 sobre 5,0. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficacia en compras y subcontrataciones = Productos y servicios entregados o desarrollados en los tiempos preestablecidos/Total productos entregados y servicios desarrollados	100%	Meta: ≥90%. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Proveedores y subcontratistas calificados = Compras (subcontrataciones) a proveedores (subcontratistas) aprobados/Total compras (subcontrataciones) realizadas	100%	Meta: ≥90%. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficiencia en la ejecución del proyecto = Costo rea/Presupuesto interno	1,0	Meta: ≤1. Periodicidad: Mensual. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficacia en la entrega de informes al cliente = Informes entregados en los plazos predeterminados por el cliente/Total informes entregados	100%	Meta: ≥80%. Periodicidad: Mensual. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Desempeño de personal = Calificación en las evaluaciones de desempeño de los trabajadores	4,5	Meta: ≥4 sobre 5. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Capacitación y entrenamiento de personal = Cursos y/o talleres/trabajador	12 Horas/trabajador	Meta: 12 horas/trabajador. Periodicidad: Anual. No aplica, teniendo en cuenta que la medición de dicho indicador se realiza anual.
Equipos calibrados = Equipos calibrados/Total equipos utilizados para los ensayos	100%	Meta: 100%. Periodicidad: Mensual. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficacia de acciones correctivas y preventivas = Número acciones correctivas y preventivas cerradas en el plazo preestablecido/Total acciones correctivas y preventivas formuladas	100%	Meta: ≥90%. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficiencia de acciones correctivas y preventivas = Número de acciones reformuladas/Número de acciones formuladas	0%	Meta: ≤5%. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:


7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Máquina de ensayo a compresión	R & R	1805AH23192	nov-23	CF001 del 17/11/2023	nov-24	
2	Maquina de Ensayos a Flexión - Eléctrica 2 kN a 50 kN	RYR	7130320356	nov-23	CF 152 del 17/11/2023	nov-24	
3	Balanza electronica	LEXUS	YS. 161439	nov-23	CB 177 del 17/11/2023	nov-24	
4	Estación Total	TOPCON GTS-229	UP0714	sep-24	CET2863 del 04/09/2024	mar-25	
4	Nivel de precisión	TOPCON AT-B4A	WP061511	sep-24	CNA3148 del 04/09/2024	mar-25	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma

Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula No.: 01113-10647 CPITV

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.7 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO X (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 239278450 **BANCO** BANCO DE BOGOTÁ SUCURSAL: Calle 100 # 9 a – 45 Piso 2

ANTICIPO OTORGADO: 20 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 257.139.097,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 2	7-jun-24	CONSORCIO ODESSA	$ 20.553.400	1	COSTOS DE PERSONAL MARZO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 2	7-jun-24	CONSORCIO ODESSA	$ 9.380.000	2	OTROS COSTOS DIRECTOS MARZO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 3	7-jun-24	CONSORCIO ODESSA	$ 21.829.800	1	COSTOS DE PERSONAL ABRIL 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 3	7-jun-24	CONSORCIO ODESSA	$ 10.430.000	2	OTROS COSTOS DIRECTOS ABRIL 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 4	20-ago-24	CONSORCIO ODESSA	$ 31.765.900	1	COSTOS DE PERSONAL MAYO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 4	20-ago-24	CONSORCIO ODESSA	$ 7.580.000	2	OTROS COSTOS DIRECTOS MAYO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 5	20-ago-24	CONSORCIO ODESSA	$ 32.449.200	1	COSTOS DE PERSONAL JUNIO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 5	20-ago-24	CONSORCIO ODESSA	$ 8.444.000	2	OTROS COSTOS DIRECTOS JUNIO 2024

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DE PERSONAL	$ 202.598.300,00	$ 106.598.300,00	$ -	$ 106.598.300,00	$ 96.000.000,00
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 54.540.797,00	$ 35.834.000,00	$ -	$ 35.834.000,00	$ 18.706.797,00
TOTALES		**$ 257.139.097,00**	**$ 142.432.300,00**	**$ -**	**$ 142.432.300,00**	**$ 114.706.797,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (SEPTIEMBRE-202 $ 14.323,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 100.014,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
427202	$ 2.854,00	$ -	may-24	8/08/2024	$ 2.854,00
427202	$ 36.940,00	$ -	jun-24	8/08/2024	$ 39.794,00
427202	$ 24.889,00	$ -	jul-24	8/08/2024	$ 64.683,00
715202	$ 21.008,00	$ -	ago-24	9/05/2024	$ 85.691,00
81272	$ 14.323,00	$ -	sep-24	17/10/2024	$ 100.014,00

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma:
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820251744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Pago exitoso

Número de autorización 427202

jueves, 08 de agosto de 2024, 3:44:28 PM

Detalle

$64,683.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******9639
Descripción:	RENDIMIENTOS MAYO JUNIO Y JULIO
Fecha y hora inicio transacción	2024-08-08 3:41:30
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	75663
Código Único de Seguimiento	832104046
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	75663
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/08/2024
Ticket ID:	75663
Transacción/CUS:	832104046
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS MAYO JUNIO Y JULIO
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	64683
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

11 de junio de 2024

CERTIFICACION

El BANCO DE BOGOTÁ, manifiesta por medio de este documento que la empresa **CONSORCIO ODESSA**, identificado(a) con NIT **901.513.605-6**, esta vinculado al Banco con el siguiente(s) producto(s),

CTA DE AHORROS No. 239278450, rendimientos generados al 31 de mayo de 2024.

31/05/2024	2,854.00

En este mismo sentido, se aclara que el presente certificado se refiere únicamente al producto(s) anteriormente mencionado(s).

Atentamente,

Firma Autorizada
Banca Pyme
Gerencia Pyme 1774

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

5 de junio de 2024

CERTIFICACION

El BANCO DE BOGOTÁ, manifiesta por medio de este documento que la empresa **CONSORCIO ODESSA**, identificado(a) con NIT **901.513.605-6**, esta vinculada al Banco con el siguiente(s) producto(s),

CTA DE AHORROS No. 239278450, rendimientos generados al 30 de Junio de 2024.

30/06/2024	36,940.00

En este mismo sentido, se aclara que el presente certificado se refiere únicamente al producto(s) anteriormente mencionado(s).

Atentamente,

Firma Autorizada
Banca Pyme
Gerencia Pyme 1774

Banco de Bogotá

Mejor banco en Colombia 2023: Global Finance | Great Place To Work 2023 | Sustainability Yearbook 2023 | EFR 2023

Estamos para usted
Pyme: 60 1 364 7400
Empresas: 60 1 607 9006

Queremos brindarle el mejor servicio, contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de **lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m.** al teléfono fijo: **601 332 0101**, celular **(+57) 318 373 00 77,** correo electrónico **defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co**, o en la dirección **Calle 36 No. 7 – 47 piso 5** en la ciudad de **Bogotá D.C.** Consulte el procedimiento para presentar una queja y las funciones que ejerce el Defensor del Consumidor Financiero **ingresando a www.bancodebogota.com/defensordelconsumidor**

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

5 de agosto de 2024

CERTIFICACION

El BANCO DE BOGOTÁ, manifiesta por medio de este documento que la empresa **CONSORCIO ODESSA**, identificado(a) con NIT **901.513.605-6**, esta vinculada al Banco con el siguiente(s) producto(s),

CTA DE AHORROS No. 239278450, rendimientos generados al 31 de Julio de 2024.

31/07/2024	24,889.00

En este mismo sentido, se aclara que el presente certificado se refiere únicamente al producto(s) anteriormente mencionado(s).

Atentamente,

Firma Autorizada
Banca Pyme
Gerencia Pyme1774

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 715202

jueves, 05 de septiembre de 2024, 11:37:17 AM

Detalle

$21,008.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******9639
Descripción:	RENDIMIENTOS AGOSTO
Fecha y hora inicio transacción	2024-09-05 11:32:58
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	77760
Código Único de Seguimiento	893242207
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	77760
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/09/2024
Ticket ID:	77760
Transacción/CUS:	893242207
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS AGOSTO
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	21008
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Nit. 860.002.964-4

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la Empresa **CONSORCIO ODESSA,** identificado con **NIT.901.513.605.6** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CUENTA DE AHORROS Nro.239278450.**

Este producto fue constituido para el manejo de los recursos del anticipo del contrato 4805-2023, cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento mantenimiento de vías terciarias en los municipios del departamento del atlántico lote 1, cuenta de ahorros que genera rendimientos y será manejada según las condiciones que el mismo contrato exprese.
La cuenta será manejada con firmas conjuntas del Señor Oscar Javier Garzon Diaz, representante legal del Consorcio Odessa y del señor Rafel Gustavo Rodriguez Meza, supervisor del contrato 4805-2023.

A la fecha a recibido intereses en total desde la apertura de $ 85.691 así:
Intereses Últimos 5 Periodos

Fecha	Valor
31/05/2024	2.854,00
30/06/2024	36.940,00
31/07/2024	24.889,00
31/08/2024	21.008,00

La presente se emite a solicitud del titular del producto a los 09 días del mes de septiembre de 2024

Cordialmente,

Firma Autorizada
Gerente PYME

Banco de Bogotá
GERENCIA PYME

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 333202

jueves, 17 de octubre de 2024, 9:23:34 AM

Detalle

$14,323.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******9639
Descripción:	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-17 9:19:08
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	81272
Código Único de Seguimiento	987240401
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	81272
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/10/2024
Ticket ID:	81272
Transacción/CUS:	987240401
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	14323
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Nit. 860.002.964-4

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la Empresa **CONSORCIO ODESSA,** identificado con **NIT.901.513.605.6** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CUENTA DE AHORROS Nro.239278450.**

Este producto fue constituido para el manejo de los recursos del anticipo del contrato 4805-2023, cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento mantenimiento de vías terciarias en los municipios del departamento del atlántico lote 1, cuenta de ahorros que genera rendimientos y será manejada según las condiciones que el mismo contrato exprese.
La cuenta será manejada con firmas conjuntas del Señor Oscar Javier Garzon Diaz, representante legal del Consorcio Odessa y del señor Rafel Gustavo Rodriguez Meza, supervisor del contrato 4805-2023.

Los intereses recibidos en el mes de septiembre 2024 $ así: 14.323.00
Intereses mes Septiembre2024

Fecha	Valor
31/09/2024	$14.323,00

La presente se emite a solicitud del titular del producto a los 15 días del mes de octubre de 2024

Cordialmente,

Firma Autorizada
Gerente PYME

Banco de Bogotá
GERENCIA PYME

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

FORMATO MEPI-MN1-N-9-FR-2 .

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	01/08/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☒ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

RESOLUCIÓN No.: DE
(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: PONEDERA: LP-001-2023 SABANAGRANDE SG-LP-OP-004-2023 CONTRATISTA: PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA SABANAGRANDE CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2023
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/12/2023
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.529.977.628,00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.529.977.628,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 14 DE DICIEMBRE 2024
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 1/02/2024
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2024																				TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	Director de Interventoria	$ 6.800.000,00		3,00	$ 20.400.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	0,47	$ 3.196.000,00	9,47	$ 64.396.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 5.100.000,00		3,00	$ 15.300.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	0,47	$ 2.397.000,00	7,47	$ 38.097.000,00
3	1	Ingeniero Residente	$ 5.100.000,00		3,00	$ 15.300.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	0,47	$ 2.397.000,00	4,47	$ 22.797.000,00
4	1	Profesional Social	$ 3.750.000,00		3,00	$ 11.250.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 1.875.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	0,47	$ 1.762.500,00	6,97	$ 26.137.500,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				$ 21.000.000,00																										
5	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,40	$ 2.440.000,00	0,40	$ 2.440.000,00	0,40	$ 2.440.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00		$ -	4,20	$ 25.620.000,00
6	1	Especialista en Estructuras	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8	1	Especialista Ambiental	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,29	$ 1.769.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,23	$ 1.403.000,00	4,52	$ 27.572.000,00
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,21	$ 1.281.000,00		$ -	0,21	$ 1.281.000,00		$ -		$ -	0,21	$ 1.281.000,00	0,21	$ 1.281.000,00	0,21	$ 1.281.000,00		$ -	1,05	$ 6.405.000,00
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,17	$ 1.037.000,00	0,17	$ 1.037.000,00	0,17	$ 1.037.000,00		$ -		$ -	0,17	$ 1.037.000,00	0,17	$ 1.037.000,00	0,17	$ 1.037.000,00		$ -	1,02	$ 6.222.000,00
		PERSONAL TECNICO																														
11	1	Inspector	$ 2.200.000,00		3,00	$ 6.600.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	0,47	$ 1.034.000,00	9,47	$ 20.834.000,00
12	1	Inspector	$ 2.200.000,00		1,00	$ 2.200.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	0,47	$ 1.034.000,00	4,47	$ 9.834.000,00
13	1	Inspector SST	$ 2.200.000,00		3,00	$ 6.600.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,36	$ 792.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	0,47	$ 1.034.000,00	5,83	$ 12.826.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
14	1	Secretaria	$ 1.240.000,00		3,00	$ 3.720.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	0,47	$ 582.800,00	9,47	$ 11.742.800,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 102.370.000,00				$ -		$ -		$ 16.767.000,00		$ 16.767.000,00		$ 25.023.000,00		$ 25.982.000,00		$ 27.390.000,00		$ 37.008.000,00		$ 37.008.000,00		$ 37.008.000,00		$ 34.690.000,00		$ 14.840.300,00		$ 272.483.300,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 241.593.200,00				$ -		$ -		$ 39.570.120,00		$ 39.570.120,00		$ 59.054.280,00		$ 61.317.520,00		$ 64.640.400,00		$ 87.338.880,00		$ 87.338.880,00		$ 87.338.880,00		$ 81.868.400,00		$ 35.023.108,00		$ 643.060.588,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024																				TOTAL	
											FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIATICOS																														
14	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	12,00	$ 2.400.000,00				$ -		$ -		$ -	5,00	$ 1.000.000,00		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 1.000.000,00	5,00	$ 1.000.000,00	5,00	$ 1.000.000,00	5,00	$ 1.000.000,00	30,00	$ 6.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
15	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.900.000,00	Mes	3,00	$ 17.700.000,00				$ -		$ -	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	0,47	$ 2.773.000,00	9,47	$ 55.873.000,00
16	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.900.000,00	Mes	3,00	$ 17.700.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	0,47	$ 2.773.000,00	4,47	$ 26.373.000,00
17	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00				$ -		$ -		$ -	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	0,47	$ 296.100,00	8,47	$ 5.336.100,00
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	0,47	$ 296.100,00	7,47	$ 4.706.100,00
19	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 315.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	0,47	$ 296.100,00	6,97	$ 4.391.100,00
20	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	0,47	$ 296.100,00	4,47	$ 2.816.100,00
21	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.280.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 18.840.000,00				$ -		$ -	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	0,47	$ 2.951.600,00	9,47	$ 59.471.600,00
22	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.800.000,00				$ -		$ -	3,00	$ 1.800.000,00	4,75	$ 2.850.000,00		$ -	1,44	$ 864.000,00	1,28	$ 768.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 1.200.000,00	32,47	$ 19.482.000,00
23	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 3.900.000,00				$ -		$ -	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	0,47	$ 611.000,00	9,47	$ 12.311.000,00
		OTROS COSTOS																														
24	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 3.600.000,00				$ -		$ -		$ -	0,38	$ 456.000,00	0,69	$ 828.000,00		$ -		$ -	0,60	$ 720.000,00	0,60	$ 720.000,00	0,60	$ 720.000,00	0,30	$ 360.000,00	3,77	$ 4.524.000,00
25	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00				$ -		$ -	0,20	$ 80.000,00	0,65	$ 260.000,00	0,76	$ 304.000,00	0,91	$ 364.000,00	0,75	$ 300.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	0,40	$ 160.000,00	7,67	$ 3.068.000,00
26	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc.)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.500.000,00				$ -		$ -	0,39	$ 195.000,00	0,34	$ 170.000,00	0,49	$ 245.000,00	0,50	$ 250.000,00	0,50	$ 250.000,00	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	0,40	$ 200.000,00	6,62	$ 3.310.000,00
27	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 450.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,56	$ 534.000,00	3,56	$ 534.000,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														$ 560,00
	+	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				$ 76.650.000,00				$ -		$ -		$ 15.555.000,00		$ 18.846.000,00		$ 16.432.000,00		$ 16.848.000,00		$ 16.688.000,00		$ 27.520.000,00		$ 27.520.000,00		$ 27.520.000,00		$ 27.520.000,00		$ 13.747.000,00		$ 208.196.560,00
	+	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 318.243.200,00				$ -		$ -		$ 55.125.120,00		$ 58.416.120,00		$ 75.486.280,00		$ 78.165.520,00		$ 81.328.400,00		$ 114.858.880,00		$ 114.858.880,00		$ 114.858.880,00		$ 109.388.400,00		$ 48.770.108,00		$ 851.257.148,00
	+	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 967.452.286,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 434.438.338,00		$ 434.438.338,00
	+	SUBTOTAL COSTOS BASICOS (E) = (C) + (D)				$ 1.285.695.486,00				$ -		$ -		$ 55.125.120,00		$ 58.416.120,00		$ 75.486.280,00		$ 78.165.520,00		$ 81.328.400,00		$ 114.858.880,00		$ 114.858.880,00		$ 114.858.880,00		$ 109.388.400,00		$ 483.208.446,00		$ 1.285.695.486,00
	+	IVA = 19% * (E) = (F)				$ 244.282.142,00				$ -		$ -		$ 10.473.773,00		$ 11.099.063,00		$ 14.342.393,00		$ 14.851.449,00		$ 15.452.396,00		$ 21.823.187,00		$ 21.823.187,00		$ 21.823.187,00		$ 20.783.796,00		$ 91.809.605,00		$ 244.282.142,00
	+	COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 1.529.977.628,00				$ -		$ -		$ 65.598.893,00		$ 69.515.183,00		$ 89.828.673,00		$ 93.016.969,00		$ 96.780.796,00		$ 136.682.067,00		$ 136.682.067,00		$ 136.682.067,00		$ 130.172.196,00		$ 575.018.051,00		$ 1.529.977.628,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

REPROGRAMACIÓN No. 1 AL PLAN DE CARGAS INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4805-2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	01/08/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☒ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio) Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

POR NECESIDADES DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL LOTE 1 - ATLÁNTICO, SE REALIZA LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS DEDICACIONES DE LOS RECURSOS POR PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada período del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ**
Representante Legal CONSORCIO ODESSA
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma:
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-090758 BLV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7

OCTUBRE 2024

CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

- A la fecha se tienen suscritas la prórroga No. 1 al convenio 2220-2023 suscrito entre el Municipio de Ponedera y el INVIAS y prorroga No. 1 al convenio 2221-2023 el 07 de diciembre de 2023, ampliado la vigencia de los convenios de obra hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Las obras del contrato de obra LP-001-2023 en el Municipio de ponedera no han iniciado debido a que posterior a la reanudación de la suspensión No. 1 del plazo del contrato del 28 de agosto de 2024 y a la suscripción de la prórroga No. 1 del plazo del contrato de obra hasta el 14 de diciembre de 2024 suscrita el 30 de agosto de 2024, el contratista no ha realizado oportunamente actividades preliminares que permitan definir la totalidad del diseño geométrico y aun cuando la interventoría ha viabilizado 1 Km de diseño geométrico, el contratista no ha dispuesto de los recursos y rentes de obra necesarios para el inicio de las explanaciones.

- Para el contrato de obra LP-001-2023, se dio inicio a la ejecución de actividades de obra con explanaciones el 07 de octubre de 2024, sin embargo, la ejecución de las actividades de obra ha tenido rendimientos bajos y no se implementan frentes adicionales de obra para mitigar los atrasos de obra. Al respecto la interventoría ha realizado requerimientos al contratista y se ha informado al Municipio de Ponedera mediante los siguientes comunicados: C-T-135-329-2024 del 02/10/2024 y C-T-135-356-2024 del 17/10/2024.

- El contrato de obra LP-001-2023 del Municipio de Ponedera, acumula atrasos en estudios y diseños, ejecución de obra, en estudios y diseños, informes sociales, informes ambientales, entrega de soportes de pago de seguridad social, actualización de pólizas. Ante dichos incumplimientos la interventoría a realizado solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024 se han incrementado.

- Se tiene pendiente que el Municipio de Pondera retorne los recursos a la cuenta del convenio por un valor de $ 58.475.000, los cuales fueron pagados a una destinación diferente a las actividades del convenio 2220-2023 por parte del Municipio de Pondera y el banco Davivienda en el mes de noviembre de 2023, sin la autorización del INVIAS como una de las firmas autorizadas y en contravía de lo indicado en el Convenio 2220-2023. Así mismo se encuentra pendiente que el Municipio de Ponedera presente soporte del giro de los rendimientos por un valor de $ 10.468.553,28 correspondientes al mes de julio de 2024.

- El Municipio de Sabanagrande tiene pendiente el retorno de rendimientos financieros de la cuenta del convenio 2221-2023 por un valor de $11.256.765,42 correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2024. La interventoría ha realizado los respectivos requerimientos al municipio como se evidencia en correspondencia enviada.

- Para el Municipio de Sabanagrande a Limites con Polonuevo se tiene un 50.1% de avance de obra representado en 1.4 Km de pavimento rígido, estando el avance acorde a la reprogramación No. 2 realizada con el acta de modificación de cantidades No. 1 con el cual se realizó balance de obra como consecuencia de los estudios y diseños. Razón por la cual se presente un atraso de obra. Al respecto la interventoría solicitó al contratista con copia al Municipio de Sabanagrande, mejorar los rendimientos de ejecución y la entrega de un plan de contingencia por los atrasos presentados mediante comunicación C-T-135-373-2024 del 25/10/2024 y se advirtió que de no implementar acciones se recomendaría la entidad contratante las medidas sancionatorias pertinentes por atrasos que sean de imputabilidad del contratista.

- Para los dos municipios objeto de las intervenciones de los contratos de obra se requirió complementar la totalidad de estudios y diseños, debido a que no se contaba con diseños suficientes para la ejecución de las obras de acuerdo con las normativas y especificaciones técnicas. La interventoría realizó solicitud de los estudios y diseños a los municipios sin encontrar respuesta alguna. Sin embargo, de acuerdo con las obligaciones de los contratistas se obra, estos deben realizar el ajuste, modificación, actualización y/o complementación de los estudios y diseños, por lo tanto, se adelanta esta etapa con el fin de definir las estructuras a ejecutar.

- El contrato de interventoría tiene un avance financiero del 47.4% representado en el seguimiento y control de documentos para el inicio de las actividades de obra, revisión de estudios en campo, etapa de ajustes y complementación de estudios y diseños, y ejecución de obra en el Tramo LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) y en el Tramo SABANAGRANDE - POLONUEVO.

7.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda al INVIAS requerir al Municipio de Ponedera, a que realice los respectivos requerimientos al contratista, en lo relacionado con el avance de obra y cumplimiento de obligaciones, teniendo en cuenta que dicho Municipio no ha dado tramite a los procesos sancionatorios recomendados y que son de carácter conminatorio con el fin de ejecutar las obras en términos de oportunidad y pertinencia.

- Se recomienda al INVIAS solicitar a los municipios otorgar respuesta a los requerimientos de la interventoría en lo relacionado con el manejo, extractos y rendimientos de las cuentas de los convenios, teniendo en cuenta que no se envían oportunamente los soportes de giros de rendimientos y extractos bancarios.

8.0 ANEXOS

8.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA											
FECHA	CÓDIGO	COD MUNICIPIO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD	ENVIADO A: NOMBRE	ÁREA	TEMA	SUBTEMA	ENTREGADO A:	RECIBIDO POR:	RADICADO
1 de octubre de 2024	C-T-135-326-2024	PO	PO Reiteración - Apremio al Contratista por incumplimiento en la presentación de informes de seguimiento ambiental correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Informes pendientes	Reiteracion	Representante Legal		Radicado 01/10/2024
2 de octubre de 2024	C-T-135-327-2024	SG	SG-Respuesta a la comunicación OBR-SOC-019-2024 del 01-10-2024 donde remiten el acta de vecindad de inicio con consecutivo N° 74 subsanada.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	SOCIAL	Actas de vecindad	Respuesta	Representante Legal		Radicado 02/10/2024
2 de octubre de 2024	C-T-135-328-2024	PO	PO- Remisión de Bitácora de obra 19 septiembre a 30 septiembre de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Bitacora de obra	Remision	Representante Legal		Radicado 02/10/2024
2 de octubre de 2024	C-T-135-329-2024	PO	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Llamado de atencion	compromisos adquiridos	Representante Legal		Radicado 02/10/2024
3 de octubre de 2024	C-T-135-330-2024	PO	PO- Reiteración-Observaciones del INVIAS al documento PAGA comunicación C-T-135-234-2024 del 7 de agosto de 2024. Actualización documento PAGA	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	PAGA		Representante Legal		Radicado 03/10/2024
3 de octubre de 2024	C-T-135-331-2024	PO	PO- Proveedor de materiales pétreos.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Materiales petreos		Representante Legal		Radicado 03/10/2024
3 de octubre de 2024	C-T-135-332-2024	PO	PO- Solicitud de extracto del mes de Septiembre de 2024 de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Extractos bancarios	Solicitud	Alcalde Municipal		Radicado 03/10/2024
3 de octubre de 2024	C-T-135-333-2024	SG	SG- Solicitud de extracto del mes de Septiembre de 2024 de la cuenta corriente # No 0241 6999 6022 DEL CONVENIO 2221 DE 2023 (SABANAGRANDE).	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Extractos bancarios	Solicitud	Alcalde Municipal		Radicado 03/10/2024
5 de octubre de 2024	C-T-135-334-2024	PO	PO-Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Documentos sociales	Requerimiento	Representante Legal		Radicado 05/10/2024
7 de octubre de 2024	C-T-135-335-2024	PO	PO- Resultado de ensayo de laboratorio del material dispuesto en obra por parte de CONSORCIO LA GIRALDA	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Laboratorio	Resultado	Representante Legal		Radicado 07/10/2024
8 de octubre de 2024	C-T-135-336-2024	PO	PO- REITERACIÓN 3 – SOLICITUD DE PRESENCIA DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Personal minimo	Reiteracion	Representante Legal		Radicado 08/10/2024
8 de octubre de 2024	C-T-135-337-2024	PO	PO- Vinculación Laboral del Personal de Topografía - Operadores.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Vinculacion de personal		Representante Legal		Radicado 09/10/2024
9 de octubre de 2024	C-T-135-338-2024	SG	SG. Observaciones Informe de Seguimiento Ambiental correspondiente al mes de septiembre.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	AMBIENTAL	Informe mensual	Observaciones	Representante Legal		Radicado 09/10/2024
9 de octubre de 2024	C-T-135-339-2024	SG	SG-Aprobación del Informe mensual social N° 7 del mes de septiembre de 2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	SOCIAL	Informe mensual	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 09/10/2024
9 de octubre de 2024	C-T-135-340-2024	PO	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	No cumplimiento compromisos	Llamado de atencion	Representante Legal		Radicado 09/10/2024
11 de octubre de 2024	C-T-135-341-2024	PO	PO- Aprobación informes ambientales No. 4 y 5, correspondientes a los meses de junio y julio de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Informes mensuales	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 11/10/2024
11 de octubre de 2024	C-T-135-342-2024	PO	PO-Aprobación Informemensual social No. 4 del junio de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Informes mensuales	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 11/10/2024
16 de octubre de 2024	C-T-135-343-2024	INV	Respuesta al radicado No 2024S-VATL-073981 - Informe mensual de Interventoría No. 7 Contrato 4805-2023 - Agosto 2024 – Versión 02.	INVIAS	Ing. Diana María Vanegas Jaramillo	TECNICA	Observaciones informe mensual 7	Respuesta	Directora Territorial Atlantico		2024E-VUVRAZ102489

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA											
FECHA	CÓDIGO	COD MUNICIPIO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD	ENVIADO A: NOMBRE	ÁREA	TEMA	SUBTEMA	ENTREGADO A:	RECIBIDO POR:	RADICADO
12 de octubre de 2024	C-T-135-344-2024	PO	PO – Planilla Seguridad Social Correspondiente a septiembre 2024 Personal en Obra	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Planillas Seguridad Social		Representante Legal		Radicado 12/10/2024
12 de octubre de 2024	C-T-135-345-2024	PO	PO- Recomendaciones en el proceso constructivo e inicio en la instalación del mejoramiento de la subrasante	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Instalacion Subrasante	Recomendaciones	Representante Legal		Radicado 12/10/2024
15 de octubre de 2024	C-T-135-346-2024	PO	PO- Reiteración 2. Solicitud de documentos de forma PRIORITARIA para el seguimiento y control del contrato de obra.	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Documentos de seguimiento y control	Reiteracion	Alcalde Municipal		Radicado 15/10/2024
15 de octubre de 2024	C-T-135-347-2024	SG	PO- REITERACIÓN Solicitud de extracto del mes de Septiembre de 2024 de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de julio de 2024.	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Extractos bancarios	Reiteracion	Alcalde Municipal		Radicado 15/10/2024
15 de octubre de 2024	C-T-135-348-2024	SG	SG- Reiteración 2. Solicitud de documentos de forma PRIORITARIA para el seguimiento y control del contrato de obra.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Documentos de seguimiento y control	Reiteracion	Alcalde Municipal		Radicado 15/10/2024
15 de octubre de 2024	C-T-135-349-2024	SG	SG REITERACIÓN- Solicitud de extracto del mes de Septiembre de 2024 de la cuenta corriente # No 0241 6999 6022 DEL CONVENIO 2221 DE 2023 (SABANAGRANDE).	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Extractos bancarios	Reiteracion	Alcalde Municipal		Radicado 15/10/2024
15 de octubre de 2024	C-T-135-350-2024	PO	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de Septiembre de 2024	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Rendimientos financieros	Consignacion	Alcalde Municipal		Radicado 15/10/2024
15 de octubre de 2024	C-T-135-351-2024	PO	PO-Aprobación Hoja de vida profesional social.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	HOJAS DE VIDA	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 15/10/2024
15 de octubre de 2024	C-T-135-352-2024	DAV	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE REDUCCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA CORRIENTE No 028069996776 DEL CONVENIO 2220 DE 2023 ENTRE EL INVIAS Y PONEDERA - ATLÁNTICO	BANCO DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA	TECNICA	Rendimientos financieros	Requerimiento	Banco Davivienda		Radicado 15/10/2024
16 de octubre de 2024	C-T-135-353-2024	PO	PO-Aprobación informe ambiental No. 6, correspondiente al mes de agosto de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Informe mensual	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 16/10/2024
16 de octubre de 2024	C-T-135-354-2024	SG	SG-Observaciones al acta de obra No3 presentada por parte del contratista.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	TECNICA	Acta de obra	Observaciones	Representante Legal		Radicado 16/10/2024
16 de octubre de 2024	C-T-135-355-2024	PO	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de Septiembre de 2024	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Rendimientos financieros	Consignacion	Alcalde Municipal		Radicado 16/10/2024
17 de octubre de 2024	C-T-135-356-2024	PO	PO- Incumplimiento de compromisos, atraso de obra y respuesta plan de contingencia.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Incumplimiento de compromisos	Observaciones	Representante Legal		Radicado 17/10/2024
18 de octubre de 2024	C-T-135-357-2024	PO	PO-Requerimientos PMT – Señalización Pendiente en Obra y Documentos SST Pendientes de Entrega Aportes a la Seguridad Social Correspondiente a septiembre 2024 - Vinculación Laboral del Personal Topografía - Operadores.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Documentacion SST	Requerimiento	Representante Legal		Radicado 18/10/2024

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA											
FECHA	CÓDIGO	COD MUNICIPIO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD	ENVIADO A: NOMBRE	ÁREA	TEMA	SUBTEMA	ENTREGADO A:	RECIBIDO POR:	RADICADO
18 de octubre de 2024	C-T-135-358-2024	PO	PO – Requerimiento PMT – Señalización Pendiente por Instalar en obra.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Señalizacion	Requerimiento	Representante Legal		Radicado 18/10/2024
21 de octubre de 2024	C-T-135-359-2024	SG	SG- REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de JUNIO A SEPTIEMBRE de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Rendimientos financieros	Reiteracion	Alcalde Municipal		Radicado 21/10/2024
18 de octubre de 2024	C-T-135-360-2024	INV	Informe mensual de Interventoría No. 8 Contrato 4805-2023 - Septiembre 2024	INVIAS	Ing. Diana María Vanegas Jaramillo	TECNICA	Informe mensual Septiembre		Directora Territorial Atlantico		2024E-VUVRAZ104145
22 de octubre de 2024	C-T-135-361-2024	PO	PO- Incumplimiento en Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Correspondiente a septiembre de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Seguridad social	Incumplimiento	Representante Legal		Radicado 22/10/2024
21 de octubre de 2024	C-T-135-362-2024	SG	SG- Acta Parcial de Obra No 03	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Acta		Alcalde Municipal		Radicado 21/10/2024
21 de octubre de 2024	C-T-135-363-2024	SG	SG- Solicitud de inicio de construcción de Bordillos y Limpieza general de obra.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	TECNICA	Construccion Bordillos		Representante Legal		Radicado 21/10/2024
22 de octubre de 2024	C-T-135-364-2024	SG	SG. Aprobación Informe Mensual Ambiental No. 7 correspondiente al mes de septiembre de 2024.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	AMBIENTAL	Informe mensual	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 22/10/2024
22 de octubre de 2024	C-T-135-365-2024	SG	SG- Acta de Ajustes No 02.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Acta		Alcalde Municipal		Radicado 22/10/2024
22 de octubre de 2024	C-T-135-366-2024	INV	PO- INFORME SOBRE DIFICULTADES Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO 2220-2023	INVIAS	Ing. Diana María Vanegas Jaramillo	TECNICA	Dificultades del convenio		Directora Territorial Atlantico		2024E-VUVRAZ105279
23 de octubre de 2024	C-T-135-367-2024	PO	PO-Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Documentos pendientes	Requerimiento	Representante Legal		Radicado 23/10/2024
23 de octubre de 2024	C-T-135-368-2024	SG	SG-Solicitud Programación y plan de contingencia cumplimiento de las actividades sociales pendientes por ejecutar.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	SOCIAL	Actividades sociales pendientes		Representante Legal		Radicado 23/10/2024
23 de octubre de 2024	C-T-135-369-2024	PO	PO- Reiteración actualización y atención a observaciones del documento PAGA.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	PAGA		Representante Legal		Radicado 23/10/2024
23 de octubre de 2024	C-T-135-370-2024	PO	PO- Solicitud de entrega del informe de seguimiento mensual ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Solicitud informe mensual Septiembre		Representante Legal		Radicado 23/10/2024
24 de octubre de 2024	C-T-135-371-2024	PO	PO-Aprobación Informemensual social No. 5 del julio de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Informe mensual	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 24/10/2024
25 de octubre de 2024	C-T-135-372-2024	PO	PO- Respuesta – Revisión de hoja de vida para cambio de director de obra. Y reiteración entrega de soportes de hoja de vida del residente.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	HOJAS DE VIDA	Revision	Representante Legal		Radicado 25/10/2024
25 de octubre de 2024	C-T-135-373-2024	SG	SG- ATRASOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA, SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN A LOS DISEÑOS Y SOLICITUD DE ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	TECNICA	Atrasos actividades de obra		Representante Legal		Radicado 25/10/2024
26 de octubre de 2024	C-T-135-374-2024	PO	PO-Aprobación Informe mensual social No. 6 del mes de agosto de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Informe mensual	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 26/10/2024
29 de octubre de 2024	C-T-135-375-2024	PO	PO- Reiterativo - Incumplimiento en Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Correspondiente a septiembre de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Seguridad social	Incumplimiento	Representante Legal		Radicado 29/10/2024

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA											
FECHA	**CÓDIGO**	**COD MUNICIPIO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A: ENTIDAD**	**ENVIADO A: NOMBRE**	**ÁREA**	**TEMA**	**SUBTEMA**	**ENTREGADO A:**	**RECIBIDO POR:**	**RADICADO**
30 de octubre de 2024	C-T-135-376-2024	PO	PO-Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Documentos pendientes		Representante Legal		Radicado 30/10/2024
31 de octubre de 2024	C-T-135-378-2024	PO	PO-Respuesta a comunicación donde remiten presentación para la reunión de seguimiento con el CPC el día 31-102024	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Presentacion reunion		Representante Legal		Radicado 31/10/2024

RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CODIGO	COD MUNICIPIO	ASUNTO	RECIBIDO DE ENTIDAD	RECIBIDO DE: NOMBRE	ÁREA	TEMA	SUBTEMA	FECHA RECIBIDO	REVISA	FIRMA	FECHA FIRMA	REQ RTA	CÓDIGO RESPUESTA	COMENTARIO
1 de octubre de 2024	OBR-SST-04	SG	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST.	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Informe		1/10/2024						
2 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	Informe de Diseño geometrico VF.	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Diseño geometrico		2/10/2024						
2 de octubre de 2024	2024S-VBOG-071697	PO	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-087490-Cto Int 4805 de 2023 Contrato de Obra No. LP-001-2023 "Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la Giralda?Santa Rita	INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO	SOCIAL	Trimestral 2	Respuesta	2/10/2024						
4 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	30/09/2024 - 03/10/2024	4/10/2024						
7 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	04/10/2024 - 06/10/2024	7/10/2024						
8 de octubre de 2024	AMB-007-2024	SG	ENTREGA DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL NRO. 007 – SEPTIEMBRE DE 2024 V1	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	AMBIENTAL	Informe mensual		7/10/2024						
8 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	Actualización PAGA.	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	AMBIENTAL	PAGA		8/10/2024						
9 de octubre de 2024	OBR-SOC-020-2024	SG	INFORME SOCIAL SEPTIEMBRE 2024.	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	SOCIAL	Informe mensual		8/10/2024						
10 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	07/10/2024- 09/10/2024	10/10/2024						
10 de octubre de 2024	2024S-VATL-073981	INV	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-092559	INVIAS	Diana Maria Vanegas Jaramillo	TECNICO	Informe mensual 7	Observaciones	10/10/2024						
10 de octubre de 2024	2024S-VATL-073984	INV	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-089007	INVIAS	Diana Maria Vanegas Jaramillo	TECNICO	Acta de costos 7	Observaciones	10/10/2024						
11 de octubre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Entrega del informe social correspondiente al mes de junio.	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	SOCIAL	Informe mensual		11/10/2024						
11 de octubre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Entrega de los informes ambientales de los meses de junio y julio del 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	AMBIENTAL	Informe mensual		11/10/2024						
11 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	ACTA No. 3 de obra	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Acta		11/10/2024						
14 de octubre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Entrega del informe ambiental mes de agosto	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	AMBIENTAL	Informe mensual		14/10/2024						
15 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	10/10/2024 - 13/10/2024	15/10/2024						
15 de octubre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	plan de contingencia	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	TECNICO	Plan contigencia		15/10/2024						
17 de octubre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Alineamiento horizontal del k0+000 hasta el k2+000.	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	TECNICO	Alineamiento de superficie		17/10/2024						
17 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	ACTA No. 3 de obra V2.	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Acta de obra		17/10/2024						
18 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	14/10/2024 - 17/10/2024	17/10/2024						
23 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	18/10/2024 - 22/10/2024	23/10/2024						
23 de octubre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL SOCIAL DE JULIO 2(	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	SOCIAL	Informe mensual		23/10/2024						
23 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	Afectaciones a la superficie del pavimento por trabajos de la empresa TRIPLE A.	SG CRIVEN	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Afectaciones al pavimento		23/10/2024						
23 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	Problemática de aguas negras vertidas al canal pluvial.	SG CRIVEN	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Aguas negras		23/10/2024						
24 de octubre de 2024	2024S-VBOG-078356	PO	Respuesta 2024E-VUVRAZ-048178 Informe Estado Ambiental No.1 CI 48052023 y CO No. LP-001-2023	INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO	AMBIENTAL	Trimestral 1 PO		24/10/2024						
25 de octubre de 2024	2024S-VBOG-078880	SG	Respuesta a 2024E-VUVRAZ-091686 del 19 de septiembre de 2024. Recibo de respuesta 2024S-VBOG-065009. CI No. 4805-2023 y CO No. SG-LP-OP-0042023	INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO	AMBIENTAL	PAGA		25/10/2024						
25 de octubre de 2024	2024S-VBOG-079179	SG	Respuesta a 2024E-VUVRAZ-092978 del 23 de septiembre de 2024. Ajustes al Informe de estado ambiental No.2. CI No. 4805-2023	INVIAS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO	AMBIENTAL	Trimestral 2 SG		25/10/2024						
26 de octubre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Entrega del informe social mensual de agosto del 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	SOCIAL	Informe mensual		26/10/2024						
28 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	24/10/2024 - 27/10/2024	28/10/2024						

RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA

28 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST.	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Informe mensual		28/10/2024						
17 de octubre de 2024	2024S-VBOG-076125	INV	Fechas de Cierre Operaciones con Impacto Financiero vigencia 2024 contrato de interventoría 4805 de 2023	INVIAS	OSCAR ACEVEDO CASTRO	TECNICO	Cierre de operaciones		30/10/2024						
30 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	Plan de contingencia	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO			30/10/2024						
30 de octubre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	PRESENTACION DE AVANCE DE OBRA PARA EL COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA.	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	SOCIAL	Presentacion		30/10/2024						
31 de octubre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	28/10/2024 - 30/10/2024	31/10/2024						

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

TRAMO SABANAGRANDE – POLONUEVO. MUNICIPIO DE SABANAGRANDE

FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	**OCTUBRE 2024**

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	k0+150 al k0+240	Toma de densidades



Descripción:	K0 + 154 al K0+ 240	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	K0 +150 al K0+240	Toma de espesores



Descripción:	k0 150 al k0 + 240	Actividades de topografia



Descripción:	K0 + 570 al K0 + 660	Acero de transferencia del pavimento



Descripción:	k0 + 000 al k0 + 032	Instalación Concreto MR 3.8 Mpa

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	K0 + 575 al K0 + 656	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k750 al k 830	Acero de transferencia del pavimento



Descripción:	K1 + 490 al K1 + 511	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k1+521 al k1 + 553	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k1+502 al k1 + 512	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k1 + 280 al k1 + 200	Cereo de la sub base

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	k1 + 502 al K1 + 512	Instalación de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k1 + 290 al k1 + 345	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k0 + 760 al k0+770	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k0 + 760 al k0+770	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k0 + 731 al k0 + 828	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa



Descripción:	k0 + 731 al k0 + 828	Corte de juntas

TRAMO LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.

FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	OCTUBRE 2024

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LA GIRALDA	**CONTRATO N°**	**LP-001-2023**	**RUTA LA GIRALDA – SANTA RITA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	k6+660	MATERIAL DE ADECUACION DE VÍA



Descripción:	K0+480	ADECUACION DE VÍA



Descripción:	K0+540 al K0 +480	ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA Y CORTE DE SUBRASANTE



Descripción:	K0+540 al K0 +480	CORTE DE SUB RASANTE



Descripción:	K0+100 al K0+180	INSTALACION DE GEOTEXTIL



Descripción:	K0+100 al K0+180	INSTALACION DE GEOTEXTIL

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LA GIRALDA	**CONTRATO N°**	**LP-001-2023**	**RUTA LA GIRALDA – SANTA RITA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	K0+360 al K0+460	INSTALACION DE GEOTEXTIL



Descripción:	K0+100 al k0+200	TOMA DE DENSIDADES



Descripción:	K0+360 al K0+420	CORTE DE SUBRASANTE



Descripción:	K0+90 al K0+200	INSTALACION MATERIAL DE MEJORAMIENTO



Descripción:	K9+400	MATERIAL DE ADECUACION



Descripción:	K0+300 al K0+360	INSTALACION DE GEOTEXTIL SOBRE SUB RASANTE



Descripción:	K0+100 al K0+180	INSTALACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO



Descripción:	K0+90 al K0+250	CEREO Y CORTE DE SUBRASANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	**OCTUBRE 2024**

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LA GIRALDA	**CONTRATO N°**	**LP-001-2023**	**RUTA LA GIRALDA – SANTA RITA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	K0+100 al K0+180	INSTALACION DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE



Descripción:	K0+380 al K0+460	INSTALACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO



Descripción:	K0 + 360 al K0 + 470	MEJORAMIENO PRIMERA CAPA



Descripción:	K0 + 360 al K0 + 470	EXCAVACION

8.4 BITACORA DE OBRA

PONEDERA

01/10/2024 Estado del Clima: Soleado

Personal de Obra: 2 ingenieros 1 Sisa 2 controladores 3 operadores 1 oficios varios

Equipos de Obra: 1 motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 Vibro

Actividad de obra

Se realiza adecuación de la Vía por parte del contratista: Por parte de la topografía no se realizo ninguna actividad la maquinaria presentan Fallas mecanicas, se retira a la 11:30 Am para por Fuga de Aceite Hidraulica. La motoniveladora para a la 2 Pm por Falla mecanica.

Nota: Se reciben 2 viajes de material para la adecuación de la Vía.

Powered by CamScanner

02/10/2024 Estado del Clima: Estable
Personal de obra: 2 contratistas 1 SISO 2 Ingenieros
3 Operadores 1 oficios varios
Equipos de Obra: 1 motoniveladora, 1 Retroexcavadora 1 vibro
Actividad de obra:
No se realizo actividad en la obra
Fuente cerrada a las 9:30 Am hasta 10:00 Am
Se evidencio 4 veces llegada a obra.

Nota: la motoniveladora esta fuera de servicios, la cual
Fue Arreglada a la 2:50 pm ya puesta operativa
El vibro compactador no realizo ninguna Función

03/10/2024 Estado del Clima: Estable
Personal en Obra: 3 operadores 2 contratistas 1 SISO
2 Ingenieros 1 Topografo 1 cadenero
Equipos de obra: 1 motoniveladora 1 Volqueta 1 Retro
1 vibro
Actividad de obra:
Se realiza adecuación de la Vía Por Parte del contratista
No se realiza ninguna actividad Por topografia en
la motoniveladora no estuvo en Función Por Horas de la
mañana los mecanicos la revisaron pues operativa a las
3:30 pm

Powered by CamScanner

Nota: No se reciben llegadas de materiales por parte del contratista

04/10/2021 Estado del clima: Soleado
Personal de obra: 1 supervisor 1 oficial varilla 2 carpinteros
1 topógrafo 1 cadenero 2 operadores 2 ingeniero
Equipos de obra: 1 motoniveladora 1 rodillo
Actividad de obra:
Se realiza adecuación de la vía por parte del contratista
Se instalan señalización informativa en el sitio de santa
rita vía Ferry.
No se realiza ninguna actividad por topografía. Se hace
cambio de maquinaria tipo retroexcavadora por una nueva que
llega 3:41 pm

Nota: No se reciben viajes de materiales

25/10/2024 Estado del clima: Soleado
Personal de obra: 1 supervisor 2 ingenieros 2 controladores
1 topógrafo 1 cadenero 3 operadores 1 ayudante.
Equipo de obra: 1 retroexcavadora 1 motoniveladora 1 vibro
Actividad de obra:
Realizan instalación de señalización del Km00 al Km090. También realizan desarrollo desde las abscisas Km000 al Km430, no se realiza actividad topográfica.

Powered by CamScanner

07/01/2024 Estado del Clima: Soleado
Personal de obra: 2 controladores 3 Operadores 1 Sisa 1 Topografo 1 cadenero 1 ingeniero
Equipos de obra: 1 Retroexcavadora 1 motoniveladora 1 Vibro 1 Volqueta
Actividad de obra:
Realizan corte de Sub-rasante en perfil de la abscisa Km0+000 al Km0+190 con la acompañia de la Topografia haciendole el control del corte.

08/01/2024 Estado del Clima: Nublado
Personal de obra: 2 controladores 1 ingeniero 1 sisa 1 cadenero 1 topografo 1 sisa 3 Operadores
Equipos de obra: 1 Retroexcavadora 1 Vibro 1 motoniveladora 1 Volqueta.
Actividad de obra.
Realizar cortes de sub-rasante con la compañia de la topografia verificando el corte, este corte se realiza en la abscisa Km0+000 al Km0+190. Se registra recorrido de obra por parte de la interventoria.

09/01/2024 Estado del Clima: Soleado
Personal de obra: 1 Sisa 1 Colocador 1 cadenero
3 ingenieros 2 contratistas y obreros
Equipos de obra: 1 motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 Vibro
1 Volqueta
Actividad de obra:
Realizan corte de sub-rasante con la cuchilla de la motoniveladora haciendo la verificación del corte desde la abscisa Km 190 al Km 2+40. llega el material del Geotextil 20 rollos a las 3:44 pm a la obra.

10/01/2024 Estado del Clima: Nublado
Personal de obra: 1 ingeniero 1 Sisa 2 contratista
3 obreros 1 colocador 1 cadenero
Equipos de obra: 1 motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 Vibro
1 Volqueta
Actividad de obra:
Realizan corte de sub-rasante con la cuchilla de la motoniveladora haciendo la verificación del corte desde la abscisa Km 2+40 al Km 3+00.

Nota: el vibro compactador no estuvo operativo hasta las 2:45 que lo repararon

Powered by CamScanner

11/10/2024 Estado del clima: Soleado
Personal de obra: 1 ingeniero 1 topógrafo 1 cadenero 2 cantoleros 3 operadores 1 sisa 1 ayudante
Equipos de obra: 1 motoniveladora 1 Retro 1 Vibro
Actividad de obra:
Realizo corte de sub-rasante de la vía con la topografía buscando la verificación del corte desde la abscisa K0+300 al K0+340.

12/10/2024 Estado del clima = Soleado
Personal de obra: 2 cantoleros, 3 operadores, 2 ingenieros 1 topógrafo 1 cadenero 1 ayudante
Equipos de obra: 1 motoniveladora 1 Retro 1 Vibro 1 volqueta
Actividad de obra:
Realizo corte de sub-rasante con la cantidad de la topografía, buscando la verificación desde la abscisa K0+300 al K0+480

14/10/2024 Estado del clima: Soleado
Personal de obra: no hay
Equipos de obra: no hay
Actividad de obra:
No se realizo ninguna actividad de obra.

15/10/2024 Estado del clima: Soleado
Personal de obra: 1 ayudante, 2 ingenieros, 2 controladores
1 Sisa, 1 Topografo
Equipo de obra: 1 motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 Sisa 1 Volqueta
Actividad de obra:
Realizan corte y corte de sub rasante con la
Compañia de la topografia, haciendo el control de niveles
de corte desde la abscisa Kotogo al Km 250.

Powered by CamScanner

16/01/2024 Estado del Clima: Nublado
Personal de obra: 1 ayudante 2 contratistas 2 ingenieros 1 SISO 1 topografo 3 Operadores
Equipo de Obra: 1 motoniveladora 1 Rejonte 1 Vibro
Actividad de obra.
Realizo corte de sub-rasante con la compañía de la topografia haciendo la Verificación de corte, se realizo recorrido con la interventoria.
nota: llegan material de afirmado 4 viajes a las 11:25 am.

17/01/2024 Estado del Clima: Soleado
Personal de obra: 2 contratistas, 2 ingenieros, 1 SISO 1 cadenero 2 topografo, 1 ayudante, 3 operadores
Equipo de obra: 1 Rejonfer 1 motoniveladora 1 vibro
Actividad de obra:
Se realiza replanteo de ejes, y nivelación para el control del corte, para hacer el cerco de la abscisa K0+100 al K0+180. Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria, se recibe por topografia de la interventoria el tramo K0+100 al K0+180 de sub-rasante
nota: la motoniveladora no tenia combustible hasta las 11:30 llegan 4 viajes de mejoramiento en el transcurso del dia se le recomienda al contratista humedecer la sub-rasante antes de aplicar el material de mejoramiento

18/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPATADOR, 1 PAJARITA, 1 CARRO TANQUE.
PERSONAL. 2 INGENIEROS, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR, 1 CONDUCTOR,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUB RASANTE POR PRUEBA DE CARGA ENTRE ABCISAS KO+100 AL KO+180 CALZADA.
INSTALACIÒN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+100 AL KO+180 CALZADA.
INSTALACIÒN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+100 AL KO+180 CALZADA.
SE CONTIANÙA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+500 AL KO+570 CALZADA.

19/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 CARRO TANQUE.
PERSONAL. 2 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 CONDUCTOR, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE REALIZA PRUEBA DE CARGA AL TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+180 AL KO+280 CALZADA.
SE RECIBE POR TOPOGRAFIA TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+180 AL KO+280 CALZADA.
INSTALACIÒN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+180 AL KO+250 CALZADA.
INSTALACIÒN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+180 AL KO+250 CALZADA.

Powered by CamScanner

20/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
DOMINGO.

21/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES,
2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUB RASANTE POR TOPOGRAFÍA
ENTRE ABCISAS KO+280 AL KO+360 CALZADA.
TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE MEJORAMIENTO ENTRE
ABCISAS KO+100 AL KO+200 CALZADA.
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE
ABCISAS KO+240 AL KO+300 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB
RASANTE ENTRE ABCISAS KO+240 AL KO+300 CALZADA.

22/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA,
1 CARRO TANQUE.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES
2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 CONDUCTOR, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. INSTALACIÓN DE SEGUNDA CAPA DE MEJORAMIENTO
ENTRE ABCISAS KO+090 AL KO+140 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE
ABCISAS KO+300 AL KO+360 CALZADA.
CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+360 - 400
CALZADA.
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE
ABCISAS KO+300 AL KO+360 CALZADA.

Powered by CamScanner

23/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES,
2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
SEGUNDA CAPA ENTRE ABCISAS KO+090 AL KO+200 CALZADA.
TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE MEJORAMIENTO PRIMERA
CAPA ENTRE ABCISAS KO+200 AL KO+360 CALZADA.
SE CONTINUA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS
KO+360 AL KO+420 CALZADA.

24/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES,
2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS
KO+480 AL KO+550 CALZADA.
CERCO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+360 AL
KO+470 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE
ENTRE ABCISAS KO+200 AL KO+330 CALZADA.
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ENTRE ABCISAS KO+360 AL
KO+460 CALZADA.
SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA CON EL CONTRATISTA Y LA
INTERVENTORIA. PARA DEFINIR LOS PUNTO CRITICOS EN
TIEMPOS DE LLUVIAS.

Powered by CamScanner

25/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES
2 PARIGIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. INST. DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA
SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+360 AL KO+460 CALZADA.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE TACOS DE NIVELES PARA CÉREO DEL
MEJORAMIENTO ENTRE ABCISAS KO+090 AL KO+190 CALZADA.
LA PAJARITA SE VARO POR TAL MOTIVO NO SE EJECUTA ACTIVIDADES
DE CORTE DE LA SUB RASANTE.

26/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 2 OPERADORES,
2 PARIGIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DEBIDO A QUE
LA MOTONIVELADORA NO CONTABA CON COCHICHA, EL VIBRO
COMPACTADOR, TENIA FUGA DE AGUA DEL PAGADOR.

27/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
DOMINGO.

Powered by CamScanner

20/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 CARRO TANQUE.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 1 CADENERO, 2 PARISIGAS, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE RECIBE POR TOPOGRAFÍA TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+470 AL KO+510 CALZADA.
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+460 AL KO+510 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO ENTRE ABCISAS KO+380 AL KO+460 CALZADA.
EN LAS HORAS DE LA MAÑANA LLEGA A LA OBRA 1 CARRO TANQUE EL CUAL QUEDA EN OBRA.

29/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, CARRO TANQUE 1
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 2 OPERADORES, 2 PARISIGAS, 1 CONDUCTOR, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE REALIZA CERO DEL MEJORAMIENTO ENTRE ABCISAS KO+090 AL KO+190 CALZADA.
EL VIBRO COMPACTADOR CONTINÚA VARADO POR EL RAIADOR LO CUAL EL DIA DE HOY NO ESTUVO ACTIVO.

30/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 CARRO TANQUE.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 2 OPERADORES.
2 PARISIGAS 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. CERO DEL MEJORAMIENTO ENTRE ABCISAS

Powered by CamScanner

KO+190 AL KO+350 SEGUNDA CAPA.
SE RECIBE POR TOPOGRAFÍA TRAMO DE MEJORAMIENTO PRIMERA CAPA ENTRE ABCISAS KO+360 AL KO+470 CALZADA.
SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE MEJORAMIENTO PRIMERA CAPA ENTRE ABCISAS KO+360 AL KO+460 CALZADA.

21/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 1:00 AM A 2:00 AM.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA 1 CARRO TANQUE.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 PARISIGAS, 1 CONDUCTOR, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+380 AL KO+460 CALZADA.
CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+580 AL KO+650 CALZADA.
SIENDO LAS 11:00 AM LLEGA A LA OBRA LA RETRO DE ORUGA A LA OBRA UNA CATERPILLAR 320CL
SE REALIZA VISITA DE OBRA CON EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA, Y LA PARTE AMBIENTAL.

Powered by CamScanner

Sabanagrande (Atlántico), 05 de Noviembre de 2024.

Señores
CONSORCIO LA GIRALDA
Atn.: Edgar José Torres Mejía
Representante Legal
La Ciudad

C-T-135-385-2024

Referencia 1: **Contrato de Interventoría No. 4805 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1".**

Referencia 2: **Contrato de Obra No. LP-001-2023 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".**

Asunto: **PO- Remisión de Bitácora de obra 01 Octubre a 31 Octubre de 2024.**

Respetados señores:

El CONSORCIO ODESSA actuando como interventor designado por parte del INVIAS para la supervisión y seguimiento del convenio interadministrativo de la referencia, del cual se deriva el contrato de obra **No. LP-001-2023** cuyo objeto es **" MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTARITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**. Se permite remitir copia de la bitácora de obra, la cual se encuentra diligenciada y firmada por parte de Interventoría desde la fecha de la orden de inicio, y en la que se han registrado los sucesos y acontecimientos que se han presentado durante el periodo de 01 de Octubre de 2024 a 31 de Octubre de 2024.

Por lo cual, nos permitimos notificar formalmente al CONSORCIO LA GIRALDA de lo consignado en dicha bitácora y así mismo solicitamos amablemente, que se acerque el residente y/o director de obra a la oficina principal de la Interventoría, ubicada en la Calle 10 No. 9-02 Barrio Santa Rita. Sabanagrande (Atlántico), con la finalidad de proceder a firmar por parte del contratista.

En el mismo sentido, nos permitimos reiterar el comunicado C-T-135-292-2024 de fecha de 10 de septiembre de 2024, mediante el cual se ratificar al contratista de obra la necesidad de que el DIRECTOR Y EL RESIDENTE DE OBRA, hagan presencia constante en cada una de las actividades programadas durante la ejecución del contrato; ya que los mismos son de vital importancia en la toma de decisiones y la firma de los respectivos documentos y además son de obligatorio cumplimiento según lo establecido en el ANEXO TÉCNICO en su numeral 7 – INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL y que fueron debidamente aprobados por parte de esta interventoría mediante el comunicado C-T-135-068-2024 desde el pasado 23 de mayo de 2024. y en caso de que dicho personal no se encuentre disponible para dar cumplimiento a lo dispuesto en los documentos contractuales, se solicita al contratista, realizar el respectivo cambio y presentar a esta interventoría las hojas de vida correspondiente.

Se aclara que en el momento que ingrese el residente de obra o director, si quieren realizar alguna anotación se puedan realizar si inconveniente alguno y mientras el contratista fija su oficina o campamento en el sitio de las obras para que la bitácora pueda ser llevada para su firma a un punto mas cercano a la obra.

Atentamente,

JOHN ANDRES ARIAS H
Director de Interventoría
CONSORCIO ODESSA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios (1)	CD ( )	Tomos ( )	Planos ( )

8.4 BITACORA DE OBRA

SABANAGRANDE

1/10/2024 ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PASARUTA, 1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 8 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS KO+240 AL KO+300 COSTADO IZQUIERDO.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTLE ABCISAS KO+150 AL KO+240 COSTADO IZQUIERDO.
SE RECIBE TRAMO DE FORMALETA POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KO+150 AL KO+240 COSTADO IZQUIERDO.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR DENSIDADES ENTRE ABCISAS KO+150 AL KO+240 COSTADO IZQUIERDO.

Powered by CamScanner

2/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 6 PARISIGAS GAUXILIARES, 1 CADENERO.
ACTIVIDADES. SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR38 ENTRE ABCISAS KO+153 AL KO+240 COSTADO IZQUIERDO.
SE CONTINUA CON EL CÉREO DE LA SUB BASE ENTRE ABCISAS KO+080 AL KO+150 COSTADO IZQUIERDO.

3/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 6 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE ENTRE ABCISAS KO+100 AL KO+150 COSTADO IZQUIERDO.
SE RECIBE TRAMO DE FORMALETA PARA CONCRETO ENTRE ABCISAS KO+100 AL KO+150 COSTADO IZQUIERDO.
SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE SUB BASE ENTRE ABCISAS KO+100 AL KO+150 COSTADO IZQUIERDO.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS KO+100 AL KO+153 COSTADO IZQUIERDO.

4/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES

Powered by CamScanner

6 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE ENTRE ABCISAS
K0+040 AL K0+100 COSTADO IZQUIERDO POR TOPOGRAFÍA,
SE RECIBE TRAMO DE FORMALETA POR TOPOGRAFÍA ENTRE
ABCISAS K0+040 AL K0+100 COSTADO IZQUIERDO.
SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE SUB BASE
ENTRE ABCISAS K0+040 AL K0+100 COSTADO IZQUIERDO.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38
ENTRE ABCISAS K0+041 AL K0+100 COSTADO IZQUIERDO.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTRE
ABCISAS K0+000 AL K0+ COSTADO IZQUIERDO.

5/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA,
1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES
6 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. SE REALIZA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA
CONCRETO ENTRE ABCISAS K0+000 AL K0+030 COSTADO IZQUIERD
SE REALIZA CONFORMACIÓN DE LA VENTANA ENTRE ABCISAS
K0+799 AL K0+809 COSTADO DERECHO PARA INSTALACIÓN DE
CONCRETO.

6/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
DOMINGO.

Powered by CamScanner

7/6/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 6 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO.
ACTIVIDADES. SE REALIZO INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+032 COSTADO IZQUIERDO.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA VENTANA DEL V1+799 AL K1+809 COSTADO IZQUIERDO.
SE REALIZA CÉREO DE LA SUB BASE ENTRE ABCISAS KO+500 AL KO+600 COSTADO DERECHO.

8/6/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO.
ACTIVIDADES. SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE SUB BASE ENTRE ABCISAS KO+500 AL KO+580 COSTADO DERECHO.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KO+500 AL KO+600 COSTADO DERECHO.
SE RECIBE TRAMO DE FORMALETA POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KO+500 AL KO+580 COSTADO DERECHO.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS KO+500 AL KO+575 COSTADO DERECHO.
SE CONTINÚA CON EL CÉREO DE LA SUB BASE ENTRE ABCISAS KO+600 AL KO+670 COSTADO DERECHO.

Escriba el texto aquí
Powered by CamScanner

9/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES. 6 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE ENTRE ABCISAS KM+610 AL KM+660 COSTADO DERECHO.
SE RECIBE TRAMO DE FORMALETA ENTRE ABCISAS KM+670 AL KM+660 COSTADO DERECHO.
SE REALIZA INSTALACIÒN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS KM+575 AL KM+566 COSTADO DERECHO.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KM+670 AL KM+750 COSTADO DERECHO.
SE CONTINÚA CON EL CÉREO DE LA SUB BASE ENTRE ABCISAS KM+750 AL KM+850 COSTADO DERECHO.

10/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 8 PARISIGAS 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE FORMALETA POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KM+670 AL KM+740 COSTADO DERECHO.
SEREALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE SUB BASE ENTRE ABCISAS KM+670 AL KM+750 COSTADO DERECHO.
SE REALIZA INSTALACIÒN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS KM+656 AL KM+731 COSTADO DERECHO.
SE REALIZA CÉREO DE LA SUB BASE ENTRE ABCISAS KM+760 AL KM+850 COSTADO DERECHO.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KM+760 AL KM+830 COSTADO DERECHO.

Powered by CamScanner

SE RECIBE TRAMO DE FORMALETA PARA INSTALACIÓN DE CONCRETO ENTRE ABCISAS KO+760 AL KO+830 COSTADO DERECHO.






11/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 8 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE SUB BASE ENTRE ABCISAS KO+760 AL KO+830 COSTADO DERECHO.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS KO+731 AL KO+828 COSTADO DERECHO.
SE REALIZA CORTE DE LA SUBRASANTE ENTRE ABCISAS K1+450 AL K1+550 CALZADA.





12/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 8 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUBRASANTE POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS K1+450 AL K1+540 CALZADA.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE SUB BASE ENTRE ABCISAS K1+490 AL K1+550 CALZADA.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS K1+490 AL K1+550 CALZADA.





Powered by CamScanner

13/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
DOMINGO.



14/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 8 PARISIGAS 6 AUXILIARES, 1 CADENERO.
ACTIVIDADES. SE CONTINÚA CON EL CÉREO DE LA SUB BASE ENTRE ABCISAS K1+490 AL K1+550 CALZADA.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K1+350 AL K1+450 CALZADA.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS K1+490 AL K1+550 COSTADO DERECHO.
SE RECIBE TRAMO DE FORMALETA POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS K1+490 AL K1+550 COSTADO DERECHO.
SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE SUB BASE ENTRE ABCISAS K1+490 AL K1+550 COSTADO DERECHO.



15/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 10:00 AM 11:00
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 8 PARISIGAS 6 AUXILIARES, 1 CADENERO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES. SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS K1+490 AL K1+511 Y K1+521 AL K1+553 COSTADO DERECHO.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K1+350 AL K1+450 CALZADA.

16/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 12:00 A 13:00
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 8 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO.
ACTIVIDADES. INSTALACIÓN DE SUB BASE ENTRE ABCISAS K1+440 AL K1+480 CALZADA.
SE RECIBE TRAMO DE SUB RASANTE POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS K1+390 AL K1+440 CALZADA.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K1+300 AL K1+360 CALZADA.

17/10/2024 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 6 PARISIGAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. INSTALACIÓN DE SUB BASE ENTRE ABCISAS K1+400 AL K1+440 CALZADA.
CERCO DE LA SUB BASE ENTRE ABCISAS K1+420 AL K1+480 COSTADO DERECHO.
SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTRE

Powered by CamScanner

ABCISAS KI+420 AL KI+480 COSTADO DERECHO.
* SE INSTALA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KI+480 AL KI+420. COSTADO DERECHO

19/10/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 17:00 A 18:00
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 PAJARITA, 1 MINI CARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA,
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES 6 PANISEAS, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUB BASE POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KI+360 - AL KI+410 COSTADO DERECHO.
SE RECIBE TRAMO DE FORNALETA POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KI+350 AL KI+410 COSTADO DERECHO.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 ENTRE ABCISAS KI+358 AL KI+421 COSTADO DERECHO.

Powered by CamScanner

20/10/24 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE 15:00 - 16:00

21/10/24 ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RASTRA
1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA.
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO
4 OFICIALES, 6 PARESIGA, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO.
ACTIVIDADES: SE REALIZA CORTE DE SUBRASANTE DEL
K1+330 AL K1+290

22/10/24 ESTADO DEL CLIMA.
EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RASTRA
1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA.
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO
4 OFICIALES, 6 PARESIGA, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO
ACTIVIDADES DE OBRA: SE RECIBE SUBRASANTE DEL
K1+330 AL K1+290, SE INSTALA MATERIAL DE
SUBBASE DEL K1+330 AL K1+290.

23/10/24 ESTADO DEL CLIMA.
EQUIPO. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RASTRA
1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIONETA.
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO,
4 OFICIALES, 6 PARESIGA, 6 AUXILIARES, 1 CADENERO
ACTIVIDADES DE OBRA: SE INSTALA SUBBASE DEL K1+330
AL K1+290. SE CEREA DEL K1+330 AL K1+290.

Powered by CamScanner

24/10/24 ESTADO DEL CLIMA

EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 RETROCARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 VIBRO COMPACTADOR 1 CAMIONETA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO 1 CADENERO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 PARESIGA, 6 AUXILIARES.

ACTIVIDADES DE OBRA: INSTALACIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DEL K1+290 AL K1+345.

INSTALACIÓN SUBBASE DEL K01+200 AL K1+220.

25/10/24. ESTADO DEL CLIMA 6

EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 1 MINI CARGADOR, 1 RETROCARGADOR 1 VOLQUETA, 1 VIBRO COMPACTADOR 1 CAMIONETA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO 1 CADENERO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 PARESIGA 6 AUXILIARES.

ACTIVIDADES DE OBRA: CAPA DE SUBBASE DEL K1+200 AL K1+200.

26/10/24 ESTADO DEL CLIMA:

EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR 1 RETROCARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 AUXILIARES,

ACTIVIDADES DE OBRA: INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DEL K1+502 AL K1+512 Y DEL K1+291 AL K1+207.

Powered by CamScanner

24/10/24 ESTADO DEL CLIMA

EQUIPO: 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 RETROCARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR 1 CAMIONETA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO 1 CADENERO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 PARESIGA, 6 AUXILIARES.

ACTIVIDADES DE OBRA: INSTALACCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DEL K1+290 AL K1+345.

INSTALACCIÓN SUBBASE DEL K01+200 AL K1+272.

25/10/24. ESTADO DEL CLIMA 6

EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 RETROCARGADOR 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO 1 CADENERO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 PARESIGA 6 AUXILIARES.

ACTIVIDADES DE OBRA: CERRO DE SUBBASE DEL K1+280 AL K1+200.

26/10/24 ESTADO DEL CLIMA:

EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR 1 RETROCARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 AUXILIARES.

ACTIVIDADES DE OBRA: INSTALACCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DEL K1+502 AL K1+512 Y DEL K1+291 AL K1+207.

Powered by CamScanner

23/10/24 ESTADO DEL CLIMA. TIEMPO SECO.

25/10/24 ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO 1 CADENERO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 AUXILIARES
EQUIPOS DE OBRA: 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 RETROCARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 CAMIONETA.
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO 1 CADENERO, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 PARESICA 6 AUXILIARES.
ACTIVIDADES DE OBRA, INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL K0+135 AL K0+145, DEL K0+760 AL K0+770 Y DEL K1+345 AL K1+348.

29/10/24 ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO 1 CADENERO 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 6 AUXILIARES
EQUIPO DE OBRA: 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 RETROCARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 CAMIONETA.
ACTIVIDADES DE OBRA: SE RECIBE SUBRASANTE DEL K1+190 AL K1+090. SE DEMUELEN CAPAS DE CAPA DE VALVULAS DE ACUEDUCTO K0+015, INSTALACIÓN DE SUBBASE DE K1+190 AL K1+130.

30/10/24 ESTADO DEL CLIMA:
MAQUINARIA DE OBRA: 1 MOTONIVELADORA - 1 RETRO CARGADOR
1 VOLQUETA - 1 VIBRO COMPACTADOR - 1 MINICARGADOR
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE - 1 SST - 1 TOPOGRAFO -
4 CAPATACES - 4 OFICIALES - 6 PARESIA - 6 AUXILIARES
ACTIVIDADES DE OBRA:

Powered by CamScanner

8.5 INFORMACION RENDIMIENTOS Y CUENTAS CONVENIOS DE OBRA

OCTUBRE 2024

8.5 INFORMACIÓN CUENTAS CONVENIOS

8.5.1 Información Cuenta Convenio 2220-2023 (PONEDERA)

Contrato de obra adjudicado mediante licitación pública No. LP-001-2023 con la siguiente información del convenio y contrato de obra:

Tabla 1 Información del convenio y contrato de obra

Convenio INVIAS No.	**2220-2023**
Fecha Convenio INVIAS No.	**21 de junio de 2023**
Objeto Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1 Convenio	Doce (12) meses
Fecha Prorroga No.1 Convenio	22 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2024
Valor inicial:	**$ 12.460.000.000**
Municipio	**PONEDERA**

- **Resumen Cuenta Convenio**

A la fecha se presentan el siguiente resumen de ingresos y egresos de la cuenta del convenio 2220-2023.

RESUMEN CUENTA CONVENIO

MUNICIPIO		**PONEDERA**
CUENTA CONVENIO		28069996776
BANCO		**DAVIVIENDA**
CONVENIO VALOR		**$ 12.460.000.000,00**
Fecha de Corte		**31/10/2024**
Descripción Ingreso/Egreso	Crédito	Debito
Recurso Inicial	$ 12.460.000.000	
Anticipo		$ 0
Giros no permitidos		-$ 58.475.000
Actas parciales		$ 0
Rendimientos generados	$ 106.825.233	
Devolución rendimientos tesoro nacional		-$ 105.760.274
Subtotal	$ 12.566.825.233	-$ 164.235.274
Saldo cuenta convenio	**$ 12.402.589.960**	

Nota: 1 Valores correspondientes a corte del extracto del mes de septiembre de 2024

* Los giros no permitidos obedecen a un pago realizado por el Municipio de Ponedera al banco Davivienda. Giro que no fue autorizado por el INVIAS y fue realizado en contravía de las reglas del manejo de la cuenta bancaria y cuya responsabilidad recae actualmente sobre el banco y el Municipio de Pondera. Al respecto la interventoría notificó por última vez al INVIAS que el Municipio no ha realizado el retorno de los recursos mediante comunicación C-T-135-099-2024 del 07/06/2024 con radicado 2024E-VUVRAZ-051832.

- **Rendimientos generados y transferidos**

Se evidencia en el resumen rendimientos generados en la cuenta del convenio por un valor de $ 106.825.233 hasta el 30/09/2024, de los cuales el municipio ha realizado la devolución de $ 105.760.274, de la siguiente manera:

Giro de Rendimientos		
Fecha	Valor	Observaciones
25/06/2024	-$ 73,543,979.31	GIRO SEBRA RENDIMIENTOS Sep23 - Abr24
26/07/2024	-$ 20,692,718.49	GIRO SEBRA RENDIMIENTOS may24 - jun24
11/09/2024	-$ 11,523,575.87	GIRO SEBRA RENDIMIENTOS jul24 - Ago24
Total	-$ 105,760,273.67	

Respecto a soportes de traslados de rendimientos del Tesoro Nacional se presenta lo siguiente:

- Traslado del 25/06/2024 se presenta Nota debido con Traslado a fondos Cebra.

- Traslado del 26/07/2024 se presenta extracto bancario de julio 2024 debido a que el Municipio de Ponedera no ha aportado certificación expedida por el banco.

- Traslado del 11/09/2024 se presenta extracto bancario de septiembre de 2024, debido a que Municipio de Ponedera no ha aportado certificación expedida por el banco.

- Mediante comunicado C-T-135-355-2024 de fecha de 16/10/2024 se remite carta debidamente firmada por parte de Interventoría con la finalidad de que el municipio de Ponedera realice el respectivo tramite del giro de los rendimientos financieros generados en el mes de Septiembre de 2024.

Respecto al no aporte de los certificados de los rendimientos la interventoría ha reiterado solicitud al Municipio mediante las siguientes comunicaciones, sin que la fecha el municipio otorgue respuesta.

FECHA	CÓDIGO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD
21 de agosto de 2024	C-T-135-257-2024	PO- REITERACIÓN COMUNICADO C-T-135-242-2024 DE FECHA DE 09 DE AGOSTO DE 2024. GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2024	ALCALDIA DE PONEDERA
29 de agosto de 2024	C-T-135-272-2024	PO- REITERACIÓN 3 COMUNICADO C-T-135-242-2024 DE FECHA DE 09 DE AGOSTO DE 2024. GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2024.	ALCALDIA DE PONEDERA
10 de septiembre de 2024	C-T-135-294-2024	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023	ALCALDIA DE PONEDERA
03 de octubre de 2024	C-T-135-332-2024	PO- Solicitud de extracto del mes de septiembre de 2024 de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023	ALCALDIA DE PONEDERA
15 de octubre de 2024	C-T-135-350-2024	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de Septiembre de 2024.	ALCALDÍA DE PONEDERA

8.5.2 Información cuenta Convenio 2221-2023 (SABANAGRANDE)

Contrato de obra adjudicado mediante licitación pública No. SG-LP-OP-004-2023 con la siguiente información del convenio y contrato de obra:

Tabla 2 Información del convenio y contrato de obra SABANAGRANDE

Convenio INVIAS No.	**2221-2023**
Fecha Convenio INVIAS No.	**21 de junio de 2023**
Objeto Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1 Convenio	Doce (12) meses
Fecha Prorroga No.1 Convenio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2024
Municipio	Sabanagrande

- **Resumen Cuenta Convenio**

A la fecha se presentan el siguiente resumen de ingresos y egresos de la cuenta del convenio 2221-2023.

RESUMEN CUENTA CONVENIO

MUNICIPIO		**SABANAGRANDE**
CUENTA CONVENIO		0241 6999 6022
BANCO		**DAVIVIENDA**
CONVENIO VALOR		**$ 6.586.000.000,00**
Fecha de Corte		**30/09/2023**
Descripción Ingreso/Egreso	Crédito	Debito
Recurso Inicial	$ 6.586.000.000	
Anticipo		-$ 1.962.654.749
Devolución Anticipo		$ 1.242.909.478
Giros no permitidos		$ 0
Actas parciales		-$ 1.774.638.460
Rendimientos generados	$ 52.384.601	
Devolución rendimientos tesoro nacional		-$ 41.127.835
Subtotal	$ 6,638,384,601	-$ 2,535,511,566
Saldo cuenta convenio	**$ 4.102.873.035**	

Nota: 2 Valores correspondientes a corte del extracto del mes de septiembre de 2024

- **Rendimientos generados y transferidos**

Se evidencia en el resumen rendimientos generados en la cuenta del convenio por un valor de $ 52.384.601 hasta el 30/09/2024, de los cuales el municipio ha realizado la devolución de $ 41.127.835, de la siguiente manera y estando pendiente el giro de rendimientos del mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024.

Giro de Rendimientos		
Fecha	Valor	Observaciones
24/05/2024	-$ 37,207,106.22	Consignación rendimientos del sep23 a abr24
18/06/2024	-$ 3,920,729.00	Consignación rendimientos del may24
Total	-$ 41,127,835.22	

Respecto a soportes de traslados de rendimientos del Tesoro Nacional se presenta lo siguiente:

- Traslado del 25/05/2024 se presenta Carta de la autorización para retorno de rendimientos y soporte de transferencia emitido por el Municipio de Sabanagrande.

- Traslado del 18/06/2024 se presenta extracto bancario de junio de 2024, debido a que Municipio de Sabanagrande no ha aportado certificación expedida por el banco.

Respecto al no aporte de los certificados de los rendimientos y el no giro de los rendimientos de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2024, la interventoría ha reiterado solicitud al Municipio mediante las siguientes comunicaciones, sin que la fecha el municipio otorgue respuesta.

FECHA	CÓDIGO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD
4 de mayo de 2024	C-T-135-041-2024	SG- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 0241-6999-6022, aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
12 de junio de 2024	C-T-135-111-2024	SG- GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2024.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
10 de julio de 2024	C-T-135-176-2024	SG- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2024. SOLICITUD DE EXTRACTO DEL MES DE JUNIO DE 2024 Y GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
8 de agosto de 2024	C-T-135-236-2024	SG- REITERACIÓN GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2024. Y GIRO DE RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2024.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
3 de septiembre de 2024	C-T-135-278-2024	SG- REITERACIÓN GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2024. Y SOLICITUD DE EXTRACTO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
18 de septiembre de 2024	C-T-135-306-2024	SG- REITERACIÓN. Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de Agosto de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
21 de octubre de 2024	C-T-135-359-2024	REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de JUNIO A SEPTIEMBRE de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio.	ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

8.5 Soportes Giros Rendimientos
PONEDERA
CONVENIO 2220-2023

Bienvenido: Señor(a) ADALBERTO JOSE RICO GUTIERREZ
NIT 8901162789 - MUNICIPIO DE PONEDERA

viernes 28 de junio de 2024

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Nd Traslad Fondos Sebra	Valor	$ 73.543.979,31

Fecha de Movimiento	25/06/2024
Hora de Movimiento	18:04:16
Cuenta Origen	XXXXXXXXXXXX6776
Oficina	GB MONEDA EXTRANJERA

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Fogafin — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA CORRIENTE
0280 6999 6776

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE PONEDERA
alcaldia@ponedera-atlantico.gov.co

Saldo Anterior	$12,422,217,718.49	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$10,468,553.28	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$20,692,718.49	Tasa Sobregiro	29.38% E.A
Nuevo Saldo	$12,411,993,553.28	Tasa Mora	29.38% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
26	07	Nd Traslad Fondos Sebra	GB MONEDA EXTRANJERA	6887	$20,692,718.49-	$12,401,525,000.00+
31	07	Ganancia Intereses Adicionales		0000	$10,468,553.28+	$12,411,993,553.28+



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Interés de Sobregiro: 2.17 % M.V. 29.38 % E.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Fogafin — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA CORRIENTE
0280 6999 6776

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE PONEDERA
alcaldia@ponedera-atlantico.gov.co

Saldo Anterior	$12,413,096,291.47	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$1,017,243.94	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$11,523,575.87	Tasa Sobregiro	28.78% E.A
Nuevo Saldo	$12,402,589,959.54	Tasa Mora	28.78% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
11	09	Nd Traslad Fondos Sebra	GB MONEDA EXTRANJERA	2221	$11,523,575.87-	$12,401,572,715.60+
30	09	Ganancia Intereses Adicionales		0000	$1,017,243.94+	$12,402,589,959.54+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en ***www.davivienda.com***, opción **"tasas y tarifas".**

Interés de Sobregiro: 2.13 % M.V. 28.78 % E.A.

8.5 Soportes Giros Rendimientos
SABANAGRANDE
CONVENIO 2221-2023

Mayo 20 de 2024

Señores
BANCO DAVIVIENDA
Banca Oficial
E.S.D.

Asunto: Reintegro de Recursos, Rendimientos generados por el convenio Interadministrativo No.2221 de 2023, suscrito entre INVIAS y el Municipio de Sabanagrande.

En cumplimiento con los términos establecidos con los recursos del Convenio Interadministrativo No.2221 de 2023, entre el Municipio de Sabanagrande y el Instituto Nacional de Vías – Invías, nos permitimos solicitar, se efectúe debito a la cuenta corriente No.024169996022 titular Municipio de Sabanagrande, denominada "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. Por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS CON 22/100 M.L. ($37.207.106.22) correspondiente a los rendimientos financieros generados durante los meses de septiembre de 2023 hasta el mes de abril de 2024.

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente
Cuenta Bancaria No.61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de transacción: SEBRA 137

La consignación de los recursos se debe efectuar únicamente a través del sistema SEBRA CUD ofrecido por el Banco de la República a los intermediarios financieros, utilizando el código de operación 137 de manera tal que la operación quede exenta del gravamen a los movimientos financieros, de acuerdo al artículo 879 numeral 3 del Estatuto Tributario. De igual manera se debe señalar que en el campo de concepto, incluya el código de portafolio asignado a INVIAS, que corresponde el (270)

Una vez efectuada la transferencia a la cuenta indicada, favor notificar expedir certificación bancaria con el detalle del movimiento al correo secretariadehacienda@sabanagrande-atlantico.gov.co.

Atentamente,

DARWIN ALEXANDER MORA
Alcalde Municipal
C.C.72.099.118

FRANCISCO CARTUSCIELLO SANZ
Secretario de Hacienda y del Tesoro
C.C.72.097.677

OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Consorcio ODESA
C.C.79.296.441

Proyectó: Ronald Vásquez
Revisó: Francisco Cartuscielio Sanz

SISTEMA OPERACIÓN:	CUD		FECHA APROBACIÓN:	24/05/2024	FECHA VALOR: 24/05/2024
CONSECUTIVO OPERACIÓN	117614418		FECHA HORA LIQUIDACIÓN	24/05/2024 18:39:26	
TRANSACCIÓN:	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3				VALOR: 37.207.106,22
CUENTA ORIGEN:	COP	62015102 BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL:	BOGOTA D.C	
CUENTA DESTINO:	COP	61011034 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	HORA RESOLUCIÓN DE LA COLA:		
USUARIO CAPTURA ORIGEN:	monzpn01039 18:33:51	USUARIO APROBACIÓN ORIGEN:	tjubnp01039 18:39:26		
USUARIO CAPTURA DESTINO:		USUARIO APROBACIÓN DESTINO:			
REFERENCIA:	TRASLADO	CONCEPTO:	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE SABANA GRANDE -RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL MES DE ABRIL 2024		
PORTAFOLIO CRÉDITO:	270	PORTAFOLIO DÉBITO:	0		

DAVIVIENDA

Fogafin — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA CORRIENTE
0241 6999 6022

INFORME DEL MES: JUNIO /2024

Apreciado Cliente
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE V?AS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATL?NTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL
secretariadehacienda@sabanagrande-atlant

Saldo Anterior	$4,627,240,038.84	Dias Sobregiro	0
Más:Créditos	$3,774,441.50	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$3,920,729.00	Tasa Sobregiro	30.76% E.A
Nuevo Saldo	$4,627,093,751.34	Tasa Mora	30.76% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
18	06	Nd Traslad Fondos Sebra	GB MONEDA EXTRANJERA	0146	$3,920,729.00-	$4,623,319,309.84+
30	06	Ganancia Intereses Adicionales		0000	$3,774,441.50+	$4,627,093,751.34+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Interés de Sobregiro: 2.26 % M.V. 30.76 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Para mayor información en www.davivienda.com
