Gmail **CONSORCIO ODESSA INTERVENTORIA ATLÁNTICO <contrato135inv@gmail.com>**

Resultado Radicación de Solicitud

1 mensaje

enviorespuestas@invias.gov.co <enviorespuestas@invias.gov.co> 13 de diciembre de 2024, 9:02
Para: contrato135inv@gmail.com

Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado vía correo electrónico: Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-127989 Remite: CONSORCIO ODESSA INTERVENTORIA ATLÁNTICO Fecha: 2024-12-12 19:34:04 Para: atencionciudadano@invias.gov.co Asunto: C T 135 467 2024 Informe mensual de Interventoria No. 10 Contrato 4805 2023 Noviembre 2024 Adjunto a este correo se incluye la solicitud original con la información de radicación

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

C_T_135_467_2024_Informe_mensual_de_Interventoria_No._10_Contrato_4805_2023___Noviembre_2024_5556593.pdf
22301K

Sabanagrande, 12 de diciembre del 2024

C-T-135-467-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn.: Ing. Diana María Vanegas Jaramillo
Directora Territorial Atlántico
La Ciudad

Referencia: **Contrato No. 4805 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1"**

Asunto: Informe mensual de Interventoría No. 10 Contrato 4805-2023 - Noviembre 2024

Respetados señores:

Se remite para su revisión el informe mensual No. 10 de interventoría del contrato de la referencia, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, de acuerdo la estructura del Manual de Interventoría de Obra Pública y lista de chequeo de informe mensual MEPI-MN1-IN-15-FR-1. Se aclara que para el periodo de dicho informe las labores de interventoría se centraron en el seguimiento legal, técnico, ambiental y social de los contratos de obra derivados de los convenios 2220-2023 (Pondera – Atlántico) y 2221-2023 (Sabanagrande – Atlántico).

Atentamente,

JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
CONSORCIO ODESSA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios (336)	CD ( )	Tomos ( )	Carpeta Digital (01)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1. LP-001-2023 (Ponedera) / 2. SG-LP-OP-004-2023 (Sabanagrande) **Contratista:** 1. CONSORCIO LA GIRALDA / 2. CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

Contrato de Interventoría No. 4805 DE 2023 **Interventoría:** CONSORCIO ODESSA

Objeto Contrato de Obra:
1. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

INFORME MENSUAL No. 10 **MES O PERIODO:** 01 al 30 de Noviembre 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		10
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		19
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		22
2.4	Características técnicas del proyecto		23
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		25
3.1	Información general del contrato		27
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		34
3.3	Seguimiento Items no previstos		35
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		36
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		46
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	48
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	66
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	70
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		75
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	79
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		85
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	91
	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	N/A	
4.8	Otros documentos seguimiento mensual		110
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-2-FR-2	111
		N/A	
	• Seguimiento Programa de Obra	N/A	
	• Seguimiento Programa de Inversiones		117
		MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	120
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	140
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		155
5.1	Información general del contrato		157
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		158
5.3	Informes especialistas y profesionales		161
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		161
5.5	Informe matriz de riesgos.		161
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		162
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		162
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		242
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	244
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	247
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	249
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	251
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	256
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		259
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-3-FR-2	260
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN1-N-9-FR-2	287
	• Seguimiento al Plan de Cargas	N/A	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		290
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		294
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		299
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		312
8.5	Informe de cuentas de los convenios de obra		338

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4694 de fecha Octubre de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 noviembre 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO INFORME 10 **PERIODO MES:** 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4805 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO: 1 de marzo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de julio de 2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACION: 14 de diciembre de 2024
PLAZO ACUMULADO: 8 MESES Y 14 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 12.460.000.000,00
VALOR ADICIÓNALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 12.460.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Pavimento rigido	Km	2,7
	Box culvert	Un	1,00
Mantenimiento	Conformación	Km	5,70

Nota: Las metas fisicas se han definidido según los estudios y diseños.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Pavimento rigido	Km	0,00	0,00
	Box culvert	Un	0,00	0,00
Estructuras	Conformación	Km	0,00	0,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA DIRECTA	$ 12.196.043.125,30	$ 0,00	$ 12.196.043.125,30
PMT	$ 48.543.625,00	$ 0,00	$ 48.543.625,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 33.807.959,00	$ 0,00	$ 33.807.959,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 57.072.200,00	$ 10.843.718,00	$ 67.915.918,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 113.689.372,70	$ 0,00	$ 113.689.372,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.449.156.282,00**	**$ 10.843.718,00**	**$ 12.460.000.000,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRA DIRECTA	N/A	$ 0,00	N/A	$ 615.151.035,60
PMT	N/A	$ 0,00	N/A	$ 0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	N/A	$ 0,00	N/A	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	$ 0,00	N/A	$ 27.166.367,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	N/A	$ 0,00	N/A	$ 0,00
VALOR EJECUTADO	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 642.317.402,60**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 10.753.966.575,22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 615.151.035,60
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 5,72%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADO: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo La Giralda - Santa Rita. Corte de Subrasante 0+590



Tramo La Giralda - Santa Rita. Instalación de material de mejoramiento. K0+650

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

* Con respecto a la reprogramación No. 1 al programa de inversiones realizada para la prórroga No. 1, se presenta un atraso en programación imputable al contratista por las demoras en la aprobación de los estudios y diseños, no inicio oportuno de ejecución de las obras y bajos rendimientos en la ejecución de las obras. Respecto a los atrasos del contratista la interventoría mediante comunicación C-T-135-188- 2024 del 18/07/2024 recomienda al Municipio de Pondera la apertura de un proceso sancionatorio por incumplimientos en la aprobación de estudios y diseños y programación de obra. Posteriormente se actualiza el proceso sancionatorio mediante comunicación C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, en el que se reitera la necesidad de conminar al contratista de obra.

* La interventoría mediante comunicado C-T-135-424-2024 del 29/11/2024 informa al Municipio de Ponedera los incumplimientos reiterados por parte del contratista, relacionados con la no actualización de pólizas, informes ambientales y atrasos de obra.

Firma
Nombre 25202-27254 CND
R.L de Interventoría
Matrícula No. JOHN ANDRES ARIAS H.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30 noviembre 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO INFORME 10 **PERIODO MES:** 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: SG-LP-OP-004-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO 4 de marzo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE TERMINACION: 4 de diciembre de 2024
PLAZO ACUMULADO: Nueve (9) meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 6.542.182.495,26
VALOR ADICIÓNALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 6.542.182.495,26
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 719.745.270,50
AMORTIZACION ANTICIPO: $ 483.389.853,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4805 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Pavimento Rigido	Km	2,0
	Rehabilitación	Km	0,00
Manteniemiento	Conformación y afirmado	Km	2,20

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Pavimento Rigido	Km	0,16	1,62
	Rehabilitación	Km	0,00	0,00
Manteniemiento	Conformación y afirmado	Km	0,00	0,00

Nota: Actualmente se desarrolla la etapa de ajustes y complementación de estudios y diseños con el fin de definiri las estructuras a ejecutar y precisar el el alcance del contrato.

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA DIRECTA	$ 6.215.826.029,36	$ 0,00	$ 6.215.826.029,36
PMT	$ 26.321.802,00	$ 0,00	$ 26.321.802,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 14.387.139,20	$ 0,00	$ 14.387.139,20
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31.638.500,00	$ 6.011.315,00	$ 37.649.815,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 247.997.709,70	$ 0,00	$ 247.997.709,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6.536.171.180,00**	**$ 6.011.315,00**	**$ 6.542.182.495,26**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRA DIRECTA	$ 1.007.298.853,00	$ 0,00	$ 1.007.298.853,00	$ 4.120.608.262,00
PMT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 40.291.954,00	$ 0,00	$ 40.291.954,00	$ 164.824.330,00
VALOR EJECUTADO	**$ 1.047.590.807,00**	**$ 0,00**	**$ 1.047.590.807,00**	**$ 4.285.432.592,00**

* Los avances son aproximados al mes y seran precisados con la suscripción del acta de recibo parcial de obra el 10 del siguiente mes.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 6.157.829.632,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.120.608.262,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 66,92%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 23
EMPLEOS INDIRECTOS GENERAD 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **31**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Tramo Sabanagrande - Limites Polonuevo. Fundida de Concreto MR38 1+160 CD



Tramo Sabanagrande - Limites Polonuevo. Fundida de Concreto MR38 1+553 CI

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

*La interventoría solicitó al contratista con copia al Municipio de Sabanagrande,mediante comunicado C-T-135-383-2024 dio respuesta al plan de contingencia emitido por el contratista, donde manifiesta que el atraso en la ejecución de las obras ha sido producto de las precipitaciones presentes en el sitio de obra generando retrasos en la ejecución de la obra, la interventoría manifiesta que, dentro de la Matriz 3 - Riesgos del proceso licitatorio, se establece la posibilidad de eventos aleatorios que puedan generar retrasos en la ejecución de las obras, con dicho formato se informó al contratista las posibles adversidad que podrían generar retraso en la obra, por lo tanto, debió preveer dichas situaciones y aun asi no se soporta debidamente el impacto de las lluvias y la variación climatica.
En el mismo Plan de Contingencia el contratista manifiesta que, aumentará el aumento de personal para la construcción de bordillos, alcantarillas, y canal, personal que a la fecha no se ha hecho presente en obra incumpliendo así el plan de contringencia presentado, se sugirió al Municipio adelantar las respectivas sanciones por causas imputable unicamente al contratista
* La interventotría recomendó al municipio de Sabanagrande el inicio de proceso sancionatorio al contratista, mediante comunicado C-T-135-404-2024 del 14/11/2024.

Firma
Nombre 25202-27254 CND
Director de Interventoría JOHN ANDRES ARIAS H.
Matrícula No. 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

CONTRATO 4805 DE 2023

CONSORCIO ODESSA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10

VERSIÓN 00

01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ELABORADO Y REVISADO POR

ING JOHN ANDRÉS ARIAS HUERTAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING RONALD MOLINARES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING OSCAR JAVIER GARZÓN DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL



INTRODUCCIÓN

1

NOVIEMBRE 2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual **No. 10** corresponde al periodo comprendido entre el **01 al 30 de NOVIEMBRE de 2024**, y contiene el seguimiento a las actividades realizadas por la interventoría ejercida mediante contrato 4805 DE 2023 suscrito entre el INVIAS y el CONSORCIO ODESSA que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1" para el seguimiento y control de los contratos de obra No. LP-001-2023 del 7 de noviembre de 2023 que tiene por objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y el contrato de obra No. SG-LP-OP-004-2023 del 29 de septiembre de 2023 que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

En el presente informe se relacionan las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental realizadas por la interventoría y los hechos más relevantes que han surgido para los contratos de obra posteriores a su fecha de suscripción e inicio, así mismo a los hechos que se han presentado en el desarrollo de los convenios interadministrativos No. 2220-2023 que tiene como objeto AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO y convenio No. 2221-2023 que tiene como objeto AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Para el periodo del presente informe se presenta el seguimiento a la ejecución de las obras en el Tramo de SABANAGRANDE – POLONUEVO del Municipio de Sabanagrande y LA GIRALDA – SANTA RITA del Municipio de Ponedera, se describe el seguimiento legal, técnico, ambiental y social y el seguimiento a la etapa de ajustes y complemento de estudios y diseños de los contratos de obra y demás documentos de seguimiento mensual como programación, APUS y presupuesto de obra.

Capítulo 2 Descripción del proyecto.

- Localización: se incluye un esquema claro y completo de ubicación de los sectores de intervención de la vía La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico) y la vía de Sabanagrande - Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico).
- Inventario y estado inicial de la vía: se hace una relación del estado de los sectores a cargo del contrato.
- Características técnicas del proyecto: En este acápite se relacionan los parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir, tipificación de los diferentes sectores.

Capítulo 3 Información contrato de obra.

- Información general del contrato: Se relaciona el número del proceso de selección, número del contrato, fecha de suscripción, objeto, Contratista, NIT, valor inicial, adiciones, valor acumulado del contrato, modificaciones, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación actual del contrato, dirección y número de teléfono.
- Se describen las actividades ejecutadas en el mes, con el avance en la ejecución del mes y el avance acumulado del proyecto; actividades desarrolladas por parte del Contratista, además del resumen ejecutivo de las gestiones realizadas, avance del proyecto.

Capítulo 4 Reportes ejecución mensual contrato de obra.

Los reportes corresponden a los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR de: Resumen mensual estado general del proyecto, Maquinaria y equipo del contrato de obra, Personal del contrato de obra, Informe financiero y presupuestal, Contrato de obra,

Estado general del tiempo, Resumen de ensayos de laboratorio, Control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra, Informe de avance físico-financiero, Seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra.

Capítulo 5 Información Contrato de Interventoría.

- Información general del contrato: Se relaciona el número del proceso de selección, número del contrato, fecha de suscripción, objeto, Contratista, NIT, valor inicial, valor acumulado del contrato, modificaciones, aclaraciones, suspensiones, cesiones de participación contractual, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación actual del contrato, dirección y número de teléfono.
- Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría.
- Informes Especialistas.

- Informe del Programa Anual de Caja- PAC: Se presenta la programación mensual de los recursos a ejecutar para el contrato de obra y para el contrato de interventoría.
- Información sobre otros programas y aplicativos: Se presenta el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en el pliego de condiciones o solicitados por el INVIAS.

Capítulo 6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría.

Los reportes corresponden a los formatos MINFRA-MN-IN-15-FR de: Equipo contrato de interventoría, Personal contrato de interventoría, Informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría, Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría, seguimiento garantías contrato de interventoría seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría.

Capítulo 7 Conclusiones y recomendaciones.

En este capítulo se presentan las conclusiones relevantes sobre el estado del contrato de obra y de interventoría en cada una de las áreas de ejecución, técnica, ambiental.

Capítulo 8 Anexos.

En el presente capítulo se relaciona la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo, Registro fotográfico del avance de las obras. El contrato se encuentra en fase de complementación de estudios y diseños.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2

NOVIEMBRE 2024

CONTENIDO

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

2.4 Características técnicas del proyecto

CAPITULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a) Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

El proyecto comprende el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vía terciaria que se localizada al sur del municipio de Ponedera conectando los sectores de LA GIRALDA y SANTA RITA EL VIEJO en longitud de 9.6 Km.

De acuerdo con el contrato de obra en su cláusula tercera y anexo técnico, el Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica.

El contrato de obra comprende la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, siendo esta una actividad preliminar a la ejecución de obras que permitirán definir las intervenciones, estructuras y precisar el alcance en la ejecución de las obras.

Los presupuestos realizados para la suscripción del convenio 2220-2023 y contrato de obra LP-001-2023 proyectan una intervención de la siguiente manera:

- 3980 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido y obras de drenaje.
- 5850 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado.
- Se proyectan anchos de 5.50 m, los cuales será revisados en la etapa de estudios y diseños y dependerán del estudio de tránsito y diseño geométrico de la vía.

No obstante, es pertinente precisar que una vez aprobado el diseño de pavimento y teniendo en cuenta el diseño geométrico y estudio hidráulico presentado las metas definidas son las siguientes:

- 2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
- 5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

- 1 Box culvert

El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

b) Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El proyecto comprende el MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vía terciaria que se localizada al occidente del municipio de Sabanagrande, conectando los sectores de SABANANGRANDE a los límites con POLONUEVO en longitud de 5.1 Km.

De acuerdo con el contrato de obra en su cláusula tercera y anexo técnico, el Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica.

El contrato de obra comprende la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, siendo esta una actividad preliminar a la ejecución de obras que permitirán definir las intervenciones, estructuras y precisar el alcance en la ejecución de las obras.

Los presupuestos realizados para la suscripción del convenio 2221-2023 y contrato de obra SG-LP-OP-004-2023 proyectaban una intervención de la siguiente manera:

- 2150 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido y obras de drenaje.

- 3335 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada existente e instalación de afirmado.

- Se proyectan anchos de 5.50 m, los cuales será revisados en la etapa de estudios y diseños y dependerán del estudio de tránsito y diseño geométrico de la vía.

No obstante, es pertinente precisar que una vez aprobado el diseño de pavimento y teniendo en cuenta el diseño geométrico y estudio hidráulico presentado las metas definidas son las siguientes:

- 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.30 m (incluyendo bordillos de 0.15 m en ambos costados), teniendo en cuenta que el estudio de tránsito arrojo un alto flujo vehicular de todo tipo y

tránsito de camiones, siendo necesario garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008.

- 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.


Respecto al alcance de las intervenciones se aclara que el Municipio de Sabanagrande mediante modificatorio al contrato suscrito el 17/04/2024, decide excluir del alcance e intervención del contrato el Tramo entre el K2+000 al K2+850 con el fin de avanzar en este tramo con pavimento rígido a cargo de otro proceso de contratación por parte del Municipio de Sabanagrande.

Por lo anterior el alcance del proyecto se establece en los siguientes tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención).

2.1 Localización

a) Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

El corredor vial de 9.6 Km de longitud corresponde a una vía terciaria localizada en el Municipio de Ponedera – Departamento del Atlántico, entre el sector conocido como La Giralda específicamente en el Ferry para Salamina y transcurre por la rivera del rio Magdalena hasta conectar la vía principal de Ponedera a Puerto Giraldo en cercanías al corregimiento de Santa Rita.

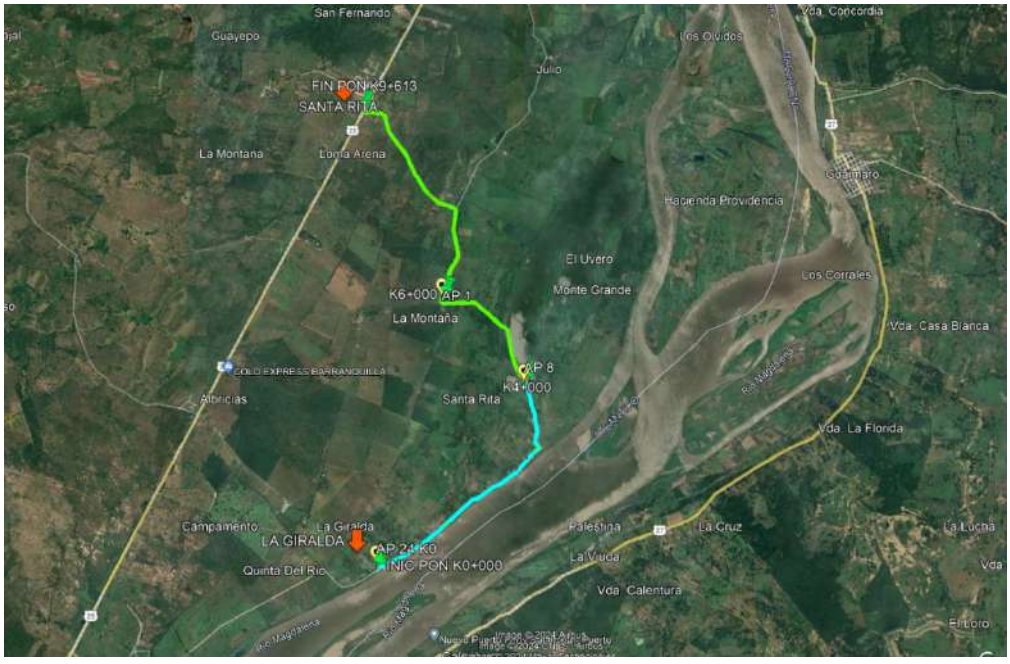

b) Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El corredor de 5.1 Km de longitud corresponde a una vía terciaria que se localiza en el Municipio de Sabanagrande – Departamento del Atlántico, entre la Glorieta de salida de Sabanagrande hasta los límites con el Municipio de Polonuevo.

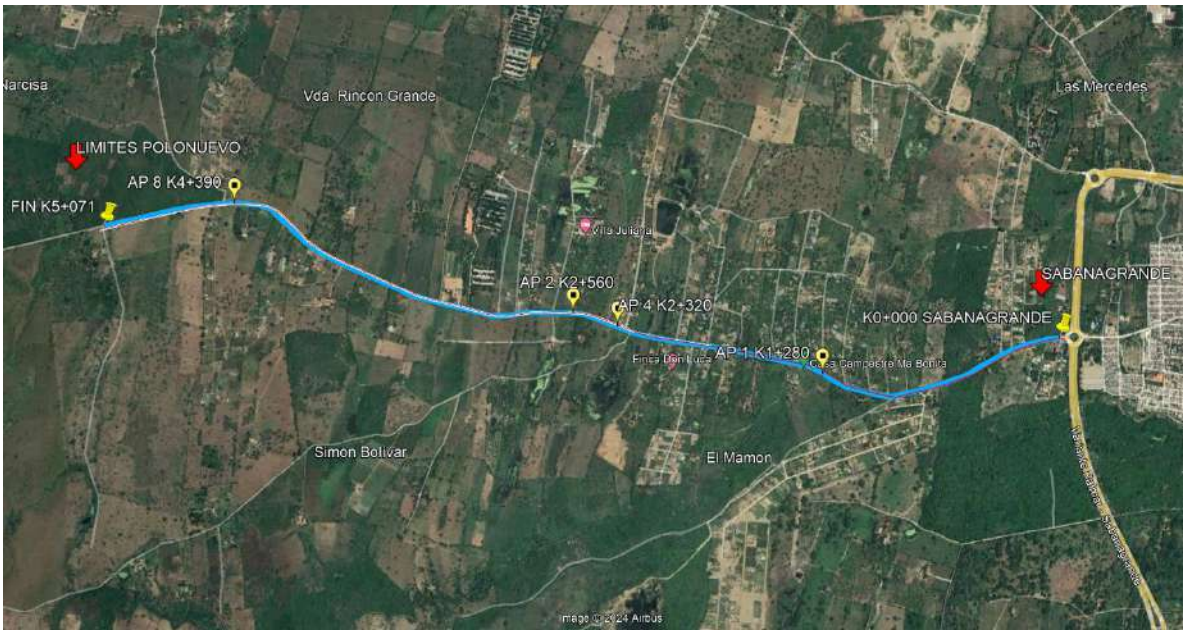


Figura 1. Localización general del Proyecto LA GIRALDA – SANTA RITA (MUNICIPIO DE PONEDERA – ATLANTICO).

Vía La Giralda en el Ferry para Salamina por la rivera del rio Magdalena y conecta a la vía principal de Ponedera a Puerto Giraldo en el corregimiento de Santa Rita.

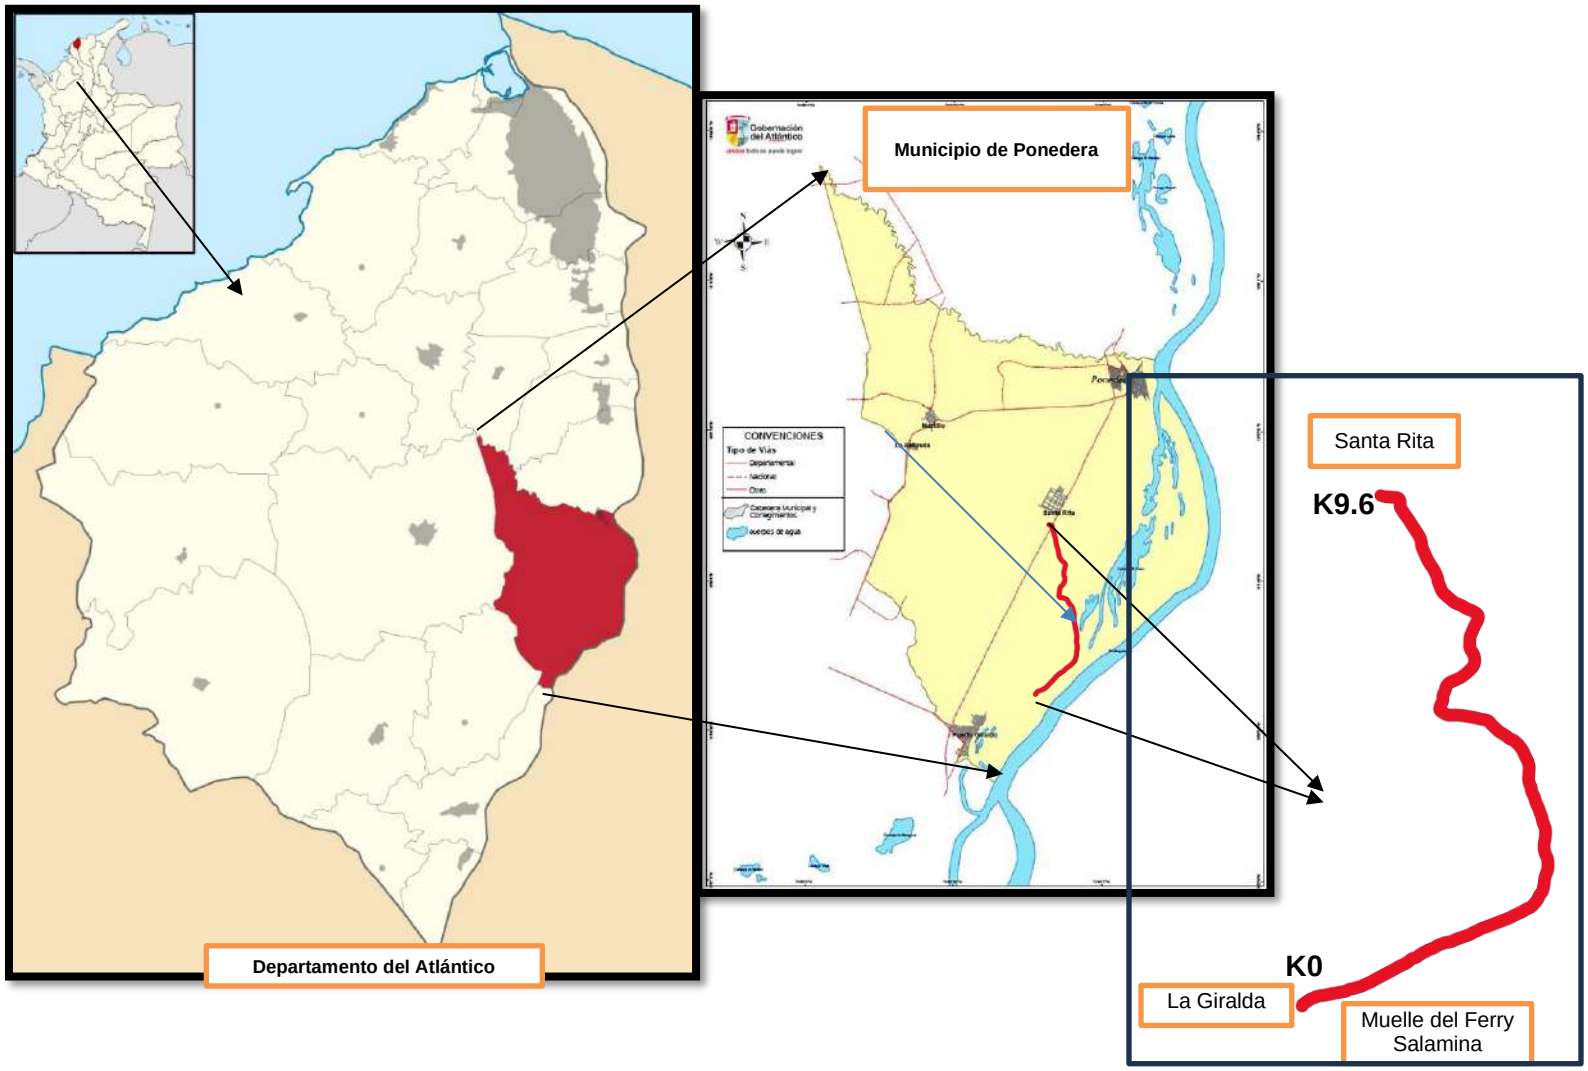


Figura 2 Localización general del Proyecto SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (MUNICIPIO DE SABANAGRANDE).

Vía terciaria que se localizada al occidente del municipio de Sabanagrande, conectando los sectores de SABANANGRANDE a los límites con POLONUEVO.

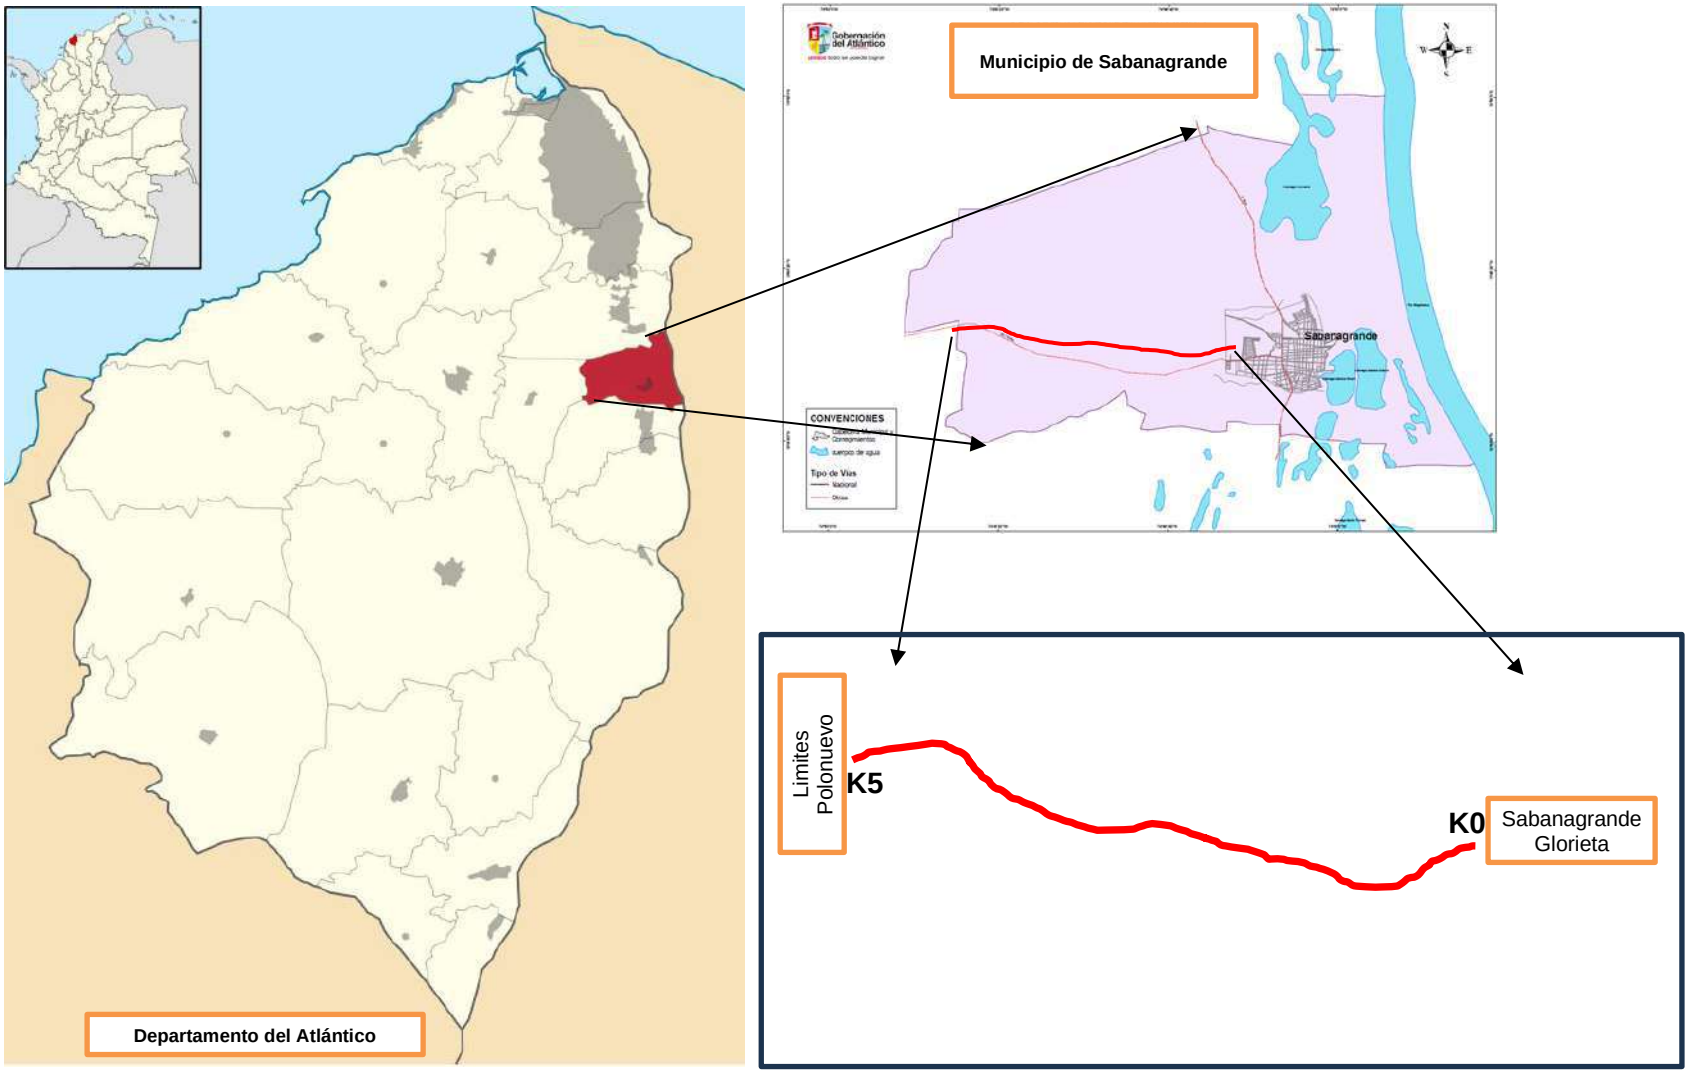


Gráfico No. 1. Esquema LA GIRALDA – SANTA RITA (MUNICIPIO DE PONEDERA – ATLANTICO).


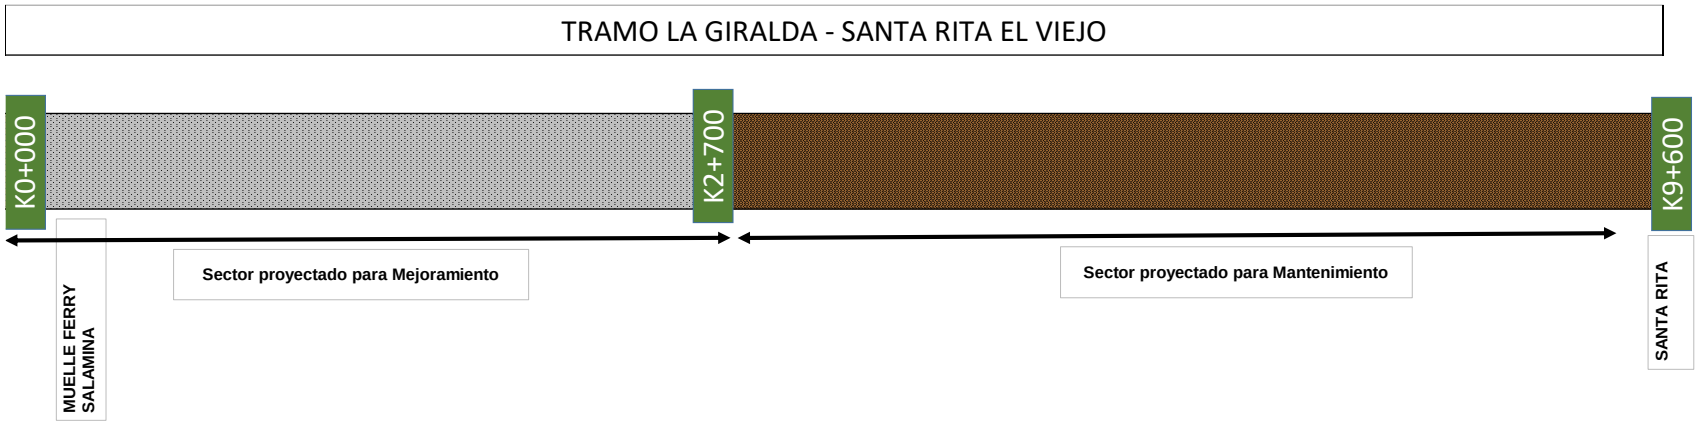



Gráfico No. 2. Esquema SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (MUNICIPIO DE SABANAGRANDE).

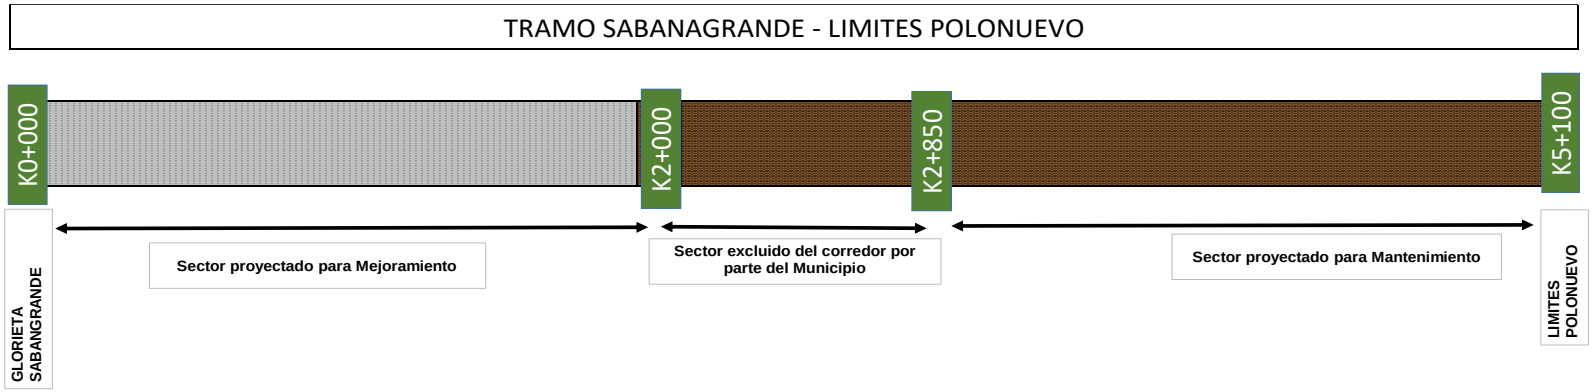

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

a) Proyecto La Giralda – Santa Rita (Ponedera)

El municipio que hace parte de la zona de influencia del proyecto, es el Municipio de PONEDERA y específicamente se verán beneficiados con la construcción del proyecto los corregimientos de Santa Rita y Puerto Giraldo, así como los vehículos que transitan desde el muelle del ferry de Salamina departamento de Magdalena hacia el departamento del Atlántico y viceversa.

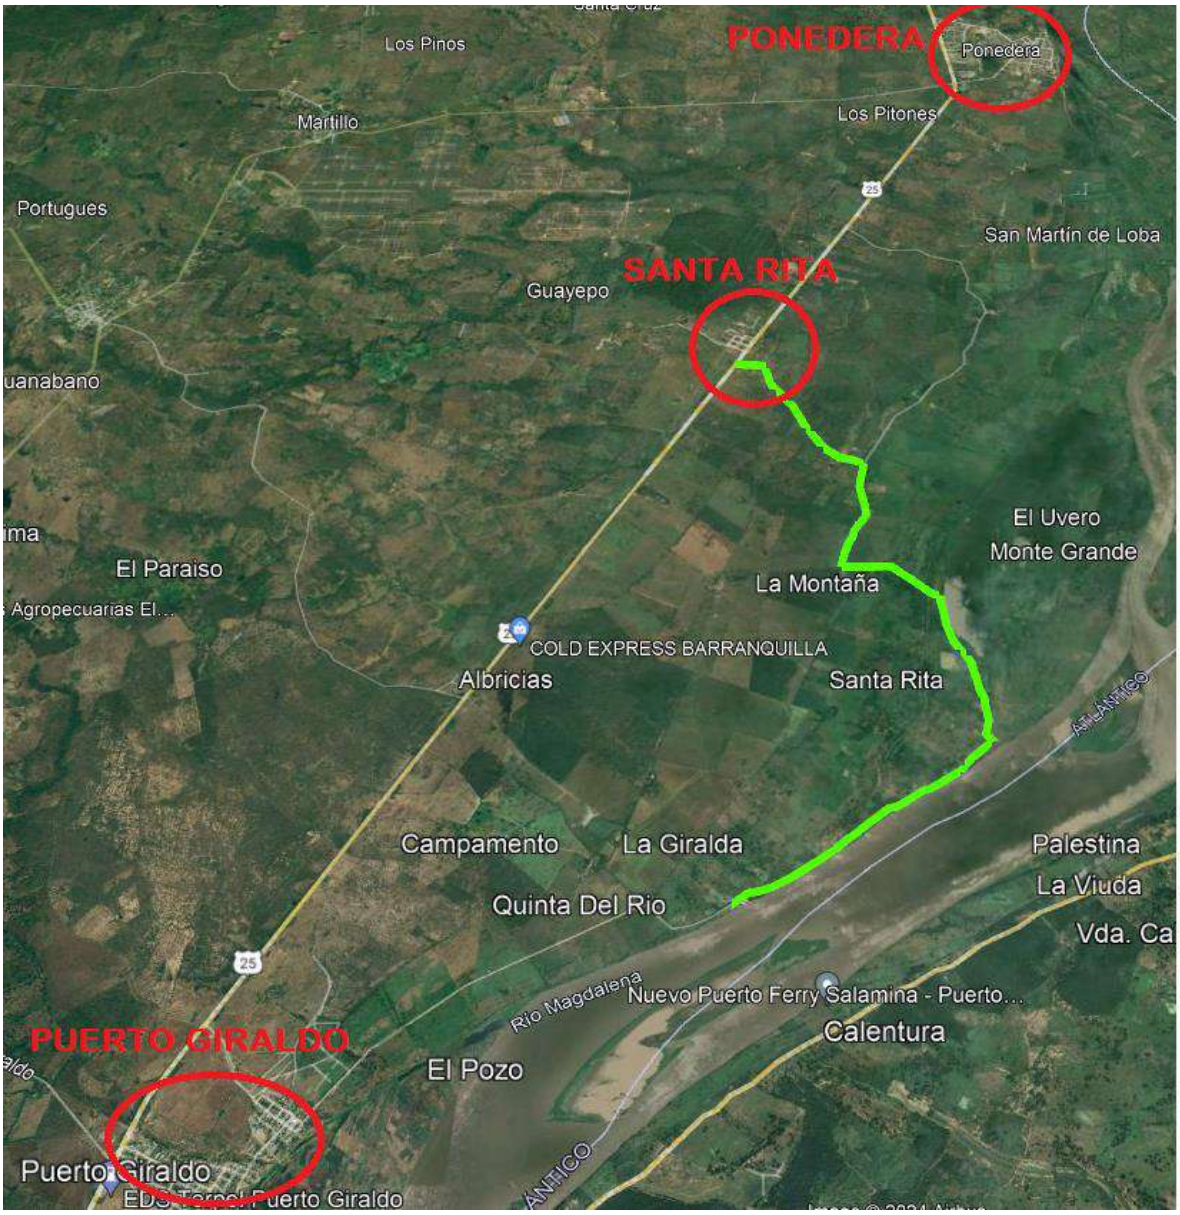

Los beneficios por la construcción de pavimento rígido proyectado para esta vía terciaria son los siguientes:

- Facilitar la movilidad de las personas que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros, hecho que disminuirá los tiempos de viaje y el índice de accidentalidad.


- Mejorar la calidad de vida de los habitantes al ofrecer una superficie de rodadura en zonas criticas por las que por lo general se presentan dificultades en la transitabilidad y por ende genera mayor esfuerzo para su paso por parte de los usuarios y habitantes de la zona.

- Generar conexión vial, reducir la accidentalidad y mejorar la economía del sector al poder garantizar el tránsito de vehículos de carga de productos agropecuarios de la zona.

- Mejorar la capacidad vial del municipio de Ponedera.

b) Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande)

El municipio que hace parte de la zona de influencia del proyecto, es el Municipio de SABANAGRANDE y específicamente se verán beneficiados con la construcción del proyecto los municipios de Sabanagrande y Polonuevo.

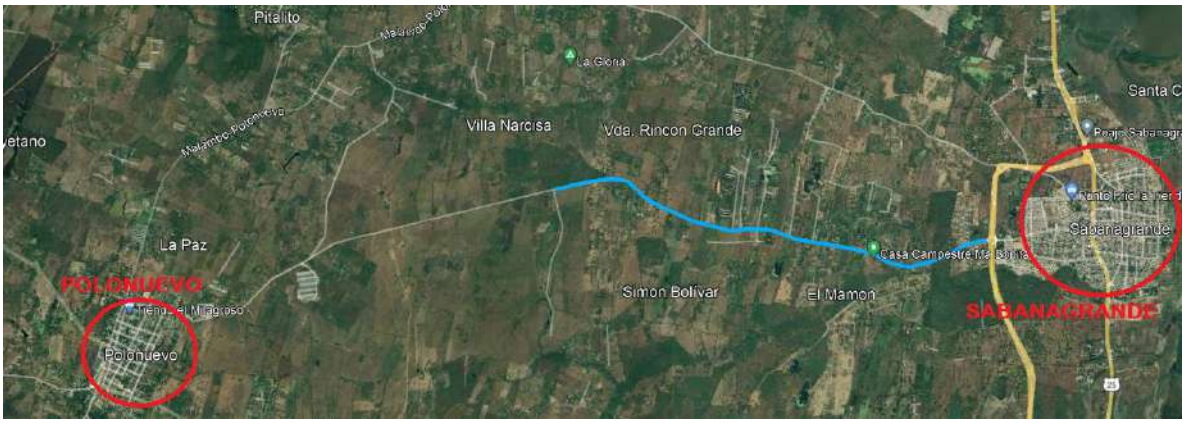

Los beneficios por la construcción de pavimento rígido proyectado para esta vía terciaria son los siguientes:

c) Facilitar la movilidad de las personas que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros, hecho que disminuirá los tiempos de viaje y el índice de accidentalidad.

d) Mejorar la calidad de vida de los habitantes al ofrecer una superficie de rodadura en zonas críticas por las que por lo general se presentan dificultades en la transitabilidad y por ende genera mayor esfuerzo para su paso por parte de los usuarios y habitantes de la zona.

e) Generar conexión vial, reducir la accidentalidad y mejorar la economía del sector al poder garantizar el tránsito de vehículos de carga de productos agropecuarios de la zona.

f) Mejorar la capacidad vial del municipio de Sabanagrande.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

a) Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

El corredor de 9.6 Km comprendido entre La Giralda (Muelle del Ferry Salamina) - Santa Rita, discurre en un tramo posicionado en su mayoría sobre un terraplén y con superficie en afirmado en mal estado y con bastantes deformaciones y hundimientos entre el K0+000 al K9+600, cuya ronda del rio Magdalena se encuentra en los tres primeros kilómetros (K0+000 al K3+000). Cuenta con obras hidráulicas en buenas condiciones. Las obras de drenaje existentes se encuentran entre en sector proyectado para mantenimiento por lo que su intervención obedecerá a las necesidades reales de mantenimiento en la etapa final del contrato.

En el marco de la ejecución de estudios y diseños que se desarrollan para los dos contratos de obra se han identificado las siguientes obras:

ABCSISADO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPECIFICACIÓN DE ALCANTARILLA		DIÁMETRO TUBERÍA (PULGADA)	DIÁMETRO DE CAJA (M)	ESTADO		
			BOX	TUBERÍA			MALA	REGULAR	BUENA
K6+960	4	4,75	X			4.7*1.0		X	
K7+280	7,12	2,56	X			2.5*1		X	
K7+420	4,87	1,2		X	36"		X		

En el siguiente informe se precisarán las abscisas y características de cada una de las obras.

b) Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El corredor vial de 5.1 Km se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre la Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro entre el K0 al K5+071 y con algunos sobrantes de asfalto en el primer kilómetro (K0+000 al K1+200) y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%. Corredor que es altamente transitado y por el alto crecimiento que se presenta en el corredor.

En el marco de la ejecución de estudios y diseños que se desarrollan se identifican las siguientes obras.

ABSCISADO	LONGITUD	ANCHO	ESPECIFICACION DE ALCANTARILLA		DIAMETRO TUBERIA (PULGADA)	DIAMETRO DE CAJA	ESTADO		
			BOX	TUBERIA			MALA	REGULAR	BUENA
K1+283.54	6,67	2,56	X			2*1.5			X
K2+210	7,08	2	X			2*1			X
K2+485	7,5	3	X			3*2			X
K3+155	6.72	1.86		X	36"			X	
K3+950				X	36"			X	
K4+700				X	36"			X	

2.4 Características técnicas del proyecto


2.4.1 PONEDERA:

El corredor comprendido entre La Giralda (Muelle del Ferry Salamina) - Santa Rita en longitud de 9.6 Km, transcurre en un tramo posicionado en su mayoría sobre un terraplén con un ancho promedio de 5.6 m y con superficie en afirmado en regular estado y con alto contenido de arcillas debajo de este, cuya ronda del rio Magdalena se encuentra cercana a la vía en los tres primeros kilómetros. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente requerirán actividades de mantenimiento.

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.

El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

La sección típica de la vía de acuerdo con el diseño geométrico y de pavimentos es la siguiente, con la aclaración del anterior párrafo:

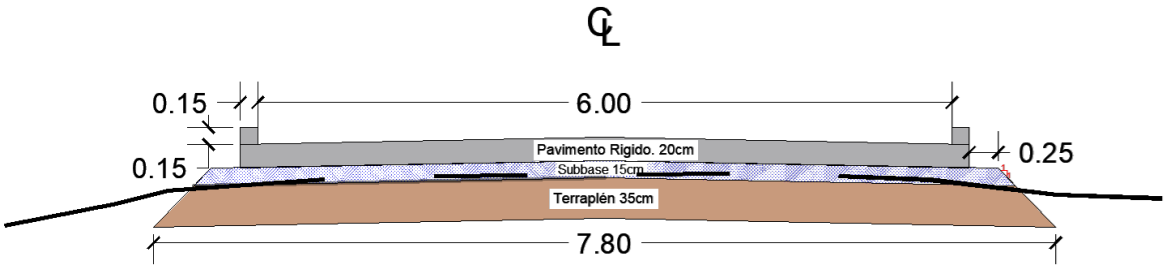

El proyecto se desarrollará bajo las especificaciones técnicas de construcción INVIAS 2022.

2.4.2 SABANAGRADE:


El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas. El Corredor

que es altamente transitado por vehículos de carga y automóviles por el alto crecimiento poblacional que se presenta en el corredor.

El alcance del proyecto se establece en los siguientes tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención).

Se proyecta la intervención de mejoramiento de vía mediante la construcción de pavimento rígido, con una meta física de 2 Km de pavimento rígido y 2.25 Km de mantenimiento vial, cuya intervención será precisado en la etapa final del contrato de acuerdo con las condiciones finales de la rasante y con el fin de garantizar la entrega a satisfacción de la capa de afirmado.

El ancho de calzada proyectado es de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico. Se presenta a continuación la sección típica.

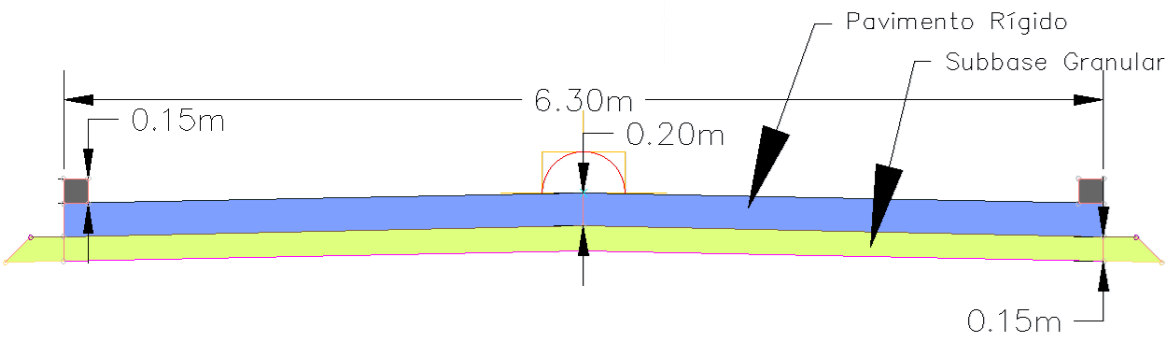

PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
LOTE 1



INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3

NOVIEMBRE 2024

CONTENIDO

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA
3.1 Información general del contrato
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes
3.3 Seguimiento Ítems no previstos
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

CAPITULO 3 CONTRATO DE OBRA

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a) Información contrato Ponedera

Contrato de obra adjudicado mediante licitación pública No. LP-001-2023 con la siguiente información del convenio y contrato de obra:

Tabla 1 Información del convenio y contrato de obra

Convenio INVIAS No.	**2220-2023**
Fecha Convenio INVIAS No.	**21 de junio de 2023**
Objeto Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1 Convenio	Doce (12) meses
Fecha Prorroga No.1 Convenio	22 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2024
No. Proceso	LP-001-2023.
Contrato Nº:	**LP-001-2023**
Fecha suscripción Contrato	**7 de noviembre de 2023**
Aprobación Cesión	N/A
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Tramo	LA GIRALDA – SANTA RITA
Contratista:	CONSORCIO LA GIRALDA
Nit	901.770.166 - 5
Conformado por:	RK CONSTRUCTION GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1 LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9
Representante legal:	EDGAR JOSE TORRES MEJIA
Valor inicial:	**$ 12.460.000.000**
Valor adicional	N/A
Anticipo:	$ 6.230.000.000
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses
Fecha de Inicio:	1 de marzo de 2024
Fecha de terminación inicial:	1 de agosto de 2024
Prorroga No. 1	Tres (3) meses y catorce (14) días.
Fecha Prorroga No. 1	30 de agosto de 2024

Suspensión No. 1	29 julio de 2024 al 27 de agosto de 2024
Fecha reanudación No. 1	28 de agosto de 2024
Fecha de terminación Actual:	14 de diciembre de 2024

Como se pudo identificar en la tabla anterior el contrato de obra LP-001-2023 fue suscrito el 07 de noviembre de 2023, sin embargo, el plazo del contrato que era de cinco (5) meses excedía la vigencia del convenio 2220-2023 suscrito entre el municipio de Ponedera y el INVIAS, que tenía con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023 y la interventoría asignada para el contrato tenía como fecha de inicio el 19 de diciembre de 2023.

Posteriormente se realiza una suspensión No. 1 al contrato de interventoría entre el 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024 con el fin de alcanzar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta que las alcaldías/gobernaciones, se encontraban finalizando su proceso de empalme administrativo debido a la finalización e inicio de los periodos constitucionales de los respectivos mandatarios, razón por la cual no se había impartido para final de año, el inicio a los respectivos contratos de obra; entre otros, por que el cambio de administración implica el cambio de funcionarios, supervisores y personal de apoyo, lo cual afecta la capacidad operativa de los entes territoriales para conducir la correcta ejecución de los contratos. Es así como a su vez dicha suspensión permitió otorgar los tiempos necesarios para el estudio y aprobación de la prórroga No. 1 al contrato de interventoría 4805 DE 2023 suscrito entre el INVIAS y el CONSORCIO ODESSA; Prorroga No. 1 al contrato de interventoría, que se suscribe el 12 de febrero de 2024 por un término de 10 meses, contemplando como fecha de terminación del contrato de interventoría el 14 de diciembre de 2024.

Por lo anterior, se suscribe la prórroga No. 1 al convenio 2220-2023 suscrito entre el Municipio de Ponedera y el INVIAS, el cual tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que mediante la prórroga No. 1 al convenio 2220-2023 el 07 de diciembre de 2023, se amplía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Lo anterior finalmente permite garantizar los plazos del convenio e interventoría para la ejecución de las obras del contrato de obra.

Contrato, adiciones, prorrogas y modificaciones.

A la fecha no se han suscrito modificaciones, adiciones o prorrogas al contrato de obra.

Tabla 2 Modificaciones, adiciones y/o prorrogas PONEDERA

Descripción	Fecha	Causales
Modificatorio 1	5/04/2024	Modificación en la que se realiza una adición en plazo de cuatro meses y en la que se hace una aclaración en el valor final del contrato. Modificatorio que no fue consultado, ni avalado por la interventoría. La interventoría mediante comunicación C-T-135-239-2024 del 09/08/2024 emite observaciones a dicho documento. Posteriormente el Municipio mediante modificatorio No. 3 del 30/08/2024 hace aclaración a los plazos del contrato.
Modificatorio 2	16/04/2024	Modificación por solicitud de la interventoría, con el fin de dar cumplimiento a las GARANTIAS establecidas en el numeral 10 de los estudios previos del convenio 2220-2023 suscrito entre INVIAS y el MUNICIPIO DE PONEDERA del cual se deriva el contrato de obra LP-001-2023. Incluyendo el amparo de Calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras. Se establece el amparo de estabilidad de obra por un valor del 30% del valor del contrato.
Modificatorio 3 (Prorroga No. 1)	30/08/2024	Modificatorio en el que se realiza aclaración del plazo del contrato y se realiza prorroga No. 1 que amplía el plazo del contrato de obra hasta el 14 de diciembre de 2024, conforme al plazo del contrato de interventoría.

Tabla 3 Suspensiones PONEDERA

Descripción	Fecha	Causales
Suspensión No. 1	Del 29 de julio al 27 de agosto de 2024.	Se realiza suspensión del contrato, con el fin de que el Municipio de Ponedera gestione los desvíos necesarios y posible vía alterna, para la restricción del tráfico pesado por el corredor objeto del contrato. La restricción del tráfico se planteó como necesaria en el PMT, debido a que por los anchos de la vía y geometría, se imposibilita la ejecución de las obras paralelamente con actividades constructivas.

Estado de Garantías

Tabla 4 Seguimiento Pólizas PONEDERA

Amparo	Póliza N°	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato.	400052346	$ 1.246.000.000,00	1/3/2024	1/2/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	400052346	$ 6.230.000.000,00	1/3/2024	1/8/2025
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	400052346	$ 2.492.000.000,00	1/3/2024	1/8/2027
Estabilidad y de la Obra	400052346		No presenta	
Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños.				
Predios labores y operaciones, contratista y subcontratistas, vehículos propios y no propios.	400052345	$ 623.000.000,00	11/4/2024	1/8/2024

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento Garantías Contractuales, se presenta sin la firma de interventoría, teniendo en cuenta que el contratista no ha realizado la corrección y actualización las pólizas según observaciones realizadas por la interventoría y que tienen que ver con que no se incluye el amparo de Estabilidad de obra, no se incluye el amparo de estudios y diseños y no se actualizan las pólizas acorde al acta de inicio del 01/03/2024, modificación 02, suspensión 01 y modificación 03 al contrato de obra.

Al respecto la interventoría ha realizado los siguientes requerimientos:

Tabla 5 Requerimientos Interventoría – Pólizas PONEDERA.

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
C-T-135-055-2024	14 de mayo de 2024	PO - Reiterativo 1 - Solicitud Pólizas Acta de inicio del contrato de obra
C-T-135-096-2024	7 de junio de 2024	PO – ADVERTENCIA POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA
C-T-135-106-2024	11 de junio de 2024	PO – REITERACIÓN 2 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA
C-T-135-267-2024	28 de agosto del 2024	Se solicita la actualización de pólizas producto de la suspensión No. 1 al contrato de obra.
C-T-135-305-2024	26 de septiembre de 2024	Se informa que no se ha dado cumplimiento a la Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.
C-T-135-329-2024	2 de octubre de 2024	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos.

COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO
C-T-135-340-2024	9 de octubre de 2024	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos
C-T-135-356-2024	17 de octubre de 2024	PO- Incumplimiento de compromisos, atraso de obra y respuesta plan de contingencia.
C-T-135-379-2024	31 de octubre de 2024	PO- Llamado de atención por la no actualización de las pólizas al Municipio de Ponedera.

Las pólizas no han sido corregidas y actualizadas por el contratista, situación que conllevo a la interventoría a recomendar dos procesos sancionatorios al Municipio de Ponedera mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024 y mediante comunicación C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se recomendó proceso de caducidad en la que se relacionó el incumplimiento reiterado en la actualización de las pólizas. Los procesos sancionatorios no han sido iniciados por el Municipio de Ponedera.

A la fecha a pesar de los compromisos fijados en comités y que se han solicitado medidas sancionatorias al Municipio de Ponedera, el contratista no ha realizado la actualización y corrección de las pólizas.

b) Información contrato Sabanagrande

Contrato de obra adjudicado mediante licitación pública No. SG-LP-OP-004-2023 con la siguiente información del convenio y contrato de obra:

Tabla 6 Información del convenio y contrato de obra SABANAGRANDE

Convenio INVIAS No.	**2221-2023**
Fecha Convenio INVIAS No.	**21 de junio de 2023**
Objeto Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1 Convenio	Doce (12) meses
Fecha Prorroga No.1 Convenio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2024
No. Proceso	SG-LP-OP-004-2023
Contrato Nº:	**SG-LP-OP-004-2023**
Fecha suscripción Contrato	**29 de septiembre de 2023**
Aprobación Cesión	17 de octubre de 2023
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Tramo	SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO
Contratista:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S
Nit	900.614.442-2
Conformado por:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S
Representante legal:	ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO
Valor inicial:	**$ 6.542.182.495,26**

Valor adicional	N/A
Anticipo:	$ 1.962.654.748,58
Plazo Inicial:	Tres (3) meses
Fecha de Inicio:	4 de marzo de 2024
Fecha de terminación inicial:	4 de junio de 2024
Prorroga No. 1	Seis (6) meses
Fecha Prorroga No. 1	9 de mayo de 2024
Suspensión No. 1	N/A
Fecha reanudación No. 1	N/A
Fecha de terminación Actual:	4 de diciembre de 2024

Como se pudo identificar en la tabla anterior el contrato de obra SG-LP-OP-004-2023 fue suscrito el 29 de septiembre de 2023, sin embargo, la interventoría solo suscribió el contrato hasta el 05 de diciembre de 2023 y orden de inicio del 19 de diciembre de 2023 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Posteriormente se realiza una suspensión No. 1 del contrato de interventoría entre el 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024 con el fin de alcanzar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta que las alcaldías/gobernaciones, se encontraban finalizando su proceso de empalme administrativo debido a la finalización e inicio de los periodos constitucionales de los respectivos mandatarios, razón por la cual no se había impartido para final de año, el inicio a los respectivos contratos de obra; entre otros, por que el cambio de administración implica el cambio de funcionarios, supervisores y personal de apoyo, lo cual afecta la capacidad operativa de los entes territoriales para conducir la correcta ejecución de los contratos. Es así que su vez dicha suspensión permite otorgar los tiempos necesarios para el estudio y aprobación de la prórroga No. 1 al contrato de interventoría 4805 DE 2023 suscrito entre el INVIAS y el CONSORCIO ODESSA; Prorroga No. 1 al contrato de interventoría, que se suscribe el 12 de febrero de 2024 por un término de 10 meses, contemplando como fecha de terminación del contrato de interventoría el 14 de diciembre de 2024.

De igual manera teniendo en cuenta el convenio 2221-2023 suscrito entre el Municipio de Sabanagrande y el INVIAS tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, se suscribe prorroga No. 1 al convenio 2221-2023 el 07 de diciembre de 2023, ampliado su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Lo anterior finalmente permite garantizar los plazos del convenio e interventoría para la ejecución de las obras del contrato de obra.

Contrato, adiciones, prorrogas y modificaciones.

A la fecha no se han suscrito modificaciones, adiciones o prorrogas al contrato de obra.

Tabla 7 Modificaciones, adiciones y prorrogas SABANAGRANDE.

Descripción	Fecha	Causales
Modificatorio 1		Modificatorio suscrito al parecer por el Municipio de Sabanagrande, sin conocimiento de la interventoría. Este ha sido solicitado por la interventoría, sin encontrar respuesta del Municipio. De igual manera no se encuentra en la plataforma SECOP.
Modificatorio 2	17/04/2024	Modificación por solicitud del Municipio de la cláusula 3 – ALCANCE DEL OBJETO, agregando el PARAGRAFO 1 con el fin de excluir de la intervención que se realizará en el corredor, el tramo comprendido entre el K2+000 al K2+850 debido a que este tramo será priorizado con otra intervención para pavimento por parte del Municipio de Sabanagrande. Se agrega el PARAGRAFO 2 que modifica una nota del formato de presupuesto en el sentido de permitir a las partes redistribuir los recursos destinados a la partida de mantenimiento vial, hacia la partida de mejoramiento con estructura de pavimento de acuerdo con las revisiones técnicas y necesidades del proyecto.
Modificatorio 3 (Prorroga No. 1)	9/05/2024	Prorroga por **seis (6) meses**, ampliando el plazo de ejecución a nueve (9) meses. Al respecto la interventoría no estuvo de acuerdo con el tiempo de dicha prorroga, ya que la interventoría otorgó aval únicamente por un término de tres (3) meses. El desacuerdo se manifestó al INVIAS y el Municipio de Sabanagrande mediante comunicado C-T-135-153-2024 del 02 de julio de 2024. Se actualiza el índice de ajustes de ICCP a ICOCIV.
Modificatorio 4	26/07/2024	Modificar la cláusula No. 8 FORMA DE PAGO, en la cual disminuye el porcentaje de anticipo del 30% al 11% de acuerdo con los desembolsos autorizados a la fecha. El saldo de los recursos de anticipo recursos fueron retornados a la cuenta del convenio el 11/09/2024.

Teniendo en cuenta la suscripción de la prórroga No. 1, la nueva fecha de terminación del contrato es el 04 de diciembre de 2024.

Estado Garantías

Tabla 8 Seguimiento Pólizas SABANAGRANDE.

Se presentan las pólizas actualizadas del contrato de obra SG-LP-OP-004-2023.

Amparo	Póliza N°	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato.	5-44-101124914	$ 654.218.249,53	4/3/2024	18/5/2025
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5-44-101124914	$ 1.308.436.499,05	4/3/2024	16/1/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	5-44-101124914	$ 1.962.654.748,58	4/3/2024	18/5/2025
Estabilidad y de la Obra	5-44-101124914	$ 1.962.654.748,58	5 años y 1 días después de terminación.	
Calidad del servicio	5-44-101124914	$ 11.294.944,50	18/5/2024	19/5/2029
Predios labores y operaciones, contratista y subcontratistas, vehículos propios y no propios.	85-40-101057279	$ 464.000.000,00	4/3/2024	16/1/2025

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento Garantías Contractuales, se amplía la información.

3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes

a) Actividades Vía GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.

Debido a que el contratista no ha finalizado la etapa de estudios y diseños del contrato debido a que no se han atendido de forma oportuna y con la calidad requerida las observaciones de interventoría se han adelantado actividades para complementar los estudios y diseños. Así mismo debido a que ya se cuenta con diseño de pavimento aprobado y se tiene el aval de 1 Km de diseño geométrico, el contratista continúo con las siguientes actividades:

- ✓ Replanteo Topográfico
- ✓ Se realizan comités de obra con el objetivo socializar ajustes a los diseños y documentos de inicio de las obras, avance de obra.
- ✓ Explanaciones: Excavación del K0+000 a K0+090 y del K0+610 al K1+000.
- ✓ Instalación de material de mejoramiento de subrasante: Del K0+610 al K0+860.

b) Actividades Vía SABANAGRANDE – POLONUEVO - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE.

En el presente periodo se realizan actividades de ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y actividades de obra, entre las que se encuentran:

- ✓ Explanaciones entre el K0+830 al K1+160.
- ✓ Instalación de subbase del K0+830 al K1+160.
- ✓ Instalación de concreto MR 3.8 Mpa del K0+860 al K1+160 CD.
- ✓ Instalación de concreto MR 3.8 Mpa del K1+000 al K1+553 CI.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos

a) Seguimiento ítems no previstos Vía GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA).

Tabla 9 Seguimiento Ítems no previstos PONEDERA

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
NP-01	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo) - Para Protección de taludes.	m3	$ 699.345,00	-	
NP-02	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil tipo tejido 2400)	m2	$ 11.682,00	4.408,00	$ 51.494.256,00
NP-03	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,15m)	m	$ 33.725,00	-	
NP-04	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	$ 1.737,00	14.799,00	$ 25.705.863,00
NP-05	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	$ 30.991,00	1.472,80	$ 45.643.545,00
			SUB-TOTAL		**$ 122.843.664,00**

Con corte al 30/11/2024, se tiene una ejecución en ítems no previstos de $ 122.843.664,00 que equivale 30.75% de la obra ejecutada. El porcentaje se debe principalmente a que el presupuesto inicial no contemplaba los ítems de excavación de la explanación y transporte de la excavación.

b) Seguimiento ítems no previstos Vía SABANAGRANDE – POLONUEVO (SABANAGRANDE).

Tabla 10 Seguimiento Ítems no previstos SABANAGRANDE.

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
NP-01	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	$ 31.500,00	2.813,30	$ 88.618.950,00
NP-02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con precio de mercado)	M3-KM	$ 2.210,00	12.871,00	$ 28.444.910,00
NP-03	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,15m)	m	$ 48.495,75	214,00	$ 10.378.091,00
NP-04	TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	m3	$ 22.204,95	77,80	$ 1.727.545,00
NP-05	TUBERIA DE PVC CORRUGADA PERFORADA Ø 4"	m	$ 22.547,14	-	$ -
NP-06	Geotextil NT 2000	m2	$ 6.748,22	-	$ -
NP-07	Material filtrante Grava de 3/4 a 3 pulgada	m3	$ 242.390,56	-	$ -
NP-08	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO CON IMPRIMANTE (Suministro e Instalación)	m	$ 5.889,00		
NP-09	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	$ 54.835,00		
NP-10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 Y 2 DIIMENSIONES 60x60cm CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR (Suministro e instalación)	und	$ 604.464,00		
NP-11	TACHA REFLECTIVA TIPO A (Suministro e instalación)	und	$ 12.712,00		
			SUB-TOTAL		**$ 129.169.496,00**

Con corte del 30/11/2024, se tiene una ejecución en ítems no previstos de $ 129.169.496,00 que equivale 3,3% de la obra ejecutada.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

a) Estado de avance Vía GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.

El CONSORCIO ODESSA en cumplimiento de sus obligaciones, y de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública LP-001-2023 cuyo Objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", mediante comunicado C-A-135-005-2023 con fecha 20 de diciembre de 2023, informa al contratista que de acuerdo con el Subnumeral 8.1 se establecen los documentos que se deben entregar por parte del contratista al interventor para el seguimiento y control del contrato de obra, los cuales son indispensables antes del inicio los cuales se dividen en la entrega de la documentación inicial y la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños; información que ha sido entregada por el contratista y revisada por la interventoría. Así mismo la interventoría solicitó al Municipio de Ponedera los estudios y diseños del contrato sin encontrar respuesta, por tanto, el contratista ha presentado a interventoría estudios y diseños en el marco de sus obligaciones contractuales.

La interventoría estuvo suspendida entre el 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024, posteriormente desde el 01 de febrero de 2024 se ha surtido la revisión de interventoría y ajustes en los documentos por parte del contratista. Posteriormente y una vez surtidas reuniones con el INVIAS y Municipio de Ponedera se suscribe acta de inicio del contrato de obra con fecha del 01 de marzo de 2024. A partir de la fecha se han desarrollado recorridos de campo, comités de obra y se ha venido definiendo las intervenciones necesarias sobre el corredor.

- **Estado Estudios y diseños.**

A la fecha el contratista ya entrego los estudios y diseños necesarios para la intervención de las obras a excepción del diseño estructural para el cual se esta evaluando la necesidad de acuerdo con las obras de drenaje que se definan en el diseño hidráulico para intervención. Los documentos se encuentran siendo ajustados por el contratista de acuerdo con observaciones de la interventoría y sus especialistas.

Se presenta incumplimiento por parte del contratista en la no obtención de la aprobación del estudio hidráulico y diseño, geométrico. Mediante comunicación C-T-135-188- 2024 del 18/07/2024 se recomienda al Municipio de Pondera la apertura de un proceso sancionatorio por incumplimientos en la aprobación de estudios y diseños y programación de obra. Posteriormente se actualiza y se reitera el proceso mediante comunicación C-T-135-275-2024 del 02/09/2024. En el presente periodo se notica al municipio los incumplimientos en los entregables de diseño hidráulico y diseño geométrico mediante comunicado C-T-135-424-2024 del /11/2024, a la fecha el municipio no ha acogido la recomendación de la interventoría.

- **Estado Ejecución de obra**

Respecto al avance de las obras, la interventoría informa que a la fecha se evidencian importantes atrasos en programación de obra por parte del CONSORCIO LA GIRALDA, que se deben principalmente lo siguiente:

- Posterior a la reanudación No. 1 del plazo del 28 de agosto de 2024, el contratista no realizó las actividades preliminares de obra y de estudios y diseños que se encuentran pendientes y que son necesarias para dar inicio a la ejecución de las obras. Al respecto la interventoría mediante comunicación C-T-135-267-2024 del 28/08/2024 requiere al contratista reanudar la ejecución de las actividades pendientes, mostrando este un avance escaso en cuanto al diseño geométrico, estudio hidráulico y actividades previas de obra, como implementación del PMT, documentación de maquinaria y personal de obra.

- Se identifica en el mes de septiembre de 2024, que los incumplimientos del contratista aumentan, entre los que se encuentran la no presencia del director de obra, residente de obra, profesional SST, informes ambientales, informes sociales, actualización de garantías y atrasos significativos en la obra, sin que se muestre por parte del contratista voluntad de cumplimiento en compromisos fijados en comités. Por tal razón la interventoría mediante comunicación C-T-135-312-2024 del 19/09/2024, solicita al municipio iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024 se han incrementado.

- El 07 de octubre de 2024 el contratista finalmente da inicio a las explanaciones e instalación de mejoramiento de subrasante, del K0+090 hacia mayores.

- Durante el mes de noviembre el contratista continúa realizando actividades de explanaciones, instalación de geotextil Tejido e instalación de mejoramiento, sin embargo, los ritmos de ejecución son bastante bajos.

- **Estado de avance físico Ponedera.**

Actividad	Programado	Ejecutado Mes	Ejecutado acumulado	% meta física
Mejoramiento (Pavimento Rígido)	2,70 Km	0,00 Km	0,00 Km	0%

Mantenimiento (Conformación de calzada y afirmado) en sectores criticos.	5,70 Km	0,00 Km	0,00 Km	0%
Box culvert	1 Un	0,00 Km	O un	0%

- **Estado de avance financiero Ponedera**

A la fecha el presupuesto del contrato no ha sufrido modificaciones y no se han suscrito actas de recibo parcial.

Tabla 11 Estado financiero Contrato de obra – Ponedera

Descripción	Programado	Ejecutado
SECCIÓN 1 - ÍTEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	**$ 9.708.724.909,30**	**$ 615.151.035,60**
I. EXPLANACIONES PAVIMENTO RIGIDO	$ 2.077.662.740,00	$ 452.463.130,20
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT 1x1 L=6m	$ 29.803.499,00	$ 0,00
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	$ 6.279.450.409,30	$ 0,00
ITEMS NO PREVISTOS	$ 1.321.808.261,00	$ 162.687.905,40
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 2.487.318.216,00**	**$ 0,00**
I.EXPLANACIONES	$ 2.487.318.216,00	$ 0,00
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 12.196.043.125,30**	**$ 615.151.035,60**
PMT	$ 48.543.625,00	$ 0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 33.807.959,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 67.915.918,00	$ 27.166.367,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 113.689.372,70	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 12.460.000.000,00**	**$ 642.317.402,60**

El avance que se presente respecto a ejecución de obra se debe a inicio de actividades de explanación, mejoramiento, instalación de geotextil.

A continuación, se presenta el estado de avance financiero de obra según el programa de inversiones, y teniendo en cuenta la totalidad de los avances ejecutados durante el desarrollo del contrato.

Tabla 12 Estado de avance financiero obra PONDERA.

MES CORTE	nov-24	
INVERSION	**VALOR**	**%**
EJECUTADO	$ 615.151.035,60	5,04%

PROGRAMADO	$ 10.753.966.575,22	88,18%
PROGRAMADO-EJECUTADO	-$ 10.138.815.539,62	-83,13%
RELACION E/P		0,06

Con corte al **30 de noviembre de 2024** se tiene un avance ejecutado acumulado del **5,04%** y avance programado acumulado **88,18%** razón por la cual con respecto a la reprogramación No. 1 al programa de inversiones realizada para la prórroga No. 1, se presenta un atraso en programación imputable al contratista por las demoras en la aprobación de los estudios y diseños, el no inicio oportuno de las actividades de obra y bajos rendimientos en la ejecución posterior al inicio de obras en el mes de octubre y noviembre de 2024, debido a que no se implementan la maquinaria, equipo, personal e ingreso de materiales necesarios para mitigar los atrasos en la programación de obra.

Respecto a los atrasos del contratista la interventoría mediante comunicación C-T-135-188- 2024 del 18/07/2024, recomendó al Municipio de Pondera la apertura de un proceso sancionatorio por incumplimientos en la aprobación de estudios y diseños y programación de obra.

Posteriormente se actualiza el proceso sancionatorio mediante comunicación C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, en el que se reitera la necesidad de conminar al contratista de obra y ante la nula ejecución de obra en el mes de septiembre de 2024 se recomienda apertura de proceso de caducidad del contrato mediante comunicación C-T-135-312-2024 del 19/09/2024.

En el presente mes se ha realizado requerimientos al contratista por la baja ejecución y atrasos en programación, por medio de comités se han establecido compromisos, los cuales no han sido cumplidos oportunamente por el contratista, lo que conlleva a la interventoría a realizar los siguientes requerimientos:

FECHA	CÓDIGO	ASUNTO
8 de noviembre de 2024	C-T-135-392-2024	PO-Requerimiento entrega de programación y plan de contingencia cumplimiento actividades sociales pendientes del PAGA
21 de noviembre de 2024	C-T-135-414-2024	PO- Seguimiento al estado de cumplimiento del contrato y atrasos de obra.
29 de noviembre de 2024	C-T-135-424-2024	PO- Seguimiento al estado de cumplimiento del contrato y atrasos de obra

Respecto al cierre del Tramo vial a intervenir y alternativas de desvío con el fin de dar cumplimiento al PMT y poder desarrollar las obras, el Municipio de Ponedera

informó en comité del 05/09/2024 que solicitó el desplazamiento del ferry que comunica con el Municipio de Salamina (Magdalena) a los operadores, lo anterior permitirá disminuir considerablemente el tráfico y evitar desvíos y rutas alternas, para llevar a buen término la ejecución de las obras.

b) Estado de avance Vía SABANAGRANDE – POLONUEVO - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE.

El CONSORCIO ODESSA en cumplimiento de las obligaciones que atañe a esta interventoría, y de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública SG-LP-OP-004-2023 cuyo Objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", mediante comunicado C-A-135-006-2023 del 20 de diciembre de 2023, informa al contratista que de acuerdo con el Subnumeral 8.1 se establecen los documentos que se deben entregar por parte del contratista al interventor para el seguimiento y control del contrato de obra, los cuales son indispensables antes del inicio los cuales se dividen en la entrega de la documentación inicial y la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños; información que ha sido entregada por el contratista y revisada por parte de esta interventoría. Así mismo la interventoría solicitó al Municipio de Sabanagrande los estudios y diseños del contrato sin encontrar respuesta, por tanto, el contratista ha presentado a interventoría estudios y diseños en el marco de sus obligaciones contractuales.

La interventoría estuvo suspendida entre el 19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024, posteriormente desde el 01 de febrero de 2024 se ha surtido la revisión de interventoría y ajustes en los documentos por parte del contratista. Posteriormente y una vez surtidas reuniones con el INVIAS y Municipio de Sabanagrande se suscribe acta de inicio del contrato de obra con fecha del 04 de marzo de 2024. A partir de la fecha se han desarrollado recorridos de campo, comités de obra y se ha venido definiendo las intervenciones necesarias sobre el corredor.

A la fecha el contratista ya entrego los estudios y diseños necesarios para la intervención de las obras. Los documentos de diseño geométrico y estudio hidráulico se encuentran siendo ajustados por el contratista de acuerdo con observaciones de la interventoría y sus especialistas, sin embargo, ya se han definido por interventoría y contratista el dimensionamiento de la estructura de pavimento y diseño geométrico de 2.0 Km, lo cual permitió dar inicio a las actividades de obra en el mes de mayo de 2024.

Para este corredor, aunque fue definido por el municipio como una vía terciaria, se identificó la presencia de redes de servicios públicos como agua y gas, lo cual ha requirió de tiempos adicionales en la etapa de estudios y diseños para verificar la ubicación y profundidades de dichas redes con el fin de proyectar adecuadamente el diseño geométrico. Como consecuencia las actividades adicionales para la

identificación de redes, necesarias para la definición de estudios y diseños se ha suscrito prorroga No. 1 al contrato de obra.

Se han requerido gestiones con la empresa de servicio de acueducto Triple A y el Municipio de Sabanagrande, gestionando la realización de tuberías nuevas a borde vía y cruces de acometidas para las tuberías proyectadas, lo cual ha demandado de tiempos adicionales y que el contratista tenga que realizar la consecución de estas tuberías para proceder con la estructura de pavimento.

La empresa de acueducto Triple A se encuentra adelantando la instalación de una tubería nueva del K0+000 al K3+000 por margen derecho. Al respecto se ha verificado que se esta se instale por fuera del ancho de vía a excepción del K0+000 al K0+150 donde en algunos puntos por el espacio puede quedar debajo de bordillo. La interventoría y planeación notificaron la situación a la empresa Triple A, así como el diseño geométrico previamente y la empresa respondieron que se haría responsables de cualquier afectación en la estructura de pavimento si se llegase a requerir alguna reparación de las tuberías.

- **Estado de avance físico de obra.**

Una vez definido el diseño de pavimento y diseño geométrico se adelantan actividades de ejecución de la estructura de pavimento con la actividad de explanación, instalación de subbase e instalación de concreto MR 3.8 Mpa.

El avance físico a la fecha es el siguiente para cada una de las actividades de obra programadas para el contrato.

Tabla 13 Estado avance físico contrato de obra – Sabanagrande

Actividad	Programado	Ejecutado mes	Ejecutado acumulado	% avance físico
Mejoramiento (Pavimento Rígido)	2,0 Km	0,16 Km	1,62 Km	81,0%
Mantenimiento (Conformación de calzada y afirmado)	2,25 Km	0,00 Km	0,00 Km	0,0%

** La longitud de pavimento tiene pendiente la terminación de algunos tramos de carril y bordillo.*

- **Estado de avance financiero del contrato obra (Sabanagrande)**

A la fecha el presupuesto del contrato no ha sufrido modificaciones y con corte al 30 de noviembre de 2024 el avance financiero en cada una de las partidas es el siguiente. Se aclara que el valor de estudios y diseños y ajustes de obra es

aproximado y se tiene en cuenta únicamente con fines de seguimiento, ya que no se ha facturado por no cumplir la totalidad de los requerimientos.

Tabla 14 Estado financiero contrato de obra – Sabanagrande

Descripción	Programado	Ejecutado
SECCION 1- ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	**$ 5.227.509.962,70**	**$ 4.120.608.262,00**
I. EXPLANACIONES	$ 0,00	$ 33.141.057,00
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT 1X1 L=6m	$ 60.076.163,00	$ 0,00
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO ANCHO CALZADA 5,5m	$ 4.654.859.040,70	$ 3.958.297.709,00
ÍTEM NO PREVISTOS	$ 512.574.759,00	$ 129.169.496,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 988.316.066,66**	**$ 0,00**
I. MANTENIMIENTO PERIODICO CON ADICION DE MATERIAL. CORREDOR VIAL	$ 988.316.066,66	$ 0,00
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 6.215.826.029,36**	**$ 4.120.608.262,00**
PMT	$ 26.321.802,00	$ 0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN	$ 14.387.139,20	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 37.649.815,00	$ 30.119.852,00
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 247.997.709,70	$ 164.824.330,00
VALOR TOTAL	**$ 6.542.182.495,26**	**$ 4.315.552.444,00**

A continuación, se presenta el estado de avance financiero de obra según el programa de inversiones, y teniendo en cuenta la totalidad de los avances ejecutados durante el desarrollo del contrato.

Tabla 15 Estado de avance financiero obra SABANAGRANDE.

MES CORTE	nov-24	
INVERSION	**VALOR**	**%**
EJECUTADO	$ 4.120.608.262,00	66,29%
PROGRAMADO	$ 6.157.829.632,75	99,07%
PROGRAMADO-EJECUTADO	-$ 2.037.221.370,75	-32,77%
RELACION E/P		0,67

Con corte al **30 de noviembre de 2024** y como consecuencia de la reprogramación No. 2 al programa de inversiones por el acta de modificación de cantidades No. 1**,** se tiene un avance ejecutado acumulado del **66.3%** y avance programado acumulado **99.07%** razón por la cual se presente un atraso de obra.

Al respecto la interventoría recomendó al Municipio de Sabanagrande, el inicio de un proceso sancionatorio al contratista mediante comunicado C-T-135-404-2024 del 14/11/2024 debido a que el contratista presentó un plan de contingencia en el mes de octubre para solventar el atraso de obra manifestando la implementación de

nuevas frentes de obra, los cuales no ha cumplido, adicionalmente no ha logrado la aprobación total del estudio hidráulico e hidrológico ya que no ha atendido las observaciones de la interventoría.

El contratista ha realizado la solicitud de una prorroga No. 2 por un termino de 10 días, proyectando como fecha de finalización el 14 de diciembre de 2024, que el plazo vigente de la interventoría. La interventoría ha remitido el visto bueno de esta prorroga al Municipio de Sabanagrande con el fin beneficiar a la comunidad con la terminación de las obras y teniendo en cuenta que en las dos ultimas semanas el contratista ha incrementado los ritmos de ejecución.

En el presente mes se ha realizado requerimientos al contratista por la baja ejecución y atrasos en programación, por medio de comités se han establecido compromisos, los cuales no han sido cumplidos oportunamente por el contratista, lo que conlleva a la interventoría a realizar los siguientes requerimientos.

FECHA	CÓDIGO	ASUNTO
14 de noviembre de 204	C-T-135-404-2024	SG- Recomendación apertura Proceso sancionatorio Contrato de Obra No. SG-LP-OP-004-2023 por presunto incumplimiento de obligaciones por parte de CRIVEN CONSTRUCTORES
22 de noviembre de 2024	C-T-135-417-2024	SG- Respuesta – Revisión Estudio Hidrológico e Hidráulico – Sabanagrande – Polonuevo V4

- **Estado del anticipo (Sabanagrande)**

Tabla 16 Estado de anticipo de obra SABANAGRANDE.

MES CORTE	Nov-24	
VALOR ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR AMORTIZADO
$ 719.745.270,50	$ 719.745.270,50	$ 719.745.270,50
100%	100%	100%

* . El Contrasta de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23 de julio de 2024 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, manifestando que, a la fecha de su oficio, han recibido aproximadamente el 11% del valor pactado en el contrato como anticipo y manifestando la renuncia al pago del SALDO DEL ANTICIPO

pactado en el contrato de la referencia y que se proceda a la devolución del saldo del ANTICIPO, no pagado y que se encuentra en la FIDUCIA, a la cuenta del convenio de la referencia

La interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30 de julio de 2024 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo manifestadas por el contrasta en comunicación del 23 de julio de 2024 indicando que no comparte los postulados del contrasta CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S y considera que el contrasta se encuentra en plena facultad de renunciar al anticipo de obra, así mismo informa al municipio que se puede proceder con solicitud de cancelación del PATRIMONIO AUTONOMO a la entidad fiduciaria y realizar la devolución de los recursos a título de anticipo a la cuenta del convenio 2221-2023.

Por lo anterior el valor del anticipo del contrato pasó de **$ 1.962.654.748,58** a **$719.745.270,50** y el valor restante **($1.242.909.478,08)** fue devuelto de la cuenta de fiducia a la cuenta del convenio 2221-2023 el 11/09/2024.

Teniendo en cuenta que el contrato tiene fecha de vencimiento actual en diciembre de 2024, con el acta parcial 04 se ha realizado la amortización del saldo del anticipo, por ende a la fecha se ha amortizado el 100% del anticipo otorgado.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1



REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4

NOVIEMBRE 2024

CONTENIDO

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	N/A
4.8	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
	• Seguimiento Programa de Obra	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1. INFORMES SEMANALES PONEDERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7-nov-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: **33** del **1-nov-24** al **7-nov-24** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas físicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 134,793,598.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 122,345,499.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 378,234,365			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 12,081,765,635			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 780,027,190			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 749,950,438			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9,212,566,697.56	75.5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 347,986,098.80	2.9%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8,864,580,598.76)	-72.7%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 30,248,266.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9,212,566,697.56	75.5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 378,234,364.80	3.1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8,834,332,332.76)	-72.4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 469,121,701.89	3.8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 139,108,096.40	1.1%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El contrato de obra se encuentra en etapa de estudios y diseños, por lo tanto a la fecha no se presentan valores ejecutados y programados de obra.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 752,917,315.93	49.21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27,109,873.93	1.77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27,109,873.93	100.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 116,185,174.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No9

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.41
Acumulado:	24.89

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2021	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 134,793,598.00
Saldo $	$ 122,345,499.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75.5% Avance o Atraso Físico % -68.8%
Meta Física Ejecutada % 6.7%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cant**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector (n)**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			90.0%	90.0%
					Ejec	53.0%			53.0%	53.0%
* Explanaciones (m)	m	2700			Prog	2039.508			2039.5	75.5%
					Ejec	500			500.0	18.5%
* Mejoramiento	m	2700			Prog	2039.508			2039.5	75.5%
					Ejec	410			410.0	15.2%
* Subbase	m	2700			Prog	2039.508			2039.5	75.5%
					Ejec					
* Pavimento rígido	m	2700			Prog	2039.508			2039.5	75.5%
					Ejec					
* Bordillos	m	5400			Prog	4079.016			4079.0	75.5%
					Ejec					
* Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador		
Compactador	1	1
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Carro tanque	1	1
retro de oruga	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-370-2024, Interventoría solicitó la entrega del informe de seguimiento mensual ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024.
Mediante oficio C-T-135-369-2024, Interventoría reiteró la actualización y atención a observaciones del documento PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

OBSERVACIONES: 01-11-2024. Se le recuerda al contratista los pendientes sociales en comité de seguimiento técnico al contrato por parte del director de Interventoría. Se le recuerda al contratista, remitir a la interventoría los informes de los meses de septiembre y octubre del año en curso, al correo de la ing. Paola interventoría para avanzar remite correspondencia del contratista, de interventoría las actas de reunión y seguimiento social de esos periodos. Se gestiona dev olución del acta N° 54 firmada del seguimiento social del 30-10-2024. Se le recuerda a la profesional social remitir el acta de la reunión con comu nidad el día 31-10-2024 con los respectivos soportes, se remite al correo social de la interventoria se revisa y se remite por el mismo medio con observaciones por parte de la interventoria. *02 -11-2024. El contratista remitió y se revisaron los formatos INVIAS remitidos por el contratista correspondientes al informe mensual social N° 7 del mes de septiembre, se devolvieron con complementaciones de los conceptos y conclusiones de la Interventoría y pendiente algunos ajustes y corrección de datos y firmas por parte del contratista y remitir los respectivos anexos de los soportes de la gestión adelantada en este periodo. *05-11-2024. El contratista radicó comunicación con actas de vecin dad de inicio, se encuentran en revisión por parte del área técnica de la Interventoria. El área social proyecto comunicación de requerimiento entrega de los informes pendientes de los meses N° 7 del mes de septiembre y N° 8 del mes de octubre de 2024. *06-11-2024. Se remitió por parte de la interventoria al contratista, la comunicación C-T-135-787-2024 requerimiento entrega de los informes mensuales sociales pendientes de septiembre y octubre de 2024. *07-11-2024. Se reprogramó el comité de seguimiento social al contrato por agenda de la social del contratista . Interventoría adelantó gestión en campo de firmas pendientes de testigo en actas de vecindad de inicio levantadas por part e del contratista. En esta semana, la profesional social del contratista no reportó la ejecución de actividades sociales

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gesti ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO

* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación especifica. A corte del presente semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

* Mediante comunicado C-T-135-366-2024 de fecha de 22/10/2024 Se Informa al INVIAS las dificultades que se tienen con el seguimiento al convenio por parte del Municipio de Ponedera

INTERVENTORÍA
*Se realiza corte de la sub rasante entre abcisas k0+580 al k0+690 calzada,
*Se realiza nivelación y contra nivelación de la vía existente entre abcisas k1+000 al k1+500 calzada,
*Se realiza corte de la sub rasante entre abcisas k0+000 al k0+090 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+600 al k0+700 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+000 al k0+090 calzada,
*Se realiza nivelación y contra nivelación de la vía existente entre abcisas k1+500 al k2+000 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abcisas k0+000 al k0+090 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+000 al k0+090 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+700 al k0+750 calzada,
*Se recibe tramo de sub rasante entre abcisas k0+460 al k0+510 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abcisas k0+460 al k0+510 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasnte entre abcisas k0+460 al k0+510 calzada,


CONTRATISTA

* Replanteo de corredor del Primer kilometro del diseño geométrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v12
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v5

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico
OBRA
** Continuar con la explanación del k0+250 a k0+500
** Mejoramiento de la Subrasante: Dar inicio a la instalación de material del k0+090 al k0+250
** Subbase: Dar inicio a la instalación de subbase del k0+090 al k0+250

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

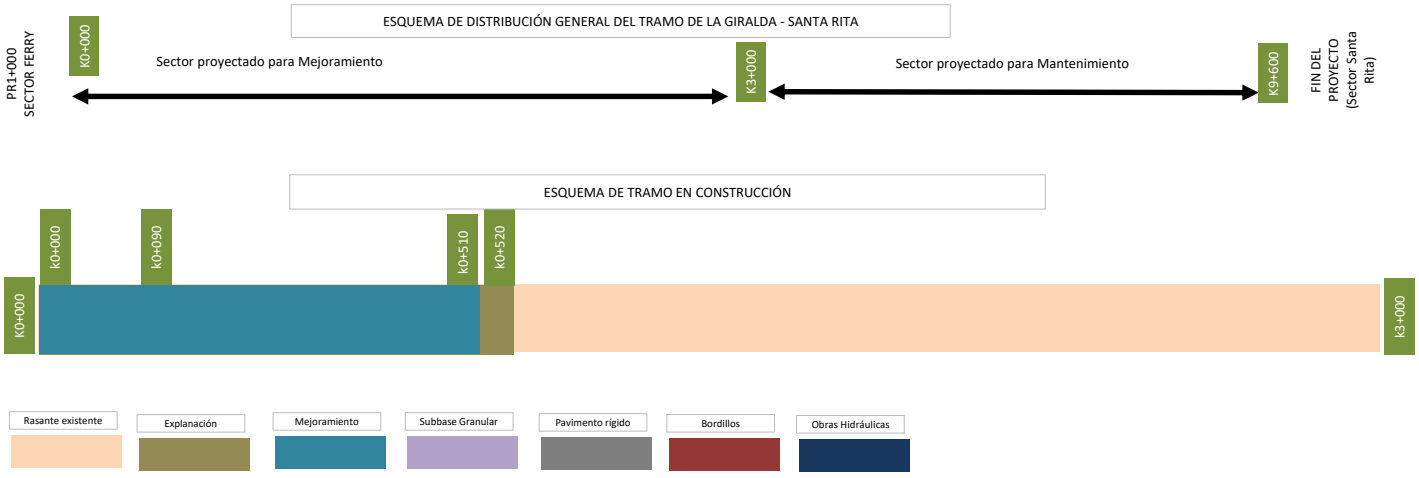

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de mejoramiento k0+350 al k0+400



Corte de la sub rasante k0+600 al k0+700



Instalación de geotextil k0+000 al k0+090

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Revisión de la documentación inicial
* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.

* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14-nov-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: 34 del 8-nov-24 al 14-nov-24 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas físicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 115,266,678.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 141,872,419.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 483,057,255			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 11,976,942,745			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 675,368,925			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 854,608,703			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9,681,688,399.46	79.4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 452,808,988.80	3.7%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9,228,879,410.65)	-75.7%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 30,248,266.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9,681,688,399.46	79.4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 483,057,254.80	4.0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (9,198,631,144.65)	-75.4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 469,121,701.89	3.8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 104,822,890.00	0.9%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El Contratista se encuentra en tramite del acta parcial de obra No1.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 653,453,372.80	42.71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	1.43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,915,552.40	100.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 93,923,796.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No8

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

	INDICADOR I/C
En el mes:	0.41
Acumulado:	21.60

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2023	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 115,266,678.00
Saldo $	$ 141,872,419.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 79.4% Avance o Atraso Físico % -67.5%
Meta Física Ejecutada % 11.9%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			90.0%	90.0%
					Ejec	53.0%			53.0%	53.0%
* Explanaciones (m)	m	2700			Prog	2143.364			2143.4	79.4%
					Ejec	900			900.0	33.3%
* Mejoramiento. Primera capa	m	2700			Prog	2143.364			2143.4	79.4%
					Ejec	720			720.0	26.7%
Mejoramiento. Segunda capa	m	2700			Prog	2143.364			2143.4	79.4%
					Ejec	310			310.0	11.5%
* Subbase	m	2700			Prog	2143.364			2143.4	79.4%
					Ejec					
* Pavimento rígido	m	2700			Prog	2143.364			2143.4	79.4%
					Ejec					
* Bordillos	m	5400			Prog	4286.728			4286.7	79.4%
					Ejec					
* Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador		
Compactador	1	1
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Carro tanque	1	1
retro de oruga	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-393-2024, Interventoría aprobó el informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2024.
Mediante oficio C-T-135-396-2024, Interventoría reiteró al Contratista que NO se autoriza la donación de material de excavación a particulares.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

OBSERVACIONES:

*08-11-2024 Se llevó a cabo reunión de seguimiento social las profesionales del contratista e interventoría se levantó el acta d e reunión N° 59. El contratista remite certificados de residencia de dos personas del AIDP. Se proyectó la comunicación de aprobación de las actas de vecindad de inicio de Ponedera y se remitió para revisión y firma del director. *09-11-2024. El contratista remitió por correo acta y soportes de la reunión de seguimiento con el CPC del día 31 de octubre se revisó y se emitió respuesta al correo el mismo día. Remiten informe mensual social N °7 del mes de septiembre del año en curso, se revisó y el área social remitió a Interventoría comunicación de aprobación para firma del director. Se remitió correo al contratista una vez realizada consulta al área técnica de interventoría, donde se tienen requerimientos para disposición de material a ubicarse en ZODME y NO autorización para disponer en otros predios. *12-11-2024 Interventoría emite comunicación C-T-135-398-2024 aprobación informe mensual social N°7 del mes de septiembre de 2024 y C-T-135-39-2024-PO Reiteración NO autorización de donación de material de excavación. El contratistaremite correo soporte invitación a integrantes del comité de participación comunitaria a reunión de seguimiento al contrato. *13-11-2024. Se elaboró informe de interventoria del 1 al 13 de noviembre de 2024Se recibe por correo de la interventoria social el informe mensual social del mes de octubre de 2024, se revisan formatos y se ajustas y anexos, se remitieron observaciones por el mismo medio. *14-11-2024. Se llevó a cabo reunión de seguimiento socioambiental, se levantó el acta N° 60. Se elaboró el volante N° 3 del PMT para que lo distribuyan el día de mañana a los actores viales presentes en el AIDP. Se proyecto comunicación referente la afectación a cercas y proceder a mitigar el impacto, se remitió al contratista la comunicación C-T-135-39-2024-PO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO

* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación especifica. A corte del presente semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

* Mediante comunicado C-T-135-366-2024 de fecha de 22/10/2024 Se Informa al INVIAS las dificultades que se tienen con el seguimiento al convenio por parte del Municipio de Ponedera

INTERVENTORÍA
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+600 al k0+700 calzada,
*Llega la obra 2 viajes de material de sub base,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+580 al k0+650 calzada,
*Se recibe por topografía tramo de sub rasante entre abcisas k0+520 al k0+580 calzada,
*Se realiza prueba de carga tramo de sub rasante entre abcisas k0+520 al k0+580 calzadfa,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abcisas k0+510 al k0+580 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+510 al k0+580 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+650 al k0+740 calzada,
*Se recibio tramo de sub rasante entre abcisas k0+590 al k0+640 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+700 al k0+750 calzada,
*Se recibe tramo de sub rasante entre abcisas k0+0+650 al k0+740 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abcisas k0+640 al k0+740 calzada,
*Instalación de materil de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+640 al k0+740 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+750 al k0+820 calzada,
*Se recibe tramo de sub rasante entre abcisas k0+750 al k0+840 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abcisas k0+740 al k0+780 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entyre abcisas k0+820 al k0+860 calzada,


CONTRATISTA

* Replanteo de corredor del Primer kilometro del diseño geométrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v13
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v5

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico
OBRA
** Continuar con la explanación del k0+900 a k01+500
** Mejoramiento de la Subrasante: Dar inicio a la instalación de material del k0+700 al k0+900
** Subbase: Dar inicio a la instalación de subbase del k0+090 al k0+250

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

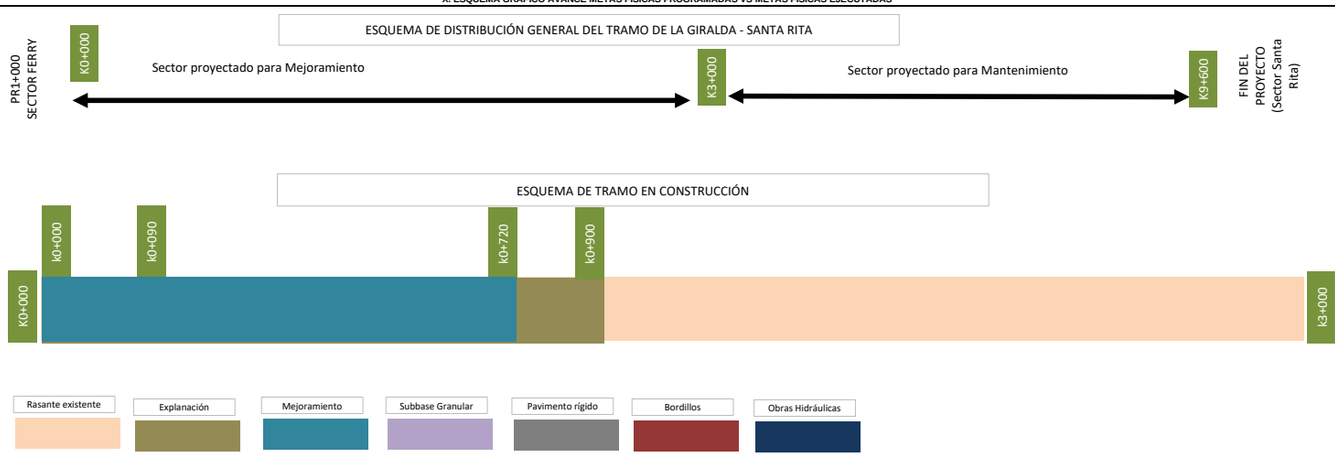

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte de la sub rasante k0+470 al k0+510



Instalación geotextil k0+460 al k0+510



Instalació mejoramiento k0+580 al k0+720

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Revisión de la documentación inicial
* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro filmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio.
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21-nov-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: **35** del **15-nov-24** al **21-nov-24** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas físicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 134,793,598.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 122,345,499.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 567,677,444			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 11,892,322,556			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 834,246,938			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 695,730,690			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10,150,810,101.35	83.2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 537,429,177.60	4.4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9,613,380,923.75)	-78.8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 30,248,266.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,150,810,101.35	83.2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 567,677,443.60	4.7%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (9,583,132,657.75)	-78.6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 469,121,701.89	3.8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 84,620,188.80	0.7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El Contratista se encuentra en tramite del acta parcial de obra No1.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 807,137,063.80	52.75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27,109,873.93	1.77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27,109,873.93	100.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 116,185,174.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No9

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.41
Acumulado:	26.68

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2021	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 134,793,598.00
Saldo $	$ 122,345,499.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 83.2% Avance o Atraso Físico % -69.2%
Meta Física Ejecutada % 14.0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			90.0%	90.0%
						Ejec	53.0%			53.0%	53.0%
*	Explanaciones (m)	m	2700			Prog	2247.22			2247.2	83.2%
						Ejec	1000			1000.0	37.0%
*	Mejoramiento. Primera capa	m	2700			Prog	2247.22			2247.2	83.2%
						Ejec	880			880.0	32.6%
	Mejoramiento. Segunda capa	m	2700			Prog	2247.22			2247.2	83.2%
						Ejec	390			390.0	14.4%
*	Subbase	m	2700			Prog	2247.22			2247.2	83.2%
						Ejec					
*	Pavimento rígido	m	2700			Prog	2247.22			2247.2	83.2%
						Ejec					
*	Bordillos	m	5400			Prog	4494.439			4494.4	83.2%
						Ejec					
*	Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador		
Compactador	1	1
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Carro tanque	1	1
retro de oruga	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-413-2024, Interventoría realizó observaciones al informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

OBSERVACIONES:
*15-11-2024. Revisión del informe mensual social N ° 8 del mes de octubre de 2024, con los ajustes realizados se firmaron los formatos y el contratista procedió a realizar la rad icación. Interventoría emitió concepto de aprobación con la comunicación C -T-135-408-2024-PO el mismo día. Se llevó a cabo la socialización del PMT. Se realizó acercamiento con propietarios de predios gestionando lo referente a manejo de cercados. Se reportó PQRSD relacionada con un cercado. Se ll evó a cabo una reunión extraordinaria solicitada espontáneamente por habitantes donde se aclararon inquietudes de los cercados y solicitudes de donación material de la vía. *18-11-2024. Interventoría programa el día de hoy comité de seguimiento social para el día 20 de noviembre/2024. El área social de Interventoría remitió los pendientes del co ntrato de Ponedera, remitiendo la información al correo de la Interventoría. *20-11-2024. Se llevó a cabo comité de seguimiento técnico-social y ambiental con el contratista con la participación del área técnica de INVIAS y Secretaria de Planeación de la alcaldía de Ponedera, contratista e interventoria. Se revisó acta de compromiso de sitio de he rramientas en el que se incluyó también en la misma acta un sitio de disposición de material que no fue aprobada por interventoía por no contar con soportes de aprobación para ZODME por parte de la Alcaldía de Ponedera, se remitieron observaciones al correo del CONSORCIO LA GIRALDA. Se revisó el volante de invitación al CPC, interventoría remitió observaciones por WhatsApp medio por el cual se revisó y solicitó coordinar la hora con los integrantes del CPC cambiar el núme ro del volante que no corresponde. Interventoría gestiono información con la Inspección de Policía de Puerto Giraldo para campaña de prevención y seguridad vial en el tramo de intervención, Se estableció contacto tel efónico con el Inspector de Policía, Interventoría remitió al correo del contratista la información para que lo contacten y planifiquen la actividad. *21-11-2024. Se recibe al correo de la interventoría PQRSD de la Sra. Consuelo Fernández y se traslada al CONSORCIO LA GIRALDA y a la alcaldía de Ponedera con la comunicación C-T-135-415-2024 PO- como también se remite respuesta a la solicitante a través del correo con la comunicación C -T-135-416-2024 PO- informando el traslado al contratista. Continua pendiente que el contratista remita a la interventoría los pendientes establecidos en el comité de seguimiento al contrato.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestl ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO

* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación específica. A corte del presente semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

* Mediante comunicado C-T-135-414-2024 de fecha de 21/11/2024 Se Informa al municipio y al contratista, sobre el incumplimiento de las obligaciones contractuales

INTERVENTORÍA
*Se recibe tramo de sub rasante por topografía entre abcisas k0+840 al k0+880 calzada,
*Instalación de geotextil sobre la sub rasante entre abcisas k0+780 al k0+840 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante en tre abcisas k0+780 al k0+840 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+900 al k0+950 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+950 al k1+000 calzada,
*Se conrinúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+950 al k1+000 calzada,
*Se realiza conformación de la vía de acceso por parte del contratista
*Se realiza nivelación del tramo de mejoramiento entre abcisas k0+520 al k0+860 calzada para instalación de la segunda capa,
*Se realiza nivelación y contra nivelación entre k2+000 al k3+000 para ejecución de los diseños,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+950 al k1+000 calzada,
*Se realiza toma de densidades tramo de mejoramiento d la sub rasante primera capa entre abcisas k0+460 al k0+610 calzada,
*Instalación de material segunda capa entre abcisas k0+400 al k0+480 calzada,


CONTRATISTA

* Replanteo de corredor del Primer kilometro del diseño geométrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v13
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v5

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico
OBRA
** Continuar con la explanación del k0+900 a k01+500
** Mejoramiento de la Subrasante: Dar inicio a la instalación de material del k0+900 al k0+1100
** Subbase: Dar inicio a la instalación de subbase del k0+000 al k0+250

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

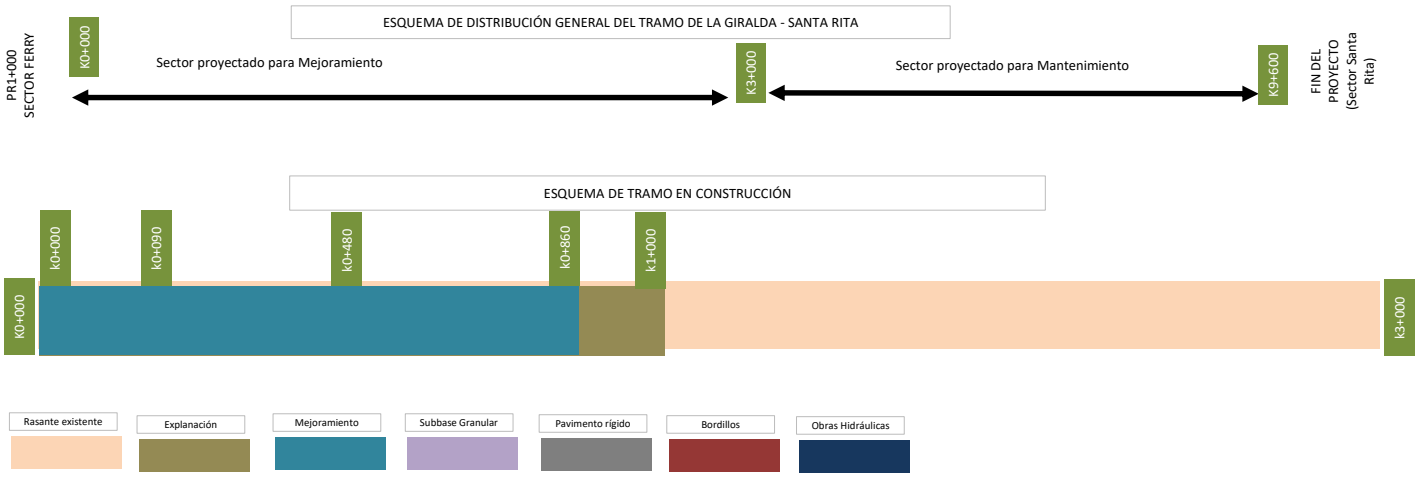

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Humentacción del mejoramiento k0+520 al k0+840



Corte de la sub rasante k0+950 al k1+000



Instalació mejoramiento k0+400 al k0+480

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Revisión de la documentación inicial
* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.

* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**

Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28-nov-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO SEMANA No.: 36 del 22-nov-24 al 28-nov-24 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo con lo definido en los estudios y diseños del contrato, las metas físicas del contrato son las siguientes:
•2700 m de mejoramiento de vía con pavimento rígido en ancho libre de 6 m y con reducciones de ancho a 5.5 m en algunos sitios críticos, teniendo en cuenta que la vía transcurre sobre un terraplén y en algunos puntos se puede invadir cercas de predios.
•5700 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.
•1 Box culvert
El contratista tiene pendiente la atención de observaciones de documentos de los diseños para obtener la aprobación completa por parte de interventoría.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se proyecta la intervención de mejoramiento del corredor mediante la construcción de pavimento rígido entre el K0+000 al K2+700 e intervención mediante mantenimiento por medio de conformación de calzada e instalación de afirmado del K2+700 a mayores.
El ancho de calzada proyectado según estudios y diseños revisados hasta la fecha es de 6.0 m, con reducción de anchos en algunos sectores debido a que la vía transcurre sobre un terraplén y existen algunos sectores donde es limitado el espacio debido a que se pueden invadir cercas, arboles o cercanía con rio magdalena.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	RK CONSTRUCCIÓN GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1 LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	LP-001-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 12,460,000,000.00	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	1/03/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	19/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/08/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 12,460,000,000.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA SUSPENSIÓN 01	29/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
FECHA REINICIO 01	28/08/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 134,793,598.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 122,345,499.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 12,460,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 645,399,302			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 11,814,600,698			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 861,356,812			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 668,620,816			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 12,196,043,125.30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10,619,931,803.25	87.1%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 615,151,035.60	5.0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (10,004,780,767.64)	-82.0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 30,248,266.00	0.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,619,931,803.25	87.1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 645,399,301.60	5.3%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (9,974,532,501.64)	-81.8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 469,121,701.89	3.8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 77,721,858.00	0.6%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1/03/2024 A 30/10/2024
VALOR FACTURA: $ 399,543,638.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El Contratista tramita el acta parcial de obra No1.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 834,246,937.73	54.53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27,109,873.93	1.77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27,109,873.93	100.0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 116,185,174.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No9

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

Anticipo se encuentra en tramite

	INDICADOR I/C
En el mes:	0.41
Acumulado:	27.58

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2023	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 134,793,598.00
Saldo $	$ 122,345,499.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 87.1% Avance o Atraso Físico % -70.8%
Meta Física Ejecutada % 16.2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	90.0%			90.0%	90.0%
					Ejec	53.0%			53.0%	53.0%
* Explanaciones (m)	m	2700			Prog	2351.075			2351.1	87.1%
					Ejec	1140			1140.0	42.2%
* Mejoramiento. Primera capa	m	2700			Prog	2351.075			2351.1	87.1%
					Ejec	880			880.0	32.6%
Mejoramiento. Segunda capa	m	2700			Prog	2351.075			2351.1	87.1%
					Ejec	610			610.0	22.6%
* Subbase	m	2700			Prog	2351.075			2351.1	87.1%
					Ejec					
* Pavimento rígido	m	2700			Prog	2351.075			2351.1	87.1%
					Ejec					
* Bordillos	m	5400			Prog	4702.151			4702.2	87.1%
					Ejec					
* Mantenimiento vial	m	6000			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas se modificaran de acuerdo con la actualización de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro compactador	1	1
Motoniveladora	1	1
Mini cargador	1	
Retrocargador		
Compactador	1	1
Rana	1	
Cortadora de pavimento	1	
Rieles	1	
Mezcladora de concreto	1	
Formaleteria metálica	1	
Carro tanque	1	1
retro de oruga	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	A & T SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	título minero EKQ-091, la vía Sabanalarga – Manatí, jurisdicción del municipio de	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	Sabanalarga	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Se encuentra aprobada como proveedor de materiales pétreos la Sociedad A&T Soluciones Integrales S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065001 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Se remiten observaciones al informe del mes de octubre de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INFORME LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

OBSERVACIONES:

*22-11-2024. El contratista informa que entregó las copias de las actas de vecindad de inicio por medio de WhatsApp el día de hoy. Entrega de volante de invitación a la reunión de seguimiento al contrato programado de acuerdo a la concertación adelantada con el CPC a realizarse el día 28 de noviembre del año 2024 a las 9:00 a.m. Se remite por parte de Interventoría al Contratista correo recordando los pendientes sociales establecidos en el comité de seguimiento al contrato el día 2011-2024. Interventoría realizó seguimiento a la PQRSD de Consuelo Fernández quién informó que el contratista le respondió WhatsApp quién próximamente realizará el pago pendiente.
*23-11-2024. La profesional social remite los soportes de la remisión del volante N° 4 de invitación al CPC programado para el 28-11-2024 y las respectivas fotos de divulgación con la comunidad, la cual se llevó a cabo el 22 de nov-2024. El área social de la Interventoría proyecta comunicaciones con recomendaciones a la Alcaldía municipal, Secretaria de Transito de Sabanagrande y Personería para que implementen medidas de seguridad vial durante la temporada decembrina y de principios del año 2024.
*25-11-2024.Se recibió por correo presentación para CPC del 28-nov-2024, se realizaron ajustes y complementaciones del componente social y se remitió al área técnica, ambiental y STT de interventoria. Se respondió correo remitido por el contratista consoportes de invitación a integrantes del CPC. Interventoría elaboró formato de permiso de intervención voluntaria de cercas en predios aledaños al proyecto en caso que se requieran.
*26-11-2024.El contratista remite al correo de interventoría soportes de la entrega de los volantes de la invitación al CPC organizados. Interventoría remite a la Alcaldía del municipio de ponedera como a la Inspección de policía del corregimiento La Gralda jurisdicción del corredor vial de Ponedera, se radicaron por correo, las comunicaciones C-T-135-421-2024-SG y C-T-135-422-2024-SG solicitando apoyo de prevención y seguridad vial durante la temporada decembrina y de enero de 2025. El área social de interventoría realizó gestión para verificar estado de la PQRSD de la Señora Consuelo Fernández, donde no se evidencia una solución a esta solicitud. Está pendiente del área técnica y ambiental concepto de la presentación del contratista para la reunión de seguimiento con el CPC.
*27-11-2024.Se revisó la presentación y continúa pendiente la información técnica del contrato se remitió respuesta al correo. Se remitió por parte de interventoria el soporte del personal reportado en obra para soporte del informe mensual social de no viembre. Se remite al correo link programación de reunión social de seguimiento al contrato programado para el día viernes 29 de noviembre. Se le recuerda al contratista iniciar la elaboración de informe mensual social para radicarlo oportunamente a la Interventoría.
*28-11-2024. Se llevó a cabo el CPC N°2 donde se presentaron los avances del proyecto. Se realizó visita y recorrido en obra por parte de INVIAS, contratista e Interventoria. Se remitió correo con correspondencia del contratista y de la interventoría a la profesional del Consorcio La Giralda para que proceda a la elaboración del informe mensual social de noviembre. Interventoría nuevamente le solicita al contratista remitir listado de entrega de copias de actas de vecindad y remiten un listado de entre a 18 propietarios en forma personalizada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MUNICIPIO

* Mediante comunicado C-T-135-098-2024 de fecha de 7-6-24 se reitera el comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 3-5-24: se solicita al municipio esclarecimiento ante los hallazgos. en el que se presenta debito de la cuenta por concepto de "Pagos Corporativos" en el mes de noviembre de 2023 y diciembre de 2023 por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/TE ($58.475.000.oo) y CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/TE ($57.618.871.oo), de los cuales estos últimos se reintegraron en el mismo mes, por lo que a todas luces el Municipio de Ponedera está incumpliendo las obligaciones contractuales, dado que estos recursos tienen una destinación específica. A corte del presente semanal el Municipio no da respuesta a la solicitud.

* Mediante comunicado C-T-135-312-2024 de fecha de 19/09/2024 se se permite recomendar a la entidad contratante, iniciar los trámites requeridos por la ley para la declaratoria de caducidad del contrato de obra, teniendo en cuenta que las causales de presunto incumplimiento descritas en las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024, no han cesado en su totalidad y algunas se han agravado conllevando a que las obras objeto del contrato no inicien acorde a la programación y reprogramación establecida, siendo estas causales a la fecha, de imputabilidad completa del contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

* Mediante comunicado C-T-135-366-2024 de fecha de 22/10/2024 Se Informa al INVIAS las dificultades que se tienen con el seguimiento al convenio por parte del Municipio de Ponedera
* Mediante comunicado C-T-135-414-2024 de fecha de 21/11/2024 Se Informa los incumplimientos reiterativos de los compromisos por parte del contratista, y solicita al municipio adelantar los respectivos procesos sancionatorios.

INTERVENTORÍA
*Se realiza instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+400 al k0+610 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k0+950 al k1+040 calzada,
*Se realiza instlación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+540 al k0+610 calzada,
*Corte de la sub rasante entre abcisas k1+000 al k1+040 calzada,
*Se realiza céreo de la sub rasante entre abcisas k0+880 al k1+040 calzada,
*Se continúa con el corte de la sub rasante entre abcisas k1+040 al k1+070 calzada,
*Instalación de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+000 al k0+090 calzada,
*Se realiza toma de densidades tramo de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+610 al k0+710 calzada primera capa,
*Instalación de tacos para segunda capa de material de mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+000 al k0+090 calzada,
*Se realiza céreo del mejoramiento de la sub rasante entre abcisas k0+000 al k0+090 calzada,


CONTRATISTA

* Replanteo de corredor del Primer kilometro del diseño geométrico
* Entrega de estudios y diseños:
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al diseño geométrico: hacen entrega de la v13
** Ajustes según observaciones realizadas por parte de interventoría al estudio hidráulico: entrega v5

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
* Continuar con la complementación y ajustes a los estudios y diseños.
** entrega del ajuste del Levantamiento topográfico
** entrega definitiva del diseño geométrico
** entrega de los ajustes al estudio hidráulico
OBRA
** Continuar con la explanación del k0+900 a k01+500
** Mejoramiento de la Subrasante: Dar inicio a la instalación de material del k0+700 al k0+900
** Subbase: Dar inicio a la instalación de subbase del k0+090 al k0+250

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

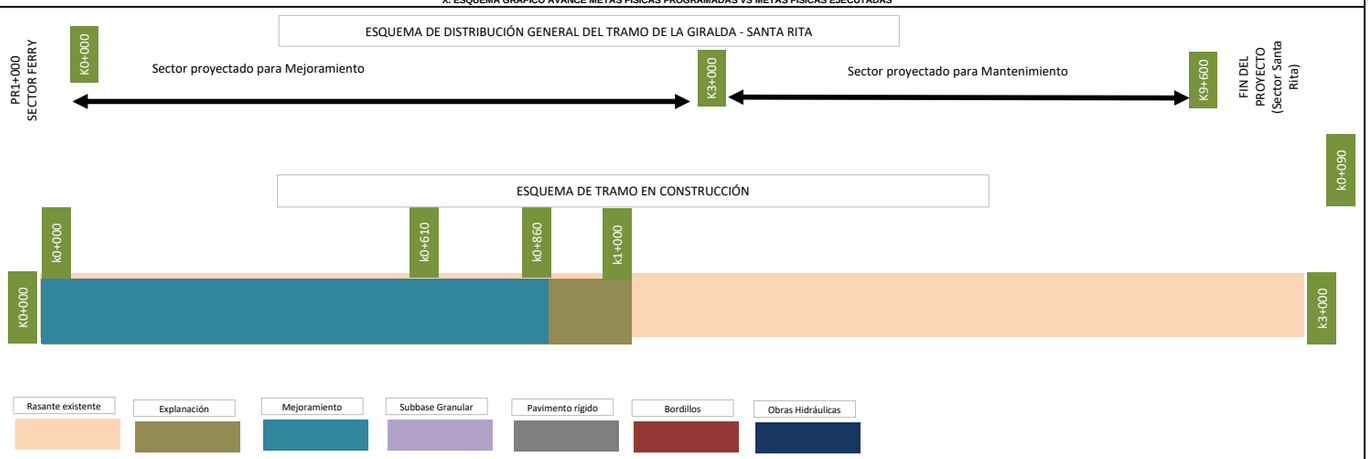

* NOTA: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Céreo de la sub rasante k0+880 al k1+040



Céreo mejoramiento k0+000 al k0+090



Instalació mejoramiento k0+400 al k0+480

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Revisión de la documentación inicial
* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Realización del Comité Técnico de obra semanal para el seguimiento al proyecto en los aspectos técnicos, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se sugiere al municipio dar inicio del proceso sancionatorio mediante comunicado C-T-135-188- 2024 de fecha de 18-7-2024, a corte del presente semanal el Municipio no ha iniciado el proceso sancionatorio.
* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad. Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1. INFORMES SEMANALES SABANAGRANDE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7-nov-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 36 del 1-nov-24 al 7-nov-24 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con un ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S			**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	SG-LP-OP-004-2023	VALOR INICIAL:	$ 6,542,182,495.26	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1,529,977,628.00
FECHA DE INICIO:	4/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	1/02/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/06/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 6,542,182,495.26	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/12/2024	VALOR ANTICIPO INICIAL:	$ 1,962,654,748.58	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257,139,097.00
		VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO:	$ (1,242,909,478.08)	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 134,793,598.00
		VALOR ANTICIPO EJECUTADO:	$ 719,745,270.50	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 122,345,499.00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 483,389,853.00				
		SALDO POR AMORTIZA	$ 236,355,417.50				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 6,542,182,495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3,208,056,376			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,334,126,119			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,529,977,628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 780,027,190			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 749,950,438			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6,215,826,029.36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4,423,737,318.57	71.2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3,176,054,033.10	51.1%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1,247,683,285.47)	-20.1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 32,002,342.75	0.5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,423,737,318.57	71.2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,208,056,375.85	51.6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1,215,680,942.72)	-19.6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 527,767,225.50	8.5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 62,744,625.06	1.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 11-09-24 A 10-10-24
VALOR FACTURA: $ 793,980,154.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No3**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,529,977,628.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 752,917,315.93	49.21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27,109,873.93	1.77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27,109,873.93	100.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 116,185,174.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No9

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719,745,270.50
Amortizado $	$ 483,389,853.00
Saldo $	$ 236,355,417.50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.17
Acumulado:	0.24

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2023	$ 6,542,182,495.26	34%	$ 526,749,643.55
LP-001-2023	$ 12,460,000,000.00	66%	$ 1,003,227,984.45
Total	$ 19,002,182,495.26	100%	$ 1,529,977,628.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257,139,097.00
Amortizado $	$ 134,793,598.00
Saldo $	$ 122,345,499.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 71.2% Avance o Atraso Físico % -14.9%
Meta Física Ejecutada % 56.3%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cant**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector (n)**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100.0%			100.0%	100.0%
					Ejec	85.0%			85.0%	85.0%
* Explanaciones (m)	m	2150	2150		Prog	1530.1			1530.1	71.2%
					Ejec	1600			1600.0	74.4%
* Subbase	m	2150	2150		Prog	1530.1			1530.1	71.2%
					Ejec	1738			1738.0	80.8%
* Pavimento rígido	m	2150	2150		Prog	1530.1			1530.1	71.2%
					Ejec	1500			1500.0	69.8%
* Bordillos	m	4300	4300		Prog	3060.3			3060.3	71.2%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas relacionadas corresponde a las consignadas en el presupuesto inicial del CONVENIO, metas físicas que se modificaran de acuerdo con la complementación y ajuste de los estudios y diseños.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	1
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	1
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	BARANOA A ATLANTICO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	LURUACO-ATLÁNTICO.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	

OBSERVACIONES: se encuenta aprobada la cantera de CONSIPEy se tiene aprobado al proveedor de concreto hidraulico para elpavimento de CONCREMOVIL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065009 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-390-2024, Interventoría aprobó el informe mensual ambiental No. 8 correspondiente al mes de octubre de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	31	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
* Carrera 7 Km 2 Al lado del Centro Recreacional El Pinar
* Teléfono: 311 619 16 96
* Correo: Constructorescrivensabanagrand@gmail.com.

OBSERVACIONES:
*01-11-2024.Se brinda atención en el SAU. Se gestiona con propietarios faltantes por recibir la copia del acta de vecindad de inicio. Se elabora y se remite al correo el informe mensual social de interventoría del mes de octubre *0211-2024.La profesional social del contratista reporta la gestión y entrega de las copias de cinco actas de vecindad de inicio (entrega personalizada) que estaban pendientes completando el 100%. *03-11-2024. El contratista remite a la Interventoría el volante N° 4 correspondiente a la invitación al comité de participación ciudadana, se revisa, se realizan ajustes y complementaciones yse remite al correo medio por el que se recibió la aprobación para que procedan a la distribución. *04-11-2024.El contratista remite por correo al área social de Interventoria el informe mensual social N ° 8 del mes de agosto de 2024, fue revisado y complementados los formatos por pate de la interventoria y se devuelve el mismo d ía y por correo al contratista y con observaciones para ajustes de los anexos y los formatos INVIAS en PDF firmados por Interventoría. Se revisan los temas sociales para la presentación de la reunión del CPC remitida por la profesional social al WhatsApp de la profesional social de interventoría, se solicita utilizar la plantilla modelo de INVIAS y or ganizar la información con los programas y subprogramas sociales ejecutados con la trazabilidad de lo ejecutado. *05-11-2024. Se remite nuevamente por parte de la Interventoría a la profesional social del contratista la presentaci ón inicial implementada para que preparen los temas u contenidos desde cada área de Intervención en la reunión que tienen proyecta realizar el 8 de nov del año en curso con el CPC y distribuyan los volantes de convocatoria y alleguen la presentación para la revisión de la interventoria. El contratista radica la comunicación OBR-SOC-021-2024, formalizando la entrega del informe mensual social N°8 del mes de octubre del 2024, fue revisado por el área social y proyecto la comunicación y la remitió al correo de la interv entoria emitiendo concepto de aprobación para firma del director. *06-11-2024. Interventoría remite al contratista la comunicación con la comunicación C-T-135-386-2024 emite concepto de aprobación del informe mensual social N °8 del mes de octubre de 2024 y la también la C-T-135-388-2024 solicitando la entrega de la presentación y los soportes del volante de invitación a la reunión con el CPC y veeduria según la programación del contratista a ejecutarse el día 08-nov-2024. La profesional social del contratista remite al área social de interventoria al WhatsApp presentación con el contenido de actividades sociales, se revisó, ajustó y complemento la información, queda pendiente relacionar la información de las áreas técnica, ambiental y SST. *07-11-2024. El contratista remitió comunicación el día de hoy informando la reprogramación de la reunión con veedores y CPC que estaba programada para el día 08 -nov-2024 quedo para el 14 de noviembre de 2024. Se revisó por parte de la interventoría el volante de invitación ajustado y se remitió respuesta al correo. Se adelantó la entrega por correo y WhatsApp de la invitación a esta reunión a la Alcaldía de Sabanagrande, Secretaria de Planeación, personería municipal, integrantes del CPC y veedores. Se realizó reunión se seguimiento social. Interventoria s ocial, remite el día de hoy la presentación en formato editable al contratista y a la interventoria para que complementen la información técnica, ambiental y SST para que proceda a relacionar la información faltante.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gesti ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INTERVENTORÍA
* Se realiza nivelación de cajas de la empresa triple A. k00+015 costado izq.
* Se realiza la instalación de concreto Mr entre el tramo del k01+123 al k01+160 costado derecho.
* Se realiza la instalación de concreto Mr entre el tramo del k01+123 al k01+160 costado derecho
* Se realiza instalación de SBG entre las abscisas 1+160 a 1+090
* Se hace chequeo de topografía a niveles de sub rasante lo cual por topografía cumple pero no se recibe ya por tema de alta humedad en la sub rasante este es el tramo k1+070 al k1+010 para poder aprobar el tramo el contratista debe esperar que la sub rasante está más seco y hacerle la prueba de carga cuando ya cumpla con eso se le dará el visto bueno por topografía

CONTRATISTA
* Explanación: Continuar con la explanación entre el k01+000 al k01+090
* Subbase: Dar inicio de instalación de subbase del k01+000 al k1+090
* Pavimento Rigido: Continuar con la inxtalación de pavimento rigido del k1+000 al k1+090

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

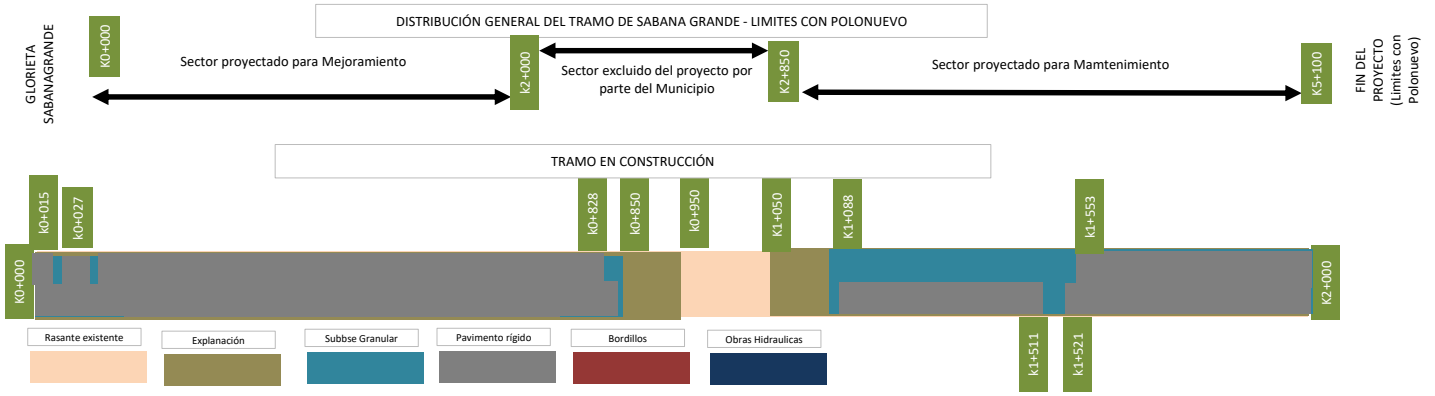

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

-65

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de Concreto MR-38 K1+090 AL K1+160



Fundida de Concreto MR-38 K1+090 AL K1+160



Chequeo de Niveles de Subrasante, K1+000 a K1+090

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños

* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50

* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento en campo a las actividades ejecutadas y verificación de la información presentada por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÈS ARIAS**

Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 14-nov-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 37 del 8-nov-24 al 14-nov-24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con un ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
INTEGRANTES:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
CONTRATO No.	SG-LP-OP-004-2023	VALOR INICIAL:	$ 6.542.182.495,26
FECHA DE INICIO:	4/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/06/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 6.542.182.495,26
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/12/2024	VALOR ANTICIPO INICIAL:	$ 1.962.654.748,58
		VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO:	$ (1.242.909.478,08)
		VALOR ANTICIPO EJECUTADO:	$ 719.745.270,50
		VALOR AMORTIZADO:	$ 483.389.853,00
		SALDO POR AMORTIZA	$ 236.355.417,50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ODESSA		
INTEGRANTES:	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)		
CONTRATO No.	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1.529.977.628,00
FECHA DE INICIO:	1/02/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 257.139.097,00
SUSPENSIÓN 01	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:**	$ 134.793.598,00
REINICIO 01	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 122.345.499,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6.542.182.495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3.316.923.098			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.225.259.398			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.529.977.628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 807.137.064			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 722.840.564			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.215.826.029,36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.951.504.544,08	79,7%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.284.920.754,85	52,8%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.666.583.789,23)	-26,8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 32.002.342,75	0,5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.951.504.544,08	79,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.316.923.097,60	53,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.634.581.446,48)	-26,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 527.767.225,50	8,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 108.866.721,75	1,8%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 11-09-24 A 10-10-24
VALOR FACTURA: $ 793.980.154,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No3**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.529.977.628,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 780.027.189,87	50,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.109.873,93	1,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.109.873,93	100,0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 116.185.174,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No9

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719.745.270,50
Amortizado $	$ 483.389.853,00
Saldo $	$ 236.355.417,50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,17
Acumulado:	0,24

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-202	$ 6.542.182.495,26	34%	$ 526.749.643,55
LP-001-2023	$ 12.460.000.000,00	66%	$ 1.003.227.984,45
Total	$ 19.002.182.495,26	100%	$ 1.529.977.628,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257.139.097,00
Amortizado $	$ 134.793.598,00
Saldo $	$ 122.345.499,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 80,7% Avance o Atraso Físico % -15,1%
Meta Física Ejecutada % 65,6%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100,0%			100,0%	100,0%
					Ejec	85,0%			85,0%	85,0%
* Explanaciones (m)	m	2000	2100		Prog	1672,9			1672,9	83,6%
					Ejec	1860			1860,0	93,0%
* Subbase	m	2000	2000		Prog	1593,2			1593,2	79,7%
					Ejec	1840			1840,0	92,0%
* Pavimento rígido	m	2000	2000		Prog	1593,2			1593,2	79,7%
					Ejec	1545			1545,0	77,3%
* Bordillos	m	4000	4000		Prog	3186,4			3186,4	79,7%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas proyectadas se encuentra acorde a lo definido en los estudios y diseños.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	1
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	1
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	BARANOA-ATLANTICO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y LURUACO-ATLÁNTICO.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	

OBSERVACIONES: se encuentra aprobada la cantera de CONSIPE y se tiene aprobado al proveedor de concreto hidráulico para el pavimento de CONCREMOVIL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065009 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Se realizó seguimiento a la implementación de los programas del documentos PAGA (Disposición de RCD, campamentos, ingreso de materiales, irrigación para control de emisión de PS.)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	31	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
* Carrera 7 Km 2, Al lado del Centro Recreacional El Pinar
* Teléfono: 311 619 16 96
* Correo: Constructorescrivensabanagrand@gmail.com

OBSERVACIONES:
08-11-2024. Gestión para actividades sociales pendientes reunión de seguimiento con el CPC, Veedores, autoridades y gestión con la Secretaria de Transito de Sabanagrande. *09-11-2024. El área social de interventoría, remite al correo del contratista y de la interventoría, la plantilla de presentación con el contenido social para que las demás áreas complementen la información a presentar el día 14-11-2024 en la reunión de seguimiento al contrato. La profesional social del contratista remite el volante N°5 e invitación a la campaña de prevención y seguridad vial, se remitió el mismo día respuesta por correo de aprobación para qu e procedan a la respectiva entrega. *12-11-2024. Contratista por WhatsApp y correo reporta el día de hoy a Interventoría reprogramación de fecha de campaña y prevención vial por solicitud de la Secretaría de transito de Sabanagrande, para el martes 19 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Centro Recreacional el Pinar. Interventoría remite correo con material de videos como apoyo para esta campaña y solicita al contratista remitir la metodología a implementar en el evento. Se remite comunicación a interventoría programación social y plan de contingencia, está pendiente por revisión y firma del director de la Interventoría. Nuevamente se envia al correo presentación con temas ambientales, SSR y social para que incluyan los técnicos. *13-11-2024 Se elaboró informe de interventoría del 1 al 13 de noviembre de 2024. Se complementó la información técnica de la presentación por parte de interventoría y se emitió concepto de aprobación por correo medio por el cual se recibió. Se radica al contratista por parte de interventoría la comunicación C-T-135-400-2024-SG-Solicitud de programación de actividades sociales y Plan de contingencia considerando que contrato finaliza el 4 de diciembre de 2024. *14-11-2024 Se llevó a cabo la reunión de seguimiento al contrato donde participó el alcalde y otros funcionarios de la Alcaldía municipal, Se remitió el link para la reunión de seguimiento al contrato el día 15-11-2024.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gesti ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realiza la instalación de concreto Mr entre el tramo del k00+011 al k00+021, k00+028 al k00+034 CI
* Se realiza instalación de SBG entre las abscisas K1+010 al K1+000.
* Se realiza fundida de concreto MR38, entre las abscisas K1+020 al K1+090
* Se realiza conformación de subrasante entre las abscisas K1+010 al K0+950.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Explanación: Continuar con la explanación entre el k0+845 al k1+000
* Subbase: Instalación de subbase del k0+850 al k1+020
* Pavimento Rígido: Continuar con la instalación de pavimento rígido del k0+850 al k1+020 CD

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

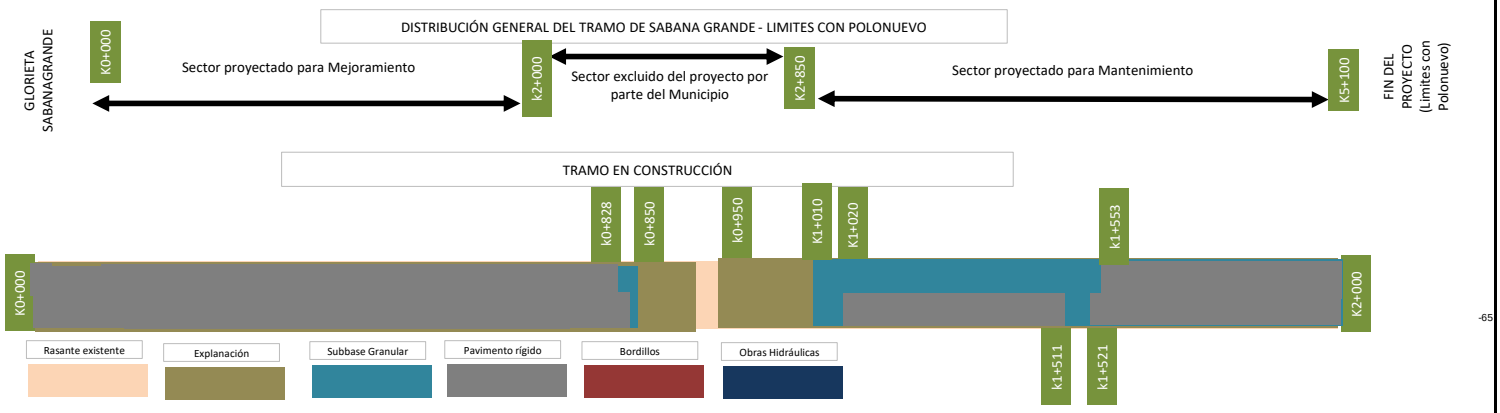

-65

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de Acero de Refuerzo, K0+011 a K0+021



Fundida de Concreto MR-38 K1+020 AL K1+090



Fundida de Concreto MR-38 K1+020 AL K1+090

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños

* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50

* La interventoría mediante comunicación C-T-135-403-2024 del 14/11/2024 solicita al contratista dar cumplimiento al plan de contingencia presentado por los atrasos de obra. Asi mismo la interventoría radicó ante el Municipio de Sabanagrande una solicitud de apertura de proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos en programación.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHÓN ANDRÉS ARIAS**

Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CP/TV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21-nov-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 38 del 15-nov-24 al 21-nov-24 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con un ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA	
INTEGRANTES:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)	
CONTRATO No.	SG-LP-OP-004-2023	VALOR INICIAL: $ 6.542.182.495,26	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:** $ 1.529.977.628,00
FECHA DE INICIO:	4/03/2024	VALOR ADICIONES: $ -	**FECHA DE INICIO:**	1/02/2024	**VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/06/2024	VALOR ACUMULADO: $ 6.542.182.495,26	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/12/2024	VALOR ANTICIPO INICIAL: $ 1.962.654.748,58	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:** $ 257.139.097,00
		VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO: $ (1.242.909.478,08)	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:** $ 134.793.598,00
		VALOR ANTICIPO EJECUTADO: $ 719.745.270,50	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:** $ 122.345.499,00
		VALOR AMORTIZADO: $ 483.389.853,00			
		SALDO POR AMORTIZA $ 236.355.417,50			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6.542.182.495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3.456.339.825			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.085.842.670			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.529.977.628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 834.246.938			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 695.730.690			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.215.826.029,36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.479.271.769,58	88,2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.424.337.482,57	55,1%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.054.934.287,01)	-33,1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 32.002.342,75	0,5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.479.271.769,58	88,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.456.339.825,32	55,6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.022.931.944,26)	-32,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 527.767.225,50	8,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 139.416.727,72	2,2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 11-09-24 A 10-10-24
VALOR FACTURA: $ 793.980.154,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No 4**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.529.977.628,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 807.137.063,80	52,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.109.873,93	1,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.109.873,93	100,0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 116.185.174,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No9

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719.745.270,50
Amortizado $	$ 483.389.853,00
Saldo $	$ 236.355.417,50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

	INDICADOR I/C
En el mes:	0,17
Acumulado:	0,24

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2023	$ 6.542.182.495,26	34%	$ 526.749.643,55
LP-001-2023	$ 12.460.000.000,00	66%	$ 1.003.227.984,45
Total	$ 19.002.182.495,26	100%	$ 1.529.977.628,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257.139.097,00
Amortizado $	$ 134.793.598,00
Saldo $	$ 122.345.499,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88,2% Avance o Atraso Físico % -19,3%
Meta Física Ejecutada % 68,9%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cant	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector (n)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100,0%			100,0%	100,0%
					Ejec	85,0%			85,0%	85,0%
* Explanaciones (m)	m	2000	2000		Prog	1763,0			1763,0	88,2%
					Ejec	1970			1970,0	98,5%
* Subbase	m	2000	2000		Prog	1763,0			1763,0	88,2%
					Ejec	1970			1970,0	98,5%
* Pavimento rígido	m	2000	2000		Prog	1763,0			1763,0	88,2%
					Ejec	1568,5			1568,5	78,4%
* Bordillos	m	4000	4000		Prog	3526,0			3526,0	88,2%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas proyectadas se encuentra acorde a lo definido en los estudios y diseños.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	1
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	1
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total	9	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	BARANOA ATLANTICO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LURUACO-ATLÁNTICO.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO

OBSERVACIONES: se encuentra aprobada la cantera de CONSIPE y se tiene aprobado al proveedor de concreto hidráulico para el pavimento de CONCREMOVIL.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065009 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante oficio C-T-135-407-2024, Interventoría hizo entrega del tercer informe trimestral ambiental al INVIAS.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	31	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
* Carrera 7 Km 2 Al lado del Centro Recreacional El Pinar
* Teléfono: 311 619 16 96
* Correo: Constructorescrivensabanagrand@gmail.com

OBSERVACIONES:
15-11-2024. Se atendió en el SAU sin ninguna novedad. Se llevó a cabo Reunión de seguimiento social al contrato se levantó el ac ta con el consecutivo N° 61. *16-11-2024.Gestión de firma acta de reunión N° 61, es remitida firmada. Se adelanta los ajustes del formato de la PQRSD N°2 de la señora Nelly Herdenes Polo por parte de la profesional social del contratista. *18-11-2024. Se gestionan firmas internas del contratista e Interventoría del formato de la PQRSD N°2. Se revisa borrador en Word de acta de CPC realizada el 14 -nov-2024, revisada por el área social y remitida al área técnica y SST de la interventoría para la respectiva revisión. Se remite para los archivos de interventoría acta de reunión N° 61 firmada para el archivo social. Se realizó gestión con funcionario de secretaria de tránsito para definir fecha de la campaña vial, pendiente el día 19-11-2024 para definir fecha y logística. *19-11-2024. Se gestiona en el área técnica y SST de interventoría las observaciones del acta del CPC, se encuentra en revisión, se gestiona gestión ante Secretaria de Transito de Sabanagrande para taller de prevención y seguridad vial, continúa pendiente definir la fecha. *20-11-2024. Se devuelven observaciones al contenido y formato del acta de reunión del CPC del 14nov-2024, se recibe por WhatsApp y por el mismo medio se remite documento con observaciones de interventoría. Se solicita gestión para definir la fecha en la que se realizará la campaña de prevención y seguridad vial. El contratista re mite correo al ICANH y al MININTERIOR gestionando respuesta de consulta realizada el 21 de mayo del año 2024. *21-11-2024. Se remite al correo social por parte de la interventoría consulta que el CRIVEN CONSTRUCCIONES realizó ante el ICANH y al MINITERIOR EL 20-11-2024. Interventoría indaga la respuesta de la campaña de prevención y seguridad vial con la profesional SST de la interventoría con la posibilidad de realizar la actividad un sábado, está pendiente confirma r la fecha exacta.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuentaque la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gestión Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realiza fundida de concreto entre las abscisas K0+900 a K1+020.
* Se realiza instalación de SBG entre las abscisas K0+900 al K1+020.
* Se realiza conformación de subrasante entre las abscisas K0+950.al K0+850

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Explanación: Continuar con la explanación entre el k0+850 al k0+830
* Subbase: Instalación de subbase del k0+860 al k0+830
* Pavimento Rígido: Continuar con la instalación de pavimento rígido del k0+850 al k1+020 CD

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

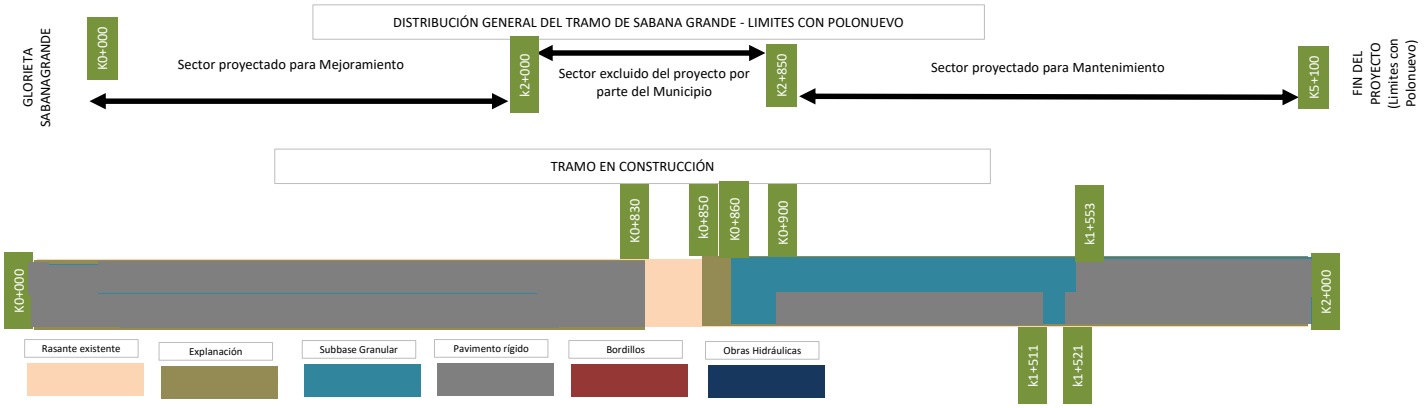

-65

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de socialización de avance del proyecto



Fundida de Concreto MR-38 K0+960 AL K0+900



Instalación de SBG K0+960 a K0+900

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños

* Respecto a los atrasos en programación, la interventoría recomendó al Municipio de Sabanagrande la apertura de un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos del contratista, mediante comunicación C-T-135-404-2024 del 14/11/2024.

* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50

* La interventoría mediante comunicación C-T-135-412-2024 del 18/11/2024 solicita al municipio la Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de JUNIO A OCTUBRE de 2024

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JHON ANDRÉS ARIAS
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28-nov-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **SEMANA No.:** 39 del 22-nov-24 al 28-nov-24 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JIMMY ALEXANDER CORREDOR CHINOME

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La ejecución de acuerdo la etapa de estudios y diseños y el balance de obra, se proyecta para los tramos: K0+000 al K2+000 definido según diseños para la intervención con pavimento rígido y posteriormente del K2+850 al K5+071 definido según diseños para intervención con mantenimiento de vía (conformación e instalación de afirmado de acuerdo con sectores críticos al momento de la intervención), con las siguientes metas físicas:

• 2000 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido, con anchos de 6.00 m (adicionalmente bordillos de 0.15 m en ambos costados), con el fin de garantizar el ancho de calzada recomendado en el manual de diseño geométrica INVIAS 2008 para trafico pesado.
• 2250 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado en sectores críticos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial se encuentra en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande y se localiza entre Sabanagrande (Salida de Glorieta) hasta límites con el Municipio de Polonuevo en longitud de 5.1 Km, el cual tiene actualmente superficie afirmado con deterioro y con algunos sobrantes de asfalto y discurre sobre una topografía plana, con pendientes longitudinales que no superan el 3%, con anchos de vía que oscilan entre 6.0 m a 7.0 m. Cuenta con obras hidráulicas en óptimas condiciones y únicamente se proyectan actividades de mantenimiento sobre estas.
Se proyecta la intervención de mejoramiento con un ancho de calzada de 6.0 m y con bordillos de 15 cm a cada lado. El drenaje será manejado por calzada, con descoles de acuerdo a lo señalado en estudio hidráulico.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ODESSA	
INTEGRANTES:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		**INTEGRANTES:**	CGR S.A.S NIT. 830.076.603-9 (95%) y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S NIT. 900.804.544-0 (5%)	
CONTRATO No.	SG-LP-OP-004-2023	VALOR INICIAL: $ 6.542.182.495,26	**CONTRATO No.**	4805 de 2023	**VALOR INICIAL:** $ 1.529.977.628,00
FECHA DE INICIO:	4/03/2024	VALOR ADICIONES: $ -	**FECHA DE INICIO:**	1/02/2024	**VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/06/2024	VALOR ACUMULADO: $ 6.542.182.495,26	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	4/12/2024	VALOR ANTICIPO INICIAL: $ 1.962.654.748,58	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	14/12/2024	**VALOR ANTICIPO:** $ 257.139.097,00
		VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO: $ (1.242.909.478,08)	**SUSPENSIÓN 01**	Del 19/12/2023 al 31/01/2024	**VALOR AMORTIZADO:** $ 134.793.598,00
		VALOR ANTICIPO EJECUTADO: $ 719.745.270,50	**REINICIO 01**	1/02/2024	**SALDO POR AMORTIZAR:** $ 122.345.499,00
		VALOR AMORTIZADO: $ 483.389.853,00			
		SALDO POR AMORTIZA $ 236.355.417,50			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 6.542.182.495			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3.987.571.256			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.554.611.240			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1.529.977.628			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 861.356.812			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 668.620.816			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.215.826.029,36	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.007.038.995,08	96,6%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.955.568.912,94	63,6%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.051.470.082,15)	-33,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 32.002.342,75	0,5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.007.038.995,08	96,6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.987.571.255,69	64,2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.019.467.739,40)	-32,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 527.767.225,50	8,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 448.235.894,57	7,2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 11-09-24 A 10-10-24
VALOR FACTURA: $ 793.980.154,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **Se Tramita acta parcial de obra No 4**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.529.977.628,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 834.246.937,73	54,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.109.873,93	1,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.109.873,93	100,0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 116.185.174,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contrato de interventoría tiene como objeto de supervisión, dos contratos de obra en el marco de dos convenios suscritos en el departamento de Atlántico.
Se radica acta costos No9

ANTICIPOS	
Valor Anticipo Ejecutado	$ 719.745.270,50
Amortizado $	$ 483.389.853,00
Saldo $	$ 236.355.417,50

** Contratista renuncia hace devolución del parte del anticipo otorgado. Ver aclaración en el apartado **XII.**

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,17
Acumulado:	0,21

Contrato	Valor	%Participación	Asignación/Contrato
SG-LP-OP-004-2023	$ 6.542.182.495,26	34%	$ 526.749.643,55
LP-001-2023	$ 12.460.000.000,00	66%	$ 1.003.227.984,45
Total	$ 19.002.182.495,26	100%	$ 1.529.977.628,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 257.139.097,00
Amortizado $	$ 134.793.598,00
Saldo $	$ 122.345.499,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,6% Avance o Atraso Físico % -25,0%
Meta Física Ejecutada % 71,7%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cant**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector (n)**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
	Estudios y diseños	gl	1	1		Prog	100,0%			100,0%	100,0%
						Ejec	85,0%			85,0%	85,0%
*	Explanaciones (m)	m	2000	2000		Prog	1932,8			1932,8	96,6%
						Ejec	2000			2000,0	100,0%
*	Subbase	m	2000	2000		Prog	1932,8			1932,8	96,6%
						Ejec	1970			1970,0	98,5%
*	Pavimento rígido	m	2000	2000		Prog	1932,8			1932,8	96,6%
						Ejec	1624			1624,0	81,2%
*	Bordillos	m	4000	4000		Prog	3865,6			3865,6	96,6%
						Ejec	280			280,0	7,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
** Las metas físicas proyectadas se encuentra acorde a lo definido en los estudios y diseños.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
volquetas sencillas	2	
compactador de rodillo.	1	1
Mini cargador	1	
retroexcavadora o pajarita	1	1
retro cargador de llantas	1	
volqueta doble troque	1	1
moto niveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Total	9	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
El contratista se encuentra en etapa de estudios y diseños

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	BARANOA-ATLANTICO BARANOA A ATLANTICO	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI SI	x x	NO NO	
UBICACIÓN:	ENTRE SANTA CALATINA -BOLIVAR Y LURUACO-ATLÁNTICO.	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI SI	x x	NO NO	

OBSERVACIONES: se encuentra aprobada la cantera de CONSIPE y se tiene aprobado al proveedor de concreto hidráulico para el pavimento de CONCREMOVIL.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	x	N/A
EMISIONES:	SI	NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: De acuerdo al tipo de proyecto y actividades a desarrollar la obra no requiere de permisos o licencias ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2024S-VBOG-065009 el INVIAS dio el concepto de No Objeción e implementación del PAGA.

OBSERVACIONES: Mediante comunicado 2024S-VBOG-087855 el INVIAS aprobó el tercer informe trimestral ambiental.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	31	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
* Carrera 7 Km 2 Al lado del Centro Recreacional El Pinar
* Teléfono: 311 619 16 96
* Correo: Constructorescrivensabanagrand@gmail.com.

OBSERVACIONES:
*22-11-2024.Se recibe correo con el número de la radicación ante el MININTERIOR para que el contratista realice la consulta y seguimiento de la respuesta. Se realiza comité de seguimiento. Se lleva a cabo reunión de seguimiento social al contrato se levanta el acta N° 62, pendiente por firma de la profesional social del contratista. 23 -11-2024. Se remite por parte de la profesional social del contratista el acta de reunión N° 62 firmada correspondiente a seguimiento social del contrato y se procede a remitir el soporte para los archivos de la Interventoría. El área social de la Interventoría proyecta comunicaciones con recomendaciones a la Alcaldía municipal, secretaria deTransito de Sabanagrande y Personería para que implementen medidas de seguridad vial durante la temporada decembrina y de principios del año 2024. 25-11-2024. Gestión en secretaria de Tránsito. 26-11-2024. El contratista realizó gestión con Transito de Sabanagrande. Interventoría remite a la Alcaldía y secretaria de Transito de Sabanagrande las comunicaciones C-T-135-420-2024-SG y C-T-135-421-2024-SG solicitando apoyo de prevención y seguridad vial durante la temporada decembrina y de enero de 2025. 27-11-2024. Se remitió por parte de interventoría el soporte del personal reportado en obra para soporte del informe mensual social de noviembre. Se remite al correo link programación de reunión social de seguimiento al contrato programado para el día viernes 29 de noviembre. Se informa por medio de WhatsApp a la profesional social del contratista que en los sitios donde ya se instalaron bordillos y se adecuaron accesos pueden proceder a programar el levantamiento de las actas de vecindad de cierre del contrato. 28-11-2024. Se remite correo solicitando al contratista adelantar la gestión para iniciar el cierre de las actas de vecindad enlos tramos donde ya se colocaron bordillos y se realizaron adecuaciones, esta pendiente remitan la programación para el acompañamiento de interventoría. Se remite al WhatsApp de la profesional social el soporte de personal remitido por el área SST de interventoría para que el contratista verifique y adjunte el soporte en el informe mensual de noviembre. Se remitió al correo social la correspondencia de interventoría y del contratista para que avancen en la elaboración del informe mensual de noviembre

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Dentro del Alcance del Contrato de Obra no se tiene contemplada el desarrollo de Actividades de Gestión Predial, teniendo en cuenta que la intervención de la obra se ejecutará de acuerdo con las condiciones existentes del corredor vial. No Obstante, de requerirse algún tipo de Gesti ón Predial para la ejecución de la obra, esta deberá ser adelantada por parte de la Entidad Contante (Municipio) de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio interadmi nistrativo del cual derivo el presente contrato de obra.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica para el Presente contrato la Implementación de Programas de Sostenibilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del proceso de licitación y/o demás documentos legales del contrato de obra y/o del convenio interadministrativo.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realiza fundida de concreto entre las abscisas K0+860 a K0+900
* Se realiza conformación de subrasante entre las abscisas K0+830 a K0+860,
* Se realiza fundida de concreto MR38 entre las abscisas K1+100 a K1+553, por un carril.
* Se realiza fundida de bordillos por ambos costados entre las abscisas K0+000 a K0+140.
* La interventoría mediante comunicación C-T-135-417-2024 del 18/11/2024 da Respuesta – Revisión Estudio Hidrológico e Hidráulico – Sabanagrande – Polonuevo V4

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Subbase: Instalación de subbase del k0+860 al k0+830
* Pavimento Rígido: Continuar con la instalación de pavimento rígido del k0+830 a K0+860 por el carril derecho, K1+410 hacia menores.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

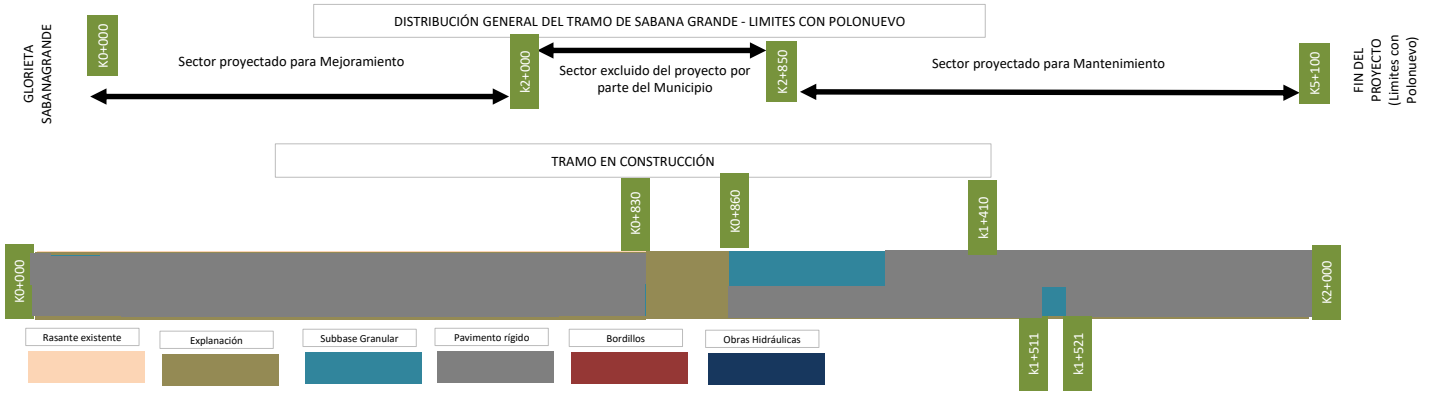

-65

*** NOTA**: El contratista se encuentra adelantando actividades de complementación y actualización de estudios y diseños. Una vez surtida dicha etapa se definirán las metas físicas del proyecto.
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Chequeo de Niveles de SBG, y rasante entre las abs 1+410 a 1+473



Fundida de bordillos entre las abs 0+000 a 0+140



Fundida de concreto MR38 entre las abscisas 1+553 a 1+470 CI

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Exigir al Contratista el equipo y maquinaria apropiado para la ejecución de obra.
* Exigir al Contratista el personal profesional, técnico y de mano de obra en la calidad y cantidad necesaria para ejecutar las obras según el cronograma
* Llevar el registro fílmico, fotográfico y escrito diario de cada una de las actividades realizadas en obra.
* Seguimiento y revisión de los estudios y diseños
* Se realiza comité de obra con el Municipio en donde se solicita al contratista mejorar rendimientos de ejecución de obra teniendo en cuenta que el plazo actual vence el 04/12/2024. El contratista solicitará prorroga por un termino de 10 dias y hasta el 14/12/2024, plazo que tiene actualmente la interventoría.

* ANTICIPO: El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23/07/24 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, y la Interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30/07/24 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo, por lo cual el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7 con un valor total de $719.745.270,50

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JHON ANDRÉS ARIAS**
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 30 de noviembre de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO/MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA N°: LP-001-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

CONTRATO INTERVENTORIA: 4805-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ODESSA

SECTOR: LA GIRALDA SANTA RITA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	JOHN DEERE	670B	PONEDERA	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	
VOLQUETA			PONEDERA							1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	
VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL RAND		PONEDERA	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1R	1R	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
CARRO TANQUE	FORD		PONEDERA	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
RETRO DE ORUGA	CATERPILLAR	320CL	PONEDERA	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1R	1R	1R	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
			TOTAL ACTIVO	3	3	0	3	3	3	4	5	5	0	0	5	5	5	5	5	1	5	3	3	3	4	4	1	4	4	4	3	3	3	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0
			TOTAL INACTIVO	1	1	4	1	1	1	1	0	0	5	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	80
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	20
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Contratista no ha firmado
Nombre: OMAR ENRIQUE RODRIGUEZ CAPELA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-084074

Firma
Nombre: RONALD OSWALDO MOLINARES TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 25202-359958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.2.MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 de noviembre de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO/MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE OBRA N°: SG-LP-OP-004-2023

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO INTERVENTORIA: 4805-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ODESSA

SECTOR: VIAL RURAL SABANAGRANDE – POLONUEVO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	sabanagrande plonuevo	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1I	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120H	sabanagrande	1A	1A	1I	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
MINICARGADOR	NEW HOLLAND	L223	sabanagrande	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	NEW HOLLAND	B95B	sabanagrande	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO	DINAPAC	CA150D	sabanagrande	1I	1I	1I	1I	1I	1I	1A	1I	1I	1I	1I	1A	1I	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO	DINAPAC	CA250D	sabanagrande	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNETIONAL	UYX397	sabanagrande	1A	1A	1I	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
CAMIONETA		HXK260	sabanagrande	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1I	1A	1A	1A	1A	1A	1A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	
TOTAL ACTIVO				6	6	0	6	6	4	7	6	6	0	6	7	4	7	7	7	0	0	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	0
TOTAL EN REPARACIÓN				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
TOTAL INACTIVO				1	1	7	1	1	3	0	1	1	7	1	0	4	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	63
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	13
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	24

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ADALBERTO FLORES SALGADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-138800 ATL

Firma
Nombre: RONALD OSWALDO MOLINARES TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 25202-359958 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PONEDERA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4805 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE EDGAR TORRES EDGAR	8.717.014	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	9477003073	$ 162.500	COLPENSIONES	9477003073	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	OMAR ENRIQUE RODRIGUEZ CAPELA	72.210.357	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	9477003073	$ 162.500	PORVENIR	9477003073	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	DANIS DANIEL GARCIA MUÑOZ	1.041.891.688	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9477003073	$ 162.500	COLFONDOS	9477003073	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	NATALY ARIZA CERVANTES	1.041.892.328	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS M	9477003073	$ 162.500	PROTECCION	9477003073	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	BRICEIDA MARIA BOLIVAR OROZCO	1.129.572.799	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	9477003073	$ 162.500	COLFONDOS	9477003073	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	DILAN ALEXANDER UTRIA SANTIAGO	1.001.788.102	INSPECTOR SISO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS M	9477003073	$ 162.500	PORVENIR	9477003073	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	BRAHINER ANDRES DIAZ MENDOZA	1.143.256.480	TOPOGRAFO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 563.334	$ 39.300	V	0	9477003073	$ 70.500	PORVENIR	9477003073	$ 90.200	$ 22.600	11300	17000	
8	ANDRES LUIZ DIAZ ALTAMAR	1.044.616.205	CADENERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA GIRALDA	$ 563.334	$ 39.300	V	0	9477003073	$ 70.500	0	9477003073	$ 90.200	$ 22.600	11300	17000	
9	CARLOS ARTURO MUÑOZ OLASCUAGAS	72.009.757	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	31578593	$ 68.000	PORVENIR	31578593	$ 272.000	$ 68.000	EXONERADO	EXONERADO	
10	ALBERTO PRIETO	19.535.335	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	$ 1.800.000	$ 125.300	V	SANITAS	31578593	$ 72.000	PORVENIR	31578593	$ 288.000	$ 72.000	EXONERADO	EXONERADO	
11	WILFREDO RAFAEL GARCIA HENRIQUEZ	12.590.007	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 2.100.000	X X X X X	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	$ 350.000	$ 24.400	V	SANITAS	31578593	$ 14.000	0	31578593	$ -	$ 14.000	EXONERADO	EXONERADO	POR LA EDAD NO COTIZA PENSION
12	ERWIN ALBERTO PRIETO ROSADO	1.042.421.842	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 2.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	$ 2.250.000	$ 156.900	V	SANITAS	31578593	$ 90.200	PORVENIR	31578593	$ 360.500	$ 90.200	EXONERADO	EXONERADO	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA AUN TIENE PLAZO PARA EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO CON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT, SEGÚN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 923 DEL 31 DE MAYO DEL 2017 ARTÍCULO 1°. MODIFICAR EL ARTÍCULO 3.2.2.1 DEL DECRETO NÚMERO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ASÍ: ARTÍCULO 3.2.2.1., EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO: FECHA DE PAGO DEL CONTRATISTA HASTA EL DÍA HÁBIL 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

El contratista adiunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectuó por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Contratista no ha firmado

Firma
Nombre: JOSE EDGAR TORRES EDGAR
Director de Obra
Contratista: CONSORCIO LA GIRALDA
CC No.: 8717014

Firma
Nombre: JHON ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

SABANAGRANDE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4805 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS ADALBERTO FLOREZ SALGADO	10.778.771	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA P - F LTDA.	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	9477589304	$ 52.000	PROTECCION	9477589304	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
2	CARLOS ARTURO AREVALO VARONA	8.683.366	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	9476918546	$ 52.000	0	9476918546	$ -	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
3	EDGARDO RAFAEL AHUMADA	8.648.705	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	9476918546	$ 52.000	PORVENIR	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
4	FRANCISCO ARRIETA PEREZ	1.002.183.010	INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRATIVO	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SURA	9476918546	$ 80.000	COLPENSIONES	9476918546	$ 320.000	$ 80.000	Exonerado	Exonerado	
5	ROBERTO CABALLERO MARTELO	72.046.820	OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 2.450.000	$ 170.600	V	SALUD TOTAL	9476918546	$ 98.000	PROTECCION	9476918546	$ 392.000	$ 98.000	Exonerado	Exonerado	
6	ALBERTO RAMON CASTILLO CHLYS	7.474.161	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	EPS MUTUAL SER	9476918546	$ 52.000	0	9476918546		$ 52.000	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
7	MARIA ALEJANDRA CONTRERAS BARRANCO	1.143.443.933	PROFESIONAL SST	$ 1.838.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.838.000	$ 128.000	V	EPS SURA	9476918546	$ 73.600	COLFONDOS	9476918546	$ 294.100	$ 73.600	Exonerado	Exonerado	
8	DAMARIS GUERRERO PAYARES	45.749.085	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.083.334	$ 75.500	V	SANITA	9476918546	$ 43.400	COLPENSIONES	9476918546	$ 173.400	$ 43.400	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
9	STEWEEN JOSE GUETTE MEJIA	1.047.231.217	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUALSER	9476918546	$ 52.000	PORVENIR	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
10	ENRIQUE CARLOS EDUARDO RUIZ	8.699.073	ALMACENISTA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	9476918546	$ 88.000	0	9476918546	$ -	$ 88.000	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
11	CARLOS ROBERTO PRINS DAGER	7.479.122	OPERADOR VIBRO COMPACRADOR	$ 1.339.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.339.000	$ 93.200	V	NUEVA E.P.S.	9476918546	$ 53.600	0	9476918546	$ -	$ 53.600	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
12	LEONEL ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ	72.149.926	CONDUCTOR	$ 1.339.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.339.000	$ 93.200	V	NUEVA E.P.S.	9476918546	$ 53.600	PORVENIR	9476918546	$ 214.300	$ 53.600	Exonerado	Exonerado	
13	CARLOS JESUS ESTEFANELL	1.143.262.859	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1.326.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.326.000	$ 92.300	V	SALUD TOTAL	9476918546	$ 53.100	PORVENIR	9476918546	$ 212.200	$ 53.100	Exonerado	Exonerado	
14	WILLIAM JOSE TORRES VALDES	72.237.353	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.387.254	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.387.254	$ 90.500	V	MUTUAL SER	9476918546	$ 52.000	PORVENIR	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
15	LUIS GUILLERMO TRESPLACIOS	98.491.403	OPERADOR MAQUINARIA	$ 1.427.126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.427.126	$ 99.400	V	SALUD TOTAL	9476918546	$ 57.100	0	9476918546	$ -	$ 57.100	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
16	MANUEL LUCIO ACOSTA	9.138.568	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SURA	9476918546	$ 52.000	PORVENIR	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
17	JESUS ARIZA FLOREZ	1.080.016.160	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAJACOPI	9476918546	$ 52.000	PORVENIR	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	RETIRADO 30/10/2024 INGRESO CON AFILIACION 26/11/2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA AUN TIENE PLAZO PARA EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO CON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT, SEGÚN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 923 DEL 31 DE MAYO DEL 2017 ARTÍCULO 1°. MODIFICAR EL ARTÍCULO 3.2.2.1 DEL DECRETO NÚMERO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ASÍ: ARTÍCULO 3.2.2.1., EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO: FECHA DE PAGO DEL CONTRATISTA HASTA EL DÍA HÁBIL 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS ADALBERTO FLOREZ SALGADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-138800

Firma
Nombre: JHON ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4805 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
18	MARCOS TULIO OROZCO CASTRO	8.774.857	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUALSER	9476918546	$ 52.000	PROTECCION	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
19	ALCIBIDES OVALLE ZULETA	77.022.170	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUALSER	9476918546	$ 52.000	0	9476918546	$ -	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	POR EDAD NO COTIZA PENSION
20	FREDDY ANTONIO PEÑA	1.046.872.076	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9476918546	$ 52.000	PROTECCION	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
21	EDUARD VANEGAS	8.534.568	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	9476918546	$ 52.000	PORVENIR	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
22	JOSE LUIS RIOS ZAMBRANO	1.042.355.641	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9476918546	$ 52.000	PROTECCION	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
23	WILBER JESUS PEÑA BUJATO	1.046.873.313	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 520.000	$ 36.200	V	COOSALUD	9476918546	$ 20.800	PORVENIR	9476918546	$ 83.200	$ 20.800	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
24	DANILO JOSE CABALLERO CERVANTES	1.001.888.283	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9476918546	$ 52.000	PORVENIR	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
25	DIANA ROSA AHUMADA CABALLERO	32.855.561	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 346.667	$ 24.200	V	SALUD TOTAL	9476918546	$ 13.900	PORVENIR	9476918546	$ 55.500	$ 13.900	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
26	JESUS ANDRES REYES VENEGA	1.090.506.127	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 346.667	$ 24.200	V	NUEVA EPS	9476918546	$ 13.900	PORVENIR	9476918546	$ 55.500	$ 13.900	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
27	JORGE GOMEZ	72.096.423	CELADOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	9476918546	$ 52.000	PORVENIR	9476918546	$ 208.000	$ 52.000	Exonerado	Exonerado	
28	CUENTAS BERDUGO OSCAR EMILIO	72.155.429	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 866.667	$ 60.400	V	MUTUALSER	9476918546	$ 34.700	PROTECCION	9476918546	$ 138.700	$ 34.700	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
29	PEDRO ANTONIO RAMIREZ CARRANZA	1.042.350.687	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 1.126.667	$ 78.500	V	CAJACOPI	9476918546	$ 45.100	PORVENIR	9476918546	$ 180.300	$ 45.100	Exonerado	Exonerado	
30	EDER RAFAEL CARRILLO CARRILLO	1.048.265.447	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 346.667	$ 24.200	V	NUEVA EPS	9476918546	$ 13.900	PORVENIR	9476918546	$ 55.500	$ 13.900	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
31	LOURDES TEOTISTA MUÑOZ GOMEZ	32.846.818	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	MUTUALSER	8381657052	$ 162.500	COLPENSIONES	8381657052	$ 208.000	0	Exonerado	Exonerado	
32	ANDRES FELIPE UCROS FABREGAS	1.042.453.771	INSPECTOR TOPOGRAFO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	74381436	$ 162.500	PORVENIR	74381436	$ 208.000	$ 7.800	Exonerado	Exonerado	
33	CHRISTIAM ANDRES DE LA HOZ VIGGIANI	1.143.262.374	CADENERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 433.334	$ 30.200	V	SALUD TOTAL	74380857	$ 54.200	COLFONDOS	74380857	$ 69.400	$ -	0	0	
34	ALEXANDER SARMIENTO PEREZ	1.042.354.143	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 260.000	$ 18.100	V	SURA	9477242562	$ 10.400	PROTECCION	9477242562	$ 41.600	$ 10.400	Exonerado	Exonerado	
35	DEIBY JADER RIVERA DOMINGUEZ	11.042.124	AUXILIAR DE TRAFICO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ 433.334	$ 30.200	V	NUEVA EPS	9476918546	$ 17.400	PORVENIR	9476918546	$ 69.400	$ 17.400	Exonerado	Exonerado	RETIRADO
36	JUAN CARLOS CASSERES SIMMONDS	1.048.270.726	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ -	$ -	V	0	$ -	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	INGRESO CON AFILIACION ARL
37	LUIS MIGUEL MARTINEZ GOMEZ	1.042.353.552	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ -	$ -	V	0	$ -	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	INGRESO CON AFILIACION ARL
38	JOSE LUISRAMIREZ CARRANZA	1.042.350.690	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ -	$ -	V	0	$ -	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	INGRESO CON AFILIACION ARL
39	CARLOS ALBERTO FANDIÑO ARIZA	1.080.010.021	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X	CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS	$ -	$ -	V	0	$ -	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	INGRESO CON AFILIACION ARL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA AUN TIENE PLAZO PARA EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DE ACUERDO CON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT, SEGÚN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 923 DEL 31 DE MAYO DEL 2017 ARTÍCULO 1°. MODIFICAR EL ARTÍCULO 3.2.2.1 DEL DECRETO NÚMERO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ASÍ: ARTÍCULO 3.2.2.1., EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO: FECHA DE PAGO DEL CONTRATISTA HASTA EL DÍA HÁBIL 07 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS ADALBERTO FLOREZ SALGADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-138800

Firma
Nombre: JHON ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

PONEDERA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

MUNICIPIO DE PONEDERA
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO LA GIRALDA
NIT: 901.770.166 - 5

FECHA 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO
MUNICIPIO: PONEDERA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: 2220-2023

CONTRATO DE OBRA No: LP - 001 - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA
PERIODO: 01-03-24 a 31-10-24
PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Saldo del Contrato Adjudicado	Saldo del CONVENIO	No. y Fecha de Radicación Cuentas En Municipio	Indicar pago según reporte CHEQUE		Observaciones
													SI	NO	
									$ 12.460.000.000,00	$ 12.460.000.000,00	$ 12.460.000.000,00				
1	Obra	01-03-24 a 31-10-24	$ 399.543.638,00	$ -	$ 399.543.638,00		$ 399.543.638,00	$ -	$ 12.060.456.362,00	$ 12.060.456.362,00	$ 12.060.456.362,00				
TOTALES			**$ 399.543.638,00**	**$ -**	**$ 399.543.638,00**	**$ -**	**$ 399.543.638,00**	**$ -**	**$ 12.060.456.362,00**	**$ 12.060.456.362,00**	**$ 12.060.456.362,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	$ 399.543.638,00	$ -	**$ 399.543.638,00**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT			$ -
SECCIÓN 1: OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)			$ -
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ -	$ -	$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 399.543.638,00	$ -	**$ 399.543.638,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **EDGAR JOSE TORRES MEJIA**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
CC No.: 8.717.014

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

MUNICIPIO DE SABANAGRANDE
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900614442-2

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRRECION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO
MUNICIPIO: SABANAGRANDE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: 2221-2023

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-0P-004-2023
CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. NIT: 900614442-2
PERIODO: 11-10-24 a 30-11-24
PROYECTO: MEJORAMINETO DE LA VIA SABANAGRANDE POLONUEVO - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE . DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Saldo del Contrato Adjudicado	Saldo del CONVENIO	No. y Fecha de Radicación Cuentas En Municipio	Indicar pago según reporte CHEQUE SI	Indicar pago según reporte CHEQUE NO	Observaciones
								$ 1,962,654,748.58	$ 6,586,000,000.00	$ 6,542,182,495.26	$ 6,586,000,000.00				
1	Obra	01-03-24 A 31-07-24	$ 1,156,258,653.00	$ -	$ 1,156,258,653.00	$ 346,877,596.00	$ 809,381,057.00	$ 1,615,777,152.58	$ 3,813,964,194.42	$ 5,385,923,842.26	$ 3,813,964,194.42	radicado CT-135-283-2024			
								-$ 1,242,909,478.08							DEVOLUCION DEL ANTICIPO **(Ver Nota)**
								$ 372,867,674.50							NUEVO SALDO DEL ANTICIPO **(Ver Nota)**
2	Obra	01-08-24 A 10-09-24	$ 999,185,151	$ -	$ 999,185,151.00	$ 69,173,619.00	$ 930,011,532.00	$ 303,694,055.50	$ 4,126,862,140.50	$ 4,386,738,691.26	$ 4,126,862,140.50	radicado CT-135-307-2024			
1	Ajuste	04-03-24 a 31-07-24	$ 50,351,244	$ -	$ 50,351,244.00	$ 15,105,373.00	$ 35,245,871.00	$ 288,588,682.50	$ 4,091,616,269.50	$ 4,336,387,447.26	$ 4,091,616,269.50	radicado CT-135-307-2024			
3	Obra	11-09-24 a 10-10-24	$ 793,980,154	$ -	$ 793,980,154.00	$ 52,233,265.00	$ 741,746,889.00	$ 236,355,417.50	$ 3,349,869,380.50	$ 3,542,407,293.26	$ 3,349,869,380.50	radicado CT-135-362-2024			
2	Ajuste	01-08-24 A 10-09-24	$ 42,745,029	$ -	$ 42,745,029.00	$ 2,957,956.00	$ 39,787,073.00	$ 233,397,461.50	$ 3,310,082,307.50	$ 3,499,662,264.26	$ 3,310,082,307.50	radicado CT-135-365-2024			
4	Obra	11-10-24 a 30-11-24	$ 1,171,184,304	$ -	$ 1,171,184,304.00	$ 233,397,461.50	$ 937,786,842.50	$ -	$ 2,372,295,465.00	$ 2,328,477,960.26	$ 2,372,295,465.00				
TOTALES			**$ 4,213,704,535.00**	**$ -**	**$ 4,213,704,535.00**	**$ 719,745,270.50**	**$ 3,493,959,264.50**	**$ -**	**$ 2,372,295,465.00**	**$ 2,328,477,960.26**	**$ 2,372,295,465.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	$ 4,120,608,262.00	$ -	**$ 4,120,608,262.00**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT			**$ -**
SECCIÓN 1: OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			**$ -**
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)			**$ -**
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 93,096,273.00	$ -	**$ 93,096,273.00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 4,213,704,535.00	$ -	**$ 4,213,704,535.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

1. El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23 de julio de 2024 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, manifestando que, a la fecha de su oficio, han recibido aproximadamente el 11% del valor pactado en el contrato como anticipo y manifestando la renuncia al pago del SALDO DEL ANTICIPO pactado en el contrato de la referencia y que se proceda a la devolución del saldo del ANTICIPO, no pagado y que se encuentra en la FIDUCIA, a la cuenta del convenio de la referencia.
2. En mesa de trabajo PRESENCIAL, en la que participo El alcalde de Sabanagrande, secretario de Obras Públicas, un Representante de la Interventoría y Representante del Contratista, realizada el pasado 23 de julio de 2024 se le puso de presente a la interventoría la solicitud de renuncia del anticipo presentada por el contratista.
3. La interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30 de julio de 2024 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo manifestadas por el contratista en comunicación del 23 de julio de 2024 indicando que no comparte los postulados del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S y considera que el contratista se encuentra en plena facultad de renunciar al anticipo de obra, así mismo informa al municipio que se puede proceder con solicitud de cancelación del PATRIMONIO AUTÓNOMO a la entidad fiduciaria y realizar la devolución de los recursos a título de anticipo a la cuenta del convenio 2221-2023.
4. Que, como consecuencia de lo anterior el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7, obteniéndose el siguiente balance:

VALOR INICIAL CONSIGNADO EN LA FIDUCIA **$ 1.962.654.748,58**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA BAJO CONCEPTO DE ANTICIPO: **$ 719.745.270,50**
SALDO POR RETORNAR A LA CUENTA DEL CONVENIO **$1.242.909.478,08**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **ITALA ESTEFANEL SANTIAGO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:
cc: 22341194

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 de noviembre de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITAEL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECTOR: **LA GIRALDA SANTA RITA**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	13	22	22	22	23	24	24	23	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	22	23	22	24	24	24	24		**691**
Lluvias moderadas	11	2	2	2	1			1		2			-							3				2	1	2						**29**
Lluvias intensas	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-		**-**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: OMAR ENRIQUE RODRIGUEZ CAPELA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-084074

Firma
Nombre: RONALD OSWALDO MOLINARES TORRES
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 25202-359958 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTACION DE CONSULTA : PUERTO GIRALDO [29040300].
PERIODO DE: NOVIEMBRE - 2024

CodigoEstacion	NombreEstacion	Variable	Parametro	Fecha	Unidad	Valor	NivelAprobacion
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	1/11/2024 0:00	mm	10	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	2/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	3/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	4/11/2024 0:00	mm	18	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	5/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	6/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	7/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	8/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	9/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	10/11/2024 0:00	mm	30	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	11/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	12/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	13/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	14/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	15/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	16/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	17/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	18/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	19/11/2024 0:00	mm	70	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	20/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	21/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	22/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	23/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	24/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	25/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	26/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	27/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	28/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	29/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040300	PUERTO GIRALDO [29040300]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	30/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 de noviembre de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

SECTOR: **VIAL RURAL SABANAGRANDE – POLONUEVO**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DIAS DEL MES**																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	24	22	22	23	24	22	24	23	23	22	24	24	22	24	24	24	24	24	23	22	24	24	24	24	21	20	22	24	24	24	24	**719**
Lluvias moderadas	-	2	2	1	-	2		1	1	2	-	-	2		-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	4	2	-	-	-		**25**
Lluvias intensas	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**-**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ADALBERTO FLORES SALGADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-138800 ATL

Firma
Nombre: RONALD OSWALDO MOLINARES TORRES
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 25202-359958 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTACION DE CONSULTA : BARRANQUILLA SEDE [29040450]

PERIODO DE: NOVIEMBRE - 2024

CodigoEstacion	NombreEstacion	Variable	Parametro	Fecha	Unidad	Valor	NivelAprobacion
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	1/11/2024 0:00	mm	6.6	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	2/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	3/11/2024 0:00	mm	11	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	4/11/2024 0:00	mm	0.2	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	5/11/2024 0:00	mm	1	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	6/11/2024 0:00	mm	0.2	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	7/11/2024 0:00	mm	47.2	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	8/11/2024 0:00	mm	54.5	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	9/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	10/11/2024 0:00	mm	5.3	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	11/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	12/11/2024 0:00	mm	6.5	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	13/11/2024 0:00	mm	25.2	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	14/11/2024 0:00	mm	8.7	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	15/11/2024 0:00	mm	12.8	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	16/11/2024 0:00	mm	14.5	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	17/11/2024 0:00	mm	0.2	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	18/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	19/11/2024 0:00	mm	20.7	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	20/11/2024 0:00	mm	21.7	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	21/11/2024 0:00	mm	87.2	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	22/11/2024 0:00	mm	0.1	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	23/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	24/11/2024 0:00	mm	110.8	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	25/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	26/11/2024 0:00	mm	10.6	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	27/11/2024 0:00	mm	7.3	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	28/11/2024 0:00	mm	0.1	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	29/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar
29040450	BARRANQUILLA SEDE [29040450]	PRECIPITACION	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	30/11/2024 0:00	mm	0	Preliminar

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

PONEDERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 2
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
ARTICULO 220-22 TERRAPLENES									
1	lunes, 18 de noviembre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	N/A	SI	N/A	
2	lunes, 18 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 10	INV E-123	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	≤ 80	47,5	SI	
3	lunes, 18 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 40	INV E-124	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	≤ 75	34,3	SI	
4	lunes, 18 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 200	INV E-125	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	≤ 25	10,0	SI	
5	lunes, 18 de noviembre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	≤ 30	0,0	SI	
6	lunes, 18 de noviembre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	≤ 10	0,0	SI	
7	lunes, 18 de noviembre de 2024	Contenido de materia organica	INV E-121	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	≤ ,2	0,0	SI	
8	lunes, 18 de noviembre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	N/A	2,051	SI	
9	lunes, 18 de noviembre de 2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada	INV E-148	K00+780 AL K00+880 CALZADA	1	≥ 5	26,5	SI	
10	lunes, 25 de noviembre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	N/A	SI	N/A	
11	lunes, 25 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 10	INV E-123	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	≤ 80	48,5	SI	
12	lunes, 25 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 40	INV E-124	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	≤ 75	36,0	SI	
13	lunes, 25 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 200	INV E-125	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	≤ 25	11,9	SI	
14	lunes, 25 de noviembre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	≤ 30	0,0	SI	
15	lunes, 25 de noviembre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	≤ 10	0,0	SI	
16	lunes, 25 de noviembre de 2024	Contenido de materia organica	INV E-121	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	≤ ,2	0,0	SI	
17	lunes, 25 de noviembre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	N/A	0,000	SI	
18	lunes, 25 de noviembre de 2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada	INV E-148	K00+880 AL K01+000 CALZADA	1	≥ 5	0,0	SI	
19	martes, 19 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+360 AL K00+460 TERRAPLEN 1 CAPA	5	≥ 95	97,6	SI	
20	jueves, 21 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+460 AL K00+610 TERRAPLEN 1 CAPA	5	≥ 95	99,1	SI	
21	martes, 26 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+000 AL K00+090 TERRAPLEN 1 CAPA	5	≥ 95	97,4	SI	
22	miércoles, 27 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+610 AL K00+710 TERRAPLEN 1 CAPA	5	≥ 95	97,0	SI	
23	viernes, 29 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+710 AL K00+860 TERRAPLEN 1 CAPA	5	≥ 95	96,2	SI	
24	viernes, 29 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+000 AL K00+100 TERRAPLEN 2 CAPA	4	≥ 95	99,2	SI	
25	sábado, 30 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+100 AL K00+200 TERRAPLEN 2 CAPA	4	≥ 95	98,2	SI	

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

El contratista no cuenta con Director de obra

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **01113-10647 CPITV**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 2
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
ARTICULO 220-22 TERRAPLENES									
26	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	N/A	SI	N/A	
27	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 10	INV E-123	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	≤ 80	51,9	SI	
28	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 40	INV E-124	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	≤ 75	38,4	SI	
29	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Porcentaje que pasa el tamiz nro 200	INV E-125	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	≤ 25	13,5	SI	
30	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	≤ 30	0,0	SI	
31	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	≤ 10	0,0	SI	
32	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Contenido de materia organica	INV E-121	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	≤ ,2	0,0	SI	
33	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	N/A	2,058	SI	
34	miércoles, 06 de noviembre de 2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada	INV E-148	K00+000 AL K00+090 CALZADA	1	≥ 5	26,5	SI	
ARTICULO 320-22 SUB BASE GRANULAR (SBG-38)									
35	martes, 05 de noviembre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K00+090 VIA ACOPIO	1	N/A	SI	N/A	
36	martes, 05 de noviembre de 2024	Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A), máximo (%) - 500 revoluciones (%)	INV E-218-13	K00+090 VIA ACOPIO	1	≤ 50	18,2%	SI	
37	martes, 05 de noviembre de 2024	Degradacion por abrasion en el equipo de micro-deval máximo (%)	INV E-238-13	K00+090 VIA ACOPIO	1	≤ 35	14,56%	SI	
38	martes, 05 de noviembre de 2024	Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) **Sulfato de magnesio agregado grueso**.	INV E-220-13	K00+090 VIA ACOPIO	1	≤ 18	7,03	SI	
39	martes, 05 de noviembre de 2024	Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) **Sulfato de magnesio agregado fino**.	INV E-220-13	K00+090 VIA ACOPIO	1	≤ 18	7,47	SI	
40	martes, 05 de noviembre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K00+090 VIA ACOPIO	1	≤ 25	0,0	SI	
41	martes, 05 de noviembre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K00+090 VIA ACOPIO	1	≤ 6	0,0	SI	
42	martes, 05 de noviembre de 2024	Equivalente de arena, mínimo (%)	INV E-133	K00+090 VIA ACOPIO	1	≥ 25	26%	SI	
43	martes, 05 de noviembre de 2024	Terrones de arcillas y particulas deleznables	INV E-211	K00+090 VIA ACOPIO	1	≤ 2	0,0	SI	
44	martes, 05 de noviembre de 2024	CBR de laboratorio, mínimo (%)	INV E-148	K00+090 VIA ACOPIO	1	≥ 30	32,3	SI	
45	martes, 05 de noviembre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K00+090 VIA ACOPIO	1	N/A	2,247	SI	

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

El contratista no cuenta con Director de obra

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **01113-10647 CPITV**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

SABANAGRANDE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No.: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
ARTICULO 320-22 SUB BASE GRANULAR (SBG-50)									
1	martes, 05 de noviembre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K01+123 AL K01+163 COSTADO DERECHO	1	N/A	SI	N/A	
2	martes, 05 de noviembre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K01+123 AL K01+163 COSTADO DERECHO	1	≤ 25	0,0	SI	
3	martes, 05 de noviembre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K01+123 AL K01+163 COSTADO DERECHO	1	≤ 6	0,0	SI	
4	martes, 05 de noviembre de 2024	Equivalente de arena, mínimo (%)	INV E-133	K01+123 AL K01+163 COSTADO DERECHO	1	≥ 25	26%	SI	
5	martes, 05 de noviembre de 2024	Terrones de arcillas y particulas deleznables	INV E-211	K01+123 AL K01+163 COSTADO DERECHO	1	≤ 2	0,0	SI	
6	martes, 05 de noviembre de 2024	CBR de laboratorio, mínimo (%)	INV E-148	K01+123 AL K01+163 COSTADO DERECHO	1	≥ 30	39,1	SI	
7	martes, 05 de noviembre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K01+123 AL K01+163 COSTADO DERECHO	1	N/A	2,264	SI	
8	martes, 12 de noviembre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K01+023 AL K01+090 CALZADA DERECHA	1	N/A	SI	N/A	
9	martes, 12 de noviembre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K01+023 AL K01+090 CALZADA DERECHA	1	≤ 25	0,0	SI	
10	martes, 12 de noviembre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K01+023 AL K01+090 CALZADA DERECHA	1	≤ 6	0,0	SI	
11	martes, 12 de noviembre de 2024	Equivalente de arena, mínimo (%)	INV E-133	K01+023 AL K01+090 CALZADA DERECHA	1	≥ 25	27%	SI	
12	martes, 12 de noviembre de 2024	Terrones de arcillas y particulas deleznables	INV E-211	K01+023 AL K01+090 CALZADA DERECHA	1	≤ 2	0,0	SI	
13	martes, 12 de noviembre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K01+023 AL K01+090 CALZADA DERECHA	1	N/A	2,248	SI	
14	martes, 05 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+120 AL K01+150 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	95,9	SI	
15	miércoles, 06 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+080 AL K01+120 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	98,5	SI	
16	martes, 12 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+020 AL K01+080 COSTADO DERECHO.	3	≥ 95	96,8	SI	
ARTICULO 500-22 CONCRETO HIDRAULICO									
17	viernes, 1 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+041 AL K00+100 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	109,7	SI	MUESTRA No O31 28 DIAS
18	lunes, 4 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+143 AL K00+153 K00+000 AL K00+015 COSTADO IZQUIERDO.	2	≥ 100 (%)	110,9	SI	MUESTRA No O32 28 DIAS
19	miércoles, 6 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+575 AL K00+656 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	111,8	SI	MUESTRA No O33 28 DIAS
20	jueves, 7 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+656 AL K00+731 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	114,0	SI	MUESTRA No O34 28 DIAS
21	martes, 12 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+490 AL K00+511 K01+521 AL K01+553 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	115,1	SI	MUESTRA No O35 28 DIAS
22	viernes, 15 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+420 AL K01+480 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	111,0	SI	MUESTRA No O36 28 DIAS
23	sábado, 2 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+207 AL K01+291 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	79,2	SI	MUESTRA No O39 7 DIAS
24	miércoles, 6 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+163 AL K01+207 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	79,5	SI	MUESTRA No O40 7 DIAS
25	martes, 12 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+123 AL K01+163 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	79,0	SI	MUESTRA No O41 7 DIAS
26	miércoles, 13 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+090 AL K01+123 COSTADO DERECHO.	2	≥ 70 (%)	78,1	SI	MUESTRA No O42 7 DIAS

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: **ADALBERTO FLORES SALGADO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **08202-138800 ATL**

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **01113-10647 CPITV**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	2 DE 2
		FECHA	30/11/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No.: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
ARTICULO 320-22 SUB BASE GRANULAR (SBG-50)									
27	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K00+950 CARRIL DERECHO	1	N/A	SI	N/A	
28	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K00+950 CARRIL DERECHO	1	≤ 25	0,0	SI	
29	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K00+950 CARRIL DERECHO	1	≤ 6	0,0	SI	
30	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Equivalente de arena, mínimo (%)	INV E-133	K00+950 CARRIL DERECHO	1	≥ 25	26%	SI	
31	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A), máximo (%) - 500 revoluciones (%)	INV E-218-13	K00+950 CARRIL DERECHO	1	≤ 50	18,6%	SI	
32	miércoles, 20 de noviembre de 2024	CBR de laboratorio, mínimo (%)	INV E-148	K00+950 CARRIL DERECHO	1	≥ 30	36,3	SI	
33	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K00+950 CARRIL DERECHO	1	N/A	2,245	SI	
34	martes, 26 de noviembre de 2024	Granulometria	INV E-213/214	K00+950 CARRIL DERECHO	1	N/A	SI	N/A	
35	martes, 26 de noviembre de 2024	Límite líquido, máximo (%)	INV E-125	K00+950 CARRIL DERECHO	1	≤ 25	0,0	SI	
36	martes, 26 de noviembre de 2024	Índice de plasticidad, máximo (%)	INV E-125-126	K00+950 CARRIL DERECHO	1	≤ 6	0,0	SI	
37	martes, 26 de noviembre de 2024	Equivalente de arena, mínimo (%)	INV E-133	K00+950 CARRIL DERECHO	1	≥ 25	27%	SI	
38	martes, 26 de noviembre de 2024	Ensayo modificado de compactación	INV E-142	K00+950 CARRIL DERECHO	1	N/A	2,259	SI	
39	sábado, 16 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+950 AL K01+030 CARRIL DERECHO.	3	≥ 95	96,7	SI	
40	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+930 AL K00+970 CARRIL DERECHO.	3	≥ 95	98,2	SI	
41	sábado, 23 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K00+870 AL K00+930 CARRIL DERECHO.	3	≥ 95	97,9	SI	
42	martes, 26 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+470 AL K01+550 CARRIL IZQUIERDO.	3	≥ 95	97,3	SI	
43	jueves, 28 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+410 AL K01+470 CARRIL IZQUIERDO.	3	≥ 95	98,1	SI	
44	viernes, 29 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+350 AL K01+410 CARRIL IZQUIERDO.	3	≥ 95	98,0	SI	
45	sábado, 30 de noviembre de 2024	Densidad de campo metodo cono y arena (%)	INV E-161	K01+290 AL K01+350 CARRIL IZQUIERDO.	3	≥ 95	97,2	SI	
ARTICULO 500-22 CONCRETO HIDRAULICO									
46	sábado, 16 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+358 AL K01+420 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	112,7	SI	MUESTRA No O37 28 DIAS
47	jueves, 21 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+291 AL K01+358 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	114,1	SI	MUESTRA No O38 28 DIAS
48	sábado, 23 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+207 AL K01+291 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	111,6	SI	MUESTRA No O39 28 DIAS
49	miércoles, 27 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+163 AL K01+207 COSTADO DERECHO.	2	≥ 100 (%)	115,3	SI	MUESTRA No O40 28 DIAS
50	viernes, 15 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+011 AL K00+028 K00+034 AL K00+041 CARRIL IZQUIERDO.	2	≥ 70 (%)	81,2	SI	MUESTRA No O43 7 DIAS
51	martes, 19 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K01+023 AL K01+090 CARRIL DERECHO.	2	≥ 70 (%)	84,7	SI	MUESTRA No O44 7 DIAS
52	sábado, 23 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+962 AL K01+023 CARRIL DERECHO.	2	≥ 70 (%)	82,6	SI	MUESTRA No O45 7 DIAS
53	miércoles, 27 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+902 AL K00+962 CARRIL DERECHO.	2	≥ 70 (%)	84,5	SI	MUESTRA No O46 7 DIAS
54	sábado, 30 de noviembre de 2024	Resistencia a la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre.	INV-414	LOSAS VIGAS - TRAMO K00+872 AL K00+902 CARRIL DERECHO.	2	≥ 70 (%)	78,0	SI	MUESTRA No O47 7 DIAS

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: **ADALBERTO FLORES SALGADO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **08202-138800 ATL**

Firma
Nombre: **JOHN ANDRES ARIAS H.**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **01113-10647 CPITV**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

PONEDERA

FECHA: 30 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

FECHA DE INICIO: 01 marzo 2024

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14-dic-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 12.460.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 12.460.000.000,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS : $ 67.915.918,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 67.915.918,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10,00%	$ 1.246.000.000,00	7 de noviembre de 2023	31 de diciembre de 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50,00%	$ 6.230.000.000,00	7 de noviembre de 2023	31 de diciembre de 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 2.492.000.000,00	7 de noviembre de 2023	31 de diciembre de 2026
Calidad de Estudios y Diseños	0,00%	$ -	Sin incluir por Municipio	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%		No se incluyó	
			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **400052346**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **NACIONAL DE SEGUROS**

NIT 860.002.527-9

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 623.000.000,00	7 de noviembre de 2023	31 de diciembre de 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **400052345** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **NACIONAL DE SEGUROS**

NIT 860.002.527-9

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/11/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** Sin actualizar **MODIFICACIÓN No.:** Sin actualizar **SUSPENSIÓN No.:** Sin actualizar

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10,00%	$ 1.246.000.000,00	7 de noviembre de 2023	1 de febrero de 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 6.230.000.000,00	7 de noviembre de 2023	1 de agosto de 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 2.492.000.000,00	7 de noviembre de 2023	1 de agosto de 2027
Calidad de Estudios y Diseños	30,00%	$ -	No se incluyó	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%		No se incluyó	No se incluyó
			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **400052346**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **NACIONAL DE SEGUROS**
NIT 860.002.527-9

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del S No se han corregido y por ende no se han aprobado por el Municipio de Pondera.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** Sin actualizar **MODIFICACIÓN No.:** Sin actualizar **SUSPENSIÓN No.:** Sin actualizar

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 623.000.000,00	7 de noviembre de 2023	1 de agosto de 2024
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **400052345** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **2**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **NACIONAL DE SEGUROS**
NIT 860.002.527-9

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: No se han corregido y por ende no se han aprobado por el Municipio de Pondera.

OBSERVACIONES:

Las pólizas no han sido corregidas y actualizadas por el contratista acorde al acta de inicio, modificatorio 2, suspensión 1, modificatorio 3 y prorroga No. 1, situación que conllevo a la interventoría ha recomendar dos proceso sancionatorios al Municipio de Ponedera mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024. La interventoría informo del incumplimiento al Municipio nuevamente mediante comunicación C-T-135-379-2024 del 31/10/2024.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

No se firma hasta tanto contratista no actualice y corrija polizas

Firma

Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
160347	BOGOTA	11		15	400052345	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
11 / 4 / 2024	11 / 4 / 2024	00:00	1 / 8 / 2024	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5	TELÉFONO	3002025801
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	311.500.000,00	623,000,000.00	623.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	93.450.000,00	311,500,000.00	311.500.000,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	311.500.000,00	623,000,000.00	623.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	93.450.000,00	311,500,000.00	311.500.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	93.450.000,00	311,500,000.00	311.500.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 12/04/2024	901770166

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 623.000.000,00	SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
BROKER DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTORES DE SEGUR	40165	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
YVALBUENA

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052345	2	BOGOTA	Día - Mes - Año 11 4 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
11 4 2024	00:00	1 8 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5	TELÉFONO	3002025801
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS CUALES SON:

MUNICIPIO DE PONEDERA NIT 890.116.278-9 Y O INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01 MARZO DE 2024, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADQUIRIDA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA - SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA,DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONSORCIO LA GIRALDA ESTA CONFORMADO POR:
RK CONSTRUCTION GROUP SAS NIT 901514977-5 50%
BUNKER CONSTRUCCIONES SAS NIT 901460958-1 40%
LT BUILDINGS SAS NIT 900371384-9 10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400052345

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
12/04/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 11 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
161288	BOGOTA		11		30	400052346	3
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
29 / 4 / 2024	16 / 4 / 2024	00:00	2 / 8 / 2027	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO	3770600

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA Y SE ACTUALIZAN LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIN DEL ANTICIPO LOS CUALES VAN HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO:

- ASEGURADO-BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE PONEDERA NIR. 890.116.278-9 EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2
- LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA ES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 07 11 2023

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/04/2024	01/02/2025	1.246.000.000.00	2.512.482,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/04/2024	01/08/2027	2.492.000.000.00	0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/04/2024	01/02/2025	6.230.000.000.00	12.562.411,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 15.074.893,00	$ 0,00	$ 2.864.229,67	$ 17.939.122,67	Día - Mes - Año 30/04/2024	901770166

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 9.968.000.000,00	NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
BROKER DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTORES DE S	40165	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
YVALBUENA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400052346	3	BOGOTA	29 /4 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 16 /4 /2024	00:00 Horas del 2 /8 /2027	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO LA GIRALDA.	NIT	901.770.166 - 5
DIRECCIÓN	CALLE 46 – 4 104, MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	3002025801
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600

- LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE INICIO DE FECHA 01 03 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS CUALES SON:

MUNICIPIO DE PONEDERA NIT 890.116.278-9 Y O INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01 MARZO DE 2024, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA
GIRALDA - SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA,DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONSORCIO LA GIRALDA ESTA CONFORMADO POR:
RK CONSTRUCTION GROUP SAS NIT 901514977-5 50%
BUNKER CONSTRUCCIONES SAS NIT 901460958-1 40%
LT BUILDINGS SAS NIT 900371384-9 10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	17.939.123,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
30/04/2024	$ 17.939.122,67

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 29 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400052346, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO LA GIRALDA.
NIT : 901.770.166 - 5
Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 29 días del mes de Abril de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

SABANAGRANDE

FECHA: 30 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

FECHA DE INICIO: 04 marzo 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4-dic-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 6.542.182.495,26

VALOR ACUMULADO: $ 6.542.182.495,26 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS : $ 37.649.815,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.649.815,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10,00%	$ 654.218.249,53	17 de octubre de 2023	1 de mayo de 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30,00%	$ 1.962.654.748,58	17 de octubre de 2023	1 de mayo de 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 1.308.436.499,05	17 de octubre de 2023	31 de diciembre de 2026
Calidad de Estudios y Diseños	30,00%	$ 11.294.944,50	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 1.962.654.748,58	5 años y 0 dias despues de terminación.	5 años y 1 dias despues de terminación.
			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **5-44-101124914**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
NIT 860.009.578-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMV	$ 464.000.000,00	17 de octubre de 2023	31 de diciembre de 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **85-40-101057279** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
NIT 860.009.578-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10,00%	$ 654.218.249,53	4 de marzo de 2024	4 de abril de 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 1.962.654.748,58	4 de marzo de 2024	4 de abril de 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 1.308.436.499,05	4 de marzo de 2024	4 de diciembre de 2027
Calidad de Estudios y Diseños	30,00%	$ 11.294.944,50	18 de mayo de 2024	19 de mayo de 2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 1.962.654.748,58	5 años y 1 dias despues de terminación.	5 años y 1 dias despues de terminación.
			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **5-44-101124914**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT 860.009.578-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Sin aprobación por Municipio

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMV	$ 464.000.000,00	4 de marzo de 2024	4 de diciembre de 2024
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **85-40-101057279** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **Anexo 5**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT 860.009.578-6

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Sin aprobación del Municipio

OBSERVACIONES:

Las polizas se encuentra actualizadas según prorroga No. 1.
La interventoría ha solicitado al Municipio de Sabanagrande la aprobación de las polizas vigentes del contrato, sin embargo del Municipio no ha otorgado respuesta. La interventoría realizó solicitud mediante comunicación C-T-135-265-2024 del 27/08/2024.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula No.: 01113-10647 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057279	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	05	2024	04	03	2024	00:00	04	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT: 900.614.442-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 78 NRO. 42 - 54	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT: 900.614.442-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 78 NRO. 42 - 54	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3603110

BENEFICIARIO: 900614442 - CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS REFERENTE AL MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE - POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO DE OBRA SG-LP-OP-004-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COMUNICADO DE SOLICITUD DE CESION DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, ACTA DE CESION Y RESOLUCION No. 777 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023.

.
-CEDENTE: CONSORCIO SABANAGRANDE 2023, NIT: 901758762-6.
INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA P-F LTDA, 900210235-1, PART 50%.
CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ATLANTICO SAS, 901355791-1, PART 50%.
-CESIONARIO: CRIVEN CONSTRUTORES SAS, NIT 900614442-2.
.
TOMADOR: CRIVEN CONSTRUTORES SAS
ASEGURADO: CRIVEN CONSTRUTORES SAS Y MUNICIPIO DE SABANAGRANDE-ATLANTICO CON NIT 890115982-1.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA MODIFICANDO PLAZO DEL CONTRATO HASTA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN OTROSI MODIFICATORO 003 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024.
.
DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****930,542.00	$ *******3,000.00	$ *****177,373.00	$ *********1,110,915.00	$ ******464,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101057279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057279	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	05	2024	04	03	2024	00:00	04	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

BENEFICIARIO: 900614442 - CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/03/2024	04/12/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101057279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DAVIDRAMBAO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057279	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	05	2024	04	03	2024	00:00	04	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

BENEFICIARIO: 900614442 - CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

OBJETO DE LA POLIZA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE SABANAGRANDE-ATLANTICO CON NIT 890115982-1.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101057279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIDRAMBAO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101057279**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**05**	**2024**	**04**	**03**	**2024**	**00:00**	**04**	**12**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

BENEFICIARIO: ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****930,542.00	$ *******3,000.00	$ *****177,373.00	$ *********1,110,915.00	$ ******464,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609506358(3900)000001110915(96)20250304

REFERENCIA PAGO:

1101360950635-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057279	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	05	2024	04	03	2024	00:00	04	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.		**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 78 NRO. 42 - 54		BARRANQUILLA, ATLANTICO		3603110

BENEFICIARIO: 900614442 - CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101057279

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DAVIDRAMBAO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101124914**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**05**	**2024**	**04**	**03**	**2024**	**00:00**	**04**	**12**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.	**NIT: 900.614.442-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 78 NRO. 42 - 54	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3603110

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	**NIT: 890.115.982-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 7 NO. 5-10	SABANAGRANDE, ATLANTICO	8791216

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, REFERENTE AL MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE - POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO DE OBRA SG-LP-OP-004-2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, COMUNICADO DE SOLICITUD DE CESION DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, ACTA DE CESION Y RESOLUCION No. 777 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023.

.

-CEDENTE: CONSORCIO SABANAGRANDE 2023, NIT: 901758762-6.
INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA P-F LTDA, 900210235-1, PART 50%.
CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ATLANTICO SAS, 901355791-1, PART 50%.
-CESIONARIO: CRIVEN CONSTRUCTORES SAS, NIT 900614442-2.

.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SABANAGRANDE IDENTIFICADO CON NIT. 890115982-1 / e INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2024	04/04/2025	$654,218,249.53	$654,218,249.53
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/03/2024	04/12/2027	$1,308,436,499.05	$1,308,436,499.05
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/03/2024	04/04/2025	$1,962,654,748.58	$1,962,654,748.58
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$1,962,654,748.58	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/05/2024	19/05/2029	$11,294,944.50	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA MODIFICANDO PLAZO DEL CONTRATO HASTA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN OTROSI MODIFICATORO 003 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024.

.

DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,725,638.00	$ *******8,000.00	$ *****709,391.00	$ *********4,443,029.00	$ ****5,899,259,190.24	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101124914

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL .

4.8.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	1 de 2	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN		1
		PÁGINA		

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4 **MES:** sep-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. P.A. 31117922 **DE** 2023 ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. **BANCO** SUCURSAL: Oficina Carrera 38 (Barranquilla)
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

ANTICIPO EJECUTADO: 11 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.962.654.748,58** **(M/CTE)**

VALOR DE DEVOLUCIÓN ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.242.909.478,08** **(M/CTE)**

VALOR DEL ANTICIPO EJECUTADO: **$ 719.745.270,50** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805-2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA DE VENTA	FEV281	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 10.329.165,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV282	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 11.207.883,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV283	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.460.844,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV284	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.282.082,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV286	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 29.462.268,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV287	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 27.078.975,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV288	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.240.725,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV289	19-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 1.413.720,00	2	Transporte de materiales
FACTURA DE VENTA	FEV298	30-jul-24	AOD LOGISTICA SAS	$ 15.864.963,00	2	Transporte de materiales*
FACTURA DE VENTA	FE71824	15-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 21.896.000,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE71825	15-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 21.622.300,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE71826	15-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 30.107.000,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE71928	17-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 21.622.300,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE71975	18-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 21.622.300,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72171	23-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 27.917.400,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72277	25-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 32.570.300,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72451	29-jul-24	CONCREMOVIL SAS	$ 32.844.000,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72686	2-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 36.675.800,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72750	3-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 20.253.800,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE72852	6-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 16.969.400,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73007	9-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 38.591.700,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73061	12-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 29.942.780,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73360	20-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 43.244.600,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73458	21-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 38.318.000,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73501	22-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 14.779.800,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73554	23-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 26.001.500,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73626	25-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 19.980.100,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE73854	29-ago-24	CONCREMOVIL SAS	$ 18.337.900,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE74034	2-sep-24	CONCREMOVIL SAS	$ 26.275.200,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FE74034	2-sep-24	CONCREMOVIL SAS	$ 20.429.920,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL7322	12-jul-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 4.602.094,14	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL7381	16-jul-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 8.557.290,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL8419	21-ago-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 2.784.596,43	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL8564	27-ago-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 3.748.500,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL8577	27-ago-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 3.748.500,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL8632	29-ago-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 25.962.111,00	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	GL9123	16-sep-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 3.748.500,00	1	Compra de materiales
PROFORMA FACTURA	GL7737	29-jul-24	STECKERL ACEROS SAS	$ 6.243,93	1	Compra de materiales
FACTURA DE VENTA	FECA 7	26-sep-24	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ATLANTICO SAS	$ 7.244.710,00	2	Transporte de materiales
			TOTAL	**$ 719.745.270,50**		

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO (Ver Nota Observaciones) (B)	NUEVO SALDO DEL VALOR DEL ANTICIPO (C)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (D)	VALOR PRESENTE MES (E)	VALOR ACUMULADO ACTUAL F=(D+E)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (C-F)
1	compra de materiales	$ 1.457.654.748,58	$ 844.494.813,08	$ 613.159.935,50	$ 613.159.935,50	$ -	$ 613.159.935,50	$ -
2	transporte de materiales	$ 310.000.000,00	$ 203.414.665,00	$ 106.585.335,00	$ 106.585.335,00	$ -	$ 106.585.335,00	$ -
3	Mano de Obra	$ 195.000.000,00	$ 195.000.000,00	$ -		$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 1.962.654.748,58**	**$ 1.242.909.478,08**	**$ 719.745.270,50**	**$ 719.745.270,50**	**$ -**	**$ 719.745.270,50**	**$ -**

37%

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (AGOSTO-2024) : $ 117.898,67
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 737.066,47
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
115440375	$ 311.961,24	N/A	MAYO Y ABRIL 2024	26/06/2024	$ 311.961,24
118370531	$ 307.206,56	N/A	JUNIO Y JULIO 2024	22/08/2024	$ 619.167,80
118717111	$ 117.898,67	N/A	AGOSTO 2024,	11/09/2024	$ 737.066,47
TOTAL	**$ 737.066,47**				**$ 737.066,47**

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

1. El Contratista de obra CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S, presentó al Municipio de Sabanagrande, el día 23 de julio de 2024 una solicitud de RENUNCIA DEL PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO, manifestando que, a la fecha de su oficio, han recibido aproximadamente el 11% del valor pactado en el contrato como anticipo y manifestando la renuncia al pago del SALDO DEL ANTICIPO pactado en el contrato de la referencia y que se proceda a la devolución del saldo del ANTICIPO, no pagado y que se encuentra en la FIDUCIA, a la cuenta del convenio de la referencia.
2. En mesa de trabajo PRESENCIAL, en la que participo El alcalde de Sabanagrande, secretario de Obras Públicas, un Representante de la Interventoría y Representante del Contratista, realizada el pasado 23 de julio de 2024 se le puso de presente a la interventoría la solicitud de renuncia del anticipo presentada por el contratista.
3. La interventoría mediante comunicación C-T-135-215-2024 de fecha de 30 de julio de 2024 realiza las respectivas aclaraciones ante las pretensiones de renuncia del anticipo manifestadas por el contratista en comunicación del 23 de julio de 2024 indicando que no comparte los postulados del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S y considera que el contratista se encuentra en plena facultad de renunciar al anticipo de obra, así mismo informa al municipio que se puede proceder con solicitud de cancelación del PATRIMONIO AUTÓNOMO a la entidad fiduciaria y realizar la devolución de los recursos a título de anticipo a la cuenta del convenio 2221-2023.
4. Que, como consecuencia de lo anterior el valor del anticipo desembolsado se limita al valor acumulado hasta orden de pago No, 7, obteniéndose el siguiente balance:
VALOR INICIAL CONSIGNADO EN LA FIDUCIA **$ 1.962.654.748,58**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA BAJO CONCEPTO DE ANTICIPO: **$ 719.745.270,50**
SALDO POR RETORNAR A LA CUENTA DEL CONVENIO **$1.242.909.478,08**
VALOR BASE DE SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO: **$ 719.745.270,50**

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO
Representante Legal o Delegado
Contratista
CC No.: 22.431.194

Firma:
Nombre: OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
CC No. 79.296.441

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Bogotá D.C, jueves, 27 de junio de 2024

Operaciones celebradas por parte del negocio Fiduciario 31117922 Fideicomiso Criven Constructores P.A

Fecha de Pago	No. Fideicomiso	Nombre Fideicomiso	N. Orden de Pago	Identificación Tercero	Nombre Tercero Pago	Valor Neto	Tipo Cuenta Destino	Nro Cuenta Destino	Entidad Financiera Destino	Estado Reporte
26/6/2024	117922	31117922 FIDEICOMISO CRIVEN CONSTRUCTORES P. A	1	NIT - 899999090	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	$311.961	CTA CTE	50000249	2 - BANCO POPULAR S A	PROCESADO

Bogotá D.C, viernes, 23 de agosto de 2024

Operaciones celebradas por parte del negocio Fiduciario 31117922 Fideicomiso Criven Constructores P.A

Fecha de Pago	No. Fideicomiso	Nombre Fideicomiso	N. Orden de Pago	Identificación Tercero	Nombre Tercero Pago	Valor Neto	Tipo Cuenta Destino	Nro Cuenta Destino	Entidad Financiera Destino	Estado Reporte
22/8/2024	117922	31117922 FIDEICOMISO CRIVEN CONSTRUCTORES P. A	22082024	NIT - 899999090	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	$307.207	CTA CTE	61011094	0 - BANCO DE LA REPUBLICA	PROCESADO

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
NIT 800182281
REPORTE DE PAGOS

Fecha Causación	Fecha de Pago	No. Fideicomiso	Nombre Fideicomiso	Tipo Doc Tercero Causaci	Doc Tercero Causación	Nombre Tercero Causación	Tipo Doc Tercero Pago	Num Doc Tercero Pago	Nombre Tercero Pago	Tipo Cuenta Origen	Nro Cuenta Origen	Entidad Financiera Origen	Cuenta Financiera Cartera Origen	Tipo Cuenta Destino	Nro Cuenta Destino	Entidad Financiera Destino	Cuenta Financiera Cartera Destino	Transaccion	Forma Recaudo / Pago	N. Orden de Pago	Valor Bruto	Incrementos	Deducciones	Valor Neto	GMF	Observacion	Nro Hoja de Trabajo	N. Orden de Giro	N. CDP	N. RP	Estado	Anticipo
10/09/2024	11/09/2024	117922	31117922 FIDEICOMISO CRIVEN CONSTRUCTORES P.A	NIT	899999090	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	NIT	899999090	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	CTA AH	482800034662	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		CTA CTE	61011094	0 - BANCO DE LA REPUBLICA		PAGO TERCEROS - (APLICADO)	SEBRA	11092024	117,898.67	0.00	0.00	117,898.67	471.59	No.Orden Pago:11092024 Pago Rendimientos Financieros mes de Agosto 2024 Contrato: SG-LP-OP-004-2023. Se procede a girar los rendimientos de la siguiente manera. Banco: Banco de la República Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094 Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Código Portafolio: 270 Código de Transacción SEBRA: 137 Forma pago: SEBRA Novedad: 2007 - (21) NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:11871711 Retirado Hoja:3404762	3404763				APLICADO	N
11/09/2024	11/09/2024	117922	31117922 FIDEICOMISO CRIVEN CONSTRUCTORES P.A	NIT	890115982	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	NIT	890115982	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	CTA AH	482800034662	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		CTA CTE	024169996022	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		PAGO TERCEROS - (PROCESADO)	ACH	11092024	1,242,909,478.08	0.00	0.00	1,242,909,478.08	4,971,637.91	No.Orden Pago:11092024 DEVOLUCION SALDO A ENTIDAD CONTRATANTE, POR SOLICITUD DEL CLIENTE. Forma pago: ACH Novedad: 2010 - (21) NIIF TRASLADOS AL FIDEICO No.Referencia: 11887149 0000 - Proceso Exitoso	3406015				PROCESADO	N

4.8.2 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO

FORMATO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01-03-24 a 31-10-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** 01-03-24 a 31-10-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 399.543.638,00

1 de 1

CONVENIO: 2220 DE 2023 **OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP - 001 - 2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRAT 1/03/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/07/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 12.460.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+**: $ 12.460.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 8 MESES 14 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/12/2024 (Incluídas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/08/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Etapa Estudios y Diseños mar-24	2 Etapa Estudios y Diseños abr-24	3 Etapa de construcción may-24	4 Etapa de construcción jun-24	5 Etapa de construcción 01-jul-24 a 29-jul-24	29-jul-2024 a 27-ago-24	5 Etapa de construcción 28-ago-24 a 31-ago-24	6 Etapa de construcción sep-24	7 Etapa de construcción oct-24	8 Etapa de construcción nov-24	9 Etapa de construcción 14-dic-24
Explanaciones (E),	$240.447.900	1,97%	0,6%	% P		5,10%	6,73%	0,27%	0,35%		0,00%	0,42%	1,25%	0,42%	0,00%
	$329.558.294,00	2,70%	$71.349.408	$ P		$621.829.500	$820.454.300	$32.955.829	$42.842.578		$0	$50.751.977	$152.255.932	$50.751.994	$0
				$ E									$71.349.408	$0	$0
				% E									0,59%	0,00%	0,00%
Sub-bases (SB),	$ 5.170.938.916,00	42,40%	2,3%	% P		7,22%	0,11%	2,46%	3,20%		0,44%	10,26%	9,86%	8,51%	10,26%
	$5.487.340.589,00	44,99%	$276.699.974	$ P		$880.000.000	$13.374.237	$300.002.237	$390.002.408		$54.254.229	$1.251.052.755	$1.203.076.366	$1.037.368.034	$1.251.584.060
				$ E									$276.699.974	$0	$0
				% E									2,27%	0,00%	0,00%
Bases (B),	$ 0,00	0,00%	0,0%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	$0	$ P		$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
				$ E									$0	$0	$0
				% E									0,00%	0,00%	0,00%
Pavimentos (P),	$ 6.756.282.072,20	55,40%	0,4%	% P		0,00%	16,12%	4,82%	6,26%		2,58%	6,90%	19,14%	6,90%	1,56%
	$5.874.217.353,75	48,16%	$51.494.256	$ P			$1.966.108.800	$587.421.735	$763.648.256		$315.110.090	$841.607.454	$2.334.329.874	$841.607.454	$190.492.490
				$ E									$51.494.256	$0	$0
				% E									0,42%	0,00%	0,00%
Estructuras y Obras de Drenajes (OA),	$ 28.374.237,10	0,23%	0,0%	% P		0,12%	0,00%	0,23%	0,24%		0,00%	0,44%	0,69%	0,31%	0,00%
	$227.858.002,30	1,87%	$0	$ P		$15.000.000	$0	$27.706.887	$29.621.540		$0	$53.449.087	$83.876.082	$38.125.492	$0
				$ E									$0	$0	$0
				% E									0,00%	0,00%	0,00%
Señalización y Control de Tránsito (SCT),	$0	0,00%	0,0%	% P				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	$0	$ P				$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
				$ E									$0	$0	$0
				% E									0,00%	0,00%	0,00%
Obras Varias y de Mitigación Ambiental (OV)	$ 0,00	0,00%	0,0%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	$0	$ P		$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
				$ E									$0	$0	$0
				% E									0,00%	0,00%	0,00%
Transportes (T) (solo los indicados en esta gran partida de pago, los demás transportes se agrupan en las actividades correspondientes)	$0	0,00%	0,0%	% P				0,23%	0,30%		0,00%	0,35%	1,05%	0,35%	0,00%
	$277.068.886,25	2,27%	$0	$ P				$27.706.887	$36.018.553		$0	$42.668.606	$128.005.818	$42.668.606	$0
				$ E									$0	$0	$0
				% E		0,00%							0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS		0,00%	0,0%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	$0	$ P		$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
				$ E											
				% E	29/07/2024	20/04/2024		9/08/2024	29/07/2024			3/09/2024	6/11/2024		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 12.196.043.125,30**	**100%**	**3,28%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 12.196.043.125,30**	**100%**	**$ 399.543.638,00**												

SUSPENSIÓN No1

Prorroga No1
Suspensión No1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	12,44%	22,96%	7,96%	10,35%		3,03%	18,36%	31,99%	16,49%	11,82%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 1.516.829.500,00	$ 2.799.937.337,10	$ 970.872.489,30	$ 1.262.134.236,10		$ 369.364.318,60	$ 2.239.529.879,66	$ 3.901.544.072,01	$ 2.010.521.579,55	$ 1.442.076.550,08
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	12,44%	35,39%	7,96%	18,31%		21,34%	39,70%	71,69%	88,18%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 1.516.829.500,00	$ 4.316.766.837,10	$ 970.872.489,30	$ 2.233.006.725,40		$ 2.602.371.044,00	$ 4.841.900.923,66	$ 8.743.444.995,67	$ 10.753.966.575,22	$ 12.196.043.125,30
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	2,69%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 328.194.230	$ 0	$ 0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	2,69%	2,69%	2,69%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 328.194.230,00	$ 328.194.230,00	$ 328.194.230,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 67.915.918,00 / $ -	$ -	%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 33.807.959,00 / $ -	$ -	%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 48.543.625,00 / $ -	$ -	%
BOLSA DE AJUSTE (ITEM's DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 113.689.372,70 / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 263.956.874,70	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 12.460.000.000,00**	**$ 399.543.638,00**	**3,21%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 12.460.000.000,00**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
PRORROGA 1		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: EDGAR TORRES 17
Nombre: **EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA**
Representante legal del Contratista
No. Identificación: 8.717.014

Aprueba Firma:
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202-272574 CND**

Revisó Firma:
Nombre: **LUCY MARY MANOTAS PACHECO**
Supervisor del Contrato
Municipio de el PONEDERA (Atlantico)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 **DE** 11-10-24 a 30-11-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1,171,184,304.00

3 de 34

CONVENIO: 2220 DE 2023 **OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO **SEGUIMIENTO No.** 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP - 001 - 2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/03/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 6,542,182,495.26 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 6,542,182,495.26

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA
Explanaciones (E),		0.00%	1.5%
	$105,197,094.00	1.69%	$90,346,495
Sub-bases (SB),	$ 185,401,684.49	2.98%	10.1%
	$1,192,520,339.41	19.19%	$627,076,337
Bases (B),	$ 28,175,617.44	0.45%	0.0%
	$0	0.00%	$0
Pavimentos (P),	$ 5,013,932,660.77	80.66%	54.3%
	$4,759,115,120.81	76.56%	$3,374,740,520
Estructuras y Obras de Drenajes (OA),		0.00%	0.0%
	$83,372,322.68	1.34%	$0
Señalización y Control de Tránsito (SCT),		0.00%	0.0%
	$39,653,364	0.64%	$0
Obras Varias y de Mitigación Ambiental (OV)	$ 988,316,066.66	15.90%	0.0%
	$0	0.00%	$0
Transportes (T) (solo los indicados en esta gran partida de pago, los demás transportes se agrupan en las actividades correspondientes)		0.00%	0.5%
	$35,967,788.97	0.58%	$28,444,910
TOTAL OTROS ITEMS			0.0%
			$0
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 6,215,826,029.36**	**100%**	**66.29%**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 6,215,826,029.36**	**100%**	**$ 4,120,608,262.00**

% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Etapa Estudios y Diseños	2 Etapa de construcción	3 Etapa de construcción	4 Etapa de construcción	5 Etapa de construcción	6 Etapa de construcción	7 Etapa de construcción	8 Etapa de construcción	9 Etapa de construcción	10 Etapa de construcción
	4/mar/2024	abr-24	may-24	4-jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	14/dic/2024
Explanaciones (E),	% P				0.10%	0.31%	0.31%	1.23%	0.14%	0.10%
	$ P				$6,361,789	$19,085,366	$19,085,366	$76,341,466	$8,910,359	$6,040,240
	$ E				$26,113,500	$29,439,900	$9,752,660	$12,520,218	$12,520,218	$0
	% E				0.42%	0.47%	0.16%	0.20%	0.20%	0.00%
Sub-bases (SB),	% P				1.11%	3.32%	3.32%	17.30%	0.89%	6.06%
	$ P		$185,401,684	$0	$250,194,082	$68,746,059	$206,238,357	$206,238,178	$1,075,346,973	$55,491,763	$376,957,715
	$ E					$221,389,014	$63,296,075	$62,139,214	$90,126,017	$90,126,017	$0
	% E					3.56%	1.02%	1.00%	1.45%	1.45%	0.00%
Bases (B),	% P				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$ P		$12,793,091	$15,382,526		$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$ E						$0	$0	$0	$0	$0
	% E					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pavimentos (P),	% P					3.27%	9.80%	9.80%	41.86%	0.82%	11.21%
	$ P		$121,452,032	$4,892,480,629	$165,192,706	$203,007,409	$609,022,226	$609,022,226	$2,601,881,008	$1,045,204,356	$696,802,904
	$ E					$899,920,559	$719,339,040	$480,964,653	$480,964,653	$480,964,653	$0
	% E					14.48%	12.77%	11.57%	7.74%	7.74%	0.00%
Estructuras y Obras de Drenajes (OA),	% P				0.00%	0.16%	0.47%	0.47%	1.87%	0.80%	0.54%
	$ P					$9,709,822	$29,129,465	$29,129,465	$116,517,861	$50,023,394	$33,348,930
	$ E						$0	$0	$0	$0	$0
	% E					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Señalización y Control de Tránsito (SCT),	% P									0.06%	0.57%
	$ P									$3,965,336	$35,688,028
	$ E									$0	$0
	% E									0.00%	0.00%
Obras Varias y de Mitigación Ambiental (OV)	% P		0.00%	14.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$ P		$0	$889,484,460	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$ E					$0	$0	$0	$0	$0	
	% E					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Transportes (T) (solo los indicados en esta gran partida de pago, los demás transportes se agrupan en las actividades correspondientes)	% P				0.00%	0.03%	0.10%	0.42%	0.07%	0.05%
	$ P				$0	$2,156,905	$6,470,714	$6,470,714	$25,882,857	$4,513,704	$3,009,136
	$ E					$8,835,580	$2,897,560	$2,749,240	$1,981,265	$1,981,265	$0
	% E					0.14%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.00%
TOTAL OTROS ITEMS	% P										
	$ P										
	$ E										
	% E										

Prorroga 1 | BALANCE | Prorroga 2 | Balance 2

66.29% $289,981,983

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	5.14%	93.27%	6.70%	4.67%	14.00%	14.00%	62.68%	18.79%	18.53%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0.00	$ 319,646,807.36	$ 5,797,347,615.00	$ 416,186,188.64	$ 289,981,983.08	$ 869,946,128.43	$ 869,945,949.23	$ 3,895,970,164.75	$ 1,168,108,913.20	$ 1,151,746,951.40
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	5.14%	98.41%	6.70%	11.36%	25.36%	39.35%	62.68%	81.47%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 319,646,807.36	$ 6,116,994,422.36	$ 416,186,188.64	$ 706,168,171.72	$ 1,576,114,300.15	$ 2,446,060,249.37	$ 3,895,970,164.75	$ 5,064,079,077.96	$ 6,215,826,029.36
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.60%	16.07%	12.77%	9.42%	9.42%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,156,258,653	$ 999,185,151	$ 793,980,154	$ 571,090,670	$ 571,090,670	$ 0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.60%	34.68%	47.45%	56.87%	66.29%	66.29%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,156,258,653.00	$ 2,155,443,804.00	$ 2,949,423,958.00	$ 3,520,514,627.50	$ 4,091,605,297.00	$ 4,091,605,297.00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 37,649,815.00 / $ -	$ -	%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 14,387,139.20 / $ -	$ -	%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 26,321,802.00 / $ -	$ -	%
BOLSA DE AJUSTE (ITEM´s DE OBRA, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 247,997,709.70 / $ -	$ 93,096,273.00	37.5%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 326,356,465.90	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 6,542,182,495.26**	**$ 4,213,704,535.00**	**64.4%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
INICIAL		
PRORROGA 1		
PRORROGA 2		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO**
Representante legal del Contratista
No. Identificación: 22,431,194

Aprueba Firma:
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202-27254 CND**

Revisó Firma:
Nombre: **BRUNO DE LA CRUZ CELY**
Supervisor del Contrato
Municipio de el SABANAGRANDE (Atlantico)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.8.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FORMATO MEPI-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 32
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

* Se realiza el seguimiento compromisos con el desarrollo de los temas.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1 Seguimiento Estudios y diseños.
2 Alcance y metas físicas.
3 Balance de obra.
4 Avance Físico de obra.
5 Avance financiero de obra.
6 Plan de manejo de trafico.
7 Seguimiento a incumplimientos del contratista

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de seguimiento LP-001-2023 para el cual se hace el seguimiento al avance de la obra y a los compromisos.

1 Seguimiento Estudios y diseños.

Interventoría realiza la exposición del estado de avance de los estudios y diseños. los cuales se encuentran en el siguiente estado

Estudio de Geología y Geotecnia:Aprobado
Estudio de transito: Aprobado
Diseño de Pavimento:Aprobado
Diseño Geométrico: Con observaciones
Estudio Hidráulico para Obras de Drenaje: Con observaciones
Diseño de Estructuras:Según cartilla.
Diseño de concreto:Se trabajará con concretera
Documento PAGA:Con observaciones de INVIAS
Cantidades y Presupuesto:Entregado

2 Alcance y metas físicas.

Interventoría informa, que de acuerdo con los estudios y diseños, se actualizaron las metas físicas del contrato. Teniendo en cuenta que el ancho de la vía inicial contemplada en el presupuesto del convenio contemplaba la sección típica de 5.6m y actualmente se mejora las condiciones en marco de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, de 6.3m

METAS FÍSICAS	INICIALES - CONVENIO	ACTUALIZADAS - ESTUDIOS Y DISEÑOS
Actividad	Alcance	Alcance
Mejoramiento (Pavimento Rígido)	3,98 Km	2,70 Km
Mantenimiento (Conformación de calzada y afirmado)	5,70 Km	5,70 Km
Box culvert	1 Un	1 Un

3 Balance de obra.

Interventoría informa, que de acuerdo con los estudios diseño, se actualizaron las metas físicas del contrato. Teniendo en cuenta que el ancho de la vía inicial contemplada en el presupuesto del convenio contemplaba la sección típica de 5.6m y actualmente se mejora las condiciones en marco de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, de 6.3m


4 Avance Físico de obra.

Interventoría precisa que el contratista se encuentra en el proceso de explanación de la calzada con un avance de entre el k0+090 al k0+510 y El mejoramiento de subrasante entre k0+090 al k0+460 Primera capa y del k0+090 al k0+400 segunda capa.

* Interventoría solicita incrementar las actividades constructivas, ya que se evidencia poco avance dadas las condiciones actuales del contrato de obra.

5 Avance financiero de obra.

Interventoría informa que el contratista tiene un programado del 71.7% versus un ejecutado del 1.6%, lo cual representa un atraso de 70.1%. Estando muy por debajo de las inversiones programadas.



* Interventoría informa que Las obras de mejoramiento se iniciaron solo hasta el 07 de octubre de 2024, siendo un inicio tardío de las actividades programadas y desde esta fecha no se han implementado los frentes de obra necesarios para compensar los atrasos en programación, lo cual representa que a la fecha el plazo por ejecutar sea de 1 mes y 14 días y se presente un atraso de obra del 70.1%, generado principalmente por el no inicio oportuno de las obras, bajos rendimientos de obra y la no implementación de frentes adicionales de obra. Por lo que se solicita al contratista la implementación inmediata de frentes adicionales de obra con su respectivo equipo, maquinaria, personal y materiales.

7 Seguimiento a incumplimientos del contratista

Interventoría informa que el contratista continua con el incumplimiento de los compromisos pactados, por lo cual resalta que se debe dar cumplimiento a los mismos. Además resalta que a la fecha se ha informado al Municipio al respecto de dichos incumplimientos.
A continuación se presenta cada uno de los compromisos pendientes por cumplir por parte del contratista y se solicita dar respuesta e informar las nuevas fechas de reprogramación de cada uno de los compromisos.

COMPROMISOS	COMENTARIOS INTERVENTORÍA	COMENTARIOS CONTRATISTA
Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.	* No cumplido	* Contratista informa que se remitió respuesta a la aseguradora, aclarando el cumplimiento de compromisos por parte del contratista, y se espera que hoy se de respuesta por parte de la aseguradora. * Contratista informa que el día 5-11-24
Incremento de la Maquinaria en obra.	* No cumplido * *Nuevamente la interventoría solicita el incremento de la maquinaria en el frente de obra.	* No contesta el contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km2).	* No cumplido * Se encuentra pendiente la nivelación del tramo.	* Contratista informa que 1-11-24, adelantan la actividad.
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4).	* No cumplido	* Contratista informa que 1-11-24 entrega el alineamiento.
Materiales para explanaciones en obra.	* No cumplido	* Contratista informa que hoy se de ingreso de material
Hoja de vida director de obra	* No cumplido * Interventoría informa que se Enviada la HV. Pero no cumple. Interventoría dio Respuesta mediante comunicación C-T-135-372-2024 del 25/10/2024.	* Contratista informa que 1-11-24 entrega el documento con los soportes
Estudio Hidráulico	* No cumplido	* Contratista informa que el 1-11-24 entrega la versión final.
Plan de contingencia	* No cumplido	* Contratista informa que el 5-11-24 entrega los solicitado
Gestión Social		

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

Informes de gestión social	* pendiente octubre 2024 * Interventoría solicita precisar los datos de personal, además solicita celeridad en el cumplimiento de los compromisos de la Gestión Social. * Interventoría solicita entrega de un plan de contingencia del área social.	* Contratista informa que el 6-11-24
Firmas de Actas de Vecindad	* No cumplido * Interventoría solicita la entrega inmediata de las actas de vecindad con el registro fotográfico y debidamente firmadas.	* Contratista informa que 2-11-24 entrega los documentos
Actas de compromiso	* Interventoría solicita la respectiva entrega de los documentos * Interventoría solicita la entrega inmediata de las actas de compromiso. * Actas de compromiso de las cercas afectadas.	* Contratista informa que el 6-11-24 entrega las actas de compromiso pendientes
Gestión Ambiental		
Informes de gestión Ambiental	* Parcialmente cumplido. pendiente septiembre y octubre 2024 * Interventoría recalca La importancia de dar cumplimiento a cada uno de los programas establecidos en la implementación al documento PAGA y solicita cumplimento estricto al documento * Interventoría solicita realizar las respectivas adecuaciones en el ZODME. Previo al inicio de la disposición de material.	* Contratista informa que envía 1-11-24 las evidencias de las adecuaciones del ZODME * Contratista informa que el Municipio no da entrega de la certificación del ZODME por parte del Municipio, no obstante el 1-11-24 remitirá solicitud al municipio.
Atención a las observaciones del PAGA	* Atender observaciones realizadas mediante el comunicado C-T-135-234-2024 de fecha de 7/8/24. Pendiente para el 20/10/2024. Se solicita de forma Prioritaria	* Contratista informa que queda pendiente el documento del ZODME. Por lo cual cuando se obtenga el respectivo soporte se remitirá el documento actualizado.
Gestión SST		
SEÑALIZACIÓN	* se solicita al contratista realizar la señalización pendiente por instalar en obra, según como se describe en el PMT. * Se solicita de forma prioritaria	* Contratista informa que el 6-11-24 da cumplimiento al compromiso.
Aportes a la seguridad social	* Se recomienda la entrega según las recomendaciones indicadas en el comunicado C-T-135-344-2024. y los lineamientos de lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.	* Contratista informa que se encuentra en liquidación la planilla de septiembre y octubre. Y las entrega 1-11-24
TEMAS MUNICIPIO DE PONEDERA		
ZODME	* Contratista solicitará al municipio la entrega de la certificación del ZODME de acuerdo a lo requerido por la interventoría.	* Contratista insistirá en la solicitud y copiara a la Interventoría.

* Se citó de forma oportuna al municipio al comité de obra, sin embargo, el municipio no asiste a la presente reunión sin presentar la respectiva justificación en marco de las obligaciones que le atañe.

* INVIAS. Informa que la fecha de finalización vigente de la interventoría es el 14 de diciembre 2024, por tal motivo se aclara que, en caso de llegar la fecha establecida, las obras ejecutadas por parte del contratista se recibirán siempre y cuando estas sean funcionales y completas, en tal sentido recalca al contratista incrementar el ritmo de trabajo.

* La interventoría aclara que, en caso de finalizar el contrato en la fecha establecida y se mantenga el ritmo de trabajo, el contratista se verá inmerso en los respectivos procesos de incumplimiento previstos en los documentos contractuales.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.	martes, 5 de noviembre de 2024	Contratista
Incremento de la Maquinaria en obra.	Prioritario	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km2): Nivelación del tramo	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km2): Entrega diseño definitivo	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4): Entrega de alineamiento	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4): Nivelación del corredor	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4): Diseño geométrico definitivo	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista
Acopio de material de mejoramiento	Prioritario	Contratista
hoja de vida del director	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista





FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

¨Plan de Contingencia ajustado	martes, 5 de noviembre de 2024	Contratista
Estudio Hidráulico	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista
Informes de gestión social de Septiembre y Octubre	miércoles, 6 de noviembre de 2024	Contratista
Actas de vecindad	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista
Actas de compromisos	miércoles, 6 de noviembre de 2024	Contratista
Informe ambiental de septiembre y octubre	Prioritario	Contratista
Entrega de PAGA actualizado	Prioritario	Contratista
Señalización del corredor de acuerdo a las observaciones realizadas en obra	Prioritario	Contratista
Entrega de Planillas de Seguridad Social	viernes, 1 de noviembre de 2024	Contratista
Consignación de rendimientos de septiembre	Prioritario	Municipio de Ponedera
Certificado del ZODME	Prioritario	Municipio de Ponedera y contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OMAR RODRÍGUEZ	ING. RESIDENTE	CONSORCIO LA GIRALDA	
EDGAR TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO ODESSA	
EDSON TAPIAS	COORDINADOR DE OBRA	CONSORCIO LA GIRALDA	
BRICEIDA BOLÍVAR OROZCO	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO LA GIRALDA	
JIMMY CORREDOR CHINOME	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
JOHN ARIAS H.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
RONALD O MOLINARES TORRES	ING. RESIDENTE	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 33
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

* Se realiza el seguimiento compromisos con el desarrollo de los temas.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1 Seguimiento Estudios y diseños.
2 Alcance y metas físicas.
3 Balance de obra.
4 Avance Físico de obra.
5 Avance financiero de obra.
6 Plan de manejo de trafico.
7 Seguimiento a compromisos del contratista

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de seguimiento LP-001-2023 para el cual se hace el seguimiento al avance de la obra y a los compromisos.

1 Seguimiento Estudios y diseños.

Interventoría realiza la exposición del estado de avance de los estudios y diseños. los cuales se encuentran en el siguiente estado

Estudio de Geología y Geotecnia:Aprobado
Estudio de transito: Aprobado
Diseño de Pavimento:Aprobado
Diseño Geométrico: Con observaciones
Estudio Hidráulico para Obras de Drenaje: Con observaciones
Diseño de Estructuras:Según cartilla.
Diseño de concreto:Se trabajará con concretera
Documento PAGA:Con observaciones de INVIAS
Cantidades y Presupuesto:Entregado

2 Alcance y metas físicas.

Interventoría informa, que de acuerdo con los estudios y diseños, se actualizaron las metas físicas del contrato. Teniendo en cuenta que el ancho de la vía inicial contemplada en el presupuesto del convenio contemplaba la sección típica de 5.6m y actualmente se mejora las condiciones en marco de lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, de 6.3m


METAS FÍSICAS	INICIALES - CONVENIO	ACTUALIZADAS - ESTUDIOS Y DISEÑOS
Actividad	Alcance	Alcance
Mejoramiento (Pavimento Rígido)	3,98 Km	2,70 Km
Mantenimiento (Conformación de calzada y afirmado)	5,70 Km	5,70 Km
Box culvert	1 Un	1 Un

3 Balance de obra.

Interventoría informa, El balance de la obra se encuentra radicado ante elmunicipio.

4 Avance Físico de obra.

Interventoría precisa que el contratista se encuentra en el proceso de explanación de la calzada con un avance de entre el k0+000 al k1+000 y El mejoramiento de subrasante entre k0+000 al k0+880 Primera capa y del k0+090 al k0+400 segunda capa.



5 Avance financiero de obra.

Interventoría informa que el contratista tiene un programado del 83.21% versus un ejecutado del 4.16%, lo cual representa un atraso de 79.05%. Estando muy por debajo de las inversiones programadas.

* Interventoría evidencia un atraso importante, en el que no se ha implementado el plan de contingencia de forma adecuada, ya que no se ha ingresado nuevas cuadrillas, ni maquinaria, lo que se evidenciado en las inversiones programadas. Además, se aclara que el contratista no ha entregado el diseño geométrico del km1 al km4, lo cual supedita el avance de las explanaciones, en tal sentido se reitera al contratista la entrega de forma inmediata.
Interventora considera prudente suspender las explanaciones, ya que no se cuenta con material suficiente para proteger la estructura

Contratista informa que presentó inconvenientes con el suministro del material, y se encuentra tomando medidas para superar el impase.

Plan de Contingencia

EN RIESGO	NOMBRE DE LA TAREA	INICIO	FIN	DURACIÓN (DÍAS)	ESTADO	COMENTARIOS
☑	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	1-Sep-24	28-Nov-24	88	En Ejecución 1km	
☑	GEOTEXTIL	15-Oct-24	2-Dec-24	48	En Ejecución 1km	
☑	TERRAPLENES	15-Oct-24	2-Dec-24	48	En Ejecución 0.9km	En Primera capa 900m y en segunda capa 310m
☑	Subbase Granular Clase C	21-Oct-24	10-Dec-24	50	Vencido	Sin material disponible en obra
☑	CONCRETO MR38	28-Oct-24	27-Dec-24	60	Vencido	
☑	ACERO	27-Oct-24	15-Dec-24	49	Vencido	
☑	BORDILLO Y PROTECCION DE TALUDES	5-Nov-24	28-Dec-24	53	Vencido	
☑	MANTENIMIENTO	28-Oct-24	28-Dec-24	61	Vencido	Sin material disponible en obra

7 Seguimiento a incumplimientos del contratista

Interventoría informa que el contratista continua con el incumplimiento de los compromisos pactados, por lo cual resalta que se debe dar cumplimiento a los mismos. Además resalta que a la fecha se ha informado al Municipio al respecto de dichos incumplimientos.
A continuación se presenta cada uno de los compromisos pendientes por cumplir por parte del contratista y se solicita dar respuesta e informar las nuevas fechas de reprogramación de cada uno de los compromisos.

COMPROMISOS	COMENTARIOS INTERVENTORÍA	COMENTARIOS CONTRATISTA
Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.	* Interventoría solicita actualizar de inmediato las pólizas del contrato de obra.	* Contratista informa que el 20-11-24 entrega
Incremento de la Maquinaria en obra.	No se ha implementado maquinaria adicional y solo se cuenta con un frente de obra.	* Contratista informa que el 25/11/24 ingresa el nuevo frente de obra el cual se encarga de la instalación de subbase
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km2).	* No se ha realizado la entrega del diseño geométrico y su replanteo en campo. Lo anterior perjudica el avance de las explanaciones del k1 al k2.	* Contratista informa que 21-11-24 entrega.

Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4).	* Sin entrega	* Contratista informa que por errores de toma de datos, es requerido verificar la topografía, el 22-11-24 al 25-11-24. Y entrega el producto final el 27-11-24
Hoja de vida director de obra	* No se ha presentado	* Contratista informa que 21-11-24 entrega
Estudio Hidráulico	Atender observaciones remitidas mediante comunicado C-T-135-394-2024 de 9/11/2024. * El nuevo volumen presentado presenta deficiencias por lo cual se requiere que se entregue de forma inmediata el volumen considerando el avance del anterior informe presentado.	* El contratista solicitará reunión con interventoría y especialista.
Instalación de subbase granular	Se solicita su inicio inmediato, debido al atraso en programación.	* Contratista informa que inicia el 22-11-24
Instalación de Pavimento Rígido	Inmediato	* A medida que se instale la subbase.
Gestión Social		
Entrega de Copias de Actas de Vecindad firmadas a propietarios	* Interventoría solicita celeridad con la actividad * Interventoría solicita listado de propietarios a los que se han entregado y los que se encuentran pendientes.	* Contratista informa que dio inicio el 15-11-24. a la entrega, con un avance de 15und promedio. * Contratista entregará el 20/11/2024 listado de predios entregados y pendientes de entrega de copia. * Contratista proyecta entregar todas las copias para el 25/11/2024.
Entrega de las Actas de compromiso	* Pendiente (5 actas) actas de SAU, Unidad sanitaria, Almacén y ZODME. * Contratista debe realizar actas de compromiso con propietarios donde por proceso constructivo se afectó la cerca y fijar compromiso con el propietario donde este manifieste si voluntariamente realiza la reinstalación de la cerca. * Se solicita al contratista no afectar cercas y si se requiere por anchos o proceso constructivo previamente se debe socializar con propietario y pedir los respectivos permisos.	* Contratista indica que ya tiene realizadas las actas y están pendientes de firma. * 2 actas (SAU y unidad sanitaria) para el 22/11/2024. * 1 acta del zodme para el 22/11/2024.
Remitir la interventoría debidamente diligenciada la o las PQRSD recibidas o presentadas	* La interventoría informa que se ha recibido información respecto a una queja por un cercado. * Se realizará recorrido el día viernes con el fin de hacer acercamiento con propietarios respecto a cercas con afectación.	* Contratista informa que no se ha recibido queja formal por las cercas.
Programación de reuniones de seguimientos con los comités de participación ciudadana	Interventoría informa que próxima reunión se programó para el 29/11/2024. Se requiere que el contratista entregue la presentación a la interventoría. Se solicita adecuada divulgación con juntas, comunidad y Municipio para próxima reunión.	* Contratista entregará presentación para el 21/11/2024.
Desarrollo del programa de cultura vial	Se solicita al contratista realizar la gestión con el Municipio, Policía e Inspección de Policía.	* Contratista se compromete a realizar la gestión. Enviará carta al 20/11/2024.
Charlas sociales al personal de obra	De acuerdo con el PAGA se deben realizar charlas con el personal de obra. Se sugiere hacer con apoyo del inspector SST del contratista.	* Contratista comunicará la gestión el 22/11/2024.
Reporte de Mano de obra contratada con enfoque de género, de derechos y diferencial.	Se solicita las certificaciones de residencia e incrementar la mano de obra de la zona de influencia del proyecto. Se solicita relación del personal donde se identifique la procedencia.	* Contratista informa que ahorita el personal de obra es mínimo y mano de obra calificada en su mayoría. * Con el inicio de nuevas actividades contratista incrementara el personal de obra.
Gestión Ambiental		
Instalación del punto ecológico en obra.	* Contratista informó que ya se había realizado la solicitud del punto y posiblemente se realizaba instalación en la presente semana.	* Contratista informa que instalará para 21/11/2024.
Presentación de las actas de compromiso del zodme, campamento, baño y bodega	Se trataron en componente social.	* Contratista entregará para el 22/11/2024.
Adecuación ZODME	Se solicita al contratista realizar el descapote, adecuación de carreteable e instalación de señalización en el ZODME.	* Contratista realizará actividades pendientes para el 23/11/2024.

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

Atención a las observaciones del PAGA	* Atender observaciones realizadas mediante el comunicado C-T-135-234-2024 de fecha de 7/8/24. Pendiente para el 20/10/2024. Se solicita de forma Prioritaria	* Contratista entregará para el 25/11/2024. * Contratista entregará informe ambiental de octubre de 2024 con atención de observaciones para el 21/11/2024.
Gestión SST		
SEÑALIZACIÓN	* Se solicita al contratista realizar la señalización pendiente por instalar en obra, según como se describe en el PMT. * Se solicita de forma prioritaria. * Se solicita al contratista realizar un registro fotográfico diario al finalizar labores y enviar de manera semanal a la interventoría.	* Contratista debe entregar para el 21/11/2024.
TEMAS MUNICIPIO DE PONEDERA		
Certificación ZODME	* Municipio ya aportó la certificación del ZODME debidamente diligenciada.	

* Se desarrolla el comité sin la presencia del residente de obra, a pesar de que fue citado por la interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Actualización de Pólizas acorde a acta de inicio, otro si No.2 y Otro si No. 3 y suspensión No. 1.	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Contratista
Incremento de la Maquinaria en obra y frente de obra subbase	lunes, 25 de noviembre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km1 a km2): Entrega diseño definitivo	jueves, 21 de noviembre de 2024	Contratista
Diseño Geométrico (entrega de Km2 a km4): Diseño geométrico definitivo	miércoles, 27 de noviembre de 2024	Contratista
Acopio de material de mejoramiento	Prioritario	Contratista
hoja de vida del director	jueves, 21 de noviembre de 2024	Contratista
Estudio Hidráulico	Prioritario	Contratista
Instalación de subbase granular	viernes, 22 de noviembre de 2024	Contratista
Copias de Actas de vecindad a propietarios	lunes, 25 de noviembre de 2024	Contratista
Actas de compromisos	viernes, 22 de noviembre de 2024	Contratista
Presentación para comité de participación	jueves, 21 de noviembre de 2024	Contratista
Punto ecológico	jueves, 21 de noviembre de 2024	Contratista
Adecuación ZODME	sábado, 23 de noviembre de 2024	Contratista
Entrega de PAGA actualizado	lunes, 25 de noviembre de 2024	Contratista
Señalización del corredor de acuerdo a las observaciones realizadas en obra - Registro Fotográfico	jueves, 21 de noviembre de 2024	Contratista

FECHA: 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
EDGAR TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO ODESSA	
EDSON TAPIAS	COORDINADOR DE OBRA	CONSORCIO LA GIRALDA	
BRICEIDA BOLÍVAR OROZCO	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO LA GIRALDA	
JIMMY CORREDOR CHINOME	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
JOHN ARIAS H.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
RONALD O MOLINARES TORRES	ING. RESIDENTE	CONSORCIO ODESSA	
ROCIO FLOREZ	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO ODESSA	
LINA CARVAJAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA 21/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 34
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se revisan el cumplimiento de compromisos con el seguimiento a cada uno de los componentes de diseño y documentos de inicio del contrato de obra.

	COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
1	Inicio de construcción de Bordillos	No cumplido
2	Atención de observaciones del Estudio Hidráulico	Cumplido
4	Construcción de canal	No cumplido
5	Entrega de Diseño geométrico complementario entre el k2+850 al k3+350	No cumplido

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento de estudios y diseños

Seguimiento actividades de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de seguimiento SG-LP-OP-004-2023, para el cual se desarrollan actividades de estudios y diseños y actividades de obra.

VOLUMEN	ACCIONES NECESARIAS	GESTIÓN CONTRATISTA
DISEÑO GEOMÉTRICO	* interventoría solicita tener en cuenta la obra hidráulica ubicada en el k3+150, con la finalidad de dejar un relleno adecuado de aproximadamente 60cm	* Contratista informa que el 25-11-24 entrega el diseño geométrico
DISEÑO PAVIMENTO	* Interventoría solicita la validación de geotecnia del tramo adicional	* Contratista informa que entregará un apique para validar geotecnia del tramo del k2+850 al k3+350
ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO HIDRÁULICO	* Interventoría informa que recibe el 20-11-24 informe de hidráulica y procederá a la respectiva verificación de la información.	* Contratista realizó entrega para revisión de interventoría.
SOCIAL	* Solicita al contratista dar claridad del estado de avance de la campaña de seguridad vial y su programación.	*

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

VARIOS

* Se acuerda construcción de filtro transversal tipo francés ubicado entre la abscisas de k0+850 al k1+050, por el costado derecho, con la finalidad de evacuar las aguas en este corredor.
* Interventoría solicita la limpieza del canal, con la finalidad de evacuar las aguas.

* Interventoría informa que el contratista cuenta con un programado de 88,2% versus un ejecutado de 54,3% lo que representa un atraso de la ejecución de la obra de 34%. Por lo cual solicita al contratista incrementar el ritmo de trabajo y adelantar la construcción de la estructura de pavimento. Además de ingresar el grupo de personal requerido para las obras adicionales como los bordillos, canal de desagüe y llenos detrás de bordillos.
* Contratista informa que el día de hoy ingresa personal, para la construcción de bordillos y se espera que 22-11-24 de inicio con la fundida.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Inicio de construcción de Bordillos	viernes, 22 de noviembre de 2024	Contratista
Construcción de filtro del k0+850 al k1+050	Prioritario	Contratista
Entrega de apique de verificación geotecnia, para el diseño de pavimento	Prioritario	Contratista
Construcción de canal	Prioritario	Contratista
Entrega de Diseño geométrico complementario entre el k2+850 al k3+350	lunes, 25 de noviembre de 2024	Contratista
Campaña de seguridad vial. Informar la nueva fecha	Prioritario	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ADALBERTO FLOREZ	DIRECTOR DE OBRA	CRIVEN CONSTRUCTORES	
JOHN ARIAS H.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
RONALD MOLINARES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
FRANCISCO ARRIETA	ING AUXILIAR	CRIVEN CONSTRUCTORES	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CARLOS ARTURO ARÉVALO VARON	RESIDENTE DE OBRA	CRIVEN CONSTRUCTORES	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 35
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se revisan el cumplimiento de compromisos con el seguimiento a cada uno de los componentes de diseño y documentos de inicio del contrato de obra.

	COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
1	Inicio de construcción de Canal	Cumplido
2	Construcción de filtro del k0+850 al k1+050	No cumplido
4	Entrega de apique de verificación geotecnia, para el	No cumplido
5	Entrega de Diseño geométrico complementario entre	No cumplido
7	Entrega del estudio hidraulico	No cumplido
8	Entrega de ajuste de la solicitud de prorroga	No cumplido

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento de estudios y diseños

Seguimiento actividades de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de seguimiento SG-LP-OP-004-2023, para el cual se desarrollan actividades de estudios y diseños y actividades de obra.

VOLUMEN	ACCIONES NECESARIAS	GESTIÓN CONTRATISTA
DISEÑO GEOMÉTRICO	* interventoría solicita celeridad con la entrega del diseño geométrico del k2+850 al k3+350, ya que es prioritario para dar inicio a las actividades constructivas.	* Contratista informa que el 25-11-24 entrega el diseño geométrico

Escaneado con CamScanner

FECHA 28/11/2024
(Día / Mes / Año)

COMPLEMENTACIÓN DE GEOTECNIA	* Interventoría informa que se encuentra pendiente a entrega de la validación de un apique adicional para la construcción del pavimento del tramo del k2+850 al k3+350.	* Contratista informa que entregará un apique para validar geotecnia del tramo del k2+850 al k3+350.
ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO HIDRÁULICO	* Interventoría informa que el estudio hidráulico, tiene pendiente la atención de observaciones y solicita su entrega inmediata de lo contrario se reiterará al municipio el inicio de actuaciones sancionatorias. * Interventoría informa que se requiere la entrega con plazo máximo el 3/12/24, de lo contrario se procederá a sugerir al municipio adelantar los procesos sancionatorios correspondiente por el incumplimiento de los compromisos pactados.	* Contratista informa que se encuentra en los respectivos ajustes del documento.

VARIOS

* Se solicita nuevamente dar inicio con la construcción de filtro transversal tipo francés ubicado entre la abscisas de k0+850 al k1+050, por el costado derecho, con la finalidad de evacuar las aguas en este corredor.
* Interventoría solicita la limpieza del canal, con la finalidad de evacuar las aguas y así mismo dar inicio con la construcción del canal.

* Invias precisa que bajo las condiciones vigentes del contrato de interventoría, el plazo esta hasta el 14/12/2024, por lo cual el contrato de obra debe incrementar el ritmo de trabajo. de igual forma se informa que una alternativa para prorrogar la interventoría es que el municipio cofinancie la interventoría en el periodo adicional requerido para finalidad, adicionalmente informa que se adelantan gestiones para una posible restitución de recursos y prorroga de la interventoría.

* Contratista solicitó prorroga del contrato de obra hasta el 14/12/2024, no obstante la interventoría solicita que se ajuste la solicitud.

* Invias precisa que en caso que se de vencimiento al plazo contractual, las obras se recibirán únicamente las que sean funcionales.

* Interventoría informa que el contratista cuenta con un programado de 96,64% versus un ejecutado de 58,11% lo que representa un atraso de la ejecución de la obra de 38,5%. Lo avance de las obras se encuentran reflejadas en la construcción de 1682m de pavimento y la instalación de subbase granular en 1900m. Por lo cual solicita al contratista incrementar el ritmo de trabajo y adelantar la construcción de la estructura de pavimento. Además de ingresar el grupo de personal requerido para las obras adicionales como el canal de desagüe y llenos detrás de bordillos.

* Las obras que se encuentran pendientes son:
- Construcción de pavimento del k0+850 al k1+400 constando izquierdo
- Construcción de estructura de pavimento del k2+850 al k3+200
- Construcción de Bordillos del k0+200 al k2+000 y del k2+850 al k3+200
- Construcción del canal
- Instalación de la señalización
- Construcción de accesos a vias o predios para empalme del pavimento.

* Interventoría solicita al Municipio de Sabanagrande remitir copia a la interventoría copia del certificado de los rendimientos consignados y generados en la cuenta del Convenio 2221-2023.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Inicio de construcción de Canal	Prioritario	Contratista
Construcción de filtro del k0+850 al k1+050	Prioritario	Contratista
Entrega de apique de verificación geotecnia, para el diseño de pavimento	martes, 3 de diciembre de 2024	Contratista
Entrega de Diseño geométrico complementario entre el k2+850 al k3+350	lunes, 25 de noviembre de 2024	Contratista
Entrega del estudio hidraulico	martes, 3 de diciembre de 2024	Contratista
Entrega de ajuste de la solicitud de prorroga	jueves, 28 de noviembre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADALBERTO FLOREZ	DIRECTOR DE OBRA	CRIVEN CONSTRUCTORES	
JOHN ARIAS H.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
RONALD MOLINARES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	
FRANCISCO ARRIETA	ING AUXILIAR	CRIVEN CONSTRUCTORES	
BRUNO DELACRUZ	SECRETARIO PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	
JIMMY CORREDOR CHINOME	GESTOR TECNICO	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 | 5

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 36
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 del 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Recorrido de Obra
- Seguimiento al avance de Obra.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- SE HACE RECORRIDO DE OBRA, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE MUNICIPIO, INVIAS, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LA OBRA.

- INTERVENTORIA MANIFIESTA LA PREOCUPACIÓN ANTE EL ESCASO AVANCE DE LA OBRA.
A CORTE DEL PRESENTE COMITE SE TIENE:
EXPLANACIÓN: K0+000 - K01+140
MEJORAMIENTO: 1ª CAPA DEL K0+000 - K0+880
2ª CAPA DEL K0+000 - K0+610

CUENTA CON UN PROGRAMADO DE 87,05%
CON UN EJECUTADO DEL 4,61%, LO QUE REPRESENTA EL 82,45% DE ATRASO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

- CONTRATISTA INFORMA QUE EL VIERNES-SABADO INICIA CON EL ACOPIO DE SUBBASE, Y EL LUNES 3/12/24 INICIA EL CERCO.

- INVIAS ACLARA QUE EN CASO DE COMPLIR EL PLAZO CONTRACTUAL, SE PROCEDERÁ A RECIBIR UNICAMENTE LAS OBRAS FUNCIONALES.

- INTERVENTORIA SOLICITA AL MUNICIPIO QUE REQUIERA AL CONTRATISTA DADO QUE PRESENTA ATRASO IMPORTANTE, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA ACTUAL DE FINALIZACION ES EL PROXIMO 14/12/2024.

- INTERVENTORIA REITERA LA IMPORTANCIA DE LA ENTREGA DEL DISEÑO GEOMETRICO PARA CONTINUAR CON LA EXPLANACIÓN DEL K1+000 AL K2+000. Y DEL K2+020 AL K4+000

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

* LA INTERVENTORIA RECALCA QUE SE TIENE PENDIENTE-
* ENTREGA DE POLIZAS ACTUALIZADAS.
* INCREMENTAR EN FRENTES DE OBRA - MAQUINARIA.
* ENTREGA DISEÑO GEOMETRICO DEL K1+000 - K4+000
* ENTREGA DE HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR.
* ENTREGA DEL ESTUDIO HIDRAULICO
* INSTALACIÓN DE SUBBASE
* INICIO CON LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTO
* GESTIÓN SOCIAL

* ENTREGA COPIAS ACTAS VECINDAD
* ENTREGA DE ACTAS COMPROMISO
* SOPORTES DE LOS PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN.
* FORMALIZAR ENTREGA DE OBSERVACIONES DE C PAGA
* REMITIR PQRSD RADICADAS.
* REPORTE DE MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO.

GESTIÓN AMBIENTAL

* INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLOGICOS
* ADECUACIÓN DE ZODME.
* ENTREGA DE INFORME DE OCTUBRE/2024.

GESTIÓN SST.

* SEÑALIZACIÓN ACORDE DEL PMT
* ENTREGA DE SOPORTE DE ENTREGA PMT
* ENTREGA EXAMENES DE INGRESO DE PERSONAL

* LA INTERVENTORIA RECALCA QUE INFORMÓ OPORTUNAMENTE ATRASOS Y SUGERENCIA DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO. MEDIANTE EL COMUNICADO.
  * C-T-135-188-2024 DE 12/07/2024
  * C-T-135-275-2024 DE 02/09/2024
  * C-T-135-312-2024 DE 19/09/2024.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

* LA INTERVENTORIA ADVIERTE QUE DE CONTINUAR CON EL BAJO RENDIMIENTO, SE ESTA ENCAMINANDO AL INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES UNICAMENTE AL CONTRATISTA.

* MUNICIPIO SOLICITA QUÉ EL CONTRATISTA DE CUMPLIMIENTO CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS, Y DE INICIO CON LA INSTALACIÓN DE SUBBASE Y LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, DE FORMA INMEDIATA.

Escaneado con CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INICIO DE ACOPIO DE SUBBASE	28/12/24	CONTRATISTA.
INICIO CERCO SUBBASE	3/12/24	CONTRATISTA.
ENTREGA GEOMÉTRICO	INMEDIATO	CONTRATISTA.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS REPORTADOS EN LA PRESENTE ACTA	INMEDIATO	CONTRATISTA.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
John A. Arias H.	Director	Interventoría	
Jimmy Cordon	Gestor técnico	Invias	
Lucy Mantilla	Sec Planeación	Alcaldía	
José Manuel Tapias Higuera	Ing. Auxiliar de Obra	Consorcio La Giralda	José M. Tapias H.
Omar E Rodriguez Cepeda	Ing. Residente de obra	Consorcio La Giralda	
Ronald O. Molinares Torres	ING. RESIDENTE	INTERVENTORÍA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

4.8.4 ACTAS DE REUNIÓN

FORMATO MEPI-MN-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 58
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRIVEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Realizar seguimiento a las actividades del componente social del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra contratada:
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4.ENTREGA DE PROGRAMACIÓN- PLAN DE CONTINGENCIA ACTIVIDADES SOCIALES PENDIENTE POR EJECUTAR EN EL CONTRATO
5.GESTIÓN DEL ICANH Y MININTERIOR.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 07 se noviembre de 2024, a las 3:40 p.m. se llevó a cabo la reunión de seguimiento al componente social del contrato LP-OP-004-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con la participación de las profesionales del área social por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES y la Interventoria Consorcio Odessa.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL
Subprograma 1. Mano de obra contratada: Se estableció con el contratista continuar realizando las charlas sociales con el personal vinculado al contrato durante el mes de noviembre. Se recomienda realizar seguimiento y adelantar la gestión de certificados del personal que se vincule del área de influencia del proyecto y verificar la información que el área SST facilitará cinco días antes del corte de mes para verificar el ingreso de MONC y MOC del área de influencia del proyecto.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.
***Estado las actas de vecindad de inicio:** a la fecha se encuentran subsanadas y aprobadas por interventoria (75) actas de vecindad de inicio y la entrega de las copias de estas actas de vecindad de inicio.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.
***Programación del levantamiento de Actas de vecindad de cierre:** Continúa pendiente la entrega de la programación, donde la profesional social del contratista informa que aún se continúan ejecutando actividades de pavimento en la vía, donde a realizado la respectiva consulta y se espera tener un mayor avance considerando que en algunos sectores esta pendiente fundir concreto y colocación de bordillos como adecuaciones de los accesos, la actividad de cierre social de actas depende del área técnica.

***Actas de compromiso:** Hay dos actas que se encuentran abiertas por las actividades de obra que se están ejecutando y los áreas de estos predios se encuentran en uso.

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 1. Atención a la comunidad.

***Estado dePQRSD que se hayan recibido**. Interventoría le solicita al contratista atender y formalizar el cierre de la PQRSD N° 2 El área social del contratista informa que esta pendiente el concepto por parte del área técnica para la próxima semana..

Subprograma 2. Información y Divulgación:

*** Remitir ajustes al volante N° 4 de invitación a reunión con el CPC.** Se solicita al contratista remitir a la Interventoria el volante de invitación a reunión de seguimiento con el comité de participación comunitaria y veeduria con los ajustes y reprogramación de la actividad, se remitirá el día de hoy a la Interventoria, para la revisión y concepto.

Subprograma 2. Información y Divulgación:

***Volante N° 5 divulgación Campaña de prevención y seguridad vial.** El contratista remitirá el día sábado 9 de noviembre de 2024 para revisión de la interventoria. Interventoria le recomienda al contratista organizar la logística y procedimiento para la ejecución de esta actividad programada para el 14 de noviembre de 2024.

Subprograma 2. Información y Divulgación:

***Entrega de la presentación de la reunión de seguimiento al contrato con el CPC:** El área social de interventoria revisó, ajustó y organizó la presentación remitida por la profesional social del contratista recibida el día 06-11-2024 y remitida al WhatsApp de la profesional del contratista dejando aprobada la información social y queda pendiente por parte del contratista relacionar la información de las áreas técnica, ambiental y STT, el contratista informa que espera que el área técnica la remita el lunes 11 de noviembre de 2024. Interventoria remite la presentación editable el día de hoy, al correo social del contratista para que complementen la información de las otras área.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. El contratista remite el día de hoy comunicación a la interventoria informando el cambio de la fecha de esta reunión aludiendo actividades técnicas, interventoría solicita no se realicen cambios cuando se tienen programadas previamente las actividades. La actividades de Reunión de seguimiento con el CPC y con veeduria se reprogramó para el día jueves 14 de noviembre a 10:30 a.m. en el predio CENTRO RECREACIONAL PINAR. La profesional social informó la entrega de las invitaciones a través de carta y remisión del volante a la Alcaldía de Sabanagrande, Secretaría de Planeación, personería municipal, integrantes del comité de participación comunitaria al grupo de WhatsApp y al correo de la veeduria "No más Silencio"

4. ENTREGA DE CRONOGRAMA - PLAN DE CONTINGENCIA. Interventoría le recuerda al contratista que esta pendiente la respuesta **a** la comunicación C-T-135-368-2024-SG remitida el día 23 de octubre del año en curso, considerando que el contrato tiene como fecha de finalización el 4 de diciembre del año en curso. La profesional social informa que adelantó gestión con el área técnica y no han emitido ninguna respuesta teniendo en cuenta que no puede programar el levantamiento de las actas vecindad de cierre por que continúan las actividades de obra. Interventoría informa que procederá a remitir una nueva comunicación de requerimiento considerando que en 21 días hábiles que faltan deben tener contemplado un plan de contingencia.

6.GESTIÓN ICAN Y MININTERIOR. Interventoría nuevamente le solicita a la profesional social del contraiga adelantar gestión a los correos remitidos a las dos entidades, teniendo en cuenta que esta información se requiere para el cierre del contrato. Se requiere que el día de mañana 8 de noviembre se adelante la gestión remitiendo nuevamente los correos o verificar si estos no corresponden y procederá a consular y dejar la trazabilidad correspondiente.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1. Formalizar el cierre de la PQRSD N° 2	martes, 12 de noviembre de 2024	Contratista
2. Remitir al correo de interventoria para revisión, el volante de con cambios de fecha y lugar de la invitación a reunión con CPC y veedores	jueves, 7 de noviembre de 2024	Contratista
3. Remitir la presentación editable con el contenido social ajustado y organizada, para complementar la información por las demás áreas.	jueves, 7 de noviembre de 2024	Interventoria
4. Dar respuesta atención de la PQRSD	viernes, 15 de noviembre de 2024	Contratista
5. Remitir a interventoria la presentación con la información pendiente de las áreas técnica, ambiental y SST.	lunes, 11 de noviembre de 2024	Contratista
6. Entrega del volante de invitación a la campaña de prevención y seguridad vial	sábado, 9 de noviembre de 2024	Contratista
7. Gestión por correo de respuesta por parte del ICANH y MININTERIOR	viernes, 8 de noviembre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LOURDES MUÑOZ GÓMEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCIONES	
ROCÍO FLÓREZ	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA 8/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 59
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento al componente de gestión social del contrato y de la vía terciaria en el municipio de Pondera Atlántico.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra Identificación de pendientes sociales
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4. INFORMES MENSUALES SOCIALES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 8 de noviembre del año en curso se realiza la reunión de seguimiento a las 4:00 p.m. con e objeto de realizar el seguimiento a las actividades sociales del contrato convenio de la vía terciaria en el municipio de Ponedera. Participaron las profesionales social del contratista y de la Intervetoria.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra.
Interventoría indaga al contratista respecto a los soportes de los certificados de residencia de las personas vinculadas al contrato que residen en el área de influencia del proyecto. La profesional social del contratista, Briceida Bolívar informa que ya se tienen con estos certificados correspondientes a los dos empleos generados de personas del AIDP, los cuales tienen fecha del mes de nombre y re remitirán a la interventoria el día de hoy.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS. Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.
Actas de Vecindad de inicio subsanadas . Interventoria informa que el día 05-11-2024 el contratista remitió a la interventoria las actas de vecindad subsanadas, en revisión, se encontró que varios folios de las actas aparecían sin firmas del propietarios o del testigo, el día 07-11-2024 se adelantó la respectiva gestión y una vez se registren todas las firmas, se procederá a realizar el escaneo de la información para dejar los soportes digitales, el contratista puede disponer de la información.
Entrega de copias de las actas de vecindad. Se solicita al contratista por parte de interventoria que una vez estén con concepto de aprobación las actas de vecindad de inicio deben procederá a la entrega de las copias a los propietarios, de acuerdo a lo establecido en PAGA.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS. Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.
A**ctas de compromiso levantadas a la fecha:** la profesional social informa que el día de ayer, se adelantó gestión y firma de estas actas con los propietarios en predios donde los propietarios solicitaron donación de material, se estableció con el contratista los siguientes consecutivos de actas de compromiso pendientes por reportar a la interventoria, incluyendo las iniciales que están pendiente por reportar a la interventoria con los siguientes consecutivos:
N°01 Préstamo área del SAU ubicado en la finca "Manuela Isabel" El acta se encuentra en revisión de la propietaria del predio para firma.
N°02 Préstamo de Baño en predio de la finca "Manuela Isabel" El acta se encuentra en revisión de la propietaria del predio para firma.
N°03 Predio Sr. Pedro Bolaños Fontalvo-Villa Gladys donde se tiene una área para guardar herramientas y sitio de disposición de material (ZODME) esta acta esta firmada por el propietario falta firma del área técnica del contratista y pendiente remitirla a Interventoria para firma.
N°04 Predio Villa Gladys donación de material para nivelación de las entradas, ya esta con firma del propietario.
N°05 Predio de Omar Ochoa Crúzate, donación de material para nivelación de las entradas, firmado por el propietario.
N°06 Predio de Amasi Barandica, vivero El Bosque, donación de material para nivelación de las entradas, firmado por el propietario.
Interventoria le solicita al contratista confirmar si esta autorización esta confirmada por interventoria y se comenta que si fue autorizada, de igual forma queda pendiente que el contratista remita las respectivas actas firmadas por el contratista y quedaría pendiente el aval con la firma del área técnica de la Interventoria. Entrega la próxima semana. Se recomienda adjuntar registro fotográfico del antes y el momento de entrega del material.

FECHA 8/11/2024
(Día / Mes / Año)

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL.

Subprograma 1. Atención a la comunidad. El contratista informa que ha venido brindando atención en la oficina del SAU ubicada en la parcela Manuela Isabel los días viernes de 8 a.m. hasta las 12 m. Se confirma que a la fecha la PQRSD, que se encuentra en proceso es la solicitud de material para adecuación de acceso a un predio, interventoria solicita remitir el formato donde el contratista reporta que ya se encuentra formalizada y cerrada. La profesional social del contratista informa que en el transcurso de esta semana se autorizó la entrega del material por parte del área técnica.

Subprograma 2. Información y Divulgación.

Volante de invitación a reunión de seguimiento del contrato con el CPC. Interventoria le solicita al contratista remitir el actas de la reunión del comité de participación comunitaria que está desde la semana pasada en ajustes y correcciones. La profesional social del contratista informa

Remitir soportes de las convocatorias a de invitación al la reunión de seguimiento al contrato. Interventoría le solicita a la profesional social del contratista, remitir los soporte de las invitaciones a los integrantes del comité de participación comunitaria, a la Alcalde de Ponedera, Secretaria de Infraestructura y obras, Personería municipal y demás entes y autoridades relacionadas con el contrato. Teniendo en cuenta que en el listado de asistentes a la reunión no se identificaron integrantes del CPC ni representantes de las autoridades municipales. La profesional social del contratista informa que estas convocatorias se realizaron a través de correo y se remitirán el día de hoy a la interventoria.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. Se le recuerda al contratista programar las actividades pendientes con los integrantes del comité de participación comunitaria taller pedagógico y reuniones periódicas informativas del avance del contra y programar actividad e información y divulgación del PMT con los usuarios de la vía, considerando que estos no participan en las reuniones programadas durante la ejecución del contrato, pueden contar con el apoyo de una pieza informativa del PMT y en la entrega dejar el respectivo registro en planillas.

4..INFORMES MENSUALES SOCIALES

Continua pendiente la entrega del informe mensual social N° 7 de septiembre de 2024. Se tenia establecido el compromiso de remitirlo a la interventoría el 24-10-2024, donde a la fecha no se ha radicado y se solicita la entrega de forma inmediata.

El informe mensual social N° 8 de octubre de 2024, se le recuerda al contratista deben radicarlo formalmente con la respectiva comunicación, donde la fecha establecida contractualmente era el día 5 de noviembre del año en curso. Deben proceder a la entrega inmediata de la información.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Remitir los certificaciones de residencia del personal vinculado del AIDP	viernes 08/11/2024	Contratista
2. Entrega de copia de actas de vecindad de inicio a propietarios	Compromiso inmediato	Contratista
3. Remitir a la interventoría las actas de compromiso levantadas	Compromiso inmediato	Contratista
4. Entrega del informe mensual social N° 7 del mes de septiembre de 2024 y N° 8 de octubre de 2024	Compromiso inmediato	Contratista


FECHA PROXIMA REUNIÓN 14/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Briceida Bolívar	Profesional Social	Consorcio La Giralda Contratista	
Rocío Flórez	Profesional Social	Consorcio ODESSA - Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA 14/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 60
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento a las actividades de los componentes ambiental y social del contrato LP-001-2023 de la vía terciaria en el municipio de Pondera Atlántico.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ZODME Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES
2. ACTAS DE COMPROMISO NO AUTORIZADAS
3. INTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO.
4.ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES PENDIENTES
5.REQUERIMIENTO ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA
6.ENTREGA DE COPIAS DE LAS ACTAS DE VECINDAD DE INICIO A PROPIETARIOS
7.FUNCIONAMIENTO DEL SAU Y ATENCIÓN DE PQRSD
7. IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS POR AFECTACIÓN DE CERCAS Y CERRAMIENTOS POR ACTIVIDADES DE OBRA
8.FUNCIONAMIENTO DEL SAU Y ATENCIÓN DE PQRSD
9. INFORMACIÓN Y DVULGACIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El día 14 de noviembre del año en curso se realiza la reunión a las 9:00 a.m. con e objeto de realizar el seguimiento a las actividades socioambiental del contrato convenio de la vía terciaria en el municipio de Ponedera. Participaron las profesionales del área ambiental y social por parte del contratista CONSORCIO LA GIRALDA y de la Intervetoria CONSORCIO ODESSA.
1.SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ZODME o RCD Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES. Interventoría pregunta al Contratista como va la implementación del ZODME para la disposición del material de excavación generado en el proyecto, el cual se esta acumulando a los costados de la vía, generando afectación a la vegetación. El área ambiental del Contratista responde que le ha solicitado al área técnica los documentos faltantes (acta de compromiso, certificado de tradición y libertad y certificado de la alcaldía de Ponedera) sin obtener respuesta hasta el momento, además, argumenta que el estado de la vía de acceso al predio ha dificultado su ingreso, por tal motivo, no se descarta la búsqueda de un nuevo predio en donde se haga la disposición de los RCD o se utilice como acopio temporal mientras el clima de la región mejora y facilita su utilización. De ser así, se presentaría previamente a Interventoría el predio a utilizar para su aprobación.
2. ACTAS DE COMPROMISO NO AUTORIZADAS. Interventoría aclara nuevamente al Contratista que NO se autoriza la donación de material de excavación a particulares y que las actas de compromiso que se realizaron en días pasado al respecto no tendrán aprobación ni firma por parte de Interventoría. Se ratifica que e día 9 de noviembre del año en curso se les remitió un correo, donde se les solicita no donar ni disponer material en predios que no están autorizados, nuevamente el 12 de noviembre con la comunicación C-T-135-396-2024 PO-se Reitera la NO autorización de donación de material de excavación, para evitar afectaciones en predios como en las fuentes hídricas presentes en el territorio como ciénagas, arroyos y el río Magdalena y en general tanto a los predios como al entorno, evitar reclamaciones e impactos que se puedan presentar por la disposición inadecuada de estos materiales. Nuevamente en este comité se ratifica la NO APROBACION.
3. INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO Interventoria le solicita al contratista información en cuanto a la falta del punto ecológico en obra, el Contratista manifiesta que ya se hizo la solicitud y que espera que el mismo se instale la próxima semana, mientras tanto, la recolección de los RS se hará en bolsas en los frentes de trabajo. Los RS serán llevados al casco urbano del municipio para ser entregados a la empresa de aseo Interaseo. El Contratista debe implementar un formato de registro y control del peso de los Residuos Solidos (RS) generados y el registro fotográfico de la entrega para su disposición final.

FECHA 14/11/2024
(Día / Mes / Año)

4. ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES PENDIENTES DEL ÁREA AMBIENTAL Y SOCIAL

El Contratista manifiesta que día de ayer remitió al correo del área social para revisión el informe mensual N° 8 del mes de Octubre. La profesional social de la interventoria informa que fue revisado el mismo día 13 de noviembre del año en curso y de igual forma remitió la observaciones al correo, se aclara que los formatos no los firma el director relacionado teniendo en cuenta que en ese periodo no se encontraba vinculado al proyecto, se estableció de acuerdo a las indicaciones del director de interventoria para que firme el representante legal. Se estableció el compromiso de remitir la información completa subsanada del informe social de octubre el día de hoy como también remitirá el informe ambiental de octubre al correo de la Ing. ambiental de la interventoria.

5. ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA

El Contratista manifiesta que del documento PAGA, están pendientes los soportes de los permisos y actas de compromiso del predio del ZODME, del baño en préstamo para el personal de obra y el área donde funciona la oficina del SAU en obra, Interventoría aclara que la entrega del mismo debe ser de forma inmediata teniendo en cuenta que el plazo contractual y de finalización del contrato es el 14 de diciembre de 2024 y aún se encuentra pendientes documentos solicitados.

6. ESTADO DE LA ENTREGA DE COMPIAS DE LAS ACTAS DE VECINDAD DE INICIO A PROPIETARIOS

La profesional social del contratista informa que mañana se tiene programado iniciar la entrega de las copias de a través de WhatsApp, interventoria le recomienda iniciar la entrega de esta información el día de hoy 14-nov-2024 considerando que el día de mañana se deben realizar visitas a predios donde se afectaron los cercados y la entrega del volante del PMT. Respecto a la entrega de las copias de las actas de vecindad de incio a los propietarios, y dejar organizados en un documentos los respectivos envíos donde se evidencia a quién se remitió, fecha, documento del acta con el respectivo consecutidi debe compilar en un documento la información remitida.

7. IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS POR AFECTACIÓN DE CERCAS Y CERRAMIENTOS POR ACTIVIDADES DE OBRA

Interventoria le solicita al contratista tener en cuenta la afectación que se esta generando por actividades de obra en algunos cerramientos cercados y le solicita que procedan a la verificación el día 15-nov-2024 y se dejen las respectivas actas de compromiso con los propietarios y con el área técnica se coordine al respectiva reparación y remitir los respectivos soportes a la interventoría, de igual forma se recomienda hablar con el área técnica para evita las afectaciones a los predios. Interventoría procederá el día de hoy a remitir comunicación al contratista, con el respectivo requerimiento. cada acta que se levante debe adjuntarse el registro fotográfico y dejar claros los compromisos y tiempos establecidos para las reparaciones que se requieran.

8.FUNCIONAMIENTO DEL SAU Y ATENCIÓN DE PQRSD

La profesional social del contratista atiende el SAU los días viernes en la mañana y a la fecha no se han reportado reclamaciones por parte de los propietarios de los predios o personas de la comunidad.

9. INFORMACIÓN Y DVULGACIÓN

Se acordó con el contratista adelantar la divulgación del PMT a lo actores viales usuarios del corredor vial, donde el día de hoy se procederá ala elaboración del respectivo volante, Interventoria procederá a remitir un ejemplar para que lo ajuste y complemente el contratista para que el día 15 de noviembre sea entregado por el contratista, se recomienda dejar registro de la entrega de este volante en la planilla de entrega y se recomienda diligenciar completo el formato o planillas de entrega y debe ir firmado por el contratista y por la interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Remitir informes mensuales del mes de octubre/2024 del componente ambiental y social de interventoria	jueves 14/11/2024	Contratista
2. Entrega de copia de actas de vecindad a propietarios	jueves 14/11/2025	Contratista
3. Instalación de Punto Ecológico	Miercoles 20/11/2026	Contratista
4.Entrega de documentos faltantes del ZODME	Miercoles 20/11/2026	Contratista
5.Entrega del documento PAGA	Entrega inmediata	Contratista
6.Volante modelo PMT	jueves 14/11/2025	Interventoría
7.Entrega del volante del PMT a actores viales	viernes 15/11/2026	Contratista
8.Visita a predios afectaciones cercados y levantar actas	viernes 15/11/2026	Contratista




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 21/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paola Velandia	Ing. Ambiental	Consorcio La Giralda Contratista	
Lina Carvajal	Ing. Ambiental	Consorcio ODESSA - Interventoría	
Briceida Bolívar	Profesional Social	Consorcio La Giralda Contratista	
Rocío Flórez	Profesional Social	Consorcio ODESSA - Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 61
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRIVEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Realizar seguimiento a las actividades del componente social del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra contratada:
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4.ENTREGA DE PROGRAMACIÓN- PLAN DE CONTINGENCIA ACTIVIDADES SOCIALES PENDIENTE POR EJECUTAR EN EL CONTRATO
5.GESTIÓN DEL ICANH Y MININTERIOR.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 14 se noviembre de 2024, a las 4:00 p.m. se llevó a cabo la reunión de seguimiento al componente social del contrato LP-OP-004-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con la participación de las profesionales del área social por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES y la Interventoria Consorcio Odessa.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL
Subprograma 1. Mano de obra contratada: Interventoría indaga sobre actividades realizadas con el personal vinculado al contrato por parte del área social y el ingreso de personas del AIDP. La profesional social del contratista informa que no se ha evidenciado el ingreso personal.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.
Interventoria le recuerda al contratista verificar **a**l área social con el área técnica en que predios se puede iniciar el levantamiento de actas e vecindad de cierre, teniendo en cuenta que el plazo actual de finalización del contrato es el 4 de diciembre del año en curso, esto no solo por esta actividad sino las demás actividades sociales que no se han ejecutado. El contratista informa al parecer se esta adelantando prorroga, y de igual forma las obras se continúan, pendiente si el área técnica define la próxima semana este tema

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.

***Actas de compromiso:** Hay dos actas que se encuentran abiertas por las actividades de obra que se están ejecutando y los áreas de estos predios se encuentran en uso, a la fecha no se han levantado nuevas actas.

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL
Subprograma 1. Atención a la comunidad.
***Estado de PQRSD N° 2**. La Profesional social del contratista informa que el día 13 de noviembre de 2024, fue formalizado el cierre con la propietaria y esta pendiente la firma por parte del área técnica tanto del contratista como de la Interventoria, el día lunes se realizará la respectiva gestión y remitirá la información al área social para la respectiva firma. Se recomienda adjuntar al formato de la PQRSD el respectivo registro fotográfico de las actividades ejecutadas y copia del acta de vecindad de inicio.

Subprograma 2. Información y Divulgación
*** Remitir ajustes al volante N° 5 de la campaña de Prevención y seguridad vial.** De acuerdo a lo informado por la profesional social se va a cambiar la fecha de esta actividad por la logística que se está gestionando con el apoyo de la profesional SST de la interventoría, donde se proyecta realizar la actividad en la tienda la cascada donde esta frente a la vía y de fácil acceso para los actores viales que la frecuentan con la posibilidad de que se disponga una mejor logística e instalación de un instan, la fecha depende de lo que se concerté nuevamente con la Secretaria de Transito de Sabanagrande. Interventoría le solicita al contratista definir esta fecha e informar a la interventoria el día lunes 18 de noviembre, se les solicita no volver a cambiar la fecha considerando el tiempo que falta del contrato, definida, volver a remitir el volante ajustado a la interventoría y remitir comunicación a la Secretaria de Transito. Además deben también gestionar el acompañamiento de la Policía Nacional.

Subprograma 2. Información y Divulgación
Aviso Informativo. Interventoria remite documento editable para que proceda a la elaboración del Aviso informativo N°2 para remitir a comunicaciones del la Alcaldía de Sabanagrande difundo e invitando a la campaña de prevención y seguridad vial, el día de hoy interventora remite ejemplar editable para que procedan a registrar la información y diseño.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. La reunión de seguimiento al contrato se realizó el día 14 de noviembre, se contó con la presencia del Alcalde de Sabanagrande , otros funcionarios de la Alcaldía y dos concejales. Teniendo en cuenta inasistencia del CPC y de veedores el contratista informó que realizo seguimiento y presentó unos audios donde manifiestan que tenían compromisos laborales y personales, otros no contestaron como es el caso de los veedores. Interventoría le recomienda al contratista que para la próxima reunión se fortalezca el proceso de convocatoria y uno o dos días antes de la reunión realizar llamadas recordándoles, remitiendo mensajes al WhatsApp y a través de los correos disponibles. Pendiente que el contratista remita a la interventoría el día martes 19 de noviembre el acta de la reunión para revisión de interventoria con los respectivos soportes: listado de asistentes, registro fotográfico y adjuntar en el documento definitivo aprobado también la presentación que se proyecto.

4. ENTREGA DE CRONOGRAMA - PLAN DE CONTINGENCIA. Continúa pendiente, se esta a la espera de la respuesta a la gestión del otro si de prorroga del contrato.

5.GESTIÓN ICAN Y MININTERIOR. Continúa pendiente la gestión ante estas entidades de la respuesta, se espera que en la próxima reunión de seguimiento al contrato se tenga respuesta.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1. Gestión firma del área técnica la PQRSD N° 2	lunes, 18 de noviembre de 2024	Contratista
2. Definir fecha de campaña vial realizar gestión con Secretaria de Tránsito de Sabanagrande	lunes, 18 de noviembre de 2024	Contratista
3. Elabora Aviso informativo N°2 de campaña vial para publicar en redes sociales de la Alcaldía de Sabanagrande	martes, 19 de noviembre de 2024	Contratista
4. Remitir al contratista la plantilla modelo para que elabore el aviso informativo N°2	viernes, 15 de noviembre de 2024	Interventoria
5.Remitir a Interventoría el volante de invitación a la campaña de prevención y seguridad vial con la nueva reprogramación	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Contratista
6. Remitir para revisión de Interventoría el acta de la reunión de seguimiento al centrado realizada el 14-11-2024.	martes, 19 de noviembre de 2024	Contratista
7.Respuesta de gestión ante el ICANH y MININTERIOR	jueves, 21 de noviembre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 21/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LOURDES MUÑOZ GÓMEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCIONES	
ROCÍO FLÓREZ	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 62
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRIVEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Realizar seguimiento a las actividades del componente social del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL. Subprograma 1. Mano de obra contratada:
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4.ENTREGA DE PROGRAMACIÓN- PLAN DE CONTINGENCIA ACTIVIDADES SOCIALES PENDIENTE POR EJECUTAR EN EL CONTRATO
5.GESTIÓN DEL ICANH Y MININTERIOR.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 22 de noviembre de 2024, a las 3:30 p.m. se llevó a cabo la reunión de seguimiento al componente social del contrato LP-OP-004-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con la participación de las profesionales del área social por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES y la Interventoria Consorcio Odessa.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL
Subprograma 1. Mano de obra contratada: . La profesional social del contratista informa que no se ha evidenciado el ingreso de nuevo personal al contrato del AIDP.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.
Esta pendiente que el área técnica defina si se dará una nueva prorroga al contrato que vence el 4 de diciembre, por el momento no se ha ratificado ninguna información al área social, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en un porcentaje de avance del 57%, de cuerdo al PAGA Las actas de vecindad de cierre se programan al tener un avance del 90%. De igual forma esta a la espera de las directrices tanto del contratista como de la interventoria para ejecutar esta actividad.

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL
Subprograma 1. Atención a la comunidad.
***PQRSD**. La Profesional social del contratista informa que durante la ejecución del contrato se han atendido y formalizado el cierre de las PQRSD N° 1 Y N°2, donde a la fecha no se han recibido nuevas solicitudes.

Subprograma 2. Información y Divulgación
*** Ajustes al volante N° 5 de la campaña de Prevención y seguridad vial.** Esta pendiente realizar el ajuste de este volante una vez la profesional SST de interventoria que asumió la coordinación de esta actividad con la Secretaria de Transito de Sabanagrande. Esta pendiente por definir la fecha de acuerdo a lo informado para el día sábado, se espera que la próxima semana ya se tenga definido este tema, de lo contrario se debe replantear por parte del área social la actividad para ejecutarla.
Interventoría recomienda a la profesional social del contratista gestionar con la alcaldía y Secretaria de tránsito acciones durante la temporada de fin de año y comienzos del 2025 con medidas de controles viales (remitir comunicaciones) y de igual forma el contratista tomar las medida de seguridad desde el área SST en los tramos que tiene a cargo por la intervención de las obras.

FECHA: 22/11/2024 (Día / Mes / Año)

Subprograma 2. Información y Divulgación
Aviso Informativo. Pendiente la elaboración de esta pieza informativa una vez se defina la campaña de prevención y seguridad vial de acuerdo a lo hablado con el señor Alcalde de Sabanagrande para que se promociones y se informe desde el portal de la alcaldía la CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL que esta pendiente para ejecutar con la Secretaría de Tránsito de Sabanagrande.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. Pendiente que el contratista remita el acta ajustada de acuerdo a las observaciones remitidas por interventoría el día 19.11-2024.
Pendiente que el contratista informe la próxima fecha en la que se realizará la reunión de seguimiento al contrato.
Interventoria le recuerda al contratista que también esta pendiente las actividad pedagógicas establecidas en el documento PAGA aprobado: onde citan textualmente: " Una vez identificados los diferentes actores, instituciones educativas, organizaciones sociales y comunitarias entre otros grupos y sus respectivas características sociales, culturales y étnicas se deberán establecer las metodologías a implementar y el cronograma, de acuerdo con la disponibilidad de estos actores; su periodicidad dependerá del tiempo de duración del contrato. Dentro de la estructuración y desarrollo de dichas estrategias, se deberán identificar mediante visitas en conjunto con la misma comunidad y miembros del comité de participación comunitaria, aquellas situaciones de uso cotidiano que puedan deteriorar la vía como mal manejo de aguas domésticas y de los sistemas de productividad y aquellas que puedan generar riesgo en la seguridad vial, dadas las nuevas condiciones de la vía, además de posibles prácticas que afecten el uso del suelo, flora, fauna, recurso hídrico, entre otros" Se solicita que se programe de forma inmediata esta actividad.

4. ENTREGA DE CRONOGRAMA - PLAN DE CONTINGENCIA. Continúa pendiente, se esta a la espera de la respuesta a la gestión del otro si de prorroga del contrato.



5.GESTIÓN ICAN Y MININTERIOR. El día 2O de noviembre el contratista remitió correo al ICANH como también al MININTERIOR, el día 22 de noviembre se recibe numero de radicación de la solicitud al MININTERIOR para que el contratista procede a realizar el respectivo seguimiento.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1. Definir fecha de campaña vial realizar gestión con Secretaria de Tránsito de Sabanagrande	lunes, 25 de noviembre de 2024	SST Interventoría y contratista
2. Elabora Aviso informativo N°2 de campaña vial para publicar en redes sociales de la Alcaldía de Sabanagrande	martes, 26 de noviembre de 2024	Contratista
3.Remitir a Interventoría el volante de invitación a la campaña de prevención y seguridad vial con la nueva reprogramación	lunes, 25 de noviembre de 2024	Contratista
4. Remitir el acta de la reunión de seguimiento al centrado realizada el 14-11-2024.	martes, 19 de noviembre de 2024	Contratista
5.Seguimiento de respuesta del ICANH y MININTERIOR	miércoles, 27 de noviembre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LOURDES MUÑOZ GÓMEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCIONES	
ROCÍO FLÓREZ	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA 29/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 63
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA-SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento al componente de gestión social del contrato y de la vía terciaria en el municipio de Pondera Atlántico.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra Identificación de pendientes sociales
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4. INFORMES MENSUALES SOCIALES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El día 29 de noviembre del año en curso se realiza la reunión de seguimiento a las 2:00 p.m. con e objeto de realizar el seguimiento a las actividades sociales del contrato convenio de la vía terciaria en el municipio de Ponedera. Participaron las profesionales social del contratista y de la Intervetoria.
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra. La profesional social del contratista informa que no se han tenido ingresos nuevos de personal del área de influencia directa del proyecto, las dos personas que estaban vinculadas una renuncio y otra se le culminó el contrato, en este periodo no se reportó ingreso de personal nuevo al contrato. Interventoría le recomienda al contratista tener en cuenta y dar cumplimiento a la vinculación de personal local tanto de mano de obra no calificada como calificada. La profesional social comenta que en la reunión con el CPC y la comunidad el día 28 de noviembre la comunidad solicito oportunidad para vincularse a personas de la zona y hay la posibilidad por medio de un líder comunitario que las personas interesadas por un convenio del SENA se capaciten en actividades de asfalto y el contratista considera que en la etapa que empiecen a realizar labores de instalación de asfalto si hay personas capacitadas se tendrían en cuenta y de igual forma el contratista viene recepcionando hojas de vida del personal de la zona, para cuando se requiera personal se contactaran.
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS. Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos. **Actas de Vecindad de inicio subsanadas.** Se recuerda al contratista que está pendiente la entrega de la página 5 del acta de vecindad N° 46, para que se gestione con el área técnica ya que corresponde al plano del predio y deben tener en cuenta que debe estar debidamente firmada por las partes de acuerdo a lo establecido en el formato de acta de vecindad de incio. Interventoría gestionó a través de WhatsApp con el ing. José Manuel Tapias quién informó remitirla y aún no la han entregado para firma de interventoría.
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS. Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos. **Entrega de copias de las actas de vecindad.** De acuerdo a la información suministrada por el contratista se han entregado un total de treinta y tres coías de actas de vecindad de inicio a propietarios, donde inicialmente se tenía previsto adelantar el envío de la copia del AVI por WhatsApp y donde no se pudo hacer la entrega porque los propietarios no cuentan con este servicio y se procedió a realizar la entrega personalizada a los propietarios. Interventoría solicita proceder a remitir la información el día de hoy a la Interventoría teniendo en cuenta que es un compromiso establecido desde la semana anterior de acuerdo a lo establecido en el comité de seguimiento general al contrato del pasado 20-11-2024. La profesional social Briceida Bolívar informa que el día de hoy remite el soporte de la entrega de las actas a la fecha.
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS. Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos. Entrega de actas de compromiso pendientes. La profesional social del contratista Informa que las actas de compromiso correspondientes al predio donde funciona el SAU y BAÑO para los trabajadores se remitió la información directamente a la propietaria que se encuentra hospitalizada y se ha realizado gestión con la hija quién solicito que las remitiera también en formato digital, sin embargo no se ha recibido respuesta. Respecto al acta de compromiso del ZODME el Ing. Edson Tapias esta encargado de la respectiva gestión. Interventoria nuevamente solicita al contratista agilizar el proceso ya que no se han cumplido los compromisos establecidos a la fecha, deben dar atención inmediata a la entrega de las actas de compromiso que a la fecha no han sido remitidas como se ha establecido.

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL.

Subprograma 1. Atención a la comunidad. El contratista informa que ha venido brindando atención en la oficina del SAU ubicada en la parcela Manuela Isabel los días viernes de 8 a.m. hasta las 12 m. Interventoria le solicita al contratista información sobre la gestión al derecho de petición remitido por interventoría el 20-11-2024 correspondiente a la reclamación del pago presentada por la Sra. Consuelo Fernández Vizcaino. La profesional social informa que ella le traslado la información al Ing. Edson tapias el mismo día que la recibió y las directrices que recibió fue que el se encargaría de atender la solicitud. Interventoría solicita nuevamente proceder a realizar gestión y brindar la atención de acuerdo a la solicitud presentada.

Subprograma 2. Información y Divulgación.

Interventoría le recuerda al contratista realizar gestión con la inspección de Policía de la Giralda encargados de operativos y acompañamiento para que realicen la gestión de acampamiento en procesos de prevención y seguridad vial teniendo en cuenta que como entidad tienen jurisdicción en el tramo vial en intervención. Se les recuerda que la semana anterior interventoría les remitió los datos del inspector encargado con quién también realizó contacto y esta a la espera de que el contratista se comunique con ellos.

Se recomienda tener en cuenta que si van a realizar la campaña de prevención y seguridad vial tengan en cuenta la temporada de vacaciones de fin de año y principios del 2024 donde internamente se establezcan las medidas de seguridad vial por parte del contratista y también con divulgación a los diferentes actores viales fortaleciendo la divulgación del PMT. Continúa pendiente el compromiso de gestión y definir la ejecución de la campaña o actividades de prevención y seguridad vial.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. El día 28 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la reunión de seguimiento al contrato se contó con la participación de integrantes de del comité de participación comunitaria y habitantes y propietarios de predios. Han informado que realizaron gestión en la Alcaldía de Ponedera para que defina y autoricen temas con ellos sin embargo manifestaron que no fueron atendidos, el día lunes de la próxima semana volverán a realizar gestión para la ayuda en la instalación de tubos para la solucionar el problema de las inundaciones que se han venido presentando desde años anteriores. Confirman que en el mismo mes de noviembre con interventoría y el contratista estuvieron realizando recorrido a los sitios donde se presentan las dificultades pero como hay situaciones que dependen del apoyo de la Alcaldía seguirán gestionando como comunidad. Se le solicita por parte de Interventoría al contratista remitir el acta de la reunión para la respectiva revisión donde se adjunte los soportes de registro y asistencia, registro fotográfico, presentación con la información brindada a la comunidad.

4..INFORMES MENSUALES SOCIALES

Se le recuerda por parte de la interventoría a la profesional social del contratista organizar los soportes y archivos y remitirlos a la profesional encargada de la elaboración del informe mensual social N° 9 del mes de noviembre de 2024, para que procedan a rediar oportunamente este informe el 5 de diciembre de 2024.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Remitir a interventoria los soportes de entrega de las copias de actas de vecindad de inicio a propietarios	viernes 29/11/2024	Contratista
2. Remitir a la interventoría las actas de compromiso levantadas	Ala mayor brevedad	Contratista
3. Entrega del informe mensual social del mes de noviembre de 2024	jueves 05/12/2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 5/12/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Briceida Bolívar	Profesional Social	Consorcio La Giralda Contratista	
Rocío Flórez	Profesional Social	Consorcio ODESSA - Interventoría	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 64
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-004-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CRIVEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Realizar seguimiento a las actividades del componente social del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCIAL. Subprograma 1. Mano de obra contratada:
2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos
3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL Subprograma 1. Atención a la comunidad Subprograma 2. Información y Divulgación Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria
4.ENTREGA DE PROGRAMACIÓN- PLAN DE CONTINGENCIA ACTIVIDADES SOCIALES PENDIENTE POR EJECUTAR EN EL CONTRATO
5.ENTREGA DEL INFORME MENSUAL SOCIAL DE NOVIEMBRE.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 29 de noviembre de 2024, a las 4:00 p.m. se llevó a cabo la reunión de seguimiento al componente social del contrato LP-OP-004-2023 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con la participación de las profesionales del área social por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES y la Interventoria Consorcio Odessa.

1. PROGRAMA 6. GESTIÓN LOCAL

Subprograma 1. Mano de obra contratada: La profesional social del contratista informa que no se ha evidenciado el ingreso de nuevo personal al contrato del AIDP. De acuerdo a la información del área SST de interventoría en el mes se generaron (39) empleos de los cuales (12) corresponden a personas vinculadas como mano de obra no calificada local.

2. PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos.

Se informa a la profesional social del contratista por parte de la interventoría y de acuerdo a lo informado por parte del área técnica deben proceder a programar el levantamiento de las actas de vecindad de cierre en los tramos donde ya se han colocado los bordillos y se han realizado las adecuaciones, se informa que el día martes se iniciará la gestión con los propietarios.

***Actas de compromiso:** Continúan abiertas las actas de compromiso correspondientes alos consecutivos N° 1 y 2.

3. PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 1. Atención a la comunidad.

***PQRSD**. La Profesional social del contratista informa que durante la ejecución del contrato se han atendido y formalizado el cierre de las PQRSD N° 1 Y N°2, donde a la fecha no se han recibido nuevas solicitudes y se ha venido brindando atención cada semana en la oficina del SAU en obra.

Subprograma 2. Información y Divulgación

*** Ajustes al volante N° 5 de la campaña de Prevención y seguridad vial.** Esta pendiente por parte de la profesional social del contratista, realizar el ajuste de este volante y remitirlo a interventoría, la fecha de la actividad esta programada para el día jueves 5 de diciembre del año en curso, el punto de encuentro será la tienda la Cascada ubicada frente al tramo en intervención.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

Subprograma 2. Información y Divulgación
Aviso Informativo. Continúa pendiente la elaboración de esta pieza informativa una vez se defina la campaña de prevención y seguridad vial de acuerdo a lo hablado con el señor Alcalde de Sabanagrande para que se promociones y se informe desde el portal de la alcaldía la CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL que esta pendiente para ejecutar con la Secretaría de Tránsito de Sabanagrande. Se debe dar prioridad a la divulgación de esta información. Se estableció que el contratista remitirá el volante de invitación a la campaña de prevención y seguridad vial a los veedores y al comité de participación comunitaria como a la alcaldía, a comunicaciones de la Alcaldía y personería municipal y divulgación con los diferentes actores viales y habitantes del AIDP.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria. Pendiente que el contratista remita el acta ajustada de acuerdo a las observaciones remitidas por interventoría el día 19.11-2024. Se requiere la entrega inmediata de esta información a la cual se debe adjuntar registro fotográfico formato INVIAS que se ha venido implementando, registro de asistencia y presentación con la información dada a conocer con los avances del contrato, se solicita la entrega inmediata de esta información.
Queda pendiente la programación de las reuniones con la veeduría y el comité de participación comunitaria una vez se defina la prorroga del contrato.

4. ENTREGA DE CRONOGRAMA - PLAN DE CONTINGENCIA. Continúa pendiente, se esta a la espera de la respuesta a la gestión del otro si de prorroga del contrato.


5.ENTREGA DEL INFORME MENSUAL SOCIAL DE NOVIEMBRE DE 2024. Se solicita al contratista radicar oportunamente el 5 de diciembre de 2024 el informe mensual social del mes de noviembre de 2024. Para que proceda a la organización de los soportes y anexos de cada programa que fueron ejecutados.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1. Definir fecha de campaña vial realizar gestión con Secretaria de Tránsito de Sabanagrande	jueves, 5 de diciembre de 2024	Contratista
2. Elaborar Aviso informativo N°2 de campaña vial para publicar en redes sociales de la Alcaldía de Sabanagrande	martes, 26 de noviembre de 2024	Contratista
3.Remitir a Interventoría el volante de invitación a la campaña de prevención y seguridad vial con la nueva reprogramación	viernes, 29 de noviembre de 2024	Contratista
4. Remitir el acta de la reunión de seguimiento al centrado realizada el 14-11-2024.	viernes, 29 de noviembre de 2024	Contratista
5.Realizar el levantamiento de actas de vecindad de cierre en tramos donde se han instalado bordillos	martes, 3 de diciembre de 2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LOURDES MUÑOZ GÓMEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCIONES	
ROCÍO FLÓREZ	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ODESSA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5

NOVIEMBRE 2024

CONTENIDO

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

5.3 Informes especialistas y profesionales

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

5.5 Informe matriz de riesgos.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

CAPITULO 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

Tabla 1 Información del contrato de interventoría

No. Proceso	CMA-DEO-SVR-070-2023
Contrato Nº:	**4805 DE 2023**
Fecha suscripción Contrato	**5 de diciembre de 2023**
Aprobación Cesión	N/A
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1.
Contratos de obra objeto de seguimiento	Contrato No 1. LP-001-2023. LA GIRALDA – SANTA RITA Contrato No 2. SG-LP-OP-004-2023. SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO
Contratista:	CONSORCIO ODESSA
Nit	901.513.605-6.
Conformado por:	CGR S.A.S (95%) Nit. 830.076.603-9 CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. (5%) Nit. 900.804.544-0
Representante legal:	OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Valor inicial:	**$ 1.529.977.628,00**
Valor adicional	N/A
Anticipo:	$ 257.139.097,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No. 1	Diez (10) meses
Fecha Prorroga No. 1	12 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024
Fecha reanudación No. 1	1 de febrero de 2024
Fecha de terminación Actual:	14 de diciembre de 2024

5.1.1 Información de modificaciones, adiciones y prorrogas.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las prórrogas, adiciones y modificaciones al contrato principal.

Tabla 2 Modificaciones, adiciones y prorrogas.

Modificación No.	Fecha	Descripción de la Modificación
1 (Prorroga No. 1)	12/02/2024	Prorrogar el plazo del Contrato No. 4805 de 2024, desde el 14 de febrero de 2024 y hasta el 14 de diciembre de 2024.

En el presente mes se no se realizan modificaciones, prorrogas y adiciones al contrato de interventoría. La última prorroga suscrita se dio en el mes de febrero de 2024.

5.1.2 Información sobre las garantías contractuales

Tabla 3 Garantías contractuales

Amparo	Aseguradora	Póliza N°	Valor asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	Mundial de seguros S.A.	M-100217062	$ 152.997.762,80	23/01/2024	14/06/2025
Buen Manejo del Anticipo	Mundial de seguros S.A.	M-100217062	$ 257.139.097,10	23/01/2024	14/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Mundial de seguros S.A.	M-100217062	$ 305.995.525,60	23/01/2024	14/12/2027
Calidad del Servicio	Mundial de seguros S.A.	M-100217062	$ 458.993.288,40	14/12/2024	14/12/2029

Las Garantías Contractuales amparan el presente contrato y se encuentran registradas en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría.

Las pólizas del contrato de interventoría se encuentran actualizadas a la prórroga No. 1, suscrita el 12 de febrero de 2024, mediante anexo No. 5.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

La interventoría en el desarrollo de sus funciones de acuerdo con el contrato 4805 de 2023 y el Manual de interventoría obra pública 2022, ha realizado las siguientes actividades generales para la etapa de complementación de estudios y diseños de los contratos de obra y ejecución de actividades de obra.

- ✓ Se ha requerido al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el pliego de condiciones en cuanto a la documentación para el inicio de obra y etapa de estudios y diseños.
- ✓ Se han verificado las garantías del contrato de obra.
- ✓ Se realiza seguimiento a la inversión y buen manejo del anticipo para el Contrato del Municipio de Sabanagrande.
- ✓ Se han elaborado conceptos de revisión de la complementación de estudios y diseños del contrato. En el presente mes de elaboraron conceptos del componente de hidrología y drenaje vial en el municipio de Sabanagrande.
- ✓ Se ha realizado la revisión de la programación de obra, programa de inversiones, plan de inversión del anticipo y análisis de precios unitarios.
- ✓ Seguimiento a los programas contemplados en el documento PAGA, así como la identificación si es el caso de los permisos ambientales que se deben tramitar ante las autoridades competentes para el desarrollo de las obras.
- ✓ Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en los documentos del convenio frente a los exigidos en los documentos que dieron origen a los contratos derivados y si es el caso solicitar los ajustes correspondientes a la administración municipal.
- ✓ Seguimiento a la ejecución de actividades de obra entre las que se encuentran explanaciones, instalación de subbase e instalación de concreto para pavimento rigido en el Municipio de Sabanagrande.
- ✓ Seguimiento a la ejecución de actividades de explanación e instalación de mejoramiento de subrasante.
- ✓ Revisión de actas de vecindad y actas de compromiso.
- ✓ Revisión y aprobación de actas de recibo parcial.
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

- **Actividades Administrativas**

✓ Elaboración de los siguientes informes semanales:

  - Municipio de Sabanagrande: Informes semanales del 36 al 39.

- Municipio de Ponedera: Informe semanal 33 a 37.

✓ Elaboración de informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2024.

✓ Elaboración de actas de comité y acta de reunión de seguimiento a los dos contratos de obra.

Se presenta a continuación las actividades específicas realizadas en cada uno de los contratos en relación con el área técnica.

5.2.1 Actividades técnicas

a) Vía La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

✓ Remisión a municipio de requerimientos relacionados con cuentas bancarias de los convenios.

✓ Revisión y seguimiento a garantías del contrato. Se ha recomendado al Municipio de Ponedera, proceso sancionatorio por incumplimiento del contratista en la actualización y corrección de pólizas.

✓ Seguimiento a actividades con presunto incumplimiento por parte del contratista de obra.

✓ Revisión de señalización de obra y PMT.

✓ Revisión de replanteo de diseño geométrico en campo.

✓ Seguimiento a ejecución de explanaciones e instalación de mejoramiento de subrasante del K0+000 a K0+860.

b) Vía Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

✓ Replanteo de topografía en campo y localización de eje

✓ Seguimiento y control para explanaciones e instalación de subbase.

✓ Seguimiento técnico a la instalación de concreto del pavimento rígido.

✓ Control de topografía a localización y replanteo del diseño geométrico, así como control de niveles de capas de la estructura de pavimento.

✓ Revisión de APUS y programación.

✓ Revisión de balance de obra con los diseños entregados hasta la fecha.

✓ Revisión y seguimiento a garantías del contrato.

- ✓ Realización de ensayos de laboratorio de los materiales empleados por el contratista para la ejecución de las obras.
- ✓ Seguimiento a ejecución de subbase y concretos para pavimento rígido entre el K1+550 al K0+960.

5.3 Informes de especialistas y profesionales

5.3.1 Informes especialistas para Ponedera

Con relación a la etapa de estudios y diseños del contrato de obra, a continuación, nos permitimos relacionar los conceptos generados por los especialistas a los documentos enviados por el Contratista CONSORCIO LA GIRALDA.

Tabla 4 Informes especialistas Interventoría – Pondera

VOLUMEN	CONCEPTO INTERVENTORÍA	FECHA
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Informe del 01 al 30 de noviembre de 2024	noviembre 2024

5.3.2 Informes especialistas para Sabanagrande

Con relación a la etapa de estudios y diseños del contrato de obra, a continuación, nos permitimos relacionar los conceptos generados por los especialistas a los documentos enviados por el Contratista CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S.

Tabla 5 Informes especialistas Interventoría – Sabanagrande

VOLUMEN	OFICIO/CONCEPTO	FECHA
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Informe del 01 al 30 de noviembre de 2024	noviembre 2024

Se presentan como anexo los informes del profesional social e informe SST.

5.4 Informe del programa anual de caja PAC.

No se requiere el informe anual de caja PAC.

5.5 Informe matriz de riesgos

No se ha materializado ningún riesgo de los estipulados en la matriz.

5.6 Información otros programas y aplicativos.

5.6.1 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

No se ha requerido dicha gestión dado que no han finalizado las obras y el ente contratante de las mismas son Municipios del Atlántico y no el INVIAS.


INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORMES ESPECIALISTAS

NOVIEMBRE 2024

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL LOTE 1PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

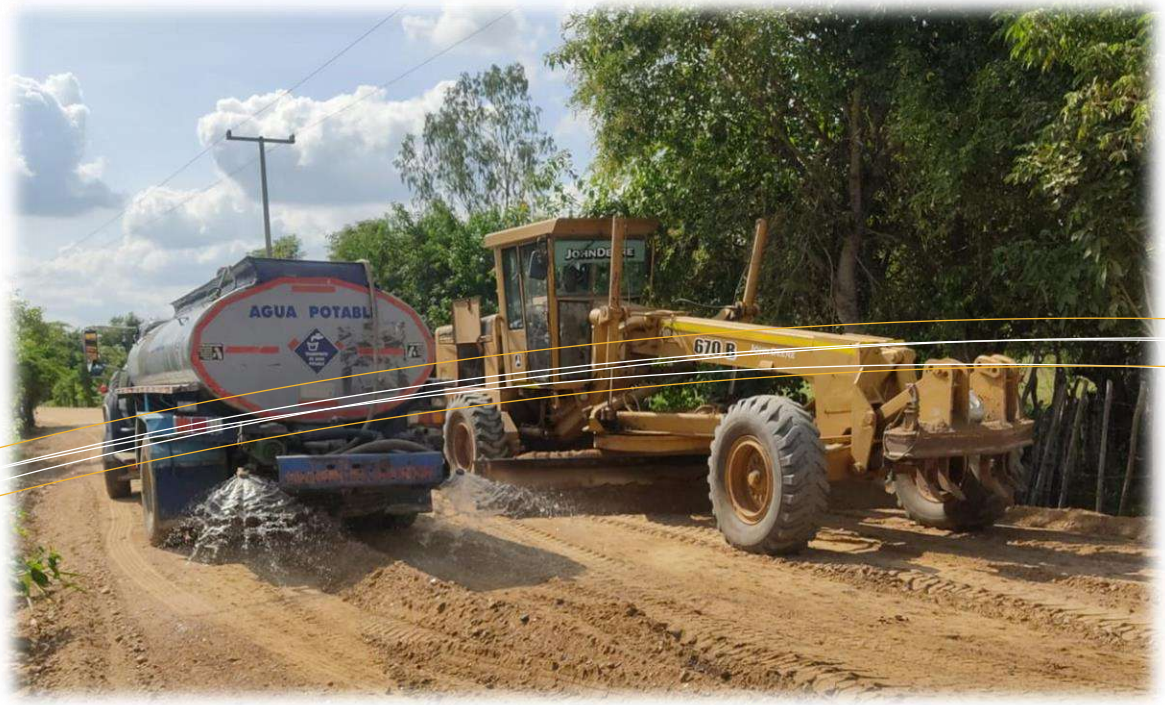

INFORME EJECUTIVO AMBIENTAL

5.3

NOVIEMBRE 2024

CONTENIDO

5.3.1 GESTIÓN AMBIENTAL - Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico).

Programa 1: Gestión del proyecto.

Programa 2: Manejo de las actividades constructivas.

Programa 3: Gestión Hídrica.

Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.

5.3.2 GESTIÓN AMBIENTAL- Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico).

Programa 1: Gestión del proyecto.

Programa 2: Manejo de las actividades constructivas.

Programa 3: Gestión Hídrica.

Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.

5.3.1 GESTIÓN AMBIENTAL - Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico).

Programa 1: Gestión del proyecto.

- Subprograma 1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental
- Subprograma 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra
- Subprograma 3. Cumplimiento de requerimientos legales

Subprograma 1. El grupo de gestión socio ambiental se encargó de mantener la señalización de la obra e instalaciones temporales, realizar las inducciones y capacitaciones al personal, supervisar la humectación de la vía, recibir y controlar los materiales pétreos de los proveedores autorizados, llevando registro del manejo adecuado de estos, atendiendo, además, observaciones en campo y documentales, elaborando los informes mensuales de cada área.

La Interventoría mediante comunicado C-T-135-390-2024 del 6 de noviembre de 2024 aprobó el informe mensual de seguimiento al PAGA correspondientes al mes de octubre de 2024.

Mediante comunicado C-T-135-407-2024, Interventoría presentó al INVIAS el tercer informe trimestral ambiental, el cual fue aprobado posteriormente por medio de oficio 2024S-VBOG-087855.

Subprograma 2: El contratista realizó inducciones y capacitaciones al personal que ingresó a la obra, para dar cumplimiento a las actividades contractuales de obligatorio cumplimiento y establecidas dentro de los programas del PAGA.





Charlas diarias a los trabajadores

Subprograma 3: El contratista presenta a los inspectores de obra los recibos de las remisiones de los materiales con el fin de comprobar su procedencia y demostrar

que están siendo adquiridos a los proveedores presentados en el PAGA. El Contratista viene presentando en los informes mensuales las diferentes certificaciones de los proveedores con la cantidad suministrada a la obra y el registro del agua en bloque adquirida para la obra.

Adicionalmente la Interventoría evidenció que el Contratista viene realizando el lavado de las mixers en el pozo acondicionando para esta labor dentro del predio que viene utilizando como campamento en el K1+800.





Utilización del pozo para el lavado de las mixers

Programa 2: Manejo de las actividades constructivas.

- Subprograma 1. Manejo integral de materiales de construcción
- Subprograma 2. Señalización para el manejo ambiental de frentes de obra y sitios temporales
- Subprograma 3. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.
- Subprograma 4. Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.

Subprograma 1: El contratista viene realizando la instalación de los materiales sobre un carril de la vía para que este sea extendido diariamente durante la jornada laboral, manteniendo la señalización y demarcación de los materiales y realizando el control del material particulado con el riego de agua para el control de las emisiones de polvo.




Instalación de materiales en obra

Subprograma 2: Durante el mes de noviembre el Contratista mantuvo la señalización instalada en el tramo, al ir avanzando en los frentes de trabajo se fueron colocando señales preventivas e informativas, al igual que la demarcación con cintas de seguridad vial en las áreas de trabajo. Los auxiliares de tráfico permanecieron en los frentes de trabajo activos ayudando en el control de los transeúntes para evitar posibles accidentes.





Señalización en la vía

Subprograma 3: Parte del material de excavación y corte fue reutilizado por el Contratista para el mejoramiento de la subrasante y la conformación de los respaldos de los bordes de la vía.

Subprograma 4: El Contratista mantuvo un punto ecológico dentro del campamento para la separación y clasificación de los residuos sólidos que se generen en obra, como el campamento se encuentra ubicado dentro de la ruta de recolección de la empresa del servicio de aseo "Triple A", los residuos son recogidos los lunes, miércoles y viernes y llevados para su disposición final al relleno sanitario "Parque Ambiental Los Pocitos".

Programa 3: Gestión Hídrica.

- Subprograma 1. Manejo de aguas superficiales

Subprograma 1: La empresa Aguas de Malambo viene suministrando al Contratista agua no tratada en bloque para las diferentes actividades de obra tales como: humectación de la vía para el control de emisiones de material particulado, humectación de la subbase y del concreto. El agua es almacenada en un isotanque de un metro cubico y transportado en el platón de una camioneta, el cual tiene adaptado un tubo perforado que hace la función de flauta y ayuda a distribuir uniformemente el agua sobre la vía.





Riego de la vía para el control de material particulado

Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de: maquinaria y equipos.

- Subprograma 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.
- Subprograma 2: Manejo de maquinaria equipos y vehículos.

Subprograma 1: Durante el periodo de reporte el Contratista mantuvo el predio alquilado para el almacenamiento de materiales y sustancias químicas, acopio de herramientas y equipo, parqueo de maquinaria, pozo para el lavado de las mixers y el funcionamiento de la oficina – SAU de la obra. Dentro del campamento se encuentra dos baños para el servicio de los trabajadores, los cuales están conectados a un pozo séptico, además, se encuentra el botiquín y camilla de emergencia, punto ecológico.





Áreas del campamento del Contratista

Subprograma 2: El contratista presentó al área SST de la Interventoría, la documentación legal de la maquinaria y equipos trasladados al proyecto para su revisión y aprobación. Los operadores diariamente hacen los preoperacionales para verificar el adecuado funcionamiento de la maquinaria y equipos.





Maquinaria en obra

5.3.2 GESTIÓN AMBIENTAL- Subprograma La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico).

Programa 1: Gestión del proyecto.

- Subprograma 1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental
- Subprograma 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra
- Subprograma 3. Cumplimiento de requerimientos legales

Subprograma 1: El Contratista durante el mes de noviembre continuo con actividades de topografía, corte de subrasante, explanación, transporte e instalación de subbase.

Interventoría mediante comunicación C-T-135-384-2024 del 5 de noviembre de 2024, realizó observaciones al informe de seguimiento ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024, el cual, posteriormente fue aprobado mediante comunicación C-T-135-393-2024 del 8 de noviembre del presente año.

Interventoría mediante comunicaciones C-T-135-389-2024 solicitó al Contratista evacuar el material de excavación acopiado a los costados de la vía hacia el Zodme avalado por la Interventoría ubicado en el predio Villa San Diego del municipio de Ponedera.

Interventoría mediante comunicaciones C-T-135-396-2024 del 11 de noviembre de 2024 le reiteró al Consorcio La Giralda que de parte de Interventoría no se acepta la donación de material de excavación a la comunidad, debido a la complejidad ambiental del área de influencia directa del proyecto, teniendo en cuenta que es una zona inundable del río Magdalena.

Interventoría mediante comunicación C-T-135-413-2024 del 19 de noviembre de 2024, realizó observaciones al informe de seguimiento ambiental correspondiente al mes de octubre de 2024.





Grupo de gestión socio ambiental

Subprograma 2: El contratista realizó inducciones y capacitaciones al personal que ingresó a la obra, para dar cumplimiento a las actividades contractuales de obligatorio cumplimiento y establecidas dentro de los programas del PAGA.



Charlas al personal de obra

Subprograma 3: El contratista presenta a los inspectores de obra los recibos de las remisiones de los materiales con el fin de comprobar su procedencia y demostrar que están siendo adquiridos a los proveedores presentados en el PAGA. Los materiales están siendo transportados por Saez Minería Suministros y JM Transporte del Caribe y suministrados por la Sociedad A&T Soluciones Integrales y su Cantera El Encanto.

Programa 2: Manejo de las actividades constructivas

- Subprograma 1. Manejo integral de materiales de construcción.
- Subprograma 3. Señalización para el manejo ambiental de frentes de obra y sitios temporales.
- Subprograma 4. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.
- Subprograma 5. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.
- Subprograma 6. Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales.

Subprograma 1: El contratista viene realizando la instalación de los materiales sobre un carril de la vía para que este sea extendido diariamente durante la jornada laboral, manteniendo la señalización y demarcación de los materiales y realizando el control del material particulado con el riego de agua para el control de las emisiones de polvo.





Transporte e instalación de materiales

Subprograma 3: Durante el mes de noviembre el Contratista realizó la instalación de señalización en el tramo a intervenir, al ir avanzando en los frentes de trabajo se fueron colocando señales preventivas e informativas. Los auxiliares de tráfico permanecieron en los frentes de trabajo activos ayudando en el control de los transeúntes para evitar posibles accidentes.





Señalización instalada y auxiliar de tráfico

Subprograma 4: Los residuos de construcción y/o demolición (RCD) se dispusieron en el zodme aprobado por Interventoría en el predio Villa San Diego en el municipio de Ponedera.





Zodme Villa San Diego

Subprograma 5: Los residuos sólidos se vienen acopiando y almacenando en bolsas de colores, según el tipo de residuo, hasta el momento y por la poca cantidad generada, aún no se hace la primera entrega de residuos sólidos convencionales para su disposición final a la empresa de aseo del municipio. El Contratista realiza periódicamente jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo.

Subprograma 6: No aplica, esta actividad se tiene contemplada en el PAGA en dado caso que se lleguen a presentar eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales.

Programa 3: Gestión Hídrica.

- Subprograma 1. Manejo de aguas superficiales.

Subprograma 1: Mediante un carro tanque se viene haciendo el transporte y distribución del agua necesaria para las actividades de obra, el proveedor de este servicio es la empresa Aguas de Malambo.



Uso del agua en obra

Programa 5: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.

- Subprograma 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.
- Subprograma 3. Instalación, funcionamiento manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Subprograma 1: El contratista cuenta con un campamento ubicado en el predio "Manuela Isabel" en el PR 1+980 de la vía que conduce a la vereda Santa Rita y El Viejo, del municipio de Ponedera, allí se estará haciendo el acopio de materiales, así como el uso del baño para los trabajadores y funcionará la oficina de atención al usuario SAU.

Subprograma 3: El contratista presentó al área SST de la Interventoría, la documentación legal de la maquinaria y equipos trasladados al proyecto para su revisión y aprobación. Para el inicio de las actividades y el mantenimiento de vía, se contó con una motoniveladora, un retro cargador (pajarita) y un vibro compactador.



Maquinaria en obra

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico).

- El Contratista debe continuar con el seguimiento a los programas del PAGA y el cumplimiento de los indicadores planteados como lo ha estado haciendo hasta el momento.

- Es pertinente que el Contratista entregue a tiempo los informes mensuales de gestión ambiental con el fin de mantener actualizada la información y de esta manera poder presentar a tiempo los informes trimestrales al Invias.

- Se recomienda al Contratista implementar periódicamente jornadas de orden y aseo en los frentes de trabajo, así como paisajear el material que se viene dejando para la protección de los hombros del pavimento rígido.

Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico).

- El Contratista debe ponerse al día en la entrega de los informes mensuales de gestión ambiental, teniendo en cuenta que al no presentarlos incurre en un incumplimiento contractual y puede acarrear sanciones económicas.

- El Contratista debe continuar con la implementación de los programas del PAGA que aún no se han ejecutado, así como continuar con la aplicación de los que sí y el cumplimiento del cronograma de actividades planteado.


- Interventoría no autoriza donaciones de materiales en este proyecto, debido a la complejidad ambiental que presenta el área de influencia directa, teniendo en cuenta que es una zona inundable.

- El contratista de obra debe realizar las adecuaciones necesarias para el funcionamiento adecuado del predio (Villa San Diego) que va a ser utilizado como zodme, según lo planteado en el Acta de Reunión No. 40 y 57.

- Es importante que el Contratista haga uso del zodme autorizado por la Interventoría con el fin de evitar la generación de impactos negativos por la mala disposición del material de excavación.

- Se recomienda la implementación de un pozo para el lavado de las mixers previo al inicio de la instalación del concreto en el proyecto, este pozo no puede estar cerca de zonas inundables ni de cuerpos de agua y debe permanecer impermeable.

- El Contratista debe presentar la subsanación de las observaciones hechas por el Invias al PAGA y la actualización del documento, como se ha estado solicitando reiterativamente por parte de la Interventoría.



LINA PATRICIA CARVAJAL SUÁREZ
Especialista Ambiental Interventoría

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL LOTE 1 PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS







INFORME EJECUTIVO SOCIAL

5.1

NOVIEMBRE 2024

CONTENIDO

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

5.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL
5.2.1. Programa 6. Gestión Social – Mano de obra contratada
5.2.2. Programa 7. Comunidades étnicas, preservación del patrimonio socio cultural
5.2.3. Programa 8. Gestión social de Infraestructura de predios y servicios públicos
5.2.4. Programa 10. Participación, Gobernanza e inclusión social

5.3. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SOCIAL AL CONTRATO
5.3.1. Informes mensuales sociales del Contratista
5.3.2. Correspondencia
5.3.3. Reuniones de seguimiento social a los contratos
5.3.4. Informes trimestrales sociales de la Interventoría
5.3.5. Oficios recibidos de INVIAS

5. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES


5.1. Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El proyecto comprende el MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vía terciaria que se localizada al occidente del municipio de Sabanagrande, conectando los sectores de SABANANGRANDE a los límites con POLONUEVO en longitud de 5.1 Km.

El contrato de obra comprende la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, siendo esta una actividad preliminar a la ejecución de obras que permitirán definir las intervenciones, estructuras y precisar el alcance en la ejecución de las obras.

Los presupuestos realizados para la suscripción del convenio 2221-2023 y contrato de obra SG-LP-OP-004-2023 proyectan una intervención de la siguiente manera:

- 2150 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido y obras de drenaje.
- 3335 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada existente e instalación de afirmado.
- Se proyectan anchos de 5.50 m, los cuales será revisados en la etapa de estudios y diseños y dependerán del estudio de tránsito y diseño geométrico de la vía.

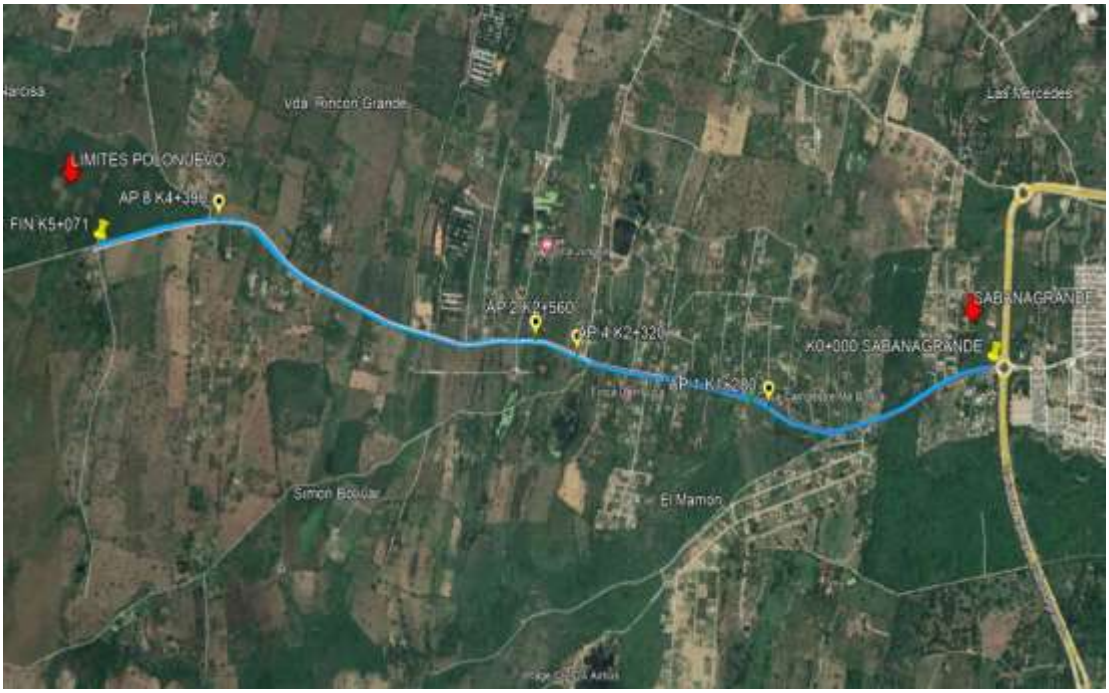

a) Localización Proyecto Sabanagrande – Limites Polonuevo (Sabanagrande – Atlántico)

El corredor de 5.1 Km de longitud corresponde a una vía terciaria que se localiza en el Municipio de Sabanagrande – Departamento del Atlántico, entre la Glorieta de salida de Sabanagrande hasta los límites con el Municipio de Polonuevo.

5.2. Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

El proyecto comprende el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, vía terciaria que se localizada al sur del municipio de Ponedera conectando los sectores de LA GIRALDA y SANTA RITA EL VIEJO en longitud de 9.6 Km.


El contrato de obra comprende la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños, siendo esta una actividad preliminar a la ejecución de obras que permitirán definir las intervenciones, estructuras y precisar el alcance en la ejecución de las obras.

Los presupuestos realizados para la suscripción del convenio 2220-2023 y contrato de obra LP-001-2023 proyectan una intervención de la siguiente manera:

- 3980 m de actividades de mejoramiento con pavimento rígido y obras de drenaje.
- 5850 m de actividades de mantenimiento periódico con conformación de calzada e instalación de afirmado.
- Se proyectan anchos de 5.50 m, los cuales será revisados en la etapa de estudios y diseños y dependerán del estudio de tránsito y diseño geométrico de la vía.

No obstante, es pertinente precisar que las metas físicas definitivas del contrato de obra, dependerán de la complementación de los estudios y diseños que viene adelantando el contratista, por lo cual las cantidades serán ajustadas una vez se surta la entrega y aprobación de cada uno de los volúmenes de diseño.

a) Localización Proyecto La Giralda - Santa Rita (Ponedera – Atlántico)

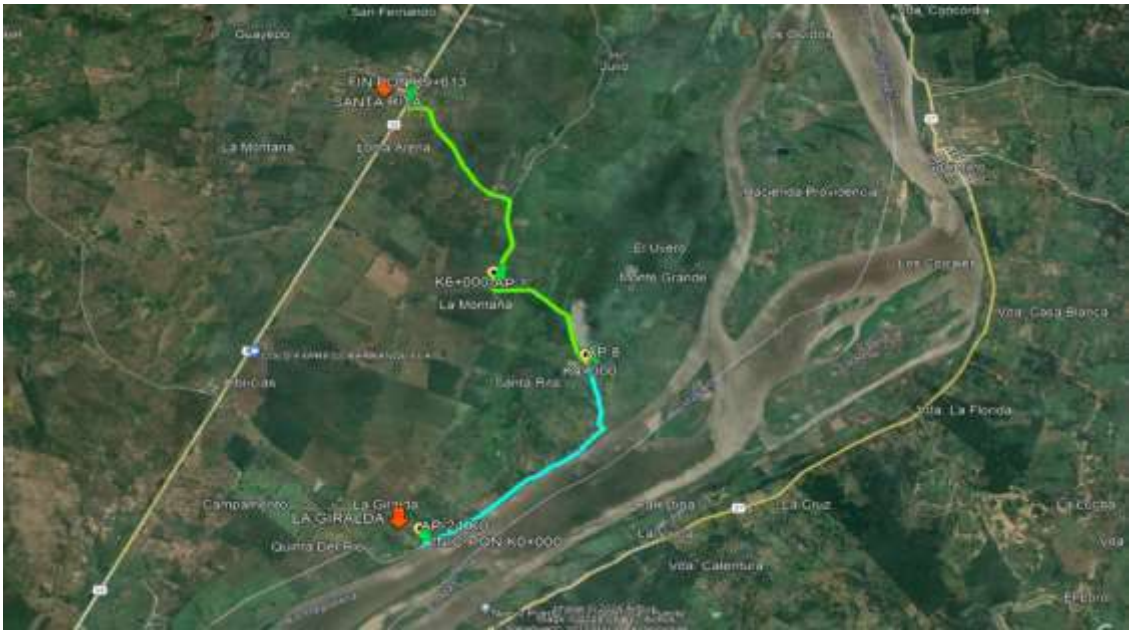

El corredor vial de 9.6 Km de longitud corresponde a una vía terciaria localizada en el Municipio de Ponedera – Departamento del Atlántico, entre el sector conocido como La Giralda específicamente en el Ferry para Salamina y transcurre por la rivera del rio Magdalena hasta conectar la vía principal de Ponedera a Puerto Giraldo en cercanías al corregimiento de Santa Rita.

5.2. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

5.2.1. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL.

Proyecto Sabanagrande:

Subprograma 1. Mano de obra contratada con enfoque de género de derechos y diferencias.

Tabla N° 1. Mano de obra vinculada al proyecto de Sabanagrande

TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	INFORMACIÓN DEL PERIODO	
	N° EMPLEOS DEL PERIODO	ACUMULADO
MONC del AIP*	3	18
MONC foránea	2	20
MOC del AIP	0	0
MOC foránea	0	12
TOTAL, GENERAL	5	50

- Para este periodo de noviembre de 2024, de acuerdo al soporte del área SST, el contratista de Sabanagrande reporta un total de (39) personas vinculadas al contrato en noviembre**.**
- El personal vinculado en el periodo por parte de la interventoría corresponde a (9) personas**.**

Proyecto Ponedera:

Tabla N° 2. Mano de obra vinculada al proyecto de Ponedera

TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	INFORMACIÓN DEL PERIODO	
	N° EMPLEOS DEL PERIODO	ACUMULADO
MONC del AIP*	**0**	3
MONC foránea	**0**	2
MOC del AIP	**0**	0
MOC foránea	**0**	14
TOTAL, GENERAL	**0**	**19**

- En este periodo de noviembre, el contrato reportó la vinculación de (12) personas en este periodo.
- El personal vinculado en el periodo por parte de la interventoría corresponde a (9) personas**.**

5.2.2. PROGRAMA 7. COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO, SITIOS DE INTERES SOCIO CULTURAL

Las consultas adelantadas ante entidades se encuentran en el siguiente estado:

Proyecto Sabanagrande:

Subprograma 1. Programa de arqueología preventiva Consulta ICANH. El Contratista el 21 de mayo del año en curso remite a la entidad la comunicación OBR-SOC-014-2024, donde a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la entidad. Interventoría le ha solicitado al contratista realizar gestión para la respuesta de la entidad. Nuevamente el 20 de noviembre del año en curso el contratista remite a la entidad correo recordando el tramite remitido en el mes de mayo, del cual está pendiente la respuesta.

Subprograma 2. Protección al patrimonio cultural -Consulta a la Dirección nacional de consulta previa- DANCP -MININTERIOR. El Contratista el 21 de mayo del año en curso remite correo a la entidad, donde a la fecha no se ha recibido respuesta. Interventoría le ha solicitado al contratista realizar gestión para la respuesta de la entidad. Nuevamente el 20 de noviembre del año en curso el contratista remite a la entidad correo recordando el tramite remitido en el mes de mayo del cual está pendiente la respuesta. Nuevamente el 20 de noviembre del año en curso el contratista remite a la entidad correo recordando el tramite remitido en el mes de mayo, continúa pendiente la respuesta.

Proyecto Ponedera:

Subprograma 1. Programa de arqueología preventiva Consulta ICANH. En el mes de febrero del año 2024, con el radicado de entrada No. **Entrada** 2024184200027632, el contratista, realizó la consulta ante la entidad. El **ICANH** – remite respuesta el 05-04-2024 con el radicado 2024162000031181 informan: En virtud del anterior marco normativo, el proyecto "contrato de obra No. LP-001-2023, cuyo objeto es el de "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDASANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", localizado en el municipio de Ponedera departamento del Atlántico, **NO** se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad, dado que no requiere licencia ambiental ni la aprobación de un Plan de Manejo Ambiental. Así mismo, a la fecha, el proyecto **NO** se encuentra en la obligación de implementar medidas de manejo arqueológico.

Subprograma 2. Protección al patrimonio cultural. El contratista Consorcio La Giralda mediante el radicado 2024-1-004044-019912 ID 299748 del 15 de marzo de 2024, Consulta a la Dirección nacional de consulta previa- DANCP -MININTERIOR.

La entidad, emite respuesta con la RESOLUCIÓN NÚMERO ST-0522 DE 14 MAY 2024. **RESUELVE:**
PRIMERO. Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA - EL VIEJO, DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". VÍA LA GIRALDA – SANTA RITA – EL VIEJO"",** localizado en jurisdicción del municipio de Ponedera, en el departamento de Atlántico, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.
SEGUNDO. Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA - EL VIEJO, DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". VÍA LA GIRALDA – SANTA RITA – EL VIEJO"",** localizado en jurisdicción del municipio de Ponedera, en el departamento de Atlántico, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.
TERCERO. Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA - EL VIEJO, DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". VÍA LA GIRALDA – SANTA RITA – EL VIEJO"",** localizado en jurisdicción del municipio de Ponedera, en el departamento de Atlántico, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Subprograma 3. Protección al patrimonio geológico y paleontológico Servicio Geológico Colombiano SGC. El 16 de mayo de 2024 el contratista remitió a la entidad comunicación solicitando información sobre la presencia de hallazgos paleontológicos y fósiles en la zona del proyecto. El 11 de junio de 2024 la entidad emite respuesta dando recomendaciones en caso de hallazgos durante la ejecución del contrato.

5.2.3 PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE PREDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Proyecto Sabanagrande:

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos

- **Actas de vecindad de inicio**

El contratista levantó un total de (75) actas de vecindad de inicio revisadas y firmadas por la interventoría.

- **Entrega de copias de las actas de vecindad de inicio**

En los meses de octubre y noviembre de 2024, la contratita finalizó, y dio cumplimiento con la entrega de (75) copias de las actas de vecindad de inicio a propietarios y encargados de los predios, información entregada por WhatsApp (70 actas) y en forma personalizada entregó (5 actas) en medio físico.

- **Actas de compromiso**

En el mes de noviembre de 2024, El contratista no reporta nuevas actas de compromiso continúan levantadas y en uso áreas registradas en periodos anteriores acta N°1 Campamento y N° 2. ZODME

Proyecto Ponedera:

Subprograma 1. Infraestructura de predios y servicios públicos

- **Actas de vecindad de Inicio.**

En el mes de noviembre de 2024 con comunicación remitida el 06-11-2024 el contratista remite a interventoría (72) actas de vecindad subsanadas para firma de interventoria, encontrando que faltaban formatos por firma de testigo, se procedió a realizar la gestión de estas firmas en el área de influencia del proyecto el día 09-11-2024 está pendiente comunicación de respuesta por falta del plano del acta N° 46 donde también va la firma del propietario. Con la comunicación C-T-135-398-2024-PO, Interventoría emite concepto de aprobación el 12 de noviembre de 2024 y falta que el contratista adjunte el soporte de la página N°5 del acta de vecindad con el consecutivo N° 46.

- **Entrega de copias de las actas de vecindad de inicio**

El contratista reportó que el día 15-11-2024, realizó la entrega a (18) propietarios la entrega de un total de 35 copias de actas de vecindad de inicio actividad que se realizó entregando copias en medio físicas.

- **Actas de Compromiso**

En el mes de noviembre de 2024, se remite al WhatsApp unas actas de donaciones de materiales que no fueron aprobados por interventoría considerando que este material debe disponerse en el ZODME aprobado no donaciones particulares por considerar sensible el territorio por los ecosistemas presentes en el territorio como son arroyos, ciénagas y el río Magdalena. El 20 de noviembre, Las profesionales del ambiental y social de enemisten respuesta a través de correo al contratista de la revisión de un acta de compromiso remitida por el contratista el mismo día, correspondiente a un sitio para almacenamiento de herramientas donde también incluían para disposición de material o residuos sólidos producto de la excavación, teniendo en cuenta las dos actividades diferente y donde en este predio no se tiene autorización para depositar material producto de excavación se requirió dejar solo el acta de compromiso para depósito de material reiterando no se tiene autorización para ZODME.

Pendiente la entrega de las actas de compromiso de la oficina del SAU y de préstamo de un baño para uso del personal vinculado a la obra como del predio donde funcionará el ZODME adjuntando los documentos requeridos que a la fecha no se han aportado.

5.2.4 PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Proyecto Sabanagrande:

Subprograma 1. Atención a la comunidad. A partir del 25 de mayo/24 el contratista inicio la atención en el SAU.

- Instalación del SAU: Se encuentra dispuesto en el campamento del contratista donde funciona y está identificado con el respectivo aviso informativo. El 8 de octubre el contratista instala de forma provisional un punto SAU satélite en comercio del área de influencia del proyecto, donde no se reportó ningún acercamiento y efectividad.



Ubicación: Carrera 7 Km 2. Al lado del Centro Recreacional El Pinar
Teléfono: 311 619 16 96
Horario de Atención: miércoles y jueves en horario de oficina
Correo:
Constructorescrivensabanagrand@gmail.com

- **Registro de PQRSD**





El 13 de noviembre del año en curso se formaliza el cierre de la PQRSD N°02 donde se evidencio que las fisuras ya se encontraban, antes de las obras ejecutadas en la vía, como se registra en el acta de vecindad de inicio del predio las fisuras se habían

evidenciado, sin embargo, el contratista le colaboró a la propietaria para pañetar estos muros, donde el día citado se formaliza el cierre y firma de la propietaria.

Subprograma 2. Información y Divulgación.

- Volante Informativo:

El 11 de noviembre del año en curso, el contratista remitió a la interventoría el volante informativo N° 04 correspondiente a la invitación al comité de participación comunitaria y con veeduria programado para el día jueves 14 de noviembre.



En la segunda semana de noviembre del año en curso, el contratista remitió a la interventoría el volante informativo N° 05 correspondiente a la invitación campaña de prevención y seguridad está pendiente que la Secretaria de Tránsito de Sabanagrande.

- **Reunión de inicio del contrato.**

Se realizó el 24 de mayo de 2024 se llevó a cabo la reunión informativa de inicio de contrato se contó con la asistencia de habitantes del área de influencia directa del proyecto, autoridades municipales y representantes de una veeduría que se encuentra registrada con resolución 036 emitida por la personería municipal con fecha del año 2021, representantes de esta veeduria se inscribieron al comité de participación comunitaria (CPC) y se levantó la respectiva acta de la conformación. Esta actividad se encuentra cumplida por parte del contratista CRIVEN CONSTRUCTORES.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria.

- **Reunión de seguimiento al contrato**

El 18 de noviembre del año en curso, el contratista llevó a cabo el segundo comité de seguimiento al contrato donde convocó a la veeduria, al comité de participación comunitaria autoridades municipales de la alcaldía y personería municipal a esta reunión asistió el alcalde municipal de Sabanagrande y Secretario de Planeación.

PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Proyecto Ponedera:



Subprograma 1. Atención a la comunidad.

- **Atención en la oficina del SAU**

Ubicación: Parcela Manuela Isabel
Teléfono: 3016474188
Horario: viernes de 8:00 a 12m
Correo: Consorciolagiralda31@gmail.com

- **Atención de PQRSD.**

El 20 de noviembre del año en cuso, en horas de la noche a través del correo de interventoría CONSORCIO ODESSA se recibe un derecho de petición de la señora Consuelo Fernández. El 21 de noviembre de 2024 interventoría procede a remitir por correo el traslado de la PQRSD al Consorcio La Giralda y a la alcaldía del municipio de Ponedera con la comunicación C-T-135-415-2024 PO.

Interventoría da respuesta a la solicitante el 21-11-1024 con la comunicación C-T-135-416-2024 PO- Informando a la peticionaria la gestión adelantada adjuntando los respectivos soportes trasladando la información al contratista CONSORCIO LA GIRALDA como también a la Alcaldía de Ponedera. El 22-11-2024, interventoria realiza seguimiento telefonico donde la peticionaria informa que el contratista no le ha realizado el pago. El 29-11-2024, interventoría remite al contratista nuevamente solicitud de información del proceso de atención adelantado a la fecha para atender el derecho de petición de la señora Consuelo Fernández Vizcaíno con la comunicación C-T-135-427-2024 PO.

Subprograma 2. Información y Divulgación.

- Volantes Informativos.



El 20 de noviembre de 2024, se remite por WhatsApp volante informativo el cual fue revisado por el área social de interventoría y con observaciones se realizaron los ajustes y la reunión se programó para el 28 de noviembre de 2024.

- **Pasacalle**



En noviembre continúan instalados tres pasacalles, uno de estos se reinstaló a un costado de la vía por las inclemencias y fuertes vientos.

- **Reunión de inicio de contrato.**

Se realizó el 19 de julio de 2024 por parte de representantes del área técnica del contratista y con el apoyo de los profesionales de dirección, área técnica, SST y social de la interventoría. En el mes de agosto no se llevó a cabo ninguna actividad por parte del contratista, el contrato estaba suspendido a parir del 29 de julio a agosto de 2024.

Subprograma 3. Cultura vial y participación comunitaria.

- **Reunión de seguimiento al contrato**

Se llevó a acabó el jueves 28-11-2024 a las 9:00 a.m. corresponde a la segunda reunión de seguimiento del contrato con el comité de participación comunitaria y otros asistentes de la comunidad.

5.3. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SOCIAL AL CONTRATO

5.3.1. Informes mensuales sociales del Contratista

Tabla N° 3. Relación y estado de los informes mensuales

N° DE INFORMES Y PERIODO	ESTADO DE LOS INFORMES SABANAGRANDE	ESTADO DE LOS INFORMES PONEDERA
N° 1 de marzo de 2024	Radicado y aprobado en mayo de 2024 con la comunicación C-T-135-086-2024 SG el 31-05-2024	Radicado y aprobado en junio 2024 con la comunicación C-T-135-123-2024-PO el 20-06-2024
N° 2 de abril de 2024	Radicado y aprobado en mayo de 2024 con la comunicación C-T-135-087-2024 SG el 01-Jun-2024	Radicado y aprobado en junio 2024 con la comunicación C-T-135-124-2024-PO el 20-06-2024

N° DE INFORMES Y PERIODO	ESTADO DE LOS INFORMES SABANAGRANDE	ESTADO DE LOS INFORMES PONEDERA
N° 3 de mayo de 2024	Radicado y aprobado en junio de 2024 con la comunicación C-T-135-115-2024-SG el 15-06-2024	El 09-09-2024 el contratista remite el informe la interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-299-2024-SG-el 11-09-2024.
N° 4 de junio de 2024	Radicado y aprobado en julio de 2024 con la comunicación C-T-135-191-2024-SG el 15-07-2024	El 11-10-2024 el contratista remite el informe, la interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-342-2024-SG-el 11-10-2024.
N° 5 de julio de 2024	Aprobado en agosto de 2024 con la comunicación C-T-135-246-2024-SG el 12-08-2024	El 23-10-2024 el contratista remite informe, la interventoría da concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-371-2024-SG-el 24-10-2024.
N° 6 de agosto de 2024	El 17-09-2024 el contratista remite el informe con la comunicación OBR-SOC-017-2024, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-308-2024-SG-el 18-09-2024.	El 26-10-2024 el contratista remite el informe, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-374-2024-SG-el 26-10-2024.
N° 7 de septiembre de 2024	El 09-10-2024 el contratista remite el informe con la comunicación OBR-SOC-020-2024, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-339-2024-SG-el 09-10-2024.	El 09-11-2024 el contratista remite el informe, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-398-2024-SG-el 12-11-2024.
N° 8 de octubre de 2024	El 06-11-2024 el contratista remite el informe con la comunicación OBR-SOC-021-2024, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-386-2024-SG-el 06-11-2024.	El 09-11-2024 el contratista remite el informe con comunicación, interventoría emite concepto de aprobación con la comunicación C-T-135-398-2024-PO-el 12-11-2024.

5.3.2. Correspondencia

A continuación, se relaciona la correspondencia remitida por interventoría durante este periodo, en cada uno de los contratos en ejecución.

Correspondencia contrato de Sabanagrande: Interventoría generó en este periodo la siguiente correspondencia.

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR INTERVENTORÍA NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO SABANAGRANDE				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	C-T-135-386-2024-SG	06-11-2024	Rta a la comunic-OBS-SOC-021-2024 Informe mensual social N° 08 de octubre de 2024. Aprobación.	CRIVEN CONSTRUCTORES
2	C-T-135-388-2024-SG	06-11-2024	Solicitud presentación de reunión de seguimiento del contrato con el CPC.	CRIVEN CONSTRUCTORES
3	C-T-135-400-2024-SG	08-11-2024	Solicitud de programación actividades sociales pendientes y plan de contingencia	CRIVEN CONSTRUCTORES
4	C-T-135-419-2024-SG	25-11-2024	Apoyo controles de prevención y seguridad vial	Secretaria de Transito de Sabanagrande

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR INTERVENTORÍA NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO SABANAGRANDE				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
5	C-T-135-420-2024-SG	25-11-2024	Apoyo controles de prevención y seguridad vial	Alcaldía de Sabanagrande
6	C-T-135-427-2024-SG	29-11-2024	Respuesta a derecho de petición al Concejo municipal de Sabanagrande	CONCEJO MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

- El contratista CRIVEN CONSTRUCTORES, del contrato de Sabanagrande, generó en este periodo la siguiente correspondencia.

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR O EL CONTRATISA CONTRUCTORES CRIVEN – NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO SABANAGRANDE				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	OBR-SOC-021-2024	05-11-2024	Radican informe mensual social N°8 del mes de octubre de 2024.	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA
2	SIN CONSECUTIVO	07-11-2024	Reprogramación de reunión de seguimiento con CPC para 14-11-2024	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA

Correspondencia contrato de Ponedera:

- Interventoría generó en este periodo la siguiente correspondencia al contratista de Ponedera Atlántico:

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR INTERVENTORÍA EN NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO PONEDERA				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	C-T-135-387-2024-PO	06-11-2024	Requerimiento entrega de Informes Sociales pendiente	CONSORCIO LA GIRALDA
2	C-T-135-392-2024-PO	08-11-2024	Requerimiento entrega programación y Plan de contingencia social	CONSORCIO LA GIRALDA
3	C-T-135-396-2024-PO	12-11-2024	No autorización donación de material	CONSORCIO LA GIRALDA
4	C-T-135-397-2024-PO	12-11-2024	Revisión y concepto aprobación actas de vecindad.	CONSORCIO LA GIRALDA
6	C-T-135-398-2024-PO	12-11-2024	Aprobación informe social mensual N° 7 del mes de septiembre de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA
7	POR CORREO	13-11-2024	Revisión y ajustes con observaciones documentos informe mensual social N° 8 de octubre 2024	CONSORCIO LA GIRALDA
8	C-T-135-405-2024-PO	14-11-2024	Requerimiento atención afectación cercado	CONSORCIO LA GIRALDA
9	C-T-135-408-2024-PO	14-11-2024	Aprobación-informe social N° 8 del mes de octubre de-2024	CONSORCIO LA GIRALDA
10	C-T-135-415-2024-PO	21-11-2024	Traslado derecho de petición de Consuelo Fernández	CONSORCIO LA GIRALDA ALCALDÍA DE PONEDERA
11	C-T-135-416-2024-PO	21-11-2024	Información de gestión del derecho de petición	CONSUELO FERNÁNDEZ

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR INTERVENTORÍA EN NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO PONEDERA				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
12	Se remite correo	22-11-2024	Solicitando al contratista la entrega de los pendientes sociales	CONSORCIO LA GIRALDA
13	C-T-135-421-2024-PO	25-11-2024	Apoyo en controles de prevención y seguridad vial	INSPECCIÓN DE POLICIA LA GIRALDA
14	C-T-135-422-2024-PO	25-11-2024	Apoyo en controles de prevención y seguridad vial	ALCALDÍA DE PONEDERA
15	C-T-135-427-2024-SG	29-11-2024	Información- Repuesta al Derecho de Petición-de-Consuelo Fernández-29-Nov-2024	CONSORCIO LA GIRALDA

Correspondencia emitida por el contratista – Ponedera.

CORRESPONDENCIA REMITIDA POR O EL CONTRATISTA CONSORCIO LA GIRALDA - EN NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO PONEDERA				
N°	Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a:
1	SIN CONSECUTIVO	09-11-2024	Entrega del informe mensual social N° 7 de septiembre de 2024.	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA
2	SIN CONSECUTIVO	15-11-2024	Entrega del informe mensual social N° 8 de octubre de 2024.	INTEVENTORIA CONSORCIO ODESSA

5.3.3. Reuniones de seguimiento social a los contratos

En este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento social al contrato de Sabanagrande:

ACTAS DE REUNIONES SOCIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO SABANAGRANE			
Fecha	Acta N°	Temas tratados	Participantes
07-11-2024	58	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría
15-11-2024	61	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría
22-11-2024	62	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría
20-11-2024	64	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría

En este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento social al contrato de Ponedera:

ACTAS DE REUNIONES SOCIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO PONEDERA			
Fecha	**Acta N°**	**Temas tratados**	**Participantes**
08-11-2024	59	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría
14-11-2024	60	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría y ambiental del contratista
20-11-2024	33	Comité de seguimiento al contrato todas las áreas de intervención	Participaron área técnica, ambiental y social de Intervetoria y área social y técnica del contratista, coordinador técnico de INVIAS y secretaria de infraestructura de alcaldía de Ponedera.
29-11-2024	63	Realizar seguimiento a las actividades sociales del contrato	Profesionales del área social del contratista e interventoría

5.3.4. Informes trimestrales sociales de la Interventoría

- Interventoria avanza en la elaboración del respectivo informe para remitirlo en el mes de diciembre de 2024 al INVIAS de acuerdo a lo establecido contractualmente.

5.3.5. Oficios recibidos de INVIAS

- En este periodo no se recibió información inherente al componente social por parte del Instituto.

Alba Rocío Flórez
Profesional Social Interventoría



INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

5.3.3

NOVIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1. A los contratos de obra - CONTRATO DE OBRA LP-001-2023 y CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023.

INTRODUCCIÓN

5.3.3 Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra.

5.3.3.1 Control de Señalización Frentes de Obra y Sitios Temporales

5.3.3.2 Registro de personal en obra

5.3.3.3 Reporte de Accidentes de Trabajo

5.3.3.4 Capacitaciones - Charlas en seguridad y Salud en el Trabajo SST

5.3.3.5 Entrega y Uso de Elementos de Protección Personal EPP

5.3.3.6 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo SST

5.3.3.7 Reporte de actos condiciones inseguras

5.3.3.8 Conclusiones

5.3.3.9 Recomendaciones

INTRODUCCION

En el presente informe se relaciona la gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST que se desarrolla desde la Interventoría, para el seguimiento a las actividades constructivas ejecutadas en los Contratos de mejoramiento y mantenimiento de Vías Terciarias en el Departamento del Atlántico, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Decreto 1072 del 2015 el cual regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la Resolución 0312 del 2019, la cual establece los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), las cuales permiten realizar la verificación de los documentos de obligatorio cumplimiento, con el objetivo de identificar, evaluar y controlar los riesgos que pueden desencadenar en accidentes de trabajo y enfermedades laborales, aplicando acciones preventivas y de mejora, con el fin de promocionar y establecer un ambiente seguro de trabajo al personal, se verifica la implementación de las actividades en seguridad y salud en el trabajo que se ejecuta por los contratistas en las obras, entre otras estrategias para mejorar el desempeño de ejecución en obra.

Por consiguiente, la implementación de las diversas actividades en prevención permite la disminución en el número de incapacidades, accidente y enfermedades laborales generan procesos más fluidos y continuos, reduce el ausentismo laboral y mejora la productividad. De tal manera que mediante los soportes y registros fotográficos suministrados de cada proyecto se evidencia la implementación de las actividades en seguridad y salud en el trabajo, donde se relaciona el seguimiento al control de personal en obra, inducciones de ingreso, verificación de los aportes a la seguridad social (ARL,EPS,AFP,CCF) del personal vinculado al proyecto exámenes ocupacionales, uso y entrega de elementos de protección personal EPP, así como también las actividades realizadas en capacitaciones y charlas de seguridad que permiten retroalimentar al personal sobre la prevención de riesgos y reforzar la seguridad y el autocuidado, igualmente las inspecciones de seguridad a herramientas, equipos, vehículos y maquinara amarilla son actividades que se implementan para dar seguimiento y controlar los riesgos de accidentalidad, así como también la instalación del esquema de señalización vial como parte de la información que permite a los usuarios del corredor vial estar informados de las actividades que se desarrollan en el tramo de intervención, como lo especifica el Manual de señalización vial del 2015 y el Plan de Manejo de Tráfico PMT elaborado para cada contrato.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas de cada proyecto.

CONSORCIO LA GIRALDA

CONTRATO DE OBRA
No. LP-001-2023



MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

INFORME MENSUAL
1 al 30 noviembre de 2024

PMT

A. PONEDERA – ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA: LP-001-2023 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

INTRODUCCION

En el presente informe se relacionan las actividades en seguridad y salud en el trabajo SST ejecutadas en el proyecto, CONTRATO DE OBRA: LP-001-2023 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, el contratista presenta los aportes a la seguridad social del personal vinculado en obra, el proyecto contempla la intervención de mejoramiento de vía mediante la construcción de pavimento rígido, localización general del Proyecto se ubica en la Vía La Giralda en el Ferry para Salamina por la rivera del rio Magdalena y conecta a la vía principal del Municipio de Ponedera a Puerto Giraldo en el corregimiento de Santa Rita.

5.3.3.A Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra: En el presente informe se evidencia la implementación de las actividades del área de seguridad y salud en el trabajo SST, durante el desarrollo de las actividades constructivas en obra, las cuales se verificaron mediante los registros fotográficos anexos, como las inducciones al personal, inspecciones a equipos y maquinaria, la instalación de la señalización en el tramo de intervención, la verificación documental tanto de maquinaria y equipos como la verificación de los aportes a la seguridad social del personal vinculado al proyecto.



Ubicación del Proyecto

5.3.3.1 CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CONSORCIO LA GIRALDA**	**CONTRATO No**	**No. LP-001-2023**
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DEL SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

SANTA RITA - PONEDERA



EL FERRY - GIRALDITA



SEÑAL - SIO-02 INICIO DE OBRA

TRAMO 1	K0+200



SEÑAL SPO 01 - HOMBRES TRABAJANDO

TRAMO 1	K0+400



SEÑAL SR18 - PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS PESADOS O DE CARGA

KM	K9+060

5.3.3.1 CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CONSORCIO LA GIRALDA**	**CONTRATO No**	**No. LP-001-2023**
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DE LA VIA POLONUEVO A SABANAGRANDE - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.





SEÑAL - SIO-02 INICIO DE OBRA	
TRAMO 1	K0+460



SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	
TRAMO 1	K9+000




SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	
TRAMO 1	K9+000


5.3.3.1 CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CONSORCIO LA GIRALDA**	**CONTRATO No**	**No. LP-001-2023**
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

REGISTRO DE LA SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

SEÑALIZACIÓN EN OBRA	CANTIDAD
SEÑALI - SIO-02 INICIO DE OBRA	2
SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA	
SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO	1
SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	2
SEÑAL SR 30 - MAXIMA VELOCIDAD	
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO	
SEÑAL SIO - 05 DESVIO	
SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	3
SEÑAL SRO 01 - VIA CERRADA	
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	
SEÑAL SR18 - PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS PESADOS O DE CARGA	1
DELINEADORES	
MALETINES VIALES	4
PARE y SIGA	2
BARRICADAS METALICAS	
CONOS	
TOTAL	15

TOTAL DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA POR PERIODO	
SEPTIEMBRE	13
OCTUBRE	15
NOVIEMBRE	15
DICIEMBRE	0

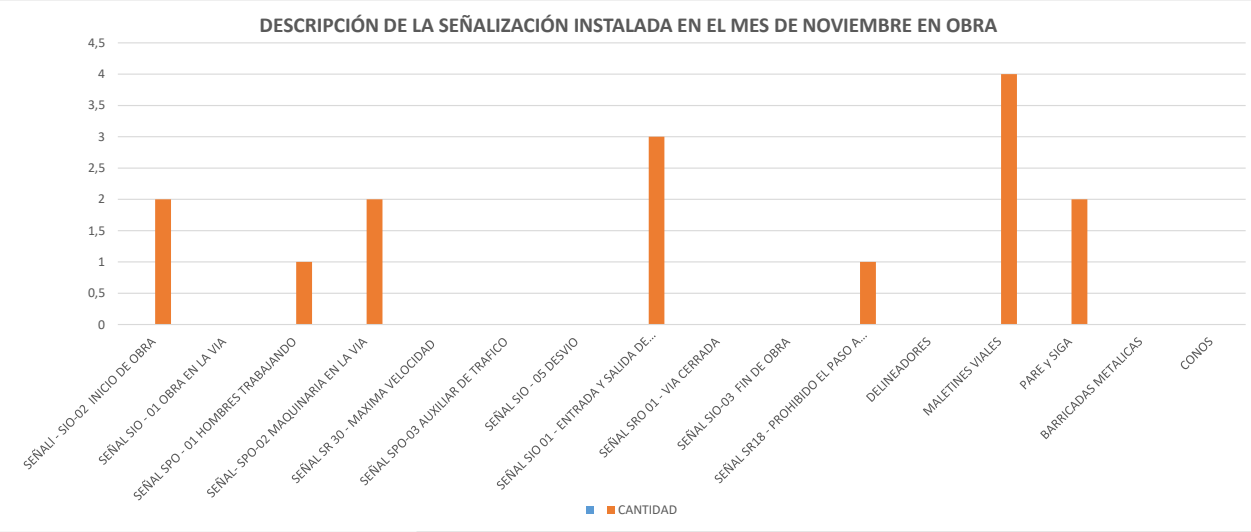

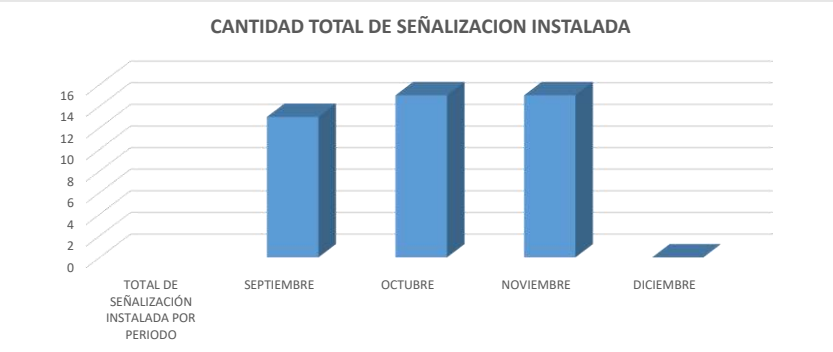

INDICADOR:

SENALIZACION= No. SENALIZACION INSTALADA EN EL FRENTE DE OBRA / No. SEÑALIZACIÓN DEL PMT ESTABLECIDO EN EL FRENTE DE OBRA *100%

SEÑALIZACION= No.15 SEÑALES INSTALADAS EN EL FRENTE DE OBRA / No. 15 SEÑALES REQUERIDAS EN OBRA *100%


SEÑALIZACION INSTALADA EN OBRA = No.15 / No. 15 *100%

SEÑALIZACION = 100%

5.3.3.2 REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

5.3.3.2 REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

INDUCCIONES EN OBRA	CANTIDAD
MAYO	5
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	9
OCTUBRE	4
NOVIEMBRE	1
DICIEMBRE	0
TOTAL	19

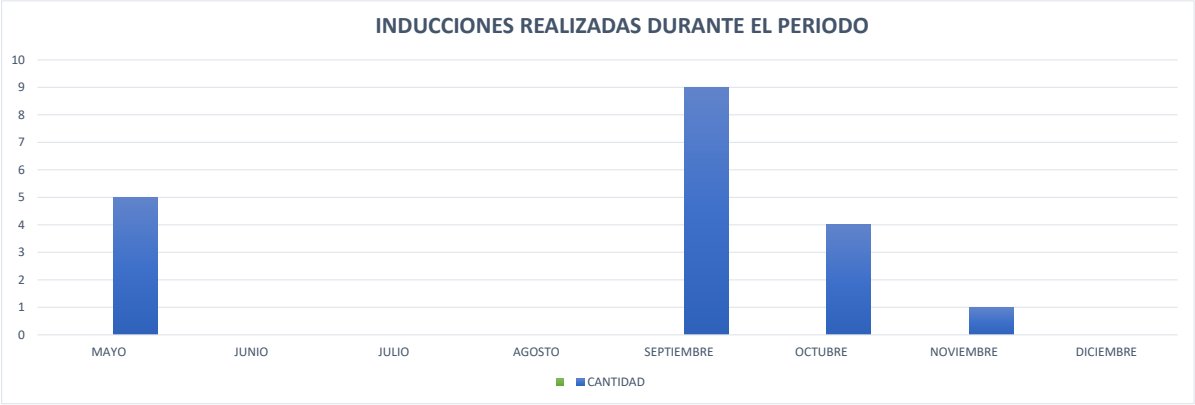

INDICADOR:

INDUCCIONES= No. TOTAL DE INDUCCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO / No. TOTAL DE TRABAJADORES DE INGRESO EN EL PERIODO *100%

INDUCCIONES = No. 0 / No. 0 *100%

INDUCCIONES= No. 0 INDUCCIONES REALIZADAS / No. 0 TOTAL DE TRABAJADORESDE INGRESO A OBRA *100%

CUMPLIMIENTO EN INDUCCIONES DE INGRESO A OBRA = 100%

MANO DE OBRA VINCULADA AL PROYECTO DE PONEDERA		
TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	INFORMACION DEL PERIODO	
	No. EMPLEOS DEL PERIODO	ACUMULADO
MONC DEL AIP	0	2
MONC FORANEA	0	3
MOC DEL AIP	0	0
MOC FORANEA	0	14
TOTAL GENERAL	0	19

OBSERVACION: PARA EL PRESENTE PERIODO, EL CONTRATISTA DE PONEDERA NO REPORTA INGRESOS PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATO. REPORTA 14 PERSONAS MOC Y SE ESTIMA 5 PERSONAS DE MONC.


Personal total durante el periodo de noviembre=12

TOTAL DE TRABAJADORES: 19 PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATO DE PONEDERA - ATLANTICO.

5.3.3.2 REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE AUSENTISMO EN OBRA

AUSENTISMO EN OBRA	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	
TOTAL	0

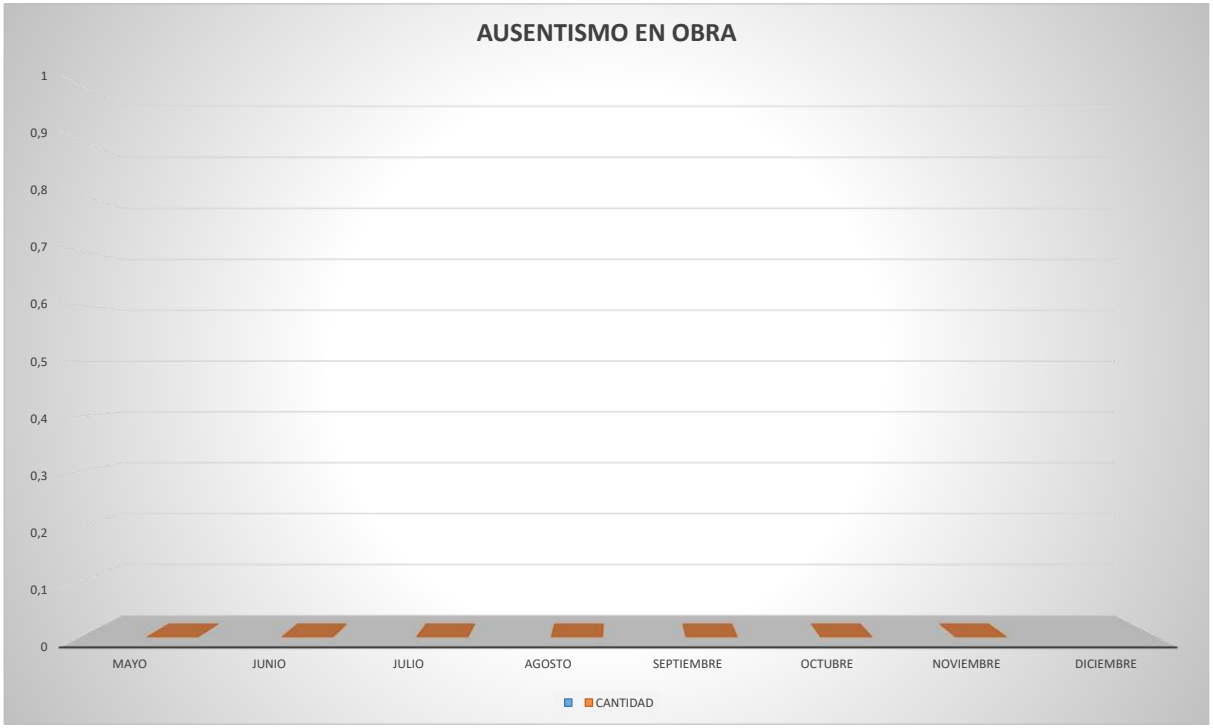


INDICADOR:

AUSENTISMO= No. TOTAL DE HORAS LABORADAS= *100%
No. TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS

AUSENTISMO= No. 0 ASUENTISMO EN OBRA = *100% AUSENTISMO= 0%
(19 Trabajadores)*(8hrs)*(30 DIAS)

5.3.3.3 REGISTRO DE ACCIDENTES EN OBRA
Observaciones: Durante el periodo del presente informe no se registran accidentes de trabajo.

ACCIDENTES DE TRABAJO	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	
TOTAL	0

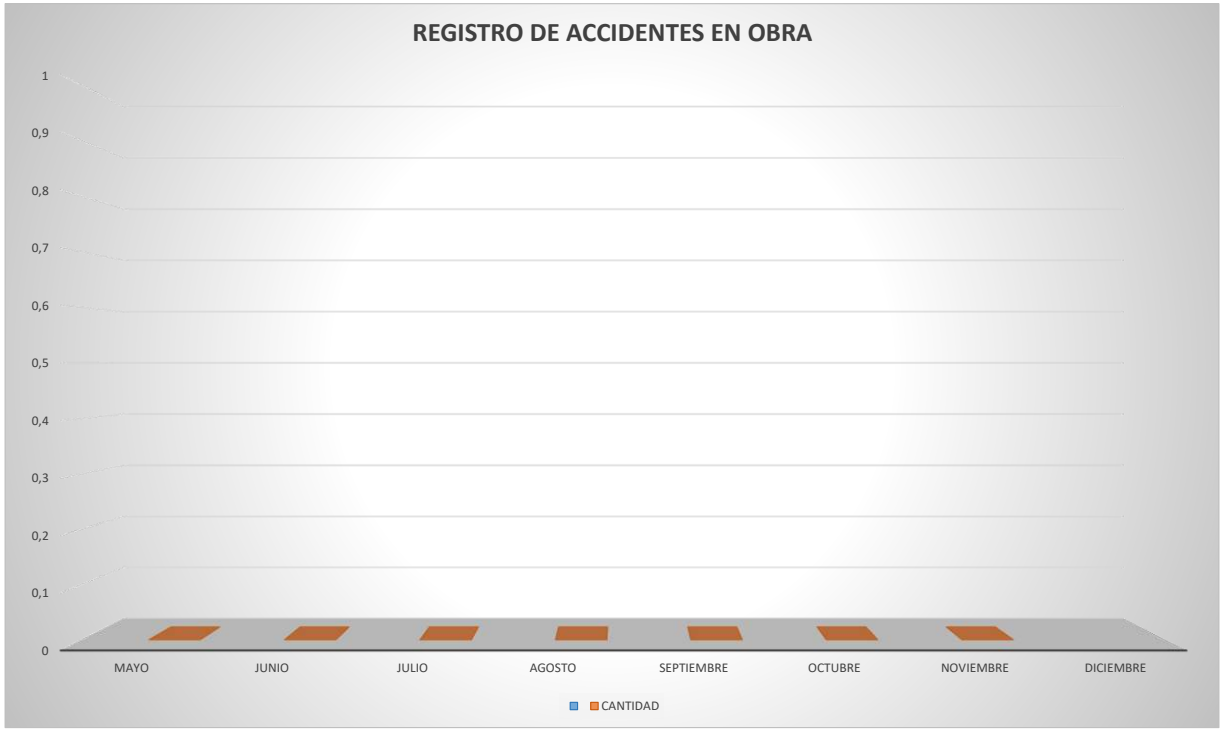

INDICADOR:

ACCIDENTE LABORAL= No. TOTAL ACCIDENTE LABORALES DURANTE EL PERIODO *100%
No. TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO

ACCIDENTE LABORAL= 0 *100%
19


ACCIDENTE LABORAL= 0%

5.3.3.4 CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA		
		
CHARLAS DIARIAS	CHARLAS DIARIAS	CHARLAS DIARIAS

OBSERVACIONES: Se registra las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas durante el periodo.

5.3.3.4 CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA


REGISTGRO DE LA CAPACITACION AL PERSONAL EN OBRA DURANTE EL PERIODO			
ITEM	**TEMA DE LA CAPACITACION**	**ASISTENTES**	**FECHA**
1	Peligros de no instalar la señalización	9	1/11/2024
2	como identificar los desechos peligrosos	9	2/11/2024
3	uso de epp	9	5/11/2024
4	Manejo de residuos sólidos	9	6/11/2024
5	Peligros de la señalización	9	7/11/2024
6	¿Cómo identificar los desechos peligrosos?	9	8/11/2024
7	EPI Equipos de protección individual	9	9/11/2024
8	Línea de Fuego motoniveladora	9	10/11/2024
9	Higiene postural - Pausas activas	9	12/11/2024
10	¿Que es un ATS y cual es su importancia?	8	13/11/2024
11	Orden y aseo en área de trabajo	8	14/11/2024
12	Mis herramientas, mis manos	8	15/11/2024
13	La seguridad es responsabilidad de todos	9	16/11/2024
14	Que es un preoperacional	9	18/11/2024
15	Riesgo Biológico: Existencia de vectores	9	19/11/2024
16	entrega de Epp y por qué es importante?	9	20/11/2024
17	Agotamiento por calor	9	21/11/2024
18	Charlas de seguridad de 15 min, importancia	9	22/11/2024
19	Seguridad en tormentas eléctricas	9	23/11/2024
20	Hidratación	9	25/11/2024
21	Protección a la fauna y flora	9	26/11/2024
22	Manejo integral de residuos líquidos, escombros	9	27/11/2024
23	Posturas de levantamiento inadecuadas	9	28/11/2024
24	El ser humano con el medio ambiente	9	29/11/2024
25	Reducir, reusar y reciclar: La regla de las 3 R	9	30/11/2024

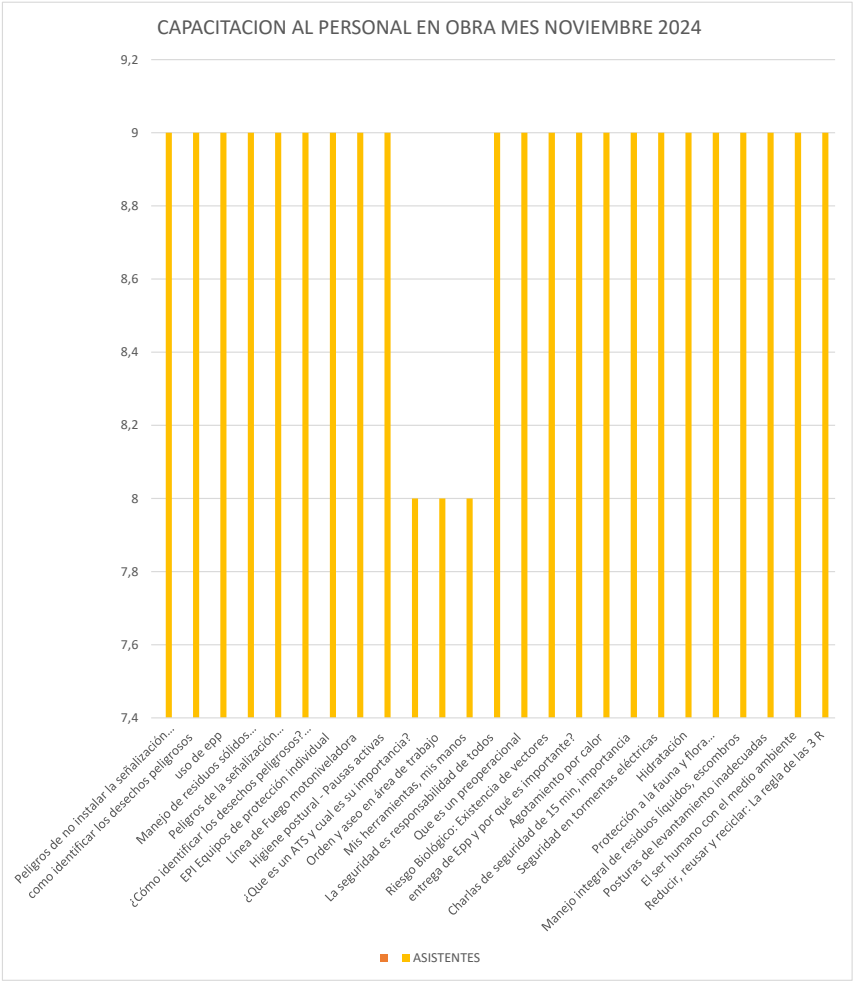

5.3.3.4 CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA

REGISTRO DE LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	3
OCTUBRE	20
NOVIEMBRE	25
DICIEMBRE	0
TOTAL	48

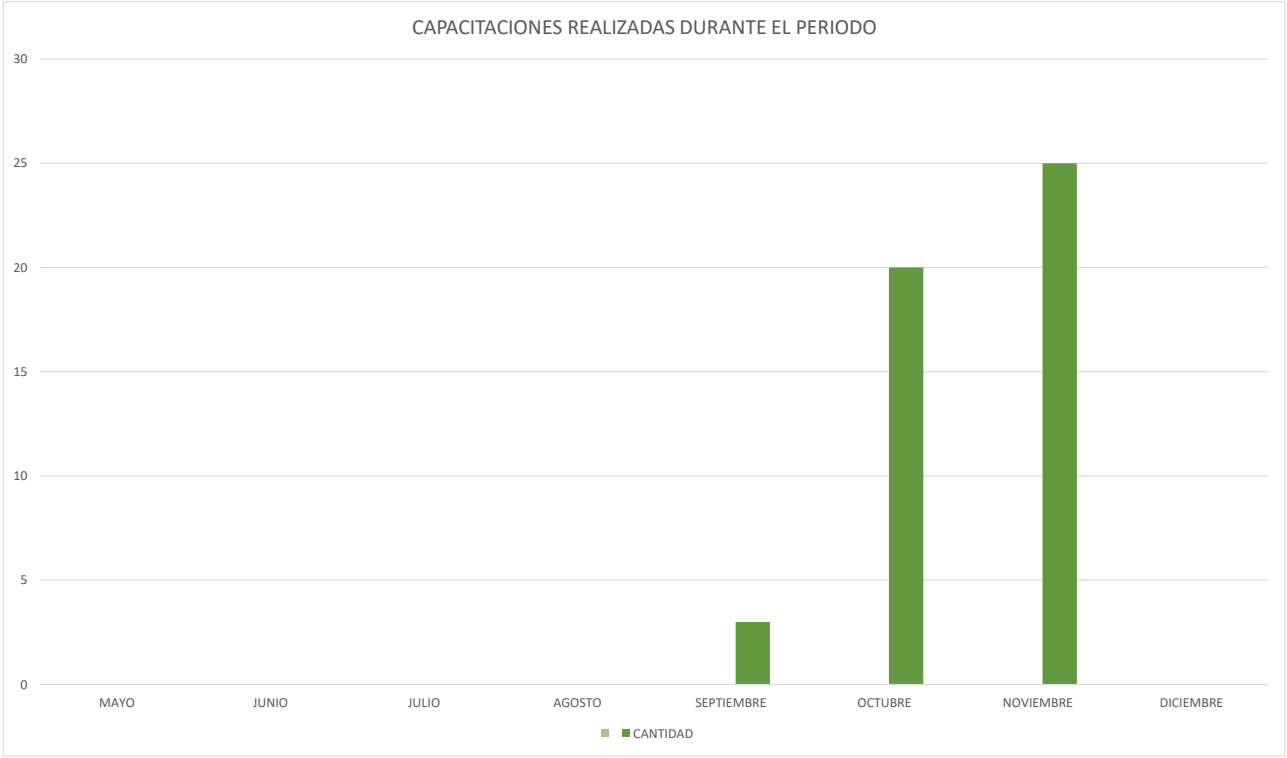

INDICADOR:

CHARLAS= No. CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO / No. TOTAL DE CHARLAS Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO *100%

CUMPLIMIENTO EN CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL EN OBRA = 100%


CHARLAS = No. 25 CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS / No. 25 TOTAL DE CHARLAS Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100%

TOTAL DE CAPACITACIONES EN EL PROYECTO= 48

5.3.3.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA

5.3.3.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA

ENTREGA DE EPP	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	2
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	2

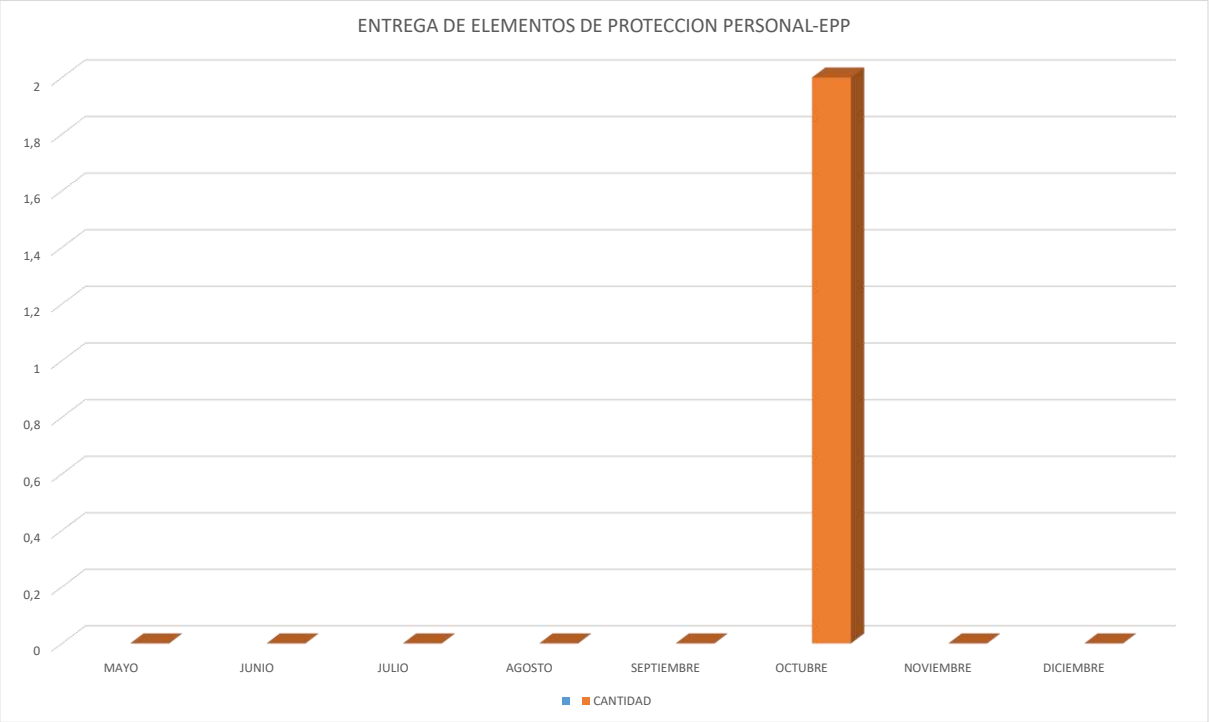

INDICADOR:

EPP= No.TRABAJADORES CON ENTREGA DE EPP EN EL PERIODO / No. TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PERIODO *100%

ENTREGA EPP = No.0 / No. 19 *100%

EPP= No. 0 ENTREGAS DE EPP EN EL PROYECTO / No. 19 TOTAL DE TRABAJADORES EN OBRA *100%

ENTREGA DE EPP = 1%

OBSERVACIONES: DURANTE EL PERIODO NO SE REGISTRARON ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA


		
INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE MAQUINARIA
		
INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN VOLQUETA-EXTINTOR	INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN MAQUINARIA-EXTINTOR

OBSERVACIONES: Se registra el seguimiento a las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas en obra.


5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA

REGISTRO DE LAS INSPECCIONES EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

INSPECCIONES EN OBRA	CANTIDAD
INSPECCION DE MOTONIVELADORA	1
INSPECCION DE VIBROCOMPACTADOR	1
INSPECCION RETROEXCAVADORA	1
INSPECCION DE HERRAMIENTAS	1
INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	1
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACION	1
TOTAL	6

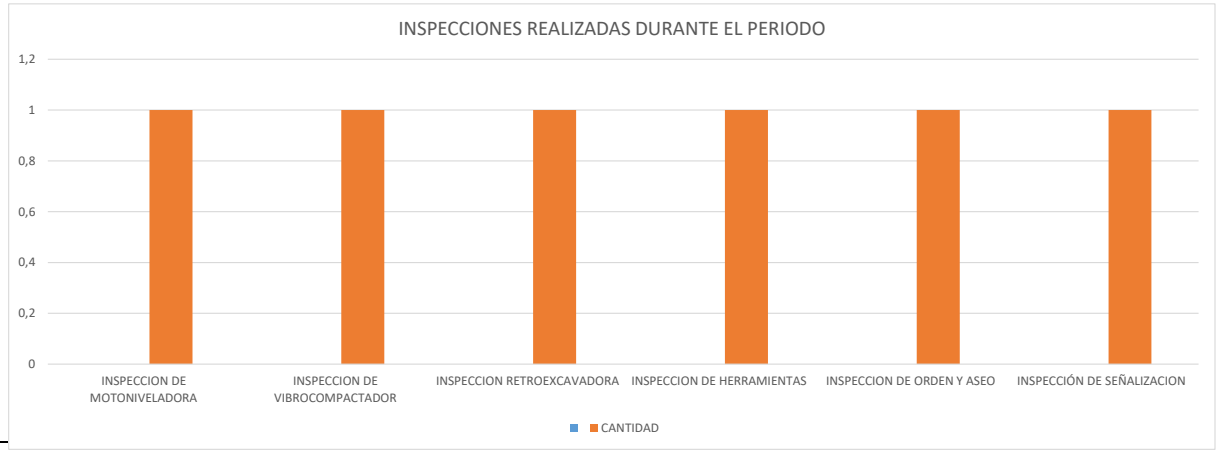

TOTAL DE INSPECCIONES DURANTE EL PERIODO	
SEPTIEMBRE	6
OCTUBRE	14
NOVIEMBRE	6
DICIEMBRE	0
TOTAL	26

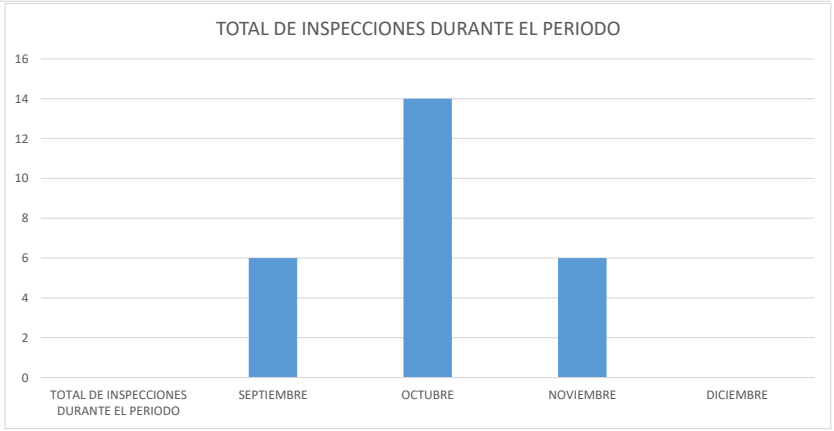

INDICADOR:

INSPECCIONES= No. TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO / No. TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO *100%

CUMPLIMIENTO INSPECCIONES EN OBRA= 100%

INSPECCIONES= No. 6 INSPECCIONES REALIZADAS / No. 6 INSPECCIONES PROGRAMADAS *100%

INSPECCIONES DURANTE EL PROYECTO = 26

5.3.3.7 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA



ANTES : No se evidencia control de trafico



DESPUES: Instalación de puntos de control de trafico

OBSERVACIONES: Se registran los actos y condiciones inseguras en obra.

5.3.3.7 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA

HALLAZGOS POR MES	CANTIDAD ABIERTAS	CANTIDAD CERRADAS
MAYO	0	0
JUNIO	0	0
JULIO	0	0
AGOSTO	0	0
SEPTIEMBRE	0	0
OCTUBRE	1	1
NOVIEMBRE	0	1
DICIEMBRE		
TOTAL	1	2



INDICADOR:

A.C= No. HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL PERIODO = / No. TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS DURANTE EL PERIODO *100%

A.C= 1 HALLAZGOS ABIERTOS DURANTE EL PERIODO = / 1 TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS EN EL PERIODO *100%

A.C= TOTAL HALLAZGOS CERRADOS DURANTE EL PROYECTO= 2

5.3.3.8.A Conclusiones

Se puede concluir que durante la ejecución de las actividades en el periodo del presente informe del "CONTRATO DE OBRA: LP-001-2023 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", se continua con la implementación de las actividades en obra, el contratista reporta los aportes a la seguridad social, los documentos del personal y maquinaria, los cuales fueron verificados con el acompañamiento del inspector SST en obra.

5.3.3.9.A Recomendaciones

Por lo anterior, se realiza al contratista las siguientes recomendaciones:

Reforzar el esquema de señalización vial según lo establecido en el PMT y Mantener visible la señalización en obra, para lo cual debe realizar el mantenimiento periódico e inspecciones rutinarias, con el fin de mantener visible la información a los usuarios del corredor vial sobre las actividades que se encuentra ejecutando en la obra.

Realizar jornadas de orden y aseo para conservar las áreas limpias de trabajo y retirando los obstáculos que puedan representar riesgos y permita evitar accidentes en obra.

Realizar la entrega de los elementos de protección individual al personal de ingreso a obra, personal directo del Consorcio La Giralda, soportando mediante registro fotográfico y firma de entrega la dotación de ingreso.

Realizar la entrega de los exámenes ocupacionales del personal de ingreso a obra, de acuerdo a la resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009.

Adecuar una zona de hidratación para el personal en obra con equipos de emergencia, punto ecológico y señalizar las áreas de almacenamiento y acopios.

CONSTRUCCIONES CRIVEN SAS

CRIVEN

CONTRATO DE OBRA
No. SG-LP-OP-004-2023



MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE - POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".

INFORME MENSUAL

1 al 30 noviembre de 2024

PMT

B. SABANAGRANDE – ATLANTICO


CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".

INTRODUCCION

En el presente informe se relacionan las actividades en seguridad y salud en el trabajo SST presentadas por el CONTRATO DE OBRA No. SG-LP-OP-004-2023 "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", el proyecto contempla la intervención de mejoramiento de vía mediante la construcción de pavimento rígido, mantenimiento vial y obras de drenaje.

Localización general del Proyecto SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (MUNICIPIO DE SABANAGRANDE), es una vía terciaria que se localiza al occidente del municipio de Sabanagrande, conectando los sectores de SABANANGRANDE a los límites con POLONUEVO – ATLANTICO.


5.3.3.B Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra: En el presente informe se evidencia la implementación de las actividades del área de seguridad y salud en el trabajo SST durante la ejecución de las actividades constructivas en obra, las cuales se verificaron mediante los registros fotográficos anexos, inducciones, inspecciones, capacitaciones, señalización instalada en el tramo de intervención, documentos de equipos y maquinaria, la verificación de los aportes a la seguridad social del personal vinculado al proyecto.

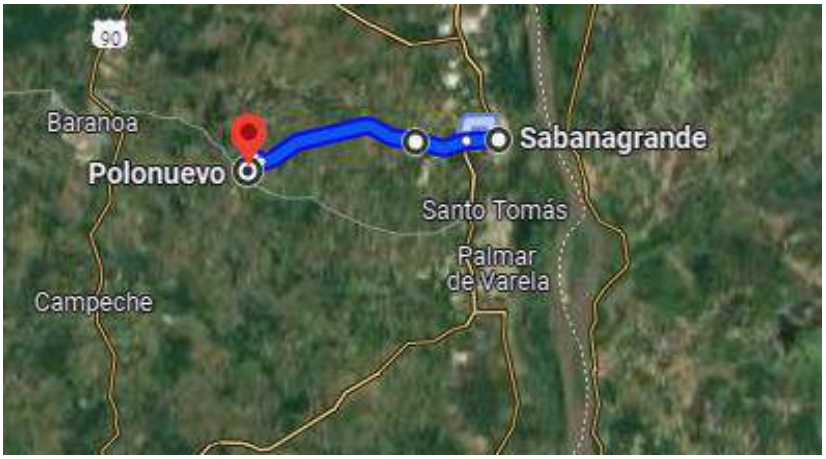

Ubicación del Proyecto

5.3.3.1 CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DEL SABANAGRANDE – POLONUEVO -MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

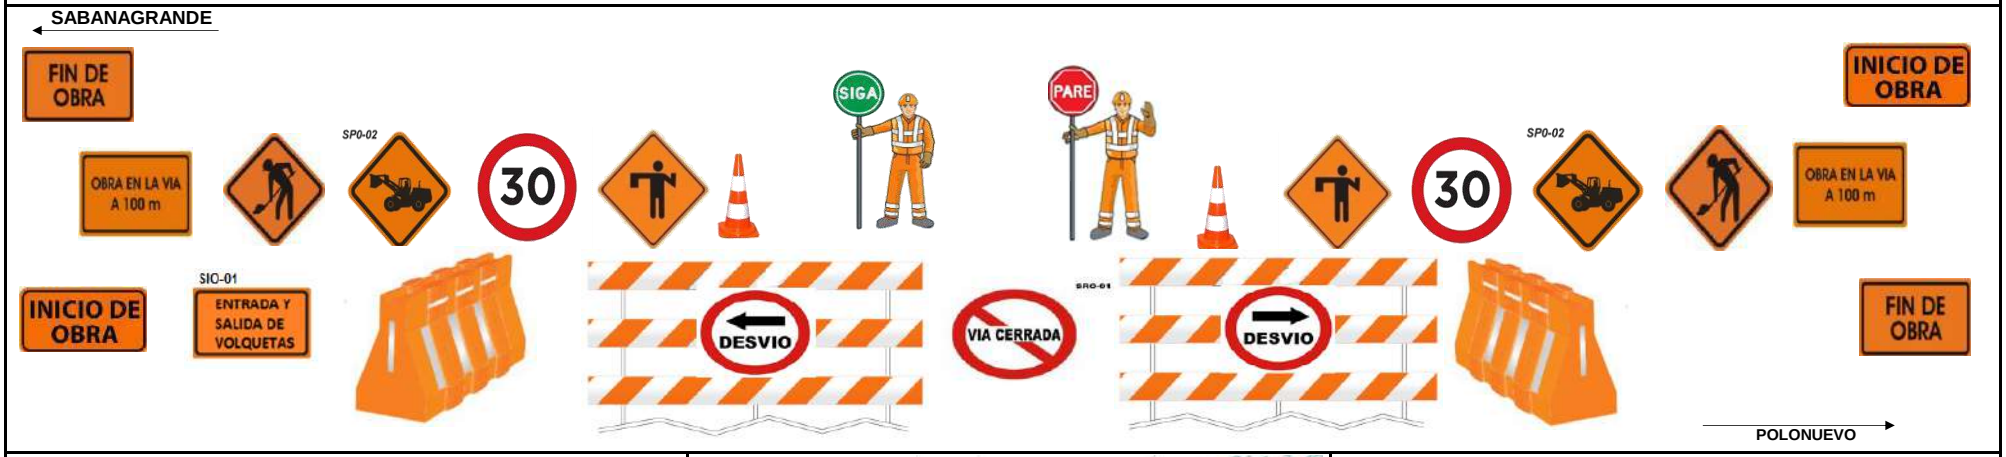



SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA

TRAMO 1	K0+020



SEÑAL - SIO-02 INICIO DE OBRA

TRAMO 1	K0+000



SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO

TRAMO 1	K0+060

5.3.3.1 CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		



SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	
TRAMO 1	K0+130



SEÑAL SR 30 - MAXIMA VELOCIDAD	
TRAMO 1	K0+200



SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO	
TRAMO 1	K0+260



SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA	
TRAMO 1	k0+820




SEÑAL- SIO 03 FIN DE OBRA	
TRAMO 1	k1+350



DISPOSITIVOS PARA DELIMITAR - BARRICADA	
TRAMO 1	k0+800

5.3.3.1 CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DE LA VIA POLONUEVO A SABANAGRANDE - MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

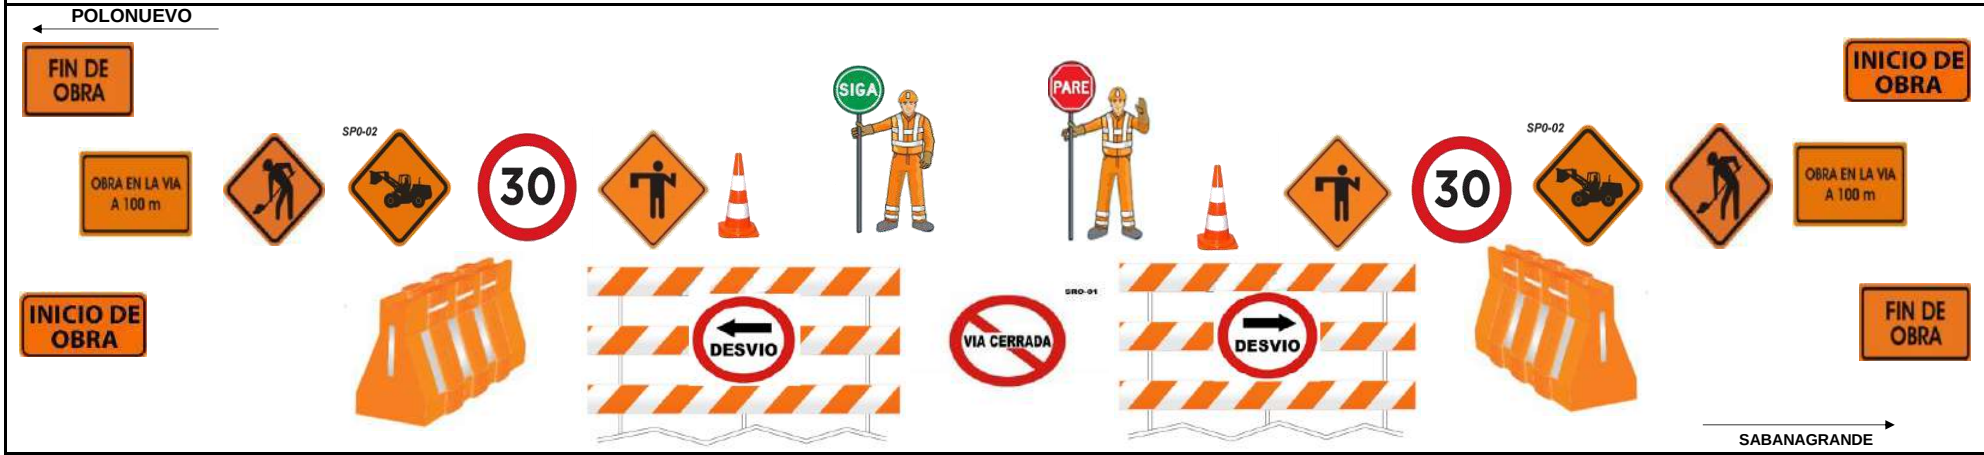



SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA

TRAMO 1	K1+980



SEÑAL SR 30 - MAXIMA VELOCIDAD

TRAMO 1	K2+000



SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO

TRAMO 1	K1+900

5.3.3.1 CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		



SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	
TRAMO 1	K1+800



SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	
TRAMO 1	K0+800



SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO	
TRAMO 1	K1+650



SEÑAL SPO-03 CONTROL DE TRAFICO EN OBRA	
TRAMO 1	k0+300



DISPOSITIVOS PARA DELIMITAR - CINTA DE PELIGRO	
TRAMO 1	k0+000




SEÑAL SPO-03 CONTROL DE TRAFICO EN OBRA	
TRAMO 1	K0+300

OBSERVACIONES: Se registran las señales instaladas en el tramo de Intervención durante la ejecución de las actividades constructivas en el presente periodo.


5.3.3.1 CONTROL DE SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
CONTRATISTA OBRA	**CRIVEN CONSTRUCTORES SAS**	**CONTRATO No**	**SG-LP-OP-004-2023.**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		

REGISTRO DE LA SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

SEÑALIZACIÓN EN OBRA	CANTIDAD
SEÑALI - SIO-02 INICIO DE OBRA	2
SEÑAL SIO - 01 OBRA EN LA VIA	3
SEÑAL SPO - 01 HOMBRES TRABAJANDO	2
SEÑAL- SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	4
SEÑAL SR 30 - MAXIMA VELOCIDAD	2
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRAFICO	2
SEÑAL SIO - 05 DESVIO	1
SEÑAL SIO 01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	1
SEÑAL SRO 01 - VIA CERRADA	0
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	2
DELINEADORES	42
MALETINES VIALES	4
PARE y SIGA	4
BARRICADAS METALICAS	5
CONOS	16
TOTAL	90

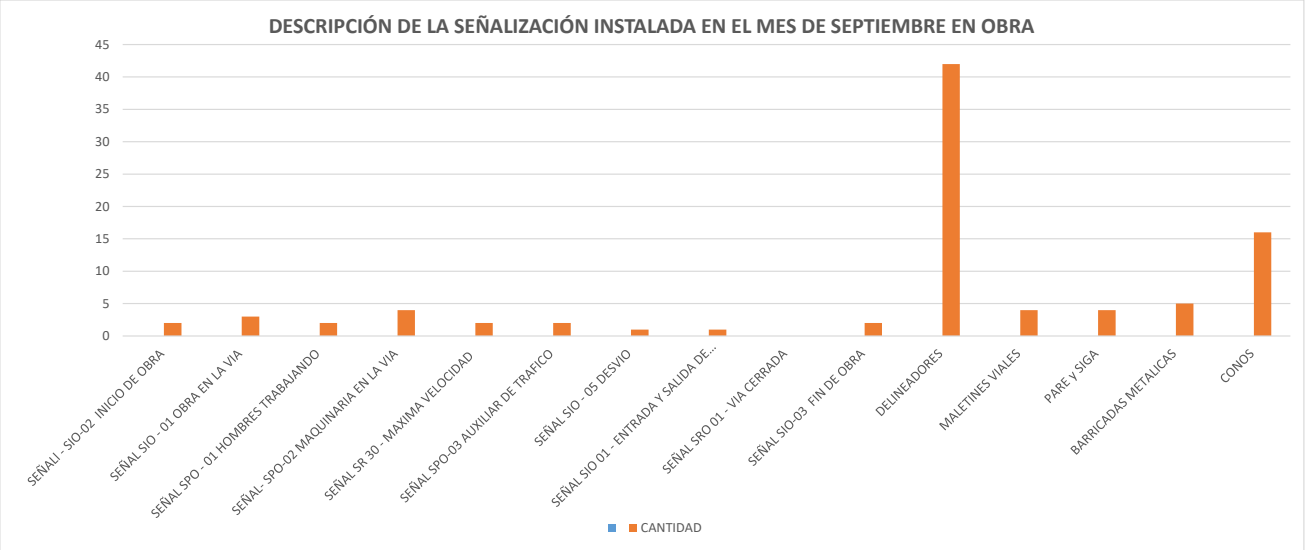

TOTAL DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA POR PERIODO	
SEPTIEMBRE	114
OCTUBRE	99
NOVIEMBRE	90
DICIEMBRE	0

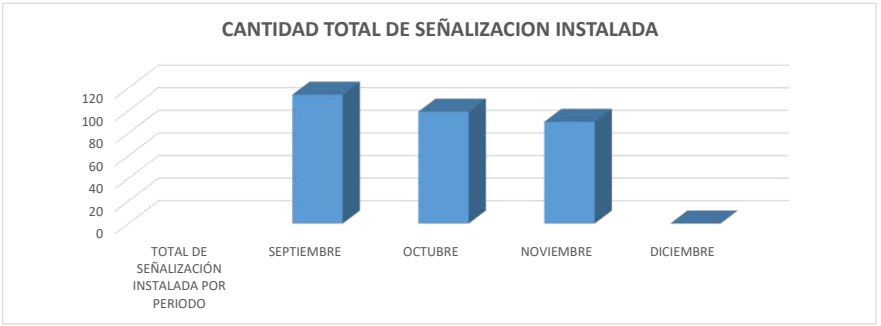

INDICADOR:

SENALIZACION= No. SENALIZACION INSTALADA EN EL FRENTE DE OBRA / No. SEÑALIZACIÓN DEL PMT ESTABLECIDO EN EL FRENTE DE OBRA *100%

SEÑALIZACION= No.90 SEÑALES INSTALADAS EN EL FRENTE DE OBRA / No. 90 SENALES REQUERIDAS EN OBRA *100%

SEÑALIZACION INSTALADA EN OBRA = No.90 / No. 90 *100%

SEÑALIZACION = 100%


5.3.3.2 REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA		
		
INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO	INDUCCION DE INGRESO

OBSERVACIONES: Se registra las inducciones de ingreso de personal de obra durante el periodo.

5.3.3.2 REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

5.3.3.2 A REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

INDUCCIONES EN OBRA	CANTIDAD
MAYO	17
JUNIO	1
JULIO	10
AGOSTO	4
SEPTIEMBRE	7
OCTUBRE	6
NOVIEMBRE	5
DICIEMBRE	0
TOTAL	50

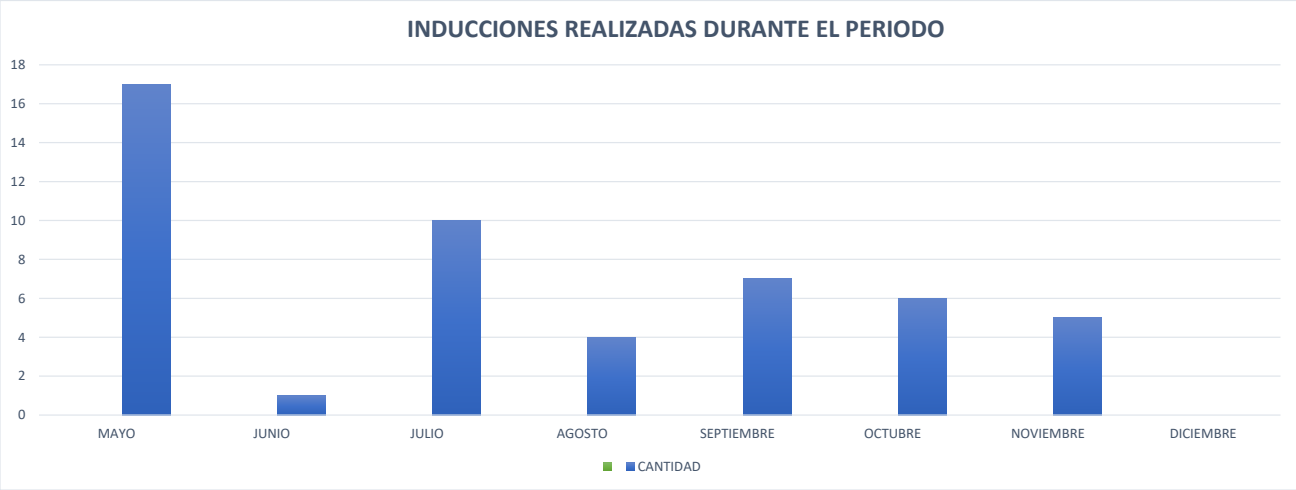

INDICADOR:

INDUCCIONES= No. TOTAL DE INDUCCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO *100%
No. TOTAL DE TRABAJADORES DE INGRESO EN EL PERIODO

INDUCCIONES = No. 50 *100%
No. 50

INDUCCIONES= No. 50 INDUCCIONES REALIZADAS *100%
No. 50 TOTAL DE TRABAJADORES DE INGRESO A OBRA

CUMPLIMIENTO EN INDUCCIONES DE INGRESO A OBRA = 100%

MANO DE OBRA VINCULADA AL PROYECTO DE SABANAGRANDE		
TIPO DE MANO DE OBRA Y PROCEDENCIA	INFORMACION DEL PERIODO	
	No. EMPLEOS DEL PERIODO	ACUMULADO
MONC DEL AIP	3	18
MONC FORANEA	2	20
MOC DEL AIP	0	0
MOC FORANEA	0	12
TOTAL GENERAL	5	50

OBSERVACION: PARA EL PRESENTE PERIODO, EL CONTRATISTA DE SABANAGRANDE REPORTA 5 INGRESOS PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATO. REPORTA 12 PERSONAS MOC Y SE ESTIMA 38 PERSONAS DE MONC.


Personal total durante el periodo de noviembre: 39

TOTAL DE TRABAJADORES: 50 PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO.

5.3.3.2 REGISTRO DE PERSONAL: INDUCCIONES DE INGRESO A PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE AUSENTISMO EN OBRA POR ACCIDENTE LABORAL

AUSENTISMO EN OBRA	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	
TOTAL	0

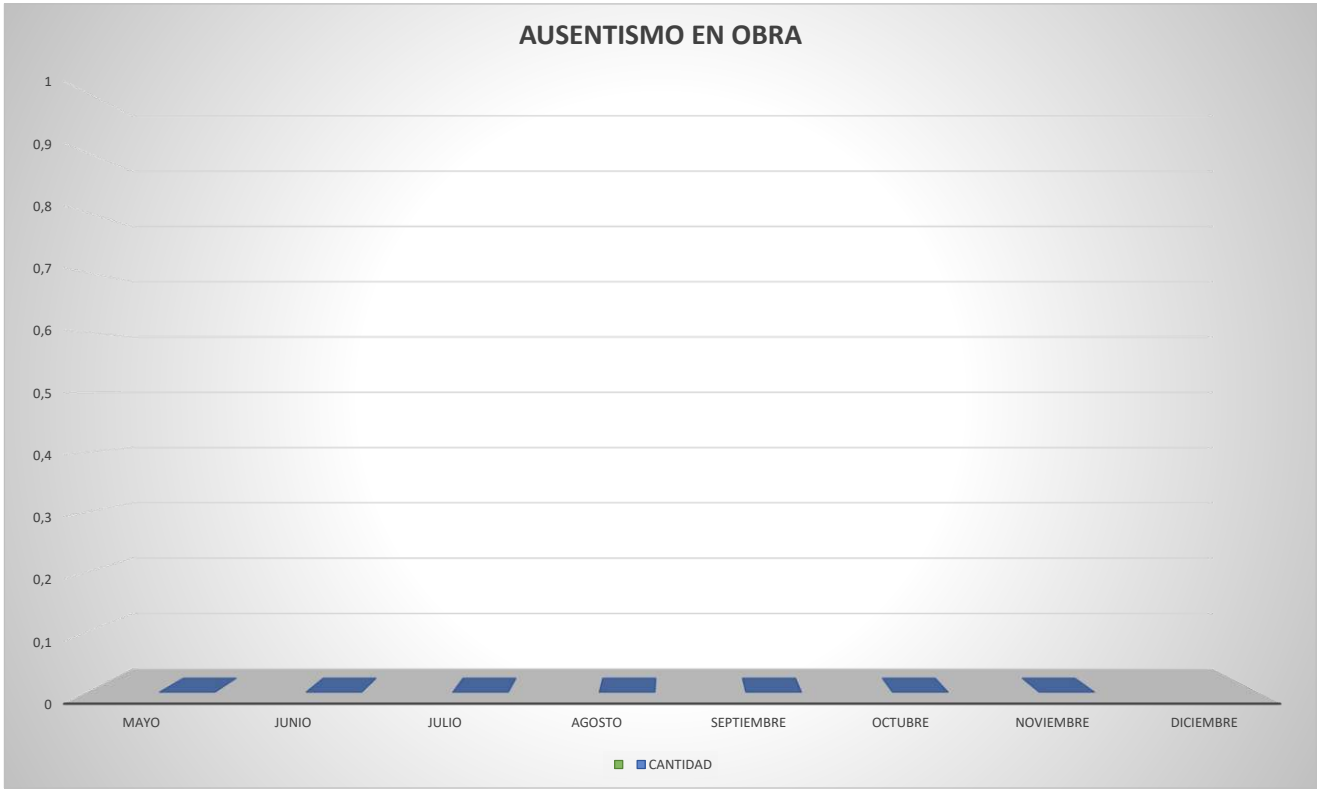

INDICADOR:


AUSENTISMO= No. TOTAL DE HORAS LABORADAS= / No. TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS *100%

AUSENTISMO= No. 0 ASUENTISMO EN OBRA = / (50 Trabajadores)*(8hrs)*(30 DIAS) *100%

AUSENTISMO= 0%

5.3.3.3 REGISTRO DE ACCIDENTES EN OBRA
Observaciones: Durante el periodo del presente informe no se registran accidentes de trabajo.

ACCIDENTES DE TRABAJO	CANTIDAD
MAYO	0
JUNIO	1
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	
TOTAL	1

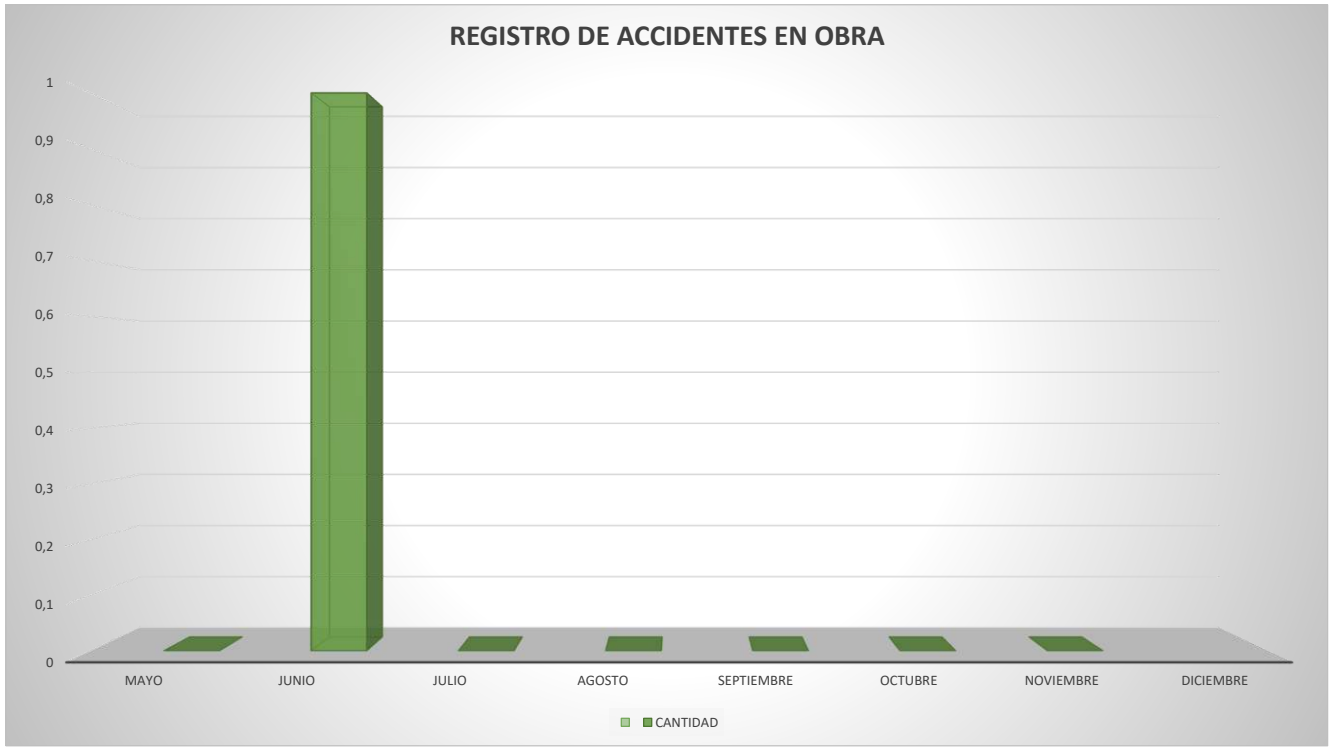

INDICADOR:

$$\text{ACCIDENTE LABORAL} = \frac{\text{No. TOTAL ACCIDENTE LABORALES DURANTE EL PERIODO}}{\text{No. TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO}} * 100\%$$

$$\text{ACCIDENTE LABORAL} = \frac{1}{39} * 100\% \qquad \text{ACCIDENTE LABORAL} = 0{,}03\%$$

5.3.3.4 CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA



CHARLAS DIARIAS



CHARLAS DIARIAS



CHARLAS DIARIAS



CHARLAS DIARIAS



CHARLAS DIARIAS



CHARLAS DIARIAS


5.3.3.4 CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA

		
CAPACITACIONES AL PERSONAL	CAPACITACIONES AL PERSONAL	CAPACITACIONES AL PERSONAL
		
CAPACITACIONES AL PERSONAL	CAPACITACIONES AL PERSONAL	CAPACITACIONES AL PERSONAL


OBSERVACIONES: Se registra las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas en obra durante el periodo.

5.3.3.4 CHARLAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL EN OBRA

REGISTGRO DE LA ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES			
ITEM	**TEMA DE LA CAPACITACION**	**ASISTENTES**	**FECHA**
1	QUE ES ARL.AFP,EPS	16	6/11/2024
2	PORQUE USAR CODIGO DE COLORES	16	7/11/2024
3	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	15	8/11/2024
4	10 CLAVES PARA SER MAS FELIZ EN EL TRABAJO	20	13/11/2024
5	RIESGO PSICOSOCIAL ESTRATEGIAS DE AUTOCONTROL	20	14/11/2024
6	QUE ES ENFERMEDAD LABORAL Y COMO SE PREVIENE	20	15/11/2024
7	8 APUNTES SOBRE EL RECICLAJE	20	21/11/2024
8	CONSEJOS DE PREVENCION RIESGOS LABORALES	20	25/11/2024
9	COMPETENCIA PARA APRENDER	22	26/11/2024
10	RIESGOS POR EL USO DEL CELULAR	20	27/11/2024

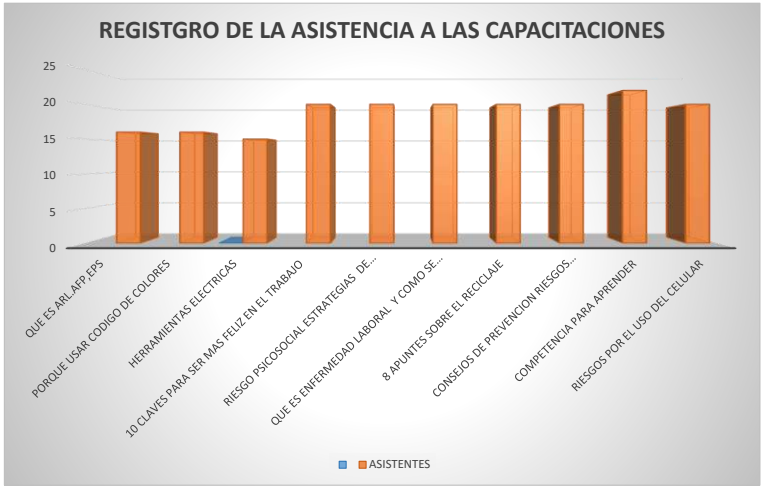

CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	CANTIDAD
MAYO	9
JUNIO	12
JULIO	14
AGOSTO	12
SEPTIEMBRE	12
OCTUBRE	11
NOVIEMBRE	10
DICIEMBRE	0
TOTAL	80

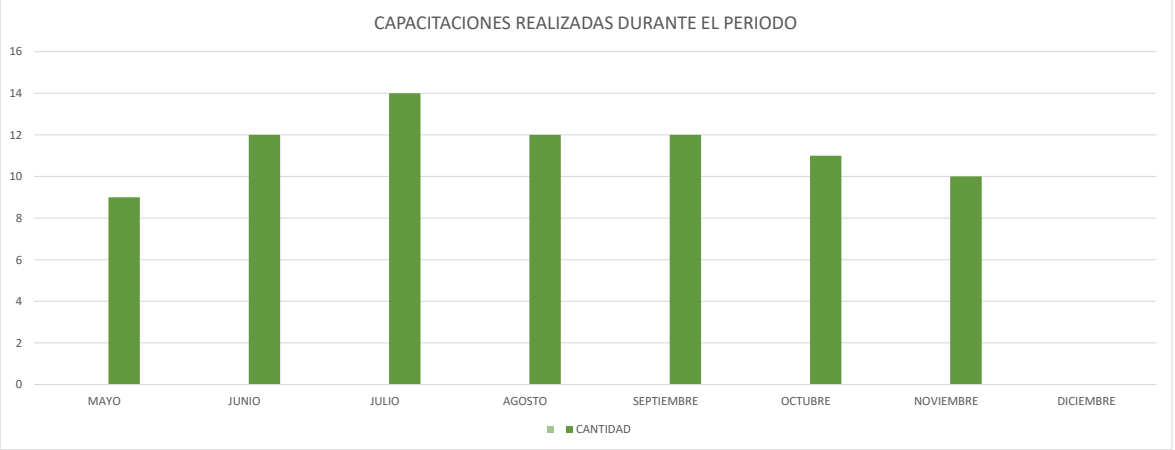

INDICADOR:

CHARLAS= No. CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO / No. TOTAL DE CHARLAS Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO *100%

CHARLAS Y CAPACITACIONES = No. 80 DURANTE EL PROYECTO No. 80 *100%

CHARLAS = No. 10 CHARLAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS / No. 10 TOTAL DE CHARLAS Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100%

CUMPLIMIENTO EN CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL EN OBRA = 100%

5.3.3.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

5.3.3.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL




ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

OBSERVACIONES: Se registro de las entregas de los elementos de protección personal a los trabajadores en obra durante el presente periodo.

5.3.3.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP POR EL PERSONAL EN OBRA

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA

INSPECCION DE USO Y ENTREGA DE EPP	CANTIDAD
MAYO	17
JUNIO	1
JULIO	10
AGOSTO	4
SEPTIEMBRE	7
OCTUBRE	28
NOVIEMBRE	20
DICIEMBRE	0
TOTAL	87

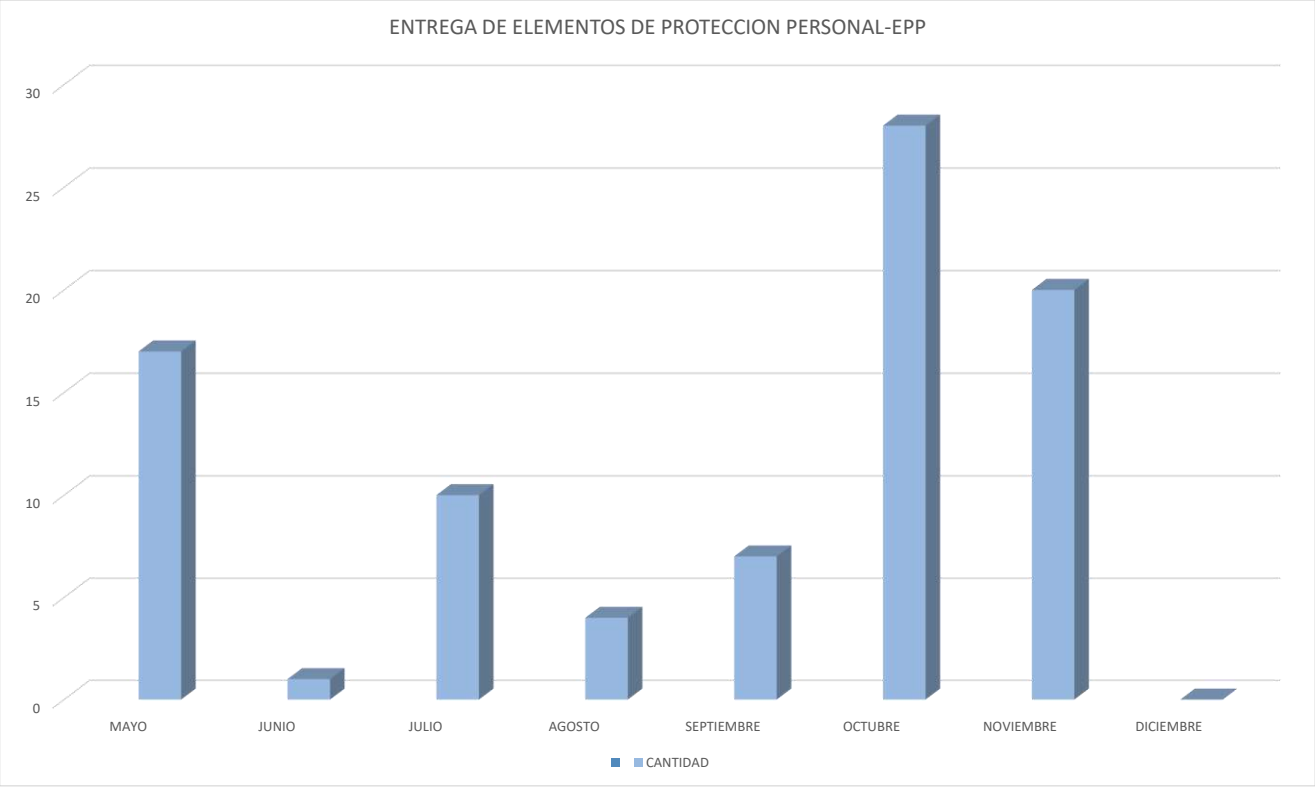

INDICADOR:

$$EPP = \frac{\text{No.TRABAJADORES CON USO Y ENTREGA DE EPP EN EL PERIODO}}{\text{No. TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PERIODO}} * 100\%$$

$$EPP = \frac{\text{No. 20 TRABAJADORES CON USO Y ENTREGA DE EPP EN EL PERIODO}}{\text{No.39 TOTAL TRABAJADORES EN EL PERIODO}} * 100\%$$

$$\text{ENTREGA EPP} = \frac{\text{No. 20}}{\text{DURANTE EL PERIODO No. 39}} * 100\%$$

ENTREGA DE EPP = 70%

5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA



INSPECCION DE MAQUINARIA



INSPECCION DE MAQUINARIA



INSPECCION DE VOLQUETAS



INSPECCION DE SEÑALIZACION



INSPECCION DE SEÑALIZACION



INSPECCION DE HERRAMIENTAS

5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA		
		
INSPECCION DE HERRAMIENTAS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS
		
INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA - CAMILLA DE EMERGENCIAS	INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA - CAMILLA DE EMERGENCIAS	INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA - CAMILLA DE EMERGENCIAS

5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA



INSPECCION DE PUNTO ECOLOGICO



PUNTO DE ENCUENTRO



INSPECCION DE AREAS DE ALMACENAMIENTO



INSPECCION DE ORDEN Y ASEO



INSPECCION DE BOTIQUIN



INSPECCION DE EXTINTORES

5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA

		
SEÑALIACIÓN DE AREAS	SEÑALIZACIÓN AREA LAVADO DE MIXER	SEÑALIACIÓN DE AREAS
		
INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE ACTIVIDADES EN OBRA	INSPECCION DE VOLQUETA

5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA



INSPECCION DE VOLQUETA



INSPECCION DE MAQUINARIA



INSPECCION DE MAQUINARIA



INSPECCION DE MAQUINARIA



INSPECCION DE ACTIVIDADES EN OBRA



INSPECCION DE PUNTOS DE ACOPIOS SEÑALIZADOS

5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA

		
INSPECCION DE MAQUINARIA	INSPECCION DE VOLQUETA	INSPECCION DE ACTIVIDADES EN OBRA
		
VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO	INSPECCION DE ACTIVIDADES EN OBRA

5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA


		
INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO
		
INSPECCION DE VOLQUETA	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	INSPECCION DE MAQUINARIA

OBSERVACIONES: Se registra el seguimiento a las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas en obra.


5.3.3.6 SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES EN OBRA

REGISTRO DE LAS INSPECCIONES EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

INSPECCIONES EN OBRA	CANTIDAD
INSPECCIÓN DE USO DE EPP	20
INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	1
INSPECCION DE EXTINTOR	1
INSPECCION DE CAMILLA	1
INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS	2
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACION	1
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA	4
INSPECCION LOCATIVA Y DE ORDEN Y ASEO	3
PERMISOS DE TRABAJO	4
INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	4
TOTAL	41

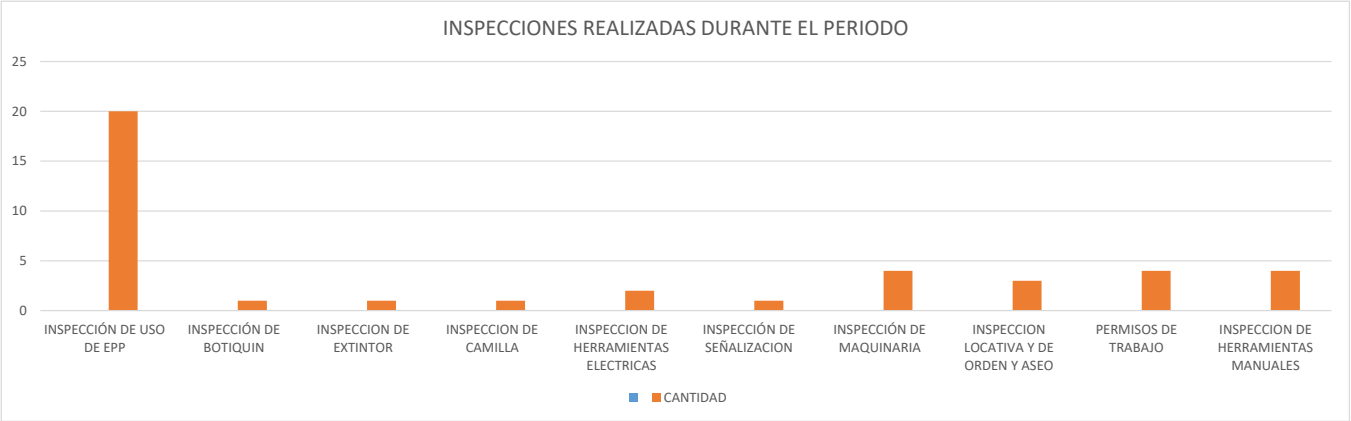

TOTAL DE INSPECCIONES DURANTE EL PERIODO	
SEPTIEMBRE	68
OCTUBRE	122
NOVIEMBRE	41
DICIEMBRE	0
TOTAL	231

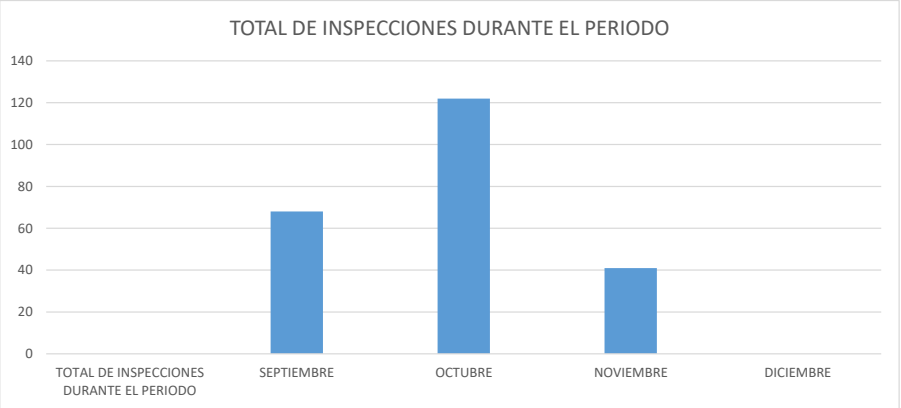

INDICADOR:

INSPECCIONES= No. TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO / No. TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO *100%

INSPECCIONES = No. 41 / DURANTE EL PERIODO No. 41 *100%=1

INSPECCIONES= No. TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO / No. 41 INSPECCIONES PROGRAMADAS *100%

INSPECCIONES DURANTE EL PROYECTO = 231

5.3.3.7 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA


	
ANTES : Se evidencia el colaborador sin uso de epp-casco	**DESPUES:** Se observa uso de los elementos de protección personal epp al colaborador-casco
	
ANTES : Se evidencia área sin demarcación o delimitación - cinta de peligro	**DESPUES:** Se observa la instalación de cinta de peligro y señalización en el área.

OBSERVACIONES: Se registran los actos y condiciones inseguras en obra.

5.3.3.7 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA

REGISTRO DE REPORTE DE LOS ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN OBRA

HALLAZGOS POR MES	CANTIDAD ABIERTAS	CANTIDAD CERRADAS
MAYO	0	0
JUNIO	1	1
JULIO	1	1
AGOSTO	1	1
SEPTIEMBRE	2	2
OCTUBRE	2	2
NOVIEMBRE	0	2
DICIEMBRE	0	0
TOTAL	7	9

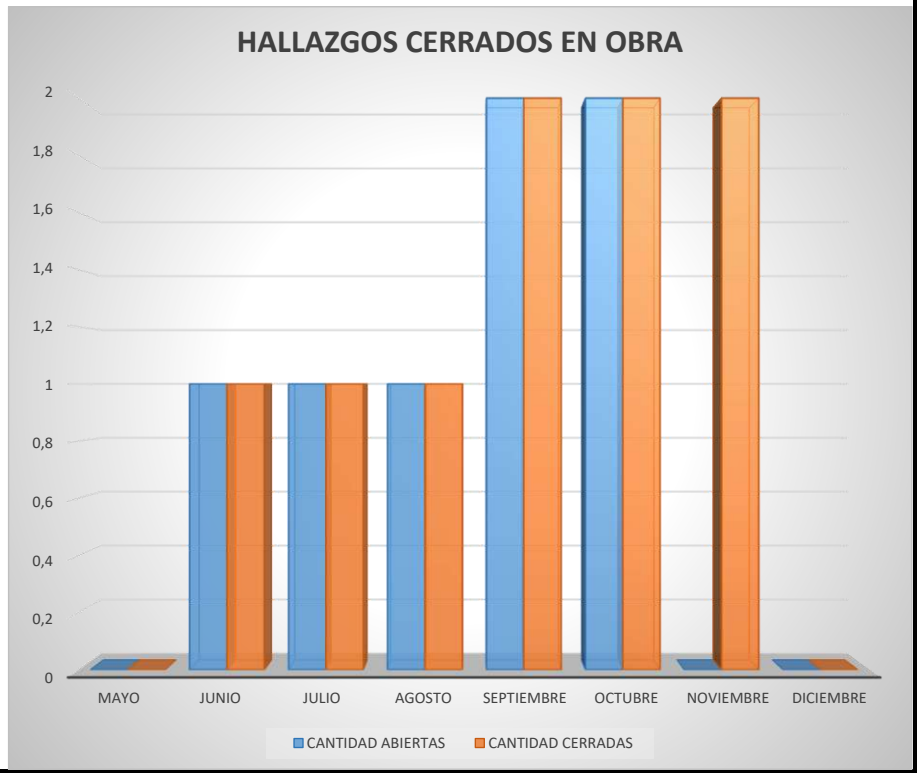

INDICADOR:

A.C= No. HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL PERIODO *100%= / No. TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS DURANTE EL PERIODO *100%

A.C= 2 HALLAZGOS ABIERTOS DURANTE EL PERIODO *100%= / 2 TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS EN EL PERIODO *100%

A.C= TOTAL HALLAZGOS CERRADOS DURANTE EL PROYECTO= 9

5.3.3.8.B Conclusiones

Durante la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía “MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAGRANDE -POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, Con el objetivo de mantener y mejorar los estándares de seguridad y salud en la empresa, durante la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía, el resultado de las actividades implementadas en la prevención y la protección de la seguridad y la salud en el trabajo.

Actividades de prevención y promoción: reforzar en temas de prevención permite que los trabajadores implementen en obra acciones preventivas para minimizar los riesgos y mantener el indicador de accidentalidad en cero, incentivaron una cultura donde la prevención de riesgos permite la mejora continua y el autocuidado.

Control de tráfico en obra: se evidencia durante el periodo la implementación del control de trafico en el sector para mantener la movilidad de los usuarios en el corredor y evitar traumatismos en la vía.

5.3.3.9.B Recomendaciones

Con el fin de mantener el objetivo y mejorar los estándares de seguridad y salud en la empresa, durante la ejecución del proyecto, se implementó una gestión proactiva de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), se derivan las siguientes recomendaciones:

Mantener la señalización del sector de intervención para lo cual debe realizar el mantenimiento periódico e inspecciones rutinarias, con el fin de mantener visible la información a los usuarios del corredor vial sobre las actividades que se encuentra ejecutando en la obra.

Realizar jornadas de orden y aseo para conservar las áreas limpias de trabajo y retirando los obstáculos que puedan representar riesgos y permita evitar accidentes en obra.

Continuar con las capacitaciones o charlas diarias al personal, fomentar en los trabajadores una cultura del autocuidado.



Inspector SISO: Mary Miranda E.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

7

NOVIEMBRE 2024

CONTENIDO

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.1. MAQUINARIA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 de noviembre de 2024 (Día) (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MES DE INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 **CONTRATO No.** 4805 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIA LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) VIA SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (SABANA GRANDE)

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ODESSA

SECTOR: VIA LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) VIA SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (SABANA GRANDE)

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Vehículo tipo camioneta	VOLSWAGEN AMAROK PLACAS GPO 496	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	MARCA AKT DE PLACAS UXJ82F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	MARCA VICTORY DE PLACAS GNU37G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	MARCA YAMAHA DE PLACAS KLI01E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Equipo de Oficina																																
Computador 1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Computador 2	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Impresora 1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Camara Fotografica 1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Cámara de video	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Equipo de Topografia																																
NIVEL AUTOMATICO	TOPCON REFERENCIA AT-B4A SERIAL WP061511	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ESTACION TOTAL ELECTRONICA	TOPCON GTS-229 SERIAL UP0714	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EP 0083 ESTACIÓN TOTAL - GTS-229 SERIAL UP0714 fecha de vencimiento de calibración el 4 de marzo de 2025.
EP 0250 NIVEL DE PRECISIÓN TOPCON REFERENCIA AT-B4A SERIAL WP061511 con fecha de vencimiento de calibración el 4 de marzo de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 de noviembre de 2024 (Día) (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MES DE INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 **CONTRATO No.** 4805 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIA LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) VIA SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (SABANA GRANDE)

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ODESSA

SECTOR: VIA LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) VIA SABANAGRANDE – LIMITES POLONUEVO (SABANA GRANDE)

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula No.: 01113-10647 CPITV

Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 0820251744 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 NOV 2024 AL 30 NOV 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No.: PONEDERA: LP-001-2023 SABANAGRANDE: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA SABANAGRANDE: CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO - CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOHN ANDRES ARIAS HUERTAS	1057185459	DIRECTOR	$ 6.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CGR S.A.S	$ 6.800.000	$ 473.300	V	NUEVA EPS	7951076451	$ 272.000	PORVENIR	7951076451	$ 1.156.000	$ 272.000			
2	RONALD OSWALDO MOLINARES	74377185	ING RESIDENTE	$ 5.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 5.100.000	$ 355.000	V	NUEVA EPS	7951076885	$ 204.000	PORVENIR	7951076885	$ 816.000	$ 204.000			
3	DANIEL ARTURO LEON ACOSTA	1018478900	ING RESIDENTE	$ 3.570.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70%	CGR S.A.S	$ 3.600.000	$ 250.600	V	NUEVA EPS	7951076451	$ 144.000	PROTECCION	7951076451	$ 576.000	$ 144.000			
4	ALBA ROCIO FLOREZ	51730932	PROF SOCIAL	$ 3.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 3.750.000	$ 130.500	V	SANITAS SA	7951076885	$ 75.000	COLPENSIONES	7951076885	$ 300.000	$ 75.000			
5	LINA PATRICIA CARVAJAL SUAREZ	37900092	ESP. AMBIENTAL	$ 3.050.000	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	50%	LINA PATRICIA C. S.	$ 3.050.000	$ 212.300	V	NUEVA EPS	31500221	$ 381.300	COLFONDOS	31500221	$ 488.000	$ -			
6	RITO ALBERTO BLANCO MONTAÑEZ	88157739	INSPECTOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 2.200.000	$ 153.200	V	SANITAS SA	7951076885	$ 88.000	PORVENIR	7951076885	$ 352.000	$ 88.000			
7	CESAR AUGUSTO LUNA GUTIERREZ	10180032	INSPECTOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CGR S.A.S	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	7951076451	$ 88.000	COLPENSIONES	7951076451	$ 352.000	$ 88.000			
8	MARY MIRANDA ERAZO	46646551	INSPECTOR SST	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	7951076885	$ 88.000	PORVENIR	7951076885	$ 352.000	$ 88.000			
9	LIZ DAYANNA PEREZ NORIEGA	1042353465	SECRETARIA	$ 1.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 1.300.000	$ 6.800	I	NUEVA EPS	7951076885	$ 52.000	PROTECCION	7951076885	$ 208.000	$ 52.000			
10																																															
11																																															
12																																															
13																																															
14																																															
N																																															
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 30.110.000																																											

El Interventor adiunta la certificación de fecha 2/12/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOHN ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES INFORME MENSUAL: 01 NOV 2024 AL 30 NOV 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No: PONEDERA: LP-001-2023 / SABANAGRANDE: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA / SABANAGRANDE: CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1354523	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 305.995.526	$ -
2023	1354523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.223.982.102	$ 681.824.687
TOTAL						$ 1.529.977.628	$ 681.824.687

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.529.977.628**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**01 Feb 2024 - 29 Feb 2024**	$ -	$ -	**$ -**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.529.977.628	$ 1.529.977.628	4780 - 27/05/2024	
2	**01 Mar 2024 - 31 Mar 2024**	$ 55.125.120	$ 10.473.773	**$ 65.598.893**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.464.378.735	$ 1.464.378.735	4780 - 27/05/2024	
3	**01 Abr 2024 - 30 Abr 2024**	$ 58.416.120	$ 11.099.063	**$ 69.515.183**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.394.863.552	$ 1.394.863.552	6408 - 26/06/2024	
	ANTICIPO				**$ 257.139.097**			1354523 de 11/12/2023	**$ 1.137.724.455**		2866 - 18/04/2024	
4	**01 May 2024 - 31 May 2024**	$ 75.486.280	$ 14.342.393	**$ 89.828.673**	$ 15.097.256	**$ 74.731.417**	$ 242.041.841	1354523 de 11/12/2023	$ 1.062.993.038	$ 1.305.034.879	6520 - 27/06/2024	
5	**01 Jun 2024 - 30 Jun 2024**	$ 78.165.520	$ 14.851.449	**$ 93.016.969**	$ 15.633.104	**$ 77.383.865**	$ 226.408.737	1354523 de 11/12/2023	$ 985.609.173	$ 1.212.017.910	9446 - 22/08/2024	
6	**01 Jul 2024 - 31 Jul 2024**	$ 81.328.400	$ 15.452.396	**$ 96.780.796**	$ 16.265.680	**$ 80.515.116**	$ 210.143.057	1354523 de 11/12/2023	$ 905.094.057	$ 1.115.237.114	10287 - 04/09/2024	
7	**01 Ago 2024 - 31 Ago 2024**	$ 84.838.620	$ 16.119.338	**$ 100.957.958**	$ 16.967.724	**$ 83.990.234**	$ 193.175.333	1354523 de 11/12/2023	$ 821.103.823	$ 1.014.279.156	14408 - 05/11/2024	
8	**01 Sep 2024 - 30 Sep 2024**	$ 78.927.560	$ 14.996.236	**$ 93.923.796**	$ 51.302.914	**$ 42.620.882**	$ 141.872.419	1354523 de 11/12/2023	$ 778.482.941	$ 920.355.360	15539 - 15/11/2024	
9	**01 Oct 2024 - 31 Oct 2024**	$ 97.634.600	$ 18.550.574	**$ 116.185.174**	$ 19.526.920	**$ 96.658.254**	$ 122.345.499	1354523 de 11/12/2023	$ 681.824.687	$ 804.170.186	15873 - 15/11/2024	
10	**01 Nov 2024 - 30 Nov 2024**	$ 84.155.600	$ 15.989.564	**$ 100.145.164**	$ 75.740.040	**$ 24.405.124**	$ 46.605.459	1354523 de 11/12/2023	$ 657.419.563	$ 704.025.022		
TOTALES		**$ 694.077.820**	**$ 131.874.786**	**$ 825.952.606**	**$ 210.533.638**		**$ 46.605.459**		**$ 657.419.563**	**$ 704.025.022**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 530.225.920	$ 100.742.925	$ 630.968.845
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 163.851.900	$ 31.131.861	$ 194.983.761
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 694.077.820**	**$ 131.874.786**	**$ 825.952.606**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOHN ANDRES ARIAS HUERTAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01113-10647 CPITV

Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

FECHA DE INICIO: 19 de diciembre de 2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14 de diciembre de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.529.977.628,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.529.977.628,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 152.997.762,80	1	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	$ 257.139.097,10	1	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 305.995.525,60	1	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 458.993.288,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **M-100217062**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 152.997.762,80	19	12	2023	14	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 257.139.097,10	19	12	2023	14	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 305.995.525,60	19	12	2023	14	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 458.993.288,40	19	12	2023	14	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **M-100217062**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:
-

OBSERVACIONES:
Polizas actualizadas con la Porroga No. 1.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto

Firma
Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula No.: 01113-10647 CPITV

Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 0820251744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.21 14:35:30 -05:00

Código de Seguridad: zZlRAeipVrrAZ7wD8l25qQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100217062	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14866951	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/12/2023	24:00 Horas Del	14/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ODESSA	No. DOC. IDENTIDAD	901.513.605-6
DIRECCIÓN	CL 150 N 16-56 OF 4001	TELÉFONO	6147590
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE PRORROGA LA VIGNEICA DEL CONTRATO HASTA EL 14/12/2024. SEGUN CONTRATO NÚMERO 4805 DE 2023
PRORROGA NÚMERO UNO (01) DE 2024.
-
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA NO SE MODIFICAN.
-
OBJETO:***
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4805-2023 , CUYO OBJETO ES: SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/01/2024	24:00 Horas Del 14/06/2025	152.997.762,80	319.618,61
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 23/01/2024	24:00 Horas Del 14/06/2025	257.139.097,10	537.174,14
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/01/2024	24:00 Horas Del 14/12/2027	305.995.525,60	637.141,37
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 14/12/2024	24:00 Horas Del 14/12/2029	458.993.288,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.175.125.673,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIESGOS Y SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.493.934,12
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.493.934,12
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	283.847,48
TOTAL A PAGAR	$	1.777.781,60

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100217062	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14866951	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/12/2023	24:00 Horas Del	14/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO 4805 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1."

.

QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

.

EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

.

LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

.

QUE EL CONSORCIO ODESSA CON NIT. 901.513.605-6 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, GARANTIZADO Y AFIANZADO.

.

QUE EL CONSORCIO ODESSA CON NIT. 901.513.605-6 ESTÁ INTEGRADO POR:
- CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 95%
- CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S CON NIT. 900.804.544-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 5%

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 830076603 (PART. 95,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900804544 (PART. 5,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ODESSA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100217062** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ODESSA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2** , expedida por la Compañía en **21/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **21** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO -MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

FECHA DE INICIO: 19 de diciembre de 2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 14 de diciembre de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2023 (Ponedera) SG-LP-OP-004-2023 (Sabanagrande) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA GIRALDA CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. 00 FECHA DE VERSIÓN: 1/12/2023

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: marzo-25

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 99 No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 99

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X N ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30 de noviembre de 2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
Satisfacción del cliente = Calificación de los clientes	4,60	Meta: Lograr que la calificación de los clientes sea mayor o igual a 4,0 sobre 5,0. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficacia en compras y subcontrataciones = Productos y servicios entregados o desarrollados en los tiempos preestablecidos/Total productos entregados y servicios desarrollados	100%	Meta: ≥90%. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Proveedores y subcontratistas calificados = Compras (subcontrataciones) a proveedores (subcontratistas) aprobados/Total compras (subcontrataciones) realizadas	100%	Meta: ≥90%. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficiencia en la ejecución del proyecto = Costo rea/Presupuesto interno	1,0	Meta: ≤1. Periodicidad: Mensual. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficacia en la entrega de informes al cliente = Informes entregados en los plazos predeterminados por el cliente/Total informes entregados	100%	Meta: ≥80%. Periodicidad: Mensual. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Desempeño de personal = Calificación en las evaluaciones de desempeño de los trabajadores	4,5	Meta: ≥4 sobre 5. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Capacitación y entrenamiento de personal = Cursos y/o talleres/trabajador	12 Horas/trabajador	Meta: 12 horas/trabajador. Periodicidad: Anual. No aplica, teniendo en cuenta que la medición de dicho indicador se realiza anual.
Equipos calibrados = Equipos calibrados/Total equipos utilizados para los ensayos	100%	Meta: 100%. Periodicidad: Mensual. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficacia de acciones correctivas y preventivas = Número acciones correctivas y preventivas cerradas en el plazo preestablecido/Total acciones correctivas y preventivas formuladas	100%	Meta: ≥90%. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.
Eficiencia de acciones correctivas y preventivas = Número de acciones reformuladas/Número de acciones formuladas	0%	Meta: ≤5%. Periodicidad: Semestral. El Indicador de Gestión cumple con la meta establecida.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Máquina de ensayo a compresión	R & R	1805AH23192	nov-23	CF001 del 11/2023	nov-24	
2	Maquina de Ensayos a Flexión - Eléctrica 2 kN a 50 kN	RYR	7130320356	nov-23	CF 152 del 11/2023	nov-24	
3	Balanza electronica	LEXUS	YS. 161439	nov-23	CB 177 del 11/2023	nov-24	
4	Estación Total	TOPCON GTS-229	UP0714	sep-24	CET2863 del 04/09/2024	mar-25	
4	Nivel de precisión	TOPCON AT-B4A	WP061511	sep-24	CNA3148 del 04/09/2024	mar-25	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma

Nombre: JOHN ANDRES ARIAS H.
Director de Interventoría
Matricula No.: 01113-10647 CPITV

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.7 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 239278450 **BANCO** BANCO DE BOGOTÁ SUCURSAL: Calle 100 # 9 a – 45 Piso 2

ANTICIPO OTORGADO: 20 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 257.139.097,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 2	7-jun-24	CONSORCIO ODESSA	$ 20.553.400	1	COSTOS DE PERSONAL MARZO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 2	7-jun-24	CONSORCIO ODESSA	$ 9.380.000	2	OTROS COSTOS DIRECTOS MARZO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 3	7-jun-24	CONSORCIO ODESSA	$ 21.829.800	1	COSTOS DE PERSONAL ABRIL 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 3	7-jun-24	CONSORCIO ODESSA	$ 10.430.000	2	OTROS COSTOS DIRECTOS ABRIL 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 4	20-ago-24	CONSORCIO ODESSA	$ 31.765.900	1	COSTOS DE PERSONAL MAYO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 4	20-ago-24	CONSORCIO ODESSA	$ 7.580.000	2	OTROS COSTOS DIRECTOS MAYO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 5	20-ago-24	CONSORCIO ODESSA	$ 32.449.200	1	COSTOS DE PERSONAL JUNIO 2024
TRANSFERENCIA	ACTA DE COSTOS 5	20-ago-24	CONSORCIO ODESSA	$ 8.444.000	2	OTROS COSTOS DIRECTOS JUNIO 2024

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DE PERSONAL	$ 202.598.300,00	$ 106.598.300,00	$ -	$ 106.598.300,00	$ 96.000.000,00
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 54.540.797,00	$ 35.834.000,00	$ -	$ 35.834.000,00	$ 18.706.797,00
TOTALES		**$ 257.139.097,00**	**$ 142.432.300,00**	**$ -**	**$ 142.432.300,00**	**$ 114.706.797,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (NOVIEMBRE-2024): $ 14.327,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 128.666,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
427202	$ 2.854,00	$ -	may-24	8/08/2024	$ 2.854,00
427202	$ 36.940,00	$ -	jun-24	8/08/2024	$ 39.794,00
427202	$ 24.889,00	$ -	jul-24	8/08/2024	$ 64.683,00
715202	$ 21.008,00	$ -	ago-24	9/05/2024	$ 85.691,00
81272	$ 14.323,00	$ -	sep-24	17/10/2024	$ 100.014,00
83748	$ 14.325,00	$ -	oct-24	14/11/2024	$ 114.339,00
87430	$ 14.327,00	$ -	nov-24	5/12/2024	$ 128.666,00

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: OSCAR JAVIER CARZON DIAZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma:
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820251744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 427202

jueves, 08 de agosto de 2024, 3:44:28 PM

Detalle

$64,683.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******9639
Descripción:	RENDIMIENTOS MAYO JUNIO Y JULIO
Fecha y hora inicio transacción	2024-08-08 3:41:30
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	75663
Código Único de Seguimiento	832104046
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	75663
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/08/2024
Ticket ID:	75663
Transacción/CUS:	832104046
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS MAYO JUNIO Y JULIO
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	64683
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

11 de junio de 2024

CERTIFICACION

El BANCO DE BOGOTÁ, manifiesta por medio de este documento que la empresa **CONSORCIO ODESSA**, identificado(a) con NIT **901.513.605-6**, esta vinculado al Banco con el siguiente(s) producto(s),

CTA DE AHORROS No. 239278450, rendimientos generados al 31 de mayo de 2024.

31/05/2024	2,854.00

En este mismo sentido, se aclara que el presente certificado se refiere únicamente al producto(s) anteriormente mencionado(s).

Atentamente,

Firma Autorizada
Banca Pyme
Gerencia Pyme 1774

Banco de Bogotá

Mejor banco en Colombia 2023: Global Finance | Great Place To Work 2023 | Sustainability Yearbook 2023 | EFR 2023

Estamos para usted
Pyme: 60 1 364 7400
Empresas: 60 1 607 9006

Queremos brindarle el mejor servicio, contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de **lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m.** al teléfono fijo: **601 332 0101**, celular **(+57) 318 373 00 77,** correo electrónico **defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co**, o en la dirección **Calle 36 No. 7 – 47 piso 5** en la ciudad de **Bogotá D.C.** Consulte el procedimiento para presentar una queja y las funciones que ejerce el Defensor del Consumidor Financiero **ingresando a www.bancodebogota.com/defensordelconsumidor**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

5 de julio de 2024

CERTIFICACION

El BANCO DE BOGOTÁ, manifiesta por medio de este documento que la empresa **CONSORCIO ODESSA**, identificado(a) con NIT **901.513.605-6**, esta vinculado al Banco con el siguiente(s) producto(s),

CTA DE AHORROS No. 239278450, rendimientos generados al 30 de Junio de 2024.

30/06/2024	36,940.00

En este mismo sentido, se aclara que el presente certificado se refiere únicamente al producto(s) anteriormente mencionado(s).

Atentamente,

Firma Autorizada
Banca Pyme
Gerencia Pyme 1774

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

5 de agosto de 2024

CERTIFICACION

El BANCO DE BOGOTÁ, manifiesta por medio de este documento que la empresa **CONSORCIO ODESSA**, identificado(a) con NIT **901.513.605-6**, esta vinculado al Banco con el siguiente(s) producto(s),

CTA DE AHORROS No. 239278450, rendimientos generados al 31 de Julio de 2024.

31/07/2024	24,889.00

En este mismo sentido, se aclara que el presente certificado se refiere únicamente al producto(s) anteriormente mencionado(s).

Atentamente,

Firma Autorizada
Banca Pyme
Gerencia Pyme 1774

Banco de Bogotá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 715202

jueves, 05 de septiembre de 2024, 11:37:17 AM

Detalle

$21,008.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******9639
Descripción:	RENDIMIENTOS AGOSTO
Fecha y hora inicio transacción	2024-09-05 11:32:58
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	77760
Código Único de Seguimiento	893242207
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	77760
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/09/2024
Ticket ID:	77760
Transacción/CUS:	893242207
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS AGOSTO
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	21008
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Nit. 860.002.964-4

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la Empresa **CONSORCIO ODESSA,** identificado con **NIT.901.513.605.6** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CUENTA DE AHORROS Nro.239278450.**

Este producto fue constituido para el manejo de los recursos del anticipo del contrato 4805-2023, cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento mantenimiento de vías terciarias en los municipios del departamento del atlántico lote 1, cuenta de ahorros que genera rendimientos y será manejada según las condiciones que el mismo contrato exprese.
La cuenta será manejada con firmas conjuntas del Señor Oscar Javier Garzon Diaz, representante legal del Consorcio Odessa y del señor Rafel Gustavo Rodriguez Meza, supervisor del contrato 4805-2023.

A la fecha a recibido intereses en total desde la apertura de $ 85.691 así:
Intereses Últimos 5 Periodos

Fecha	Valor
31/05/2024	2.854,00
30/06/2024	36.940,00
31/07/2024	24.889,00
31/08/2024	21.008,00

La presente se emite a solicitud del titular del producto a los 09 días del mes de septiembre de 2024

Cordialmente,

Firma Autorizada
Gerente PYME

Banco de Bogotá
GERENCIA PYME

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 333202

jueves, 17 de octubre de 2024, 9:23:34 AM

Detalle

$14,323.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******9639
Descripción:	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-17 9:19:08
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	81272
Código Único de Seguimiento	987240401
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	81272
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/10/2024
Ticket ID:	81272
Transacción/CUS:	987240401
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	14323
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Nit. 860.002.964-4

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la Empresa **CONSORCIO ODESSA,** identificado con **NIT.901.513.605.6** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CUENTA DE AHORROS Nro.239278450.**

Este producto fue constituido para el manejo de los recursos del anticipo del contrato 4805-2023, cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento mantenimiento de vías terciarias en los municipios del departamento del atlántico lote 1, cuenta de ahorros que genera rendimientos y será manejada según las condiciones que el mismo contrato exprese.
La cuenta será manejada con firmas conjuntas del Señor Oscar Javier Garzon Diaz, representante legal del Consorcio Odessa y del señor Rafel Gustavo Rodriguez Meza, supervisor del contrato 4805-2023.

Los intereses recibidos en el mes de septiembre 2024 $ así: 14.323.00

Intereses mes Septiembre2024

Fecha	Valor
31/09/2024	$14.323,00

La presente se emite a solicitud del titular del producto a los 15 días del mes de octubre de 2024

Cordialmente,

Firma Autorizada
Gerente PYME

Banco de Bogotá
GERENCIA PYME

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 333202

jueves, 17 de octubre de 2024, 9:23:34 AM

Detalle

$14,323.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta corriente ******9639
Descripción:	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-17 9:19:08
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	81272
Código Único de Seguimiento	987240401
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	81272
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/10/2024
Ticket ID:	81272
Transacción/CUS:	987240401
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	14323
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Nit. 860.002.964-4

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la Empresa **CONSORCIO ODESSA,** identificado con **NIT.901.513.605.6** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CUENTA DE AHORROS Nro.239278450.**

Este producto fue constituido para el manejo de los recursos del anticipo del contrato 4805-2023, cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento mantenimiento de vías terciarias en los municipios del departamento del atlántico lote 1, cuenta de ahorros que genera rendimientos y será manejada según las condiciones que el mismo contrato exprese.
La cuenta será manejada con firmas conjuntas del Señor Oscar Javier Garzon Diaz, representante legal del Consorcio Odessa y del señor Rafel Gustavo Rodriguez Meza, supervisor del contrato 4805-2023.

Los intereses recibidos en el mes de septiembre 2024 $ así: 14.323.00
Intereses mes Octubre 2024

Fecha	Valor
31/10/2024	$14.325,00

La presente se emite a solicitud del titular del producto a los 15 días del mes de octubre de 2024

Cordialmente,

Firma Autorizada
Gerente PYME

Banco de Bogotá
GERENCIA PYME

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 545202

jueves, 14 de noviembre de 2024, 4:15:46 PM

Detalle

$14,325.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******9594
Descripción:	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-14 4:14:42
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	83748
Código Único de Seguimiento	1050063479
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	83748
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	14/11/2024
Ticket ID:	83748
Transacción/CUS:	1050063479
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	14325
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Nit. 860.002.964-4

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la Empresa **CONSORCIO ODESSA,** identificado con **NIT.901.513.605.6** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CUENTA DE AHORROS Nro.239278450.**

Este producto fue constituido para el manejo de los recursos del anticipo del contrato 4805-2023, cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento mantenimiento de vías terciarias en los municipios del departamento del atlántico lote 1, cuenta de ahorros que genera rendimientos y será manejada según las condiciones que el mismo contrato exprese.
La cuenta será manejada con firmas conjuntas del Señor Oscar Javier Garzon Diaz, representante legal del Consorcio Odessa y del señor Rafel Gustavo Rodriguez Meza, supervisor del contrato 4805-2023.

Los intereses recibidos en el mes de noviembre 2024 $ así: 14.327.00

Intereses mes Noviembre 2024

Fecha	Valor
31/11/2024	$14.327,00

La presente se emite a solicitud del titular del producto a los 04 días del mes de diciembre del 2024

Cordialmente,

Firma Autorizada
Gerente PYME

Banco de Bogotá
GERENCIA PYME

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 929202

jueves, 05 de diciembre de 2024, 10:19:30 AM

Detalle

$14,327.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******9594
Descripción:	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2024
Fecha y hora inicio transacción	2024-12-05 10:18:38
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	87430
Código Único de Seguimiento	1102611016
Dirección IP:	190.159.241.37
Referencia 1:	190.159.241.37
Referencia 2:	901513605
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901513605
Nombre del Obligado:	CONSORCIO ODESSA
Teléfono de Contacto:	3165297863
Correo Electrónico del Pagador:	admon.cgrsas@gmail.com
IP:	190.159.241.37

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	87430
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/12/2024
Ticket ID:	87430
Transacción/CUS:	1102611016
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2024
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE BOGOTA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	14327
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

FORMATO MEPI-MN1-N-9-FR-2

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☒ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: PONEDERA: LP-001-2023 SABANAGRANDE SG-LP-OP-004 2023 CONTRATISTA: PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA SABANAGRANDE CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.529.977.628,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.529.977.628,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 14 DE DICIEMBRE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 1/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2024																		TOTAL	
											FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
1	1	Director de Interventoria	$ 6.800.000,00		3,00	$ 20.400.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	0,47	$ 3.196.000,00	9,47	$ 64.396.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 5.100.000,00		3,00	$ 15.300.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	0,47	$ 2.397.000,00	7,47	$ 38.097.000,00
3	1	Ingeniero Residente	$ 5.100.000,00		3,00	$ 15.300.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	0,47	$ 2.397.000,00	4,47	$ 22.797.000,00
4	1	Profesional Social	$ 3.750.000,00		3,00	$ 11.250.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 1.875.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	1,00	$ 3.750.000,00	0,47	$ 1.762.500,00	6,97	$ 26.137.500,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				$ 21.000.000,00																								
5	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,40	$ 2.440.000,00	0,40	$ 2.440.000,00	0,40	$ 2.440.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00		$ -		$ -	4,20	$ 25.620.000,00
6	1	Especialista en Estructuras	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8	1	Especialista Ambiental	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,29	$ 1.769.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	0,23	$ 1.403.000,00	4,52	$ 27.572.000,00
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,21	$ 1.281.000,00		$ -	0,21	$ 1.281.000,00		$ -		$ -	0,21	$ 1.281.000,00	0,21	$ 1.281.000,00	0,21	$ 1.281.000,00		$ -		$ -	1,05	$ 6.405.000,00
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.100.000,00			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,17	$ 1.037.000,00	0,17	$ 1.037.000,00	0,17	$ 1.037.000,00		$ -		$ -	0,17	$ 1.037.000,00	0,17	$ 1.037.000,00	0,17	$ 1.037.000,00		$ -		$ -	1,02	$ 6.222.000,00
		PERSONAL TECNICO																												
11	1	Inspector	$ 2.200.000,00		3,00	$ 6.600.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	0,47	$ 1.034.000,00	9,47	$ 20.834.000,00
12	1	Inspector	$ 2.200.000,00		1,00	$ 2.200.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	0,47	$ 1.034.000,00	4,47	$ 9.834.000,00
13	1	Inspector SST	$ 2.200.000,00		3,00	$ 6.600.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,36	$ 792.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	0,47	$ 1.034.000,00	5,83	$ 12.826.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
14	1	Secretaria	$ 1.240.000,00		3,00	$ 3.720.000,00	$ -	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	1,00	$ 1.240.000,00	0,47	$ 582.800,00	9,47	$ 11.742.800,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 102.370.000,00				$ -		$ -		$ 16.767.000,00		$ 16.767.000,00		$ 25.023.000,00		$ 25.982.000,00		$ 27.390.000,00		$ 37.008.000,00		$ 37.008.000,00		$ 37.008.000,00		$ 34.690.000,00		$ 14.840.300,00		$ 272.483.300,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 241.593.200,00				$ -		$ -		$ 39.570.120,00		$ 39.570.120,00		$ 59.054.280,00		$ 61.317.520,00		$ 64.640.400,00		$ 87.338.880,00		$ 87.338.880,00		$ 87.338.880,00		$ 81.868.400,00		$ 35.023.108,00		$ 643.060.588,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024																		TOTAL	
											FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
14	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	12,00	$ 2.400.000,00				$ -		$ -		$ -	5,00	$ 1.000.000,00		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 1.000.000,00	5,00	$ 1.000.000,00	5,00	$ 1.000.000,00	5,00	$ 1.000.000,00	30,00	$ 6.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
15	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.900.000,00	Mes	3,00	$ 17.700.000,00				$ -		$ -	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	0,47	$ 2.773.000,00	9,47	$ 55.873.000,00
16	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.900.000,00	Mes	3,00	$ 17.700.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	0,47	$ 2.773.000,00	4,47	$ 26.373.000,00
17	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00				$ -		$ -		$ -	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	0,47	$ 296.100,00	8,47	$ 5.336.100,00
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	0,47	$ 296.100,00	7,47	$ 4.706.100,00
19	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 315.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	0,47	$ 296.100,00	6,97	$ 4.391.100,00
20	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00	0,47	$ 296.100,00	4,47	$ 2.816.100,00
21	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.280.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 18.840.000,00				$ -		$ -	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	1,00	$ 6.280.000,00	0,47	$ 2.951.600,00	9,47	$ 59.471.600,00
22	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.800.000,00				$ -		$ -	3,00	$ 1.800.000,00	4,75	$ 2.850.000,00		$ -	1,44	$ 864.000,00	1,28	$ 768.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 1.200.000,00	32,47	$ 19.482.000,00
23	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 3.900.000,00				$ -		$ -	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	0,47	$ 611.000,00	9,47	$ 12.311.000,00
		OTROS COSTOS																												
24	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 3.600.000,00				$ -		$ -		$ -	0,38	$ 456.000,00	0,69	$ 828.000,00		$ -		$ -	0,60	$ 720.000,00	0,60	$ 720.000,00	0,60	$ 720.000,00	0,30	$ 360.000,00	3,77	$ 4.524.000,00
25	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00				$ -		$ -	0,20	$ 80.000,00	0,65	$ 260.000,00	0,76	$ 304.000,00	0,91	$ 364.000,00	0,75	$ 300.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	0,40	$ 160.000,00	7,67	$ 3.068.000,00
26	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc.)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.500.000,00				$ -		$ -	0,39	$ 195.000,00	0,34	$ 170.000,00	0,49	$ 245.000,00	0,50	$ 250.000,00	0,50	$ 250.000,00	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	0,40	$ 200.000,00	6,62	$ 3.310.000,00
27	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 450.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,56	$ 534.000,00	3,56	$ 534.000,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												$ 560,00
	+	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				$ 76.650.000,00				$ -	$ -	$ -	$ 15.555.000,00	$ 18.846.000,00	$ 16.432.000,00	$ 16.848.000,00	$ 16.688.000,00	$ 27.520.000,00	$ 27.520.000,00	$ 27.520.000,00	$ 27.520.000,00	$ 13.747.000,00	$ 208.196.560,00								
	+	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 318.243.200,00				$ -	$ -	$ -	$ 55.125.120,00	$ 58.416.120,00	$ 75.486.280,00	$ 78.165.520,00	$ 81.328.400,00	$ 114.858.880,00	$ 114.858.880,00	$ 114.858.880,00	$ 109.388.400,00	$ 48.770.108,00	$ 851.257.148,00								
	+	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 967.452.286,00				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 434.438.338,00							
	+	SUBTOTAL COSTOS BASICOS (E) = (C) + (D)				$ 1.285.695.486,00				$ -	$ -	$ -	$ 55.125.120,00	$ 58.416.120,00	$ 75.486.280,00	$ 78.165.520,00	$ 81.328.400,00	$ 114.858.880,00	$ 114.858.880,00	$ 114.858.880,00	$ 109.388.400,00	$ 483.208.446,00	$ 1.285.695.486,00								
	+	IVA = 19% * (E) = (F)				$ 244.282.142,00				$ -	$ -	$ -	$ 10.473.773,00	$ 11.099.063,00	$ 14.342.393,00	$ 14.851.449,00	$ 15.452.396,00	$ 21.823.187,00	$ 21.823.187,00	$ 21.823.187,00	$ 20.783.796,00	$ 91.809.605,00	$ 244.282.142,00								
	+	COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 1.529.977.628,00				$ -	$ -	$ -	$ 65.598.893,00	$ 69.515.183,00	$ 89.828.673,00	$ 93.016.969,00	$ 96.780.796,00	$ 136.682.067,00	$ 136.682.067,00	$ 136.682.067,00	$ 130.172.196,00	$ 575.018.051,00	$ 1.529.977.628,00								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

REPROGRAMACIÓN No. 1 AL PLAN DE CARGAS INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4805-2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	01/08/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☒ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio) Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

POR NECESIDADES DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL LOTE 1 - ATLÁNTICO, SE REALIZA LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS DEDICACIONES DE LOS RECURSOS POR PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada período del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ**
Representante Legal CONSORCIO ODESSA
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-090758 BLV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7

NOVIEMBRE 2024

CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

- A la fecha se tienen suscritas la prórroga No. 1 al convenio 2220-2023 suscrito entre el Municipio de Ponedera y el INVIAS y prorroga No. 1 al convenio 2221-2023 el 07 de diciembre de 2023, ampliado la vigencia de los convenios de obra hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, se encuentran en tramite ante INVIAS las solicitudes de prorroga de los convenios, debido a los atrasos que se han presentado en las obras.

- Para el contrato de obra LP-001-2023, se dio inicio a la ejecución de actividades de obra con explanaciones el 07 de octubre de 2024 y durante el mes de noviembre 2024 el contratista ha realizado actividades de explanación, corte, instalación de material de mejoramiento entre las abscisas K0+670 al K0+880, instalación de geotextil, representando esto un avance de obra del del 5,04%, y un programado del 88.18%, con un atraso del 83.13%, atraso que es completamente imputable al contratista, producto del inicio tardío de ejecución de obra, no implementación de frentes adicionales y bajos rendimientos ejecución de obra, los cuales son motivos totalmente imputables al contratista de obra.

- El contrato de obra LP-001-2023 del Municipio de Ponedera, acumula atrasos en estudios y diseños, ejecución de obra, en estudios y diseños, informes sociales y actualización de pólizas. Ante dichos incumplimientos la interventoría ha realizado solicitudes de apertura de procesos sancionatorios de carácter conminatorio mediante comunicaciones C-T-135-188-2024 de fecha de 12 de julio de 2024 y C-T-135-275-2024 del 02/09/2024 se han incrementado. En el periodo del presente informe se ha informado el estado de cumplimiento del contrato, al Municipio de Ponedera, con el fin de que se adopten las medidas de carácter conminatorio frentes al contratista.

- Se tiene pendiente que el Municipio de Pondera retorne los recursos a la cuenta del convenio por un valor de $ 58.475.000, los cuales fueron pagados a una destinación diferente a las actividades del convenio 2220-2023 por parte del Municipio de Pondera y el banco Davivienda en el mes de noviembre de 2023, sin la autorización del INVIAS como una de las firmas autorizadas y en contravía de lo indicado en el Convenio 2220-2023.

- El Municipio de Ponedera tiene pendiente el retorno de rendimientos financieros de la cuenta del convenio 2221-2023 por un valor de $ 23.697.494 correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024. La interventoría ha realizado los respectivos requerimientos al municipio como se evidencia en correspondencia enviada.

- El Municipio de Sabanagrande tiene pendiente el retorno de rendimientos financieros de la cuenta del convenio 2221-2023 por un valor de $1.401.358,36 correspondiente al mes de noviembre de 2024. La interventoría ha realizado los respectivos requerimientos al municipio como se evidencia en correspondencia enviada.

- Para el Municipio de Sabanagrande a Limites con Polonuevo se tiene un 66.3% de avance de obra representado en 1,62 Km de pavimento rígido y se tiene un programado 99.07%, acorde a la reprogramación No. 2 realizada con el acta de modificación de cantidades No. 1 con el cual se realizó balance de obra como consecuencia de los estudios y diseños. Razón por la cual se presente un atraso de obra. Al respecto la interventoría recomendó al municipio de Sabanagrande el inicio de un proceso sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, debido al atraso en ejecución que se presenta en la obra, el contratista presentó un plan de contingencia y adicionalmente ha presentado solicitud de prorroga hasta el 14/12/2024, la cual se encuentra en estudio de interventoría.

- Para los dos municipios objeto de las intervenciones de los contratos de obra se requirió complementar la totalidad de estudios y diseños, debido a que no se contaba con diseños suficientes para la ejecución de las obras de acuerdo con las normativas y especificaciones técnicas. La interventoría realizó solicitud de los estudios y diseños a los municipios sin encontrar respuesta alguna. Sin embargo, de acuerdo con las obligaciones de los contratistas se obra, estos debían realizar el ajuste, modificación, actualización y/o complementación de los estudios y diseños, por lo tanto, se adelantaron los diseños geométricos y de pavimentos con el fin de definir la estructura a ejecutar en cada uno de los contratos de obra.

- El contrato de interventoría tiene un avance financiero del 53,98% representado en el seguimiento y control de documentos para el inicio de las actividades de obra, revisión de estudios en campo, etapa de ajustes y complementación de estudios y diseños, y ejecución de obra en el Tramo LA GIRALDA – SANTA RITA (PONEDERA) y en el Tramo SABANAGRANDE - POLONUEVO.

7.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda al INVIAS requerir al Municipio de Ponedera, debido a que por parte de este ente no se esta dando cumplimiento a las clausulas del Convenio 2220-2023 en lo referente a que el Municipio de ponedera no ha restituido los recursos debitados de la cuenta por un valor de $ 58.475.000 sin

la autorización del INVIAS y para fines diferentes al objeto del convenio. Así mismo, incumplimientos en lo relacionado con la no apertura de procesos sancionatorios por los incumplimientos del contratista de obra y cuyos incumplimientos más graves obedecen al atraso de obra y no actualización de garantías del contrato de acuerdo a lo establecido en el convenio 2220-2023 y modificaciones del contrato LP-001-2023 y que ponen en riesgo el cumplimiento del contrato.

- Se recomienda al INVIAS solicitar a los municipios otorgar respuesta a los requerimientos de la interventoría en lo relacionado con el manejo, extractos y rendimientos de las cuentas de los convenios, teniendo en cuenta que no se envían oportunamente los soportes de giros de rendimientos y extractos bancarios.

8.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA											
FECHA	CÓDIGO	COD MUNICIPIO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD	ENVIADO A: NOMBRE	ÁREA	TEMA	SUBTEMA	ENTREGADO A:	RECIBIDO POR:	RADICADO
2 de noviembre de 2024	C-T-135-380-2024	SG	SG-Solicitud de extracto del mes de Octubre de 2024 de la cuenta corriente # No 0241 6999 6022 DEL CONVENIO 2221 DE 2023 (SABANAGRANDE)	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Extractos bancarios		Alcalde Municipal		Radicado 02/11/2024
2 de noviembre de 2024	C-T-135-381-2024	PO	PO-Solicitud de extracto del mes de Octubre de 2024 de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Extractos bancarios		Alcalde Municipal		Radicado 02/11/2024
2 de noviembre de 2024	C-T-135-382-2024	PO	PO- Respuesta – Revision_Acta_obra_No1	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Acta de obra		Representante Legal		Radicado 04/11/2024
6 de noviembre de 2024	C-T-135-383-2024	SG	SG- REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y APREMIO POR ATRASO DE OBRA.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Itala Corina Stefanell Santiago	TECNICA	Plan de contingencia	PAS	Representante Legal		Radicado 06/11/2024
5 de noviembre de 2024	C-T-135-384-2024	PO	Observaciones informe de seguimiento mensual ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Informe mensual		Representante Legal		Radicado 05/11/2024
5 de noviembre de 2024	C-T-135-385-2024	PO	PO- Remisión de Bitácora de obra 01 Octubre a 31 Octubre de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Bitacora de obra		Representante Legal		Radicado 05/11/2025
6 de noviembre de 2024	C-T-135-386-2024	SG	SG-Aprobación del Informe mensual social N° 8 del mes de octubre de 2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Itala Corina Stefanell Santiago	SOCIAL	Informe mensual		Representante Legal		Radicado 06/11/2024
6 de noviembre de 2024	C-T-135-387-2024	PO	PO-Requerimiento entrega de Informes mensuales sociales pendientes con los respectivos anexos y soportes	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Informe mensual	Requerimiento	Representante Legal		Radicado 06/11/2024
6 de noviembre de 2024	C-T-135-388-2024	SG	SG-Requerimiento entrega de Presentación y soportes de la entrega del volante de invitación al comité de participación comunitaria del 08 noviembre de 2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Itala Corina Stefanell Santiago	SOCIAL	Comité de participacion comunitaria	Requerimiento	Representante Legal		Radicado 06/11/2024
7 de noviembre de 2024	C-T-135-389-2024	PO	PO- Retiro del material de excavación del frente de trabajo al ZODME autorizado.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Material de excavacion		Representante Legal		Radicado 07/11/2024
6 de noviembre de 2024	C-T-135-390-2024	SG	SG. Aprobación Informe Mensual Ambiental No. 8 correspondiente al mes de octubre de 2024.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Itala Corina Stefanell Santiago	AMBIENTAL	Informe mensual		Representante Legal		Radicado 06/11/2024
7 de noviembre de 2024	C-T-135-391-2024	INV	Informe mensual de Interventoría No. 9 Contrato 4805-2023 - Octubre 2024	INVIAS	Ing. Diana María Vanegas	TECNICA	Informe mensual		Directora Territorial Atlantico		2024E-VUVRAZ112153
8 de noviembre de 2024	C-T-135-392-2024	PO	PO-Requerimiento entrega de programación y plan de contingencia cumplimiento actividades sociales pendientes del PAGA.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Plan de contigencia social	Requerimiento	Representante Legal		Radicado 08/11/2024
8 de noviembre de 2024	C-T-135-393-2024	PO	PO- Aprobación informe ambiental No. 7, correspondiente al mes de septiembre de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Informe mensual	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 08/11/2024
9 de noviembre de 2024	C-T-135-394-2024	PO	PO- Respuesta – Revisión Estudio Hidrológico e Hidráulico V5 – La Giralda – Santa Rita V5	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Estudio Hidrológico e Hidráulico		Representante Legal		Radicado 09/11/2024
12 de noviembre de 2024	C-T-135-396-2024	PO	PO- Reiteración NO autorización de donación de material de excavación	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Material de excavacion	Reiteracion	Representante Legal		Radicado 12/11/2024
12 de noviembre de 2024	C-T-135-397-2024	SG	SG- Respuesta a la comunicación del 05-11-2024 entrega de las actas de vecindad subsanadas	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Actas de vecindad		Representante Legal		Radicado 13/11/20254

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA											
FECHA	CÓDIGO	COD MUNICIPIO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD	ENVIADO A: NOMBRE	ÁREA	TEMA	SUBTEMA	ENTREGADO A:	RECIBIDO POR:	RADICADO
12 de noviembre de 2024	C-T-135-398-2024	PO	PO-Aprobación Informe mensual social No. 7 del mes de septiembre de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Informe mensual	Aprobacion	Representante Legal		Radicado 12/11/2024
13 de noviembre de 2024	C-T-135-399-2024	SG	SG – Solicitud de Aportes Parafiscales Planilla de seguridad Social correspondiente a octubre de 2024 de Alexander Sarmiento – Ayudante de Obra.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	TECNICA	Seguridad social		Representante Legal		Radicado 13/11/2024
13 de noviembre de 2024	C-T-135-400-2024	SG	SG-Solicitud Programación y plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades sociales pendientes por ejecutar.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	SOCIAL	Plan de contigencia social		Representante Legal		Radicado 13/11/2024
13 de noviembre de 2024	C-T-135-401-2024	PO	PO – Observaciones - Seguridad y Salud en el trabajo SST.	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	SST	Observaciones	Representante Legal		Radicado 13/11/2024
13 de noviembre de 2024	C-T-135-402-2024	SG	SG – Instalar Esquema de Señalización - PMT km 2+850 - km 5+100.	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	TECNICA	PMT		Representante Legal		Radicado 13/11/2024
14 de noviembre de 2024	C-T-135-403-2024	SG	RESPUESTA AL COMUNICADO DE 7 DE noviembre de 2024 Y REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	TECNICA	Plan de contingencia	Respuesta	Representante Legal		Radicado 14/11/2024
14 de noviembre de 2024	C-T-135-404-2024	SG	SG- Recomendación apertura Proceso sancionatorio Contrato de Obra No. SG-LP-OP-004-2023 por presunto incumplimiento de obligaciones por parte de CRIVEN CONSTRUCTORES	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Proceso sancionatorio		Alcalde Municipal		Radicado 14/11/2024
14 de noviembre de 2024	C-T-135-405-2024	PO	PO-Requerimiento atención afectación cercados y cerramiento en predios afectados	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Afectacion al cercado	Requerimiento	Representante Legal		Radicado 14/11/2024
15 de noviembre de 2024	C-T-135-406-2024	SG	SG- REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de JUNIO A OCTUBRE de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Rendimientos financieros	Reiteracion	Alcalde Municipal		Radicado 16/11/2024
15 de noviembre de 2024	C-T-135-407-2024	SG	SG- INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL N° 3 DE INTERVENTORÍA	INVIAS	Jairo fernando Arguello	AMBIENTAL	Trimestral Ambiental N°3		INVIAS		2024E-VUVRAZ115196
15 de noviembre de 2024	C-T-135-408-2024	PO	PO-Aprobación Informe mensual social No. 8 del mes de octubre de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	SOCIAL	Informe mensual		Representante Legal		Radicado 15/11/2024
16 de noviembre de 2024	C-T-135-409-2024	PO	PO- Acta Parcial de Obra No 01.	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Acta de obra		Alcalde Municipal		Radicado 16/11/2024
18 de noviembre de 2024	C-T-135-410-2024	SG	SG- Revisión de Balance de APU No Previsto v2	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Itala Corina Stefanell Santiago	TECNICA	APU'S		Representante Legal		Radicado 18/11/2024
18 de noviembre de 2024	C-T-135-411-2024	PO	PO-REITERACIÓN Solicitud de extracto del mes de Octubre de 2024 de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023.	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Extractos bancarios		Alcalde Municipal		Radicado 18/11/2024

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA											
FECHA	**CÓDIGO**	**COD MUNICIPIO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A: ENTIDAD**	**ENVIADO A: NOMBRE**	**ÁREA**	**TEMA**	**SUBTEMA**	**ENTREGADO A:**	**RECIBIDO POR:**	**RADICADO**
18 de noviembre de 2024	C-T-135-412-2024	SG	SG- REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de JUNIO A OCTUBRE de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	TECNICA	Rendimientos financieros		Alcalde Municipal		Radicado 18/11/2024
19 de noviembre de 2024	C-T-135-413-2024	PO	PO- Observaciones informe de seguimiento mensual ambiental correspondiente al mes de octubre de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	AMBIENTAL	Informe mensual		Representante Legal		Radicado 19/11/2024
21 de noviembre de 2024	C-T-135-414-2024	PO	PO- Seguimiento al estado de cumplimiento del contrato y atrasos de obra.	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Seguimiento del contrato		Alcalde Municipal		Radicado 21/11/2024
21 de noviembre de 2024	C-T-135-415-2024	PO	PO- Traslado de derecho de Petición y Solicitud de respuesta inmediata a la Señora Consuelo Fernández Vizcaíno	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Derecho de peticion		Representante Legal		Radicado 21/11/2024
21 de noviembre de 2024	C-T-135-416-2025	PO	PO- información de Traslado de derecho de Petición y Solicitud de respuesta inmediata a la Señora Consuelo Fernández Vizcaíno, al contratista CONSORCIO LA		Consuelo Fernandez Vizcaino	TECNICA	Derecho de peticion	Respuesta	Antigua profesional social		Radicado 21/11/2024
22 de noviembre de 2024	C-T-135-417-2024	SG	SG- Respuesta – Revisión Estudio Hidrológico e Hidráulico – Sabanagrande – Polonuevo V4	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Adalberto Flórez Salgado	TECNICA	Estudio Hidrológico e Hidráulico	Respuesta	Representante Legal		Radicado 22/11/2024
23 de noviembre de 2024	C-T-135-418-2024	PO	PO- REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220- 2023. Del periodo de septiembre a octubre de 2024	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICA	Rendimientos financieros		Alcalde Municipal		Radicado 23/11/2024
26 de noviembre de 2024	C-T-135-419-2024	SG	SG-Apoyo con controles de prevención y seguridad vial en la vía Sabanagrande– Polonuevo del municipio durante los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025	TRANSITO SABANAGRANDE	TRANSITO SABANAGRANDE	SOCIAL	Prevencion víal		Transito Sabanagrande		Radicado 26/11/2024
26 de noviembre de 2024	C-T-135-420-2024	SG	SG-Apoyo con controles de prevención y seguridad vial en la vía Sabanagrande– Polonuevo del municipio, durante los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	Darwin Rosales Mora	SOCIAL	Prevencion víal		Transito Sabanagrande		Radicado 26/11/2024
26 de noviembre de 2024	C-T-135-421-2024	PO	PO-Apoyo con controles de prevención yseguridad vial, en la vía LaGiralda-Santa Rita El Viejo del municipio de Pondera, durante los meses dediciembre de 2024 y enero de 2025	INSPECCION DE POLICIA PUERTO GIRALDO	Eudaldo Romero	SOCIAL	Prevencion víal		Inspector de policia		Radicado 26/11/2024
26 de noviembre de 2024	C-T-135-422-2024	PO	PO-Apoyo con controles de prevención yseguridad vial, en la vía LaGiralda-Santa Rita El Viejo del municipio de Pondera, durante los meses dediciembre de 2024 y enero de 2025	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	SOCIAL	Prevencion víal		Alcalde Municipal		Radicado 26/11/2024
29 de noviembre de 2024	C-T-135-424-2024	PO	PO- Seguimiento al estado de cumplimiento del contrato y atrasos de obra	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	SOCIAL	Seguimiento del contrato		Alcalde Municipal		Radicado 29/11/2024
29 de noviembre de 2024	C-T-135-426-2024	SG	SG - Respuesta Derecho de Petición del Concejo Municipal Sabanagrande del 07-NOV-2024	CONCEJO MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	TECNICA	Derecho de peticion	Respuesta	CONCEJO MUNICIPAL		Radicado 29/11/2024
30 de noviembre de 2024	C-T-135-427-2024	PO	PO-Solicitud de información y atención al Derecho de Petición de la Señora Consuelo Fernández Vizcaíno	CONSORCIO LA GIRALDA	Edgar José Torres Mejía	TECNICA	Derecho de peticion	Solicitud	Representante Legal		Radicado 30/11/2024

RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA

5 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	INFORME MENSUAL AMBIENTAL SEPTIEMBRE_LP-001_2	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	AMBIENTAL	Informe mensual		5/11/2024						
5 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	RESPUESTA OFICIO C-T-135-303-2024 ENTREGA CORRECCION INFORME HIDROLOGICO E HIDRAHULICO	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	TECNICO	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO		5/11/2024						
5 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	31/10/2024 - 04/11/2024	5/11/2024						
5 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	COMUNICADO OBR-021-2024 INFORME SOCIAL OCTUBRE 2024	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	SOCIAL	Informe mensual		5/11/2024						
5 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	ENTREGA DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL NRO. 008 –OCTUBRE DE 2024 V1	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	AMBIENTAL	Informe mensual		5/11/2024						
5 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	RESPUESTA C-T-135-375-2024PO- Reiterativo - Incumplimiento en Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Correspondiente a septiembre de 2024.	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	TECNICO	SEGURIDAD SOCIAL		6/11/2024						
5 de noviembre de 2024	SG ALCALDIA	SG	Derecho de peticion con fundamento en los articulos 23° y 74° de la constirucion Nacional y los Articulos 5° y 9° del Codigo Contencioso Administrativo	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	CONCEJALES DE SABANAGRANDE	TECNICO	Derecho de peticion		7/11/2024						
7 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	Reasignación fecha COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	SOCIAL	Comité participacion comunitaria		7/11/2024						
7 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	Respuesta a SG- REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y APREMIO POR ATRASO	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Plan de contingencia		7/11/2024						
9 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Entrega de informe mensual de actividades del mes de Septiembre.	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	SOCIAL	Informe mensual		9/11/2024						
11 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	05/11/2024 - 10/11/2024	11/11/2024						
7 de noviembre de 2024	SG ALCALDIA	SG	SOLICITUD DE PRORROGA N°2 CONVENIO 2221-2023.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	BRUNO DE LA CRUZ	TECNICO	Prorroga	Solicitud	13/11/2024						
13 de noviembre de 2024	PO ALCALDIA	PO	SOLICITUD DE PRORROGA N°2 CONVENIO 2220-2023.	ALCALDIA DE PONEDERA	Aristarco Romero Mériño	TECNICO	Prorroga	Solicitud	13/11/2024						
14 de noviembre de 2024	2024S-VATL-084963	INV	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-114242 - Devolución sin trámite ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 10 - NOVIEMBRE 2024.	INVIAS	Diana Maria Vanegas Jaramillo	TECNICO	Acta de costos		14/11/2024						
14 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Entrega del informe ambiental mes de octubre	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	AMBIENTAL	Informe mensual		14/11/2024						
15 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Entrega del informe social mes de octubre	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	SOCIAL	Informe mensual		15/11/2024						
15 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Entrega de acta de obra 01 y sus anexos	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	TECNICO	Acta de obra		15/11/2024						
13 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	AUTORIZACIÓN DE CORREO PARA REMISIÓN DE ACTAS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO EN REFERENCIA	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	TECNICO	Correo para notificaciones	Autorizacion	18/11/2024						
18 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	11/11/2024 - 17/11/2024	18/11/2024						
21 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	Solicitud de Pago de Actas de Vecindad Pendientes.	CONSORCIO LA GIRALDA	Consuelo Fernandez Vizcaino	TECNICO	Derecho de peticion	Solicitud	21/11/2024						
20 de noviembre de 2024	2024S-VBOG-086526	INV	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-068654	INVIAS	OSCAR ACEVEDO CASTRO	TECNICO	Hojas de vida	Aprobacion	20/11/2024						
20 de noviembre de 2024	2024S-VBOG-086864	INV	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-090047	INVIAS	OSCAR ACEVEDO CASTRO	TECNICO	Hojas de vida	Aprobacion	20/11/2024						
25 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	18/11/2024 - 24/11/2024	25/11/2024						
27 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL 14 DE DICIEMBRE	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Prorroga	Solicitud	27/11/2024						
27 de noviembre de 2024	PO LA GIRALDA	PO	SOLICITUD DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA.	CONSORCIO LA GIRALDA	EDGAR JOSÉ TORRES MEJÍA	TECNICO	Hojas de vida	Solicitud	27/11/2024						
29 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	REGISTRO FOTOGRAFICO AL FINALIZAR LABORES	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Registro fotografico	25/11/2024 - 28/11/2024	29/11/2024						
29 de noviembre de 2024	SG CRIVEN	SG	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST.	CRIVEN CONSTRUCTORES	ADALBERTO FLOREZ	TECNICO	Informe mensual		29/11/2024						

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

TRAMO LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.

FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-5.

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LA GIRALDA	**CONTRATO N°**	**LP-001-2023**	**RUTA LA GIRALDA – SANTA RITA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	k1+500 al k2+000	ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA- NIVELACION DEL TERRENO



Descripción:	K0+000 al k0 + 090	CORTE DE SUB RASANTE



Descripción:	K0+460 al k0 + 510	INSTALACION DE GEOTEXTIL



Descripción:	K0+460 al K0 + 510	INSTALACION DE GEOTEXTIL Y MATERIAL DE MEJORAMIENTO



Descripción:	K0+460 al k0 + 510	INSTALACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO



Descripción:		ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LA GIRALDA	**CONTRATO N°**	**LP-001-2023**	**RUTA LA GIRALDA – SANTA RITA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	K0+700 AL K0 + 750	TRAMO DE SUB RASANTE



Descripción:	K0+590 AL K0+640	INSTALACION DE SUB RASANTE



Descripción:	K0+360 al K0+420	INSTALACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO



Descripción:	K0+000 al k0 + 090	CORTE DE LA SUB RASANTE



Descripción:	K9+400	MATERIAL DE ADECUACION



Descripción:	K0+300 al K0+360	INSTALACION DE GEOTEXTIL SOBRE SUB RASANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 2024

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LA GIRALDA	**CONTRATO N°**	**LP-001-2023**	**RUTA LA GIRALDA – SANTA RITA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	K0+100 al K0+180	INSTALACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO



Descripción:	K0+90 al K0+250	CEREO Y CORTE DE SUBRASANTE



Descripción:	k0 + 090 al k0 + 480	Compactacion de la seguunda capa de mejoramiento de la sub rasante



Descripción:	K0+380 al K0+460	INSTALACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO



Descripción:	k0 + 000 al k0 + 500	Se recibe capa de mejoramiento por topografía



Descripción:	k0 + 000 al k0 + 500	Recorrido de obra con gestor tecnico INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	**NOVIEMBRE 2024**

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LA GIRALDA	**CONTRATO N°**	**LP-001-2023**	**RUTA LA GIRALDA – SANTA RITA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	k0+500 al k0+800	Cereo de la segunda capa del mejoramiento de la sub rasante



Descripción:	k0+500 al k0+800	Cereo de la segunda capa del mejoramiento de la sub rasante

TRAMO SABANAGRANDE – POLONUEVO. MUNICIPIO DE SABANAGRANDE

FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-5.

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	k01+123 al k01+160	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa	



Descripción:	k01+123 al k01+160	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa	



Descripción:	K1 + 070 al K1 + 010	Toma de espesores	



Descripción:	K1+090 hasta la K1+020	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa	



Descripción:	k01+123 al k01+160	Instalacion de Concreto MR 3.8 Mpa	



Descripción:	K1+020 a K0+960	TOMA DE MUESTRAS	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	K0+950 a K0+900	CONFORMACION DE SUB RASANTE



Descripción:	k750 al k 830	Instalacion de concreto MR38



Descripción:	K0 + 950 al K0 + 900	Cereo de sub base 0+950 al 0+900



Descripción:	k0+950 al k0 + 900	Se recibe sub base por topografía



Descripción:	k1+502 al k1 + 512	Se recibe Fornaleta por topografía



Descripción:	K0+900 a K0+960	Instalacion de concreto MR38

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	**NOVIEMBRE 2024**

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	k1 + 502 al K1 + 512	INSTALACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	Descripción:	K1+000 al K0+960	INSTALACION DE SUB BASE





Descripción:	k00+860 al k00+900	instalación y compactación de sub base granular	Descripción:	k00+860 al k00+900	instalación y compactación de sub base granular





Descripción:	k00 + 000 al k00 + 100	Instalacion de fornaleta para instalacion de bordillo	Descripción:	K01 + 500 hacia menores costado izquierdo	conformación de sub base granular

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	**NOVIEMBRE 2024**

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	TRAMO 5	k00+130 hacia mayores	retiro e instalación de formaletas para bordillo



Descripción:	TRAMO 5	k00+130 hacia mayores	retiro e instalación de formaletas para bordillo



Descripción:	TRAMO 5	k01+473 al k01+550	Instalacion de concreto MR38



v

Descripción:	TRAMO 5	k01+380 al k01+470	conformacion y compactación de sub base granular



Descripción:	TRAMO 5	K0 + 140 hacia mayores	instalación de formaleta de en ambos costados



Descripción:	k0+140 a k0+210		Fundida de bordillos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 2024

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**





Descripción:	K01 + 290 AL K01 + 350	conformacion y compactación de sub base granular	Descripción:	K01 + 360 AL K01 + 411	Instalacion de concreto MR38





Descripción:	k1+350 al k1 + 290	Se recibe sub base y fornaleta por topografía	Descripción:	k0+140 a k0+210	Revision de bordillos





Descripción:	k1+291 al k1+351	Instalacion de concreto MR38	Descripción:	k1+291 al k1+351	Instalacion de concreto MR38

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 2024

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	**CONTRATO N°**	**LP-OP-004-2023**	**RUTA SABANAGRANDE – POLONUEVO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ODESSA	**CONTRATO N°**	**4805 DE 2023**	

NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**



Descripción:	k1 + 200 al k1 + 167	Instalacion de concreto MR38	Descripción:	k1 + 200 al k1 + 167	Instalacion de concreto MR38



Descripción:	k1 + 200 al k1 + 167	Fundida de concreto MR38	Descripción:	k1+204 al k1 + 291	Fundida de concreto MR38

8.4 BITACORA DE OBRA

SABANAGRANDE

9/11/24	Estado del tiempo: lluvias leves Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 Retrocargador, 1 volqueta, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 topógrafo, 2 cadenero 4 opiciales, 6 AUX tráfico

Escaneado con CamScanner

Actividades: conformación de subrasante entre las abscisas, Km 0+90 a Km 0+40,

02/11/24 estado del tiempo: lluvias leves 13:00 15:00
Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 retrocargador, 1 Volqueta, 1 vibrocompactador, 1 minicargador.
Personal de obra: 1 Residente, 1 SST, 1 topográfo, 1 cadenero, 4 oficiales, 6 Aux tráfico, 6 Aux obra, 2 operadores.
Actividades: Conformación de subrasante entre las abscisas Km 0+90 a Km 0+40, se repite la actividad debido a las lluvias presentadas el día anterior


03/11/24 estado del tiempo: lluvias, 13:00 a 16:00
Domingo sin actividades.

04/11/24 estado del tiempo: lluvias 11:00 a 13:00
Lunes festivos: sin actividades.


05/11/24 estado del tiempo: lluvias 14:00 a 15:30
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 volqueta 1 vibrocompactador, 1 minicargador
personalobra: 1 Residente, 1 SST, 1 topográfo, 1 cadenero

Escaneado con CamScanner


Actividades: Fundida de concreto MR38 entre las abscisas 1+123 a 1+160 por el costado derecho, conformación de subrasante 1+040 a 1+000.



06/11/24 Estado del tiempo: lluvias leves: 15:00 a 16:00
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retrocargador 1 volqueta, 1 volqueta
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra.
Actividades: instalación de SB6 entre las abscisas 1+120 a 1+080



07/11/24 Estado del tiempo: soleado
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retrocargador, 1 volqueta, 1 minicargador.
personal: 1 residente; 1 SST, 1 topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra.
Actividades: Instalación de concreto MR38 1+088 a 1+123, conformación de subrasante



Escaneado con CamScanner

08/11/24 estado del tiempo: lluvias 13:00 a 15:00
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retro-cargador, 1 minicargador. 1 volqueta.
Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 Topografo, 1 cadenera 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra
Actividades: instalación de 3B6 1+080 a 1+010

09/11/24 Estado del tiempo: soleado
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta.
personal: 1 Residente, 1 SST, 1 topografo, 1 cadenera 4 oficiales 2 Aux tráfico, 6 Aux obra.
Actividades: Extendido y compactación de 3B6, instalación de formaleta, para fundida de concreto MR38, chequeo de niveles de topografía en 3B6


10/11/24 Estado del tiempo: soleado
Domingo: Sin actividades

11/11/24 estado del tiempo: soleado
Lunes festivo: Sin actividades


Escaneado con CamScanner

12/11/24 Estado del tiempo: soleado, lluvias 14:00 a 15:30
Maquinario: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retro-cargador, 1 volqueta, 1 minicargador
Maquina
personal: 1 residente, 1 sst, 1 topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 2 operadores
Actividades: fundida de concreto MD 3E entre las abscisas. 1+020 a 1+088,





13/11/24 Estado del tiempo: lluvias 14:00 a 16:00
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 Retro-cargador, 1 volqueta 1 minicargador
Personal Obra: 1 residente, 4 sst, 1 topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 2 operadores
Actividades: conformación de subrasante; 0+950 a 1+000,





14/11/24 Estado del tiempo: lluvias 13:00 a 14:00
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador 1 retrocargador, 1 volqueta 1 minicargador
Personal: 1 residente, 1 sst, 1 topografo 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 2 operadores

Escaneado con CamScanner

Actividades: conformación de subrasante entre las abscisas 1+000 a 0+950

15/11/24 Estado del tiempo: soleado
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 volqueta, 1 minicargador, 1 retrocargador.
Personal: 1 Residente, 1 sst, 1 topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 2 operadores
Actividades: Instalación de SB6 0+950 a 1+010
Instalación de formaleta para fundida de MR38

16/11/24 Estado del tiempo: soleado
Maquinaria: 1 motoniveladora y vibrocompactador, 1 volqueta, 1 minicargador, 1 retrocargador
Personal: 1 Residente, 1 sst, 1 topografo, 1 cadenero 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 2 operadores
Actividades: fundida de MR38 a entre abscisas 0+960 a 1+020, conformación de subrasante entre las abscisas 0+950 a 0+900.

17/11/24 Estado del tiempo: soleado
Domingo: Sin Actividades.

Escaneado con CamScanner

18/11/24 Estado del tiempo: Soleado.
Maquinarias: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 Retrocargador 1 minicargador, 1 volqueta
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 5 Aux obra, 2 operadores
Actividades: conformación de subrasante 0+960 hasta 0+900,



19/11/24 Estado del tiempo: lluvia 16:00 a 17:00
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 Retrocargador 1 minicargador, 1 volqueta
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 2 operadores
Actividades: Instalación de SB6 entre las abscisas 0+950 a 0+900, se recibe por topografia la subrasante entre las abscisas 0+950 a 0+890.




20/11/24 Estado del tiempo: lluvias fuertes 14:00 a 15:30
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retrocargador 1 minicargador, 1 volqueta
Personal: 1 residentes, 1 SST, 1 topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 2 operadores
Actividades: Instalación de concreto MR38 entre las abscisas 0+900 a 0+960, instalación de acero longitudinal, para bordillos e instalación de formaleta, entre las abscisas 0+000 a 0+040 CI.



Escaneado con CamScanner


21/11/24 Estado del tiempo: Soleado
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 volqueta.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 topografo, 1 cadenero, 4 oficiales, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 3 operadores
Actividades: Conformación de subrasante entre las abscisas 0+900 a 0+850.





22/11/24 Estado del tiempo: soleado
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 volqueta.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 topográfo, 1 cadenero 4 oficiales, 2 Aux trafico, 6 Aux obra, 3 operadores.
Actividades: instalación y compactación de SB6 entre las abscisas 0+900 a 0+860, instalación de formaleta para bordillos entre las abscisas 0+000 a 0+040 C.I






23/11/24 Estado del tiempo: soleado
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 volqueta
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 topografo, 1 cadenero 4 oficiales 2 Aux tráfico, 6 Aux obra 3 operadores
Actividades: Instalación de concreto MR38. entre las Abscisas 0+900 a 0+860. fundida de


Escaneado con CamScanner

Bordillos entre las abscisas 0+000 a 0+040 CI
Notas: en verificación en campo la interventoría evidencion qué en la SBB entre las abscisas 0+873 a 0+860, una humedad superior a la humedad optima de compactación se realizó la recomendación al contratista de no fundir concreto sobre esa zona, sin embargo el contratista Manifestó qué el Asumia los costos de reparaciones en caso de presentarse.






25/11/24 Estado del tiempo: lluvias 18:00 a 19:30
Domingo: Sin Actividades





26/11/24. Estado del tiempo: soleado
·Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Topografo, 1 cadenera 3operadores, 2 Aux tráfico, 6 Aux obra, 4 oficiales.
Actividades: Instalación de formaleta para bordillos CD 0+000 a 0+040, Reconformación de SBB CI entre las abscisas. 1+553 a 1+500





Escaneado con CamScanner


27/11/2024
Estado del tiempo: soleado, lluvias 15:30 a 17:30
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retrocargador 1 minicargador, 1 volqueta
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 topografo, 1 cadenero, 2 Aux tráfico, 4 oficiales 8 ayudantes, 3 operadores.
Actividades: conformación de SBG entre las abscisas 1+473 a 1+410, Instalación formaletas para bordillos, conformación de subrasante 0+830 a 0+860





28/11/2024
Estado del tiempo: soleado
Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador 1 retrocargador, 1 minicargador
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 topografo, 1 cadenero 2 Aux tráfico, 4 oficales, 8 Ayudantes, 3 operadores
Actividades: fundida de concreto MR38 entre las abscisas 1+410 a 1+473. carril Izquierdo, Fundida de bordillos hasta la abscisa 0+140. en ambos costados





Escaneado con CamScanner

29/11/24	Estado del tiempo: soleado Personal: Residente 1, SST 1, Topografo 1, cadenero 1, 2 AUX tráfico, 4 oficiales 6 Ayudantes, 3 operadores 1 conductor. Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 volqueta Actividades: Reconformación de SBG por el carril izq, instalación de formaleta para bordillos.
30/11/24	Estado del tiempo: soleado Personal: Residente 1, SST 1, Topografo 1, cadenero 1, 2 AUX tráfico, 4 oficiales, 6 Ayudantes, 3 operadores 1 conductor Maquinaria: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta. Actividades: Instalación de formaleta, para bordillos, fundida de Concreto MR38 entre las abscisas 1+291 a 1+351 carril izquierdo, fundida de bordillos por ambos costados entre la 0+140 a 0+180

Escaneado con CamScanner

8.4 BITACORA DE OBRA

PONEDERA

1/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 5:00 AM A 4:00 PM

NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES POR LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA.

Escaneado con CamScanner

2/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS 14:00 A 16:00
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 CARRO TANQUE
1 RETRO ORUGA.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES,
1 CONDUCTOR, 1 CADENERO, 2 PARISIGAS, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE REALIZA CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE
ABCISAS KO+580 AL KO+690 CALZADA.

3/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE HAS 11:00 A 13:00
DOMINGO.

4/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 13:00 A 14:00
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 3 OPERADORES,
ACTIVIDADES, SE REALIZA CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE
ABCISAS KO+000 AL KO+090 CALZADA.

5/11/2024 ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES,
2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES, SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE
ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+090 CALZADA.
SE REALIZA NIVELACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE ENTRE
ABCISAS K0+500 AL K1+000

Escaneado con CamScanner

SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+600 AL KO+700 CALZADA.

6/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES,
2 PARRILLAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR, 1 CONDUCTOR,
ACTIVIDADES, CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+090 CALZADA.
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+090 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+090 CALZADA.

7/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 1 VOLQUETA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES 2 PARRILLAS, 2 CONDUCTORES, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+460 AL KO+510 CALZADA.
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+460 AL KO+510 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+460 AL KO+510 CALZADA.

Escaneado con CamScanner

8/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 1 VOLQUETA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 CONDUCTORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES, SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+580 AL KO+640 CALZADA.

9/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 1 VOLQUETA.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 CONDUCTORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES, SE RECIBIO TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+520 AL KO+580 CALZADA,
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+520 AL KO+580 CALZADA,
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MESORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+520 AL KO+580 CALZADA.
CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+650 AL KO+750 CALZADA.

10/11/2024 ESTADO DEL CLIMA:
DOMINGO:

Escaneado con CamScanner

11/11/2024 ESTADO DEL CLIMA:
LUNES FESTIVO:

12/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 VOLQUETA, 1 CARRO TANQUE,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES 2 CONDUCTORES, 2 PARRILEROS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES, SE RECIBE TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+590 AL KO+640 CALZADA.
CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+700 AL KO+750 CALZADA.

13/11/2024 ESTADO DEL CLIMA; SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 1 VOLQUETA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 PARRILEROS, 2 CONDUCTORES, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES, SE RECIBIO TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+650 AL KO+740 CALZADA,
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+580 AL KO+740 CALZADA,
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE ENTRE ABCISAS KO+580 AL KO+720 CALZADA.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABASAS KO+750 AL KO+820 CALZADA.

Escaneado con CamScanner

14/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 1 VOLQUETA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 CONDUCTORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR.
ACTIVIDADES. SE RECIBE TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+740 AL KO+840 CALZADA.
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+740 AL KO+780 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+740 AL KO+780 CALZADA.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+880 AL KO+900 CALZADA.

15/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 1 VOLQUETA,
PERSONAL, 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 CONDUCTORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES, SE RECIBE TRAMO DE SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+850 AL KO+880 CALZADA.
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL SOBRE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+840 AL KO+880 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+780 AL KO+840 CALZADA.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+900 AL KO+950 CALZADA.

Escaneado con CamScanner

16/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 1 VOLQUETA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 2 CONDUCTORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+950 AL K1+000 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE ENTRE ABCISAS KO+820 AL KO+880 CALZADA.

17/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
DOMINGO

18/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+950 AL K1+000 CALZADA.
SE REALIZA CONFORMACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
SE REALIZA NIVELACIÓN DEL TRAMO DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+520 AL KO+860 PARA INSTALACIÓN DE SEGUNDA CAPA MEJORAMIENTO.

Escaneado con CamScanner

19/11/2024 ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS. 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 OPERADOR, 1 CONDUCTOR, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE CONTINÚA CON EL CORTE DELA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K0+950 AL K1+000 CALZADA.
SE REALIZA NIVELACIÓN Y CONTRANIVELACIÓN ENTRE LOS K2+000 AL K3+000 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISEÑOS RESPECTIVOS.

20/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 1:00 AM 4:00 AM
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 2 VOLQUETAS.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 1 AUXILIAR, 1 CADENERO,
ACTIVIDADES, SE CONTINÚA CON EL CORTE DELA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K0+950 AL K1+000 CALZADA.
SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE MESORAMIENTO DELA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K0+920 AL K0+610 CALZADA.

21/11/2024 ESTADO DEL CLIMA; SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA 1 CARRO TANQUE, 2 VOLQUETA,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 2 OPERADORES, 1 PARISIGA, 1 CONDUCTOR, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE MESORAMIENTO DELA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS

Escaneado con CamScanner

K0+520 AL K0+680 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE ENTRE ABCISAS K0+400 AL K0+480 CALZADA. SEGUNDA CAPA.

22/11/2024 ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE. 2 VOLQUETAS,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE REALIZA CÉREO DEL MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA CAPA DEL K0+090 AL K0+480
LA MOTONIVELADORA PRESENTA UN DAÑO EN UNO DELOS DADOS QUE GIRAN LA TORNAMEZA LO CUAL NO SE PUDO TERMINAR LA ACTIVIDAD DE CÉREO.
SE REALIZO VISITA DE LA INTERVENTORÍA JUNTO CON EL CONTRATISTA PARA DEFINIR LOS PUNTOS DONDE SE DEBE COLOCAR MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA SOPORTE DE LA ESTRUCTURA.
SE PROCEDERA A REALIZAR APIQUES CON PROPIETARIOS de las Areas a Intervenir y Vbo para Material Botadero.

23/11/2024 ESTADO DEL CLIMA:
NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES.

Escaneado con CamScanner

24/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 12:00 PM A 2:00 AM DOMINGO.

25/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 17:00 A 19:00
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE. 2 VOLQUETAS.
PERSONAL: 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE REALIZA INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE ENTRE ABCISAS KO+540 AL KO+600 CALZADA.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+990 AL K1+040 CALZADA.
SE REALIZA CÉREO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+880 AL K1+040 CALZADA.

26/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 16:00 A LAS 17:00
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 2 VOLQUETAS.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 3 CONDUCTORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+090 CALZADA.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K1+000 AL K1+070 CALZADA.
SE REALIZA INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+090 SEGUNDA CAPA.
SE CONTINÚA CON EL CÉREO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+880 AL KO+950 CALZADA.

Escaneado con CamScanner

27/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 2 VOLQUETAS,
PERSONAL, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 3 CONDUCTORES, 2 PARISIGAS, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR,
ACTIVIDADES. SE REALIZA INSTALACIÓN DE TACOS DE NIVEL PARA SEGUNDA CAPA DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K0+000 AL K0+090 CALZADA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K0+000 AL K0+090 CALZADA. SEGUNDA CAPA.
SE CONTINÚA CON EL CORTE DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K0+090 AL K1+160 CALZADA.

28/11/2024 ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 3 VOLQUETAS,
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES 4 CONDUCTORES, 1 CADENERO, 1 AUXILIAR.
ACTIVIDADES. SE CONTINÚA CON EL CÉRCEO DE LA SEGUNDA CAPA DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS K0+000 AL K0+300 CALZADA.
INST. DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A LOS COSTADO DE LA CALZADA PARA SOSTENIMIENTO DE LOS GRANULARES.
SE REALIZA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PONEDERA.
SE VISITA DE LA INTERVENTORIA E INICIAS CON PRESENCIA DE LA ING. PLANEACIÓN DE PONEDERA.

Escaneado con CamScanner

29/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 2 VOLQUETAS.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 3 CONDUCTORES, 1 CADENERO, 2 AUXILIARES.
ACTIVIDADES. CÉREO DE LA SEGUNDA CAPA DE MATERIAL DE MAL MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+500 CALZADA.
SE RECIBE TRAMO DE MEJORAMIENTO SEGUNDA CAPA POR TOPOGRAFÍA ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+500 CALZADA.
SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+000 AL KO+100 SEGUNDA CAPA.
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+680 AL KO+750 CALZADA. SEGUNDA CAPA.
SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES TRAMO DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+750 AL KO+860 PRIMERA CAPA.

30/11/2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EQUIPOS. 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 RETRO ORUGA, 1 CARRO TANQUE, 2 VOLQUETAS.
PERSONAL. 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 3 CONDUCTORES, 1 CADENERO, 2 AUXILIARES
ACTIVIDADES. SE REALIZA CÉREO DEL MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE ENTRE ABCISAS KO+500 AL KO+600 CALZADA.

Escaneado con CamScanner

8.5 INFORMACION RENDIMIENTOS Y CUENTAS CONVENIOS DE OBRA

NOVIEMBRE 2024

8.5 INFORMACIÓN CUENTAS CONVENIOS

8.5.1 Información Cuenta Convenio 2220-2023 (PONEDERA)

Contrato de obra adjudicado mediante licitación pública No. LP-001-2023 con la siguiente información del convenio y contrato de obra:

Tabla 1 Información del convenio y contrato de obra

Convenio INVIAS No.	**2220-2023**
Fecha Convenio INVIAS No.	**21 de junio de 2023**
Objeto Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1 Convenio	Doce (12) meses
Fecha Prorroga No.1 Convenio	22 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2024
Valor inicial:	**$ 12.460.000.000**
Municipio	**PONEDERA**

- **Resumen Cuenta Convenio**

A la fecha se presentan el siguiente resumen de ingresos y egresos de la cuenta del convenio 2220-2023.

RESUMEN CUENTA CONVENIO

MUNICIPIO		**PONEDERA**
CUENTA CONVENIO		28069996776
BANCO		**DAVIVIENDA**
CONVENIO VALOR		**$ 12.460.000.000,00**
Fecha de Corte		**30/11/2024**
Descripción Ingreso/Egreso	Credito	Debidto
Recurso Inicial	$ 12.460.000.000	
Anticipo		$ 0
Giros no permitidos		-$ 58.738.335
Actas parciales		$ 0
Rendimientos generados	$ 129.457.768	
Devolución rendimientos tesoro nacional		-$ 105.760.274
Subtotal	$ 12.589.457.768	-$ 164.498.609
Saldo cuenta convenio	**$ 12.424.959.159**	

Nota: 1 Valores correspondientes a corte del extracto del mes de noviembre de 2024.

* Los giros no permitidos obedecen a:

Un movimiento de $ 58.475.000,00 realizado por el Municipio de Ponedera al banco Davivienda. Giro que no fue autorizado por el INVIAS y fue realizado en contravía de las reglas del manejo de la cuenta bancaria y cuya responsabilidad recae actualmente sobre el banco y el Municipio de Pondera. Al respecto la interventoría notificó por última vez al INVIAS que el Municipio no ha realizado el retorno de los recursos mediante comunicación C-T-135-099-2024 del 07/06/2024 con radicado 2024E-VUVRAZ-051832.

Un descuento de $ 263.335,00 por concepto de cobro de chequeras e IVA por servicios en el mes de noviembre de 2024, el cual debe ser reembolsado por parte del Municipio de Ponedera.

- **Rendimientos generados y transferidos**

Se evidencia en el resumen rendimientos generados en la cuenta del convenio por un valor de $ 118.322.434 hasta el 31/10/2024, de los cuales el municipio ha realizado la devolución de $ 105.760.274, de la siguiente manera, estando pendiente el giro de rendimientos por un valor de $ 12.562.160 de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024.

Giro de Rendimientos		
Fecha	Valor	Observaciones
25/06/2024	-$ 73,543,979.31	GIRO SEBRA RENDIMIENTOS Sep23 - Abr24
26/07/2024	-$ 20,692,718.49	GIRO SEBRA RENDIMIENTOS may24 - jun24
11/09/2024	-$ 11,523,575.87	GIRO SEBRA RENDIMIENTOS jul24 - Ago24
Total	-$ 105,760,273.67	

Respecto a soportes de traslados de rendimientos del Tesoro Nacional se presenta lo siguiente:

- Traslado del 25/06/2024 se presenta Nota debido con Traslado a fondos Cebra.

- Traslado del 26/07/2024 se presenta extracto bancario de julio 2024 debido a que el Municipio de Ponedera no ha aportado certificación expedida por el banco.

- Traslado del 11/09/2024 se presenta extracto bancario de septiembre de 2024, debido a que Municipio de Ponedera no ha aportado certificación expedida por el banco.

- Mediante comunicado C-T-135-355-2024 de fecha de 16/10/2024 se remite carta debidamente firmada por parte de Interventoría con la finalidad de que el municipio de Ponedera realice el respectivo tramite del giro de los rendimientos financieros generados en el mes de Septiembre de 2024.

Respecto al no aporte de los certificados de los rendimientos la interventoría ha reiterado solicitud al Municipio mediante las siguientes comunicaciones, sin que la fecha el municipio otorgue respuesta.

FECHA	CÓDIGO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD
21 de agosto de 2024	C-T-135-257-2024	PO- REITERACIÓN COMUNICADO C-T-135-242-2024 DE FECHA DE 09 DE AGOSTO DE 2024. GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2024	ALCALDIA DE PONEDERA
29 de agosto de 2024	C-T-135-272-2024	PO- REITERACIÓN 3 COMUNICADO C-T-135-242-2024 DE FECHA DE 09 DE AGOSTO DE 2024. GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2024.	ALCALDIA DE PONEDERA
10 de septiembre de 2024	C-T-135-294-2024	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023	ALCALDIA DE PONEDERA
03 de octubre de 2024	C-T-135-332-2024	PO- Solicitud de extracto del mes de septiembre de 2024 de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023	ALCALDIA DE PONEDERA
15 de octubre de 2024	C-T-135-350-2024	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de Septiembre de 2024.	ALCALDÍA DE PONEDERA
23 de noviembre de 2024	C-T-135-418-2024	"PO- REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de septiembre a octubre de 2024."	ALCALDÍA DE PONEDERA

8.5.2 Información cuenta Convenio 2221-2023 (SABANAGRANDE)

Contrato de obra adjudicado mediante licitación pública No. SG-LP-OP-004-2023 con la siguiente información del convenio y contrato de obra:

Tabla 2 Información del convenio y contrato de obra SABANAGRANDE

Convenio INVIAS No.	2221-2023

Fecha Convenio INVIAS No.	**21 de junio de 2023**
Objeto Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1 Convenio	Doce (12) meses
Fecha Prorroga No.1 Convenio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2024
Municipio	Sabanagrande

- **Resumen Cuenta Convenio**

A la fecha se presentan el siguiente resumen de ingresos y egresos de la cuenta del convenio 2221-2023.

RESUMEN CUENTA CONVENIO

MUNICIPIO		**SABANAGRANDE**
CUENTA CONVENIO		0241 6999 6022
BANCO		**DAVIVIENDA**
CONVENIO VALOR		**$ 6.586.000.000,00**
Fecha de Corte		**30/11/2024**
Descripción Ingreso/Egreso	Credito	Debidto
Recurso Inicial	$ 6.586.000.000	
Anticipo		-$ 1.962.654.749
Devolución Anticipo	$ 1.242.909.478	
*Giros no permitidos		-$ 125.658
Actas parciales		-$ 2.556.172.422
Rendimientos generados	$ 55.521.474	
Devolución rendimientos tesoro nacional		-$ 54.120.116
Subtotal	$ 7.884.430.952	-$ 4.573.072.945
Saldo cuenta convenio	**$ 3.311.358.008**	

Nota: 2 Valores correspondientes a corte del extracto del mes de noviembre de 2024

* Los giros no permitidos obedecen a un reembolso pendiente por parte del contratista por concepto de cheques de gerencia para pago de actas parciales e IVA por servicios.

- **Rendimientos generados y transferidos**

Se evidencia en el resumen rendimientos generados en la cuenta del convenio por un valor de $ 55.521.474 hasta el 30/11/2024, de los cuales el municipio ha realizado la devolución de $ 54.120.116, de la siguiente manera y estando pendiente el giro de rendimientos del mes de noviembre de 2024.

Giro de Rendimientos		
Fecha	Valor	Observaciones
24/05/2024	-$ 37,207,106.22	Consignación rendimientos del sep23 a abr24
18/06/2024	-$ 3,920,729.00	Consignación rendimientos del may24
29/11/2024	-$ 12.992.280,71	Consignación rendimientos del jun24 a Oct24
Total	-$ 54.120.115,93	

Respecto a soportes de traslados de rendimientos del Tesoro Nacional se presenta lo siguiente:

- Traslado del 25/05/2024 se presenta Carta de la autorización para retorno de rendimientos y soporte de transferencia emitido por el Municipio de Sabanagrande.
- Traslado del 18/06/2024 se presenta extracto bancario de junio de 2024, debido a que Municipio de Sabanagrande no ha aportado certificación expedida por el banco.
- Traslado del 29/11/2024 se presenta extracto bancario de noviembre de 2024, debido a que Municipio de Sabanagrande no ha aportado certificación expedida por el banco.

Respecto al no aporte de los certificados de los rendimientos y el no giro de los rendimientos de los meses de noviembre de 2024, la interventoría ha reiterado solicitud al Municipio mediante las siguientes comunicaciones, sin que la fecha el municipio otorgue respuesta.

FECHA	CÓDIGO	ASUNTO	ENVIADO A: ENTIDAD
4 de mayo de 2024	C-T-135-041-2024	SG- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 0241-6999-6022, aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
12 de junio de 2024	C-T-135-111-2024	SG- GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2024.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
10 de julio de 2024	C-T-135-176-2024	SG- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2024. SOLICITUD DE EXTRACTO DEL MES DE JUNIO DE 2024 Y GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
8 de agosto de 2024	C-T-135-236-2024	SG- REITERACIÓN GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2024. Y GIRO DE RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2024.	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
3 de septiembre de 2024	C-T-135-278-2024	SG- REITERACIÓN GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2024. Y SOLICITUD DE EXTRACTO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE

18 de septiembre de 2024	C-T-135-306-2024	SG- REITERACIÓN. Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de Agosto de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio	ALCALDIA DE SABANAGRANDE
21 de octubre de 2024	C-T-135-359-2024	REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de JUNIO A SEPTIEMBRE de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio.	ALCALDÍA DE SABANAGRANDE
18 de noviembre de 2024	C-T-135-412-2024	SG- REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de JUNIO A OCTUBRE de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio	ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

8.5 Soportes Giros Rendimientos
PONEDERA
CONVENIO 2220-2023







Bienvenido: Señor(a) ADALBERTO JOSE RICO GUTIERREZ
NIT 8901162789 - MUNICIPIO DE PONEDERA

viernes 28 de junio de 2024

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Nd Traslad Fondos Sebra	Valor	$ 73.543.979,31

Fecha de Movimiento	25/06/2024
Hora de Movimiento	18:04:16
Cuenta Origen	XXXXXXXXXXXX6776
Oficina	GB MONEDA EXTRANJERA

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA CORRIENTE
0280 6999 6776

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE PONEDERA
alcaldia@ponedera-atlantico.gov.co

Saldo Anterior	$12,422,217,718.49	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$10,468,553.28	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$20,692,718.49	Tasa Sobregiro	29.38% E.A
Nuevo Saldo	$12,411,993,553.28	Tasa Mora	29.38% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
26	07	Nd Traslad Fondos Sebra	GB MONEDA EXTRANJERA	6667	$20,692,718.49-	$12,401,525,000.00+
31	07	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	$10,468,553.28+	$12,411,993,553.28+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Interés de Sobregiro: 2.17 % M.V. 29.38 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Para mayor información en www.davivienda.com
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA CORRIENTE
0280 6999 6776

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE PONEDERA
alcaldia@ponedera-atlantico.gov.co

Saldo Anterior	$12,413,096,291.47	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$1,017,243.94	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$11,523,575.87	Tasa Sobregiro	28.78% E.A
Nuevo Saldo	$12,402,589,959.54	Tasa Mora	28.78% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
11	09	Nd Traslad Fondos Sebra	GB MONEDA EXTRANJERA	2221	$11,523,575.87-	$12,401,572,715.60+
30	09	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	$1,017,243.94+	$12,402,589,959.54+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en ***www.davivienda.com***, opción **"tasas y tarifas".**

Interés de Sobregiro: 2.13 % M.V. 28.78 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7 Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA CORRIENTE
0280 6999 6776

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2024

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE PONEDERA
alcaldia@ponedera-atlantico.gov.co

Saldo Anterior	$12,402,589,959.54	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$11,497,200.89	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$0.00	Tasa Sobregiro	28.02% E.A
Nuevo Saldo	$12,414,087,160.43	Tasa Mora	28.02% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
31	10	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	$11,497,200.89+	$12,414,087,160.43+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en ***www.davivienda.com***, opción **"tasas y tarifas".**

Interés de Sobregiro: 2.08 % M.V. 28.02 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7 Para mayor información en www.davivienda.com

8.5 Soportes Giros Rendimientos
SABANAGRANDE
CONVENIO 2221-2023

Mayo 20 de 2024

Señores
BANCO DAVIVIENDA
Banca Oficial
E.S.D.

Asunto: Reintegro de Recursos, Rendimientos generados por el convenio Interadministrativo No.2221 de 2023, suscrito entre INVIAS y el Municipio de Sabanagrande.

En cumplimiento con los términos establecidos con los recursos del Convenio Interadministrativo No.2221 de 2023, entre el Municipio de Sabanagrande y el Instituto Nacional de Vías – Invías, nos permitimos solicitar, se efectúe debito a la cuenta corriente No.024169996022 titular Municipio de Sabanagrande, denominada "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. Por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS CON 22/100 M.L. ($37.207.106.22) correspondiente a los rendimientos financieros generados durante los meses de septiembre de 2023 hasta el mes de abril de 2024.

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente
Cuenta Bancaria No.61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de transacción: SEBRA 137

La consignación de los recursos se debe efectuar únicamente a través del sistema SEBRA CUD ofrecido por el Banco de la República a los intermediarios financieros, utilizando el código de operación 137 de manera tal que la operación quede exenta del gravamen a los movimientos financieros, de acuerdo al artículo 879 numeral 3 del Estatuto Tributario. De igual manera se debe señalar que en el campo de concepto, incluya el código de portafolio asignado a INVIAS, que corresponde el (270)

Una vez efectuada la transferencia a la cuenta indicada, favor notificar expedir certificación bancaria con el detalle del movimiento al correo secretariadehacienda@sabanagrande-atlantico.gov.co.

Atentamente,

DARWIN ALEXANDER MORA
Alcalde Municipal
C.C.72.099.118

FRANCISCO CARTUSCIELLO SANZ
Secretario de Hacienda y del Tesoro
C.C.72.097.677

OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Consorcio ODESA
C.C.79.296.441

Proyectó: Ronald Vásquez
Revisó: Francisco Cartusciello Sanz

SISTEMA OPERACIÓN:	CUD		FECHA APROBACIÓN:	24/05/2024	FECHA VALOR: 24/05/2024
CONSECUTIVO OPERACIÓN	117614418		FECHA HORA LIQUIDACIÓN	24/05/2024 18:39:26	
TRANSACCIÓN:	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3				VALOR: 37,207,106.22
CUENTA ORIGEN:	COP	62015102 BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL:	BOGOTA D.C.	
CUENTA DESTINO:	COP	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	HORA RESOLUCIÓN DE LA COLA:		
USUARIO CAPTURA ORIGEN:	mcruzpin01039 18:33:51		USUARIO APROBACIÓN ORIGEN:	rjutinpi01039 18:39:26	
USUARIO CAPTURA DESTINO:			USUARIO APROBACIÓN DESTINO:		
REFERENCIA:	TRASLADO		CONCEPTO:	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE SABANA GRANDE -RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL MES DE ABRIL 2024	
PORTAFOLIO CRÉDITO:	270		PORTAFOLIO DÉBITO:	0	

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA CORRIENTE
0241 6999 6022

INFORME DEL MES: JUNIO /2024

Apreciado Cliente

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE V?AS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATL?NTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

secretariadehacienda@sabanagrande-atlant

Saldo Anterior	$4,627,240,038.84	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$3,774,441.50	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$3,920,729.00	Tasa Sobregiro	30.76% E.A
Nuevo Saldo	$4,627,093,751.34	Tasa Mora	30.76% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
18	06	Nd Traslad Fondos Sebra	GB MONEDA EXTRANJERA	0146	$3,920,729.00-	$4,623,319,309.84+
30	06	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	$3,774,441.50+	$4,627,093,751.34+



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 2.26 % M.V. 30.76 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA CORRIENTE
0241 6999 6022

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024


Apreciado Cliente

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÃ AS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÃ?NTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

secretariadehacienda@sabanagrande-atlantico.gov.co

Saldo Anterior	$4,104,608,556.21	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$1,401,358.36	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$794,651,906.71	Tasa Sobregiro	27.87% E.A
Nuevo Saldo	$3,311,358,007.86	Tasa Mora	27.87% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
05	11	Retiro Cheque en Oficina con Tarjeta	PASEO BOLVIVAR	4586	$623,920,234.15-	$3,480,688,322.06+
05	11	Cobro Por Giro De Cheque De Gerencia	PASEO BOLVIVAR	4586	$26,400.00-	$3,480,661,922.06+
05	11	Retiro Cheque en Oficina con Tarjeta	PASEO BOLVIVAR	4587	$33,443,710.70-	$3,447,218,211.36+
05	11	Cobro Por Giro De Cheque De Gerencia	PASEO BOLVIVAR	4587	$26,400.00-	$3,447,191,811.36+
05	11	Retiro Cheque en Oficina con Tarjeta	PASEO BOLVIVAR	4588	$117,826,654.85-	$3,329,365,156.51+
05	11	Cobro Por Giro De Cheque De Gerencia	PASEO BOLVIVAR	4588	$26,400.00-	$3,329,338,756.51+
05	11	Retiro Cheque en Oficina con Tarjeta	PASEO BOLVIVAR	4589	$6,343,362.30-	$3,322,995,394.21+
05	11	Cobro Por Giro De Cheque De Gerencia	PASEO BOLVIVAR	4589	$26,400.00-	$3,322,968,994.21+
29	11	Nd Traslad Fondos Sebra	GB MONEDA EXTRANJERA	0222	$12,992,280.71-	$3,309,976,713.50+
30	11	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	$1,401,358.36+	$3,311,378,071.86+
30	11	IVA por Servicios		0000	$20,064.00-	$3,311,358,007.86+

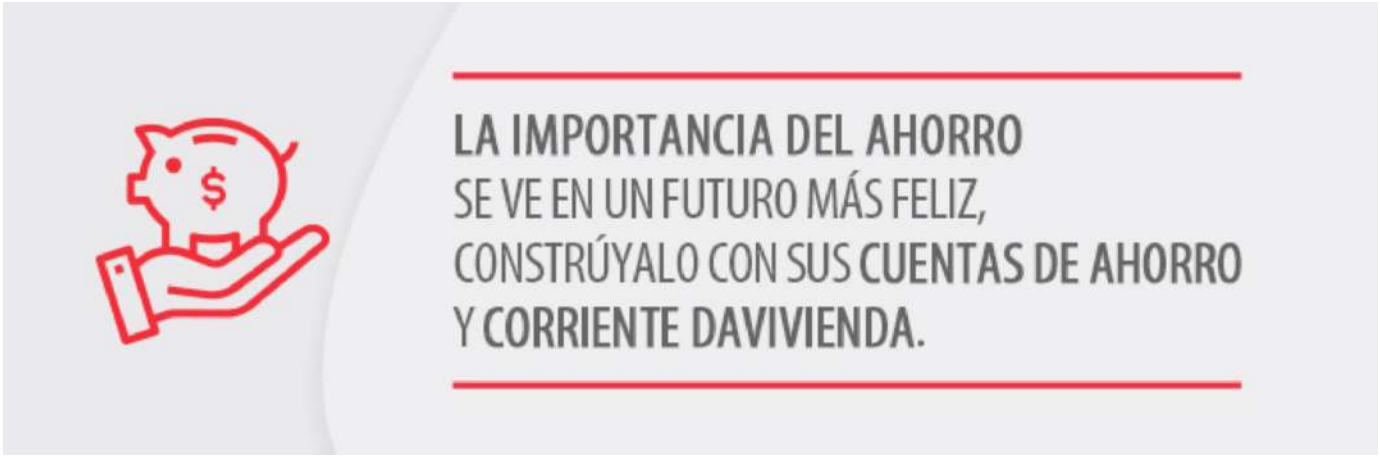

Interés de Sobregiro: 2.07 % M.V. 27.87 % E.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
