INFORME EJECUTIVO

CONTRATO No: SI-LP-002-2024

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: DEL 17 DE MAYO DE 2025 A 13 DE JUNIO DE 2025

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
ALCANCE DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR 5
PLAZO DE EJECUCIÓN 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 10
ASPECTOS CONTRACTUALES 11
FORMA DE PAGO 11
CONTROL DE PÓLIZAS 12
INORMES SEMANALES Y ACTAS SUSCRITAS 14
INFORMES SEMANALES 14
ACTAS SUSCRITAS 15
INFORME DE AVANCE 15
FRENTES DE TRABAJO 15
ASISTENCIA DE PERSONAL PROFESIONAL 16
MAQUINARIA Y EQUIPOS 16
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 16
PORCENTAJE DE AVANCE 17
INFORMACIÓN FINANCIERA 18
SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 20
REGISTRO FOTOGRÁFICO 21
CONCLUSIONES 27

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

Ilustración 1. Localización General del Proyecto 4

Fotografía 3.figuracion de acero de estructuras 21
Fotografía 4. Figuracion acero cimentaciones 21
Fotografía 5. Instalacion de tuberias 21
Fotografía 6. Instalcion de tuberias 22
Fotografía 7. Instalcion de cinta pvc 22
Fotografía 8. Levante de muros 22
Fotografía 9. Levante de muros 22
Fotografía 10. Concreto de columnas 23
Fotografía 11.Concreto de vigas 23
Fotografía 12. Cargue y retiro de material 23
Fotografía 13.Instalcion de cubierta 23
Fotografía 14. Instalacion de cubierta 23
Fotografía 15. Instalacion de perfileria 23
Fotografía 16. Instalacion de perfileria 23
Fotografía 17. Plantilla en concreto 24
Fotografía 18. Plantilla en concreto 24
Fotografía 19. Instalacion de ceramica 24
Fotografía 20.Instalacion de ceramica 24
Fotografía 21.Demolicion 24
Fotografía 22. Demolicion 24

Dirección: Cra9 #6-36 Of202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe del periodo mensual del contrato de Obra No. SI-LP-002-2024, comprendido del 17 DE MAYO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2025; cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

En el presente informe, se detallan los aspectos más relevantes del contrato de obra y se describen las actividades desarrolladas en el periodo, equivalentes al 30.01% de las actividades contratadas. El proyecto consiste en la intervención de 10 instituciones educativas en los diferentes municipios del departamento de Córdoba cuyo objeto es mantenimiento y adecuación que permitan el óptimo funcionamiento de las instalaciones, para brindar un servicio de calidad a la población estudiantil ;se contemplan actividades como excavaciones, rellenos ,concretos, impermeabilización, instalación de redes hidrosanitarias redes eléctricas, instalación de cubiertas, pintura enchapes; entre otras actividades.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, Departamento de Córdoba. Específicamente en los municipios de Cereté (I.E. Marceliano Polo), San Pelayo (I.E. Santa Teresita sede general Santander), Ciénaga de Oro (I.E. Marco Fidel Suarez), Moñitos (I.E. San José de Moñitos sede principal), Tierralta (I.E. Junín), Planeta Rica (I.E. Plaza bonita), San Bernardo del Viento (I.E. El Castillo), Canalete (I.E. San José de Canalete), San Andrés de Sotavento (I.E. San Simón sede sagrado corazón de Jesús) y Los Córdobas (I.E. El Ébano).



Ilustración 1. Localización General del Proyecto

Dirección: Cra9 #6-36 Of202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

ALCANCE DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR

El proyecto tiene como objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAEESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA". Y las actividades a ejecutar, de acuerdo al Balance de obra N°1 son las siguientes:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA			
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.872,00
1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	1.872,00
1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	444,00
	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	171,00
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	409,00
2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	57,00
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	730,20
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	270,15
	3. CIMENTACIÓN		
3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	5,70
3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	34,20
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	365,40
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	7.173,00
3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	596,40
	4. ESTRUCTURAS		
4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	438,00
4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	318,00
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	12.107,40
4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	131,00
4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	108,00
4,06	MESON PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E=0.08, CON REFUERZO 3/8" @ .15 EN AMBOS SENTIDOS CON ACABO EN GRANITO PULIDO	M2	9,60
	5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE		
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	1.236,00
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	2.662,00
5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	2.362,00
5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	2.362,00

Dirección: Cra9 #6-36 Of202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

6. ESTRUCTURA - CUBIERTA			
6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	1.304,00
6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	7.925,30
6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	4.379,96
7. PISOS			
7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	985,80
7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	985,80
7,03	ENCHAPE CERÁMICA DE 0.30 X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	266,40
7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	707,40
8. CARPINTERIA METALICA			
8,01	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	42,00
8,02	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.80 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	12,00
8,03	S/I PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, DE 1,50 X 2,20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJAS DE 30 CMS EN AMBAS PUERTAS Y POR AMBOS LADOS.	UN	12,00
8,04	S/I CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO DE 0,6 MM ESPESOR, ACABADO EN COLOR GRIS, APERTURA MANUAL.	M2	21,60
8,05	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	42,72
8,06	S/I PROTECTOR DE VENTANAS EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	62,16
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS			
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE			
9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	246,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	ML	105,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	54,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	87,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	42,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM	UN	18,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	UN	24,00
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA	UN	6,00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	UN	6,00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	UN	12,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	UN	6,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	UN	12,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	UN	12,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	42,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	18,00

	TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA		
9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	351,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	108,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	ML	45,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	114,00
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	72,00
9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UN	84,00
9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UN	6,00
9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UN	18,00
	EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO		
9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)	UN	12,00
9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UN	6,00
	APARATOS SANITARIOS		
9,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UN	6,00
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	12,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UN	12,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UN	54,00
9,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADOS METÁLICOS	UN	12,00
9,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	12,00
	TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE		
9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS	M3	36,00
9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	12,00
9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13,82
9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	8,40
9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	28,98
9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	24,00
9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	1.615,80
	TANQUE DE AGUA POTABLE		
9,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20
9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00
9,42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56
9,43	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	10,80
9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	117,60
9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20
9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20
	TANQUE DE AGUAS RESIDUALES		
9,48	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20
9,49	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00
9,50	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56
9,51	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,52	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20
9,53	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

10. INSTALACIONES ELECTRICAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)			
10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	42,00
10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	18,00
10,03	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UN	72,00
10,04	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W- Wallpack LED 30W)	UN	234,00
10,05	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA)	UN	60,00
10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UN	126,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)	UN	6,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tuberia PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	ML	25,00
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE MEDIDA Y ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE PROTECCIONES (incluye Tuberia PVC, Tuberia IMC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00
10,11	SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6)	UN	12,00
10,12	CERTIFICACION Retie Y Retilap Uso Final	UN	6,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR		
10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	UND	6,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	UND	6,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	6,00
10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	48,00
10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE VEINTITRES (23) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PRESERVEN LA INTEGRIDAD DE LOS PANELES	UND	48,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	18,00

11. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN LA I.E SAN JOSE CANALETE			
ACTIVIDADES PRELIMINARES			
11,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Und	1,00
11,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	102,00
11,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	55,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS			
11,04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	18,00
11,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	41,60
11,06	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	6,00
11,07	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	66,80
11,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	28,27
CIMENTACIÓN			
11,09	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,60
11,10	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	3,60
11,11	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	36,20
11,12	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	856,20
11,13	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	40,00
ESTRUCTURAS			
11,14	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	40,00
11,15	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	21,60
11,16	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1.241,80
11,17	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	18,00
ESTRUCTURA - CUBIERTA			
11,18	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	130,40
11,19	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	825,55
11,20	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	417,14
PISOS			
11,23	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	98,60
11,24	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	98,60
11,25	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	12,00
PINTURA COCINA EXISTENTE			
11,26	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	124,30
11,27	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	124,30

12. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E EL CASTILLO - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO			
12,01	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO E= 0.10 MTS DE CONCRETO Y SOPORTE EN BLOQUE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Und	1,00
12,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	75,00
12,03	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	70,70
12,04	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	75,00
12,05	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	75,00
12,06	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	48,38
12,07	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	41,60
12,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	70,70
13. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS - MUNICIPIO SAN ANDRES DE SOTAVENTO			
13,01	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	48,00
13,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE ENTRAMADO EN CERCHAS METALICAS	M2	48,00
13,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	171,40
13,04	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	48,00
13,05	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	48,00
13,06	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	48,00
13,07	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	47,00
13,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	57,80
14. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E EL EBANO - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS			
14,01	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	46,46
14,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN TABLON ROJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	80,96
14,03	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	80,96
14,04	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOSION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	28,30
14,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	46,46
14,06	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	40,40
14,07	DESMONTE DE VENTILADORES EN MAL ESTADO	UND	4,00
14,08	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UND	4,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución inicial del contrato, es de OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita entre contratista y supervisión el día **17 de MARZO de 2025.**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El contratista presentó una reprogramación de actividades, de acuerdo al plazo contractual del proyecto, de 08 meses, con fecha de finalización 17 de noviembre de 2025. Se anexa programación de obra y flujo financiero del contrato por semanas; para su seguimiento.

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No:	SI-LP-002-2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 Nit: 901915670-0 R.L María Isabel Quintero González C.C 1.010.007.099
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
VALOR TOTAL:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESO M/CTE ($4.135.056.075)
CDP:	4625 11 de febrero de 2025
ACTA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (08) MESES
INTERVENTORIA	ANTICA SAS BIC

FORMA DE PAGO

El Departamento de Córdoba cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: **1.- PAGOS PARCIALES**, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 30% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. **PARÀGRAFO PRIMERO:** Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el Interventor y/o supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de gestión social y planos. **2.- PAGO FINAL**, equivalente al 10% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y

riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA** deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO SEGUNDO. -** Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoría durante el período de las actas. **PARÁGRAFO TERCERO**. Para efectos del último pago deberá presentarse el Acta de Liquidación del contrato. **PARÁGRAFO CUARTO. EL CONTRATISTA** deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **EI CONTRATISTA** deberá anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. **PARÁGRAFO QUINTO: EI CONTRATISTA** deberá acreditar previo a cada pago que, respecto de sus obligaciones en materia laboral, frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación de cada factura. **NOTA: EL DEPARTAMENTO** no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se presenta un resumen de las garantías del contrato de obra SI-LP -002-2024:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100369947
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

AMPARO	**VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO**	**VALOR ASEGURADO**

	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	12/04/2026	$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12/02/2025	12/04/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	12/10/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	1210/2025	12/10/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/02/2025	12/04/2026	$41.226.771,00

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2025	17/05/2026	$413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	17/03/2025	17/05/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	17/11/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/11/2025	17/11/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/03/2025	17/05/2026	$41.226.771,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100095688
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
AMPARO	**VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BÁSICO	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00

Las garantías fueron revisas y aprobadas por el área jurídica de la Gobernación de Córdoba, inicialmente se realizó la aprobación con fecha 19/02/2025, donde se establece que las garantías cumplen con los requisitos exigidos por el contrato y por la ley; en lo que corresponde a las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

El contratista realizó la actualización de las vigencias de las garantías contractuales, con la fecha del acta de inicio suscrita entre contratista y supervisión, y con las actas de suspensión, reinicio y prorroga las cuales fueron aprobadas con fecha 28/04/2025 por la entidad contratante.

INORMES SEMANALES Y ACTAS SUSCRITAS

INFORMES SEMANALES

Con una periodicidad semanal se elaboran informes con el resumen de las actividades desarrolladas durante la semana. Durante el periodo correspondiente a la ejecución de obra, se elaboraron 4 informes semanales.

DESCRIPCIÓN DEL INFORME	FECHA
Informe Semanal N°10	24-05-2025
Informe Semanal N°11	01-06-2025
Informe Semanal N°12	08-06-2025
Informe Semanal N°13	13-06-2025

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025

INFORME DE AVANCE

FRENTES DE TRABAJO

INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANO POLO	MUNICIPIO DE CERETE
INSTITUCION EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ	MUNICIPIO DE CIENEGA DE ORO
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER	MUNICIPIO DE SAN PELAYO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS	MUNICIPIO DE MOÑITOS
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CANALETE	MUNICIPIO DE CANALETE

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

ASISTENCIA DE PERSONAL PROFESIONAL

A continuación, se relaciona el personal profesional propuesto por el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 para dar cumplimiento a equipo requerido por entidad contratante en el anexo técnico del contrato:

No	PROFESIONAL	DEDICACIÓN	NOMBRE
1	DIRECTOR DE OBRA	30%	KAMAL AUGUSTO BEJRANO FERNANDEZ
2	RESIDENTE DE OBRA 1	100%	ANDY MIGUEL AGAMEZ GENEY
3	RESIDENTE DE OBRA 2	100%	JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA
4	RESIDENTE DE OBRA 3	100%	RICARDO JAVIER CASTRO ESCOBAR
5	INGENIERO ELECTRICO	50%	HECTOR RAMIREZ LIBREROS
6	INGENIERO AMBIENTAL	50%	SHARON MELISA CORRALES MARTINEZ

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se destaca el uso de los siguientes equipos:

- Mezcladora de Concreto
- Placa Vibratoria (Compactador Rana)
- Vibrador de concreto
- Herramienta Menor
- Pulidora
- Taladro

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas en el periodo del presente informe, corresponden principalmente a:

- Figuración de acero de cimentación y estructuras
- Suministro e instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias
- Instalación de cinta PVC
- Relleno con material seleccionado
- Levante de muros
- Concreto de columnas
- Concreto de vigas de cimentación
- Instalación de cubierta
- Instalación de cerchas en perfilería metálica
- Instalación de correas en perfilería metálica

- Plantilla en concreto
- Demolición de estructuras
-

PORCENTAJE DE AVANCE

Durante el periodo correspondiente al presente informe; se ejecutaron las siguientes cantidades de obra; resultando en un avance de $839.103.101,23

	DESCRIPCION	UND.	VALOR	CANTIDADES	VALOR EJECUTADO
	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	$ 4.287,00	312,00	$ 1.337.544,00
1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	$ 7.514,00	312,00	$ 2.344.368,00
1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	$ 21.007,00	74,00	$ 1.554.518,00
	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	$ 6.543,00	68,10	$ 445.578,30
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 200.140,00	62,86	$ 12.580.800,40
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	$ 22.830,00	41,49	$ 947.216,70
	3. CIMENTACIÓN				
3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$ 890.152,00	0,95	$ 845.644,40
3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	$ 1.020.946,00	5,70	$ 5.819.392,20
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 124.557,00	59,40	$ 7.398.685,80
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	$ 9.658,00	1555,21	$ 15.020.218,18
3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	$ 40.066,00	309,45	$ 12.398.423,70
	4. ESTRUCTURAS				
4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 135.680,00	77,90	$ 10.569.472,00
4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 135.759,00	66,60	$ 9.041.549,40
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	$ 9.658,00	2384,40	$ 23.028.535,20
	5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE				
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	$ 99.267,00	519.34	$ 54.549.201,84
	6. ESTRUCTURA - CUBIERTA				
6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	$ 281.430,00	804,00	$ 226.269.720,00
6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$ 22.867,00	3974,88	$ 90.893.580,96
6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	$ 18.468,00	2430,56	$ 44.887.582,08
	7. PISOS				
7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	$ 127.857,00	894,87	$ 114.415.393,59
7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	$ 163.779,00	497,52	$ 81.483.328,08

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com


	9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS				
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE				
9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	$ 2.798,00	123,00	$ 344.154,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	ML	$ 12.259,00	52,50	$ 643.597,50
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	$ 15.603,00	27,00	$ 421.281,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	$ 14.626,00	43,50	$ 636.231,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	$ 33.494,00	21,00	$ 703.374,00
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA				$ -
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	$ 34.840,00	53,00	$ 1.846.520,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	ML	$ 46.441,00	22,50	$ 1.044.922,50
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	$ 62.212,00	57,00	$ 3.546.084,00
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	$ 57.990,00	36,00	$ 2.087.640,00
9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UN	$ 66.284,00	42,00	$ 2.783.928,00
9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UN	$ 82.396,00	3,00	$ 247.188,00
9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UN	$ 618.920,00	9,00	$ 5.570.280,00
9,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	$ 616.694,00	6,00	$ 3.700.164,00
	TANQUE		$ -		$ -
9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	$ 1.195.256,00	6,94	$ 8.295.076,64
9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	$ 106.274,00	58,80	$ 6.248.911,20
9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	$ 1.270.097,00	19,50	$ 24.766.891,50
9,52	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	$ 905.605,00	7,05	$ 6.384.515,25
	10. INSTALACIONES ELECTRICAS				
10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	$ 251.975,00	24,00	$ 6.047.400,00
10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	$ 254.729,00	6,00	$ 1.528.374,00
10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UN	$ 203.416,00	63,00	$ 12.815.208,00
	11. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN JOSE CANALETE				
	PRELIMINARES				
11,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Und	$ 817.173,00	1,00	$ 817.173,00
11,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	$ 7.514,00	102,00	$ 766.428,00
11,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	$ 21.007,00	55,00	$ 1.155.385,00
	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
11,04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	$ 39.259,00	15,00	$ 588.885,00
11,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	$ 6.543,00	40,40	$ 264.337,20
11,06	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	$ 206.382,00	5,00	$ 1.031.910,00
11,07	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 200.140,00	3,64	$ 728.509,60
11,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	$ 22.827,00	24,23	$ 553.098,21
	CIMENTACIÓN				
11,09	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$ 890.152,00	0,50	$ 445.076,00
11,10	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	$ 1.020.946,00	3,00	$ 3.062.838,00
11,11	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 124.557,00	36,20	$ 4.508.963,40
11,12	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	$ 9.658,00	610,3	$ 5.894.277,40
	ESTRUCTURAS				
11,14	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 135.860,00	40,00	$ 5.434.400,00
11,15	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 135.759,00	21,60	$ 2.932.394,40
11,16	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	$ 9.658,00	822,52	$ 7.943.898,16
					$ 839.103.101,23

INFORMACION FINANCIERA

A continuación, se presenta un resumen de los porcentajes de avance programados, de acuerdo con la programación presentada, la cual cuenta con la aprobación de la supervisión y con base en la cual se medirá el avance del proyecto mes a mes; la programación de obra fue elaborada con base a las cantidades de obra contratadas, en esta se puede evidenciar un avance del 20.29% durante este periodo, superior al programado de 8.84% lo que a la fecha indica que el porcentaje ejecutado acumulado es del 30%

PERIODO	PROGRAMADO PESOS	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO (PESOS)	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE ATRASO O AVANCE
17 DE MARZO A 16 DE ABRIL	$ 161.269.564,00	3,90%	3,90%	$ 162.815.817,62	3,94%	0,36
17 DE ABRIL A 16 DE MAYO	$ 659.481.289,00	15,94%	15,94%	$ 238.631.740,50	5,77%	-10,17%
17 DE MAYO A 13 DE JUNIO	$ 365.566.469,00	8,84%	8,84%	$ 839.103.101,23	20,29%	11,45%
TOTAL	**$ 1.186.317.322,00**		**28,68%**	**$ 1.240.550.659,35**	**30%**	**1,32%**

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

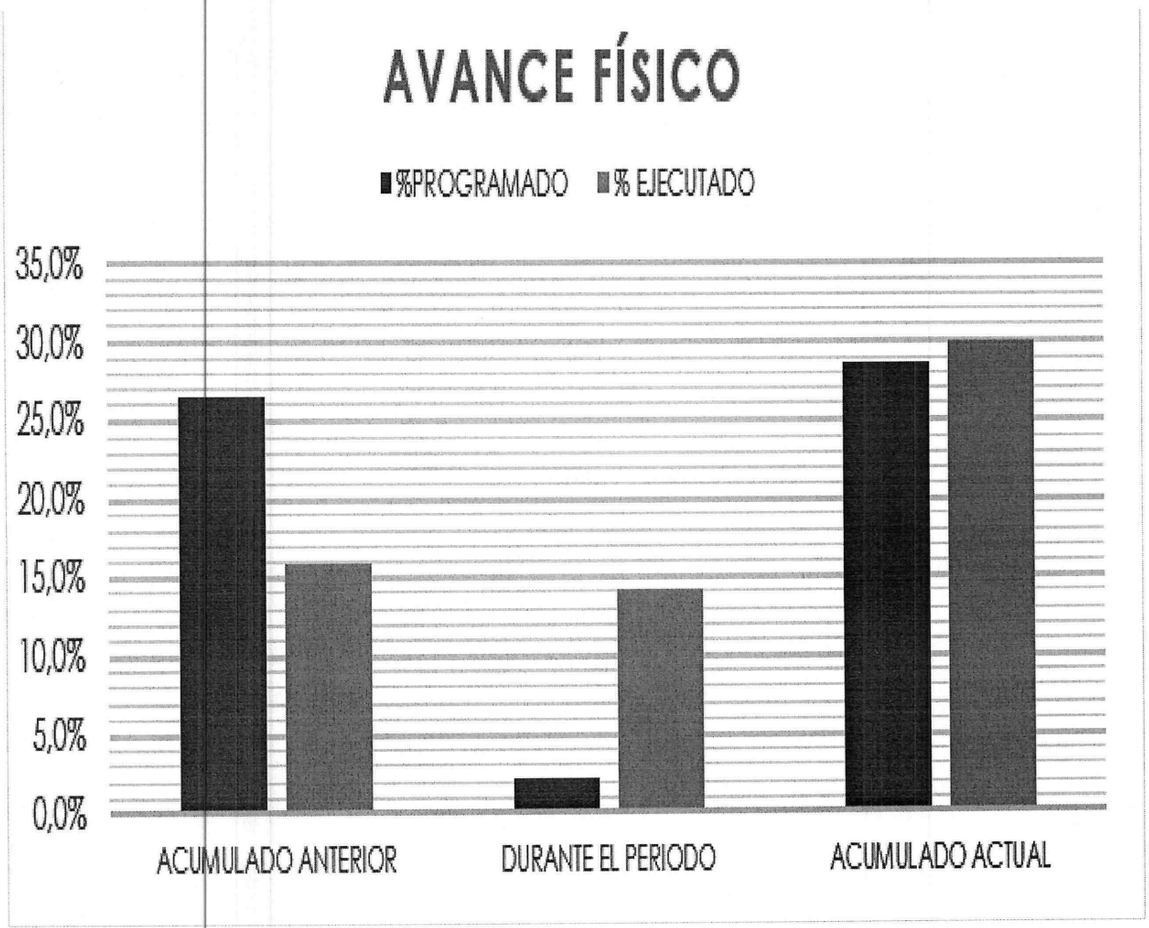

En el presente periodo, el proyecto avanzo un 20.29% que equivale a $839.103.101,23 De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas

Teniendo en cuenta el avance presentado durante este periodo, en el cual se desarrolla la etapa de ejecución de obra, él proyecto cuenta con un avance acumulado del **30%** que financieramente equivale a **$1.240.550.659.35** se presenta un avance superior en el cronograma del 1.32%.

SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa planilla de pago de seguridad social del consorcio y trabajadores independientes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades realizadas entre el 17 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2025, en el desarrollo del contrato No. SI-LP-002-2024.




Fotografía 3. figuracion de acero de estructuras




Fotografía 4. Figuracion acero cimentaciones


Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

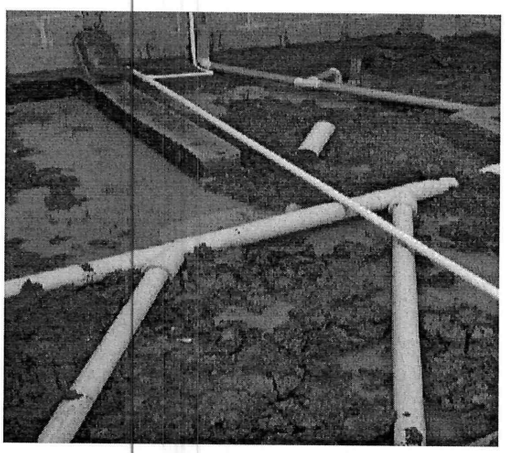


Fotografía 5 Instalacion de tuberias

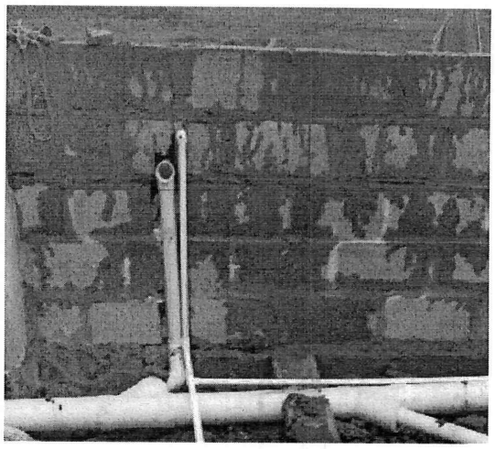


Fotografía 6. Instalacion de tuberias

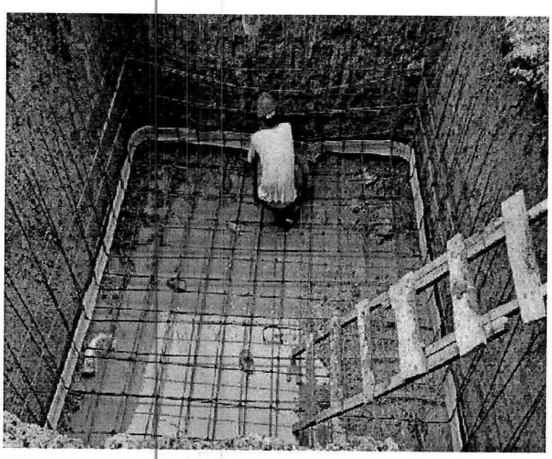


Fotografía 7. Instalacion de cinta pvc

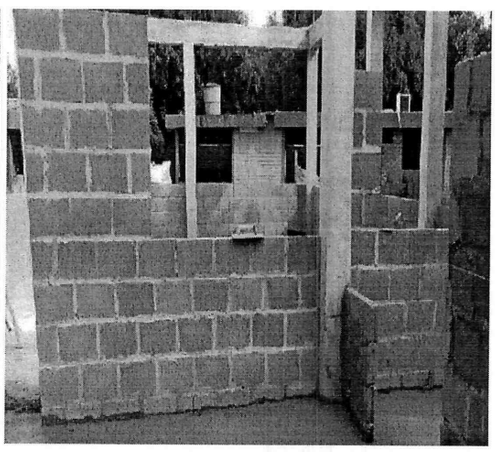


Fotografía 8. Levante de muros

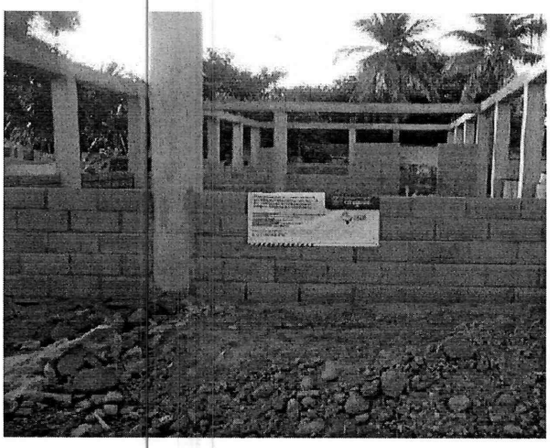


Fotografía 9. Levante de muros

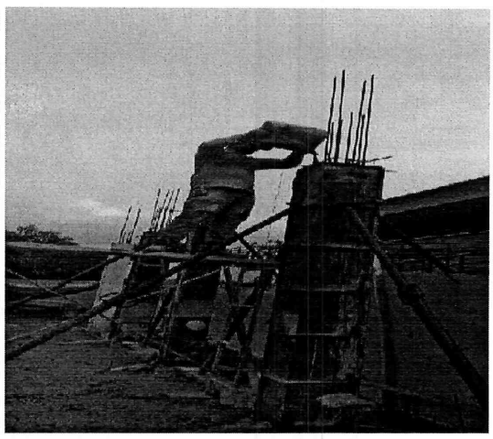

Fotografía 10. Concreto de columnas

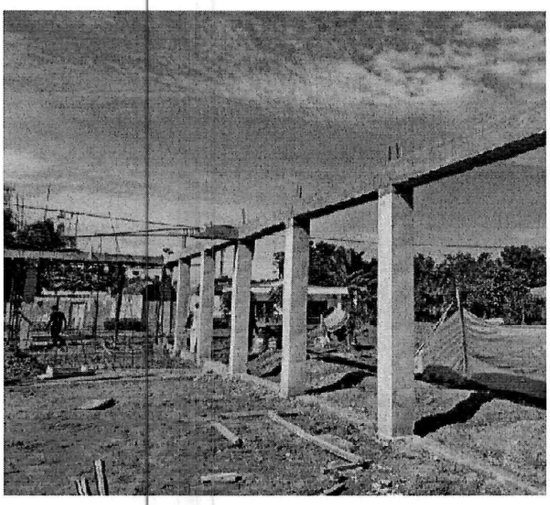


Fotografía 11. Concreto de columnas

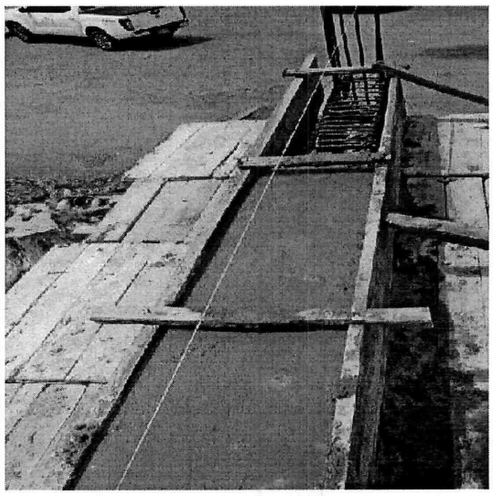


Fotografía 12. Concreto de vigas


Dirección: Cra9 #6-36 Of202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

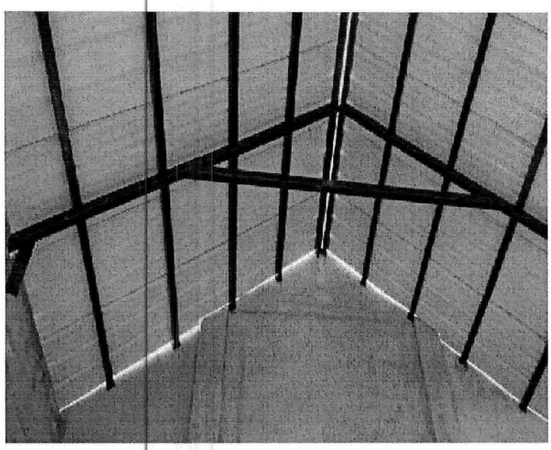

Fotografía 13. Instalcion de cubierta

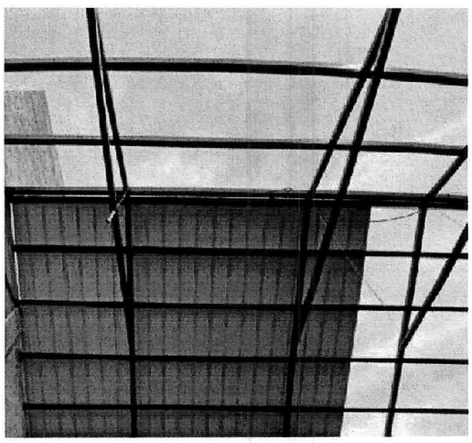

Fotografía 14.Instalacion de perfileria

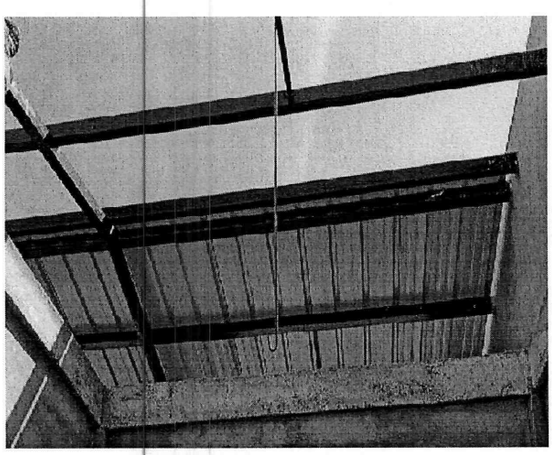


Fotografía 15.Instalacion de perfileria




Fotografía16.Instalcion eléctricas


Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

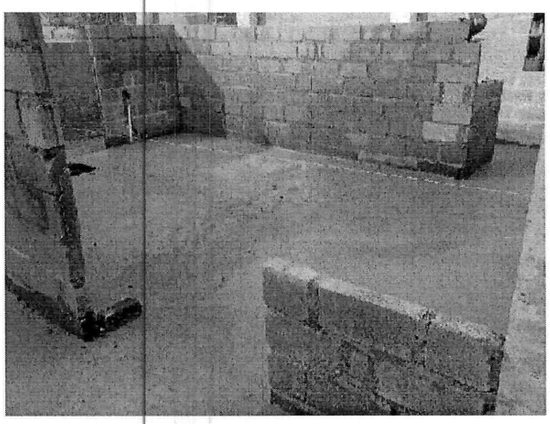

Fotografía 17. Plantilla en concreto

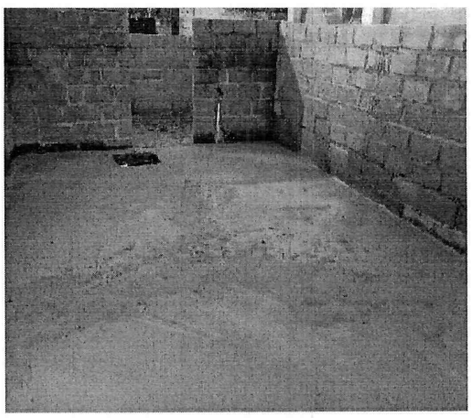

Fotografía18.plantilla en concreto

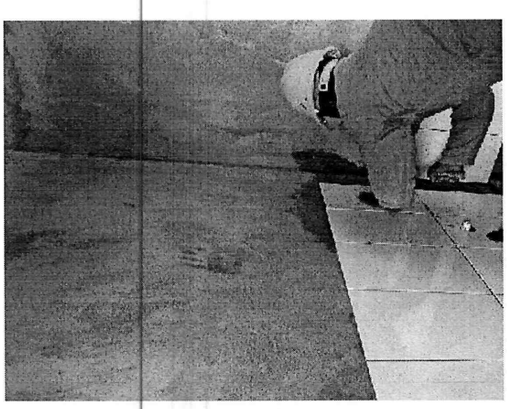


Fotografía 19. Instalación de cerámica



Fotografía 20. Instalacion de cerámica

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

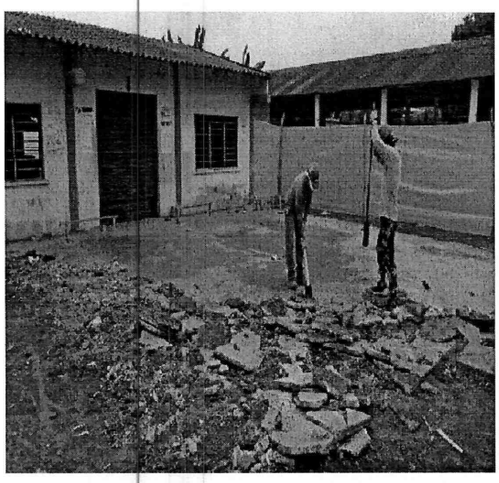

Fotografía 21. Demoliciones



Fotografía 22. Demoliciones

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

CONCLUSIONES

Dentro del periodo comprendido del 17 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2025; correspondiente al presente informe podemos mencionar las siguientes conclusiones más relevantes:

- El contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, ha ejecutado actividades de instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias, instalación de cubiertas, instalación de perfilería metalica,plantilla en concreto, instalación de cerámica excavaciones, concretos de cimentación entre otras; alcanzando un porcentaje de avance acumulado de 30% para este periodo, que comparado con el avance programado acumulado del 28.68%, nos indica que, durante el periodo de ejecución del contrato, el proyecto presentó un avance mayor al programado del 1,33%

- Durante el presente periodo, el avance acumulado del proyecto es 30.01%, que comparado con el 28.68% programado acumulado; indica un avance con respecto a lo programado de 1.33%, se espera continuar aumentando este porcentaje de ejecución para el siguiente periodo.

- Las obras se vienen ejecutando de conformidad con los diseños suministrados por la entidad contratante; dando cumplimiento a las especificaciones técnicas de construcción y de acuerdo a los plazos establecidos.

- Se emplean los equipos necesarios y materiales de calidad para la ejecución de las obras.

- Con el presente informe se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista consorcio infraestructura educativa 002, en lo correspondiente a la parte técnica, financiera y jurídica.

- Se incluye como anexo al presente informe, el reporte de las actividades y seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo.

María Q.

R.L Maria Isabel Quintero Gonzalez
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 Teléfono:3217764749 E-Mail: consorcioinfraeducativo022@gmail.com

ANEXO 4. ACTAS SUSCRITAS

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No.:	SI-LP-002-2024 de fecha 12 de febrero de 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 NIT: 901915670-0 R.L: María Isabel Quintero Gonzalez C.C No.: 1.010.007.099
INTERVENTORIA:	ANTICA S.A.S BIC NIT: 901823241-9 R.L: Juan Pablo Banquez Gonzalez C.C No.: 1.067.958.787
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($4.135.056.075,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025

En Montería, el día Diecisiete (17) de marzo de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: el señor **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.067.958.787 de Montería, representante legal de **ANTICA S.A.S BIC** con Nit: 901823241-9, en su calidad de interventor del contrato, y la señora **MARÍA ISABEL QUINTERO GONZALEZ**, identificada con C.C No. 1.010.007.099 de Montería en calidad de represéntate legal de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** con Nit. 901915670-0 en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-002-2024** y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.

ANTICA S.A.S BIC
Nit: 901823241-9
R.L: Juan Pablo Banquez González
C.C. No. 1.067.958.787
INTERVENTOR

Maria Q.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
NIT: 901915670-0
R.L: María Isabel Quintero González
C.C No.: 1.010.007.099
CONTRATISTA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Abdul Zarur Lakah	Nombre: Oscar Pineda Mendoza	Nombre: GABRIELA RUIZ CARRASCAL
Cargo: Contratista SID	Cargo: Contratista SID	Cargo: Auxiliar Admin SID
Firma:	Firma:	Firma:

ANEXO 5. PLANILLAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9487681997	9487681997	E	2025/06/18	2025/06/25	BANCO DE BOGOTA	7	$8,411,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067940218	AGAMEZ ANDY	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	1066735527	ALEAN NEVER	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC24	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
3	CC	1233340397	ALVAREZ JOSE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	1064976924	ARGUELLO CESAR	231001	23	$1,091,350	$174,700	CCFC55	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
5	CC	78025167	AYALA JOSE	25-14	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
6	CC	1020789957	BEJARANO KAMAL	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
7	CC	78748099	CASTRO RICARDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
8	CC	1073813229	COGOLLO CARMELO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1067942893	CORRALES SHARON	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	1003457959	FRANCO OSCAR	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
11	CC	1073825958	MENDOZA SAIBIS	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
12	CC	8374898	MERCADO MANUEL	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
13	CC	10782561	ORTEGA UBERTO	230201	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
14	CC	7382988	PLAZA OLIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	19191822	RAMIREZ HECTOR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	1068656210	RUIZ JOSE	230201	23	$1,091,350	$174,700	CCFC55	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
17	CC	1063719364	RUIZ YEISON	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC24	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
18	CC	1102823938	SERPA ISAIA	230201	17	$806,650	$129,100	ESSC24	17	$806,650	$32,300	CCF16	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
19	CC	1073155444	TORRES HERIBERTO	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	6888826	VERGARA HERNAN		0	$0	$0	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
21	CC	72237694	VERGARA JHOJAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(21)**					**$26,505,500**	**$4,241,900**			**$27,596,850**	**$1,104,700**			**$27,596,850**	**$1,104,700**			**$27,596,850**	**$1,921,400**		**$0**	**$0**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

679

2025/06/26 09:45 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,241,900	$19,400	$0	$4,261,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$630,300	$2,900	$0	$633,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$402,500	$1,900	$0	$404,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,114,400	$9,600	$0	$2,124,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,094,700	$5,000	$0	$1,099,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,921,400	$8,700	$0	$1,930,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,921,400	$8,700	$0	$1,930,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,104,700	$5,000	$0	$1,109,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	21	$1,104,700	$5,000	$0	$1,109,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	$1,104,700	$5,300	$0	$1,110,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$87,400	$400	$0	$87,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$119,700	$600	$0	$120,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$300	$0	$57,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$305,900	$1,400	$0	$307,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$123,700	$600	$0	$124,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$600	$0	$114,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$217,000	$1,000	$0	$218,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$400	$0	$80,400
TOTAL				21	$8,372,700	$38,400	$0	$8,411,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/06/26 09:45 AM
