ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
		VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No. Xx	INFORME DE VISITA (consecutivo)	No. Xx

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)

RESOLUCIÓN N°. 449 del 29/05/2025

CONSECUTIVO N°. 5116

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	30 de mayo de 2025	MUNICIPIO:	NOCAIMA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	vía desde el acceso en la Concesión Sabana de Occidente al casco urbano municipio de Nocaima	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	INICIO 5° 2´38,74¨N 74°22´28,37¨ O FIN 5°4´8,72¨N 74°22´32,66¨O

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	INTERVENTORIA ICCU-234-2025 OBRA ICCU-276-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	
		FECHA INCIO	22/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	CONTRATO DE OBRA - CONSORCIO ICCU G3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA26		
NIT	NIT OBRA: 901.917.583-7 NIT INTERVENTORÍA: 901.920.055-0		
OBJETO DEL CONVENIO	Rehabilitación y mantenimiento de la vía desde el acceso en la Concesión Sabana de Occidente al casco urbano municipio de Nocaima		
PLAZO EJECUCIÓN	8 MESES PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6 MESES PARA EL CONTRATO DE OBRA		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	NA		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	NA		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	NA		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial las prorrogas y suspensiones)	CONTRATO DE OBRA - 21/10/2025 CONTRATO DE INTERVENTORÍA - 21/12/2025		
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	OBRA: $6,860,453,716 INTERVENTORÍA: $749.880.880 Valor total del Proyecto: $ 7, 610,334,596
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	22 de abril de 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	ICCU-276-2025	Fecha	22/04/2025	Valor	$6,860,453,716	Porcentaje de ejecución físico	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	ICCU-234-2025	Fecha	22/04/2025	Valor	$ 749.880.880		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	39-44-101171085 ANEXO 2	22/04/2025	24/04/2026	$ 1.372.090.743,20
Pago de salarios	39-44-101171085 ANEXO 2	22/04/2025	25/10/2028	$ 343.022.685,80
Estabilidad de la obra	39-44-101171085 ANEXO 2	22/04/2025	22/04/2030	$ 2.058.136.114,80

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	45-44-101164322 ANEXO 2	22/04/2025	22/04/2026	$ 74.988.088
Pago de salarios	45-44-101164322 ANEXO 2	22/04/2025	23/12/2028	$ 37.494.044
Calidad del servicio	45-44-101164322 ANEXO 2	23/12/2025	23/12/2027	$ 224.964.264

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Se verifico las coordenadas iniciales del proyecto "Rehabilitación y mantenimiento de la vía desde el acceso en la Concesión Sabana de Occidente al casco urbano municipio de Nocaima".

Dentro del recorrido se identificó 4 sectores críticos para la intervención con muro de contención, sin embargo se dará prioridad con este proyecto para la ejecución del tramo 2 con un muro en concreto de 30metros de acuerdo al diseño del Ingeniero Carlos Ramiro Vallecilla.
Se realizó comité técnico en obra, identificando las necesidades del proyecto.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	$ 7, 610,334,596			
N° de Pagos Realizados	0			
Pago No. 1	*0*			
Pago No. 2				
Pago No. 3				
Valor Ejecutado				
Saldo Pendiente por Cancelar				
Porcentaje de ejecución				
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales (En las visitas el supervisor podrá solicitar al municipio la verificación de afiliacion y pago de aportes de seguridad social y parafiscales, aun cuando el responsable sea el municipio como ejecutor)	SI		NO	X


8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	OK	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	SI	NO	


9. REGISTRO FOTOGRAFICO







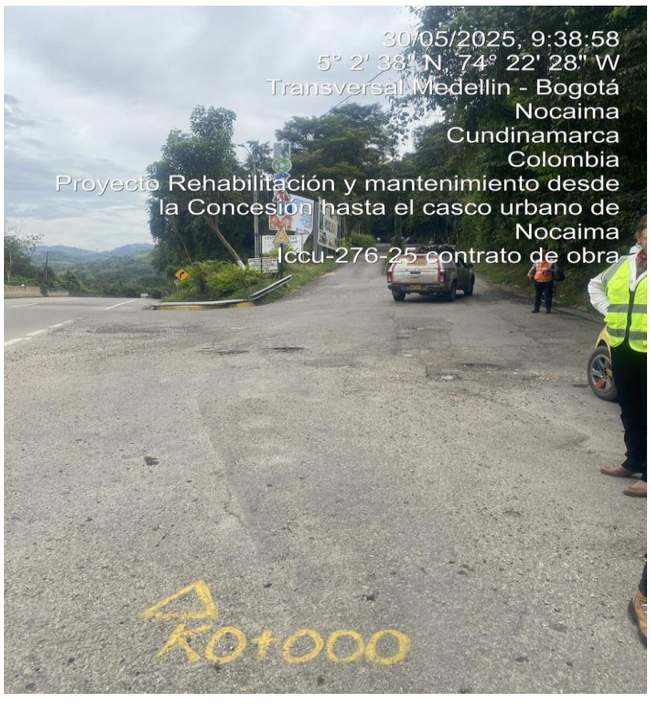

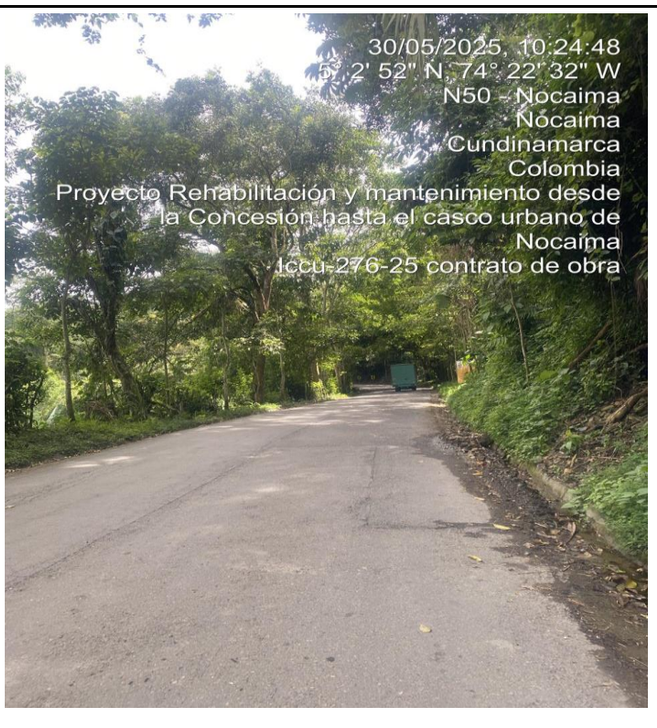

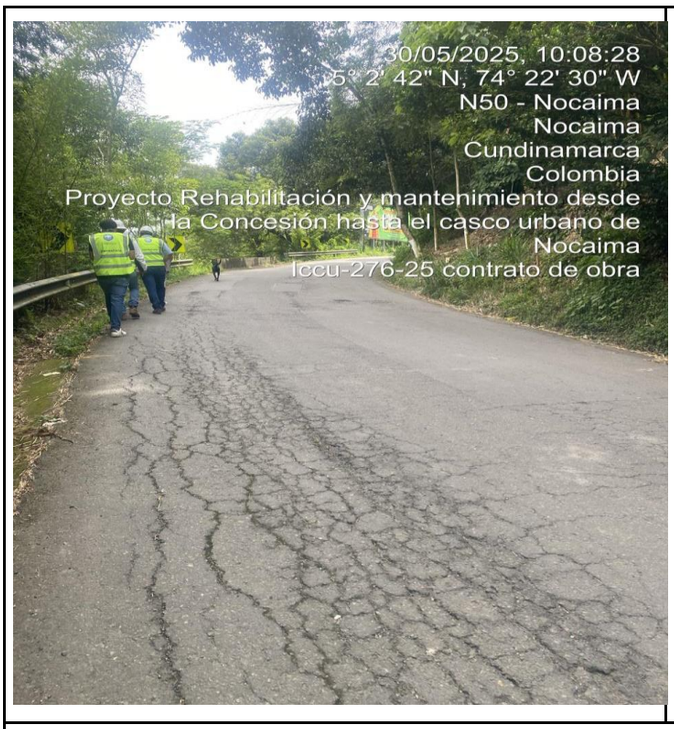

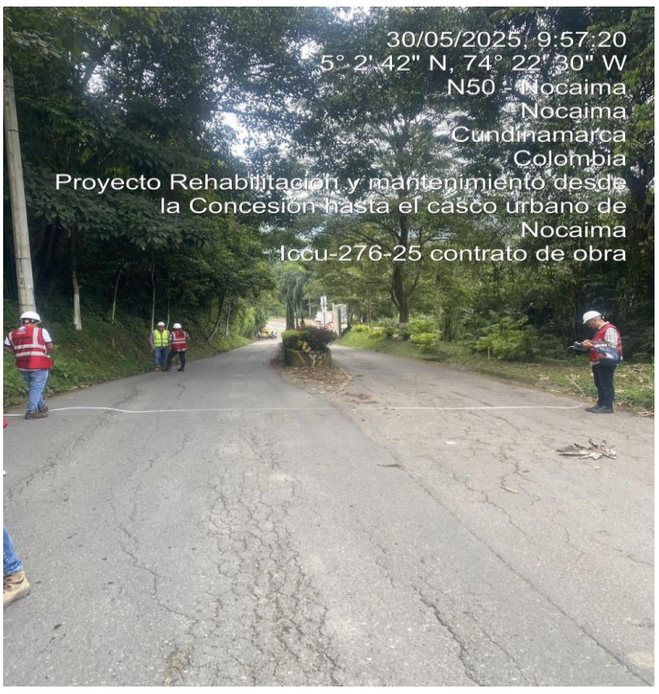

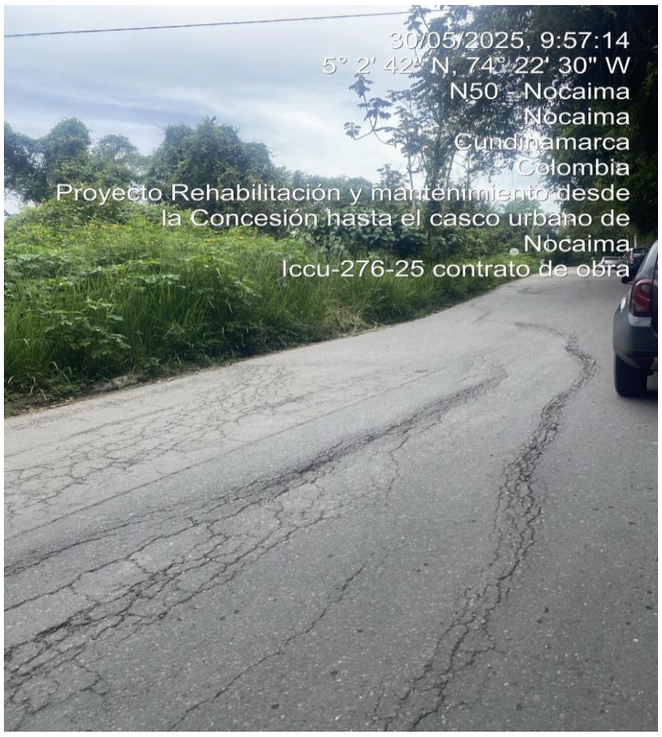



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

se solicita a la Interventoria del contrato y al contratista de obra estar acorde con la programación del proyecto, presentando

11. ANEXOS

ACTA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN	DIRECCIÓN DE CAMINOS Subdirección de Infraestructura	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	2/06/2025	
