REPORTE

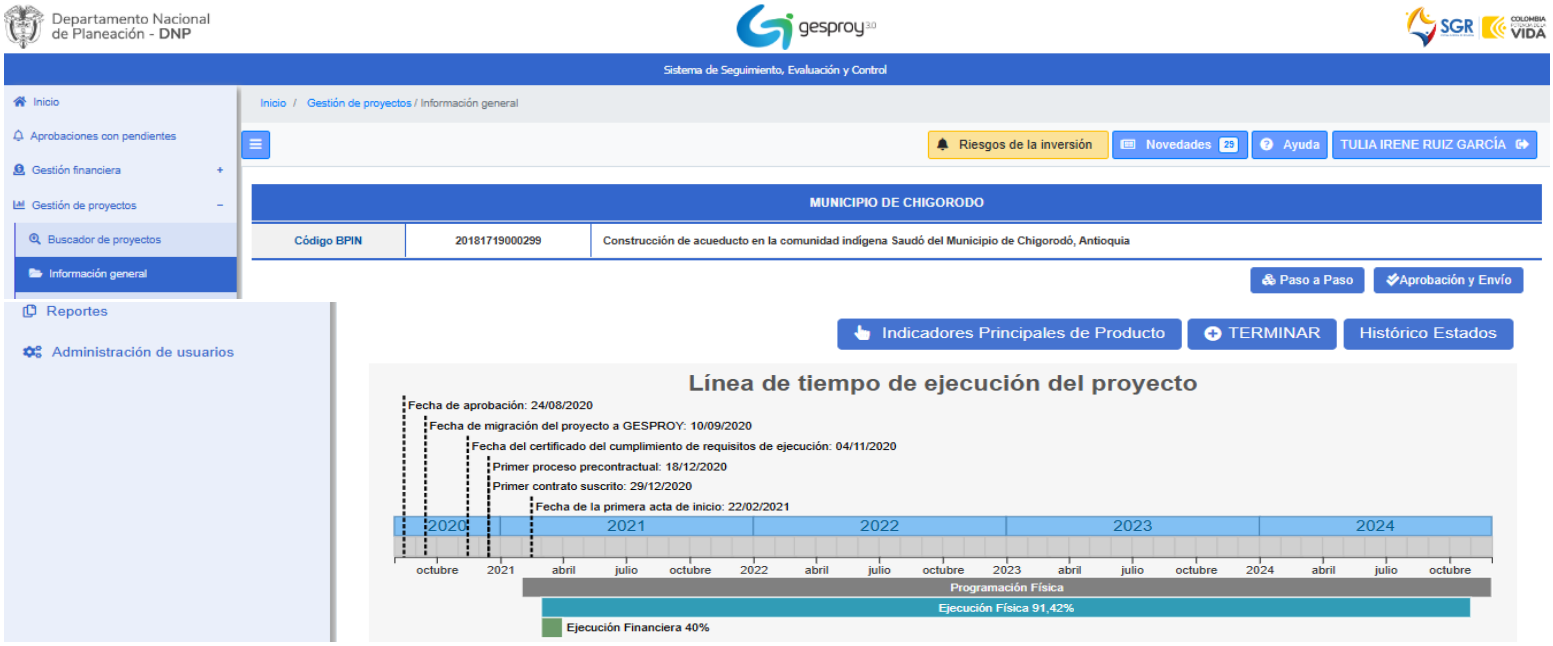
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS “SGR”

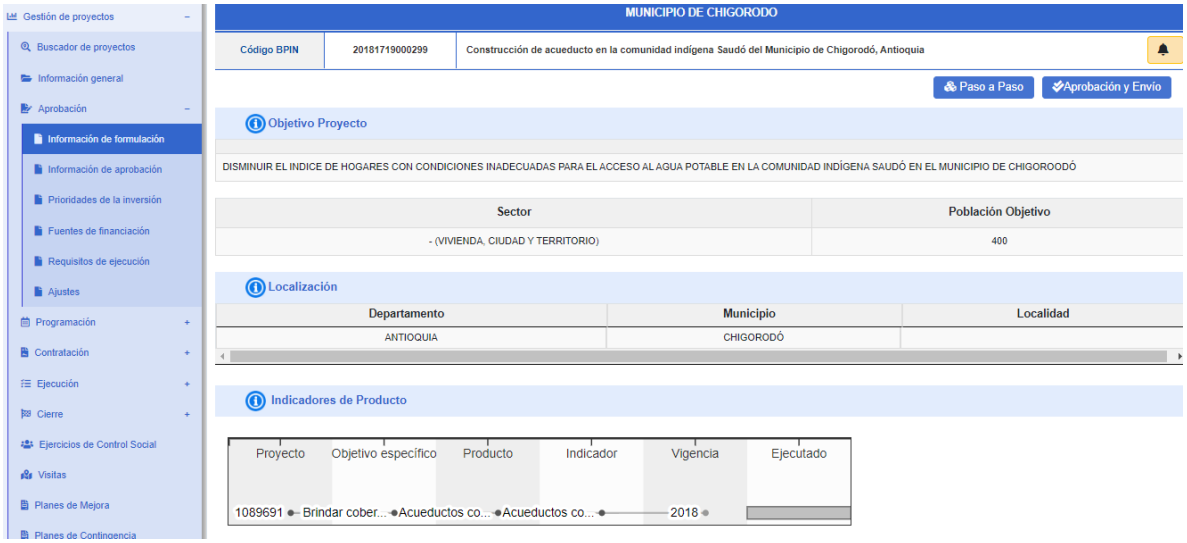
SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
“SMSCE”

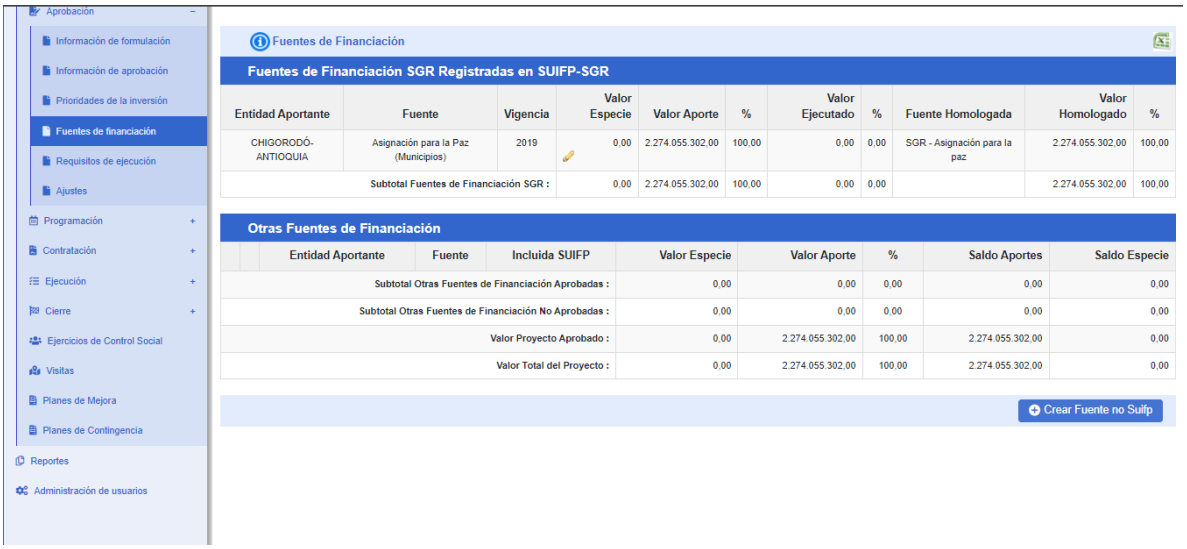
GESPROY - SGR -

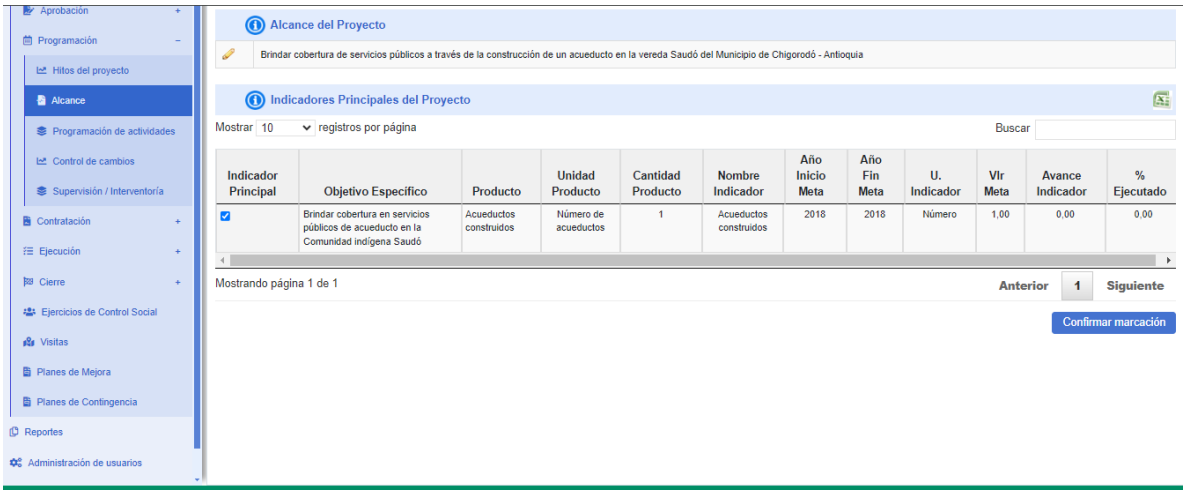
En el siguiente informe se evidencia un reporte detallado del proyecto en la linea detiempo del proyecto

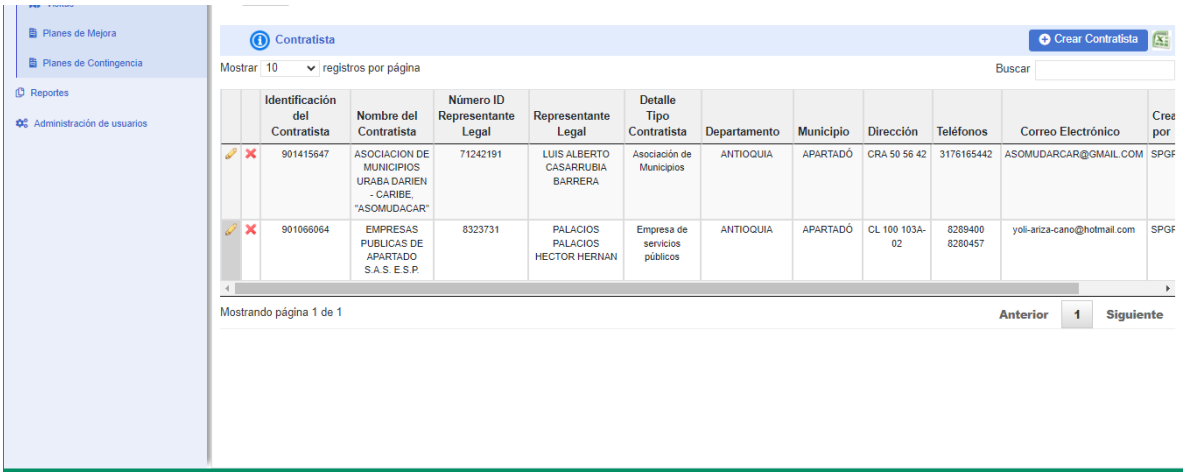
Seguimiento y monitoreo desde la plataforma del SGR – GESPROY al proyecto “Construcción de acueducto en la comunidad indígena Saudó del Municipio de Chigorodó, Antioquia”

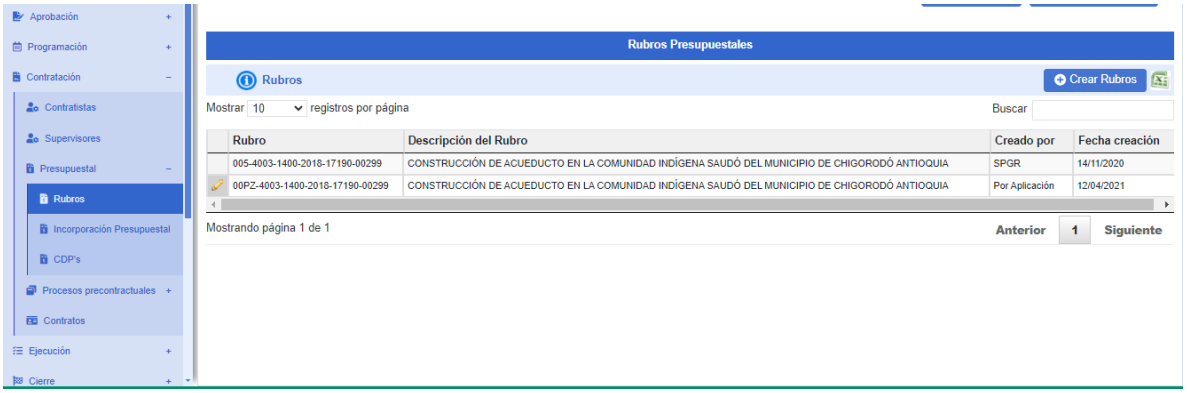


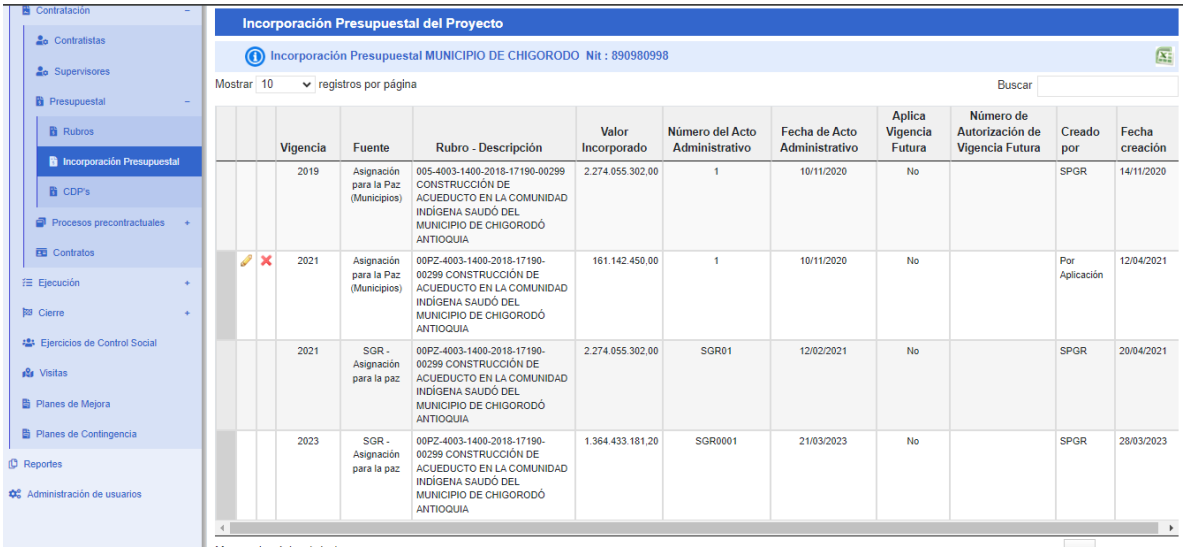

Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Información de formulación
Información de aprobación
Prioridades de la inversión
Fuentes de financiación
Requisitos de ejecución
Ajustes
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
MUNICIPIO DE CHIGORODO
Código BPIN
20181719000299
Construcción de acueducto en la comunidad indígena Saudó del Municipio de Chigorodó, Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Objetivo Proyecto
DISMINUIR EL INDICE DE HOGARES CON CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ EN EL MUNICIPIO DE CHIGOROODÓ
Sector
Población Objetivo
- (VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO)
400
Localización
Departamento
Municipio
Localidad
ANTIOQUIA
CHIGORODÓ
Indicadores de Producto
Proyecto
Objetivo específico
Producto
Indicador
Vigencia
Ejecutado
1089691
Brindar cober...
Acueductos co...
Acueductos co...
2018

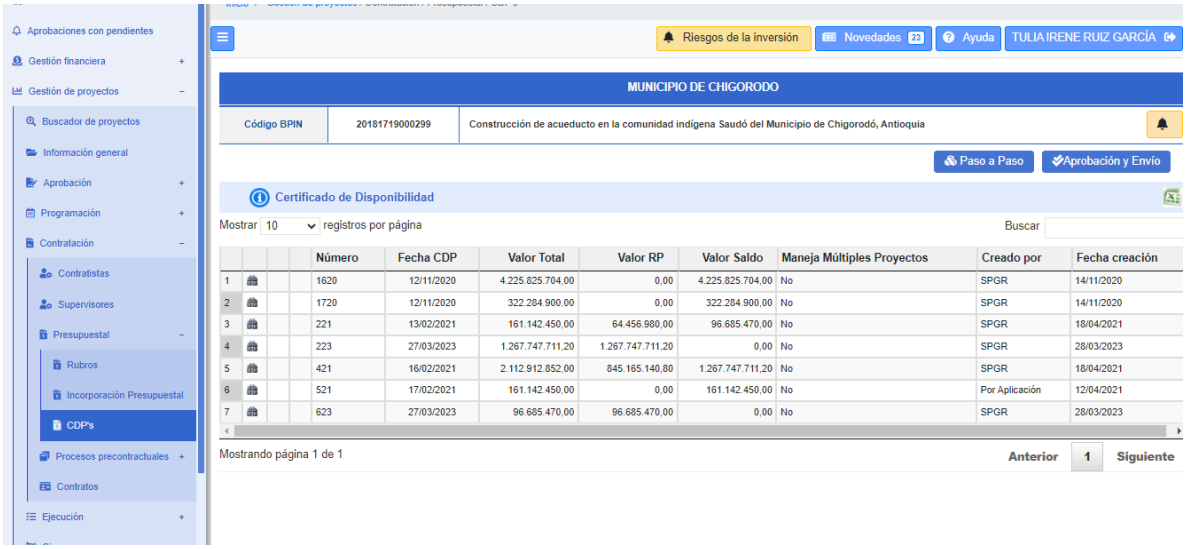

Aprobación
Información de formulación
Información de aprobación
Prioridades de la inversión
Fuentes de financiación
Requisitos de ejecución
Ajustes
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Fuentes de Financiación
Fuentes de Financiación SGR Registradas en SUIFP-SGR
Entidad Aportante
Fuente
Vigencia
Valor Especie
Valor Aporte
%
Valor Ejecutado
%
Fuente Homologada
Valor Homologado
%
CHIGORODÓ-ANTIOQUIA
Asignación para la Paz (Municipios)
2019
0,00
2.274.055.302,00
100,00
0,00
0,00
SGR - Asignación para la paz
2.274.055.302,00
100,00
Subtotal Fuentes de Financiación SGR :
0,00
2.274.055.302,00
100,00
0,00
0,00
2.274.055.302,00
100,00
Otras Fuentes de Financiación
Entidad Aportante
Fuente
Incluida SUIFP
Valor Especie
Valor Aporte
%
Saldo Aportes
Saldo Especie
Subtotal Otras Fuentes de Financiación Aprobadas :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subtotal Otras Fuentes de Financiación No Aprobadas :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Proyecto Aprobado :
0,00
2.274.055.302,00
100,00
2.274.055.302,00
0,00
Valor Total del Proyecto :
0,00
2.274.055.302,00
100,00
2.274.055.302,00
0,00
Crear Fuente no Suifp

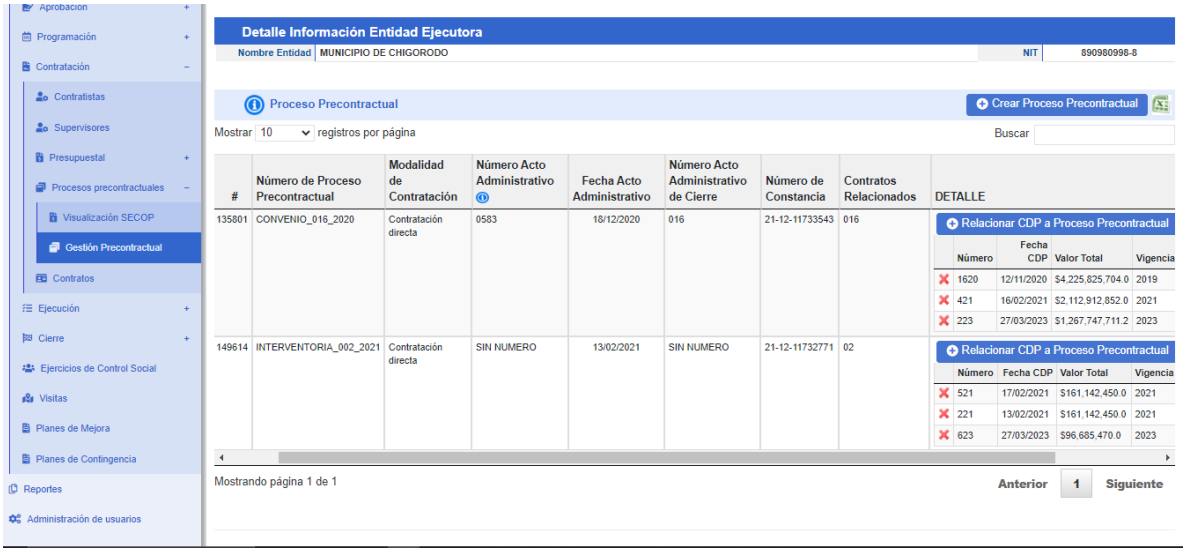

Aprobación
Programación
Hitos del proyecto
Alcance
Programación de actividades
Control de cambios
Supervisión / Interventoría
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Alcance del Proyecto
Brindar cobertura de servicios públicos a través de la construcción de un acueducto en la vereda Saudó del Municipio de Chigorodó - Antioquia
Indicadores Principales del Proyecto
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Indicador Principal
Objetivo Específico
Producto
Unidad Producto
Cantidad Producto
Nombre Indicador
Año Inicio Meta
Año Fin Meta
U. Indicador
Vlr Meta
Avance Indicador
% Ejecutado
Brindar cobertura en servicios públicos de acueducto en la Comunidad indígena Saudó
Acueductos construidos
Número de acueductos
1
Acueductos construidos
2018
2018
Número
1,00
0,00
0,00
Mostrando página 1 de 1
Anterior
1
Siguiente
Confirmar marcación

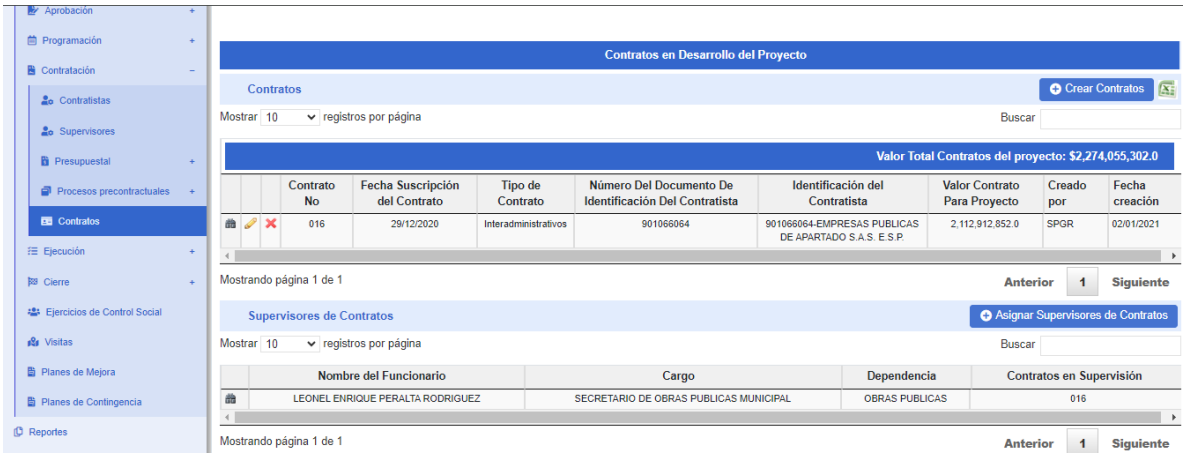

Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Contratista
Crear Contratista
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Identificación del Contratista
Nombre del Contratista
Número ID Representante Legal
Representante Legal
Detalle Tipo Contratista
Departamento
Municipio
Dirección
Teléfonos
Correo Electrónico
Crea por
901415647
ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE, "ASOMUDACAR"
71242191
LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA
Asociación de Municipios
ANTIOQUIA
APARTADÓ
CRA 50 56 42
3176165442
ASOMUDARCAR@GMAIL.COM
SPGR
901066064
EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P.
8323731
PALACIOS PALACIOS HECTOR HERNAN
Empresa de servicios públicos
ANTIOQUIA
APARTADÓ
CL 100 103A-02
8289400 8280457
yoli-ariza-cano@hotmail.com
SPGR
Mostrando página 1 de 1
Anterior
1
Siguiente


Aprobación
Programación
Contratación
Contratistas
Supervisores
Presupuestal
Rubros
Incorporación Presupuestal
CDP's
Procesos precontractuales
Contratos
Ejecución
Cierre
Rubros Presupuestales
Rubros
Crear Rubros
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Rubro
Descripción del Rubro
Creado por
Fecha creación
005-4003-1400-2018-17190-00299
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA
SPGR
14/11/2020
00PZ-4003-1400-2018-17190-00299
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA
Por Aplicación
12/04/2021
Mostrando página 1 de 1
Anterior
1
Siguiente


Contratación
Contratistas
Supervisores
Presupuestal
Rubros
Incorporación Presupuestal
CDP's
Procesos precontractuales
Contratos
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Incorporación Presupuestal del Proyecto
Incorporación Presupuestal MUNICIPIO DE CHIGORODO Nit : 890980998
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Vigencia
Fuente
Rubro - Descripción
Valor Incorporado
Número del Acto Administrativo
Fecha de Acto Administrativo
Aplica Vigencia Futura
Número de Autorización de Vigencia Futura
Creado por
Fecha creación
2019
Asignación para la Paz (Municipios)
005-4003-1400-2018-17190-00299 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA
2.274.055.302,00
1
10/11/2020
No
SPGR
14/11/2020
2021
Asignación para la Paz (Municipios)
00PZ-4003-1400-2018-17190-00299 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA
161.142.450,00
1
10/11/2020
No
Por Aplicación
12/04/2021
2021
SGR - Asignación para la paz
00PZ-4003-1400-2018-17190-00299 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA
2.274.055.302,00
SGR01
12/02/2021
No
SPGR
20/04/2021
2023
SGR - Asignación para la paz
00PZ-4003-1400-2018-17190-00299 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA
1.364.433.181,20
SGR0001
21/03/2023
No
SPGR
28/03/2023


Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Contratistas
Supervisores
Presupuestal
Rubros
Incorporación Presupuestal
CDP's
Procesos precontractuales
Contratos
Ejecución
Riesgos de la inversión
Novedades 23
Ayuda
TULIA IRENE RUIZ GARCÍA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
Código BPIN
20181719000299
Construcción de acueducto en la comunidad indígena Saudó del Municipio de Chigorodó, Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Certificado de Disponibilidad
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Número
Fecha CDP
Valor Total
Valor RP
Valor Saldo
Maneja Múltiples Proyectos
Creado por
Fecha creación
1 1620 12/11/2020 4.225.825.704,00 0,00 4.225.825.704,00 No SPGR 14/11/2020
2 1720 12/11/2020 322.284.900,00 0,00 322.284.900,00 No SPGR 14/11/2020
3 221 13/02/2021 161.142.450,00 64.456.980,00 96.685.470,00 No SPGR 18/04/2021
4 223 27/03/2023 1.267.747.711,20 1.267.747.711,20 0,00 No SPGR 28/03/2023
5 421 16/02/2021 2.112.912.852,00 845.165.140,80 1.267.747.711,20 No SPGR 18/04/2021
6 521 17/02/2021 161.142.450,00 0,00 161.142.450,00 No Por Aplicación 12/04/2021
7 623 27/03/2023 96.685.470,00 96.685.470,00 0,00 No SPGR 28/03/2023
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente


Aprobación
Programación
Contratación
Contratistas
Supervisores
Presupuestal
Procesos precontractuales
Visualización SECOP
Gestión Precontractual
Contratos
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT 890980998-8
Proceso Precontractual
Crear Proceso Precontractual
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Número de Proceso Precontractual Modalidad de Contratación Número Acto Administrativo Fecha Acto Administrativo Número Acto Administrativo de Cierre Número de Constancia Contratos Relacionados DETALLE
135801 CONVENIO_016_2020 Contratación directa 0583 18/12/2020 016 21-12-11733543 016
Relacionar CDP a Proceso Precontractual
Número Fecha CDP Valor Total Vigencia
1620 12/11/2020 $4,225,825,704.0 2019
421 16/02/2021 $2,112,912,852.0 2021
223 27/03/2023 $1,267,747,711.2 2023
149614 INTERVENTORIA_002_2021 Contratación directa SIN NUMERO 13/02/2021 SIN NUMERO 21-12-11732771 02
Relacionar CDP a Proceso Precontractual
Número Fecha CDP Valor Total Vigencia
521 17/02/2021 $161,142,450.0 2021
221 13/02/2021 $161,142,450.0 2021
623 27/03/2023 $96,685,470.0 2023
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente


Aprobación
Programación
Contratación
Contratistas
Supervisores
Presupuestal
Procesos precontractuales
Contratos
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Contratos en Desarrollo del Proyecto
Contratos
Crear Contratos
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Valor Total Contratos del proyecto: $2,274,055,302.0
Contrato No Fecha Suscripción del Contrato Tipo de Contrato Número Del Documento De Identificación Del Contratista Identificación del Contratista Valor Contrato Para Proyecto Creado por Fecha creación
016 29/12/2020 Interadministrativos 901066064 901066064-EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P. 2,112,912,852.0 SPGR 02/01/2021
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Supervisores de Contratos
Asignar Supervisores de Contratos
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Nombre del Funcionario Cargo Dependencia Contratos en Supervisión
LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS 016
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente

Aspectos Financieros del Contrato

Registros Presupuestales

Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página

Buscar

ID	No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
1	121	Si	Si	16/02/2021	845.165.140,80	2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 016/2020. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUNDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.	MUNICIPIO DE CHIGORODO	SPGR	20/04/2021
2	223	Si	Si	27/03/2023	1.267.747.711,20	2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 016/2020. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUNDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.	MUNICIPIO DE CHIGORODO	SPGR	03/04/2023

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Recursos de Regalías

Ingresar Fuente Aporte Especie

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Vigencia	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
CHIGORODÓ-ANTIOQUIA	SGR - Asignación para la paz 20181719000299	2019	SPGR	20/04/2021	2.112.912.852,00	0,00
				Total Recursos Regalías	2.112.912.852,00	0,00

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Incluida SUIFP	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
No se encontró información.						
				Total Otras Fuentes	0,00	0,00
				Total Contrato	2.112.912.852,00	0,00

No se encontró información.

Anterior Siguiente

Actas del Contrato

Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
SIN NUMERO	Acta de inicio	22/02/2021	Fijar como fecha de inicio el Convenio interadministrativo No. 016-2020 el día Veintidós (22) de Febrero de 2021. Por lo tanto, la fecha de terminación será el día	0,00	02/03/2021		

Actas del Contrato

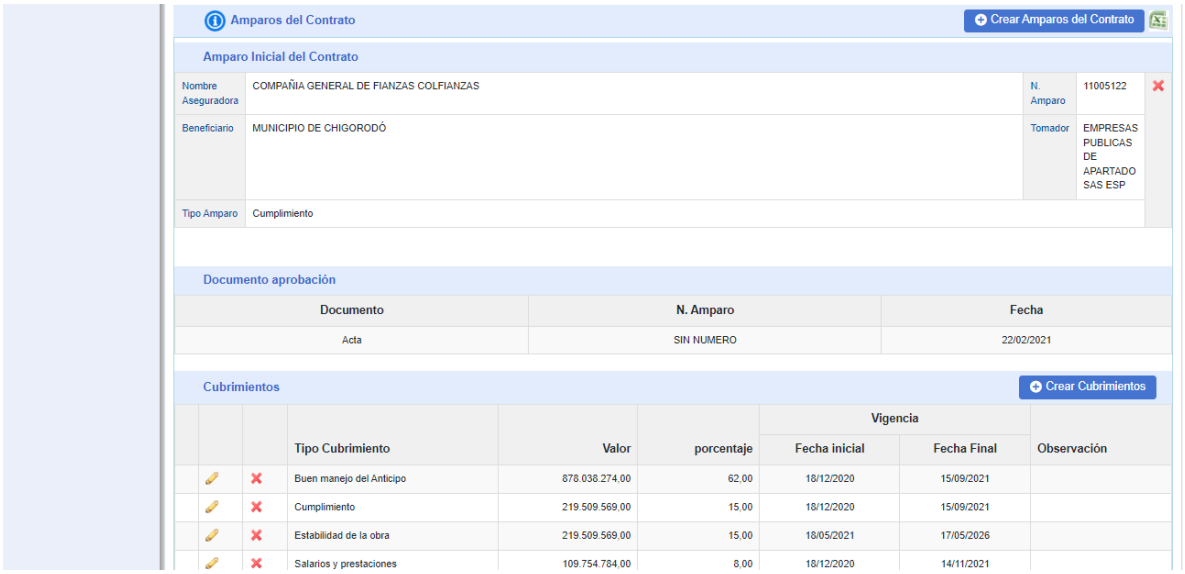
Crear Actas del Contrato

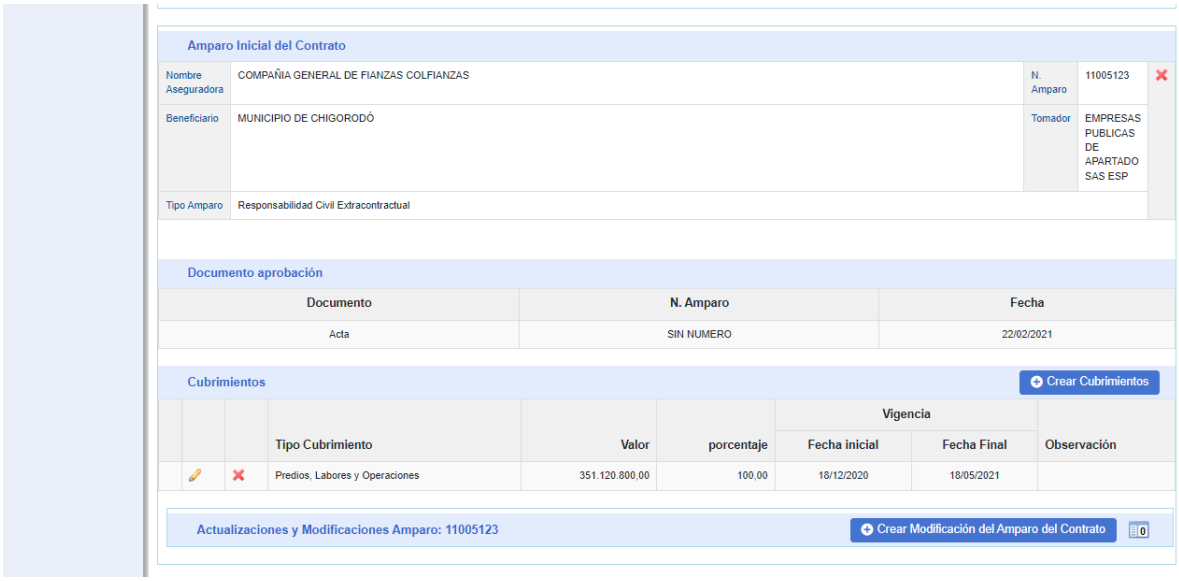
Mostrar 10 registros por página

Buscar

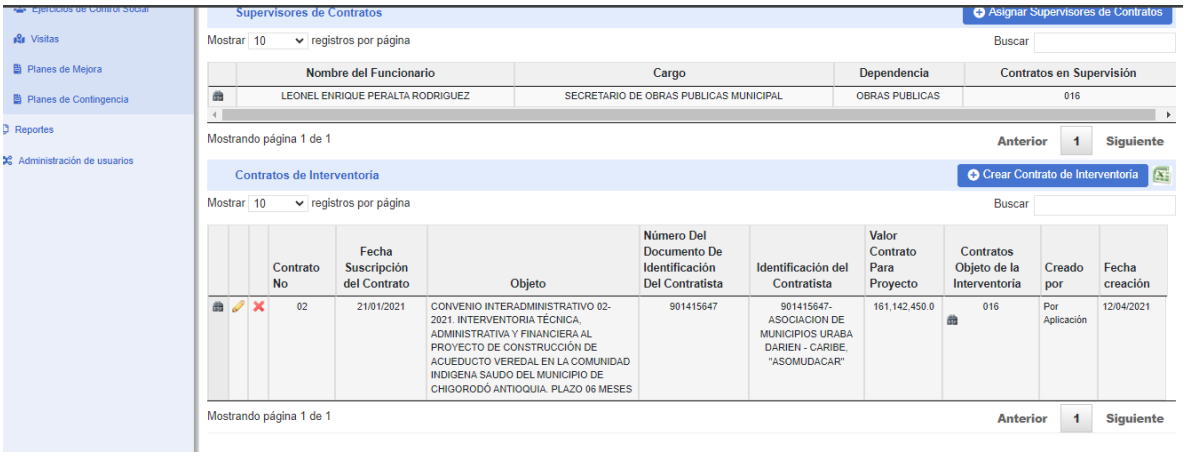
Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
SIN NUMERO	Acta de inicio	22/02/2021	Fijar como fecha de inicio el Convenio interadministrativo No. 016-2020 el día Veintidós (22) de Febrero de 2021. Por lo tanto, la fecha de terminación será el día 22 de Julio de 2021.	0,00	02/03/2021		
001	Acta de suspensión	15/03/2021	Se da suspensión al convenio por motivo de pandemia COVID-19 y escasez de materiales esenciales para la construcción del proyecto tales como acero, tuberías entre otros	0,00	09/09/2021	Covid-19	
001	Acta de reinicio	13/07/2021		0,00	15/05/2023		
002	Acta de suspensión	30/08/2021		0,00	15/05/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
002	Acta de reinicio	15/02/2022		0,00	15/05/2023		
003	Acta de suspensión	04/07/2022		0,00	15/05/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
003	Acta de reinicio	20/10/2022		0,00	15/05/2023		
004	Acta de suspensión	09/01/2023	Condiciones Climaticas Adversas	0,00	15/05/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
004	Acta de reinicio	29/09/2023	se mejoraron las condiciones climáticas, por tal motivo se le da reinicio a la obra.	0,00	25/07/2024		
05	Acta de suspensión	22/12/2023	Por festividades del mes de diciembre el personal se ausenta de las actividades y la mano de obra en el sector rural es escasa	0,00	22/12/2023	Inconvenientes con la comunidad.	

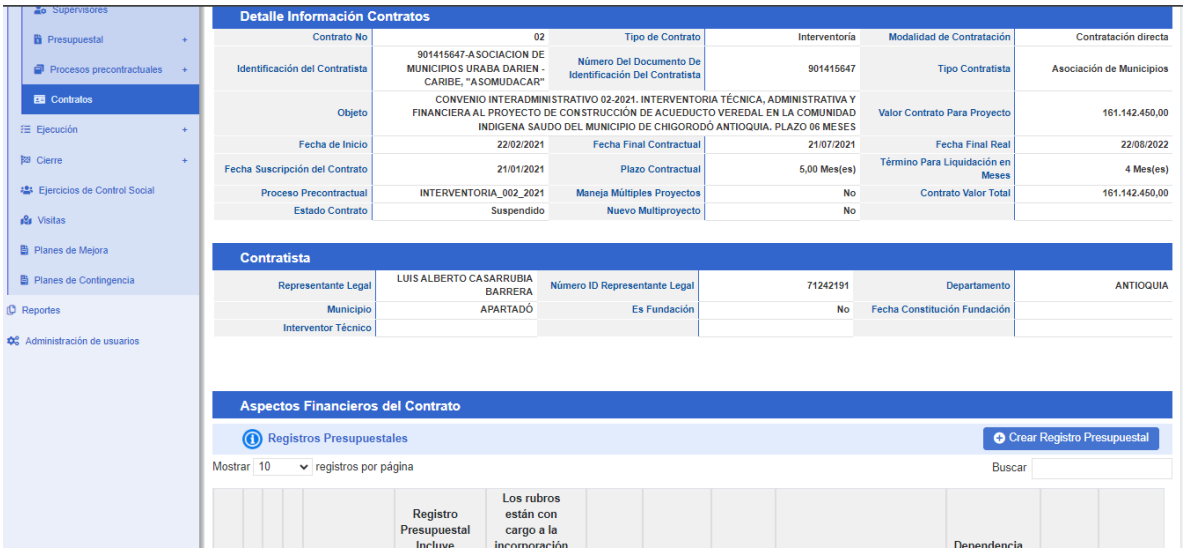
Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
005	Acta de reinicio	08/03/2024	se firma el acta de reinicio del proyecto, teniendo en cuenta que los hechos que motivaron la suspensión ya se encuentran superados	0,00	25/07/2024		
006	Acta de suspensión	09/03/2024	se solicita la suspensión, con la intención de replantear aspectos tecnicos que impiden la continuidad idonea del proyecto, el contratista propone elaborar un nuevo presupuesto ajustado y un nuevo cronograma ajustado.	0,00	25/07/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
006	Acta de reinicio	09/07/2024	Los hechos que motivaron la suspensión ya se encuentran superadas.	0,00	25/07/2024		

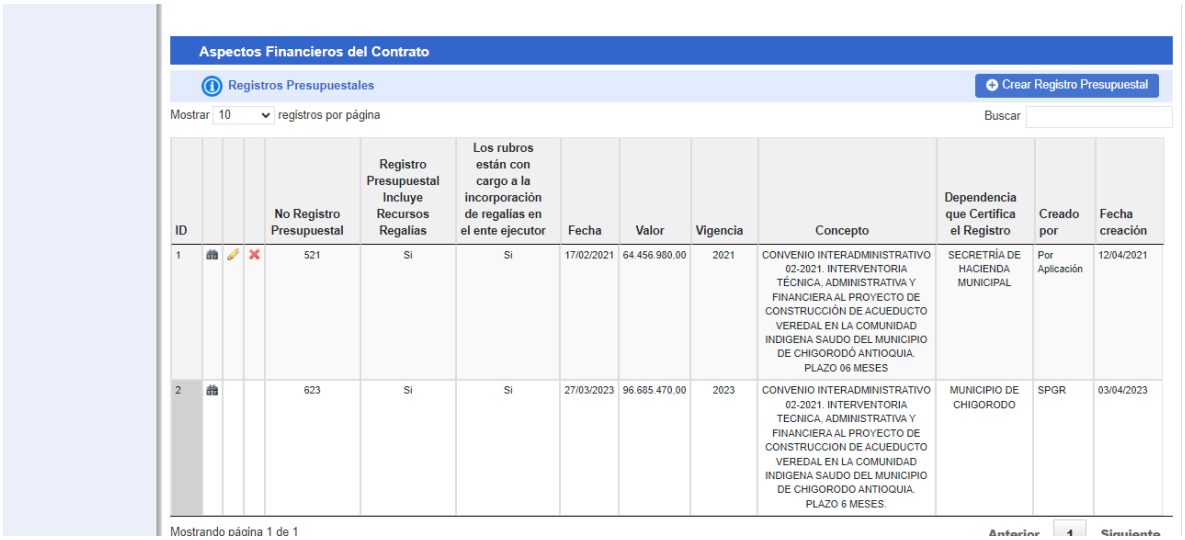


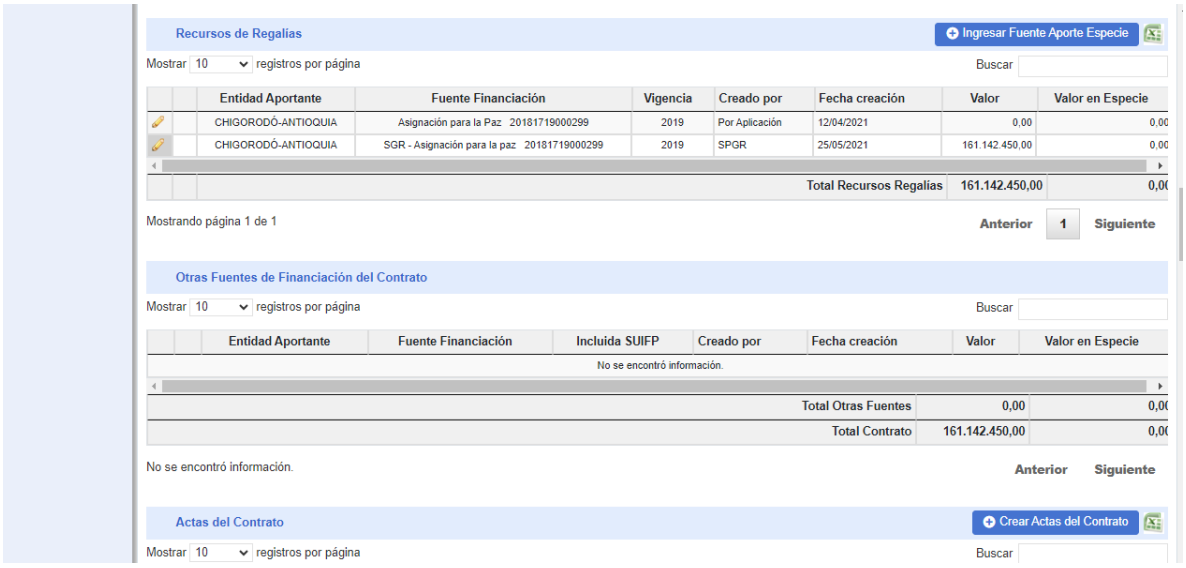


interventoría




Supervisores
Presupuestal
Procesos precontractuales
Contratos
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Detalle Información Contratos
Contrato No 02
Tipo de Contrato Interventoría
Modalidad de Contratación Contratación directa
Identificación del Contratista 901415647-ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE, "ASOMUDACAR"
Número Del Documento De Identificación Del Contratista 901415647
Tipo Contratista Asociación de Municipios
Objeto CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 02-2021. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA. PLAZO 06 MESES
Valor Contrato Para Proyecto 161.142.450,00
Fecha de Inicio 22/02/2021
Fecha Final Contractual 21/07/2021
Fecha Final Real 22/08/2022
Fecha Suscripción del Contrato 21/01/2021
Plazo Contractual 5,00 Mes(es)
Término Para Liquidación en Meses 4 Mes(es)
Proceso Precontractual INTERVENTORIA_002_2021
Maneja Múltiples Proyectos No
Contrato Valor Total 161.142.450,00
Estado Contrato Suspendido
Nuevo Multiproyecto No
Contratista
Representante Legal LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA
Número ID Representante Legal 71242191
Departamento ANTIOQUIA
Municipio APARTADÓ
Es Fundación No
Fecha Constitución Fundación
Interventor Técnico
Aspectos Financieros del Contrato
Registros Presupuestales
Crear Registro Presupuestal
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Registro Presupuestal Incluye
Los rubros están con cargo a la incorporación
Dependencia


Aspectos Financieros del Contrato
Registros Presupuestales
Crear Registro Presupuestal
Mostrar 10 registros por página
Buscar
ID
No Registro Presupuestal
Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías
Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor
Fecha
Valor
Vigencia
Concepto
Dependencia que Certifica el Registro
Creado por
Fecha creación
1 521 Si Si 17/02/2021 64.456.980,00 2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 02-2021. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA. PLAZO 06 MESES SECRETRÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Por Aplicación 12/04/2021
2 623 Si Si 27/03/2023 96.685.470,00 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 02-2021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIOQUIA. PLAZO 6 MESES. MUNICIPIO DE CHIGORODO SPGR 03/04/2023
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente


Recursos de Regalías
Ingresar Fuente Aporte Especie
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Vigencia
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
CHIGORODÓ-ANTIOQUIA Asignación para la Paz 20181719000299 2019 Por Aplicación 12/04/2021 0,00 0,00
CHIGORODÓ-ANTIOQUIA SGR - Asignación para la paz 20181719000299 2019 SPGR 25/05/2021 161.142.450,00 0,00
Total Recursos Regalías 161.142.450,00 0,00
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Otras Fuentes de Financiación del Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes 0,00 0,00
Total Contrato 161.142.450,00 0,00
No se encontró información.
Anterior Siguiente
Actas del Contrato
Crear Actas del Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar

Actas del Contrato

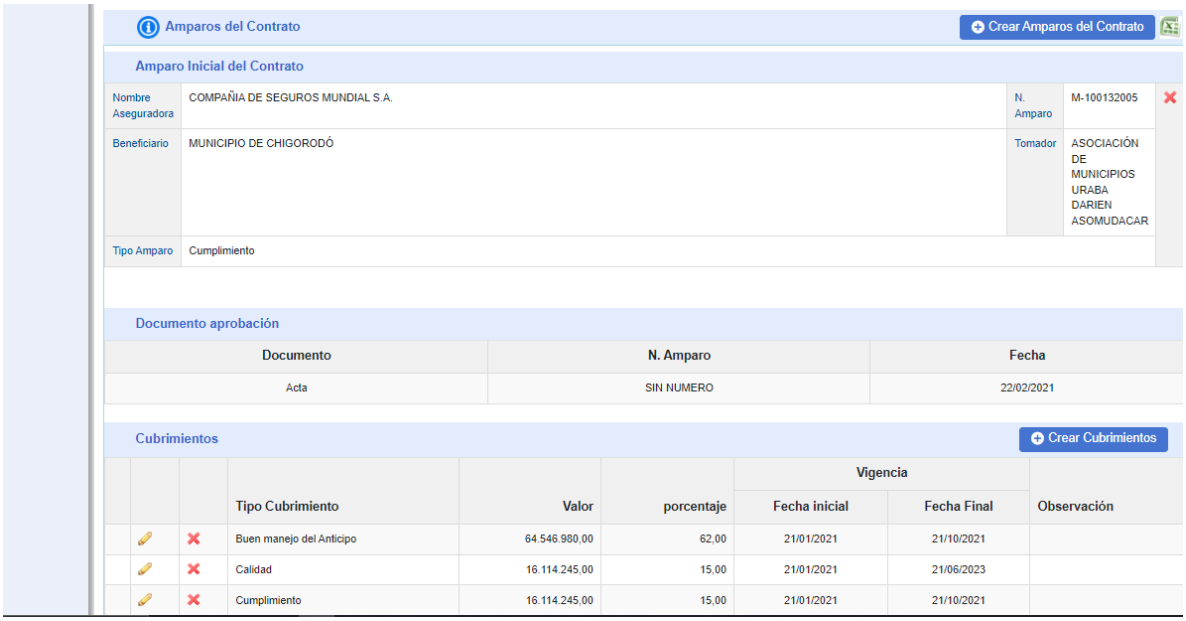
Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
SIN NUMERO	Acta de inicio	22/02/2021	Fijar como fecha de inicio el Convenio interadministrativo No. 016-2020 el día Veintidós (22) de Febrero de 2021. Por lo tanto, la fecha de terminación será el día 22 de Julio de 2021.	0,00	02/03/2021		
001	Acta de suspensión	15/03/2021	Se da suspensión al convenio por motivo de pandemia COVID-19 y escasez de materiales esenciales para la construcción del proyecto tales como acero, tuberías entre otros	0,00	09/09/2021	Covid-19	
001	Acta de reinicio	13/07/2021		0,00	15/05/2023		
002	Acta de suspensión	30/08/2021		0,00	15/05/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
002	Acta de reinicio	15/02/2022		0,00	15/05/2023		
003	Acta de suspensión	04/07/2022		0,00	15/05/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
003	Acta de reinicio	20/10/2022		0,00	15/05/2023		
004	Acta de suspensión	09/01/2023	Condiciones Climaticas Adversas	0,00	15/05/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
004	Acta de reinicio	29/09/2023	se mejoraron las condiciones climáticas, por tal motivo se le da reinicio a la obra.	0,00	25/07/2024		
05	Acta de suspensión	22/12/2023	Por festividades del mes de diciembre el personal se ausenta de las actividades y la mano de obra en el sector rural es escasa	0,00	22/12/2023	Inconvenientes con la comunidad.	

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
005	Acta de reinicio	08/03/2024	se firma el acta de reinicio del proyecto, teniendo en cuenta que los hechos que motivaron la suspensión ya se encuentran superados	0,00	25/07/2024		
006	Acta de suspensión	09/03/2024	se solicita la suspensión, con la intención de replantear aspectos tecnicos que impiden la continuidad idonea del proyecto, el contratista propone elaborar un nuevo presupuesto ajustado y un nuevo cronograma ajustado.	0,00	25/07/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
006	Acta de reinicio	09/07/2024	Los hechos que motivaron la suspensión ya se encuentran superadas.	0,00	25/07/2024		



Amparos del Contrato

Crear Amparos del Contrato

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	COMPAÑIA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.	N. Amparo	M-100132005
Beneficiario	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Tomador	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS URABA DARIEN ASOMUDACAR
Tipo Amparo	Cumplimiento		

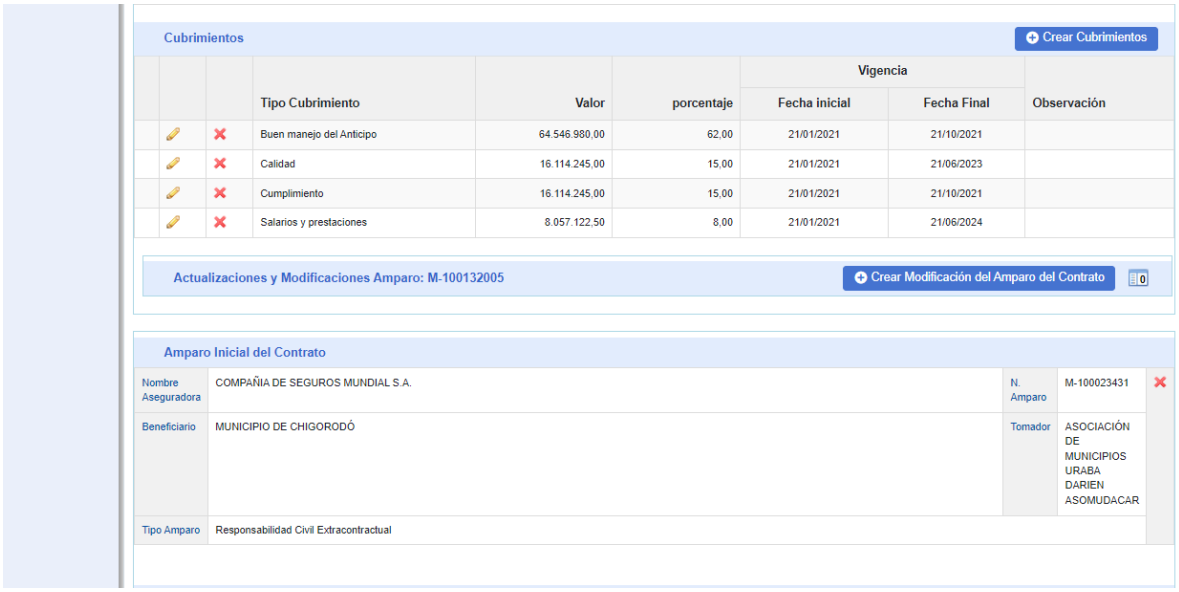
Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Acta	SIN NUMERO	22/02/2021

Cubrimientos

Crear Cubrimientos

			Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
						Fecha inicial	Fecha Final	
			Buen manejo del Anticipo	64.546.980,00	62,00	21/01/2021	21/10/2021	
			Calidad	16.114.245,00	15,00	21/01/2021	21/06/2023	
			Cumplimiento	16.114.245,00	15,00	21/01/2021	21/10/2021	



Cubrimientos

Crear Cubrimientos

			Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
						Fecha inicial	Fecha Final	
			Buen manejo del Anticipo	64.546.980,00	62,00	21/01/2021	21/10/2021	
			Calidad	16.114.245,00	15,00	21/01/2021	21/06/2023	
			Cumplimiento	16.114.245,00	15,00	21/01/2021	21/10/2021	
			Salarios y prestaciones	8.057.122,50	8,00	21/01/2021	21/06/2024	

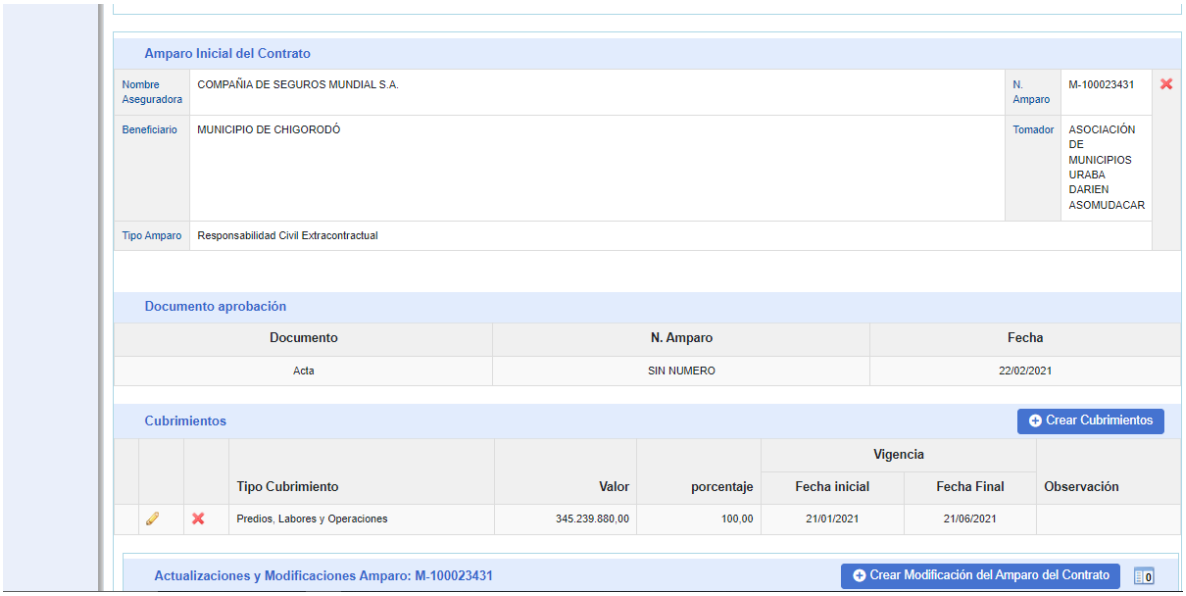
Actualizaciones y Modificaciones Amparo: M-100132005

Crear Modificación del Amparo del Contrato

0

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	COMPAÑIA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.	N. Amparo	M-100023431
Beneficiario	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Tomador	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS URABA DARIEN ASOMUDACAR
Tipo Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual		



Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	COMPAÑIA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.	N. Amparo	M-100023431
Beneficiario	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	Tomador	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS URABA DARIEN ASOMUDACAR
Tipo Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual		

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Acta	SIN NUMERO	22/02/2021

Cubrimientos

Crear Cubrimientos

			Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
						Fecha inicial	Fecha Final	
			Predios, Labores y Operaciones	345.239.880,00	100,00	21/01/2021	21/06/2021	

Actualizaciones y Modificaciones Amparo: M-100023431

Crear Modificación del Amparo del Contrato

0

Requisitos Para Cierre del Proyecto

Requisito	Cumplido	Descripción
Proyecto terminado	☒	Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual.
Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto.	☒	El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%.
Pólizas de estabilidad para contratos de obra	NA	Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación.
Contratos liquidados	☒	El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere'
Contratos pagados	☒	Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato.
Recursos reintegrados	NA	Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de Interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción; es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación.
Ejercicios de control social	NA	Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable
El Proyecto no tiene Alertas sin Subsanar	☒	Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsanar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito.
Planes de Mejora	NA	Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos).

Verificar Requisitos de Cierre

REGISTRO FOTOGRAFICO

Construcción de acueducto en la comunidad indígena Saudó del Municipio de Chigorodó, Antioquia









