ACTA DE RECIBO FINAL

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE SALES
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

PAGINA: 1 DE 1

FECHA ACTA: 16 / 7 / 2025

OBJETO: (i) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (ii) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025

ELABORO: ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONTRATISTA: INTERCONDI SAS — NIT 901.199.491-6
SUPERVISION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO — NIT 899.999.173-5
SUPERVISOR: ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
ACTA No.: FINAL

VALOR CONTRACTUAL:	$ 199.999.834,00
ADICION:	$ 30.000.000,00
VALOR CONTRATO + ADICION:	$ 229.999.834,00
VALOR ACTA PARCIAL 1:	$ -
VALOR EJECUTADO:	$ 229.999.834,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL:	$ 229.999.834,00
SALDO A FAVOR ENTIDAD:	$ -
FECHA ACTA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA ACTA DE MODIFICATORIO No. 1:	01 DE JULIO DE 2025
FECHA ADICION:	01 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1:	N/A
FECHA REINICIO:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACION CONTRATO:	21 DE JULIO DE 2025

							CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES MODIFICADAS			ACTA FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES / MENORES	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024																		
1	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	$ 80.720,00	$ 708.721,60	+	0,92	$ 74.503,22	9,70	$ 783.224,82			0%
2	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,98	$ 1.024.201,08	$ 32.753.950,54	-	-0,56	-$ 573.552,60	31,42	$ 32.180.397,93			0%
3	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,80	$ 697.569,04	$ 15.207.005,07	+	6,12	$ 4.269.122,52	27,92	$ 19.476.127,60			0%
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	$ 851.644,22	$ 16.658.160,94	-	-1,75	-$ 1.490.377,39	17,81	$ 15.167.783,56			0%
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3319,23	$ 10.445,82	$ 34.672.079,12	-	-218,24	-$ 2.279.695,76	3.100,99	$ 32.392.383,36			0%
					Subtotal	$ 99.999.917,27					$ 99.999.917,27		$ -	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024																		
1	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	$ 80.720,00	$ 708.721,60	+	1,46	$ 118.078,04	10,24	$ 826.799,64			0%
2	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,98	$ 1.024.201,08	$ 32.753.950,54	-	0,83	$ 850.086,90	32,81	$ 33.604.037,43			0%
3	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,80	$ 697.569,04	$ 15.207.005,07	-	0,27	$ 188.343,64	22,07	$ 15.395.348,71			0%
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	$ 851.644,22	$ 16.658.160,94	-	-1,01	-$ 860.160,66	18,55	$ 15.798.000,28			0%
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3319,23	$ 10.445,82	$ 34.672.079,12	-	-28,37	-$ 296.347,91	3.290,86	$ 34.375.731,21			0%
					Subtotal	$ 99.999.917,27					$ 99.999.917,27		$ -	
ADICION CON RECURSOS PROPIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA																		
1	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,02	$ 80.720,00	$ 1.616.416,04	+	-14,00	-$ 1.129.930,15	6,02	$ 486.084,25			0%
2	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	9,99	$ 1.024.201,08	$ 10.231.768,79	-	-0,09	-$ 92.178,10	9,90	$ 10.139.590,69			0%
3	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	6,35	$ 697.569,04	$ 4.429.563,40	-	0,23	$ 160.440,88	6,58	$ 4.590.004,28			0%
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	5,38	$ 851.644,22	$ 4.581.845,90	-	-0,20	-$ 170.328,84	5,18	$ 4.411.517,06			0%
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	875,03	$ 10.445,82	$ 9.140.405,87	+	117,98	$ 1.232.397,84	993,01	$ 10.372.803,72			0%
					Subtotal	$ 30.000.000,00					$ 30.000.000,00		$ -	
					ajuste al peso	-$ 0,54					-$ 0,54			
					SUBTOTAL OBRAS	$ 229.999.834,00					$ 229.999.834,00		$ -	

SUBTOTAL OBRAS	$ 229.999.834,00
VALOR TOTAL	$ 229.999.834,00

	$ 229.999.834,00		
	$ 229.999.834,00		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL: **DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	$ 229.999.834,00	100%
SALDO A FAVOR /SALDO SIN EJECUTAR	$ -	0%
VALOR ACTAS PARCIALES / VALOR CANCELADO A LA FECHA	$ -	0%

INTERCONDI SAS
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONTRATISTA

SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS
SUPERVISOR MUNICIPAL

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	1	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ITEM: 600.4 P **UBICACIÓN:** LA ESCUELA **UNIDAD:** M3 DATOS

FOTOGRAFIAS










LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD TOTAL HUELLAS	98,20				
PLASCAS DE INGRESO	3,0				
			# VIGA RIOSTRAS		
LONGITUD	95,20	3,00	33		
VIGA RIOSTRAS	3,80	0,15	0,10	33	1,92
EXCAVACION CUNETAS					
DESCENDENTE IZQ	98,20	0,35	0,05	1,0	1,72
DESCENDENTE DER	98,20	0,35	0,05	1,0	1,72
PLACAS DE INGRESO	1,60	5,00	0,15	2,0	2,40
EXCAVACION HACIA CARCAMO	15,00	0,87	0,15	1,0	1,95
				SUB-TOTAL:	9,70
				VIENE:	
				TOTAL:	9,70

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		SUPERVISOR DE OBRA	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	2	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5


OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO


ACTIVIDAD: CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

ITEM: 630.4 **UBICACIÓN:** LA ESCUELA **UNIDAD:** M3 DATOS

FOTOGRAFIAS

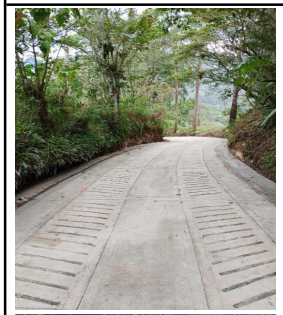

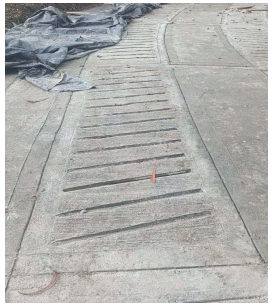


LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD HUELLA	98,20			**# VIGA RIOSTRAS**	
# VIA RIOSTRAS				33	
	# VIGA RIOSTRAS	ANCHO	TOTAL		
	33	0,15	4,91	ML	
	LONG TRAMO	ANCHO VIGAS	TOTAL		
LONG TRAMO EFECTIVA	95,20	4,91	90,29	ML	
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	# ELEMENTOS	
HUELLAS	90,29	0,90	0,15	2,0	24,38
PLACAS DE INGRESO	1,50	5,00	0,15	2,0	2,25
VIGA RIOSTRAS	3,80	0,15	0,25	33	4,79
				SUB-TOTAL:	31,42
				VIENE:	
				TOTAL:	31,42

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.		SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	
	FIRMA:		**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	3	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

ITEM:	630.7	**UBICACIÓN:**	LA ESCUELA	**UNIDAD:**	M3	DATOS

FOTOGRAFIAS

















LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD TOTAL	98,20				
				# VIGA RIOSTRAS	
# VIGAS RIOSTRAS				33	
	# VIGA RIOSTRAS	ANCHO	TOTAL		
	33	0,15	4,91	ML	
	LONG TRAMO	ANCHO VIGAS	TOTAL		
LONG TRAMO EFECTIVA	95,20	4,91	90,29	ML	
CENTRO	90,29	0,90	0,15	1,0	12,51
SOBREANCHOS EXTERNOS	90,29	0,55	0,15	2,0	15,41
				SUB-TOTAL:	27,92
				VIENE:	
				TOTAL:	27,92

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS	David R.	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	4	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

ITEM:	671,1	**UBICACIÓN:**	LA ESCUELA	**UNIDAD:**	M3

FOTOGRAFIAS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
CUNETA					
ASCENDENTE IZQ	95,20	0,60	0,15	1,0	8,57
ASCENDENTE DER	95,20	0,60	0,15	1,0	8,57
SOBRE ANCHO INGRESO PREDIO HACIA CARCAMO	15,00	0,30	0,15	1,0	0,68
				SUB-TOTAL:	17,81
				VIENE:	
				TOTAL:	17,81

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.		SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	
	FIRMA:		**FIRMA:**

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	5	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	LA ESCUELA	**UNIDAD:**	KG

FOTOGRAFIAS



LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
HUELLAS					
LONGITUD TOTAL:	95,20				
LONGITUDINAL	LONG	# BARRAS	# HUELLAS	TOTAL	
	95,20	5,0	2,0	952,00	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				952,00	KG
				159	VARILLAS
	LONG	SEPARACION	TOTAL		
TRANSVERSAL	95,20	0,20	476,00	VARILLAS DE 1,10 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# HUELLAS	TOTAL	
	476,00	1,10	2,0	1047,20	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				1047,20	KG
				175	VARILLAS
	LONG	LONG VARILLA	TOTAL		
TRASLAPOS	95,20	6,0	16		
	# TRASLAPOS	LONG TRASLAPO	# VARILLAS	# HUELLAS	TOTAL
	16	0,6	5,0	2,0	95,20
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				95,20	KG
				16	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	2094,40
				VIENE:	
				TOTAL:	2094,40

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA 6 DE 8

CONTRATISTA: INTERCONDI SAS **NIT:** 901,199,491-6

FECHA DE CUANTIFICACION 16 / 7 / 2025

SUPERVISION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO **NIT:** 899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM: 640.1 **UBICACIÓN:** LA ESCUELA **UNIDAD:** KG DATOS

FOTOGRAFIAS






LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LONG	SEPARACION	TOTAL		
PLACAS DE INGRESO					
TRANSVERSAL	1,50	0,20	7,50	VARILLAS DE 4,50 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# PLACAS	TOTAL	
	7,50	5,0	2,0	75,00	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				75,00	KG
				13	VARILLAS
LONGITUDINAL	5,00	0,20	25,00	VARILLAS DE 1,50 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# PLACAS	TOTAL	
	25,00	1,50	2,0	75,00	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				75,00	KG
				13	VARILLAS
			SUB-TOTAL:		150,00
			VIENE:		2094,40
			TOTAL:		2244,40

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		SUPERVISOR DE OBRA	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	FIRMA:	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	FIRMA:

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	7	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	LA ESCUELA	**UNIDAD:**	KG	DATOS	

FOTOGRAFIAS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	# BARRAS	# VIGAS	# DE ELEMENTOS	TOTAL
VIGA RIOSTRAS					
LONG SUPERIOR	4,40	1,0	33	144,03	ML
LONG INFERIOR	3,80	1,0	33	124,39	ML
			TOTAL	268,41	ML
	HIERRO # 3 - 0,56KG*ML			0,56	
				150,31	KG
				45	VARILLAS
			SUBTOTAL (1)	# VIGAS (2)	TOTAL FLEJES (1*2)
FLEJES	3,80	0,20	19,00	33	622
				VARILLAS DE 0,27 METRO DE LONGITUD	
	# FLEJES	LONGITUD	TOTAL		
	622	0,27	167,92	ML	
	HIERRO # 3 - 0,56KG*ML			0,56	
				94,04	KG
				28	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	244,35
				VIENE:	2244,40
				TOTAL:	2488,75

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	8	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	LA ESCUELA	**UNIDAD:**	KG

DATOS

FOTOGRAFIAS












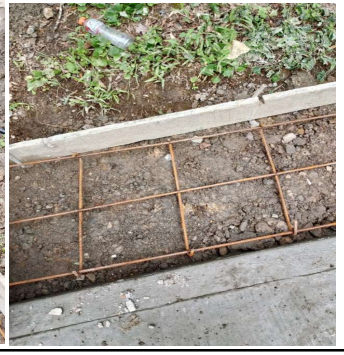

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LONG	# BARRAS	# VIGAS		
CUNETAS					
LONGITUDINAL	LONGITUD	# BARRAS	# CUNETAS		
DESCENDENTE IZQ	98,20	3,0	1,0	294,60	ML
DESCENDENTE DER	98,20	3,0	1,0	294,60	ML
			SUBTOTAL	589,20	ML
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				329,95	KG
				98	VARILLAS
TRANSVERSAL					
	LONGITUD	SEPARACION	TOTAL (L/S)		
	98,20	0,30	327	VARILLAS DE 0,68 METRO DE LONGITUD	
		SUBTOTAL	327,33		
	# BARRAS	LONG VARILLA	# CUNETAS	TOTAL	
	327	0,68	2,0	445,17	ML
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				249,30	KG
				74	VARILLAS
	LONGITUD	LONG VARILLA	TOTAL		
TRASLAPOS	98,20	6	16		
	# TRASLAPOS	LONG TRASLAPO	# VARILLAS	# CUNETAS	TOTAL
	16	0,60	3,0	2,0	58,92
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				33,00	KG
				10	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	612,24
				VIENE:	2488,75
				TOTAL:	3100,99

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA 1 DE 8

CONTRATISTA: INTERCONDI SAS **NIT:** 901,199,491-6

FECHA DE CUANTIFICACION 16 / 7 / 2025

SUPERVISION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO **NIT:** 899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ITEM: 600.4 P **UBICACIÓN:** ELIECER **UNIDAD:** M3 DATOS

FOTOGRAFIAS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD TOTAL HUELLAS	102,74				
PLASCAS DE INGRESO	3,0				
			# VIGA RIOSTRAS		
LONGITUD	99,74	3,00	34		
VIGA RIOSTRAS	3,30	0,15	0,10	34	1,77
EXCAVACION CUNETAS					
DESCENDENTE IZQ	102,74	0,60	0,05	1,0	3,35
DESCENDENTE DER	102,74	0,60	0,05	1,0	3,10
PLACAS DE INGRESO	1,60	4,60	0,14	2,0	2,02
				SUB-TOTAL:	10,24
				VIENE:	
				TOTAL:	10,24

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		SUPERVISOR DE OBRA	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	FIRMA:	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	FIRMA:

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	2	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO


ACTIVIDAD: CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

ITEM: 630.4 **UBICACIÓN:** ELIECER **UNIDAD:** M3 DATOS

FOTOGRAFIAS





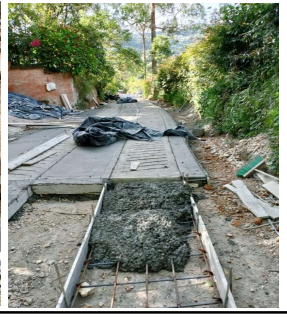


OBSERVACIONES:

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD HUELLA	102,74			**# VIGA RIOSTRAS**	
# VIA RIOSTRAS				34	
	# VIGA RIOSTRAS	ANCHO	TOTAL		
	34	0,15	4,97	ML	
	LONG TRAMO	ANCHO VIGAS	TOTAL		
LONG TRAMO EFECTIVA	99,74	4,97	94,77	ML	
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	# ELEMENTOS	
HUELLAS	94,77	0,90	0,15	2,0	26,39
PLACAS DE INGRESO	1,50	4,60	0,15	2,0	2,07
VIGA RIOSTRAS	3,30	0,15	0,25	34	4,36
				SUB-TOTAL:	32,81
				VIENE:	
				TOTAL:	32,81

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA 3 DE 8

CONTRATISTA: INTERCONDI SAS **NIT:** 901,199,491-6

FECHA DE CUANTIFICACION 16 / 7 / 2025

SUPERVISION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO **NIT:** 899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

ITEM: 630.7 **UBICACIÓN:** ELIECER **UNIDAD:** M3 DATOS

FOTOGRAFIAS






LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD TOTAL	102,74				
				# VIGA RIOSTRAS	
# VIGAS RIOSTRAS				34	
	# VIGA RIOSTRAS	ANCHO	TOTAL		
	34	0,15	4,97	ML	
	LONG TRAMO	ANCHO VIGAS	TOTAL		
LONG TRAMO EFECTIVA	99,74	4,97	94,77	ML	
CENTRO	94,77	0,90	0,15	1,0	13,19
SOBREANCHOS EXTERNOS	94,77	0,30	0,15	2,0	8,87
				SUB-TOTAL:	22,07
				VIENE:	
				TOTAL:	22,07

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		SUPERVISOR DE OBRA	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	4	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5


OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

ITEM:	671,1	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	M3

FOTOGRAFIAS

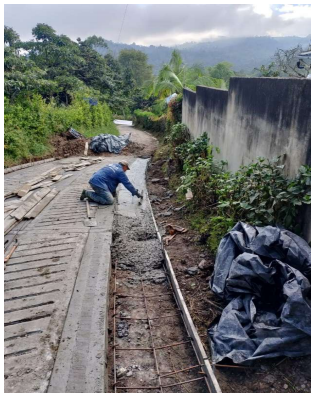



LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CUNETA					
ASCENDENTE IZQ	99,74	0,60	0,15	1,0	9,28
ASCENDENTE DER	99,74	0,60	0,15	1,0	9,28
			SUB-TOTAL:		18,55
			VIENE:		
			TOTAL:		18,55

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	5	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024


CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	KG — DATOS

FOTOGRAFIAS



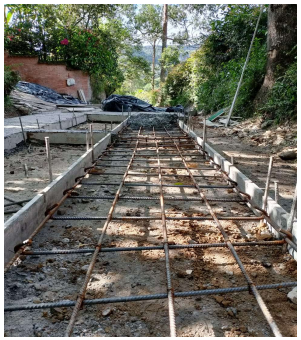




OBSERVACIONES:

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
HUELLAS					
LONGITUD TOTAL:	99,74				
LONGITUDINAL	LONG	# BARRAS	# HUELLAS	TOTAL	
	99,74	5,0	2,0	997,40	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				997,40	KG
				166	VARILLAS
	LONG	SEPARACION	TOTAL		
TRANSVERSAL	99,74	0,20	488,92	VARILLAS DE 1,10 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# HUELLAS	TOTAL	
	488,92	1,10	2,0	1101,13	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				1145,17	KG
				184	VARILLAS
	LONG	LONG VARILLA	TOTAL		
TRASLAPOS	99,74	6,0	17		
	# TRASLAPOS	LONG TRASLAPO	# VARILLAS	# HUELLAS	TOTAL
	17	0,60	5,0	2,0	101,73
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				105,80	KG
				17	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	2248,38
				VIENE:	
				TOTAL:	2248,38

CONTRATISTA DE OBRA		SUPERVISOR DE OBRA	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	FIRMA:	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	FIRMA:

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	6	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	KG

DATOS

FOTOGRAFIAS





LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LONG	SEPARACION	TOTAL		
PLACAS DE INGRESO					
TRANSVERSAL	1,60	0,20	8,02	VARILLAS DE 4,50 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# PLACAS	TOTAL	
	8,02	4,60	2,0	73,78	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				76,74	KG
				12	VARILLAS
LONGITUDINAL	4,60	0,20	23,00	VARILLAS DE 1,60 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# PLACAS	TOTAL	
	23,00	1,60	2,0	73,78	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				76,74	KG
				12	VARILLAS
			SUB-TOTAL:		153,47
			VIENE:		2248,38
			TOTAL:		2401,85

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS	David R	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	7	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	KG

DATOS

FOTOGRAFIAS



LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LONG	# BARRAS	# VIGAS		
VIGA RIOSTRAS					
LONG SUPERIOR	3,90	1,00	34	133,56	ML
LONG INFERIOR	3,30	1,00	34	113,01	ML
			TOTAL	246,58	ML
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				139,07	KG
				41	VARILLAS
			SUBTOTAL (1)	# VIGAS (2)	TOTAL FLEJES (1*2)
FLEJES	3,30	0,20	16,50	34	565
				VARILLAS DE 0,27 METRO DE LONGITUD	
	# FLEJES	LONGITUD	TOTAL		
	565	0,27	152,57	ML	
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				86,05	KG
				25	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	225,12
				VIENE:	2401,85
				TOTAL:	2626,97

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	8	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	KG

DATOS

FOTOGRAFIAS






OBSERVACIONES:

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	# BARRAS	# VIGAS	# DE ELEMENTOS	TOTAL
CUNETAS					
LONGITUDINAL	LONGITUD	# BARRAS	# CUNETAS		
DESCENDENTE IZQ	102,74	3,0	1,0	308,22	ML
DESCENDENTE DER	102,74	3,0	1,0	308,22	ML
			SUBTOTAL	616,44	ML
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				347,67	KG
				103	VARILLAS
TRANSVERSAL					
	LONGITUD	SEPARACION	TOTAL (L/S)		
	102,74	0,28	367	VARILLAS DE 0,68 METRO DE LONGITUD	
		SUBTOTAL	366,93		
	# BARRAS	LONG VARILLA	# CUNETAS	TOTAL	
	367	0,68	2	499,02	ML
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				281,45	KG
				83	VARILLAS
	LONGITUD	LONG VARILLA	TOTAL		
TRASLAPOS	102,74	6	17		
	# TRASLAPOS	LONG TRASLAPO	# VARILLAS	# CUNETAS	TOTAL
	17	0,60	3,00	2,00	61,64
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				34,77	KG
				10	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	663,89
				VIENE:	2626,97
				TOTAL:	3290,86

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	1	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ITEM: 600.4 P **UBICACIÓN:** ELIECER **UNIDAD:** M3 DATOS

FOTOGRAFIAS



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD TOTAL HUELLAS	28,26				
PLASCAS DE INGRESO	1,50				
			# VIGA RIOSTRAS		
LONGITUD	26,76	3,00	11		
VIGA RIOSTRAS	3,30	0,15	0,10	11,0	0,56
EXCAVACION CUNETAS					
DESCENDENTE IZQ	28,26	0,60	0,05	1,0	0,89
DESCENDENTE DER	28,26	0,60	0,05	1,0	0,89
PLACAS DE INGRESO	1,60	4,50	0,15	1,0	1,16
EXCAVACION PLACA EXISTENTE PH ALTA	5,50	1,60	0,25	1,0	2,33
CORTE Y EXCAVACION HACIA CARCAMO	4,12	0,30	0,15	1,0	0,20
				SUB-TOTAL:	6,02
				VIENE:	
				TOTAL:	6,02

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	2	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024


CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

ITEM: 630.4 **UBICACIÓN:** ELIECER **UNIDAD:** M3 DATOS

FOTOGRAFIAS

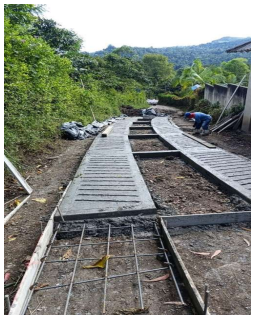


LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD HUELLA	28,26				
				# VIGA RIOSTRAS	
# VIA RIOSTRAS				11	
	# VIGA RIOSTRAS	ANCHO	TOTAL		
	11	0,15	1,60	ML	
	LONG TRAMO	ANCHO VIGAS	TOTAL		
LONG TRAMO EFECTIVA	26,76	1,60	26,00	ML	
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	# ELEMENTOS	
HUELLAS	26,00	0,90	0,15	2,0	7,39
PLACAS DE INGRESO	1,50	4,50	0,15	1,0	1,08
VIGA RIOSTRAS	3,30	0,15	0,25	11,0	1,43
				SUB-TOTAL:	9,90
				VIENE:	
				TOTAL:	9,90

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	3	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5


OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

ITEM:	630.7	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	M3

FOTOGRAFIAS






LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	# DE ELEMENTOS	TOTAL
LONGITUD TOTAL	28,26				
				# VIGA RIOSTRAS	
# VIGAS RIOSTRAS				11	
	# VIGA RIOSTRAS	ANCHO	TOTAL		
	11	0,15	1,60	ML	
	LONG TRAMO	ANCHO VIGAS	TOTAL		
LONG TRAMO EFECTIVA	26,76	1,60	26,00	ML	
CENTRO	26,00	0,90	0,15	1,0	3,77
SOBREANCHOS EXTERNOS	26,00	0,30	0,15	2,0	2,48
SOBREANCHO TERMINACION EMPATE PH	2,60	0,45	0,15	1,0	0,19
SOBREANCHO TERMINACION EMPATE PH	4,40	0,20	0,15	1,0	0,14
				SUB-TOTAL:	6,58
				VIENE:	
				TOTAL:	6,58

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS	David R	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	4	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

ITEM:	671,1	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	M3

DATOS

FOTOGRAFIAS



LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CUNETA					
ASCENDENTE IZQ	26,76	0,60	0,15	1,0	2,59
ASCENDENTE DER	26,76	0,60	0,15	1,0	2,59
			SUB-TOTAL:		5,18
			VIENE:		
			TOTAL:		5,18

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	5	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM: 640.1 **UBICACIÓN:** ELIECER **UNIDAD:** KG DATOS

FOTOGRAFIAS



LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
HUELLAS					
LONGITUD TOTAL:	26,76				
LONGITUDINAL	LONG	# BARRAS	# HUELLAS	TOTAL	
	26,76	5,0	2,0	275,14	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				286,14	KG
				46	VARILLAS
	LONG	SEPARACION	TOTAL		
TRANSVERSAL	26,76	0,20	137,23	VARILLAS DE 1,10 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# HUELLAS	TOTAL	
	137,23	1,10	2,0	309,07	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				321,43	KG
				52	VARILLAS
	LONG	LONG VARILLA	TOTAL		
TRASLAPOS	26,76	6,00	6		
	# TRASLAPOS	LONG TRASLAPO	# VARILLAS	# HUELLAS	TOTAL
	6	0,60	5,0	2,0	37,26
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				38,75	KG
				6	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	646,32
				VIENE:	
				TOTAL:	646,32

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS	David R.	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	6 DE 8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025 **CORTE No.** FINAL **ELABORO:** ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM: 640.1 **UBICACIÓN:** ELIECER **UNIDAD:** KG DATOS

FOTOGRAFIAS





LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LONG	SEPARACION	TOTAL		
PLACAS DE INGRESO					
TRANSVERSAL	1,60	0,20	8,23	VARILLAS DE 4,60 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# PLACAS	TOTAL	
	8,23	4,60	1,0	39,39	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				40,96	KG
				7	VARILLAS
LONGITUDINAL	4,60	0,20	23,61	VARILLAS DE 1,60 METRO DE LONGITUD	
	# BARRAS	LONG BARRA	# PLACAS	TOTAL	
	23,61	1,60	1,0	39,39	ML
		HIERRO # 4 - 1KG*ML		1,0	
				40,96	KG
				7	VARILLAS
			SUB-TOTAL:		81,92
			VIENE:		646,32
			TOTAL:		728,24

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	7	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16 / 7 / 2025			**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	KG

FOTOGRAFIAS





LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LONG	# BARRAS	# VIGAS		
VIGA RIOSTRAS					
LONG SUPERIOR	3,90	1,0	11	44,66	ML
LONG INFERIOR	3,30	1,0	11	37,80	ML
			TOTAL	82,46	ML
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				46,51	KG
				14	VARILLAS
			SUBTOTAL (1)	# VIGAS (2)	TOTAL FLEJES (1*2)
FLEJES	3,30	0,20	16,94	11	186
				VARILLAS DE 0,27 METRO DE LONGITUD	
	# FLEJES	LONGITUD	TOTAL		
	186	0,27	50,32	ML	
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				28,38	KG
				8	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	74,89
				VIENE:	728,24
				TOTAL:	803,13

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

MEMORIAS DE CALCULO

PAGINA	8	DE	8	**CONTRATISTA:**	INTERCONDI SAS	**NIT:**	901,199,491-6
FECHA DE CUANTIFICACION	16	/ 7	/ 2025	**SUPERVISION:**	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT:**	899.999.173-5

OBJETO: (I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO:	SAMC-OP-003-2025	**CORTE No.**	FINAL	**ELABORO:**	ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO


ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM:	640.1	**UBICACIÓN:**	ELIECER	**UNIDAD:**	KG

DATOS

FOTOGRAFIAS



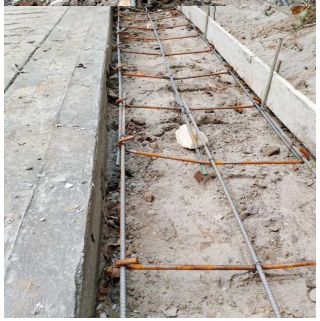


LOCALIZACION	DIMENSIONES			# DE ELEMENTOS	TOTAL
	LONG	# BARRAS	# VIGAS		
CUNETAS					
LONGITUDINAL	LONGITUD	# BARRAS	# CUNETAS		
DESCENDENTE IZQ	28,26	3,0	1,0	88,17	ML
DESCENDENTE DER	28,26	3,0	1,0	88,17	ML
			SUBTOTAL	176,34	ML
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				99,46	KG
				29	VARILLAS
	LONGITUD	SEPARACION	TOTAL (L/S)		
	28,26	0,28	101	VARILLAS DE 0,68 METRO DE LONGITUD	
		SUBTOTAL	101		
	# BARRAS	LONG VARILLA	# CUNETAS	TOTAL	
	101	0,68	2,0	140,09	ML
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				79,01	KG
				23	VARILLAS
	LONGITUD	LONG VARILLA	TOTAL		
TRASLAPOS	28,26	6	5		
	# TRASLAPOS	LONG TRASLAPO	# VARILLAS	# CUNETAS	TOTAL
	5	0,60	3,0	2,0	20,23
		HIERRO # 3 - 0,56KG*ML		0,56	
				11,41	KG
				3	VARILLAS
				SUB-TOTAL:	189,88
				VIENE:	803,13
				TOTAL:	993,01

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DE OBRA		**SUPERVISOR DE OBRA**	
INTERCONDI SAS		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO		ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS	
C.C 1,020,797,397 DE BOGOTA D.C.	**FIRMA:**	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	**FIRMA:**

INFORME FINAL

+ (57) 310 762 2024
Intercondisas@gmail.com

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

INFORME TÉCNICO

OBJETO DEL CONTRATO

(I) **"***MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024", (II) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024.***"**

CONTRATO No. SAMC-OP-003-2025
INTERCONDI SAS
JULIO DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 5
4.1 GARANTÍAS 6
4.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS 7
5. ENSAYOS DE LABORATORIOS Y DISEÑO DE MEZCLA 8
6. PMT 11
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
SECTOR LA ESCUELA 13
SECTOR ELIECER INICIAL 15
SECTOR ELIECER (ADICION) 18
8. RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 20
9. CORRESPONDENCIA ENVIADA 20
10. CONCLUSIONES 21
- ANEXOS 22

1. Introducción

El Suscrito alcalde del municipio de San Francisco, en ejercicio de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en el artículo 30 de la Ley 454 de 1998; los decretos 1798 y 1799 de 2003; el artículo 11 de la Ley 80 de 1993; la ley 1150 de 2007; el Decreto 1082 de 2015; y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones armónicas y concordantes, celebra con la empresa INTERCONDI SAS identificado con NIT. 901.199.491el contrato SAMC-OP-003-2025, cuyo objeto es (I)“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024” con un plazo inicial de 3 meses calendario y un valor inicial de $ 199.999.834,54 M/CTE.


El presente informe plasma las actividades ejecutadas por la empresa INTERCONDI SAS en cumplimiento de lo pactado en este contrato.

2. Localización

Los mejoramientos viales de los sectores la Escuela y Eliecer de la vereda El Toriba se encuentran ubicada en el municipio de San Francisco Cundinamarca, aproximadamente a 20 minutos del casco urbano.

Las coordenadas iniciales de cada sector son: 4°58'42.8" N, 74°16'47.4"W y 4°58'40.46"N, 74°16'47.4"W respectivamente.



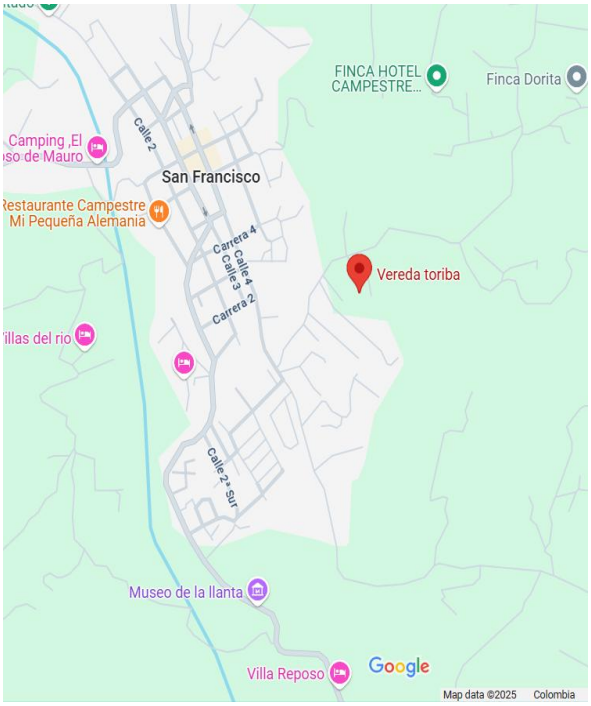

3. Descripción del Proyecto

CONTRATISTA	INTERCONDI SAS NIT 901199491-6
CONTRATO No.	SAMC-OP-003-2025
OBJETO:	*(I)MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO*

	INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
PLAZO:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 de julio de 2025
PRORROGAS	N/A
ADICION	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) 01 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACION	16 de julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	$ 229.999.834,00
REPRESENTANTE LEGAL:	DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
DATOS DE LA SUPERVISION	
SUPERVISOR	ING. SEBASTIÁN RODRIGUEZ OVALLOS (Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos)
DATOS DE LA ENTIDAD	
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA
ALCALDE	JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ

4. Obligaciones Contractuales

Las condiciones contractuales establecidas para el contratista son fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo y cumplimiento del contrato. En primer lugar, se destaca la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las obligaciones acordadas en el contrato, así como en la reparación de cualquier daño ocasionado a la Entidad como resultado de su ejecución. Este aspecto subraya la importancia de la diligencia y el cuidado en todas las actividades relacionadas con el proyecto.

Además, se especifica que el contratista debe llevar a cabo la ejecución del contrato utilizando sus propios recursos y manteniendo su autonomía técnica y administrativa. Esto implica que la Entidad confía en la capacidad y experiencia del contratista para llevar a cabo las tareas según lo acordado, sin depender de terceros para la gestión y dirección del proyecto.

En cuanto a la selección de personal, se le otorga al contratista la libertad de elegir al personal necesario para la ejecución del contrato, siempre y cuando cumplan con los

requisitos exigidos. Esta disposición brinda flexibilidad al contratista para armar un equipo adecuado que se ajuste a las necesidades del proyecto.

El contratista también asume la responsabilidad exclusiva del pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones a su personal, lo que resalta su compromiso con las obligaciones laborales y su deber de cumplirlas en su totalidad.

Por otra parte, se establece la obligación de suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidación del contrato, lo que asegura una documentación adecuada y transparente del proceso contractual desde su inicio hasta su finalización.

Asimismo, se exige al contratista estar al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales para la suscripción y perfeccionamiento del contrato, lo que subraya la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y laborales.

Para garantizar la seguridad en caso de posibles incidentes, el contratista debe contratar un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por un valor determinado, lo que proporciona una capa adicional de protección tanto para la Entidad como para terceros afectados.

4.1 Garantías

La empresa INTERCONDI SAS estableció una garantía única emitida por una compañía de seguros debidamente establecida en Colombia. Estas garantías tienen el propósito de cubrir los perjuicios tanto contractuales como extracontractuales, en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015 y en la cláusula 18 de la minuta de este contrato.

Póliza según firma del contrato

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101063306	16/04/2025	16/01/2026	$19,999,983.40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			16/04/2025	16/07/2028	$19,999,983.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			16/07/2025	16/07/2030	$39,999,966.80
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101023766	16/04/2025	16/07/2025	$284,700,000.00

Póliza según acta de inicio

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101063306	22/04/2025	22/01/2026	$19,999,983.40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			22/04/202	22/07/2028	$19,999,983.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			22/07/2025	22/07/2030	$39,999,966.8
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101023766	16/04/2025	16/07/2025	$284,700,000.00

Póliza según adición No. 1

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101063306	22/04/2025	22/01/2026	$22.999.983,40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			22/04/202	22/07/2028	$22.999.983,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			22/07/2025	22/07/2030	$45.999.966,80
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101023766	16/04/2025	16/07/2025	$284,700,000.00

Póliza según acta de recibo final

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101063306	22/04/2025	22/01/2026	$22.999.983,40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			22/04/202	22/07/2028	$22.999.983,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			16/07/2025	16/07/2030	$45.999.966,80
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101023766	22/04/2025	22/07/2025	$284,700,000.00

4.2 Actos administrativos

En el presente cuadro se muestra a los actos administrativos del contrato:

ACTAS	FECHA
Acta de Inicio	22-abr-2025
Acta de adición No. 1	01-jul-2025
Acta de recibo final	16-jul-2025

5. Ensayos de laboratorios y diseño de mezcla

En cumplimiento a la normatividad vigente de calidad de los concretos, se tomaron muestras del hormigón usado en los elementos de la placa huella cada 30 m aprox., para garantizar que se cumpla con la resistencia del diseño de mezcla presentada.

En los anexos de este informe se presenta el diseño de mezcla y los resultados de los ensayos de las muestras de del concreto.



LA ESCUELA						
Elemento	**Fecha de Toma**	**Ubicación**	**Muestra**	**Fecha de Rotura**	**RESULTADOS**	
					Resistencia (P.S.I)	**(%) F'c**
HUELLAS	9/06/2025	k0+030	1	16/06/2025	2449	81,63%
			2	23/06/2025	2887	96,23%
			3	7/07/2025	3300	110,00%
VIGAS RIOSTRAS	9/06/2025		1	16/06/2025	2230	74,33%
			2	23/06/2025	2809	93,63%
			3	7/07/2025	3045	101,50%
CUNETAS	12/06/2025		1	19/06/2025	2236	74,53%
			2	26/06/2025	2801	93,37%
			3	10/07/2025	3078	102,60%
HUELLAS	13/06/2025	k0+060	1	20/06/2025	2449	81,63%
			2	27/06/2025	2887	96,23%
			3	11/07/2025	3211	107,03%
VIGAS RIOSTRAS	13/06/2025		1	20/06/2025	2398	79,93%
			2	27/06/2025	2916	97,20%
			3	11/07/2025	3123	110.00%
CUNETAS	16/06/2025		1	23/06/2025	2230	74,33%
			2	30/06/2025	2809	93,63%
			3	14/07/2025	3045	101,50%
HUELLAS	17/06/2025	K0+090	1	24/06/2025	2502	83,40%
			2	1/07/2025	2876	95,87%
			3	15/07/2025	3098	103,27%
VIGAS RIOSTRAS	17/06/2025		1	24/06/2025	2467	82,23%
			2	1/07/2025	2889	96,30%
			3	15/07/2025	3286	110.00%
CUNETAS	20/06/2025		1	27/06/2025	2230	74,33%
			2	4/07/2025	2809	93,63%
			3	18/07/2025	-	-

ELIECER						
Elemento	**Fecha de Toma**	**Ubicación**	**Muestra**	**Fecha de Rotura**	**RESULTADOS**	
					Resistencia (P.S.I)	**(%) F'c**
HUELLAS	21/06/2025	k0+030	1	28/06/2025	2423	80,77%
			2	5/07/2025	2880	96,00%
			3	-	-	-
	21/06/2025		1	28/06/2025	2309	76,97%

VIGAS RIOSTRAS			2	5/07/2025	2825	94,17%
			3	-	-	-
CUNETAS	24/06/2025		1	1/07/2025	2236	74,53%
			2	8/07/2025	2801	93,37%
			3	-	-	-
HUELLAS	25/06/2025		1	2/07/2025	2512	83,73%
			2	9/07/2025	2861	95,37%
			3	-	-	-
VIGAS RIOSTRAS	25/06/2025	k0+060	1	2/07/2025	2391	79,70%
			2	9/07/2025	2911	97,03%
			3	-	-	-
CUNETAS	28/06/2025		1	5/07/2025	2290	76,33%
			2	12/07/2025	2858	95,27%
			3	-	-	-
HUELLAS	29/06/2025		1	6/07/2025	2502	83,40%
			2	13/07/2025	2876	95,87%
			3	27/07/2025	-	-
VIGAS RIOSTRAS	29/06/2025	k0+090	1	6/07/2025	2497	83,23%
			2	13/07/2025	2905	96,83%
			3	27/07/2025	-	-
CUNETAS	2/07/2025		1	9/07/2025	2230	74,33%
			2	16/07/2025	2809	93,63%
			3	30/07/2025	-	-
HUELLAS	3/07/2025		1	10/07/2025	2547	84,90%
			2	-	-	-
			3	-	-	-
VIGAS RIOSTRAS	3/07/2025	k0+120	1	10/07/2025	2460	82,00%
			2	-	-	-
			3	-	-	-
CUNETAS	6/07/2025		1	13/07/2025	2224	74,13%
			2	-	-	-
			3	-	-	-

Se puede observar que todos los ensayos presentados cumplen con la resistencia del diseño de mezcla de 3000 PSI a los 28 días de rotura. A la fecha de este informe existen muestras que aun no han sido estalladas en el laboratorio debido a que no se ha completado la edad necesaria para su ensayo.

6. PMT

Para la construcción de la placa huella en los sectores de la Escuela y Eliecer, hubo la necesidad de crear volantes informativos para entregar a la comunidad sobre los cierres viales, la información del contrato, tiempo de ejecución, tiempo de curado del concreto y las rutas alternas a tomar durante el tiempo que dure la ejecución.

Estos volantes fueron repartidos en lugares estratégicos y se le realizó socialización a la comunidad sobre las fechas de inicio y los alcances del contrato SAMC-OP-003-2025.

Los cierres de la vía se efectuaron el mismo día del inicio de las obras para evitar inconvenientes en la movilidad de los transeúntes de esta región.

Las vías alternas fueron:

Sector Eliecer
VÍA ALTERNA 1: La Frontera - Alto de la Virgen hacia San Miguel y Alto de Toriba
VÍA ALTERNA 2: Piedra de los Novios - Alto de Toriba



Sector la Escuela
VÍA ALTERNA 1: La Frontera - Alto de la Virgen hacia San Miguel y Alto de Toriba
VÍA ALTERNA 2: Piedra de los Novios - Alto de Toriba



Los volantes informativos se presentan como anexo a este informe.





Cierre de vía en ambos sectores.

7. Actividades ejecutadas

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el proyecto.

Sector la escuela

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	9,70





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,98	31,42





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,80	27,92





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	17,81





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3319,23	3.100,99





Sector Eliecer inicial

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	10,24





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,98	32,81





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
671,1	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,80	22,07





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	18,55





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3319,23	3.290,86





Sector Eliecer (ADICIÓN)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,02	6,02





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	9,99	9,90





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
671,1	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	6,35	6,58





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	5,38	5,18





ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA
640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	875,03	993,01





8. Recursos humanos del proyecto

La empresa INTERCONDI SAS para la ejecución del contrato No. SAMC-OP-003-2025 contó con el siguiente personal en obra, cumpliendo con el perfil requerido en el anexo técnico del proceso.

CARGO	PROFESIONAL	DEDICACION	CEDULA
Director de obra	Ing. Edgar Augusto Villate Hernández	50%	74.376.833
Residente de obra	Ing. Hernán Mauricio Villalobos Ramírez	100%	1.018.410.252

9. Correspondencia enviada

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
001	18/06/2025	Solicitud de adición	Secretaría de Planeación

10. Conclusiones

Cumplimiento del Contrato:
La ejecución del contrato **C-MO-MC-034-2024** se llevó a cabo de manera satisfactoria, cumpliendo en su totalidad con los compromisos estipulados en la minuta contractual.

Aunque el acta de inicio se firmó el 22 de abril de 2025, la ejecución comenzó formalmente la última semana del mes de mayo debido a las fuertes lluvias presentes en la zona, producto de la ola invernal que atraviesas el país.

Se vio la necesidad de una adición presupuestal al contrato en el sector de Eliecer por valor de $30.000.000,00 debido a que se identificaron condiciones topográficas y de drenaje no previstas que afectaban la funcionalidad de la obra, principalmente en el tramo del sector Eliecer, tales como pendientes pronunciadas, acumulación de aguas superficiales y riesgo de socavación, aspectos que es necesario ser corregidos oportunamente. De esta forma y para garantiza el adecuado desarrollo del proyecto, se estimó por la Administración Municipal por conducto de la supervisión conveniente ejecutar obras complementarias para eliminar el riesgo de afectación a la obra.

Aspectos Financieros:
El contrato no contempló anticipo ni pagos parciales. Por tanto, la empresa INTERCONDI SAS asumió en su totalidad los costos del proyecto, garantizando una ejecución fluida y eficiente.

Gestión de Riesgos y Problemas:
Fuera del retraso inicial por las lluvias y las condiciones climáticas adversas, no se presentaron mayores inconvenientes en la ejecución del contrato. Las actividades se desarrollaron sin contratiempos significativos, evidenciando una adecuada planificación y gestión por parte de INTERCONDI SAS.

Firma:

David R.

_____

DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
R.L INTERCONDI SAS

ANEXOS

- Anexo 1. Registro fotográfico
- Anexo 2. Correspondencia
- Anexo 3. Actas generadas (inicio, adición)
- Anexo 4. PMT
- Anexo 5. Diseño de Mezcla
- Anexo 6. Ensayos de laboratorio
- Anexo 7. Certificado de calidad de los materiales
- Anexo 8. Bitácora de obra

Anexo 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Sector La Escuela



Sector Eliecer



Anexo 2. Correspondencia

San Francisco, 19 de junio de 2025

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

Calle 4 No. 7 56 – Administración Municipal

REFERENCIA: CONTRATO SAMC-OP-003-2025

OBJETO: *MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024*.

ASUNTO: Solicitud De Adición Presupuestal.

Cordial saludo,

De acuerdo al contrato en mención que se encuentra en ejecución y en específico, al tramo que se esta construyendo en la vereda Toriba sector ELIECER, sugerimos muy respetuosamente adicionar la suma de ($30.000.000) Treinta millones de pesos M/cte teniendo en cuenta que

- Las condiciones del sector en épocas de invierno se dificultan dada la naturaleza de la zona, con inclinaciones superiores al 7% dificultan la entrada y salida de la comunidad hacia el casco urbano.
- Que teniendo como alcance 104 metros lineales para la construcción de la placa huella con un ancho de 4.50 metros y agotando el 100% del valor dado, el tramo donde se construye dicha placa huella solo cubriría el 75% de la necesidad total de este tramo.
- Que producto a lo anterior, la pendiente quedaría funcional solo el 70% de su longitud total.
- Que en épocas de invierno dicha pendiente acumularía grandes cantidades de aguas lluvias afectando y logrando erosionar la placa huella que se encuentra en construcción en la parte inferior del tramo.
- Mayor longitud efectiva de intervención, en atención a solicitudes de la comunidad y la revisión del trazado, que permitirá garantizar la funcionalidad y continuidad del tramo vial.

Esta vía rural tiene un carácter prioritario para la comunidad de la vereda Toriba, ya que permite la movilidad de estudiantes, campesinos y habitantes hacia el casco urbano de San Francisco. La adición solicitada permitirá:

+57 (310) 762 70 24
intercondisas@gmail.com

- Extender los beneficios del proyecto a una mayor cantidad de familias rurales.
- Reducir tiempos de desplazamiento y costos de transporte de productos agrícolas.
- Mejorar la conectividad en épocas invernales, fortaleciendo la seguridad vial.
- Aumentar el impacto positivo de la inversión pública y garantizar mayor cobertura territorial.

Teniendo en cuenta lo anterior pedimos aunar esfuerzos para garantizar dicha adición y poder culminar este tramo cubriendo el 100% de la pendiente, de esta forma se garantiza el tránsito en cualquier época climática en esta zona rural del municipio de San Francisco.

Que La empresa INTERCONDI SAS de manera responsable respalda esta solicitud con el visto bueno del equipo de ingenieros con los que cuenta y que han evaluado este tramo en aspectos técnicos, jurídicos y financieros dando el visto bueno.

Esperamos que la administración Municipal en cabeza del Señor alcalde Jorge Enrique Infante Bermudez y el ing. Sebastián Rodriguez nos den la viabilidad para incorporar dichos recursos al contrato SAMC-OP-002-2025.

Cordialmente,

DAVID RICARDO RODRIGUEZ
R.L INTERCONDI SAS

+57 (310) 762 70 24
intercondisas@gmail.com

ANEXO 1 – PRESUPUESTO ADICION.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024								
1	2,13	INVIAS 600	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR	M3	20,03	$ 80.720,00	$ 1.616.737,25
2	4,6	INVIAS 630	630,4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	9,99	$ 1.024.201,08	$ 10.231.768,79
3	4,26	INVIAS 630	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	6,35	$ 697.569,04	$ 4.429.563,40
4	4,21	INVIAS 671	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	5,38	$ 851.644,22	$ 4.581.845,90
5	4,52	INVIAS 640	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	875,03	$ 10.445,82	$ 9.140.405,87
Subtotal								**$ 30.000.321,21**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$	30.000.321,21
AJUSTE	$	(321,21)
VALOR TOTAL	$	30.000.000,00

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO.







+57 (310) 762 70 24
intercondisas@gmail.com

Anexo 3. Actas generadas

ACTA DE INICIO

CONTRATO No	SAMC-OP-003-2025	FECHA DEL CONTRATO	15/04/2025	FECHA DEL ACTA	22/04/2025

OBJETO CONTRACTUAL:

"(I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024"

PLAZO DE EJECUCION:	MESES 3 DIAS 0	**INICIA**	22/04/2025	**FECHA DE TERMINACION**	21/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.999.834,00	**ANTICIPO%:**	0%		$ 0,00
CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO			**NIT.:**	899.999.173-5
ORD DEL GASTO:	X JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ			**C.C.:**	3.158.886
CONTRATISTA:	X INTERCONDI S.A.S.			**NIT.**	901.199.491-6
REP. LEGAL:	X DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO			**C.C.:**	1.020.797.397
SUPERVISOR:	X SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS			**CARGO**	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DEP. SUPERVISOR:	X SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL				
INTERVENTOR:	X NA			**NIT.:**	NA
ASUNTO:	DAR INICIO AL CONTRATO EN REFERENCIA				

REGISTRO PRESUPUESTAL, FUENTES DE FINANCIACION Y REGISTROS PRESUPUESTALES

No	RES-2025000254	FECHA:	16/04/2025	RUBRO:	X	2.3.2402041.2.3.2.01.01.001.03.02.53211.A109	FUENTE	1.3.1.1.08-3	VALOR:	$ 100.000.000,00
No	RES-2025000254	FECHA:	16/04/2025	RUBRO:	X	2.3.2402041.2.3.2.01.01.001.03.02.53	FUENTE	1.3.1.1.08-6	VALOR:	$ 99.999.834,00
									TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	**$ 199.999.834,00**

GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	ASEGURADORA	FECHA APROB.:	COBERTURA	
				DESDE	HASTA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	30-40-101023766	SEGUROS DE ESTADO S.A.	22/04/2025	16/04/2025	16/07/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	30-40-101023766	SEGUROS DE ESTADO S.A.	22/04/2025	16/04/2025	16/07/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	30-40-101023766	SEGUROS DE ESTADO S.A.	22/04/2025	16/04/2025	16/07/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-44-101063306	SEGUROS DE ESTADO S.A.	22/04/2025	16/04/2025	16/01/2026
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	30-44-101063306	SEGUROS DE ESTADO S.A.	22/04/2025	16/04/2025	16/07/2028
RENTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30-44-101063306	SEGUROS DE ESTADO S.A.	22/04/2025	SI AMPARA, 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
NA	NA	NA	NA		

FORMA DE PAGO:

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista UN ACTA DE PAGO cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del supervisor.



El pago al Contratista se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

ACTA DE INICIO

OBSERVACIONES:

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el contrato, de conformidad con los requisitos de ley y con las estipulaciones del contrato. Por tanto las partes declaran formalmente iniciado el presente contrato.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:		NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA:	X	**INTERCONDI S.A.S.** 901.199.491-6 **DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO** 1.020.797.397	
[1] **SUPERVISOR:**	X	**SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS** SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL	
INTERVENTOR:	X	NA	

[1] Terminos señalados en el Decreto 10 del 3 de enero de 2024 y el Decreto Municipal 206 de 2023

MODIFICATORIO No. 01
ADICIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA SAMC-OP-003-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA:	INTERCONDI SAS NIT 901.199.491-6 R/L David Ricardo Rodríguez Buitrago C.C. No. 1.020.797.397		
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL		
OBJETO DEL CONTRATO	"(I) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024".		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.999.834)		
VALOR ADICIÓN	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE		
VALOR FINAL	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($229.999.834) M/CTE		
CDP INICIAL	DIS-2025000066 24/01/2025	RP	RES - 2025000254 del 16/04/2025
CDP ADICION	DIS-2025000293 DEL 19/06/2025		
FECHA DE SUSCRIPCION	15 DE ABRIL DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
VENCIMIENTO INICIAL	21 DE JULIO DE 2025		
PRORROGA PLAZO	N/A		
PLAZO FINAL	N/A		
VENCIMIENTO FINAL	21 DE JULIO DE 2025		
FECHA MODIFICATORIO N°01	01 DE JULIO DE 2025		

Entre los suscritos: **CARLOS HERNAN ROCHA ALVARADO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 1.018.480.593 de Bogotá, en su calidad de secretario General y de Gobierno, cargo para el cual fue designado mediante decreto No. 0121 del 15 de mayo de 2024 y debidamente posesionado mediante acta No. 024 del 15 de mayo de 2024, delegado para la celebración de contratos y convenios en nombre del Municipio de acuerdo con el decreto No. 010 del 3 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del **Municipio de San Francisco-Cundinamarca**, por una parte, y por la otra; el señor **INTERCONDI SAS,** con **NIT. 901.199.491-6,** representada legalmente por **David Ricardo Rodríguez Buitrago C.C. No. 1020797397**, con capacidad para contratar, quien declara bajo la gravedad de juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar que tratan los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO No. 1** al Contrato de Obra No.**SAMC-OP-003-2025,** el cual se regirá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y el decreto 1082 de 2015, así como por las cláusulas que se expresan a continuación, las cuales se encuentran plasmadas en la comunicación remitida por parte de la Secretaria de Planeación y Desarrollo

Territorial, **1.** La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial justifica la realización del modificatorio, así: *"(…) En mi calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. SAMC-OP-003-2025, me permito remitir a su despacho la solicitud de autorización para adelantar la respectiva adición presupuestal, en atención a lo expuesto en el Acta de Comité Técnico celebrada el 19 de junio de 2025, la cual se adjunta como soporte técnico y factual de la presente solicitud. En ella se indica que se identificaron condiciones topográficas y de drenaje no previstas en la etapa de estudios y diseños, especialmente en el tramo del sector Eliecer, donde se evidenciaron pendientes pronunciadas, acumulación de aguas superficiales y riesgo de socavación, factores que, de no ser atendidos, comprometerían la estabilidad, funcionalidad y vida útil de la infraestructura. Así mismo, se recibieron solicitudes reiteradas de la comunidad, expresadas durante visitas de supervisión, respecto a la necesidad de asegurar la correcta conexión de la vía mejorada con zonas productivas y habitadas que aún presentan tramos críticos, lo que podría generar inconformidades y riesgos sociales si no se ejecutan los ajustes pertinentes para garantizar una solución integral y funcional. Por tal razón, el Comité Técnico determinó que se requieren intervenciones adicionales para garantizar la estabilidad estructural, correcta evacuación de aguas y la funcionalidad de la obra contratada. Dichas actividades se traducen en partidas nuevas y ajustes técnicos que no alteran el objeto contractual, sino que permiten su cabal cumplimiento, en coherencia con los principios de planeación y responsabilidad de la administración pública. Es importante destacar que la fuente de financiación de la adición proviene exclusivamente de recursos propios del Municipio de San Francisco, Cundinamarca, apropiados y disponibles dentro del presupuesto vigente, sin comprometer ni modificar los aportes del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU, establecidos mediante los Convenios Interadministrativos Nos. ICCU 541-2024 y ICCU 551-2024, vigentes hasta el 16 de septiembre de 2025. En consecuencia, no resulta procedente modificar dichos convenios, ya que la adición no afecta la cofinanciación convenida ni altera los compromisos asumidos con el ICCU. El Contrato de Obra No. SAMC-OP-003-2025 mantiene su plazo de ejecución hasta el 21 de julio de 2025, contando aún con tiempo suficiente para ejecutar las actividades complementarias sin exceder la fecha de vencimiento. Por tanto, no es necesario prorrogar el contrato, dado que las partes consideran que la adición y los trabajos que ella implica se realizarán dentro del plazo de ejecución contractual actual resulta suficiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual permite modificar los contratos cuando se presenten circunstancias imprevistas que exijan adicionar valores o cantidades de obra para garantizar la ejecución completa del objeto. En este sentido, el contratista presentó el presupuesto detallado de ejecución de las actividades complementarias y el cronograma ajustado, confirmando expresamente que no se requiere ampliación del plazo, toda vez que el tiempo restante es suficiente para culminar la obra con los ajustes necesarios, de acuerdo con la disponibilidad de persona, bienes y recursos ofrecidos. De igual forma, el artículo 2, numeral 4, literal d) de la Ley 1150 de 2007, establece que procede la modificación de contratos estatales para ajustar valores o cantidades de obra siempre que se cumplan causas objetivas y debidamente justificadas, como ocurre en este caso conforme a lo documentado en el acta técnica. Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 (artículo 2.2.1.2.2.4.1 y siguientes) reglamenta la posibilidad de realizar adiciones presupuestales dentro de los límites legales (máximo 50% del valor inicial), límite que no se excede con la adición propuesta, la cual corresponde solo al 15% del valor inicial, es decir, $30.000.000 M/CTE. (…)* **2.** Que la presente adición no supera el 50% del valor inicial del contrato y se encuentra soportada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda N°DIS-2025000293 de 19 de junio de 2025. **3.** Que según justificación del supervisor a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del contrato de obra y se ha desarrollado la ejecución del mismo en el marco de lo establecido de las condiciones contractuales. Por lo anteriormente expuesto, las partes de común acuerdo proceden a modificar el contrato de obra No. SAMC-OP-003-2025 adicionado el valor del mismo, de la siguiente manera: **CLAUSULA PRIMERA**: Modificar la cláusula quinta que establece el valor del contrato, la cual quedará así: **CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO.** El valor total del Contrato de obra incluida la adición es por la suma de **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($229.999.834)** M/CTE equivalentes a 210,74 SMLMV para el año de celebración del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	2,13	INVIAS 600	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	$ 80.720	$ 708.721,60
2	4,6	INVIAS 630	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,98	$ 1.024.201,08	$ 32.753.950,54
3	4,26	INVIAS 630	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,80	$ 697.569,04	$ 15.207.005,07
4	4,21	INVIAS 671	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	$ 851.644,22	$ 16.658.160,94
5	4,52	INVIAS 640	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3319,23	$ 10.445,82	$ 34.672.079,12
SUBTOTAL OBRAS								**$ 99.999.917,27**
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024								
1	2,13	INVIAS 600	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	$ 80.720	$ 708.721,60
2	4,6	INVIAS 630	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,98	$ 1.024.201,08	$ 32.753.950,54
3	4,26	INVIAS 630	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,80	$ 697.569,04	$ 15.207.005,07
4	4,21	INVIAS 671	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	$ 851.644,22	$ 16.658.160,94
5	4,52	INVIAS 640	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3319,23	$ 10.445,82	$ 34.672.079,12
SUBTOTAL OBRAS								**$ 99.999.917,27**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$199.999.834,54**
AJUSTE	**-$ 0,54**
VALOR TOTAL	**$199.999.834**

PRESUPUESTO ADICIONADO								
Nº	ITEM DE PAGO	GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,13	INVIAS 600	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,02	$ 80.720,00	$ 1.616.416,04
2	4,6	INVIAS 630	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	9,99	$ 1.024.201,08	$ 10.231.768,79
3	4,26	INVIAS 630	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	6,35	$ 697.569,04	$ 4.429.563,40
4	4,21	INVIAS 671	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	5,38	$ 851.644,22	$ 4.581.845,90
5	4,52	INVIAS 640	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	875,03	$ 10.445,82	$ 9.140.405,87
							Subtotal	**$ 30.000.000,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 30.000.000,00**
AJUSTE	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 30.000.000,00**

Nota: El valor total del presupuesto ya incluye los valores correspondientes a AIU, los cuales se discriminan en un treinta y tres (33%) por ciento de acuerdo al Presupuesto Oficial. Nota: El contratista deberá asumir los descuentos Nacionales, Municipales a los que haya lugar incluyendo el 5% de contribución especial de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006. Los ítems anteriormente mencionados, deben ser ejecutados teniendo en cuentas las especificaciones técnicas de referencia en las que se basa la Cartilla de precios del Instituto de infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU – 2024. No conformidad: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. El presupuesto derivado para el presente proceso es la conformación de los dos presupuestos contenidos en los convenios derivados para cada sector a contratar en la vereda San Miguel, dicho lo anterior es necesario plasmar los presupuestos por sector para especificar las cantidades y el valor que se destinara a cada uno de los sectores. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. **CLAUSULA SEGUNDA.** Las demás cláusulas del Contrato, no presentan modificación y su exigibilidad permanece inteligible. **CLAUSULA TERCERA**: Este modificatorio queda perfeccionado con la firma de las partes. **CLAUSULA CUARTA:** El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento conforme a la presente adición, la cual deberá ser presentada a la supervisión para su respectiva aprobación.

Para constancia, se firma en el Municipio de San Francisco Cundinamarca, el primer (01) día del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

CARLOS HERNAN ROCHA ALVARADO
Secretario General y de Gobierno
Decreto 010 de 03 de enero 2025

INTERCONDI SAS
NIT 901.199.491-6
R/L David Ricardo Rodríguez Buitrago
C.C. No. 1.020.797

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE SALES
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

PAGINA: 1 DE 1

FECHA ACTA: 16 / 7 / 2025

OBJETO: (i) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (ii) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024

CONTRATO: SAMC-OP-003-2025

ELABORO: ING DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONTRATISTA: INTERCONDI SAS — NIT 901.199.491-6
SUPERVISION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO — NIT 899.999.173-5
SUPERVISOR: ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
ACTA No.: FINAL

VALOR CONTRACTUAL:	$ 199.999.834,00
ADICION:	$ 30.000.000,00
VALOR CONTRATO + ADICION:	$ 229.999.834,00
VALOR ACTA PARCIAL 1:	$ -
VALOR EJECUTADO:	$ 229.999.834,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL:	$ 229.999.834,00
SALDO A FAVOR ENTIDAD:	$ -
FECHA ACTA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA ACTA DE MODIFICATORIO No. 1:	01 DE JULIO DE 2025
FECHA ADICION:	01 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1:	N/A
FECHA REINICIO:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACION CONTRATO:	21 DE JULIO DE 2025

							CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES MODIFICADAS			ACTA FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES / MENORES	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024																		
1	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	$ 80.720,00	$ 708.721,60	+	0,92	$ 74.503,22	9,70	$ 783.224,82			0%
2	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,98	$ 1.024.201,08	$ 32.753.950,54	-	-0,56	-$ 573.552,60	31,42	$ 32.180.397,93			0%
3	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,80	$ 697.569,04	$ 15.207.005,07	+	6,12	$ 4.269.122,52	27,92	$ 19.476.127,60			0%
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	$ 851.644,22	$ 16.658.160,94	-	-1,75	-$ 1.490.377,39	17,81	$ 15.167.783,56			0%
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3319,23	$ 10.445,82	$ 34.672.079,12	-	-218,24	-$ 2.279.695,76	3.100,99	$ 32.392.383,36			0%
					Subtotal	$ 99.999.917,27					$ 99.999.917,27		$ -	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024																		
1	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,78	$ 80.720,00	$ 708.721,60	+	1,46	$ 118.078,04	10,24	$ 826.799,64			0%
2	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,98	$ 1.024.201,08	$ 32.753.950,54	-	0,83	$ 850.086,90	32,81	$ 33.604.037,43			0%
3	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,80	$ 697.569,04	$ 15.207.005,07	-	0,27	$ 188.343,64	22,07	$ 15.395.348,71			0%
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	$ 851.644,22	$ 16.658.160,94	-	-1,01	-$ 860.160,66	18,55	$ 15.798.000,28			0%
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3319,23	$ 10.445,82	$ 34.672.079,12	-	-28,37	-$ 296.347,91	3.290,86	$ 34.375.731,21			0%
					Subtotal	$ 99.999.917,27					$ 99.999.917,27		$ -	
ADICION CON RECURSOS PROPIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA																		
1	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,02	$ 80.720,00	$ 1.616.416,04	+	-14,00	-$ 1.129.930,15	6,02	$ 486.084,25			0%
2	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	9,99	$ 1.024.201,08	$ 10.231.768,79	-	-0,09	-$ 92.178,10	9,90	$ 10.139.590,69			0%
3	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	6,35	$ 697.569,04	$ 4.429.563,40	-	0,23	$ 160.440,88	6,58	$ 4.590.004,28			0%
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	5,38	$ 851.644,22	$ 4.581.845,90	-	-0,20	-$ 170.328,84	5,18	$ 4.411.517,06			0%
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	875,03	$ 10.445,82	$ 9.140.405,87	+	117,98	$ 1.232.397,84	993,01	$ 10.372.803,72			0%
					Subtotal	$ 30.000.000,00					$ 30.000.000,00		$ -	
					ajuste al peso	-$ 0,54					-$ 0,54			
					SUBTOTAL OBRAS	$ 229.999.834,00					$ 229.999.834,00		$ -	

SUBTOTAL OBRAS	$ 229.999.834,00
VALOR TOTAL	$ 229.999.834,00

	$ 229.999.834,00		
	$ 229.999.834,00		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL: **DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	$ 229.999.834,00	100%
SALDO A FAVOR /SALDO SIN EJECUTAR	$ -	0%
VALOR ACTAS PARCIALES / VALOR CANCELADO A LA FECHA	$ -	0%

INTERCONDI SAS
R.L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONTRATISTA

SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
ING SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS
SUPERVISOR MUNICIPAL

Anexo 4. PMT

VÍA CERRADA
PLACA HUELLA SECTOR ELIECER

- CONTRATO: SAMC-OP-003-2025
- CONTRATISTA: INTERCONDI SAS
- CONTACTO: 3107627024

- TIEMPO DE EJECUCIÓN: **15 DÍAS**
- TIEMPO DE CURADO CONCRETO: **28 DÍAS**
- TIEMPO TOTAL: **45 DÍAS (MES Y MEDIO)**



CUADRO DE CONVENCIONES

- SECTOR ELIECER **VIA CERRADA**
- VÍA ALTERNA 1: LA FRONTERA – ALTO DE LA VIRGEN HACIA SAN MIGUEL Y ALTO DE TORIBA
- VÍA ALTERNA 2: PIEDRA DE LOS NOVIOS – ALTO DE TORIBA

INICIO DE LAS OBRAS:
21 DE MAYO DE 2025

¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN!

VÍA CERRADA
PLACA HUELLA SECTOR LA ESCUELA

- CONTRATO: SAMC-OP-003-2025
- CONTRATISTA: INTERCONDI SAS
- CONTACTO: 3107627024

- TIEMPO DE EJECUCIÓN: **15 DÍAS**
- TIEMPO DE CURADO CONCRETO: **28 DÍAS**
- TIEMPO TOTAL: **45 DÍAS (MES Y MEDIO)**



CUADRO DE CONVENCIONES

- SECTOR LA ESCUELA **VIA CERRADA**
- VÍA ALTERNA 1: LA FRONTERA – ALTO DE LA VIRGEN HACIA SAN MIGUEL Y ALTO DE TORIBA
- VÍA ALTERNA 2: PIEDRA DE LOS NOVIOS – ALTO DE TORIBA

INICIO DE LAS OBRAS:
10 DE JUNIO DE 2025

¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN!

Anexo 5. Diseño de mezcla

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá, 22 de abril de 2025
Ref. DPD - 0797 - 25

Empresa
INTERCONDI SAS – R.L. ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

Obra: (I) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024."

San Francisco- Cundinamarca

Asunto: Diseño de mezcla de Concreto

Estimado ingeniero:

El siguiente informe consta de ocho páginas y contiene los resultados de los ensayos de laboratorio para la caracterización física de agregados procedentes de la obra de la referencia. A partir de los resultados obtenidos se dosificaron dichos materiales para una mezcla de concreto de 211 kg/cm^2 (3000 PSI). Las muestras fueron tomadas y enviadas por ustedes a nuestro laboratorio.

RESULTADOS

1. MATERIALES EMPLEADOS

- Cemento TEQUENDAMA tipo ART
- Arena de río planta (HONDA-CAMBAO)
- Grava tamaño máximo 25 mm (MOSQUERA)
- Agua

1.1. CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS AGREGADOS

1.1.1. Granulometría: Ver gráficos anexos.

Variables	Arena	Grava
Módulo de finura:	2,92	-----
Tamaño máximo mm:	-----	25
Tamaño máximo nominal mm:	-----	25
Contenido de materia orgánica (ensayo colorimétrico):	1	-----
Absorción %:	1,61	5,06
Densidad aparente (g/cm^3):	2,61	2,34
Densidad sss (g/cm^3):	2,65	2,46
Densidad nominal (g/cm^3):	2,73	2,65
Masa unitaria suelta sss (kg/m^3):	1510	1444
Masa unitaria apisonada sss (kg/m^3):	1660	1560

1.2. CARACTERISTICAS FISICAS DEL CEMENTO TEQUENDAMA tipo ART

1.2.1. Densidad (g/cm^3): 2,883
1.2.2. Finura Blaine (cm^2/g): 5071

2. RESISTENCIA DE DISEÑO

Las proporciones para el diseño de mezcla se hicieron según los requerimientos descritos en el capítulo C5, tabla C.5.3.2.2 NSR-10 (NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMORESISTENTE).

Resistencia promedio requerida a la compresión cuando no hay datos que permitan determinar la desviación estándar.

RESISTENCIA A 28 DIAS (f'c)

21 MPa ≤ f´c ≤ 35 MPa f´cr = f´c + 8,3 Mpa

2.1. PROPORCIONES DE LOS MATERIALES EN CONDICION SSS

2.1.1. Por metro cúbico de concreto

	EN MASA	EN VOLUMEN
- Cemento	395,0 kg	7 bultos de 42,5 kg
- Arena	882,0 kg	0,584 m^3
- Grava fina	817,0 kg	0,566 m^3
- Agua	-----	196,0 litros

2.1.2. Por bulto de cemento de 42,5 kg

	EN MASA	EN VOLUMEN
- Cemento	42,5 kg	1,0 bultos
- Arena	112,0 kg	74,0 litros
- Grava fina	103,0 kg	72,0 litros
- Agua	-----	24,8 litros

2.1.3. Proporciones en masa: 1 : 2,2 : 2,1

En caso que se decida producir el concreto dosificado en volumen, para medir las cantidades de material se podrán utilizar baldes negros para concreto con la siguiente dosificación:

- Cemento: 1 bulto
- Arena: 12 baldes de construcción
- Grava: 10 baldes de construcción

Se mezclará 1 bulto de cemento TEQUENDAMA tipo ART de 42,5 kg, 12 baldes de construcción llenos rasos de arena, 10 baldes de construcción llenos rasos de grava y aproximadamente 24,8 litros de agua.

NOTAS:

1. Se deben elaborar cilindros de prueba para establecer el grado de control en la producción del concreto en obra.

2. **Ajustes al agua de mezclado:**

   Teniendo en cuenta que la humedad de absorción no hace parte del agua de mezclado se deben realizar los siguientes ajustes:

   2.1. Cuando la humedad natural es mayor que la absorción (Agua libre).

   El agua de mezclado se debe disminuir en una cantidad igual al agua libre que contengan los agregados.

   2.2. Cuando la humedad natural es menor que la absorción.

   El agua de mezclado se debe incrementar en una cantidad igual a la diferencia entre la humedad natural y la absorción.

3. **Ajuste a la masa de los agregados:**

   Como la condición de diseño considera la masa de los agregados en estado sss, se deben realizar los ajustes para una condición de humedad diferente así:

   3.1. Cuando la humedad natural es mayor que la absorción (Agua libre).

   La masa de los agregados se debe incrementar en una cantidad igual a la masa del agua libre.

   3.2. Cuando la humedad natural es menor que la absorción.

   La masa del agregado se debe disminuir en una cantidad igual a la diferencia entre la absorción y la humedad natural.

Los ensayos se realizaron según los procedimientos descritos en las normas técnicas NTC 33, NTC 221, NTC 3674, NTC 77, NTC 78, NTC 176, NTC 237, NTC 92 y NTC 127.

Los resultados de los ensayos corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Gustosamente suministraremos cualquier información al contenido del presente informe.

Atentamente,

FRANCISCO DIAZ
COORD. DIV. DE PATOLOGÍA Y DISEÑOS

ING. HOLMAN A. ARIAS C.
DIVISION DE PATOLOGÍA Y DISEÑOS


Lab. Leonardo Guerra M.
OTP 30882

Concrelab MEDICIÓN CONFIABLE	INFORME ENSAYO DE PATOLOGÍA - AGREGADOS ANALISIS GRANULOMETRICO *NTC 77- 2007 NTC 78-1995*	F-272 Actualización 2020-12-05

Cliente	**INTERCONDI SAS**	Referencia: **DPD - 0797 - 25**
Obra	**(I) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024."**	Laboratorista: Leonardo Guerra M
Descripción	**Arena de río (HONDA-CAMBAO)**	Fecha ensayo: **15/04/2025**
Cantera		Ingeniero: **H. ARIAS**
Especificación	***ASTM C 33 - NTC 174***	Página: **6 de 8**

Masa Inicial Seca g	**1527,6**	**Masa Final g**	**1527,4**	**Masa Seca después de Lavado g**	**1481,5**	**LIMITES**	
						SUPERIOR	**INFERIOR**
tamiz	**mm.**	**masa ret. g**	**%ret.**	**% acum.**	**% que pasa**		
2	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
11/2"	37,5	0,0	0,0	0,0	100,0		
1"	25,00	0,0	0,0	0,0	100,0		
3/4"	19,00	0,0	0,0	0,0	100,0		
1/2"	12,50	0,0	0,0	0,0	100,0		
3/8"	9,51	45,9	3,0	3,0	97,0	100	100
4	4,75	46,5	3,0	6,0	94,0	100	95
8	2,36	95,4	6,2	12,3	87,7	100	80
16	1,18	250,6	16,4	28,7	71,3	85	50
30	0,60	517,0	33,8	62,6	37,4	60	25
50	0,30	344,4	22,5	85,1	14,9	30	10
100	0,15	142,3	9,3	94,4	5,6	10	2
200	0,075	36,9	2,4	96,8	3,2		
	Fondo	48,4	3,2	100,0			
	TOTAL	1527,4	100,0				
MÓDULO DE FINURA		***2,92***					

TAMICES "US STANDARD"

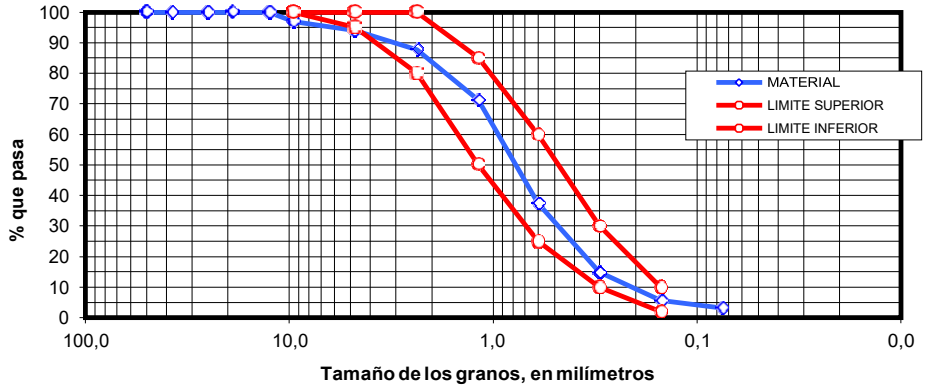

Atentamente,

FRANCISCO DÍAZ
COORD. DIV. DE PATOLOGIA Y DISEÑOS

ING. HOLMAN A. ARIAS C.
DIVISIÓN DE PATOLOGÍA Y DISEÑOS

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2005 09-LAB-001

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo


El Laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la División de Patología y Diseños

Concrelab MEDICIÓN CONFIABLE	INFORME ENSAYO DE PATOLOGÍA - AGREGADOS ANALISIS GRANULOMETRICO *NTC 77- 2007 NTC 78-1995*	F-272 Actualización 2020-12-05

Cliente	**INTERCONDI SAS**	Referencia: **DPD - 0797 - 25**
Obra	**(I) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024."**	Laboratorista: Leonardo Guerra M
Descripción	**Arena de río (HONDA-CAMBAO)**	Fecha ensayo: **15/04/2025**
Cantera		Ingeniero: **H. ARIAS**
Especificación	***ASTM C 33 - NTC 174***	Página: **7 de 8**

Masa Inicial seca g	**10096**	**Masa Final g**	**10094,2**	**Masa seca después de lavado g**	**10026**	**LIMITES**	
						SUPERIOR	**INFERIOR**
tamiz	**mm.**	**masa ret.**	**%ret.**	**% acum.**	**% que pasa**		
21/2"	63,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
2"	50,00	0,0	0,0	0,0	100,0		
11/2"	37,50	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
1"	25,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100	90
3/4"	19,00	3944,0	39,1	39,1	60,9	85	40
1/2"	12,50	3864,0	38,3	77,4	22,6	40	10
3/8"	9,50	1312,0	13,0	90,3	9,7	15	0
4	4,75	856,0	8,5	98,8	1,2	5	0
8	2,36	0,0	0,0	98,8	1,2		
16	1,18	8,0	0,1	98,9	1,1		
200	0,075	40,0	0,4	99,3	0,7		
	Fondo	70,2	0,7	100,0			
	TOTAL	10094,2	100,0				

TAMICES "US STANDARD"

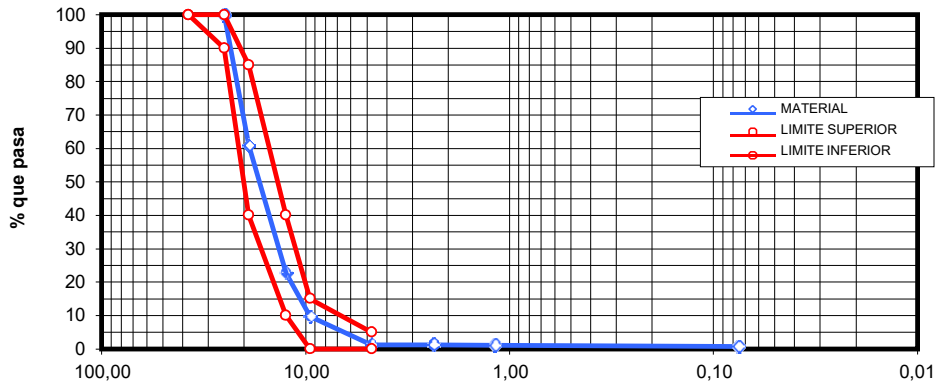

Tamaño de los granos, en milímetros

Atentamente,

FRANCISCO DÍAZ
COORD. DIV. DE PATOLOGIA Y DISEÑOS

ING. HOLMAN A. ARIAS C.
DIVISION DE PATOLOGÍA Y DISEÑOS

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2005 O9-LAB-001

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo


El Laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la División de Patología y Diseños

Concrelab MEDICIÓN CONFIABLE	INFORME DE ENSAYOS DE PATOLOGÍA - AGREGADOS COMBINACIÓN IDEAL DE AGREGADOS PARA DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	F-286 Actualización 2020-12-05

Cliente	**INTERCONDI SAS**	Referencia: **DPD - 0797 - 25**
Obra	**(I) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL**	Laboratorista: Leonardo Guerra M
Descripción	**Combinación 50% Grava - 50% Arena**	Fecha ensayo: **15/04/2025**
CONSOMUESTRA	**OTP 30556**	Ingeniero: **H. ARIAS**
		Página: **8 de 8**

LIMITES GRANULOMETRICOS

ABERTURA DE TAMIZ (mm)	% PASA METODO FULLER-THOMSOM		% PASA		%PASA COMBINADO 50%G - 50%A
	MINIMO	MAXIMO	GRAVA	ARENA	
76,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
50,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
38,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19,1	86,0	90,8	60,9	100,0	80,5
12,7	68,3	78,5	22,6	100,0	61,3
9,51	58,7	71,3	9,7	97,0	53,3
4,76	40,3	56,1	1,2	94,0	47,6
2,38	27,6	44,0	1,2	87,7	44,4
1,19	18,8	34,5	1,1	71,3	36,2
0,595	12,9	27,1	1,1	37,4	19,3
0,297	8,8	21,3	1,1	14,9	8,0
0,149	6,0	16,7	1,1	5,6	3,3
0,075	4,1	13,1	0,7	3,2	2,0

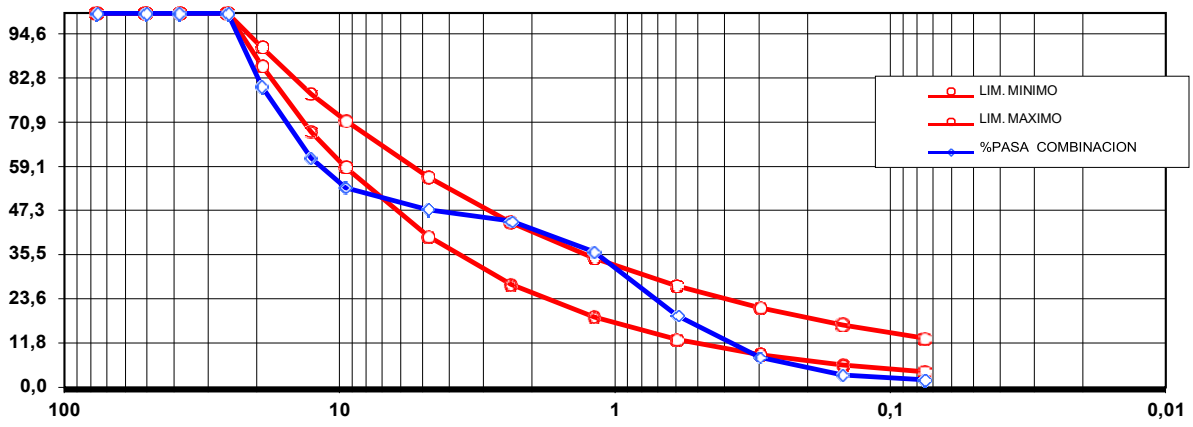

Atentamente,

FRANCISCO DÍAZ
COORD. DIV. DE PATOLOGIA Y DISEÑOS

ING. HOLMAN A. ARIAS C.
DIVISIÓN DE PATOLOGÍA Y DISEÑOS

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2005 O9-LAB-001

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo

El Laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la División de Patología y Diseños

Anexo 6. Ensayos de laboratorio

GEOPAV LTDA. LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO	ORDEN DE TRABAJO
GL-F-41-a V.03 FECHA: 04/06/24	NORMA(S) APLICADA(S): INV. E - 410 - 07 NTC 673 - 396	0819 - 3705 - 25
		Página 1 de 3

Proyecto: (I) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024."

Firma Constructora: INTERCONDI S.A.S.
Solicitante: INTERCONDI S.A.S. NIT: 901.199.491-6
Director de Obra: **Edgar Villate**
Fecha Entrega: 17-Julio de 2025

SECTOR LA ESCUELA

Número		Localización	Fecha		Edad	Slump	f'-psi	Resistencia			Falla Tipo	% Resist.
Lab.	Obra	Concreto en la Obra	Fundida	Rotura	Días	Pulg.		psi	kg/cm²	MPa		
1	HUELLAS	Tramo 1Abscisa Ko+030	9-jun-25	16-jun-25	7		3.000,00	2449	171,43	16,89	c	81,63%
2		Tramo 1Abscisa Ko+030	9-jun-25	23-jun-25	14		3.000,00	2887	202,09	19,91	d	96,23%
3		Tramo 1Abscisa Ko+030	9-jun-25	7-jul-25	28		3.000,00	3300	231,00	22,76	c	110,00%
4	VIGAS RIOSTRAS	Tramo 1Abscisa Ko+030	9-jun-25	16-jun-25	7		3.000,00	2230	156,1	15,38	d	74,33%
5		Tramo 1Abscisa Ko+030	9-jun-25	23-jun-25	14		3.000,00	2809	196,63	19,37	b	93,63%
6		Tramo 1Abscisa Ko+030	9-jun-25	7-jul-25	28		3.000,00	3045	213,15	21,00	c	101,50%
7	CUNETAS	Tramo 1Abscisa Ko+030	12-jun-25	19-jun-25	7		3.000,00	2236	156,52	15,42	c	74,53%
8		Tramo 1Abscisa Ko+030	12-jun-25	26-jun-25	14		3.000,00	2801	196,07	19,32	c	93,37%
9		Tramo 1Abscisa Ko+030	12-jun-25	10-jul-25	28		3.000,00	3078	215,46	21,23	d	102,60%
10	HUELLAS	Tramo 2 Abscisa Ko+060	13-jun-25	20-jun-25	7		3.000,00	2449	171,43	16,89	d	81,63%
11		Tramo 2 Abscisa Ko+060	13-jun-25	27-jun-25	14		3.000,00	2887	202,09	19,91	c	96,23%
12		Tramo 2 Abscisa Ko+060	13-jun-25	11-jul-25	28		3.000,00	3211	224,77	22,14	c	107,03%
13	VIGAS RIOSTRAS	Tramo 2 Abscisa Ko+060	13-jun-25	20-jun-25	7		3.000,00	2398	167,86	16,54	c	79,93%
14		Tramo 2 Abscisa Ko+060	13-jun-25	27-jun-25	14		3.000,00	2916	204,12	20,11	c	97,20%
15		Tramo 2 Abscisa Ko+060	13-jun-25	11-jul-25	28		3.000,00	3123	218,61	21,54	b	104,10%
16	CUNETAS	Tramo 2 Abscisa Ko+060	16-jun-25	23-jun-25	7		3.000,00	2230	156,1	15,38	c	74,33%
17		Tramo 2 Abscisa Ko+060	16-jun-25	30-jun-25	14		3.000,00	2809	196,63	19,37	c	93,63%
18		Tramo 2 Abscisa Ko+060	16-jun-25	14-jul-25	28		3.000,00	3045	213,15	21,00	d	101,50%
19	HUELLAS	Tramo 3 Abscisa Ko+090	17-jun-25	24-jun-25	7		3.000,00	2502	175,14	17,26	b	83,40%
20		Tramo 3 Abscisa Ko+090	17-jun-25	1-jul-25	14		3.000,00	2876	201,32	19,83	d	95,87%
21		Tramo 3 Abscisa Ko+090	17-jun-25	15-jul-25	28		3.000,00	3098	216,86	21,37	b	103,27%
22	VIGAS RIOSTRAS	Tramo 3 Abscisa Ko+090	17-jun-25	24-jun-25	7		3.000,00	2467	172,69	17,01	c	82,23%
23		Tramo 3 Abscisa Ko+090	17-jun-25	1-jul-25	14		3.000,00	2889	202,23	19,92	c	96,30%
24		Tramo 3 Abscisa Ko+090	17-jun-25	15-jul-25	28		3.000,00	3286	230,02	22,66	c	109,53%
25	CUNETAS	Tramo 3 Abscisa Ko+090	20-jun-25	27-jun-25	7		3.000,00	2230	156,1	15,38	c	74,33%
26		Tramo 3 Abscisa Ko+090	20-jun-25	4-jul-25	14		3.000,00	2809	196,63	19,37	c	93,63%
27		Tramo 3 Abscisa Ko+090	20-jun-25	18-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-

Proyecto: (I) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024."

Firma Constructora: INTERCONDI S.A.S.
Solicitante: INTERCONDI S.A.S. NIT: 901.199.491-6
Director de Obra: Edgar Villate
Fecha Entrega: 16-Julio de 2025

SECTOR ELIECER


Número		Localización	Fecha		Edad	Slump	f'-psi	Resistencia			Falla Tipo	% Resist.
Lab.	Obra	Concreto en la Obra	Fundida	Rotura	Días	Pulg.		psi	kg/cm²	MPa		
1	HUELLAS	Tramo 1Abscisa Ko+030	21-jun-25	28-jun-25	7		3.000,00	2423	169,61	16,71	b	80,77%
2		Tramo 1Abscisa Ko+030	21-jun-25	5-jul-25	14		3.000,00	2880	201,6	19,86	d	96,00%
3		Tramo 1Abscisa Ko+030	21-jun-25	19-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
4	VIGAS RIOSTRAS	Tramo 1Abscisa Ko+030	21-jun-25	28-jun-25	7		3.000,00	2309	161,63	15,92	c	76,97%
5		Tramo 1Abscisa Ko+030	21-jun-25	5-jul-25	14		3.000,00	2825	197,75	19,48	c	94,17%
6		Tramo 1Abscisa Ko+030	21-jun-25	19-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
7	CUNETAS	Tramo 1Abscisa Ko+030	24-jun-25	1-jul-25	7		3.000,00	2236	156,52	15,42	c	74,53%
8		Tramo 1Abscisa Ko+030	24-jun-25	8-jul-25	14		3.000,00	2801	196,07	19,32	c	93,37%
9		Tramo 1Abscisa Ko+030	24-jun-25	22-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
10	HUELLAS	Tramo 2 Abscisa Ko+060	25-jun-25	2-jul-25	7		3.000,00	2512	175,84	17,32	b	83,73%
11		Tramo 2 Abscisa Ko+060	25-jun-25	9-jul-25	14		3.000,00	2861	200,27	19,73	c	95,37%
12		Tramo 2 Abscisa Ko+060	25-jun-25	23-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
13	VIGAS RIOSTRAS	Tramo 2 Abscisa Ko+060	25-jun-25	2-jul-25	7		3.000,00	2391	167,37	16,49	c	79,70%
14		Tramo 2 Abscisa Ko+060	25-jun-25	9-jul-25	14		3.000,00	2911	203,77	20,08	d	97,03%
15		Tramo 2 Abscisa Ko+060	25-jun-25	23-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
16	CUNETAS	Tramo 2 Abscisa Ko+060	28-jun-25	5-jul-25	7		3.000,00	2290	160,3	15,79	c	76,33%
17		Tramo 2 Abscisa Ko+060	28-jun-25	12-jul-25	14		3.000,00	2858	200,06	19,71	d	95,27%
18		Tramo 2 Abscisa Ko+060	28-jun-25	26-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
19	HUELLAS	Tramo 3 Abscisa Ko+090	29-jun-25	6-jul-25	7		3.000,00	2502	175,14	17,26	c	83,40%
20		Tramo 3 Abscisa Ko+090	29-jun-25	13-jul-25	14		3.000,00	2876	201,32	19,83	d	95,87%
21		Tramo 3 Abscisa Ko+090	29-jun-25	27-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
22	VIGAS RIOSTRAS	Tramo 3 Abscisa Ko+090	29-jun-25	6-jul-25	7		3.000,00	2497	174,79	17,22	c	83,23%
23		Tramo 3 Abscisa Ko+090	29-jun-25	13-jul-25	14		3.000,00	2905	203,35	20,03	b	96,83%
24		Tramo 3 Abscisa Ko+090	29-jun-25	27-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
25	CUNETAS	Tramo 3 Abscisa Ko+090	2-jul-25	9-jul-25	7		3.000,00	2230	156,1	15,38	c	74,33%
26		Tramo 3 Abscisa Ko+090	2-jul-25	16-jul-25	14		3.000,00	2809	196,63	19,37	d	93,63%
27		Tramo 3 Abscisa Ko+090	2-jul-25	30-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
28	HUELLAS	Tramo 4 Abscisa K0+120	3-jul-25	10-jul-25	7		3.000,00	2547	178,29	17,57	c	84,90%
29		Tramo 4 Abscisa K0+120	3-jul-25	17-jul-25	14		3.000,00	-	-	-		-
30		Tramo 4 Abscisa K0+120	3-jul-25	31-jul-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-
31	VIGAS RIOSTRAS	Tramo 4 Abscisa K0+120	3-jul-25	10-jul-25	7		3.000,00	2460	172,2	16,97	b	82,00%
32		Tramo 4 Abscisa K0+120	3-jul-25	17-jul-25	14		3.000,00	-	-	-	-	-
33		Tramo 4 Abscisa K0+120	3-jul-25	31-jul-25	28		3.000,00	-	-	-		-
34	CUNETAS	Tramo 4 Abscisa K0+120	6-jul-25	13-jul-25	7		3.000,00	2224	155,68	15,34	b	74,13%
35		Tramo 4 Abscisa K0+120	6-jul-25	21-jul-25	14		3.000,00	-	-	-	-	-
36		Tramo 4 Abscisa K0+120	6-jul-25	4-ago-25	28		3.000,00	-	-	-	-	-

GEOPAV LTDA. LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO	ORDEN DE TRABAJO
GL-F-41-a V.03 FECHA: 04/06/24	NORMA(S) APLICADA(S): INV. E - 410 - 07 NTC 673 - 396	0819 - 3705 - 25
		Página 3 de 3

Proyecto: (I) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024."

Firma Constructora: INTERCONDI S.A.S.
Solicitante: INTERCONDI S.A.S. NIT: 901.199.491-6
Director de Obra: **Edgar Villate**
Fecha Entrega: 16-Julio de 2025

TIPOS DE FALLA DE CILINDROS

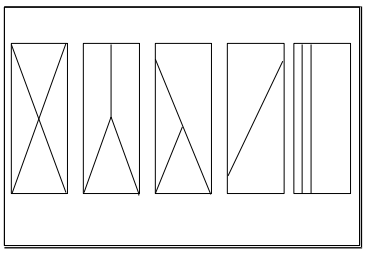

OBSERVACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Leonardo Guerra M.	Alida Guerra	
Laboratorista	Dep. Técnico	

Este informe no podrá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Laboratorios de Materiales y Control de Calidad Ltda.

Anexo 7. Certificado de calidad de los materiales

+ (57) 310 762 2024
Intercondisas@gmail.com

REPORTE DE CALIDAD DE PRODUCTO

Fecha: 26/05/2025	Versión: 6	Código: FR.CC.34	Página 1 de 4

MES: Mayo 2025

CEMENTO: ☐ **TIPO UG** ■ **TIPO ART**

REQUISITOS FÍSICOS-MÉCANICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN*	INCERTIDUMBRE	CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S
Finura Blaine, m^2/kg	NTC 33	No especifica	0,36	395
Densidad (g/cm^3)	NTC 221	No especifica	0,03	3,13
Finura Tamiz 45µm (No. 325). %	NTC 294	No especifica	0,4	98,4
Cambio de longitud por autoclave, %	NTC 107	Máximo 0,80	0,0066	0,016
Tiempo de fraguado inicial, no menos de, minutos	NTC 118	No menos de 45	8,17	155
Tiempo de fraguado inicial, no más de, minutos	NTC 118	No más de 420		
Tiempo de fraguado final, minutos	NTC 118	No especifica	3,48	211
Expansión de barra de mortero 14 días. %	NTC 4927	Máximo 0,020	0,002	0,007
Contenido de aire en volumen de mortero. %	NTC 224	Máximo 12,0	0,55	2,55
Resistencia a la compresión, a 1 día, MPa	NTC 220	Mínimo 11,0	0,52	18,3
Resistencia a la compresión, a 3 días, MPa		Mínimo 22,0	0,52	32,6
Resistencia a la compresión, a 7 días, MPa		No especifica	3,38	38,9
Resistencia a la compresión, a 28 días, MPa		No especifica	2,34	47,4

NTC: Norma Técnica Colombiana

Nota:

*Los requisitos físicos definidos en la norma NTC-121 , para cemento Tipo ART.

*Las condiciones ambientales estan controladas de acuerdo con las normas referenciadas en este informe.

***Los datos reportados corresponden al promedio mes de mayo**

*El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayo "PL.CC.01"

Fin del Informe



JEFE CONTROL DE CALIDAD

Nombre: Renán Jaimes

Email: rjaimes@cetesa.com.co

Tel. 6017420090 Ext. 2006

Vereda Chitiva, Abajo Finca La María

Suesca, Cundinamarca

CEMENTO HIDRÁULICO TIPO ART ALTAS RESISTENCIAS TEMPRANAS

1. Condiciones de almacenamiento adecuado:

- Se debe almacenar el cemento en Silos.
- Los Silos deben ser herméticos y sin ningún tipo de perforaciones o filtraciones.
- Deben estar separados del piso por lo menos 1,00 metros de la válvula para evitar contacto con la humedad del suelo.
- El tiempo de almacenamiento máximo es de 45 días.
- Se debe hacer un mantenimiento preventivo a los silos, al haber presencia de grumos, dificultad el descargue del cemento, el estado de las válvulas y el estado general cilindro del silo y sus componentes.
- Al momento de la recepción del camión granelero, verificar:
    - La remisión que lo acompaña entrega al trasportador
    - Los sellos de seguridad (precintos), ubicados en las válvulas y compuertas de cargue, que no presenten roturas o alteraciones.
    - Los seriales que identifican los sellos de seguridad. Si usted retira el producto de las instalaciones de la compañía, esta verificación debe realizarla antes de que el vehículo salga de nuestra planta de producción o centro de distribución.
- La ubicación de los Silos en los que se va a almacenar el producto debe contar con fácil acceso por parte de los camiones graneleros y cimentación calculada que evite la alteración de ésta por el peso de los camiones.

  Controlar la presurización al momento del descargue, teniendo despejados los dispositivos de ventilación y los ductos de desfogue.

Los filtros del silo que se usan para captar el polvo en el momento de descargue deben ser inspeccionados periódicamente, dejando evidencia física del mantenimiento realizado.

2. Manipulación:

- El transporte del cemento a granel siempre debe ser realizado en vehículos debidamente adaptados para tal fin, los cuales se conocen como Pipas o Cisternas.
- El descargue del cemento se realiza por medio de un equipo neumático y debe ser almacenado en Silos con un estricto cuidado, según recomendaciones de almacenamiento.

3. Manual de uso:

- Este producto, debe usarse bajo la supervisión de un profesional en la construcción y ser aplicado por una persona experta, debidamente certificada en la elaboración de mezclas con base en cemento.
- Para su correcto funcionamiento en mezclas de concreto, se deben atender todas las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 3318 "Producción de concreto" del ICONTEC.
- Para su correcto funcionamiento, en mezclas de mortero se deben atender todas las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana 3329 "Especificaciones del mortero en unidades de mampostería" del ICONTEC.
- Las Normas Técnicas Colombianas están disponibles para consulta en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. ICONTEC.

- Para uso en la construcción de estructuras, se debe cumplir con los requerimientos del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes NSR-10 y supervisado por un profesional de la construcción.
- Deben utilizarse agregados de alta calidad, libres de arcilla e impurezas en los tamaños adecuados (bien gradados) y que cumplan con las normas según su uso.
- Debe utilizarse una superficie limpia y no absorbente para realizar la mezcla.
- Mezclar los agregados y el cemento en seco, en las proporciones adecuadas hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Mezclar con la mínima cantidad necesaria de agua limpia para obtener el asentamiento o la fluidez requerida.
- Este producto debe ser utilizado antes de su fecha de vencimiento, la cual está plasmada en la remisión de producto.
- Los cementos alterados por envejecimiento, humedad, contaminación, etc. no deben ser utilizados.



4. Precauciones:

- Es indispensable el uso de guante, botas de látex, gafas de protección para los ojos y mascarilla protectora, para su manipulación.
- Se debe usar atendiendo las medidas de precaución señaladas, en especial, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos, no se debe aspirar y no es producto comestible.
- El uso de este producto sin las debidas medidas de protección (como las indicadas), puede producir efectos nocivos para la salud.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

5. Composición:

Este producto contiene: Clinker Portland, adiciones calcáreas y sulfato de calcio.

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Componentes	Porcentaje en peso	Número CAS	ACGIH TLV-TWA (mg/m3)
Clinker Portland	50 - 95	65997-15-1	1
Adiciones Calcáreas (Caliza)	0 - 20	471-34-1	10
Sulfato de Calcio (Yeso)	0 - 10	13397-24-5	10

Fuente: Hoja de datos de seguridad de cemento GI.CC.02

6. Garantía de Producto:

Este es un producto perecedero. De conformidad con lo establecido por la ley 1480 de 2011, el término de la garantía legal se extenderá, como máximo, a la fecha de vencimiento o expiración que se indica en la remisión. La garantía legal no aplica y queda sin efectos, si se realiza un uso indebido del cemento. Se entiende por uso indebido el no seguir las condiciones y recomendaciones descritas en este documento y que el producto se utilice después de la fecha de vencimiento. En todo caso, la garantía legal descrita, expirará en el momento en que el cemento se mezcle con cualquier otra sustancia.

Para cualquier reclamación, se requiere que el cliente acredite de forma satisfactoria y suficiente:

- Un comprobante de las condiciones de adquisición del producto.
- La remisión.
- Los soportes del correcto recibo, manipulación y aplicación del producto.
- Una muestra que contenga parte del producto objeto de reclamación. En todo caso, el cliente deberá presentar pruebas adecuadas y suficientes de que el producto es de Cementos Tequendama S.A.S., así como de la fecha y condiciones de adquisición de este.

La fecha de vencimiento del producto es de 45 días calendario, contados partir de la fecha de despacho.

Nota: Para más información consultar la hoja de seguridad de cemento.

Este producto ha sido fabricado en la planta de producción de Cementos Tequendama S.A.S.
Suesca, Cundinamarca.
Teléfono: 601 747 00 90

Servicio al cliente: servicliente@cetesa.com.co

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 073666

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 12/05/2025

CLIENTE	FERRELUGUE S.A.S	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	31488
		PLACA	SWK 962	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	31496
						FACTURA No.	103282

						ENSAYOS FÍSICOS				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 7	12	2402974	12	672	✓	474.3	605.7	15.6	1.28	0.27	1.10	0.01	0.014	0.18	0.01	0.01	0.02	0.020	0.00100	0.0105	0.46	2.929	1.410	15.080	72.7	3.260
R - No. 4	12	20243476	1	840	✓	472.1	618.3	16.0	1.31	0.27	1.17	0.0154	0.028	0.18	0.23	0.07	0.08	0.037	0.00095	0.0023	0.48	0.966	0.910	8.570	71.1	1.610
		20243474	4		✓	466.7	610.6	15.9	1.31	0.25	1.23	0.0158	0.032	0.19	0.18	0.06	0.08	0.026	0.00064	0.0022	0.47	0.965	0.920	8.570	71.1	1.610
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CONTROL CALIDAD

Enviado: principal@ferrelugue.com;ferrelugue@hotmail.com;anais_raquel@yahoo.es;inventarios@ferrelugue.com

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S**	Fecha Impresión	**25/05/26**	Informe N°:	
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**187131521**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2010808**	Página:	**1 de 8**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO.PAQ	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300827	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.07	0.23	0.017	0.013	0.036	0.019	0.01	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300826	2,056.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.07	0.23	0.017	0.013	0.036	0.019	0.01	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300819	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.07	0.23	0.017	0.013	0.036	0.019	0.01	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300815	2,048.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.07	0.23	0.017	0.013	0.036	0.019	0.01	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300816	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.07	0.23	0.017	0.013	0.036	0.019	0.01	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1296136	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.06	0.22	0.016	0.018	0.039	0.036	0.01	0.004	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294538	2,028.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.05	0.22	0.020	0.015	0.024	0.018	0.01	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BIDO306604	2,040.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.07	0.22	0.013	0.021	0.036	0.021	0.01	0.004	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300818	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.07	0.23	0.017	0.013	0.036	0.019	0.01	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612E	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.06	0.22	0.016	0.018	0.039	0.036	0.01	0.004	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612U	2,045.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.06	0.22	0.016	0.018	0.039	0.036	0.01	0.004	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129611W	2,041.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.06	0.22	0.016	0.018	0.039	0.036	0.01	0.004	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1254949	1,959.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.06	0.23	0.014	0.015	0.040	0.037	0.02	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294586	1,769.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.05	0.22	0.020	0.015	0.024	0.018	0.01	0.005	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1265702	2,055.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.06	0.23	0.014	0.014	0.035	0.021	0.01	0.005	0.008
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1258802	2,032.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	1.11	0.22	0.016	0.021	0.031	0.019	0.01	0.005	0.007

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S**	Fecha Impresión	**25/05/26**	Informe N°:	
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**187131521**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2010808**	Página:	**2 de 8**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO.PAQ	NORMA.PROD	FABRICANTE	% CE
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300827	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300826	2,056.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300819	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300815	2,048.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300816	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1296136	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294538	2,028.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BIDO306604	2,040.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300818	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612E	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612U	2,045.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129611W	2,041.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1254949	1,959.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294586	1,769.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1265702	2,055.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1258802	2,032.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.48

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S**	Fecha Impresión	**25/05/26**	Informe N°:	
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**187131521**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2010808**	Página:	**3 de 8**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO.PAQ	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2	Carga Fluencia N	Carga Tracción N
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300827	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	466	675	15.23	SinGrieta	1.45	71	33064	47880
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300826	2,056.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	466	675	15.23	SinGrieta	1.45	71	33064	47880
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300819	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	466	675	15.23	SinGrieta	1.45	71	33064	47880
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300815	2,048.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	466	675	15.23	SinGrieta	1.45	71	33064	47880
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300816	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	466	675	15.23	SinGrieta	1.45	71	33064	47880
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1296136	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	488	690	14.88	SinGrieta	1.41	71	34655	48960
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294538	2,028.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	691	14.77	SinGrieta	1.42	71	34540	49075
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BIDO306604	2,040.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	454	694	15.10	SinGrieta	1.53	71	32233	49308
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300818	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	466	675	15.23	SinGrieta	1.45	71	33064	47880
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612E	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	488	690	14.88	SinGrieta	1.41	71	34655	48960
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612U	2,045.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	488	690	14.88	SinGrieta	1.41	71	34655	48960
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129611W	2,041.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	488	690	14.88	SinGrieta	1.41	71	34655	48960
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1254949	1,959.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	490	684	15.17	SinGrieta	1.40	71	34767	48535
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294586	1,769.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	691	14.77	SinGrieta	1.42	71	34540	49075
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1265702	2,055.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	493	686	15.24	SinGrieta	1.39	71	35037	48711

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S**	Fecha Impresión	**25/05/26**	Informe N°:	
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**187131521**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2010808**	Página:	**4 de 8**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO.PAQ	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2	Carga Fluencia N	Carga Tracción N
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1258802	2,032.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	479	672	15.15	SinGrieta	1.40	71	33961	47728

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO.PAQ	NORMA.PROD	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300827	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300826	2,056.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300819	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300815	2,048.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300816	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1296136	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294538	2,028.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250212
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BIDO306604	2,040.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250212
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300818	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612E	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S**	Fecha Impresión	**25/05/26**	Informe N°:	
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**187131521**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2010808**	Página:	**5 de 8**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO.PAQ	NORMA.PROD	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612U	2,045.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129611W	2,041.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250211
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1254949	1,959.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250209
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294586	1,769.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250212
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1265702	2,055.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250208
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1258802	2,032.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	20250227

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S**	Fecha Impresión	**25/05/26**	Informe N°:	
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**187131521**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2010808**	Página:	**6 de 8**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO.PAQ	NORMA.PROD	FABRICANTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos
						mm	Kg/m	mm	mm
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300827	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.566	0.56	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300826	2,056.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.566	0.56	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300819	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.566	0.56	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300815	2,048.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.566	0.56	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300816	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.566	0.56	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1296136	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.9	0.564	0.65	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294538	2,028.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.9	0.563	0.52	2.0
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BIDO306604	2,040.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.9	0.560	0.58	1.8
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300818	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.566	0.56	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612E	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.9	0.564	0.65	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612U	2,045.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.9	0.564	0.65	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129611W	2,041.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.9	0.564	0.65	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1254949	1,959.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.568	0.55	2.2
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294586	1,769.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.9	0.563	0.52	2.0
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1265702	2,055.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.8	0.565	0.51	2.2
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1258802	2,032.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	5.8	0.553	0.55	2.3

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S**	Fecha Impresión	**25/05/26**	Informe N°:	
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**187131521**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2010808**	Página:	**7 de 8**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO.PAQ	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300827	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300826	2,056.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300819	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300815	2,048.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300816	2,051.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1296136	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	54
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294538	2,028.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BIDO306604	2,040.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1300818	2,049.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612E	2,057.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	54
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129612U	2,045.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	54
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID129611W	2,041.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	54
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1254949	1,959.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1294586	1,769.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1265702	2,055.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID1258802	2,032.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S**	Fecha Impresión	**25/05/26**	Informe N°:	
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**187131521**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2010808**	Página:	**8 de 8**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 2 Mpa
Alargamiento	± 0.53 %
Altura Resalte	± 0.006 mm
Separación entre extremos	± 0.026 mm
Espaciamiento	± 0.011 mm
Angulo de Resalte	± 0.5 °
Peso metro (masa)	± 0.11 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

CEMENTOS
TEQUENDAMA
Juntos construimos el sueño
de una Colombia mejor.



CEMENTO HIDRÁULICO
TIPO UG
Uso General
25 Kg - 50 Kg - 42,5 Kg - Granel

1 Descripción

El cemento de Uso General producido por Cementos Tequendama es ideal para elaborar todo tipo de elementos estructurales y no estructurales, tales como morteros, mampuestos, prefabricados y pisos.

Este cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 121 y NSR-10 "Especificación de desempeño para cemento hidráulico" en todos sus requerimientos como cemento tipo UG (Uso General). El cemento producido por Cementos Tequendama se fabrica a partir de la molienda del clinker producido internamente en la planta de producción, el cual se mezcla con yeso y otras adiciones minerales.

2 Condiciones de almacenamiento adecuado

Condiciones de almacenamiento a granel:

1. El cemento se debe almacenar en silos.
2. Los silos deben ser herméticos y sin ningún tipo de perforaciones o filtraciones.
3. Deben estar separados del piso por lo menos a 1 m de la válvula para evitar contacto con la humedad del suelo.
4. Se sugiere hacer mantenimiento preventivo de los silos, desocupándolos cada 12 semanas por completo para limpiar internamente; y cada 24 semanas un mantenimiento general.
5. Al momento de la recepción del camión granelero (pipas, cisternas), verificar la remisión que lo acompaña y los sellos de seguridad ubicados en las válvulas y compuertas.
6. Controlar la presurización del cemento en el momento del descargue teniendo despejados los dispositivos de ventilación y los ductos de desfogue.

Condiciones de almacenamiento en bultos:

1. **Se deben almacenar los bultos de cemento en un lugar cubierto.**
2. **No almacenar el cemento pegado a las paredes, en especial cuando existe problemas de filtraciones. Se debe dejar un espacio mínimo de 30 centímetros entre los arrumes de bultos de cemento y la pared del lugar de almacenamiento.**
3. **Verificar que el lugar de almacenamiento no tenga humedades, ni problemas por lluvias o manejo de agua.**



4. Hacer arrumes verticales de máximo 10 bultos.

5. Almacenar el cemento sobre estibas de madera o plásticas, a una altura de 10 centímetros del piso.

6. En climas con una humedad relativa alta, se deben cubrir con plástico los arrumes de bultos de cemento.

7. Apilar los sacos de cemento de tal forma que los que estén más cercanos a vencerse sean los primeros en utilizarse.

8. Se debe evitar que los sacos se expongan a corrientes de aire.

3 Manipulación

Manipulación del producto a granel:

Con el fin de garantizar la idoneidad, calidad y seguridad del producto, el traslado del cemento a granel siempre debe realizarse a través de un vehículo técnicamente adaptado para tal fin, como el camión granelero de cemento (pipas, cisternas).

La descarga del producto en el lugar de destino debe realizarse con un equipo neumático. El producto debe ser almacenado en un silo que esté adaptado para tal fin.

Manipulación del producto en bulto:

1. Para el traslado del cemento, levante el bulto no lo arrastre por el suelo.

2. Cuando se descargue el bulto de cemento, no lo deje caer desde una altura superior a 50 centímetros.

4 Responsabilidad medioambiental

Nuestro horno opera con una emisión garantizada de 30 mg/nm^3 permitidos por la Norma Colombiana, logrando así un impacto ambiental extremadamente bajo.

5 Especificaciones técnicas

Información de reporte de calidad de producto "diagramada", aclarando que la información es el resultado del último año de muestreo.

Nuestro cemento se caracteriza por:

- **Mayor manejabilidad**
- **Baja fisuración**
- **Menor retracción**
- **Durabilidad**
- **Altas resistencias**

Requisitos Físicos Mecánicos	Unidad	Método de ensayo	NTC 121	Cementos Tequendama
Cambio de longitud por autoclave	%	NTC 107	máx. 0,8	
Tiempo de fraguado inicial	Minutos	NTC 118	Inicial mayor que Inicial menor que	45 420
Expansión de barra de morteros 14 días	%	NTC 4927	máx. 0,02	
Contenido de aire en volumen de mortero	%	NTC 224	máx. 12	
Resistencia a la compresión a 3 días	MPa	NTC 220	mín. 8,0	mín. 11
Resistencia a la compresión a 7 días			mín. 15	
Resistencia a la compresión a 28 días			mín. 24	

6 Precauciones

1. Se debe evitar el contacto prolongado con la piel, evite el contacto con los ojos, en caso de contacto con los ojos lave con agua abundante y solicite asistencia médica inmediata.

2. No se debe aspirar. No es un producto comestible. En caso de ingerirse, aspirarse o tener contacto con los ojos, solicite asistencia médica inmediata y lleve el envase.

3. Es indispensable el uso de guantes, botas de látex, gafas de protección para los ojos y mascarilla protectora para su manipulación.

El uso de este producto sin las debidas medidas protección (como las indicadas), puede producir efectos nocivos para la salud.

4. Mantener fuera del alcance de los niños.



7 Manual de uso

Este producto debe usarse bajo la supervisión de un profesional en la construcción y ser aplicado por una persona experta, debidamente certificada en la elaboración de mezclas con base en cemento.

- Para su correcto funcionamiento en mezclas de concreto, se deben tener todas las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 3318 "Producción de concreto" de ICONTEC.
- Para su correcto funcionamiento en mezclas de mortero, se deben tener todas las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana 3329 "Especificaciones del mortero en unidades de mampostería" de ICONTEC.
- Para su uso en la construcción de estructuras, se debe cumplir con los requerimientos del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, (Decreto 925 del 19 de marzo de 2010, NRS de 2010 y supervisado por un profesional de la construcción).
- Se sugiere utilizar agregados de alta calidad, en los tamaños adecuados (bien gradados) y que cumplan con las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC - 174. Libres de arcilla e impurezas.
- Debe utilizarse una superficie limpia y no absorbente para realizar la mezcla.
- Mezclar los agregados y el cemento en seco, en las proporciones adecuadas de acuerdo al diseño teórico, hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Una vez sacado del sitio, se debe utilizar inmediatamente.
- Los cementos alterados por envejecimiento, humedad, contaminación, etc., producen concreto con problemas en su aplicación y desempeño.



8 Garantía de producto

Este es un producto perecedero de conformidad con lo establecido por la Ley 1430 de 2011.

El término de la garantía legal se extenderá como máximo 2 meses correspondientes a la fecha de vencimiento o expiración.

Cementos Tequendama responderá por el producto ensacado o a granel que presente grumos, siempre y cuando el cliente garantice y certifique que las condiciones de manejo y almacenamiento son las adecuadas, evitando que el producto esté en contacto con la lluvia y humedad del ambiente.

Para cualquier reclamación se requiere que el consumidor acredite un comprobante y las condiciones de adquisición del producto de forma satisfactoria y suficiente, presente copia de este documento y una muestra que contenga parte del producto objetivo de reclamación.

En caso de no contar con lo anterior, el consumidor deberá presentar pruebas adecuadas y suficientes de que el producto es de Cementos Tequendama S.A.S., así como de la fecha y condiciones de adquisición del mismo.

Fecha de vencimiento: 60 días a partir de la fecha de despacho

CEMENTOS
TEQUENDAMA
Juntos construimos el sueño de una Colombia mejor.

CEMENTO HIDRÁULICO
TIPO ART
Alta Resistencia Temprana
42,5 Kg - Granel

Apreciado cliente,
gracias por adquirir nuestro producto, a continuación encontrará las especificaciones técnicas y las condiciones de manipulación. Por su seguridad y para efectividad de la garantía, por favor léalas y sígalas atentamente.



1 Descripción

El cemento de Alta Resistencia Temprana es producido por Cementos Tequendama y cumple con las especificaciones Colombianas NTC 121, es ideal para elaborar concreto, prefabricados, pisos y todo tipo de elementos estructurales. Su proceso de producción inicia a partir de la fabricación de clinker y posterior molienda para así obtener un producto de acuerdo con las especificaciones colombianas.

2 Condiciones de almacenamiento adecuado

Condiciones de almacenamiento a granel:

1. El cemento se debe almacenar en silos.

2. Los silos deben ser herméticos y sin ningún tipo de perforaciones o filtraciones.

3. Deben estar separados del piso por lo menos a 1 m de la válvula para evitar contacto con la humedad del suelo.

4. Se sugiere hacer mantenimiento preventivo de los silos, desocupándolos por completo cada 12 semanas para limpiar internamente, y cada 24 semanas un mantenimiento general.

5. Al momento de la recepción del camión granelero (pipas, cisternas), verificar la remisión que lo acompaña y los sellos de seguridad ubicados en las válvulas y compuertas.

6. Controlar la presurización del cemento en el momento del descargue teniendo despejados los dispositivos de ventilación y los ductos de desfogue.

Condiciones de almacenamiento en bultos:

1. Se deben almacenar los bultos de cemento en un lugar cubierto.

2. No almacenar el cemento pegado a las paredes, en especial cuando existe problemas de filtraciones. Se debe dejar un espacio mínimo de 30 centímetros entre los arrumes de bultos de cemento y la pared del lugar de almacenamiento.

3. Verificar que el lugar de almacenamiento no tenga humedades, ni problemas por lluvias o manejo de agua.

4. Hacer arrumes verticales de máximo 10 bultos.

5. Almacenar el cemento sobre estibas de madera o plásticas, a una altura de 10 centímetros del piso.

6. En climas con una humedad relativa alta, se deben cubrir con plástico los arrumes de bultos de cemento.

7. Apilar los sacos de cemento de tal forma que los que estén más cercanos a vencerse sean los primeros en utilizarse.

8. Se debe evitar que los sacos se expongan a corrientes de aire.

3 Manipulación

Manipulación del producto a granel:

Con el fin de garantizar la idoneidad, calidad y seguridad del producto, el traslado del cemento a granel siempre debe realizarse a través de un vehículo técnicamente adaptado para tal fin, como el camión granelero de cemento (pipas, cisternas).

La descarga del producto en el lugar de destino debe realizarse con un equipo neumático. El producto debe ser almacenado en un silo que esté adaptado para tal fin.

Manipulación del producto en bulto:

1. Para el traslado del cemento, levante el bulto no lo arrastre por el suelo.

2. Cuando se descargue el bulto de cemento, no lo deje caer desde una altura superior a 50 centímetros.

4 Manual de uso

Este producto debe usarse bajo la supervisión de un profesional en la construcción y ser aplicado por una persona experta, debidamente certificada en la elaboración de mezclas con base en cemento.

• Para su correcto funcionamiento en mezclas de concreto, se deben tener todas las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 3318 “Producción de concreto” de ICONTEC.

• Para su correcto funcionamiento en mezclas de mortero, se deben tener todas las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana 3329 “Especificaciones del mortero en unidades de mampostería” de ICONTEC.

• Para su uso en la construcción de estructuras, se debe cumplir con los requerimientos del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, (Decreto 925 del 19 de marzo de 2010, NRS de 2010 y supervisado por un profesional de la construcción).

• Se sugiere utilizar agregados de alta calidad, en los tamaños adecuados (bien gradados) y que cumplan con las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC - 174. Libres de arcilla e impurezas.

• Debe utilizarse una superficie limpia y no absorbente para realizar la mezcla.

• Mezclar los agregados y el cemento en seco, en las proporciones adecuadas de acuerdo al diseño teórico, hasta conseguir una mezcla homogénea.

• Una vez sacado del sitio, se debe utilizar inmediatamente.

• Los cementos alterados por envejecimiento, humedad, contaminación, etc., producen concreto con problemas en su aplicación y desempeño.

Ahora 42.5 kg

5 Especificaciones técnicas

Información de reporte de calidad de producto “diagramada”, aclarando que la información es el resultado del último año de muestreo.

Nuestro cemento se caracteriza por:

- **Mayor manejabilidad**
- **Baja fisuración**
- **Menor retracción**
- **Durabilidad**
- **Altas resistencias**

Especificaciones Técnicas. Requisitos Físicos Mecánicos	Unidad	Método de ensayo	NTC 121	Cementos Tequendama
Cambio de longitud por autoclave	%	NTC 107	Máx. 0,8	
Tiempo de fraguado inicial	Minutos	NTC 118	Inicial mayor que Inicial menor que	45 420
Expansión de barra de mortero 14 días	%	NTC 4927	Máx. 0,02	
Contenido de aire en volumen de mortero	%	NTC 224	Máx. 12	
Resistencia a la compresión a 1 día	MPa	NTC 220	Mín. 11	Mín. 14
Resistencia a la compresión a 3 días			Mín. 22	Mín. 24

6 Responsabilidad medioambiental

Nuestro horno opera con una emisión garantizada de 30 mg/nm^3 permitidos por la Norma Colombiana, logrando así un impacto ambiental extremadamente bajo.

7 Precauciones

- Se debe evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evite el contacto con los ojos. En caso de haberlo hecho, lávelos con abundante agua y solicite asistencia médica inmediata.
- No se debe aspirar.
- No es un producto comestible. En caso de ingerir, solicite asistencia médica inmediata.
- Es indispensable el uso de guantes, botas de látex, gafas de protección y mascarilla protectora para su manipulación.
- El uso de este producto sin las debidas medidas de protección (indicadas anteriormente), puede producir efectos nocivos para la salud.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- Para cualquier reclamación se requiere que el consumidor acredite un comprobante y las condiciones de adquisición del producto de forma satisfactoria y suficiente, presente copia de este documento y una muestra que contenga parte del producto objetivo de reclamación.
- En caso de no contar con lo anterior, el consumidor deberá presentar pruebas adecuadas y suficientes de que el producto es de Cementos Tequendama S.A.S., así como de la fecha y condiciones de adquisición del mismo.



8 Garantía de producto

Este es un producto perecedero de conformidad con lo establecido por la Ley 1430 de 2011.

El término de la garantía legal se extenderá como máximo 2 meses correspondientes a la fecha de vencimiento o expiración.

Cementos Tequendama responderá por el producto ensacado o a granel que presente grumos, siempre y cuando el cliente garantice y certifique que las condiciones de manejo y almacenamiento son las adecuadas, evitando que el producto esté en contacto con la lluvia y humedad del ambiente.

Para cualquier reclamación se requiere que el consumidor acredite un comprobante y las condiciones de adquisición del producto de forma satisfactoria y suficiente, presente copia de este documento y una muestra que contenga parte del producto objetivo de reclamación.

En caso de no contar con lo anterior, el consumidor deberá presentar pruebas adecuadas y suficientes de que el producto es de Cementos Tequendama S.A.S., así como de la fecha y condiciones de adquisición del mismo.





Fecha de vencimiento: 60 días a partir de la fecha de despacho

Anexo 8. Bitácora de obra

+ (57) 310 762 2024
Intercondisas@gmail.com


INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **22 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se da inicio al contrato de obra, y se reune el equipo profesional para realizar una inspecion visual del terreno del sector de la escuela.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **23 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la inspeccion visual del terreno de la escuela por parte de los profesionales del proyecto.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **24 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se presentan fuertes lluvias en la zona lo que imposibilita el desplazamiento del personal profesional de la obra.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **25 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuan lluvias en la zona lo que imposibilita el desplazamiento de los profesionales del proyecto.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **26 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Los profesionales del proyecto se reunen para trazar directrices de ejecucion del contrato.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **27 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA DOMINGO NO LABORABLE

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **28 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Lluvias torrenciales en el transcuros del día en la zona no permitieron el desplazamiento de los profesionales, por lo tanto no llevaron a cabo actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **29 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las lluvias se prolongan todo el dia lo que no permite realizar actividades propias del contrato.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **30 de abril de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las lluvias se prolongan todo el dia lo que no permite realizar actividades propias del contrato.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **01 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA FESTIVO NO LABORABLE

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **02 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

El personal profesional termina la inspeccion visual del sector de la escuela y se realiza registro fotografico del estado de la via.

Firma: David R.

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **03 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Lluvias torrenciales en el transcurso del dia no permiten llevar a cabo actividades de obra.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **04 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA DOMINGO NO LABORABLE

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **05 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fuertes lluvias en la zona durante todo el dia no permitieron realizar actividades propias de obra.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **06 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuan las lluvias esporadicas pero fuertes en la zona lo que no permitió realizar actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **07 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuan las lluvias en la zona lo que no permitió realizar actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **08 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuan las lluvias en la zona lo que no permitió realizar actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **09 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuan las lluvias en la zona lo que no permitió realizar actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **10 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizan actividades debido a amenaza de lluvias fuertes en la region.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **11 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA DOMINGO NO LABORABLE

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **12 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las condiciones climaticas no permitieron realizar actividades de obra en este dia.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **13 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Los profesionales del proyecto inician visita al sector de Eliecer, para determinar las condiciones iniciales de la via.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **14 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las condiciones climaticas impiden la movilizacion de los profesionales del proyecto, por lo tanto, este dia no se realizaron actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **15 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las condiciones climaticas impiden la movilizacion de los profesionales del proyecto, por lo tanto, este dia no se realizaron actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **16 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las condiciones climaticas impiden la movilizacion de los profesionales del proyecto, por lo tanto, este dia no se realizaron actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **17 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las condiciones climaticas impiden la movilizacion de los profesionales del proyecto, por lo tanto, este dia no se realizaron actividades.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **18 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA DOMINGO NO LABORABLE

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **19 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se presentan lluvias durante el transcurso de la jornada lo que impide la movilizacion a la zona de los profesionales del proyecto. En este dia no se realizaron actividades del proyecto.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **20 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Los profesionales del proyecto terminan la inspeccion a la via donde se ejecutará el proyecto y realizan registro fotografico del estado de la vía.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **21 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Los profesionales del proyecto terminan la inspeccion a la via donde se ejecutará el proyecto y realizan registro fotografico del estado de la vía.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **22 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reparten los volantes del cierre de las vias y se informa a la comunidad sobre los alcances del proyecto

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **23 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Los profesionales realizan mesa tecnica para definir las directrices de la construccion del tramo del sector Eliecer.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **24 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fuertes lluvias en la zona impiden realizar actividades del proyecto, por lo que no ejecutaron actividades este día.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **25 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA DOMINGO NO LABORABLE

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **26 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la contratacion del personal de obra de mano no calificada que hará parte del proyecto.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **27 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fuertes lluvias en la zona no permiten ejecutar actividades del proyecto en este día.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **28 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fuertes lluvias en la zona no permiten ejecutar actividades del proyecto en este día.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **29 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se comienza el acopio del material granular que se va a usar en la fundicion de las losas, las vigas riostras y las cunetas.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **30 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza el acopio del acero que se va usar en los refuerzos de los elementos de la placa huella. Se inicia el figurado de estos de acuerdo con los planos.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **31 de mayo de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con el figurado de acero requerido en los dos tramos del mejoramiento de la vía.

Firma: David R


Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **01 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA DOMINGO NO LABORABLE

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **02 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA FESTIVO NO LABORABLE

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: **03 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

llega un viaje de cemento marca Tequendama que se va usar en el proyecto. Se procede a almacenarlo de forma segura evitando daños por humedad. Se continua con el figurado de acero. En las horas de la tarde se presnetan lluvias esporadicas.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **04 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Arriva al sitio maquinaria amarilla que se usará en la excavacion y conformacion de la vía. Se continua con el figurado de acero.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **05 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se procede a realizar cierre de la via en el sector de la escuela. Se colocan avisos al inicio y al final del tramo intervenido. La maquinaria amarilla inicia trabajos de conformación. Se continua con el figurado de acero.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **06 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la colocacion del acero necesario para la construccion de las huellas y las vigas riostras de los primeros 10 metros de longitud. Ademas, se continua con el figurado de acero. La maquinaria amarilla continua trabajando.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **07 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la colocacion en sitio del acero y las formaletas para la fundicion del concreto. Se sigue con el figurado de acero. En total se formaletean 30 m lineales.

Firma: 


Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **08 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace ajustes al acero para los concretos reforzados de la via y se adecua el sitio para iniciar con la fundida de los 30 primeros metros de via. La maquinaria amarilla continua trabajos y el personal de figurado del acero continua trbajando.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: **09 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia con la fundicion de las placas de la vía. La mezcla de concreto se hace de acuerdo con el diseño de mezcla presentado. En total se funden 30 metros lineales incluyendo las vigas riostras.

Se toman muestras del concreto usado en obra para su posterior ensayo a la compresión.

Se continua con el figurado de acero y la colocacion en sitio de este. La maquinaria amarilla continua trabajando.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **10 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se procede a desencofrar los moldes de las placas huellas y las vigas riostras. Se observa que el concreto presenta buen estado y no presenta grietas.
El personal de figurado de acero continua labores. Se hace curado al concreto periodicamente.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **11 de junio de 2025**


DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia el fundido del concreto ciclópeo. Se instala las formaletas en sitio y se le agrega la piedra y el concreto respectivo. En total se completan 30 metros lineales de concreto ciclópeo.

Se inicia la colocacion en sitio y las formaletas para la fundicion de las cunetas.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: **12 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024


ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia con el fundido de la primera seccion de cunetas. Se procede a realizar la mezcla en las proporciones estipuladas en el diseño de mezcla y se verifica que el acero de refuerzo se encuentre bien colocado.

En total se funden 30 metros lineales de cunetas.

Se toman muestras de concreto para su posterior ensayo de compresión.

el personal de figurado de acero continua trabajando.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **13 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia con la fundicion de la segunda sección de huellas y vigas riostras.

Se toman muestras de concreto para su ensayo a la compresión.

En total se funden 30 metros lineales completando asi un total de 60 m lineales de via.

El personal de figurado del acero continua labores.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **14 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desencofra las formaletas de las placas huellas y de las vigas riostras y se procede a realizarle curado al concreto.

Se continua con el figurado de acero.

Se coloca las formaletas y la piedra necesarias para el concreto ciclópeo interno y externo.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **15 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la fundicion de la segunda seccion de los concretos ciclópeos internos y externos. En total se funden 30 metros lineales de via.

Se continua con el figurado de acero y las formaletas para las cunetas.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: **16 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA


NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se funde la segunda seccion de cunetas de la via. Se verifica que las proporciones de la mezcla este acorde con el diseño de mezcla y se procede a tomas 3 muestras del concreto para su posterior ensayo a la compresión.

Se completan 60 metros lineales de cunetas de la via.

Se continua con el figurado de acero.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **17 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace desencofrado de las cunetas y se procede a fundir la tercera seccion de huellas y vigas riostras.

En total se funden 38,20 metros lineales, completando así 98,20 metros de vía.

Se toman muestras del concreto usado en obra.

Firma: David R


Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **18 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se procede a desencofrar las formaletas, y se continua con el figurado de acero para las cunetas.



Firma:_____

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: **19 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025


DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia con la fundicion de La tercera y ultima seccion de concreto ciclopeo de la via. La actividad se termina de forma satisfactoria.

Se inicia con el formaleteo y colocacion del acero de refuerzo para las cunetas.



Firma:_____

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: **20 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA


NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza con la fundicion de la ultima seccion de cunetas. En total se funden 38,20 metros de cunetas en ambos lados de la via.

Se toman muestras de concreto de la mezcla usada en obra.

De esta forma se finaliza con las actividades en el sector de la Escuela.



Firma:_____

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **21 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la intervención en el sector Eliecer. Se procede a dar cierre temporal a esta via de acceso.
Se funden los primeros 30 metros lineales de huellas y vigas riostras.

Se toman muestras del concreto para su posterior ensayo.

Se continua con el figurado del acero para los elementos que conllevan refuerzo.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **22 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace el desencofrado de las formaletas y se colocan las piedras para el concreto ciclópeo.

Se continua con el figurado de acero.



Firma:_____

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **23 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace la fundicion de 30 m lineales de concreto ciclópeo.

Se instalan formaletas y se coloca el acero de refuerzo para las cunetas.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **24 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza el fundido de la primera seccion de cunetas en el sector Eliecer.

En total se funden 30 m lineales de cuentas con su respectivo acero de refuerzo.

Se toman 3 muestras de concreto para su ensayo a la compresión.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **25 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace el fundido de la segunda seccion de huellas y vigas riostras con su respectivo acero de refuerzo. Se funden 30 m para completar un total de 60 m lineales de via.

Se toman muestras de concreto de la mezcla utilizada.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **26 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza el desencofrado de las formaletas de la fundicion del dia anterior. Se procede a colocar la piedra para el concreto ciclópeo.

Se realiza el curado al concreto.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **27 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se funde el concreto ciclópeo interno y externo de las huellas ya construidas.

Se continua con el figurado de acero.

Se instala formaletas y acero para cunetas.

Firma: _____

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **28 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025


DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se construyen 30 m lineales de cunetas en ambos costados. Se completan en total 60 m.

Se toman muestras de la mezcla para los ensayos a la compresión.

Se contnua con el figurado de acero.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **29 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se funde la tercera seccion de huellas y vigas riostras completando asi un total de 95 m lineales.

Se toma muestras de la mezcla usada en estos elementos.

Se continua con el figurado de acero.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **30 de junio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se procede a desencofrar las formaletas y a la colocacion de las peidras y los moldes para el concreto ciclópeo.

El equipo encargado de figurar el acero continua labores.

Firma:_____

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **01 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se funde el concreto ciclópeo interno y externo de la seccion de huellas ya fundido.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA	
		FECHA: **02 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se funden 35 metros lineales de cunetas en ambos sentidos con sus respectivos refuerzos.

Se toman las muestras respectivas de este concreto.

Firma:_____

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **03 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia con la fundicion de la ultima sección de la vía con su respectivo refuerzo en acero. Se funden las huellas y sus respectivas vigas riostras. Se funden 34 m lineales completando de esta forma un total de 131 metros lineales de via en este sector.

Se toman las muestras respectivas de la mezcla usada en obra.

Se procede a colocar las piedras y las formaletas para la posterior fundicion del concreto ciclópeo externo e interno de la vía.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **04 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace el desencofrado de las formaletas y se hace curado del concreto.

Firma: David R.

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **05 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace la fundicion de la ultima seccion del ciclópeo de la via. Se procede a colocar el acero para la fundicion de las cunetas.

Se realiza el formaleteo para las cunetas.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: **06 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se construye la ultima seccion de las cunetas del proyecto con su respectivo acero de refuerzo.

Se construyen 34 metros lineales en ambos sentidos para un total de 131 metros.

Se toman las muestras de la mezcla respectiva para su posterior ensayo a la compresión.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **07 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se procede a desencofrar las formaletas de la fundicion de las cunetas y realizar curado a los concretos.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **08 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR LA ESCUELA**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza jornada de aseo general del sector de la Escuela y se continua con el curado del concreto.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **09 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza jornada de aseo general del sector eliecer y se continua con el curado del concreto.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **10 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se presentan lluvias torrenciales en la zona por lo que no hubo necesidad de realizar el curado del concreto.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **11 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de curado del concreto y se procede a cargar las formaletas.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA	
		FECHA: **12 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se retiran materiales sobrantes y se hace curado de los concretos de ambos sectores.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA	
		FECHA: **13 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA DOMINGO NO LABORABLE

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **14 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza curado del concreto y retiro de materiales sobrantes y basura.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal


INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **15 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de curado del concreto.

Firma: 

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	BITÁCORA DE OBRA
	FECHA: **16 de julio de 2025**

DATOS DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO:	**SAMC-OP-003-2025**
LOCALIZACIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
OBJETO DEL CONTRATO:	(I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024. (II) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024
SITIO DE EJECUCION:	**SECTOR ELIECER**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INTERCONDI SAS
DIRECCION:	CR 47 125 14 AP 402 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONOS:	310 762 7024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de curado del concreto.

Firma: David R

Ing. David Ricardo Rodriguez Buitrago
Representante legal

PLANOS RÉCORD DE TRAMOS

FINAL
4°58'47.10"N
74°16'46.95"W

ANCHO DE VÍA: 4.50m


LONGITUD TOTAL:
131,00 m

TOTAL VIGARIOSTRAS:
46


ESC: 1___450

INICIO
4°58'42.8" N
74°16'47.4"W


ISOMETRÍA




ESC: 1___35




ESC: 1___35




ESC: 1___10






ESC: 1___10

CUNETA EN CONCRETO CLASE E (2500 psi)
Tipo V




ÁREA SECCIÓN CUNETA: 0.090 m2
VOLUMEN POR (m)= 0.090 m3


(C1) 3 #3 C/0.25 m



PESO ACERO TRANSVERSAL POR (m) DE CUNETA: (0.68 m X 0.56 Kg) = 0.38 x 3und= 1.14 Kg
PESO ACERO LONGITUDINAL POR (m) DE CUNETA: (1,00 m X 0.56 Kg) = 0.56 x 3und= 1.68 Kg
NOTA: SE OBLIGA A EL CONFINAMIENTO CON LOS TALUDES
SEGÚN CORRESPONDA PARA EVITAR SOCAVACIÓN O EROSIÓN




ESC: 1___15




SECCIÓN TRANSVERSAL

ESC: 1___15



ESC: 1___40

PLANTA RAMPA ACCESO Y /O SALIDA

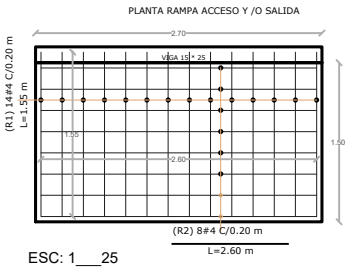


ESC: 1___25

TABLA ACEROS POR METRO (KG)						
POSICIÓN	FIGURA	L(m)	#3	#4	#5	PESO(KG)
P1	0,15 0,80 0,15	1.10		10 (2P)		11,00
P2	1,0	1,0		10 (2P)		10,00
V1		0,23	5			0,644
V2	1,0	1,0	2			1,120
C1 Tipo L	0,15 0,05 0,05 0,09 0,43	0.77	6 (2C)			2.58
C1 Tipo V	5 cm 5 cm 3 cm 3 cm 52 cm	0.68	6 (2C)			2.28
C2	3,00	3,0	6 (2C)			3.34


TABLA DE ACEROS

POSICIÓN	FIGURA	L(m)	#3	#4	#5	PESO(KG)
R1	1,55	1,55		28 (2R)		43,4
R2	2,60	2,60		16 (2R)		41.6
		TOTAL Kg				85,00



SECCIÓN LONGITUDINAL

ESC: 1___15



ESC: 1___10

SECCIÓN LONGITUDINAL RAMPA ACCESO Y/O SALIDA

UBICACIÓN	PROYECTO	FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE	CONTIENE	ESCALA	
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA	*"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024."*	NOMBRE ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ M.P. 091037-0723362 CND	PLANO TRAMO TOTAL PLANO DE PLANTA ISOMETRIAS DETALLES ESTRUCTURALES TABLAS DE ACEROS	INDICADA	PLANO 1 DE 1

FINAL
4°58'44.30"N
74°16'31.64"W

ANCHO DE VÍA: 5.0 m


LONGITUD TOTAL:
98,20 m

TOTAL VIGARIOSTRAS:
33

INICIO
4°58'40.46"N
74°16'47.4"W


ESC: 1___450

ISOMETRÍA





ESC: 1___35

ESC: 1___35




ESC: 1___10






ESC: 1___10

CUNETA EN CONCRETO CLASE E (2500 psi)
Tipo V




ÁREA SECCIÓN CUNETA: 0.090 m2
VOLUMEN POR (m)= 0.090 m3


(C1) 3 #3 C/0.25 m



PESO ACERO TRANSVERSAL POR (m) DE CUNETA: (0.68 m X 0.56 Kg) = 0.38 x 3und= 1.14 Kg
PESO ACERO LONGITUDINAL POR (m) DE CUNETA: (1.00 m X 0.56 Kg) = 0.56 x 3und= 1.68 Kg
NOTA: SE OBLIGA A EL CONFINAMIENTO CON LOS TALUDES
SEGÚN CORRESPONDA PARA EVITAR SOCAVACIÓN O EROSIÓN




ESC: 1___15




SECCIÓN TRANSVERSAL

ESC: 1___15



ESC: 1___40

PLANTA RAMPA ACCESO Y /O SALIDA




ESC: 1___25

TABLA ACEROS POR METRO (KG)

POSICIÓN	FIGURA	L(m)	#3	#4	#5	PESO(KG)
P1	0,15 0,80 0,15	1.10		10 (2P)		11,00
P2	1,0	1,0		10 (2P)		10,00
V1		0,23	5			0,644
V2	1,0	1,0	2			1,120
C1 Tipo L	0,15 0,05 0,05 0,09 0,43	0.77	6 (2C)			2.58
C1 Tipo V	5 cm 5 cm 3 cm 3 cm 52 cm	0.68	6 (2C)			2.28
C2	3,00	3,0	6 (2C)			3.34


TABLA DE ACEROS

POSICIÓN	FIGURA	L(m)	#3	#4	#5	PESO(KG)
R1	1,55	1,55		28 (2R)		43,4
R2	2,60	2,60		16 (2R)		41.6
		TOTAL Kg				85,00



SECCIÓN LONGITUDINAL

ESC: 1___15



ESC: 1___10

SECCIÓN LONGITUDINAL RAMPA ACCESO Y/O SALIDA

UBICACIÓN	PROYECTO	FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE	CONTIENE	ESCALA	
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA	*"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024"*	NOMBRE ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ M.P. 091037-0723362 CND	PLANO TRAMO TOTAL PLANO DE PLANTA ISOMETRIAS DETALLES ESTRUCTURALES TABLAS DE ACEROS	INDICADA	PLANO 1 DE 1

PAGO SENAFIC

+ (57) 310 762 2024
Intercondisas@gmail.com

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social INTERCONDI SAS identificado con el NIT 901199491, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
SAMC No. 004 DE 2022	MEJORAMIENTO PLACA HUELLAS	GUAYABAL DE SIQUIMA	494,244	2022-08	16-AGO-2022	76788670
180 DE 2023	MEJORAMIENTO VIAS	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	500,000	2023-12	14-DIC-2023	101263218
SAMC-OP-003-2025	Placa Huella San Francisco	SAN FRANCISCO	575,000	2025-07	14-JUL-2025	135677659
		Total	1,569,244			

Expedido por el SENA, a los catorce (14) dias del mes de Julio de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-07-14

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2867835926 y el Número de Certificado: 407156

@SENAComunica
www.sena.edu.co

PLANLLAS SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F9B5A7320C6036B0E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN FERNANDO REYES PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86082697 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 250210-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

VALIDO SOLO PARA CERTIFICADO INTERCONDI SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86082697**

REYES PARRA
APELLIDOS

JUAN FERNANDO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1984**
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-AGO-2002 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69112622-M-0086082697-20030717 **01808** 03198O 01 122799224

VALIDO PARA CERTIFICACION DE INTERCONDI SAS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.797.397 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **INTERCONDI SAS,** identificado con Nit 901.199.491-6, certifico el pago de los aportes realizados en los últimos seis meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

A los pagos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), me encuentro exonerado según inciso tercero del articulo 25 la Ley 1607 de 2012 adicionado a través del artículo 19 de la Ley 1739 de 2014.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JUAN FERNANDO REYES PARRA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.082.697 de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. 250210-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **INTERCONDI SAS**, identificada con Nit. 901.199.491-6, certifico el pago de los últimos seis meses de los aportes realizados por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

A los pagos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), me encuentro exonerado según inciso tercero del articulo 25 la Ley 1607 de 2012 adicionado a través del artículo 19 de la Ley 1739 de 2014.

Dada en Villavicencio a los diez (10) días de julio de 2025.

Cordialmente:

David Ricardo Rodríguez Buitrago
Representante Legal

Juan Fernando Reyes Parra
Contador Público
T.P 250210-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250210-T



JUAN FERNANDO
REYES PARRA
C.C. 86082697
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258050 277896

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

VALIDO PARA CERTIFICAR LA EMPRESA INTERCONDOSAS

Scanned by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	06/06/2025	87126044	$2.044.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	72.000	0		0		0	15	800	0	72.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	174.000	0		0		0	15	1.700	0	175.700	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	13.400	0		0		0	15	200	0	13.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	253.500	0	0	0	0	15	2.500	0	256.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	755.800	0	0	0	0	15	7.400	0	763.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	15	2.300	0	230.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	268.000				268.000	15	2.700	270.700			2.680	270.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	259.400	15	2.600	262.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	259.400	262.100
Pensión	3	1.237.100	1.249.300
Riesgos Laborales	1	268.000	270.700
CCF	1	259.400	262.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.023.900	2.044.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	06/06/2025	87126044	$2.044.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019892401	GARZON LEON JORGE IVAN	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF34	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1121839789	CARRERA ANDRADE WILIAN DEIBY	1	0			S																	230201	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS017	333.334	13.400	14-11	333.334	5	23.300	CCF34	333.334	13.400	0	0	0	0	0
3	CC	1121839789	CARRERA ANDRADE WILIAN DEIBY	1	0			S									X								230201	1.666.667	200.100	0	0	0	0	EPS017	1.666.667	0	14-11	1.666.667	5	0	CCF34	1.666.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	86082697	REYES PARRA JUAN FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1121858373	MORENO CASTILLO BLANCA NELLY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1121914547	OSPINA TOVAR LEONARDO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF34	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAZ Y SALVOS

+ (57) 310 762 2024
Intercondisas@gmail.com

PAZ YSALVO

A solicitud del ingeniero de proyectos, **Sr. Mario Rubiano**, quien se identifica con **C.C N.1019.068.674**, nos permitimos expedir Paz y Salvo, por concepto de venta en año 2025 para los proyectos:

INTERCONDI SAS - NIT. 901.199.491.

Sin otro particular, se expide a los 18 días del mes de junio de 2025, en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

MULTIALAMBRES
FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA
NIT. 860.067.998-3

BLANCA JANETH FERREIRA
Jefe de Crédito y Cartera

Bogotá, 14 de Junio del 2025

A QUIEN INTERESE

Asunto: PAZ Y SALVO INTERCONDI SAS

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito informar que nuestro cliente INTERCONDI SAS con NIT 901199491 ,a la fecha se encuentra a paz y salvo. Sus compras las realiza pago contado anticipado.

Cordial Saludo



Vivian Diaz
Asesor Comercial
Cel.: 320 2753660

Bogotá, 15 de JULIO del 2025

A QUIEN INTERESE:

Asunto: PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito informar que la empresa INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la MANO DE OBRA del tramo en placa huella **SECTOR LA ESCUELA** construido, cuyos pagos se hicieron mediante transferencias y pagos en efectivo de acuerdo al avance de obra bajo la modalidad de CONTRATO DE OBRA CIVIL.

A la fecha se encuentra cancelado el 100% de valor contratado y pactado.

Cordial Saludo,

LEONEL ENRIQUE BERNAL BAUTISTA
MAESTRO DE OBRA
C.C 2.991.479

Bogotá, 15 de JULIO del 2025

A QUIEN INTERESE:

Asunto: PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito informar que la empresa INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la MANO DE OBRA del tramo en placa huella **SECTOR ELIECER** construido, cuyos pagos se hicieron mediante transferencias y pagos en efectivo de acuerdo al avance de obra bajo la modalidad de CONTRATO DE OBRA CIVIL.

A la fecha se encuentra cancelado el 100% de valor contratado y pactado.

Cordial Saludo,

LEONEL ENRIQUE BERNAL BAUTISTA
MAESTRO DE OBRA
C.C 2.991.479



FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1983

CHAGUANI
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-FEB-2002 CHAGUANI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1505200-01048684-M-0002991479-20181205 0063442567A 1 49943289



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 2.991.479

BERNAL BAUTISTA

APELLIDOS

LEONEL ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA

RUT Y RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

+ (57) 310 762 2024
Intercondisas@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141162062337

(415)7707212489984(8020) 000014116206233 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTERCONDI SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
CR 47 125 14 AP 402

42. Correo electrónico intercondisas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 6 2 7 0 2 4	3 1 0 6 8 4 8 9 8 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 1 8 0 7 1 7	4 2 9 0	2 0 1 8 0 7 1 7	4 9 2 3		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ BUITRAGO DAVID RICARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162062337

(415)7707212489984(8020) **000014116206233 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 7 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 7 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 9 0 0 0 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 7 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 0 7 2 5		-
2	8 0	2 0 1 8 0 7 2 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141162062337

(415)7707212489984(8020) **000014116206233 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 0 7 9 7 3 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	BUITRAGO	DAVID	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 4 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 5 3 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GRANADOS	RAMIREZ	LEONARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141162062337

(415)7707212489984(8020) **000014116206233 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 8 2 6 9 7	7	2 5 0 2 1 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
REYES	PARRA	JUAN	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085800850

(415)7707212489984(8020) 001876408580085 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6				

11. Razón social
INTERCONDI SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 47 125 14 AP 402 BRR EL BATAN

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-12-20 / 11:46:59 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ BUITRAGO DAVID RICARDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1020797397 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INTERCONDI SAS

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 2 - 2 0 / 1 1 : 4 6 : 5 9

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085800850

(415)7707212489984(8020) 001876408580085 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6				

11. Razón social

INTERCONDI SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INTERCONDI SAS CR 47 125 14 AP 402	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEIN	30	50	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	**VILLAVICENCIO**	**30**	**30-44-101063306**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**04**	**2025**	**16**	**04**	**2025**	**00:00**	**16**	**07**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CLL 4 7 56	CIUDAD: SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	8478394

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N SAMC-OP-003-2025, CUYO OBJETO ES: (I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR
ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU - NIT: 900.258.711-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/04/2025**	**16/01/2026**	**$19,999,983.40**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/04/2025**	**16/07/2028**	**$19,999,983.40**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$39,999,966.80**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****700,547.00	$ ******20,000.00	$ *****136,904.00	$ **********857,451.00	$ *******79,999,933.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

30-44-101063306

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	**VILLAVICENCIO**	**30**	**30-44-101063306**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**04**	**2025**	**16**	**04**	**2025**	**00:00**	**16**	**07**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CLL 4 7 56	CIUDAD: SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	8478394

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****700,547.00	$ ******20,000.00	$ *****136,904.00	$ **********857,451.00	$ *******79,999,933.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006104101768(3900)000000857451(96)20260416

REFERENCIA PAGO:

1100610410176-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

No. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ **SEGURESTADO** OTORGA A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS

GRÁFICAS COLOMBIA LTDA . 06/15

PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR **SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE **SEGURESTADO** Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y

ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A **SEGURESTADO**. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, **SEGURESTADO** TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE **SEGURESTADO**, SIN PERJUICIO QUE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE **SEGURESTADO** O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, **SEGURESTADO** RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE **SEGURESTADO**.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, **SEGURESTADO** DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, **SEGURESTADO** A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A **SEGURESTADO** EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE L**A ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	**VILLAVICENCIO**	**30**	**30-40-101023766**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**04**	**2025**	**16**	**04**	**2025**	**00:00**	**16**	**07**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CLL 4 7 56	CIUDAD: SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	8478394
BENEFICIARIO:	899999173 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N SAMC-OP-003-2025, CUYO OBJETO ES: (I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024.

ASEGURADOS ADICIONALES: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU - NIT: 900.258.711-1 Y INTERCONDI SAS - NIT: 901.199.491-6

BENEFICIARIOS ADICIONALES: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA IDENTIFICADA CON NIT 899999173-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**16/04/2025**	**16/07/2025**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**16/04/2025**	**16/07/2025**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**16/04/2025**	**16/07/2025**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****177,450.00	$ *******3,000.00	$ ******34,285.00	$ **********214,735.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101023766

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101023766	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	16	04	2025	00:00	16	07	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CLL 4 7 56	**CIUDAD:** SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8478394

BENEFICIARIO: 899999173 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**16/04/2025**	**16/07/2025**	**$284,700,000.00**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**16/04/2025**	**16/07/2025**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**16/04/2025**	**16/07/2025**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101023766

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	**VILLAVICENCIO**	**30**	**30-40-101023766**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**04**	**2025**	**16**	**04**	**2025**	**00:00**	**16**	**07**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CLL 4 7 56	CIUDAD: SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	8478394

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****177,450.00	$ *******3,000.00	$ ******34,285.00	$ **********214,735.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006104101775(3900)000000214735(96)20260416

REFERENCIA PAGO:

1100610410177-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA CONTRATISTAS DE ENTIDADES ESTATALES RCE SEGURESTADO ESTATAL

CONDICIONES GENERALES

No. _____

CLÁUSULA PRIMERA

1. AMPAROS

1.1 AMPARO BÁSICO: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

SEGUROS DEL ESTADO S.A. QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO, EN VIRTUD DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OBLIGA A INDEMNIZAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SIN EXCEDER DEL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO QUE PARA LUCRO CESANTE SE ESTABLECE EN LA CARÁTULA) QUE LE CAUSE EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AFIANZADO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, DE CARÁCTER ACCIDENTALES, SÚBITOS E IMPREVISTOS, IMPUTABLES AL ASEGURADO, QUE ORIGINEN LA MUERTE, LESIÓN O MENOSCABO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y/O EL DAÑO O LA DESTRUCCIÓN DE BIENES Y/O PERJUICIOS ECONÓMICOS, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE TALES HECHOS.

LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO PROPÓSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE RECONOZCAN AL ASEGURADO (INCLUYENDO LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES A QUE SEA CONDENADO, MEDIANTE SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, HASTA EL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO QUE PARA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES ASUMA EL ASEGURADO, ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA).

LA VÍCTIMA TIENE ACCIÓN DIRECTA CONTRA SEGURESTADO. PARA ACREDITAR SU DERECHO ANTE ELLA, LA VÍCTIMA EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA PODRÁ EN UN SOLO PROCESO JUDICIAL, DEMOSTRAR TANTO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN DE SEGURESTADO, PERO ESTA ÚLTIMA PODRÁ OPONER A LA VÍCTIMA, TODAS LAS EXCEPCIONES QUE HUBIERE PODIDO ALEGAR CONTRA EL TOMADOR O EL ASEGURADO.

SEGURESTADO RECONOCERÁ, AL ASEGURADO, INCLUIDA EN LA SUMA ASEGURADA Y HASTA UN DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA MISMA, LOS COSTOS Y GASTOS DEL PROCESO JUDICIAL QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA, PARA DECLARARLO CIVILMENTE RESPONSABLE, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES:

1. SI LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, PROVIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA.
2. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO JUDICIAL CONTRA ORDEN EXPRESA DE SEGURESTADO, Y
3. SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA QUE DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO, ÉSTA SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS, EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DERIVADA DE:

1. LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA, EN LOS CUALES EL ASEGURADO EJECUTA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO DESCRITO EN ESTE CONTRATO DE SEGUROS.

2. LAS LABORES U OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO, INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS. ESTA COBERTURA INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE FORMAN PARTE

GRÁFICAS COLOMBIA LTDA. 04/2009

DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXOS O CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN DE ELLA, TALES COMO:

A. POSESIÓN O USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMÁTICAS.

B. POSESIÓN O USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, DE CARGUE, DESCARGUE Y DE TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

C. OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.

D. POSESIÓN O USO DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

E. POSESIÓN O USO DE INSTALACIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS Y LOS EVENTOS QUE EL ASEGURADO, REALICE EN ELLAS.

F. REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.

G. VIAJES DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.-

H. PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

I. VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS, DONDE SE DESARROLLE EL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO, EJERCIDA POR PERSONAL DE VIGILANCIA EMPLEADO DEL ASEGURADO, INCLUYENDO EL USO DE ARMAS Y DE PERROS GUARDIANES, PARA TALES PROPÓSITOS.

J. POSESIÓN O USO DE DEPÓSITOS, TANQUES Y TUBERÍAS DENTRO DE LOS PREDIOS EN DONDE SE DESARROLLA EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.

K. ACTUACIONES DE LOS DIRECTIVOS, Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.

L. POSESIÓN O USO DE CAFETERÍAS, CASINOS Y RESTAURANTES PARA UTILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO, QUE SE CONTRATEN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.-

M. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PRODUCIDOS DENTRO DE LOS PREDIOS EN DONDE SE EJECUTA Y DESARROLLA EL CONTRATO AFIANZADO.-

1.2 AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL SERVICIO DEL CONTRATISTA ASEGURADO

EL PRESENTE AMPARO OTORGA COBERTURA A LOS BENEFICIARIOS POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE LE GENEREN LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES, Y QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRAN COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LABORES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.-

ESTE AMPARO OPERA ÚNICAMENTE EN EL EVENTO DE QUE DICHOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES NO CUENTEN CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ESPECÍFICA, CON IGUALES AMPAROS A LOS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA

1.3 AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR POR MUERTE O LESIONES A LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO, DURANTE LAS LABORES A ELLOS ASIGNADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO, , COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.

ESTE AMPARO OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO EL TRABAJADOR BAJO EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, BAJO EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y/O DE CUALQUIER OTRO SEGURO INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE EL ASEGURADO CONTRATE PARA SUS TRABAJADORES (YA SEA POR PACTOS O CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO).-

1.4 AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

ESTE AMPARO OTORGA COBERTURA POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUES O SEMIREMOLQUES, DE SU PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.

ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE

SE PACTE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE TENER CONTRATADA EL ASEGURADO, AMPARANDO EL(LOS) VEHÍCULO(S) OBJETO DE ESTA COBERTURA ADICIONAL.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. EXCLUSIONES

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS COBERTURAS DE LA PÓLIZA NO OPERAN, CUANDO SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1 EXCLUSIONES GENERALES

2.1.1 LOS DAÑOS CAUSADOS VOLUNTARIA E INTENCIONALMENTE POR EL ASEGURADO O CON SU COMPLICIDAD, O POR PERSONAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS CON ÉL, POR UN CONTRATO DE TRABAJO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS O COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS.

2.1.2 LOS PERJUICIOS QUE SUFRA EL ASEGURADO EN SU PERSONA O EN LOS BIENES DE SU PROPIEDAD O SOBRE LOS QUE EJERZA POSESIÓN O CUSTODIA.- EN EL EVENTO QUE EL ASEGURADO SEA UNA PERSONA JURÍDICA NO SE CUBREN TAMPOCO, LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS DE LA MISMA, EN SUS PERSONAS O EN SUS BIENES.

2.1.3 LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL CÓNYUGE DIVORCIADO O NO, DEL ASEGURADO, SU COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE O A PERSONAS QUE TENGAN PARENTESCO CON EL ASEGURADO HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD.

2.1.4 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR PERSONAS AL SERVICIO DEL ASEGURADO, LOS SOCIOS, DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES.- SUS TRABAJADORES Y/O CONTRATISTAS VINCULADOS MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O SUS APODERADOS GENERALES, CUANDO ELLOS, NO SE ENCUENTREN EJERCIENDO NINGUNA ACTIVIDAD PROPIA DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.-

2.1.5 LAS OPERACIONES O LOS PRODUCTOS, EN LOS QUE SE EMPLEEN MATERIALES NUCLEARES O RADIOACTIVOS, ASBESTO EN ESTADO NATURAL O POR SUS PRODUCTOS, POLVO QUE CONTENGA FIBRAS DE AMIANTO, VACUNAS Y SUSTANCIAS TALES COMO DIETILESTILBESTROL, OXIQUINOLINA, Y FORMALDEHÍDO.

2.1.6 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO, A RAÍZ DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES U ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE, DE NORMAS TÉCNICAS O DE PRESCRIPCIONES MÉDICAS O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

2.1.7 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO, RESPECTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EN GENERAL, DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

2.1.8 LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DAÑO AMPARADO POR LA PÓLIZA.

2.1.9 LOS DAÑOS OCASIONADOS POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS, FALLAS GEOLÓGICAS, TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIÓN VOLCÁNICA O CUALESQUIER OTRA PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA O DE LA NATURALEZA.

2.1.10 LOS PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRA DECLARADA O NO, ACTOS TERRORISTAS, SUBVERSIVOS O GUERRILLEROS, MOTINES, HUELGAS O CUALQUIER ACTO QUE PERTURBE LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO.

2.1.11 LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO, POR SU CULPA GRAVE.- CUANDO ÉSTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA NO SE AMPARARÁN LOS PERJUICIOS QUE CAUSEN SUS SOCIOS, DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES, TRABAJADORES Y PERSONAS VINCULADAS MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APODERADOS GENERALES POR SU CULPA GRAVE.

2.1.12 LA CONTAMINACIÓN Y/O POLUCIÓN GRADUAL O PAULATINA DE CUALQUIER ÍNDOLE, LA POLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

2.1.13 LAS OPERACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y CANADÁ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN Y/O EL RESULTADO DE DEMANDAS EN DICHOS PAÍSES.

2.1.14 LOS PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN POR LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y ÓRDENES DE AUTORIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA O POR ASUNTOS INVESTIGATIVOS DE CARÁCTER PENAL.

2.1.15 LOS DAÑOS OCASIONADOS POR VEHÍCULOS, AERONAVES O EMBARCACIONES.

2.1.16 LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA EXTRACCIÓN, FABRICACIÓN, MANIPULACIÓN Y USO DE ASBESTOS Y/O AMIANTO O SUSTANCIAS QUE CONTENGAN DICHAS MATERIAS.

2.1.17 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL PERSONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.-

2.1.18 LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN ENTRE SI, LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE SEAN CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS DEL ASEGURADO.

2.1.19 LOS PERJUICIOS A CAUSA DE DAÑOS O LESIONES PERSONALES OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA ASEGURADO, O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O POR SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS DAÑOS Y LESIONES SE PRODUJEREN DESPUÉS DE LA ENTREGA A LA QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL ASEGURADO, POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-

2.1.20 EL EJERCICIO DE LA POSESIÓN Y USO DE PARQUEADEROS.

2.1.21 LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL, REPENTINA E IMPREVISTA U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DE AGUAS, ATMÓSFERA, SUELOS, SUBSUELOS, O BIEN POR RUIDOS.

2.1.22 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE HECHOS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL COLOMBIANO.

2.1.23 LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA ASEGURADO EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS, LEYES O DISPOSICIONES OFICIALES DE TAL NATURALEZA.

2.1.24 LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA FABRICACIÓN, ELABORACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, CARGUE Y DESCARGUE, ASI COMO POR LA UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y COMBUSTIBLES.

2.1.25 LOS PERJUICIOS POR DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR REACCIÓN NUCLEAR O CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA.

2.1.26 LOS PERJUICIOS PROVENIENTES DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES (INCLUIDO EL DEBILITAMIENTO DE CIMIENTOS Y BASES), ASENTAMIENTOS, VIBRACIÓN O VARIACIÓN DEL NIVEL DEL SUELO Y VARIACIONES DEL NIVEL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

2.1.27 LOS PERJUICIOS QUE SURJAN DE UNA ERRADA PRÁCTICA PROFESIONAL Y QUE ORIGINEN UNA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.1.28 LOS DAÑOS CAUSADOS A CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS DE CUALQUIER CLASE.

2.1.29 LOS DAÑOS CAUSADOS A PROPIEDADES ADYACENTES O ESTRUCTURAS EXISTENTES.

2.1.30 LOS PERJUICIOS POR DETERIOROS O DAÑOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS EN PODER DEL ASEGURADO BAJO SU CUIDADO, CONTROL, DEPÓSITO, VIGILANCIA O CUSTODIA, COMODATO, PRÉSTAMO, CONSIGNACIÓN O EN COMISIÓN O SOBRE LOS CUALES EL ASEGURADO REALICE UNA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PROFESIONAL (MANIPULACIÓN, TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN, TRANSPORTE, EXAMEN Y SIMILARES).

2.2 EXCLUSIONES PARTICULARES

2.2.1 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.-

LA COBERTURA OTORGADA BAJO EL AMPARO CITADO, NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

2.2.1.1 DAÑOS A PROPIEDADES SOBRE LAS CUALES SE ENCUENTREN O HAYAN LABORADO LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

2.2.1.2 DAÑOS CAUSADOS A LA PERSONA O A LOS BIENES DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

2.2.1.3 ESTA COBERTURA TAMPOCO SE EXTIENDE A CUBRIR RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTRE LOS CONTRATISTAS O ENTRE ESTOS Y LOS SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

2.2.2 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.-

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

2.2.2.1 ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS, SEGÚN SU DEFINICIÓN LEGAL.

2.2.2.2 ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

2.2.3 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE

CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

2.2.3.1 LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.

2.2.3.2 LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA ASEGURADO.

2.3.3.3 LAS PÉRDIDAS O DAÑOS A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES MATERIA DE LA PRESENTE COBERTURA, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS Y A LOS BIENES TRANSPORTADOS EN TALES VEHÍCULOS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE LOS RIESGOS NO AMPARADOS BAJO LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE CUBRAN LOS VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS OBJETO DE COBERTURA BAJO ESTE AMPARO.

LA COBERTURA OTORGADA TAMPOCO TENDRÁ APLICACIÓN CUANDO EL(OS) VEHÍCULO(S) ASEGURADO(S) NO SE ENCUENTRE(N) AMPARADO(S) BAJO UN SEGURO DE AUTOMÓVILES CUBRIENDO EL LÍMITE PRIMARIO, CUYO EXCESO ES OBJETO DE LA COBERTURA BRINDADA POR ESTE AMPARO.

CLÁUSULA TERCERA

3. DEDUCIBLE

La presente póliza tiene un deducible, que será del diez por ciento (10%) del valor asegurado enunciado en la carátula de la misma.- Tal deducible nunca será superior a 2.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

CLÁUSULA CUARTA

4. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado deberá dar aviso a **SEGURESTADO** sobre la ocurrencia de todo hecho que pudiere afectar la presente póliza dentro del término legal de tres (3) días contados a partir de la fecha que haya conocido o debido tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro.

Si contra **El Asegurado** se iniciare algún procedimiento judicial, o fuere citado a asistir a diligencia de conciliación previa por la ocurrencia de un suceso que pudiere afectar esta póliza, deberá dar aviso inmediato a **SEGURESTADO**, aunque ya lo haya dado respecto a la ocurrencia del siniestro.

El Asegurado queda obligado a colaborar en su defensa judicial, a facilitar los documentos y demás medios probatorios que busquen la exoneración de responsabilidad o disminuir el monto de la misma y a concurrir a las citaciones que la ley o **SEGURESTADO** le solicite.

Queda igualmente obligado a realizar todas las diligencias razonables, tendientes a evitar la agravación o aumento de los perjuicios.

Si **El Asegurado**, por su culpa o negligencia faltare a alguna de las obligaciones arriba descritas, **SEGURESTADO** deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que dicho incumplimiento le cause.

CLÁUSULA QUINTA

5. GARANTÍAS

La presente póliza se expide bajo la condición que **El Asegurado** cumplirá durante toda la vigencia del seguro con las siguientes garantías y compromisos:

5.1 **El Asegurado** no puede sin consentimiento previo y escrito de **SEGURESTADO** aceptar responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de la póliza cuando es nominativa, so pena de perder todo derecho bajo este contrato de seguro. Tampoco puede incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los gastos necesarios para prestar auxilios médicos, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a evitar la agravación de un daño. Le son aplicables al Beneficiario reclamante todas las prohibiciones del **Asegurado,** que por su naturaleza procedan contra él también.

5.2 El Beneficiario reclamante y/o **El Asegurado** cuando directamente reclame, perderán todo derecho derivado de esta póliza cuando lleguen a formular reclamación en alguna manera fraudulenta.

5.3 **El Asegurado** debe mantener vigentes y válidos todos los documentos y certificaciones exigidos por la autoridad competente, para el ejercicio de su actividad.

5.4 **El Asegurado** dentro de su operación o actividad, descrita en la carátula de la póliza, observará todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que rigen su actividad profesional.

5.5 **El Asegurado** se compromete y obliga a mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los bienes con los cuales desarrolla su actividad descrita en la carátula de la póliza y comunicará por escrito a **SEGURESTADO** cualquier modificación o alteración que ocurra a la propiedad o características de los mismos bienes.

5.6 **El Asegurado** no podrá permitir que se le de a los bienes con los cuales desarrolla su actividad descrita en la carátula de la póliza, un uso diferente al normal y

autorizado según su tipo y capacidad y se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales y técnicas referentes a su mantenimiento y seguridad.

En el evento de violar **El Asegurado,** una cualquiera de las garantías que se compromete a cumplir y observar, durante el desarrollo y ejecución de este contrato de seguros, faculta a **SEGURESTADO**, para dar por terminado este contrato de seguros, desde el mismo momento de cometida la infracción.-

CLÁUSULA SEXTA

6. ESTIPULACIONES SOBRE RECLAMACIONES

Si el monto de las reclamaciones excediere del límite asegurado para cada cobertura o evento, **SEGURESTADO** solo responderá por los gastos del proceso judicial, en la proporción que haya entre el límite del valor asegurado y el importe total de las reclamaciones, aún cuando se trate de varios juicios resultantes de un mismo acontecimiento. En tales casos **SEGURESTADO** podrá eximirse de otras reclamaciones mediante el pago del límite asegurado y su participación proporcional en los gastos hasta entonces causados.

Toda indemnización o pago que se haga de conformidad con la presente póliza, originará una disminución igual al valor asegurado.- Esta póliza no tiene restitución automática de valor asegurado. Cualquier restitución del mismo, debe ser aprobada previamente por **SEGURESTADO**, una vez que **El Asegurado** cumpla los requisitos exigidos por **SEGURESTADO** para una nueva contratación.

CLÁUSULA SÉPTIMA

7. DEFINICIONES

Para los efectos del presente seguro las siguientes expresiones tendrán el significado que se estipula:

7.1 **El Asegurado:** es la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal conformado por varias personas naturales o jurídicas, que se encarga de ejecutar y cumplir con el objeto del contrato celebrado con la Entidad Estatal. Dentro de la vigencia asegurada quedan amparadas las personas vinculadas a éste, mediante contrato de trabajo. Tendrá también la calidad de Asegurado la Entidad Estatal contratante, limitado ello únicamente a los daños producidos por el Contratista Asegurado con motivo de determinada responsabilidad civil extracontractual en que éste incurra con ocasión de la ejecución del contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

7.2 Beneficiario: Los Terceros Afectados que puedan resultar perjudicados y la Entidad Estatal contratante, esta última respecto de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista Asegurado, con ocasión de la ejecución del contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

7.3 Tercero Afectado: es la persona natural o jurídica damnificada por el hecho imputable al Contratista Asegurado, y del cual resulte civilmente responsable, amparado bajo la presente póliza, y que no tenga relación de parentesco directo con el Contratista Asegurado hasta en cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, y tampoco ningún grado de subordinación o dependencia.-

7.4 Predios: son los bienes inmuebles donde se ejecuta el contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

7.5 Límite o valor asegurado: es la máxima responsabilidad de **SEGURESTADO** por cada siniestro y por el total de siniestros que puedan ocurrir durante la vigencia del seguro. Cuando en esta póliza o en su carátula, se fije o establezca un sublímite de valor asegurado, ya sea por persona, daño material, lucro cesante, daño extrapatrimonial, gastos legales, agregado anual o similar, se entenderá que tal sublímite será el valor máximo de responsabilidad de **SEGURESTADO**, y que forma parte del límite del valor asegurado, no siendo en consecuencia, una adición de este último.-

7.6 Vigencia de la cobertura o de la póliza: es el período de tiempo comprendido entre las fechas de iniciación del amparo, colocado en la carátula de esta póliza y terminación de los amparos ofrecidos, que también se indica en la carátula de la póliza.- Tal vigencia de los amparos, puede coincidir con la vigencia del contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

Para constancia de lo expuesto, y en señal de asentimiento y compromiso con todo lo aquí pactado se firma en _____ a los _____ ( ) días del mes de_____ del año _____.

EL TOMADOR

David R

_____

SEGURESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

_____

FIRMA AUTORIZADA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101023766	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2025	22	04	2025	00:00	22	07	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INTERCONDI SAS	NIT: 901.199.491-6	CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA	NIT: 899.999.173-5	CL 4 7 57 PALAC HPAL	SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	8478394

BENEFICIARIO: 899999173 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N SAMC-OP-003-2025, CUYO OBJETO ES: (I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024.

ASEGURADOS ADICIONALES: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU - NIT: 900.258.711-1 Y INTERCONDI SAS - NIT: 901.199.491-6

BENEFICIARIOS ADICIONALES: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA IDENTIFICADA CON NIT 899999173-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/04/2025	22/07/2025	$284,700,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/04/2025	22/07/2025	$284,700,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/04/2025	22/07/2025	$284,700,000.00	

ACLARACIONES

CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LO PLASMADO EN EL MODIFICATORIO No. 01, ADICION No. 1 DE FECHA 01/07/2025, EL VALOR DEL CONTRATO QUEDA EN $ 229.999.834.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101023766

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101023766	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2025	22	04	2025	00:00	22	07	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INTERCONDI SAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.199.491-6**

DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.173-5**

DIRECCIÓN: CL 4 7 57 PALAC HPAL — **CIUDAD:** SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA — **TELÉFONO:** 8478394

BENEFICIARIO: 899999173 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/04/2025	22/07/2025	$284,700,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/04/2025	22/07/2025	$284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/04/2025	22/07/2025	$284,700,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101023766

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101023766	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2025	22	04	2025	00:00	22	07	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 4 7 57 PALAC HPAL		SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA		8478394

BENEFICIARIO: 899999173 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101023766

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101063306	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2025	22	04	2025	00:00	22	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTERCONDI SAS	NIT: 901.199.491-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA	NIT: 899.999.173-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 7 57 PALAC HPAL	SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	8478394

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N SAMC-OP-003-2025, CUYO OBJETO ES: (I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR
ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU - NIT: 900.258.711-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2025	22/01/2026	$22,999,983.40	$19,999,983.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/04/2025	22/07/2028	$22,999,983.40	$19,999,983.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$45,999,966.80	$39,999,966.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LO PLASMADO EN EL MODIFICATORIO No. 01, ADICION No. 1 DE FECHA 01/07/2025, SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN $ 229.999.834, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS CONTENIDOS EN LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****102,205.00	$ *******8,000.00	$ ******20,939.00	$ ***********131,144.00	$ *******91,999,933.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

30-44-101063306

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101063306	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2025	22	04	2025	00:00	22	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 4 7 57 PALAC HPAL		SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA		8478394

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101063306

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101063306, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 03 días del mes de JULIO de 2025

30-44-101063306

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	**VILLAVICENCIO**	**30**	**30-40-101023766**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	**07**	**2025**	**22**	**04**	**2025**	**00:00**	**22**	**07**	**2025**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTERCONDI SAS	**NIT: 901.199.491-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA	**NIT: 899.999.173-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 4 7 57 PALAC HPAL	SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	8478394

BENEFICIARIO: 899999173 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N SAMC-OP-003-2025, CUYO OBJETO ES: (I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024.

ASEGURADOS ADICIONALES: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU - NIT: 900.258.711-1 Y INTERCONDI SAS - NIT: 901.199.491-6

BENEFICIARIOS ADICIONALES: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA IDENTIFICADA CON NIT 899999173-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/04/2025**	**22/07/2025**	**$284,700,000.00**	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/04/2025**	**22/07/2025**	**$284,700,000.00**	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/04/2025**	**22/07/2025**	**$284,700,000.00**	

ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 16/07/2025 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA QUEDA NOTIFICADA DE LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101023766

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101023766	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	22	04	2025	00:00	22	07	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CL 4 7 57 PALAC HPAL	**CIUDAD:** SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8478394

BENEFICIARIO: 899999173 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/04/2025**	**22/07/2025**	**$284,700,000.00**	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/04/2025**	**22/07/2025**	**$284,700,000.00**	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/04/2025**	**22/07/2025**	**$284,700,000.00**	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101023766

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101023766	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	22	04	2025	00:00	22	07	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CL 4 7 57 PALAC HPAL	**CIUDAD:** SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8478394

BENEFICIARIO: 899999173 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101023766

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	**VILLAVICENCIO**	**30**	**30-44-101063306**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	**07**	**2025**	**22**	**04**	**2025**	**00:00**	**22**	**07**	**2030**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CL 4 7 57 PALAC HPAL	CIUDAD: SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	8478394

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N SAMC-OP-003-2025, CUYO OBJETO ES: (I) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA EL TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 551 DE 2024, (II) MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR
ELIECER EN LA VEREDA TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 541 DE 2024.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU - NIT: 900.258.711-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**22/04/2025**	**22/01/2026**	**$22,999,983.40**	**$22,999,983.40**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**22/04/2025**	**22/07/2028**	**$22,999,983.40**	**$22,999,983.40**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$45,999,966.80**	**$45,999,966.80**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 16/07/2025 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA QUEDA NOTIFICADA DE LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/07/2025	16/07/2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******91,999,933.60	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101063306

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101063306	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	22	04	2025	00:00	22	07	2030	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INTERCONDI SAS		**NIT: 901.199.491-6**
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		**NIT: 899.999.173-5**
DIRECCIÓN: CL 4 7 57 PALAC HPAL	**CIUDAD:** SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8478394

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101063306

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101063306, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 22 días del mes de JULIO de 2025

30-44-101063306

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
