I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **490 de 2024**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."

FECHA DE SUSCRIPCION: 20 diciembre de 2024.

FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2024.

PLAZO INICIAL: Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

SUSPENSION N° 1: N/A

REINICIO N° 1: N/A

FECHA DE TERMINACION: 29 de agosto de 2025.

FECHA DEL INFORME: 21 de julio de 2025.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 20 de diciembre de 2024 se suscribe el contrato de obra No.490 de 2024, entre la entidad contratante CAM y el contratista de obra CONSORCIO OBRAS RURALES 2024.
- El 27 de diciembre de 2024 se suscribe el contrato de consultoría No.485 de 2022, entre la entidad contratante CAM y el contratista de consultoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 30 de diciembre de 2024 se firma el acta de inicio de los contratos No.490 de 2024 y No.485 de 2024.
- Durante los meses de enero, febrero y parte de marzo de 2025, se realizaron las visitas diagnóstico a los predios objeto del contrato de obra, con el fin de verificar la ubicación de predios, de los beneficiarios y las condiciones técnicas establecidas y del terreno donde se realizará la construcción de las obras, encontrando algunas novedades, que implican modificaciones al contrato.

- El 22 de febrero de 2025, se hizo entrega del **primer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, cargado al Secop II.
- El primero de abril de 2025 se suscribió el acta de justificación No.1 de modificación de beneficiarios, mayores y menores cantidades, creación de ítem nuevo y corrección de la descripción de algunos capítulos y actividades sin adición en valor y plazo al contrato de obra, con el fin de presentar con sus respectivos soportes a la Entidad contratante e iniciar el trámite correspondiente para aprobación mediante un Otrosí No.1 al contrato de obra.
- El 14 de abril de 2025 se hizo entrega del **segundo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, cargado al Secop II.
- El 21 de abril de 2025 se hizo entrega del **tercer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 15 de marzo de 2025, cargado al Secop II.
- El 08 de mayo de 2025 se hizo entrega del **cuarto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, cargado al Secop II.
- El 16 de mayo de 2025 se suscribió el Otrosí No.1 al contrato de obra pública No.490 de 2024, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, el contratista de obra y el contratista de interventoría, para la modificación de beneficiarios, mayores y menores cantidades, creación de ítem nuevo y corrección de la descripción de algunos capítulos y actividades sin adición en valor y plazo al contrato de obra.
- EL 9 de junio de 2025 se realizó comité técnico para aprobar realizar balance de mayores y menores cantidades sin adición de valor en el contrato.
- El 11 de junio de 2025 se entregó y aprobó acta de mayores y menores cantidades y acta de justificación (Anexo 1).
- El 17 de junio de 2025 se hizo entrega del **quinto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, cargado al Secop II.
- El 8 de julio de 2025 se hizo entrega del **sexto informe de obra final** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 01 de mayo al 30 de junio de 2025.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	GENERALIDADES		
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diámetro 2.5 mm,**		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">correa en perfil cerrado rectangular 40x20 mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2", paseras en tabla nogal o pino apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16" y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 YL2=0.3</td><td>M3</td><td>4,80</td><td>4,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,3</td><td>CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>M3</td><td>6.40</td><td>6,40</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS
TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts
NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores
8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS
TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts
NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS
PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores
8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td><td>UND</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,5</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td><td>UND</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td><td>UND</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,7</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td><td>UND</td><td>64.00</td><td>64.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>64,00</td><td>64.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diámetro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>125.00</td><td>125.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 YL2=0.3</td><td>M3</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 YL2=0.3</td><td>M3</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS
PARA PARALES O COLUMNAS</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr>
<td></td>
<td>METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES
8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES
PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75
3 TUBOS RECTOS DE 0.25
Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.5</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2.7</td>
<td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA.
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.7</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA.
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td><td>UND</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.8</td>
<td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.9</td>
<td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td colspan="3">Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras móviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyadas sobre ángulo de 2"x 1/8"</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR.
Incluye:
Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes.
Ángulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2'' x 5/8") para instalación en los vértices de las paseras. Dos por vértices. Colocados internamente.
Balinera común (eje 1/2") diámetro de la balinera 2"
Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2"); bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas.
Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de anclaje del sistema de rodamiento a la pasera soldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de puerta corredera</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR.
Incluye:
Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes.
Ángulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2'' x 5/8") para instalación en los vértices de las paseras. Dos por vértices. Colocados internamente.
Balinera común (eje 1/2") diámetro de la balinera 2"
Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2"); bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas.
Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de anclaje del sistema de rodamiento a la pasera
soldadura eléctrica 6013
Alambre liso galvanizado calibre 12
tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de puerta corredera</td><td>UND</td><td>16.00</td><td>16,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.2</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>3.00</td><td>3,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>TRANSPORTE ANIMAL</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.3</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>VIAJE</td><td>10.00</td><td>10,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>4</td><td colspan="3">Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyadas sobre ángulo de 2"x1/8"</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA</td><td>UND</td><td>16.00</td><td>16,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>3.00</td><td>3,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>VIAJE</td><td>10.00</td><td>10,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 3.71mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>156.00</td><td>156.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.3</td><td>INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>5.4</td>
<td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90).</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)..</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5.5</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.5</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>5.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.7</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.8</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>VIAJE</td><td>96.00</td><td>96.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">SISTEMAS SEPTICOS ARD</td></tr>
<tr><td>6.1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>84.00</td><td>84.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6..1.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>151,80</td><td>151,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.1.3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>M2</td><td>302,19</td><td>302,19</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.1.4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20X20 CM.</td><td>KG</td><td>1.140,30</td><td>1.140,30</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.1.5</td><td>CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,5</td><td>CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO</td><td>M2</td><td>83,37</td><td>83,37</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL		ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**100%**	El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 6,1,6 | CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL | M2 | 84.00 | 84.00 | 100%
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	**100%**	El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 6,1,7 | ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO | UND | 21.00 | 21.00 | 100%
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**100%**	El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 6,1,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA | M3 | 14.28 | 14,28 | 100%
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	**100%**	El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 6,1,9 | CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT | M2 | 21.00 | 21,00 | 100%
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4" PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	**100%**	El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 6,1,10 | TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4" PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. | ML | 228,34 | 228,34 | 100%
	CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80		
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**100%**	El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 6.2.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 14,91 | 14,91 | 100%
6.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	**100%**	El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad. **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUCION** 6.2.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN | M3 | 8,19 | 8,19 | 100%

<table>
<tr><td>6.2.3</td><td>CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.2.3</td><td>CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.2.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.2.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60</td></tr>
<tr><td>6.3.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>8,61</td><td>8,61</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.3.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>5,00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.3.3</td><td>CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.3</td><td>CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.3.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.3.5</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.5</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"</td><td>ML</td><td>126.00</td><td>126.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.</td></tr>
<tr><td>6.4.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.4.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>100.80</td><td>100,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>COMÚN</td><td></td><td>especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.4.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>33.60</td><td>33,60</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.4.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION</td><td>ML</td><td>168.00</td><td>168.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.4.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>17.85</td><td>17.85</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>126.00</td><td>126.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>57.60</td><td>57.60</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>19.20</td><td>19,20</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE</td><td>ML</td><td>96.00</td><td>96,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>INFILTRACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>7.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>7.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>6.00</td><td>6,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>7.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>48.00</td><td>48,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="8">Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tubería de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8">SISTEMA SEPTICO</td></tr>
<tr><td>8.1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>20.00</td><td>20,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>19,28</td><td>19,28</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>M2</td><td>44.00</td><td>44,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.</td><td>KG</td><td>228,70</td><td>228,70</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.5</td><td>CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.5</td><td>CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO</td><td>M2</td><td>18,60</td><td>18,60</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL</td><td></td><td colspan="2"><table><tr><td></td><td>ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.6</td><td>CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>100%</td><td colspan="2">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.6</td><td>CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>M2</td><td>18,60</td><td>18,60</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.7</td><td>ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS</td><td>100%</td><td colspan="2">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.7</td><td>ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.8</td><td>TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.</td><td>100%</td><td colspan="2">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.8</td><td>TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.</td><td>ML</td><td>28,40</td><td>28,40</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.9</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"</td><td>100%</td><td colspan="2">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8.1.9</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"</td><td>M3</td><td>1,50</td><td>1.50</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.1.10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"</td><td>100%</td><td colspan="2">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8,1,10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"</td><td>M3</td><td>0,85</td><td>0.85</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR H CAJA=0.5 e muro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC</td></tr>
<tr><td>8.2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td colspan="2">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8,2,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>2.00</td><td>2,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td colspan="2">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>8,2,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>1,58</td><td>1.58</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>8.2.3</td><td>CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,2,3</td><td>CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">FOZA DE INFILTRACION DE 1 X 1 M, H=0.8: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4” HASTA LA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE)</td></tr>
<tr><td>8.3.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,3,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>16,62</td><td>16,62</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,3,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>6,69</td><td>6,69</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,3,3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".</td><td>ML</td><td>22,80</td><td>22,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,3,4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN</td><td>M3</td><td>4.00</td><td>4,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.4</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>2.50</td><td>2,50</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.5</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>30.00</td><td>30,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>B</td><td>Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.</td><td>TALLER</td><td>5.00</td><td>5,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

A	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**		
1	Cumplir oportunamente el objeto contractual, no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella, según la disposición del artículo 1603 del Código Civil y artículo 863 y 871 del Código de Comercio.	**100%**	El contratista de obra durante el periodo ha dado cumplimiento oportuno al objeto contractual.
2	Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, los y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.	**100%**	El contratista de obra entregó las obras ejecutadas durante el periodo, conforme a los criterios de calidad y las especificaciones técnicas de construcción.
3	Realizar las obras a ejecutar en las cantidades y sitios indicados en Neiva, Paicol, Acevedo y Elías (Consultar anexo listado de beneficiarios)	**100%**	El contratista de obra ejecutó en cantidades y sitios indicados en Neiva durante el periodo.
4	Realizar tres (3) talleres de sensibilización social comunitaria en área de la Cuenca del río Las Ceibas relacionadas en el cuadro 1.	**100%**	El contratista de obra realizó los talleres de sensibilización social comunitaria en área de la Cuenca del río Las Ceibas.
5	Ejecutar las actividades contratadas conforme a lo dispuesto en el cronograma de actividades.	**100%**	El contratista de obra durante el periodo ejecutó las actividades conforme a lo dispuesto en el cronograma de actividades.
6	Utilizar materiales y/o productos de acuerdo a las características y/o especificaciones técnicas exigidos por LA CORPORACIÓN.	**100%**	El contratista de obra una vez inició actividades constructivas utilizó materiales y/o productos de acuerdo a las características y/o especificaciones técnicas exigidos.
7	Solicitar a LA CORPORACIÓN los archivos en formato DWG de las obras a realizar.	**100%**	El contratista de obra solicitó a la Corporación los archivos en formato DWG de las obras a realizar.
8	Presentar acta de recibo de cada obra, suscrita a satisfacción por el beneficiario y avalado por el Interventor.	**100%**	El contratista de obra presentó el acta de recibo suscrita a satisfacción por el beneficiario y avalado por el Interventor de las obras terminadas en el periodo. Anexo 2.
9	Velar por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato;	**100%**	El contratista de obra veló por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato.
10	Retirar y disponer de forma adecuada cualquier tipo de residuo generado, tales como bolsas plásticas, bolsas de	**100%**	El contratista de obra una vez ejecutó las actividades de obra del periodo, retiró y dispuso de forma adecuada los residuos generados en el proceso constructivo.

	cemento, etc.		
11	Vincular al personal que requiera y utilice para dar alcance al objeto contractual;	**100%**	El contratista de obra vinculó al personal requerido para dar alcance al objeto contractual.
12	No causar daños a personas y bienes de terceros o de LA CORPORACIÓN; y responder por los daños eventuales que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o a sus trabajadores.	**100%**	El contratista de obra no ha causado daños a personas y bienes de terceros o de la Corporación.
13	Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad industrial y bioseguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades.	**100%**	El contratista de obra dotó a sus trabajadores de los elementos de protección personal, necesarios para el buen desempeño de las actividades.
14	Vincular a todo el personal en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.	**100%**	El contratista de obra vinculó al personal previo al inicio de labores al sistema integral de seguridad social.
15	Actualizar las pólizas con las actas que haya a lugar, tales como el acta de inicio, actas de reinicio y/o acta de recibo final.	**100%**	El contratista de obra actualizó las pólizas requeridas.
16	Presentar al Supervisor informes de ejecución física y financiera cada mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio y un informe final consolidado. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Interventoría;	**100%**	El contratista de obra presentó al Supervisor los informes mensuales de ejecución física y financiera.
17	Mantener indemne a LA CORPORACIÓN ante cualquier reclamación laboral o civil de sus dependientes;	**100%**	El contratista de obra mantuvo indemne a la Corporación ante cualquier reclamación laboral o civil.
18	Acreditar el cumplimiento en el pago de sus aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión, ARP) y parafiscales, según lo establecido en el artículo 1 del parágrafo 2 de la Ley 828 del 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	**100%**	El contratista de obra acreditó el pago de sus aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión, ARL) y parafiscales.

19	Aplicar los protocolos de bioseguridad según lo establecido por el Ministerio de Salud en la normatividad legal vigente, para el desarrollo de las actividades propias del contrato.	**100%**	El contratista de obra aplicó los protocolos de bioseguridad de acuerdo a lo establecido actualmente por el Ministerio de Salud y la normatividad legal vigente.
20	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.		El contratista de obra para la contratación de la mano de obra local tuvo en cuenta lo requerido en el presente numeral.
B	**OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA**		
1	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por LA CORPORACIÓN, el Supervisor o de los organismos de control.	**100%**	El contratista de obra atendió y subsanó las observaciones y requerimientos formulados por la Corporación.
2	Presentar informes mensuales y finales que contengan como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Supervisor.	**100%**	El contratista presentó los informes mensuales.
3	Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá llevar una Bitácora (libro) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Supervisor, en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y	**100%**	El contratista de obra llevó una bitácora conforme a los requerimientos del presente numeral.

	relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente de EL CONTRATISTA y del Supervisor. Los responsables de mantener al día este diario serán los residentes de obra.		
4	Presentar a la Interventoría contratada, los informes conforme lo requieran LA CORPORACIÓN, para cada pago parcial que se efectúe y uno al final de la ejecución del contrato. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Interventoría;	**100%**	El contratista de obra presentó el respectivo informe de ejecución para tramitar el primer pago, con sus respectivos soportes conforme lo requiere la Corporación.
5	Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.	**100%**	El contratista de obra juntamente con el interventor, están elaborando el acta final.
6	El contratista deberá publicar todos los documentos derivados de la ejecución contractual, a través de la plataforma transaccional del SECOP II.	**100%**	El contratista de obra publicó los documentos correspondientes al periodo derivados de la ejecución contractual en la plataforma Secop II.
7	Nota: La aprobación por parte de LA CORPORACIÓN de algún procedimiento o método utilizado por EL CONTRATISTA, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte de LA CORPORACIÓN. EL CONTRATISTA es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	**100%**	El contratista de obra tuvo la responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones
C	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**		
1	Dar estricto y cabal cumplimiento a las actividades y cantidades enunciadas en las condiciones técnicas exigidas y contempladas en el análisis técnico del presente documento, y con las	**100%**	El contratista dio cumplimiento a las actividades y cantidades establecidas en las condiciones técnicas.

	especificaciones y lugares allí enunciados.		
2	Presentar informes: a. De ejecución, el cual se computa desde la suscripción del acta de inicio. b. De ejecución para cuando solicite pago parcial o el pago final y publicar dicho documento con los respectivos soportes en la plataforma del SECOP II. c. De avance de obra ejecutada para cuando le sea solicitado por la interventoría o la supervisión. Dicho informe estará soportado con registros fotográficos, actas, entre otros que se puedan anexar.	**100%**	El contratista de obra presentó los informes mensuales correspondientes al periodo ejecutado y publicados con los respectivos soportes en la plataforma del SECOP II.
3	De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, EL CONTRATISTA deberá cumplir con la facturación electrónica si a ello estuviere obligado conforme la reglamentación vigente.	**100%**	Una vez se requiera el contratista de obra dará cumplimiento con la facturación electrónica.
4	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a LA CORPORACIÓN o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	**100%**	Cuando haya lugar El contratista de obra responderá ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Corporación o a terceros.
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra LA CORPORACIÓN, por causa o con ocasión del contrato.	**100%**	A la fecha no se ha presentado ningún tipo de reclamación.
6	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, según cronograma.	**100%**	El contratista de obra programó las actividades a desarrollar para el cumplimiento contractual.
7	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y/o la Interventoría contratada para tal fin.	**100%**	El contratista de obra acató las instrucciones durante el desarrollo de las actividades en el presente periodo.

8	Notificar a LA CORPORACIÓN en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	**100%**	El contratista de obra no cedió los derechos económicos, societarios o de cualquier índole del contrato.
9	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	**100%**	El contratista de obra asumió los riesgos previsibles de la ejecución del contrato.
10	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	**100%**	El contratista de obra mantuvo las condiciones exigidas en su oferta durante el periodo.
11	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor o Supervisor.	**100%**	El contratista de obra presentó los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante la Interventoría.
12	Coordinar el equipo interdisciplinario solicitado en el acápite 5.1.8 “PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO”, garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el presente estudio previo.	**100%**	El contratista de obra coordinó el equipo de trabajo, garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el contrato.
13	Ante la necesidad de prescindir de los servicios profesionales de alguno de los integrantes del equipo técnico propuesto en la oferta técnica, deberá informar por escrito a LA CORPORACIÓN y reemplazarlo por otro que cumpla las mismas características a las exigidas en el Pliego de Condiciones, anexando hoja de vida con los respectivos soportes, tanto de formación académica como los de experiencia, para revisión y aprobación de la interventoría y presentar la respectiva vinculación al sistema de seguridad social una vez haya sido verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por LA CORPORACIÓN en el Pliego de Condiciones. De igual forma deberá vincular el personal adicional que requiera necesario para dar cumplimiento al objeto contractual dentro del término establecido.	**100%**	El contratista de obra informó por escrito a la Corporación a través de la Interventoría el reemplazo del residente de obra y del tecnólogo en obra civil, entregando los soportes que garantizaron el cumplimiento de características a las exigidas en el Pliego de Condiciones.

14	Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.	**100%**	El contratista de obra durante el periodo no causó daños a terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato.
15	El hospedaje de obreros, alimentación de los mismos, sitio de campamentos, vigilancia de equipos y demás gastos a que incurra en la ejecución del objeto contractual, serán asumidos en su totalidad por parte de EL CONTRATISTA y mantendrá indemne a LA CORPORACIÓN ante cualquier reclamación por este aspecto.	**100%**	El contratista de obra asumió el hospedaje del personal de obra, alimentación y demás gastos incurridos durante el periodo ejecutado.
16	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de 2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	**100%**	El contratista de obra dio cumplimiento a los establecido en la Ley relacionado con los pagos al sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales.
17	EL CONTRATISTA deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación, generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, LA CORPORACIÓN, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.	**100%**	El contratista de obra para la contratación de la mano de obra local tuvo en cuenta lo requerido en el presente numeral.
	Promedio de % Cumplimiento	**100%**	Según Acta de recibo final No.2 de obra. Anexo 3

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	SECADEROS DE CAFÉ										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	200.00	$ 2,270,960.00	0.37%	200.00	$ 2,270,960.00	0.37%	0	$ -	0.00%
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4.80	$ 142,497.00	0.02%	4.80	$ 142,497.00	0.02%	0	$ -	0.00%
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6.40	$ 6,985,432.00	1.14%	6.40	$ 6,985,432.00	1.14%	0.00	$ -	0.00%
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	8.00	$ 38,554,165.00	6.27%	8.00	$ 38,554,165.00	6.27%	0.00	$ -	0.00%
1.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	8.00	$ 31,410,166.00	5.11%	8.00	$ 31,410,166.00	5.11%	0.00	$ -	0.00%
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	8.00	$ 13,276,545.00	2.16%	8.00	$ 13,276,545.00	2.16%	0.00	$ -	0.00%
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	64.00	$ 43,134,931.00	7.01%	64.00	$ 43,134,931.00	7.01%	0.00	$ -	0.00%
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	8.00	$ 7,218,400.00	1.17%	8.00	$ 7,218,400.00	1.17%	0.00	$ -	0.00%
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	64.00	$ 5,774,720.00	0.94%	64.00	$ 5,774,720.00	0.94%	0.00	$ -	0.00%

2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**										
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	125.00	$ 1,419,350.00	0.23%	125.00	$ 1,419,350.00	0.23%	0.00	$ -	0.00%
2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	3.00	$ 89,061.00	0.01%	3.00	$ 89,061.00	0.01%	0.00	$ -	0.00%
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4.00	$ 4,365,895.00	0.71%	4.00	$ 4,365,895.00	0.71%	0.00	$ -	0.00%
2.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	5.00	$ 24,847,982.00	4.04%	5.00	$ 24,847,982.00	4.04%	0.00	$ -	0.00%
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	5.00	$ 19,631,354.00	3.19%	5.00	$ 19,631,354.00	3.19%	0.00	$ -	0.00%
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	5.00	$ 8,297,841.00	1.35%	5.00	$ 8,297,841.00	1.35%	0.00	$ -	0.00%
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	40.00	$ 26,959,332.00	4.38%	40.00	$ 26,959,332.00	4.38%	0.00	$ -	0.00%
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	5.00	$ 4,511,500.00	0.73%	5.00	$ 4,511,500.00	0.73%	0.00	$ -	0.00%
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	40.00	$ 3,609,200.00	0.59%	40.00	$ 3,609,200.00	0.59%	0.00	$ -	0.00%

3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo**							0.00%		$ -	0.00%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vertices de las paseras. Dos por vertices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diametro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera sóldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de ppuesrta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV,HUECO TIPO ROMBO QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	UND	16.00	$ 13,349,668.00	2.17%	16.00	$ 13,349,668.00	2.17%	0.00	$ -	0.00%
3.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3.00	$ 2,706,900.00	0.44%	3.00	$ 2,706,900.00	0.44%	0.00	$ -	0.00%
3.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10.00	$ 902,300.00	0.15%	10.00	$ 902,300.00	0.15%	0.00	$ -	0.00%
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x1/8"**							0.00%		$ -	0.00%
4.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90°, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO A LOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	16.00	$ 10,783,733.00	1.75%	16.00	$ 10,783,733.00	1.75%	0.00	$ -	0.00%
4.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	3.00	$ 2,706,900.00	0.44%	3.00	$ 2,706,900.00	0.44%	0.00	$ -	0.00%
4.3	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	10.00	$ 902,300.00	0.15%	10.00	$ 902,300.00	0.15%	0.00	$ -	0.00%

5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**								0.00%		$ -	0.00%
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156.00	$ 1,771,349.00	0.29%	156.00	$ 1,771,349.00	0.29%	0.00	$ -	0.00%
5.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	6.00	$ 178,122.00	0.03%	6.00	$ 178,122.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
5.3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	12.00	$ 11,005,962.00	1.79%	12.00	$ 11,005,962.00	1.79%	0.00	$ -	0.00%
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	UND	12.00	$ 27,620,805.00	4.49%	12.00	$ 27,620,805.00	4.49%	0.00	$ -	0.00%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	12.00	$ 38,906,660.00	6.32%	12.00	$ 38,906,660.00	6.32%	0.00	$ -	0.00%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	UND	12.00	$ 3,703,379.00	0.60%	12.00	$ 3,703,379.00	0.60%	0.00	$ -	0.00%
5.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	6.00	$ 5,413,800.00	0.88%	6.00	$ 5,413,800.00	0.88%	0.00	$ -	0.00%
5.8	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	96.00	$ 8,662,080.00	1.41%	96.00	$ 8,662,080.00	1.41%	0.00	$ -	0.00%
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**							0.00%		$ -	0.00%
6.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**							0.00%	0.00	$ -	0.00%
6,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	84.00	$ 953,803.00	0.16%	84.00	$ 953,803.00	0.16%	0.00	$ -	0.00%
6,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	151.80	$ 4,506,481.00	0.73%	151.80	$ 4,506,481.00	0.73%	0.00	$ -	0.00%
6,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	302.19	$ 47,957,672.00	7.80%	302.19	$ 47,957,672.00	7.80%	0.00	$ -	0.00%
6,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	1140.30	$ 13,475,554.00	2.19%	1,140.30	$ 13,475,554.00	2.19%	0.00	$ -	0.00%
6,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	83.37	$ 9,692,064.00	1.58%	83.37	$ 9,692,064.00	1.58%	0.00	$ -	0.00%

6,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84.00	$ 9,311,519.00	1.51%	84.00	$ 9,311,519.00	1.51%	0.00	$ -	0.00%
6,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	21.00	$ 7,205,876.00	1.17%	21.00	$ 7,205,876.00	1.17%	0.00	$ -	0.00%
6,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	14.28	$ 2,654,958.00	0.43%	14.28	$ 2,654,958.00	0.43%	0.00	$ -	0.00%
6,1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	21.00	$ 2,494,706.00	0.41%	21.00	$ 2,494,706.00	0.41%	0.00	$ -	0.00%
6,1,10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	228.34	$ 11,564,427.00	1.88%	228.34	$ 11,564,427.00	1.88%	0.00	$ -	0.00%
6.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**							0.00%		$ -	0.00%
6,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	14.91	$ 169,300.00	0.03%	14.91	$ 169,300.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
6,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	8.19	$ 243,136.00	0.04%	8.19	$ 243,136.00	0.04%	0.00	$ -	0.00%
6,2,3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21.00	$ 17,336,124.00	2.82%	21.00	$ 17,336,124.00	2.82%	0.00	$ -	0.00%
6,2,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21.00	$ 3,035,734.00	0.49%	21.00	$ 3,035,734.00	0.49%	0.00	$ -	0.00%
6.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**							0.00%		$ -	0.00%
6,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	8.61	$ 97,764.00	0.02%	8.61	$ 97,764.00	0.02%	0.00	$ -	0.00%
6,3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5.00	$ 148,435.00	0.02%	5.00	$ 148,435.00	0.02%	0.00	$ -	0.00%
6,3,3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21.00	$ 11,755,877.00	1.91%	21.00	$ 11,755,877.00	1.91%	0.00	$ -	0.00%
6,3,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	1.00	$ 144,559.00	0.02%	1.00	$ 144,559.00	0.02%	0.00	$ -	0.00%
6,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	ML	126.00	$ 5,400,753.00	0.88%	126.00	$ 5,400,753.00	0.88%	0.00	$ -	0.00%
6.4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E**							0.00%		$ -	0.00%
6,4,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100.80	$ 1,144,564.00	0.19%	100.80	$ 1,144,564.00	0.19%	0.00	$ -	0.00%
6,4,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	33.60	$ 997,482.00	0.16%	33.60	$ 997,482.00	0.16%	0.00	$ -	0.00%
6,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	168.00	$ 7,863,436.00	1.28%	168.00	$ 7,863,436.00	1.28%	0.00	$ -	0.00%
6,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	21.00	$ 6,342,781.00	1.03%	21.00	$ 6,342,781.00	1.03%	0.00	$ -	0.00%
6,4,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	17.85	$ 16,106,055.00	2.62%	17.85	$ 16,106,055.00	2.62%	0.00	$ -	0.00%
6.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	126.00	$ 11,368,980.00	1.85%	126.00	$ 11,368,980.00	1.85%	0.00	$ -	0.00%
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**							0.00%		$ -	0.00%
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	57.60	$ 654,037.00	0.11%	57.60	$ 654,037.00	0.11%	0.00	$ -	0.00%
7.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19.20	$ 569,990.00	0.09%	19.20	$ 569,990.00	0.09%	0.00	$ -	0.00%
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	96.00	$ 4,493,392.00	0.73%	96.00	$ 4,493,392.00	0.73%	0.00	$ -	0.00%
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	12.00	$ 3,624,446.00	0.59%	12.00	$ 3,624,446.00	0.59%	0.00	$ -	0.00%
7.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6.00	$ 5,413,800.00	0.88%	6.00	$ 5,413,800.00	0.88%	0.00	$ -	0.00%
7.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	48.00	$ 4,331,040.00	0.70%	48.00	$ 4,331,040.00	0.70%	0.00	$ -	0.00%
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**							0.00%		$ -	0.00%
8.1	**SISTEMA SÉPTICO**	0	0.00	$ -	0.00%	0.00		0.00%	0.00	$ -	0.00%
8,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20.00	$ 227,096.00	0.04%	20.00	$ 227,096.00	0.04%	0.00	$ -	0.00%

8,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19.28	$ 572,365.00	0.09%	19.28	$ 572,365.00	0.09%	0.00	$ -	0.00%
8,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	44.00	$ 6,982,817.00	1.14%	44.00	$ 6,982,817.00	1.14%	0.00	$ -	0.00%
8,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	228.70	$ 2,702,675.00	0.44%	228.70	$ 2,702,675.00	0.44%	0.00	$ -	0.00%
8,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	18.60	$ 2,162,317.00	0.35%	18.60	$ 2,162,317.00	0.35%	0.00	$ -	0.00%
8,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	18.60	$ 2,061,837.00	0.34%	18.60	$ 2,061,837.00	0.34%	0.00	$ -	0.00%
8,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	UND	5.00	$ 2,085,112.00	0.34%	5.00	$ 2,085,112.00	0.34%	0.00	$ -	0.00%
8,1,8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	28.40	$ 1,438,349.00	0.23%	28.40	$ 1,438,349.00	0.23%	0.00	$ -	0.00%
8,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	1.50	$ 332,030.00	0.05%	1.50	$ 332,030.00	0.05%	0.00	$ -	0.00%
8,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0.85	$ 182,508.00	0.03%	0.85	$ 182,508.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
8.2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE**							0.00%		$ -	0.00%
8,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2.00	$ 22,710.00	0.00%	2.00	$ 22,710.00	0.00%	0.00	$ -	0.00%
8,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.58	$ 46,905.00	0.01%	1.58	$ 46,905.00	0.01%	0.00	$ -	0.00%
8,2,3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	UND	5.00	$ 3,634,696.00	0.59%	5.00	$ 3,634,696.00	0.59%	0.00	$ -	0.00%
8.3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**							0.00%		$ -	0.00%
8,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	16.62	$ 188,718.00	0.03%	16.62	$ 188,718.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
8,3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.69	$ 198,512.00	0.03%	6.69	$ 198,512.00	0.03%	0.0000	$ -	0.00%
8,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	22.80	$ 1,154,731.00	0.19%	22.80	$ 1,154,731.00	0.19%	0.00	$ -	0.00%
8,3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	4.00	$ 885,414.00	0.14%	4.00	$ 885,414.00	0.14%	0.00	$ -	0.00%
8,3,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2.50	$ 2,255,750.00	0.37%	2.50	$ 2,255,750.00	0.37%	0.00	$ -	0.00%
8,3,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	30.00	$ 2,706,900.00	0.44%	30.00	$ 2,706,900.00	0.44%	0.00	$ -	0.00%
B	**Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.**	TALL	5.00	$ 3,179,442.00	0.52%	5.00	$ 3,179,442.00	0.52%	0.00	$ -	0.00%
	VALOR TOTAL			**$ 615,192,918.00**	**100.00%**		**$ 615,192,918.00**	**100.00%**		**$ -**	**0.00%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
"Adelantar acciones de ingeniería para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas, mediante el manejo de aguas residuales domésticas rurales con la construcción de sistemas sépticos en cuencas hidrográficas, y áreas protegidas de la categoría Distrito Regional de Manejo Integrado y Humedales que poseen instrumentos de planificación aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en su jurisdicción".	$ 615.192.918,00	$ 615.192.918,00	$ 0,00	**100%**	En el presente período ejecutó por encima del porcentaje de la reprogramación establecida para el contrato, ejecutando un porcentaje equivalente al **100%** vs el **81,63%** del programado; teniendo en cuenta que el contratista aumentó la mano de obra. El contratista está cumpliendo el alcance y las especificaciones técnicas del contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	-
Oportunidad en entrega	-
Cantidad entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 15 sistemas sépticos de aguas domésticas, 2 sistema séptico de aguas residuales no domésticas, 1 tanque australiano, 8 secaderos de café, 1 secadero de cacao, 10 campos de infiltración correspondientes al **56,18%** de las actividades ejecutadas en el periodo por el valor de **$ 345.602.970,00**. En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA –FORMA DE PAGO: "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra hasta un 80% del valor total del contrato, para cada pago parcial EL CONTRATISTA deberá presentar un informe de ejecución física, con registro fotográfico de las actividades ejecutadas, al igual deberá anexar acta de recibo de la obra firmada por el beneficiario y la interventoría técnica, si hay lugar a ello...*" "*…El pago final equivalente al 20 % del valor del contrato se materializará con la liquidación del mismo y con la presentación de...*"; la Interventoría considera conveniente adelantar el trámite para el segundo pago correspondiente a **$222.564.386,40** .M/cte., que equivale al 80% acumulado del valor contractual y los $123.038.583,60 que equivale al 20% se pagaran con la liquidación del contrato, que comprende el período de ejecución desde el 01 de mayo hasta 30 de junio de 2025; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL	$ 345.602.970,00
VALOR A PAGAR HASTA EL 80% DEL CONTRATO	$222.564.386,40
VALOR A PAGAR LIQUIDACIÓN 20%	$123.038.583,60
RECURSOS CAM	$ 80.448.363,55
RECURSOS CEIBAS	$ 265.154.606,45
VALOR A PAGAR	**$ 345.602.970,00**

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Interventoría

ANEXO 1
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA – MEMORIAS - ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.2

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**									
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**				
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00						
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES						
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025		**FECHA ACTA**		**11/06/2025**		
	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 40x20 mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2", paseras en tabla nogal o pino apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16" y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**											
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	200,00	$ 8.809,00	$ 1.761.800,00	200,00	$ 1.761.800,00	0,00	$ -	200,00	$ 1.761.800,0	
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 23.031,00	$ 147.398,40	6,40	$ 147.398,40	-1,60	$ (36.849,60)	4,80	$ 110.548,8	
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 846.760,00	$ 5.419.264,00	6,40	$ 5.419.264,00	0,00	$ -	6,40	$ 5.419.264,0	
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	8,00	$ 3.738.767,00	$ 29.910.136,00	8,00	$ 29.910.136,00	0,00	$ -	8,00	$ 29.910.136,0	
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	8,00	$ 3.045.982,00	$ 24.367.856,00	8,00	$ 24.367.856,00	0,00	$ -	8,00	$ 24.367.856,0	
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	8,00	$ 1.287.485,00	$ 10.299.880,00	8,00	$ 10.299.880,00	0,00	$ -	8,00	$ 10.299.880,0	
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	64,00	$ 522.873,00	$ 33.463.872,00	64,00	$ 33.463.872,00	0,00	$ -	64,00	$ 33.463.872,0	
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	8,00	$ 700.000,00	$ 5.600.000,00	8,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 5.600.000,0	
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	64,00	$ 70.000,00	$ 4.480.000,00	64,00	$ 4.480.000,00	0,00	$ -	64,00	$ 4.480.000,0	
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**											
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	125,00	$ 8.809,00	$ 1.101.125,00	125,00	$ 1.101.125,00	0,00	$ -	125,00	$ 1.101.125	

		OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**											
		CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**			
		VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00							
		PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES							
		F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025				**FECHA ACTA**		**11/06/2025**	
		CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**		
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 23.031,00	$ 92.124,00		4,00	$ 92.124,00	-1,00	$ (23.031,00)	3,00	$ 69.093,0		
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 846.760,00	$ 3.387.040,00		4,00	$ 3.387.040,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.387.040,0		
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	5,00	$ 3.855.389,00	$ 19.276.945,00		5,00	$ 19.276.945,00	0,00	$ -	5,00	$ 19.276.945,0		
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	5,00	$ 3.045.982,00	$ 15.229.910,00		5,00	$ 15.229.910,00	0,00	$ -	5,00	$ 15.229.910,0		
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	5,00	$ 1.287.485,00	$ 6.437.425,00		5,00	$ 6.437.425,00	0,00	$ -	5,00	$ 6.437.425,0		
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	40,00	$ 522.873,00	$ 20.914.920,00		40,00	$ 20.914.920,00	0,00	$ -	40,00	$ 20.914.920,0		
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00		5,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.500.000,0		
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	40,00	$ 70.000,00	$ 2.800.000,00		40,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ -	40,00	$ 2.800.000,0		
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x 1/8"**													

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**									
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**	
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00					
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES					
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025				**FECHA ACTA**	**11/06/2025**

	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vertices de las paseras. Dos por vertices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diametro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera sóldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de ppuesrta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV,HUECO TIPO ROMBO QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	UND	16,00	$ 647.288,00	$ 10.356.608,00	16,00	$ 10.356.608,00	0,00	$ -	16,00	$ 10.356.608,0
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000,0
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 700.000,0
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x1/8"**										
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90°, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO A LOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	16,00	$ 522.873,00	$ 8.365.968,00	16,00	$ 8.365.968,00	0,00	$ -	16,00	$ 8.365.968,0
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000,0
4,3	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 700.000,0
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**										
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156,00	$ 8.809,00	$ 1.374.204,00	156,00	$ 1.374.204,00	0,00	$ -	156,00	$ 1.374.204,0
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	6,00	$ 23.031,00	$ 138.186,00	6,00	$ 138.186,00	0,00	$ -	6,00	$ 138.186,0

	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"								
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024			
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00		VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00					
	PLAZO	8	MESES	PLAZO	8 MESES					
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025	30/12/2024	27/08/2025		FECHA ACTA	11/06/2025		

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1		MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	12,00	$ 711.531,00	$ 8.538.372,00	12,00	$ 8.538.372,00	0,00	$ -	12,00	$ 8.538.372,0
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	UND	12,00	$ 1.785.674,00	$ 21.428.088,00	12,00	$ 21.428.088,00	0,00	$ -	12,00	$ 21.428.088,0
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	12,00	$ 2.515.300,00	$ 30.183.600,00	12,00	$ 30.183.600,00	0,00	$ -	12,00	$ 30.183.600,0
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	UND	12,00	$ 239.422,00	$ 2.873.064,00	12,00	$ 2.873.064,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.873.064,0
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 4.200.000,0
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	96,00	$ 70.000,00	$ 6.720.000,00	96,00	$ 6.720.000,00	0,00	$ -	96,00	$ 6.720.000,0
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**										
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**						$ -				
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	84,00	$ 8.809,00	$ 739.956,00	84,00	$ 739.956,00	0,00	$ -	84,00	$ 739.956,0
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	140,70	$ 23.031,00	$ 3.240.462,00	140,70	$ 3.240.462,00	11,10	$ 255.644,00	151,80	$ 3.496.106,0
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	298,20	$ 123.119,00	$ 36.714.086,00	298,20	$ 36.714.086,00	3,99	$ 491.245,00	302,19	$ 37.205.331,0
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	1.050	$ 9.168,00	$ 9.626.400,00	1.050,00	$ 9.626.400,00	90,30	$ 827.870,00	1140,30	$ 10.454.270,0
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 90.189,00	$ 7.575.876,00	84,00	$ 7.575.876,00	-0,63	$ (56.819,00)	83,37	$ 7.519.057,0
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 85.998,00	$ 7.223.832,00	84,00	$ 7.223.832,00	0,00	$ -	84,00	$ 7.223.832,0
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	21,00	$ 266.204,00	$ 5.590.284,00	21,00	$ 5.590.284,00	0,00	$ -	21,00	$ 5.590.284,0
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	14,70	$ 144.237,00	$ 2.120.284,00	14,70	$ 2.120.284,00	-0,42	$ (60.580,00)	14,28	$ 2.059.704,0
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	21,00	$ 92.161,00	$ 1.935.381,00	21,00	$ 1.935.381,00	0,00	$ -	21,00	$ 1.935.381,0
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	126,00	$ 39.291,00	$ 4.950.666,00	126,00	$ 4.950.666,00	102,34	$ 4.020.961,00	228,34	$ 8.971.627,0
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**										
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	13,44	$ 8.809,00	$ 118.393,00	13,44	$ 118.393,00	1,47	$ 12.949,00	14,91	$ 131.342,0
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	10,75	$ 23.031,00	$ 247.629,00	10,75	$ 247.629,00	-2,56	$ (59.005,00)	8,19	$ 188.624,0
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 640.442,00	$ 13.449.282,00	21,00	$ 13.449.282,00	0,00	$ -	21,00	$ 13.449.282,0

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**										
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**				
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00							
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES							
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025			**FECHA ACTA**		**11/06/2025**		
	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**			**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	21,00	$ 2.355.108,00		0,00	$ -	21,00	$ 2.355.108,0	
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**						$ -					$ -	
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3,36	$ 8.809,00	$ 29.598,00	3,36	$ 29.598,00		5,25	$ 46.247,00	8,61	$ 75.845,0	
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,02	$ 23.031,00	$ 46.430,00	2,02	$ 46.430,00		2,98	$ 68.725,00	5,00	$ 115.155,0	
6.3.3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 434.293,00	$ 9.120.153,00	21,00	$ 9.120.153,00		0,00	$ -	21,00	$ 9.120.153,0	
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	21,00	$ 2.355.108,00		-20,00	$ (2.242.960,00)	1,00	$ 112.148,0	
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	ML	126,00	$ 33.253,00	$ 4.189.878,00	126,00	$ 4.189.878,00		0,00	$ -	126,00	$ 4.189.878,0	
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**												
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100,80	$ 8.809,00	$ 887.947,00	100,80	$ 887.947,00		0,00	$ -	100,80	$ 887.947,0	
6.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	33,60	$ 23.031,00	$ 773.842,00	33,60	$ 773.842,00		0,00	$ -	33,60	$ 773.842,0	
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	168,00	$ 36.312,00	$ 6.100.416,00	168,00	$ 6.100.416,00		0,00	$ -	168,00	$ 6.100.416,0	
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	21,00	$ 234.319,00	$ 4.920.699,00	21,00	$ 4.920.699,00		0,00	$ -	21,00	$ 4.920.699,0	
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	17,85	$ 700.000,00	$ 12.495.000,00	17,85	$ 12.495.000,00		0,00	$ -	17,85	$ 12.495.000,0	
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	126,00	$ 70.000,00	$ 8.820.000,00	126,00	$ 8.820.000,00		0,00	$ -	126,00	$ 8.820.000,0	
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**												
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	57,60	$ 8.809,00	$ 507.398,40	57,60	$ 507.398,40		0,00	$ -	57,60	$ 507.398,40	
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19,20	$ 23.031,00	$ 442.195,20	19,20	$ 442.195,20		0,00	$ -	19,20	$ 442.195,20	
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	96,00	$ 36.312,00	$ 3.485.952,00	96,00	$ 3.485.952,00		0,00	$ -	96,00	$ 3.485.952,0	
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	12,00	$ 234.319,00	$ 2.811.828,00	12,00	$ 2.811.828,00		0,00	$ -	12,00	$ 2.811.828,0	
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00		0,00	$ -	6,00	$ 4.200.000,0	
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	48,00	$ 70.000,00	$ 3.360.000,00	48,00	$ 3.360.000,00		0,00	$ -	48,00	$ 3.360.000,0	
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**												
8,1	**SISTEMA SÉPTICO**												
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20,00	$ 8.809,00	$ 176.180,00	20,00	$ 176.180,00		0,00	$ -	20,00	$ 176.180,0	
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	38,00	$ 23.031,00	$ 875.178,00	38,00	$ 875.178,00		-18,72	$ (431.140,00)	19,28	$ 444.038,0	
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	55,00	$ 123.119,00	$ 6.771.545,00	55,00	$ 6.771.545,00		-11,00	$ (1.354.309,00)	44,00	$ 5.417.236,0	
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	250,00	$ 9.168,00	$ 2.292.000,00	250,00	$ 2.292.000,00		-21,30	$ (195.278,00)	228,70	$ 2.096.722,0	
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 90.189,00	$ 1.803.780,00	20,00	$ 1.803.780,00		-1,40	$ (126.265,00)	18,60	$ 1.677.515,0	
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 85.998,00	$ 1.719.960,00	20,00	$ 1.719.960,00		-1,40	$ (120.397,00)	18,60	$ 1.599.563,0	
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	UND	5,00	$ 323.524,00	$ 1.617.620,00	5,00	$ 1.617.620,00		0,00	$ -	5,00	$ 1.617.620,0	
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	30,00	$ 39.291,00	$ 1.178.730,00	30,00	$ 1.178.730,00		-1,60	$ (62.866,00)	28,40	$ 1.115.864,0	
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	2,00	$ 171.725,00	$ 343.450,00	2,00	$ 343.450,00		-0,50	$ (85.863,00)	1,50	$ 257.587,00	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	1,50	$ 166.575,00	$ 249.862,50	1,50	$ 249.862,50		-0,65	$ (108.273,75)	0,85	$ 141.588,75	
8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC**												
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2,00	$ 8.809,00	$ 17.618,00	2,00	$ 17.618,00		0,00	$ -	2,00	$ 17.618,0	

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**										
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**	
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00					
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES					
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025				**FECHA ACTA**	**11/06/2025**

		CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
8.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,10	$ 23.031,00	$ 25.334,10		1,10	$ 25.334,10	0,48	$ 11.054,88	1,58	$ 36.388,98
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	UND	5,00	$ 563.956,00	$ 2.819.780,00		5,00	$ 2.819.780,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.819.780,0
8,3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**											
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	24,00	$ 8.809,00	$ 211.416,00		24,00	$ 211.416,00	-7,38	$ (65.010,00)	16,62	$ 146.406,0
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	8,00	$ 23.031,00	$ 184.248,00		8,00	$ 184.248,00	-1,31	$ (30.244,00)	6,69	$ 154.004,0
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	40,00	$ 39.291,00	$ 1.571.640,00		40,00	$ 1.571.640,00	-17,20	$ (675.805,20)	22,80	$ 895.834,8
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	4,00	$ 171.725,00	$ 686.900,00		4,00	$ 686.900,00	0,00	$ -	4,00	$ 686.900,0
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2,50	$ 700.000,00	$ 1.750.000,00		2,50	$ 1.750.000,00	0,00	$ -	2,50	$ 1.750.000,0
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	30,00	$ 70.000,00	$ 2.100.000,00		30,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	30,00	$ 2.100.000,0
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 474.797.111,00**		**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 474.797.111,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 474.797.111,00**
	ADMINISTRACION 12% =				$ 56.975.653,00		ADMINISTRACION 12% =	$ 56.975.653,00	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	$ 56.975.653,00
	IMPREVISTOS 5% =				$ 23.739.856,00		IMPREVISTOS 5% =	$ 23.739.856,00	IMPREVISTOS 5% =	$ -	IMPREVISTOS 5% =	$ 23.739.856,00
	UTILIDAD 10% =				$ 47.479.711,00		UTILIDAD 10% =	$ 47.479.711,00	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	$ 47.479.711,00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 9.021.145,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.021.145,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.021.145,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 137.216.365,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 137.216.365,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 137.216.365,00**
	TOTAL COSTOS EQUIPAMENTO RURAL (Directos + Indirectos)				**$ 612.013.476,00**		**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 612.013.476,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ -**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 612.013.476,00**
B	SENCIBILIZACION SOCIAL COMUNITARIO											
	Talleres de sencibilizacion social comunitario	TALLER	3	$ 730.000,00	$ 2.190.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -		
	ADMINISTRACION 12% =				$ 262.800,00		ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	
	UTILIDAD 10% =				$ 219.000,00		UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 507.642,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENCIBILIZACION					**$ 3.179.442,00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
	NUEVO ITEM											
9	Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.	TALLER		$ 534.360,00			5,00	$ 2.671.800,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.671.800,00
	I.V.A. (19%)				$ -			$ 507.642,00		$ -	I.V.A. (19%)	$ 507.642,00
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENSIBILIZACION					**$ -**			**$ 3.179.442,00**		**$ -**		**$ 3.179.442,00**
	TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION				**$ 615.192.918,00**			**$ 615.192.918,00**		**$ -**		**$ 615.192.918,00**
							VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 615.192.918,00**		**$ -**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 615.192.918,00**

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
RL. CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES** N/A	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,2	ANAIS VILLAREAL	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARIA RUTH PEREZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARITZA NINCO ROJAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	ALBA LUZ MOLANO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
						TOTAL	**4,80**

TOTAL	**4,80**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,80**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,2	JOEL DIAZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JOSE ONÍÍAS TOVAR	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	ASPROCAECO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JAIRO LOZANO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
						TOTAL	**3,00**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.1.2	LUCILA MENDEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE GOMEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE BENITO SANCHEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	FLOR ALBENIS SALINAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	KERLY JOHANA BONILLA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,20	0,36	1,00	**0,36**
	LUZ DARY ESCOBAR	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	30,00	0,30	0,20	1,80	1,00	**1,80**
	MARIA RUTH PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,20	0,15	1,00	**0,15**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,30	0,23	1,00	**0,23**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,30	1,30	0,30	1,29	1,00	**1,29**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	13,00	0,30	0,30	1,17	1,00	**1,17**
	SAUL PULIDO TELLO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	22,00	0,40	0,70	6,16	1,00	**6,16**
	JHON PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	ABIGAIL MONTIEL	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YORLADIS PASINGA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	8,00	0,30	0,30	0,72	1,00	**0,72**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	7,80	0,30	0,30	0,70	1,00	**0,70**
						TOTAL	**151,80**





TOTAL	151,80
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	151,80



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE SUSPENSION 3:	
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.3	LUCILA MENDEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE GOMEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE BENITO SANCHEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	FLOR ALBENIS SALINAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	KERLY JOHANA BONILLA	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	LUZ DARY ESCOBAR	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**302,19**





TOTAL	302,19
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	302,19



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
6.1.4	LUCILA MENDEZ				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE GOMEZ				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE ALDEMAR TIQUE				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE BENITO SANCHEZ				54,30	1,00	**54,30**
	FLOR ALBENIS SALINAS				54,30	1,00	**54,30**
	KERLY JOHANA BONILLA				54,30	1,00	**54,30**
	LUZ DARY ESCOBAR				54,30	1,00	**54,30**
	MARIA RUTH PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JHON JAIRO PASCUAS				54,30	1,00	**54,30**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES				54,30	1,00	**54,30**
	SAUL PULIDO TELLO				54,30	1,00	**54,30**
	YENI ANDREA PERDOMO				54,30	1,00	**54,30**
	JHON FAIBER MANRIQUE				54,30	1,00	**54,30**
	JHON PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	ABIGAIL MONTIEL				54,30	1,00	**54,30**
	YORLADIS PASINGA				54,30	1,00	**54,30**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO				54,30	1,00	**54,30**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	RAFAEL BECERRA VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
						TOTAL	**1.140,30**





TOTAL	**1.140,30**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1.140,30**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.5	LUCILA MENDEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE GOMEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE BENITO SANCHEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	FLOR ALBENIS SALINAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	KERLY JOHANA BONILLA	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
						TOTAL	**83,37**





TOTAL	**83,37**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**83,37**

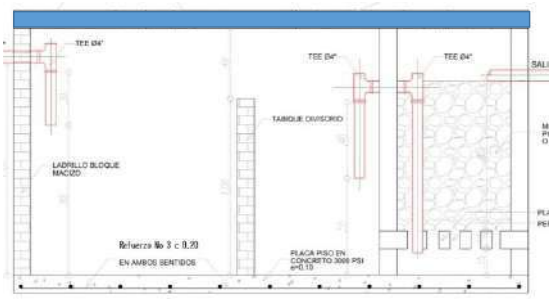

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.1.8	LUCILA MENDEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE GOMEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE BENITO SANCHEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	FLOR ALBENIS SALINAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	KERLY JOHANA BONILLA	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	LUZ DARY ESCOBAR	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	MARIA RUTH PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON JAIRO PASCUAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	SAUL PULIDO TELLO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENI ANDREA PERDOMO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON FAIBER MANRIQUE	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ABIGAIL MONTIEL	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YORLADIS PASINGA	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
						TOTAL	**14,28**



TOTAL	**14,28**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,28**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.1.10	LUCILA MENDEZ	15,00				1,00	**15,00**
	JOSE GOMEZ	16,00				1,00	**16,00**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	14,00				1,00	**14,00**
	JOSE BENITO SANCHEZ	12,00				1,00	**12,00**
	FLOR ALBENIS SALINAS	25,04				1,00	**25,04**
	KERLY JOHANA BONILLA	6,00				1,00	**6,00**
	LUZ DARY ESCOBAR	22,00				1,00	**22,00**
	MARIA RUTH PEREZ	2,50				1,00	**2,50**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	2,50				1,00	**2,50**
	JHON JAIRO PASCUAS	6,50				1,00	**6,50**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	13,00				1,00	**13,00**
	SAUL PULIDO TELLO	6,00				1,00	**6,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	6,00				1,00	**6,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	22,00				1,00	**22,00**
	JHON PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	ABIGAIL MONTIEL	6,00				1,00	**6,00**
	YORLADIS PASINGA	14,00				1,00	**14,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	14,00				1,00	**14,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	7,80				1,00	**7,80**
						TOTAL	**228,34**



TOTAL	**228,34**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**228,34**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.2.1	LUCILA MENDEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE GOMEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
						TOTAL	**14,91**





TOTAL	**14,91**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,91**

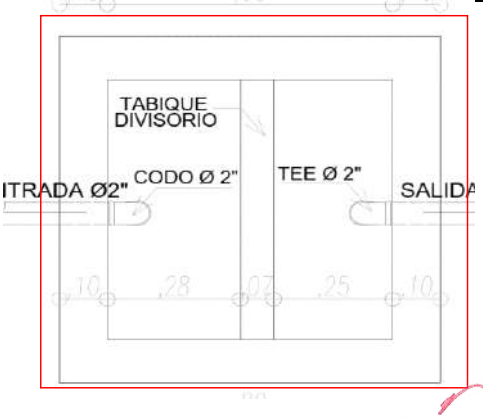

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.2.2	LUCILA MENDEZ	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84	0,6	0,42	1,00	**0,42**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
						TOTAL	**8,19**

TOTAL	**8,19**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,19**



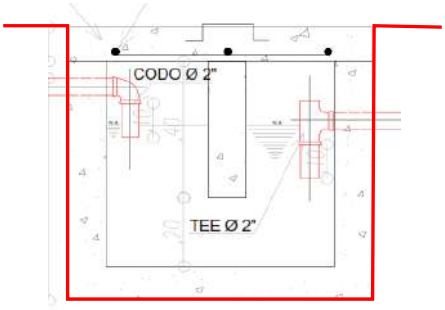

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.3.1	LUCILA MENDEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE GOMEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
						TOTAL	**8,61**



TOTAL	**8,61**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,61**

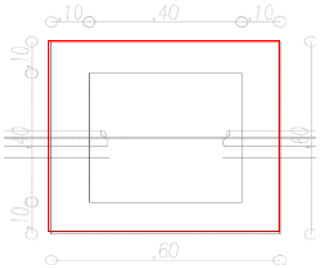

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.3.2	LUCILA MENDEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE GOMEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
						TOTAL	**5,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**5,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 3: **FECHA DE REINICIO 3:**	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE SUSPENSION 4: **FECHA DE REINICIO 4:**	**11/06/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -		**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.3.4	FLOR ALBENIS SALINAS					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
		FECHA DE REINICIO 1: N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 2:**	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.2	HERMES SUNCE TOVAR	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	HERMES- TUBERÍA ENTERRADA	2,50	0,30	0,5	0,38	1,00	**0,38**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	JOSE ANTONIO-TUBERÍA ENTERRADA	0,50	0,30	0,5	0,08	1,00	**0,08**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	ELCIAS YAGUE-tubería conexión	9,00	0,20	0,2	0,36	1,00	**0,36**
	BEATRIS BAUTISTA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	6,50	0,20	0,2	0,26	1,00	**0,26**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	5,00	0,20	0,2	0,20	1,00	**0,20**
						TOTAL	**19,28**

TOTAL	**19,28**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**19,28**

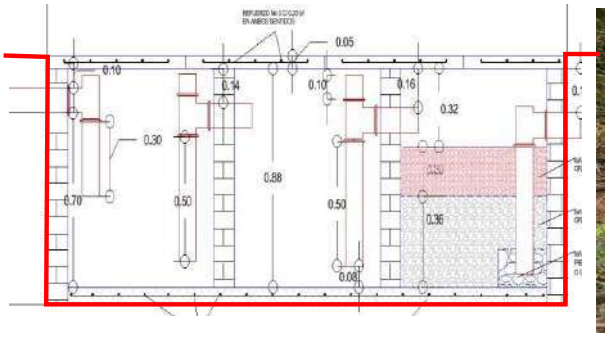



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL:	$ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO:	$ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.3	HERMES SUNCE TOVAR	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	BEATRIS BAUTISTA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	JUAN CARLOS POLOCHE	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
						TOTAL	**44,00**

TOTAL	**44,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**44,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
8.1.4	HERMES SUNCE TOVAR				45,74	1,00	**45,74**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA				45,74	1,00	**45,74**
	ELCIAS YAGUE RIVERA				45,74	1,00	**45,74**
	BEATRIS BAUTISTA				45,74	1,00	**45,74**
	JUAN CARLOS POLOCHE				45,74	1,00	**45,74**
						TOTAL	**228,70**

TOTAL	**228,70**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**228,70**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00		**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00		**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.5	HERMES SUNCE TOVAR	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**18,60**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**18,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00		**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00		**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.6	HERMES SUNCE TOVAR	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**18,60**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**18,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.1.8	HERMES SUNCE TOVAR	5,00				1,00	**5,00**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	1,00				1,00	**1,00**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	10,40				1,00	**10,40**
	BEATRIS BAUTISTA	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	6,00				1,00	**6,00**
						TOTAL	**28,40**



TOTAL	**28,40**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**28,40**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: **FECHA DE REINICIO 3:**	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE SUSPENSION 4: **FECHA DE REINICIO 4:**	**11/06/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.9	HERMES SUNCE TOVAR	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
						TOTAL	**1,50**

TOTAL	**1,50**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,50**



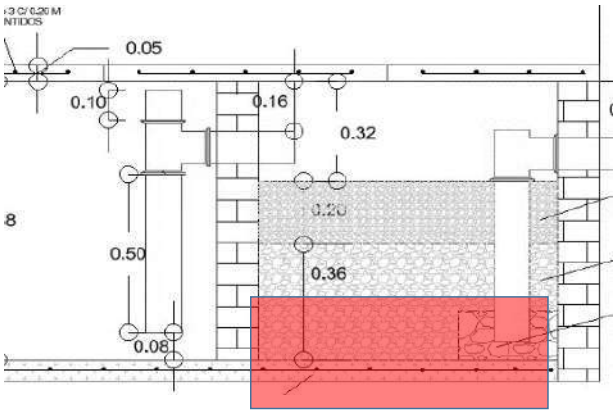

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.10	HERMES SUNCE TOVAR	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
						TOTAL	**0,85**

TOTAL	**0,85**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,85**



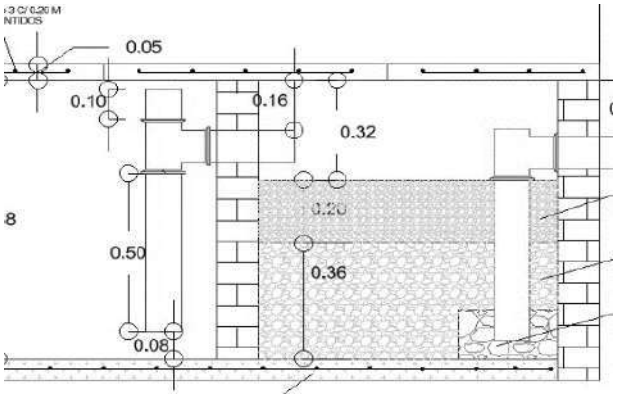

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.3.1	HS_FOSA INFILTRACIÓN	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	HS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,45		0,45	1,00	**0,45**
	JAS_FOZA INFILTRACIÓN	1,50	1,10		1,65	1,00	**1,65**
	JAS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,50	0,45		0,68	1,00	**0,68**
	ELCIAS YAGUE-FOSA	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	ELCIAS YAGUE-PVC-S 4"	4,00	0,45		1,80	1,00	**1,80**
	BEATRIS BAUTISTA	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
						TOTAL	**16,62**

TOTAL	**16,62**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**16,62**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.3.2	HS_FOZA INFILTRACIÓN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	HS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,37	0,20	0,08	1,00	**0,08**
	JAS_FOZA INFILTRACIÓN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JAS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,37	0,20	0,08	1,00	**0,08**
	ELCIAS YAGUE-FOSA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ELCIAS YAGUE-PVC-S 4"	4,00	0,40	0,20	0,32	1,00	**0,32**
	BEATRIS BAUTISTA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,60	1,00	**0,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,60	1,00	**0,60**
						TOTAL	**6,68**

TOTAL	**6,68**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,68**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.3.3	HERMES SUNCE TOVAR	1,30				1,00	**1,30**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	1,50				1,00	**1,50**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	4,00				1,00	**4,00**
	BEATRIS BAUTISTA	8,00				1,00	**8,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**22,80**

TOTAL	**22,80**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**22,80**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE JUSTIFICACIÓN N°2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024 CELEBRADO EL 20 DE DICEMBRE DE 2024 ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL CONSORCIO OBRAS RURALES 2024.

OBJETO	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL".
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024 R.L. DEYANID GUILOMBO VALENZUELA C.C. 1.075.220.497 DE NEIVA - HUILA
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($615.192.918,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
INTERVENTORÍA DE LA OBRA	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO C.C. 79.142.300 DE BOGOTÁ D.C.
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA	JAVIER CARDOSO GUTIERREZ Profesional Universitario SGA Coordinador proyecto "Cuenca río Las Ceibas"
FECHA ACTA JUSTIFICACIÓN N°2	11/06/2025
FECHA ACTA DE INICIO	30/12/2024

En Neiva - Huila, a los once (11) días del mes de junio de 2025, se reunieron el Ingeniero **JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ,** profesional universitario de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM en calidad de Supervisor de la interventoría para el contrato de Obra No.490 de 2024, **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**, en calidad de Interventor del contrato de obra en comento y, **DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**, como representante legal del **CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**, contratista de obra, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que mediante el proceso de Licitación pública LP-04-CAM-2024, se adjudicó el contrato de obra No.490 de 2024, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y el CONSORCIO OBRAS RURALES 2024, representada legalmente por Deyanid Guilombo Valenzuela, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.075.220.497 de Neiva - Huila, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS

AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL".

2. Que el 15 de mayo de 2025 se firmó el otrosí No.1 al contrato de obra pública No.490 de 2024, mediante el cual se modificaron beneficiarios, cantidades de obra, descripción de algunos capítulos y actividades y se creó nuevo ítem, sin adición y plazo.

3. Que el contrato de obra No.490 de 2024 actualmente se encuentra vigente en todas sus partes.

4. Que, de conformidad al acta de comité técnico No.8, celebrado el 9 de junio de 2025, se determinó necesario realizar acta de mayores y menores cantidades de obra, la cual refleja la ejecución física real del contrato de obra y proceder a dar cierre financiero de las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato de obra pública No.490 de 2024.

5. Que el día 11 de junio del 2025, el contratista presenta el acta de mayores y menores cantidades, conforme a la medición de las cantidades de obra ejecutadas y por terminar, las cuales fueron objeto de verificación por la interventoría y aprobación por la supervisión, sin generar adición de recursos financieros del valor contratado.

6. Que la Interventoría y Supervisión delegada por la CAM, encuentran ajustada a las condiciones de ejecución el acta de mayores y menores cantidades de obra, sin adición en valor al contrato de obra No.490 de 2024, con lo cual se garantiza la correcta ejecución del mismo.

7. Que es necesario e ineludible para esta Entidad se garantice la continuidad en la ejecución del Contrato de obra No.490 de 2024 de acuerdo al requerimiento programado.

Para constancia se firma en Neiva (Huila), a los once (11) día del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
R.L. Consorcio Obras Rurales 2024

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Interventor

JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ
Profesional Universitario SGA
Supervisor Contrato No.485 de 2024

ANEXO 2
ACTAS DE RECIBO INDIVIDUAL BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS SECADEROS DE CAFE (8)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Primavera	Anais Villarreal	28.809.197
2	Primavera	María Ruth Pérez	26.444.156
3	Primavera	Maritza Ninco Rojas / Franeth Rojas Vargas (Propietario – Esposo fallecido)	36.305.398
4	Canoas	Carolina Rojas Vanegas	1.075.271.427
5	San Bartolo	Alba Luz Molano	26.406.480
6	Chapuro	Leidy Johana Olaya Ricaurte	26.431.696
7	Canoas	Martha Piedad Castro	55.166.979
8	Chapuro	María Ruth Oliveros / Nubia Payo Oliveros (hija)	36.161.580

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ANAIS VILLAERAL	28,809,197

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Quien recibe:

Nombre: LILIANA POLANCO VILLAREAL
Cédula: 55,169,722 CC 55.169.722 N.

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARIA RUTH PEREZ	26,444,156

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: MARIA RUTH PEREZ
Cédula: 26,444,156

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARITZA NINCO ROJAS	36,305,398

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Quien recibe:

Maritza Ninco Rojas

Nombre: MARITZA NINCO ROJAS
Cédula: 36,305,398

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	CANOAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,075,271,427

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Carolina Rojas Vanegas

Nombre: CAROLINA ROJAS VANEGAS
Cédula: 1,075,271,427

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
10/06/2025	HUILA		NEIVA	SAN BARTOLO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ALBA LUZ MOLANO	26,406,480

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Nombre: ALBA LUZ MOLANO
Cédula: 26,406,480

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
11/06/2025	HUILA		NEIVA	CHAPURO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LEIDY JOHANNA OLAYA	36,431,696

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Leidy Johanna olaya Ricaurte

Nombre: LEIDY JOHANNA OLAYA
Cédula: 36,431,696 26 431 696

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	CANOAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARTHA PIEDAD CASTRO	55,166,979

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: MARTHA PIEDAD CASTRO
Cédula: 55,166,979

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584


VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA





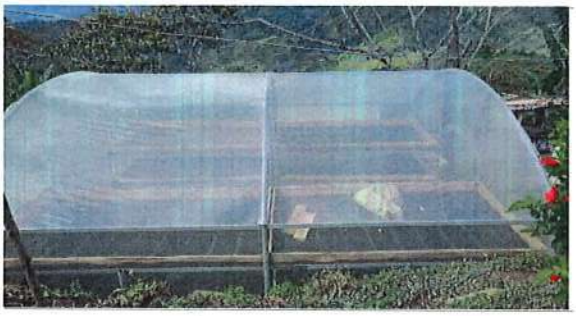



ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
11/06/2025	HUILA		NEIVA	CHAPURO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARIA RUTH OLIVEROS	36,161,580

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario: Maria Ruth Oliveros = hija: Rubia Rayo Oliveros ss177118

Nombre: MARIA RUTH OLIVEROS
Cédula: 36,161,580

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









BENEFICIARIOS SECADEROS DE CACAO (1)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Los Cauchos	José Benito Sánchez	12.108.020

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.698.260-0

OBRA: SECADERO DE CACAO

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
29/04/2025	HUILA		NEIVA	LOS CAUCHOS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JOSE BENITO SANCHEZ	12.108.020

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CACAO, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SENTIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1,00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA.	Unidad	8,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: JOSE BENITO SANCHEZ
Cédula: 12.108.020

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CACAO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









BENEFICIARIOS TANQUES AUSTRALIANOS (1)

MUNICPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Platanillal	Edgar Bahamón	12.109.251

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: TANQUE AUSTRALIANO

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
30/04/2025	HUILA		NEIVA	PLATANILLAL

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
EDGAR BAHAMON	12.109.251

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	13,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	0,50
INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: EDGAR BAHAMON
Cédula: 12.109.251

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.392.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: TANQUE AUSTRALIANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









BENEFICIARIOS SISTEMAS SÉPTICOS ARD (15)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Palestina	Luz Dary Escobar	41.928.458
2	Primavera	María Ruth Pérez	26.444.156
3	Canoas	Carolina Rojas Vanegas	1.075.271.427
4	Platanillal	Jhon Jairo Pascuas	7.700.713
5	Canoas	Eduardo Quino Quiñones	7.696.658
6	Las Nubes	Saul Pulido Tello	12.106.107
MUNICIPIO DE PAICOL			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
7	Alto San Miguel	Jhon Faiber Manrique	1.079.510.034
8	Alto San Miguel	Yeni Andrea Perdomo	36.069.922
9	Alto San Miguel	Jhon Jairo Pérez	7.711.428
MUNICIPIO DE ELIAS			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
10	San Vicente	Juan Pablo Meneses Vargas	7.716.512
11	San Vicente	Alfredo Ceballos Vargas	4.900.634
12	San Vicente	Rafael Becerra Vargas	91.134.383
MUNICIPIO DE ACEVEDO			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
13	El Salado	Yorladis Pasinga Tapiero	1.083.911.911
14	El Salado	Abigail Montiel	36.275.176
15	El Salado	Yenny Rocio Prieto Caicedo	1.078.753.588

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PALESTINA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LUZ DARY ESCOBAR BAHAMON	41,928,458

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Luz Dary Escobar

Nombre: LUZ DARY ESCOBAR BAHAMON
Cédula: 41,928,458

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARIA RUTH PEREZ	26.444.156

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: MARIA RUTH PEREZ
Cédula: 26.444.156

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	CANOAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
CAROLINA ROJAS VANEGAS	1.075.271.427

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría,·para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Carolina Rojas Vanegas

Nombre: CAROLINA ROJAS
Cédula: 1.075.271.427

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
29/04/2025	HUILA		NEIVA	PLATANILLAL

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JHON JAIRO PASCUAS ROJAS	7.700.713

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario: Jhon Jairo Pascuas

Nombre: JHON JAIRO PASCUAS ROJAS
Cédula: 7.700.713

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	CANOAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
EDUARDO QUINO QUIÑONES	7,696,658

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Quien recibe:

Nombre: MAGALY VANEGAS CAICEDO
Cédula: 26,428,233

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
19/05/2025	**HUILA**		**NEIVA**	**LAS NUBES**

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
SAUL PULIDO TELLO	**12.106.107**

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): **DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: **SAUL PULIDO TELLO**
Cédula: 12.106.107

Director de obra:

Nombre: **OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN**
Cédula: 93.393.584

VoBo **JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	VEREDA
	HUILA		PAICOL	ALTO SANMIGUEL

CONTRATISTA		INTERVENTOR
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	N/o DE CEDULA
JHON FAIBER MANRIQUE	

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit 901 898 260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo, este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO, INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P S I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4" I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 60 x 60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15, Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075 220 497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario: Jhon Faiver manrique

Nombre: JHON FAIBER MANRIQUE
Cédula: 1079510034

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

Scanned with CamScanner


OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA







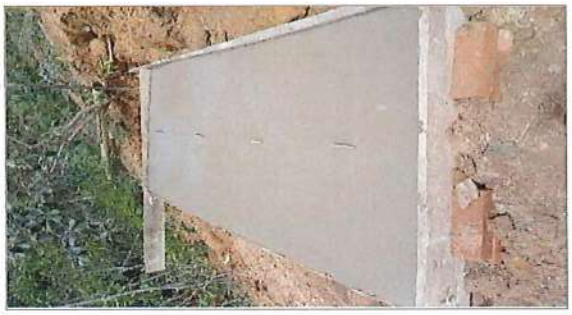

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.698.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	VEREDA
	HUILA		PAICOL	ALTO SANMIGUEL

CONTRATISTA		INTERVENTOR
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	No. DE CEDULA
YENI ANDREA PERDOMO	

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit 901.698.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo, este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema, además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0 07 X 0 12 X 0 24) e=0 12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P S I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0 80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCION 0 60 x 0 60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0 60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0 25 (Grava de 2 a 6 cm H=0 15, Arena H=0 10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Yeni Andrea perdomo pobre

Nombre: YENI ANDREA PERDOMO
Cédula: 36.069.922

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 91.399.184

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

Scanned with CamScanner

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT 901.893.200-9

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARO

FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VEREDA
	HUILA	PAICOL	ALTO SANMIGUEL

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	No. DE CEDULA
JHON PEREZ	7.711.428

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representacion del Consorcio Obras Rurales 2024, NIT.901.893.200-9, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de interventoria, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantias de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc. adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema, además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes caracteristicas y cantidades de obra.

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, ANCLAJE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	Kg	94.50
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M. INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR E STEMA SÉPTICO AGUAS DOMESTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL TAPA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL TAPA PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4", PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80. TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PARETE INTERIOR, H- 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	6.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15, Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,270,497

Interventoria:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: JHON PEREZ
Cedula: 7711428

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,390,584

Vo.Bo. JAVIER CAICEDO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SOA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ELÍAS	SAN VICENTE

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JUAN PABLO MENESES VARGAS	7.716.512

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: JUAN PABLO MENESES
Cédula: 7.716.512

Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA



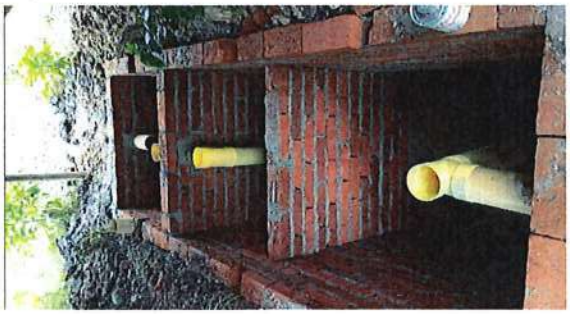





ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ELÍAS	SAN VICENTE

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ALFREDO CEBALLOS VARGAS	4.900.634

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: ALFREDO CEBALLOS
Cédula: 4.900.634

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Vo.bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ELÍAS	SAN VICENTE

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
RAFAEL BECERRA VARGAS	91.134.383

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Rafael Becerra Vargas

Nombre: RAFAEL BECERRA VARGAS
Cédula: 91134383

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 83.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ACEVEDO	EL SALADO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
YORLADIS PASINGA	1083911911

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Yorladi Pasinga tapiero

Nombre: YORLADIS PASINGA
Cédula: 1083911911

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA


OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA







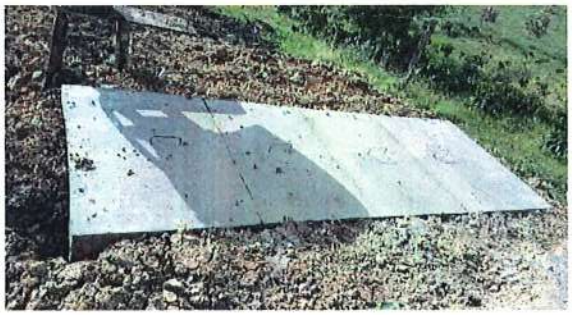

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA	ACEVEDO	EL SALADO

CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ABIGAIL MONTIEL	36275176

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0,10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario: Abigail Montiel

Nombre: ABIGAIL MONTIEL
Cédula: 36275176

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300


Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

V.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

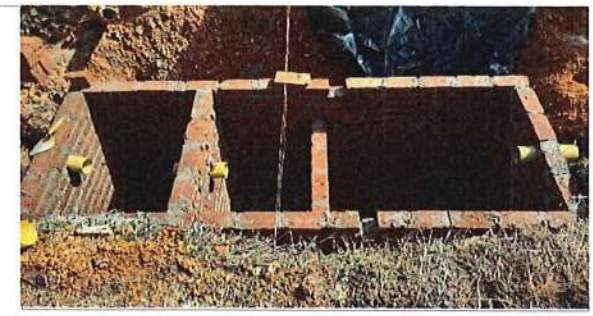







ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ACEVEDO	EL SALADO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
YENNY ROCIO PRIETO CAICEDO	1078753588

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Rocio Prieto

Nombre: YENNY ROCIO PRIETO
Cédula: 1.078.753.588

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
26/03/2025	HUILA		NEIVA	SANTA HELENA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LUCILA MENDEZ MOSQUERA	36.158.531

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,50
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

Karol dayana saldaña

Nombre: Karol dayana
Cédula: 1077177918

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









BENEFICIARIOS CAMPOS DE INFILTRACIÓN (10)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Primavera	Federico Ramírez Osorio	17.249.256
2	Canoas	Martha Piedad Castro	55.166.979
3	Canoas	Humberto Polania	7.699.506
4	Chapuro	Rodrigo Osorio / Mercy Hernández Tovar (Propietario – Esposo)	7.704.520
5	Santa Lucía	Faiber Bahamón Bahamón	7.700.521
6	Santa Lucía	Leonardo de Jesús Pérez	3.296.882
7	Santa Lucía	Yarelis Gómez Esquivel	28.614.019
8	Primavera	AGROMEZON - Arley Caquimbo	900.232.000-0
9	Santa Lucía	José David Arias Solano	7.731.534
10	Santa Helena	Ferney Polanía Polanía	12.112.462

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO	17,249,256

En Neiva - Huila; se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Federico Ramirez osorio

Nombre: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
Cédula: 17,249,256

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,594

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARTHA PIEDAD CASTRO	55,166,979

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Nombre: MARTHA PIEDAD CASTRO
Cédula: 55,166,979

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 98,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
HUMBERTO POLANIA	7,699,506

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: HUMBERTO POLANIA
Cédula: 7,699,506

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 98,399,584

VoBO JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
4/06/2025	HUILA		NEIVA	CHAPURO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
RODRIGO OSORIO	7,704,520

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: RODRIGO OSORIO
Cédula: 7,704,520

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 83,399,384

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
29/05/2025	**HUILA**		**NEIVA**	**SANTA LUCÍA**

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
FAIBER BAHAMON BAHAMON	**7.700.521**

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Beneficiario: Faiber Bahamon

Nombre: FAIBER BAHAMON BAHAMON
Cédula: 7.700.521

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LEONARDO DE JESUS PÉREZ MARTÍNEZ	3,296,882

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Nombre: LEONARDO DE JESUS PÉREZ MARTÍNEZ
Cédula: 3,296,882

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
YARELIS GOMEZ ESQUIVEL	28,614,019

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Yareliz Gomez Esquivel.

Nombre: YARELIS GOMEZ ESQUIVEL
Cédula: 28,614,019

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300


Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA



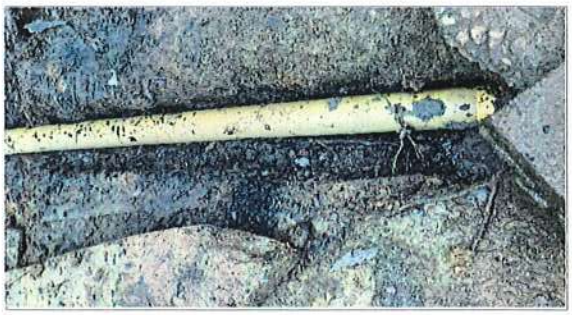





ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA	NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
AGROMESON	900232000-0

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.49[illegible]

Interventoria:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:


Nombre: [illegible] CAGUASANGO
Cédula: 7[illegible]


Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

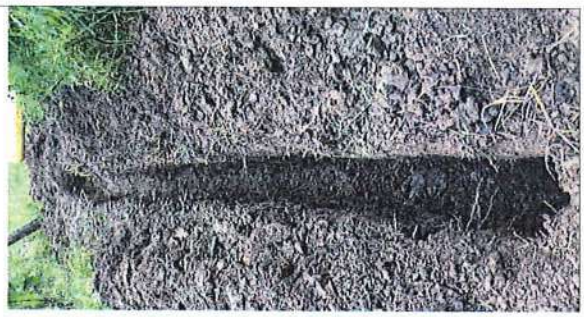

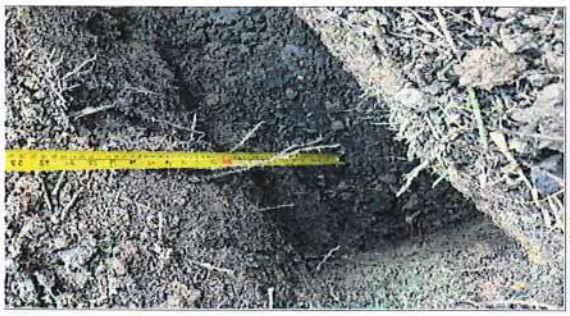





ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
29/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JOSE DAVID ARIAS SOLANO	7.731.534

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Beneficiario: José David Arias

Nombre: JOSE DAVID ARIAS SOLANO
Cédula: 7.731.534

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		NEIVA	SANTA HELENA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
FERNEY POLANIA POLANIA	12.112.462

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

FERNEY POLANIA POLANIA

Nombre: FERNEY POLANIA POLANIA
Cédula: 12.112.462

Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA



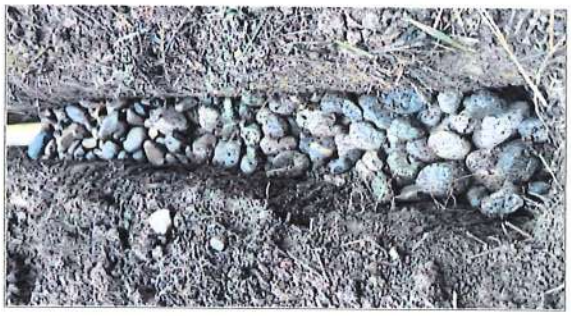





BENEFICIARIOS SISTEMAS SÉPTICOS ARND (2)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Santa Lucía	Juan Carlos Poloche	17.775.870
MUNICIPIO DE RIVERA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
2	Las Juntas	Beatriz Bautista Useche	36.169.726

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARnD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		RIVERA	LAS JUNTAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
BEATRIS BAUTISTA USECHE	36.169.726

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3,96
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	8,80
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	45,74
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3,72
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3,72
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	Unidad	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	6,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	0,30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0,17
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,40
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,38
CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3,01
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,32
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	0,80

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

Nombre: BEATRIS BAUTISTA USECHE
Cédula: 36.169.726

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARnD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
27/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JUAN CARLOS POLOCHE	17,775,870

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3.96
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	8.80
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	45.74
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3.72
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3.72
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	Unidad	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	6.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	0.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0.17
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.40
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.38
CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3.01
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.32
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	0.80

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Quien recibe:

Bernardo Riojas

Nombre: BERNARDO RIOJAS
Cédula: 1692652

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARnD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ANEXO 3
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.2
ACTA DE OBRA No.2 – MEMORIAS DE CANTIDADES

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**																			
	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			FECHA DE INICIO:	30/12/2024			**ACTA DE RECIBO FINAL**										
	R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA			**R. LEGAL**	N.A			FECHA SUSPENSION No.1:	N/A													
	VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00			**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00			FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A													
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -			**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -																	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00			**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00			FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A													
	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES			**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES			PLAZO ADICIONAL:	N/A			**FECHA: 11/07/2025**										
	PLAZO ADICIONAL:	N/A			**PLAZO ADICIONAL:**	N/A			FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025													
	PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES			**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES			PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025													

	CONDICIONES INICIALES						**OBRA EJECUTADA**																
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 40x20 mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2", paseras en tabla nogal o pino apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16" y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**																					
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	200,00	$ 8.809,00	$ 1.761.800,00	200,00	$ 1.761.800,00	0,00	$ -	200,00	$ 1.761.800,0	200,00	$ 1.761.800	100,00%	0,00	$ -
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 23.031,00	$ 147.398,40	4,80	$ 110.548,80	0,00	$ -	4,80	$ 110.548,8	4,80	$ 110.548,80	100,00%	0,00	$ -
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 846.760,00	$ 5.419.264,00	6,40	$ 5.419.264,00	0,00	$ -	6,40	$ 5.419.264,0	6,40	$ 5.419.264	100,00%	0,00	$ -
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	8,00	$ 3.738.767,00	$ 29.910.136,00	8,00	$ 29.910.136,00	0,00	$ -	8,00	$ 29.910.136,0	8,00	$ 29.910.136	100,00%	0,00	$ -
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	8,00	$ 3.045.982,00	$ 24.367.856,00	8,00	$ 24.367.856,00	0,00	$ -	8,00	$ 24.367.856,0	8,00	$ 24.367.856	100,00%	0,00	$ -
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	8,00	$ 1.287.485,00	$ 10.299.880,00	8,00	$ 10.299.880,00	0,00	$ -	8,00	$ 10.299.880,0	8,00	$ 10.299.880	100,00%	0,00	$ -
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	64,00	$ 522.873,00	$ 33.463.872,00	64,00	$ 33.463.872,00	0,00	$ -	64,00	$ 33.463.872,0	64,00	$ 33.463.872	100,00%	0,00	$ -
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	8,00	$ 700.000,00	$ 5.600.000,00	8,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 5.600.000,0	8,00	$ 5.600.000	100,00%	0,00	$ -
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	64,00	$ 70.000,00	$ 4.480.000,00	64,00	$ 4.480.000,00	0,00	$ -	64,00	$ 4.480.000,0	64,00	$ 4.480.000	100,00%	0,00	$ -
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**																					

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**					
	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL**
	R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A	
	VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00			
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00			
	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**
					FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025	
	PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025	

		CONDICIONES INICIALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**											
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	125,00	$ 8.809,00	$ 1.101.125,00	125,00	$ 1.101.125,00	100,00	$ 880.900	25,00	$ 220.225,0	125,00	$ 1.101.125	100,00%	0,00	$ -
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 23.031,00	$ 92.124,00	3,00	$ 69.093,00	2,40	$ 55.274,0	0,60	$ 13.819,0	3,00	$ 69.093	100,00%	0,00	$ -
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 846.760,00	$ 3.387.040,00	4,00	$ 3.387.040,00	3,20	$ 2.709.632,0	0,80	$ 677.408,0	4,00	$ 3.387.040	100,00%	0,00	$ -
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	5,00	$ 3.855.389,00	$ 19.276.945,00	5,00	$ 19.276.945,00	4,00	$ 15.421.556,0	1,00	$ 3.855.389,0	5,00	$ 19.276.945	100,00%	0,00	$ -
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	5,00	$ 3.045.982,00	$ 15.229.910,00	5,00	$ 15.229.910,00	4,00	$ 12.183.928,0	1,00	$ 3.045.982,0	5,00	$ 15.229.910	100,00%	0,00	$ -
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	5,00	$ 1.287.485,00	$ 6.437.425,00	5,00	$ 6.437.425,00	4,00	$ 5.149.940,0	1,00	$ 1.287.485,0	5,00	$ 6.437.425	100,00%	0,00	$ -
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	40,00	$ 522.873,00	$ 20.914.920,00	40,00	$ 20.914.920,00	32,00	$ 16.731.936,0	8,00	$ 4.182.984,0	40,00	$ 20.914.920	100,00%	0,00	$ -
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	5,00	$ 3.500.000,00	4,00	$ 2.800.000,0	1,00	$ 700.000,0	5,00	$ 3.500.000	100,00%	0,00	$ -
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	40,00	$ 70.000,00	$ 2.800.000,00	40,00	$ 2.800.000,00	32,00	$ 2.240.000,0	8,00	$ 560.000,0	40,00	$ 2.800.000	100,00%	0,00	$ -
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x 1/8"**															

OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**						
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL**	
R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A		
VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00				
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A		
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00				
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A		
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**	
				FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025		

		CONDICIONES INICIALES				**OBRA EJECUTADA**										
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vertices de las paseras. Dos por vertices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diametro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera sóldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de ppuesrta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV,HUECO TIPO ROMBO QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	UND	16,00	$ 647.288,00	$ 10.356.608,00	16,00	$ 10.356.608,00	16,00	$ 10.356.608,0	0,00	$ -	16,00	$ 10.356.608	100,00%	0,00	$ -
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,0	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000	100,00%	0,00	$ -
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,0	0,00	$ -	10,00	$ 700.000	100,00%	0,00	$ -
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x1/8"**															
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90°, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO A LOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	16,00	$ 522.873,00	$ 8.365.968,00	16,00	$ 8.365.968,00	16,00	$ 8.365.968,0	0,00	$ -	16,00	$ 8.365.968	100,00%	0,00	$ -
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,0	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000	100,00%	0,00	$ -
4,3	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,0	0,00	$ -	10,00	$ 700.000	100,00%	0,00	$ -
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**															
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156,00	$ 8.809,00	$ 1.374.204,00	156,00	$ 1.374.204,00	143,00	$ 1.259.687,0	13,00	$ 114.517,0	156,00	$ 1.374.204	100,00%	0,00	$ -
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	6,00	$ 23.031,00	$ 138.186,00	6,00	$ 138.186,00	5,50	$ 126.670,5	0,50	$ 11.515,5	6,00	$ 138.186,00	100,00%	0,00	$ -
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" Y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	12,00	$ 711.531,00	$ 8.538.372,00	12,00	$ 8.538.372,00	11,00	$ 7.826.841,0	1,00	$ 711.531,0	12,00	$ 8.538.372		0,00	$ -

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**					
	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL**
	R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A	
	VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00			
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00			
	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**
					FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025	
	PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025	

			CONDICIONES INICIALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PANELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	UND	12,00	$ 1.785.674,00	$ 21.428.088,00		12,00	$ 21.428.088,00	11,00	$ 19.642.414,0	1,00	$ 1.785.674,0	12,00	$ 21.428.088	100,00%	0,00	$ -
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	12,00	$ 2.515.300,00	$ 30.183.600,00		12,00	$ 30.183.600,00	11,00	$ 27.668.300,0	1,00	$ 2.515.300,0	12,00	$ 30.183.600	100,00%	0,00	$ -
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	UND	12,00	$ 239.422,00	$ 2.873.064,00		12,00	$ 2.873.064,00	11,00	$ 2.633.642,0	1,00	$ 239.422,0	12,00	$ 2.873.064	100,00%	0,00	$ -
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00		6,00	$ 4.200.000,00	5,50	$ 3.850.000,0	0,50	$ 350.000,0	6,00	$ 4.200.000	100,00%	0,00	$ -
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	96,00	$ 70.000,00	$ 6.720.000,00		96,00	$ 6.720.000,00	88,00	$ 6.160.000,0	8,00	$ 560.000,0	96,00	$ 6.720.000	100,00%	0,00	$ -
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**																
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**																
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	84,00	$ 8.809,00	$ 739.956,00		84,00	$ 739.956,00	24,00	$ 211.416,0	60,00	$ 528.540,0	84,00	$ 739.956	100,00%	0,00	$ -
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	140,70	$ 23.031,00	$ 3.240.462,00		151,80	$ 3.496.106,00	40,20	$ 925.846,0	111,60	$ 2.570.260,0	151,80	$ 3.496.106	100,00%	0,00	$ -
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	298,20	$ 123.119,00	$ 36.714.086,00		302,19	$ 37.205.331,00	86,34	$ 10.630.094,0	215,85	$ 26.575.237,0	302,19	$ 37.205.331	100,00%	0,00	$ -
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	1.050	$ 9.168,00	$ 9.626.400,00		1.140,30	$ 10.454.270,00	325,80	$ 2.986.934,0	814,50	$ 7.467.336,0	1140,30	$ 10.454.270	100,00%	0,00	$ -
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 90.189,00	$ 7.575.876,00		83,37	$ 7.519.057,00	23,82	$ 2.148.302,0	59,55	$ 5.370.755,0	83,37	$ 7.519.057	100,00%	0,00	$ -
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 85.998,00	$ 7.223.832,00		84,00	$ 7.223.832,00	24,00	$ 2.063.952,0	60,00	$ 5.159.880,0	84,00	$ 7.223.832	100,00%	0,00	$ -
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	21,00	$ 266.204,00	$ 5.590.284,00		21,00	$ 5.590.284,00	6,00	$ 1.597.224,0	15,00	$ 3.993.060,0	21,00	$ 5.590.284	100,00%	0,00	$ -
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	14,70	$ 144.237,00	$ 2.120.284,00		14,28	$ 2.059.704,00	4,08	$ 588.487,0	10,20	$ 1.471.217,0	14,28	$ 2.059.704	100,00%	0,00	$ -
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	21,00	$ 92.161,00	$ 1.935.381,00		21,00	$ 1.935.381,00	6,00	$ 552.966,0	15,00	$ 1.382.415,0	21,00	$ 1.935.381	100,00%	0,00	$ -
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	126,00	$ 39.291,00	$ 4.950.666,00		228,34	$ 8.971.627,00	36,00	$ 1.414.476,0	192,34	$ 7.557.151,0	228,34	$ 8.971.627	100,00%	0,00	$ -
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**																
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	13,44	$ 8.809,00	$ 118.393,00		14,91	$ 131.342,00	4,26	$ 37.526,0	10,65	$ 93.816,0	14,91	$ 131.342	100,00%	0,00	$ -
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	10,75	$ 23.031,00	$ 247.629,00		8,19	$ 188.624,00	2,94	$ 67.711,0	5,25	$ 120.913,0	8,19	$ 188.624	100,00%	0,00	$ -
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 640.442,00	$ 13.449.282,00		21,00	$ 13.449.282,00	6,00	$ 3.842.652,0	15,00	$ 9.606.630,0	21,00	$ 13.449.282	100,00%	0,00	$ -
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00		21,00	$ 2.355.108,00	6,00	$ 672.888,0	15,00	$ 1.682.220,0	21,00	$ 2.355.108	100,00%	0,00	$ -
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**							$ -						$ -			
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3,36	$ 8.809,00	$ 29.598,00		8,61	$ 75.845,00	2,46	$ 21.670,0	6,15	$ 54.175,0	8,61	$ 75.845	100,00%	0,00	$ -
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,02	$ 23.031,00	$ 46.430,00		5,00	$ 115.155,00	1,50	$ 34.546,0	3,50	$ 80.609,0	5,00	$ 115.155,00	100,00%	0,00	$ -

OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**						
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL**	
R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A		
VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00				
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A		
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00				
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A		
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**	
				FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025		

		CONDICIONES INICIALES					**OBRA EJECUTADA**									
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
6.3.3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 434.293,00	$ 9.120.153,00	21,00	$ 9.120.153,00	6,00	$ 2.605.758,0	15,00	$ 6.514.395,0	21,00	$ 9.120.153	100,00%	0,00	$ -
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	1,00	$ 112.148,00	1,00	$ 112.148,0	0,00	$ -	1,00	$ 112.148	100,00%	0,00	$ -
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	ML	126,00	$ 33.253,00	$ 4.189.878,00	126,00	$ 4.189.878,00	36,00	$ 1.197.108,0	90,00	$ 2.992.770,0	126,00	$ 4.189.878	100,00%	0,00	$ -
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**															
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100,80	$ 8.809,00	$ 887.947,00	100,80	$ 887.947,00	28,80	$ 253.699,0	72,00	$ 634.248,0	100,80	$ 887.947	100,00%	0,00	$ -
6.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	33,60	$ 23.031,00	$ 773.842,00	33,60	$ 773.842,00	9,60	$ 221.098,0	24,00	$ 552.744,0	33,60	$ 773.842	100,00%	0,00	$ -
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	168,00	$ 36.312,00	$ 6.100.416,00	168,00	$ 6.100.416,00	48,00	$ 1.742.976,0	120,00	$ 4.357.440,0	168,00	$ 6.100.416	100,00%	0,00	$ -
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	21,00	$ 234.319,00	$ 4.920.699,00	21,00	$ 4.920.699,00	6,00	$ 1.405.914,0	15,00	$ 3.514.785,0	21,00	$ 4.920.699	100,00%	0,00	$ -
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	17,85	$ 700.000,00	$ 12.495.000,00	17,85	$ 12.495.000,00	5,10	$ 3.570.000,0	12,75	$ 8.925.000,0	17,85	$ 12.495.000	100,00%	0,00	$ -
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	126,00	$ 70.000,00	$ 8.820.000,00	126,00	$ 8.820.000,00	36,00	$ 2.520.000,0	90,00	$ 6.300.000,0	126,00	$ 8.820.000	100,00%	0,00	$ -
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**															
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	57,60	$ 8.809,00	$ 507.398,40	57,60	$ 507.398,40	9,60	$ 84.566,40	48,00	$ 422.832,0	57,60	$ 507.398	100,00%	0,00	$ -
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19,20	$ 23.031,00	$ 442.195,20	19,20	$ 442.195,20	3,20	$ 73.699,20	16,00	$ 368.496,0	19,20	$ 442.195,20	100,00%	0,00	$ -
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	96,00	$ 36.312,00	$ 3.485.952,00	96,00	$ 3.485.952,00	16,00	$ 580.992,0	80,00	$ 2.904.960,0	96,00	$ 3.485.952	100,00%	0,00	$ -
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	12,00	$ 234.319,00	$ 2.811.828,00	12,00	$ 2.811.828,00	2,00	$ 468.638,0	10,00	$ 2.343.190,0	12,00	$ 2.811.828	100,00%	0,00	$ -
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00	1,00	$ 700.000,0	5,00	$ 3.500.000,0	6,00	$ 4.200.000	100,00%	0,00	$ -
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	48,00	$ 70.000,00	$ 3.360.000,00	48,00	$ 3.360.000,00	8,00	$ 560.000,0	40,00	$ 2.800.000,0	48,00	$ 3.360.000	100,00%	0,00	$ -
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**															
8,1	**SISTEMA SÉPTICO**											0,00				
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20,00	$ 8.809,00	$ 176.180,00	20,00	$ 176.180,00	12,00	$ 105.708,0	8,00	$ 70.472,0	20,00	$ 176.180	100,00%	0,00	$ -
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	38,00	$ 23.031,00	$ 875.178,00	19,28	$ 444.038,00	11,62	$ 267.620,0	7,66	$ 176.418,0	19,28	$ 444.038	100,00%	0,00	$ -
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	55,00	$ 123.119,00	$ 6.771.545,00	44,00	$ 5.417.236,00	26,40	$ 3.250.342,0	17,60	$ 2.166.894,0	44,00	$ 5.417.236	100,00%	0,00	$ -
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	250,00	$ 9.168,00	$ 2.292.000,00	228,70	$ 2.096.722,00	137,22	$ 1.258.033,0	91,48	$ 838.689,0	228,70	$ 2.096.722	100,00%	0,00	$ -
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 90.189,00	$ 1.803.780,00	18,60	$ 1.677.515,00	11,16	$ 1.006.509,0	7,44	$ 671.006,0	18,60	$ 1.677.515	100,00%	0,00	$ -
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 85.998,00	$ 1.719.960,00	18,60	$ 1.599.563,00	11,16	$ 959.738,0	7,44	$ 639.825,0	18,60	$ 1.599.563	100,00%	0,00	$ -
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	UND	5,00	$ 323.524,00	$ 1.617.620,00	5,00	$ 1.617.620,00	3,00	$ 970.572,0	2,00	$ 647.048,0	5,00	$ 1.617.620	100,00%	0,00	$ -
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	30,00	$ 39.291,00	$ 1.178.730,00	28,40	$ 1.115.864,00	16,40	$ 644.372,0	12,00	$ 471.492,0	28,40	$ 1.115.864	100,00%	0,00	$ -
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	2,00	$ 171.725,00	$ 343.450,00	1,50	$ 257.587,00	0,90	$ 154.552,00	0,60	$ 103.035,0	1,50	$ 257.587	100,00%	0,00	$ -
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	1,50	$ 166.575,00	$ 249.862,50	0,85	$ 141.588,75	0,51	$ 84.953,25	0,34	$ 56.635,5	0,85	$ 141.588,75	100,00%	0,00	$ -
8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC**															
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2,00	$ 8.809,00	$ 17.618,00	2,00	$ 17.618,00	1,20	$ 10.571,0	0,80	$ 7.047,0	2,00	$ 17.618	100,00%	0,00	$ -
8.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,10	$ 23.031,00	$ 25.334,10	1,58	$ 36.388,98	0,82	$ 18.885,42	0,76	$ 17.503,56	1,58	$ 36.389,0	100,00%	0,00	$ -
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	UND	5,00	$ 563.956,00	$ 2.819.780,00	5,00	$ 2.819.780,00	3,00	$ 1.691.868,0	2,00	$ 1.127.912,0	5,00	$ 2.819.780	100,00%	0,00	$ -

OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**						
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024		
R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A	**ACTA DE RECIBO FINAL**	
VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00				
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A		
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00				
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A		
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**	
				FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025		

					CONDICIONES INICIALES			**OBRA EJECUTADA**										
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
8,3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**															
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	24,00	$ 8.809,00	$ 211.416,00	16,62	$ 146.406,00	10,99	$ 96.811,0	5.63	$ 49.595,0	16.62	$ 146.406	100,00%	0,00	$ -
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	8,00	$ 23.031,00	$ 184.248,00	6,69	$ 154.004,00	3,48	$ 80.148,0	3,21	$ 73.856,0	6,69	$ 154.004	100,00%	0,00	$ -
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	40,00	$ 39.291,00	$ 1.571.640,00	22,80	$ 895.834,80	6,80	$ 267.178,8	16,00	$ 628.656,0	22,80	$ 895.835	100,00%	0,00	$ -
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	4,00	$ 171.725,00	$ 686.900,00	4,00	$ 686.900,00	2,40	$ 412.140,0	1,60	$ 274.760,0	4,00	$ 686.900	100,00%	0,00	$ -
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2,50	$ 700.000,00	$ 1.750.000,00	2,50	$ 1.750.000,00	1,50	$ 1.050.000,0	1,00	$ 700.000,0	2,50	$ 1.750.000	100,00%	0,00	$ -
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	30,00	$ 70.000,00	$ 2.100.000,00	30,00	$ 2.100.000,00	18,00	$ 1.260.000,0	12,00	$ 840.000,0	30,00	$ 2.100.000	100,00%	0,00	$ -
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 474.797.111,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 474.797.111,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 209.146.585,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 265.650.526,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 474.797.111,00**		**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**
	ADMINISTRACION 12% =				$ 56.975.653,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 56.975.653,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 25.097.590,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 31.878.063,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 56.975.653,00		ADMINISTRACION 12% =	$ -
	IMPREVISTOS 5% =				$ 23.739.856,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 23.739.856,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 10.457.329,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 13.282.526,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 23.739.856,00		IMPREVISTOS 5% =	$ -
	UTILIDAD 10% =				$ 47.479.711,00	UTILIDAD 10% =	$ 47.479.711,00	UTILIDAD 10% =	$ 20.914.659,00	UTILIDAD 10% =	$ 26.565.052,00	UTILIDAD 10% =	$ 47.479.711,00		UTILIDAD 10% =	$ -
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 9.021.145,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.021.145,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 3.973.785,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 5.047.360,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.021.145,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 137.216.365,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 137.216.365,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 60.443.363,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 76.773.002,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 137.216.365,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**
	TOTAL COSTOS EQUIPAMENTO RURAL (Directos + Indirectos)				**$ 612.013.476,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 612.013.476,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 269.589.948,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 342.423.528,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 612.013.476,00**		**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ -**
B	SENCIBILIZACION SOCIAL COMUNITARIO															
	Talleres de sencibilizacion social comunitario	TALLER	3	$ 730.000,00	$ 2.190.000,00	0,00	$ -									$ -
	ADMINISTRACION 12% =				$ 262.800,00	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =				ADMINISTRACION 12% =			ADMINISTRACION 12% =	$ -
	UTILIDAD 10% =				$ 219.000,00	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =				UTILIDAD 10% =			UTILIDAD 10% =	$ -
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 507.642,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =				IVA % sobre utilidad 19% =			IVA % sobre utilidad 19% =	
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENCIBILIZACION					**$ 3.179.442,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**
	NUEVO ITEM															
9	Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.	TALLER		$ 534.360,00		5,00	$ 2.671.800,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.671.800,00	5,00	$ 2.671.800,00		0,00	$ -
	I.V.A. (19%)				$ -		$ 507.642,00	I.V.A. (19%)	$ -		$ 507.642,00	I.V.A. (19%)	$ 507.642,00		I.V.A. (19%)	$ -
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENSIBILIZACION					**$ -**		**$ 3.179.442,00**		**$ -**		**$ 3.179.442,00**		**$ 3.179.442,00**			**$ -**
TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION					**$ 615.192.918,00**		**$ 615.192.918,00**		**$ 269.589.948,00**		**$ 345.602.970,00**		**$ 615.192.918,00**	**100,00%**		**$ -**
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 615.192.918,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 269.589.948,00**		**$ 345.602.970,00**	**VALOR ACUMULADO**	**$ 615.192.918,00**	**100,00%**	**VALOR POR EJECUTAR**	**$ -**
											56,18%					

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $345.602.970,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
RL. CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
1,1	ANAIS VILLAREAL	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	MARIA RUTH PEREZ	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	MARITZA NINCO ROJAS	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	ALBA LUZ MOLANO	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
						TOTAL	**200,00**

TOTAL	**200,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**200,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,2	ANAIS VILLAREAL	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARIA RUTH PEREZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARITZA NINCO ROJAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	ALBA LUZ MOLANO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
						TOTAL	**4,80**

TOTAL	**4,80**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**4,80**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,3	ANAIS VILLAREAL	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	MARIA RUTH PEREZ	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	MARITZA NINCO ROJAS	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	ALBA LUZ MOLANO	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
						TOTAL	**6,40**

TOTAL	**6,40**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**6,40**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,4	ANAIS VILLAREAL					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	MARITZA NINCO ROJAS					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	ALBA LUZ MOLANO					1,00	**1,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA					1,00	**1,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					1,00	**1,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,5	ANAIS VILLAREAL					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	MARITZA NINCO ROJAS					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	ALBA LUZ MOLANO					1,00	**1,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA					1,00	**1,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					1,00	**1,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,6	ANAIS VILLAREAL					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	MARITZA NINCO ROJAS					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	ALBA LUZ MOLANO					1,00	**1,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA					1,00	**1,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					1,00	**1,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,7	SUMINISTRO E3 INSTALACION DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFE, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,7	ANAIS VILLAREAL					8,00	**8,00**
	MARIA RUTH PEREZ					8,00	**8,00**
	MARITZA NINCO ROJAS					8,00	**8,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					8,00	**8,00**
	ALBA LUZ MOLANO					8,00	**8,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA					8,00	**8,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					8,00	**8,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS					8,00	**8,00**
						TOTAL	**64,00**

TOTAL	**64,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**64,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR					8,00	**8,00**
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
1,9	TRANSPORTE MULAR					64,00	**64,00**
							0,00
						TOTAL	**64,00**

TOTAL	**64,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**64,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
2,1	JOSE BENITO SANCHEZ	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**25,00**

TOTAL	**125,00**
ANTERIORES ACTAS	**100,00**
PRESENTE ACTA	**25,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,2	JOSE BENITO SANCHEZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,60**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	**2,40**
PRESENTE ACTA	**0,60**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,3	JOSE BENITO SANCHEZ	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,80**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	**3,20**
PRESENTE ACTA	**0,80**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,4	JOSE BENITO SANCHEZ					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**4,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,5	JOSE BENITO SANCHEZ					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	5,00
ANTERIORES ACTAS	**4,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO: N/A**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,6	JOSE BENITO SANCHEZ					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**4,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,7	JOSE BENITO SANCHEZ					8,00	**8,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**40,00**
ANTERIORES ACTAS	**32,00**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**4,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
2,9	TRANSPORTE MULAR					8,00	**8,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**40,00**
ANTERIORES ACTAS	**32,00**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
5,1	EDGAR BAHAMON				13,00	1,00	**13,00**
						TOTAL	**13,00**

TOTAL	**156,00**
ANTERIORES ACTAS	**143,00**
PRESENTE ACTA	**13,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
5,2	EDGAR BAHAMON				0,50	1,00	**0,50**
						TOTAL	**0,50**

TOTAL	6,00
ANTERIORES ACTAS	**5,50**
PRESENTE ACTA	**0,50**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,3	EDGAR BAHAMON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**12,00**
ANTERIORES ACTAS	**11,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,4	EDGAR BAHAMON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	12,00
ANTERIORES ACTAS	**11,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,5	EDGAR BAHAMON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	12,00
ANTERIORES ACTAS	11,00
PRESENTE ACTA	1,00





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,6	EDGAR BAHAMON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**12,00**
ANTERIORES ACTAS	**11,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR					0,50	**0,50**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,50**

TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	**5,50**
PRESENTE ACTA	**0,50**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
5,8	TRANSPORTE MULAR					8,00	**8,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	96,00
ANTERIORES ACTAS	88,00
PRESENTE ACTA	8,00





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.1	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON PEREZ	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
						TOTAL	**60,00**

TOTAL	**84,00**
ANTERIORES ACTAS	**24,00**
PRESENTE ACTA	**60,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
	KERLY BONILLA TUBO PVC-S 4" ENT.	6,00	0,30	0,20	0,36	1,00	**0,36**
	LUZ DARY ESCOBAR	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	30,00	0,30	0,20	1,80	1,00	**1,80**
	MARIA RUTH PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,20	0,15	1,00	**0,15**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,30	0,23	1,00	**0,23**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,30	1,30	0,30	1,29	1,00	**1,29**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	13,00	0,30	0,30	1,17	1,00	**1,17**
	SAUL PULIDO TELLO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	22,00	0,40	0,70	6,16	1,00	**6,16**
	JHON PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	ABIGAIL MONTIEL	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YORLADIS PASINGA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	8,00	0,30	0,30	0,72	1,00	**0,72**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**

	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	7,80	0,30	0,30	0,70	1,00	**0,70**
						TOTAL	**111,60**

TOTAL	**151,80**
ANTERIORES ACTAS	**40,20**
PRESENTE ACTA	**111,60**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.3	LUZ DARY ESCOBAR	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**

		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**215,85**

TOTAL	**302,19**
ANTERIORES ACTAS	**86,34**
PRESENTE ACTA	**215,85**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
6.1.4	LUZ DARY ESCOBAR				54,30	1,00	**54,30**
	MARIA RUTH PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JHON JAIRO PASCUAS				54,30	1,00	**54,30**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES				54,30	1,00	**54,30**
	SAUL PULIDO TELLO				54,30	1,00	**54,30**
	YENI ANDREA PERDOMO				54,30	1,00	**54,30**
	JHON FAIBER MANRIQUE				54,30	1,00	**54,30**
	JHON PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	ABIGAIL MONTIEL				54,30	1,00	**54,30**
	YORLADIS PASINGA				54,30	1,00	**54,30**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO				54,30	1,00	**54,30**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	RAFAEL BECERRA VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
						TOTAL	**814,50**

TOTAL	**1.140,30**
ANTERIORES ACTAS	**325,80**
PRESENTE ACTA	**814,50**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.5	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
						TOTAL	**59,55**

TOTAL	83,37
ANTERIORES ACTAS	23,82
PRESENTE ACTA	59,55



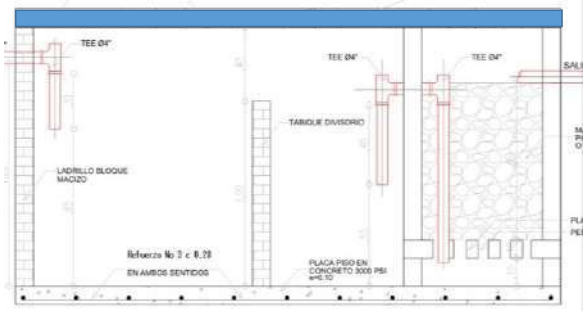

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.6	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON PEREZ	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
						TOTAL	**60,00**

TOTAL	**84,00**
ANTERIORES ACTAS	**24,00**
PRESENTE ACTA	**60,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.1.7	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	21,00
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.1.8	LUZ DARY ESCOBAR	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	MARIA RUTH PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON JAIRO PASCUAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	SAUL PULIDO TELLO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENI ANDREA PERDOMO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON FAIBER MANRIQUE	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ABIGAIL MONTIEL	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YORLADIS PASINGA	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
						TOTAL	**10,20**

TOTAL	**14,28**
ANTERIORES ACTAS	**4,08**
PRESENTE ACTA	**10,20**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.9	LUZ DARY ESCOBAR	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	JHON PEREZ	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	**21,00**
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.1.10	LUZ DARY ESCOBAR	22,00				1,00	**22,00**
	MARIA RUTH PEREZ	2,50				1,00	**2,50**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	2,50				1,00	**2,50**
	JHON JAIRO PASCUAS	6,50				1,00	**6,50**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	13,00				1,00	**13,00**
	SAUL PULIDO TELLO	6,00				1,00	**6,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	6,00				1,00	**6,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	22,00				1,00	**22,00**
	JHON PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	ABIGAIL MONTIEL	6,00				1,00	**6,00**
	YORLADIS PASINGA	14,00				1,00	**14,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	14,00				1,00	**14,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	7,80				1,00	**7,80**
	LUCILA MENDEZ	9,00				1,00	**9,00**
	JOSE GOMEZ	10,00				1,00	**10,00**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	8,00				1,00	**8,00**
	JOSE BENITO SANCHEZ	6,00				1,00	**6,00**
	FLOR ALBENIS SALINAS	19,04				1,00	**19,04**
						TOTAL	**192,34**

TOTAL	**228,34**
ANTERIORES ACTAS	**36,00**
PRESENTE ACTA	**192,34**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.2.1	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
						TOTAL	**10,65**

TOTAL	**14,91**
ANTERIORES ACTAS	**4,26**
PRESENTE ACTA	**10,65**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.2.2	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84	0,6	0,42	1,00	**0,42**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	LUCILA MENDEZ				-0,21	1,00	**-0,21**
	JOSE GOMEZ				-0,49	1,00	**-0,49**
	JOSE ALDEMAR TIQUE				-0,21	1,00	**-0,21**
	JOSE BENITO SANCHEZ				-0,21	1,00	**-0,21**
	FLOR ALBENIS SALINAS				-0,21	1,00	**-0,21**
						TOTAL	**5,25**

TOTAL	8,19
ANTERIORES ACTAS	**2,94**
PRESENTE ACTA	**5,25**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.2.3	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	**21,00**
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.2.4	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	21,00
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





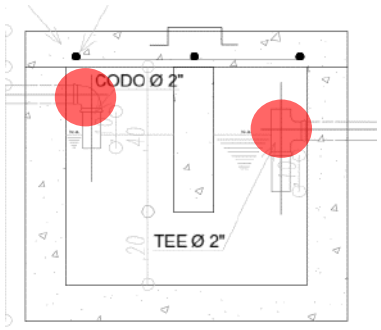

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.3.1	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
						TOTAL	**6,15**

TOTAL	8,61
ANTERIORES ACTAS	**2,46**
PRESENTE ACTA	**6,15**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.3.2	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
						TOTAL	**3,50**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**1,50**
PRESENTE ACTA	**3,50**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA		**FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.3.3	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	**21,00**
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.3.5	LUZ DARY ESCOBAR	6,00				1,00	**6,00**
	MARIA RUTH PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	6,00				1,00	**6,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	6,00				1,00	**6,00**
	SAUL PULIDO TELLO	6,00				1,00	**6,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	6,00				1,00	**6,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	6,00				1,00	**6,00**
	JHON PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	ABIGAIL MONTIEL	6,00				1,00	**6,00**
	YORLADIS PASINGA	6,00				1,00	**6,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	6,00				1,00	**6,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
						TOTAL	**90,00**

TOTAL	**126,00**
ANTERIORES ACTAS	**36,00**
PRESENTE ACTA	**90,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.4.1	LUZ DARY ESCOBAR	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	MARIA RUTH PEREZ	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JHON JAIRO PASCUAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	SAUL PULIDO TELLO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	YENI ANDREA PERDOMO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JHON FAIBER MANRIQUE	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JHON PEREZ	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	ABIGAIL MONTIEL	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	YORLADIS PASINGA	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
						TOTAL	**72,00**

TOTAL	**100,80**
ANTERIORES ACTAS	**28,80**
PRESENTE ACTA	**72,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.4.2	LUZ DARY ESCOBAR	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	MARIA RUTH PEREZ	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JHON JAIRO PASCUAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	SAUL PULIDO TELLO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	YENI ANDREA PERDOMO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JHON FAIBER MANRIQUE	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JHON PEREZ	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	ABIGAIL MONTIEL	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	YORLADIS PASINGA	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
						TOTAL	**24,00**

TOTAL	**33,60**
ANTERIORES ACTAS	**9,60**
PRESENTE ACTA	**24,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.4.3	LUZ DARY ESCOBAR	8,00				1,00	**8,00**
	MARIA RUTH PEREZ	8,00				1,00	**8,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	8,00				1,00	**8,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	8,00				1,00	**8,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	8,00				1,00	**8,00**
	SAUL PULIDO TELLO	8,00				1,00	**8,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	8,00				1,00	**8,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	8,00				1,00	**8,00**
	JHON PEREZ	8,00				1,00	**8,00**
	ABIGAIL MONTIEL	8,00				1,00	**8,00**
	YORLADIS PASINGA	8,00				1,00	**8,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	8,00				1,00	**8,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	8,00				1,00	**8,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	8,00				1,00	**8,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**120,00**

TOTAL	168,00
ANTERIORES ACTAS	**48,00**
PRESENTE ACTA	**120,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.4.4	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	**21,00**
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR					12,75	**12,75**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**12,75**

TOTAL	17,85
ANTERIORES ACTAS	5,10
PRESENTE ACTA	12,75





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORÍA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA			**FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
			FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
	VALOR INICIAL:	$ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL:	$ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO: N/A**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO:	$ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
6.4.6	TRANSPORTE MULAR					90,00	**90,00**
						TOTAL	**90,00**

TOTAL	**126,00**
ANTERIORES ACTAS	**36,00**
PRESENTE ACTA	**90,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
7,1	LEONARDO DE JESUS PEREZ MARTIN	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	YARELIS GOMEZ ESQUIVEL	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JOSE DAVID ARIAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	FERNEY POLANIA POLANIA	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	AGROMEZON	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	FAIBER BAHAMON BAHAMON	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	HUMBERTO POLANIA	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	MERCY HERNANDEZ TOVAR	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
						TOTAL	**48,00**

TOTAL	
ANTERIORES ACTAS	**9,60**
PRESENTE ACTA	**48,00**
TOTAL	**57,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
7,2	LEONARDO DE JESUS PEREZ MARTIN	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	YARELIS GOMEZ ESQUIVEL	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JOSE DAVID ARIAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	FERNEY POLANIA POLANIA	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	AGROMEZON	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	FAIBER BAHAMON BAHAMON	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	HUMBERTO POLANIA	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	MERCY HERNANDEZ TOVAR	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
						TOTAL	**16,00**

TOTAL	**19,20**
ANTERIORES ACTAS	**3,20**
PRESENTE ACTA	**16,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
7,3	LEONARDO DE JESUS PEREZ MARTIN	8,00				1,00	**8,00**
	YARELIS GOMEZ ESQUIVEL	8,00				1,00	**8,00**
	JOSE DAVID ARIAS	8,00				1,00	**8,00**
	FERNEY POLANIA POLANIA	8,00				1,00	**8,00**
	AGROMEZON	8,00				1,00	**8,00**
	FAIBER BAHAMON BAHAMON	8,00				1,00	**8,00**
	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	8,00				1,00	**8,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	8,00				1,00	**8,00**
	HUMBERTO POLANIA	8,00				1,00	**8,00**
	MERCY HERNANDEZ TOVAR	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**80,00**

TOTAL	**96,00**
ANTERIORES ACTAS	**16,00**
PRESENTE ACTA	**80,00**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
7,4	LEONARDO DE JESUS PEREZ MARTIN					1,00	**1,00**
	YARELIS GOMEZ ESQUIVEL					1,00	**1,00**
	JOSE DAVID ARIAS					1,00	**1,00**
	FERNEY POLANIA POLANIA					1,00	**1,00**
	AGROMEZON					1,00	**1,00**
	FAIBER BAHAMON BAHAMON					1,00	**1,00**
	FEDERICO RAMIREZ OSORIO					1,00	**1,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					1,00	**1,00**
	HUMBERTO POLANIA					1,00	**1,00**
	MERCY HERNANDEZ TOVAR					1,00	**1,00**
						TOTAL	**10,00**

TOTAL	**12,00**
ANTERIORES ACTAS	**2,00**
PRESENTE ACTA	**10,00**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR					5,00	**5,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**5,00**

TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	**1,00**
PRESENTE ACTA	**5,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7,6	TRANSPORTE MULAR					40,00	**40,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**40,00**

TOTAL	**48,00**
ANTERIORES ACTAS	**8,00**
PRESENTE ACTA	**40,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.1	BEATRIS BAUTISTA	3,10	1,29		4,00	1,00	**4,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,10	1,29		4,00	1,00	**4,00**
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	20,00
ANTERIORES ACTAS	12,00
PRESENTE ACTA	8,00





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.2	BEATRIS BAUTISTA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	6,50	0,20	0,2	0,26	1,00	**0,26**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	5,00	0,20	0,2	0,20	1,00	**0,20**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**7,66**

TOTAL	19,28
ANTERIORES ACTAS	11,62
PRESENTE ACTA	7,66

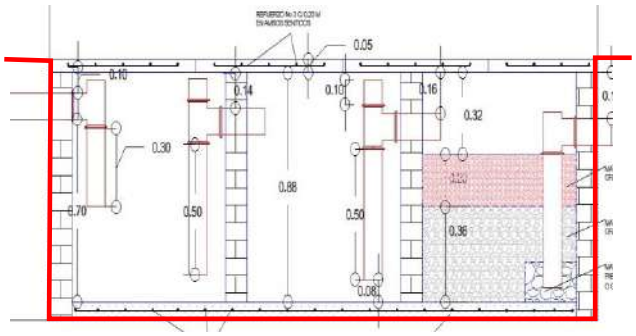



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.3	BEATRIS BAUTISTA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	JUAN CARLOS POLOCHE	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
						TOTAL	**17,60**

TOTAL	**44,00**
ANTERIORES ACTAS	**26,40**
PRESENTE ACTA	**17,60**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.4	BEATRIS BAUTISTA				45,74	1,00	**45,74**
	JUAN CARLOS POLOCHE				45,74	1,00	**45,74**
						TOTAL	**91,48**

TOTAL	**228,70**
ANTERIORES ACTAS	**137,22**
PRESENTE ACTA	**91,48**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.5	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**7,44**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	**11,16**
PRESENTE ACTA	**7,44**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.6	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**7,44**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	**11,16**
PRESENTE ACTA	**7,44**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
8.1.7	BEATRIS BAUTISTA					1,00	**1,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE					1,00	**1,00**
						TOTAL	**2,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**3,00**
PRESENTE ACTA	**2,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.1.8	BEATRIS BAUTISTA	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	6,00				1,00	**6,00**
						TOTAL	**12,00**

TOTAL	28,40
ANTERIORES ACTAS	16,40
PRESENTE ACTA	12,00



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.9	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
						TOTAL	**0,60**

TOTAL	**1,50**
ANTERIORES ACTAS	**0,90**
PRESENTE ACTA	**0,60**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.10	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
						TOTAL	**0,34**

TOTAL	0,85
ANTERIORES ACTAS	**0,51**
PRESENTE ACTA	**0,34**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.2.1	BEATRIS BAUTISTA	0,63	0,63		0,40	1,00	**0,40**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,63	0,63		0,40	1,00	**0,40**
						TOTAL	**0,80**

TOTAL	**2,00**
ANTERIORES ACTAS	**1,20**
PRESENTE ACTA	**0,80**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.2.2	BEATRIS BAUTISTA	0,60	0,60	0,6	0,22	1,00	**0,22**
	tubo cajilla-pozo	0,80	0,40	0,5	0,16	1,00	**0,16**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,60	0,60	0,6	0,22	1,00	**0,22**
	tubo cajilla-pozo	0,80	0,40	0,5	0,16	1,00	**0,16**
						TOTAL	**0,76**

TOTAL	**1,58**
ANTERIORES ACTAS	**0,82**
PRESENTE ACTA	**0,76**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
8.2.3	BEATRIS BAUTISTA					1,00	**1,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE					1,00	**1,00**
						TOTAL	**2,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**3,00**
PRESENTE ACTA	**2,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.3.1	BEATRIS BAUTISTA	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
	HS_FOSA INFILTRACIÓN	1,10	1,10		1,21	-1,00	**-1,21**
	HS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,45		0,45	-1,00	**-0,45**
	JAS_FOZA INFILTRACIÓN	1,50	1,10		1,65	-1,00	**-1,65**
	JAS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,50	0,45		0,68	-1,00	**-0,68**
						TOTAL	**5,63**

TOTAL	**16,62**
ANTERIORES ACTAS	**10,99**
PRESENTE ACTA	**5,63**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.3.2	BEATRIS BAUTISTA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,60	1,00	**0,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,61	1,00	**0,61**
						TOTAL	**3,21**

TOTAL	**6,69**
ANTERIORES ACTAS	**3,48**
PRESENTE ACTA	**3,21**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.3.3	BEATRIS BAUTISTA	8,00				1,00	**8,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**16,00**

TOTAL	**22,80**
ANTERIORES ACTAS	**6,80**
PRESENTE ACTA	**16,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.3.4	BEATRIS BAUTISTA	1,00	1,00	0,80	0,80	1,00	**0,80**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,00	1,00	0,80	0,80	1,00	**0,80**
						TOTAL	**1,60**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	**2,40**
PRESENTE ACTA	**1,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR					1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**2,50**
ANTERIORES ACTAS	**1,50**
PRESENTE ACTA	**1,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
8.3.6	TRANSPORTE MULAR					12,00	**12,00**
							0,00
						TOTAL	**12,00**

TOTAL	**30,00**
ANTERIORES ACTAS	**18,00**
PRESENTE ACTA	**12,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA
