I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **485 de 2024**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN __X__** **INTERVENTORÍA _____**

CONTRATISTA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

OBJETO: Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del contrato No. 490 de 2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."

FECHA DE SUSCRIPCION: 27 de diciembre de 2024.

FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2024.

PLAZO INICIAL: Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

SUSPENSION N° 1: N/A

REINICIO N° 1: N/A

FECHA DE TERMINACION: 29 de agosto de 2025.

FECHA DEL INFORME: 21 de julio de 2025.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 20 de diciembre de 2024 se suscribe el contrato de obra No.490 de 2024, entre la entidad contratante CAM y el contratista de obra CONSORCIO OBRAS RURALES 2024.
- El 27 de diciembre de 2024 se suscribe el contrato de consultoría No.485 de 2024, entre la entidad contratante CAM y el contratista de consultoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 30 de diciembre de 2024 se firma el acta de inicio de los contratos No.490 de 2024 y No.485 de 2024.
- Durante los meses de enero, febrero y parte de marzo de 2025, se realizaron las visitas diagnóstico a los predios objeto del contrato de obra, con el fin de verificar la ubicación de predios, de los beneficiarios y las condiciones técnicas establecidas y del terreno donde se realizará la construcción de las obras, encontrando algunas novedades, que implican modificaciones al contrato.

- El 13 de marzo de 2025, se hizo entrega del **primer informe de interventoría** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, cargado al Secop II.
- El primero de abril de 2025 se suscribió el acta de justificación No.1 de modificación de beneficiarios, mayores y menores cantidades, creación de ítem nuevo y corrección de la descripción de algunos capítulos y actividades sin adición en valor y plazo al contrato de obra, con el fin de presentar con sus respectivos soportes a la Entidad contratante e iniciar el trámite correspondiente para aprobación mediante un Otrosí No.1 al contrato de obra.
- El 19 de abril de 2025 se hizo entrega del **segundo informe de interventoría** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, cargado al Secop II.
- El 13 de mayo de 2025 se hizo entrega del **tercer informe de interventoría** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 15 de marzo de 2025, cargado al Secop II.
- El 13 de mayo de 2025 se hizo entrega del **cuarto informe de interventoría** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, cargado al Secop II.
- El 16 de mayo de 2025 se suscribió el Otrosí No.1 al contrato de obra pública No.490 de 2024, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, el contratista de obra y el contratista de interventoría, para la modificación de beneficiarios, mayores y menores cantidades, creación de ítem nuevo y corrección de la descripción de algunos capítulos y actividades sin adición en valor y plazo al contrato de obra.
- El 9 de junio de 2025 se realizó comité técnico para aprobar realizar balance de mayores y menores cantidades sin adición de valor en el contrato.
- El 11 de junio de 2025 se entregó y aprobó acta de mayores y menores cantidades y acta de justificación No.2 (Anexo 1).
- El 17 de junio de 2025 se hizo entrega del **quinto informe de interventoría** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, cargado al Secop II.
- El 16 de julio de 2025 se hizo entrega del **sexto informe de interventoría** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 01 de mayo al 30 de junio de 2025.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	GENERALIDADES		
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diámetro 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 40x20 mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico**		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2", paseras en tabla nogal o pino apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16" y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 YL2=0.3</td><td>M3</td><td>4,80</td><td>4,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,3</td><td>CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPADIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>M3</td><td>6.40</td><td>6,40</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS
TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts
NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS
PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores
8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS
TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts
NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS
PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores
8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td><td>UND</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,5</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td><td>UND</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td><td>UND</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,7</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td><td>UND</td><td>64.00</td><td>64.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>64,00</td><td>64.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diámetro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>125.00</td><td>125.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 YL2=0.3</td><td>M3</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 YL2=0.3</td><td>M3</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS
PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>AMARRE DE LAS GUAYAS
PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA:
6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS
6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS
4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES
8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES
PARA CERCHA.
3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS
INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS
PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN
3 CURVAS DE 0.75
3 TUBOS RECTOS DE 0.25
Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algún elemento.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.5</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 6M DE ANCHO X RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2.7</td>
<td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA.
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.7</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA.
Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones útiles de la estructura.
Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla
Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.</td><td>UND</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.8</td>
<td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.8</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.9</td>
<td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.9</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td colspan="3">Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras móviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyadas sobre ángulo de 2"x 1/8"</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR.
Incluye:
Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes.
Ángulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2'' x 5/8") para instalación en los vértices de las paseras. Dos por vértices. Colocados internamente.
Balinera común (eje 1/2") diámetro de la balinera 2"
Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2"); bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas.
Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de anclaje del sistema de rodamiento a la pasera soldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de puerta corredera</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR.
Incluye:
Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes.
Ángulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2'' x 5/8") para instalación en los vértices de las paseras. Dos por vértices. Colocados internamente.
Balinera común (eje 1/2") diámetro de la balinera 2"
Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2"); bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas.
Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de anclaje del sistema de rodamiento a la pasera
soldadura eléctrica 6013
Alambre liso galvanizado calibre 12
tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de puerta corredera</td><td>UND</td><td>16.00</td><td>16,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.2</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>3.00</td><td>3,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>TRANSPORTE ANIMAL</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.3</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>VIAJE</td><td>10.00</td><td>10,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>4</td><td colspan="3">Suministro es instalación de dieciséis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vértices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyadas sobre ángulo de 2"x1/8"</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA TIPO CAFETERA</td><td>UND</td><td>16.00</td><td>16,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>3.00</td><td>3,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>VIAJE</td><td>10.00</td><td>10,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 3.71mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>156.00</td><td>156.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, ISNTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.3</td><td>INSTALCION DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2"COMO DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>5.4</td>
<td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90).</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.4</td><td>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)..</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5.5</td>
<td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO</td>
<td>100%</td>
<td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.5</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>5.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.7</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR</td><td>VIAJE</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>5.8</td><td>TRANSPORTE ANIMAL</td><td>VIAJE</td><td>96.00</td><td>96.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">SISTEMAS SEPTICOS ARD</td></tr>
<tr><td>6.1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>84.00</td><td>84.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6..1.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>151,80</td><td>151,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.1.3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>M2</td><td>302,19</td><td>302,19</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.1.4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20X20 CM.</td><td>KG</td><td>1.140,30</td><td>1.140,30</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.1.5</td><td>CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,5</td><td>CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,</td><td>M2</td><td>83,37</td><td>83,37</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL</td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.1.6</td><td>CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,6</td><td>CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>M2</td><td>84.00</td><td>84.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.1.7</td><td>ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,7</td><td>ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.1.8</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,8</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA</td><td>M3</td><td>14.28</td><td>14,28</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.1.9</td><td>CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,9</td><td>CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT</td><td>M2</td><td>21.00</td><td>21,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.1.10</td><td>TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4" PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6,1,10</td><td>TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4" PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.</td><td>ML</td><td>228,34</td><td>228,34</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80</td></tr>
<tr><td>6.2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>14,91</td><td>14,91</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>6.2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>8,19</td><td>8,19</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.2.3</td><td>CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.2.3</td><td>CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.2.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.2.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60</td></tr>
<tr><td>6.3.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>8,61</td><td>8,61</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.3.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>5,00</td><td>5.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.3.3</td><td>CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.3</td><td>CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.3.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.4</td><td>ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.3.5</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.3.5</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"</td><td>ML</td><td>126.00</td><td>126.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>6.4.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.4.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>100.80</td><td>100,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.4.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>33.60</td><td>33,60</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.4.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION</td><td>ML</td><td>168.00</td><td>168.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.4.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>UND</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.4.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>17.85</td><td>17.85</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>6.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>126.00</td><td>126.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>57.60</td><td>57.60</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>19.20</td><td>19,20</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>7.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION</td><td>ML</td><td>96.00</td><td>96,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)</td><td>UND</td><td>12.00</td><td>12,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>6.00</td><td>6,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>7.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>48.00</td><td>48,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">Construcción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tubería de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">SISTEMA SEPTICO</td></tr>
<tr><td>8.1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>20.00</td><td>20,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.1.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>19,28</td><td>19,28</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.1.3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.3</td><td>MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M</td><td>M2</td><td>44.00</td><td>44,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.1.4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.4</td><td>SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20</td><td>KG</td><td>228,70</td><td>228,70</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CM.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.1.5</td><td>CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.5</td><td>CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>M2</td><td>18,60</td><td>18,60</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.1.6</td><td>CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.6</td><td>CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL</td><td>M2</td><td>18,60</td><td>18,60</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.1.7</td><td>ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.7</td><td>ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.1.8</td><td>TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.8</td><td>TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.</td><td>ML</td><td>28,40</td><td>28,40</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.1.9</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.1.9</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"</td><td>M3</td><td>1,50</td><td>1.50</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.1.10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,1,10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"</td><td>M3</td><td>0,85</td><td>0.85</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8">CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR H CAJA=0.5 e muro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC</td></tr>
<tr><td>8.2.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td colspan="6">El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,2,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>2.00</td><td>2,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>8.2.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,2,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>1,58</td><td>1.58</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.2.3</td><td>CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,2,3</td><td>CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"</td><td>UND</td><td>5.00</td><td>5,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">FOZA DE INFILTRACION DE 1 X 1 M, H=0.8: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4” HASTA LA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE)</td></tr>
<tr><td>8.3.1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,3,1</td><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>16,62</td><td>16,62</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,3,2</td><td>EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN</td><td>M3</td><td>6,69</td><td>6,69</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,3,3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".</td><td>ML</td><td>22,80</td><td>22,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8,3,4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN</td><td>M3</td><td>4.00</td><td>4,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.5</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.4</td><td>TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>2.50</td><td>2,50</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.3.6</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>8.5</td><td>TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES</td><td>VIAJE</td><td>30.00</td><td>30,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>9</td><td>Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra no ha ejecutado esta actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>B</td><td>Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.</td><td>TALLER</td><td>5.00</td><td>5,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>LOGÍSTICOS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bitácora o libro de obra: Llevar con el contratista una bitácora de obra, en donde se registrarán diariamente todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Exigir las firmas de las personas directamente implicadas en la ejecución de la obra. El libro de bitácora debe estar disponible el 100% del tiempo de ejecución en el sitio de obra para ser consultado por la supervisión o personal del proyecto cuenca rio las Ceibas y deberá dar apertura al libro de bitácora con la suscripción del acta de inicio del contrato de obra.</td><td>100%</td><td>La interventoría lleva con el contratista una bitácora, registrando diariamente los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de las actividades de obra, la cual se firma por parte de las personas directamente implicadas en la ejecución de la obra. Se encuentra disponible en el sitio de obra para ser consultado por la supervisión o el personal del proyecto.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mediciones de obra: Efectuar las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de acuerdo con las unidades de medida estipuladas en las especificaciones técnicas y siguiendo planos de referencia. La Interventoría revisará el formato diligenciado por el Contratista en donde se registrará diariamente la ejecución de la obra. Aprobará las actividades ejecutadas y el contenido del formato elaborando actas de corte de obra.</td><td>100%</td><td>La interventoría realizó las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados en el periodo informado, de acuerdo con las medidas establecidas en las especificaciones técnicas y los planos del contrato, para dar aprobación a las actividades ejecutadas.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Comité de obra: Programar una reunión de Comité de Obra semanal con el contratista, el supervisor del contrato y demás personal que intervenga en la ejecución de los trabajos. Se llevarán actas de Comité de los puntos tratados, los problemas que se hayan presentado y las soluciones</td><td>100%</td><td>La Interventoría en cumplimiento de sus funciones, realizó comités técnicos con la participación del ente contratante y el contratista, para tratar los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales y jurídicos del contrato de obra No.490 de 2024, los mismos son anexados en los informes mensuales de interventoría</td></tr>
</table>

	adoptadas.		
4	Inspección de obra: Evaluar e inspeccionar los trabajos ejecutados por el contratista con la programación presentada por el mismo. Controlar y vigilar la correcta construcción de cada una de las actividades que componen el contrato.	**100%**	La interventoría evaluó e inspeccionó los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo a la programación presentada, supervisando la correcta construcción de las actividades.
5	Suministros: Ejercer control permanente de los suministros de los diferentes materiales de construcción que se requieran para ejecutar las obras; y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el contratista, que no cumpla con las especificaciones técnicas y los planos, o si en su construcción no se emplearon materiales o procedimientos adecuados.	**100%**	La interventoría ejerció control permanente de los suministros de los diferentes materiales utilizados por el contratista para la ejecución de la obra, las cuales cumplieron con las especificaciones técnicas y los planos.
6	Control de calidad de los materiales: Exigir al contratista el suministro de las muestras de los materiales a utilizar antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de las mismas. Así mismo solicitar los ensayos y/o pruebas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas y las necesarias y convenientes de acuerdo al desarrollo de la obra.	**100%**	La interventoría exigió al contratista de obra el suministro de muestras de los materiales a utilizar y los ensayos y/o pruebas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas, de acuerdo al desarrollo del contrato; durante el periodo informado no se ejecutaron actividades que requirieran de dichos ensayos y/o pruebas.
7	Realizar los siguientes informes en donde se consignará el avance de la obra de acuerdo a la programación y ejecución del contrato, atrasos en tiempo, costos, observaciones generales, cuadros comparativos, gráficos, fotografías, anexos, etc.: 1) Informe mensual, 2) Informe final.	**100%**	La interventoría realizó informes semanales y mensuales consignando allí el avance del contrato y exigió al contratista de obra la entrega de un informe mensual, detallando cada actividad realizada con su respectivo registro fotográfico.
	ADMINISTRATIVOS		
1	Exigir al contratista la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades	**100%**	La interventoría verificó que el contratista de obra entregara los Análisis de Precios Unitarios de las actividades, los cuales son la base para la aprobación y fijación de actividades no previstas que se requieran en el desarrollo del

	estipuladas en las reglas de participación, los cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo del proyecto.		contrato.
2	Hacer cumplir durante el desarrollo del contrato los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así mismo se exigirá la afiliación a la EPS y ARP de la totalidad del personal que intervenga en la obra. Se verificará el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato.	**100%**	La interventoría durante el desarrollo del contrato, verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación de los mismos; además, que estuvieran afiliados a la EPS y ARL todo el personal que ha intervenido en la obra, cumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales, etc.
3	Mensualmente solicitar copia de los pagos al sistema integrado de seguridad social al ejecutor del contrato de obra y verificar las planillas del personal propuesto por el ejecutor del contrato de obra.		La interventoría solicitó mensualmente copia de los pagos de seguridad social del personal en obra
4	Programar y coordinar por lo menos una reunión mensual con el contratista y con la CAM, para evaluar el desarrollo del contrato y se llevará un estricto control de las actas de las reuniones, las cuales serán entregadas en los informes periódicos que se entreguen.	**100%**	La Interventoría coordinó las reuniones entre las partes, para evaluar el desarrollo del contrato de obra No.490 de 2024.
5	Elaborar, revisar y suscribir las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato como son: Actas de iniciación de los trabajos, actas de reuniones que se celebren en la obra o en las instalaciones de la entidad, actas de suspensiones, de terminación, de recibo final y liquidación de obra, las cuales deberán ser firmadas por la entidad, la interventoría y el contratista, según el caso.	**100%**	La interventoría elaboró, revisó y suscribió las actas de inicio de obra e interventoría; además, los documentos necesarios para la ejecución del contrato, como: actas de comité técnico y/o reuniones y acta de recibo final de obra (Anexo 2).
6	Revisar las solicitudes de	**100%**	El contratista de obra no ha solicitado prórrogas.

	adición y/o prórroga del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y se emitirá un concepto técnico al respecto a la entidad. Así mismo, elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el Representante legal, de la viabilidad de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato.		
7	Revisar la vigencia de las pólizas del contrato y, cuando sea necesario ampliarlas en plazo, requerir al efecto al contratista antes del vencimiento, en un tiempo no menor de cinco (5) días hábiles, para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes.	**100%**	La interventoría revisó la vigencia de las pólizas del contrato de acuerdo a la actualización según la fecha de inicio del contrato.
8	Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución de los trabajos y elaborar las respectivas actas a que haya lugar.	**100%**	La Interventoría atendió las reuniones citadas por la CAM, en desarrollo del contrato de obra No.490 de 2024.
9	Exigir y controlar la permanencia en los frentes de obra, del residente de obra y demás profesionales del contratista de acuerdo al % de dedicación exigido en el Pliego de Condiciones.	**100%**	La interventoría exigió al contratista la permanencia en los frentes de obra del residente y demás profesionales de acuerdo al porcentaje de dedicación exigido en el pliego de condiciones.
10	Mantener actualizado la carpeta del contrato, verificando documentos precontractuales y contractuales aportados en desarrollo del contrato objeto de interventoría, y deberá adelantar la foliación de los mismos conforme a las normas de archivo de la Corporación.	**100%**	La interventoría mantuvo la carpeta del contrato actualizada.
11	Permanecer en la obra en horas nocturnas, festivos y domingos programados o en horas no laborales comúnmente, y se exigirá la presencia del residente del contratista, así como de todos los profesionales que se requieran en la ejecución de	**100%**	La interventoría mantuvo su personal en el tiempo requerido y dedicación de cada profesional en obra.

	dichos trabajos conforme a la dedicación mensual.		
12	Exigir al contratista el estricto cumplimiento de las normas de seguridad industrial y bioseguridad, con el fin salvaguardar la integridad física de los operarios y de todas las personas que transitan por la zona de ejecución de las obras.	**100%**	La interventoría exigió al contratista de obra el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para todas las actividades ejecutadas por los trabajadores en obra, los cuales garantizaron la integridad física de los mismos.
13	Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma, con el fin de prever incumplimientos parciales o definitivos del contrato. Efectuar los requerimientos a que haya lugar al contratista.	**100%**	La interventoría mediante los informes semanales realizó las evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma presentado por el contratista, con el fin de ir previendo los posibles incumplimientos y así tomar las acciones a las que haya lugar.
14	Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitirlo a la entidad para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los soportes.	**100%**	A la fecha no se ha efectuado la liquidación del contrato.
15	Revisar y aprobar las hojas de vida y demás documentos de los profesionales que intervendrán en el contrato y/o cuando se requiera nuevo personal.	**100%**	La interventoría realizó la revisión y aprobación de las hojas de vida y demás documentos de los profesionales que han intervenido en la ejecución del contrato; a la fecha no se ha requerido nuevo personal.
16	En los casos en que amerite, ordenar la suspensión temporal de la respectiva ejecución hasta tanto no se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción de la interventoría y/o de la CAM, cuando el contratista utilice procedimientos inaceptables u operaciones que presenten riesgos para el personal, para los trabajos, para el contratista o para la entidad o terceros.	**100%**	A la fecha la interventoría no ha ordenado la suspensión temporal de la ejecución del contrato, debido a que no se han presentado situaciones inaceptables en donde el contratista de obra haya realizado procedimientos u operaciones que presenten riesgos para el personal, para los trabajos, para la entidad o terceros.
17	Exigir al contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.	**100%**	La interventoría ha verificado que el contratista de obra haya realizado los procedimientos y utilizado los equipos acordes a los requerimientos para la correcta ejecución de las actividades y que garanticen la seguridad y calidad de la obra.

18	Exigir verificadas e implementadas las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista, a su costo, las realice correctamente sin derecho a remuneración adicional, las obras de acuerdo con las especificaciones, técnicas, planos de referencia y demás condiciones del contrato.	**100%**	La interventoría verificó que el contratista de obra a la fecha ha ejecutado las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de referencia; por lo tanto, no fue necesario la exigencia de medidas correctivas.
19	Verificar que el contratista mantenga a tiempo, durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta técnica.	**100%**	La interventoría verificó que el contratista de obra mantuviera el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecido en la propuesta técnica durante el periodo informado.
20	Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el correcto desarrollo de los trabajos; todas las instrucciones que impartan al contratista serán por escrito y con copia a la CAM.	**100%**	La interventoría impartió al contratista de obra por escrito las instrucciones, órdenes y autorizaciones requeridas para el correcto desarrollo de las actividades, con conocimiento del supervisor de la CAM.
	TÉCNICOS		
1	Vigilar que las obras se ejecuten técnicamente y se verificará el cumplimiento de las condiciones generales y específicas técnicas para la correcta ejecución de las obras, se evitará entrabamientos con el contratista de obra y se colaborará en la solución de problemas surgidos en el desarrollo del mismo a fin de cumplir a satisfacción la ejecución del contrato.	**100%**	La interventoría vigiló que la obra se está ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas para la correcta ejecución del contrato.
2	Coordinar y asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato	**100%**	La Interventoría coordinó y asistió a todas las reuniones, para tratar los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales y jurídicos del contrato de obra No.490 de 2024, los mismos son anexados en los informes mensuales de interventoría.
3	Verificar y aprobar la localización de los trabajos y verificar que la implantación de proyecto realizada por el contratista sea la correcta.	**100%**	La interventoría verificó y aprobó la localización e implantación de las obras realizados por el contratista, corroborando que fuera la correcta, de acuerdo a las condiciones encontradas en el terreno.
4	Verificar las cantidades de obra establecidas en el contrato y, a partir de la información suministrada, presentará un informe a la entidad sobre los	**100%**	La interventoría verificó las cantidades de obras establecidas en el contrato y ha presentado en los informes semanales y mensuales los aspectos ambientales que han repercutido en el normal desarrollo del contrato.

	aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones del mismo.		
5	Consolidar, verificar y aprobar las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de las mediciones de los cortes de obra.	**100%**	La interventoría consolidó, verificó y aprobó las cantidades de obra ejecutadas en el período comprendido desde el 30 de diciembre de 2024 al 30 de abril de 2025.
6	Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. En caso de identificación de cambio de especificaciones coordinar reunión extraordinaria con el contratista y la entidad, a fin de exigir que se cumpla con las especificaciones, de lo cual se realizará la respectiva acta.	**100%**	La interventoría verificó que el contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por la CAM.
7	Verificar y garantizar que, en la ejecución de las obras, el contratista cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.	**100%**	La interventoría verificó que el contratista de obra en la ejecución de las actividades cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad y estabilidad.
8	Realizar los controles de las actividades programadas, así como recomendar los ajustes a que haya lugar en forma oportuna.	**100%**	La interventoría realizó los controles de las actividades programadas y recomendó los ajustes necesarios de manera oportuna para la correcta ejecución de la obra.
9	Exigir que la totalidad del personal del contratista, mantenga durante el tiempo de ejecución de los trabajos la dotación adecuada para la labor desempeñada, esto es, botas, casco, overol con el nombre de la empresa contratista en la espalda, monogafas y todos los elementos de seguridad industrial y bioseguridad necesarios para la correcta ejecución de las actividades a desarrollar.	**100%**	La interventoría exigió al contratista de obra la permanencia del personal durante el tiempo ejecutado, con su respectiva dotación y elementos de protección personal.
	FINANCIEROS		
1	Revisar y aprobar las solicitudes de pago realizadas por el contratista.	**100%**	La interventoría revisó y aprobó las solicitudes de pago realizadas por el contratista

2	Presentar un balance económico de ejecución del contrato, así como la concertación de cantidades para la liquidación final para efectos de la liquidación del contrato.	**100%**	Mediante los informes mensuales de interventoría se presenta en balance económico de ejecución del contrato. A la fecha el contrato se encuentra en en proceso de recibo.
3	Efectuar el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad, seguridad industrial, vinculación del personal contratista a los sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con dichas entidades; así mismo que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con los aportes parafiscales al SENA, ICBF y cajas de compensación, en los términos de ley.	**100%**	La interventoría efectuó el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, verificando el cumplimiento del contratista de obra en cuanto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la vinculación de su personal al sistema de seguridad social integral y el pago oportuno de la misma.
4	Efectuar un control detallado de inversión en el contrato.	**100%**	La interventoría realizó control detallado de inversión del contrato.
5	Realizar mensualmente, en el respectivo informe, un análisis del avance financiero de las obras, a fin de prever con la suficiente anticipación eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la CAM tome para asegurar el flujo de fondos del contrato.	**100%**	La interventoría mediante los informes mensuales se realizó el análisis del avance financiero de la obra.
	JURÍDICOS		
1	Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el contratista, en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el Contrato de obra, sus anexos y modificaciones, prórroga y adiciones y exigir el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.	**100%**	La interventoría verificó el estado de las pólizas y garantías constituidas por el contratista de obra.
2	En general, asesorar, apoyar y mantener informada a la CAM, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo	**100%**	La interventoría asesoró, apoyó y mantuvo informada a la CAM, sobre todos los asuntos jurídicos en el desarrollo de la obra, con el fin de resolver aspectos jurídicos respecto a la ejecución del contrato.

	de las obras objeto del Contrato, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la Subdirección que hará el seguimiento al contrato de Interventoría.		
	GENERALES		
1	Permanecer en la obra en horas nocturnas, festivos y domingos programados o en horas No laborales comúnmente, y se exigirá la presencia del residente del contratista, así como de todos los profesionales que se requieran en la ejecución de dichos trabajos conforme a la dedicación mensual.	**100%**	La interventoría mantuvo su personal en obra según la dedicación estipulada en el contrato.
2	Cumplir el objeto del Contrato, realizando seguimiento permanente en la ejecución y entrega de la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, las especificaciones de construcción con sujeción a los precios unitarios estipulados.	**100%**	La interventoría cumplió con el objeto del contrato.
3	Como requisito para la suscripción del acta de inicio deberá presentar la afiliación del personal empleado para la ejecución del contrato (el personal propuesto como equipo técnico) al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales);	**100%**	La interventoría presentó afiliación del personal propuesto a la seguridad social.
4	Mantener indemne a la CAM de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.	**100%**	La interventoría mantuvo a la CAM indemne de cualquier reclamación de terceras personas.
5	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la CAM o a un	**100%**	La interventoría responde civil y penalmente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales

	tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.		
6	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	**100%**	La interventoría asumió los pagos generados por legalización del contrato y demás obligaciones
7	Notificar a la CAM en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	**100%**	La interventoría no ha realizado ninguna cesión de contrato
8	Notificar a la CAM cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	**100%**	La interventoría ha informado a la CAM de todas las circunstancias que han afectado el contrato.
9	Presentar los documentos que le solicite el supervisor y/o supervisor.	**100%**	La interventoría ha presentado la documentación requerida por el supervisor.
10	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	**100%**	La interventoría ha mantenido las condiciones exigidas en el contrato durante la ejecución del mismo.
11	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Supervisor.	**100%**	La interventoría presentó la documentación requerida por el supervisor para el acta de inicio firmada el 30 de diciembre de 2024.
12	El Contratista velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades	**100%**	La interventoría veló por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras

	competentes.		
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
1	Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental y el seguimiento a la ejecución del contrato de obra cuyo objeto consiste en "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL", conforme a las condiciones técnicas establecidas en el contrato de obra por la Corporación.	**100%**	La interventoría cumplió con el objeto del contrato.
2	Realizar la interventoría a las obras a ejecutar	**100%**	La interventoría supervisó las actividades ejecutadas en el periodo por el contratista de obra
3	Entregar al contratista un acta de recibo de cada obra o ítem construida a satisfacción, conforme a los formatos entregados por la Corporación;	**100%**	La interventoría exigió al contratista la entrega de un acta de recibo de cada obra ejecutada a conformidad de los beneficiarios. Anexo 3
4	Realizar las visitas necesarias de campo durante la ejecución del contrato, a cada uno de los sitios donde se ejecutarán las obras, actividades y/o inversiones. De cada visita se deberán tomar registros fotográficos y coordenadas geográficas para su localización exacta, y presentar informes, de conformidad con el formato que se acuerde con la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM al inicio del contrato;	**100%**	La interventoría realizó visitas de campo a cada beneficiario, durante la ejecución del contrato y se tomó registro de cada visita realizada.
5	Evaluar los informes presentados por el ejecutor del contrato objeto de esta interventoría, verificar la documentación anexa y emitir para el caso el respectivo	**100%**	La interventoría revisó y evaluó los informes presentados por el contratista de obra, el cual debe contener la información pertinente a las actividades realizadas en el periodo.

	concepto de la interventoría, para el recibo o no de las actividades y obras, así como sus respectivos desembolsos;		
6	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista para con la CAM, e informar oportunamente y por escrito a la CAM cualquier anormalidad;	**100%**	La interventoría vigilo el cumplimiento de las obligaciones del contratista con la CAM.
7	Proyectar y suscribir actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo final y liquidación del contrato, cuya interventoría le haya sido asignada;	**100%**	La interventoría suscribió actas de inicio del proyecto el día 30 de diciembre de 2024.
8	Proyectar solicitudes de desembolso del contrato objeto de esta interventoría, conforme a las actas parciales de recibo generadas, para lo cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y que se haya realizado el cargue de la información requerida para cada pago en el secop II y emitir un concepto de que se puede adelantar el pago por parte de la supervisión;	**100%**	La interventoría proyectó solicitud de desembolso del contratista de obra, conforme acta parcial No.1, la cual se cargó la información en el Secop II.
9	Realizar al contratista del contrato objeto de interventoría la solicitud de actualización de pólizas si a ello hubiere lugar;		La interventoría solicito al contratista al contratista de obra mantener las pólizas actualizadas
10	Verificar conforme a los requisitos de Ley, los documentos técnicos y jurídicos que soportan las solicitudes de desembolso presentada por el contratista;	**100%**	La interventoría revisó y aprobó la documentación técnica presentada por el contratista de obra para desembolso del acta
	OBLIGACONES DE INFORMACION		
1	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la CAM, el Supervisor o de los organismos de control.	**100%**	La interventoría atendió y resolvió las observaciones realizadas por la CAM.
2	Presentar informes técnicos, administrativos, contables, jurídicos y financieros de avance de la ejecución física mensuales y final del contrato objeto de interventoría, conforme a presentación de informes del contrato de obra. Dichos informes estarán soportados con los Informes de ejecución física y financiera, actas parciales, finales, de	**100%**	La interventoría presentó informes mensuales con avances financieros y físicos de la obra.

	liquidación, informes de interventoría, desembolsos autorizados, comprobantes de egreso, órdenes de pago, registros fotográficos, registros presupuestales, entre otros; ejecutados por el contrato objeto de esta interventoría		
3	Diligenciar el formato F-CAM-066 que será requisito previo para la liquidación del contrato, la cual se debe presentar en medio físico y magnético.	**100%**	La interventoría previa a la liquidación del contrato presentará el formato F-CAM-066.
4	Presentar los informes conforme lo requiera la Corporación, para cada pago parcial que se efectúe y uno al final de la ejecución del contrato. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Supervisión;	**100%**	La interventoría presento los informes, de acuerdo a lo requerido por la entidad
5	Elaborar y presentar las actas de necesarias de acuerdo con los porcentajes de ejecución.	**100%**	La interventoría elaboró y presentó acta de acuerdo al porcentaje ejecutado.
6	El contratista deberá publicar todos los documentos derivados de la ejecución contractual, a través de la plataforma transaccional del SECOP II.	**100%**	La interventoría publicó en la plataforma Secop II la totalidad de documentos generados en la ejecución del contrato.
	OBLIGACIONES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
1	Los profesionales vinculados al proyecto deben contar con tarjeta profesional vigente;	**100%**	Los profesionales propuestos cuentan con tarjeta profesional vigente
2	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP), según el caso.	**100%**	La interventoría dio estricto y oportuno cumplimiento al pago al sistema integral de seguridad social del personal.
3	Dar cumplimiento a la normatividad vigente con respecto al Sistema de Riesgos laborales y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST en cumplimiento de la Resolución	**100%**	La interventoría dio cumplimiento a los distintos sistemas de gestión.

	No. 312 de 2019 y suministrar a la CAM la información y documentación que ésta solicite en cumplimiento de la normatividad vigente.		
4	Disponer de los elementos de seguridad industrial y de bioseguridad que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato;	**100%**	La interventoría dispuso de los elementos de seguridad industrial y bioseguridad que se requirieron en las actividades contractuales.
5	Adoptar la política "Cero Papel" y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.	**100%**	La interventoría adopto la política de la CAM de cero papel y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos.
6	No contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	**100%**	La interventoría no contrato ningún menor de edad en la ejecución del contrato.
	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL REQUERIDO		
1	Vincular y mantener en la ejecución de las actividades, la totalidad del personal requerido y propuesto para tal fin.	**100%**	La interventoría mantuvo la totalidad del personal propuesto durante la ejecución del contrato
2	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y; dotación de calzado y vestido de labor.	**100%**	La interventoría cumplió con las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.
3	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y	**100%**	La interventoría asumió el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal ocupado en el contrato.

	ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.		
4	Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensación Familiar (salud, pensión, ARP) y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2.007 Art. 23 cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.	**100%**	La interventoría cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral de todo el personal.
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra la CAM, por causa o con ocasión del contratante.	**100%**	No se han presentado reclamaciones de ningún tipo.
	Promedio de % Cumplimiento	**100%**	Según Acta de recibo final No.2 de interventoría. Anexo 4

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	SECADEROS DE CAFÉ										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	200.00	$ 2,270,960.00	0.37%	200.00	$ 2,270,960.00	0.37%	0	$ -	0.00%
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4.80	$ 142,497.00	0.02%	4.80	$ 142,497.00	0.02%	0	$ -	0.00%
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6.40	$ 6,985,432.00	1.14%	6.40	$ 6,985,432.00	1.14%	0.00	$ -	0.00%
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	8.00	$ 38,554,165.00	6.27%	8.00	$ 38,554,165.00	6.27%	0.00	$ -	0.00%
1.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	8.00	$ 31,410,166.00	5.11%	8.00	$ 31,410,166.00	5.11%	0.00	$ -	0.00%
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	8.00	$ 13,276,545.00	2.16%	8.00	$ 13,276,545.00	2.16%	0.00	$ -	0.00%
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	64.00	$ 43,134,931.00	7.01%	64.00	$ 43,134,931.00	7.01%	0.00	$ -	0.00%
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	8.00	$ 7,218,400.00	1.17%	8.00	$ 7,218,400.00	1.17%	0.00	$ -	0.00%
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	64.00	$ 5,774,720.00	0.94%	64.00	$ 5,774,720.00	0.94%	0.00	$ -	0.00%

2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**										
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	125.00	$ 1,419,350.00	0.23%	125.00	$ 1,419,350.00	0.23%	0.00	$ -	0.00%
2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	3.00	$ 89,061.00	0.01%	3.00	$ 89,061.00	0.01%	0.00	$ -	0.00%
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4.00	$ 4,365,895.00	0.71%	4.00	$ 4,365,895.00	0.71%	0.00	$ -	0.00%
2.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	5.00	$ 24,847,982.00	4.04%	5.00	$ 24,847,982.00	4.04%	0.00	$ -	0.00%
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	5.00	$ 19,631,354.00	3.19%	5.00	$ 19,631,354.00	3.19%	0.00	$ -	0.00%
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	5.00	$ 8,297,841.00	1.35%	5.00	$ 8,297,841.00	1.35%	0.00	$ -	0.00%
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	40.00	$ 26,959,332.00	4.38%	40.00	$ 26,959,332.00	4.38%	0.00	$ -	0.00%
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	5.00	$ 4,511,500.00	0.73%	5.00	$ 4,511,500.00	0.73%	0.00	$ -	0.00%
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	40.00	$ 3,609,200.00	0.59%	40.00	$ 3,609,200.00	0.59%	0.00	$ -	0.00%

3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo**							0.00%		$ -	0.00%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vertices de las paseras. Dos por vertices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diametro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera sóldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de ppuesrta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV,HUECO TIPO ROMBO QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	UND	16.00	$ 13,349,668.00	2.17%	16.00	$ 13,349,668.00	2.17%	0.00	$ -	0.00%
3.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3.00	$ 2,706,900.00	0.44%	3.00	$ 2,706,900.00	0.44%	0.00	$ -	0.00%
3.3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10.00	$ 902,300.00	0.15%	10.00	$ 902,300.00	0.15%	0.00	$ -	0.00%
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x1/8"**							0.00%		$ -	0.00%
4.1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90°, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO A LOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	16.00	$ 10,783,733.00	1.75%	16.00	$ 10,783,733.00	1.75%	0.00	$ -	0.00%
4.2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	3.00	$ 2,706,900.00	0.44%	3.00	$ 2,706,900.00	0.44%	0.00	$ -	0.00%
4.3	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	10.00	$ 902,300.00	0.15%	10.00	$ 902,300.00	0.15%	0.00	$ -	0.00%

5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**								0.00%		$ -	0.00%
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156.00	$ 1,771,349.00	0.29%	156.00	$ 1,771,349.00	0.29%	0.00	$ -	0.00%
5.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	6.00	$ 178,122.00	0.03%	6.00	$ 178,122.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
5.3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	12.00	$ 11,005,962.00	1.79%	12.00	$ 11,005,962.00	1.79%	0.00	$ -	0.00%
5.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	UND	12.00	$ 27,620,805.00	4.49%	12.00	$ 27,620,805.00	4.49%	0.00	$ -	0.00%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	12.00	$ 38,906,660.00	6.32%	12.00	$ 38,906,660.00	6.32%	0.00	$ -	0.00%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	UND	12.00	$ 3,703,379.00	0.60%	12.00	$ 3,703,379.00	0.60%	0.00	$ -	0.00%
5.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	6.00	$ 5,413,800.00	0.88%	6.00	$ 5,413,800.00	0.88%	0.00	$ -	0.00%
5.8	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	96.00	$ 8,662,080.00	1.41%	96.00	$ 8,662,080.00	1.41%	0.00	$ -	0.00%
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**								0.00%		$ -	0.00%
6.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**								0.00%	0.00	$ -	0.00%
6,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	84.00	$ 953,803.00	0.16%	84.00	$ 953,803.00	0.16%	0.00	$ -	0.00%
6,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	151.80	$ 4,506,481.00	0.73%	151.80	$ 4,506,481.00	0.73%	0.00	$ -	0.00%
6,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	302.19	$ 47,957,672.00	7.80%	302.19	$ 47,957,672.00	7.80%	0.00	$ -	0.00%
6,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	1140.30	$ 13,475,554.00	2.19%	1,140.30	$ 13,475,554.00	2.19%	0.00	$ -	0.00%
6,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	83.37	$ 9,692,064.00	1.58%	83.37	$ 9,692,064.00	1.58%	0.00	$ -	0.00%

6,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84.00	$ 9,311,519.00	1.51%	84.00	$ 9,311,519.00	1.51%	0.00	$ -	0.00%
6,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	21.00	$ 7,205,876.00	1.17%	21.00	$ 7,205,876.00	1.17%	0.00	$ -	0.00%
6,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	14.28	$ 2,654,958.00	0.43%	14.28	$ 2,654,958.00	0.43%	0.00	$ -	0.00%
6,1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	21.00	$ 2,494,706.00	0.41%	21.00	$ 2,494,706.00	0.41%	0.00	$ -	0.00%
6,1,10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	228.34	$ 11,564,427.00	1.88%	228.34	$ 11,564,427.00	1.88%	0.00	$ -	0.00%
6.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**							0.00%		$ -	0.00%
6,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	14.91	$ 169,300.00	0.03%	14.91	$ 169,300.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
6,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	8.19	$ 243,136.00	0.04%	8.19	$ 243,136.00	0.04%	0.00	$ -	0.00%
6,2,3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21.00	$ 17,336,124.00	2.82%	21.00	$ 17,336,124.00	2.82%	0.00	$ -	0.00%
6,2,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21.00	$ 3,035,734.00	0.49%	21.00	$ 3,035,734.00	0.49%	0.00	$ -	0.00%
6.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**							0.00%		$ -	0.00%
6,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	8.61	$ 97,764.00	0.02%	8.61	$ 97,764.00	0.02%	0.00	$ -	0.00%
6,3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5.00	$ 148,435.00	0.02%	5.00	$ 148,435.00	0.02%	0.00	$ -	0.00%
6,3,3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21.00	$ 11,755,877.00	1.91%	21.00	$ 11,755,877.00	1.91%	0.00	$ -	0.00%
6,3,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	1.00	$ 144,559.00	0.02%	1.00	$ 144,559.00	0.02%	0.00	$ -	0.00%
6,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	ML	126.00	$ 5,400,753.00	0.88%	126.00	$ 5,400,753.00	0.88%	0.00	$ -	0.00%
6.4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E**							0.00%		$ -	0.00%
6,4,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100.80	$ 1,144,564.00	0.19%	100.80	$ 1,144,564.00	0.19%	0.00	$ -	0.00%
6,4,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	33.60	$ 997,482.00	0.16%	33.60	$ 997,482.00	0.16%	0.00	$ -	0.00%
6,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	168.00	$ 7,863,436.00	1.28%	168.00	$ 7,863,436.00	1.28%	0.00	$ -	0.00%
6,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	21.00	$ 6,342,781.00	1.03%	21.00	$ 6,342,781.00	1.03%	0.00	$ -	0.00%
6,4,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	17.85	$ 16,106,055.00	2.62%	17.85	$ 16,106,055.00	2.62%	0.00	$ -	0.00%
6.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	126.00	$ 11,368,980.00	1.85%	126.00	$ 11,368,980.00	1.85%	0.00	$ -	0.00%
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**							0.00%		$ -	0.00%
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	57.60	$ 654,037.00	0.11%	57.60	$ 654,037.00	0.11%	0.00	$ -	0.00%
7.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19.20	$ 569,990.00	0.09%	19.20	$ 569,990.00	0.09%	0.00	$ -	0.00%
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	96.00	$ 4,493,392.00	0.73%	96.00	$ 4,493,392.00	0.73%	0.00	$ -	0.00%
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	12.00	$ 3,624,446.00	0.59%	12.00	$ 3,624,446.00	0.59%	0.00	$ -	0.00%
7.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6.00	$ 5,413,800.00	0.88%	6.00	$ 5,413,800.00	0.88%	0.00	$ -	0.00%
7.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	48.00	$ 4,331,040.00	0.70%	48.00	$ 4,331,040.00	0.70%	0.00	$ -	0.00%
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**							0.00%		$ -	0.00%
8.1	**SISTEMA SÉPTICO**	0	0.00	$ -	0.00%	0.00		0.00%	0.00	$ -	0.00%
8,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20.00	$ 227,096.00	0.04%	20.00	$ 227,096.00	0.04%	0.00	$ -	0.00%

8,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19.28	$ 572,365.00	0.09%	19.28	$ 572,365.00	0.09%	0.00	$ -	0.00%
8,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	44.00	$ 6,982,817.00	1.14%	44.00	$ 6,982,817.00	1.14%	0.00	$ -	0.00%
8,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	228.70	$ 2,702,675.00	0.44%	228.70	$ 2,702,675.00	0.44%	0.00	$ -	0.00%
8,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	18.60	$ 2,162,317.00	0.35%	18.60	$ 2,162,317.00	0.35%	0.00	$ -	0.00%
8,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	18.60	$ 2,061,837.00	0.34%	18.60	$ 2,061,837.00	0.34%	0.00	$ -	0.00%
8,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	UND	5.00	$ 2,085,112.00	0.34%	5.00	$ 2,085,112.00	0.34%	0.00	$ -	0.00%
8,1,8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	28.40	$ 1,438,349.00	0.23%	28.40	$ 1,438,349.00	0.23%	0.00	$ -	0.00%
8,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	1.50	$ 332,030.00	0.05%	1.50	$ 332,030.00	0.05%	0.00	$ -	0.00%
8,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0.85	$ 182,508.00	0.03%	0.85	$ 182,508.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
8.2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE**							0.00%		$ -	0.00%
8,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2.00	$ 22,710.00	0.00%	2.00	$ 22,710.00	0.00%	0.00	$ -	0.00%
8,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.58	$ 46,905.00	0.01%	1.58	$ 46,905.00	0.01%	0.00	$ -	0.00%
8,2,3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	UND	5.00	$ 3,634,696.00	0.59%	5.00	$ 3,634,696.00	0.59%	0.00	$ -	0.00%
8.3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**							0.00%		$ -	0.00%
8,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	16.62	$ 188,718.00	0.03%	16.62	$ 188,718.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
8,3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.69	$ 198,512.00	0.03%	6.69	$ 198,512.00	0.03%	0.0000	$ -	0.00%
8,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	22.80	$ 1,154,731.00	0.19%	22.80	$ 1,154,731.00	0.19%	0.00	$ -	0.00%
8,3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	4.00	$ 885,414.00	0.14%	4.00	$ 885,414.00	0.14%	0.00	$ -	0.00%
8,3,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2.50	$ 2,255,750.00	0.37%	2.50	$ 2,255,750.00	0.37%	0.00	$ -	0.00%
8,3,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	30.00	$ 2,706,900.00	0.44%	30.00	$ 2,706,900.00	0.44%	0.00	$ -	0.00%
B	**Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.**	TALL	5.00	$ 3,179,442.00	0.52%	5.00	$ 3,179,442.00	0.52%	0.00	$ -	0.00%
	VALOR TOTAL			**$ 615,192,918.00**	**100.00%**		**$ 615,192,918.00**	**100.00%**		**$ -**	**0.00%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
"Adelantar acciones de ingeniería para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas, mediante el manejo de aguas residuales domésticas rurales con la construcción de sistemas sépticos en cuencas hidrográficas, y áreas protegidas de la categoría Distrito Regional de Manejo Integrado y Humedales que poseen instrumentos de planificación aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en su jurisdicción".	$ 615.192.918,00	$ 615.192.918,00	$ 0,00	**100%**	En el presente período ejecutó por encima del porcentaje de la reprogramación establecida para el contrato, ejecutando un porcentaje equivalente al **100%** vs el **81,63%** del programado; teniendo en cuenta que el contratista aumentó la mano de obra. El contratista está cumpliendo el alcance y las especificaciones técnicas del contrato.

INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA					EJECUCIÓN INTERVENTORÍA					
No.	**DESCRIPCIÓN CONTRATO OBRA**	**VALOR INICIAL CONTRATO**	**VALOR ADICIÓN CONTRATO**	**VALOR FINAL CONTRATO**	**ACTA No.**	**COSTO ACTAS ANTERIORES**	**COSTO PRESENTE ACTA**	**% PRESENTE ACTA**	**COSTO ACUMULADO**	**% ACUMULADO**
490 -2024	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."	$ 615,192,918.00	$ -	$ 615,192,918.00	2	$ 25,169,665.51	$ 32,269,096.24	56.18%	$ 57,438,761.75	100.00%
VALOR TOTAL OBRAS PARA REALIZAR INTERVENTORIA		**$ 615,192,918.00**	**$ -**	**$ 615,192,918.00**		**$ 25,169,665.51**	**$ 32,269,096.24**	**56.18%**	**$ 57,438,761.75**	**100.00%**
	COSTO INTERVENTORIA	$ 57,438,762.00				$ 25,169,665.51	$ 32,269,096.24		$ 57,438,761.75	
	IVA - 19%	$ 10,913,365.00				$ 4,782,236.45	$ 6,131,128.29		$ 10,913,364.73	
	TOTAL COSTO INTERVENTORIA	**$ 68,352,127.00**				**$ 29,951,901.96**	**$ 38,400,224.53**		**$ 68,352,126.49**	
	PORCENTAJE COSTO INTERVENTORIA SOBRE VALOR CONTRATO	11.11%								
VALOR PRESENTE ACTA INTERVENTORIA:		**TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE**								

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de obra cuyo objeto es "Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del contrato No.490 de 2024, cuyo objeto es "Realizar la construcción de obras rurales requeridas como estrategia de descontaminación hídrica y de adaptación al cambio climático en el proceso de implementación del POMCA rio Loro, rio Las Ceibas y otros directos al Magdalena y de preservación de zonas de interés ecosistémico en los municipios de Acevedo, Elías y Paicol".	$68.352.127,00	$68.352.126,49	$ 0,51	**100%**	La ejecución de las actividades se realizó según lo establecido en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	-
Oportunidad en entrega	-
Cantidad entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

La interventoría ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, recibiendo a satisfacción un total de 15 sistemas sépticos de aguas domésticas, 2 sistema séptico de aguas residuales no domésticas, 1 tanque australiano, 8 secaderos de café, 1 secadero de cacao, 10 campos de infiltración correspondientes al **56,18**% de las actividades ejecutadas en el contrato de obra. En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA – FORMA DE PAGO "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, así: PAGOS PARCIALES: En el mismo porcentaje en el que se realicen los pagos parciales del contrato objeto de interventoría hasta un 80% del valor del contrato de Interventoría. PAGO FINAL: El veinte por ciento (20%) restante del valor total del Contrato, con la suscripción del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación del Contrato de Interventoría aprobadas por el supervisor, una vez terminado y liquidado el contrato de obra objeto de interventoría...*", el Supervisor considera conveniente adelantar el trámite para el pago correspondiente a **$38.400.224,53** M/cte., según acta de recibo final No.2 de interventoría, que comprende el período de ejecución desde el 01 de mayo de 2025 hasta el 30 de junio de 2025; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL 2	$38.400.224,53
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
RECURSOS CAM	$ 8.885.776,89
RECURSOS CEIBAS	$ 29.514.447,64
VALOR A PAGAR	**$38.400.224,53**

Atentamente,

Vo. Bo. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor contrato No.485 de 2024.

ANEXO 1
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA – MEMORIAS - ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.2

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**									
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**				
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00						
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES						
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025		**FECHA ACTA**		**11/06/2025**		
	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 40x20 mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2", paseras en tabla nogal o pino apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16" y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**											
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	200,00	$ 8.809,00	$ 1.761.800,00	200,00	$ 1.761.800,00	0,00	$ -	200,00	$ 1.761.800,0	
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 23.031,00	$ 147.398,40	6,40	$ 147.398,40	-1,60	$ (36.849,60)	4,80	$ 110.548,8	
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 846.760,00	$ 5.419.264,00	6,40	$ 5.419.264,00	0,00	$ -	6,40	$ 5.419.264,0	
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	8,00	$ 3.738.767,00	$ 29.910.136,00	8,00	$ 29.910.136,00	0,00	$ -	8,00	$ 29.910.136,0	
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	8,00	$ 3.045.982,00	$ 24.367.856,00	8,00	$ 24.367.856,00	0,00	$ -	8,00	$ 24.367.856,0	
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	8,00	$ 1.287.485,00	$ 10.299.880,00	8,00	$ 10.299.880,00	0,00	$ -	8,00	$ 10.299.880,0	
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	64,00	$ 522.873,00	$ 33.463.872,00	64,00	$ 33.463.872,00	0,00	$ -	64,00	$ 33.463.872,0	
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	8,00	$ 700.000,00	$ 5.600.000,00	8,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 5.600.000,0	
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	64,00	$ 70.000,00	$ 4.480.000,00	64,00	$ 4.480.000,00	0,00	$ -	64,00	$ 4.480.000,0	
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**											
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	125,00	$ 8.809,00	$ 1.101.125,00	125,00	$ 1.101.125,00	0,00	$ -	125,00	$ 1.101.125	

		OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**											
		CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**			
		VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00							
		PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES							
		F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025				**FECHA ACTA**		**11/06/2025**	
		CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**		
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 23.031,00	$ 92.124,00		4,00	$ 92.124,00	-1,00	$ (23.031,00)	3,00	$ 69.093,0		
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 846.760,00	$ 3.387.040,00		4,00	$ 3.387.040,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.387.040,0		
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	5,00	$ 3.855.389,00	$ 19.276.945,00		5,00	$ 19.276.945,00	0,00	$ -	5,00	$ 19.276.945,0		
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	5,00	$ 3.045.982,00	$ 15.229.910,00		5,00	$ 15.229.910,00	0,00	$ -	5,00	$ 15.229.910,0		
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	5,00	$ 1.287.485,00	$ 6.437.425,00		5,00	$ 6.437.425,00	0,00	$ -	5,00	$ 6.437.425,0		
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	40,00	$ 522.873,00	$ 20.914.920,00		40,00	$ 20.914.920,00	0,00	$ -	40,00	$ 20.914.920,0		
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00		5,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.500.000,0		
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	40,00	$ 70.000,00	$ 2.800.000,00		40,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ -	40,00	$ 2.800.000,0		
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x 1/8"**													

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**									
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**	
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00					
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES					
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025				**FECHA ACTA**	**11/06/2025**

	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vertices de las paseras. Dos por vertices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diametro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera sóldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de ppuesrta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV,HUECO TIPO ROMBO QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	UND	16,00	$ 647.288,00	$ 10.356.608,00	16,00	$ 10.356.608,00	0,00	$ -	16,00	$ 10.356.608,0
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000,0
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 700.000,0
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x1/8"**										
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90°, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO A LOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	16,00	$ 522.873,00	$ 8.365.968,00	16,00	$ 8.365.968,00	0,00	$ -	16,00	$ 8.365.968,0
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000,0
4,3	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 700.000,0
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**										
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156,00	$ 8.809,00	$ 1.374.204,00	156,00	$ 1.374.204,00	0,00	$ -	156,00	$ 1.374.204,0
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	6,00	$ 23.031,00	$ 138.186,00	6,00	$ 138.186,00	0,00	$ -	6,00	$ 138.186,0

	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"								
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024			
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00		VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00					
	PLAZO	8	MESES	PLAZO	8 MESES					
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025	30/12/2024	27/08/2025		FECHA ACTA	11/06/2025		

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1		MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	12,00	$ 711.531,00	$ 8.538.372,00	12,00	$ 8.538.372,00	0,00	$ -	12,00	$ 8.538.372,0
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	UND	12,00	$ 1.785.674,00	$ 21.428.088,00	12,00	$ 21.428.088,00	0,00	$ -	12,00	$ 21.428.088,0
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	12,00	$ 2.515.300,00	$ 30.183.600,00	12,00	$ 30.183.600,00	0,00	$ -	12,00	$ 30.183.600,0
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	UND	12,00	$ 239.422,00	$ 2.873.064,00	12,00	$ 2.873.064,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.873.064,0
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 4.200.000,0
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	96,00	$ 70.000,00	$ 6.720.000,00	96,00	$ 6.720.000,00	0,00	$ -	96,00	$ 6.720.000,0
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**										
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**						$ -				
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	84,00	$ 8.809,00	$ 739.956,00	84,00	$ 739.956,00	0,00	$ -	84,00	$ 739.956,0
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	140,70	$ 23.031,00	$ 3.240.462,00	140,70	$ 3.240.462,00	11,10	$ 255.644,00	151,80	$ 3.496.106,0
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	298,20	$ 123.119,00	$ 36.714.086,00	298,20	$ 36.714.086,00	3,99	$ 491.245,00	302,19	$ 37.205.331,0
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	1.050	$ 9.168,00	$ 9.626.400,00	1.050,00	$ 9.626.400,00	90,30	$ 827.870,00	1140,30	$ 10.454.270,0
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 90.189,00	$ 7.575.876,00	84,00	$ 7.575.876,00	-0,63	$ (56.819,00)	83,37	$ 7.519.057,0
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 85.998,00	$ 7.223.832,00	84,00	$ 7.223.832,00	0,00	$ -	84,00	$ 7.223.832,0
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	21,00	$ 266.204,00	$ 5.590.284,00	21,00	$ 5.590.284,00	0,00	$ -	21,00	$ 5.590.284,0
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	14,70	$ 144.237,00	$ 2.120.284,00	14,70	$ 2.120.284,00	-0,42	$ (60.580,00)	14,28	$ 2.059.704,0
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	21,00	$ 92.161,00	$ 1.935.381,00	21,00	$ 1.935.381,00	0,00	$ -	21,00	$ 1.935.381,0
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	126,00	$ 39.291,00	$ 4.950.666,00	126,00	$ 4.950.666,00	102,34	$ 4.020.961,00	228,34	$ 8.971.627,0
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**										
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	13,44	$ 8.809,00	$ 118.393,00	13,44	$ 118.393,00	1,47	$ 12.949,00	14,91	$ 131.342,0
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	10,75	$ 23.031,00	$ 247.629,00	10,75	$ 247.629,00	-2,56	$ (59.005,00)	8,19	$ 188.624,0
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 640.442,00	$ 13.449.282,00	21,00	$ 13.449.282,00	0,00	$ -	21,00	$ 13.449.282,0

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**										
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**				
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00							
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES							
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025			**FECHA ACTA**		**11/06/2025**		
	CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**			**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	21,00	$ 2.355.108,00		0,00	$ -	21,00	$ 2.355.108,0	
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**						$ -					$ -	
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3,36	$ 8.809,00	$ 29.598,00	3,36	$ 29.598,00		5,25	$ 46.247,00	8,61	$ 75.845,0	
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,02	$ 23.031,00	$ 46.430,00	2,02	$ 46.430,00		2,98	$ 68.725,00	5,00	$ 115.155,0	
6.3.3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 434.293,00	$ 9.120.153,00	21,00	$ 9.120.153,00		0,00	$ -	21,00	$ 9.120.153,0	
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	21,00	$ 2.355.108,00		-20,00	$ (2.242.960,00)	1,00	$ 112.148,0	
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	ML	126,00	$ 33.253,00	$ 4.189.878,00	126,00	$ 4.189.878,00		0,00	$ -	126,00	$ 4.189.878,0	
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**												
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100,80	$ 8.809,00	$ 887.947,00	100,80	$ 887.947,00		0,00	$ -	100,80	$ 887.947,0	
6.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	33,60	$ 23.031,00	$ 773.842,00	33,60	$ 773.842,00		0,00	$ -	33,60	$ 773.842,0	
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	168,00	$ 36.312,00	$ 6.100.416,00	168,00	$ 6.100.416,00		0,00	$ -	168,00	$ 6.100.416,0	
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	21,00	$ 234.319,00	$ 4.920.699,00	21,00	$ 4.920.699,00		0,00	$ -	21,00	$ 4.920.699,0	
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	17,85	$ 700.000,00	$ 12.495.000,00	17,85	$ 12.495.000,00		0,00	$ -	17,85	$ 12.495.000,0	
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	126,00	$ 70.000,00	$ 8.820.000,00	126,00	$ 8.820.000,00		0,00	$ -	126,00	$ 8.820.000,0	
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**												
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	57,60	$ 8.809,00	$ 507.398,40	57,60	$ 507.398,40		0,00	$ -	57,60	$ 507.398,40	
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19,20	$ 23.031,00	$ 442.195,20	19,20	$ 442.195,20		0,00	$ -	19,20	$ 442.195,20	
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	96,00	$ 36.312,00	$ 3.485.952,00	96,00	$ 3.485.952,00		0,00	$ -	96,00	$ 3.485.952,0	
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	12,00	$ 234.319,00	$ 2.811.828,00	12,00	$ 2.811.828,00		0,00	$ -	12,00	$ 2.811.828,0	
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00		0,00	$ -	6,00	$ 4.200.000,0	
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	48,00	$ 70.000,00	$ 3.360.000,00	48,00	$ 3.360.000,00		0,00	$ -	48,00	$ 3.360.000,0	
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**												
8,1	**SISTEMA SÉPTICO**												
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20,00	$ 8.809,00	$ 176.180,00	20,00	$ 176.180,00		0,00	$ -	20,00	$ 176.180,0	
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	38,00	$ 23.031,00	$ 875.178,00	38,00	$ 875.178,00		-18,72	$ (431.140,00)	19,28	$ 444.038,0	
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	55,00	$ 123.119,00	$ 6.771.545,00	55,00	$ 6.771.545,00		-11,00	$ (1.354.309,00)	44,00	$ 5.417.236,0	
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	250,00	$ 9.168,00	$ 2.292.000,00	250,00	$ 2.292.000,00		-21,30	$ (195.278,00)	228,70	$ 2.096.722,0	
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 90.189,00	$ 1.803.780,00	20,00	$ 1.803.780,00		-1,40	$ (126.265,00)	18,60	$ 1.677.515,0	
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 85.998,00	$ 1.719.960,00	20,00	$ 1.719.960,00		-1,40	$ (120.397,00)	18,60	$ 1.599.563,0	
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	UND	5,00	$ 323.524,00	$ 1.617.620,00	5,00	$ 1.617.620,00		0,00	$ -	5,00	$ 1.617.620,0	
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	30,00	$ 39.291,00	$ 1.178.730,00	30,00	$ 1.178.730,00		-1,60	$ (62.866,00)	28,40	$ 1.115.864,0	
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	2,00	$ 171.725,00	$ 343.450,00	2,00	$ 343.450,00		-0,50	$ (85.863,00)	1,50	$ 257.587,00	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	1,50	$ 166.575,00	$ 249.862,50	1,50	$ 249.862,50		-0,65	$ (108.273,75)	0,85	$ 141.588,75	
8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC**												
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2,00	$ 8.809,00	$ 17.618,00	2,00	$ 17.618,00		0,00	$ -	2,00	$ 17.618,0	

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**										
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024**	
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00			VALOR INTERVENTORIA	$ 68.352.127,00					
	PLAZO	8	MESES		PLAZO	8 MESES					
	F. INICIO / TERMINACION	30/12/2024	29/08/2025		30/12/2024	27/08/2025				**FECHA ACTA**	**11/06/2025**

		CONDICIONES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSI No.1**		**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
8.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,10	$ 23.031,00	$ 25.334,10		1,10	$ 25.334,10	0,48	$ 11.054,88	1,58	$ 36.388,98
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	UND	5,00	$ 563.956,00	$ 2.819.780,00		5,00	$ 2.819.780,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.819.780,0
8,3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**											
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	24,00	$ 8.809,00	$ 211.416,00		24,00	$ 211.416,00	-7,38	$ (65.010,00)	16,62	$ 146.406,0
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	8,00	$ 23.031,00	$ 184.248,00		8,00	$ 184.248,00	-1,31	$ (30.244,00)	6,69	$ 154.004,0
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	40,00	$ 39.291,00	$ 1.571.640,00		40,00	$ 1.571.640,00	-17,20	$ (675.805,20)	22,80	$ 895.834,8
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	4,00	$ 171.725,00	$ 686.900,00		4,00	$ 686.900,00	0,00	$ -	4,00	$ 686.900,0
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2,50	$ 700.000,00	$ 1.750.000,00		2,50	$ 1.750.000,00	0,00	$ -	2,50	$ 1.750.000,0
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	30,00	$ 70.000,00	$ 2.100.000,00		30,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ -	30,00	$ 2.100.000,0
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 474.797.111,00**		**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 474.797.111,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 474.797.111,00**
	ADMINISTRACION 12% =				$ 56.975.653,00		ADMINISTRACION 12% =	$ 56.975.653,00	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	$ 56.975.653,00
	IMPREVISTOS 5% =				$ 23.739.856,00		IMPREVISTOS 5% =	$ 23.739.856,00	IMPREVISTOS 5% =	$ -	IMPREVISTOS 5% =	$ 23.739.856,00
	UTILIDAD 10% =				$ 47.479.711,00		UTILIDAD 10% =	$ 47.479.711,00	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	$ 47.479.711,00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 9.021.145,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.021.145,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.021.145,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 137.216.365,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 137.216.365,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 137.216.365,00**
	TOTAL COSTOS EQUIPAMENTO RURAL (Directos + Indirectos)				**$ 612.013.476,00**		**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 612.013.476,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ -**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 612.013.476,00**
B	SENCIBILIZACION SOCIAL COMUNITARIO											
	Talleres de sencibilizacion social comunitario	TALLER	3	$ 730.000,00	$ 2.190.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -		
	ADMINISTRACION 12% =				$ 262.800,00		ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	
	UTILIDAD 10% =				$ 219.000,00		UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 507.642,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENCIBILIZACION					**$ 3.179.442,00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
	NUEVO ITEM											
9	Talleres de sensibilización social comunitario - conversatorio de buenas prácticas ambientales y socialización de manual de operación y mantenimiento para cada componente del equipamiento rural.	TALLER		$ 534.360,00			5,00	$ 2.671.800,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.671.800,00
	I.V.A. (19%)				$ -			$ 507.642,00		$ -	I.V.A. (19%)	$ 507.642,00
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENSIBILIZACION					**$ -**			**$ 3.179.442,00**		**$ -**		**$ 3.179.442,00**
	TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION				**$ 615.192.918,00**			**$ 615.192.918,00**		**$ -**		**$ 615.192.918,00**
							VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 615.192.918,00**		**$ -**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 615.192.918,00**

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
RL. CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES** N/A	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,2	ANAIS VILLAREAL	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARIA RUTH PEREZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARITZA NINCO ROJAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	ALBA LUZ MOLANO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
						TOTAL	**4,80**

TOTAL	**4,80**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**4,80**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,2	JOEL DIAZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JOSE ONÍÍAS TOVAR	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	ASPROCAECO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JAIRO LOZANO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
						TOTAL	**3,00**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.1.2	LUCILA MENDEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE GOMEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	JOSE BENITO SANCHEZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	FLOR ALBENIS SALINAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	KERLY JOHANA BONILLA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,20	0,36	1,00	**0,36**
	LUZ DARY ESCOBAR	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	30,00	0,30	0,20	1,80	1,00	**1,80**
	MARIA RUTH PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,20	0,15	1,00	**0,15**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,30	0,23	1,00	**0,23**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,30	1,30	0,30	1,29	1,00	**1,29**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	13,00	0,30	0,30	1,17	1,00	**1,17**
	SAUL PULIDO TELLO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	22,00	0,40	0,70	6,16	1,00	**6,16**
	JHON PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	ABIGAIL MONTIEL	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YORLADIS PASINGA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	8,00	0,30	0,30	0,72	1,00	**0,72**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	7,80	0,30	0,30	0,70	1,00	**0,70**
						TOTAL	**151,80**





TOTAL	151,80
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	151,80



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE SUSPENSION 3:	
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.3	LUCILA MENDEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE GOMEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JOSE BENITO SANCHEZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	FLOR ALBENIS SALINAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	KERLY JOHANA BONILLA	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	LUZ DARY ESCOBAR	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**302,19**





TOTAL	302,19
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	302,19



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
6.1.4	LUCILA MENDEZ				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE GOMEZ				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE ALDEMAR TIQUE				54,30	1,00	**54,30**
	JOSE BENITO SANCHEZ				54,30	1,00	**54,30**
	FLOR ALBENIS SALINAS				54,30	1,00	**54,30**
	KERLY JOHANA BONILLA				54,30	1,00	**54,30**
	LUZ DARY ESCOBAR				54,30	1,00	**54,30**
	MARIA RUTH PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JHON JAIRO PASCUAS				54,30	1,00	**54,30**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES				54,30	1,00	**54,30**
	SAUL PULIDO TELLO				54,30	1,00	**54,30**
	YENI ANDREA PERDOMO				54,30	1,00	**54,30**
	JHON FAIBER MANRIQUE				54,30	1,00	**54,30**
	JHON PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	ABIGAIL MONTIEL				54,30	1,00	**54,30**
	YORLADIS PASINGA				54,30	1,00	**54,30**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO				54,30	1,00	**54,30**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	RAFAEL BECERRA VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
						TOTAL	**1.140,30**





TOTAL	**1.140,30**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1.140,30**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.5	LUCILA MENDEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE GOMEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JOSE BENITO SANCHEZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	FLOR ALBENIS SALINAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	KERLY JOHANA BONILLA	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
						TOTAL	**83,37**





TOTAL	**83,37**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**83,37**

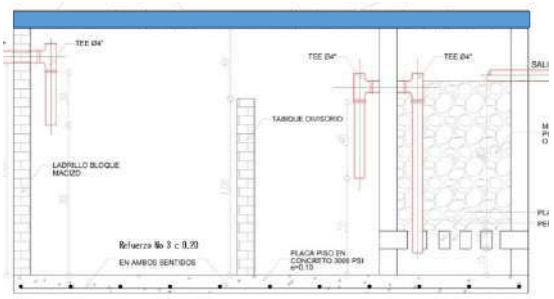

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.1.8	LUCILA MENDEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE GOMEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JOSE BENITO SANCHEZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	FLOR ALBENIS SALINAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	KERLY JOHANA BONILLA	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	LUZ DARY ESCOBAR	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	MARIA RUTH PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON JAIRO PASCUAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	SAUL PULIDO TELLO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENI ANDREA PERDOMO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON FAIBER MANRIQUE	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ABIGAIL MONTIEL	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YORLADIS PASINGA	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
						TOTAL	**14,28**



TOTAL	**14,28**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,28**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.1.10	LUCILA MENDEZ	15,00				1,00	**15,00**
	JOSE GOMEZ	16,00				1,00	**16,00**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	14,00				1,00	**14,00**
	JOSE BENITO SANCHEZ	12,00				1,00	**12,00**
	FLOR ALBENIS SALINAS	25,04				1,00	**25,04**
	KERLY JOHANA BONILLA	6,00				1,00	**6,00**
	LUZ DARY ESCOBAR	22,00				1,00	**22,00**
	MARIA RUTH PEREZ	2,50				1,00	**2,50**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	2,50				1,00	**2,50**
	JHON JAIRO PASCUAS	6,50				1,00	**6,50**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	13,00				1,00	**13,00**
	SAUL PULIDO TELLO	6,00				1,00	**6,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	6,00				1,00	**6,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	22,00				1,00	**22,00**
	JHON PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	ABIGAIL MONTIEL	6,00				1,00	**6,00**
	YORLADIS PASINGA	14,00				1,00	**14,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	14,00				1,00	**14,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	7,80				1,00	**7,80**
						TOTAL	**228,34**



TOTAL	**228,34**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**228,34**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.2.1	LUCILA MENDEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE GOMEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
						TOTAL	**14,91**





TOTAL	**14,91**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,91**

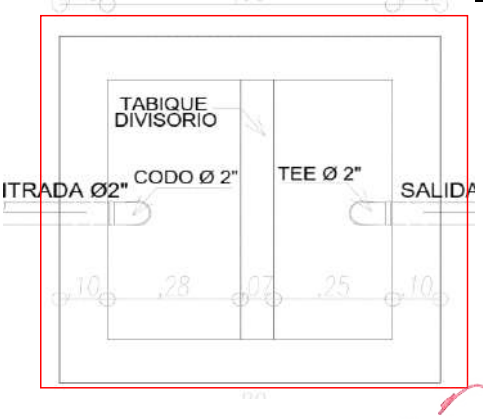

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.2.2	LUCILA MENDEZ	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84	0,6	0,42	1,00	**0,42**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
						TOTAL	**8,19**

TOTAL	**8,19**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,19**



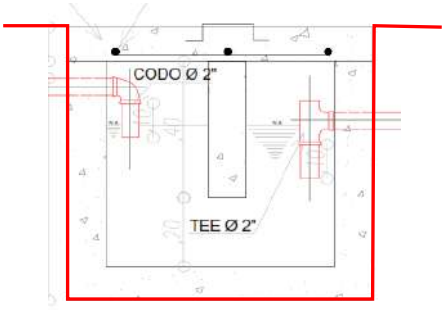

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.3.1	LUCILA MENDEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE GOMEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
						TOTAL	**8,61**



TOTAL	**8,61**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**8,61**

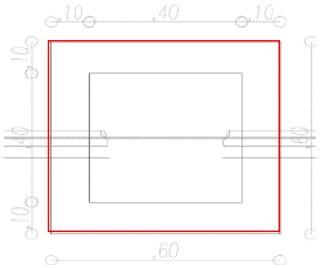

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.3.2	LUCILA MENDEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE GOMEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JOSE BENITO SANCHEZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	FLOR ALBENIS SALINAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	KERLY JOHANA BONILLA	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
						TOTAL	**5,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**5,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 3: **FECHA DE REINICIO 3:**	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE SUSPENSION 4: **FECHA DE REINICIO 4:**	**11/06/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -		**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.3.4	FLOR ALBENIS SALINAS					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**1,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
		FECHA DE REINICIO 1: N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 2:**	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.2	HERMES SUNCE TOVAR	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	HERMES- TUBERÍA ENTERRADA	2,50	0,30	0,5	0,38	1,00	**0,38**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	JOSE ANTONIO-TUBERÍA ENTERRADA	0,50	0,30	0,5	0,08	1,00	**0,08**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	ELCIAS YAGUE-tubería conexión	9,00	0,20	0,2	0,36	1,00	**0,36**
	BEATRIS BAUTISTA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	6,50	0,20	0,2	0,26	1,00	**0,26**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	5,00	0,20	0,2	0,20	1,00	**0,20**
						TOTAL	**19,28**

TOTAL	**19,28**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**19,28**

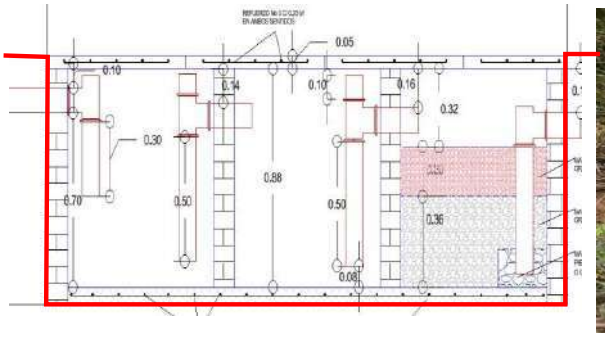



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL:	$ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO:	$ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.3	HERMES SUNCE TOVAR	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	BEATRIS BAUTISTA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	JUAN CARLOS POLOCHE	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
						TOTAL	**44,00**

TOTAL	**44,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**44,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES** **11/06/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
8.1.4	HERMES SUNCE TOVAR				45,74	1,00	**45,74**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA				45,74	1,00	**45,74**
	ELCIAS YAGUE RIVERA				45,74	1,00	**45,74**
	BEATRIS BAUTISTA				45,74	1,00	**45,74**
	JUAN CARLOS POLOCHE				45,74	1,00	**45,74**
						TOTAL	**228,70**

TOTAL	**228,70**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**228,70**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00		**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00		**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.5	HERMES SUNCE TOVAR	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**18,60**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**18,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	
			FECHA DE REINICIO 2:	
			FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
			FECHA DE REINICIO 3:	
			FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
			FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00		**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00		**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.6	HERMES SUNCE TOVAR	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**18,60**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**18,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.1.8	HERMES SUNCE TOVAR	5,00				1,00	**5,00**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	1,00				1,00	**1,00**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	10,40				1,00	**10,40**
	BEATRIS BAUTISTA	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	6,00				1,00	**6,00**
						TOTAL	**28,40**



TOTAL	**28,40**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**28,40**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: **FECHA DE REINICIO 3:**	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE SUSPENSION 4: **FECHA DE REINICIO 4:**	**11/06/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** N/A **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.9	HERMES SUNCE TOVAR	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
						TOTAL	**1,50**

TOTAL	**1,50**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,50**



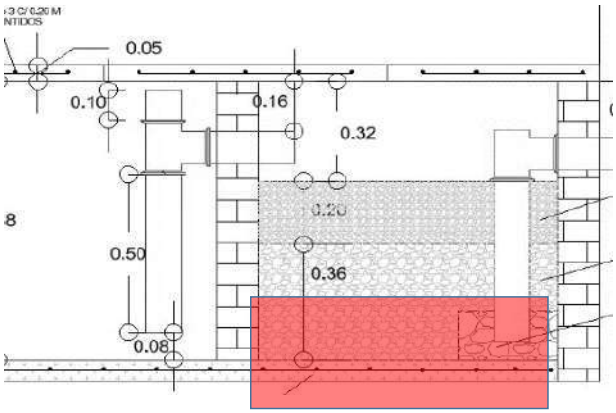

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES


REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.10	HERMES SUNCE TOVAR	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
						TOTAL	**0,85**

TOTAL	**0,85**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,85**



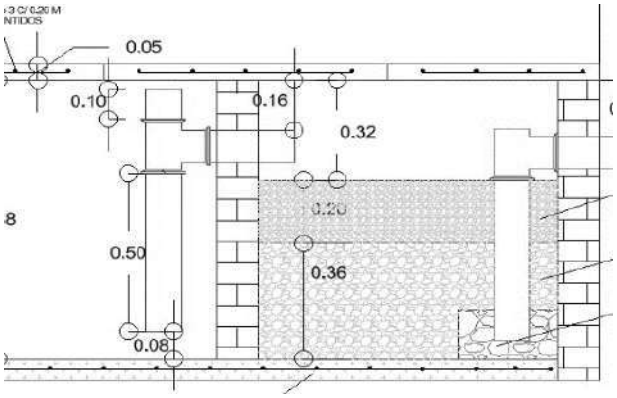

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.3.1	HS_FOSA INFILTRACIÓN	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	HS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,45		0,45	1,00	**0,45**
	JAS_FOZA INFILTRACIÓN	1,50	1,10		1,65	1,00	**1,65**
	JAS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,50	0,45		0,68	1,00	**0,68**
	ELCIAS YAGUE-FOSA	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	ELCIAS YAGUE-PVC-S 4"	4,00	0,45		1,80	1,00	**1,80**
	BEATRIS BAUTISTA	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
						TOTAL	**16,62**

TOTAL	**16,62**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**16,62**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.3.2	HS_FOZA INFILTRACIÓN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	HS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,37	0,20	0,08	1,00	**0,08**
	JAS_FOZA INFILTRACIÓN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JAS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,37	0,20	0,08	1,00	**0,08**
	ELCIAS YAGUE-FOSA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ELCIAS YAGUE-PVC-S 4"	4,00	0,40	0,20	0,32	1,00	**0,32**
	BEATRIS BAUTISTA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,60	1,00	**0,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,60	1,00	**0,60**
						TOTAL	**6,68**

TOTAL	**6,68**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**6,68**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:** 30/12/2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	
		FECHA DE REINICIO 2:	
		FECHA DE SUSPENSION 3:	**FECHA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES**
		FECHA DE REINICIO 3:	
		FECHA DE SUSPENSION 4:	**11/06/2025**
		FECHA DE REINICIO 4:	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.3.3	HERMES SUNCE TOVAR	1,30				1,00	**1,30**
	JOSE ANTONIO SALDAÑA	1,50				1,00	**1,50**
	ELCIAS YAGUE RIVERA	4,00				1,00	**4,00**
	BEATRIS BAUTISTA	8,00				1,00	**8,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**22,80**

TOTAL	**22,80**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**22,80**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA DE JUSTIFICACIÓN N°2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024 CELEBRADO EL 20 DE DICEMBRE DE 2024 ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL CONSORCIO OBRAS RURALES 2024.

OBJETO	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL".
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024 R.L. DEYANID GUILOMBO VALENZUELA C.C. 1.075.220.497 DE NEIVA - HUILA
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($615.192.918,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
INTERVENTORÍA DE LA OBRA	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO C.C. 79.142.300 DE BOGOTÁ D.C.
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA	JAVIER CARDOSO GUTIERREZ Profesional Universitario SGA Coordinador proyecto "Cuenca río Las Ceibas"
FECHA ACTA JUSTIFICACIÓN N°2	11/06/2025
FECHA ACTA DE INICIO	30/12/2024

En Neiva - Huila, a los once (11) días del mes de junio de 2025, se reunieron el Ingeniero **JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ,** profesional universitario de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM en calidad de Supervisor de la interventoría para el contrato de Obra No.490 de 2024, **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**, en calidad de Interventor del contrato de obra en comento y, **DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**, como representante legal del **CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**, contratista de obra, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA No.490 DE 2024,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que mediante el proceso de Licitación pública LP-04-CAM-2024, se adjudicó el contrato de obra No.490 de 2024, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y el CONSORCIO OBRAS RURALES 2024, representada legalmente por Deyanid Guilombo Valenzuela, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.075.220.497 de Neiva - Huila, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS

AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL".

2. Que el 15 de mayo de 2025 se firmó el otrosí No.1 al contrato de obra pública No.490 de 2024, mediante el cual se modificaron beneficiarios, cantidades de obra, descripción de algunos capítulos y actividades y se creó nuevo ítem, sin adición y plazo.

3. Que el contrato de obra No.490 de 2024 actualmente se encuentra vigente en todas sus partes.

4. Que, de conformidad al acta de comité técnico No.8, celebrado el 9 de junio de 2025, se determinó necesario realizar acta de mayores y menores cantidades de obra, la cual refleja la ejecución física real del contrato de obra y proceder a dar cierre financiero de las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato de obra pública No.490 de 2024.

5. Que el día 11 de junio del 2025, el contratista presenta el acta de mayores y menores cantidades, conforme a la medición de las cantidades de obra ejecutadas y por terminar, las cuales fueron objeto de verificación por la interventoría y aprobación por la supervisión, sin generar adición de recursos financieros del valor contratado.

6. Que la Interventoría y Supervisión delegada por la CAM, encuentran ajustada a las condiciones de ejecución el acta de mayores y menores cantidades de obra, sin adición en valor al contrato de obra No.490 de 2024, con lo cual se garantiza la correcta ejecución del mismo.

7. Que es necesario e ineludible para esta Entidad se garantice la continuidad en la ejecución del Contrato de obra No.490 de 2024 de acuerdo al requerimiento programado.

Para constancia se firma en Neiva (Huila), a los once (11) día del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
R.L. Consorcio Obras Rurales 2024

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Interventor

JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ
Profesional Universitario SGA
Supervisor Contrato No.485 de 2024

ANEXO 2
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.2
ACTA DE OBRA No.2 – MEMORIAS DE CANTIDADES

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**																			
	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO			FECHA DE INICIO:	30/12/2024			**ACTA DE RECIBO FINAL**										
	R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA			**R. LEGAL**	N.A			FECHA SUSPENSION No.1:	N/A													
	VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00			**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00			FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A													
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -			**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -																	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00			**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00			FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A													
	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES			**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES			PLAZO ADICIONAL:	N/A			**FECHA: 11/07/2025**										
	PLAZO ADICIONAL:	N/A			**PLAZO ADICIONAL:**	N/A			FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025													
	PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES			**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES			PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025													

	CONDICIONES INICIALES						**OBRA EJECUTADA**																
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 40x20 mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2", paseras en tabla nogal o pino apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16" y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**																					
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	200,00	$ 8.809,00	$ 1.761.800,00	200,00	$ 1.761.800,00	0,00	$ -	200,00	$ 1.761.800,0	200,00	$ 1.761.800	100,00%	0,00	$ -
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 23.031,00	$ 147.398,40	4,80	$ 110.548,80	0,00	$ -	4,80	$ 110.548,8	4,80	$ 110.548,80	100,00%	0,00	$ -
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	6,40	$ 846.760,00	$ 5.419.264,00	6,40	$ 5.419.264,00	0,00	$ -	6,40	$ 5.419.264,0	6,40	$ 5.419.264	100,00%	0,00	$ -
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	8,00	$ 3.738.767,00	$ 29.910.136,00	8,00	$ 29.910.136,00	0,00	$ -	8,00	$ 29.910.136,0	8,00	$ 29.910.136	100,00%	0,00	$ -
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	8,00	$ 3.045.982,00	$ 24.367.856,00	8,00	$ 24.367.856,00	0,00	$ -	8,00	$ 24.367.856,0	8,00	$ 24.367.856	100,00%	0,00	$ -
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	8,00	$ 1.287.485,00	$ 10.299.880,00	8,00	$ 10.299.880,00	0,00	$ -	8,00	$ 10.299.880,0	8,00	$ 10.299.880	100,00%	0,00	$ -
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	64,00	$ 522.873,00	$ 33.463.872,00	64,00	$ 33.463.872,00	0,00	$ -	64,00	$ 33.463.872,0	64,00	$ 33.463.872	100,00%	0,00	$ -
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	8,00	$ 700.000,00	$ 5.600.000,00	8,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 5.600.000,0	8,00	$ 5.600.000	100,00%	0,00	$ -
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	64,00	$ 70.000,00	$ 4.480.000,00	64,00	$ 4.480.000,00	0,00	$ -	64,00	$ 4.480.000,0	64,00	$ 4.480.000	100,00%	0,00	$ -
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**																					

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**					
	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL**
	R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A	
	VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00			
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00			
	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**
					FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025	
	PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025	

		CONDICIONES INICIALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**											
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	125,00	$ 8.809,00	$ 1.101.125,00	125,00	$ 1.101.125,00	100,00	$ 880.900	25,00	$ 220.225,0	125,00	$ 1.101.125	100,00%	0,00	$ -
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 23.031,00	$ 92.124,00	3,00	$ 69.093,00	2,40	$ 55.274,0	0,60	$ 13.819,0	3,00	$ 69.093	100,00%	0,00	$ -
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	4,00	$ 846.760,00	$ 3.387.040,00	4,00	$ 3.387.040,00	3,20	$ 2.709.632,0	0,80	$ 677.408,0	4,00	$ 3.387.040	100,00%	0,00	$ -
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	5,00	$ 3.855.389,00	$ 19.276.945,00	5,00	$ 19.276.945,00	4,00	$ 15.421.556,0	1,00	$ 3.855.389,0	5,00	$ 19.276.945	100,00%	0,00	$ -
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	5,00	$ 3.045.982,00	$ 15.229.910,00	5,00	$ 15.229.910,00	4,00	$ 12.183.928,0	1,00	$ 3.045.982,0	5,00	$ 15.229.910	100,00%	0,00	$ -
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	5,00	$ 1.287.485,00	$ 6.437.425,00	5,00	$ 6.437.425,00	4,00	$ 5.149.940,0	1,00	$ 1.287.485,0	5,00	$ 6.437.425	100,00%	0,00	$ -
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	40,00	$ 522.873,00	$ 20.914.920,00	40,00	$ 20.914.920,00	32,00	$ 16.731.936,0	8,00	$ 4.182.984,0	40,00	$ 20.914.920	100,00%	0,00	$ -
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	5,00	$ 3.500.000,00	4,00	$ 2.800.000,0	1,00	$ 700.000,0	5,00	$ 3.500.000	100,00%	0,00	$ -
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	40,00	$ 70.000,00	$ 2.800.000,00	40,00	$ 2.800.000,00	32,00	$ 2.240.000,0	8,00	$ 560.000,0	40,00	$ 2.800.000	100,00%	0,00	$ -
3	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x 1/8"**															

OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**						
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL**	
R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A		
VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00				
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A		
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00				
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A		
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**	
				FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025		

		CONDICIONES INICIALES				**OBRA EJECUTADA**										
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vertices de las paseras. Dos por vertices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diametro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera sóldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de ppuesrta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV,HUECO TIPO ROMBO QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	UND	16,00	$ 647.288,00	$ 10.356.608,00	16,00	$ 10.356.608,00	16,00	$ 10.356.608,0	0,00	$ -	16,00	$ 10.356.608	100,00%	0,00	$ -
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,0	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000	100,00%	0,00	$ -
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,0	0,00	$ -	10,00	$ 700.000	100,00%	0,00	$ -
4	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificio de malla tipo rombo. Incluye la instalación de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"x1/8"**															
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90°, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO A LOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	UND	16,00	$ 522.873,00	$ 8.365.968,00	16,00	$ 8.365.968,00	16,00	$ 8.365.968,0	0,00	$ -	16,00	$ 8.365.968	100,00%	0,00	$ -
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	3,00	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,0	0,00	$ -	3,00	$ 2.100.000	100,00%	0,00	$ -
4,3	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	10,00	$ 70.000,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,00	10,00	$ 700.000,0	0,00	$ -	10,00	$ 700.000	100,00%	0,00	$ -
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**															
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156,00	$ 8.809,00	$ 1.374.204,00	156,00	$ 1.374.204,00	143,00	$ 1.259.687,0	13,00	$ 114.517,0	156,00	$ 1.374.204	100,00%	0,00	$ -
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	6,00	$ 23.031,00	$ 138.186,00	6,00	$ 138.186,00	5,50	$ 126.670,5	0,50	$ 11.515,5	6,00	$ 138.186,00	100,00%	0,00	$ -
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" Y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	12,00	$ 711.531,00	$ 8.538.372,00	12,00	$ 8.538.372,00	11,00	$ 7.826.841,0	1,00	$ 711.531,0	12,00	$ 8.538.372		0,00	$ -

	OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**					
	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL**
	R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A	
	VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00			
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00			
	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**
					FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025	
	PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025	

			CONDICIONES INICIALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PANELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	UND	12,00	$ 1.785.674,00	$ 21.428.088,00		12,00	$ 21.428.088,00	11,00	$ 19.642.414,0	1,00	$ 1.785.674,0	12,00	$ 21.428.088	100,00%	0,00	$ -
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	12,00	$ 2.515.300,00	$ 30.183.600,00		12,00	$ 30.183.600,00	11,00	$ 27.668.300,0	1,00	$ 2.515.300,0	12,00	$ 30.183.600	100,00%	0,00	$ -
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	UND	12,00	$ 239.422,00	$ 2.873.064,00		12,00	$ 2.873.064,00	11,00	$ 2.633.642,0	1,00	$ 239.422,0	12,00	$ 2.873.064	100,00%	0,00	$ -
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00		6,00	$ 4.200.000,00	5,50	$ 3.850.000,0	0,50	$ 350.000,0	6,00	$ 4.200.000	100,00%	0,00	$ -
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	VIAJE	96,00	$ 70.000,00	$ 6.720.000,00		96,00	$ 6.720.000,00	88,00	$ 6.160.000,0	8,00	$ 560.000,0	96,00	$ 6.720.000	100,00%	0,00	$ -
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**																
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**																
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	84,00	$ 8.809,00	$ 739.956,00		84,00	$ 739.956,00	24,00	$ 211.416,0	60,00	$ 528.540,0	84,00	$ 739.956	100,00%	0,00	$ -
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	140,70	$ 23.031,00	$ 3.240.462,00		151,80	$ 3.496.106,00	40,20	$ 925.846,0	111,60	$ 2.570.260,0	151,80	$ 3.496.106	100,00%	0,00	$ -
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	298,20	$ 123.119,00	$ 36.714.086,00		302,19	$ 37.205.331,00	86,34	$ 10.630.094,0	215,85	$ 26.575.237,0	302,19	$ 37.205.331	100,00%	0,00	$ -
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	1.050	$ 9.168,00	$ 9.626.400,00		1.140,30	$ 10.454.270,00	325,80	$ 2.986.934,0	814,50	$ 7.467.336,0	1140,30	$ 10.454.270	100,00%	0,00	$ -
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 90.189,00	$ 7.575.876,00		83,37	$ 7.519.057,00	23,82	$ 2.148.302,0	59,55	$ 5.370.755,0	83,37	$ 7.519.057	100,00%	0,00	$ -
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	84,00	$ 85.998,00	$ 7.223.832,00		84,00	$ 7.223.832,00	24,00	$ 2.063.952,0	60,00	$ 5.159.880,0	84,00	$ 7.223.832	100,00%	0,00	$ -
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UND	21,00	$ 266.204,00	$ 5.590.284,00		21,00	$ 5.590.284,00	6,00	$ 1.597.224,0	15,00	$ 3.993.060,0	21,00	$ 5.590.284	100,00%	0,00	$ -
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	14,70	$ 144.237,00	$ 2.120.284,00		14,28	$ 2.059.704,00	4,08	$ 588.487,0	10,20	$ 1.471.217,0	14,28	$ 2.059.704	100,00%	0,00	$ -
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	21,00	$ 92.161,00	$ 1.935.381,00		21,00	$ 1.935.381,00	6,00	$ 552.966,0	15,00	$ 1.382.415,0	21,00	$ 1.935.381	100,00%	0,00	$ -
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	126,00	$ 39.291,00	$ 4.950.666,00		228,34	$ 8.971.627,00	36,00	$ 1.414.476,0	192,34	$ 7.557.151,0	228,34	$ 8.971.627	100,00%	0,00	$ -
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**																
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	13,44	$ 8.809,00	$ 118.393,00		14,91	$ 131.342,00	4,26	$ 37.526,0	10,65	$ 93.816,0	14,91	$ 131.342	100,00%	0,00	$ -
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	10,75	$ 23.031,00	$ 247.629,00		8,19	$ 188.624,00	2,94	$ 67.711,0	5,25	$ 120.913,0	8,19	$ 188.624	100,00%	0,00	$ -
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 640.442,00	$ 13.449.282,00		21,00	$ 13.449.282,00	6,00	$ 3.842.652,0	15,00	$ 9.606.630,0	21,00	$ 13.449.282	100,00%	0,00	$ -
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00		21,00	$ 2.355.108,00	6,00	$ 672.888,0	15,00	$ 1.682.220,0	21,00	$ 2.355.108	100,00%	0,00	$ -
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**							$ -						$ -			
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3,36	$ 8.809,00	$ 29.598,00		8,61	$ 75.845,00	2,46	$ 21.670,0	6,15	$ 54.175,0	8,61	$ 75.845	100,00%	0,00	$ -
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,02	$ 23.031,00	$ 46.430,00		5,00	$ 115.155,00	1,50	$ 34.546,0	3,50	$ 80.609,0	5,00	$ 115.155,00	100,00%	0,00	$ -

OBJETO:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**						
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL**	
R. LEGAL	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA	**R. LEGAL**	N.A	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A		
VALOR OBRA:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 68.352.127,00				
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ -	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ -	FECHA REINICIACIÓN No.1:	N/A		
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 615.192.918,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 68.352.130,00				
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	OCHO (8) MESES	FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A		
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA: 11/07/2025**	
				FECHA TERMINACIÓN:	27/08/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	PERIODO:	01/05/2025 a 30/06/2025		

		CONDICIONES INICIALES					**OBRA EJECUTADA**									
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
6.3.3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	21,00	$ 434.293,00	$ 9.120.153,00	21,00	$ 9.120.153,00	6,00	$ 2.605.758,0	15,00	$ 6.514.395,0	21,00	$ 9.120.153	100,00%	0,00	$ -
6.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	UND	21,00	$ 112.148,00	$ 2.355.108,00	1,00	$ 112.148,00	1,00	$ 112.148,0	0,00	$ -	1,00	$ 112.148	100,00%	0,00	$ -
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	ML	126,00	$ 33.253,00	$ 4.189.878,00	126,00	$ 4.189.878,00	36,00	$ 1.197.108,0	90,00	$ 2.992.770,0	126,00	$ 4.189.878	100,00%	0,00	$ -
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**															
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100,80	$ 8.809,00	$ 887.947,00	100,80	$ 887.947,00	28,80	$ 253.699,0	72,00	$ 634.248,0	100,80	$ 887.947	100,00%	0,00	$ -
6.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	33,60	$ 23.031,00	$ 773.842,00	33,60	$ 773.842,00	9,60	$ 221.098,0	24,00	$ 552.744,0	33,60	$ 773.842	100,00%	0,00	$ -
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	168,00	$ 36.312,00	$ 6.100.416,00	168,00	$ 6.100.416,00	48,00	$ 1.742.976,0	120,00	$ 4.357.440,0	168,00	$ 6.100.416	100,00%	0,00	$ -
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	21,00	$ 234.319,00	$ 4.920.699,00	21,00	$ 4.920.699,00	6,00	$ 1.405.914,0	15,00	$ 3.514.785,0	21,00	$ 4.920.699	100,00%	0,00	$ -
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	17,85	$ 700.000,00	$ 12.495.000,00	17,85	$ 12.495.000,00	5,10	$ 3.570.000,0	12,75	$ 8.925.000,0	17,85	$ 12.495.000	100,00%	0,00	$ -
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	126,00	$ 70.000,00	$ 8.820.000,00	126,00	$ 8.820.000,00	36,00	$ 2.520.000,0	90,00	$ 6.300.000,0	126,00	$ 8.820.000	100,00%	0,00	$ -
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**															
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	57,60	$ 8.809,00	$ 507.398,40	57,60	$ 507.398,40	9,60	$ 84.566,40	48,00	$ 422.832,0	57,60	$ 507.398	100,00%	0,00	$ -
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	19,20	$ 23.031,00	$ 442.195,20	19,20	$ 442.195,20	3,20	$ 73.699,20	16,00	$ 368.496,0	19,20	$ 442.195,20	100,00%	0,00	$ -
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	96,00	$ 36.312,00	$ 3.485.952,00	96,00	$ 3.485.952,00	16,00	$ 580.992,0	80,00	$ 2.904.960,0	96,00	$ 3.485.952	100,00%	0,00	$ -
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	UND	12,00	$ 234.319,00	$ 2.811.828,00	12,00	$ 2.811.828,00	2,00	$ 468.638,0	10,00	$ 2.343.190,0	12,00	$ 2.811.828	100,00%	0,00	$ -
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	6,00	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00	1,00	$ 700.000,0	5,00	$ 3.500.000,0	6,00	$ 4.200.000	100,00%	0,00	$ -
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	48,00	$ 70.000,00	$ 3.360.000,00	48,00	$ 3.360.000,00	8,00	$ 560.000,0	40,00	$ 2.800.000,0	48,00	$ 3.360.000	100,00%	0,00	$ -
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**															
8,1	**SISTEMA SÉPTICO**											0,00				
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20,00	$ 8.809,00	$ 176.180,00	20,00	$ 176.180,00	12,00	$ 105.708,0	8,00	$ 70.472,0	20,00	$ 176.180	100,00%	0,00	$ -
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	38,00	$ 23.031,00	$ 875.178,00	19,28	$ 444.038,00	11,62	$ 267.620,0	7,66	$ 176.418,0	19,28	$ 444.038	100,00%	0,00	$ -
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	55,00	$ 123.119,00	$ 6.771.545,00	44,00	$ 5.417.236,00	26,40	$ 3.250.342,0	17,60	$ 2.166.894,0	44,00	$ 5.417.236	100,00%	0,00	$ -
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	250,00	$ 9.168,00	$ 2.292.000,00	228,70	$ 2.096.722,00	137,22	$ 1.258.033,0	91,48	$ 838.689,0	228,70	$ 2.096.722	100,00%	0,00	$ -
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 90.189,00	$ 1.803.780,00	18,60	$ 1.677.515,00	11,16	$ 1.006.509,0	7,44	$ 671.006,0	18,60	$ 1.677.515	100,00%	0,00	$ -
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	20,00	$ 85.998,00	$ 1.719.960,00	18,60	$ 1.599.563,00	11,16	$ 959.738,0	7,44	$ 639.825,0	18,60	$ 1.599.563	100,00%	0,00	$ -
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	UND	5,00	$ 323.524,00	$ 1.617.620,00	5,00	$ 1.617.620,00	3,00	$ 970.572,0	2,00	$ 647.048,0	5,00	$ 1.617.620	100,00%	0,00	$ -
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	30,00	$ 39.291,00	$ 1.178.730,00	28,40	$ 1.115.864,00	16,40	$ 644.372,0	12,00	$ 471.492,0	28,40	$ 1.115.864	100,00%	0,00	$ -
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	2,00	$ 171.725,00	$ 343.450,00	1,50	$ 257.587,00	0,90	$ 154.552,00	0,60	$ 103.035,0	1,50	$ 257.587	100,00%	0,00	$ -
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	1,50	$ 166.575,00	$ 249.862,50	0,85	$ 141.588,75	0,51	$ 84.953,25	0,34	$ 56.635,5	0,85	$ 141.588,75	100,00%	0,00	$ -
8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC**															
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	2,00	$ 8.809,00	$ 17.618,00	2,00	$ 17.618,00	1,20	$ 10.571,0	0,80	$ 7.047,0	2,00	$ 17.618	100,00%	0,00	$ -
8.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,10	$ 23.031,00	$ 25.334,10	1,58	$ 36.388,98	0,82	$ 18.885,42	0,76	$ 17.503,56	1,58	$ 36.389,0	100,00%	0,00	$ -
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	UND	5,00	$ 563.956,00	$ 2.819.780,00	5,00	$ 2.819.780,00	3,00	$ 1.691.868,0	2,00	$ 1.127.912,0	5,00	$ 2.819.780	100,00%	0,00	$ -

| | | |

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
1,1	ANAIS VILLAREAL	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	MARIA RUTH PEREZ	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	MARITZA NINCO ROJAS	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	ALBA LUZ MOLANO	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
						TOTAL	**200,00**

TOTAL	**200,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**200,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,2	ANAIS VILLAREAL	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARIA RUTH PEREZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARITZA NINCO ROJAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	ALBA LUZ MOLANO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
						TOTAL	**4,80**

TOTAL	**4,80**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**4,80**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
1,3	ANAIS VILLAREAL	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	MARIA RUTH PEREZ	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	MARITZA NINCO ROJAS	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	ALBA LUZ MOLANO	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	LEYDI JOHANNA OLAYA	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
	MARÍA RUTH OLIVEROS	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
						TOTAL	**6,40**

TOTAL	**6,40**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**6,40**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,4	ANAIS VILLAREAL					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	MARITZA NINCO ROJAS					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	ALBA LUZ MOLANO					1,00	**1,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA					1,00	**1,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					1,00	**1,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,5	ANAIS VILLAREAL					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	MARITZA NINCO ROJAS					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	ALBA LUZ MOLANO					1,00	**1,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA					1,00	**1,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					1,00	**1,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,6	ANAIS VILLAREAL					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	MARITZA NINCO ROJAS					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	ALBA LUZ MOLANO					1,00	**1,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA					1,00	**1,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					1,00	**1,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,7	SUMINISTRO E3 INSTALACION DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFE, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
1,7	ANAIS VILLAREAL					8,00	**8,00**
	MARIA RUTH PEREZ					8,00	**8,00**
	MARITZA NINCO ROJAS					8,00	**8,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					8,00	**8,00**
	ALBA LUZ MOLANO					8,00	**8,00**
	LEYDI JOHANNA OLAYA					8,00	**8,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					8,00	**8,00**
	MARÍA RUTH OLIVEROS					8,00	**8,00**
						TOTAL	**64,00**

TOTAL	**64,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**64,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR					8,00	**8,00**
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**8,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabólico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, retícula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**	
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
1,9	TRANSPORTE MULAR					64,00	**64,00**
							0,00
						TOTAL	**64,00**

TOTAL	**64,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA	**64,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
2,1	JOSE BENITO SANCHEZ	5,00	5,00		25,00	1,00	**25,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**25,00**

TOTAL	**125,00**
ANTERIORES ACTAS	**100,00**
PRESENTE ACTA	**25,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,2	JOSE BENITO SANCHEZ	0,30	0,30	0,3	0,03	20,00	**0,60**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,60**

TOTAL	**3,00**
ANTERIORES ACTAS	**2,40**
PRESENTE ACTA	**0,60**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
2,3	JOSE BENITO SANCHEZ	0,30	0,30	0,35	0,04	20,00	**0,80**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,80**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	**3,20**
PRESENTE ACTA	**0,80**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,4	JOSE BENITO SANCHEZ					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**4,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,5	JOSE BENITO SANCHEZ					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**4,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00	**PLAZO: OCHO MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00	**ADICIÓN EN PLAZO: N/A**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,6	JOSE BENITO SANCHEZ					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**4,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
2,7	JOSE BENITO SANCHEZ					8,00	**8,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**40,00**
ANTERIORES ACTAS	**32,00**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR					1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**4,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm (incluye ventilación de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular 40x20mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en tabla de pino o nogal apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16 y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" , incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 5 paseras en madera. ver planos.**	
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
2,9	TRANSPORTE MULAR					8,00	**8,00**
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**40,00**
ANTERIORES ACTAS	**32,00**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
5,1	EDGAR BAHAMON				13,00	1,00	**13,00**
						TOTAL	**13,00**

TOTAL	**156,00**
ANTERIORES ACTAS	**143,00**
PRESENTE ACTA	**13,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
5,2	EDGAR BAHAMON				0,50	1,00	**0,50**
						TOTAL	**0,50**

TOTAL	6,00
ANTERIORES ACTAS	**5,50**
PRESENTE ACTA	**0,50**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,3	EDGAR BAHAMON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**12,00**
ANTERIORES ACTAS	**11,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,4	EDGAR BAHAMON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**12,00**
ANTERIORES ACTAS	**11,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,5	EDGAR BAHAMON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	12,00
ANTERIORES ACTAS	11,00
PRESENTE ACTA	1,00





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,6	EDGAR BAHAMON					1,00	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**12,00**
ANTERIORES ACTAS	**11,00**
PRESENTE ACTA	**1,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR					0,50	**0,50**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,50**

TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	**5,50**
PRESENTE ACTA	**0,50**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 3.71mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada ondulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 3.71 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presión 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
5,8	TRANSPORTE MULAR					8,00	**8,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	**96,00**
ANTERIORES ACTAS	**88,00**
PRESENTE ACTA	**8,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.1	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON PEREZ	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
						TOTAL	**60,00**

TOTAL	**84,00**
ANTERIORES ACTAS	**24,00**
PRESENTE ACTA	**60,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
	KERLY BONILLA TUBO PVC-S 4" ENT.	6,00	0,30	0,20	0,36	1,00	**0,36**
	LUZ DARY ESCOBAR	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	30,00	0,30	0,20	1,80	1,00	**1,80**
	MARIA RUTH PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,20	0,15	1,00	**0,15**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	2,50	0,30	0,30	0,23	1,00	**0,23**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,30	1,30	0,30	1,29	1,00	**1,29**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	13,00	0,30	0,30	1,17	1,00	**1,17**
	SAUL PULIDO TELLO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	22,00	0,40	0,70	6,16	1,00	**6,16**
	JHON PEREZ	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	ABIGAIL MONTIEL	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	YORLADIS PASINGA	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	14,00	0,30	0,30	1,26	1,00	**1,26**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	8,00	0,30	0,30	0,72	1,00	**0,72**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**
	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	6,00	0,30	0,30	0,54	1,00	**0,54**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,30	1,30	1,56	6,70	1,00	**6,70**

	TUBERÍA PVC-S 4" ENTERRADA	7,80	0,30	0,30	0,70	1,00	**0,70**
						TOTAL	**111,60**

TOTAL	**151,80**
ANTERIORES ACTAS	**40,20**
PRESENTE ACTA	**111,60**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.3	LUZ DARY ESCOBAR	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JHON PEREZ	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**

		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	9,56		1,40	13,39	1,00	**13,39**
		1,00		1,00	1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**215,85**

TOTAL	**302,19**
ANTERIORES ACTAS	**86,34**
PRESENTE ACTA	**215,85**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
6.1.4	LUZ DARY ESCOBAR				54,30	1,00	**54,30**
	MARIA RUTH PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JHON JAIRO PASCUAS				54,30	1,00	**54,30**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES				54,30	1,00	**54,30**
	SAUL PULIDO TELLO				54,30	1,00	**54,30**
	YENI ANDREA PERDOMO				54,30	1,00	**54,30**
	JHON FAIBER MANRIQUE				54,30	1,00	**54,30**
	JHON PEREZ				54,30	1,00	**54,30**
	ABIGAIL MONTIEL				54,30	1,00	**54,30**
	YORLADIS PASINGA				54,30	1,00	**54,30**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO				54,30	1,00	**54,30**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
	RAFAEL BECERRA VARGAS				54,30	1,00	**54,30**
						TOTAL	**814,50**

TOTAL	**1.140,30**
ANTERIORES ACTAS	**325,80**
PRESENTE ACTA	**814,50**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.5	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JHON PEREZ	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,24		3,97	1,00	**3,97**
						TOTAL	**59,55**

TOTAL	**83,37**
ANTERIORES ACTAS	**23,82**
PRESENTE ACTA	**59,55**



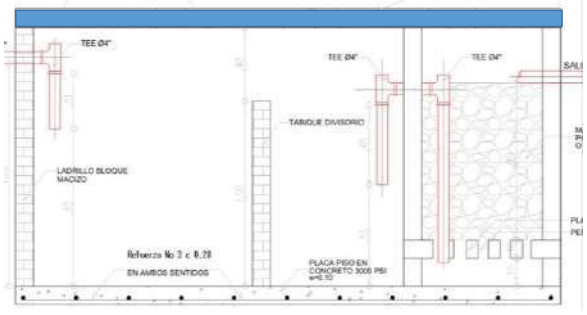

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.6	LUZ DARY ESCOBAR	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	MARIA RUTH PEREZ	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	SAUL PULIDO TELLO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JHON PEREZ	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	ABIGAIL MONTIEL	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YORLADIS PASINGA	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	3,20	1,25		4,00	1,00	**4,00**
						TOTAL	**60,00**

TOTAL	**84,00**
ANTERIORES ACTAS	**24,00**
PRESENTE ACTA	**60,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.1.7	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	21,00
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.1.8	LUZ DARY ESCOBAR	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	MARIA RUTH PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON JAIRO PASCUAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	SAUL PULIDO TELLO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENI ANDREA PERDOMO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON FAIBER MANRIQUE	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JHON PEREZ	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ABIGAIL MONTIEL	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YORLADIS PASINGA	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	1,00	0,80	0,85	0,68	1,00	**0,68**
						TOTAL	**10,20**

TOTAL	**14,28**
ANTERIORES ACTAS	**4,08**
PRESENTE ACTA	**10,20**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.1.9	LUZ DARY ESCOBAR	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	JHON PEREZ	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	1,00	1,00		1,00	1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	**21,00**
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.1.10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.1.10	LUZ DARY ESCOBAR	22,00				1,00	**22,00**
	MARIA RUTH PEREZ	2,50				1,00	**2,50**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	2,50				1,00	**2,50**
	JHON JAIRO PASCUAS	6,50				1,00	**6,50**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	13,00				1,00	**13,00**
	SAUL PULIDO TELLO	6,00				1,00	**6,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	6,00				1,00	**6,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	22,00				1,00	**22,00**
	JHON PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	ABIGAIL MONTIEL	6,00				1,00	**6,00**
	YORLADIS PASINGA	14,00				1,00	**14,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	14,00				1,00	**14,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	7,80				1,00	**7,80**
	LUCILA MENDEZ	9,00				1,00	**9,00**
	JOSE GOMEZ	10,00				1,00	**10,00**
	JOSE ALDEMAR TIQUE	8,00				1,00	**8,00**
	JOSE BENITO SANCHEZ	6,00				1,00	**6,00**
	FLOR ALBENIS SALINAS	19,04				1,00	**19,04**
						TOTAL	**192,34**

TOTAL	**228,34**
ANTERIORES ACTAS	**36,00**
PRESENTE ACTA	**192,34**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.2.1	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JHON PEREZ	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84		0,71	1,00	**0,71**
						TOTAL	**10,65**

TOTAL	**14,91**
ANTERIORES ACTAS	**4,26**
PRESENTE ACTA	**10,65**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.2.2	LUZ DARY ESCOBAR	0,84	0,84	0,4	0,28	1,00	**0,28**
	MARIA RUTH PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	SAUL PULIDO TELLO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JHON PEREZ	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ABIGAIL MONTIEL	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YORLADIS PASINGA	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,84	0,84	0,6	0,42	1,00	**0,42**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,84	0,84	0,7	0,49	1,00	**0,49**
	LUCILA MENDEZ				-0,21	1,00	**-0,21**
	JOSE GOMEZ				-0,49	1,00	**-0,49**
	JOSE ALDEMAR TIQUE				-0,21	1,00	**-0,21**
	JOSE BENITO SANCHEZ				-0,21	1,00	**-0,21**
	FLOR ALBENIS SALINAS				-0,21	1,00	**-0,21**
						TOTAL	**5,25**

TOTAL	8,19
ANTERIORES ACTAS	**2,94**
PRESENTE ACTA	**5,25**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.2.3	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	**21,00**
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**


ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.2.4	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	21,00
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





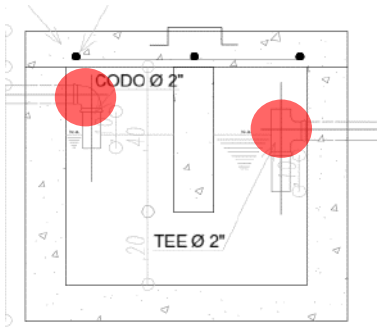

DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.3.1	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON JAIRO PASCUAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JHON PEREZ	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64		0,41	1,00	**0,41**
						TOTAL	**6,15**

TOTAL	8,61
ANTERIORES ACTAS	**2,46**
PRESENTE ACTA	**6,15**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.3.2	LUZ DARY ESCOBAR	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	MARIA RUTH PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	SAUL PULIDO TELLO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENI ANDREA PERDOMO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON FAIBER MANRIQUE	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JHON PEREZ	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ABIGAIL MONTIEL	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YORLADIS PASINGA	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	0,64	0,64	0,6	0,25	1,00	**0,25**
						TOTAL	**3,50**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**1,50**
PRESENTE ACTA	**3,50**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.3.3	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	**21,00**
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.3.5	LUZ DARY ESCOBAR	6,00				1,00	**6,00**
	MARIA RUTH PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	6,00				1,00	**6,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	6,00				1,00	**6,00**
	SAUL PULIDO TELLO	6,00				1,00	**6,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	6,00				1,00	**6,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	6,00				1,00	**6,00**
	JHON PEREZ	6,00				1,00	**6,00**
	ABIGAIL MONTIEL	6,00				1,00	**6,00**
	YORLADIS PASINGA	6,00				1,00	**6,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	6,00				1,00	**6,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	6,00				1,00	**6,00**
						TOTAL	**90,00**

TOTAL	**126,00**
ANTERIORES ACTAS	**36,00**
PRESENTE ACTA	**90,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
6.4.1	LUZ DARY ESCOBAR	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	MARIA RUTH PEREZ	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JHON JAIRO PASCUAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	SAUL PULIDO TELLO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	YENI ANDREA PERDOMO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JHON FAIBER MANRIQUE	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JHON PEREZ	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	ABIGAIL MONTIEL	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	YORLADIS PASINGA	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
						TOTAL	**72,00**

TOTAL	**100,80**
ANTERIORES ACTAS	**28,80**
PRESENTE ACTA	**72,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6.4.2	LUZ DARY ESCOBAR	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	MARIA RUTH PEREZ	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JHON JAIRO PASCUAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	SAUL PULIDO TELLO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	YENI ANDREA PERDOMO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JHON FAIBER MANRIQUE	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JHON PEREZ	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	ABIGAIL MONTIEL	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	YORLADIS PASINGA	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
						TOTAL	**24,00**

TOTAL	**33,60**
ANTERIORES ACTAS	**9,60**
PRESENTE ACTA	**24,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
6.4.3	LUZ DARY ESCOBAR	8,00				1,00	**8,00**
	MARIA RUTH PEREZ	8,00				1,00	**8,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS	8,00				1,00	**8,00**
	JHON JAIRO PASCUAS	8,00				1,00	**8,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES	8,00				1,00	**8,00**
	SAUL PULIDO TELLO	8,00				1,00	**8,00**
	YENI ANDREA PERDOMO	8,00				1,00	**8,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE	8,00				1,00	**8,00**
	JHON PEREZ	8,00				1,00	**8,00**
	ABIGAIL MONTIEL	8,00				1,00	**8,00**
	YORLADIS PASINGA	8,00				1,00	**8,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO	8,00				1,00	**8,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS	8,00				1,00	**8,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS	8,00				1,00	**8,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**120,00**

TOTAL	168,00
ANTERIORES ACTAS	**48,00**
PRESENTE ACTA	**120,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
6.4.4	LUZ DARY ESCOBAR					1,00	**1,00**
	MARIA RUTH PEREZ					1,00	**1,00**
	CAROLINA ROJAS VANEGAS					1,00	**1,00**
	JHON JAIRO PASCUAS					1,00	**1,00**
	EDUARDO QUINO QUIÑONES					1,00	**1,00**
	SAUL PULIDO TELLO					1,00	**1,00**
	YENI ANDREA PERDOMO					1,00	**1,00**
	JHON FAIBER MANRIQUE					1,00	**1,00**
	JHON PEREZ					1,00	**1,00**
	ABIGAIL MONTIEL					1,00	**1,00**
	YORLADIS PASINGA					1,00	**1,00**
	YENY ROCIO PRIETO CAICEDO					1,00	**1,00**
	ALFREDO CEBALLOS VARGAS					1,00	**1,00**
	JUAN PABLO MENESES VARGAS					1,00	**1,00**
	RAFAEL BECERRA VARGAS					1,00	**1,00**
						TOTAL	**15,00**

TOTAL	**21,00**
ANTERIORES ACTAS	**6,00**
PRESENTE ACTA	**15,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
6.4.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR					12,75	**12,75**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**12,75**

TOTAL	**17,85**
ANTERIORES ACTAS	**5,10**
PRESENTE ACTA	**12,75**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORÍA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"		**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 615.192.918,00	**FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
	VALOR TOTAL:	$ 615.192.918,00	**FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR ANTICIPO:	$ -	**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 60 x 60 cm, trampa de grasas de 80 x 80 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**	
6.4.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
6.4.6	TRANSPORTE MULAR					90,00	**90,00**
						TOTAL	**90,00**

TOTAL	**126,00**
ANTERIORES ACTAS	**36,00**
PRESENTE ACTA	**90,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
7,1	LEONARDO DE JESUS PEREZ MARTIN	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	YARELIS GOMEZ ESQUIVEL	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	JOSE DAVID ARIAS	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	FERNEY POLANIA POLANIA	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	AGROMEZON	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	FAIBER BAHAMON BAHAMON	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	HUMBERTO POLANIA	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
	MERCY HERNANDEZ TOVAR	8,00	0,60		4,80	1,00	**4,80**
						TOTAL	**48,00**

TOTAL	
ANTERIORES ACTAS	**9,60**
PRESENTE ACTA	**48,00**
TOTAL	**57,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
7,2	LEONARDO DE JESUS PEREZ MARTIN	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	YARELIS GOMEZ ESQUIVEL	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	JOSE DAVID ARIAS	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	FERNEY POLANIA POLANIA	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	AGROMEZON	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	FAIBER BAHAMON BAHAMON	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	HUMBERTO POLANIA	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
	MERCY HERNANDEZ TOVAR	8,00	0,45	0,45	1,60	1,00	**1,60**
						TOTAL	**16,00**

TOTAL	**19,20**
ANTERIORES ACTAS	**3,20**
PRESENTE ACTA	**16,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
7,3	LEONARDO DE JESUS PEREZ MARTIN	8,00				1,00	**8,00**
	YARELIS GOMEZ ESQUIVEL	8,00				1,00	**8,00**
	JOSE DAVID ARIAS	8,00				1,00	**8,00**
	FERNEY POLANIA POLANIA	8,00				1,00	**8,00**
	AGROMEZON	8,00				1,00	**8,00**
	FAIBER BAHAMON BAHAMON	8,00				1,00	**8,00**
	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	8,00				1,00	**8,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO	8,00				1,00	**8,00**
	HUMBERTO POLANIA	8,00				1,00	**8,00**
	MERCY HERNANDEZ TOVAR	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**80,00**

TOTAL	**96,00**
ANTERIORES ACTAS	**16,00**
PRESENTE ACTA	**80,00**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
7,4	LEONARDO DE JESUS PEREZ MARTIN					1,00	**1,00**
	YARELIS GOMEZ ESQUIVEL					1,00	**1,00**
	JOSE DAVID ARIAS					1,00	**1,00**
	FERNEY POLANIA POLANIA					1,00	**1,00**
	AGROMEZON					1,00	**1,00**
	FAIBER BAHAMON BAHAMON					1,00	**1,00**
	FEDERICO RAMIREZ OSORIO					1,00	**1,00**
	MARTHA PIEDAD CASTRO					1,00	**1,00**
	HUMBERTO POLANIA					1,00	**1,00**
	MERCY HERNANDEZ TOVAR					1,00	**1,00**
						TOTAL	**10,00**

TOTAL	**12,00**
ANTERIORES ACTAS	**2,00**
PRESENTE ACTA	**10,00**







DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR					5,00	**5,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**5,00**

TOTAL	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	**1,00**
PRESENTE ACTA	**5,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**	
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
7,6	TRANSPORTE MULAR					40,00	**40,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**40,00**

TOTAL	**48,00**
ANTERIORES ACTAS	**8,00**
PRESENTE ACTA	**40,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.1	BEATRIS BAUTISTA	3,10	1,29		4,00	1,00	**4,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,10	1,29		4,00	1,00	**4,00**
						TOTAL	**8,00**

TOTAL	20,00
ANTERIORES ACTAS	12,00
PRESENTE ACTA	8,00





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA


ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.2	BEATRIS BAUTISTA	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	6,50	0,20	0,2	0,26	1,00	**0,26**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,10	1,29	0,9	3,60	1,00	**3,60**
	TUBERÍA CONEXIÓN	5,00	0,20	0,2	0,20	1,00	**0,20**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**7,66**

TOTAL	19,28
ANTERIORES ACTAS	11,62
PRESENTE ACTA	7,66

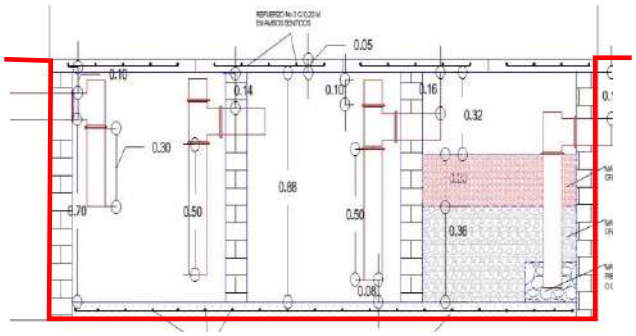



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.3	BEATRIS BAUTISTA	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
	JUAN CARLOS POLOCHE	10,00		0,88	8,80	1,00	**8,80**
						TOTAL	**17,60**

TOTAL	**44,00**
ANTERIORES ACTAS	**26,40**
PRESENTE ACTA	**17,60**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.4	BEATRIS BAUTISTA				45,74	1,00	**45,74**
	JUAN CARLOS POLOCHE				45,74	1,00	**45,74**
						TOTAL	**91,48**

TOTAL	**228,70**
ANTERIORES ACTAS	**137,22**
PRESENTE ACTA	**91,48**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.5	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**7,44**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	**11,16**
PRESENTE ACTA	**7,44**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.6	BEATRIS BAUTISTA	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
	JUAN CARLOS POLOCHE	3,00	1,24		3,72	1,00	**3,72**
						TOTAL	**7,44**

TOTAL	**18,60**
ANTERIORES ACTAS	**11,16**
PRESENTE ACTA	**7,44**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
8.1.7	BEATRIS BAUTISTA					1,00	**1,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE					1,00	**1,00**
						TOTAL	**2,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**3,00**
PRESENTE ACTA	**2,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.1.8	BEATRIS BAUTISTA	6,00				1,00	**6,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	6,00				1,00	**6,00**
						TOTAL	**12,00**

TOTAL	28,40
ANTERIORES ACTAS	16,40
PRESENTE ACTA	12,00



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.1.9	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,36	0,30	1,00	**0,30**
						TOTAL	**0,60**

TOTAL	**1,50**
ANTERIORES ACTAS	**0,90**
PRESENTE ACTA	**0,60**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.1.10	BEATRIS BAUTISTA	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,84	1,00	0,2	0,17	1,00	**0,17**
						TOTAL	**0,34**

TOTAL	0,85
ANTERIORES ACTAS	**0,51**
PRESENTE ACTA	**0,34**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.2.1	BEATRIS BAUTISTA	0,63	0,63		0,40	1,00	**0,40**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,63	0,63		0,40	1,00	**0,40**
						TOTAL	**0,80**

TOTAL	**2,00**
ANTERIORES ACTAS	**1,20**
PRESENTE ACTA	**0,80**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.2.2	BEATRIS BAUTISTA	0,60	0,60	0,6	0,22	1,00	**0,22**
	tubo cajilla-pozo	0,80	0,40	0,5	0,16	1,00	**0,16**
	JUAN CARLOS POLOCHE	0,60	0,60	0,6	0,22	1,00	**0,22**
	tubo cajilla-pozo	0,80	0,40	0,5	0,16	1,00	**0,16**
						TOTAL	**0,76**

TOTAL	**1,58**
ANTERIORES ACTAS	**0,82**
PRESENTE ACTA	**0,76**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.2.3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	**UND**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
8.2.3	BEATRIS BAUTISTA					1,00	**1,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE					1,00	**1,00**
						TOTAL	**2,00**

TOTAL	**5,00**
ANTERIORES ACTAS	**3,00**
PRESENTE ACTA	**2,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
8.3.1	BEATRIS BAUTISTA	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,10	1,10		1,21	1,00	**1,21**
	tuberia pozo-fosa	8,00	0,45		3,60	1,00	**3,60**
	HS_FOSA INFILTRACIÓN	1,10	1,10		1,21	-1,00	**-1,21**
	HS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,00	0,45		0,45	-1,00	**-0,45**
	JAS_FOZA INFILTRACIÓN	1,50	1,10		1,65	-1,00	**-1,65**
	JAS_TUBERÍA 4 PVC-S 4"	1,50	0,45		0,68	-1,00	**-0,68**
						TOTAL	**5,63**

TOTAL	**16,62**
ANTERIORES ACTAS	**10,99**
PRESENTE ACTA	**5,63**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.3.2	BEATRIS BAUTISTA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,60	1,00	**0,60**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	POZO-FOSA TUBERÍA PVC-S 4"	8,00	0,37	0,20	0,61	1,00	**0,61**
						TOTAL	**3,21**

TOTAL	**6,69**
ANTERIORES ACTAS	**3,48**
PRESENTE ACTA	**3,21**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
8.3.3	BEATRIS BAUTISTA	8,00				1,00	**8,00**
	JUAN CARLOS POLOCHE	8,00				1,00	**8,00**
						TOTAL	**16,00**

TOTAL	**22,80**
ANTERIORES ACTAS	**6,80**
PRESENTE ACTA	**16,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
8.3.4	BEATRIS BAUTISTA	1,00	1,00	0,80	0,80	1,00	**0,80**
	JUAN CARLOS POLOCHE	1,00	1,00	0,80	0,80	1,00	**0,80**
						TOTAL	**1,60**

TOTAL	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	**2,40**
PRESENTE ACTA	**1,60**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A **FECHA DE REINICIO 3: N/A**	**FECHA DE RECIBO ACTA FINAL**
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
8.3.5	TRANSPORTE AUTOMOTOR					1,00	**1,00**
							0,00
						TOTAL	**1,00**

TOTAL	**2,50**
ANTERIORES ACTAS	**1,50**
PRESENTE ACTA	**1,00**



DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.490 DE 2024**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RURALES 2024**
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL"	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: DEYANID GUILOMBO VALENZUELA** **FECHA DE RECIBO ACTA FINAL** **11/07/2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 615.192.918,00 VALOR TOTAL: $ 615.192.918,00 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**PLAZO: OCHO MESES** **ADICIÓN EN PLAZO: N/A** **PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**	
8.3.6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
8.3.6	TRANSPORTE MULAR					12,00	**12,00**
							0,00
						TOTAL	**12,00**

TOTAL	**30,00**
ANTERIORES ACTAS	**18,00**
PRESENTE ACTA	**12,00**





DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Consorcio Obras Rurales 2024
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ANEXO 3
ACTAS DE RECIBO INDIVIDUAL BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS SECADEROS DE CAFE (8)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Primavera	Anais Villarreal	28.809.197
2	Primavera	María Ruth Pérez	26.444.156
3	Primavera	Maritza Ninco Rojas / Franeth Rojas Vargas (Propietario – Esposo fallecido)	36.305.398
4	Canoas	Carolina Rojas Vanegas	1.075.271.427
5	San Bartolo	Alba Luz Molano	26.406.480
6	Chapuro	Leidy Johana Olaya Ricaurte	26.431.696
7	Canoas	Martha Piedad Castro	55.166.979
8	Chapuro	María Ruth Oliveros / Nubia Payo Oliveros (hija)	36.161.580

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ANAIS VILLAERAL	28,809,197

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Quien recibe:

Nombre: LILIANA POLANCO VILLAREAL
Cédula: 55,169,722 CC 55.169.722 N.

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARIA RUTH PEREZ	26,444,156

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: MARIA RUTH PEREZ
Cédula: 26,444,156

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARITZA NINCO ROJAS	36,305,398

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Quien recibe:

Maritza Ninco Rojas

Nombre: MARITZA NINCO ROJAS
Cédula: 36,305,398

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	CANOAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
CAROLINA ROJAS VANEGAS	1,075,271,427

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Carolina Rojas Vanegas

Nombre: CAROLINA ROJAS VANEGAS
Cédula: 1,075,271,427

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
10/06/2025	HUILA		NEIVA	SAN BARTOLO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ALBA LUZ MOLANO	26,406,480

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Nombre: ALBA LUZ MOLANO
Cédula: 26,406,480

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
11/06/2025	HUILA		NEIVA	CHAPURO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LEIDY JOHANNA OLAYA	36,431,696

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Leidy Johanna olaya Ricaurte

Nombre: LEIDY JOHANNA OLAYA
Cédula: 36,431,696 26 431 696

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	CANOAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARTHA PIEDAD CASTRO	55,166,979

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: MARTHA PIEDAD CASTRO
Cédula: 55,166,979

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584


VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA





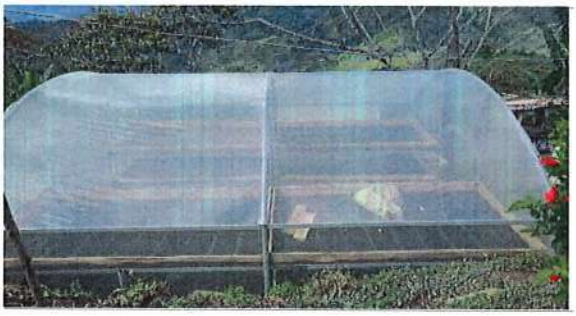



ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
11/06/2025	HUILA		NEIVA	CHAPURO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARIA RUTH OLIVEROS	36,161,580

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25.00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0.80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20mm CALIBRE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS	Unidad	1.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1.00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA	Unidad	8.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario: Maria Ruth Oliveros = hija: Rubia Rayo Oliveros ss177118

Nombre: MARIA RUTH OLIVEROS
Cédula: 36,161,580

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CAFÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









BENEFICIARIOS SECADEROS DE CACAO (1)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Los Cauchos	José Benito Sánchez	12.108.020

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.698.260-0

OBRA: SECADERO DE CACAO

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
29/04/2025	HUILA		NEIVA	LOS CAUCHOS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JOSE BENITO SANCHEZ	12.108.020

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,60
CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	0,80
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 40x20MM CALIBRE 1.1MM X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CACAO, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SENTIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	Unidad	1,00
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1" y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALLA. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA.	Unidad	8,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: JOSE BENITO SANCHEZ
Cédula: 12.108.020

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SECADERO DE CACAO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









BENEFICIARIOS TANQUES AUSTRALIANOS (1)

MUNICPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Platanillal	Edgar Bahamón	12.109.251

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: TANQUE AUSTRALIANO

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
30/04/2025	HUILA		NEIVA	PLATANILLAL

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
EDGAR BAHAMON	12.109.251

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	13,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	0,50
INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	Unidad	1,00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3.71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 3.71 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: EDGAR BAHAMON
Cédula: 12.109.251

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.392.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: TANQUE AUSTRALIANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









BENEFICIARIOS SISTEMAS SÉPTICOS ARD (15)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Palestina	Luz Dary Escobar	41.928.458
2	Primavera	María Ruth Pérez	26.444.156
3	Canoas	Carolina Rojas Vanegas	1.075.271.427
4	Platanillal	Jhon Jairo Pascuas	7.700.713
5	Canoas	Eduardo Quino Quiñones	7.696.658
6	Las Nubes	Saul Pulido Tello	12.106.107
MUNICIPIO DE PAICOL			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
7	Alto San Miguel	Jhon Faiber Manrique	1.079.510.034
8	Alto San Miguel	Yeni Andrea Perdomo	36.069.922
9	Alto San Miguel	Jhon Jairo Pérez	7.711.428
MUNICIPIO DE ELIAS			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
10	San Vicente	Juan Pablo Meneses Vargas	7.716.512
11	San Vicente	Alfredo Ceballos Vargas	4.900.634
12	San Vicente	Rafael Becerra Vargas	91.134.383
MUNICIPIO DE ACEVEDO			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
13	El Salado	Yorladis Pasinga Tapiero	1.083.911.911
14	El Salado	Abigail Montiel	36.275.176
15	El Salado	Yenny Rocio Prieto Caicedo	1.078.753.588

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PALESTINA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LUZ DARY ESCOBAR BAHAMON	41,928,458

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Luz Dary Escobar

Nombre: LUZ DARY ESCOBAR BAHAMON
Cédula: 41,928,458

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARIA RUTH PEREZ	26.444.156

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: MARIA RUTH PEREZ
Cédula: 26.444.156

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	CANOAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
CAROLINA ROJAS VANEGAS	1.075.271.427

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría,·para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Carolina Rojas Vanegas

Nombre: CAROLINA ROJAS
Cédula: 1.075.271.427

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
29/04/2025	HUILA		NEIVA	PLATANILLAL

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JHON JAIRO PASCUAS ROJAS	7.700.713

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario: Jhon Jairo Pascuas

Nombre: JHON JAIRO PASCUAS ROJAS
Cédula: 7.700.713

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	CANOAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
EDUARDO QUINO QUIÑONES	7,696,658

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Quien recibe:

Nombre: MAGALY VANEGAS CAICEDO
Cédula: 26,428,233

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
19/05/2025	**HUILA**		**NEIVA**	**LAS NUBES**

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
SAUL PULIDO TELLO	**12.106.107**

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): **DEYANID GUILOMBO VALENZUELA**
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: **SAUL PULIDO TELLO**
Cédula: 12.106.107

Director de obra:

Nombre: **OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN**
Cédula: 93.393.584

VoBo **JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	VEREDA
	HUILA		PAICOL	ALTO SANMIGUEL

CONTRATISTA		INTERVENTOR
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	N/o DE CEDULA
JHON FAIBER MANRIQUE	

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit 901 898 260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo, este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO, INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P S I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4" I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 60 x 60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15, Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075 220 497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario: Jhon Faiver manrique

Nombre: JHON FAIBER MANRIQUE
Cédula: 1079510034

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

Scanned with CamScanner


OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA







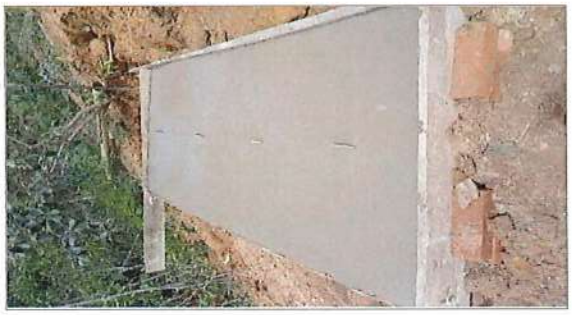

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.698.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	VEREDA
	HUILA		PAICOL	ALTO SANMIGUEL

CONTRATISTA		INTERVENTOR
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	No. DE CEDULA
YENI ANDREA PERDOMO	

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit 901.698.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo, este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema, además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0 07 X 0 12 X 0 24) e=0 12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P S I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0 80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCION 0 60 x 0 60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0 60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0 25 (Grava de 2 a 6 cm H=0 15, Arena H=0 10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Yeni Andrea perdomo pobre

Nombre: YENI ANDREA PERDOMO
Cédula: 36.069.922

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 91.399.184

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

Scanned with CamScanner

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT 901.893.200-9

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARO

FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VEREDA
	HUILA	PAICOL	ALTO SANMIGUEL

CONTRATISTA	INTERVENTOR
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	No. DE CEDULA
JHON PEREZ	7.711.428

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representacion del Consorcio Obras Rurales 2024, NIT.901.893.200-9, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de interventoria, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantias de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc. adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema, además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes caracteristicas y cantidades de obra.

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, ANCLAJE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	Kg	94.50
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M. INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR E STEMA SÉPTICO AGUAS DOMESTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL TAPA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL TAPA PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4", PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80. TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PARETE INTERIOR, H- 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	6.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15, Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,270,497

Interventoria:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: JHON PEREZ
Cedula: 7711428

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,390,584

Vo.Bo. JAVIER CAICEDO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SOA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ELÍAS	SAN VICENTE

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JUAN PABLO MENESES VARGAS	7.716.512

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: JUAN PABLO MENESES
Cédula: 7.716.512

Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA



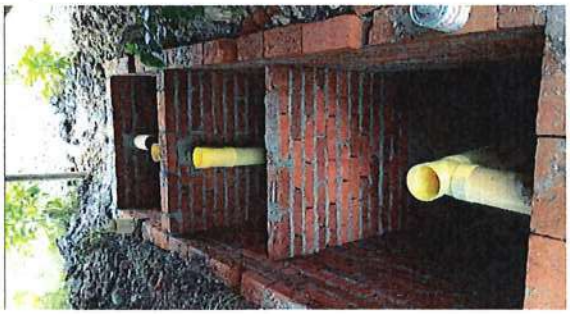





ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ELÍAS	SAN VICENTE

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ALFREDO CEBALLOS VARGAS	4.900.634

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Nombre: ALFREDO CEBALLOS
Cédula: 4.900.634

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Vo.bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ELÍAS	SAN VICENTE

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
RAFAEL BECERRA VARGAS	91.134.383

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Beneficiario:

Rafael Becerra Vargas

Nombre: RAFAEL BECERRA VARGAS
Cédula: 91134383

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 83.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ACEVEDO	EL SALADO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
YORLADIS PASINGA	1083911911

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Yorladi Pasinga tapiero

Nombre: YORLADIS PASINGA
Cédula: 1083911911

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA


OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA







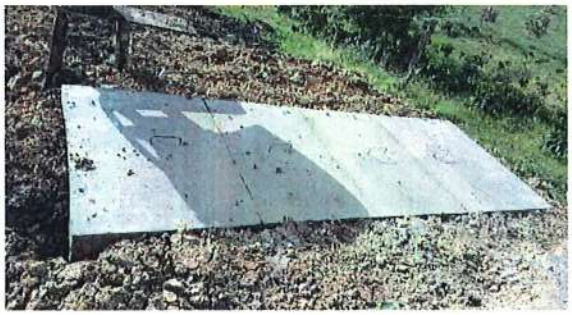

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA	ACEVEDO	EL SALADO

CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
ABIGAIL MONTIEL	36275176

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0,10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario: Abigail Montiel

Nombre: ABIGAIL MONTIEL
Cédula: 36275176

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300


Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

V.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

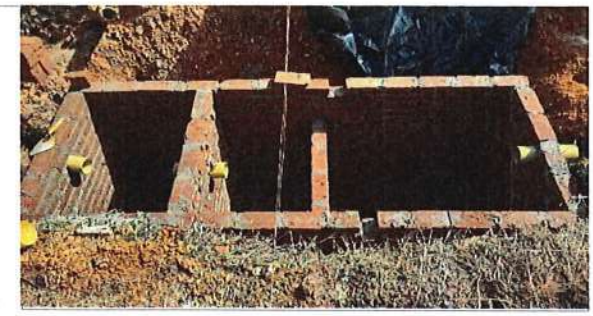







ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		ACEVEDO	EL SALADO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
YENNY ROCIO PRIETO CAICEDO	1078753588

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6.70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54.30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3.97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4.00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25
CAJA DE INSPECCION 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Rocio Prieto

Nombre: YENNY ROCIO PRIETO
Cédula: 1.078.753.588

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
26/03/2025	HUILA		NEIVA	SANTA HELENA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LUCILA MENDEZ MOSQUERA	36.158.531

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,70
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8" PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	54,30
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	3,97
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	4,00
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO AGUAS DOMÉSTICAS	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,68
CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	ML	6,50
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,71
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,49
CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,41
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 x 0.60 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	Unidad	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	ML	6,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

Karol dayana saldaña

Nombre: Karol dayana
Cédula: 1077177918

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









BENEFICIARIOS CAMPOS DE INFILTRACIÓN (10)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Primavera	Federico Ramírez Osorio	17.249.256
2	Canoas	Martha Piedad Castro	55.166.979
3	Canoas	Humberto Polania	7.699.506
4	Chapuro	Rodrigo Osorio / Mercy Hernández Tovar (Propietario – Esposo)	7.704.520
5	Santa Lucía	Faiber Bahamón Bahamón	7.700.521
6	Santa Lucía	Leonardo de Jesús Pérez	3.296.882
7	Santa Lucía	Yarelis Gómez Esquivel	28.614.019
8	Primavera	AGROMEZON - Arley Caquimbo	900.232.000-0
9	Santa Lucía	José David Arias Solano	7.731.534
10	Santa Helena	Ferney Polanía Polanía	12.112.462

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO	17,249,256

En Neiva - Huila; se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Federico Ramirez osorio

Nombre: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
Cédula: 17,249,256

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,594

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
MARTHA PIEDAD CASTRO	55,166,979

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Nombre: MARTHA PIEDAD CASTRO
Cédula: 55,166,979

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 98,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
HUMBERTO POLANIA	7,699,506

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: HUMBERTO POLANIA
Cédula: 7,699,506

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 98,399,584

VoBO JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
4/06/2025	HUILA		NEIVA	CHAPURO

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
RODRIGO OSORIO	7,704,520

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Beneficiario:

Nombre: RODRIGO OSORIO
Cédula: 7,704,520

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 83,399,384

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
29/05/2025	**HUILA**		**NEIVA**	**SANTA LUCÍA**

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
FAIBER BAHAMON BAHAMON	**7.700.521**

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Beneficiario: Faiber Bahamon

Nombre: FAIBER BAHAMON BAHAMON
Cédula: 7.700.521

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
LEONARDO DE JESUS PÉREZ MARTÍNEZ	3,296,882

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Nombre: LEONARDO DE JESUS PÉREZ MARTÍNEZ
Cédula: 3,296,882

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional Universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
28/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
YARELIS GOMEZ ESQUIVEL	28,614,019

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1.00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Beneficiario:

Yareliz Gomez Esquivel.

Nombre: YARELIS GOMEZ ESQUIVEL
Cédula: 28,614,019

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300


Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA



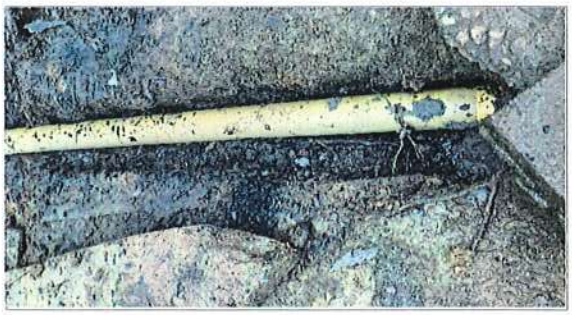





ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA	NEIVA	PRIMAVERA

CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
AGROMESON	900232000-0

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.49[illegible]

Interventoria:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:


Nombre: [illegible] CAGUASANGO
Cédula: 7[illegible]


Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

Vo.Bo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA

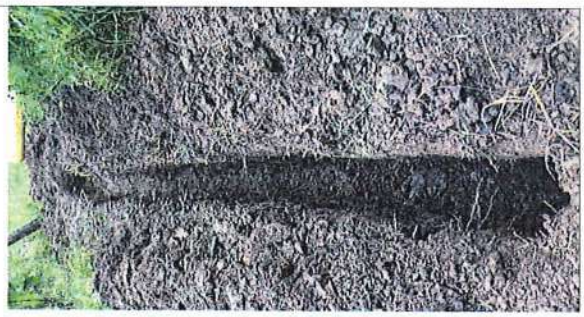

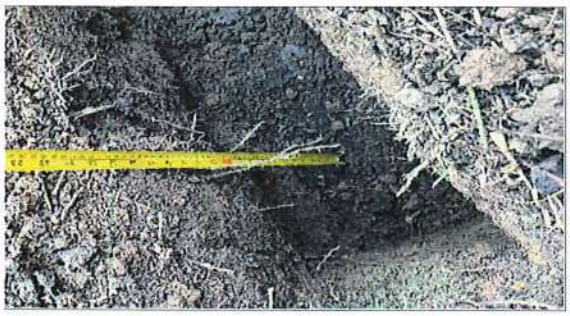





ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
29/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JOSE DAVID ARIAS SOLANO	7.731.534

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Beneficiario: José David Arias

Nombre: JOSE DAVID ARIAS SOLANO
Cédula: 7.731.534

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		NEIVA	SANTA HELENA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
FERNEY POLANIA POLANIA	12.112.462

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,80
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	Unidad	1,00

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

FERNEY POLANIA POLANIA

Nombre: FERNEY POLANIA POLANIA
Cédula: 12.112.462

Director de obra:


Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: CAMPOS DE INFILTRACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA



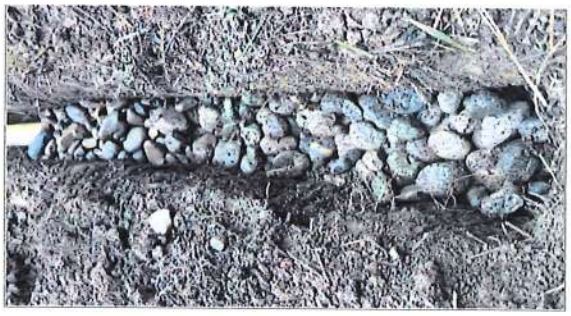





BENEFICIARIOS SISTEMAS SÉPTICOS ARND (2)

MUNICIPIO DE NEIVA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
1	Santa Lucía	Juan Carlos Poloche	17.775.870
MUNICIPIO DE RIVERA			
No.	**VEREDA**	**BENEFICIARIO**	**CÉDULA**
2	Las Juntas	Beatriz Bautista Useche	36.169.726

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARnD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
	HUILA		RIVERA	LAS JUNTAS

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
BEATRIS BAUTISTA USECHE	36.169.726

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3,96
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	8,80
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	45,74
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3,72
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3,72
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	Unidad	1,00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	6,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	0,30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0,17
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,40
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,38
CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	Unidad	1,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3,01
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,32
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	8,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	0,80

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1.075.220.497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79.142.300

Quien recibe:

Nombre: BEATRIS BAUTISTA USECHE
Cédula: 36.169.726

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93.399.584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO No. 490 DE 2024

CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
NIT. 901.898.260-0

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARnD

FECHA:	DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	VEREDA:
27/05/2025	HUILA		NEIVA	SANTA LUCIA

CONTRATISTA:		INTERVENTOR:
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024		CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Nro. DE CEDULA:
JUAN CARLOS POLOCHE	17,775,870

En Neiva - Huila, se reunieron DEYANID GUILOMBO VALENZUELA, actuando en representación del Consorcio Obras Rurales 2024, Nit.901.898.260-0, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, contratista de Interventoría, para entregar la obra terminada en las condiciones indicadas en el proyecto y contrato de obra respectivo; este documento no exime a las partes de las garantías de estabilidad, calidad, daños a terceros, etc, adquiridas según las obligaciones contractuales.

Nota: La tubería adicional de la obra es por cuenta del beneficiario, el cual es responsable del uso y protección de la misma para el correcto funcionamiento del sistema; además, se compromete a realizar el mantenimiento respectivo de la misma, exonerando a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y al Contratista de obra de toda responsabilidad.

La obra objeto de la presente diligencia tiene las siguientes características y cantidades de obra:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3.96
MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	8.80
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	KG	45.74
CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3.72
CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	3.72
ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA. INCLUYE TUBERIA 4" PARA CONEXIONES INTERNAS	Unidad	1.00
TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	ML	6.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	M3	0.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	M3	0.17
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0.40
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.38
CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"x1/8"	Unidad	1.00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3.01
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.32
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	ML	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	M3	0.80

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervienen:

Contratista: Consorcio obras rurales 2024

Nombre (RL): DEYANID GUILOMBO VALENZUELA
Cédula: 1,075,220,497

Interventoría:

Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cédula: 79,142,300

Quien recibe:

Bernardo Riojas

Nombre: BERNARDO RIOJAS
Cédula: 1692652

Director de obra:

Nombre: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
Cédula: 93,399,584

VoBo JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor - Profesional universitario SGA

OBRA: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO ARnD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA









ANEXO 4
ACTA RECIBO FINAL INTERVENTORÍA No.2
ACTA DE INTERVENTORÍA No.2

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X__ PARCIAL: _____ No.: ____**			
_X_ CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**	**Nº: 485**	**AÑO:**	**2024**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**		
	NIT y/o CC:	**79.142.300**		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 8 C No.34 – 05 Los Molinos**	**TEL:**	**608 8757000**
	CIUDAD:	**NEIVA - HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**		
OBJETO:	Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del contrato No.490 de 2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024002181 del 20/12/2024** **2024000045 del 20/12/2024**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 68.352.127,00**			
	Valor en Letras: SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 0,00		
VALOR TOTAL	**$ 68.352.127,00**			
PLAZO INICIAL:	**OCHO (8) MESES**			

PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A	
FECHA INICIO	30 de diciembre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	N/A
		REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de julio de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	11/07/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 01/05/2025 al 30/06/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:		
	EN CALIDAD DE:		

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**19/12/2024**	**-**	**$ 68.352.127,00**	**$ 68.352.127,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	-	**$ 68.352.127,00**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	30/04/2025	$ 29.951.901,96	-	**$ 38.400.225,04**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL 2	30/06/2025	$ 38.400.224,53	-	**$ 0,51**
VALOR A PAGAR	Por pagar	$ 38.400.224,53		**$ 0,51**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades en el período del 01 de mayo al 30 de junio de 2025 objeto del contrato.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $38.400.224,53, conforme al Acta de recibo final No.2 de interventoría; la Supervisión en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, así: PAGOS PARCIALES: En el mismo porcentaje en el que se realicen los pagos parciales del contrato objeto de interventoría hasta un 80% del valor del contrato de Interventoría. PAGO FINAL: El veinte por ciento (20%) restante del valor total del Contrato, con la suscripción del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación del Contrato de Interventoría aprobadas por el supervisor, una vez terminado y liquidado el contrato de obra objeto de*

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

interventoría…"; por tanto, se autoriza el pago correspondiente hasta el 80%, es decir, la suma de **$24.729.799,13**, quedando pendiente para la liquidación el pago del 20% por un valor de **$13.670.425,40**.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final No.2 de Interventoría.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.6**

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Coordinador Proyecto Ceibas
Supervisor contrato No.485 de 2024

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

CONTRATO No.	485 de 2024		**VALOR INICIAL:**	$ 68.352.127	
VALOR:	$ 68.352.127		**ADICIÓN:**	$ -	
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ADICIONAL:**	**VALOR FINAL:**	$ 68.352.127	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."		**FECHA INICIO:**	30 de diciembre de 2024	
			FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	N/A	**ACTA DE INTERVENTORÍA**
			FECHA REINICIO 1:	N/A	**FINAL No.2**
INTERVENTOR-CONTRATISTA	CARLOS ARTUTO QUIZA CAMACHO - Nit. 79.142.300-1		**FECHA TERMINACIÓN:**	27 de agosto de 2025	FECHA: 11 de julio de 2025
SUPERVISOR:	Ing. JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ		**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 68.352.126,49**	PERIODO: MAYO 01 A JUNIO 30 DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA					EJECUCION DE OBRA					EJECUCIÓN INTERVENTORÍA				
No.	**DESCRIPCIÓN CONTRATO OBRA**	**VALOR INICIAL CONTRATO**	**VALOR ADICIÓN CONTRATO**	**VALOR FINAL CONTRATO**	**ACTA No.**	**VALOR PRESENTE ACTA**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA**	**VALOR ACUMULADO**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADO**	**COSTO ACTAS ANTERIORES**	**COSTO PRESENTE ACTA**	**% PRESENTE ACTA**	**COSTO ACUMULADO**	**% ACUMULADO**
490 -2024	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL."	$ 615.192.918,00	$ -	$ 615.192.918,00	2	$ 345.602.364,00	56,18%	$ 615.192.312,00	100,00%	$ 25.169.665,51	$ 32.269.096,24	56,18%	$ 57.438.761,75	100,00%
VALOR TOTAL OBRAS PARA REALIZAR INTERVENTORIA		**$ 615.192.918,00**	**$ -**	**$ 615.192.918,00**				**$ 615.192.312,00**	**100,00%**	**$ 25.169.665,51**	**$ 32.269.096,24**	**56,18%**	**$ 57.438.761,75**	**100,00%**
	COSTO INTERVENTORIA	$ 57.438.762,00								$ 25.169.665,51	$ 32.269.096,24		$ 57.438.761,75	
	IVA - 19%	$ 10.913.365,00								$ 4.782.236,45	$ 6.131.128,29		$ 10.913.364,73	
	TOTAL COSTO INTERVENTORIA	**$ 68.352.127,00**								**$ 29.951.901,96**	**$ 38.400.224,53**		**$ 68.352.126,49**	
	PORCENTAJE COSTO INTERVENTORIA SOBRE VALOR CONTRATO	11,11%												

VALOR PRESENTE ACTA INTERVENTORIA: **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE**

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA C.
Interventor

Ing. JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ
Supervisor
