403

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6765982
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OBDULIO LA ROTTA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 12 # 21 - 50	TELÉFONO:	7437451
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Alquiler y arrendamiento de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7975189941**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		55			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1553579259

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 30.800
SUBTOTAL:			1	**$ 30.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 29.700**
VALOR MORA:	**$ 1.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 30.800**

Planilla Pagada

404

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6765982
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OBDULIO LA ROTTA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 12 # 21 - 50	TELÉFONO:	7437451
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Alquiler y arrendamiento de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7975211791**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	abril
	AÑO:	2025		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	26				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1553569190

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 181.000
SUBTOTAL:			1	**$ 181.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 178.000**
VALOR MORA:	**$ 3.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 181.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6765982
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			OBDULIO LA ROTTA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 12 # 21 - 50	TELÉFONO:	7437451
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7975211791	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			26				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1553569190

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 178.000	$ 3.000	$ 0	$ 181.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 181.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6765982	LA ROTTA GARCIA OBDULIO	INDEPEND	PENSIONADO ACT	$ 1.423.500			NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 181.000

Planilla Pagada

PLANILLAS

INGENIERA SST

407

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073230379
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA YULIETT OVALLE AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 10 # 12-32 TORRE 7 APTO	TELÉFONO:	6018802
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7959600710**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1352334541	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073230379
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA YULIETT OVALLE AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 10 # 12-32 TORRE 7 APTO 227	TELÉFONO:	6018802
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7959600710	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1352334541

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1073230379	OVALLE AGUILERA DIANA YULIETT	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	107323037	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

408

409

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073230379
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA YULIETT OVALLE AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 10 # 12-32 TORRE 7 APTO	TELÉFONO:	6018802
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7964897020**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1407324494		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073230379
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA YULIETT OVALLE AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 10 # 12-32 TORRE 7 APTO 227	TELÉFONO:	8018802
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7964897020	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1407324494

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CGE	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1073230379	OVALLE AGUILERA DIANA YULIETT	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	107323037	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

PLANILLAS

CONTRATISTA (LH CONSTRUCCIONES CIVILES)

EMPLEADOS

RESIDENTE DE OBRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1330839848	9482065217	E	2025/03/07	2025/03/12	BANCO DAVIVIENDA	5	$213,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																														
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																														
1	CC	6756179	RODRIGUEZ SANCHEZ HUGO LEON																		0	EPS002	30	CCF10	30	14-23	30	6.960%	30	SI
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1330839848	9482065217	E	2025/03/07	2025/03/12	BANCO DAVIVIENDA	5	$213,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$400	$0	$99,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$200	$0	$57,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$200	$0	$57,200
TOTAL				1	$213,100	$800	$0	$213,900

412

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-02	Periodo Salud	2025-03
Fecha límite de pago	2025/03/07	Fecha de pago	2025/03/12
Dias de mora	5	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$213,100
Intereses de mora	$800
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$213,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9482065217
Clave de pago	1330839848
Banco	BANCO DAVIVIENDA

2025/06/19 12:13 PM

413

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1384714585	9484086254	E	2025/04/07	2025/04/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$748,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																																
1	CC	1056482029	BUITRAGO JEREZ MIGUEL FABIAN	X																		23030 1	6	CCFC55	6	CCF10	6	14-23	6	0.522%	6	SI
2	CC	74356876	GIL MATAMOROS VICTOR MANUEL	X																		23030 1	6	ESSC24	6	CCF10	6	14-23	6	0.522%	6	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																																
3	CC	80368230	BUITRAGO SAAVEDRA ORLANDO	X																		23030 1	6	EPS041	6	CCF10	6	14-23	6	6.960%	6	SI
4	CC	6768348	MARTINEZ BAMBASICA PEDRO JOSE	X																		25-14	6	EPS005	6	CCF10	6	14-23	6	6.960%	6	SI
5	CC	4235314	RODRIGUEZ ESPITIA GERMAN	X																		25-14	6	EPS017	6	CCF10	6	14-23	6	6.960%	6	SI
6	CC	6756179	RODRIGUEZ SANCHEZ HUGO LEON																				0	EPS002	30	CCF10	30	14-23	30	6.960%	30	SI
7	CC	4292853	ROJAS MARTINEZ TEODORO	X																		23030 1	6	EPS041	6	CCF10	6	14-23	6	6.960%	6	SI
8	CC	6768357	URRUTIA BAQUERO PUBLIO JOSE	X																			0	EPS005	6	CCF10	6	14-23	6	6.960%	6	SI
Total			**Afiliados(8)**																													

2025/06/19 12:16 PM

414

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1384714585	9484086254	E	2025/04/07	2025/04/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$748,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$273,600	$0	$0	$273,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$91,200	$0	$0	$91,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$182,400	$0	$0	$182,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$201,600	$0	$0	$201,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$201,600	$0	$0	$201,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$136,800	$0	$0	$136,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$136,800	$0	$0	$136,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$136,800	$0	$0	$136,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$11,400	$0	$0	$11,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$11,400	$0	$0	$11,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$11,400	$0	$0	$11,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$22,800	$0	$0	$22,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$22,800	$0	$0	$22,800
TOTAL				8	$748,800	$0	$0	$748,800

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-03	Periodo Salud	2025-04
Fecha límite de pago	2025/04/07	Fecha de pago	2025/04/03
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$748,800
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$748,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9484086254
Clave de pago	1384714585
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/06/19 12:12 PM

415

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1450784258	9484897253	E	2025/05/08	2025/05/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,620,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,192,200	$0	$0	$1,192,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$736,600	$0	$0	$736,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$603,900	$0	$0	$603,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$603,900	$0	$0	$603,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$412,300	$0	$0	$412,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$412,300	$0	$0	$412,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$412,300	$0	$0	$412,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$13,300	$0	$0	$13,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				8	$2,620,700	$0	$0	$2,620,700

2025/06/19 12:16 PM

416

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1450784258	9484897253	E	2025/05/08	2025/05/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,620,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Cocigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																																
1	CC	1056482029	BUITRAGO JEREZ MIGUEL FABIAN																		23030 1	30	CCFC5 5	30	CCF10	30	14-23	30	0.522%	30	SI
2	CC	74356876	GIL MATAMOROS VICTOR MANUEL		X																23030 1	7	ESSC24	7	CCF10	7	14-23	7	0.522%	7	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																																
3	CC	80368230	BUITRAGO SAAVEDRA ORLANDO																		23030 1	30	EPS041	30	CCF10	30	14-23	30	6.960%	30	SI
4	CC	6768348	MARTINEZ BAMBASICA PEDRO JOSE																		25-14	30	EPS005	30	CCF10	30	14-23	30	6.960%	30	SI
5	CC	4235314	RODRIGUEZ ESPITIA GERMAN																		25-14	30	EPS017	30	CCF10	30	14-23	30	6.960%	30	SI
6	CC	6756179	RODRIGUEZ SANCHEZ HUGO LEON																			0	EPS002	30	CCF10	30	14-23	30	6.960%	30	SI
7	CC	4292853	ROJAS MARTINEZ TEODORO																		23030 1	30	EPS041	30	CCF10	30	14-23	30	6.960%	30	SI
8	CC	6768357	URRUTIA BAQUERO PUBLIO JOSE																			0	EPS005	30	CCF10	30	14-23	30	6.960%	30	SI
Total			**Afiliados(8)**																													

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 820003826	5	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 12 21 50	TUNJA-BOYACA	7403570

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-04	Periodo Salud	2025-05
Fecha límite de pago	2025/05/08	Fecha de pago	2025/05/02
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$2,620,700
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$2,620,700

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9484897253
Clave de pago	1450784258
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/06/19 12:11 PM

417

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

(PERSONAS JURÍDICAS)

REF. CD-CO-003-2025 - INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025".

OBDULIO LA ROTTA GARCIA identificado con **C. C. No. 6.765.982** en mi condición de representante legal de **LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.** identificada con **NIT 820.003.826-5,** y **MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO** en mi condición de **CONTADORA** de **LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.** identificada con **CC 40.031.136 y matriculada 67193-T por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía en siguiente período de ejecución del contrato de la referencia.

DESDE	**26 DE MARZO DE 2025**
HASTA	**25 DE ABRIL DE 2025**

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que **LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.** se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Tunja, a los 25 días del mes de abril de 2025

OBDULIO LA ROTTA GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO

CONTADORA

LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 D D F D 9 7 1 E 9 3 3 E F 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40031136 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 67193-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

420

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
40.031.136

NUMERO

ALBA ACEVEDO

APELLIDOS

MIRYAM PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1970**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

05-MAY-1989 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0700100-33147156-F-0040031136-20070416 **02162** 07106B 02 189195775

421

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



67193-T

MIRYAM PATRICIA
ALBA ACEVEDO
C.C. 40031136
RESOLUCION INSCRIPCION 123 FECHA 21/10/1999
UNIVERSIDAD DE BOYACA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COMENARES RODRÍGUEZ 76773

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**
Dirección: **CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**
Teléfono: **7457093**

Fecha Impresión **24/12/13**
No. Remisión: **187095567**
Página: **1 de 11**

Informe N°: **54135**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P *	% Nb *	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633612	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.87	0.18	0.025	0.018	0.004	0.46	0.187	0.068	0.166
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633613	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.87	0.18	0.025	0.018	0.004	0.46	0.187	0.068	0.166
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.94	0.16	0.028	0.020	0.004	0.45	0.218	0.072	0.181
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.94	0.16	0.028	0.020	0.004	0.45	0.218	0.072	0.181
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633404	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.94	0.16	0.028	0.020	0.004	0.45	0.218	0.072	0.181
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623711	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623707	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623706	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623715	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623705	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623703	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634202	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.91	0.18	0.017	0.020	0.003	0.45	0.204	0.060	0.161
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623719	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634201	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.91	0.18	0.017	0.020	0.003	0.45	0.204	0.060	0.161
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623717	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.17	0.019	0.014	0.003	0.45	0.176	0.088	0.182

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

424

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**
Dirección: **CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**
Teléfono: **7457093**

Fecha Impresión **24/12/13**
No. Remisión: **187095567**
Página: **2 de 11**

Informe N°: **54135**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V *	% Mo *
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633612	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.013
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633613	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.013
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.013
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.013
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633404	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.013
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623711	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623707	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623706	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623715	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623705	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623703	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634202	NTC 2289 GR60	Ternium	0.004	0.016
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623719	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634201	NTC 2289 GR60	Ternium	0.004	0.016
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623717	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**
Dirección: **CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**
Teléfono: **7457093**

Fecha Impresión **24/12/13**
No. Remisión: **187095567**
Página: **3 de 11**

Informe N°: **54135**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal * mm2	Carga Fluencia * N	Carga Tracción * N
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633612	NTC 2289 GR60	Ternium	488	622	19	SinGrieta	1.27	129	62980	80288
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633613	NTC 2289 GR60	Ternium	488	622	19	SinGrieta	1.27	129	62980	80288
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633409	NTC 2289 GR60	Ternium	467	593	17	SinGrieta	1.27	129	60197	76543
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633410	NTC 2289 GR60	Ternium	467	593	17	SinGrieta	1.27	129	60197	76543
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633404	NTC 2289 GR60	Ternium	467	593	17	SinGrieta	1.27	129	60197	76543
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623711	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623707	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623706	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623715	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623705	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623703	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634202	NTC 2289 GR60	Ternium	479	632	17	SinGrieta	1.32	129	61795	81589
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623719	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634201	NTC 2289 GR60	Ternium	479	632	17	SinGrieta	1.32	129	61795	81589
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623718	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**
Dirección: **CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**
Teléfono: **7457093**

Fecha Impresión **24/12/13**
No. Remisión: **187095567**
Página: **4 de 11**

Informe N°: **54135**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal * mm2	Carga Fluencia * N	Carga Tracción * N
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623717	NTC 2289 GR60	Ternium	483	634	17	SinGrieta	1.31	129	62254	81729

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633612	NTC 2289 GR60	Ternium	20241211
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633613	NTC 2289 GR60	Ternium	20241211
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633409	NTC 2289 GR60	Ternium	20241211
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633410	NTC 2289 GR60	Ternium	20241211
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633404	NTC 2289 GR60	Ternium	20241211
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623711	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623707	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623706	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623715	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623705	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
Z1-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**
Dirección: **CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**
Teléfono: **7457093**

Fecha Impresión **24/12/13**
No. Remisión: **187095567**
Página: **5 de 11**

Informe N°: **54135**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623703	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634202	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623719	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634201	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623718	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623717	NTC 2289 GR60	Ternium	20241210

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

424

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**
Dirección: **CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**
Teléfono: **7457093**

Fecha Impresión **24/12/13**
No. Remisión: **187095567**
Página: **6 de 11**

Informe N°: **54135**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
					Kg/m	mm	mm	mm
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633612	NTC 2289 GR60	Ternium	0.969	0.93	2.2	8.2
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633613	NTC 2289 GR60	Ternium	0.969	0.93	2.2	8.2
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.982	0.97	2.1	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.982	0.97	2.1	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633404	NTC 2289 GR60	Ternium	0.982	0.97	2.1	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623711	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623707	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623706	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623715	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623705	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623703	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634202	NTC 2289 GR60	Ternium	0.995	1.03	2.5	8.2
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623719	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634201	NTC 2289 GR60	Ternium	0.995	1.03	2.5	8.2
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623717	NTC 2289 GR60	Ternium	0.983	1.00	2.6	8.1

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social:	**Ternium Colombia S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**890932389-8**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**24/12/13**	Informe N°:	**54135**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187095567**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**7 de 11**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Angulo Resalte** °
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633612	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633613	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633409	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633410	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011633404	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623711	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623707	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623706	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623715	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623705	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623703	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634202	NTC 2289 GR60	Ternium	58
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623719	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011634201	NTC 2289 GR60	Ternium	58
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623718	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A011623717	NTC 2289 GR60	Ternium	61

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

425

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**24/12/13**	Informe N°:	**54135**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187095567**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**8 de 11**		

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Composición Química: NTC 5192: 2021 Num. 9.1.2 (ASTM E415) NTC 5231: 2020
* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 NTC 3353: 2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2024
* Doblado: NTC 2289:2020 Num. 10, NTC 3353: 2024, Num. 15, NTC 1:2024
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% C	± 0.0096 %
% Mn	± 0.0360 %
% Si	± 0.0062 %
% S	± 0.0017 %
% P	± 0.0015 %
% Cr	± 0.0219 %
% Ni	± 0.0094 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**
Dirección: **CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**
Teléfono: **7457093**

Fecha Impresión **24/12/13**
No. Remisión: **187095567**
Página: **9 de 11**

Informe N°: **54135**
Informe Ant N°:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% Cu	± 0.0081 %
% V	± 0.0010 %
% Nb	± 0.0026 %
% Mo	± 0.0062%
Resistencia a la Fluencia	± 3.20 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 3.20 Mpa
Alargamiento	± 0.44 %
Altura Resalte	± 0.02411 mm
Separación entre extremos	± 0.075 mm
Espaciamiento	± 0.0299 mm
Angulo de Resalte	± 0.90 °
Peso metro (masa)	± 0.105%

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

426

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**24/12/13**	Informe N°:	**54135**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187095567**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**10 de 11**		

Observaciones

Material: C9006459 **Lote:** A011623703
A
Material: C9006459 **Lote:** A011623705
A
Material: C9006459 **Lote:** A011623706
A
Material: C9006459 **Lote:** A011623707
A
Material: C9006459 **Lote:** A011623711
A
Material: C9006459 **Lote:** A011623715
A
Material: C9006459 **Lote:** A011623717
A
Material: C9006459 **Lote:** A011623718
A
Material: C9006459 **Lote:** A011623719

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**24/12/13**	Informe N°:	**54135**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187095567**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**11 de 11**		

Observaciones

A

Material: C9006459 **Lote:** A011633404

A

Material: C9006459 **Lote:** A011633409

A

Material: C9006459 **Lote:** A011633410

A

Material: C9006459 **Lote:** A011633612

A

Material: C9006459 **Lote:** A011633613

A

Material: C9006459 **Lote:** A011634201

A

Material: C9006459 **Lote:** A011634202

A

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

429


	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-150
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO	FECHA: 2023-12-08


RECEPCIÓN MUESTRA	FECHA ENSAYO	FECHA DE IMPRESIÓN	REFERENCIA DEL PRODUCTO	ÍTEM	No. ENSAYO
2025-03-25	2025-03-26	2025-04-05	MALLA ELECTRO XX-084 (4.0 x 4.0mm)15X15	254	VTF-2787

INFORMACIÓN GENERAL	
CLIENTE	GYJ FERRETERIAS S A.
CIUDAD	Tunja
No. FACTURA	223051
ORDEN DE PRODUCCIÓN	93439
COLADA	X624100132
GRADO DE CALIDAD	5.50 - 1015
DIÁMETRO (mm)	-

Características de la malla (NTC 5806)	Mín.	Máx.	Resultado	¿Cumple?
Dimensión longitudinal (m)	5,94	6,06	5,97	Cumple
Dimensión transversal (m)	2,33	2,37	2,34	Cumple
Separación longitudinal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Separación transversal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Pelos longitudinales (mm)	62,0	88,0	74,0	Cumple
Pelos transversales (mm)	37,0	63,0	49,0	Cumple
Cuantía principal (cm²/ml)	0,84	No aplica	0,84	Cumple
Número de Varillas Longitudinales	16	17	16	Cumple
Número de Varillas Transversales	40	41	40	Cumple
Características del grafil (NTC 5806)	**Mín.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Masa unitaria (gr/m)	93,06	104,94	94,10	Cumple
Espaciamiento de resaltes (mm)	4,62	7,24	5,02	Cumple
Altura promedio resaltes (mm)	0,16	No aplica	0,20	Cumple
Ángulo del resalte (°)	45	70	55	Cumple
Propiedades Mecánicas de la Malla (NTC 5806)	**Mín.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Límite de fluencia (kgf/mm²)	49,46	No aplica	64,88	Cumple
Resistencia a tracción (kgf/mm²)	56,08	No aplica	76,90	Cumple
Esfuerzo cortante (N)	3 599	No aplica	47 837	Cumple

COMPORTAMIENTO
Esfuerzo vs Deformación

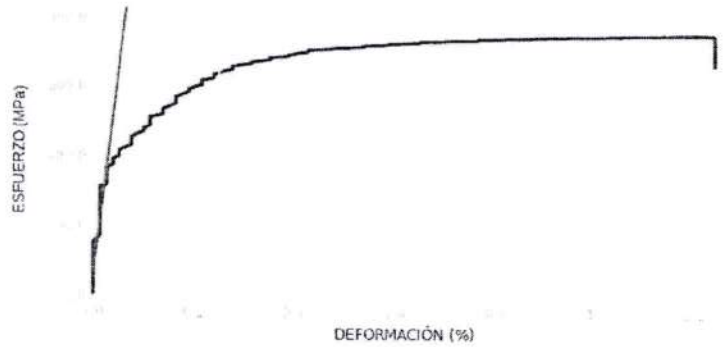



¡Importante! Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 5806:2019 y con el reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas resolución 0277 de Febrero de 2015, La información de las propiedades mecánicas y dimensionales contenida en el presente reporte son valores promedio obtenidos de una muestra del lote especificado en este documento, los muestreos son realizados de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad interno de Alambres y Mallas S.A. - ALMASA, cumpliendo con la norma antes mencionada y siguiendo los lineamientos descritos en la NTC 3353:2008

John Freddy Florez A.	
John Florez	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

PLANTA VENECIA - Cr. 68 D N° 39F - 58 Sur Bogotá - Colombia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

429

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	03	2025	21	03	2025	00:00	21	03	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PARAR EL CUMPLIMIENTO Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES VILES S.A.S. RELACIONADO CON INTERVENCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TCNICA SALAMANCA DE SAMACA, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PBLICA DECLARADA SEGN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/03/2025	25/08/2025	$21,485,174.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/03/2025	25/04/2028	$10,742,587.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$21,485,174.30

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****609,296.00	$ ******20,000.00	$ *****119,566.00	$ **********748,862.00	$ *******53,712,935.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

51-44-101029411

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

430

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	03	2025	21	03	2025	00:00	21	03	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · GANA · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****609,296.00	$ ******20,000.00	$ *****119,566.00	$ **********748,862.00	$ *******53,712,935.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015602213914(3900)000000748862(96)20260321

REFERENCIA PAGO: 1101560221391-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

431

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101009974	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	03	2025	21	03	2025	00:00	25	04	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

BENEFICIARIO: 800016757 - MUNICIPIO DE SAMACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MPARAR EL CUMPLIMIENTO Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES IVILES S.A.S. RELACIONADO CON INTERVENCIN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA TCNICA SALAMANCA DE SAMAC, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PBLICA DECLARADA SEGN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025..

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**21/03/2025**	**25/04/2025**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****111,930.00	$ *******3,000.00	$ ******21,836.00	$ **********136,766.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101009974

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

432

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101009974	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	03	2025	21	03	2025	00:00	25	04	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****111,930.00	$ *******3,000.00	$ ******21,836.00	$ **********136,766.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015602213921(3900)000000136766(96)20260321

REFERENCIA PAGO: 1101560221392-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

De Acuerdo a la inspección Visual referente a la Inundación presentada en el Colegio Santamonca del Municipio de Sgmacá debido al taponamiento de la Alcantarilla y tubería que pasa por entre las instalaciones se determinaron a adelantar para dar solución a esta problemática.

Se determino instalar tubería de 36" en reemplazo de la Existente, que es de menor diámetro la cual se encuentra taponada, además la construcción de 3 pozos de inspección, un sumidero con desarenador y un disipador de Energía ubicados antes de la Entrada a la tubería de la alcantarilla Existente, terminando en un cabezal de salida que entrega la tubería a la Quebrada y demás obras complementarias necesarias.

De Acuerdo a lo Anterior se procede a la localización de los trabajos a Ejecutar para dar comienzo al Contrato.

Marzo 26 de 2025

Como primer paso procedemos a localización y replanteo de la obra teniendo en cuenta los parametros establecidos en visita previa por parte de la Administración Municipal.
Se fijaron los puntos de la tubería, localización de Pozos de inspección niveles de tubería y pendientes respectivas en cada uno de los tramos a construir quedando estipulado que sean las mayores pendientes posibles para darle un mayor flujo y velocidad al agua proveniente de las lluvias evitando depositar el arrastre producido en una escorrentia.
Paralelo a la anterior actividad se adelanta el cerramiento en toma verde de la Zona de trabajo aislando la obra de la circulación propia de las actividades del Colegio.
Antes de dar comienzo a estas actividades se procedio a dotar de Elementos de protección personal a los trabajadores, tales como cascos, botas punta de Acero, guantes, tapabocas, tapaoidos etc.
Se Adelanto igualmente la Afiliacion del personal al sistema de Seguridad Social.
Se instalo Valla informativa de acuerdo al diseño presentado por la Administración Municipal, quedo ubicada en parte visible a la comunidad.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construccion
- 3 Ayudantes

Maquinaria en Obra
- Equipos de topografia.
- Herramienta menor

Marzo 27 / 2025

Una vez adelantados los frentes se procede a cortar la placa de la cancha de baloncesto con un ancho inicial de 1.50 mts y las excavaciones existentes para dar comienzo a las Excavaciones.

En esta labor se encuentran 4 capas de concreto con un espesor aproximado de 32 cm, se hace necesario emplear un taladro perforador y herramienta menor para estas labores.

Igualmente se adelanta la rotura del ciclopeo existente debajo del cerramiento para dar entrega de la tubería a la quebrada dandole la mayor profundidad posible a la entrega.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria en Obra
- Cortadora de Concreto
- Taladro perforador
- Herramienta menor.

Marzo 28 / 2025

Se da comienzo a la Excavación y retiro de sobrantes iniciando de la Quebrada hacia la alcantarilla.
se hace acopio de materiales de construcción tales como Gravilla, Arena lavada, arena sucia, ladrillos, cemento, varilla, etc
De Acuerdo al piso encontrado en la excavación correspondiente a un relleno en material de Escoria de carbon totalmente saturado se hace necesario entibar con madera la zona de Excavación, aun asi se presentan derrumbes que estan dificultando la labor dando como resultado mayores volumenes de excavación y cargue de sobrantes.
Se Adelanta la Excavación para instalar un tubo de 6.50 mts, se hace alistamiento de la base del piso en gravilla de 3/4" para instalar la tuberia, una vez hecho se procede a hacer atraque de la misma hasta medio tubo en gravilla de 3/4 y el relleno en arena tapando el tubo, se instalaron 2 tubos en el dia.

Personal en Obra	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de Oruga
- Maestro General	- 2 Volquetas Sencillas
- Oficial de Construccion	- Compuro compactador
- 3 ayudantes	- Taladro percutor
	- Herramienta menor.

435

Marzo 29 / 2025

Se continua con la Excavación y retiro de sobrantes continua el piso totalmente inestable a pesar del entibado se siguen presentando derrumbes se hace adecuación del botadero estabilizado con retroexcavadora de llantas.
De Acuerdo al registro fotografico se observa el piso de Excavación totalmente inestable lo cual esta ocasionando un mayor Volumen de Excavación y retiro de sobrantes.
Se Adelanta la Instalación de 1 tubo con sus respectivos atraques y rellenos en grabilla y Arena de peña

Personal en Obra	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de llanta
- Maestro General	- Retroexcavadora de Oruga
- Oficial de construccion	- 2 Volquetas Sencillas
- 3 Ayudantes	- Canguro compactador
	- Herramienta menor.

Marzo 31/2025

Se continua con la Excavación y retiro de escombros debido a los derrumbes por el mal estado de los rellenos, la reparación de tuberías de Alcantarillado y regadío no fue posible la instalación de un tubo.
Se hizo reparación de tubería de regadío existente de 4" en P.V.C y otra reparación de tubo de 6" en Gress, se contó con la colaboración del fontanero del Municipio.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retro excavadora de Orugas
- Vibrocuatro Señalizar
- Conguero compactador
- Herramienta menor.

Abril 01/2025

Se da inicio a la construcción del pozo #3 con una altura aproximada de Excavación 3.40 mts se hace placa en concreto de 3000 psi y Acero de refuerzo de 1/2 pulgada en parrilla doble cada 0.15 mts de separación en ambos sentidos.

Continua excavación y retiro de sobrantes para la instalación de un cuarto tubo, se sigue presentando el mismo tipo de suelo inestable ocasionando derrumbes que dificultan el entibado con madera, se hace la instalación del tubo con sus respectivos rellenos y base en gravilla y Arena de peña.

Se hace perfilado manual para alistado de las paredes del pozo igualmente se nivela el piso manualmente.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construccion
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retro Excavadora de Oruga
- 2 Volquetas Sencillas
- Canguro compactador
- Herramienta menor.

Abril 02 / 2025

Se continua con la construcción del Pozo #3, se instalan pasos en varilla 5/8" a cada 40 centimetros.
Se sigue adelantando excavación y retiro de sobrantes continúa el mismo piso de Excavación afectando la instalación de la tubería en el día de hoy, no pudiendo avanzar con este labor.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria
- 1 retroexcavadora de Oruga
- 2 Volquetas Sencillas
- Herramienta menor.

Abril 03 / 2025

Se procede a hacer el desmonte de adoquín en las zonas por donde va a pasar la Excavación por el uso de maquinaria pesada y el transito de las volquetas para el retiro de los escombros se debe retirar todo el ancho entre las casas (Salomas). continua construcción de pozo # 3 se deja a la altura de construcción de la tapa en concreto. Luego excavación y retiro de escombros, el piso continua muy inestable, se retira un poste de alumbrado evitando así accidentes, se instala un tubo.

Personal en Obra	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de Oruga
- Maestro General	- 2 Volquetas Sencillas
- Oficial de Construcción	- Canguro compactador
- 3 ayudantes	- Herramienta menor

Abril 04 / 2025

Se continua con excavación y retiro de sobrantes sigue el piso en las mismas condiciones ocasionando mayores volumenes de excavación y retiro.
Se construyeron cañuelas y pañete impermeabilizado hasta 1.20 mts de Altura. en el pozo #3.
La Entidad contratante suministro 7 tubos de 36 pulgadas por 6.50 mts de longitud el contratista suministro 4 tubos para completar la longitud de la tubería.
Se suministro tubería de 6" para adelantar reparaciones de tubería existente que recoje aguas negras y lluvias conectadas a la tubería existente se instala tubo de 36 pulgadas con sus respectivos rellenos en gravilla y arena de peña.

Personal en Obra	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de Oruga
- Maestro de Obra	- 2 Volquetas Sencillas
- Oficial de Construcción	- Conjunto compactador
- 3 Ayudantes	- Herramienta menor

Abril 05 / 2025

Manualmente se hace excavación sobre los tubos electricos, el tecnico electrico suspendio la corriente en este sector de trabajo levantando cables y tuberias existentes evitando de esta manera cualquier incidente. se da comienzo a la construcción del pozo # 2 con una profundidad aproximada de Excavación de 3.50 mts, se funde placa de piso en concreto reforzado parilla doble de 1/2 pulgada cada 15 cms en ambos Sentidos.
se instala un tubo de 36" del pozo # 2 al pozo # 1, se da comienzo a la Instalacion de una red paralela en 6 pulgadas que va a recoger las tuberías existentes que llegan al Pozo actual y tuberia principal, esta tuberia se entrega en el pozo # 2
se hizo limpieza de la Cancha de balonesto, observando hundimiento y rotura en la placa existente debido a los derrumbes y trabajo de la maquinaria por los pisos de mala calidad.

Personal en obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retroexcavadora de Oruga
- 2 Volquetas Sencillas
- Compuro compactador
- Herramienta menor.

Abril 07/2025

Se continua con la construcción del Pozo #2 se levanta mamposteria y pasos en Varilla 5/8" cada 0.40 mts.
Continua excavación y retiro de Sobrantes, se hacen las bases y atraques en grava de 3/4" y relleno tapando el tubo completo en arena de peña.
Continua construcción de la Red paralela en 6 pulgadas.

Personal en Obra	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de Oruga
- Maestro General	- 2 Volquetas sencillas
- Oficial de Construcción	- Herramienta menor
- 3 ayudantes	

Abril 09 / 2025

Se continua al abanante de los adoquines en la zona de trabajo.
Se termino la construccion del pozo # 2, se procede a formar los cañuelos en concreto y pañetes impermeabilizados hasta una altura de 1.20 mts
Se continua excavación y retiro de sobrantes, los pisos existentes continuan siendo muy inestables.
Se instala un tubo de 6.50 mts más un tramo más pequeño de 2.60 mts con el fin de no dejar que se cierre la Excavación adelantada con sus respectivos atraques y rellenos en gravilla 3/4" y arena de peña.

Personal en Obra	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de Oruga
- Maestro General	- 2 Volquetas Sencillas
- Oficial de Construcción	- Canguro compactador
- 3 ayudantes	- Herramienta menor.

Abril 09 /2025

Se continua desmonte de Adoquín en la zona de trabajo para la reutilización del mismo se estan limpiando y enzarando de forma adecuada.
Se continua instalación de 6 pulgadas paralela a la red de alcantarillado de 36" pulgadas para recoger toda la tubería existente en otros diametros, se hace reparación de caja existente que recoge las aguas lluvias de las cubiertas.
Se vuelve hacer limpieza de Escombros sobre la cancha de baloncesto con una retroexcavadora de llantas.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construccion
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retroexcavadora de llantas
- 2 Volqueteas Sencillas
- Herramienta menor.

Abril 10 / 2025

Nuevamente se cuantificaron los daños que se han ocasionado sobre la placa de la cancha de baloncesto y las escaleras existentes, se ve la necesidad de hacer reparaciones mayores tanto en la placa como en la escalera.
Se continua con la excavación y retiro de sobrantes para instalación de tubería de 36 pulgadas.

Personal en Obra	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de Oruga
- Maestro General	- Vibroapisonador
- Oficial de Construccion	- Compactador
- 3 Ayudantes	- Herramienta menor.

Abril 11 de 2025

Se Continua con la excavación y retiro de sobrantes para la instalación de tuberías.
continua presentandose derrumbes en la excavación demorando el trabajo de instalación de tuberías.
Se continua instalación de ad parabla en 6 pulgadas que va abanderado a medida que se instala la tubería principal.

Personal en Obra.	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de Oruga
- Maestro General	- 2 Volquetas Sencillas
- Oficial de Construcción	- Conjunto compactador
- 3 Ayudantes	- Herramienta menor.

441

Abril 12/2025

Se continua excavación y retiro de sobrantes para instalación de tubería de 36 pulgadas.
Sigue instalación de tubería para bala en 6 pulgadas para recoger aguas negras y aguas lluvias existentes previamente.
Se instala un tubo de 36 pulgadas con sus respectivos rellenos y atraques en gravilla y arena de peña.
Se toma la decisión de no trabajar en la semana santa ya que algunos de los trabajadores solicitaron permiso por compromisos de familia y no se contaba con el personal suficiente para adelantar las labores en Obra.
Se retoma labores en la semana de Pascua.

Personal en Obra	Maquinaria
- Ingeniero Residente	- Retroexcavadora de Oruga
- Maestro General	- 2 Volquetas Sencillas
- Oficial de Construcción	- Compactador
- 3 Ayudantes	- Herramienta menor.

Abril 21 /2025

Se reanudan labores de acuerdo a lo establecido con el personal de Obra.
Se da por terminada la labor de desmonte y limpieza de adoquín.
Se hizo charla de capacitación ~~de~~ en seguridad industrial por parte de la Ingeniera ambiental y de seguridad Diana Ovalle Aquiteru (SSTT de la Obra) haciendo enfasis en el uso permanente de los elementos de protección personal de igual manera mantener los cerramientos en ~~lona~~ lona Verde y cinta de protección en las zonas de trabajo impidiendo el acceso de personal que no tenga nada que ver con la Obra.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retroexcavadora de Oruga
- 2 Volquetas Sencillas
- Herramienta menor.

442

Abril 22/2025

Se da inicio a la Excavación manual para la construcción del Caseta de salida es necesario hacerle un buen soporte a la tubería para lo cual se excavo mas o menos 30 cmts por debajo de la batea del tubo para poder hacer un buen relleno en piedra y Concreto Simple y Acero de refuerzo.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 Ayudantes

Maquinaria
- Retroexcavadora de Oruga
- Herramienta menor.

Abril 23/2025

Se adelanta solicitud por parte del Contratista para la aprobación de Items no previstos que se hacen necesarios para el desarrollo de la obra.
Tambien se adelanto solicitud de prorroga en el tiempo de ejecución del contrato debido a factores como el descanso en semana Santa, mal tiempo reinante en la zona y aprobación de Items no previstos.
De igual manera se solicita un adicional el precio del contrato inicial teniendo en cuenta la aprobación de Items no previstos en la ejecución de la Obra.
Se adelanta la Construcción de las placas de los 2 pozos construidos dejando terminada la Instalación de Oro-tapas en concreto.
No se ha terminado la Instalación de tubería de 36 pulgadas y Pozo #1 hasta la aprobación de Items no previstos.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retroexcavadora de Oruga
- Herramienta menor

443

Abril 24 / 2025

Se termino la fundida de las placas de los postes construidos, se hizo placa de piso en concreto reforzado para el cabezal de salida, se formaleteo para levantar muros de esta estructura.

Personal en Obra.
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retroexcavadora de Oruga
- Herramienta menor.

Abril 24 / 2025

Se termino la fundida de las placas de los pozos construidos, se hizo placa de piso en concreto reforzado para el acceso de salida, se formaleteo para levantar muros de esta estructura.

Personal en Obra.
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retroexcavadora de Oruga
- Herramienta menor.

Abril 25 / 2025

Se aprueba por parte de la Administración Municipal la solicitud adelantada por parte del contratista referente a Items no previstos, prorroga en el tiempo de ejecución del contrato y adicional en precio del mismo.
dentro de los Items aprobados estan:
- Rellenos en Material Seleccionado
- Instalacion de Adoquin
- Mano de obra comun
- Desmonte de cubiertas
- Limpieza de Alcantarilla
- Desmonte de Estructura metálica
- Instalación de Cubierta
- Instalación de Estructura metálica
- Instalación Accesorios PVC de 6, y 3 pulgadas
- Instalación tubería de 4 pulgadas
- Instalación y suministro tubería eléctrica

De acuerdo a lo anterior se procede al desmonte de la Estructura metálica y las cubiertas para poder continuar con la Excavación y retiro de Escombros para la Instalación de la tubería de 36 pulgadas.

Personal en Obra
- Ingeniero Residente
- Maestro General
- Oficial de Construcción
- 3 ayudantes

Maquinaria
- Retroexcavadora de Oruga
- 2 Volquetas sencillas
- Herramienta menor.

Pus Estructuras

Placa

Sergio 445

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA
MUNICIPIO DE SAMACÁ
DANE: 215646000170
Registro Educativo: 7912301515
Licencia de funcionamiento: Resolución No, 000130 del 22 de enero de 2009
NIT: 820002203-2

SD-0082_2025

Samacá, 25 de Abril del 2025

Ingeniero
DANILO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Samacá

Asunto: Solicitud visita para informar sobre aspectos relacionados con las obras en curso

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, de acuerdo al asunto en mención, me permito solicitar de manera atenta la realización de una visita por parte de su equipo de trabajo a nuestra **Institución Educativa Técnica Salamanca Sede Central Secundaria**, con el fin de socializarles algunos aspectos relevantes que pueden contribuir al aprovechamiento, embellecimiento y mejoramiento de las obras que actualmente se están ejecutando en el marco de la emergencia presentada en nuestra institución, puesto que el contratista manifiesta unos limites en su intervención que deben ser atendidos directamente desde su oficina.

Agradezco su atención y disposición para coordinar esta visita en el menor tiempo posible; pues algunas situaciones específicas requieren de su conocimiento e intervención oportuna, quedo atenta a la confirmación de fecha y hora según su disponibilidad.

Cordialmente,

Mgtr.DEISY AMAPOLA VÁSQUEZ GUERRERO
Rectora

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAMACÁ - BOYACÁ
COMUNICACIÓN RECIBIDA
Radicado No. 602
Fecha: 25/04/25 Hora:
Asunto: Solicitud
Nº Folios: 1 Anexos:
Canal Recepción: Personal
Recibido Por: Catalina P

Notificaciones correo rector.samacatecnicosalamanca@sedboyaca.gov.co
Correo institucional: samacatecnicosalamanca@sedboyaca.gov.co
Celular:3133708928Contacto: Deisy Amapola Vásquez Guerrero- Rectora

República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Samacá
Nit. 800016757-9

446

Samacá, 09 de mayo de 2025

Ref.: SP-2025-5-417

Rectora
MGTR. DEISY AMAPOLA VÁZQUEZ GUERRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA
samacatecnicosalamanca@sedboyaca.gov.co

Referencia: RESPUESTA SOLICITUD 602 DE FECHA 25/04/2025

Respetada Rectora

En primer lugar, permítame extenderle un cordial y fraternal saludo y desearles éxitos en sus labores diarias

En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que una vez analizada técnica y financieramente su solicitud, no es posible atender la misma ya que el proyecto que actualmente se encuentra en ejecución dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Técnica Salamanca – Sede Bachillerato a través del Contrato de Obra Pública CD-CO-003-2025 cuyo objeto es "**INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025"**, ya cuenta con cierre financiero y sus actividades están próximas a culminar, adicional a ello, las obras adicionales que solicita la Institución están fuera del alcance del proyecto.

No obstante, en visita realizada el día lunes 05 de mayo de 2025, el contratista de obra mencionó que, ya que los materiales necesarios para la realización de las adecuaciones menores solicitadas por la Institución Educativa son aportados por esta, se comprometía a aportar la mano de obra para llevarlas a cabo por sus propios medios, entendiendo esto por fuera del contrato que se ejecuta con la Administración Municipal.

Sin otro particular,

DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Samacá

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAMACÁ - BOYACÁ
COMUNICACIÓN ENVIADA
Radicado No. S 317
Fecha: 9/05/25
Asunto: Respuesta PQR 602
Canal de Envió: Correo

Proyectó: Sergio Alejandro Anzola Pinzón / Profesional Universitario Sec. Planeación
Revisó y Aprobó: Danilo Alexander Vianchá Valderrama Sec. Planeación y Obras Públicas

Gmail

Secretaria de Planeacion Municipio de Samacá <planeacion@samaca-boyaca.gov.co>

RTA RAD 602

Secretaria de Planeacion Municipio de Samacá <planeacion@samaca-boyaca.gov.co> 12 de mayo de 2025, 12:40 p.m.
Para: IET Salamanca - Samacá <samacatecnicosalamanca@sedboyaca.gov.co>

Cordial saludo

En respuesta a su solicitud por medio de la presente me permito enviar documento adjunto para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente

--
--
Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Samacá
Teléfono y Fax: 737 2095 / 737 2890 / 7372083 / 313 - 8892193
Email: contactenos@samaca-boyaca.gov.co - planeacion@samaca-boyaca.gov.co
Código Postal: 153660
Carrera 6 No. 4 - 53
Samacá - Boyacá

*Este mensaje contiene **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** destinada solo para el uso de las direcciones nombradas arriba. Cualquier revisión, distribución, divulgación, uso de ésta información por otras personas, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido éste mensaje por error, por favor avise inmediatamente al remitente y borre el mensaje original. This message contains **CONFIDENTIAL INFORMATION** intended solely for the use of the address named above. Any review, disclosure, distribution, copying or use of the information by others is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender by immediate reply and delete the original message.*

RTA RAD 602.pdf
464K

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

448

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101009974	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	25	05	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5	CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9	CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

BENEFICIARIO: 800016757 - MUNICIPIO DE SAMACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. RELACIONADO CON INTERVENCIN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA TCNICA SALAMANCA DE SAMAC, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PBLICA DECLARADA SEGN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025..

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/03/2025	25/05/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN AMAPROS CONTRATADDOS SEGUN :
MODIFICACION 1, ADICIONAL N1, PRORROGA N1 AL CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025,SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******95,940.00	$ *******3,000.00	$ ******18,798.00	$ **********117,738.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101009974
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101009974	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	25	05	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******95,940.00	$ *******3,000.00	$ ******18,798.00	$ **********117,738.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015602230632(3900)000000117738(96)20260321

REFERENCIA PAGO: 1101560223063-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101009974	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	25	05	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.		NIT: 820.003.826-5	
DIRECCIÓN: CRA 12 NO 21-50	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SAMACA		NIT: 800.016.757-9	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 4 - 53	**CIUDAD:** SAMACA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7372095

BENEFICIARIO: 800016757 - MUNICIPIO DE SAMACA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101009974

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

450

	APROBACION DE POLIZA	

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO										
Número del Contrato	CD-CO-003-2025									
Fecha del Contrato	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)									
Valor del Contrato	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($236,218,279) M/CTE									
Nombre del Contratista	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.									
Número de Identificación	820.003.826-5	Tipo	C.C		CE		NIT	X		

2. IDENTIFICACION DE LA POLIZA			
Compañia Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Número de Póliza	51-40-101009974		
Fecha de Expedición	29/04/2025	Anexo	1

4. DESCRIPCION DE AMPAROS DE LA POLIZA							
No	TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo	Aprobado		Observaciones
		desde	hasta		SI	NO	
1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2025	25/05/2025	$284,700,000.00	X		

5. APROBACION DE LA POLIZA		
¿La póliza es aprobada?	SI [X] NO [ ]	
Nombre de quien revisa	YENNI MARCELA GARCIA SIERRA	Firma
Fecha de diligenciamiento	DOS (2) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)	

6. RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN SIN APROBACION		
Nombre de quien recibe		
Fecha		Firma
Hora		

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	21	03	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. RELACIONADO CON INTERVENCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TCNICA SALAMANCA DE SAMACA, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PBLICA DECLARADA SEGN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/03/2025	25/08/2025	$23,621,827.90	$21,485,174.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/03/2025	25/04/2028	$11,810,913.95	$10,742,587.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$23,621,827.90	$21,485,174.30

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESETE ANEXO SE AJUSTAN AMPAROS CONTRATADOS SEGUN : MODIFICACION 1, ADICIONAL N1, PRORROGA N1 AL CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025,SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******58,628.00	$ *******8,000.00	$ ******12,659.00	$ **********79,287.00	$ *******59,054,569.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101029411

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	21	03	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5	CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9	CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA | MasterCard

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******58,628.00	$ *******8,000.00	$ ******12,659.00	$ **********79,287.00	$ *******59,054,569.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015602230600(3900)000000079287(96)20260429

REFERENCIA PAGO:
1101560223060-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	21	03	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.		NIT: 820.003.826-5	
DIRECCIÓN: CRA 12 NO 21-50	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SAMACA		NIT: 800.016.757-9	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 4 - 53	**CIUDAD:** SAMACA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7372095

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101029411

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

453

	APROBACION DE POLIZA	

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO									
Número del Contrato	CD-CO-003-2025								
Fecha del Contrato	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)								
Valor del Contrato	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($236,218,279) M/CTE								
Nombre del Contratista	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.								
Número de Identificación	820.003.826-5	Tipo	C.C		CE		NIT	X	

2. IDENTIFICACION DE LA POLIZA			
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Número de Póliza	51-44-101029411		
Fecha de Expedición	29/04/2025	Anexo	1

4. DESCRIPCION DE AMPAROS DE LA POLIZA							
No	TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo	Aprobado		Observaciones
		desde	hasta		SI	NO	
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/03/2025	25/08/2025	$ 23.621.827,90	X		
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	21/03/2025	25/04/2028	$ 11.810.913,95		X	
3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$ 23.621.827,90	X		

5. APROBACION DE LA POLIZA		
¿La póliza es aprobada?	SI [ ] NO [X]	
Nombre de quien revisa	YENNI MARCELA GARCIA SIERRA	Firma
Fecha de diligenciamiento	DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)	

6. RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN SIN APROBACION		
Nombre de quien recibe		
Fecha		Firma
Hora		

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	17	05	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. RELACIONADO CON INTERVENCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TCNICA SALAMANCA DE SAMACA, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PBLICA DECLARADA SEGN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/03/2025	17/09/2025	$23,621,827.90	$23,621,827.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/03/2025	17/05/2028	$11,810,913.95	$11,810,913.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$23,621,827.90	$23,621,827.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESETE ANEXO SE AJUSTAN AMPAROS CONTRATADOS SEGUN : MODIFICACION 1, ADICIONAL N1, PRORROGA N1 AL CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025,SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******11,442.00	$ *******4,000.00	$ *******2,934.00	$ **********18,376.00	$ *******59,054,569.75	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101029411

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	17	05	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5	7437451

DIRECCIÓN: CRA 12 NO 21-50 — CIUDAD: TUNJA, BOYACA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9	7372095

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 4 - 53 — CIUDAD: SAMACA, BOYACA

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GANGAZO · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******11,442.00	$ *******4,000.00	$ *******2,934.00	$ **********18,376.00	$ *******59,054,569.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN FORERO GARCIA	132922	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11015602230618 (3900) 000000018376 (96) 20260321

REFERENCIA PAGO: 1101560223061-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	04	2025	21	03	2025	00:00	17	05	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.		NIT: 820.003.826-5	
DIRECCION: CRA 12 NO 21-50	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELEFONO:**	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SAMACA		NIT: 800.016.757-9	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 4 - 53	**CIUDAD:** SAMACA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7372095

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101029411

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	APROBACION DE POLIZA	

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO										
Número del Contrato	CD-CO-003-2025									
Fecha del Contrato	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)									
Valor del Contrato	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($236,218,279) M/CTE									
Nombre del Contratista	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.									
Número de Identificación	820.003.826-5	Tipo	C.C		CE		NIT	X		

2. IDENTIFICACION DE LA POLIZA			
Compañia Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Número de Póliza	51-44-101029411		
Fecha de Expedición	29/04/2025	Anexo	2

4. DESCRIPCION DE AMPAROS DE LA POLIZA							
No	TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo	Aprobado		Observaciones
		desde	hasta		SI	NO	
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/03/2025	17/09/2025	$ 23.621.827,90	X		
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	21/03/2025	17/05/2028	$ 11.810.913,95	X		
3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$ 23.621.827,90	X		

5. APROBACION DE LA POLIZA		
¿La póliza es aprobada?	SI [X] NO [ ]	
Nombre de quien revisa	YENNI MARCELA GARCIA SIERRA	Firma
Fecha de diligenciamiento	DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)	

6. RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN SIN APROBACION		
Nombre de quien recibe		Firma
Fecha		
Hora		

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-013	Página 1 de 1
		Versión 1	7/09/2015

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. DOS (02)

CIUDAD Y FECHA:	SAMACÁ, 08 DE MAYO DE 2025
ACTA No.	DOS (02)
OBJETO:	INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025".
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA:	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. R/L OBDULIO LA ROTTA GARCIA
NIT Y/O C.C	NIT 820.003.826-5 C.C No. 6.765.982 Expedida en Tunja
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	Rubro No. 2.3.2.02.02.005.02 – Construcción y mantenimiento de la Infraestructura Educativa. Registro presupuestal No. 2025000355 de fecha 21 de marzo de 2025.
CONTRATO:	CD-CO-003-2025
SUPERVISOR:	SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON Profesional Universitario - Supervisor
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($214`851.743,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA):	VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 21.366.536,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 236,218,279.00) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO:	UN (01) MES
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	QUINCE (15) DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	N/A
FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN 1	N/A
FECHA DE REINICIO 1	N/A
ADICIONES (SI APLICA):	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
***CUMPLIMIENTO**	T

* (T: CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS) (P: CUMPLE PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (N: NO CUMPLE LAS ACTIVIDADES PACTADAS)

PRIMERO: Modificar las cantidades de los ítems inicialmente contratados según balance adjunto al presente documento.

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-013	Página 1 de 1
		Versión 1	7/09/2015

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. DOS (02)

SEGUNDO: Se anexa documento donde se presenta la justificación técnica de las catidades que varian durante la ejecución de la obra, así como de los items no previstos que se requieren como complementación a la misma.

En Samacá, a los OCHO (08) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco (2025), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de modificación de cantidades No.02.

LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
R/L OBDULIO LA ROTTA GARCIA
C.C. 6.765.982 EXPEDIDA EN TUNJA
CONTRATISTA

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON
Profesional Universitario
SUPERVISOR

Anexo: Documento técnico de justificación de cantidades
Anexo Sábana de Modificación de Cantidades N°2.

CONTRATO	CONTRATO CD-CO-003-2025 - INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAMACÁ

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES

ITEM	JUSTIFICACIÓN
2.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500); 40% RAJON PARA ELEVACIONES	El menor valor corresponde a una corrección menor en el cálculo del volumen de concreto ciclópeo para la estructura de entrada.
4.02 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	Las mayores excavaciones se dan por que se tiene un material orgánico con una saturación alta debido al taponamiento de las tuberías de la alcantarilla de la vía y del alcantarillado pluvial y sanitario del colegio. El material excavado fue de tipo orgánico y escoria de carbón, dando como resultado derrumbes de gran dimensión.
4.04 RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	El volumen corresponde a una base de 20 centímetros de gravilla y el atraque a medio tubo. Hay un menor valor por que la sección final cambió por una menor longitud de tubería instalada con respecto a las estimaciones iniciales.

ITEM	JUSTIFICACIÓN
4.05 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	Hay un mayor valor teniendo en cuanta que aumentaron las secciones de la excavación debido a los derrumbes que se ocasionaron, al tener un material orgánico inestable con una saturación alta.
4.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	El valor es menor por que los volúmenes corresponden al ítem de RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. En este ítem se tienen en cuenta el mejoramiento del piso de los pozos y la adecuación del piso para la instalación de adoquines (para darle un piso uniforme a la base en arena)
4.07 DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.	El menor valor en área corresponde a las medidas finales intervenidas en el sitio de la construcción. Corresponde al piso de la cancha y una franja de la escalera.
4.08 PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	El mayor valor en este ítem se evidencio en la intervención de la cancha para la excavación e instalación de la tubería de alcantarillado, se observa que la base de la cancha cuenta con materiales saturados de baja calidad que no tienen la capacidad portante necesaria. Al ingresar la maquinaria pesada y una vez abierta la sección de alcantarillado, el soporte inicial que tenían las placas se derrumbó, lo que ocasionó rotura y hundimiento de las mismas. Para dar servicio nuevamente a la cancha se realiza una reconstrucción de toda el área afectada. De igual manera las escaleras son de concreto simple (no reforzado), por lo que se encontraban agrietadas, además se vieron afectadas por la intervención de la maquinaria para abrir la sección de excavación y la baja calidad de los materiales de soporte. La mayor longitud de escalera se debe a que los rellenos existentes son de muy baja calidad y además se vio la necesidad de hacer una rampa de acceso para el ingreso de los materiales y retiro de los sobrantes, lo anterior por que era la única zona para el ingreso de maquinaria pesada.
4.09 DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	El menor valor de cantidades se debe a la medición real hecha en obra de acuerdo a las áreas trabajadas.

ITEM	JUSTIFICACIÓN
4.10 ADOQUIN DE GRES	Hay un menor valor porque se hizo la recuperación y limpieza de los adoquines retirados en el área de trabajo, elementos que se encontraban en buen estado. El adoquín suministrado corresponde a elementos que se encontraban en muy mal estado y no era posible instalarlos nuevamente.
4.11 DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO)	La escalera existente no es de concreto reforzado sino de concreto simple, por lo tanto este ítem no se ejecutó y la actividad corresponde a otro ítem.
4.12 ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Este ítem esta en cero por que se requiere realizar la escalera con placa de concreto de 10 cm y malla electrosoldada.
4.13 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	De acuerdo a la justificación técnica dada en el ítem de excavación mecánica, los volúmenes aumentaron debido a los derrumbes presentados.
4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	De acuerdo a las medidas de trabajo la longitud por ejecutar es menor a lo estimado inicialmente.
4.17 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=36"	Se determinó por medidas la longitud real del proyecto dando como resultado un menor valor a ejecutar.
4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	El valor de la longitud aumentó por que se hizo una estimación inicial sin conocer el detalle de las redes sanitarias y pluviales del colegio. Una vez abiertas las excavaciones se encontraron todas las instalaciones existentes, las cuales fueron conectadas directamente a los pozos de inspección ya que originalmente se encontraban instaladas a la tubería existente previamente. El diámetro instalado corresponde a la capacidad necesaria para evacuar el caudal de aguas lluvias y aguas negras del colegio.

ITEM	JUSTIFICACIÓN
4.21 CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	Hay un aumento en el volumen de corte dado que se encontraron cuatro capas instaladas de concreto simple con un espesor total de 30 cm.
5.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	La menor medida corresponde a las medidas adelantadas en obra de acuerdo a la necesidad de ejecución.
5.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	No hubo necesidad de adelantar esta actividad, lo cual también se debió a la imposibilidad de entrar una maquina a la zona de trabajo por lo cual se hizo solamente excavación manual.
5.05 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	El menor valor corresponde a un ajuste en el cálculo de las dimensiones de los muros, teniendo en cuenta el espacio disponible en el sitio de la construcción.
5.06 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	El menor valor corresponde a un ajuste en el cálculo de las dimensiones de los muros, teniendo en cuenta el espacio disponible en el sitio de la construcción.
5.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 175 MPA (2500), 40 % RAJON PARA ELEVACIONES	Inicialmente no se ve la necesidad de adelantar este item teniendo en cuenta las condiciones de la estructura a construir.
NP1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	Una vez tapado el tubo con arena de peña se procede a realizar un relleno con material de afirmado compactado con la altura correspondiente a la rasante del terreno. Esta altura es variable a lo largo de la sección de excavación debido a las pendientes propias de la instalación de la tubería. Este ítem no fue previsto en las cantidades iniciales del proyecto.
NP2: INSTALACIÓN DE ADOQUÍN	Como se explicó en item de suministro e instalación de adoquín, en este item se presenta solamente la instalación de los adoquines que fueron recuperados luego del desmonte inicial de los adoquines existentes.
NP3: MURO TOLETE COMUN	Los muros en tolete común corresponden a las contrahuellas de la escalera a reconstruir de la cancha, teniendo en cuenta que las contra huellas de la escalera existente eran de este material para conservar el mismo procedimiento constructivo.

ITEM	JUSTIFICACIÓN
CABEZAL DE SALIDA ALCANTARILLA	El cabezal de salida es una estructura hidráulica para dar soporte y protección ante la erosión causada por la corriente de la quebrada. En este punto se entrega el caudal del alcantarillado construido a la quebrada.
NP4 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	Para adelantar los trabajos de excavación, retiro de sobrante y suministro de material de rellenos, se vio la necesidad de desmontar parte de la estructura y cubierta de uno de los espacios de encuentro del colegio, aledaño al sitio de trabajo, facilitando de esta manera el movimiento de las maquinas
NP5 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM	La tubería de la alcantarilla existente se encontró totalmente saturada y tapada con materiales depositados por el arrastre de las lluvias, por esta razón se adelantó la limpieza correspondiente.
NP6 DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS.	Para adelantar los trabajos de excavación, retiro de sobrante y suministro de material de rellenos, se vio la necesidad de desmontar parte de la estructura y cubierta de uno de los espacios de encuentro del colegio, aledaño al sitio de trabajo, facilitando de esta manera el movimiento de las maquinas
NP7 INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO NUMERO 10	Teniendo en cuenta que la cubierta en teja fue retirada es necesario reinstalarla para entregar los trabajos en las condiciones iniciales.
NP8 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	Teniendo en cuenta que la estructura metálica de la teja fue retirada es necesario reinstalarla para entregar los trabajos en las condiciones iniciales.
NP9 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"	Se construyó una red paralela a la tubería de 36" en tubería de 6" para recoger el caudal sanitario y pluvial del colegio para lo cual fue necesario la instalación de los codos del mismo diámetro.
NP10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	Se instaló tubería de 4" para las conexiones domiciliarias previamente existentes.

ITEM	JUSTIFICACIÓN
NP11 UNIÓN PVC SANITARIA D=3"	Es ítem corresponde la recuperación de las tuberías existentes que se rompieron en el proceso de excavación, viéndose la necesidad de instalar accesorios.
NP12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Se instaló tubería PVC Conduit para recuperar las redes existentes que se dañaron en los trabajos de excavación.

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES

MODIFICACION No 2

ITEM	JUSTIFICACIÓN
2.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	El mayor valor se debe a la necesidad de mejorar el piso existente para darle un mayor soporte en pedraplen a la placa de piso a construir para el disipador.
2.02 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Se presentó un mayor volumen debido a la necesitad de profundizar la excavación buscando un mejor piso de soporte para la estructura y poder hacer un mejoramiento en pedraplen.
2.03 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS.	El mayor volumen de cantidades se debe a las medidas reales de obra una vez finalizada la obra.
2.04 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.	El menor valor en el volumen de concreto se debe a el cambio a la altura de los muros de acuerdo a la necesidad y adecuación a las rasantes del terreno existente.
2.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500); 40% RAJON PARA ELEVACIONES	El menor valor en el volumen de debe a medidas reales de obra de acuerdo a lo ejecutado.

ITEM	JUSTIFICACIÓN
2.06 SUMNISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 420 MPa.	El mayor valor se debe a darle a la estructura la mejor cuantía hierro-concreto que garantice la estabilidad de la obra.
3.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN.	El menor valor en este ítem se debe a las medidas reales de obra con respecto a lo previsto.
3.02 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO.	El mayor volumen de cantidades se presentó por la necesidad de construir un buen desarenador de mayor profundidad que deposite los materiales de arrastre y no tapen las tubería de alcantarillado y alcantarilla.
3.03 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO.	El mayor valor es debido a la excavación más profunda buscando un mejor piso de cimentación para darle un mayor soporte a la estructura del desarenador mejorando el piso con un mayor espesor de relleno en capas con material de afirmado compactado.
3.04 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS.	La mayor cantidad en el volumen de concreto se debe al aumento de área en la construcción de una estructura de mayor capacidad a la prevista.
3.05 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.	La menor cantidad se debe a una menor altura de los muros de acuerdo a la estructura de la alcantarilla existente y la rasante propia del terreno.
3.06 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS.	Este item no se hizo necesario porque se tiene que preveer un mantenimiento frecuente del desarenador para evitar taponamiento de las tuberías por el arrastre de materiales ocasionado por la escorrentía.
3.07 SUMNISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 420 MPa.	La menor cantidad se debe a la disminución en la altura de los muros del desarenador como se mencionó anteriormente.
4.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO.	El mayor valor de debe a las medidas reales una vez terminada esta actividad de obra.
4.07 DEMOLICION PLACA DE PISO ESPESOR = 10 cm.	Se presentó una mayor cantidad de demolición de la prevista por los derrumbes ocasionados por los rellenos existentes de mala calidad y el peso de la

ITEM	JUSTIFICACIÓN
	maquinaria utilizada en el desarrollo de la obra, ocasionando deterioro en la estructura existente..
4.08 PLACA BASE EN CONCRETO E = 10 CM 2500 PSI.	El mayor volumen se debió a la petición por parte de la Rectora para la construcción placas en dos áreas pequeñas en la zona del Colegio que les estaba causando humedades.
4.09 DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO.	Se presentó una mayor cantidad una vez se adelantaron las medidas que se ejecutaron en esta actividad.
4.10 ADOQUIN DE GRESS	La menor cantidad de debe a que se recuperó la mayor cantidad de piezas posibles de adoquín existente realizando una limpieza y lavado del mismo.
4.13 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOSPRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACCARREO LIBRE).	El mayor volumen de retiro de materiales se debe a los derrumbes ocasionados por la mala calidad de los pisos existentes que se encontraron en las excavaciones.
4.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC DE 6 ".	El mayor valor se debe a la necesidad de recoger todas las tuberías existentes que se encontraban conectadas a la tubería vieja, se remodelo construyendo una red independiente que va conectada directamente a los pozos de inspección.
4.20 BORDILLO DE 8 X 15 FUNDIDO EN CONCRETO.	Se reconstruyo una mayor cantidad de bordillos a los que se encontraron en el desmonte de adoquín prefabricado porque se vio la necesidad de construir una cuneta que recoja las aguas en un sector de adoquín haciendo un bordillo por cada lado de la misma.
4.21 CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS.	El mayor valor en este ítem se debe a los cortes en la placa que no estaban previstos, hubo necesidad de hacerlos para reponer las placas que fallaron por el hundimiento de las mismas y el trabajo de la maquinaria.
5.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	El mayor valor en la cantidad de excavación se debe a la cota de instalación del tubo de arranque, que debe pasar por debajo de las vigas del cerramiento del Colegio.
5.03 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	El menor valor corresponde a un ajuste en el área de trabajo de esta estructura, teniendo en cuenta el espacio disponible en el sitio de la construcción.

ITEM	JUSTIFICACIÓN
5.04 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS.	El menor valor se debe al ajuste en las dimensiones de la estructura para el cabezal de salida en bases y elevaciones.
5.05 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.	El menor valor se debe al ajuste en las dimensiones de la estructura para el cabezal de salida en bases y elevaciones.
5.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500); 40% RAJON PARA ELEVACIONES	El mayor valor se presenta por tener una estructura uniforme sobre el cabezal de salida para tapar el espacio entre este y las vigas del cerramiento del Colegio donde con anterioridad ya existe esta estructura.
NP1: RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	Una vez terminada esta actividad del contrato se hizo una medida real la cual da como resultado un mayor valor en la misma.
NP2: INSTALACIÓN DE ADOQUÍN	Se dio un mayor valor en la instalación de adoquín debido a la recuperación que se hizo del desmonte de adoquín, de acuerdo a esto el suministro fue mínimo.
NP3: MURO TOLETE COMUN	Los muros en ladrillo tolete común corresponden a las contrahuellas de la escalera a reconstruir de la cancha, se presento un menor valor en este ítem ya que se presentó una disminución en la longitud de las escaleras a recuperar de acuerdo a lo estimado.
NP4 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	Para adelantar los trabajos de excavación, retiro de sobrante y suministro de material de rellenos, se vio la necesidad de desmontar parte de la estructura y cubierta de uno de los espacios de encuentro del colegio, aledaño al sitio de trabajo, facilitando de esta manera el movimiento de las maquinas, el mayor valor en este ítem se debe a medias adelantadas en obra.
NP7 INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO NUMERO 10	Una vez terminados los trabajos con maquinaria se precede a la instalación de la cubierta, el mayor valor se debe los valores correspondientes al desmonte de la cubierta.

ITEM	JUSTIFICACIÓN
NP10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	Se instaló tubería de 4" para las conexiones domiciliarias previamente existentes, el mayor valor se debió a la recolección de aguas negras y lluvias que estaban conectadas directamente a la tubería existente.

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: OBDULIO LA ROTTA GARCIA

REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA
LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON

SUPERVISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO:				CÓDIGO:	
		VERSIÓN:				VERSIÓN:	
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:				VIGENCIA:	

ACTA DE CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES 02

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA **CONTRATO No.** CD-CO-003-2025 CD-CO-003-2025

OBJETO INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025.*.

CONTRATISTA : LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

SUPERVISOR: SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON

FECHA **8 de mayo de 2025**

ÍTEM	CODIGO DE REFERENCIA (*/ * *)		DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CANTIDADES	VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON OTRO SI 01		CANTIDADES	VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES 02	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+/-)	MAYORES (+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+/-)	MAYORES (+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES Y MANEJO DE AGUAS														
1.01	1.01.69	*	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.	M2	150.00	$ 4,492.88	$ 673,932.00		$ -	150.00	$ 673,932.00	0.00	$ -	150.00	$ 673,932.00
1.02	3.13.09	*	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	M	120.00	$ 48,379.34	$ 5,805,521.00	$ -	$ -	120.00	$ 5,805,521.00	0.00	$ -	120.00	$ 5,805,521.00
							SUBTOTAL CAPÍTULO 1	$ -	$ -		$ 6,479,453.00		$ -		$ 6,479,453.00
2	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA ENTRADA														
2.01	3.03.10	*	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	27.00	$ 64,546.54	$ 1,742,757.00	$ -	$ -	27.00	$ 1,742,757.00	3.25	$ 209,776.00	30.25	$ 1,952,533.00
2.02	1.11.06	*	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	4.50	$ 73,747.12	$ 331,862.00	$ -	$ -	4.50	$ 331,862.00	9.50	$ 700,598.00	14.00	$ 1,032,460.00
2.03	2.07.02	*	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	5.63	$ 961,647.52	$ 5,414,076.00	$ -	$ -	5.63	$ 5,414,076.00	0.04	$ 38,465.00	5.67	$ 5,452,541.00
2.04	2.07.01	*	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	10.03	$ 1,004,308.23	$ 10,073,212.00	$ -	$ -	10.03	$ 10,073,212.00	-5.84	$ -5,865,161.00	4.19	$ 4,208,051.00
2.05	3.03.20	*	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA ELEVACIONES	M3	2.18	$ 839,900.33	$ 1,830,983.00	$ -0.18	$ -151,182.00	2.00	$ 1,679,801.00	-0.56	$ -472,780.00	1.44	$ 1,207,021.00
2.06	1.02.42	*	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	440.34	$ 7,002.12	$ 3,083,314.00	$ -	$ -	440.34	$ 3,083,314.00	103.64	$ 725,699.00	543.98	$ 3,809,013.00
							SUBTOTAL CAPÍTULO 2	$ -	$ -151,182.00		$ 22,325,022.00		$ -4,663,403.00		$ 17,661,619.00
3	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO CON DESARENADOR														
3.01	3.03.10	*	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	7.50	$ 64,546.54	$ 484,099.00	$ -	$ -	7.50	$ 484,099.00	-1.30	$ -83,910.00	6.20	$ 400,189.00
3.02	3.02.07	*	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	6.00	$ 16,429.53	$ 98,577.00	$ -	$ -	6.00	$ 98,577.00	23.62	$ 388,066.00	29.62	$ 486,643.00
3.03	1.11.06	*	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	1.80	$ 73,747.12	$ 132,745.00	$ -	$ -	1.80	$ 132,745.00	2.19	$ 161,506.00	3.99	$ 294,251.00
3.04	2.07.02	*	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	1.50	$ 961,647.52	$ 1,442,471.00	$ -	$ -	1.50	$ 1,442,471.00	1.91	$ 1,836,747.00	3.41	$ 3,279,218.00
3.05	2.07.01	*	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	5.05	$ 1,004,308.23	$ 5,071,757.00	$ -	$ -	5.05	$ 5,071,757.00	-1.39	$ -1,395,989.00	3.66	$ 3,675,768.00
3.06	2.07.03	*	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3	0.96	$ 839,445.61	$ 805,868.00	$ -	$ -	0.96	$ 805,868.00	-0.96	$ -805,868.00	0.00	$ -
3.07	1.02.42	*	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	312.41	$ 7,002.12	$ 2,187,532.00	$ -	$ -	312.41	$ 2,187,532.00	-27.63	$ -193,468.00	284.78	$ 1,994,064.00
							SUBTOTAL CAPÍTULO 3	$ -	$ -		$ 10,223,049.00		$ -92,916.00		$ 10,130,133.00
4	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS														
4.01	3.03.10	*	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	10.00	$ 64,546.54	$ 645,465.00	$ -	$ -	10.00	$ 645,465.00	0.00	$ -	10.00	$ 645,465.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO:				CÓDIGO:	
		VERSIÓN:				VERSIÓN:	
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:				VIGENCIA:	

4.02	3.02.07	*	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	245.70	$ 16,429.53	$ 4,036,736.00	$ 252.47	$ 4,147,963.00	498.17	$ 8,184,699.00	0.00	$ -	498.17	$ 8,184,699.00
4.03	2.01.03	*	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	M2	75.00	$ 74,859.60	$ 5,614,470.00	$ -	$ -	75.00	$ 5,614,470.00	0.00	$ -	75.00	$ 5,614,470.00
4.04	3.13.37	*	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	69.30	$ 97,274.42	$ 6,741,117.00	$ -6.37	$ -619,638.00	62.93	$ 6,121,479.00	0.00	$ -	62.93	$ 6,121,479.00
4.05	3.13.36	*	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACI	M3	30.00	$ 115,320.06	$ 3,459,602.00	$ 11.72	$ 1,351,551.00	41.72	$ 4,811,153.00	0.00	$ -	41.72	$ 4,811,153.00
4.06	1.11.06	*	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	146.74	$ 73,747.12	$ 10,821,652.00	$ -133.86	$ -9,871,424.00	12.88	$ 950,228.00	0.24	$ 17,408.00	13.12	$ 967,636.00
4.07	1.01.38	*	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.	M2	40.00	$ 55,765.73	$ 2,230,629.00	$ -4.78	$ -266,560.00	35.22	$ 1,964,069.00	82.68	$ 4,610,711.00	117.90	$ 6,574,780.00
4.08	1.11.26	*	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	40.00	$ 82,398.30	$ 3,295,932.00	$ 107.50	$ 8,857,817.00	147.50	$ 12,153,749.00	5.31	$ 437,535.00	152.81	$ 12,591,284.00
4.09	1.01.47	*	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	103.73	$ 4,742.57	$ 491,947.00	$ -1.55	$ -7,351.00	102.18	$ 484,596.00	0.04	$ 190.00	102.22	$ 484,786.00
4.1	1.18.01	*	ADOQUIN DE GRES	M2	103.73	$ 76,964.22	$ 7,983,499.00	$ -78.23	$ -6,020,911.00	25.50	$ 1,962,588.00	-9.96	$ -766,564.00	15.54	$ 1,196,024.00
4.11	1.01.25	*	DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO)	M3	6.00	$ 36,924.08	$ 221,544.00	$ -6.00	$ -221,544.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.12	1.03.06	*	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	1.92	$ 1,518,710.44	$ 2,915,924.00	$ -1.92	$ -2,915,924.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.13	3.12.01	*	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	270.70	$ 5,013.50	$ 1,357,154.00	$ 237.47	$ 1,190,556.00	508.17	$ 2,547,710.00	91.51	$ 458,793.00	599.68	$ 3,006,503.00
4.14	2.05.05	*	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	1.00	$ 2,451,553.56	$ 2,451,554.00	$ -	$ -	1.00	$ 2,451,554.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,451,554.00
4.15	2.05.07	*	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M, 2.5 < H < 3.5	UND	2.00	$ 5,108,376.39	$ 10,216,753.00	$ -	$ -	2.00	$ 10,216,753.00	0.00	$ -	2.00	$ 10,216,753.00
4.16	2.05.61	*	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	M	32.00	$ 1,389,680.04	$ 44,469,761.00	$ -7.00	$ -9,727,760.00	25.00	$ 34,742,001.00	0.00	$ -	25.00	$ 34,742,001.00
4.17	**2,05,61**	*	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=36"	M	43.00	$ 31,599.04	$ 1,358,759.00	$ -3.00	$ -94,797.00	40.00	$ 1,263,962.00	0.00	$ -	40.00	$ 1,263,962.00
4.18	2.05.52	*	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	M	25.00	$ 62,608.90	$ 1,565,223.00	$ 17.00	$ 1,064,351.00	42.00	$ 2,629,574.00	6.00	$ 375,653.00	48.00	$ 3,005,227.00
4.19	1.01.10	*	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	M3	1.00	$ 197,409.42	$ 197,409.00	$ -	$ -	1.00	$ 197,409.00	0.00	$ -	1.00	$ 197,409.00
4.2	3.08.08	*	BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO	M	50.00	$ 24,674.73	$ 1,233,737.00	$ -	$ -	50.00	$ 1,233,737.00	6.88	$ 169,762.00	56.88	$ 1,403,499.00
4.21	2.07.08	*	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	4.00	$ 286,965.46	$ 1,147,862.00	$ 2.75	$ 789,155.00	6.75	$ 1,937,017.00	0.39	$ 111,916.00	7.14	$ 2,048,933.00
NP1	3.03.15	*	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	0.00	$ 90,646.13	$ -	$ 354.21	$ 32,107,766.00	354.21	$ 32,107,766.00	1.03	$ 93,365.00	355.24	$ 32,201,131.00
NP2	**1.18.01**	*	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN	M2	0.00	$ 23,850.00	$ -	$ 74.34	$ 1,773,009.00	74.34	$ 1,773,009.00	16.26	$ 387,801.00	90.60	$ 2,160,810.00
NP3	1.04.30	*	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	0.00	$ 80,547.73	$ -	$ 15.60	$ 1,256,545.00	15.60	$ 1,256,545.00	-1.57	$ -126,460.00	14.03	$ 1,130,085.00
						SUBTOTAL CAPÍTULO 4	**$ 112,456,729.00**		**$ 22,792,804.00**		**$ 135,249,533.00**		**$ 5,770,110.00**		**$ 141,019,643.00**
5	**CABEZAL DE SALIDA ALCANTARILLA**														
5.01	3.03.10	*	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	7.48	$ 64,546.54	$ 482,808.00	$ -5.48	$ -353,715.00	2.00	$ 129,093.00	2.30	$ 148,457.00	4.30	$ 277,550.00
5.02	3.02.07	*	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	7.48	$ 16,429.53	$ 122,893.00	$ -7.48	$ -122,893.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.03	1.11.06	*	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	1.57	$ 73,747.12	$ 115,783.00	$ -	$ -	1.57	$ 115,783.00	-1.14	$ -84,072.00	0.43	$ 31,711.00
5.04	2.07.02	*	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	1.74	$ 961,647.52	$ 1,673,267.00	$ -	$ -	1.74	$ 1,673,267.00	-1.23	$ -1,182,827.00	0.51	$ 490,440.00
5.05	2.07.01	*	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	2.48	$ 1,004,308.23	$ 2,490,684.00	$ -0.98	$ -984,222.00	1.50	$ 1,506,462.00	-0.32	$ -321,378.00	1.18	$ 1,185,084.00
5.06	1.02.42	*	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	147.44	$ 7,002.12	$ 1,032,393.00	$ -77.44	$ -542,245.00	70.00	$ 490,148.00	-2.11	$ -14,774.00	67.89	$ 475,374.00
5.07	3.03.20	*	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA ELEVACIONES	M3	2.13	$ 839,900.33	$ 1,788,988.00	$ -2.13	$ -1,788,988.00	0.00	$ -	0.40	$ 335,960.00	0.40	$ 335,960.00
						SUBTOTAL CAPÍTULO 5	**$ 7,706,816.00**		**$ -3,792,063.00**		**$ 3,914,753.00**		**$ -1,118,634.00**		**$ 2,796,119.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO:				CÓDIGO:	
		VERSIÓN:				VERSIÓN:	
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:				VIGENCIA:	

6	OBRAS ADICIONALES																	
NP4	1.01.54	*	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	0.00	$ 11,929.22	$ -	$ 19.60	$ 233,813.00	19.60	$ 233,813.00	0.01	$ 119.00	19.61	$ 233,932.00
NP5	3.11.03	*	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM	UND	0.00	$ 296,093.95	$ -	$ 1.00	$ 296,094.00	1.00	$ 296,094.00	0.00	$ -	1.00	$ 296,094.00
NP6	1.01.61	*	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS.	kg	0.00	$ 4,111.70	$ -	$ 40.00	$ 164,468.00	40.00	$ 164,468.00	0.00	$ -	40.00	$ 164,468.00
NP7	1.12.23		INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	0.00	$ 39,017.37	$ -	$ 19.60	$ 764,740.00	19.60	$ 764,740.00	0.01	$ 391.00	19.61	$ 765,131.00
NP8	1,12,13		INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	M	0.00	$ 42,873.10	$ -	$ 20.00	$ 857,462.00	20.00	$ 857,462.00	0.00	$ -	20.00	$ 857,462.00
NP9	2.05.34	*	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"	UND	0.00	$ 106,902.06	$ -	$ 5.00	$ 534,510.00	5.00	$ 534,510.00	0.00	$ -	5.00	$ 534,510.00
NP10	2.05.58	*	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	M	0.00	$ 34,777.61	$ -	$ 12.00	$ 417,331.00	12.00	$ 417,331.00	3.00	$ 104,333.00	15.00	$ 521,664.00
NP11	2.05.72	*	UNIÓN PVC SANITARIA D=3"	UND	0.00	$ 7,758.29	$ -	$ 3.00	$ 23,275.00	3.00	$ 23,275.00	0.00	$ -	3.00	$ 23,275.00
NP12	7.01.81	*	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	0.00	$ 14,857.70	$ -	$ 15.00	$ 222,866.00	15.00	$ 222,866.00	0.00	$ -	15.00	$ 222,866.00
						SUBTOTAL CAPITULO 6	$ -		$ 3,514,559.00		$ 3,514,559.00		$ 104,843.00		$ 3,619,402.00
COSTOS DIRECTOS							$ 159,342,251.00		$ 22,364,118.00		$ 181,706,369.00				$ 181,706,369.00
		ADMINISTRACIÓN		22%			$ 35,055,295.00		$ 4,920,106.00		$ 39,975,401.00				$ 39,975,401.00
		IMPREVISTOS		3%			$ 4,780,268.00		$ 670,923.00		$ 5,451,191.00				$ 5,451,191.00
		UTILIDAD		5%			$ 7,967,113.00		$ 1,118,205.00		$ 9,085,318.00				$ 9,085,318.00
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS							$ 214,851,743.00		$ 21,366,536.00		$ 236,218,279.00		$ -		$ 236,218,279.00

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: OBDULIO LA ROTTA GARCIA

REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA
LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON

SUPERVISOR

Copias: Contratista, Supervisor

966

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 008	Página 1 de 2
		Versión 2	13-09-2024

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CD-CO-003-2025

CIUDAD Y FECHA	Samacá, Boyacá, Quince (15) de mayo de 2025
OBJETO	"INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025."
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. R/L OBDULIO LA ROTTA GARCÍA
NIT y/o C.C	NIT 820.003.826-5 C.C No. 6.765.982 Expedida en Tunja
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP No. 2025000349 de fecha 21 de marzo de 2025 Rubros No. 2.3.2.02.02.005.02 Construcción y mantenimiento de infraestructura educativas
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($214`851.743,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 21.366.536,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 236.218.279,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO ADICIONALES UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	QUINCE (15) DE MAYO DE 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE.
SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN Profesional adscrito a la secretaria de Planeación y Obras Públicas
CUMPLIMIENTO	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

OFICINA ASESORA JURIDICA
FECHA Y HORA: 12/06/25
RADICADO No.
ASUNTO: Polizas
ANEXOS:
Lorena

ACTA RECIBO FINAL

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos Colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($214.851.743,00)	
* Aporte Alcaldía		
* Aporte Entidad Conveniente		
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	($ 21.366.536,00)	
VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES		
VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN		($ 236.218.279,00)
SUMAS IGUALES	($ 236.218.279,00)	($ 236.218.279,00)

* Aplica solo para convenios.

En Samacá, a los quince (15) días del mes de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025.**

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra Pública, se encontró que el Contratista desarrolló satisfactoriamente el objeto del Contrato de Obra en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a cancelar la presente Acta.

Nota: Si bien las obras fueron recibidas en su totalidad por la supervisión del proyecto, se evidencia la necesidad de realizar algunos ajustes de funcionamiento a elementos como lo son el desarenador principal, y los disipadores de energía, en ese sentido, el contrato no se liquidará ni se efectuarán pagos derivados del mismo hasta que se realicen los ajustes requeridos por la supervisión en aras de garantizar la calidad y estabilidad de todos los componentes.

En constancia se firma a los quince (15) días del mes de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025)

LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
R/L OBDULIO LA ROTTA GARCÍA
CONTRATISTA DE OBRA

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
Profesional Universitario Sec. Planeación
SUPERVISOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	06	2025	21	03	2025	00:00	21	03	2030	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5	
DIRECCIÓN: CRA 12 NO 21-50	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO: 7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 4 - 53	CIUDAD: SAMACA, BOYACA	TELÉFONO 7372095
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. RELACIONADO CON INTERVENCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TCNICA SALAMANCA DE SAMACA, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PBLICA DECLARADA SEGN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/03/2025	17/09/2025	$23,621,827.90	$23,621,827.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/03/2025	17/05/2028	$11,810,913.95	$11,810,913.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$23,621,827.90	$23,621,827.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA AMAPRO DE ESTABILIDAD SEGUN CONTRATO DE OBRA PBLICA CD-OCO-003-2025 ESTABILIDAD DESDE 15/05/2025 HASTA 15/05/2030

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******59,054,569.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CLAUDIA YASMIN PORERO GARCIA	132922	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

51-44-101029411

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	06	2025	21	03	2025	00:00	21	03	2030	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	NIT: 820.003.826-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 12 NO 21-50	TUNJA, BOYACA	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAMACA	NIT: 800.016.757-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 6 NRO. 4 - 53	SAMACA, BOYACA	7372095

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

MOVIIRED · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO -No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******59,054,569.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA YASMIN ROBERO GARCIA	132922	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

470

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029411	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	06	2025	21	03	2025	00:00	21	03	2030	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.		NIT: 820.003.826-5	
DIRECCIÓN: CRA 12 NO 21-50	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO:	7437451

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SAMACA		NIT: 800.016.757-9	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 4 - 53	CIUDAD: SAMACA, BOYACA	TELÉFONO:	7372095

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101029411

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF1329228 2

	APROBACION DE POLIZA	

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO										
Número del Contrato	CD-CO-003-2025									
Fecha del Contrato	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)									
Valor del Contrato	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($236,218,279) M/CTE									
Nombre del Contratista	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.									
Número de Identificación	820.003.826-5	Tipo	C.C		CE		NIT	X		

2. IDENTIFICACION DE LA POLIZA			
Compañia Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Número de Póliza	51-44-101029411		
Fecha de Expedición	9/06/2025	Anexo	3

4. DESCRIPCION DE AMPAROS DE LA POLIZA							
No	TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo	Aprobado		Observaciones
		desde	hasta		SI	NO	
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/03/2025	17/09/2025	$ 23.621.827,90	X		
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	21/03/2025	17/05/2028	$ 11.810.913,95	X		
3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$ 23.621.827,90	X		

5. APROBACION DE LA POLIZA		
¿La póliza es aprobada?	SI [X] NO [ ]	
Nombre de quien revisa	YENNI MARCELA GARCIA SIERRA	Firma
Fecha de diligenciamiento	ONCE (11) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)	

6. RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN SIN APROBACION		
Nombre de quien recibe		Firma
Fecha		
Hora		

INFORME DE CONTRATISTA N°2

LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025".

DEL 25 DE ABRIL DE 2025

AL 15 DE MAYO DE 2025

INFORME TÉCNICO N° 2

CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025

INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025.".

MUNICIPIO DE SAMACÁ - BOYACÁ

LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

NIT: 820.003.826-5

Contenido

4. LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

UBICACIÓN 3

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 19

4.22 - NP1. RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR 19

4.23 NP 2 - INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20

4.24 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. 21

6.OBRAS ADICIONALES 22

6.01 NP4 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. 22

6.02 NP5 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM 23

6.03 NP6 DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS. 24

6.04 NP7 INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO NUMERO 10 25

6.05 NP8 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO 26

6.06 NP9 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6" 27

6.07 NP10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" 28

6.08 NP11 UNIÓN PVC SANITARIA D=3" 29

6.09 NP12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB). 30

UBICACIÓN



DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025".
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA:	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. R/L OBDULIO LA ROTTA GARCIA
CONTRATO:	CD-CO-003-2025
SUPERVISOR:	SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON Profesional Universitario - Supervisor
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($214` 851.743,00) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO:	UN (01) MES

INFORME TÉCNICO DE OBRA
LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
CONTRATO DE OBRA CF-CO-003-2025

Fecha de informe	15/05/2025	PLANILLAS CONTRATISTA	may-25			
			SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
RL CONTRATISTA 1	Obdulio La Rotta Garcia	LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	Planilla No.:		9487236818	
	C.C. 6765982					

EQUIPO	Periodos trabajados	Salario base cotización (Salario propuesto)	may-25			
			SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
OBDULIO LA ROTTA GARCIA	De: Marzo 2025	$ 1,423,500.00	Planilla No.:		7975212331	
Director de obra	A: Mayo 2025					
PUBLIO JOSE URRUTIA BAQUERO	De: Marzo 2025	$ 1,423,501.00	Planilla No.:		9487236818	
Residente de obra	A: Mayo 2025					
DIANA YULIETH OVALLE AGUILERA	De: Marzo 2025	$ 1,423,502.00	Planilla No.:		7967925092	
Profesional SST	A: Mayo 2025					
MIGUEL FABIAN BUITRAGO JEREZ	De: Marzo 2025	$ 1,423,503.00	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025					
VICTOR MANUEL GIL MATAMOROS	De: Marzo 2025	$ 1,423,504.00	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025					
ORLANDO BUITRAGO SAAVEDRA	De: Marzo 2025	$ 1,423,505.00	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025					

INFORME TÉCNICO DE OBRA
LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
CONTRATO DE OBRA CF-CO-003-2025

EQUIPO	Periodos trabajados	Salario base cotización (Salario propuesto)	may-25			
			SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
PEDRO JOSE MARTINEZ BAMBASICA	De: Marzo 2025	$ 1,423,506.00	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025					
GERMAN RODRIGUEZ ESPITIA	De: Marzo 2025	$ 1,423,507.00	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025					
TEODORO ROJAS MARTINEZ	De: Marzo 2025	$ 1,423,508.00	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025					

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES (seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

OBLIGACIÓN No. 1

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Revisar la minuta del contrato, planos constructivos, estudios y diseños, memorias de diseño, presupuesto, especificaciones técnicas y/o demás documentos de orden legal y técnico que hagan parte del proyecto. En el caso de no contar con la información que garantice la calidad y funcionalidad de las obras, y considerando la naturaleza del contrato y modalidad contractual, deberá contar con el personal profesional especializado que asegure la calidad de las obras realizando en atención al debido proceso, los ajustes correspondientes, conceptos y certificaciones de calidad a través de los correspondientes memoriales de responsabilidad	Se hizo seguimiento del contrato de acuerdo a los planos y diseños presentados, además se cuenta con el personal idóneo para la ejecución de las obras.	100%

OBLIGACIÓN No. 2:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Seguir las recomendaciones que el interventor/Supervisor del contrato realice, siempre que estas no estén en contravía de los alcances y objeto del contrato y siempre que las mismas no impliquen variaciones al objeto contractual.	Se han tenido en cuenta las recomendaciones impartidas por el supervisor de la obra.	100%

OBLIGACIÓN No. 3:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Informar con la debida antelación al interventor o supervisor para que este a su vez comunique a la supervisión todo accidente o incidente de trabajo. El CONTRATISTA deberá informar al interventor/Supervisor dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione	No se presentó ningún incidente y/o accidente en el transcurso de la obra.	100%

muerte o prejuicio a cualquier persona o daño a la propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el MUNICIPIO o el INTERVENTOR/supervisor. El informe incluirá, al menos la siguiente información 1. Lugar, fecha y hora del accidente. 2. Nombre del accidentado 3. Estado civil y edad. 4. Oficio que desempeña y su experiencia, actividad que realizaba en el momento del accidente 5. Indicar si hubo lesión 6. Clase de lesión sufrida 7. Posibles causas del accidente 8. Tratamiento recibido y concepto medico ARL.		

OBLIGACIÓN No. 4

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Antes de proceder con las obras, se deberá realizar y suscribir acta de socialización con el (los) beneficiario (s) y levantar la respectiva acta de vecindad. La socialización debe incluir como mínimo la descripción de las actividades a desarrollar, el cronograma de obra y los compromisos necesarios de las partes durante la obra. De igual manera, en conjunto con interventoría y los propietarios, se debe realizar las respectivas actas de vecindad de las edificaciones aledañas.	Se adelantó acta de socialización, se le informo a la comunidad el alcance de los trabajos programados.	100%

OBLIGACIÓN No. 5:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Al finalizar las obras y previo a liquidación, se deberá realizar y suscribir acta de entrega a la comunidad vinculando las personas relacionadas en las actas de vecindad y demás veedores, vecinos y/o líderes del sector. La entrega debe incluir como mínimo la descripción de las actividades desarrolladas y la aceptación de las partes.	Se hizo entrega de las obras adelantadas a la Señora Rectora del Colegio y la comunidad, suscribiendo actas de vecindad con los predios colindantes al proyecto.	100%

OBLIGACIÓN No. 6:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cada documento suscrito durante la ejecución del contrato, deberá ser debidamente radicado en el MUNICIPIO en formato original y debidamente firmado por quienes intervinieron en el acto.	Se hizo solicitud de prórroga en tiempo y adicional en el costo del proyecto, aprobado por la Administración Municipal.	100%

OBLIGACIÓN No. 7

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cumplir con el avance de obra actualizado en el marco del plazo de ejecución del contrato,	Se cumplió con el tiempo estipulado en el contrato incluida la prorroga solicitada por el contratista.	100%

OBLIGACIÓN No. 8:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Promover la contratación de la mano de obra no calificada de la población vulnerable de la región.	El personal de obra no calificado fue enteramente contratado con personas de la región.	100%

OBLIGACIÓN No. 9

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Informar oportunamente al interventor/Supervisor del contrato sobre las imposibilidades, irregularidades o dificultades que se presenten en el proceso contractual y de ejecución de la obra.	No se presentó ninguna dificultad en la ejecución del contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 10:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cumplir con las instrucciones que le imparta el interventor/Supervisor y demás obligaciones que se deriven de la Ley, reglamento o lineamientos vigentes o que se	Se cumplió con las instrucciones dadas por el supervisor de la Obra.	100%

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
expidan con posterioridad y que contemplen aspectos relativos a la ejecución del objeto contratado.		

OBLIGACIÓN No. 11:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Bitácora: Se contará con una bitácora en donde el contratista y la Interventoría, deberán dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con indicaciones). En esta bitácora se dejarán consignadas todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la Interventoría, estado del clima entre otros. La bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla, el representante del contratista, el interventor y el representante del MUNICIPIO. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada al MUNICIPIO para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de Obra.	Se llevó la bitácora de Obra en la cual se hicieron las anotaciones referentes al avance diario de la misma.	100%

OBLIGACIÓN No. 12

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Presencia en Obra: El contratista deberá controlar la permanencia de los frentes de obra de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborales, deberá contarse con la presencia del Residente.	En obra siempre existio la presencia del Ingeniero Residente en representación del contratista.	100%

OBLIGACIÓN No. 13:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Reuniones y Actas de Obra: Convocar y/o asistir a Comités Técnicos cuando lo	Se realizó comité de obra en la oficina del contratista para dar	100%

considere conveniente y/o cuando la supervisión o la interventoría lo convoquen y/o requieran. Con la periodicidad en el sitio y hora previamente establecidos se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir: representante del contratista, la interventoría y/o el supervisor o delegado del MUNICIPIO cuando se requiera. De cada reunión se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella. Quincenalmente y en las fechas indicadas por el MUNICIPIO deberá presentarse un acta de avance de obra correspondiente. Todas las actas deben estar firmadas y aceptadas por la interventoría y el contratista. Se verificará estrictamente que las obras cumplan con lo establecido en los términos del contrato. El proponente elegido deberá cumplir con estos requisitos y en cualquier momento deberá demostrar el cumplimiento de los mismos	inicio a las labores y comités mensuales en obra para hacer un informe del avance de los trabajos junto con la Supervicion.	

OBLIGACIÓN No. 14:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por parte de la interventoría y/o que las cantidades no están incluidas en la minuta del contrato o consignadas en acta u otrosí correspondiente en atención al debido proceso. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora correspondiente y copia de la misma deberá ser enviada al MUNICIPIO.	En el transcurso de la obra se vio la necesidad de implementar ítems no previstos en la ejecución del contrato, para lo cual se solicitó por parte del contratista la respectiva aprobación.	100%

OBLIGACIÓN No. 15

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
No realizar modificación de cantidades y/o ejecución de ítems adicionales, sin previa autorización del interventor del contrato, para lo cual se debe solicitar comité técnico y realizar las respectivas actas o formalizaciones en atención al debido	Se presentó al supervisor modificación en las cantidades e ítem no previstos, aprobados de manera oportuna por la supervisión.	100%

proceso. Las consecuencias presupuestales de cualquier modificación realizada sin previa autorización de la interventoría, supervisión y/o municipio, según aplique, serán responsabilidad del contratista. Las modificaciones permisibles deben limitarse a las disponibilidades presupuestales y estar directamente relacionadas con el objeto contractual. Adicionalmente, deben ser concertadas y aprobadas mediante acta suscrita con el (los) beneficiario (s) y el interventor antes de proceder.		

OBLIGACIÓN No. 16:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
. Obras adicionales: Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de común acuerdo entre INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA se convendrán los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificación o acta técnica del contrato y aprobada por Área Jurídica del MUNICIPIO en atención al debido proceso. Por ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer ninguna reclamación posterior.	Se solicitó la aprobación de ítems no previstos en la ejecución del contrato, previa presentación de análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar, una vez aprobados se procede a ejecutarlos.	100%

OBLIGACIÓN No. 17:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cuando se presenten inconsistencias y/o dudas técnicas en cuanto a cantidades contractuales, programación de obra, materiales, especificaciones técnicas, alcances y/o demás aspectos que puedan atentar contra la calidad, cumplimiento y/o estabilidad de las obras, se debe reportar de inmediato a interventoría para que en su	No se presentó ningún tipo de inconsistencia o dudas técnicas en la ejecución del contrato.	100%

competencia se realicen las consultas y/o ajustes necesarios que garanticen la calidad de las obras. Las decisiones tomadas al respecto deben quedar plasmadas en actas de comité y bitácoras, y deben ser legalizadas ante la entidad de acuerdo al debido proceso cuando aplique.		

OBLIGACIÓN No. 18:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
El proponente elegido deberá cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad social que haya emitido el Ministerio de Protección Social, así como las normas vigentes relacionadas. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la interventoría establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del proponente elegido informará, en primera instancia al MUNICIPIO para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.	Se adelantó la afiliación del personal presente en la ejecución del contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 19:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Mantener debidamente señalizados cada uno de los frentes de trabajo tanto en jornada laboral, como en jornadas no laborales, registrando en bitácora hora de cierre y estado de señalización y emplear las señales y medidas de seguridad apropiadas y utilizar adecuadamente los equipos o vehículos requeridos por la obra	Se hizo cerramiento del sitio de trabajo teniendo en cuenta que se trata de una institución educativa, cuando se trabajó fuera de las instalaciones se utilizó cinta de protección y señales de tránsito.	100%

OBLIGACIÓN No. 20:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Dotar con y obligar el uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos, a todos los trabajadores en obra,	Se hizo entrega desde el primer día de los elementos de protección personal a todos	100%

quienes deberán estar afiliados por el contratista a seguridad social, pensión, riesgos profesionales y demás de la planilla integral que la ley exige. Durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad en todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados o trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general.	los trabajadores y se llevó a cabo seguimiento del cumplimiento durante toda la ejecución del contrato.	

OBLIGACIÓN No. 21:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras mediante el plan de gestión integral de obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento.	No se hizo ninguna afectación ambiental en la zona de trabajo.	100%

OBLIGACIÓN No. 22:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Ejecutar, organizar los trabajos y adoptar las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducir los riesgos y peligros a que ellos puedan estar expuestos.	Como se dijo anteriormente se hizo cerramiento en lona verde de las áreas de trabajo, así se evitó el ingreso de personas ajenas a la obra.	100%

OBLIGACIÓN No. 23:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. El contratista debe asumir la responsabilidad de daños y accidentes a trabajadores y/o a terceros que se puedan generar durante la ejecución de las obras y realizar las acciones de ley correspondientes para mitigar cualquier situación presentada. De	No se presentó ningún daño al personal de la obra o a terceros ni a bienes muebles e inmuebles.	100%

igual manera, deberá responder por los daños realizados a los bienes muebles e inmuebles de los propietarios de las edificaciones aledañas, generados como consecuencias de las obras sin el debido control y/o procedimiento.		

OBLIGACIÓN No. 24:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cumplir con la adopción de las medidas de seguridad e higiene requeridas para proporcionar a sus trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la conservación de la salud y la vida y disminuir los riesgos profesionales durante la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas las personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, Deberá existir una persona encargada por parte de EL CONTRATISTA para el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas	La Institución Educativa cedió al contratista un salón y unidad sanitaria para el uso del personal de la obra.	100%

OBLIGACIÓN No. 25:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato el Interventor/Supervisor le podrá ordenar al contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y este deberá proceder de conformidad. En caso de peligro inminente se podrá obviar la notificación escrita y ordenar que ese ejecute inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL CONTRATISTA para estos casos no tendrá derecho a reconocimiento de indemnización alguna.	No se presentó ningún incidente y/o accidente en el transcurso de la ejecución del contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 26:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato de obra, tales como correspondencia o correos electrónicos cruzados, planos, requerimientos, actas de reuniones, instrucciones impartidas, y demás documentos necesarios para el control físico y financiero del contrato de obra, relacionando en general toda la información que se refiera al desarrollo de los mismos.	Se cuenta con una oficina donde se maneja toda la información y correspondencia de la obra.	100%

OBLIGACIÓN No. 27:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Ejecutar las obras en los sitios señalados por el MUNICIPIO, cumpliendo con el presupuesto para cada intervención, de acuerdo con las especificaciones técnicas, programación de obra, materiales, alcances y/o demás aspectos. El contratista se debe ceñir a las especificaciones técnicas, de acuerdo a los diseños y/o normas que apliquen a cada actividad que hace parte de este tipo de proyectos.	El sitio de ejecución de la obra está totalmente definido por la Administración Municipal, cumpliendo con las cantidades de obra presupuestadas, especificaciones técnicas y materiales requeridos.	100%

OBLIGACIÓN No. 28:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Brindar la colaboración en su condición de Ejecutor para el cumplimiento del objeto contractual, poniendo a su disposición bajo su autonomía, toda su infraestructura física, administrativa, técnica y logística que se requiera para el desarrollo de todas las actividades necesarias.	Se contó con el equipo necesario y personal calificado en el desarrollo de todas las actividades de la obra.	100%

OBLIGACIÓN No. 29:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO

Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar el antes y después de la obra realizada; así mismo, donde se evidencie los productos nuevos instalados.	Se lleva un registro fotográfico a diario de todas las actividades desarrolladas.	100%

OBLIGACIÓN No. 30:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y aseo.	En el transcurso del desarrollo de la obra se hicieron jornadas de aseo, terminada la obra se adelantó aseo general de todas las áreas.	100%

OBLIGACIÓN No. 31:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Presentar informe mensual de avance de las obras.	Se presentaron informes mensuales de acuerdo a la ejecución del contrato	100%

OBLIGACIÓN No. 32:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Durante y previa liquidación del contrato, el contratista debe garantizar que el expediente físico contractual, así como el digital, se encuentre debidamente organizado, foliado y escaneado en su totalidad (Según aplique tipo de archivo), para efectos de archivo, control, vigilancia, informes a entes de control, entre otros.	Se presentaron todos los informes en físico y digital requerido por el supervisor para la liquidación del contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 33:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato con las obras debidamente terminadas y dispuestas para el uso de la comunidad.	Se entregó a satisfacción de la comunidad y la Administración Municipal de las obras objeto del contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 34:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Presentar oportunamente la información solicitada por la supervisión, interventoría, el departamento, la nación y/o los entes de control.	Se entregó a la Administración Municipal y Supervisor de la obra de toda la información pertinente al contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 35:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Suministrar e instalar durante el tiempo que dure la obra la valla informativa de acuerdo a los requerimientos del MUNICIPIO, la cual deberá ser instalada a más tardar dentro de los 10 días calendario, contados a partir del acta de iniciación de la obra según modelo de la entidad.	Se instaló la valla informativa para dar comienzo a la ejecución del contrato de acuerdo al diseño presentado por la entidad contratante.	100%

OBLIGACIÓN No. 36:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Tener al día la información sobre la nómina del personal a su cargo, además del listado de subcontratistas que tuviese para el desarrollo del objeto contractual, para garantizar que el personal se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social, pensión, riesgos profesionales y demás de la planilla integral que la ley ordena	Se cuenta con los servicios de una persona (SSTT) encargada de tener al día todo lo referente a las afiliaciones y pago de la seguridad social.	100%

OBLIGACIÓN No. 37:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Contratar y mantener al personal mínimo señalado en la propuesta técnica. Cualquier cambio de personal deberá previamente ser avalado por la INTERVENTORÍA.	A lo largo de toda la ejecución del contrato se contó con el mismo personal idóneo para el desarrollo de la obra.	100%

OBLIGACIÓN No. 38:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Controlar e informar periódicamente a la entidad sobre el avance del objeto contratado con base en el plazo del mismo, así como proponer las acciones y los ajustes periódicos que sean necesarios para dar cumplimiento a dicho contrato.	Se le informo al Supervisor de la obra de forma permanente sobre el avance de la obra, cumpliendo con los tiempos estipulados en el contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 39:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cumplir las demás obligaciones que resulten de la ejecución del contrato y las demás que por ley o contrato le corresponda.	Se cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 40:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
El incumplimiento de una de estas obligaciones será reportado a la Oficina jurídica de la entidad, para que se determinen las sanciones correspondientes.	Se dio cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas.	100%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.22 - NP1. RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR

Teniendo en cuenta que el material de excavación era orgánico de relleno y saturado por las tuberías taponadas de alcantarillado de la vía, alcantarillado sanitario y pluvial del colegio fue necesario hacer el relleno con material de afirmado.

ACTIVIDAD	UNIDAD
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3







RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR

4.23 NP 2 - INSTALACIÓN DE ADOQUÍN

En esta actividad se realiza la instalación del adoquín previamente retirado.

ACTIVIDAD	UNIDAD
INSTALACIÓN DE ADOQUÍN	M2

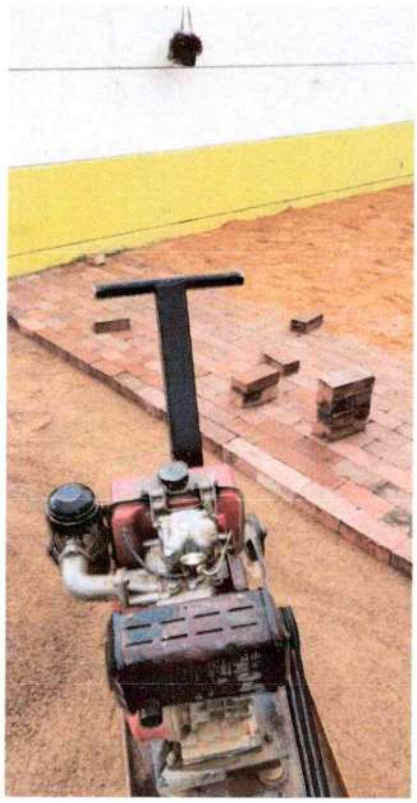

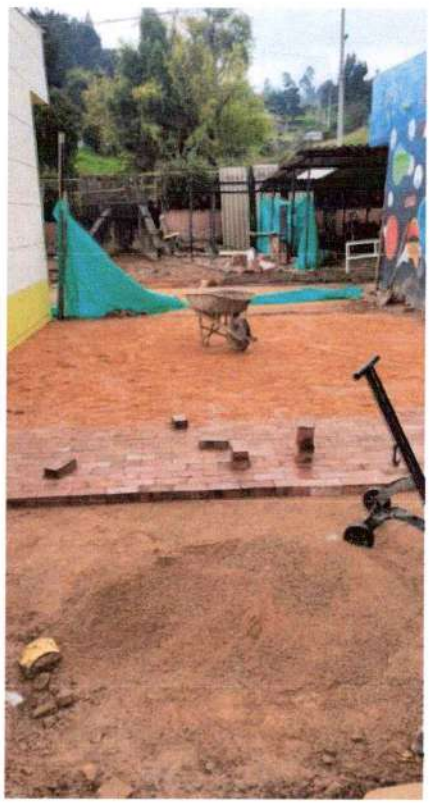

INSTALACIÓN DE ADOQUÍN

4.24 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.

El muro tolete común se usa como contra huella para la construcción de escaleras de la cancha.

ACTIVIDAD	UNIDAD
MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2






INSTALACIÓN DE ADOQUÍN

6.OBRAS ADICIONALES

6.01 NP4 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

Desmonte de cubierta necesario para darle espacio a la maquinaria en la excavación.

ACTIVIDAD	UNIDAD
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2

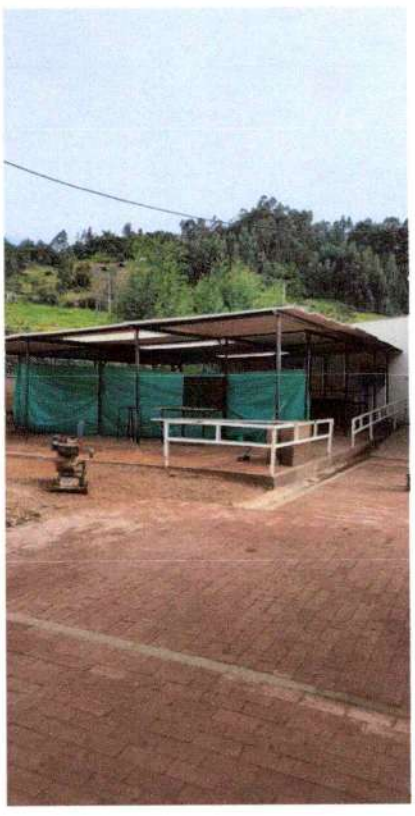



DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

6.02 NP5 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM

La alcantarilla se encuentra totalmente saturada de materiales depositados por la escorrentía.

ACTIVIDAD	UNIDAD
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM	UND






LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM

6.03 NP6 DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS.

Desmonte de estructura metálica necesaria para proporcionarle espacio a la maquinaria.

ACTIVIDAD	UNIDAD
DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS.	KG



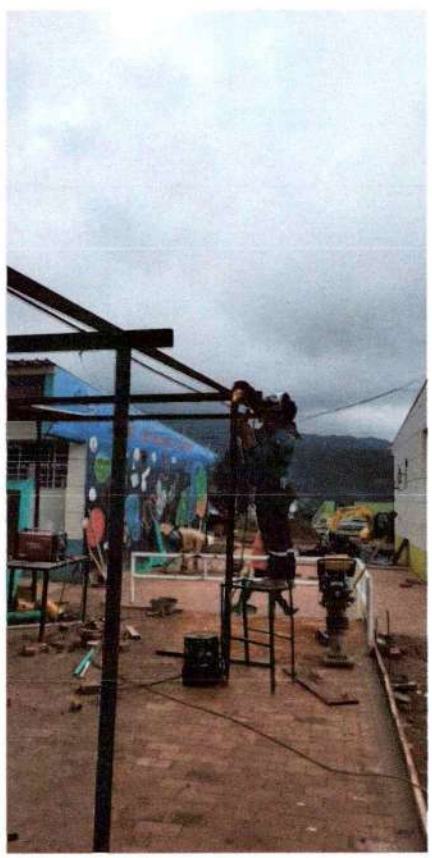

DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS.

6.04 NP7 INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO NUMERO 10

Montaje de cubierta previamente desmontada

ACTIVIDAD	UNIDAD
INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2




INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA EN FIBROCEMENTO NUMERO 10

6.05 NP8 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO

Instalación de la estructura de la cubierta previamente desmontada

ACTIVIDAD	UNIDAD
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	ML



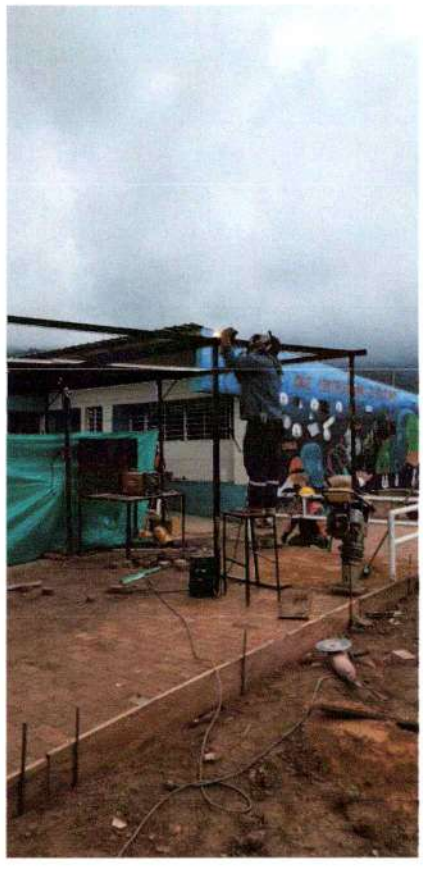

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO

6.06 NP9 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"

Suministro de accesorios necesarios para la reposición de tuberías existentes.

ACTIVIDAD	UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"	UND






SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"

6.07 NP10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"

Tubería de 4 pulgadas para reposición de tuberías existentes.

ACTIVIDAD	UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML



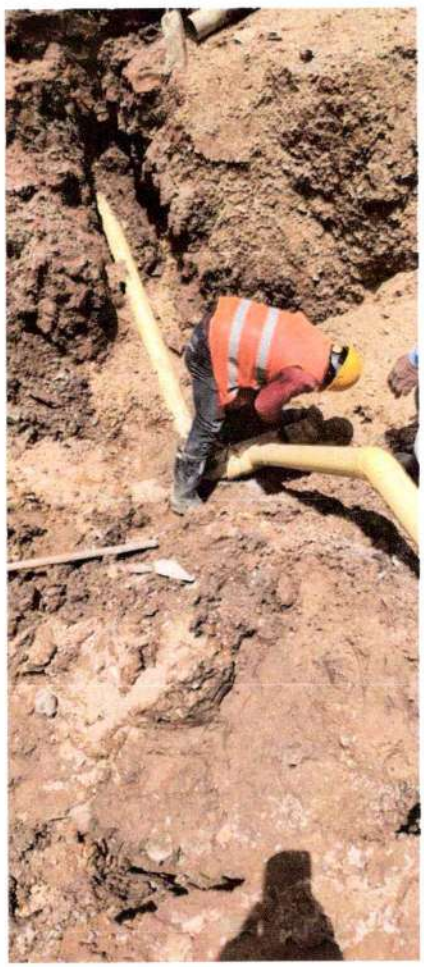

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"

6.08 NP11 UNIÓN PVC SANITARIA D=3"

Accesorios de PVC necesarios para instalación de tuberías.

ACTIVIDAD	UNIDAD
UNIÓN PVC SANITARIA D=3"	UND



UNIÓN PVC SANITARIA D=3"

6.09 NP12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).

Reposición de tubería PVC conduit que fue necesario levantar para adelantar las excavaciones.

ACTIVIDAD	UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).

INFORME TÉCNICO DE OBRA
LH CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
CONTRATO DE OBRA CF-CO-003-2025

Anexos:

- Planillas pagadas del período
- Cuadro de seguimiento de la seguridad social
- Copia de la bitácora
- Certificado de Revisoría Fiscal y documentos del contador público
- Certificados de calidad
- Pólizas correspondientes al período

OBDULIO LA ROTTA GARCIA **Director de obra**	**PUBLIO JOSE URRUTIA BAQUERO** **Residente de obra**
DIANA YULIETH OVALLE AGUILERA **Profesional SST**	

INFORME DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO:

INTERVENCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADASÉGUN DECRETO 028 DEL 13 DE MARZO DE 2025

BOYACÁ

MUNICIPIO: SAMACÁ, BOYACÁ.

No. Contrato CD-CO-003-2025

LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta lo relacionado con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo para el reporte correspondiente a Seguridad y Salud en el trabajo del contrato de obra **Contrato CD-CO-003-2025** con el objeto: INTERVENCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADASÉGUN DECRETO 028 DEL 13 DE MARZO DE 2025.

El presente documentos es confidencial y se mantiene para uso exclusivo del proyecto, su reserva para personas ajenas a ***L&H CONSTRUCCIONES CIVILES SAS*** que no hayan sido aprobadas por el director de obra.

1. **Exámenes Médicos Ocupacionales**
   Se realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso al personal ver anexo N° 4. Exámenes Médicos Ocupacionales.

2. **Entrega de Dotación y EPP al personal**
   Se dotó al personal operativo de obra con sus elementos de protección personal y dotación como son , gafas de seguridad, protección auditiva de inserción, tapabocas industrial , guantes, casco de seguridad, , chaleco reflectivo Ver anexo N° 5. Registro de Entrega de EPP.

3. **Inducción a labores**
   Se realizó la respectiva inducción general de ingreso a la empresa, se encuentra establecida la divulgación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a la empresa, el registro de la realización de dicha actividad se encuentra en el anexo N° 6. Registro de Inducción y/o reinducción.

4. **Reporte de actividades de alto riesgo (Trabajo en Altura y/o Confinamiento)**
   Durante el periodo se realizó servicios de excavación, instalación de tubería, rellenos en material selección, retiro de tierra, construcción de pozos de inspección, instalación de adoquines, arreglo de cancha de baloncesto.

5. **Reporte de accidentes**
   Durante este periodo se presentaron cero (0) accidentes y/o incidentes laborales o de tránsito como lo refleja el cuadro resumen, que se muestra a continuación.

6. Reporte de actividades de alto riesgo (Trabajo en Altura y/o Confinamiento)

Durante el periodo se tendrá en cuenta el desarrollo de las actividades de alto riesgo cuando aplique.

7. Reporte de accidentes

Durante el periodo se consolidarán los accidentes y/o incidentes laborales o de tránsito en caso de presentarse tal como lo refleja el cuadro resumen, que se muestra a continuación.

Tabla reporte de accidentes

Descripción	Periodo	Cantidad
N° Accidentes de Trabajo	Marzo-Mayo Año 2025	Cero (0)
N° Accidente de Tránsito	Marzo-Mayo Año 2025	Cero (0)
Días de capacidad por accidentes laborales	Marzo-Mayo Año 2025	Cero (0)

8. Inspecciones de Obra

En este periodo se realizó inspección de las actividades ejecutadas en obra, inspección a condiciones de seguridad, señalización uso adecuado de EPP,Ver anexo N°7 inspección locativa, anexo 8 inspección de EPP

9. Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.

En obra se encuentra botiquín, extintor y camilla rígida, los cuales fueron inspeccionados respectivamente ver anexo N° 9. Inspecciones Equipo para atención de emergencias.

10. Reporte de los equipos empleados en el proyecto

En la obra se encuentran varias herramientas de trabajo, de las cuales se realiza inventario al inicio y al final de la obra; así mismo el seguimiento de estas en las inspecciones realizadas ver anexo No 10 Formato de Herramientas e inspecciones de equipos.

11. Reporte de Capacitaciones

Durante el periodo y teniendo en cuenta el plan de trabajo y el plan de capacitación, se llevaron a cabo las capacitaciones programadas en obra, anexo N° 11 registros de asistencia a las capacitaciones

12. Situaciones de emergencias

Durante la ejecución del contrato no se presentaron situaciones de emergencia, por eventos naturales, tecnológicos o sociales.

13. Reporte Actualización de riesgos y peligros

Dentro del desarrollo del proyecto no se han identificado riesgos adicionales asociados a las actividades desarrolladas.

14. Reporte de estándares mínimos y auto evaluación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

En cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019, se realiza a cabo la autoevaluación de estándares mínimos y ante el ministerio de trabajo. Ver anexo 11 informe de autoevaluación. Anexo 13. Reporte ante el ministerio de trabajo

LH NIT. 820.901.824 - 5 construcciones civiles s.a.s. ingenieros constructores y constructores de obras civiles y ambientales	**FORMATO INFORME DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Código:** FT-SST-062 **Fecha:** 13/06/2020 **Versión:** 001 Página **5** de **7**

FOTOGRAFÍAS

























Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST - 705919 - 2024 - 1**

Nombre de la Empresa :	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.		
Tipo Persona	Jurídica	Regimén Tributario :	Régimen común
Tipo Documento Empresa :	Número de Identificación Tributario	Número de Documento	820003826
Nombre Representante Legal :	Obdulio Larotta Garcia		
Responsable SG-SST :	Diana Yuliett Ovalle Aguilera	Correo SG-SST :	consultoria.sgssta@gmail.com
Periodo Correspondiente :	2024	Número Teléfonico fijo :	6087437451
Correo Electrónico :	lhconstruccionesciviles049@gmail.com	Cantidad Trabajadores :	2

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
5454302	**Riesgo V**	**TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS LAS EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIAS PARA HABILITAR LAS EDIFICACIONES Y LAS OBRAS CIVILES**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	Cumple totalmente	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	Cumple totalmente	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	Cumple totalmente	3.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	Cumple totalmente	2.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	Cumple totalmente	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	Cumple totalmente	5.00
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	Cumple totalmente	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	Cumple totalmente	2.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	Cumple totalmente	2.50
Total, Valor Estándar Valores Míminos de Calificación						99.00

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna "No Aplica" frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 3/3/2025 10:00 PM
Fecha de Diligenciamiento : 3/3/2025

Fecha de informe	15/05/2025	PLANILLAS CONTRATISTA	may-25			
			SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
RL CONTRATISTA 1	Obdulio La Rotta Garcia	LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	Planilla No.:		9487236818	
	C.C. 6765982					

EQUIPO	Periodos trabajados	Salario base cotización (Salario propuesto)	40% Salario base 40%	IBC (AFECTADO POR EL % DE DEDICACIÓN)	Salud (12,5%) 12.50%	Pensión (16%) 16.00%	ARL (%) 6.96%	may-25			
								SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
OBDULIO LA ROTTA GARCIA	De: Marzo 2025	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		7975212331	
Director de obra	A: Mayo 2025										
PUBLIO JOSE URRUTIA BAQUERO	De: Marzo 2025	$ 1,423,501.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		9487236818	
Residente de obra	A: Mayo 2025										
DIANA YULIETH OVALLE AGUILERA	De: Marzo 2025	$ 1,423,502.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		7967925092	
Profesional SST	A: Mayo 2025										
MIGUEL FABIAN BUITRAGO JEREZ	De: Marzo 2025	$ 1,423,503.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025										
VICTOR MANUEL GIL MATAMOROS	De: Marzo 2025	$ 1,423,504.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025										
ORLANDO BUITRAGO SAAVEDRA	De: Marzo 2025	$ 1,423,505.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025										
PEDRO JOSE MARTINEZ BAMBASICA	De: Marzo 2025	$ 1,423,506.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025										
GERMAN RODRIGUEZ ESPITIA	De: Marzo 2025	$ 1,423,507.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025										
TEODORO ROJAS MARTINEZ	De: Marzo 2025	$ 1,423,508.00	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 177,937.50	$ 227,760.00	$ 99,075.60	Planilla No.:		9487236818	
Empleado	A: Mayo 2025										

Revisó:	
Firma:	
Nombre:	OBDULIO LA ROTTA GARCÍA
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA

Aprobó	
Firma:	
Nombre:	SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON
Cargo:	SUPERVISOR

512

PLANILLAS

DIRECTOR DE OBRA

514

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6765982
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OBDULIO LA ROTTA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 12 # 21 - 50	TELÉFONO:	7437451
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Alquiler y arrendamiento de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7975212331**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1553589571

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 178.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 178.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6765982
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OBDULIO LA ROTTA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 12 # 21 - 50	TELÉFONO:	7437451
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7975212331	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1553589571

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6765982	LA ROTTA GARCIA OBDULIO	INDEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.423.500				NO		15																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 178.000

ach SOI
Planilla Pagada

515

PLANILLAS

INGENIERA SST

517

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073230379
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA YULIETT OVALLE AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 10 # 12-32 TORRE 7 APTO	TELÉFONO:	6018802
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7967925092**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1463629167		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073230379
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA YULIETT OVALLE AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 10 # 12-32 TORRE 7 APTO 227	TELÉFONO:	8018802
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7967925092	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1463629167

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0		$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**		**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD					ARP							CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1073230379	OVALLE AGUILERA DIANA YULIETT	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 107323037	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

548
