CONTRATO No. 4600102287 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (Digitar el período del informe a describir)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME OCTUBRE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	MOREAL INGENIEROS (Digitar NIT del contratista)
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL BARRIO LAS PALMAS SECTOR LA CALERA Y LA ATENCIÓN DE UNA ACCIÓN JUDICIAL**
VALOR INICIAL:	(Trescientos millones novecientos diez mil novecientos treinta y nueve pesos) $300.910.939
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	24 de agosto del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2024

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 46000102287 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de lo estipulado en el contrato 4600102287 de 2024, se presenta en el contenido del presente informe, el avance mensual correspondiente para las actividades ejecutadas hasta el momento, donde se contempla el seguimiento administrativo y financiero a partir de los lineamientos técnicos y el cronograma propuesto para le ejecución del mencionado contrato en el sitio de interés: sector La Calera – barrio Las Palmas, carrera 17 # 2- 161.

Las actividades ejecutadas que componen este primer informe de avance comprenden principalmente las labores iniciales de la etapa de campo, tal como lo son rocería y limpieza de vegetación, levantamientos topográficos, investigación de redes de servicios y prospección geotécnica. Los resultados obtenidos a partir de estas actividades se documentan a detalle en los informes técnicos que se presentarán una vez se tengan los respectivos diseños, así como los recursos empleados para su realización.

El presente informe se realiza con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución del contrato desde una perspectiva administrativa y financiera, permitiendo validar la ejecución y entrega adecuada de los diferentes productos, así como del cumplimiento del cronograma y los recursos presupuestados.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

Objeto:	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL BARRIO LAS PALMAS SECTOR LA CALERA Y LA ATENCION DE UNA ACCION JUDICIAL

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Ítem	Descripción	Cantidad (1)	% de Dedicación (2)	Salario (3)	Plazo (Meses) (4)	FM (5)	Valor Total ($) (1*2*3*4*5) = (6)
1	Director de consultoría	1.00	50.00%	$ 7,500,000.00	4.0	2.11	$ 31,650,000
2	Geólogo	1.00	50.00%	$ 5,300,000.00	2.0	2.11	$ 11,183,000
3	Geotecnista Senior	1.00	100.00%	$ 6,800,000.00	2.0	2.11	$ 28,696,000
4	Especialista Hidráulico	1.00	50.00%	$ 6,800,000.00	2.0	2.11	$ 14,348,000
5	Profesional Ingeniero Forestal.	1.00	50.00%	$ 5,300,000.00	2.0	2.11	$ 11,183,000
6	Profesional Presupuestador	1.00	100.00%	$ 5,300,000.00	1.0	2.11	$ 11,183,000
7	Arquitecto de apoyo	1.00	100.00%	$ 5,300,000.00	2.0	2.11	$ 22,366,000

B - Otros Costos directos

	Descripción	Cantidad (7)	Unidad de Medida	Valor Unitario ($) (8)	Duración (9)		Valor Total ($) (7*8*9) = (10)
1	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS						
1.1	TRABAJO DE CAMPO						
1.1.1	Levantamiento altiplanimetrico y topografico del terreno al detalle con la topografía tradicional (equipo de precisión con estación total y nivel); incluye amarre geodesico aprobado, mojones en los sitios que lo requieran, posicionamiento y todo lo necesario para la entrega completa del levantamiento del polígono a detalle. Incluye además, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; demarcación, pintura línea de trazado en los sitios que lo requieran, memorias de cálculo, copia de carteras, planos en AUTOCAD o el software que defina la Entidad, transporte a los sitios indicados en las especificaciones técnicas, archivos digitales, salarios, prestaciones sociales, utilidades y todo lo especificado en el Anexo 1 - Anexo Técnco de las especificaciones téncicas.	18.00	Día	$ 771,112.00	1.00		$ 13,880,016
1.1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA de vegetación herbácea preexistente, hasta altura de la vegetación de 0,50 m. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye transporte hasta botaderos oficiales.	800.00	m2	$ 7,464.00	1.00		$ 5,971,200
1.2	INVESTIGACION DE REDES DE SERVICIOS						$ -
1.2.1	TRABAJO DE CAMPO						$ -
1.2.1.1	Investigación de redes de alcantarillado (incluye elaboración de planos)	235.00	m	$ 3,850.00	1.00		$ 904,750
1.2.1.2	Investigación de redes de acueducto (incluye elaboración de planos).	235.00	m	$ 1,950.00	1.00		$ 458,250
1.2.1.3	Investigación de redes de gas.(incluye elaboración de planos)	235.00	m	$ 1,300.00	1.00		$ 305,500
1.2.1.4	Investigación de redes secas (energía, alumbrado público, telecomunicaciones y postes especiales de seguridad). Incluye elaboración de planos	235.00	m	$ 2,450.00	1.00		$ 575,750
1.2.1.5	Investigación de estructuras de recolección y/o evacuación de aguas (incluye elaboración de planos). Las estructuras de recoleccion pueden ser carcamos, sumideros, cunetas entre otras estructuras, con sus respectivos puntos de descarga como cajas de inspeccion, tanques y sumideros.	100.00	m	$ 3,800.00	1.00		$ 380,000
1.2.1.6	Apiques cuadrados en suelo de un metro de lado. Incluye excavacion o demolición en concreto de cualquier resistencia, llenos, acabado y cargue transporte y botada de escombros)	3.00	Unidad	$ 275,000.00	1.00		$ 825,000
2	ESTUDIOS GEOTECNICOS						$ -
2.1	TRABAJO DE CAMPO						$ -
2.1.1	Perforación en coluvion (diametro NQ) con broca de diamante que incluye toma de muestras alteradas e inalteradas cada metro. Incluye además suministro de agua, recobro de muestras debidamente almacenadas en cajas bajo todos los estándares de clasificación con su respectivo registro geológico diferente al del perforador. instalación y transporte del equipo, registros y personal de perforación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	57.00	m	$ 435,550.00	1.00		$ 24,826,350
2.1.2	Perforaciones en suelos con ensayo SPT, que incluyen toma de muestras alteradas e inalteradas cada metro, recobro de muestras inalteradas en shelby cada metro, debidamente almacenadas en cajas bajo todos los estándares de clasificación con su respectivo registro geológico diferente al del perforador.	31.00	m	$ 164,250.00	1.00		$ 5,091,750
2.2	TRABAJO DE LABORATORIO						$ -
2.2.1	Granulometria por tamizado.	21.00	Unidad	$ 129,360.00	1.00		$ 2,716,560
2.2.2	Limites consistencia.	21.00	Unidad	$ 76,560.00	1.00		$ 1,607,760
2.2.3	Humedades.	21.00	Unidad	$ 21,120.00	1.00		$ 443,520
2.2.4	Ensayos corte directo CD.	8.00	Unidad	$ 569,250.00	1.00		$ 4,554,000
2.2.5	Compresiones simples. Incluye preparacion de muestra en suelos.	13.00	Unidad	$ 341,550.00	1.00		$ 4,440,150
2.2.6	Compresiones simples, incluye preparación de la muestra en rocas.	10.00	Unidad	$ 221,918.00	1.00		$ 2,219,180
2.2.7	Gravedad específica	21.00	Unidad	$ 78,500.00	1.00		$ 1,648,500
2.2.8	Determinación de CBR sobre muestras inalteradas. Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual).	3.00	Unidad	$ 330,000.00	1.00		$ 990,000
2.3	ENSAYOS GEOFÍSICOS						$ -
2.3.1	Ensayo de refraccion sísmica con medición de velocidad de onda compresional (o de corte, según criterio del geotecnista). La línea deberá tener una longitud mínima de 80 m. El ensayo deberá llevarse a cabo en una fecha y horario que permita obtener datos confiables sobre la real estratigrafía del subsuelo.	2.00	Unidad	$ 3,215,000.00	1.00		$ 6,430,000
4	EDICION E IMPRESIÓN DE INFORMES Y PLANOS						$ -
4.1	Informe de avance mensuales (un (1) informe mensual por sitio intervenido). Incluye componente tecnico,administrativo, financiero juridico y forestal. Conclusiones, registro fotografico. Este informe se entrega uan vez obtenga la aprobacion del supervisor. Formato entregado por supervisor.	8.00	Unidad	$ 100,000.00	1.00		$ 800,000
4.2	Edición e impresión de mínimo tres (3) informes finales por sitio intervenido, incluye planos y CD. El informe debe incluir procedimientos empleados en los estudios y en los diseños (si aplica), información de todos los criterios para realizar los estudios y los diseños, memorias de calculo, registro fotográfico, planos, videos y todo lo necesario para un informe detallado. Lo anterior, siguiendo con los requerimientos descritos en el Anexo 1 de las especificaciones técnicas).	6.00	Unidad	$ 450,000.00	1.00		$ 2,700,000
4.3	Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	1.00	Mes	$ 519,100.00	4.00		$ 2,076,400
5	TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS						$ -
5.1	Transporte de personal y equipo liviano de perforación	6.00	Día	$ 495,000.00	1.00		$ 2,970,000
5.2	Trasporte equipos pesados de PERFORACIÓN a rotación.	2.00	Día	$ 2,090,000.00	1.00		$ 4,180,000
5.3	Auxilio por vigilancia de equipos	1.00	Estimado	$ 7,357,871.00	1.00		$ 7,357,871
5.4	Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista.	0.50	Mes	$ 8,500,000.00	2.00		$ 8,500,000
5.5	Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	3.00	Mes	$ 214,200.00	4.00		$ 2,570,400
6	Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas dentro de estas el diseño estructural de obras de contención u obras hidráulicas para estabilización de talud	382.00	Hora	$ 31,250.00	1.00		$ 11,937,500

	Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)		$ 130,809,000
	Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B)		$ 121,360,407
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= (C)		$ 251,969,407
	IVA (C * 19%) = (D)	19.00%	$ 47,874,187
	TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)		$ 299,843,594
	Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)		$ 1,067,345
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)			$ 300,910,939

alle 44 No. 52 – 165
iudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividades ejecutadas con porcentaje de avance hasta la fecha

A continuación, se relaciona en la Tabla 1.3 el avance en cada una de las actividades según el cronograma propuesto para la ejecución del contrato.

NOMBRE DE LA TAREA	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN (días)	COMENTARIOS
ESTABILIZACIÓN DEL TALUD CARRERA 17 # 2 - 161, SECTOR LA CALERA	**Iniciado**	**08/24**	**12/24**	**122**	
1. Levantamiento topográfico	Completado 100%	08/24	09/13	20	Pendiente de entrega para revisión
1.1 Rocería y limpieza de vegetación	Completado 100%	08/24	08/27	3	
1.2 Trabajo de campo topografía	Completado 100%	08/26	09/13	18	
1.3 Revisión y aprobación de productos	En proceso	09/13	09/28	15	En espera de aprobación del amarre
2. Investigación de redes de servicios públicos	Completado 100%	08/26	09/13	18	
3. Estudios geotécnicos	Iniciado	09/14	11/13	60	
3.1 Trabajo de campo geotecnia	Iniciado 33%	09/14	10/04	20	

Personal técnico que participó en la ejecución de actividades

Con relación a las actividades ejecutadas y a los avances presentados en el cronograma, a continuación, en la Tabla 1.4 se relaciona el personal profesional que ha participado durante el periodo septiembre-octubre.

Tabla 1.4 Relación del personal técnico involucrado en las actividades ejecutadas

Nombre	Cargo	Plazo (meses)	Dedicación
Daniel Mauricio Moreno Alarcón	Director de consultoría	1	50 %
Fredy Alejandro Tabares	Geólogo	1	50 %
Luis Carlos Cardona Galeano	Geotecnista	1	100%
Jhony Alejando Valencia Ocampo	Especialista hidráulico	1	50%
Ángela María Rodríguez González	Ingeniero forestal	1	50%

Registro fotográfico Ensayos geofísicos	
Registro fotográfico Trabajo de campo geotecnia - Perforación #2 y Perforación # 3: Profundidad 30 m c/u	 

NOMBRE DE LA TAREA	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN (días)	COMENTARIOS
ESTABILIZACIÓN DEL TALUD CARRERA 17 # 2 - 161, SECTOR LA CALERA	**Iniciado**	**08/24**	**12/24**	**122**	
1. Levantamiento topográfico	Completado 100%	08/24	09/13	20	
1.1 Rocería y limpieza de vegetación	Completado 100%	08/24	08/27	3	
1.2 Trabajo de campo topografía	Completado 100%	08/26	09/13	18	
1.3 Revisión y aprobación de productos	En proceso	09/13	09/28	15	Pendiente de entrega para revisión
2. Investigación de redes de servicios públicos	Completado 100%	08/26	09/13	18	
2.1 Revisión y aprobación de productos	En proceso	09/13	09/28	15	Pendiente de entrega para revisión
3. Estudios geotécnicos	Iniciado	09/14	11/13	60	
3.1 Trabajo de campo geotecnia	Completado 100%	09/14	10/04	20	
3.2 Trabajo de laboratorio	No iniciado	09/24	10/14	20	
3.3 Ensayos geofísicos	Completado 100%	10/10	10/19	9	
3.4 Estudios y análisis geológicos - geotécnicos	Iniciado	10/19	11/13	25	

Nombre	Cargo	Plazo (meses)	Dedicación
Daniel Mauricio Moreno Alarcón	Director de consultoría	1	50 %
Fredy Alejandro Tabares	Geólogo	1	50 %
Luis Carlos Cardona Galeano	Geotecnista	1	100%
Jhony Alejando Valencia Ocampo	Especialista hidráulico	1	50%
Ángela María Rodríguez González	Ingeniero forestal	1	50%

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

MOREAL INGENIEROS
Moreno Alarcón

Medellín, 30 de noviembre de 2024

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo DANIEL MAURICIO MORENO ALARCÓN identificado con cédula de ciudadanía N° 1.036.945.621 de Rionegro, actuando en representación legal de la empresa MOREAL INGENIEROS, entidad debidamente constituida e identificada con NIT. 900.992.071-3 de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442; que he efectuado el pago por concepto de aportes a sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje cuando a ello hubiere lugar (Artículo 65 ley 1819 de 2016), en los últimos seis (6) meses.

En constancia de lo anterior, se firma en Medellín-Antioquia a los treinta (30) días del mes noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

DANIEL MAURICIO MORENO ALARCÓN
C.C 1.036.945.621
Representante Legal
MOREAL INGENIEROS

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-02, 12:46:09 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72783034

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-06 14:11:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOREAL INGENIEROS SAS				
Documento	NI 900992071	**Dirección**	CR 46 #38 - 36 URBANIZACION SAMANES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6149934		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	5
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 1036945621		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036945621		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	5615000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF										Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														C		30	30	30									F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.300.000	$ 6.800	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-02, 12:45:35 p. m. **Tipo Planilla** N **Número Planilla** 73806771

Planilla Corregida Nro 72783034 **Periodo Cotización** 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-10-16 12:33:15.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOREAL INGENIEROS SAS				
Documento	NI 900992071	**Dirección**	CR 46 #38 - 36 URBANIZACION SAMANES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6149934		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 1036945621		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036945621		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	5615000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF										Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														C		30	30	30									F	$ 1.422.370	230301		16 %	$ 1.422.370	$ 227.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.422.370	$ 56.900	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.422.370	$ 99.000	CCF04	4 %	$ 1.422.370	$ 56.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 92.200	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.600

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-02, 12:49:23 p. m. **Tipo Planilla** N **Número Planilla** 73920159

Planilla Corregida Nro 73092886 **Periodo Cotización** 202409 **Periodo Servicio** 202410

PAGADA 2024-10-25 09:33:43.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOREAL INGENIEROS SAS				
Documento	NI 900992071	**Dirección**	CR 46 #38 - 36 URBANIZACION SAMANES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6149934		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 1036945621		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036945621		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	5615000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos							Caja				Parafiscales			
ING	RET	SLN	LMA	TDP	TAP	VSP	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
							C	X					0	30	30	30			F	$ 1.625.370	230301		16 %	$ 2.648.730	$ 423.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.648.730	$ 106.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.648.730	$ 184.400	CCF04	4 %	$ 2.648.730	$ 106.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 131.700	$ 0	$ 0	$ 32.900	$ 57.300	$ 32.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.800

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-02, 12:48:10 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73092886

Periodo Cotización 202409 **Periodo Servicio** 202410

PAGADA 2024-10-21 21:04:33.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOREAL INGENIEROS SAS				
Documento	NI 900992071	**Dirección**	CR 46 #38 - 36 URBANIZACION SAMANES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6149934		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	7
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 1036945621		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036945621		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	5615000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos							Caja				Parafiscales			
ING	RET	SLN	LMA	TDP	TAP	VSP	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
							X						0	30	30	30			F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.625.370	$ 292.100	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.625.370	$ 73.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.625.370	$ 127.100	CCF04	4 %	$ 1.625.370	$ 73.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 292.100	$ 0	$ 0	$ 73.100	$ 127.100	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.400

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-02, 12:49:23 p. m. **Tipo Planilla** N **Número Planilla** 73920159

Planilla Corregida Nro 73092886 **Periodo Cotización** 202409 **Periodo Servicio** 202410

PAGADA 2024-10-25 09:33:43.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOREAL INGENIEROS SAS				
Documento	NI 900992071	**Dirección**	CR 46 #38 - 36 URBANIZACION SAMANES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6149934		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 1036945621		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036945621		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	5615000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Días SENA			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
							C	X							0	30	30	30	30		F	$ 1.825.370	230301		16 %	$ 2.648.730	$ 423.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.648.730	$ 106.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.648.730	$ 184.400	CCF04	4 %	$ 2.648.730	$ 106.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 131.700	$ 0	$ 0	$ 32.900	$ 57.300	$ 32.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.800

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-02, 12:48:10 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73092886

Periodo Cotización 202409 **Periodo Servicio** 202410

PAGADA 2024-10-21 21:04:33.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOREAL INGENIEROS SAS				
Documento	NI 900992071	**Dirección**	CR 46 #38 - 36 URBANIZACION SAMANES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6149934		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	7
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 1036945621		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036945621		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MORENO ALARCON DANIEL MAURICIO	5615000 - 05		ANTIOQUIA


III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Días SENA			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.825.370	$ 292.100	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.825.370	$ 73.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.825.370	$ 127.100	CCF04	4 %	$ 1.825.370	$ 73.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 292.100	$ 0	$ 0	$ 73.100	$ 127.100	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.400

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	73806771	4000	19.600	92.200	121.800
Agosto	73806771	4000	19.600	92.200	121.800
Septiembre	73920159	32.000	131.700	57.300	254.000
Septiembre	73092886	73.100	292.100	127.100	585.400
Septiembre	73920159	32.900	131.700	57.300	254.800

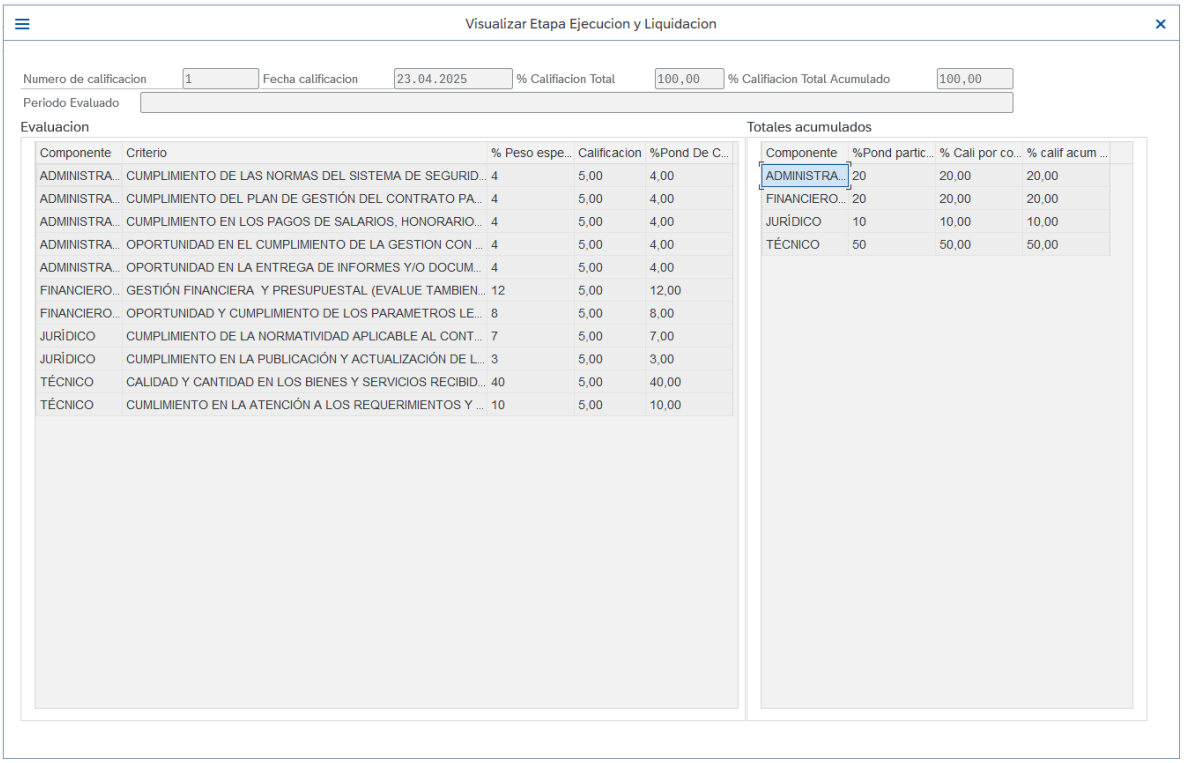

Componente	Criterio	% Peso espe...	Calificacion	%Pond De C...
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURID...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PA...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIO...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON ...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUM...	4	5,00	4,00
FINANCIERO...	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN...	12	5,00	12,00
FINANCIERO...	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LE...	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONT...	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE L...	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBID...	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y ...	10	5,00	10,00

Componente	%Pond partic...	% Cali por co...	% calif acum ...
ADMINISTRA...	20	20,00	20,00
FINANCIERO...	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	300.910.939
Adiciones	N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Total valor del contrato más adiciones	300.910.939
Pagos Realizados (Acumulado)	-0-
Pago autorizado del mes de Septiembre	-0-
Porcentaje de ejecución financiera	0%

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
MUNDIAL	100056026	Calidad		260.000.000		
		Cumplimiento		260.000.000		
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros		260.000.000		

-

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor, el contratista no presento cuenta de cobro.

Atentamente,

Óscar Omar Montoya E
Supervisor y/o Interventor
