AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	14 de julio de 2025
Semana No.	**52**	**Del :**	5 de julio de 2025	**al**	11 de julio de 2025

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	360	días	**Tiempo restante**	96 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	78.95%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

A partir del informe 36, se reporta la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta el plan de contigencia No. 2, aprobado al contratista, para la nivelación de la ejecución, cuyo plazo de monitoreo se determina hasta el 16 de mayo de 2025. De acuerdo con esto, se ajustaron los porcentajes y valores acumulados, que para el informe semanal 52, reporta lo siguiente:

	Semanal	Acumulado		Semanal		Acumulado
(%) Programado	4.04%	82.34%	**(%) Ejecutado**	4.06%		65.39%
Valor programado ($)	$99,827,308.44	$2,035,229,045.94	**Valor ejecutado ($)**	$100,336,131.00		$1,616,343,669.19
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**		-16.95%
				Valor Adelanto/Atraso		-$ 418,885,376.75

OBSERVACIONES

Teniendo en cuentael plan de contenegia No. 2, aprobadoal contratista, se las actividades que ya se encutrna programadas para ejecución, se reporta el sigueitne estado y porcentaje:

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**100.00%**	**85.47%**	**-14.53%**	**Ejecutado con retrasos**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Localización y replanteo con equipo topográfico	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Campamento 18 M2	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Dia de trasiego - 2 ayudantes	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Unica, Formato (0,56 M x 0,56 M).	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Guardaescobas en PVC Blanco h = 8.5 cms	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	100.00%	93.28%	**-6.72%**	**Ejecutado con retrasos**
Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta	100.00%	61.14%	**-38.86%**	**Ejecutado con retrasos**
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100.00%	33.13%	**-66.87%**	**Ejecutado con retrasos**
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100.00%	33.33%	**-66.67%**	**Ejecutado con retrasos**
Estuco plastico acrilico	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta correditza,	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica entrada posterior para fluxómetro REF. REF 113121001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de orinal alongado, conexión superior 0,5 GPD. Importado Toto. 5-AA-UT104E#01. No incluye fluxometro	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación grifería con sensor city - sku: KG25CR048	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable Referencia 706590001	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de ducha antivandalica con regadera Tubular - REF. 754000001 O SIMILAR	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación dispensador de jabón 1.2 LT cuerpo en acero inoxidable REF- 217601 (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel higiénico para rollo institucional en acero inoxidable (incluye accesorios de fijación) Ref. 706670001	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de Dispensadores de toallas para manos en acero inoxidable. REF 706150001. (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Cañuela prefabricada Tipo A-120	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco,	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario sala de turno	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario Taller	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario de oficina	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**100.00%**	**77.84%**	**-22.16%**	**Ejecutado con retrasos**
TUBERIA PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
S/CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
YEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
TEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
UNIÓN PVC-S 2"	100.00%	25.00%	**-75.00%**	**Terminado**
PUNTO LAVAMANOS 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
TRAGANTE 4"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN 4"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**

Equipo Hidroneumático 1 hp 60 Litros Horizontal Horiz	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
VÁLVULA DE CORTE 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
BRIDA 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
CHEQUE 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
TUBERIA PVC-P 1"	100.00%	66.89%	-33.11%	Ejecutado con retrasos
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CODO PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TEE PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
UNIÓN PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO DUCHA 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**99.29%**	**69.77%**	**-29.51%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100.00%	57.50%	-42.50%	Ejecutado con retrasos
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4".	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	100.00%	23.33%	-76.67%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	100.00%	25.00%	-75.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa.	100.00%	20.00%	-80.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	45.33%	-54.67%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	100.00%	15.67%	-84.33%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100.00%	82.00%	-18.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100.00%	50.00%	-50.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorizacion de 12 hilos de fibra.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalacion de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 × 1080.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de Disco Duro 8TB 3.5IN	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
ENTREGA SEGUNDA FASE	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes sin AIU - Solo IVA)	**69.57%**	**35.87%**	**-33.70%**	**Ejecutado con retrasos**
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 480/220 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-IK 10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	-15.00%	Ejecutado con retrasos
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 220/480 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	-15.00%	Ejecutado con retrasos
Tablero General Aerocivil 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	100.00%	80.00%	-20.00%	Ejecutado con retrasos
Equipo controlador de reactivos 30 kVA - 220 V (Generador activo electronico) incluye comunicación con SCADA, (velocidad <15 mseg, compensacion inductiva y	100.00%	25.00%	-75.00%	Ejecutado con retrasos
Tablero General Ayudas Visuales 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Sistema de generación solar 30 Paneles monocristalinos de 545 W, incluye; Soportes mecánicos y eléctricos de todo el sistema, todo el cableado y conexionado DC,	56.25%	50.00%	-6.25%	Ejecutado con retrasos
Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	56.25%	0.00%	-56.25%	Ejecutado con retrasos
Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	56.25%	50.00%	-6.25%	Ejecutado con retrasos
TERMINACIÓN Y ENTREGA	**25.00%**	**25.00%**	**0.00%**	**Terminado**
ENTREGA PRIMERA FASE	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2,471,685,007.00	**Valor Inicial:**	$ 855,375,978.00
Valor Anticipo:	$ 535,395,600	**Valor Anticipo:**	$ 0.00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2,471,685,007	**Valor total actual del contrato**	$ 855,375,978.00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIALES
2. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME SEMANAL 51
3. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA
4. ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ
5. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 48

ACTIVIDADES DIARIAS

SABADO 5 de julio de 2025	TURNO DIURNO 07:00 AM a 12:00 M	1. Pintura exterior de subestación. 2. Apertura de regatas para instalacion de tuberia de aires acondicionados.
DOMINGO	TURNO DIURNO	DIA NO LABORAL

6 de julio de 2025	7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL
LUNES 7 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Aplicación de pintura exterior en subestación 2. Ingreso de 4 aires acondicionados marca LG inverter, 2 de 18000 BTU, 1 de 24000 BTU y 1 de 12000 BTU.
MARTES 8 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Aplicación de pintura exterior en subestación
MIERCOLES 9 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Aplicación de pintura exterior en subestación 2. Instalación de aires acondicionados 3. Instalación de red contra incendios
JUEVES 10 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 17:00 PM	1. Fusion de fibra optica en S/E nueva, S/E Principal y torre de control 2. Instalación de aires acondicionados día 2 3. Instalación de red contra incendios día 2 4. Resane de mamposteria
VIERNES 11 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Instalación de estaciones manuales, sensores y sirena de red contra incendios 2. Resane de regatas

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Sabado 05/07/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Exposicion al ruido y sus consecuencias"
• Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de aplicacion de pintura parte exterior de subestación
• Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de señalizacion de area de trabajo
• Se realiza socialización de programación de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Domingo 06/07/2025
•Dia no laboral

Lunes 07/07/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Riesgo Psicosocial en la obra"
• Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de aplicacion de pintura parte exterior de subestación
• Se realiza socialización de programación de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Martes 08/07/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado " estiramiento muscular"
• Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de aplicacion de pintura parte exterior de subestación
• Se realiza socialización de programación de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Miercoles 09/07/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Importancia del uso de los EPP"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de aplicación de pintura exterior en subestación
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instalación de aires acondicionados
• Se realiza socialización de programación de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo con el profesional SST del contratista para validar condiciones de trabajo

Jueves 10/07/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Higiene postural"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instalación de reflectores exteriores con alimentación
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instalación de red contra incendio
• Se realiza socialización de programación de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Viernes 11/07/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Importancia de los elementos de proteccion personal"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instalación de estaciones manuales, sensores y sirena de red contra incendios
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de señalizacion de area de trabajo
• Se realiza socialización de programación de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo con el profesional SST del contratista para validar condiciones de trabajo

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1. Educación Ambiental	**EA -1 Educación Ambiental**	El 5 de julio de 2025, en conmemoración del Día Internacional de la Reducción de Bolsas Plásticas, la residente ambiental del contratista llevó a cabo una charla de educación ambiental enfocada en la importancia del reciclaje de las bolsas plásticas. Durante la actividad, se abordaron las principales afectaciones generadas por el uso excesivo de este material, así como las prácticas más comunes y efectivas para su reducción. Por otra parte, el 8 de julio de 2025 se realizó una capacitación sobre el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del aeropuerto. En esta sesión se explicaron las medidas implementadas en función de los impactos identificados, y se analizó su influencia sobre el entorno en el que se desarrollan las actividades constructivas.
2. Disposición Adecuada de Residuos Solidos Generados en Obra.	**PGR - 1 Gestión Integral de Residuos Solidos Convencionales y Residuos Líquidos**	El 8 de julio de 2025, el contratista realizó actividades de segregación, pesaje y traslado de los residuos sólidos convencionales generados en la obra hacia el centro de acopio del Aeropuerto Almirante Padilla. Durante la semana 52, se registró un total de 7,82 kg de residuos sólidos aprovechables evacuados desde el frente de obra. Se informa que aún se encuentra pendiente la evacuación de residuos líquidos y el mantenimiento de la unidad sanitaria dispuesta en el área de trabajo. Adicionalmente, se efectuaron labores de inspección y seguimiento a la generación de residuos derivados de las actividades de pintura ejecutadas en el exterior de la subestación. Igualmente, se realizó el seguimiento a la entrega de bolsas de cemento por parte del contratista a la Ferretería Beraca, para su posterior reutilización.

3. Manejo de Actividades de Construcción y Adecuación. 1.Pintura exterior de subestación. 2. Apertura de regatas para instalación de tubería de aire acondicionados. 3. Ingreso de 4 aires acondicionados marca LG inverter, 2 de 18000 BTU, 1 de 24000 BTU y 1 de 12000 BTU. 4.Instalación de aires acondicionados 5.Instalación de red contra incendios 6. Fusión de fibra óptica en S/E nueva, S/E Principal y torr de control 7.Resane de mampostería 8. Instalación de estaciones manuales, sensores y sirena d red contra incendios	**MACA 4- Manejo de materiales de construcción**	Con base en las inspecciones diarias realizadas, se verificó el cumplimiento de las siguientes condiciones en el frente de obra: - El material de construcción (Arena y Grava) presente en el frente de obra se encuentra cubierto y demarcado. - No se realizaron actividades de lavado de maquinaria ni de la mezcladora en el frente de obra. - Los elementos prefabricados se almacenaron a una altura inferior a 1,5 metros; por lo tanto, su disposición y manejo no representaron riesgo alguno para el personal del aeropuerto, los pasajeros ni el equipo de obra. - Las zonas con varillas o elementos con puntas expuestas fueron debidamente demarcadas con cinta de señalización de peligro.
	MACA #6 - Control de la contaminación en la construcción.	- Se realizó seguimiento a la inspección previa al inicio de labores de los equipos presentes en la zona de trabajo. - Los residuos de construcción y demolición (RCD) permanecen cubiertos en el frente de obra. - Se adelantaron labores de Organización y limpieza en el frente de obra. - No se efectuaron actividades de lavado de maquinaria y/o equipos en el frente de obra. - El frente de obra cuenta con contenedores para la clasificación de residuos, conforme a la nueva codificación de colores establecida en la Resolución 2184 de 2019. - Se cuenta con una unidad sanitaria en funcionamiento y a la espera del respectivo mantenimiento
	MACA #7 - Señalización de las áreas de construcción	Los sitios con alto potencial de riesgo y que pueden provocar algún tipo de accidente permanecen debidamente señalizados, estos incluyen puntas expuestas, excavaciones, entre otros. Las áreas se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas con cinta de peligro.
4. Acciones desarrolladas por la interventoría Ambiental	**Inspección y seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental**	En el marco de las funciones de interventoría ambiental, se realizaron inspecciones técnicas diarias en el frente de obra con el propósito de verificar la implementación de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto y hacer seguimiento a las actividades de gestión ambiental. Se llevó a cabo una capacitación sobre el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, en la cual se abordaron los lineamientos legales, las etapas del proceso y las posibles consecuencias ante el incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades del proyecto. Durante la semana, se realizó acompañamiento a la visita de la Directora de Medio Ambiente y Vivienda del Distrito de Riohacha al frente de obra, con el objetivo de evaluar el aprovechamiento del material RCD (Residuos de Construcción y Demolición) como material de relleno. Tras la inspección, se expresó un concepto favorable sobre el desarrollo de esta actividad, destacando su viabilidad técnica y ambiental. Se encuentra en espera el comunicado oficial por parte de la entidad, que formalice dicha aprobación. Se realizó la revisión de los informes semanales y mensual presentados por el contratista. Se participó en el comité de seguimiento, donde se manifestó la importancia del mantenimeinto a la unidad sanitaria.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


Durante la semana del 5 al 11 de julio de 2025 se realizaron diversas actividades técnicas relevantes para el avance del proyecto. Se ejecutó la pintura exterior de la subestación en varias jornadas consecutivas. Se llevó a cabo la instalación completa de los cuatro aires acondicionados LG inverter (dos de 18.000 BTU, uno de 24.000 BTU y uno de 12.000 BTU), incluyendo pruebas de funcionamiento, quedando pendiente la adecuación de su alimentación eléctrica. En paralelo, se dio inicio y continuidad a la instalación de la red contra incendios, con ubicación de estaciones manuales, sensores y sirenas. También se realizó la fusión de fibra óptica entre la subestación nueva, la subestación principal y la torre de control. Complementariamente, se ejecutaron trabajos de resane de mampostería y regatas, así como el trasiego de materiales en sitio.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este perdido no se reporta el ingreso del vehículo de la empresa Sani Public	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas


PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA


Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	14
Total Personal	20






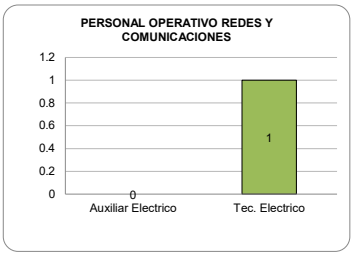



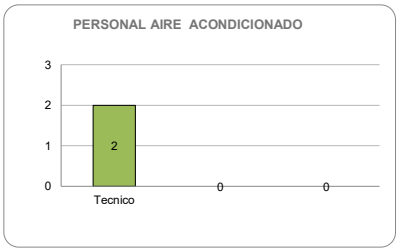



CORRESPONDENCIA ENVIADA

CS. UAAC-INT-518-084-2025 Entrega informe semanal 51 interventoría
CS. UAAC-INT-518-085-2025 Solicitud adición Interv. por reajuste valor del contrato - V2
CS. UAAC-INT-518-086-2025 Instalación de aires acondicionados
CS. UAAC-INT-518-087-2025 Solicitud adición obra. por reajuste valor del contrato

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72,340,149.00
2	del 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025	$ 234,646,711.00
3	del 1 febrero al 25 marzo de 2025	$ 280,038,868.00
4	del 26 de marzo al 31 de mayo de 2025	$ 63,010,550.00
Total Acumulado	**$ 650,036,278.00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 650,036,278.00
% Avance facturado Acumulado
26.30%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27,115,133.00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11,466,118.00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11,466,118.00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11,466,118.00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27,984,159.00
6	del 17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025	$ 11,466,118.00
7	del 17 de enero al 16 de febrero de 2025	$ 64,966,531.00
8	del 17 de febrero al 16 de marzo de 2025	$ 11,466,118.00
9	del 17 de marzo al 16 de abril de 2025	$ 75,339,635.00
10	del 17 de abril al 16 de mayo de 2025	$ 11,466,117.67
11	del 17 de mayo al 16 de junio de 2025	$ 11,466,117.67
Total Acumulado	**$ 275,668,283.34**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855,375,978.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 275,668,283.34
% Avance facturado Acumulado
32.23%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Revision de preoperacion, equipós y herramientas y AST



Acompañameinto durante la charla de segrudiad





Pintura de fachda exterior



Apertura de tegatas para instalacion de aires acondicionados



Pintura de fachda exterior





Instalación de aires acondicionados





Instalación de tablero de control RCI y tanque con agente limpio



Instalación de tuberias de cobre - Aires acondicionados



Pañete de mamposteria de regatas





Instalacion de tuberia para agente extintor




Anclaje de unidades aires acondicionados







Pruebas de operación y funcionamiento - Aires acondicionados





Fusión de fibra optica





Instalación de estaciones manuales de sistema RCI, sensores, y sirena - cableado del sistema



Educación Ambiental



Gestión de Residuos



Jornada de Limpieza, orden y aseo



Visita del ente municipal para aprovechamiento del RCD

 	 
Material de construcción y RCD debidamente Cubiertos	Unidad Sanitaria Presente en el frente de obra/ Señalizaciones en areas intervenidas

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Durante la semana del 5 al 11 de julio de 2025 se avanzó en actividades como la pintura exterior de la subestación, instalación y pruebas de operación de cuatro aires acondicionados LG inverter (pendiente su alimentación eléctrica), inicio de la red contra incendios y fusión de fibra óptica en puntos clave del proyecto. Sin embargo, se mantiene una limitación operativa por la reducción del personal de obra civil a solo tres auxiliares, lo que afecta el ritmo general de ejecución. El avance físico acumulado en presupuesto es del 65.22%, con un retraso del 17.12% respecto a lo programado (82.34%), mientras que en duraciones el avance acumulado es del 72.14%, reflejando un atraso estimado de 73 días. Se está a la espera de la actualización del balance de obra y los no previstos para ajustar proyecciones.	ING. OMAR TRIGOS LACERA
