112 12 de Febrero de 2019

Se realizan acciones correctivas: se reemplazan los terraplenes del componente forestal se le realiza mantenimiento a los cerramientos internos de cajas y pozos con una capa delimitación y/o identificación; Adicional a esto se realiza señalización del componente NO-BIOTICO y se ubica a una cota de la salida en la base de dicho costado, y la instalación de 4 nuevas señalizaciones correspondientes a "Ruta de evacuación"; Sumandose estas a las 4 previamente existentes se revisan los tanques.

ATT: ASTRID MALDONADO
RESIDENTE SST

113 13 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

SE REALIZA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN MILENTA TUBERIA 4" AC ENTRE K0+009 - K0+126 C. NORTE.

SE INICIA CONSTRUCCIÓN CAJAS AGUAS NEGRAS COSTADO NORTE (PRUEBA APROBADA) SE RECIBE SUBRASANTE POR NIVELES Y PRUEBA DE CARGA ENTRE K0+000 K0+138,70 AUTORIZANDO ESTA INTERVENTORIA LA COLOCACIÓN MEZCLA Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE RECICLADO O NO CUMPLIENDO CON LAS SOLICITUDES DEL DISEÑO QUE APLICA A ESTE FRENTE.

ING. INTERSA S.A
INTERVENTOR.

RES TECNICO
INTERVENTORIA

114 14 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

SE AUTORIZA INSTALACIÓN BORDILLO ANDEN PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL COSTADO SUR, SE SOLICITAN MAS PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA YA QUE SE INCREMENTAN LAS ACTIVIDADES Y LAS 6 PERSONAS QUE HAY EN OBRA NO DAN ALCANCE PARA EJECUTAR TODAS LAS OBRAS PENDIENTES.

NO AUTORIZANDO CORRER CIERRE A 80cm DEL INTERVENTOR. PERMANENTE.

SE INICIA EN OBRA MEZCLA 50:50 FRESADO Y B600 ACORDE A DISEÑO DE PAVIMENTO APROVADO POR ESTA INTERVENTORIA.

ING INTERVENTOR
INTERSA S.A

RES TECNICO
INTERVENTORIA

norma

Scanned with CamScanner

49

115. 14- febrero se autoriza cortes cerramiento para la instalacion del Bordillo A-80.cm como gestor Peatonal y personal de Aux. trafico para indicar al peaton del ingreso a sus Predios.

Residente SISTRA

116 14- febrero del 2019.
Componente Social: Se realiza recorrido Por frente de Obra Junto a la Profesional Social del contratista con el fin de verificar que las instalaciones del componente Social se encuentre en orden y al dia, Por otro lado se verifica si se encuentra algún tipo de queja reclamo o Solicitud Por Parte de la comunidad.

Residente Social Alejandra Chaparro
Yesica Agudelo G. Interventora.
RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA

Pink Yesi Rueda

117 15/02/2019 luego de realizar verificación del Frente de la obra se evidencia que no hay presencia del personal de la interventoria dado que al recorrido realizado por el IDU se empieza a las 08:00 am, no se encuentre el inspector de la interventoria por más que se ha preguntado al personal de la obra, se evidencia que el COI ubicado en el componente se encuentra Vencido a fecha del 14 de febrero de 2019 por lo anterior es evidente una (falta) inadecuada gestion frente al seguimiento administrativo del contrato en el Frente de obra. De igual Forma las Vallas de identificación general de la obra no se encuentran instaladas en debida Forma, Hecho que fue del conocimiento del Director de la obra por parte de la Interventoria.

15/2/19 Fecha de Recorrido Local.

Angélica R
Contratista
LGUA

RES TECNICO INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

118 13/02/19

Se realiza recorrido por el tramo, evidenciando que la valla no se encuentra visible para la comunidad, además se hace la solicitud mayor presencia de la residente social, para recibir las quejas y quienes inquietudes de la comunidad.

Paul Yesid Rueda

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

119 15-02-19

Se realiza recorrido al frente de Milenta, se observa falta de Orden y aseo en las carpas, por lo tanto se solicita al Contratista definir una sola persona para Cumplir estas funciones; realizar reinducción del personal sobre uso adecuado de los EPP.

Monica Fajardo P.

Residente SISMA Interventoría.

125 Febrero 15 de 2019

De acuerdo con el requerimiento realizado por la Alcaldía se confirma que la obra de Milenta cuenta con PMT aprobado vigente y publicado el 14 de febrero en horas de la noche, COI No. 07 del 14 de febrero de 2019, item No. 8554 autorizado del 15 de febrero al 28 de marzo y se procede a imprimir y publicar en carpa de obra.

Angélica R.
Contratista
LGNG.

116 FEBRERO 15 DE 2019

DE ACUERDO A LA NOTA EMITIDA POR LA ALCALDIA EL DIA DE HOY, LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE EL PERSONAL TECNICO (INSPECTOR) SE ENCONTRABA LLEVANDO UNA MUESTRA DEL MATERIAL DE FRESADO Y MATERIAL BASO AL LABORATORIO PARA SU CLASIFICACIÓN Y DIFERENTES ENSAYOS PROPIOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS POR LO ANTERIOR SU HORA DE LLEGADA A OBRA FUE A LAS 9:00 a.m.

EL COI SE ENCUENTRA VIGENTE (ACTUALIZADO) Y NO SE ENCUENTRA EN OBRA SEGUN LO SOLICITADO.

INTELSA S.A

RES TECNICO
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

5!

De acuerdo a la observación realizada por la alcaldía, cabe aclarar que los residentes de la interventoría se encontraban realizando actividades administrativas (Elaboración informe de incumplimiento al contratista), por tal motivo no se encontraron en obra, sin embargo se realizó recorrido a las 8:20 am con el supervisor de la alcaldía.
Por otro lado, NUEVAMENTE se le solicita al contratista mas permanencia de los residentes en obra, Se requiere que por lo menos 1 de los 2 residentes técnicos se encuentre en obra ya que en varias ocasiones la interventoría en sus recorridos no encuentra ninguno, Se le solicita al contratista vincular el inspector que falta, ya que se van a intervenir otros segmentos.
- SE SOLICITA PRESENCIA EN OBRA 100%

Raúl A. Arciniegas C.
RES. INTERVENTORIA

11-7 Febrero 15 de 2019

De manera inmediata se realiza orden y aseo de las cajas y como es evidenciado por la interventoría, en cuanto a la reiterada solicitud de realizar, pero este aclarar que es muy importante acercarse al trabajador y verificar la actividad que este realizando todo en razón a que el trabajador tenía el casco al revés porque estaba trabajando dentro de la excavación para las cajas de inspección, y para esa actividad el ala del casco les impide realizar la labor llegando a ser más riesgoso que tenga el casco bien puesto, puesto que en el ala se queda y es más fácil generar un accidente.

ADOLFO MALDONADO
RESIDENTE

118 16 - FEB - 2019 TIEMPO SECO

16- FEB - 2019.
Se realiza recorrido por el tramo, comprobando que la valla informativa se encuentra visible a la comunidad. El día de ayer se le comunico al contratista, inquietud por parte de una residente, la cual manifesta en olor fuerte a gas, posiblemente en el predio 53A-41, la residente informa que efectivamente el día de ayer 15 de febrero se presento ruptura en el tubo del gas, pero ya se hizo el arreglo respectivo. Por otro lado el día de hoy, en las inspecciones realizadas por parte del acueducto EEAB, indicó que entre martes 19 y miercóles 20 de febrero, se suspendrá el servicio de agua, para realizar actividades de unión de la red de acueducto nueva a la existente, por lo cúal se le solicita al contratista enviar volante informativo, para que la comunidad realice abastecimiento de agua.

Dinh Yesid Rueda
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

119 16- FEBRERO 2019 121

Se evidencia a todo el personal de obra con su dotación, personal de trafico y BOAL completo. Quedan todas las placas de las cajas de Inspección del costado Norte, se le informa al inspector de obras dejen señalizado todas las pozos de inspección y queda un Registro fotografico para el fin de semana.

Cuadro informe residente SISTRA.

120 16 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO
SE RECIBE SUBRASANTE ENTRE K0+138 - K0+020 PARA MEZCLA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RAP TODA LA CALZADA, EL CONTRATISTA DEBE TENER EN CUENTA Y DATOR LAS OBSERVACIONES QUE REALICE LA INTERVENTORIA ANTES DURANTE Y DESPUES DE INSTALADO EL RAP, SE SUGIERE TENER MAS DE DOS EQUIPOS PARA MEZCLA LO CUAL PERMITE

norma

Scanned with CamScanner

53

GARANTIZAR LA HOMOGENIDAD DE DICHA MEZCLA. Y MINIMIZANDO LOS TIEMPOS REQUERIDOS. DICHA MEZCLA DEBERA SER EXTENDIDA EN PRIMER INSTANCIA PARA ADICIONAR EL 50% DE EMULSION, SE MEZCLARA Y SE EXTENDERA Y SE PROCEDERA CON LA ADICIÓN DEL OTRO 50% DE EMULSION MEZCLANDO EXTENDIENDO Y NIVELANDO DICHO DOPE, ESTE TRAMO TRABAJADO QUEDARA CERRADO EN SU TOTALIDAD DURANTE 5 DIAS TIEMPO PRUDENCIAL DE CURADO (ART. 461 INVIAS).

SE DEBE HACER LAVADO Y REVISIÓN DE LAS REDES INSTALADAS (ANTES DE ROP PREFERIBLEMENTE) PREVINIENDO DAÑOS. EN EL K0+050 M. HACER REPARACIÓN DE RED PLUVIAL (NUEVA EN CONCRETO CRTV EVIDENCIA DAÑO) SOBRE EL LOMO DE TUBO. LAS ACOMETIDAS DEBEN ESTAR A 50cm MINIMO DE LA SUBRASANTE (SOLICITUD EAAB).

INTERSO
INTERVENTORIA

RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

12) Febrero 16 de 2019

El día de hoy se realiza visita por parte de la CHB para inspección de las tuberías recién instaladas y de acuerdo con las novedades encontradas se procederá con el lavado de la red de alcantarillado sanitario y el arreglo del tubo de aguas lluvias lo antes posible previa programación con el contratista que realizará la actividad.

De acuerdo con lo solicitado por el acueducto, el lunes se realizarán las excavaciones para los empates y se tendrán los materiales solicitados en obra para programar el cierre para el día martes 19 de febrero posiblemente. Por parte del acueducto realizarán nueva visita el lunes 18 de febrero para verificación y programación definitiva.

El día de hoy se iniciará la extensión de material granular mezclado en el tramo para proceder con la mezcla con emulsión el próximo lunes.

R. Residente Técnico Interventoría.

Scanned with CamScanner

(122) 18 - FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

DANDO ALCANCE A LA NOTA EMITIDA POR ESTA INTERVENTORIA (NOTA 120 DT 16 DE FEBRERO) LA INTERVENTORIA LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS SON SU RESPONSABILIDAD YA QUE DEBEN ENTREGAR A ESTA INTERVENTORIA EL PRODUCTO TERMINADO EN CADA PROCESO, POR LO ANTERIOR SE LE RECUERDA QUE EL RAP SERA RECIBIDO BAJO LOS PARAMETROS Y NORMAS VIGENTES TANTO EN TOPOGRAFIA COMO POR AREA TECNICA (ESPECIFICACIONES VIGENTES).


INTERSA S.A
INTERVENTORIA

RES TECNICO
INTERVENTORIA

(123) 18 - FEBRERO DE 2019

Siendo las 7:30 am se realiza recorrido por el tramo, evidenciando nuevamente que la valla informativa se encuentra dentro del cerramiento y por ende no es visible a la comunidad Se le es solicita al contratista realizar gestión para que la valla este visible a la comunidad

Paola Yaneth Rueda
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

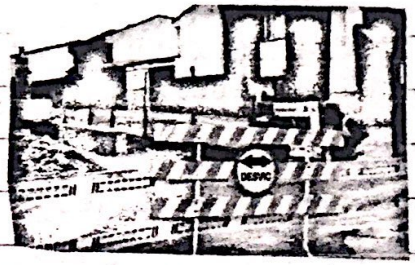

(124) 18-Febrero-2019

Se realiza recorrido al CIV 16002026, se evidencia Sumidero en mal estado, cajas Sin Señalización, Señales informativas Caidas, Se recomienda que la persona encargada de Bodi, este pendiente de estas observaciones y al inicio del dia, los Cornejos no se evidencia presencia del Personal SSTMA, en actividades de RAP.

Horacio Fajardo.
Residente Ambiental Intersa.

55

(125) 16 de Febrero de 2019
Dando respuesta a las observaciones de interventoría, se informa que se corrigieron, se hace presencia en la actividad de RAP; se evidencia que se cumple con las especificaciones técnicas; las actividades se iniciaron hoy con emulsión; si estamos haciendo presencia es una actividad técnica el área ambiental reporta cantidades, sin embargo se deja constancia.

Angélica R.
Contratista LQVG

(126) 18 de Febrero de 2019
De acuerdo con lo programado la semana anterior, el día de hoy se realiza la mezcla de material granular con emulsión asfáltica tipo CRL-1 a lo largo del tramo. Adicionalmente se trabaja en las excavaciones para los empates de la red de acueducto renovada, siguiendo lo solicitado por el personal de la EAB en la visita realizada el sábado anterior.

Angélica
Contratista LQVG

(127) 18 - FEBRERO DE 2019
Se evidencia la entrega predio a predio del volante N°9, correspondiente a la reunión de avance del día 26 de febrero; la entrega fué realizada por la guia cívica, a las 2:30 pm.
Se solicita nuevamente mayor presencia de la residente social.

Paola Yised Rueda
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

128 18 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO.
SE TERMINA MEZCLADO DE RAP EN HORAS DE LA TARDE, DEBIDO A POSIBLE(S) LLUVIA) SE ACOPIA ESTE MATERIAL SE TAPA CON PLASTICO PARA SU EXTENSION CEREADO Y COMPACTACION EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA,

INTEXSA S.A
INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner


54

(122) 18-FEBRERO 2019 TIEMPO SECO
DANDO ALCANCE A LA NOTA EMITIDA POR ESTA INTERVENTORIA (NOTA 120 DE 16 DE FEBRERO) LA INTERVENTORIA LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS SON SU RESPONSABILIDAD YA QUE DEBEN ENTREGAR A ESTA INTERVENTORIA EL PRODUCTO TERMINADO EN CADA PROCESO, POR LO ANTERIOR SE LE RECUERDA QUE EL RAP SERA RECIBIDO BAJO LOS PARAMETROS Y NORMAS VIGENTES TANTO EN TOPOGRAFIA COMO POR AREA TECNICA (ESPECIFICACIONES VIGENTES).

INTERSA S.A
INTERVENTORIA

INGS TECNICO
INTERVENTORIA

(123) 18-FEBRERO DE 2019
Siendo las 7:30 am se realiza recorrido por el tramo, evidenciando nuevamente que la valla informativa se encuentra dentro del cerramiento y por ende no es visible a la comunidad Se le solicita al contratista realizar gestión para que la valla este visible a la comunidad

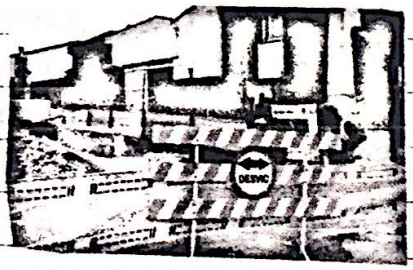

Paola Yaneth Rueda
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

(124) 18-Febrero-2019
Se realiza recorrido al CIV 16002026; se evidencia Sumidero en mal estado, cajas sin señalización, señales informativas Cuidej, se recomienda que la persona encargada de Bodj; este pendiente de estas observaciones y al inicio del dia, las corrija; no se evidencia presencia del Personal SSTMA, en actividades de RAP.

Monica Fajardo.
Residente Ambiental interna.

Scanned with CamScanner

(125) 16 de Febrero de 2019
Dando respuesta a las observaciones de interventoría, se informa que se corrigieron, se hace presencia en la actividad de RAP; se evidencia que se cumple con las especificaciones técnicas; las actividades se iniciaron hoy con emulsión; si estamos haciendo presencia es una actividad técnica el área ambiental reporta cantidades, sin embargo se deja constancia.

Angélica R.
Contratista LGNG

(126) 18 de Febrero de 2019
De acuerdo con lo programado la semana anterior, el día de hoy se realiza la mezcla de material granular con emulsión asfáltica tipo CRL-1 a lo largo del tramo. Adicionalmente se trabaja en las excavaciones para los empates de la red de acueducto renovada, siguiendo lo solicitado por el personal de la EAB en la visita realizada el sábado anterior.

Angélica
Contratista
LGNG

(127) 18 - FEBRERO DE 2019
Se evidencia la entrega piedra a piedra del volumen N°9, correspondiente a la reunión de avance del día 26 de febrero; la entrega fué realizada por la guía cívica, a las 2:30 p.m.
Se solicita nuevamente mayor presencia de la residente social.

Rod Yael Redu
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

128 18 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO.
SE TERMINÓ MEZCLADO DE RAP EN HORAS DE LA TARDE, DEBIDO A POSIBLES LLUVIAS SE ACOPIA ESTE MATERIAL SE TAPA CON PLASTICO PARA SU EXTENSIÓN CERRADO Y COMPACTACIÓN EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA,
INTEVIA SA
INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner

(129) 19 DE FEBRERO / 2019

Se realizo verificación del punto satélite a las 7.30 am, evidenciando que no se encuentra publicado el volante N° 9 "Reunión de avance", el cual fue entregado punto a punto, el dia de ayer 18 de febrero; por tal motivo se le solicita al contratista, realizar el mantenimiento del PS.

En el recorrido se evidenció que la valla informativa se encuentra visible para la comunidad

Paola Yised Rueda

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

(130) 19/02/19

De Acuerdo a las recomendaciones dadas por los especialistas de geotécnia y Pavimentos de la Interventoria, es indispensable que una vez realizada la mezcla del RAP con la emulsion según el ART 461-07 se debe instalar y compactar el mismo dia para garantizar este proceso constructivo. Debido a que el contratista no contaba con los recursos necesarios para realizar esta actividad (Falta de reflectores) el dia de ayer 18/02/19, esta interventoria aclara que si el material no cumple con la norma, se le solicitará su retiro total y nó sera reconocido por esta interventoria

RES TECNICO
INTERVENTORIA

131 19/02/19

Como quedo estipulado el dia anterior en la presente no se extendio el material por posibles lluvias lo cual fue informado a los residentes de Interventoria Por lo que se procedeo a copiar el material y taparlo para mantener sus propiedades, el dia de hoy se inicia el extendido y compactado del material desde las 7:00 AM

Scanned with CamScanner

132 FEB 19 2019

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA, ENCONTRANDO EL PERSONAL DE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE ACUERDO A LO SOLICITADO CONTRACTUALMENTE, EQUIPO Y MAQUINARIA ACTIVOS Y EN NUMERO CONCORDANTE A LAS ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS.
SE RECOMIENDA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCION REFORZANDO CON PERSONAL (Y/O MA) DE APOYO. EL MATERIAL DE EXCAVACION ACOPIADO HACIA LA TV 53 DEBE SER RETIRADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE O EN SU DEFECTO SEÑALIZADO Y O CUBIERTO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES Y SST.

ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA ASEO INTEGRAL

132-A. Febrero-19-de-2019.
Dando respuesta a la observación, se informa que el material será retirado al finalizar la jornada laboral; toda vez que se esta recopilando la mayor cantidad, de igual manera se informa que se cuenta con la brigada de orden Aseo, 3 banderas, punto ecológico capa vestir, kit de emergencia, unidades sanitarias personal con epps adecuados, cerramientos internos y externos adecuados.

ASEO INTEGRAL E SSTMA

133 Feb 19-2019
Se actualiza Punto Satelite con volante de convocatoria a reunión de avance. con volante N. 5 dicho punto satelite se debe actualizar 5 dias antes del evento segun los terminos de referencia; y estamos a 8 dias de la actividad.
Se realiza recorrido social punto cra Movil sin evidenciar solicitudes de la comunidad; Cfesicaterodelo Residsocialcas

134 FEB-19 DE 2019
Efectivamente se evidencio la actualizacion del punto satelite, con el volante N° 9 "Reunión de avance"
Paola Yesid Rueda
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

59 19/02/2019

(135) Se le solicita al contratista, garantizar el suministro de agua potable a todos los propietarios, esto con el fin de evitar inconvenientes e incomodidades a la comunidad.

RES TECNICO
INTERVENTORIA

(136) FEB - 20 - 2019.

Se le informa al contratista que el día de hoy, al salir la retroexcavadora del tramo, se subió al andén, generando el desconfinamiento del mismo, sobre la carrera, por este motivo se considera pertinente levantar acta de compromiso con la propietaria del predio que esta allí ubicado la Sra Antonia Sánchez, donde se indique que se realizaran las reparaciones pertinentes, para dar solución a los daños ocasionados.

Por otro lado, se realizó recorrido por el tramo evidenciando valla informativa visible a la comunidad.

Paola Yised Rueda
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA



(137) 20/02/2019

Esta interventoria manifiesta su preocupación, ya que a la fecha nó se ha instalado ni compactado todo el material RAP, el cual fue mezclado el día ~~18~~ 18/02/2019 con la emulsión asfáltica, cabe aclarar que la recomendación dada al contratista era instalar y compactar todo el material RAP en el mismo día 18/02/19, por otro lado no se entiende porque el personal mano de obra nó calificada del contratista, están llegando algunos de ellos a las 7:30 Am, iniciando actividades constructivas a las 8:00 Am, ya que se supone que se deben iniciar actividades a las 7:00 Am, esto con el fin de optimizar más el tiempo y mitigar el atraso que se está presentando como se evidencio en las

Scanned with CamScanner

informes semanales.

POR OTRA PARTE SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL PERSONAL DE OBRA (NO CALIFICADO) PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES ORIGINADAS POR LA COLOCACION DE RAP: INSTALACIÓN BORDILLO A10,- A-55, A30, CONSTRUCCIÓN CANAL AGUAS NEGRAS (CON MORO) POZOS, SUMIDEROS, RAMPAS. SE DEBE ACELERAR LA INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA PROGRAMAR LA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA MD Y ASI MEDIRAL LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.

RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA

INTENSA S.A INTERVENTORIA

128 20 de Febrero de 2019.

Por medio de la bitácora la empresa LGNG C.I. 1562 deja constancia que según PMT aprobado del día 14 de Febrero de 2019 COI N° 7, la presencia de los auxiliares de transito es 24 horas, razon por la cual estos se han mantenido, sin embargo y según comité técnico la interventoria manifiesto que dichos auxiliares no deben estar 24 horas, por lo anterior LGNG esta haciendo turnos de día, ya que no pagan el turno de noche, en consecuencia la empresa LGNG salva responsabilidad de cualquier requerimiento que nos haga la Secretaria de transito le invita a Interventoria a realizar la consulta con el especialista

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TRÁMITO
Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)
VERSIÓN: 2.0

COI No. 07
FEBRERO 14 DE 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

N 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

HORARIO DE OBRAS	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	RES. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
24 HORAS	FOLPA-155-2018	LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 47-18 NUMERAL 56827, PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS. BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE CARGA CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	PUENTE ARANDA	DIEGO A. TORO C	38446-2019

Scanned with CamScanner

60

(139) 20 Feb 2019
Se evidencia cierre total de calzada en intersección de la Tv 53A con C120Sur el cual impide el transito peatonal sobre anden hacia donde el peaton desciende hacia la calzada.

El contratista se compromete en dejar generar sendero peatonal transversal con platon y estabilizacion. para hoy al finalizar el dia (17:00). Se enviara registro fotografico a dtoro@movilidadbogota.gov.co

(140) Febrero 20 de 2019
El dia de hoy se continuó con la actividad de extensión y compactación de base estabilizado hasta finalizar. Se reciben en obra los bordillos A-85, 110 unidades y se cuenta con 66 unidades de A-10. Se realizan excavaciones para su instalación.
En horas de la tarde se realiza visita por parte del ing. Diego Toro de Movilidad, verifica el estado de señales e implementación de PMT sin observaciones con respecto al dispositivo. Las observaciones con respecto al paso peatonal por la Tv 53A están siendo atendidos y quedan el día de hoy.
Con respecto al PMT, el ing Diego Toro confirma que de acuerdo a lo establecido en el COI No. 07 del 14 de febrero de 2019, los auxiliares de tránsito propuestos deben permanecer en todo momento, mientras esté implementado el PMT.

Angelica R.
Contratista
LGVSA

(141) FEB 20 - 2019
Siendo las 3:50, Interventoria realiza acompañamiento a capacitación al personal de mano de obra no calificada, liderada por los residentes del area social, ambiental y SST. El tema socializado por el área social fué el "Respeto" y "Programa de Gestión Social". y

Por otro lado, se realiza junto con el area técnica y social del contratista e Interventoria, visita al predio de la Sra Aitana Sánchez para verificar la afectación por la retroexcavadora en Labor de la reparación. Constatando pertinente revisar el levantamiento de acta de vecindad, para corroborar los daños, para así realizar las reparaciones en el andén sobre la carrera. Se solicita realizar el acta de compromiso, junto con la propietaria, donde quede consignado el compromiso de dar solución a tal afectación.

Yesica Agudelo: Res. Social Ccta

Prof Yesid Rueda

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.

(142) 21 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

SE CONTINUA COMPACTACION DEL RAP K0+000 - K0+025 SE EVIDENCIA LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

INSTALACIÓN BORDILLO A-85-A10 AMBOS COSTADOS

A LA FECHA Y A PESAR QUE ESTA INTERVENTORIA HA SOLICITADO AUMENTO DE PERSONAL, EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES CON 2 OFICIALES Y 4 AYUDANTES POR LO ANTERIOR NUEVAMENTE SE SOLICITA INCREMENTO DE PERSONAL EN OBRA DEBIDO A QUE TODAS LAS ACTIVIDADES LAS INICIAN PERO NO ESTAN SIENDO TERMINADAS PUES EL MISMO PERSONAL ES TRASLADADO SIN CONCLUIR NINGUNA TAREA.

EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 VOLQUETAS HERRAMIENTA MENOR

A LA FECHA NO SE HA HECHO ENTREGA DE LA CAPA DE RAP PARA VERIFICACIÓN RELIEVO POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA.

INTERSA INTERVENTORIA

RES TECNICO INTERVENTORIA

(143) 21. FEBRERO. 2019

Se Realiza Recorrido en Conjunto con el Contratista. Realizando Observaciones del Area SST y Ambiental. Quedando Acta del Recorrido y Compromisos para la Siguiente Semana.

Carlos Alfaro. Residente SSTMA

(144) 21 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA EL RETIRO INMEDIATO DEL MATERIAL RAP INSTALADO ENTRE EL K0+030 AL K0+005 ESTO DEBIDO A QUE ESTE FUE MEZCLADO

norma

Scanned with CamScanner

62

DESDE EL DIA 18 DE FEBRERO Y HASTA HOY 21 DE FEBRERO SE EVIDENCIA FALTA DE COMPACTACION EN TODA EL ÀREA MENCIONADA, POR TAL MOTIVO LA EMULSIÓN YA REALIZÓ SU TRABAJO DE ROMPIMIENTO FORMANDO EN LAS PARTICULAS FINAS Y GRUESAS DEL MATERIAL UNA CAPA IMPERMEABIL QUE EVITA LA ABSORCION DEL AGUA QUE SE ADICIONÓ PARA SU COMPACTACIÓN Y ASI VEZ EVITANDO LA TRABAZÓN DE DICHAS PARTICULAS AL SER COMPACTADAS. POR OTRA PARTE NO SE EVIDENCIA LA HIDRATACIÓN DEL MATERIAL RAP ENTRE EL KO+130 AL KO+030 NOTANDO CON PREOCUPACIÓN LA FALTA DE CUIDADO QUE SE DEBE TENER SOBRE ESTE MATERIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DADO QUE A LA FECHA NO HAN ENTREGADO ESTA CAPA 3 DIAS DESPUES DE INSTALADA POR LO ANTERIOR ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GARANTIZAR LAS DENSIDADES Y RESISTENCIAS REQUERIDAS POR LAS NORMAS VIGENTES QUE APLIQUEN PARA QUE ESTA INTERVENTORIA DE POR RECIBIDO Y APROBADO.
LA EXTENSIÓN COLOCACIÓN Y COMPACTACION DE LA CAPA DE RAP MEZCLADO CHUCADA Y COMPACTADO ENTRE EL 18 Y 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. EN EL FRENTE DE MIENTO,

INTERSA S.A
INTERVENTORIA.

RES TECNICO
INTERVENTORIA

(141)

21- febrero - 2019.

El día de hoy se realiza recorrido con la Profesional Social del contratista, evidenciando el buen estado del Punto Satélite y valla informativa, esta actividad se llevaba a cabo con el fin de brindar cumplimiento al apéndice Social.

Prof Yesid Rueda

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

Residente social Interventoria.
Abelardo Suarez Vargas.

Yesica Agudelo: Residente social Contratist

Scanned with CamScanner

(176) FEBRERO 21 DE 2019

Se realizó el levantamiento de acta de compromiso con la propietaria la Sa Antonia Sánchez, donde se le informa que se le arreglarán los daños causados por las retroexcavadora el día 19 de febrero, se fué enfáticos con la propietaria frente al planteamiento para realizar modificación en el andén, indicando que no es posible realizar estos cambios, ya que el espacio público se debe entregar tal y como estaba.

- Se hace entrega de volante informativo N° 10 "Reunión Comité de Participación #2"

Paola Yised Rueda

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

(177) FEBRERO 22 DE 2019.

Se realiza recorrido por el tramo, evidenciando que el Punto Satelite se encuentra actualizado, con el último volante informativo N° 10 "Reunion de Comité de Participación ciudadana".

Paola Yised Rueda

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.

- Se le solicita al contratista levantar acta con el propietario de la vivienda ubicada en la 53A - 46, donde se le consignado, el cauce que se está generando en el registro de agua.

Paola Yised Rueda

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

22 - FEBRERO 2019

(178) Febrero 22 de 2019

El día de hoy se procede con la toma de densidades de la capa de base estabilizada con emulsión asfáltica en 5 puntos ubicados entre el K0+030 y el K0+138. Se realizo también el día de hoy el lavado de la tubería de la red de alcantarillado sanitario y el arreglo del tubo roto en la red de alcantarillado pluvial. Se define en también el trabajo a realizar con base en las observaciones realizadas por Interventoría para el tramo del K0+030 al K0+005. El día de hoy se realizará la nivelación del tramo por entregar.

Angélica R
Contratista
Lavado

norma

Scanned with CamScanner

(149) 22 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

SE EVIDENCIA LAVADO Y REPOSICIÓN DE DUCTO RED PLUVIAL, EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE: EXCAVACIÓN MANUAL PARA SUMIDERO KO+033 +/- SARDINEL ENTRE KO+005 - KO+135 AMBOS COSTADOS. NO SE INICIA INSTALACIÓN DE BORDILLO O SARDINEL TIPO A-10 DEBIDO A LA MALA CALIDAD DEL QUE LLEGO A OBRA.

AUN SE CUENTA CON EL MISMO PERSONAL (2 OFICIALES Y AYUDANTES) A PESAR DE LAS MUCHAS TAREAS PENDIENTES POR EJECUTAR (TERMINAR POZOS DE INSPECCIÓN, CONSTRUCCIÓN SUMIDEROS, CAJAS DE INSPECCIÓN, INSTALACIÓN DE SARDINEL A-01 - A-80 Y A-10, CORTES DE PAVIMENTO) ESTA INTERVENTORIA NUEVAMENTE VÉ CON PREOCUPACIÓN LA FALTA DE PERSONAL YA QUE LA INSTALACIÓN DE BORDILLO O SARDINEL ES UNA ACTIVIDAD QUE LIBERA LA INSTALACIÓN DE LA MEZCLA ASFALTICA EN TODO EL TRAMO. A LA FECHA NO HEMOS SIDO NOTIFICADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE LA CAPA DE RAP ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA LA HUMECTACIÓN (RECOMENDADA) DE LA CAPA DE RAP INSTALADA ENTRE EL KO+138 A KO+030.

INTERSA S.A
INTERVENTORIA.

RES TECNICO
INTERVENTORIA

Esta interventoría le solicita al contratista informar los días que se van a laborar en el frente de Hilanta, incluyendo Sabados, domingos y festivos, esto con el fin de poder programar y realizar seguimiento, control y acompañamiento con el personal de la interventoría, por ningun motivo se le autoriza al contratista realizar actividades sin el acompañamiento de la interventoría (152)

RES TECNICO
INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner

(150) 23 Febrero 2019.
Se realiza recorrido Verificando la gestión SSTMA realizada por el Contratista en el frente de obra; evidencia los auxiliares de tráfico y Boal cumpliendo con su función; cargas y senderos peatonales en buen estado (ordenado); Se recomienda al terminar la jornada de trabajo retirar el escombro.

Residente SSTMA interventoría.

(151) 23 de Febrero 2019
El día de hoy se realiza Verificación al Punto Satelite y Valla informativa, donde se evidencia que se encuentra en buen estado; Por otro lado se hace visita en el Predio ubicada en la 53A-46, donde se encuentra una fuega de Agua y el día de hoy se realizo la llamada al acueducto, donde se manifiesta que el día de hoy se va realizar la Visita Por Parte del acueducto, Para la Revision de la misma.
- Se le solicita al contratista levantar el acta con el Propietario de este predio el día lunes, Para dejar la evidencia de la visita realizada y Solicitud atendida.

Residente Social Interventoría

(152) 25 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO
SE EVIDENCIAN LLUVIAS FUERTES EL FIN DE SEMANA, A LA FECHA SE CONTINUA CON EL MISMO PERSONAL SIENDO QUE ESTA INTERVENTORIA LLEVA MAS DE 1 (DOS) MESES SOLICITANDO EL AUMENTO DE PERSONAL DEBIDO AL ATRASO DE OBRA Y A QUE EXISTEN MUCHAS ACTIVIDADES QUE ESTAN SIN TERMINAR Y MUCHAS SIN HACER: 1) INSTALACIÓN SARDINEL TIPO A-10 2) INSTALACIÓN BORDILLO A-85 3) INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80 4) CAJAS AGUAS NEGRAS (REMOTES, MARCO Y TAPA) 5) ACTIVIDADES EN POZOS DE INSPECCIÓN 6) SUMIDEROS ENTRE OTROS.

66

POR OTRA PARTE DESPUES DE VISITA TECNICA SE EVIDENCIA INTERFERENCIA EN LOS SECTORES DE LOS SUMIDEROS, INTERFERENCIAS CON LAS REDES DE SERVICIO PUBLICO MOTIVO POR EL CUAL SE CAMBIAN LAS SECCIONES DE LOS SUMIDEROS SOBRE VIA SIN ALTERAR SU DISEÑO ESTRUCTURAL NI FUNCIONALIDAD, SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DE ESTOS ACEROS Y FORMALETAS A ESTA INTERVENTORIA ANTES DE HACER SU FUNDIDO DE LO CONTRARIO ESTE ITEM NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN EL ACTA DE PAGO AL NO PODER SER VERIFICADO Y APROBADO.
NUEVAMENTE A LA FECHA NO A SIDO ENTREGADO LOS COPIA DE RAP INSTALADA EL 18 DE FEBRERO DE 2019 RECORDANDO AL CONTRATISTA QUE ESTA INTERVENTORIA NO RECIBIRA ESTA COPIA SI SE EVIDENCIA QUE A SIDO SOMETIDO A REMIVELACIONES CON MINICARGADOR Ó A MANO EN POSIBLES SECTORES ALTOS, DE IGUAL MANERA SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE ESTA COPIA DEBE TENER UN ACABADO UNIFORME (EVITANDO CRESTAS Y VALLES) ESTO DEBIDO A QUE LA CARPETA ASFALTICA CALCA DE FORMA DIRECTA DICHAS DEFORMACIONES Y SE DEBE PREVEER EL APISONAMIENTO DE AGUAS DE ESCORRENTIA EN DICHA RASANTE.

INTERVENTORIA
INTERSA S.A.

PAES TECNICO
INTERVENTORIA

153. - Se evidencia Retiro del material de excavación
- El Sr Jose Carreño, es la persona encargada del Orden y Aseo en obra Boal, se le recomienda terminando la Jornada dejar señalizado los cajas de inspección con delineadores tubulares y triple cinta.
- El personal de obra se encuentra instalando los Sardineles A 85. para lo cual se le Recomendo al area SST que al momento de levantar. se debe realizar con 2 personas, para prevenir lesiones lumbares al trabajador.

Scanned with CamScanner

154 FEBRERO 25 DE 2019
La interventoria manifiesta al contratista que el dia de hoy se recibe queja de la comunidad. predio 53A-75 referente a que debido al mal estacionamiento del municargador su garaje quedo blogueado lo cual impidio la salida de su vehiculo TODO el fin de semana, por lo anterior, esta interventoria exige la presencia del area social y dar atencion a esta solicitud del propietario; tal por lo anterior se solicita que el area social esté mas pendiente de todas las temas referentes de obra y en especial los fines de semana para evitar este tipo de incomodidades a la comunidad.

Residente Social Interventoria
Alejandra Chaparro V.

155 FEBRERO 25 DE 2019
El dia de hoy se realiza recorrido Social, Junto a la Profesional Social del contratista, Verificando que el Punto Satelite se encuentre en buen estado y valla informativa, de igual forma Atendiendo Solicitudes Por Parte de la Comunidad.

Yesica Agudelo G. Residente Social Interventoria
Alejandra Chaparro V.

156. Se realiza acompañamiento social al arreglo realizado en la acometida domiciliaria del predio calle 20 N. 53a 46 por parte del Acueducto; evidenciando que el contador quedo Sin escape; se informa al propietario y se acuerda esta para firmar acta; despues de las 2:00 pm.
Residente social Contratista. LONG: Yesica Agudelo G.

Scanned with CamScanner

Febrero 25 de 2019

El día de hoy se continúa con los trabajos de excavación para instalación de bordillos y construcción de sumideros. Se informa a la Interventoría que el tramo localizado entre el K0+030 y el K0+138 que se encuentra a nivel de base estabilizada con emulsión asfáltica ya fue verificado con densidades y nivelación topográfica por parte del Contratista, por lo que se solicita el recibo de la Interventoría para proceder con la siguiente capa de la estructura.

Angélica R.
Contratista
LGNCR.

157 FEBRERO 25 2019

LA INTERVENTORIA PROCEDERA AL RECIBO DE DICHA CAPA EL DIA 26 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA ENTRE K0+030 Y K0+138 TANTO EN TOPOGRAFIA COMO POR DENSIDADES PARA DETERMINAR EL RECIBO EL CUAL SE HARA POR ESTE MEDIO SEGUN RESULTADOS OBTENIDOS.

INTERVENTOR
INTERSA.

RES TECNICO
INTERVENTORIA

158 26 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

SE REVISA CAPA RAP ENTRE K0+030 \ K0+138 DANDO COMO RESULTADO DENSIDADES > 98%, POR NIVELES SE APRUEBAN COTAS, HACIENDO SOLICITUD AL CONTRATISTA DE MANEJAR LOS PUNTOS ALTOS Y BAJOS (DENTRO DE LA TOLERANCIA) YA QUE LA MEZCLA ASFALTICA CAE DIRECTAMENTE ESTOS PUNTOS (VALLES Y CRESTAS) ORIGINANDO POSIBLES APOZAMIENTOS DE AGUA DE ESCORRENTIA SOBRE LA RASANTE.

* EL MATERIAL PERIMETRAL DE LOS POZOS ESTA SUELTO Y POR ENDE DEBE SER RETIRADO Y REEMPLAZADO CON MEZCLA ASFALTICA (NO PETREO), EL ESPACIO ENTRE EL BORDILLO Ó SARDINEL DEBE SER REEMPLAZADO CON UN MORTERO FLUIDO YA QUE EL MATERIAL PETREO NO SE PUEDE COMPACTAR.

INTERSA S.A
INTERVENTORIA.

RES TECNICO
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Se realiza recorrido de seguimiento SSTMA junto con el y/o los residentes SSTMA del contratista; por lo tanto quedando acta N° 12, adicional se solicitó el retiro del escombro en el transcurso del día; se evidenció orden y aseo en el campamento, auxiliares de tráfico según PMT.

Honorato Quintero P.
R SSTMA Interventoría

(160) 26/02/2019

Se realizo reunión de avance, en el salón comunal de Milenta, con la participación de los residentes de interventoría y contratista, así como los residentes del tramo. Se socializo las actividades que se han ejecutado hasta la fecha, en los diferentes componentes (SST, ambiental, técnico y social), se responden inquietudes de la comunidad.

Paola Yesid Rueda
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA

(161) 26/02/2019

Esta interventoría vé con gran preocupación el bajo rendimiento del segmento Milenta 16002026, incumpliendo nuevamente con el compromiso adquirido en el comité técnico realizado el día Miercoles 20/02/2019 acerca de la vinculación de una cuadrilla de 6 ó 7 ayudantes de obra, en el cual se habían comprometido vincularlos el día lunes 25/02/2019, la ausencia de este personal está generando atrasos en la ejecución de este tramo como del contrato en general, se le solicita al contratista nuevamente su vinculación y se le recuerda que estos atrasos son imputables al contratista.

RES. TECNICO
INTERVENTORIA

norma

Scanned with CamScanner

70

162. Se deja constancia en la presente bitácora que el árbol número 110955-2 se volcó; el árbol estaba en condiciones fitosanitarias muy malas, lo anterior ocurrió mientras se estaba haciendo actividades de cargue de cemento, se aclara que estaba el auxiliar de tráfico y los residentes SST-A. Se informará de manera formal a la Alcaldía ya que no se debe reponer por que estaba en peligro de volcamiento - Riesgo inminente a la comunidad.

ADRIO MALDONADO
O. SST-A

163 27 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

DEBIDO A QUE SE TUVO QUE RETIRAR EL MATERIAL COMPACTADO DE RAP ENTRE EL KO+005 - KO+030, LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA UNA VEZ ESTE NUEVAMENTE NIVELADA Y CERRADA ESTA CUBRASANTE HACER ENTREGA DE LA MISMA A ESTA INTERVENTORIA PARA SU LIBERACION.

* A LA FECHA NO SE VE AVANCE DE OBRA DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL EN MILENTA. SE RETIRA ESCOMBRO.

INTERVENTORIA
INTERSA

RES TECNICO
INTERVENTORIA

164 28 FEBRERO 2019 TIEMPO SECO

SE EVIDENCIA Y VERIFICA EL INGRESO DE 3 (TRES) AYUDANTES NUEVOS AL FRENTE DE MILENTA, SE SOLICITA AL CONTRATISTA AGILIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL A-85, A-80 Y A-10 EN TODO EL TRAMO PARA PODER DAR PASO A LA INSTALACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, DE IGUAL MANERA HACER ENTREGA DEL TRAMO ENTRE KO+000 \ KO+050.

INTERSA S.A
INTERVENTORIA.

RES. TECNICO
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ANEXO NO. 11
INFORMES SEMANALES

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 21 **DEL** 25 DE FEBRERO **AL** 3 **DE MARZO DE 2019**

CONTRATO No 141-2018 (Número del Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 156 de 2018 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

CONSTRUCTOR LUIS GABRIEL NIETO GARCIA (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 11331006-4

INTERVENTOR INTERSA S.A (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 860450644-3 (Escriba el NIT del interventor)

SUPERVISIÓN FDLPA ING. FABIÁN CRUZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la supervisión FDLPA)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 8 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2018 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 7 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		4,00%	47,00%	Trabajo Ejecutado		17%
Valor del Trabajo Programado	$	3.202.858.436,00	$ 3.474.013.377,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$1.120.211.949,00	$ 1.205.353.570,00
ETAPA DE DIAGNOSTICO (PREVIA)		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			100%	Trabajo Ejecutado		99%
Valor del Trabajo Programado			$ 200.586.472,00	Valor del Trabajo Ejecutado		$ 180.527.824,00
ETAPA DE EJECUCION		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			42%	Trabajo Ejecutado		14%
Valor del Trabajo Programado	$	490.957.691,00	$ 3.273.426.905,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 210.106.127,00	$ 1.024.825.746,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE /TRAMO	CENEFA	CÓDIGO ELEMENTO	CIV	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCIÓN	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A						

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1	COMPONENTE TÉCNICO • Excavación para construcción de sumideros • Excavación para instalación de bordillos por costados izquierdo y derecho de la via • Instalación y emboquillado de bordillos tipo A-85 y A-10 • Figurado de acero para refuerzo de sumideros • Toma de densidades a la capa de Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica por parte de la Interventoría • Retiro de material de base estabilizada entre el K0+005 y el K0+030 • Nivelación de cajas de inspección domiciliarias de aguas negras • Preparación de material remante entre el K0+000 y el K0+030 • Extensión y compactación de Base Granular entre el K0+000 y el K0+030 • Se recibe visita por parte de supervisor de la Secretaria Distrital de Movilidad • El 27 de febrero se realiza Comité Integral de Seguimiento en las instalaciones del PAC del Contratista • El 01 de marzo se realiza reunión en conjunto por parte del delegado EAB, Interventoría y Contratista para revisión de videos de inspección de redes

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 21 **DEL** 25 DE FEBRERO **AL** 3 **DE MARZO DE 2019**

CONTRATO No 141-2018

2	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST Para este periodo se realizaron las siguientes actividades. -Se realizaron recorridos el dia 26 y 28 de febrero junto con los residentes SSTMA del contratista, verificando la gestión realizada, quedando en actas número 12 y 13. -Se realizó ajuste al procedimiento de sumideros por parte del contratista -Se realizó comité mensual integral en las oficinas de la interventoria -El contratista radico certificación de disposición de RCD, indicadores de cumplimiento para su revisión y aprobación. -Se calificaron las listas del chequeo del periodo correspondiente, las cuales se envían al contratista para su revisión. -El dia 27 de febrero de 2019 el contratista realizó Inducción y Notificación de Riesgos a los siguientes trabajadores. Cristian Rodriguez, Andrés Cárdenas y Virgilio Arboleda de la Empresa Consrtuhidraulicos y Transportes Tomas León - El dia 27 de febrero de 2019 el contratista realizó Inducción y Notificación de Riesgos a la Ingeniera Ana Nicely Casas de la Empresa Luis Gabriel Nieto -El dia 27 de febrero el contratista realizo la Capacitación sobre Plan de prevención de daños en redes de gas natural los soportes se enviaran en el informe mensual - Se realiza el envio de la Documentación del personal nuevo a la interventoria de Afiliaciones al SGSS, Inducciones y Notificación de riesgos del personal nuevo para su revisión y fines pertinentes.
3	COMPONENTE SOCIAL Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: 1. Del 25 de febrero al 02 de marzo, el contratista realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 12:m. 2. El dia 25 de febrero a las 11:00 am, el contratista en compañia con la interventoria, realizó el levantamiento de acta de compromiso con los propietarios del predio ubicado en la 53ª-46; en donde se identificó que la fuga de agua, correspondia a un daño interno del predio 3. El dia 26 de febrero la interventoria realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m. 4. El dia 27 de febrero a las 9:00 en el parque Mirasol, contratista e interventoria realizó reunión de socialización de PMT con el presidente de la JAC el Sol, luego se llevó a cabo esta misma socialización con los residentes del área de influencia. 5. El dia 27 de febrero a las 10:30 a.m. se realizó, en el campamento del contratista, el Comité integral #6 6. El dia 27 de febrero a las 11:30 a.m. se realizó comité social, en el tramo de Milenta, en donde se trabajaron los siguientes temas. • Verificación en el cumplimiento de compromisos. • Elaboración de vallas móviles • Actividades del personal de levantamiento de actas de vecindad. • Especificaciones contractuales para la Reunión de comité de participación ciudadana. • Complementación de matriz de socializaciones de PMT hasta la fecha. • Priorización de CIV según comité integral. • Observaciones de la reunión de avance CIV 16002026 • Solicitud por parte del contratista para levantamiento de actas de vecindad en CIV de rehabilitación. • Compromisos. 7. El dia 28 de febrero a las 8:00 am, en el salón comunal de Milenta se llevó a cabo el Comité de participación ciudadana #2, donde se tuvo la participación de los veedores del CIV 16002026 y los residentes sociales, ambientales y técnicos del contratista y de la interventoría. Se socializó las actividades ejecutadas por todos los componentes hasta la fecha y se dio respuesta a las inquietudes. 8. El dia 28 de febrero el contratista, envió por correo electrónico los volantes informativos #11, #12 #13, #14 y #15, correspondientes a los volantes para el inicio de obra, el levantamiento de actas de vecindad e inicio de obra del CIV 16001040 correspondiente al barrio San Rafael; esta interventoria realizó las observaciones para realizar los ajustes pertinentes. 9. El dia 01 de marzo, el contratista envió los volantes informativos #16, #17, #18, #19 y 20 correspondientes a los volantes para el inicio de obra , el levantamiento de actas de vecindad e inicio de obra del CIV 16004097 correspondiente al barrio Autopista Sur. Además envió los volantes informativos #21, #22, #23, #25 y 25 correspondientes a los volantes para el inicio de obra , el levantamiento de actas de vecindad e inicio de obra del CIV 16003550, correspondiente al barrio Santa Rita. Esta interventoria realizó revisión y aprobación a los mismos. 10. El dia 02 de marzo el contratista realizó la entrega predio a predio, de los volantes informativos para reunión de inicio, levantamiento de actas de vecindad e inicio de obra de los CIV´s : 16001040, 16004097 y 16003550.

ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO
Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:
-Terminar de instalar prefabricado de confinamiento A80.
-Terminar espacio publico.

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

-Dar continuidad a los recorridos SSTMA con el contratista con el fin de realizar las observaciones que se encuentren en obra.
-Se revisarán los documentos del personal nuevo y subcontratistas que ingresen para esta semana, lo mismo que los documentos de la maquinaria.
-Reuniones de inicio de los nuevos CIV y simulacros por parte del contratista.
-Retirar material de excavación e instalación de mezcla asfáltica, certificaciones de las mezclas.
-Recorridos con el contratista para revisión del inventario arbóreo y de sumideros en los nuevos CIV.
-Entrega del informe mensual SSTMA para su revisión y aprobación
-Revisión por parte de la interventoria de los documentos del personal nuevo de ingreso y sus afiliaciones.
-Asistir a las reuniones de inicio de los nuevos CIV del contrato.

COMPONENTE SOCIAL
Para este periodo se realizarán las siguientes actividades.
El contratista e interventoría realizará la atención en el Punto en los horarios y días establecidos. Se llevará a cabo el comité social.
Elaboración y entrega del informe mensual #3 de ejecución de obra, correspondiente mes de marzo.
Revisión de volantes de implementación del PMT, para su debida entrega.
Levantamiento de registro fílmico y fotográfico de las vías a intervenir.
El dia 04 de marzo a las 2:30 pm, se realizará el simulacro para la reunión de inicio del CIV 16001040, 16004097, 16003550.
El día 05 de marzo a las 4:00 pm, se realizará reunión de inicio del CIV 16001040, en el salón comunal del barrio San Rafael.
El dia 05 de marzo a las 6:00 pm, se realizará reunión de inicio del CIV 16004097, en el salón comunal del barrio Autopista Sur.
El dia 06 de marzo a las 6:00 pm, se realizará reunión de inicio del CIV 16004097, en el salón comunal del barrio Santa Rita.

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 21 DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

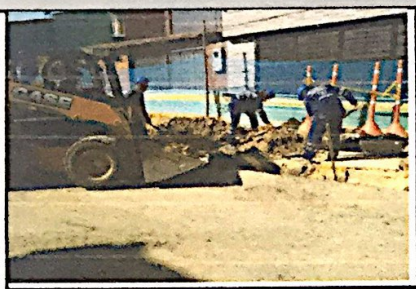

Retiro de material de excavación




Instalación de bordillos



Instalación de plafones para los senderos



Barricadas en el frente de obra

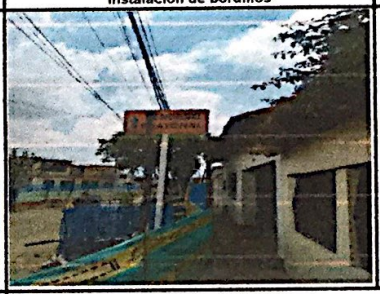



REVISION DE SEÑALIZACION VERTIVAL DE MILENTA



Retiro de Base Estabilizada con Emulsión K0+005 al K0+030



Instalación de bordillos tramo Milenta



Instalación de bordillos tramo Milenta



Ajuste en mortero fluido entre estructura y bordillos



Colocación Base granular K0+000 al K0+030



Construcción cajas de inspección domiciliarias y sumideros

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA


ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 21 DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

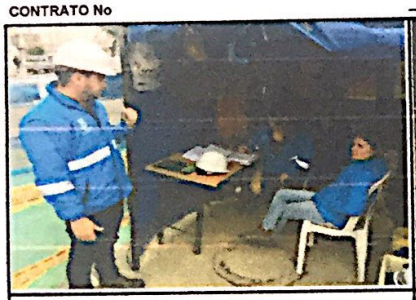

Comité Sociail #17 . 27/02/19



Recorrido social en el CIV 16002026 . 27/02/19



Comité de particiáción ciudadana #2. 28/02/19




Socialización del PMT en el barrio el Sol con presidente de la JAC. . 27/02/19




Socialización del PMT en el barrio el Sol con la comunidad. . 26/02/19




Comité Integral #6 . 27/02/19

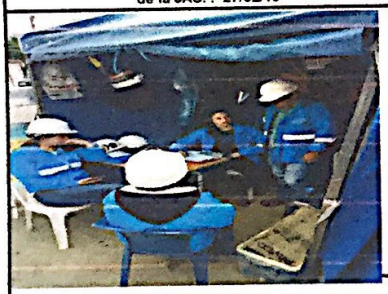

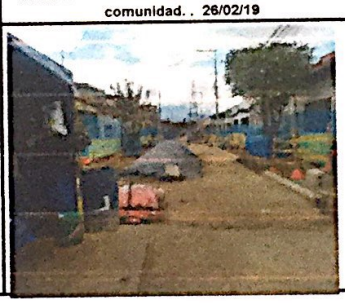

RECORRIDOS EN OBRA CON EL CONTRATISTA PARA EL CIERRE DE OBSERVACIONES

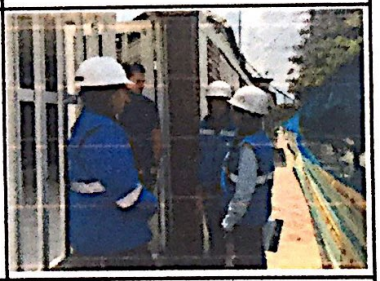

Levantamiento de acta de compromiso del predio 53a-46 (Milenta). 25/02/19

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CUATRO (Día en letras) (4) (Día en numeros) días del mes de MARZO (Mes en el que se firma el acta) de 2019 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Andrés Usecha Gaitán
Director de Interventoría.
INTERSA S.A.

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 20 **DEL** 18 **AL** 24 **DE FEBRERO DE 2019**

CONTRATO No 141-2018 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 156 de 2018 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

CONSTRUCTOR LUIS GABRIEL NIETO GARCIA (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 11331006-4

INTERVENTOR INTERSA S A (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 860450644-3 (Escriba el NIT del interventor)

SUPERVISIÓN FDLPA ING. FABIÁN CRUZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la supervisión FDLPA)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2018 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 7 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2019 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO 43,00%			SEMANAL	ACUMULADO 16%
Trabajo Programado				Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado		$ 3.202.858.436,00		Valor del Trabajo Ejecutado		$ 1.120.211.949,00
ETAPA DE DIAGNÓSTICO (PREVIA)	SEMANAL	ACUMULADO 100%			SEMANAL	ACUMULADO 99%
Trabajo Programado				Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado		$ 200.586.472,00		Valor del Trabajo Ejecutado		$ 180.527.824,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO 42%			SEMANAL	ACUMULADO 14%
Trabajo Programado				Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado	$ 1.243.739.803,00	$ 2.782.469.214,00		Valor del Trabajo Ejecutado	$ 353.265.926,00	$ 814.719.619,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE /TRAMO	CENEFA	CÓDIGO ELEMENTO	CIV	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCIÓN	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A						

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1

COMPONENTE TÉCNICO

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

-Se realiza mezcla de base granular tipo BG-A con emulsión asfáltica tipo CRL-1
-Extendido, nivelación y compactación de base Granular Estabilizada con Emulsión Asfáltica
-Se realizan empates de red renovada de acueducto por parte de personal de la EAB y conexiones a domiciliarias por parte del Contratista
- Se realizan excavaciones para instalación de bordillos por costados izquierdo y derecho de la vía
- Se recibe visita por parte de supervisor de la Secretaría Distrital de Movilidad sin observaciones a la implementación de PMT en el momento
- Las observaciones realizadas por la SDM al sendero peatonal ubicado por la Tv 53A se atienden de manera inmediata
- Se realiza reparación de tubo red alcantarillado pluvial y lavado red alcantarillado sanitario según observaciones de inspección realizada por la EAB
- Inician trabajos de excavación para construcción de sumideros
- Se realiza nivelación y toma de densidades a la capa de Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica
- Se continúa con la construcción de cajas de inspección domiciliarias
- El 20 de febrero se realiza Comité de Seguimiento en las instalaciones de la Alcaldía Local de Puente Aranda
- El 21 de febrero se realiza recorrido en conjunto por parte del delegado EAB, Interventoría y Contratista para revisión de redes en 12 CIV

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 20 **DEL** 18 **AL** 24 **DE FEBRERO DE 2019**

CONTRATO No 141-2018

2

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

-Se realizaron recorridos el dia 19 y 21 de febrero junto con los residentes SSTMA del contratista, verificando la gestión realizada, quedando en actas número 10 y 11.
-Se asiste a capación y reinducción de suministro de combustible el dia 20 de febrero, realizada por parte del residente SST del contratista Dentro de las observaciones del recorrido
-Se evidencia Extendido, nivelación y compactación del RAP, actividad en donde se reutilizo 75 m3 de fresado, proveniente de la Unidad de mantenimiento Vial.
-Se asiste al simulacro realizado por parte del contratista el dia 22 de febrero en el PAC de Interventoria.
-Se evidenció el retiro del material (escombro), según las especificaciones y condiciones estipuladas en los pliegos.
-Se revisan documentos enviados por el contratista (planillas y documentos de vehiculos)
-Se realiza la calificación de las listas de chequeo, según lo observado en los recorridos diarios realizados por interventoria

3

COMPONENTE SOCIAL

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

-Del 18 al 22 de febrero, el contratista realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 12 m.
-El dia 18 de febrero a las 2:30 p.m., el contratista realizó la entrega predio a predio, del volante informativo N°9, correspondiente a la reunión de avance del CIV 16002026.
-El dia 19 de febrero la interventoria realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m.
-El dia 19 de febrero a las 8:00 a.m. realizó el mantenimiento del Punto satélite, donde se incluyó el volante N°9 correspondiente a la reunión de avance del CIV 16002026.
-El dia 19 de febrero, el contratista envió via correo electrónico para revisión, el volante informativo N°10, correspondiente a "Reunión de comité de participación ciudadana #2", dando aprobación al mismo el dia 20 de febrero, después de haberlo enviando a la oficina de prensa de la Alcaldia Local de Puente Aranda.
-El dia 19 de febrero el contratista envió vía correo electrónico, el arte de la valla móvil, para revisión. Interventoria remitió a la oficina de prensa, quien realizó algunas observaciones, las cuales fueron informadas al contratista, para subsanarlas.
-El dia 20 de febrero a las 3:50 p.m. el contratista realizó capacitación con el personal de mano de obra no calificada, liderada por los componentes social, ambiental y de SST. Interventoria realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad.
-El dia 21 de febrero el contratista realizó la entrega a cada uno de los participantes del comité de veeduria, el volante informativo N°10, correspondiente a "Reunión de comité de participación ciudadana #2".
-El dia 21 de febrero el contratista junto con el acompañamiento de interventoria, realizó el levantamiento de acta de compromiso con la propietaria Sra. Antonia Sánchez, en donde se estipuló, que se le realizarán las reparaciones pertinentes en el andén de la carrera.
-El dia 21 de febrero en horas de la tarde, el contratista realizo visita predio a predio, para corroborar que cada uno de los mismos contará con el servicio de agua.
-El dia 22 de febrero de 2019 a las 2:00 pm se realizó el simulacro de "reunión de avance del CIV 16002026", con la participación de los residentes técnicos, sociales, ambientales y SST, asi como los directores de obra tanto del contratista, como de interventoria. Se realizaron algunas observaciones frente a la presentación, para que se tengan en cuenta el dia 26 de febrero, dia en el que se realizará la reunión con la comunidad.
-El dia 22 de febrero de 2019 a las 3:30 pm se realizó el levantamiento de acta en el predio ubicado en la 53ª-46, donde se estableció que el escape existente es interno y no bene nada que ver con la intervención. Se realizó el acompañamiento por parte de interventoria del área técnica y social.
-El contratista el dia 20 y 21 de febrero realizó el mantenimiento del Punto satélite, en donde quedaron publicado los volantes N°9 (Reunión de avance CIV 16002026) y volante N°10 (Reunión de comité de participación ciudadana).
-El dia 23 de febrero de 2019, se realizó visita al predio ubicado en la 53ª-46 para solucionar el escape de agua que se está produciendo en el inmueble. Los propietarios realizaron llamada a la empresa de EABB, donde indican que se realizará visita en horas de la tarde. Es por este motivo que el acta se levantará el dia 25 de febrero, con información que suministre el EABB.

ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:
- Se liberará por parte de la Interventoria capa de RAP
-Se terminara instalación de prefabricado A10
-Se iniciara actividades de estructura comprendida en espacio público
-Continuar recorrido con empresas de Acueducto para revisión de informes con cámara CCTV
-Construcción Sumideros.


COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:
-Dar continuidad a los recorridos SSTMA con el contratista con el fin de realizar las observaciones que se encuentren en obra.
-Se revisarán los documentos del personal nuevo y subcontratistas que ingresen para esta semana, lo mismo que los documentos de la maquinaria.
-El recibido de las certificaciones de disposición de los RCD y la certificación de loa materiales utilizados en obra.


COMPONENTE SOCIAL

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:
-El contratista e interventoria realizará la atención en el Punto PAC, en los horarios y dias establecidos.
Se realizará "reunión de avance del CIV 16002026, el dia 26 de febrero a las 2:00 pm, el salón comunal del barrio Milenta.
-Se llevará a cabo el comité integral el dia 25 de febrero.
-Se llevará a cabo el comité social # 17, el dia 25 de febrero.
-Se levantará acta de compromiso con los propietarios de predio 53 a-46.
-Se llevará a cabo el comité de participación ciudadana #2, el dia 26 de febrero.
-Se realizará socialización de PMT con JAC y comunidad.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

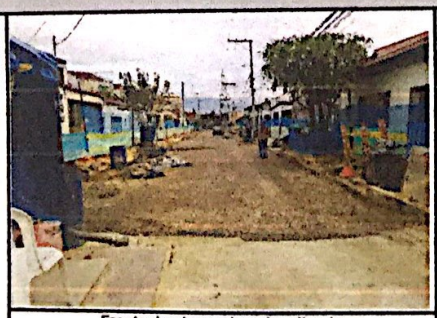

Frente de obra ordenado y limpio

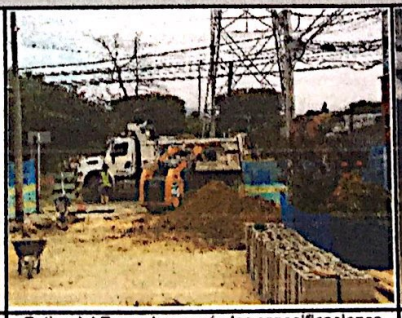

Retiro del Escombro según las especificaciones



Extendido del RAP

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 20 DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

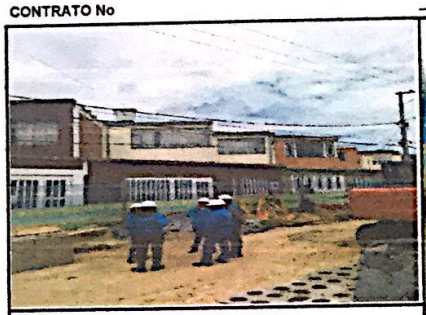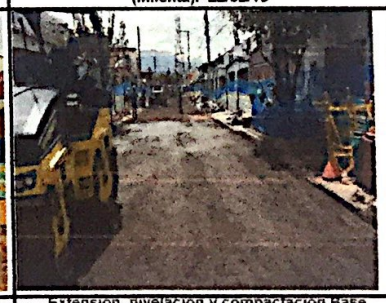		
Recorridos SSTMA	Entrega de Volante informativ0 N°9 CIV 16002026 (Milenta). 18/02/19	Caapcitación con MONC del CIV 16002026 (Milenta). 20/02/19
		
Levantamiento de acta de compromiso con la Sra Antnia Sánchez del CIV 16002026 (Milenta). 21/02/19	Recorrido social del CIV 16002026 (Milenta). 21/02/19	Verificación del suministro de agua CIV 16002026 (Milenta). 21/02/19
		
Entrega de Volante informativ0 N°10 CIV 16002026 (Milenta). 21/02/19	Actualización del Punto satélite del CIV 16002026 (Milenta). 21/02/19	Simulacro reunón de avance del CIV 16002026 (Milenta). 22/02/19
		
Reunón con propietario del predio 53 a-46(Milenta). 23/02/19	Mezcla Base Granular con Emulsión Asfáltica	Extensión, nivelación y compactación Base estabilizada


Scanned with CamScanner

AG

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 20 **DEL** 18 **AL** 24 **DE FEBRERO DE 2019**

CONTRATO No 141-2018

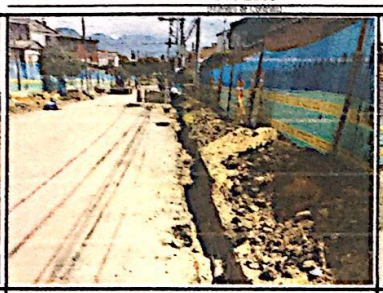		
Empates red acueducto renovada	**Excavaciones para instalación de bordillos**	**Toma densidades capa de Base estabilizada CIV Milenta**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (Día en letras) (25) (Día en numeros) **días del mes de** FEBRERO (Mes en que se firma el acta) **de** 2019 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Andres Urdaneta Guzman

Director de Interventoría

INTERSA S.A

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 19 **DEL** 11-feb **AL** 17 **DE FEBRERO DE 2019**

CONTRATO No 141-2018 (Número de contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 156 de 2018 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

CONSTRUCTOR LUIS GABRIEL NIETO GARCIA (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 11331006-4

INTERVENTOR INTERSA S A (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 860450644-3 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISIÓN FDLPA ING. FABIÁN CRUZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la supervisión FDLP)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2018 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 7 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO		SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO		SEMANAL	ACUMULADO
TOTAL CONTRATO							
Trabajo Programado		4,00%	40,00%	Trabajo Ejecutado		0%	15%
Valor del Trabajo Programado	$	733.812.288,03	$ 2.932.029.145,03	Valor del Trabajo Ejecutado	$	182.812.173,83	$ 1.068.581.636,83
ETAPA DE DIAGNOSTICO (PREVIA)		SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		0%	100%	Trabajo Ejecutado		0%	99%
Valor del Trabajo Programado	$	-	$ 200.586.472,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$	-	$ 180.527.824,00
ETAPA DE EJECUCION		SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		3%	38%	Trabajo Ejecutado		2%	13%
Valor del Trabajo Programado	$	229.632.080,12	$ 2.626.626.473,55	Valor del Trabajo Ejecutado	$	19.751.743,14	$ 808.959.566,03

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE /TRAMO	CENEFA	CÓDIGO ELEMENTO	CIV	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCIÓN	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A						

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1	**COMPONENTE TÉCNICO** Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: - Durante esta semana se continua con la intalacion de la tuberia de acueducto en el segmento de Milenta CIV 16002026 - Esta semana no se realizo comite debido a varios recorridos organizados con los especialistas - Durante esta semana se inicia la mezcla del fresado con la base granular en el segmento de Milenta CIV 16002026 - Durante esta semana se inicia la
2	**COMPONENTE AMBIENTAL Y SST** Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: - Recorridos de obra al CIV 16002026, con el propósito de verificar las actividades ejecutadas en el área SSTMA - Recorridos en el frente de obra con el contratista verificando las actividades SSTMA y realizar las observaciones por parte de la interventoría para dar cierre de las mismas. - Se realiza pruebas de presión a la tuberia de agua potable, se revisan documentos del personal que ejecuta esta actividad y se verifica los EPP - Dentro de las observaciones del recorrido se observa recipientes con combustible, para lo cual se le informa al contratista aplicar el procedimiento para abastecimiento de combustibles en obra y reforzar con capacitación en manejo de combustibles y tanqueo de equipo menor. - Se le indica al contratista que las excavaciones para las cajas de inspección deben quedar plafonados y mantener un auxiliar de tráfico en el dia para indicarle al peatón el sendero. - Se observó el retiro de material de excavación a REX . - Se le indica al contratista mantener los cerramientos internos, sumideros y la protección de los árboles en buen estado. - Se inician actividades de conformación de RAP, con base y emulsión asfáltica. - Calificación lista de chequeo para esta semana. - Se envia al FDLPA los certificados de los materiales dispuestos en obra y los indicadores del mes de enero

Scanned with CamScanner

COMPONENTE SOCIAL

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades

- Del 11 al 15 de febrero, el contratista realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8.00 am a las 12 m
- El día 12 de febrero la interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8.00 am a las 4.00 p m.
- El día 11 de febrero el contratista realizó socialización del PMT con la comunidad del CIV 16003026 ubicado en Cll 1 D entre Kr 33 vía cerrada (Barrio Ciudad Montes)
- El día 12 de febrero a las 2.00 pm y 4.00 pm, el contratista y la interventoría realizó reunión con los Presidentes de la JAC de los barrios Brasilia y San Rafael, respectivamente, con el fin de socializarles las actividades de intervención que se realizarán en los CIV 16001283 (Kr 44 entre Cll 4B y Cll 4F barrio Brasilia) y CIV. 16001040 (Kr 53C entre Cll 4C y Cll 4F Barrio San Rafael).
- El día 13 de febrero a las 2.00 pm , el contratista y la interventoría realizó reunión con el Presidente de la JAC del barrio Autopista Sur Muzú , con el fin de socializarles las actividades de intervención que se realizarán en el CIV 16004097 (Kr 50 entre Cll 39 Sur.

3

- El día 14 de febrero a las 8.00 am se realizó reunión con el personal que realizará el levantamiento de actas de vecindad, con el fin de socializar los lineamientos para esta actividad. En la reunión se contó con la asistencia de las residentes sociales del contratista e interventoría, así como de Juan Sebastián Roncancio (Ing, para levantamiento de actas), Angie Daniela Moreno (T.S para levantamiento de actas), quienes serán los encargados de realizar este levantamiento.
- A las 8.30 am, se llevó a cabo el comité social #16, en el campamento de interventoría, donde se trabajaron las siguientes temáticas: Verificación en el cumplimiento de compromisos. Verificación de Pre-actas, en donde se realizó aprobación de las mismas.
- A las 2.00 pm, se realizó recorrido junto con el contratista por el CIV 16002026, para responder a posibles inquietudes de la comunidad.
- El día 15 de febrero el contratista envío programación y volante informativo para la reunión de avance en el CIV 16002026, la interventoría envió observaciones frente a estos productos el día 16 de febrero. En horas de la tarde se realizó recorrido por parte de la interventoría, recibiendo inquietud por parte de una residente del tramo de Milenta, frente al fuerte olor a gas en el predio ubicado en la 53 A-41, dándole solución ese mismo día

ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Se continuará con el proceso de incumplimiento contra el contratista debido a su poco rendimiento, falta de entrega de diseños avalados por los especialistas, falta de entrega de informes de inspección con CCTV, ya que todo esto está presentando un atraso del 25% a nivel general del proyecto.
- Se programó el cierre del acueducto para poder realizar el empate de la red renovada con la red principal existente, en el segmento de Milenta con CIV 16002026.
- Se realizará comité técnico No 19 el día miercoles 20 de febrero de 2019 a las 9 am, en las instalaciones de la Alcaldía de Puente Aranda.

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Dar continuidad a los recorridos SSTMA con el contratista con el fin de realizar las observaciones que se encuentren en obra
- Hacer acompañamiento de la aplicación del RAP para la estructura de la vía.
- Se revisarán los documentos del personal nuevo y subcontratistas que ingresen para esta semana, lo mismo que los documentos de la maquinaria.
- Se hará acompañamiento a las capacitaciones para esta semana, de acuerdo al cronograma tanto para el área ambiental como SST.
- Se continuará realizando las observaciones de acuerdo al MAO para el frente de milenta.

COMPONENTE SOCIAL

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

- El contratista e interventoría realizará la atención en el Punto PAC, en los horarios y días establecidos.
- El contratista realizará entrega del volante N°9 "reunión de avance del CIV 16002026".
- Se realizará el simulacro de la "reunión de avance del CIV 16002026, el día 22 de febrero a las 2.00 pm.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO




Instalacion de domiciliarias de acueducto




Prueba de carga por la Interventoria



Mezcla del material

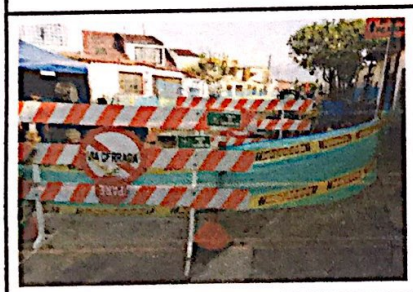

Ubicación de barricadas y señalización informativa de seguridad

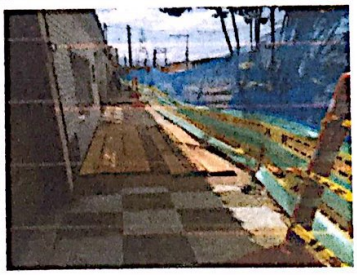

Instalación de plafones en las cajas de inspección y señalización para el paso de peatones en milenta



Limpieza y retiro de materiales de excavación por parte del personal Boal y ayudantes



Recorrido en el frente de obra con el personal SSTMA Interventoria y contratista




Seguimiento al mantenimiento de la protección de los árboles dentro del frente de obra.



Reunión socialización PMT en el CIV 16001283 (Brasilia). 12/02/19

Scanned with CamScanner

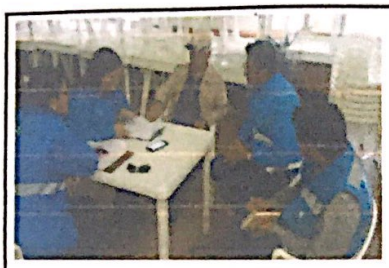		
Reunión socialización PMT en el CIV 16001040 (San Rafael). 12/02/19	**Reunión socialización PMT en el CIV 16004097 (Autopista sur-Muzú). 13/02/19**	**Reunión personal para el levantamiento de actas de vecindad. 14/02/19**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECINUEVE (Día en letras) (19) (Día en números) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2019 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Andrés Useche Luzmar
Director de Interventoría
INTERSA S.A

Scanned with CamScanner

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 18 **DEL** 4-feb **AL** 10 **DE FEBRERO DE 2019**

CONTRATO No 141-2018 (Número del contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 156 de 2018 (Indique en este espacio el número del contrato licitado)

CONSTRUCTOR LUIS GABRIEL NIETO GARCIA (Escriba el nombre o razon social del contratista de obra) **NIT** 11331006-4

INTERVENTOR INTERSA S.A (Escriba el nombre o razon social del interventor) **NIT** 860450644-3 (Escriba el NIT del interventor)

SUPERVISIÓN FDLPA ING. FABIÁN CRUZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión (ETL))

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2018 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 7 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2019 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		3,00%	36,00%	Trabajo Ejecutado	2%	15%
Valor del Trabajo Programado	$	489.193.656,73	$ 2.687.410.513,73	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 70.899.694,00	$ 885.769.463,00
ETAPA DE DIAGNÓSTICO (PREVIA)		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		0%	100%	Trabajo Ejecutado	0%	99%
Valor del Trabajo Programado	$	-	$ 200.586.472,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 180.527.824,00
ETAPA DE EJECUCIÓN		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		4%	35%	Trabajo Ejecutado	1%	11%
Valor del Trabajo Programado	$	758.264.982,43	$ 2.296.994.393,43	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 327.754.129,89	$ 789.207.822,89

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE/TRAMO	CENEFA	CÓDIGO ELEMENTO	CIV	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCIÓN	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A						

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1	COMPONENTE TÉCNICO Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: - Durante esta semana se inicia la intalación de la tuberia de acueducto en el segmento de Milenta CIV 16002026. - El dia 6 de febrero de 2019 se realizó comité técnico en las instalaciones de la Alcaldia local de Puente Aranda.
2	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: - Recorridos de obra al CIV 16002026, con el propósito de verificar las actividades ejecutadas en el área SSTMA. - Revisión de informe No 4 de contratista, envió de observaciones. - Capacitación de pausas activas e importancia del agua, como cumplimiento al cronograma de actividades de interventoria. - Inspección de oficina, de botiquin del PAC de interventoria. - Calificación lista de chequeo. - Elaboración y entrega del informe No 2 de obra de interventoria al FDLPA. - Aprobación de las memorias de las actas del componente SSTMA.

Scanned with CamScanner

3

COMPONENTE SOCIAL

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Del 04 al 08 de febrero, el contratista realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 12 m.
- El día 05 de febrero interventoria realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m.
- El día 05 de febrero a las 3:00 pm, contratista e interventoria realizo socialización de PMT en los CIV´s: 16004097 correspondiente a la Kr 50 A entre Cll 38 B Sur y CLL 39 Sur y 16001040 correspondiente a la Kr 53 C entre CL 4 C Y CL 4 Sur, donde se realizará rehabilitación. En la socialización se les indicó a cada uno de los propietarios en que consiste la intervención, el manejo que se tendrá del PMT, así mismo se les indicó que a través de volantes se les estará informando todas las actividades que se llevarán a cabo.
- El día 06 de febrero a las 8:00 am, el contratista y la interventoría realizó reunión con la Presidente de la JAC y algunos residentes del barrio Jazmin, con el fin de socializarles las actividades de intervención que se realizarán en el CIV: 16001911 correspondiente al segmento de la Cll 2b entre Kr 41a y Kr 42.
- El día 06 de febrero se elaboraron los siguientes oficios: Aprobación de hojas de vida del personal para el levantamiento de actas de vecindad, solicitud de procedimiento para divulgación en tramos de mantenimiento periódico, solicitud de acompañamiento por parte de los residentes técnicos a las reuniones sociales con la comunidad.
- El día 07 de febrero a las 10:00 am, se realizó capacitación obre el proceso de priorización para escoger las vias de intervención, con la Supervisión del contrato. A las 11:00 am se realizó el comité social #15, en el campamento de interventoría, donde se trabajaron las siguientes temáticas: Verificación en el cumplimiento de compromisos Verificación de Pre-actas, en donde se realizó aprobación de las mismas. Informe mensual del mes de enero, donde se establecieron los parámetros para la entrega del mismo. Actividades sociales que se llevarán a cabo en los siguientes CIV´s a intervenir. Compromisos En horas de la tarde el contratista realizo mantenimiento al Punto satélite de Milenta.
- El 08 de febrero contratista e interventoria realizó reunión con la propietaria Antonia Sánchez, del predio ubicado en la transversal 53ª # 20- 05, donde se levantó acta de compromiso frente a l tema de la caja de inspección del predio.
- El día 08 de febrero, se radicó en la Alcaldía Local de Puente Aranda el informe mensual de ejecución de ora N°2.

ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Se iniciará proceso de incumplimiento contra el contratista debido a su poco rendimiento, falta de entrega de diseños avalados por los especialistas, falta de entrega de informes de inspección con CCTV, ya que todo esto está presentando un atraso del 21% a nivel general del proyecto.
- Se instalarán las acometidas del acueducto en el segmento de Milenta con CIV 16002026.
-Se realizará comité técnico No 19 en las instalaciones de la Alcaldía de Puente Aranda.

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Entrega del Informe N4 del contratista al FDLPA.
- Recorridos en conjunto con el contratista al CIV 16002026.
- Calificación lista de chequeo al contratista por parte de la interventoria.
- Revisión documental, enviada por el contratista.

COMPONENTE SOCIAL

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

- El contratista e interventoría realizará la atención en el Punto PAC, en los horarios y días establecidos.
- Levantamiento de registros fílmicos y fotográficos de los CIV´s para mantenimiento rutinario.
- Martes 12 de febrero, reunión de socialización de PMT a las 2:00 pm con la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Brasilia
- Martes 12 de febrero, reunión de socialización de PMT a las 4:00 pm con el presidente de la junta de acción comunal barrio San Rafael
- Miércoles 13 de febrero, reunión de socialización de PMT a las 2: 00 pm con el presidente de la junta de acción comunal del barrio autopista sur- Muzú
- Miércoles 13 de febrero, reunión de socialización del PMT a las 3:00 pm con el presidente de la junta de acción comunal del barrio Santa Rita


4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socialización del PMT



Vista al predio por solicitud de la comunidad

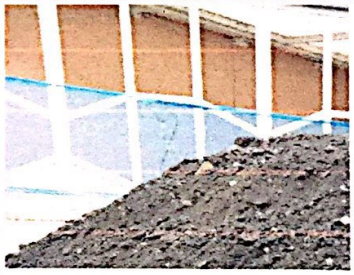

ACOPIO DEL FRESADO DE LA UMMV



INSTALACION DE LA TUBERIA DE ACUEDUCTO



NIVELACION DE LA SUB RASANTE



Brigada de orden y aseo



Acopio de Materiales



Manejo Puntos Ecológicos



Estado de Señalización Vertical

Scanned with CamScanner

		
Reunión con JAC y comunidad del barrio Torremolinos.	**Inducción sobre priorización de vias con FDLPA.**	**Comité social #4.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TRECE (13) días del mes de FEBRERO de 2019

(Día en letras) (Día en numeros) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Andrés Utreche Guzman

Director de Interventoría

INTERSA S.A

Scanned with CamScanner


INFORME N°3 ETAPA DE OBRA
GESTION SSTMA
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.
INTERSA S.A.

INFORME Nº 3. ETAPA DE OBRA
GESTION SSTMA

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
GESTION SSTMA INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA FDLPA- 141-2018
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 156-2018

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.

INTERSA S.A
NIT: 860.450.644-3

BOGOTA D.C, MARZO 2019

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSION	DETALLE
MARZO DE 2019	00	ORIGINAL

CONTROL DEL DOCUMENTO

Elaboró		FIRMA
Nombre:	Biól. Mónica Andrea Fajardo Paramo	
Nombre:	Administrador Ambiental: Carlos Arturo Alfonso	
Cargo:	Residente SSTMA	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 7
1 OBJETIVOS 8

1.1. GENERAL 8

ESPECÍFICOS 8
2 GENERALIDADES DEL PROYECTO 9

2.1. Ubicación 9

2.2. Descripción del proyecto 10

2.3. Descripción de contratos de obra y de interventoría 12
3 ACTIVIDADES DE GESTION SST DEL CONTRATISTA 13

3.1. Componente D1 seguridad y salud en el trabajo 13
3.1.1 COPASST O Comité de Convivencia en Seguridad y Salud en el Trabajo .. 13
3.1.2 Socialización Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo 14
3.1.3 Socialización Política de SST 14
3.1.4 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 14
3.1.5 Pago de Parafiscales 15
3.1.6 Inducción 15
3.1.7 Auditorias 15
3.1.8 Actualización Matriz de Peligros 16
3.1.9 Diagnóstico de Condiciones de salud 16
4 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 17
5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 21
6 ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA 21
6.1.1 A-1: Conformación del equipo de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 22
6.1.2 A-2: Capacitación ambiental (ver anexo 22
6.1.3 B1. Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o temporales y centros de acopio 23
6.1.4 B2- Manejo de materiales de construcción 24

6.1.5 B3 - Manejo integral de residuos sólidos 24
6.1.6 B4 – Control de emisiones atmosféricas 26
6.1.7 B5 – Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros 26
7 COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACION Y EL PAISAJE 26
7.1.1 C-1: Manejo de la vegetación 26
8 COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 27
8.1.1 E-1: Manejo de Señalización 27
9 INDICADORES DE DESEMPEÑO SSTMA DEL CONTRATISTA 27
9.1.1 Valoración de desempeño SSTMA del contratista ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.1.2 Cumplimiento del Componente Ambiental ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.1.3 Cumplimiento del Componente SST ..... **¡Error! Marcador no definido.**
10 VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO SSTMA DEL CONTRATISTA 28
11 ACTIVIDADES DE GESTION SST Y AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA 28
12 CONCLUSIONES 32
13 RECOMENDACIONES 33
ANEXOS CONTRATISTA 34
ANEXOS INTEVENTORIA 43

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Relación de CIV a intervenir 10
Tabla 2: Información Contrato 12
Tabla 3 15
Tabla 4. indicador de accidentabilidad 19
Tabla 5. Los integrantes de la Brigada de Emergencias son: 20
Tabla 6.residentes sstma del contratista 22
Tabla 7.relación fechas de capacitación 22
Tabla 8. Relación de personal Boal - febrero de 2019. 23
Tabla 9. Relación de materiales utilizados en obra 24
Tabla 10. Relación de RCD 25
Tabla 11 RCD´s utilizados en el mes de febrero de 2019. 25

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. FT-17; APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA 35

ANEXO 2.1 SOPORTES PAGOS DE NOMINA CONTRATISTA 36

ANEXO 3. FORMATOS DE ACCIDENTABILIDAD DEL CONTRATISTA.....37

ANEXO 4. FORMATOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CONTRATISTA.....38

ANEXO 5 **FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE RCD Y CERTIFICACIONES** 39

ANEXO 6 FORMATOS DE MATERALES Y CERTIFICACIONES 40

ANEXO 7. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO. 41

ANEXO 8. ACTAS DE REUNION, COMITES SEMANALES E INFORMES SEMANALES 42

ANEXO 9. CERTIFICADOS DE REVISION DE INFORMES Y CUMPLIMIENTOS SSTMA DEL CONTRATISTA 44

ANEXO 10. FT-17; APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA.....45

ANEXO 11. FORMATOS SSTMA.....46

ANEXO 12.CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO 47

ANEXO 13 . SOPORTE PAGO DE NOMINA 48

ANEXO 14 REGISTRO FOTOGRAFICO.....49

ANEXO 15. LISTAS DE CHEQUEO 50

INTRODUCCION

La seguridad y salud en el trabajo junto con La Gestión Ambiental, están orientadas a mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad, en el desarrollo de los proyectos, y para el caso en particular, los diagnósticos e intervención del mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda, se realice bajo el marco normativo SSTMA aplicable y vigente y por lo establecido en los términos contractuales de las partes, además por el compromiso por parte de la Gerencia en esta temática, por lo anterior, se lograra una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismo, en los diferentes oficios contribuyendo al bienestar físico y social del trabajador

INTERSA S.A, en cumplimiento de las obligaciones contractuales presenta el siguiente informe de las actividades Ambientales, Salud y Seguridad en el Trabajo, ejecutadas durante el 01 de febrero al 28 de febrero del 2019, en Etapa de Construcción, como cumplimiento de cada uno de los componentes de la gestión SSTMA

El contrato 141 de 2018 junto con el COP 156 de 2018, inició la etapa de diagnóstico el 08 de octubre de 2018, teniendo en cuenta que durante los primeros días de etapa preliminar se entregaron los documentos contractuales para la aprobación y la ejecución del proyecto.

1 OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Describir de forma detallada la gestión, seguimiento y control semanal y mensual de las actividades programadas dentro del MAO, presentado por el contratista. Lo anterior se evaluara con lo establecido en el anexo sisoma y por medio de las listas de chequeo; enmarcadas a las actividades de *diagnósticos e intervención del mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá DC"*, con el fin de verificar que los productos presentados por el Contratista respondan a criterios de calidad y suficiencia; de tal manera que sus resultados garanticen el adecuado manejo de los impactos ambientales y desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los parámetros del FDLPA.

ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento y acompañamiento a las actividades ejecutadas por el contratista para la etapa de obra.
- Verificar que las actividades realizadas, se lleven a cabo según la normativa vigente y el anexo SISOMA.
- Verificar el manejo y el transporte de los RCD's Generados en obra
- Revisar y aprobar el acopio de los materiales en obra
- Verificar las actividades ejecutadas por los BOAL en el frente de obra


- Verificar la protección del arbolado y los sumideros existentes en el CIV 16002026
- Verificar el estado y la documentación de la maquinaria utilizada en obra.
- Revisión y Aprobación de informes semanales y mensuales por parte del contratista
- Recomendar y realizar las observaciones que se presenten en obra para las actividades SSTMA con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el MAO.

2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. UBICACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en las diferentes UPZ de la localidad 16 de Puente Aranda; entre ellas tenemos: entre ellas tenemos: UPZ 40— CIUDAD MONTES - UPZ 41 - MUZU - UPZ 43 — SAN RAFAEL - UPZ 111 — PUENTE ARANDA

figura No. 1 localidad donde de Puente Aranda.

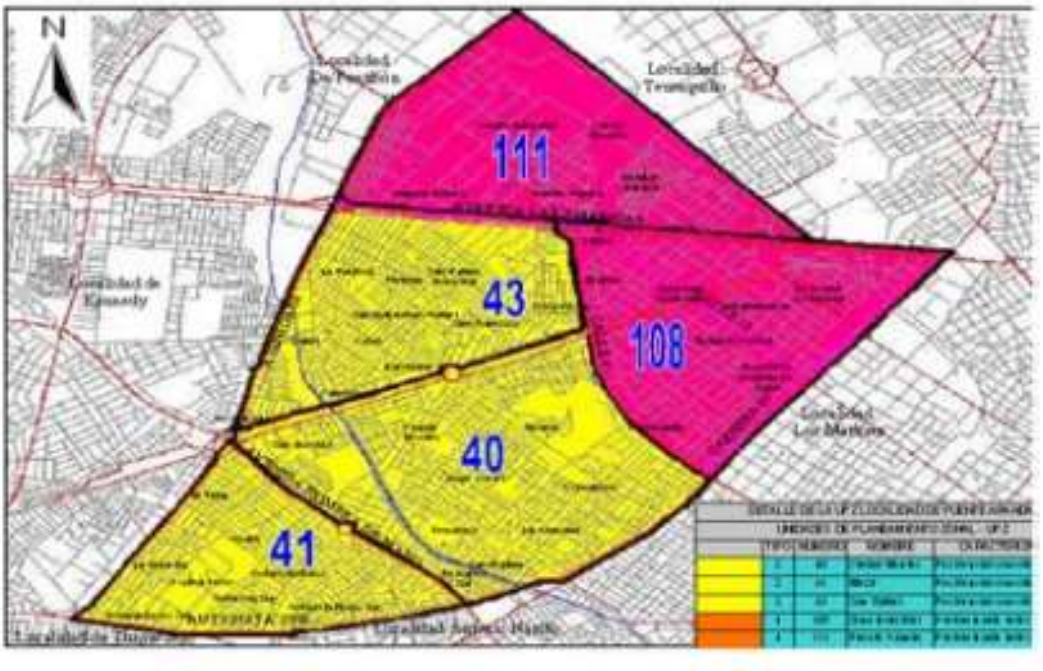

Fuente. Alcaldía mayor de Bogotá

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto, se está desarrollando dentro del área determinada por los Pliegos de condiciones, en la localidad de Puente Aranda y en los CIV determinados en la licitación pública No. ALPA-LP-006-2087

En los tramos a intervenir en la localidad de Puente Aranda se realizarán los diagnósticos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial en cada uno de los CIV relacionados:

Tabla 1: Relación de CIV a intervenir

N	CIV	VIA	INICIO	FIN
1	16000217	CL 9A	KR 67	KR 67A
