CONTRATO No.: GN4106-2024

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"

INFORME DE SUPERVISION N°3

PERIODO: 27/05/2025 AL 27/06/2025

San Juan de Pasto , 14 de julio de 2025

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	11/7/2025	CON CORTE :	27/6/2025

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
CONVENIO MACRO No:	N.A.
CONVENIO No.:	GN 4106-2025 del 31 de diciembre de 2024

APORTE DEPARTAMENTO

CDP No.:	2024110147	FECHA:	18 de noviembre de 2024	Valor: $250.000.000,00
REGISTRO No:	2024120868	FECHA:	31 de diciembre de 2024.	Valor: $250.000.000,00

APORTE MUNICIPIO

CDP Municipio No.:	2024001105	FECHA:	20 de noviembre de 2024	Valor: $1.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"
MODIFICACION No1.:	Modificación imputación presupuestal
SUSCRIPCIÓN MODIFICACION No1.	08 de mayo de 2025

CDP Municipio No.: (Modificatorio Nº1)	2025000284	FECHA:	03 de marzo de 2025	Valor: $999.352.25

CONTRATISTA:	Municipio de Los Andes (N) NIT No.: 800.019.112-2 R.L. Cristian Jhonathan Apraez Marroquín C.C. No.: 1.089.243.314 de Los Andes (N)
CONTRATISTA INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISOR	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	ANDRÉS ORTIZ GUERRERO
META FISICA PROGRAMADA	1.80 KM
VALOR DEL CONVENIO:	$ 250,999,352.25
VALOR TOTAL CONTRATADO APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 250,000,000.00
APORTE DEL DEPARTAMENTO PARA OBRA CIVIL:	$ 250,000,000.00
APORTE DEL DEPARTAMENTO PARA INTERVENTORÍA:	N/A
APORTE TOTAL MUNICIPIO:	$ 999,352.25
APORTE MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS :	$ 999,352.25

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

APORTE MUNICIPIO EN BIENES Y SERVICIO	N/A				
FECHA DE INICIACION:	27/3/2025				
PLAZO DEL CONTRATO:	5 MESES				
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	27/8/2025				
PORCENTEJE ANTICIPO	40%				
TOTAL ANTICIPO	$ 100,000,000.00				
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.					
GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia				
Póliza de Cumplimiento No.:	775-47-994000001047				
Póliza RCE No.:	N/A				
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	85.72%	% EJECUTADO:	34.67%	
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	40.00%	% EJECUTADO	0.00%	
META FISICA A LA FECHA:	0	KM			

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: el Proyecto contempla el "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR", mediante la ejecución de conformación de calzada y suministro de material de afirmado.

El Municipio ha llevado a cabo , las gestiones administrativas y legales para llevar a cabo el proceso de contratación del contrato derivado del presente Convenio, proceso que se llevará a cabo por parte del Municipio, mediante la suscripción de un Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal de la Verdea Dos Quebradas.

El día 16 de junio de presente año, el Municipio de los Andes suscribe Convenio Solidario con la JAC de la Vereda Dos Quebradas, cuyo objeto es ; "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS Y EL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO SOTOMAYOR- LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO", por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($255.999.352,25) MDA/CTE, y un plazo de ejecución de Dos (02) meses.

Dentro del proyecto, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

ITEM N°1 : Conformación de calzada:

Esta actividad consistió en la preparación de la superficie, lo que incluye la nivelació y compactación del terreno. De igual manera, se realizó el retiro de la capa superficial, con la ayuda de motoniveladora, en aras de seguir con la extensión y nivelación del material de afirmado sobre la vía, y la conformación de los drenajes logitudinales, (Cunetas laterales), que garanticen un adecuado drenaje.

ITEM N°2 : Suministro de Material de Afirmado:

Labor que incluye el corte y transporte del material granular desde la fuente de acopio hasta el sitio de intervención.

Resumen de Actividades			
Periodo		28/05/2025 – 27/06/2025	
N°	Descripción	Und	Cant
1	Conformación de calzada	M2	2.564.65
2	Suministro de material de afirmado	M3	450,25

De acuerdo al seguimiento realizado por el Municipio de Los Andes (N), y a la información contenida en el informe técnico N°3, el porcentaje de avance de obra programado hasta la fecha es del 85.72 % según el cronograma presentado, y el porcentaje de ejecución evaluado según el seguimiento de las actividades corresponde al 34.67%. De esta manera se evidencia que hay un retraso significativo en las labores programadas, lo cual ya se ha contemplado en el cronograma presentado por la junta de acción comunal, para garantizar el cumplimiento de las mismas.

Contrato Derivado:

ELEMENTOS	CONDICIONES INICIALES	ACTO ADITIVO
No Contrato	CS-001-2025	
Fecha Contrato	16 de junio de 2025	
Valor del contrato $	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($255.999.352,25) MDA/CTE	
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS Y EL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO SOTOMAYOR- LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO	
Plazo	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	
Supervisor	YULY XIMENA VACA DIAZ Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
Fecha de Iniciación	16 de junio de 2025	
Fecha de Terminación	16 de agosto del 2025	
Póliza	Póliza No 41-44-101294742	
Vigencia cumplimiento	16-06-2025 hasta 16-08-2028	
Vigencia Anticipo	16-06-2025 hasta 16-12-2025	

ASPECTOS FINANCIEROS:

El Convenio Interadministrativo N° GN4106-2024, cuyo objeto es **Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado:"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR",** tiene un costo total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($250.999.352,25) MDA/CTE, aportados y distribuidos de la siguiente manera:

1. El Departamento realizará el aporte de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($250.000.000.00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios.

2. El Municipio de Los Andes (N), aporta la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($999.352,25) MDA/CTE.

El Municipio una vez realice la contratación del Derivado, podrá tramitar el pago de Ancticipo ante el Departamento de Nariño, toda vez que, se debe anexar para dicha gestión, el recaudo de la tasa Pro Deporte del contratista de Obra.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: El día 31 de diciembre de 2024,el Departamento de Nariño y el Municipio deLos Andes (N), suscriben Convenio Interadministrativo Nº GN4106-2024, Objeto ; **Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"**

El día 07 de marzo del presente año, se suscribe Certificado de Legalización, por parte del DAC Departamental.

El día 27 de marzo del presente año, se suscribió Acta de Inicio , con la actualización de la garantía y publicación en Plataforma SECOP II.

El día 08 de mayo de 2025, se suscribe Modificatorio Nº1, el cual modifica la imputación presupuestal, Claúsula Ocatava del Convenio Interadministrativo No. GN4106-2024 la cual queda de la siguiente manera:

OCTAVA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial destinado para el presente convenio se encuentra amparado en el(los) siguiente(s)

Por el Departamento:

Numero	*Fecha*	*Valor*	*Valor a Apropiar*
2024110147	*18/11/2024*	*$250.000.000*	*$250.000.000*

Por el Municipio:

Numero	*Fecha*	*Valor*	*Valor a Apropiar*
2025000284	*03/03/2025*	*$999.352.25*	*$999.352.25*

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se está a la espera de que DAC realice la revisión del documento Aclaratorio presentado por el área Jurídica de la SIMD, en el cual se corrigen algunos errores de forma existentes en el Anexo Contractual inicial. Una vez publicado dicho Acto Administrativo, el Municipio de Los Andes (N), podrá continuar con el proceso de cobro del anticipo.

Proyectó: **ANDRES ORTIZ GUERRERO**
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión

Revisó: **Ing. LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernacion de Nariño

Revisó: **Ing.GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Supervisora - Gobernación de Nariño

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1:Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).
Conformación de Calzada

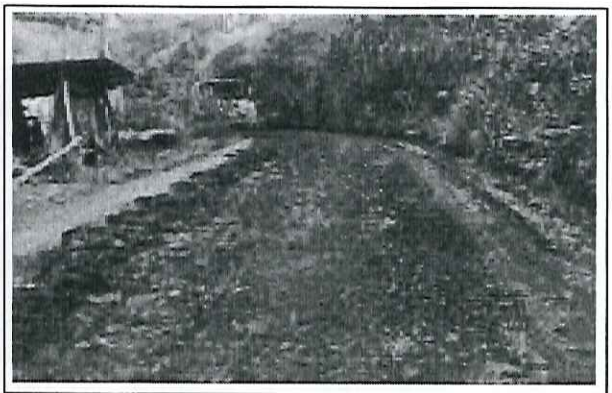


Foto 2:Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).
Conformación de Calzada

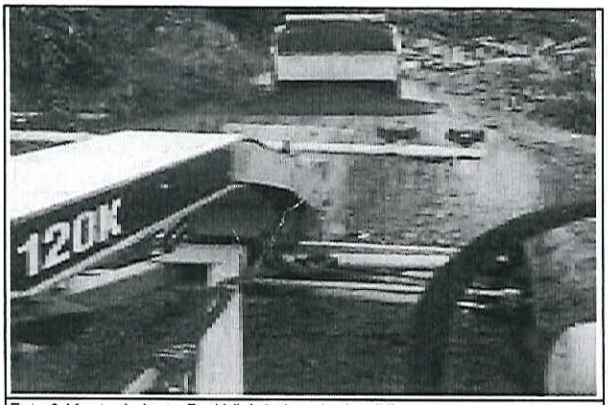


Foto 3:Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).
Conformación de Calzada



Foto 4:Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).
Conformación de Calzada



Foto 5:Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).
Suministro Material Afirmado



Foto 6:Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).
Suministro Material Afirmado

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

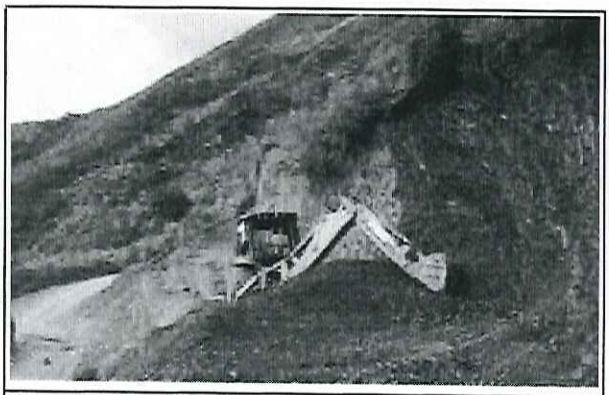


Foto 7:Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).
Suministro Material Afirmado



Foto 8:Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).
Suministro Material Afirmado

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.:	**GN 4106-2024**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO			$ -	0	$ -		$ 0.00		
							$ 0.00		
TOTAL		$ -		$ 0.00	$ -		$ 0.00		

AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No GN 4106-2024

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza No.:	775-47-994000001047

PÓLIZAS CONTRATO- ANEXO 0	FECHA APROBACION	30/1/2025	FECHA EXPEDICION	30/1/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 25,099,935.22	10%	31-dic-24	30-nov-25		
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 100,000,000.00	100%	31-dic-24	30-nov-25		

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	FECHA APROBACION	2/4/2025	FECHA EXPEDICION	1/4/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 25,099,935.22	10%	27-mar-25	27-feb-26		
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 100,000,000.00	100%	27-mar-25	27-feb-26		
