ALCALDIA DE PEREIRA Versión: 01

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 3653-2024	Fecha:	Valor inicial: $ 1,590,000,000.00	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02**
	Día: 19	Valor adición: $ -	**Valor:**
EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.	Mes: 12	Valor total: $ 1,590,000,000.00	**$ 375,786,686.00**
	Año: 2024	Valor Anticipo: $ -	
	Contratista:		
	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ		
	Interventoría:		
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	**CONSORCIO INGTEC 2024**	Plazo: 4 meses Fecha terminación: 22/05/2024 Fecha Suspension: 20/09/2024 Fecha de Reinicio: 19/11/2024 Prórroga: 1 Mes Fecha Terminación Real: 19/12/2024	

CONDICIONES GENERALES	CONTRATADO	MAYORES Y	EJECUTADO	ACUMULADO

OBRA MURO DE CONTENCIÓN VIA ALTAGRACIA - SECTOR FILOBONITO

No	ITEM	ACTIVIDAD	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Menores	Mayores	Tipo	Acta No. 01	Vr. Acta 01	Cant. Acta 02	Vr. Parcial Acta 02	Cant.	Vr. Parcial
1		**PRELIMINARES**													
1.1	1.012	Campam esterilla + teja Zn + piso	m^2	50.00	$ 146,847.00	$ 7,342,350.00	17.50		-	17.50	$ 2,569,822.50		$ -	17.50	$ 2,569,822.50
1.2	1.020	Localización y replanteo obra	m^2	400.00	$ 5,176.00	$ 2,070,400.00		691.25	+	1091.25	$ 5,648,310.00		$ -	1091.25	$ 5,648,310.00
2		**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2.01	2.049	Exc config talud tierra man	m^3	270.00	$ 39,410.00	$ 10,640,700.00		288.12	+	539.22	$ 21,250,660.20	18.90	$ 744,849.00	558.12	$ 21,995,509.20
2.02	2.034	Exc config subrasante man	m^3	96.25	$ 40,514.00	$ 3,899,473.00	77.40		-	77.40	$ 3,135,783.60		$ -	77.40	$ 3,135,783.60
2.03	2.062	Excavación Caisson material comun h= 0 - 2 m	m^3	22.62	$ 40,798.00	$ 922,802.00	18.62		-	18.62	$ 759,658.76		$ -	18.62	$ 759,658.76
2.04	2.063	Excavación Caisson material comun h= 2 - 4 m	m^3	22.62	$ 67,607.00	$ 1,529,189.00	18.62		-	18.62	$ 1,258,842.34		$ -	18.62	$ 1,258,842.34
2.05	2.064	Excavación Caisson material comun h= 4 - 6 m	m^3	22.62	$ 99,941.00	$ 2,260,545.00	18.62		-	18.62	$ 1,860,901.42		$ -	18.62	$ 1,860,901.42
2.06	2.065	Excavación Caisson material comun h= 6 - 8 m	m^3	22.62	$ 132,967.00	$ 3,007,554.00	18.62		-	18.62	$ 2,475,845.54		$ -	18.62	$ 2,475,845.54
2.07	2.066	Excavación Caisson material comun h= 8 - 10 m	m^3	79.17	$ 168,165.00	$ 13,312,917.00	1.86		-	1.86	$ 312,786.90		$ -	1.86	$ 312,786.90
2.08	2.020	Lleno comp mater transportado	m^3	204.00	$ 93,205.00	$ 19,013,820.00	204.00		-		$ -		$ -		$ -
2.09	2.019	Lleno comp mater sitio man	m^3	420.00	$ 55,828.00	$ 23,447,760.00	258.87		-	255.09	$ 14,241,164.52	3.78	$ 211,029.84	258.87	$ 14,452,194.36
3		**CONCRETO**													
3.01	5.265	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.20m	m^3	95.43	$ 953,801.00	$ 91,017,297.00	21.14		-	21.14	$ 20,163,353.14		$ -	21.14	$ 20,163,353.14
	5.268	Conc C24 MPa premezclado pilotes y caissons	m^3	169.95	$ 1,276,998.00	$ 216,637,607.00	169.95		-		$ -		$ -		$ -
3.02	5.141	Muro conc ref C20.7 MPa Esp: >0.15 m <= .30 m	m^3	19.50	$ 1,380,582.00	$ 26,921,349.00	19.50		-		$ -		$ -		$ -
3.03	5.014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	kg	21,861.18	$ 9,458.00	$ 206,763,080.00	21861.18		-		$ -		$ -		$ -
3.04	5.212-24	Columna circular C27.6 MPa premezclado secc G (3.600 cm2 < área secc. Transversal <=4.800 cm2)	m^3	73.51	$ 1,849,838.00	$ 135,987,637.00	73.51		-		$ -		$ -		$ -
	5.117	Viga cimentación C27.6 MPa secc E premezclado (1.600 cm2<área secc. Transversal<=2.500 cm2)	m^3	10.50	$ 1,440,729.00	$ 15,127,655.00		10.50	+	21.00	$ 30,255,309.00		$ -	21.00	$ 30,255,309.00
3.06	5.045-13	Viga aérea C27.6 MPa secc E premezclado (1.600 cm2< área secc. Transversal <=2.500 cm2)	m^3	10.50	$ 1,688,679.00	$ 17,731,130.00	10.50		-		$ -		$ -		$ -
3.07	5.269	Conc C28 MPa estribos premezclado	m^3	3.00	$ 1,650,727.00	$ 5,282,326.00	3.00		-		$ -		$ -		$ -
3.08	12.06	Enrocado Protecc Salida Canalr R	m^3	0.90	$ 460,412.00	$ 414,371.00	0.90		-		$ -		$ -		$ -
4		**PAVIMENTO**													
4.01	13.031	Subbase granular tipo INVIAS	m^3	30.00	$ 146,017.00	$ 4,380,510.00		21.00	+	51.00	$ 7,446,867.00		$ -	51.00	$ 7,446,867.00
4.02	13.029	Base granular tipo INVIAS	m^3	24.00	$ 160,174.00	$ 3,844,176.00	24.00		-		$ -		$ -		$ -
4.03	13.026	Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 19 (Incl Transporte)	m^3	12.00	$ 1,211,954.00	$ 14,543,448.00		3.00	+	15.00	$ 18,179,310.00		$ -	15.00	$ 18,179,310.00
4.04	12.004	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ	m^3	2.40	$ 1,148,421.00	$ 2,756,210.00	2.40		-		$ -		$ -		$ -
5		**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**													
5.01	12.006	Tub Concr. Perforada 8" filtro Pata	m	18.00	$ 104,239.00	$ 1,876,302.00		3.00	+	21.00	$ 2,189,019.00		$ -	21.00	$ 2,189,019.00
5.02	12.012	Filtro francés + Geotex.1600 N-T	m^3	27.60	$ 212,927.00	$ 5,876,785.00	13.80		-	13.80	$ 2,938,392.60		$ -	13.80	$ 2,938,392.60
6		**OBRAS EXTERIORES**													
6.02	3.038	Tub concr reforz.Uc 36" Cl 2	m	7.00	$ 864,471.00	$ 6,051,297.00	7.00		-		$ -		$ -		$ -
6.03	12.029	Cuerpo canal rápidas R	m^3	14.85	$ 1,287,363.00	$ 19,117,341.00	14.85		-		$ -		$ -		$ -
6.04	12.061	Trincho guadua Imperm Config Talud	m^2	160.00	$ 58,878.00	$ 9,420,480.00	160.00		-		$ -		$ -		$ -
7		**DEMARCACIÓN VIAL**													
7.01	4.013	Señal preventiva reflectiva L=0.9 m	Un	2.00	$ 396,371.00	$ 792,742.00	2.00		-		$ -		$ -		$ -
7.06	4.002	Pintura tráfico línea carril / borde Vía	m	90.00	$ 6,154.00	$ 553,860.00	90.00		-		$ -		$ -		$ -
7.07	4.034	Defensa metálica	m	30.00	$ 606,060.00	$ 18,181,800.00	6.00		-		$ -	24.00	$ 14,545,440.00	24.00	$ 14,545,440.00
		PRECIOS NO PREVISTOS													
	AD1	Alquiler de baño portátil (2 aseos semanales)	mes		$ 489,389.00			8.00	+	7.00	$ 3,425,723.00	1.00	$ 489,389.00	8.00	$ 3,915,112.00
	AD2	Trincho guadua Imperm + Geotex NT 1600	m^2		$ 63,031.70			155.00	+	155.00	$ 9,769,913.50		$ -	155.00	$ 9,769,913.50

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA Versión: 01

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 3653-2024																	
EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.																	
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción																	

Fecha:
Día: 19
Mes: 12
Año: 2024

Contratista:
ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

Interventoría:
CONSORCIO INGTEC 2024

Valor inicial:	$	1,590,000,000.00
Valor adición:	$	-
Valor total:	$	1,590,000,000.00
Valor Anticipo:	$	-

Plazo: 4 meses
Fecha terminación: 22/05/2024
Fecha Suspension: 20/09/2024
Fecha de Reinicio: 19/11/2024
Prórroga: 1 Mes
Fecha Terminación Real: 19/12/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	
Valor:	
$	**375,786,686.00**

	AD3	Sistema de conducción de aguas superficiales (incluye anclaje de delineadores plasticos para señalización)	m		$ 76,175.68			70.00	+	70.00	$ 5,332,297.60		$ -	70.00	$ 5,332,297.60
	AD4	Polietileno (plastico) negro Cal 4	m^2		$ 3,895.87			1200.00	+	1200.00	$ 4,675,044.00		$ -	1200.00	$ 4,675,044.00
	AD5	Conc 27.6 Mpa premezclado para pilotes y caisson	m3		$ 1,712,120.96			53.20	+	53.20	$ 91,084,835.07		$ -	53.20	$ 91,084,835.07
	AD6	Rocería + limpieza cuneta vía	m		$ 9,893.64			1650.00	+	1200.00	$ 11,872,368.00	450.00	$ 4,452,138.00	1650.00	$ 16,324,506.00
	AD7	Transporte de material granular/piedra	m3 - km		$ 9,616.64			11040.17	+	8514.796248000	$ 81,883,730.19	2525.37	$ 24,285,574.16	11040.1662480	$ 106,169,304.35
	AD8	Solado concreto de 17,2 Mpa	m3		$ 734,243.37			2.84	+	2.84	$ 2,085,251.17		$ -	2.84	$ 2,085,251.17
	AD9	AFIRMADO AZUL COMBIA SU+TR+RI+COMP MAN	m3		$ 119,573.35			229.22	+	212.00	$ 25,349,550.20	17.22	$ 2,059,053.09	229.22	$ 27,408,603.29
	AD10	Transporte vertical de excavaciones con diferencia de altura > 2 metros hasta sitio para cargue manual	m3		$ 27,959.44			360.50	+	360.50	$ 10,079,378.12		$ -	360.50	$ 10,079,378.12
	AD11	Cargue Manual+Retiro+Mat Sobrante Inluye El Deposito (Cargue Y Retiro A Escombrera Oficial O Autorizada) Incluye derecho de disposición	m3		$ 58,192.00			580.57	+	551.09	$ 32,069,029.28	29.48	$ 1,715,500.16	580.57	$ 33,784,529.44
	AD12	Muro conc ref C27.6 MPa Esp: >0.15 m <= .35 m	m3		$ 1,849,838.04			22.75	+	22.75	$ 42,083,815.41		$ -	22.75	$ 42,083,815.41
	AD13	Concreto Simple 20.7 Mpa (para empotrar guaduas de trincho). Trasciego > 10m.	m3		$ 958,662.00			30.06	+	29.34	$ 28,127,143.08	0.72	$ 690,236.64	30.06	$ 28,817,379.72
	AD14	Empradización Zonas Verdes	m2		$ 12,609.00			517.18	+	517.18	$ 6,521,122.62		$ -	517.18	$ 6,521,122.62
	AD15	Demol Pavimento Flexible E<.21M	m2		$ 14,159.00			128.55	+	128.55	$ 1,820,139.45		$ -	128.55	$ 1,820,139.45
	AD16	Demol concreto simple manual	m3		$ 314,725.82			3.78	+		$ -	3.78	$ 1,189,663.60	3.78	$ 1,189,663.60
	AD17	Lleno compactado manual con material transportado	m3		$ 95,048.00			164.04	+	164.04	$ 15,591,673.92		$ -	164.04	$ 15,591,673.92
	AD18	Corte mecánico placas y pavimentos de concreto asfatico H>10 cm (incluye operario)	m		$ 7,057.00			56.00	+	56.00	$ 395,192.00		$ -	56.00	$ 395,192.00
	AD19	Acelerante para concreto Sikaset L o similar.	kg		$ 18,125.00			330.72	+	330.72	$ 5,994,300.00		$ -	330.72	$ 5,994,300.00
	AD20	Defensa metálica tipo pingüino	m		$ 985,700.00			20.00	+			20.00	$ 19,714,000.00	20.00	$ 19,714,000.00
	AD21	Muro Afirmado Armado +Refuerzo Geotextil H<3.01M (m3)	m3		$ 242,910.00			19.74	+			19.74	$ 4,795,043.40	19.74	$ 4,795,043.40
	AD22	Anden C 20.7 Mpa E=.10M (m2)	m2		$ 88,516.00			15.00	+			15.00	$ 1,327,740.00	15.00	$ 1,327,740.00
		PRECIOS DOBLES EN CONTRATO, PAGO POR MENOR VALOR													
3.04	5.014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	kg	21,861.18	$ 8,736.00		9972.10		-	9972.10	$ 87,116,265.60		$ -	9972.10	$ 87,116,265.60
3.05	12.06	Enrocado Protecc Salida Canalr R	m3	0.90	$ 438,099.00		0.90		-		$ -		$ -		$ -
4.02	13.029	Base granular tipo INVIAS	m3	24.00	$ 159,994.00			10.04	+	34.04	$ 5,446,195.76		$ -	34.04	$ 5,446,195.76
4.05	12.004	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ	m3	2.40	$ 1,058,524.00			6.21	+		$ -	8.61	$ 9,113,891.64	8.61	$ 9,113,891.64
6.03	12.029	Cuerpo canal rápidas R	m3	14.85	$ 1,148,421.00		14.85		-		$ -		$ -		$ -
7.01	4.013	Señal preventiva reflectiva L=0.9 m	Un	2.00	$ 396,187.00		2.00		-		$ -	2.00	$ 792,374.00	2.00	$ 792,374.00

OBRA BOX CULVERT VIA MUNDO NUEVO - SECTOR EL CHOCHO

No	ITEM	ACTIVIDAD	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Menores	Mayores	Tipo	Cant Acta 01	Vr. Acta 01	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
1		**PRELIMINARES**													
1.1	1.012	Campam esterilla + teja Zn + piso	m^2	30.00	$ 146,847.00	$ 4,405,410.00	30.00		-		$ -		$ -		$ -
1.2	1.020	Localización y replanteo obra	m^2	134.00	$ 5,176.00	$ 693,584.00	105.00		-	105.00	$ 543,480.00		$ -	105.00	$ 543,480.00
1.3	1.005	Demol pavimento rígido E<0.21 m	m^2	42.00	$ 21,313.00	$ 895,146.00	42.00		-		$ -		$ -		$ -
	1.070	Demol concreto simple manual	m^3	9.80	$ 314,464.00	$ 3,081,747.00		8.40	+	18.20	$ 5,723,244.80		$ -	18.20	$ 5,723,244.80
2		**MOVIMIENTO DE TIERRA**				$ -									
2.01	2.049	Exc config talud tierra man	m^3	18.00	$ 39,410.00	$ 709,380.00		78.40	+	96.40	$ 3,799,124.00		$ -	96.40	$ 3,799,124.00
2.02	2.034	Exc config subrasante man	m^3	25.20	$ 39,410.00	$ 993,132.00	25.20		-		$ -		$ -		$ -
2.03	2.002	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man	m^3	10.50	$ 39,410.00	$ 413,805.00		71.22	+	81.72	$ 3,220,585.20		$ -	81.72	$ 3,220,585.20
2.04	2.005	Excavación conglomer B-A H=0-1,5 m man	m^3	15.00	$ 57,059.00	$ 855,885.00		60.42	+	75.42	$ 4,303,389.78		$ -	75.42	$ 4,303,389.78
2.05	2.070	Excavación manual en tierra de 0 a 2 m	m^3	7.00	$ 110,346.00	$ 772,422.00		40.49	+	25.89	$ 2,856,857.94	21.60	$ 2,383,473.60	47.4900000	$ 5,240,331.54
2.06	2.042	Excavación conglomer H=0-2 m mec	m^3	125.00	$ 24,127.00	$ 3,015,875.00	125.00		-		$ -		$ -		$ -
2.07	2.019	Lleno comp mater sitio man	m^3	56.00	$ 55,828.00	$ 3,126,368.00	6.02		-	6.02	$ 336,084.56		$ -	6.02	$ 336,084.56
2.08	2.020	Lleno comp mater transportado	m^3	35.00	$ 83,154.00	$ 2,910,390.00	35.00		-		$ -		$ -		$ -
2.09	2.023	Cargue material mec	m^3	131.95	$ 8,043.00	$ 1,061,274.00	131.95		-		$ -		$ -		$ -
	2.080	Transporte de material granular/piedra	m3-km	1055.60	$ 9,565.00	$ 10,096,814.00		7810.09	+	6147.73	$ 58,803,037.45	2717.96	$ 25,997,287.40	8865.69	$ 84,800,324.85
3		**CONCRETO**													
3.01	5.137	Zarpa conc.ciclópeo	m^3	12.00	$ 938,972.00	$ 11,267,664.00	10.50		-	10.50	$ 9,859,206.00		$ -	10.50	$ 9,859,206.00
3.02	5.169	Box-Culvert C 28 Mpa	m^3	12.40	$ 1,459,263.00	$ 18,094,861.00		1.62	+	14.02	$ 20,458,867.26		$ -	14.02	$ 20,458,867.26

ALCALDIA DE PEREIRA Versión: 01

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 3653-2024

EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

Fecha:
Día: 19
Mes: 12
Año: 2024

Contratista:
ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

Interventoría:
CONSORCIO INGTEC 2024

Valor inicial:	$	1,590,000,000.00
Valor adición:	$	-
Valor total:	$	1,590,000,000.00
Valor Anticipo:	$	-

Plazo: 4 meses
Fecha terminación: 22/05/2024
Fecha Suspension: 20/09/2024
Fecha de Reinicio: 19/11/2024
Prórroga: 1 Mes
Fecha Terminación Real: 19/12/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02
Valor:
$ 375,786,686.00

3.03	5.269	Conc C28 MPa estribos	m^3	3.50	$	1,552,848.00	$	5,434,968.00		8.12	+	5.30	$	8,230,094.40	6.32	$	9,813,999.36	11.62	$	18,044,093.76
	5.141	Muro conc ref C8 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m	m^3	3.13	$	1,239,737.00	$	3,874,178.00	3.13		-		$	-		$	-		$	-
3.04	5.014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	kg	1550.00	$	8,736.00	$	13,540,800.00		3732.00	+	4070.94	$	35,563,731.84	1211.06	$	10,579,820.16	5282.00	$	46,143,552.00
3.05	12.060	Enrocado Protecc Salida Canalr R	m^3	0.90	$	438,099.00	$	394,289.00		7.98	+	4.44	$	1,945,159.56	4.44	$	1,945,159.56	8.88	$	3,890,319.12
3.06	5.160	Junta Dil/Exp cinta PVC V-15	M	14.00	$	37,420.00	$	523,880.00	14.00		-	14.00	$	523,880.00		$	-	14.00	$	523,880.00
4		**PAVIMENTO**																		
4.01	13.031	Subbase granular tipo INVIAS	m^3	22.50	$	146,017.00	$	3,285,383.00	22.50		-		$	-		$	-		$	-
4.02	13.029	Base granular tipo INVIAS	m^3	18.00	$	159,994.00	$	2,879,892.00	18.00		-		$	-		$	-		$	-
4.03	13.013	Pavimento MR=4.1 MPa obra	m^3	12.00	$	756,512.00	$	9,078,144.00	12.00		-		$	-		$	-		$	-
4.04	5.026	Acelerante para concreto Sikaset L o similar (según diseño de mezcla)	kg	54.29	$	18,125.00	$	984,074.00		69.42	+		$	-	123.71	$	2,242,243.75	123.71	$	2,242,243.75
4.05	12.004	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ	m^3	2.40	$	1,058,524.00	$	2,540,458.00	2.40		-		$	-		$	-		$	-
5		**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**																-		
5.01	12.006	Tub Concr. Perforada 8" filtro Pata	m	18.00	$	103,667.00	$	1,866,006.00	18.00		-		$	-		$	-		$	-
5.02	12.012	Filtro francés + Geotex.1600 N-T	m^3	27.60	$	212,927.00	$	5,876,785.00	3.36		-	3.36	$	715,434.72		$	-	3.36	$	715,434.72
6		**OBRAS EXTERIORES**																		
6.03	12.029	Cuerpo canal rápidas R	m^3	6.60	$	1,175,616.00	$	7,759,066.00	6.60		-		$	-		$	-		$	-
7		**DEMARCACIÓN VIAL**																		
7.01	4.013	Señal preventiva reflectiva L=0.9 m	Un	2.00	$	396,187.00	$	792,374.00	2.00		-		$	-	2.00	$	792,374.00	2.00	$	792,374.00
7.03	4.021	Cinta plastica seguridad cal 6	m	100.00	$	450.00	$	45,000.00		400.00	+	500.00	$	225,000.00		$	-	500.00	$	225,000.00
7.06	4.002	Pintura tráfico línea carril / borde Vía	m	45.00	$	6,154.00	$	276,930.00	45.00		-		$	-		$	-		$	-
7.07	4.034	Defensa metálica	m	14.00	$	606,060.00	$	8,484,840.00	8.00		-		$	-	8.00	$	4,848,480.00	8.00	$	4,848,480.00
7		**PRECIOS NO PREVISTOS**																		
7.01	AD1MN	Arrendamiento Inmueble-Campamento	m2/mes		$	23,216.00				500.00	+	400.00	$	9,286,400.00	100.00	$	2,321,600.00	500.00	$	11,608,000.00
7.02	AD2MN	Demol pavimento rígido E>0.21 m	m^2		$	53,425.00				48.00	+	48.00	$	2,564,400.00		$	-	48.00	$	2,564,400.00
7.03	AD3MN	Puente provisional en madera	m		$	147,645.00				20.00	+	20.00	$	2,952,900.00		$	-	20.00	$	2,952,900.00
7.06	AD4MN	Transporte vertical de excavaciones con diferencia de altura > 2 metros hasta sitio para cargue manual	m3		$	27,959.44				174.15	+	174.1488580000	$	4,869,104.55		$	-	174.1488580	$	4,869,104.55
7.07	AD5MN	Manejo provisional de aguas (und)	m		$	305,433.89				7.00	+	7.00	$	2,138,037.23		$	-	7.00	$	2,138,037.23
7.08	AD6MN	AFIRMADO AZUL COMBIA SU+TR+RI+COMP MAN	m3		$	119,573.35				123.09	+	74.11	$	8,861,580.97	48.98	$	5,856,702.68	123.09	$	14,718,283.65
7.09	AD7MN	Cargue Manual+Retiro+Mat Sobrante Inluye El Deposito (Cargue Y Retiro A Escombrera Oficial O Autorizada) Incluye derecho de disposición	m3		$	58,192.00				448.30	+	418.01	$	24,324,837.92	30.29	$	1,762,635.68	448.30	$	26,087,473.60
7.10	AD8MN	Conc C20.7 MPa para pilotes y caissons	m3		$	1,115,489.44				10.00	+	5.00	$	5,577,447.20	5.00	$	5,577,447.20	10.00	$	11,154,894.40
7.11	AD9MN	Excavación roca con cuña hidráulica bajo agua	m3		$	344,709.26				1.70	+		$	-	1.70	$	586,005.74	1.70	$	586,005.74
7.12	AD10MN	Viga Cimentación C27.6 Mpa Secc E (1.600Cm2<Area Secc. Transversal<=2.500Cm2)	m3		$	1,457,943.00				11.77	+	3.74	$	5,452,706.82	8.03	$	11,707,282.29	11.77	$	17,159,989.11
7.13	AD11MN	Excavación caisson en conglomerado	m3		$	380,778.72				10.00	+	5.00	$	1,903,893.60	5.00	$	1,903,893.60	10.00	$	3,807,787.20
7.14	AD12MN	Columna circular C27.6 MPa secc G (3.600 cm2 < área secc. Transversal <=4.800 cm2)	m3		$	1,850,078.00				4.82	+	2.41	$	4,458,687.98	2.41	$	4,458,687.98	4.82	$	8,917,375.96
7.15	AD13MN	Placa Maci.C27.6 Mpa E=.25M	m2		$	351,105.31				17.50	+		$	-	17.50	$	6,144,342.93	17.50	$	6,144,342.93
7.16	AD14MN	Anclaje Manual Varilla Ø=1/2" L<Ó=.40M (Un)	und		$	7,609.00				50.00	+		$	-	48.00	$	365,232.00	48.00	$	365,232.00
7.17	AD15MN	Solado Concreto 17,2 MPa (m3)	m3		$	720,324.00				0.58551	+		$	-	0.20	$	144,064.80	0.20	$	144,064.80

ALCALDIA DE PEREIRA Versión: 01

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Fecha de Vigencia:
Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 3653-2024	Fecha:	Valor inicial: $ 1,590,000,000.00	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02**
	Día: 19	Valor adición: $ -	**Valor:**
EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.	Mes: 12	Valor total: $ 1,590,000,000.00	**$ 375,786,686.00**
	Año: 2024	Valor Anticipo: $ -	
	Contratista:	Plazo: 4 meses	
	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	Fecha terminación: 22/05/2024	
	Interventoría:	Fecha Suspension: 20/09/2024	
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	**CONSORCIO INGTEC 2024**	Fecha de Reinicio: 19/11/2024 Prórroga: 1 Mes Fecha Terminación Real: 19/12/2024	

COSTO DIRECTO VIA PEREIRA ALTAGRACIA - SECTOR FILO BONITO				**$ 890,724,913.0**	**$ 605,408,994.0**	$ 691,534,917.00	**$ 86,125,923.0**		**$ 691,534,917.0**		
COSTO DIRECTO BOX CULVERT - VIA EL CHOCHO				**$ 130,030,824.0**	**$ 229,497,174.0**	$ 328,927,907.00	**$ 99,430,733.0**		**$ 328,927,907.0**		
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 1,020,755,737.0**	**$ 834,906,168.0**	$ 1,020,462,824.00	**$ 185,556,656.0**		**$ 1,020,462,824.0**		
ADMINISTRACION	%	29.20%		$ 298,060,675.0	$ 243,792,601.0	$ 297,975,144.61	$ 54,182,544.0		$ 297,975,145.0		
UTILIDAD	%	5.00%		$ 51,037,787.0	$ 41,745,308.0	$ 51,023,141.20	$ 9,277,833.0		$ 51,023,141.0		
COSTO TOTAL				**$ 1,369,854,199.0**	**$ 1,120,444,077.0**	$ 1,369,461,109.81	**$ 249,017,033.0**		**$ 1,369,461,110.0**		
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA PEREIRA ALTAGRACIA - SECTOR FILO BONITO (INCLUYE IVA Y DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS)	Según factura			$ 88,376,148.0							
PAGA (SEGÚN FRA, INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según factura			$ 15,000,000.0			$ 15,000,000.0		$ 15,000,000.0		
PMT (SEGÚN FRA, INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según factura			$ 58,421,301.0			$ 58,421,301.0		$ 58,421,301.0		
PGIO (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según factura			$ 5,000,000.0			$ 5,000,000.0		$ 5,000,000.0		
ESTUDIOS Y DISEÑOS BOX CULVERT - VIA EL CHOCHO				$ 38,348,352.0			$ 38,348,352.0		$ 38,348,352.0		
PAGA (Según Factura, incluye impuestos y deducciones)	Según factura			$ 5,000,000.0			$ 5,000,000.0		$ 5,000,000.0		
PMT (Según Factura, incluye impuestos y deducciones)	Según factura			$ 5,000,000.0							
PGIO (Según Factura, incluye impuestos y deducciones)	Según factura			$ 5,000,000.0			$ 5,000,000.0		$ 5,000,000.0		
COSTO TOTAL APROX DE INTERVENCION				**$ 1,590,000,000.0**	**$ 1,120,444,077.0**		**$ 375,786,686.0**		**$ 1,496,230,763.0**		

ARMANDO MARULANDA FERNÁNDEZ
Contratista

RICARDO TABARES GONZALES
Director de Interventoría

JOSE MANUEL RENDÓN
R.L. Interventoría

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 | Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCION		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO: **EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	MOVIMIENTO DE TIERRA	ITEM	2.049	ACTIVIDAD	Exc config talud tierra man	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



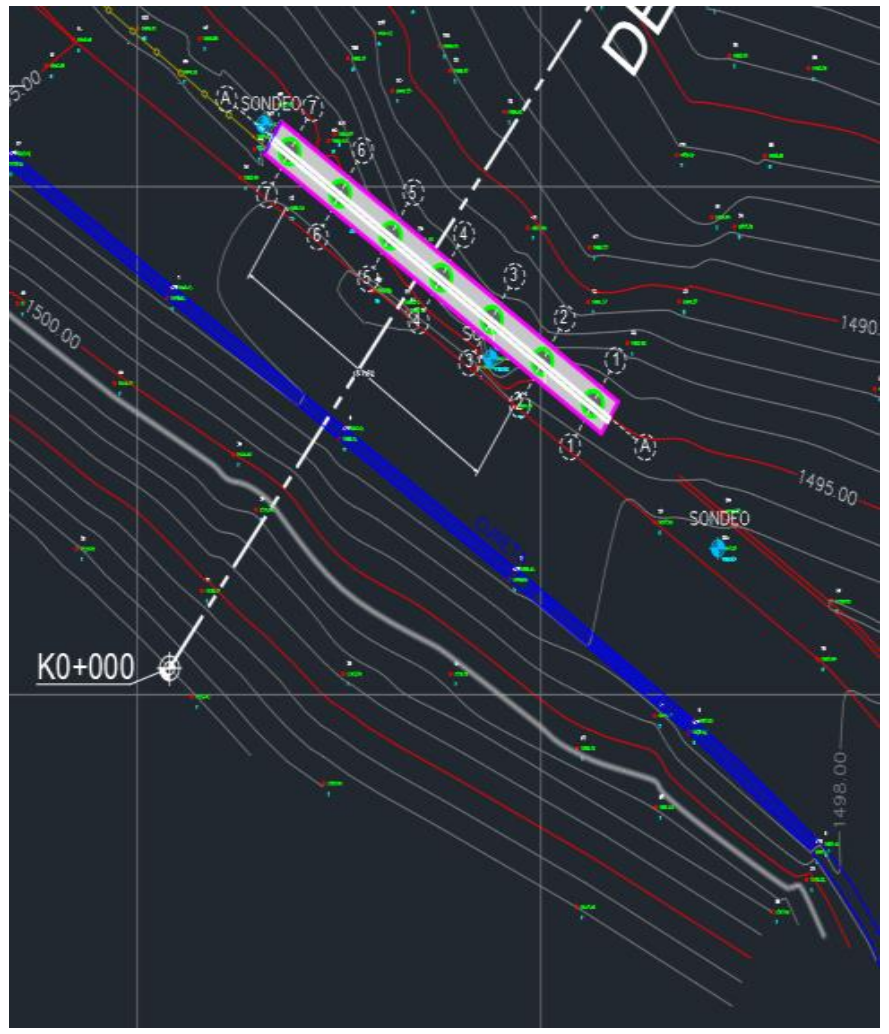

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Excavación para conformación de talud costado de cuneta sentido Pereira-Altagracia	1.0	63.00	1.00	0.30	18.90	18.90
Subtotal						18.90
Vienen						
TOTAL						**18.90**

OBSERVACIONES:				
ACTA 1	539.22	ACTA5	0.00	
ACTA 2	18.90	**ACTA6**	**0.00**	
ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**558.12**

ING. LIBARDO ANDRÉS TABARES D, | ING. CLAUDIA MILENA MARIN GARCIA

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 | Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	MOVIMIENTO DE TIERRA	ITEM	2.019	ACTIVIDAD	Lleno comp mater sitio man	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



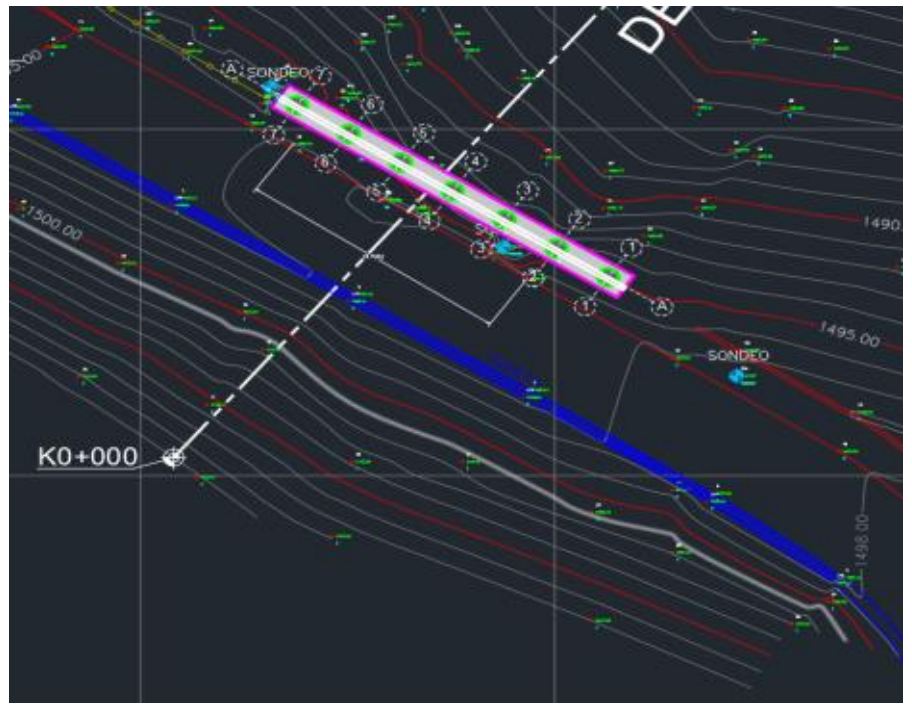

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Lleno del costado derecho de cuneta frente a muro	1.00	63.00	0.20	0.30	3.78	3.78
Subtotal						3.78
Vienen						
TOTAL						3.78

OBSERVACIONES:				
ACTA 1	255.09	ACTA5	0.00	
ACTA 2	3.78	ACTA6	0.00	
ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM
ACTA 4	0.00			258.87

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**		**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**DEMARCACION VIAL**	**ITEM**	4.034	**ACTIVIDAD**	DEFENSA METALICA	**Un**	m	**UBICACIÓN**	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



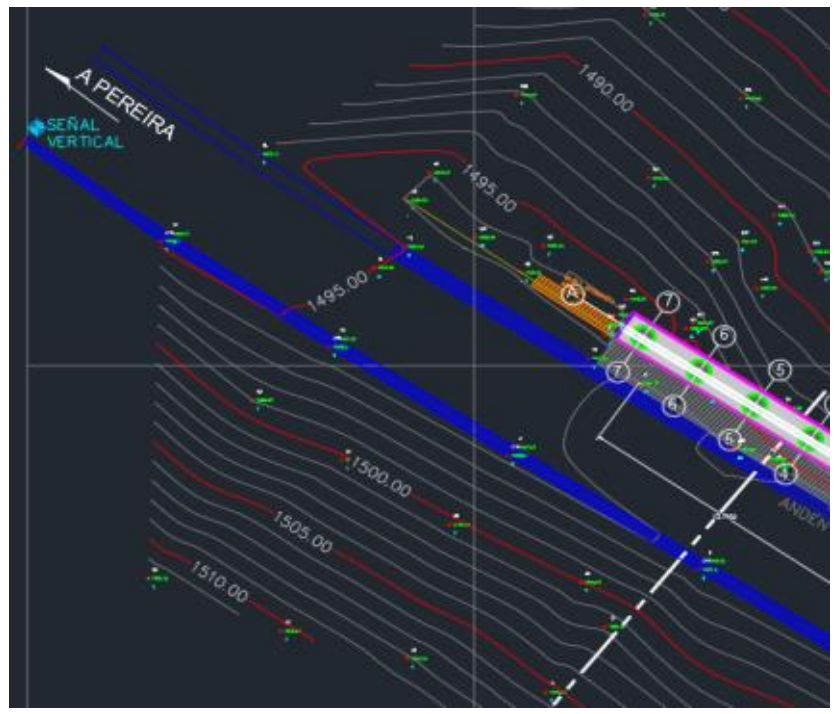

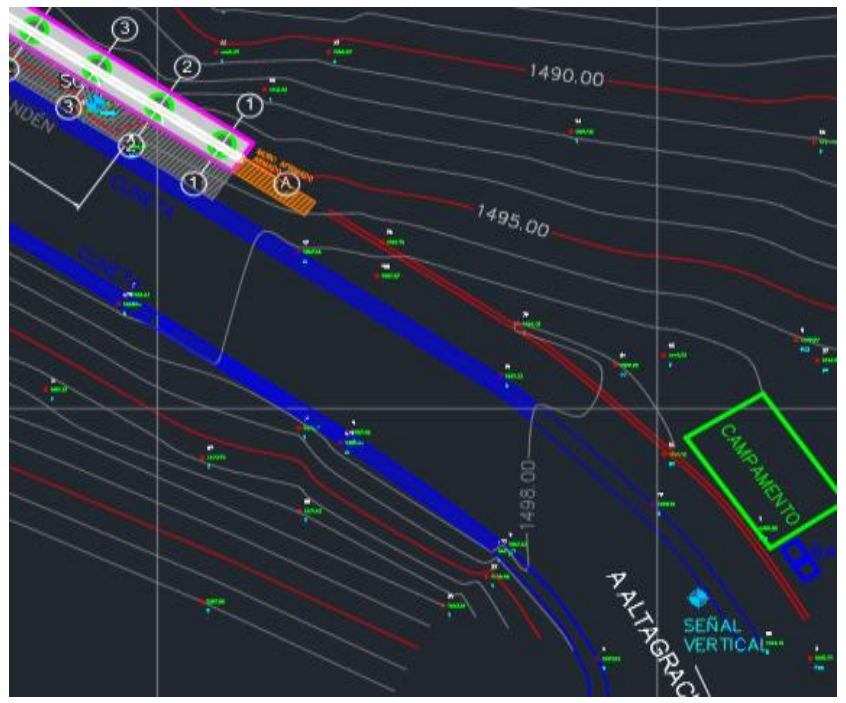

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
contigua a muro	1.0	24.00			24.00	24.00
Subtotal						24.00
Vienen						
TOTAL						**24.00**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	24.00	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**24.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

ALCALDIA DE PEREIRA

Versión: 01 | Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD1	**ACTIVIDAD**	Alquiler de baño portátil (2 aseos semanales)	**Un**	mes	**UBICACIÓN**	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



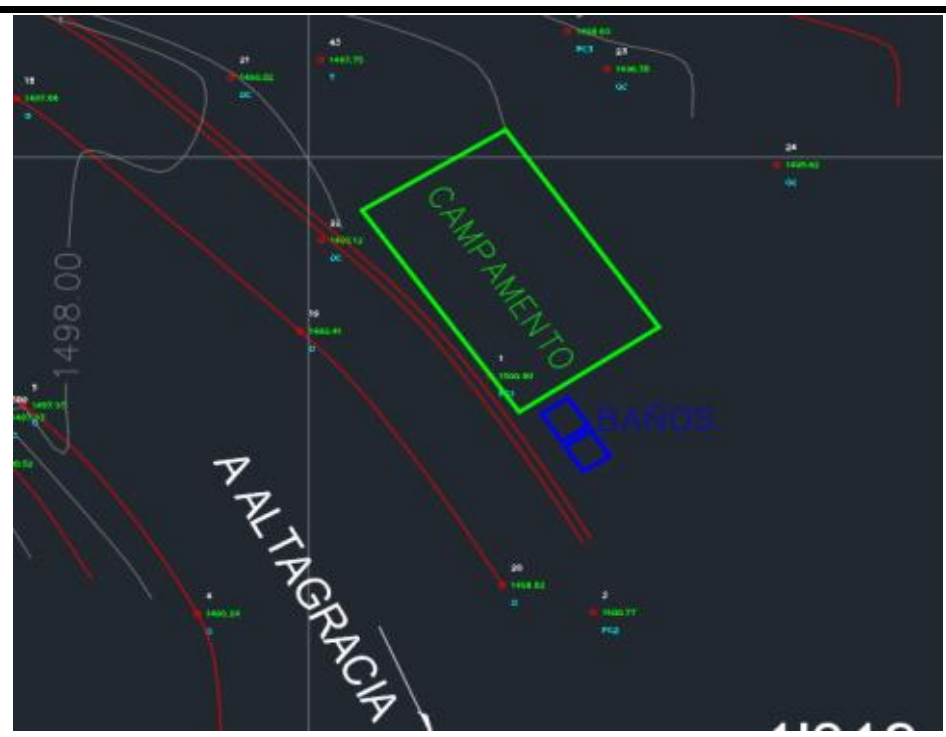

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Alquiler de baño 1	1.0				1.00	1.00
Subtotal						1.00
Vienen						
TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	7.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	1.00	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**8.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**		**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD6	**ACTIVIDAD**	Rocería + limpieza cuneta vía	**Un**	m	**UBICACIÓN**	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



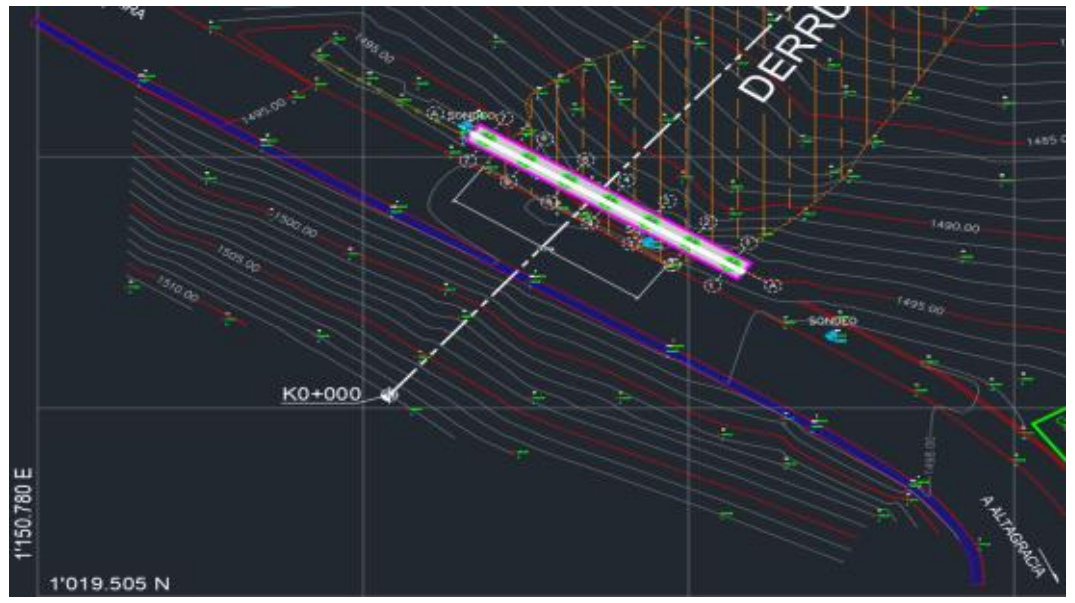

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Rocería y Limpieza 20 noviembre		150.00			150.00	150.00
Rocería y Limpieza 01 diciembre		150.00			150.00	300.00
Rocería y Limpieza 15 diciembre		150.00			150.00	450.00
Subtotal						450.00
Vienen						
TOTAL						**450.00**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	1200.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	450.00	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**1650.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	


FECHA	DD	19	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD7	ACTIVIDAD	Transporte de material granular/piedra	Un	m3 - km	UBICACIÓN	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



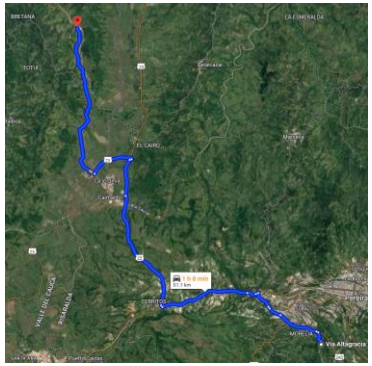

Descripción	CANT	DOSIFICACIÓN	VOLUMEN	DISTANCIA	Subtotal	TOTAL
AGREGRADO ARENA						
Cuneta en concreto de 21 Mpa	8.61	0.56	4.8216	52.40	252.65	252.65
Andén en concreto de 21 Mpa	1.50	0.56	0.84	52.40	44.02	296.67
AGREGRADO TRITURADO						296.67
Cuneta en concreto de 21 Mpa	8.61	0.84	7.2324	52.40	378.98	675.65
Andén en concreto de 21 Mpa	1.50	0.84	1.26	52.40	66.02	741.67
OTROS						741.67
Base granular tipo INVIAS	34.04	1.00	34.04	52.40	1783.70	2525.37
NOTAS:						
1. PROCEDENCIA DE AGREGRADOS: EMPRESA AGREGADOS DE OCCIDENTE. LOCALIZACION KM 1.3 VIA LA VIRGINIA-APIA						
2. DOSIFICACION SEGÚN DISEÑO DE MEZCLAS PRESENTADO ELABORADO EN OBRA						
Subtotal						2,525.37
Vienen						
TOTAL						**2,525.37**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	8514.80	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	2525.37	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM
	ACTA 4	0.00			11040.17

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD9	ACTIVIDAD	AFIRMADO AZUL COMBIA SU+TR+RI+COMP MAN	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



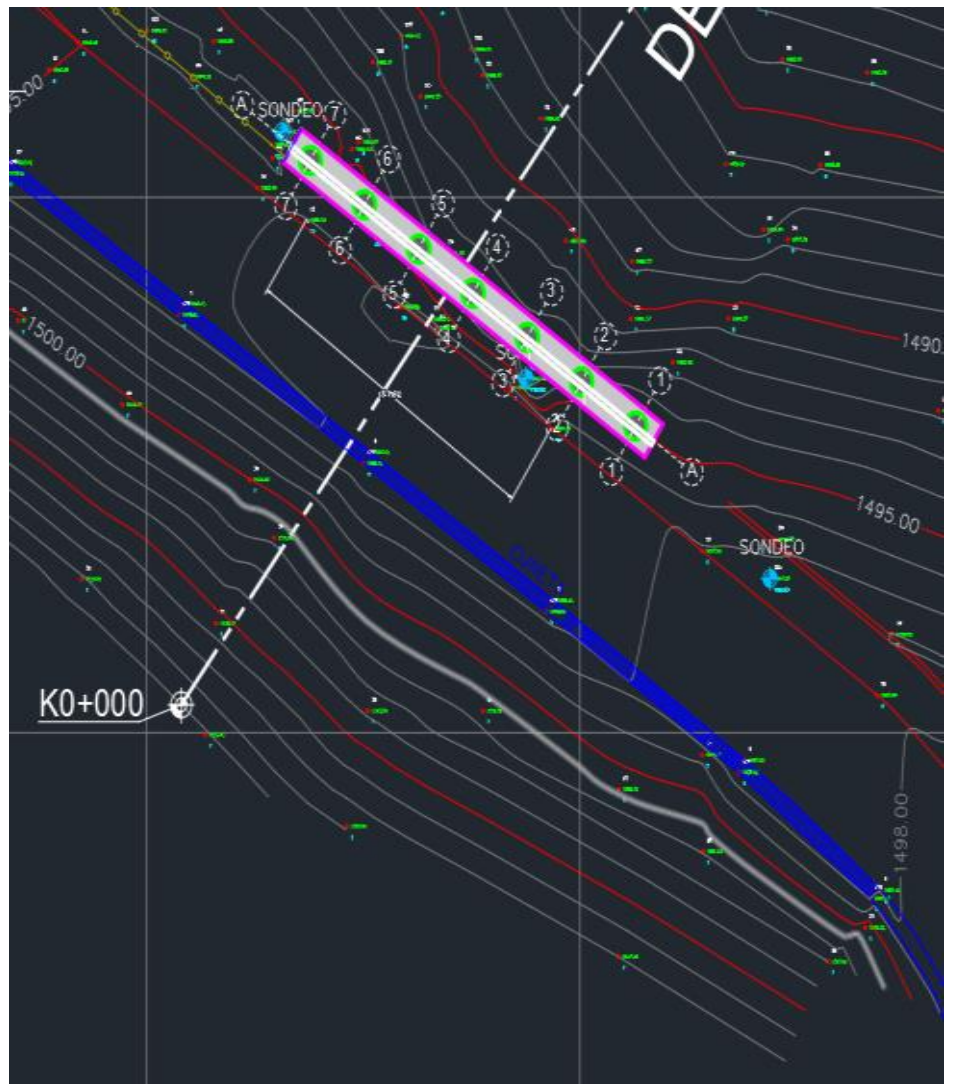

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Afirmado para lleno de cuneta	1.0	123.00	0.70	0.20	17.22	17.22
Subtotal						17.22
Vienen						
TOTAL						**17.22**

OBSERVACIONES:				
ACTA 1	212.00	ACTA5	0.00	
ACTA 2	17.22	ACTA6	0.00	
ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM
ACTA 4	0.00			229.22

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Claudia Milena Marin G.

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 | Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN	AV SUR 42 - 10 OFI. 2	FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD11	ACTIVIDAD	Cargue Manual+Retiro+Mat Sobrante Inluye El Deposito (Cargue Y Retiro A Escombrera Oficial O Autorizada) Incluye derecho de disposición	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



Descripción	CANT	Expansión	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Viene del item "Exc config talud tierra man"	18.90	1.30			24.57	24.57
Viene del item "Demolición de cuneta existente"	3.78	1.30			4.91	29.48
Subtotal						29.48
Vienen						
TOTAL						**29.48**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	551.09	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	29.48	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**580.57**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

ALCALDIA DE PEREIRA

Versión: 01 | Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORO	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	C.C.:	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD13	ACTIVIDAD	Concreto Simple 20.7 Mpa (para empotrar guaduas de trincho). Trasciego > 10m. (m3)	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



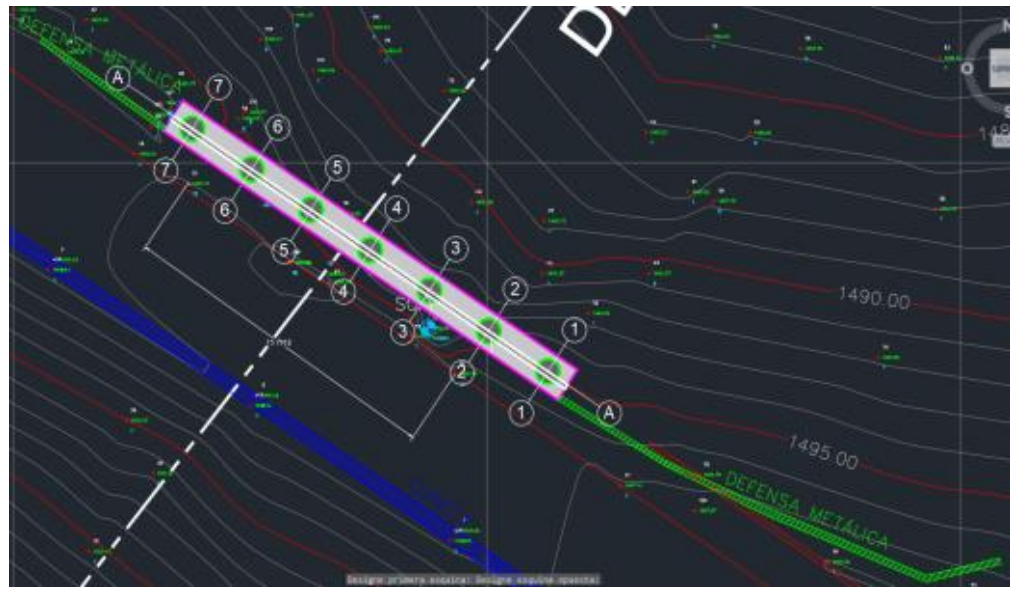

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Concreto para empotrar parales de defensa metálica	8.0	0.30	0.30	1.00	0.72	0.72
Subtotal						0.72
Vienen						
TOTAL						0.72

OBSERVACIONES:				
	ACTA 1	29.34	ACTA5	0.00
	ACTA 2	0.72	ACTA6	0.00
	ACTA 3	0.00	ACUMULADO PREACTA	
	ACTA 4	0.00	**30.06**	

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

ALCALDIA DE PEREIRA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD16	**ACTIVIDAD**	Demol concreto simple manual	**Un**	m3	**UBICACIÓN**	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA



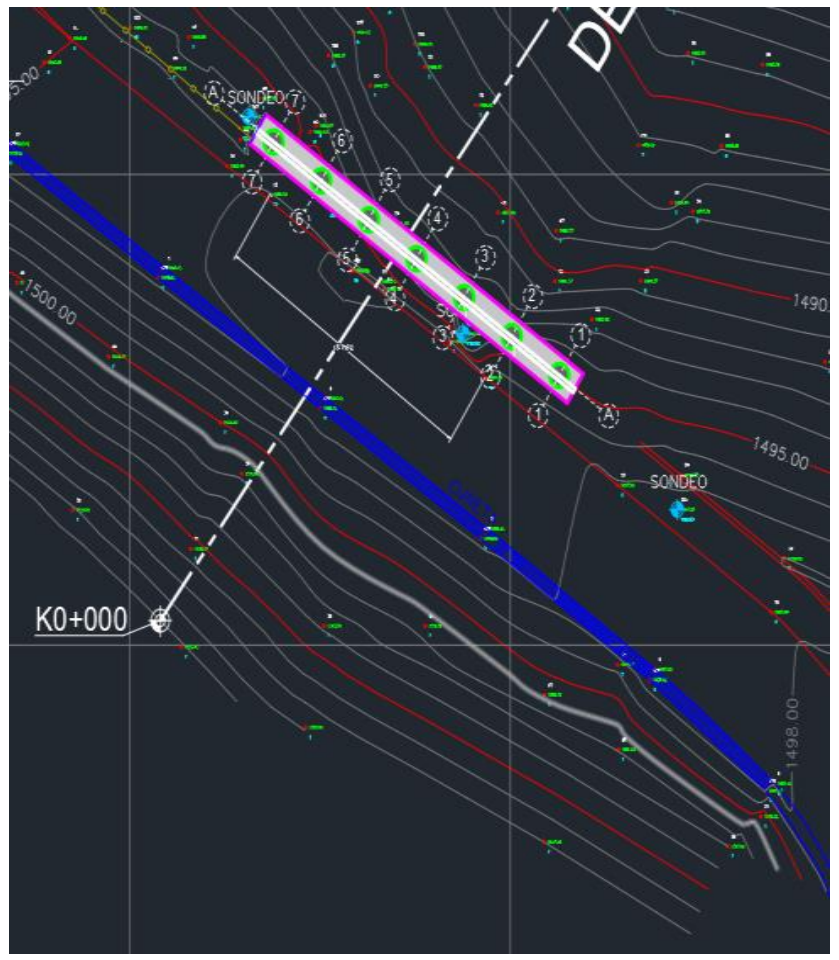

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Demolición cuneta existente	1.0	63	0.60	0.10	3.78	3.78
Subtotal						3.78
Vienen						
TOTAL						**3.78**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	3.78	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**3.78**

g. Libardo Andrés Tabares Doronso — Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD20	**ACTIVIDAD**	Defensa metálica tipo pingüino	**Un**	m	**UBICACIÓN**	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



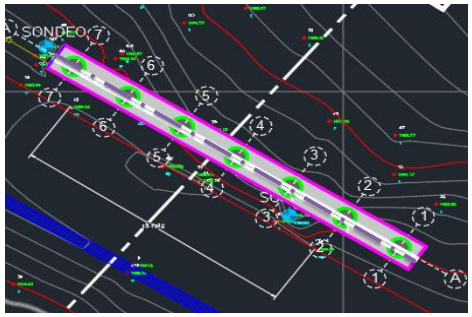

Descripción	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**TOTAL**
Baranda metálica tipo pingüino	1.00	20.00			20.00	20.00
Subtotal						20.00
Vienen						
TOTAL						**20.00**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	20.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	0.00	**ACTA6**	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**20.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**


CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD21	ACTIVIDAD	Muro Afirmado Armado +Refuerzo Geotextil H<3.01M (m3)	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION





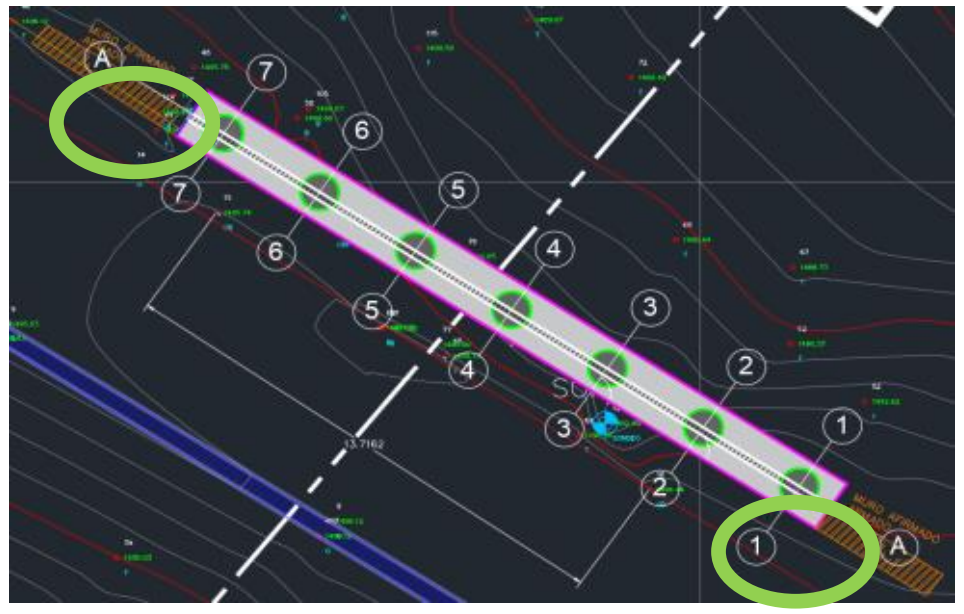

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
CIERRE DE TALUD CON MURO DE CONTENCION 1	1.00	2.20	1.20	3.50	9.24	9.24
CIERRE DE TALUD CON MURO DE CONTENCION 2	1.00	2.50	1.20	3.50	10.50	19.74
Subtotal						19.74
Vienen						
TOTAL						**19.74**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	19.74	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM
	ACTA 4	0.00			**19.74**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD22	**ACTIVIDAD**	Anden C 20.7 Mpa E=.10M (m2)	**Un**	m2	**UBICACIÓN**	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION





Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Andén en concreto	1.00	20.00	0.75		15.00	15.00
Subtotal						15.00
Vienen						
TOTAL						**15.00**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	15.00	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**15.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS DOBLES EN CONTRATO, PAGO POR MENOR VALOR**	**ITEM**	12.004	**ACTIVIDAD**	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ	**Un**	m3	**UBICACIÓN**	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION



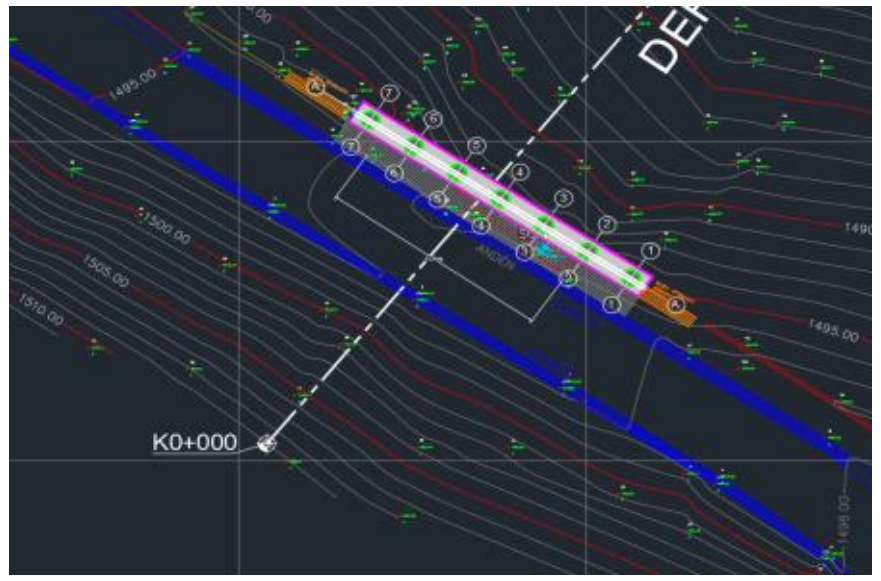

Descripción	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**TOTAL**
Cuneta lado muro	1.0	60.00	0.70	0.10	4.20	4.20
Cuneta lado talud	1.0	63.00	0.70	0.10	4.41	8.61
Subtotal						8.61
Vienen						
TOTAL						**8.61**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	8.61	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**8.61**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Claudia Milena Marin G.

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024


CAPÍTULO	**PAGO POR MENORES PRECIOS CONTRACTUALES**	**ITEM**	4.013	**ACTIVIDAD**	Señal preventiva reflectiva L=0.9 m	**Un**	Un	**UBICACIÓN**	VÍA PEREIRA - ALTAGRACIA

ILUSTRACION





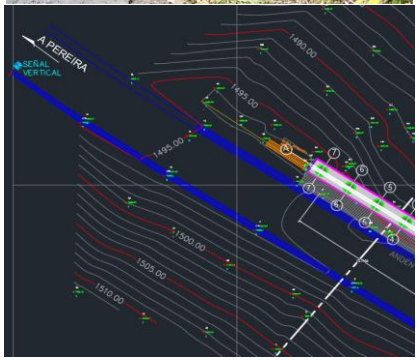

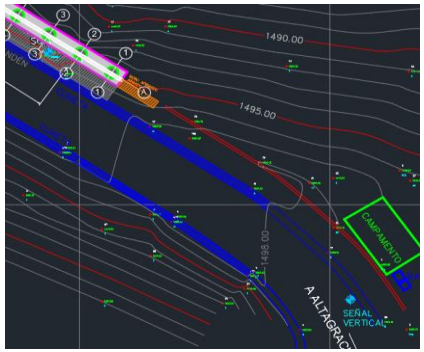

Descripción	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**TOTAL**
Señales verticales	2.0				2.00	2.00
Subtotal						2.00
Vienen						
TOTAL						**2.00**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	2.00	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**2.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	


FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	MOVIMIENTO DE TIERRA	ITEM	2.070	ACTIVIDAD	Excavación manual en tierra de 0 a 2 m	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION

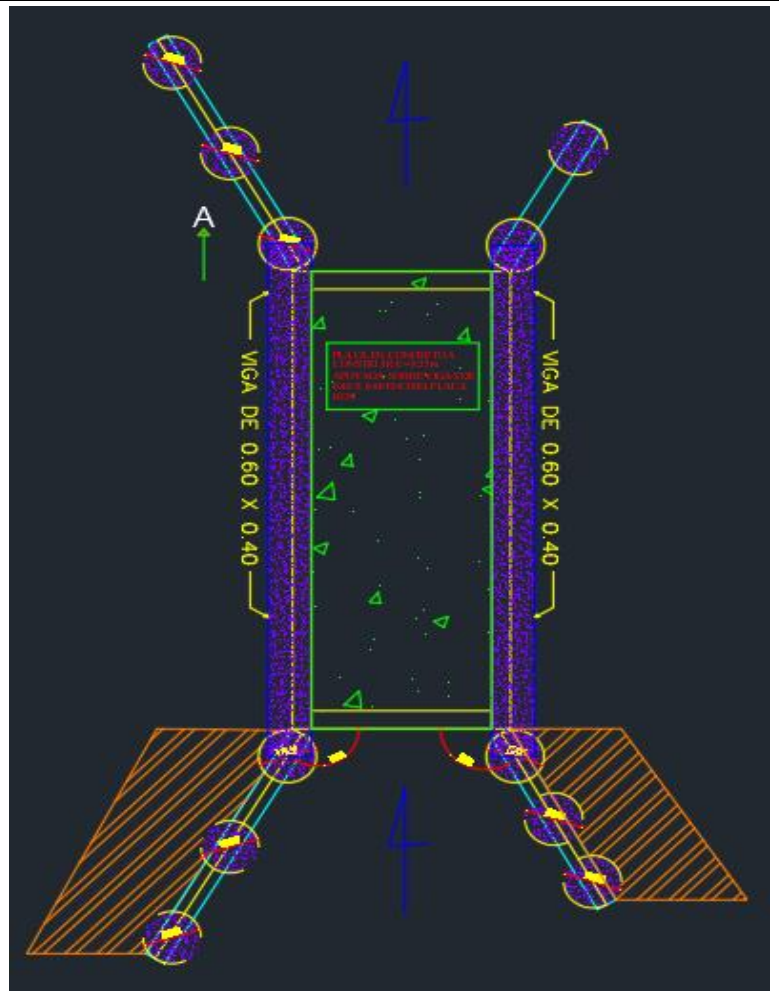



Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
MUROS DESCOLE MUNDO NUEVO	1.0	4.20	1.45	1.80	10.96	10.96
MUROS DESCOLE CHOCHO	1.0	4.00	1.40	1.90	10.64	21.60
Subtotal						21.60
Vienen						
TOTAL						21.60

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	25.89	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	21.60	ACTA6	0.00	
	ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM
	ACTA 4	0.00			47.49

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02


DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	MOVIMIENTO DE TIERRA	ITEM	2.080	ACTIVIDAD	Transporte de material granular/piedra	Un	m3-km	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO







Descripción	CANT	Dosificación	Volumen	Distancia	Subtotal	TOTAL
AGREGRADO TRITURADO						
COLUMNA CIRCULAR C27.6 MPA SECCION G	2.41	0.67	1.61	64.30	103.52	103.52
MUROS DEL BOX	21.60	0.67	14.47	65.30	944.89	1048.41
AGREGRADO TRITURADO						
COLUMNA CIRCULAR C27.6 MPA SECCION G	2.41	0.67	1.61	64.30	103.52	1151.93
MUROS DEL BOX	21.60	0.67	14.47	65.30	944.89	2096.82
OTROS						2096.82
Filtro francés + Geotex.1600 N-T	3.36	1.00	3.36	64.30	216.05	2312.87
Zarpa conc.ciclópeo	6.30	1.00	6.30	64.30	405.09	2717.96
NOTAS:						
1. PROCEDENCIA DE AGREGRADOS: EMPRESA AGREGADOS DE OCCIDENTE. LOCALIZACION KM 1.3 VIA LA VIRGINIA-APIA						
2. DOSIFICACION SEGÚN DISEÑO DE MEZCLAS PRESENTADO ELABORADO EN OBRA						
Subtotal						2,717.96
Vienen						
TOTAL						**2,717.96**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	6147.73	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	2717.96	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**8865.69**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.	

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.”**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**CONCRETO**	**ITEM**	5.269	**ACTIVIDAD**	Conc C28 MPa estribos	**Un**	m3	**UBICACIÓN**	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



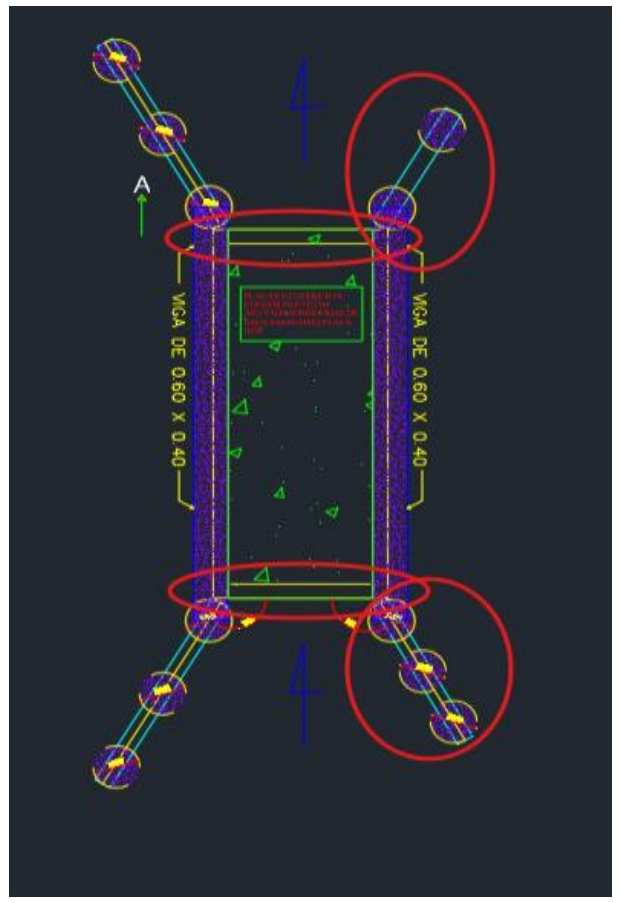

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
LADO MUNDO NUEVO						
MUROS ENCOLE LADO EL REMANSO	1.0	3.50	0.25	2.90	2.54	2.54
MUROS DESCOLE LADO EL REMANSO	1.0	4.00	0.25	2.90	2.90	5.44
GUARDARUEDA	2.0	2.5	0.25	0.70	0.88	6.32
Subtotal						6.32
Vienen						
TOTAL						**6.32**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	5.30	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	6.32	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**11.62**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	


FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PAVIMENTO	ITEM	5.026	ACTIVIDAD	Acelerante para concreto Sikaset L o similar (según diseño de mezcla)	Un	kg	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



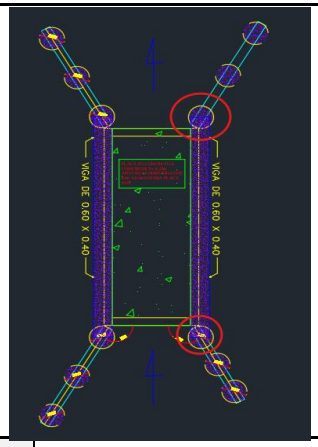

Descripción	vol	dosificacion (kg/m3)	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Placa para pavimento	3.50	14.53725			50.88	50.88
Vigas para losa de pavimento	4.13	14.53725			60.04	110.92
Guardarueda	0.88	14.53725			12.79	123.71
					Subtotal	123.71
					Vienen	
					TOTAL	123.71

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	123.71	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**123.71**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.”

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	CONCRETO	ITEM	12.060	ACTIVIDAD	Enrocado Protecc Salida Canalr R	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



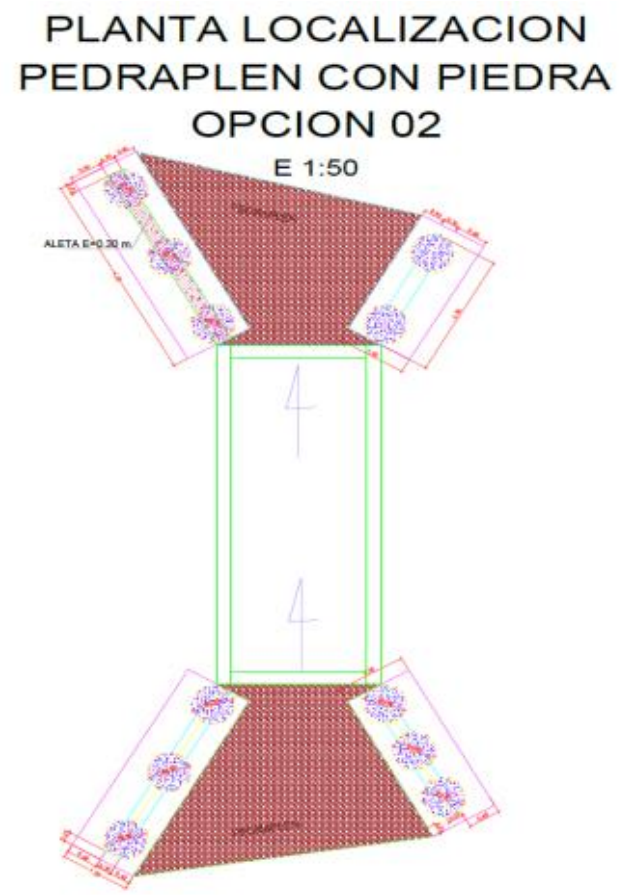

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
DESCOLE	0.5	4.75	3.50	0.30	2.49	2.49
ENCOLE	0.5	3.25	4.00	0.30	1.95	4.44
Subtotal						4.44
Vienen						
TOTAL						4.44

OBSERVACIONES:				
ACTA 1	4.44	ACTA5	0.00	
ACTA 2	4.44	ACTA6	0.00	
ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM
ACTA 4	0.00			8.88

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024


CAPÍTULO	CONCRETO	ITEM	5.014	ACTIVIDAD	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Un	kg	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION







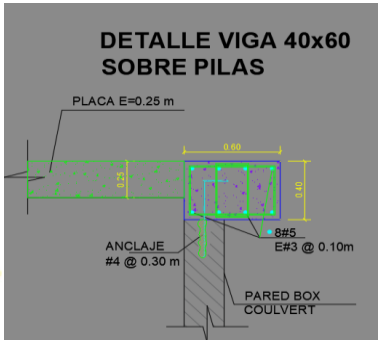

Descripción	CANT	Longitud	Varilla #	Peso / m	Subtotal	TOTAL
Acero longitudinal para vigas superiores	16.00	9.20	5	1.552	228.45	228.45
Acero transversal para vigas superiores	180.00	2.84	3	0.560	286.27	514.72
Acero transversal de losa de pavimento	72.00	3.60	5	1.552	402.28	917.00
Acero longitudinal para losa de pavimento	25.00	9.40	4	1.000	235.00	1152.00
Guarda ruedas	35.0	0.70	4	1.00	24.50	1176.50
Acero para anclajes	48.0	0.72	4	1.00	34.56	1211.06
Subtotal						1,211.06
Vienen						
TOTAL						1,211.06

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	4070.94	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	1211.06	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**5282.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2024	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.”**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**DEMARCACIÓN VIAL**	**ITEM**	4.013	**ACTIVIDAD**	Señal preventiva reflectiva L=0.9 m	**Un**	Un	**UBICACIÓN**	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION





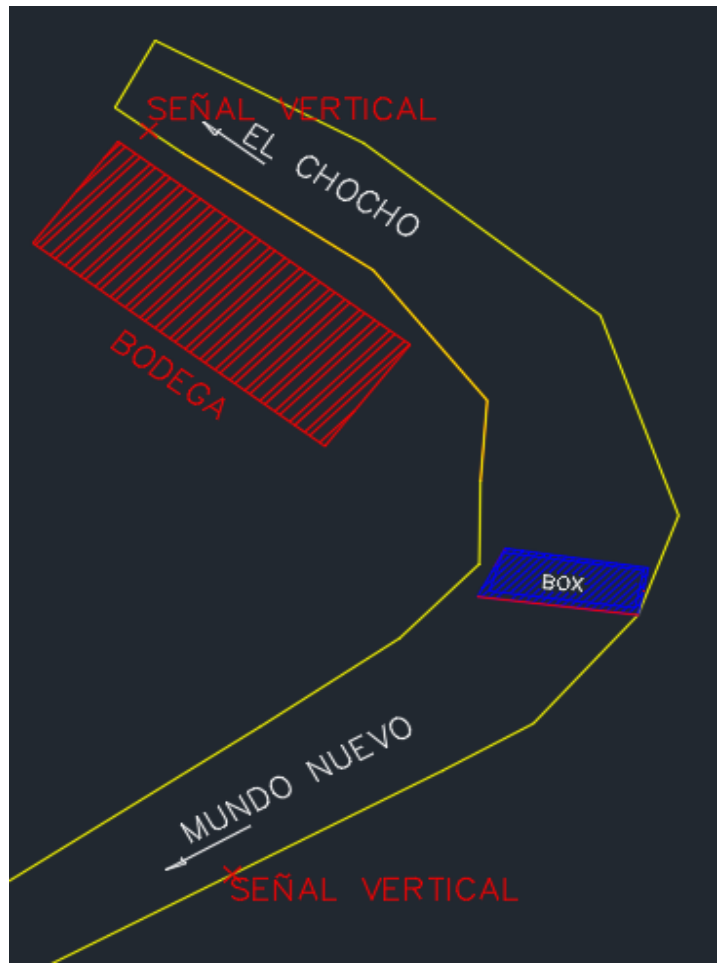

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Señal vertical reflectiva	2.0				2.00	2.00
Subtotal						2.00
Vienen						
TOTAL						**2.00**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00
	ACTA 2	2.00	**ACTA6**	**0.00**
	ACTA 3	0.00	**ACUMULADO ITEM**	
	ACTA 4	0.00	**2.00**	

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2024	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.	

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.”**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**DEMARCACIÓN VIAL**	**ITEM**	4.034	**ACTIVIDAD**	Defensa metálica	**Un**	m	**UBICACIÓN**	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



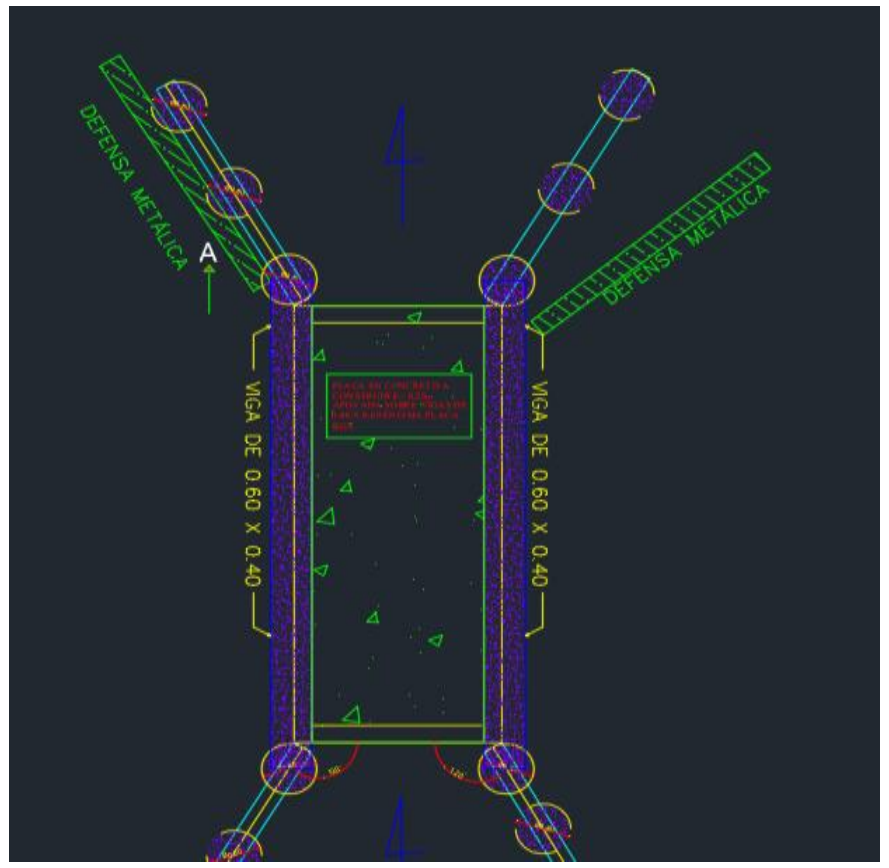

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Defensa metálica	2.0	4.00			8.00	8.00
Subtotal						8.00
Vienen						
TOTAL						**8.00**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	8.00	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**8.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD1MN	**ACTIVIDAD**	Arrendamiento Inmueble-Campamento	**Un**	m2/mes	**UBICACIÓN**	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



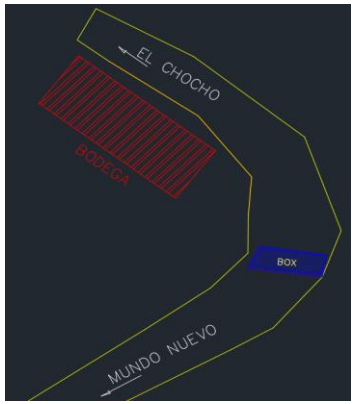

Descripción	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**TOTAL**
Arriendo 20 Nov A 20 Dic	1.0	10.00	10.00		100.00	100.00
Subtotal						100.00
Vienen						
TOTAL						**100.00**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	400.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	100.00	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**500.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	


FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD6MN	ACTIVIDAD	AFIRMADO AZUL COMBIA SU+TR+RI+COMP MAN	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION

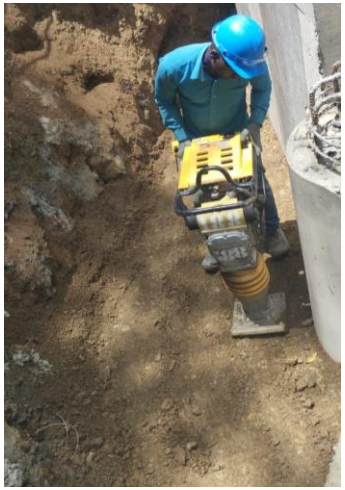

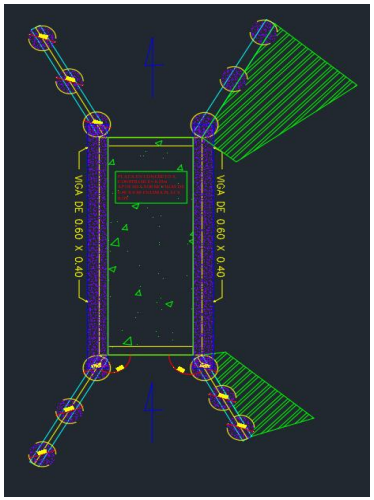

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
LLENO DESCOLE REMANSO	1	4.00	2.20	3.10	27.28	27.28
LLENO ENCOLE REMANSO	1	3.50	2.00	3.10	21.70	48.98
Subtotal						48.98
Vienen						
TOTAL						48.98

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	74.11	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	48.98	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM
	ACTA 4	0.00			123.09

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD7MN	**ACTIVIDAD**	Cargue Manual+Retiro+Mat Sobrante Inluye El Deposito (Cargue Y Retiro A Escombrera Oficial O Autorizada) Incluye derecho de disposición	**Un**	m3	**UBICACIÓN**	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO		

ILUSTRACION



Descripción	**Cant.**	**Vol.**	**Expansion**	**Alto**	**Subtotal**	**TOTAL**
Excavaciones del item 2.070MN	21.60		1.30		28.08	28.08
Demolición de roca en item AD9MN	1.70		1.30		2.21	30.29
Subtotal						30.29
Vienen						
TOTAL						**30.29**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	418.01	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	30.29	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**448.30**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	


FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD8MN	ACTIVIDAD	Conc C20.7 MPa para pilotes y caissons	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



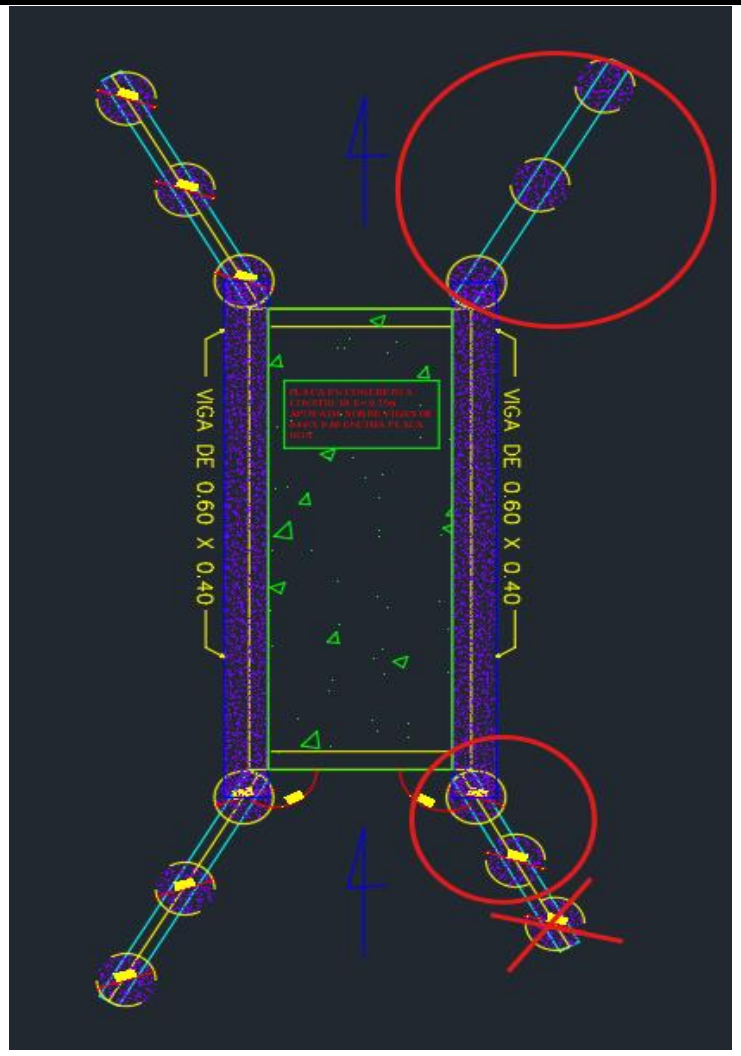

Descripción	CANT	Longitud	AREA	Alto	Subtotal	TOTAL
Concreto para pilotes de encole y descole, lado remanso	5.0	2.00	0.50		5.00	5.00
Subtotal						5.00
Vienen						
TOTAL						5.00

OBSERVACIONES:	ACTA 1	5.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	5.00	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**10.00**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	


FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.”**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD9MN	ACTIVIDAD	Excavación roca con cuña hidráulica bajo agua	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



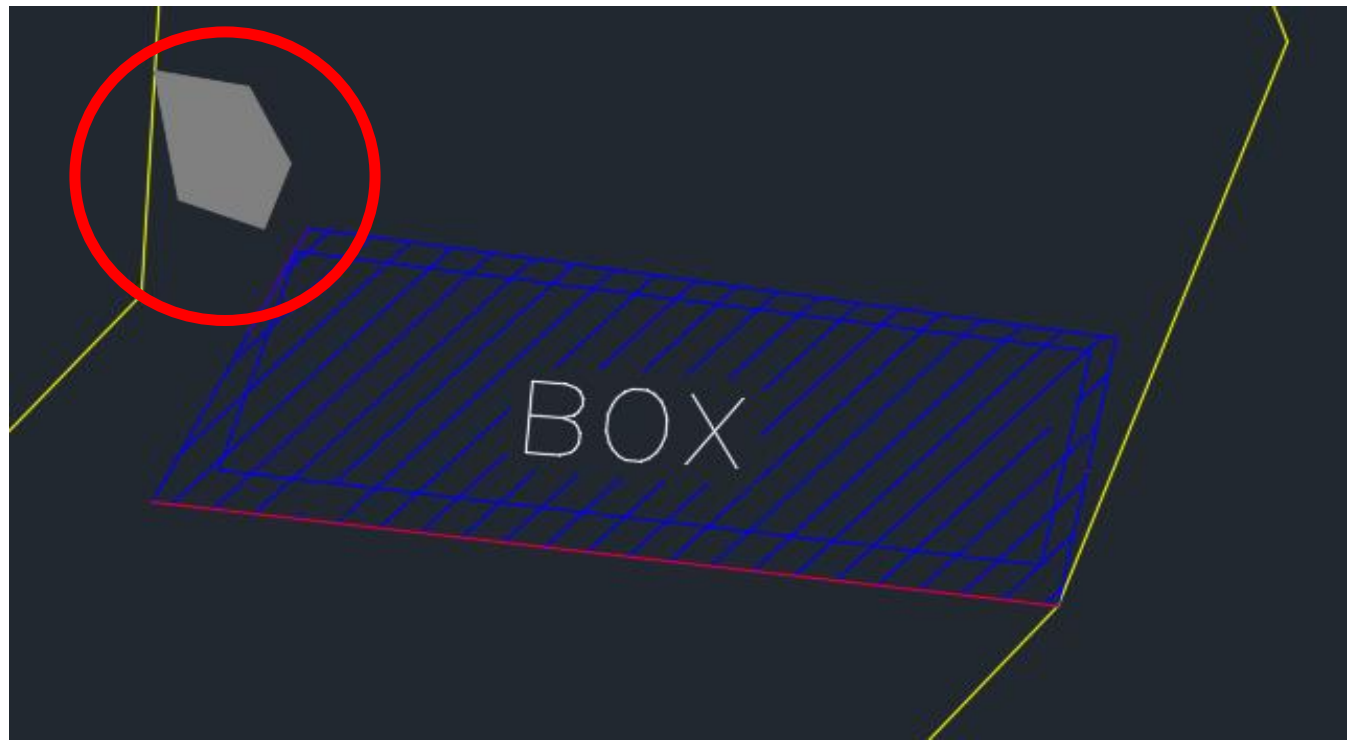

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Demolición de roca con cuña hidraulica descole	1.0	1.60	1.30	0.63	1.31	1.31
Demolición de roca con cuña hidraulica descole	1.0	0.70	0.60	0.40	0.17	1.48
Demolición de roca con cuña hidraulica descole	1.0	0.80	0.70	0.40	0.22	1.70
Subtotal						1.70
Vienen						
TOTAL						**1.70**

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	1.70	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**1.70**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD10MN	ACTIVIDAD	Viga Cimentación C27.6 Mpa Secc E (1.600Cm2<Area Secc. Transversal<=2.500Cm2)	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



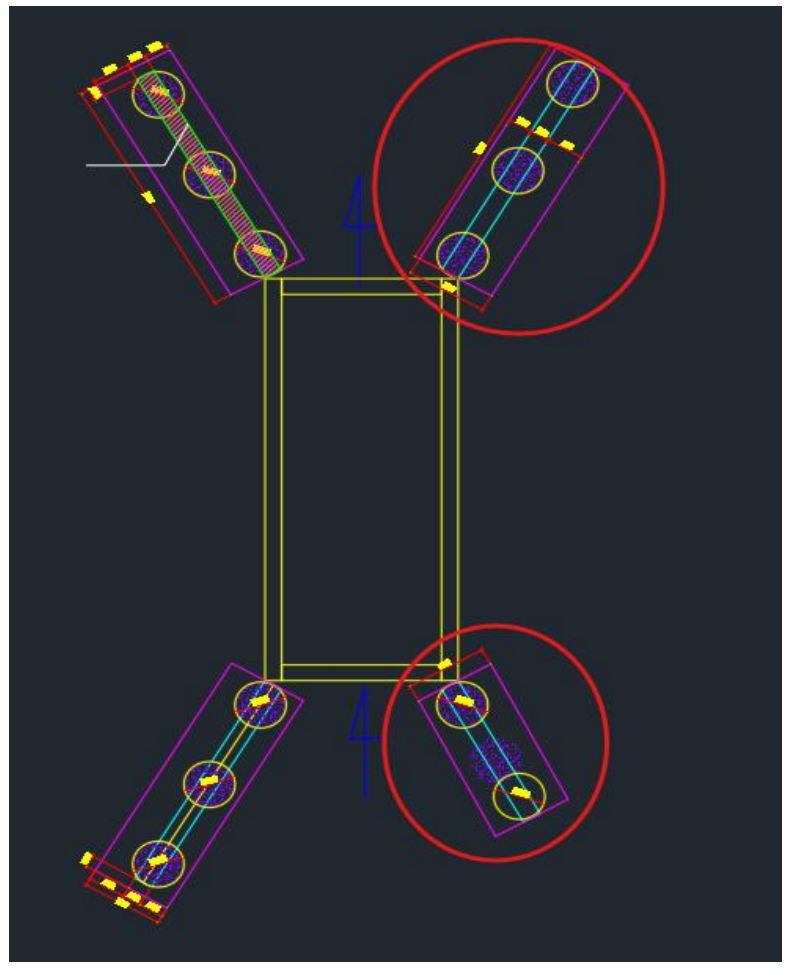

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
VIGA CIMENTACION ENCOLE REMANSO	1.0	3.50	1.30	0.40	1.82	1.82
VIGA CIMENTACION DESCOLE REMANSO	1.0	4.00	1.30	0.40	2.08	3.90
Vigas para losa de pavimento	2.0	8.60	0.6	0.40	4.13	8.03
Subtotal						8.03
Vienen						
TOTAL						8.03

OBSERVACIONES:				
ACTA 1	3.74	ACTA5	0.00	
ACTA 2	8.03	**ACTA6**	**0.00**	
ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**11.77**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2024	CORTE N°	2	ELABORÓ	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	NIT O C.C.	14,565,656	CONTRATO N°	3653-2024

CAPÍTULO	PRECIOS NO PREVISTOS	ITEM	AD11MN	ACTIVIDAD	Excavación caisson en conglomerado	Un	m3	UBICACIÓN	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION





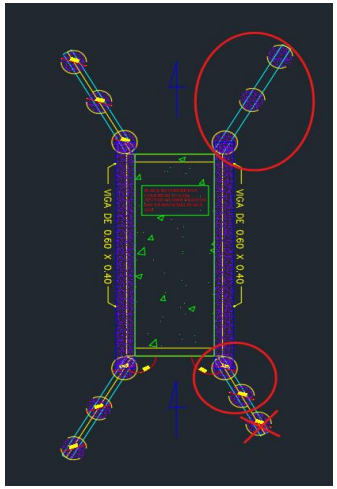

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Excavación de pilotes de muro encole (lado hacia Remanso)	3.0		0.50	2.00	3.00	3.00
Excavación de pilotes de muro descole (lado hacia Remanso)	2.0		0.50	2.00	2.00	5.00

OBSERVACIONES:							
	ACTA 1	5.00	ACTA5	0.00		Subtotal	5.00
	ACTA 2	5.00	ACTA6	0.00		Vienen	
	ACTA 3	0.00			ACUMULADO ITEM	TOTAL	5.00
	ACTA 4	0.00			10.00		

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN		**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2024	**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.


OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."**

CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD12MN	**ACTIVIDAD**	Columna circular C27.6 MPa secc G (3.600 cm2 < área secc. Transversal <=4.800 cm2)	**Un**	m3	**UBICACIÓN**	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



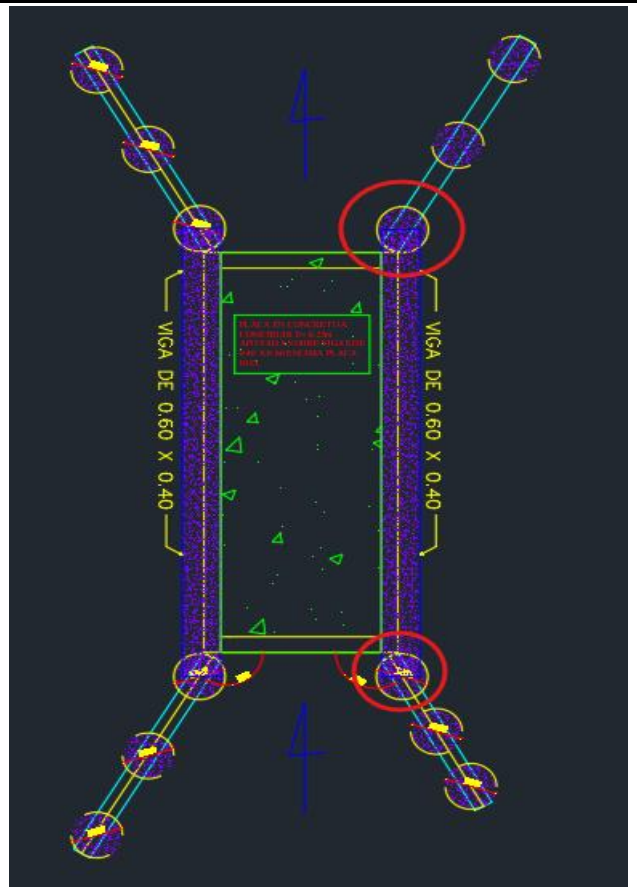

Descripción	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**TOTAL**
Columnas de encole y descole, lado Remanso	2.0	2.40	0.5027		2.41	2.41
Subtotal						2.41
Vienen						
TOTAL						**2.41**

OBSERVACIONES:				
ACTA 1	2.41	ACTA5	0.00	
ACTA 2	2.41	**ACTA6**	**0.00**	
ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**4.82**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

DIRECCIÓN	**AV SUR # 42 - 10 OFI. 2**	**FORMATO**	
PROCESO		**CÓDIGO**	
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	


FECHA	**DD**	**19**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**	**CORTE N°**	**2**		**ELABORÓ**	LIBARDO ANDRÉS TABARES D.

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024."**				
CONTRATISTA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	**NIT O C.C.**	14,565,656	**CONTRATO N°**	3653-2024

CAPÍTULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**	**ITEM**	AD13MN	**ACTIVIDAD**	Placa Maci.C27.6 Mpa E=.25M	**Un**	m2	**UBICACIÓN**	VÍA MUNDO NUEVO - EL REMANDO, SECTOR EL CHOCHO

ILUSTRACION



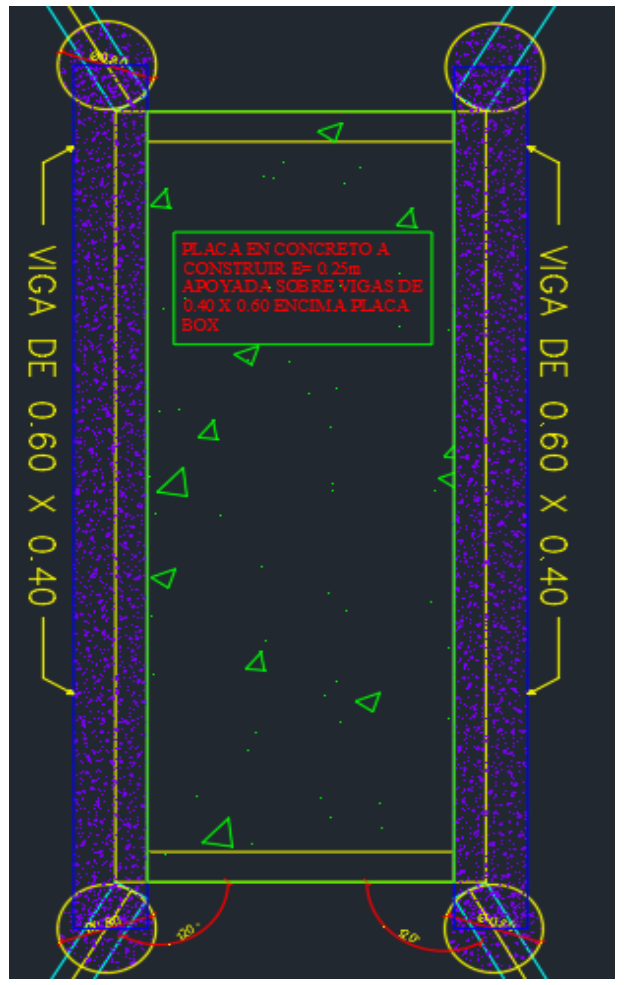

Descripción	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	TOTAL
Placa para pavimento	1.0	7.00	2.50		17.50	17.50
Subtotal						17.50
Vienen						
TOTAL						**17.50**

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	
	ACTA 2	17.50	**ACTA6**	**0.00**	
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
	ACTA 4	0.00			**17.50**

Ing. Libardo Andrés Tabares Doronsoro

Ing. Claudia Milena Marin Garcia

RASANCHEZR-02460675101433-4115557-008761216-A
