IBAGUE 23 DE JULIO 2025

Señores
AT GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Supervisora
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

CAQUETA

Referencia: Proceso de Contratación No. **039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025.**

Solicitamos respetuosamente prorrogar el contrato cuyo objeto es **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6**. Por diez (10) días hasta el 4 de agosto 2025, teniendo en cuenta que por altas lluvias presentadas desde el día 1 de julio la actividad de pintura de exteriores a presentado atrasos, pero serán superadas con este tiempo solicitado de manera satisfactoria, cumpliendo a cabalidad el 100% de actividades contractuales.

Agradecemos su atención y colaboración prestada

Cordialmente,

NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
C.C. No. 11105476751 expedida en Ibagué
NIT: 11105476751-1
Cel: 311 4695678
REPRESENTANTE LEGAL

FAC-S-2025-027375-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-027375-CE del 23 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señora
NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
Ibague Tolima

Contraseña:8v8lKG8Wzg

Asunto: RTA Solicitud prorroga CTO 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

En mi calidad de SUPERVISORA DEL CONTRATO 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, cuyo objeto es la "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6", me permito informar a la señora NEISY ELIZABETH SERNA GÓMEZ, con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO, que debido a las constantes lluvias presentadas durante la ejecución del vínculo contractual en mención, se considera viable la prorroga del mismo, teniendo en cuenta que dichas condiciones climáticas afectaron el normal desarrollo de las actividades de pintura, mantenimiento de infraestructura metálica y demás labores que deben ejecutarse a la intemperie.

Por lo anterior, el plazo de ejecución se modifica de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	25 de julio de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	04 de agosto de 2025

En consecuencia, la forma de pago quedaría de está forma:

FORMA DE PAGO ACTUAL

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN	JULIO

	CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	
SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 25 DE JULIO	SEPTIEMBRE

FORMA DE PAGO MODIFICADA

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 04 DE AGOSTO	SEPTIEMBRE

De igual manera, me permito recordar la nota aclaratoria expuesta en el "FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA":

La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del

valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2025.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. *Factura en Original por valor total del contrato.*
2. *Planilla de los Pagos Parafiscales.*
3. *Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.*
4. *Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.*
5. *Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.*
6. *Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.*

Finalmente, es de destacar que, lo anterior queda sujeto a aprobación del señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-6 y Ordenador del Gasto.

Aerotécnico SANDRA MILENA GONZALEZ PAREDES
Técnico Mantenimiento Instalaciones

ST. LOZANO / DECOP

Elaboró: AT. GONZALEZ / MANIN Revisó: AT. GONZALEZ / MANIN Aprobó:AT. GONZALEZ / MANIN

FAC-S-2025-142602-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-142602-CI del 24 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor
Tres Esquinas, Solano - Caquetá

Asunto: Concepto viabilidad y solicitud autorización prorroga contrato 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

En mi calidad de supervisora del contrato 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, cuyo objeto es "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6", respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-6, Ordenador de Gasto, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la modificación (prorroga) del contrato en mención en los siguientes términos y según los documentos anexos:

- El plazo de ejecución se encuentra vigente.
- No altera la ejecución ni las condiciones que originaron la selección objetiva de la propuesta.
- La señora NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO mediante oficio allegado el día 23 de julio, solicita la prorroga del contrato en mención teniendo en cuenta las condiciones climaticas durante la ejecución del mismo, ya que han afectado el normal desarrollo de las actividades que tienen lugar al aire libre.
- El COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 mediante oficio No FAC-S-2025-027375-CE del 23 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN manifiesta la viabilidad de la prorroga teniendo en cuenta las consideraciones expuestas a la supervisión.
- El plazo de ejecución se prorroga de acuerdo a lo siguiente:

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	25 de julio de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	04 de agosto de 2025

- En consencuencia, la forma de pago se modifica de acuerdo a lo siguiente:

FORMA DE PAGO ACTUAL

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 25 DE JULIO	SEPTIEMBRE

FORMA DE PAGO MODIFICADA

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 04 DE AGOSTO	SEPTIEMBRE

- El contrato es un vínculo el cual busca la satisfacción de la necesidad planteada en el estudio previo.

Aerotécnico SANDRA MILENA GONZALEZ PAREDES
Técnico Mantenimiento Instalaciones

Anexo: documentos anexos
ST. LOZANO / DECOP

Elaboró: AT. GONZALEZ / MANIN Revisó: AT. GONZALEZ / MANIN Aprobó:AT. GONZALEZ / MANIN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Tres Esquinas, Caquetá 25 de julio de 2025

Señor Coronel
KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 6

Asunto: Viabilidad jurídica para modificación del contrato 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

En referencia al contrato en asunto cuyo objeto es la “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6.", me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM 6, que una vez analizada la información de la modificación del contrato (Prorroga y forma de pago), ésta se considera viable, teniendo en cuenta que:

- El contrato se encuentra con plazo de ejecución se encuentra hasta el 25 de julio de 2025.

- Que mediante oficio S/N de fecha 23 de julio de 2025 la Señora NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ, Representante Legal de CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO solicitó:

  (…) “Solicitamos respetuosamente prorrogar el contrato cuyo objeto es ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6. Por diez(10) días hasta el 4 de agosto 2025, teniendo en cuenta que por altas lluvias presentadas desde el día 1 de julio la actividad de pintura de exteriores a presentado atrasos, pero serán superadas con este tiempo solicitado de manera satisfactoria, cumpliendo a cabalidad el 100% de actividades contractuales..” (…)

- Que mediante oficio No. FAC-S-2025-027375-CE de fecha 23 de julio de 2025, la Supervisora del contrato informó al contratista que dicha solicitud implicaría la modificación de la forma de pago y que sería solicitada al ordenador del gasto para su aprobación, en dicho oficio la supervisora del contrato emite concepto de viabilidad a la solicitud del contratista así:


  (…) “se considera viable la prorroga del mismo, teniendo en cuenta que dichas condiciones climáticas afectaron el normal desarrollo de las actividades de pintura, mantenimiento de infraestructura metálica y demás labores que deben ejecutarse a la intemperie.” (…)

- Que mediante oficio No. FAC-S-2025-142602-CI de fecha 24 de julio de 2025, el supervisor del contrato solicita al ordenador del gasto la solicitud de modificación del plazo de ejecución hasta el 04 de agosto de 2025 y forma de pago así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 04 DE AGOSTO	SEPTIEMBRE


- Que se adjunta el cronograma de obra de acuerdo a la solicitud del contratista con plazo de ejecución a 04 de agosto de 2025.

Que, de acuerdo a documentos adjuntos, se emite viabilidad jurídica una vez cumplidos los requisitos establecidos en el numeral 6.3.2.1 Modificación del contrato de la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 Modificada por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023 “Manual de Contratación y Convenios” del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidad Ejecutoras.




CTO. DANIELA LIZETH ROJAS TORRES
Asesora Jurídica DECOP- CACOM 6

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO,FILOS Y DILATACIONES)	2 días	sáb 26/07/25	lun 28/07/25
2			ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS			
3			ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	2 días	vie 1/08/25	lun 4/08/25
4			RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNID	2 días	vie 29/08/25	lun 1/09/25
5			AUMENTO AL VALOR DEL BIEN			
6			PUNTO SANITARIO Ø 4 , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	2 días	vie 30/05/25	sáb 31/05/25
7			PUNTO SANITARIO Ø 2 , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	1 día	mar 29/07/25	mar 29/07/25

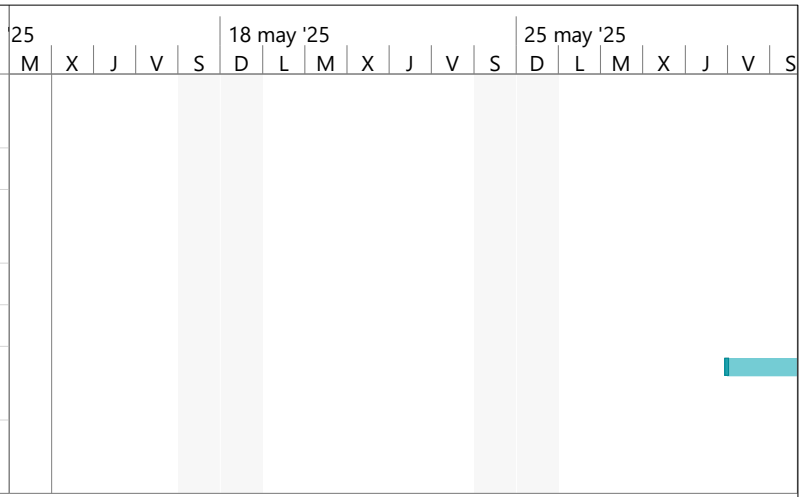


Proyecto: Proyect caqueta
Fecha: vie 25/07/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

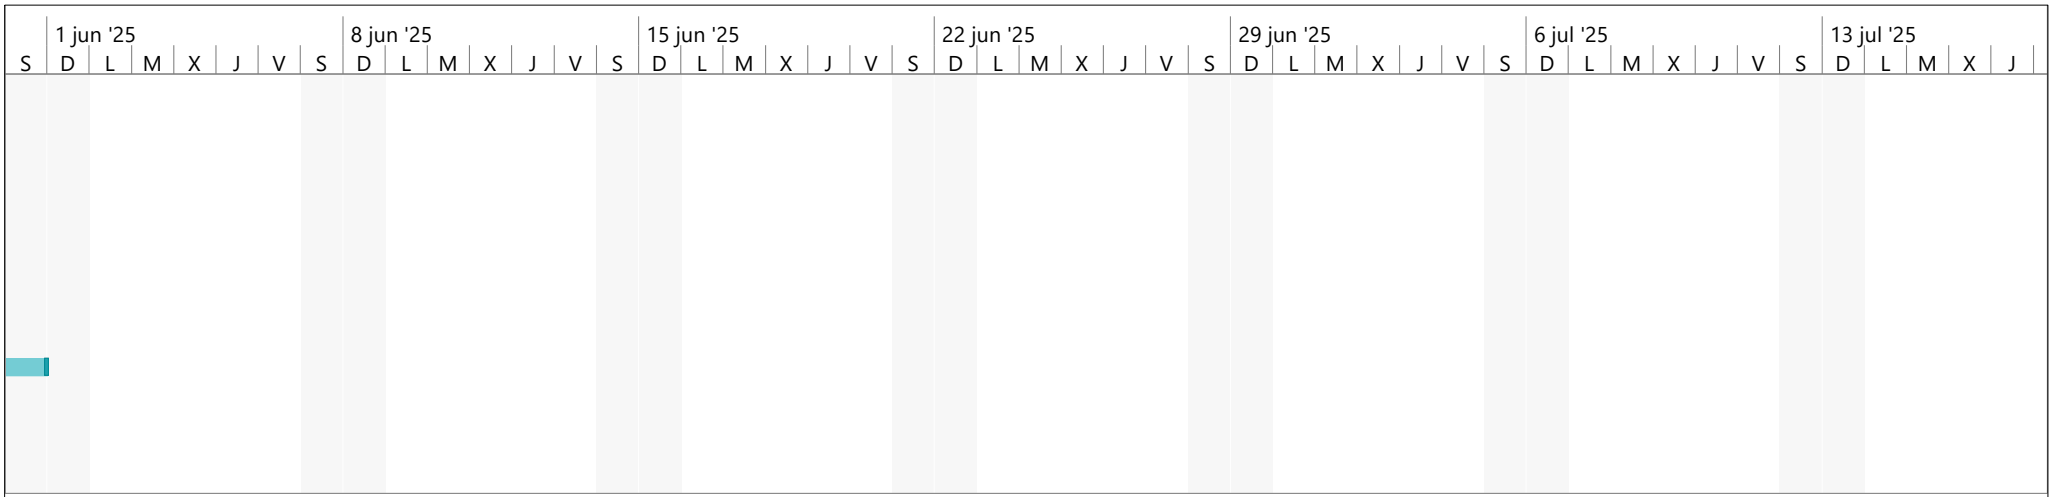

Proyecto: Proyect caqueta
Fecha: vie 25/07/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

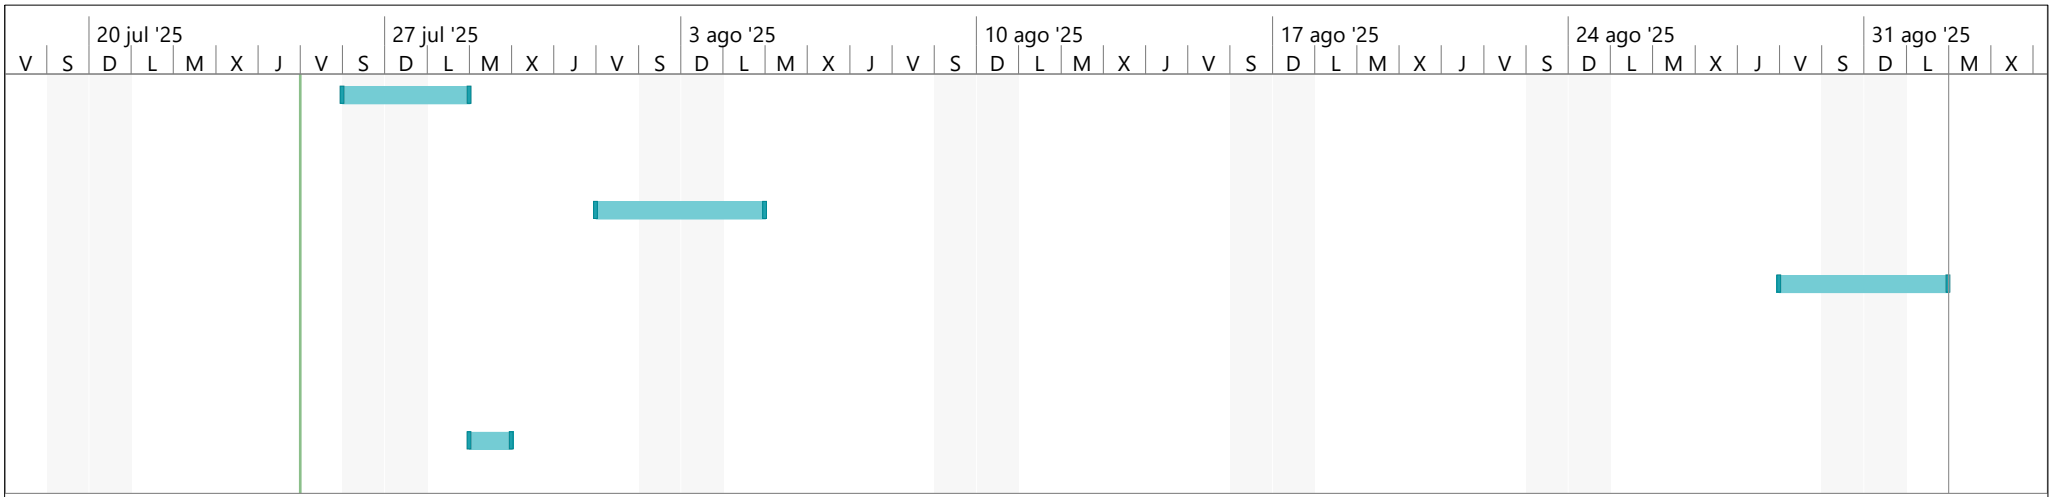

Proyecto: Proyect caqueta
Fecha: vie 25/07/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	24/07/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/07/2025	**AL:**	23/07/2025
CONTRATO Nº	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025	**CONTRATISTA**	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ		
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6				
FECHA DE INICIO	26/05/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/06/2025		

VALOR INICIAL	$ 57.375.000,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 28.687.500,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 86.062.500,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 09 DE MAYO DE 2025, CON ACTA DE INICIO DESDE EL DÍA 26 DE MAYO DE 2025 Y CON PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2025, CON POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO No. 25-40-101053655 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A VIGENTE DESDE 09 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 Y POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101202403 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A VIGENTE DESDE 08 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2025 (Fecha aprobación SECOP)
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6
FORMA DE PAGO	Se añade TERCER PAGO, con valor de PAGO DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 25 DE JULIO y PAC SEPTIEMBRE, manteniendo las demás condiciones establecidas para la forma de pago en el "FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA" de este vínculo contractual.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	25 de Julio de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 86.062.500,00
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		**Materiales en Obra**		**Equipos en Obra**		**Personal en obra**		**Dedicacion contractual**	**Dedicacion ejecutada**	**Cumplio/ No cumplio**	**Observaciones**
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
						GESTOR SISO	1	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	2				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	64,93%			
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (01/07/2025 AL 07/07/2025)	2,59%	**85,56%**	**97,22%**	**-11,66%**
Semana 2 (08/07/2025 AL 14/07/2025)	4,31%			
Semana 3 (15/07/2025 AL 21/07/2025)	12,90%			
Semana 4 (22/07/2025 AL 23/07/2025)	0,83%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO





GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. ACABADOS EN PISO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**78,60%**
3. ACABADOS EN MUROS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ESTRUCTURA METÁLICA	PROGRAMADO		**100,00%**
			100,00%
5. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		**83,52%**
	EJECUTADO		**62,57%**
ÍTEM NO PREVISTOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**7,39%**

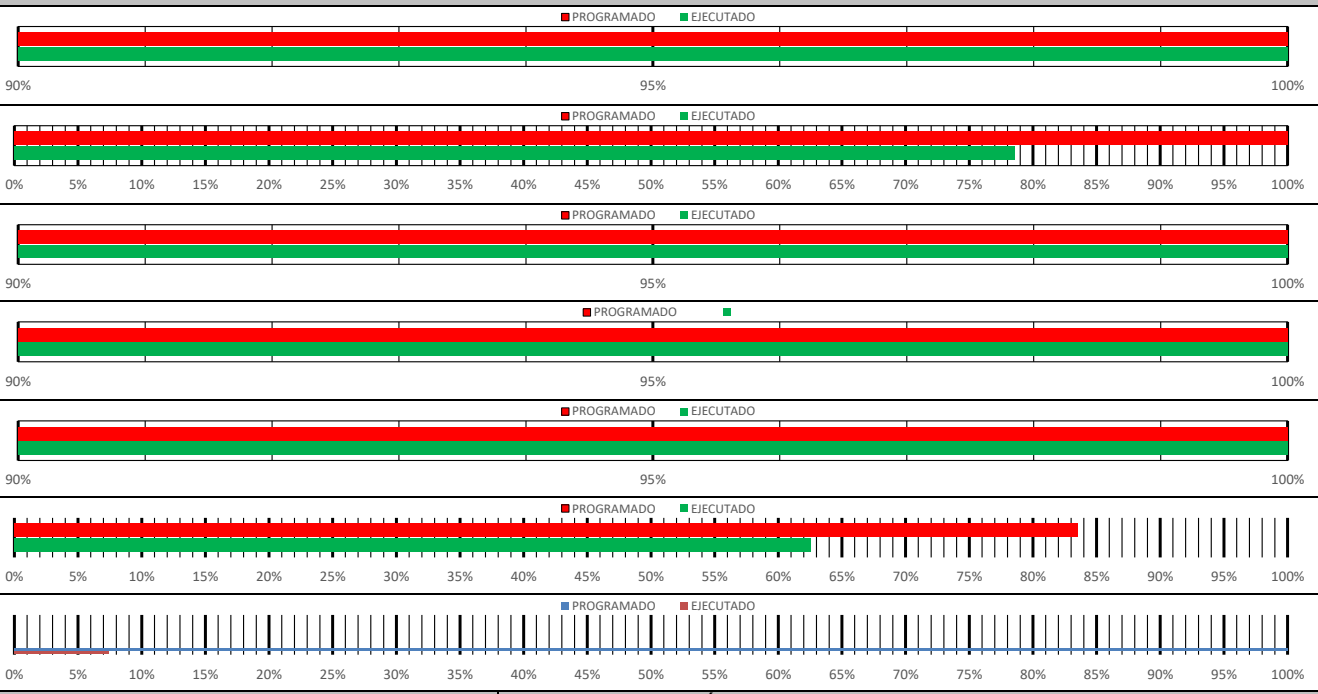

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	61	59	2

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS					
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?				
DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE INFORME SE DESARROLLARON ACTIVIDADES COMO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y SE EJECUTARON CANTIDADES QUE CORRESPONDEN A LA ADICIÓN REALIZA A ESTE VÍNCULO CONTRACTUAL, TALES COMO LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE E INSTALACIÓN DE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERAMICA, RESTANDO LA MAYORIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO DE ÍTEMS NO PREVISTOS DEBIDO AL ATRASO POR LAS CONSTANTES LLUVIAS	ÍTEMS NO PREVISTOS	SI		NO	X
	N/A	SI		NO	
	N/A	SI		NO	
	N/A	SI		NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 57.375.000,00	$ 57.375.000,00	$ 73.633.204,75	85,56%	$ 12.429.295,25	14,44%
Adiciones	N/A	$ 28.687.500,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 57.375.000,00	$ 86.062.500,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 57.375.000,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 28.687.500,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 86.062.500,00	
ANTICIPO	N/A	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
ACTAS DE VECINDAD	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SI		SI	SI	SI	SE ANEXAN SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha no se tienen observaciones y/o recomendaciones para el contratista.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas): Se presentaron lluvias constantes en la región, lo cual afecto una de las actividades que se desarrollan en la intemperie.

ELABORO:	**REVISO:**
AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA Firma y Posfirma	**AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA** Firma y Posfirma

E

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

			
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE**	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE**	**INSTALACIÓN DE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERAMICA**
			
INSTALACIÓN DE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERAMICA	**INSTALACIÓN DE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERAMICA**		
