TABLA DE CONTENIDO

Informe de calidad No. 6	420
Anexo A. Actividades del periodo	442
Anexo B. Control de actividades	449
a. Actas de entrega Parques	449
a.a. Puesta en servicio Carmelo F5 - F11	450
a.b. Puesta en servicio Florencia Tronquitos	459
a.c. Puesta en servicio La Europa	464
a.d. Puesta en servicio Marsella Sintética	469
a.e. Puesta en servicio Normandía	474
a.f. Puesta en servicio San Andrés F11 – F8	479
a.g. Puesta en servicio Tibabuyes	488
a.h. Puesta en servicio Villas del Madrigal	493
b. Ingreso de materiales	498
c. Instalaciones	503
Anexo C. Actas de comité	534
Anexo D. Control de documentos	542
a. Balance	543
b. Programación de obra	607
c. Listado maestro de documentos	625
Anexo E. Compras	628
a. Américas Occidental	630
b. Carvajal	633
c. Gorgonzola	636
d. Hayuelos	639
e. Jazmín	642
f. Lombardía	646
g. Milenta Tejar	649
h. Nuevo Muzu	652
i. Recreo	655
j. Pradera Sur	658
k. Santa Isable I - II	661
l. Villa de Los Sauces	664
m. Villa Rica	667
n. Campos naturales	670
Anexo F. Certificados de calidad	673
a. Alquería	674
b. Cafam Los Gavilanes	675
c. Carmelo	678
d. La Europa	693
e. Gaitana	715
f. Hayuelos	715
g. Lombardia	736
h. Marsella	753
i. Normandía	775
j. Pijaos	795
k. Florencia Tronquitos	818
l. Villa de Los Sauces	840
m. Villas del Madrigal	848
n. Campos naturales	878
o. Control de materiales con certificados de conformidad	881
Anexo G. Inspección y ensayos	883
Anexo H. Medición	897
Anexo I. Salidas no conformes	917
Anexo J. Auditoria	994

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.06.19 15:22:44 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

1. INFORME COMPONENTE DE CALIDAD No. 6 – ABRIL 2025

INFORME DE CALIDAD Nro. 6

CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

OBRA PUBLICA 4041 DE 2024 CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD DE BOGOTA

Bogotá D.C., mayo de 2025

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ:
Fecha: 9/06/2025	Fecha: 10/06/2025	Fecha: 10/06/2025
Nombre: Ing. John Jairo Marín López Ing. QA-QC	Nombre: Ing. Brayan Stivens García Ing. Residente.	Nombre: Ing. Javier Linares Director de Obra

421

VERSIÓN NO.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	9/05/2025	Se elabora el Documento
2	21/05/2025	Ajustes al documento con base a observaciones de la interventoría.
3	9/06/2025	Ajustes al documento con base a observaciones de la interventoría.

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 5
2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 5
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO 6
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 7
5. Seguimiento al cumplimiento de plan de calidad 8
5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto 8
6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 8
6.1 Actas de Comité 8
6.2 Correspondencia 9
Correspondencia enviada 9
6.3 Correspondencia recibida 11
6.4 Bitácora. 11
7. Seguimiento de la información documentada 12
8. PLAN DE ADQUISICIONES 12
9. INFRAESRUCTURA Y PRESERVACION 14
10. Control de calidad de materiales 15
10.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor 15
10.2 Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto 17
11. Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo 18
12. CONTROL DE LA GESTION 19
12.1 Control de Cambios 19
12.2 Salidas no conformes 20
Para el presente informe registra 1 salida no conforme, producto de la auditoría realizada en el periodo en el anexo J. 20
13. Auditorías internas 20
14. Listado de Anexos 21

LISTADO DE TABLAS

Tabla Nro. 1 Estado del contrato 5
Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo 6
Tabla Nro. 3 Personal del contrato 7
Tabla Nro. 4 Correspondencia enviada 9
Tabla Nro. 5 Correspondencia recibida 11
Tabla Nro. 6 Tabla de adquisiciones 12
Tabla Nro. 7 Materiales certificados por proveedor 16
Tabla Nro. 8 Materiales controlados por inspección y ensayos 17
Tabla Nro.9 Equipos de medición utilizados en la ejecución del contrato 19
Tabla Nro.10 Consolidado de control de cambios 19
Tabla Nro. 11 Consolidado de salidas no conformes 20
Tabla Nro. 12 Consolidado de Auditorías realizadas 21

ILUSTRACIONES

Ilustración 1.Pegue de Grama – Américas Occidental 14
Ilustración 2. Cepillado – Domingo Lain 14
Ilustración 3. Poda estadio Alquería 14
Ilustración 4. Demarcación – florida 14
Ilustración 5. Chicalá TOP DRESSING 15
Ilustración 6. Chicalá Des compactación 15
Ilustración 7. Juan Amarillo / fumigación CARRETON 15
Ilustración 8. UDS - Bordeo 15

424

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

El contrato formalizado con el Instituto Distrital De Recreación y Deporte corresponde a la siguiente información:

Tabla Nro. 1 Estado del contrato

CONTRATO DE OBRA IDRD No.	*4041 - 2024*
CONTRATISTA	*CONSORCIO INNOVAPARQUES*
OBJETO	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".* *Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	***GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS.*** *Las obras por ejecutar se realizarán en los campos deportivos administrados por el IDRD en grama natural, sintética y de arena, los cuales se encuentran en un listado preliminar, sin perjuicio del ingreso de nuevos campos deportivos a cargo del IDRD, los cuales podrán ser sujeto de intervención conforme a las necesidades del Instituto, definidos en los comités de obra.*
FECHA DE INICIO	*Noviembre 20 de 2024*
FECHA FINAL INICIAL	*Julio 19 de 2025*
PLAZO INICIAL	*8 meses*
VALOR DE CONTRATO	*$ 5.200.000.000,00*
INTERVENTORÍA	*CONSORCIO SANTA TERESA 28*
SUPERVISOR	*RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO*

2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento al porcentaje de avance que se fue presentando de acuerdo con el desarrollo y condiciones particulares detectadas, el cual fue reportado como parte del informe 6. El desempeño generado de los indicadores del contrato para el cierre de este son los siguientes:

- Avance físico y en tiempo:

Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESULTADOS	FRECUENCIA	META	EJECUTADO Periodo 5
Porcentaje de avance en el tiempo	Nro. De Meses de Ejecución Acumulado x 100 / Meses de ejecución contractual.	5.33 / 8 x 100 = **66.6%**	Mensual	100% en el tiempo de ejecución del proyecto	Del 100% del plazo de ejecución del proyecto, se lleva un **66.6 %** de tiempo utilizado.
Porcentaje de avance Financiero	Valor ejecutado en el periodox100 / Valor total del Contrato	720.664.420 / 5.200.000.000 x 100= **13.9 %**	Mensual	100% del presupuesto	Del 100% del presupuesto en el periodo se ejecutó un **13.9%** y un acumulado del **80.8% sobre el valor total del contrato**
Porcentaje de Avance Físico	Nro. De actividades ejecutadas acumulado periodo x100 / Nro. De actividades planeadas periodo.	22 / 22 x 100= 100%	Mensual	100% de las actividades de la programación	Del 100 % de las actividades planeadas en el periodo se ejecutó el **100%**.
Entrega de Productos	#Entrega de productos presentados aprobados /#Productos presentados) *100%	35 / 49 x 100= 71%	Inicio del Proyecto y mensualmente	Aprobación del 100% de los productos entregados.	De 49 productos proyectados para aprobación en el contrato se han aprobado el **71.%**. A corte de 30 de abril de 2025

Nota: El indicador de entrega de productos, tiene como base 13 planes iniciales entregados y aprobados. Para cada periodo va sumando 4 informes que corresponden al técnico, calidad, SST y ambiental. Los datos serán con base a las aprobaciones del informe anterior. **Falta la aprobación del informe de calidad nro. 5.** De noviembre de 2024 a julio de 2025 se tienen proyectado entregar 49 productos

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio INNOVAPARQUES dio cumplimiento con el personal mínimo requerido en los requisitos contractuales obteniendo de las respectivas aprobaciones para el área de calidad del contrato por parte de la interventoría. No se registra novedades de personal en el periodo.

A continuación, se relaciona el personal contractual de obra que estuvo durante el periodo, el cual contó con la respectiva aprobación por parte de la interventoría:

426

Tabla Nro. 3 Personal del contrato

No.	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	PROFESION	DEDICACION	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA PARA APROBACION	
1	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	1.013.623.379	DIRECTOR DE OBRA	Ing. Civil	22.4%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
2	JAVIER GUTIERREZ PINEDA	79.455.166	AGRONOMO	Ing. Agrónomo	60%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
3	ANDREA MARCELA LOPEZ ECHEVERRY	1.018.422.772	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	Ing. Ambiental	34%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
4	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	1.013 632.556	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
5	OSCAR MAURICIO ACEVEDO BERNAL	1.115.913.000	INSPECTOR	Tecnólogo en obras civiles	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
6	CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA	**1.022.443.543**	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-093**	**IDRD-4080-G1-2024-132**
7	ALEANDRO STEVE SARAY HERNANDEZ	80.050.329	TOPOGRAFO	Tecnólogo en topografía	12%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
8	JUAN CARLOS SANABRIA NUNZABA	79.398.876	CADENERO	NA	12%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
9	DEASSI MAGALY VELASQUEZ QUEVEDO	1.023.865.830	SECRETARIA	Técnico en gestión de aerolíneas y agencias de viajes	5%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
10	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	1.024.488.768	RESIENTE DE OBRA	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-061**	**IDRD-4080-G1-2024-081**

Fuente: Elaboración Consorcio Innova parques

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

Dentro de las actividades realizadas por el CONSORCIO en las diferentes canchas, alcance del contrato, se encuentran las siguientes:

- *Demarcación*
- *Bordeo*
- *Cepillado*
- *Corte césped*
- *Aireación*
- *Top-pressing*
- *Poda zonas verdes*
- *Fumigación*
- *Suministro y reparación malla nylon*
- *Imprimación asfáltica*
- *Relleno en arena de rio suelta*
- *Mantenimiento de arcos de portería*

El consolidado de las actividades realizadas se encuentran registradas en el ***anexo A***

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CALIDAD

Dentro de las actividades de cumplimiento del plan de calidad las cuales se describen en el presente documento se encuentran entre otras la siguiente:

- Seguimiento a los indicadores del proyecto en el periodo.
- Seguimiento a las comunicaciones
- Control de ensayos de materiales
- Control y medición de equipos
- Control de los cambios existente en el proyecto.
- Auditorías internas las cuales se realizarán según la programación aprobada.
- Mejora continua.

5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto

Dentro de las actividades que se realizan para el control del proyecto se encuentran las siguientes las cuales y se pueden observar en el ***anexo B***:

- PS-F-11 Formato de verificación instalaciones v3.
- PS-F-08 Formato de control de llegada de materiales semanal
- Acta de entrega para puesta en servicio del parque en formato IDRD.
- Supervisión y control de las actividades realizadas

Para el periodo se cuenta con el acta de entrega de Puesta en Servicio de la canchas de Carmelo F4, Carmelo F11, Florencia tronquitos, la Aurora , Marsella sintética, Normandía, San Andrés 1, San Andrés 2 y Tibabuyes.

6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

6.1 Actas de Comité

Teniendo en cuenta los temas tratados en los comités de obra los cuales se realizan cada 8 días, se establecen compromisos de dichos temas a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos del contrato. El resumen y seguimiento de los temas tratados se encuentran registrados en el ***anexo C***.

Para el presente informe se anexan y registra el seguimiento del acta 21 dado que no han sido copiadas por la interventoría las actas 18, 19 y 20.

6.2 Correspondencia

A continuación, se relacionan las comunicaciones que fueron enviadas entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2025, tiempo que comprende el 6to informe de la siguiente manera:

Correspondencia enviada

Tabla Nro. 4 Correspondencia enviada

CONSECUTIVO No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CINNOVAPARQUES-CE-151	2/04/2025	Envío programación ejecución mantenimientos rutinarios mes de abril del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-152	3/04/2025	Entrega acta de pago No. 5 - Marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-153	7/04/2025	Entrega presupuestos campos Pradera Sur y El Recreo	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-154	8/04/2025	Cumplimiento de acreditación de emprendimiento y empresas de mujeres y vinculación de personas con discapacidad	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-155	7/04/2025	Subsanación informe mensual técnico No. 4 V2.0 - febrero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-156	8/04/2025	Envío informe técnico No. 5 - Marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-157	8/04/2025	Envio presupuesto campo Clarelandia F11	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-158	9/04/2025	Informe de calidad No. 5 - Marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-159	11/04/2025	Entrega física informe de calidad No. 4 - Febrero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-160	11/04/2025	Entrega física informe mensual técnico No. 4 - Febrero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-161	11/04/2025	Entrega física informe mensual ambiental No. 5 - Marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28

429

CONSECUTIVO No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CINNOVAPARQUES-CE-162	11/04/2025	Entrega física informe mensual SST No. 5 - Marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-163	14/04/2025	Entrega de presupuesto para trámite de adición contrato 4041 de 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-164	15/04/2025	Respuesta IDRD-4080-G1- 2024-124 Observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-165	15/04/2025	Respuesta IDRD-4080-G1- 2024-157 Requerimiento remisión soportes y comprobantes de los imprevistos e IDRD-4080-G1- 2024-159 Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-114 Informe de imprevistos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-166	16/04/2025	Solicitud de adición contrato de obra No. 4041 de 2024 v2	CONSORCIO SANTA TERESA 28 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
CINNOVAPARQUES-CE-167	21/04/2025	Respuesta IDRD-4080-G1- 2024-166 Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-124 Informe de imprevistos No. 2 diciembre 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-168	21/04/2025	Entrega informe e imprevistos No. 3 - enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-169	21/04/2025	Subsanación informe técnico No. 5 - marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-170	21/04/2025	Respuesta IDRD-4080-G1- 2024-080 Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-045 Diagnósticos gramas naturales	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-171	28/04/2025	Presupuestos cancha Villa Mayor	CONSORCIO SANTA TERESA 28

CONSECUTIVO No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CINNOVAPARQUES-CE-172	29/04/2025	Envío concepto arena de rio y ensayos de laboratorio	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-173	30/04/2025	Registro de cantidad de materiales mes de abril del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28

6.3 Correspondencia recibida

Tabla Nro. 5 Correspondencia recibida

FECHA	CONSECUTIVO No	ASUNTO	REMITENTE
2/04/2025	IDRD-4080-G1-2024-198	Observaciones al informe mensual No. 4 Componente técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28
3/04/2025	IDRD-4080-G1-2024-200	Aprobación informe SST No. 5	CONSORCIO SANTA TERESA 28
10/04/2025	IDRD-4080-G1-2024-205	Aprobación informe mensual No. 4 componente técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28
11/04/2025	IDRD-4080-G1-2024-206	Observaciones informe mensual No. 5 componente técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28
14/04/2025	IDRD-4080-G1-2024-207	Revisión informe de calidad No. 5 V1	CONSORCIO SANTA TERESA 28
25/04/2025	IDRD-4080-G1-2024-214	Aprobación informe mensual No. 5 componente técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28
30/04/2025	IDRD-4080-G1-2024-216	Aprobación informe SST No. 6	CONSORCIO SANTA

6.4 Bitácora.

La bitácora se constituyó como el instrumento para el registro del control y supervisión de obra se usa para ir haciendo las anotaciones en el libro o libreta que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en el Consorcio Innovaparques la cual contó con las siguientes características:

Fechado: Todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día en que se efectúa el registro.

Escritura de la bitácora: Los asientos deben efectuarse con tinta indeleble, nunca con tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz. Es importante además tener cuidado en escribir con letra fácilmente legible y sin abreviaturas. Cualquier persona debe ser capaz de leer todo lo escrito.

431

Errores en la escritura de la bitácora: Cuando se comete un error de redacción, de intención o de ortografía, la nota debe anularse acompañada de una leyenda que diga "Esta nota se anula por tener error". De inmediato se abre la siguiente nota repitiendo lo asentado, esta vez sin errores. En lo posible se debe evitar el tener que proceder como se indica, pero llegado el caso es imprescindible hacerlo.

7. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada del Consorcio Innova parques durante la ejecución del contrato corresponde a los siguientes documentos:

- Informe técnico
- Informe de Seguridad y Salud en el trabajo
- Informe de Calidad
- Actas de reuniones y comités de seguimiento

Las firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación corresponden a los profesionales aprobados por la interventoría para la elaboración, en algunos casos la revisión y para la probación corresponde al director y /o representante legal del contratista e interventoría. En el periodo se actualiza el listado maestro de documentos 20250430 HSEQ-F-38 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS donde cambia la programación a versión 5 y el balance a versión 4 los cuales están descritos en el proceso de Prestación del Servicio, registrado en el *anexo E.*

8. PLAN DE ADQUISICIONES

Esta actividad nos permite verificar el control de compra de los materiales necesarios para la ejecución del contrato, a fin de identificación los tiempos, el consecutivo de órdenes de compra y proveedor o aleados estratégicos. A continuación, se **actualiza** el plan de adquisiciones, realizándose un resumen de las ordenes de servicio del periodo, donde algunas las cuales se pueden también visualizar, en el ***anexo F***, así como los materiales utilizados en los siguientes parques:

Tabla Nro. 6 Tabla de adquisiciones

432

PARQUE	MATERIALES	REMISION NRO.	PROVEEDOR
LUCES VILLARICA	PEGANTE	4140-04-15	SELLECO
	CINTA	4140-04-15	MALLAS Y GRAMAS
	GRAMA SINTETICA	4140-04-15	CUPERZ
	CAUCHO	4140-04-15	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CUICE	4140-04-15	BEPE
	CAUCHO	4140-04-15	ECO TIRE GREEN SAS
VILLA DE LOS SAUCES	MALLA PERIMETRAL	4140-04-14	MALLAS N M
	MALLA ARCO CAL 4	4140-04-14	MALLAS N M
	MALLA ARCO CAL 8	4140-04-14	MALLAS N M
AMERICAS OCCIDENTAL	GRAMA SINTETICA	4140-04-13	CUPERZ
	CAUCHO	4140-04-13	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CUICE	4140-04-13	BEPE
	CINTA	4140-04-13	MALLAS Y GRAMAS
	PEGANTE	4140-04-13	SELLECO
	CAUCHO	4140-04-13	ECO TIRE GREEN SAS
HOTUELOS F5-F8	MALLA PERIMETRAL	4140-04-12	MALLAS N M
	MALLA ARCO CAL 4	4140-04-12	MALLAS N M
	MALLA PERIMETRAL	4140-04-12	MALLAS N M
	MALLA ARCO CAL 4	4140-04-12	MALLAS N M
	MALLA ARCO CAL 8	4140-04-12	MALLAS N M
PARQUE RECREO	GRAMA SINTETICA	4140-04-11	CUPERZ
	CINTA	4140-04-11	MALLAS Y GRAMAS
	PEGANTE	4140-04-11	MALLAS N M
	CAUCHO	4140-04-11	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CUICE	4140-04-11	BEPE
	CAUCHO	4140-04-11	ECO TIRE GREEN SAS
NUEVO MUZU	MALLA PERIMETRAL	4140-04-10	MALLAS N M
	MALLAS ARCO CAL 4	4140-04-10	MALLAS N M
	MALLAS ARCO CAL 8	4140-04-10	MALLAS N M
SANTA ISABEL 1 Y 2	CIENTA	4140-04-09	MALLAS Y GRAMAS
	PEGANTE	4140-04-09	SELLECO
	CAUCHO	4140-04-09	ECO TIRE GREEN SAS
LOMBARDIA	MALLA PERIMETRAL	4140-04-08	MALLAS N M
	MALLA DE ARCO CAL 4	4140-04-08	MALLAS N M
MILENTA TEJAR	GRAMA SINTETICA	4140-04-07	CUPERZ
	CINTA	4140-04-07	MALLAS Y GRAMAS
	PEGANTE	4140-04-07	SELLECO
	CAUCHO	4140-04-07	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CUICE	4140-04-07	BEPE
	CAUCHO	4140-04-07	ECO TIRE GREEN SAS
	MALLA PERIMENTRAL	4140-04-07	MALLAS N M
	MALLAS CAL 4	4140-04-07	MALLAS N M
	MALLAS CAL 8	4140-04-07	MALLAS N M
CARVAJAL	MALLA PERIMETRAL	4140-04-06	MALLAS N M
	MALLAS DE ARCO CAL 8	4140-04-06	MALLAS N M
PRADERA SUR	GRAMA SINTETICA	4140-04-05	CUPERZ
	CINTA	4140-04-05	MALLAS Y GRAMAS
	PEGANTE	4140-04-05	SELLECO
	CAUCHO	4140-04-05	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CUICE	4140-04-05	BEPE
	CAUCHO	4140-04-05	ECO TIRE GREEN SAS
	MALLAS ARCO CAL 4	4140-04-05	MALLAS N M
	MALLA CERRAMIENTO	4140-04-05	MALLAS N M
GORGONZOLA	PEGANTE	4140-04-04	SELLECO
	CINTA	4140-04-04	MALLAS Y GRAMAS
	CAUCHO	4140-04-04	ECO TIRE GREEN SAS
	MALLAS DE ARCO CAL 4	4140-04-04	MALLAS N M
	MALLAS DE ARCO CAL 8	4140-04-04	MALLAS N M
CANCHAS NATURALES	VINILO	4140-04-03	TITO PABON
JAZMIN	CAUCHO	4140-04-02	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CUICE	4140-04-02	BEPE
	CAUCHO	4140-04-02	ECO TIRE GREEN SAS
	GRAMA SINTETICA	4140-04-01	CUPERZ
	CINTA	4140-04-01	MALLAS Y GRAMAS
	PEGANTE	4140-04-01	SELLECO
	MALLA PERIMETRAL	4140-04-01	MALLAS N M
	MALLA ARCO CAL 4	4140-04-01	MALLAS N M

9. INFRAESRUCTURA Y PRESERVACION

Para la ejecución del proyecto se hizo uso de los siguientes recursos de infraestructura:

- ✓ Oficina de control de proyecto: Calle 51 Nro. 71ª-18
- ✓ Baños fijos en oficina y parques.
- ✓ Equipos y maquinaria como Vibro compactadores, minicargadores, Sopladoras de pasto.
- ✓ Herramientas manuales.
- ✓ Vallas móviles.
- ✓ Suministro de agua potable.
- ✓ Energía eléctrica
- ✓ Equipos de comunicación.



Ilustración 1.Pegue de Grama – Américas Occidental



Ilustración 2. Cepillado – Domingo Lain

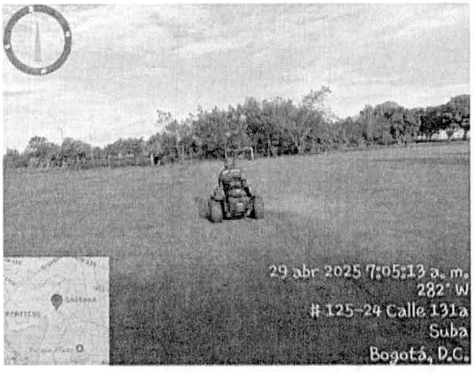


Ilustración 3. Poda estadio Alquería



Ilustración 4. Demarcación – florida

434

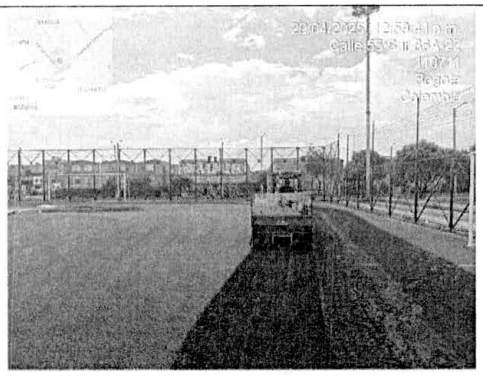


Ilustración 5. Chicalá TOP DRESSING



Ilustración 6. Chicalá Des compactación



Ilustración 7. Juan Amarillo / fumigación CARRETON

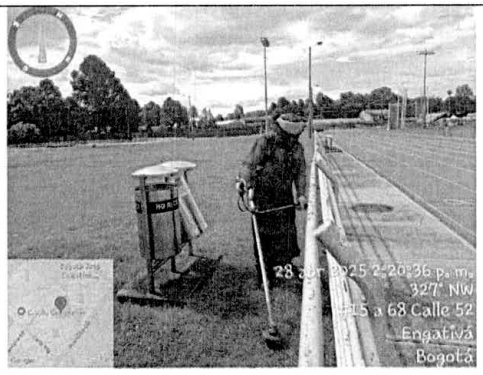


Ilustración 8. UDS - Bordeo

10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Durante la ejecuc ón del contrato, el Consorcio Innovaparques estableció e implementó las medidas necesarias para controlar la calidad de las actividades de obra ejecutadas y los equipos de medición utilizados así como los materiales utilizados en cada una de estas, para lo cual, de conformidad con el plan de calidad aprobado por la interventoría, realizó el control a los materiales certificados por los proveedores, verificando que los mismos cumplieran con las características requeridas por el contrato .

10.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor

435

Los controles implementados por el Consorcio Innovaparques permitieron tener la trazabilidad de los materiales utilizados en obra, asegurando que los proveedores proveedor han proporcionado bajo los estándares de calidad requerido permitiendo identificar la conformidad de los productos bajo parámetros establecidos por normas nacionales o internacionales de acuerdo con las particularidades de cada material y cuyos resultados se muestran en los certificados de calidad emitidos por el mismo proveedor los cuales no varían en el periodo de febrero dado que la compra de estos materiales es en grandes cantidades ***ver anexo G.***

En la ejecución del contrato, se recibieron materiales con certificado de conformidad como se listan en la siguiente tabla resumen por mes de ejecución:

Tabla Nro. 7 Materiales certificados por proveedor

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
Caucho	NTC 5176	EN 933-1 EN 1097-3 EN 14955	N. E	CAUCHOS DINAMICOS
Vinilo Basico Tipo 2 Blanco	MNI 125,0- MAX 130,0	NTC 559	1561	TITO PABON
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr /Palermo SUR 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
ULTRACORROSIVO	N. E	N. E	95468	ULTRA PINTURAS
ESMALTE SINTETICO	N. E	N. E	95742	ULTRA PINTURAS
CINTA DE UNION DE CESPED	IDRD	N. E	CGQ-0345	MALLAS Y GRAMAS
MALLA DE CERRAMIENTO	IDRD	N.E.	1224-032	TRENZACOL
NYLON #4	IDRD	N.E.	1224-023	TRENZACOL
NYLON #8	IDRD	N.E.	1224-017	TRENZACOL
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr / Pijaos Lotes 24N530-E581B, 24N530AE581B, 24N531-E581B, 24N531AE581B, 24N532-E581B, 24N532AE581B, 24N529-E581B, 24N529AE581B, 24N528-	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
E020B, 24N533-E581B, 24N533AE581B, 24N534-E581B, 24N534AE581B, 24N538-E581B, 24N538AE581B, 24N536-E581B, 24N536AE581B, 24N535-E581B, 24N535AE581B, 24N546-E581B, 24N546AE581B, 24N537-E581B, 24N537AE581B, 24N545-E581B				

Fuente: Informes mensuales Consorcio Innovaparques

10.2 Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto

Durante el desarrollo del contrato se hace necesario hacer uso de materiales pétreos a los cuales para verificación del cumplimiento de los parámetros requeridos de calidad se les realiza algún tipo de ensayo de laboratorio.

Lo que permite evaluar la conformidad del grupo de materiales que son entregados como parte de la obra ejecutada, correspondiendo a las actividades técnicas, tipos de inspección, frecuencia, criterios de aceptación, lo que permite asegurar la calidad y el cumplimiento de los requisitos de calidad, y que en caso de que alguno de estos no cumpla con los parámetros establecidos, se realizara el tratamiento de producto no conforme por calidad en los materiales proporcionados.

Los puntos de control y verificación son realizados de manera constante en obra al recibo de los materiales y documentados como parte de los informes mensuales dejando la trazabilidad registrada en el anexo del plan de inspección y ensayos de cada informe, los cuales son aprobados por la interventoría. En el periodo 6 se toman muestras nuevamente para ser realizadas con el laboratorio CONCRELAB, pero estas se entregaron al laboratorio el 19 de mayo, suscitado por los retrasos relacionados con la no aceptación de los ensayos realizado por el laboratorio de PSI, siendo necesario reenviarla nuevamente. ***Ver anexo H.***

Tabla Nro. 8 Materiales controlados por inspección y ensayos

437

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD DE MATERIAL	LABORATORIO	ENSAYO A REALIZAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ANALISIS DE RESULTADOS		
						CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
21/11/2024	ARENA CILICE	N/A	Centro desarrollo Tecnológico Minero ENERGETICO SAS	análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos para agregados	**NTC - 77**	X		NO
8/07/2024	CAUCHO	N/A	ACOUSTO SCAN LATAM	CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO*TAMAÑO DE PARTÍCULA*DENSIDAD*FORMA	IDRD	X		NO
5/03/2025	ARENA DE PEÑA	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
		N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN.	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
	CAUCHO	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Durante el presente periodo, se realizó el control para el aseguramiento de las óptimas condiciones y confiabilidad de las lecturas tomadas por los equipos de topografía para las actividades de obra permitiendo la conformidad del producto y/o revisión con respecto a los requisitos de cliente y según fue el caso, los cuales fueron calibrados y verificados con el formato de control de equipos de topografía del IDRD garantizando que los datos obtenidos fueran conformes. ***VER ANEXO I***

Durante el periodo se contó con los siguientes equipos:

Tabla Nro.9 Equipos de medición utilizados en la ejecución del contrato

INFORME	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	NRO. DE CERTIFICADO	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE VENCIMIENTO
3	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	15/01/2025 27/01/2025	9/06/2025
4	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	11/02/2025 26/02/2025	9/06/2025
5	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	13/03/2025 28/03/2025	9/06/2025
5	Tamiz	Sin especificar	Sin especificar	Ver certificado 14-LAC-055 /	Ver certificado 14-LAC-055 / CONCRELAB	16/02/2024	29/09/2027
6	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	12/04/2025 28/04/2025	9/06/2025

12. CONTROL DE LA GESTION

12.1 Control de Cambios

Durante el periodo el proyecto no presento cambios que hayan afectado el alcance del contrato. Esta actividad asegura cualquier cambio del proceso constructivo de manera efectiva y con las partes interesadas desde el punto de vista técnico y legal en el alcance del contrato.
Cuando se suscitan estos cambios se llevan a cabo de la siguiente manera planificada:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del proyecto;
c) la disponibilidad de recursos.
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
e) La concertación con la interventoría y con el cliente.

Tabla Nro.10 Consolidado de control de cambios

COMPILADO DE CAMBIOS DEL PROYECTO		
1	ACTIVIDAD DEL CAMBIO	
No	DESCRIPCIÓN	OBSERVACION
1	Cambio de la programación v4	Inclusión de nuevos parques con base a la información suministrada por el cliente. San Andrés F11 y F5, Florencia tronquitos, la Europa, Normandía, villas del madrigal y Marsella F5
2	Plan de inspección y ensayo cambia a V5	Se remite en comunicado 136-CE-CINNOVAPARQUES Respuesta IDRD-4080-G1-2024-171 Plan de inspección y ensayos
3	Cambio de la programación v5	Se adiciona las canchas de UDS playa, UDS Softbol, PRD playa, Complejo Acuático, UDS Beisbol, Gaitana voley playa, Ciudad Montes

439

		vóley playa, Ciudad Montes Softbol, Tunal Softbol, Hayuelos, Carvajal, Nuevo Muzu, Porvenir, Lombardia, Jazmín, Gorgonzola, Pradera sur, Parque Industrial Los Ejidos, Milenta Tejar, Santa Isabel, Américas Occidental, Fontanar mini Beisbol, Luces Villa Rica, Chicala y Alfonso Lopez

12.2 Salidas no conformes

El consorcio durante el contrato realizó seguimiento a la conformidad del cliente, con relación a los productos suministrados establecidos donde se presenta una salida no conforme, relacionada con el cumplimiento del indicador, la cual se documenta, estableciendo la acción de mejora respectiva, buscando la calidad en la implementación de las actividades constructivas con base a los lineamientos de los manuales técnicos del IDRD, como se muestra a continuación:

Tabla Nro. 11 Consolidado de salidas no conformes

Informe No.	Fuente	Descripción	Estado
2	Requisitos de Cliente	No se ha realizado la presentación de las caracterizaciones iniciales de los materiales pétreos correspondientes con base a las especificaciones TECNICAS del Contrato.	Cerrada
3	Requisitos de Cliente	No se encuentra evidencia objetiva de la aprobación de los informes mensuales afectando el indicador de entrega de productos.	Cerrada
4	Auditoría Interna / Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores.	Cerrada
6	Proceso de Prestación del Servicio	No se observa trazabilidad objetiva del envió de la programación V5 mediante comunicado a la interventoría, ni con fecha que identifique su elaboración según lo descrito en "7. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS" y 10. PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad v2.	ABIERTA

Para el presente informe registra 1 salida no conforme, producto de la auditoría realizada en el periodo en el anexo J.

13. AUDITORÍAS INTERNAS

En cumplimiento del plan de calidad presentado por el consorcio, se podrán adelantar Auditorías Internas por parte de un profesional asignado por una de las empresas consorciadas cuyo propósito es evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a los componentes: ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos. En el periodo se realiza la auditoria correspondiente al 70% haciendo énfasis al proceso de

prestación del Servicio. En el anexo ***K*** se registra el informe de auditoría y acta de apertura y cierre de la auditoria.

Tabla Nro. 12 Consolidado de Auditorías realizadas

Mes de reporte	No. Informe	No. Auditoría Interna	Hallazgos (No conformidades u observaciones)
4	4	1	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores. ***Cerrada.***
5	5	2	Programada para el 29 de abril de 2025
6	6	2	No se observa trazabilidad objetiva del envió de la programación V5 mediante comunicado a la interventoría, ni con fecha que identifique su elaboración según lo descrito en "7. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS" y 10. PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad v2.

Según el resultadc de las auditorias se implementarán los controles y acciones de mejora que permitan la optimización de la gestión del Consorcio y el mejoramiento continuo en las actividades desarrolladas, y estas serán entregadas en los informes respectivo-mensuales permitiendo cerrar los hallazgos identificados.

14. LISTADO DE ANEXOS

AA Actividades Periodo
AB Control actividades
AC Actas de Comité
AD Bitácora
AE Control de Documentos
AF Compras
AG Certificados de Calidad
AH Inspección y Ensayos
AI Medición
AJ Salidas no conformes.
AK Auditoria.

441

2. ANEXO A
ACTIVIDADES DEL PERIODO

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4080-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 6. - 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	PRD ESTADIO	12-091	Transversal 48 N°63-65	$ -	$ -	$ -	
2	PRD ALTERNA 3	12-091	Transversal 48 N°63-65	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
3	TABORA	10-192	Carrera 76 y Carrera 77A con entre Calle 74 y Calle 75A	$ -	$ -	$ -	
4	EL CAJÓN ATAHUALPA	09-104	Av. Carrera 116 y Carrera 113 con entre Av. Calle 24 y Calle 23B	$ 1.597.346,91	$ 614.659,09	$ 2.212.006,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
5	TIMIZA ESTADIO	08-219	Carrera 113 Calle 23 B	$ -	$ -	$ -	
6	TUNAL FUTBOL	06-063	Cra 24 A Cll 48 Sur Av. Boyacá	$ 3.015.979,92	$ 1.160.549,08	$ 4.176.529,00	Demarcación, bordeo, corte de cesped y corte de cesped
7	SAN CRISTOBAL	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
8	SERENA	10-223	Av. Carrera 86 y Carrera 76 con entre Calle 90A y Calle 91	$ 1.597.346,91	$ 614.659,09	$ 2.212.006,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
9	PARQUE NACIONAL	03-035	Carrera 7 Calle 36	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
10	COUNTRY	01-1000	Av. Calle 127 con Carrera 11C	$ 12.997.512,28	$ 5.001.442,72	$ 17.998.955,00	Corte de campo de polo
11	UDS BEISBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
12	UDS SOFTBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 532.448,73	$ 204.886,27	$ 737.335,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
13	UDS ATLETISMO MARTE	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 629.163,78	$ 242.102,22	$ 871.266,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
14	UDS ATLETISMO	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 629.163,78	$ 242.102,22	$ 871.266,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
15	MILENTA TEJAR	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
17	CIUDAD MONTES VOLEY	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 22.206,09	$ 8.544,91	$ 30.751,00	Bordeo con guadaña
18	TUNAL SOFTBOL	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
19	PAVCO	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 629.163,78	$ 242.102,22	$ 871.266,00	Bordeo y corte de cesped
20	PRD PLAYA	12-091	Transversal 48 N°63-65	$ 44.412,19	$ 17.089,81	$ 61.502,00	Bordeo con guadaña
21	UDS VOLEY PLAYA	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 22.206,09	$ 8.544,91	$ 30.751,00	Bordeo con guadaña
22	COMPLEJO ACUÁTICO	12-1000	Calle 63 con Av. 68	$ 22.206,09	$ 8.544,91	$ 30.751,00	Bordeo con guadaña
23	BOCHICA	16-037	Calle 37 Calle 1H	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
24	MARSELLA	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 943.745,67	$ 363.153,33	$ 1.306.899,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
25	JUAN AMARILLO NATURAL	10-171	Carrera 111A Calle 90	$ 24.464.664,93	$ 9.414.003,07	$ 33.878.668,00	Demarcación, bordeo, corte de cesped, transporte, verticutter, aireación y poda de zonas verdes
26	FLORIDA 1	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 1.911.928,80	$ 735.710,20	$ 2.647.639,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
27	FLORIDA 2	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 1.911.928,80	$ 735.710,20	$ 2.647.639,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
28	FLORIDA 3	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 1.911.928,80	$ 735.710,20	$ 2.647.639,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
29	FLORIDA 4	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 2.129.796,36	$ 819.545,64	$ 2.949.342,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
30	FLORIDA 5	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 2.129.796,36	$ 819.545,64	$ 2.949.342,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
31	ESTADIO ALQUERIA	16-024	Carrera 52B Calle 42 b sur	$ 21.428.311,67	$ 8.245.614,33	$ 29.673.926,00	Bordeo, corte de cesped, relleno de arena de rio, top dressing, fumigación y aplicación de fertilizante químico
32	CIUDAD MONTES SOFTBOL	07-152	Calle 10 sur N° 39-29	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
33	NUEVO MUZU NATURAL	16-112	Carrera 59 Diagonal 52B sur	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
34	LA GAITANA PLAYA	16-112	Carrera 125B Calle 131A	$ -	$ -	$ -	
35	LA GAITANA NATURAL	11-205	Carrera 125B Calle 131A	$ 18.445.932,26	$ 7.097.994,74	$ 25.543.927,00	Demarcación, bordeo, corte de cesped, relleno en arena de rio y top dressing
36	RINCON DE LOS ANGELES	08-108	Cra 78. #6f-91	$ 835.927,93	$ 321.665,07	$ 1.157.593,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
			TOTAL	**$ 108.502.100,00**	**$ 41.751.608,00**	**$ 150.253.708,00**	

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEFORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4080-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 6. - 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 6. - 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - CAMPOS SINTÉTICOS CORRECTIVOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	SERVITA F11	01-023	Carrera 7H Calle 165	$ 726.800,26	$ 279.672,74	$ 1.006.473,00	Cepillado y fumigación
2	SERVITA F5	01-023	Carrera 7H Calle 165	$ 711.613,23	$ 273.828,77	$ 985.442,00	Cepillado y fumigación
3	CABRERA JAPON	02-007	Av. Carrera 11 Calle 87	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
4	CANTALEJO	11-036	Carrera 55 Calle 160	$ -	$ -	$ -	
5	PRADO PINZON	11-109	Calle 143 Carrera 49	$ 831.112,07	$ 319.811,93	$ 1.150.924,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
6	MAZUREN	11-161	Calle 152 Carrera 50	$ 713.737,00	$ 274.646,00	$ 988.383,00	Cepillado y fumigación
7	VILANOVA	11-668	Carrera 54 D Calle 186	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
8	VERBENAL	11-313	Calle 187 Transversal 18 B	$ 712.674,75	$ 274.237,25	$ 986.912,00	Cepillado y fumigación
9	UDS SINT	10-290	CALLE63 CARRERA AV 68	$ 1.070.376,23	$ 411.880,77	$ 1.482.257,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
10	EDUARDO SANTOS	14-030	Cra.19 y cra.18 b entre cl 5 A y cl 4 A bis	$ 713.949,31	$ 274.727,69	$ 988.677,00	Cepillado y fumigación
11	GUSTAVO RESTREPO	18-009	Calle 28 Sur Carrera 15A	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
12	VENECIA 1	06-006	Cra.53 A y Cra.53 B entre Diagonal 47 A S y Diagonal 49 S	$ 712.463,17	$ 274.155,83	$ 986.619,00	Cepillado y fumigación
13	VENECIA 2	06-006	Cra.53 A y Cra.53 B entre Diagonal 47 A S y Diagonal 49 S	$ 712.463,17	$ 274.155,83	$ 986.619,00	Cepillado y fumigación
14	LAGUNETA	06-005	Cra 55 Diagonal 49 sur	$ 716.179,95	$ 275.586,05	$ 991.766,00	Cepillado y fumigación
15	SAN JOSE CENTRO	18-429	Calle 26 Sur y Av. 1 de Mayo con Cra 12 D	$ 711.187,90	$ 273.665,10	$ 984.853,00	Cepillado y fumigación
16	PARQUE OLAYA HERRERA	18-207	Carrera 21 25-35 Sur	$ 724.952,34	$ 278.961,66	$ 1.003.914,00	Cepillado y fumigación
17	PIJAOS	18-090	Av Cra 10 Calle 35 sur	$ -	$ -	$ -	
18	CEDRITOS	01-031	Carrera 9 Calle 145	$ 1.072.733,97	$ 412.788,03	$ 1.485.522,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
19	CALLE 170	01-540	Carrera 17 Calle 175	$ 823.495,45	$ 316.881,05	$ 1.140.376,50	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
20	BACHUE	10-117	Carrera 95 Calle 90 A	$ 725.207,25	$ 279.059,75	$ 1.004.267,00	Cepillado y fumigación
21	AURORA	05-002	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyaca)	$ 1.316.891,68	$ 506.739,92	$ 1.823.631,60	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
22	VALLES DEL CAFAM	05-003	Calle 92 sur Carrera 14 I	$ 713.949,31	$ 274.727,69	$ 988.677,00	Cepillado y fumigación
23	VILLA ALEMANA	05-087	Carrera 5 este (Aup Llano) Calle 100 sur	$ 712.463,17	$ 274.155,83	$ 986.619,00	Cepillado y fumigación
24	MIRAVALLE F8-1	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	$ 787.991,70	$ 303.219,20	$ 1.091.210,90	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
25	MIRAVALLE F8-2	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	$ -	$ -	$ -	
26	MIRAVALLE F5	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
27	ALFONSO LOPEZ	05-141	Carrera 5 G Calle 93 sur	$ 713.071,20	$ 274.389,80	$ 987.461,00	Cepillado y fumigación
28	NUEVO USME	05-459	Carrera 14 A Calle 137 B sur	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
29	MOLINOS	18-055	Transversal 5 Calle 48 L sur	$ 858.039,43	$ 330.173,57	$ 1.188.213,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
30	PALERMO SUR	18-035	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	$ 712.713,75	$ 274.252,25	$ 986.966,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
31	MARRUECOS	18-041	Calle 48 P sur Carrera 5L	$ 715.010,83	$ 275.136,17	$ 990.147,00	Cepillado y fumigación
32	EL TUNAL 1	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	$ 718.271,95	$ 276.391,05	$ 994.663,00	Cepillado y fumigación
33	EL TUNAL 2	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	$ 718.271,95	$ 276.391,05	$ 994.663,00	Cepillado y fumigación
34	EL TUNAL 3	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	$ 716.678,94	$ 275.778,06	$ 992.457,00	Cepillado y fumigación
35	EL TUNAL ALTERNA	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	$ 722.126,66	$ 277.874,34	$ 1.000.001,00	Cepillado y fumigación
36	NUEVO MUZU	06-017	Diagonal 52 B sur Cra 61B	$ 8.793.133,30	$ 3.383.597,70	$ 12.176.731,00	Bordeo, cepillado, fumigación, poda de zonas verdes, mantenimiento de arcos, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en Nylon
37	SANTA LUCIA 1	18-073	Carrera 14 Calle 41 B sur	$ 716.658,00	$ 275.770,00	$ 992.428,00	Cepillado y fumigación
38	SANTA LUCIA 2	18-073	Carrera 14 Calle 41 B sur	$ 718.568,75	$ 276.505,25	$ 995.074,00	Cepillado y fumigación
39	URB TUNJUELITO	06-012	Cra 12 Calle 59 sur	$ 721.171,29	$ 277.506,71	$ 998.678,00	Cepillado y fumigación
40	NUEVO MILENIO 1	05-476	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur	$ 712.037,84	$ 273.992,16	$ 986.030,00	Cepillado y fumigación
41	NUEVO MILENIO 2	05-476	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur	$ 711.400,92	$ 273.747,08	$ 985.148,00	Cepillado y fumigación
42	ALTOS DE LA ESTANCIA 1	19-756	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur	$ 353.417,10	$ 135.994,90	$ 489.412,00	Cepillado y fumigación
43	ALTOS DE LA ESTANCIA 2	19-756	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur	$ 353.417,10	$ 135.994,90	$ 489.412,00	Cepillado y fumigación
44	ILLIMANI F11	19-346	Calles 71 P Sur Transversal 27 H	$ 1.119.799,97	$ 430.899,03	$ 1.550.699,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
45	ILLIMANI F5	19-346	Calles 71 P Sur Transversal 27 H	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
46	ILLIMANI EL MIRADOR	19-788	Carrera 27 C Diagonal 70 U Bis sur	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
47	EL TALLER EL ENSUEÑO	19-348	Carrera 75A Diagonal 68 A	$ 714.958,12	$ 275.115,88	$ 990.074,00	Cepillado y fumigación
48	ESTANCIA	19-231	Calle 58 C sur Carrera 74 C	$ 714.373,92	$ 274.891,08	$ 989.265,00	Cepillado y fumigación

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4080-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 6. - 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
49	PARAISO	19-490	Cra 27 Q Calle 71 K sur	$ 710.657,13	$ 273.460,87	$ 984.118,00	Cepillado y fumigación
50	LA JOYA	19-349	Carrera 18 I Calle 80 B sur	$ 713.206,24	$ 274.441,76	$ 987.648,00	Cepillado y fumigación
51	DOMINGO LAIN	19-032	Calle 64 C sur Transv 17N	$ 710.657,13	$ 273.460,87	$ 984.118,00	Cepillado y fumigación
52	ARBOLIZADORA ALTA	19-058	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B	$ 710.657,13	$ 273.460,87	$ 984.118,00	Cepillado y fumigación
53	CARACOLI	19-710	Carrera 74 B Calle 77 sur	$ 712.409,73	$ 274.135,27	$ 986.545,00	Cepillado y fumigación
54	BALMORA GUADALUPE	19-750	Autopista sur Carrera 71	$ 713.417,82	$ 274.523,18	$ 987.941,00	Cepillado y fumigación
55	LA VICTORIA 1	04-122	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05	$ 711.507,08	$ 273.787,92	$ 985.295,00	Cepillado y fumigación
56	LA VICTORIA 2	04-122	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05	$ 711.507,08	$ 273.787,92	$ 985.295,00	Cepillado y fumigación
57	SAN CRISTOBAL 1	04-127	Calle 13 sur N.° 2- 50 este	$ 721.998,84	$ 277.825,16	$ 999.824,00	Cepillado y fumigación
58	SAN CRISTOBAL 2	04-127	Calle 13 sur N.° 2- 50 este	$ 724.113,23	$ 278.638,77	$ 1.002.752,00	Cepillado y fumigación
59	ANTIOQUIA	04-038	Transversal 8a este Calle 50 b sur	$ 711.081,74	$ 273.624,26	$ 984.706,00	Cepillado y fumigación
60	GAITAN CORTÉS	04-103	Calle 31A S y Diagonal 31C S con entre Carrera 7E y Carrera 4E	$ 1.112.720,97	$ 428.175,03	$ 1.540.896,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
61	NARANJOS	07-035	Carrera 80 J Calle 70 A sur	$ 744.864,24	$ 286.623,76	$ 1.031.488,00	Bordeo, cepillado y fumigación
62	VILLA DEL RIO	07-036	Carrera 65 Calle 55 A sur	$ 726.587,23	$ 279.590,77	$ 1.006.178,00	Cepillado y fumigación
63	EL RECREO	07-260	Calle 69 A Sur 93D - 45	$ 45.264.311,09	$ 17.417.706,91	$ 62.682.018,00	Cepillado, transporte en grua planchon, aireación, top dressing, fumigación, mantenimiento de arcos, suministro de caucho, desmonte y suministro de grama sintética
64	LA TINGUA TIBANICA	07-274	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis	$ 720.639,80	$ 277.302,20	$ 997.942,00	Cepillado y fumigación
65	EL PORVENIR 1	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 715.330,01	$ 275.258,99	$ 990.589,00	Cepillado y fumigación
66	EL PORVENIR 2	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 715.330,01	$ 275.258,99	$ 990.589,00	Cepillado y fumigación
67	EL PORVENIR 3	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 715.330,01	$ 275.258,99	$ 990.589,00	Cepillado y fumigación
68	EL PORVENIR 4	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 713.567,30	$ 274.580,70	$ 988.148,00	Cepillado y fumigación
69	EL PORVENIR 5	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 713.567,30	$ 274.580,70	$ 988.148,00	Cepillado y fumigación
70	EL PORVENIR MINI	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 708.745,67	$ 272.725,33	$ 981.471,00	Cepillado y fumigación
71	SAN JOSE DE MARYLAND	07-164	Carrera 86 Calle 73 G sur	$ 717.928,22	$ 276.258,78	$ 994.187,00	Cepillado y fumigación
72	LUCES VILLA RICA	08-533	Carrera 77 H Calle 52 A sur	$ 21.372.933,28	$ 8.224.304,72	$ 29.597.238,00	Cepillado, transporte en grua planchon, aireación, top dressing, fumigación, mantenimiento de arcos, suministro de caucho y suministro de grama sintética
73	LA ALEJANDRA	08-568	Carrera 72J y Carrera 72I con entre Calle 42B S y Calle 42 S	$ 714.162,33	$ 274.809,67	$ 988.972,00	Cepillado y fumigación
74	AMERICAS OCCIDENTAL	08-127	Calle 2A S y Av. Calle 5 S con entre Carrera 72C y Av. Carrera 72	$ 37.906.120,02	$ 14.586.274,98	$ 52.492.395,00	Cepillado, transporte en grua planchon, aireación, top dressing, fumigación, mantenimiento de arcos, suministro de caucho, desmonte y suministro de grama sintética
75	VILLA DE LOS SAUCES	08-180	Carrera 17A y Carrera 17 con entre Calle 175 y Calle 173	$ 3.428.188,91	$ 1.319.167,09	$ 4.747.356,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
76	CARVAJAL	08-040	Cra 70 B Calle 24 A sur	$ 6.375.457,83	$ 2.453.276,17	$ 8.828.734,00	Cepillado, fumigación, mantenimiento de arcos, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en Nylon
77	TIMIZA F8	08-219	Carrera 72 P Calle 40 H sur	$ 715.330,01	$ 275.258,99	$ 990.589,00	Cepillado y fumigación
78	TIMIZA 11	08-219	Carrera 72 P Calle 40 H sur	$ 725.207,25	$ 279.059,75	$ 1.004.267,00	Cepillado y fumigación
79	LA IGUALDAD	08-212	Carrera 68A entre Calle 2	$ 724.092,29	$ 278.630,71	$ 1.002.723,00	Cepillado y fumigación
80	CASTILLA	08-200	Carrera 74 Calle 8A Bis	$ 738.916,81	$ 284.335,19	$ 1.023.252,00	Cepillado y fumigación
81	LAGO TIMIZA	08-629	Carrera 17A y Carrera 17 con entre Calle 175 y Calle 173	$ 715.010,83	$ 275.136,17	$ 990.147,00	Cepillado y fumigación
82	LAS CRUCES	03-036	Cra.4 y Cra.5 A entre cl 1 b bis y cl 1 c bis	$ 714.267,76	$ 274.850,24	$ 989.118,00	Cepillado y fumigación
83	LACHES	03-148	Diagonal 4B Cra 8 E	$ 718.516,03	$ 276.484,97	$ 995.001,00	Cepillado y fumigación
84	TERCER MILENIO 1 F5	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 712.569,32	$ 274.196,68	$ 986.766,00	Cepillado y fumigación
85	TERCER MILENIO 2 F5	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 712.569,32	$ 274.196,68	$ 986.766,00	Cepillado y fumigación
86	TERCER MILENIO 3 F11	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 724.462,74	$ 278.773,26	$ 1.003.236,00	Cepillado y fumigación
87	LOURDES	03-122	Carrera 1A Este Calle 3	$ 710.550,98	$ 273.420,02	$ 983.971,00	Cepillado y fumigación
88	DINDALITO	08-144	Carrera 94 C Calle 42 sur	$ 353.417,10	$ 135.994,90	$ 489.412,00	Cepillado y fumigación
89	CAYETANO CAÑIZARES	08-241	Av.cra.80 y cra.80 d bis ente cl 42 A S y cl 39	$ 1.287.279,03	$ 495.344,97	$ 1.782.624,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
90	GILMA F11	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 723.295,06	$ 278.323,94	$ 1.001.619,00	Cepillado y fumigación
91	GILMA F8	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 715.436,16	$ 275.299,84	$ 990.736,00	Cepillado y fumigación
92	GILMA F5 1	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 713.100,09	$ 274.400,91	$ 987.501,00	Cepillado y fumigación
93	GILMA F5 2	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 713.100,09	$ 274.400,91	$ 987.501,00	Cepillado y fumigación
94	GILMA MINI	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 708.532,64	$ 272.643,36	$ 981.176,00	Cepillado y fumigación

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4080-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 6. - 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
95	GORGONZOLA	16-126	Carrera 41 A Calle 5	$ 17.860.015,16	$ 6.872.533,84	$ 24.732.549,00	Cepillado, transporte en grua planchon, aireación, top dressing, fumigación, mantenimiento de arcos, suministro de mallas de arcos, mantenimiento de malla de cerramiento en nylon y suministro de caucho
96	MARSELLA F11	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 721.702,05	$ 277.710,95	$ 999.413,00	Cepillado y fumigación
97	MARSELLA F5	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 715.049,83	$ 275.151,17	$ 990.201,00	Cepillado y fumigación
98	SANTA ISABEL 1	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	$ 14.284.365,97	$ 5.496.624,03	$ 19.780.990,00	Cepillado, transporte en grua planchon, aireación, top dressing, fumigación, mantenimiento de arcos y suministro de caucho
99	SANTA ISABEL 2	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	$ 5.786.078,13	$ 2.226.482,87	$ 8.012.561,00	Cepillado, aireación, top dressing, fumigación, mantenimiento de arcos y suministro de caucho
100	JUAN AMARILLO F5 1	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 711.824,81	$ 273.910,19	$ 985.735,00	Cepillado y fumigación
101	JUAN AMARILLO F5 2	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 711.824,81	$ 273.910,19	$ 985.735,00	Cepillado y fumigación
102	JUAN AMARILLO F5 3	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 711.824,81	$ 273.910,19	$ 985.735,00	Cepillado y fumigación
103	JUAN AMARILLO F5 4	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 711.824,81	$ 273.910,19	$ 985.735,00	Cepillado y fumigación
104	JUAN AMARILLO F8 1	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 715.330,01	$ 275.258,99	$ 990.589,00	Cepillado y fumigación
105	JUAN AMARILLO F8 2	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 715.330,01	$ 275.258,99	$ 990.589,00	Cepillado y fumigación
106	LA EUROPA	10-045	Carrera 71D y Carrara 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	$ 713.206,24	$ 274.441,76	$ 987.648,00	Cepillado y fumigación
107	LA EUROPA MINI	10-045	Carrera 71D y Carrara 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	$ 356.072,36	$ 137.016,64	$ 493.089,00	Cepillado y fumigación
108	METROPOLIS	12-035	Carrera 66 Calle 84	$ 713.206,24	$ 274.441,76	$ 987.648,00	Cepillado y fumigación
109	BONANZA	10-215	Carrera 70 F Calle 75	$ 725.761,84	$ 279.273,16	$ 1.005.035,00	Cepillado y fumigación
110	SAN ANDRES F5	10-234	Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 100A	$ 715.361,79	$ 275.271,21	$ 990.633,00	Cepillado y fumigación
111	SAN ANDRES F11	10-234	Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 100A	$ 724.994,22	$ 278.977,78	$ 1.003.972,00	Cepillado y fumigación
112	EL CARMELO F5	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	$ 715.033,22	$ 275.144,78	$ 990.178,00	Cepillado y fumigación
113	EL CARMELO F11	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	$ 1.230.385,47	$ 473.452,33	$ 1.703.837,80	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
114	VILLA LUZ F5	10-018	Carrera 77A y Carrara 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	$ 715.330,01	$ 275.258,99	$ 990.589,00	Cepillado y fumigación
115	VILLA LUZ F11	10-018	Carrera 77A y Carrara 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	$ 723.284,23	$ 278.319,77	$ 1.001.604,00	Cepillado y fumigación
116	VILLAS DEL MADRIGAL	10-002	Calle 75 C Carrera 99 B	$ 360.850,66	$ 138.855,34	$ 499.706,00	Cepillado y fumigación
117	FLORENCIA LOS TRONQUITOS	10-028	Carrera 91A y Carrara 90 BIS con entre Calle 76 BIS y Calle 75C	$ 713.630,85	$ 274.605,15	$ 988.236,00	Cepillado y fumigación
118	PAVCO	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.047.354,13	$ 403.021,87	$ 1.450.376,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
119	JAZMIN	16-204	Av. Carrera 50 y Carrera 40B con entre Calle 1D y Calle 1H	$ 48.736.414,64	$ 18.753.772,36	$ 67.490.187,00	Cepillado, transporte grua planchon, aireación, top dressing, fumigación, mantenimiento de arcos, suministro de mallas de arcos, mantenimiento de malla de cerramiento en nylon, suministro de caucho, desmonte y suministro de grama sintética
120	PEPITA	14-008	Carrera 26 y Carrera 25A con entre Calle 11 y Calle 10	$ 712.182,99	$ 274.048,01	$ 986.231,00	Cepillado y fumigación
121	CIUDAD MONTES 1	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 710.550,98	$ 273.420,02	$ 983.971,00	Cepillado y fumigación
122	CIUDAD MONTES 2	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 710.550,98	$ 273.420,02	$ 983.971,00	Cepillado y fumigación
123	SIERRA MORENA 1	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
124	SIERRA MORENA 2	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
125	CASA BLANCA	11-069	Calle 146A con entre Carrera 80 y Carrera 76	$ 716.497,69	$ 275.708,31	$ 992.206,00	Cepillado y fumigación
126	FONTANAR DEL RIO F11	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 722.869,73	$ 278.160,27	$ 1.001.030,00	Cepillado, fumigación y suminitro de mallas
127	FONTANAR DEL RIO F5	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado, fumigación y suminitro de mallas
128	FONTANAR MINI BESIBOL	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 719.217,22	$ 276.754,78	$ 995.972,00	Cepillado y fumigación

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4080-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 6. - 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
129	LA GAITANA	11-205	Tranversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 135B y Calle 132B	$ 718.940,64	$ 276.648,36	$ 995.589,00	Cepillado y fumigación
130	URB LOMBARDIA	11-052	Calle 143 y Calle 142A con entre Carrera 106B y Av. Carrera 104	$ 3.658.019,21	$ 1.407.605,79	$ 5.065.625,00	Cepillado, fumigación, mantenimiento de arcos, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en Nylon
131	CIUDADELA CAFAM	11-008	Carrera 113C con entre Calle 142 y Calle 142A	$ 361.062,97	$ 138.937,03	$ 500.000,00	Cepillado y fumigación
132	BERLIN	11-015	Calle 142 y Calle 139 con entre Carrera 145B y Carrera 144A	$ 713.630,85	$ 274.605,15	$ 988.236,00	Cepillado y fumigación
133	TIBABUYES 1	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	$ 715.755,34	$ 275.422,66	$ 991.178,00	Cepillado y fumigación
134	TIBABUYES 2	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	$ 717.453,78	$ 276.076,22	$ 993.530,00	Cepillado y fumigación
135	CAFAM LOS GAVILANTES	11-1101	Calle 142F y Calle 142A con entre Carrera 146 y Carrera 143	$ 369.347,20	$ 142.124,80	$ 511.472,00	Cepillado y fumigación
136	LA ESPERANZA	07-273	Carrera 80J y Carrera 79 con entre Calle 76A S y Calle 75BIS S	$ 715.117,71	$ 275.177,29	$ 990.295,00	Cepillado y fumigación
137	CLARELANDIA F11	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80I y Carrera 80B	$ 744.438,91	$ 286.460,09	$ 1.030.899,00	Cepillado y fumigación
138	CLARELANDIA MINI	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80I y Carrera 80B	$ 736.154,68	$ 283.272,32	$ 1.019.427,00	Cepillado y fumigación
139	TEJAR	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	$ 56.669.136,34	$ 21.806.283,66	$ 78.475.420,00	Cepillado, transporte en grua planchon, aireación, top dressing, fumigación, mantenimiento de arcos, suministro de mallas de arcos, mantenimiento de malla de cerramiento en nylon, suministro de caucho, desmonte y suministro de grama sintética
140	CHICALA	07-292	Calle 54C S y Calle 55 S con entre Av. Carrera 86 y Carrera 86C	$ 720.745,96	$ 277.343,04	$ 998.089,00	Cepillado y fumigación
141	ATALAYAS	07-32[illegible]	Carrera 99C y Carrera 98A con entre Calle 59B S y Calle 61A S	$ 716.699,88	$ 275.786,12	$ 992.486,00	Cepillado y fumigación
142	PORTAL DEL SOL	07-403	Carrera 98B y Carrera 95A con entre Calle 74 S y Calle 75 S	$ 368.284,95	$ 141.716,05	$ 510.001,00	Cepillado y fumigación
143	CAMPO VERDE 1	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 717.242,20	$ 275.994,80	$ 993.237,00	Cepillado y fumigación
144	CAMPO VERDE 2	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 716.816,87	$ 275.831,13	$ 992.648,00	Cepillado y fumigación
145	CAMPO VERDE 3	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 712.037,84	$ 273.992,16	$ 986.030,00	Cepillado y fumigación
146	SANTA CLARA	13-015	Carrera 47 y Carrera 45 con entre Calle 22A y Calle 22 BIS	$ 716.626,23	$ 275.757,77	$ 992.384,00	Cepillado y fumigación
147	HAYUELOS F8	09-200	Carrera 81B y Carrara 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	$ 6.692.292,75	$ 2.575.194,25	$ 9.267.487,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
148	HAYUELOS F5	09-200	Carrera 81B y Carrara 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	$ 8.023.799,83	$ 3.087.558,17	$ 11.111.358,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
149	NORMANDIA	10-190	Carrera 73A y Carrera 73 con entre Calle 52A y Calle 51	$ 722.551,99	$ 278.038,01	$ 1.000.590,00	Cepillado, fumigación y suminitro de mallas
150	VILLEMAR			$ 1.088.321,78	$ 418.786,22	$ 1.507.108,00	Cepillado y fumigación
151	PRADERA SUR	16-153	Av. Calle 3 y Calle 4B con entre Carrera 66 y Carrera 65	$ 14.445.844,17	$ 5.558.760,83	$ 20.004.605,00	Bordeo, cepillado, transporte en grua planchon, fumigación, aireación, top dressing, poda de zonas verdes, mantenimiento de arcos, suministro de mallas de arcos, mantenimiento de malla de cerramiento en nylon, suministro de caucho, desmonte y suministro de grama sintética
152	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	Calle 12 y Calle11A con entre Av. Carrera 36 y Carrera 37	$ 2.108.757,22	$ 811.449,78	$ 2.920.207,00	Cepillado, fumigación y mantenimiento de arcos
153	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR	16-415	Calle 12 y Calle11A con entre Av. Carrera 36 y Carrera 37	$ 713.311,67	$ 274.482,33	$ 987.794,00	Cepillado y fumigación
154	TOBERIN	01-079	Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 145 y Calle 146	$ 1.027.575,82	$ 395.411,18	$ 1.422.987,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
155	ESTRELLA NORTE	01-189	Calle 160 y Calle 159A con entre Carrera 21 y Carrera 19B	$ 821.346,62	$ 316.054,18	$ 1.137.400,80	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
156	BURGOS BRITALIA 1	11-058	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	$ 962.747,54	$ 370.465,26	$ 1.333.212,80	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
157	BURGOS BRITALIA 2	11-058	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	$ 1.013.893,49	$ 390.146,21	$ 1.404.039,70	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4080-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 6. - 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
158	LINDARAJA	11-309	Calle 128 y Diagonal 127B con entre Carrera 79 y Carrera 78	$ 712.143,99	$ 274.033,01	$ 986.177,00	Cepillado y fumigación
159	COMETAS	11-204	Calle 127C y Calle 127A con entre Carrera 81 y Carrera 87A	$ 361.912,91	$ 139.264,09	$ 501.177,00	Cepillado y fumigación
160	PTAR	10-531	Carrera 119 y Rol Bogota con entre Calle 80A Bis y Calle 86	$ 725.312,68	$ 279.100,32	$ 1.004.413,00	Cepillado y fumigación
161	PRD 1	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	$ 996.987,29	$ 383.640,71	$ 1.380.628,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
162	PRD 2	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	$ 747.731,08	$ 287.726,92	$ 1.035.458,00	Bordeo, cepillado y fumigación
163	GIMNASIO DEL NORTE	12-023	Carrera 28 y Carrera 27A con entre Calle 63C y Calle 63B	$ 773.914,64	$ 297.802,36	$ 1.071.717,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
164	FRAGUA	15-040	Carrera 31 N.° 14 B 57 sur	$ 1.170.051,99	$ 450.236,01	$ 1.620.288,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
165	VILLA MAYOR	15-036	Calle 32 A sur Carrera 34 C	$ 723.295,06	$ 278.323,94	$ 1.001.619,00	Cepillado y fumigación
166	CIUDAD HONDA	10-153	Carrera 68H y Carrera 68D con entre Calle 64H y Calle 65	$ 839.566,72	$ 323.065,28	$ 1.162.632,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
167	VILLA ALSACIA	08-065	Carrera 72 B Calle 11 A BIS	$ 370.408,72	$ 142.533,28	$ 512.942,00	Cepillado y fumigación
168	DESARROLLO BILBAO	11-074	Calle 142 C Carrera 151 A	$ 710.486,71	$ 273.395,29	$ 983.882,00	Cepillado y fumigación
169	CANDELARIA MINI	17-028	Calle 12 f #3-27	$ 1.063.225,01	$ 409.128,99	$ 1.472.354,00	Cepillado y fumigación
			COSTO DIRECTO	**$ 411.908.371,00**	**$ 158.502.341,00**	**$ 570.410.712,00**	
			SUMA TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 520.410.471,00**	**$ 200.253.949,00**	**$ 720.664.420,00**	

OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

3. ANEXO B
CONTROL DE ACTIVIDADES

3.1. PUESTA EN SERVICIO CARMELO F5 Y CARMELO F11

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 10-169

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Carmelo F5

DIRECCIÓN: Carrera 101 A Calle 71B **LOCALIDAD:** Engativá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 *(Día)*	**DE**	Noviembre *(Mes)*	**DE**	2024 *(Año)*			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 *(Día)*	**DE**	Julio *(Mes)*	**DE**	2025 *(Año)*			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 *(Día)*	**DE**	Julio *(Mes)*	**DE**	2025 *(Año)*			
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	4041 *(Número Contrato)*	**DE**	2024 *(Año)*	
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	4080 *(Número de Contrato)*	**DE**	2024 *(Año)*	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA


2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA






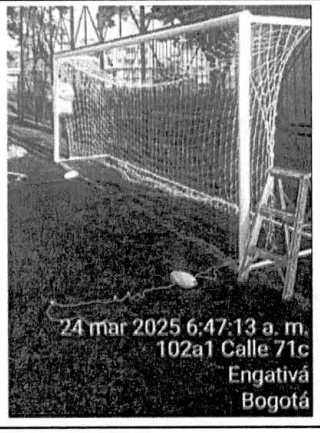





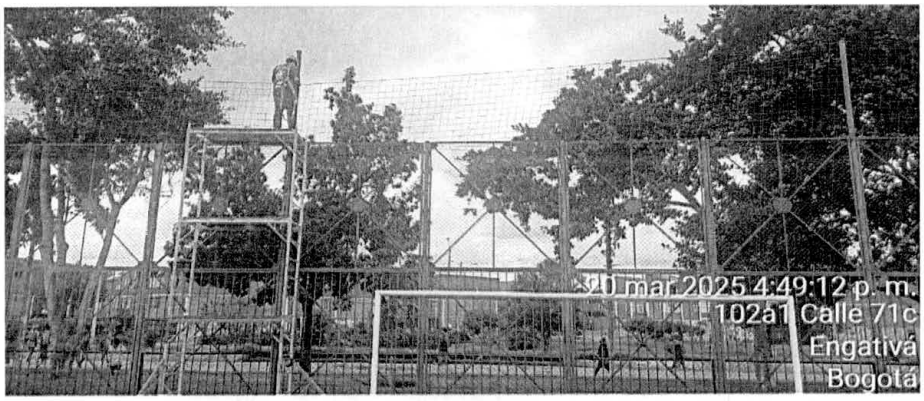

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	1.433,71 m2	100,00%
		TOTAL ÁREA INTERVENIDA	**1.433,71 m2**	**100,00%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	82,5	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000	Nuevo

2.2.4 DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica



N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete (*día en letras*) (7) (*día en números*) días del mes de Abril (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)
(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de interventoría
Área Técnica
Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)
(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad IDRD

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 10-169

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Carmelo F11

DIRECCION: Carrera 101 A Calle 71B **LOCALIDAD:** Engativá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20** (Dia)	**DE**	**Noviembre** (Mes)	**DE**	**2024** (Año)			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19** (Dia)	**DE**	**Julio** (Mes)	**DE**	**2025** (Año)			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**19** (Dia)	**DE**	**Julio** (Mes)	**DE**	**2025** (Año)			
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	**4041** (Número Contrato)	**DE**	**2024** (Año)	
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	**4080** (Número de Contrato)	**DE**	**2024** (Año)	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subcirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA


2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN


2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

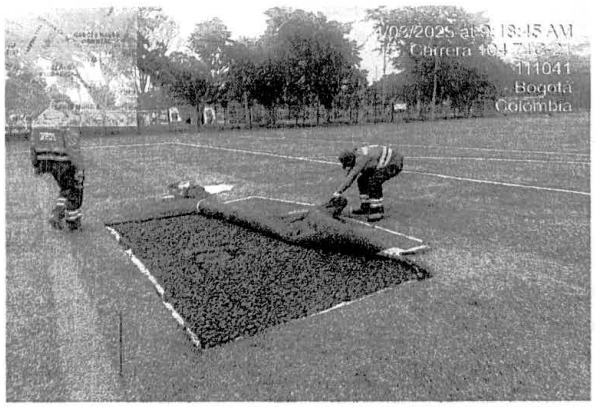




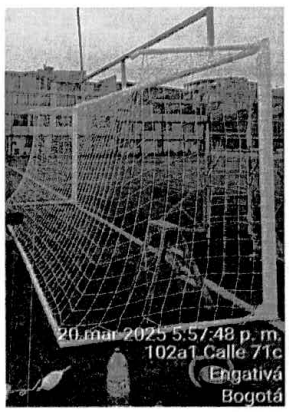

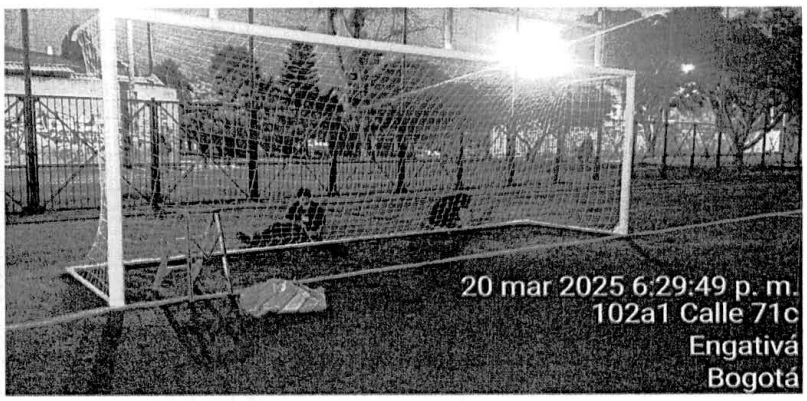





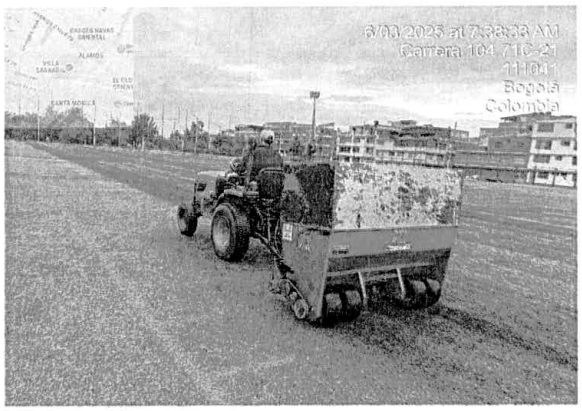





2.2.2 DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 8750 m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA Y GRANULO DE CAUCHO SBR	39,96 m2	0,46%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**39,96 m2**	**0,46%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	39,96	Nueva
13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	215,25	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoria	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete *(día en letras)* (7) *(día en números)* días del mes de Abril *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega: Recibe:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.2. PUESTA EN SERVICIO FLORENCIA TRONQUITOS

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 10-028

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Florencia Tronquitos

DIRECCION: Carrera 91 A Calle 75 C **LOCALIDAD:** Engativá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20** *(Día)*	**DE**	**Noviembre** *(Mes)*	**DE**	**2024** *(Año)*			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19** *(Día)*	**DE**	**Julio** *(Mes)*	**DE**	**2025** *(Año)*			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**19** *(Día)*	**DE**	**Julio** *(Mes)*	**DE**	**2025** *(Año)*			
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	**4041** *(Número Contrato)*	**DE**	**2024** *(Año)*	
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	**4080** *(Número de Contrato)*	**DE**	**2024** *(Año)*	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las concidiones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA


2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL


ZONA DE LA CANCHA






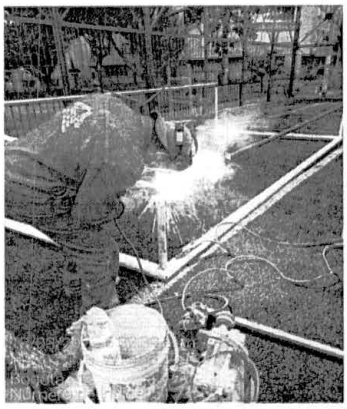



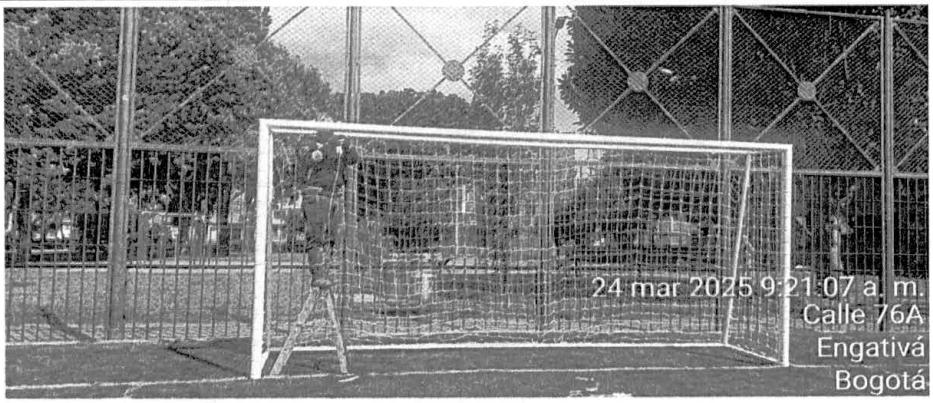

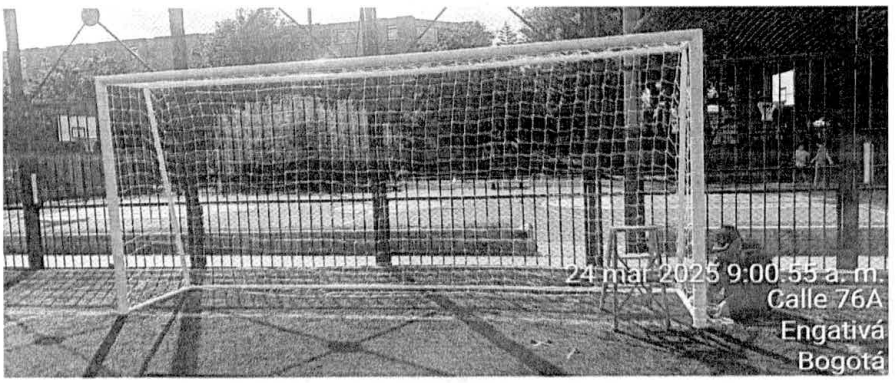





2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	1.008,00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**1.008,00 m2**	**100,00%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	199,5	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete (*día en letras*) (7) (*día en números*) días del mes de Abril (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega: Recibe:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.3. PUESTA EN SERVICIO LA EUROPA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogctá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 10-045

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética La Europa

DIRECCIÓN: Carrera 71 D Calle 67 **LOCALIDAD:** Engativá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20** (Día)	**DE**	**Noviembre** (Mes)	**DE**	**2024** (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19** (Día)	**DE**	**Julio** (Mes)	**DE**	**2025** (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**19** (Día)	**DE**	**Julio** (Mes)	**DE**	**2025** (Año)		
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	**4041** (Número Contrato)	**DE**	**2024** (Año)
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	**4080** (Número de Contrato)	**DE**	**2024** (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN


2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA








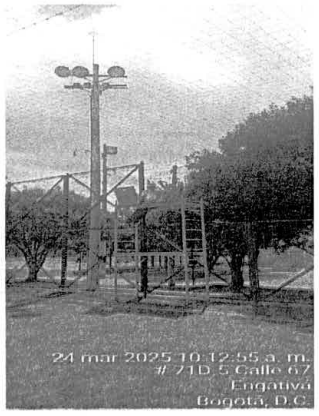



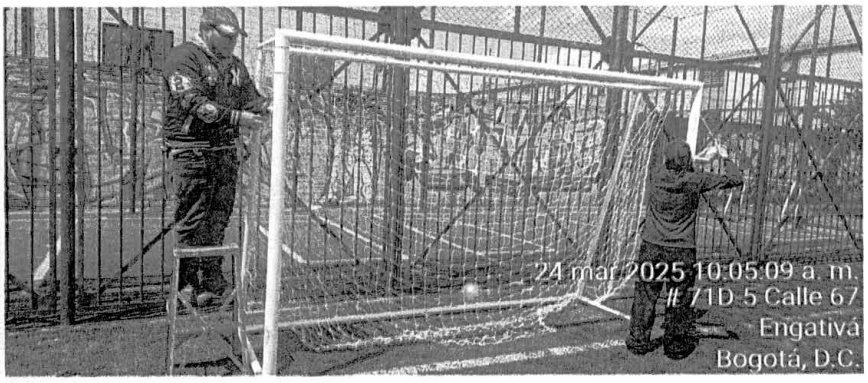





2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	840,00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**840,00 m2**	**100,00%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	Mallas Semiprcfes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	122,5	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	1500	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLE¯AR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:
Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)
E.A.A.B **ENEL** **VANTI**
UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**
Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:
Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)
Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete (*día en letras*) (7) (*día en números*) días del mes de Abril (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Enticad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.4. PUESTA EN SERVICIO MARSELLA SINTÉTICA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogctá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 08-066

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Marsella

DIRECCIÓN: Carrera 69 Calle 8 **LOCALIDAD:** Kennedy

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la preserte entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20** *(Día)*	**DE**	**Noviembre** *(Mes)*	**DE**	**2024** *(Año)*			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19** *(Día)*	**DE**	**Julio** *(Mes)*	**DE**	**2025** *(Año)*			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**19** *(Día)*	**DE**	**Julio** *(Mes)*	**DE**	**2025** *(Año)*			
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*					**CONTRATO No**	**4041** *(Número Contrato)*	**DE** **2024** *(Año)*
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*					**CONTRATO No**	**4080** *(Número de Contrato)*	**DE** **2024** *(Año)*
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA


2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL


ZONA DE LA CANCHA






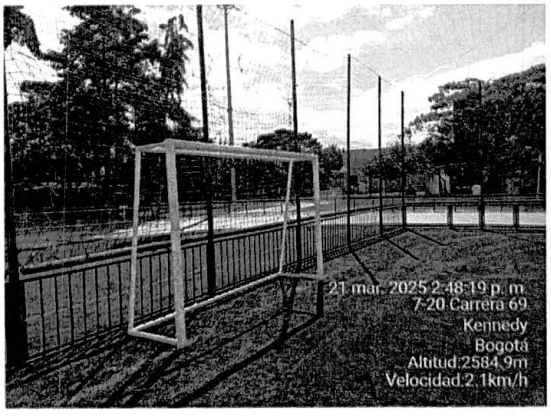







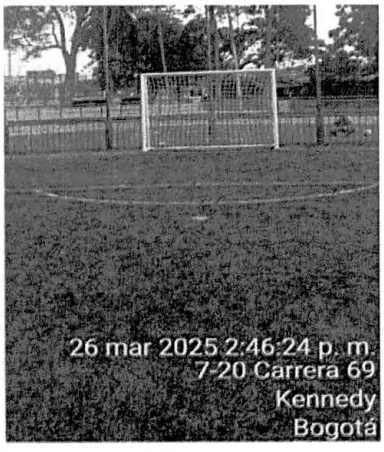







2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	1.309,00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**1.309,00 m2**	**100,00%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	194	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:
Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADC **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:
Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)
Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete *(día en letras)* (7) *(día en números)* días del mes de Abril *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:

(Firma)
(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de interventoría
Área Técnica
Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)
(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad IDRD

3.5. PUESTA EN SERVICIO NORMANDIA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 10-109

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Normandia

DIRECCIÓN: Carrera 73 Calle 51 **LOCALIDAD:** Enagtivá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 *(Dia)*	**DE**	Noviembre *(Mes)*	**DE**	2024 *(Año)*			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 *(Dia)*	**DE**	Julio *(Mes)*	**DE**	2025 *(Año)*			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 *(Dia)*	**DE**	Julio *(Mes)*	**DE**	2025 *(Año)*			
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	4041 *(Número Contrato)*	**DE**	2024 *(Año)*	
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	4080 *(Número de Contrato)*	**DE**	2024 *(Año)*	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA













BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	5.000,00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**5.000,00 m2**	**100,00%**

2.2.3. NVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	95	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	4800	Nuevo

2.2.4 DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete (*día en letras*) (7) (*día en números*) días del mes de Abril (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Pao a Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.6. PUESTA EN SERVICIO SAN ANDRES F11 Y F8

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 10-234

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética San andres F11

DIRECCIÓN: CALLE 82 CARRARA 102 **LOCALIDAD:** Engativá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20** (Día)	**DE**	**Noviembre** (Mes)	**DE**	**2024** (Año)			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19** (Día)	**DE**	**Julio** (Mes)	**DE**	**2025** (Año)			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**19** (Día)	**DE**	**Julio** (Mes)	**DE**	**2025** (Año)			
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	**4041** (Número Contrato)	**DE**	**2024** (Año)	
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	**4080** (Número de Contrato)	**DE**	**2024** (Año)	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.


480

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA


2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

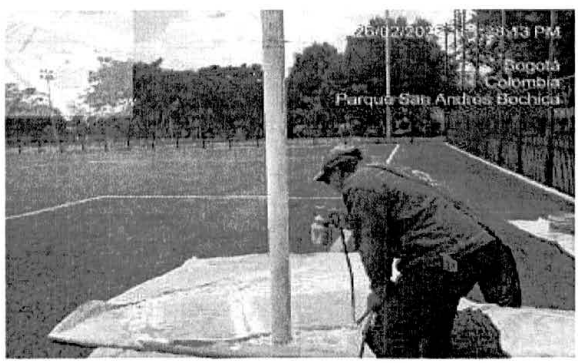




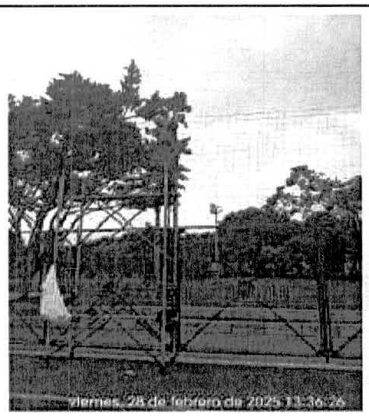







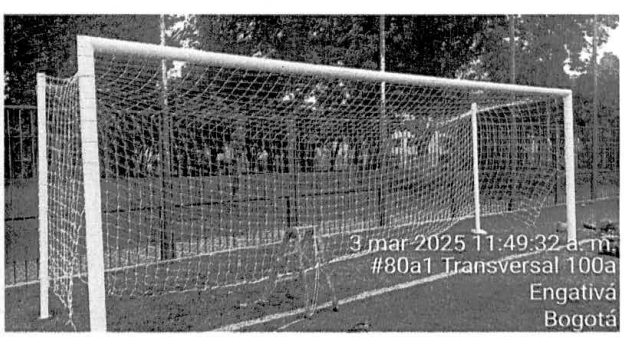

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	7.200,00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**7.200,00 m2**	**100,00%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	149	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	10000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete (*día en letras*) (7) (*día en números*) días del mes de Abril (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 11-243

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética San Andres F5

DIRECCIÓN: Carrera 102 con Calle 79 **LOCALIDAD:** Engativá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 *(Dia)*	**DE**	Noviembre *(Mes)*	**DE**	2024 *(Año)*			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 *(Dia)*	**DE**	Julio *(Mes)*	**DE**	2025 *(Año)*			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 *(Dia)*	**DE**	Julio *(Mes)*	**DE**	2025 *(Año)*			
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	4041 *(Número Contrato)*	**DE**	2024 *(Año)*	
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	4080 *(Número de Contrato)*	**DE**	2024 *(Año)*	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Tecnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA


2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

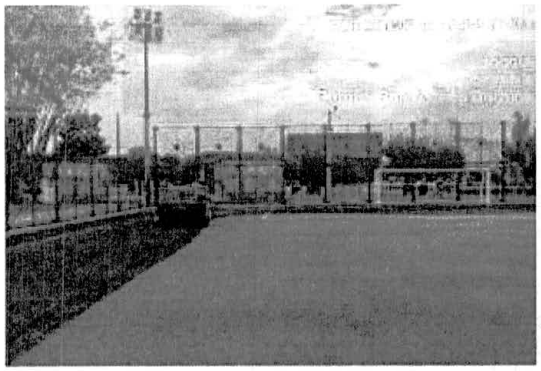




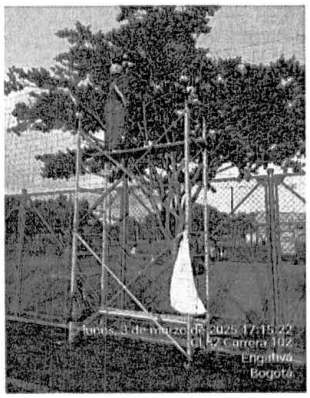





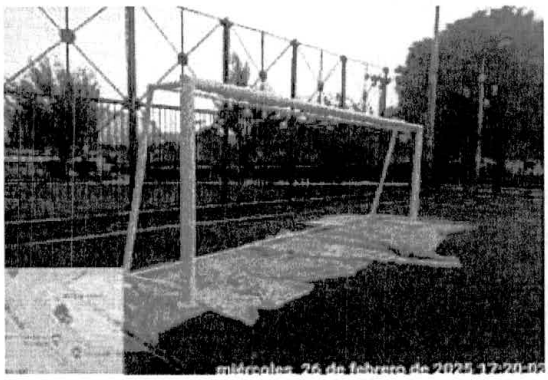



2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL : Descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	1.515,00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**1.515,00 m2**	**100,00%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

	Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
1	13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
	15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	81,75	Mantenimiento
	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
	10539	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	3000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete	(7)	días del mes de	Abril	de	2025
(día en letras)	*(día en números)*		*(mes en letras)*		*(Año)*

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de interventoría
Área Técnica
Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad IDRD

3.7. PUESTA EN SERVICIO TIBABUYES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 07 días del mes de Abril de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 11-084

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Tibabuyes 2

DIRECCIÓN: Carrera 121 C Calle 130 C **LOCALIDAD:** Suba

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20** (Día)	**DE**	**Noviembre** (Mes)	**DE**	**2024** (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19** (Día)	**DE**	**Julio** (Mes)	**DE**	**2025** (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**19** (Día)	**DE**	**Julio** (Mes)	**DE**	**2025** (Año)		
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	**4041** (Número Contrato)	**DE**	**2024** (Año)
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	**4080** (Número de Contrato)	**DE**	**2024** (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.


2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ZONA DE LA CANCHA

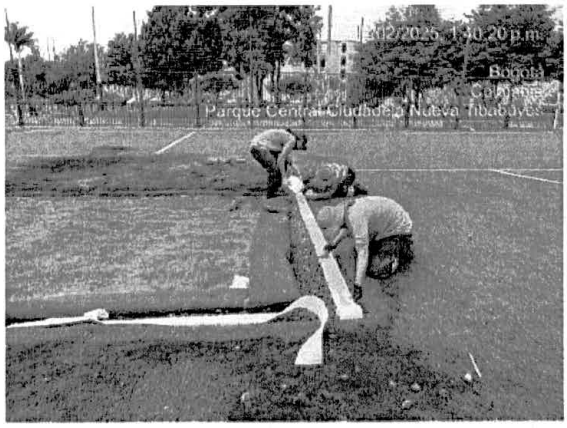










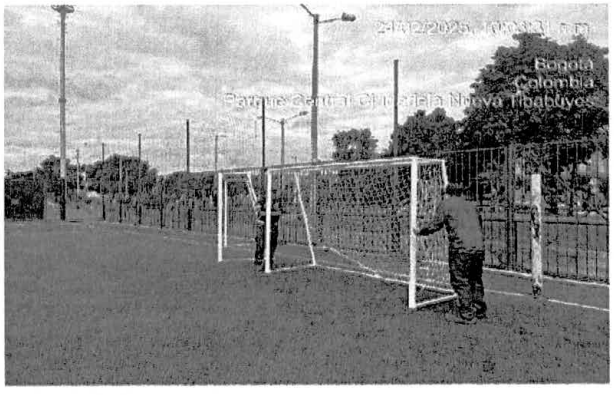





2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 2400 m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA Y GRANULO DE CAUCHO SBR	60,00 m2	2,50%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**60,00 m2**	**2,50%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	60	Nueva
13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	162,5	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	2	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	4000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Siete (7) días del mes de Abril de 2025

(día en letras) *(día en números)* *(mes en letras)* *(Año)*

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.8. PUESTA EN SERVICIO VILLAS DEL MADRIGAL

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 31 días del mes de Marzo de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 10-002

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Villas del Madrigal

DIRECCIÓN: Calle 75 C Carrera 99 B **LOCALIDAD:** Engativá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20** *(Dia)*	**DE**	**Noviembre** *(Mes)*	**DE**	**2024** *(Año)*		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19** *(Dia)*	**DE**	**Julio** *(Mes)*	**DE**	**2025** *(Año)*		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**19** *(Dia)*	**DE**	**Julio** *(Mes)*	**DE**	**2025** *(Año)*		
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	**4041** *(Número Contrato)*	**DE**	**2024** *(Año)*
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	**4080** *(Número de Contrato)*	**DE**	**2024** *(Año)*
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL


ZONA DE LA CANCHA









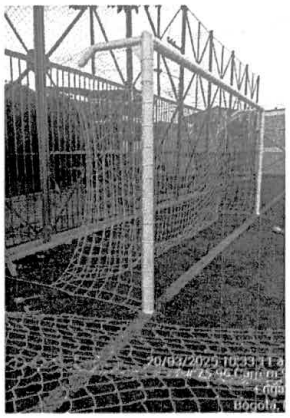







2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 1200 m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA Y GRANULO DE CAUCHO SBR	5,00 m2	0,42%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**5,00 m2**	**0,42%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	5	Nueva
13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	101	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213983386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Treinta y uno *(día en letras)* (31) *(día en números)* días del mes de Marzo *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:

(Firma)
(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de interventoría
Área Técnica
Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)
(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad IDRD

3.9. INGRESO DE MATERIALES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO 04 de Abril de 2025
RESPONSABLE Daniel Sabogal
PERIODO del 01 al 04 de abril de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	1/04/2025	TITO PABON	PINTURA TIPO 2	60	CANECAS	CANCHAS NATURALES
2	1/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	3	CANECA	JAZMIN
3	1/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	60	ML	JAZMIN
4	1/04/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	40,70	M2	JAZMIN
5	1/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	280,75	M2	JAZMIN
6	1/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	JAZMIN
7	1/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	732,6	KILOS	JAZMIN
8	1/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	8000	KILOS	JAZMIN
9	1/04/2025	BEPE	ARENA SILICE	732,6	KILOS	JAZMIN
10	2/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	2	CANECA	GORGONZOLA
11	2/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	6	ML	GORGONZOLA
12	2/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	191	M2	GORGONZOLA
13	2/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	GORGONZOLA
14	2/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	GORGONZOLA
15	2/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2500	KILOS	GORGONZOLA
16	2/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	8000	KILOS	GORGONZOLA
17	2/04/2025	BEPE	ARENA SILICE	732,6	KILOS	GORGONZOLA
18	3/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	2	CANECA	PRADERA SUR
19	3/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	22	ML	PRADERA SUR
20	3/04/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	15,65	M2	PRADERA SUR
21	3/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	153,75	M2	PRADERA SUR
22	3/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	PRADERA SUR
23	3/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	281,7	KILOS	PRADERA SUR
24	3/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1500	KILOS	PRADERA SUR
25	3/04/2025	BEPE	ARENA SILICE	281,7	KILOS	PRADERA SUR

III. OBSERVACIONES


IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

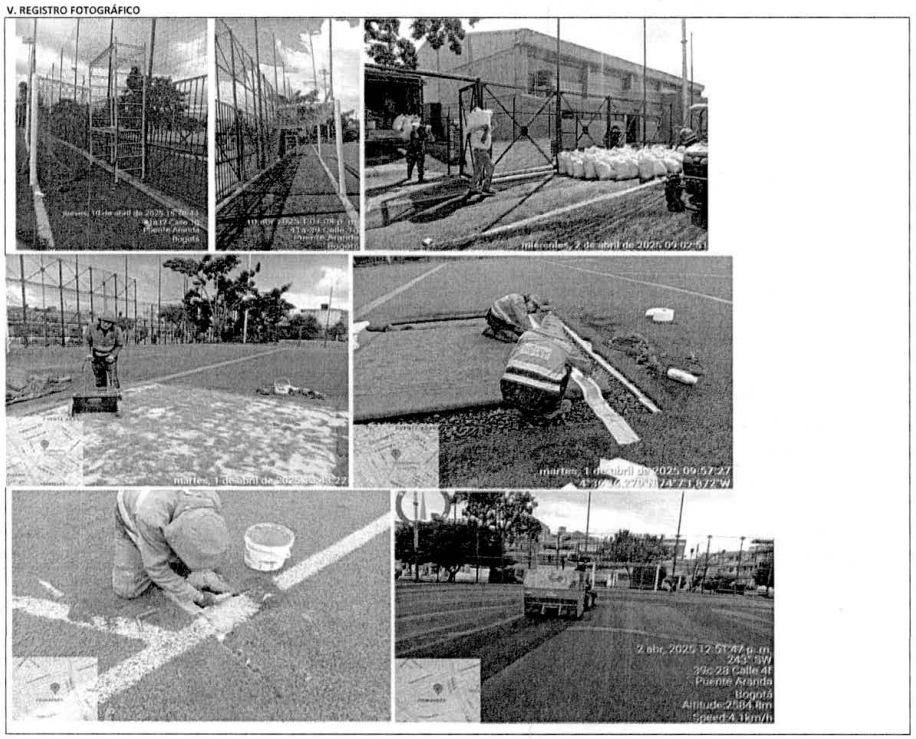

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO 11 de Abril de 2025
RESPONSABLE Daniel Sabogal
PERIODO del 07 al 11 de abril de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	7/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	347	M2	CARVAJAL
2	7/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	CARVAJAL
3	9/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	5	CANECA	MILENTA TEJAR
4	9/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	100	ML	MILENTA TEJAR
5	9/04/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	99,90	M2	MILENTA TEJAR
6	9/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	272	M2	MILENTA TEJAR
7	9/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	MILENTA TEJAR
8	9/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	MILENTA TEJAR
9	9/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1800	KILOS	MILENTA TEJAR
10	9/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	6000	KILOS	MILENTA TEJAR
11	9/04/2025	BEPE	ARENA SILICE	1800	KILOS	MILENTA TEJAR
12	9/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	120	M2	LOMBARDIA
13	9/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	LOMBARDIA
14	11/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	SANTA ISABEL 1 Y 2
15	11/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	3	ML	SANTA ISABEL 1 Y 2
16	11/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	4000	KILOS	SANTA ISABEL 1 Y 2
17						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	16 de Abril de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	del 14 al 16 de abril de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	14/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	149,75	M2	NUEVO MUZU
2	14/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	NUEVO MUZU
3	14/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1,00	JUEGO	NUEVO MUZU
4	16/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	4	CANECA	PARQUE EL RECREO
5	16/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	40	ML	PARQUE EL RECREO
6	16/04/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	79,99	M2	PARQUE EL RECREO
7	16/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1439,82	KILOS	PARQUE EL RECREO
8	16/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	7000	KILOS	PARQUE EL RECREO
9	16/04/2025	BEPE	ARENA SILICE	1439,82	KILOS	PARQUE EL RECREO

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	25 de Abril de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	del 21 al 25 de abril de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	22/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	492	M2	HAYUELOS F5
2	22/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	HAYUELOS F5
3	22/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	2	JUEGO	HAYUELOS F8
4	22/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	141,75	M2	HAYUELOS F8
5	22/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	HAYUELOS F8
6	22/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	4	CANECA	AMERICAS OCCIDENTAL
7	22/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	85	ML	AMERICAS OCCIDENTAL
8	22/04/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	83,99	M2	AMERICAS OCCIDENTAL
9	22/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1511,82	KILOS	AMERICAS OCCIDENTAL
10	22/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	AMERICAS OCCIDENTAL
11	22/04/2025	BEPE	ARENA SILICE	1511,82	KILOS	AMERICAS OCCIDENTAL
12	23/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	102,5	M2	VILLA DE LOS SAUCES
13	23/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	VILLA DE LOS SAUCES
14	23/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	VILLA DE LOS SAUCES
15	24/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	LUCES VILLA RICA
16	24/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	4	ML	LUCES VILLA RICA
17	24/04/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	2	ML	LUCES VILLA RICA
18	24/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	4000	KILOS	LUCES VILLA RICA
19	24/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	LUCES VILLA RICA
20	24/04/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	LUCES VILLA RICA

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



3.10. INSTALACION DE MATERIALES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	02-04-25
Ubicación:	Jazmin
Inspector que verifica	Carol Lopez T.
Tipo de uso del césped:	Deportivo - Campo de Futbol
Nro de Lote instalado	24N322B - E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Superz.	Material del Cesped	Monofilamento Poli
Color del Césped:	Verde/Blanco	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	02-04-2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	05-04-25
Ubicación:	Pradera Sur
Inspector que verifica	Oscar M. Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo - Campo Futbol
Nro de Lote instalado	24N322B - E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cupert	Material del Cesped	Mantenimiento Poke
Color del Césped:	Verde/Blanca	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6 cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	05-04-2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	11-04-25
Ubicación:	Milenio Tegar
Inspector que verifica	Carol Lopez I.
Tipo de uso del césped:	Deportivo - Campo de Futbol
Nro de Lote instalado	24N3228 - EBIAB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cuperz	Material del Cesped	Monofilamento Polie.
Color del Césped:	Verde / Blanca	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6 cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	
4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11 - 04 - 2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	16-04-25
Ubicación:	El Recreo
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportiva - Campo Futbol
Nro de Lote instalado	74N322B - E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cupsa	Material del Cesped	Monofilamento PE
Color del Césped:	Verde/Blanco	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	16-04-2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	22-04-25
Ubicación:	Parque Americas Occidental
Inspector que verifica	Carol Giselle Lopez T.
Tipo de uso del césped:	Deportivo - Campo de Futbol
Nro de Lote instalado	24N3228-EPIAB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cupez	Material del Cesped	Rompimiento Polietileno
Color del Césped:	Verde / Blanco	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6 cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		Si	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	22-04-2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	25-04-25
Ubicación:	Lucas Villa Rica.
Inspector que verifica	Cesar Lopez T.
Tipo de uso del césped:	Deportivo - Campo de Futbol
Nro de Lote instalado	24 N 322B - 23 1A B

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cuperz.	Material del Cesped	Monofilamento Poli.
Color del Césped:	Blanco	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Lineas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	08-04-25			
Ubicación:	Carvajal			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Beinal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occidente			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 47

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si.	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	✓		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	✓		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Beinal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	08-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	08-04-25			
Ubicación:	Cayuga 1			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Beral			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ, -Occi			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-017			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Xg

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzacol	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	NA .	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	7x 2mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si .	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si .	VB
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beral	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		08-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	10-04-25			
Ubicación:	Lombardia			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Fruzaco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	120 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		10-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	10-04-25			
Ubicación:	Lombardia			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ - Occi			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenfaco	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3x2mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OKVBN
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		10-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	11-04-25			
Ubicación:	Gargantá			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Peatonal			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224 033			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Ivenzadi	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	1'91

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	Si		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	11-04-25			
Ubicación:	Cordoba G			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Ivertaco	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	5 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		11-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	11-04-25			
Ubicación:	Granada			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Beral			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Ori - Occi			
Nro de certificado de calidad del Hilo	224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	2 JG

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzada	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas pelIgrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beltal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		11 - 04 - 2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	11-04-25			
Ubicación:	Jazmin			
Inspector que verifica	Carol Lopez T			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetro			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224 - 032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	280,75 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	11-04-25			
Ubicación:	Jazmin			
Inspector que verifica	Carol Lopez F			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-3			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol.	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	5 x 2,2 m.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	14-04-25			
Ubicación:	Milenta Tejar			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224 - 032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	a	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzacol.	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	272 m².

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	14-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	14-04-25			
Ubicación:	Milestu Tejar.			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ - Occi			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-027.			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaco	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	7,40 x 2,10 m.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No.	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		14-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	14-04-25			
Ubicación:	Milenta Tejar			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	2jg

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		14-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	14-04-25			
Ubicación:	Nuevo Muro			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetro			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-037			
Uso de la malla (marque una x).	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzado	Material de la Red	Nylon #7
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	149,75 m².

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	✓		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No.	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	✓		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	14-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	14-04-25			
Ubicación:	Nuevo Muzu			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Cr-Occ.			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-077			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Lig

2. Detalles de las redes			
Marca	Inerzaco	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red. [Medida en m.] Alto por Ancho	7,30 x 2,40m.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beiral	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		14-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	14-04-25			
Ubicación:	Nuevo Muzu			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	2,9

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzado.	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 x 2.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si.	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si.	
Estado de sistema de fijacion		Si.	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No.	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas pellgrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Keiral	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		14-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	22-04-25			
Ubicación:	Hayuelos F8			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Ramon.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetro			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	141,72m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si.	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	22-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	12-04-25			
Ubicación:	Hayuelos F8			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Beral			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1724-027.			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzara	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	NA	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7 x 2,5 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK.
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beiral	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		22-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	22-04-25			
Ubicación:	Haydelos F8			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Sur - Occi			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	2 Jgs

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol.	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A -	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	3 x 2 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	OK
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		22-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	22-04-25			
Ubicación:	Hayuelos F5			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Beinal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-037			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	


2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	492 m².

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	x		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	x		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beinal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		22-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	22-04-25			
Ubicación:	Hayuelos FS			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-823			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1Jg

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A .	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 x 2 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas pelIgrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		22-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	23-04-25			
Ubicación:	Pradera Sur			
Inspector que verifica	Carol Lopez T.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1214-037			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol.	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A .	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	153.75 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A.		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	23-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	23-04-25			
Ubicación:	Pradera Sur.			
Inspector que verifica	Carol Lopez T			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCCS PORTERIA	1JG

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol.	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK.
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Giselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		23-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	23-02-25			
Ubicación:	Villa Sauces			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Beinal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Xx

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzado	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	Fil

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si.	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beinal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		28-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	23-04-25			
Ubicación:	Villa de los Sauces			
Inspector que verifica	Oscar Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetro			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tramaco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	102,8 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	X		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		23-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

4. ANEXO C
ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de seguimiento #21	DD	MM	AA
ACTA No.	CDP-4041-2024 / CIN-4060/24	25	04	2025

LUGAR: Administracion de escenarios IDRD HORA DE INICIO: 9:30 am. HORA FIN: 10:30

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revision de Compromisos	4. Componente Ambiental
2. Componente Tecnico	5. Componente Calidad.
3. Componente SST	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados.
   1.1. Subsanación de informes de imprevistos.
   - Se cumplió están en revisión.
   1.2. Definir donde instalar los bicicleteros de criterios ponderables.
   - Pendiente por definir.
   1.3. Remitir plan de auditoria al 70 %
   - Se cumplio.
   1.4. Justificación del Polvo de ladrillo.
   - No se cumplio.

2. Tecnica:
   A corte del 20/04/2025
   % Programado: 75,33%
   % Ejecutado: 74,47%
   Atraso: 0,86 %

- Se presentó avances en las canchas Santa Isabel 1 y 2.

TEMAS TRATADOS

El Recreo, Nuevo Muzu, Pradera Sur, Gorgonzola, Jazmin y Carvajal.

- Se recibió el presupuesto de Pradera Sur corregido y el Recreo. Conforme el presupuesto radicado se tenia un saldo de 118 millones, que incluyendo la cancha de El Recreo, que tiene un valor de 70 millones, disminuiria a 48 millones el saldo.
- Tambien se ajustó el valor de Pradera Sur de 15 millones a 19 millones, porque se incluyó cambio de grama sintética que no estaba contemplado, restándole otros 4 millones al saldo, quedando en 44 millones aproximadamente.
- El Contratista aclara que, actualizando los presupuestos al acta parcial, el saldo aproximado es de 119 millones, ya que hubo parches de grama que no se instalaron y se realizaron pegues, que queda pendiente como se va a realizar el pago de esa actividad.

- Se remitieron a la Arq por correo las actas de puesta en servicio de:
  - San Andres 1 y 2
  - Carmelo F5 y F11
  - Florencia Tronquitos
  - La Europa
  - Marsella Sintética
  - Normandia
  - Tibabuyes
  - Villas de Madrigal.

  No se han recibido firmadas para hacer la radicación formal.

- Se tienen listas para entrega las canchas de:
  - Villa de los Sauces
  - Nuevo Muzu
  - Carvajal
  - Alqueria (Natural)
  - Gaitana (Natural)
  - Juan Amarillo (Natural)
  - Gorgonzola
  - Hayuelos F5 y F8
  - Lombardia
  - Milenta Tejar
  - Jazmin.

TEMAS TRATADOS

- Se fan en elaboración las actas de puesta en servicio de estos campos para enviar para firma.

- La entidad aclara que la cancha de Alquería entra a ser usada para torneos, razón por la cual solicita al contratista disponer de una persona que se encuentre allí para realizar la demarcación los días sabados y domingos, hasta el 2 de junio. Se debe hacer demarcación de la cancha el día viernes.

- No se evidenció avance en la aplicación de polvo de ladrillo, ni se recibió la justificación respecto al precio de la actividad que había indicado el contratista.

- El contratista indica que tiene pendientes unas cotizaciones para remitir la justificación.

- La entidad solicita que la remisión de la justificación sea lo mas pronto posible, debido a la necesidad del uso de la cancha donde se requiere.

- Ya se radicaron ante el IDRD los diagnosticos de las canchas.

- Respecto a la adición, la entidad indica que posblemente la proxima semana se tendra ya la adición. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al contratista realizar la proyección de las programaciones de las canchas a intervenir en la adición.

- De los informes de imprevistos se evidencio varias canchas donde no se han hecho los mantenimientos rutinarios, razon por la cual la entidad solicita la remisión de las canchas que no se han intervenido.

TEMAS TRATADOS

- Se deben remitir las actas de terminación de las canchas ejecutadas.
- Se solicita presupuesto para mantenimiento de los arcos de Rugby.

3. Componente SST:
   - En los frentes de obra activos se evidencia el uso de dotación institucional al personal operativo.
   - Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.

4. Componente Ambiental:
   - Durante el periodo del reporte se verifica que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto, como la instalación de un punto ecológico, la identificación de sustancias químicas y suministro de hojas de seguridad. Con relación a la protección de sumideros e individuos arbóreos, se aclara que no se ha requerido su implomentacion debido a la ausencia de estos en los polígonos intervenidos a la fecha.

   - A la fecha no se ha allegado la certificación solicitada por la interventoría en el comité anterior.

5. Componente Calidad:
   - Se envian observaciones al informe 5, a la fecha no han sido atendidas.
   - No se realiza reporte semanal de materiales, lo que no permite realizar seguimiento y trazabilidad de los mismos de forma adecuada.
   - El contratista presenta plan de auditoria de avance al 70%, La cual se realizará el 29 de abril.

2. Tecnico: la proxima semana se inicia Chicala y Alfonso Lopez.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Justificación del polvo de ladrillo	Contratista	28/04/25
Subsanación informe de calidad	Contratista	30/04/25
Radicación acta parcial	Contratista	30/04/25
Definición donde instalar bicicleteros	IDRD	Pendiente.
Certificación del Proveedor para seguimiento ambiental	Contratista	28/04/25
Reporte de ingreso de material	Contratista	28/04/25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) SI en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Cale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Cale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Cale.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento #21 COP-4041-2024 RESPONSABLE DEL EVENTO

FECHA 25 04 2025 HORA INICIAL 9:30 HORA FINAL LUGAR Administración de escenarios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Brayan Stiven García	1024483458	Residente	Innovaparques		Contratista	consorcioinnovapar2024@gmail.com	3117131601
2	Keidy Mayerli Cortés Roto	1082785099	Apoyo	Consorcio Innovaparques	Keidy M Cortés	contratista	consorcioinnovaparques24@gmail.com	3112542461
3	Cristhian Correa Noriega	1020737915	Apoyo a supervisión	IDRD-STP		Contratista	cristhian.correa@idrd.gov.co	3017387479
4	Liliana P. Pinzón S.	52690947	Contratista	IDRD-STP		Contratista	lilipaola6@gmail.com	3203409620
5	JORGE MADERO G.	79424228	CONTRATISTA	IDRD-STP		IDRD	—	—
6	Raul O Delgado C	79573492	Director	CST028-Int		Interventoría	—	—
7	MARGARITA HERRERA GALVIS	52539792	Coordinadora proyectos.	CST028 Int		Interrent.	proyectos2@sdinvsas.com	3143396020.
8	Diego Andres Gale F	1019019919	Inspector Int.	CST. 28		Interventoría	proyectos2@sdinvsas.com	—
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL- V.5

ACTA DE COMITÉ NRO.	FECHA DE REUNIÓN	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
18				
ACTA DE COMITÉ NRO.	FECHA DE REUNIÓN	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
19				
ACTA DE COMITÉ NRO.	FECHA DE REUNIÓN	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
20		Subsanciones de informes de imprevistos	Compromiso cumplido	
		Definir donde instalar los bicicleteros de criterio ponderable	Abierto	
		Remitir plan de auditoria al 70%	Compromiso cumplido	
		Justificacción del polvo de ladrillo	Abirto	
ACTA DE COMITÉ NRO.	FECHA DE REUNIÓN	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
21	25/04/2025	Justificación del polvo de ladrillo		
		subsanación informe de calidad		
		Radicación acta parcial		
		Definición donde instalar bicicleteros		
		Certificaci¨on del proveedor para seguimiento ambiental		
		Reporte de ingresos de material		

5. ANEXO D
CONTROL DE DOCUMENTOS

5.1. BALANCE

MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA				
ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES	
CEPILLADO	333.00	$ 492.946	$	164.151.018
BORDEO	54.00	$ 15.486	$	836.244
FUMIGACION	7.759,40	$ 247	$	1.916.572
PODA DE ZONA VERDE	9.941,53	$ 840	$	8.350.885
VALOR TOTAL POR MES CAMPOS SINTETICOS INCLUIDO AIU			$	175.254.719

MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA NATURAL				
ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES	
CORTE CAMPO DE FUTBOL	104.00	$ 423.292	$	44.022.368
BORDEO	91.00	$ 15.486	$	1.409.226
FUMIGACION	7759.40	$ 247	$	1.916.572
DEMARCACION	78.00	$ 303.891	$	23.702.718
PODA ZONA VERDE	7227.50	$ 840	$	6.071.100
PODA COUNTRY	5.00	$ 2.266.116	$	11.330.580
VALOR TOTAL POR MES CAMPOS NATURALES INCLUIDO AIU			$	88.452.564

VALOR TOTAL POR 8 MESES CAMPOS NATURALES INCLUIDO AIU	$	659.151.764
VALOR TOTAL POR 8 MESES CAMPOS SINTETICOS INCLUIDO AIU	$	1.155.671.201
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$	1.814.822.965

0

No. CANCHAS	VALOR MANTENIMIENTOS CORREPTIVOS	TOTAL	ESTADO	TIPO DE CAMPO	$ 3.286.740.688,37
1	TOBERIN F11	$ 55.282.724,00	EJECUTADO	SINTÉTICO	
2	ALAMEDA CALLE 170	$ 35.115.454,11	EJECUTADO	SINTÉTICO	
3	VERBENAL	$ 24.845.018,66	EJECUTADO	SINTÉTICO	
4	CEDRITOS	$ 33.011.163,78	EJECUTADO	SINTÉTICO	
5	SERVITA F11	$ 54.008.834,68	EJECUTADO	SINTÉTICO	
6	PIJAOS	$ 1.442.442.316,11	EJECUTADO	SINTÉTICO	
7	PALERMO SUR	$ 198.518.360,74	EJECUTADO	SINTÉTICO	
8	MIRAVALLE F8-1	$ 15.532.397,95	EJECUTADO	SINTÉTICO	
9	MIRAVALLE F8 -2	$ 26.449.359,47	EJECUTADO	SINTÉTICO	
10	MIRAVALLE F5	$ 10.863.850,32	EJECUTADO	SINTÉTICO	
11	MARRUECOS	$ 22.242.023,38	EJECUTADO	SINTÉTICO	
12	BURGOS BRITALIA 1	$ 53.060.466,92	EJECUTADO	SINTÉTICO	
13	BURGOS BRITALIA 2	$ 16.560.327,89	EJECUTADO	SINTÉTICO	
14	TIBABUYES 2	$ 48.256.131,32	EJECUTADO	SINTÉTICO	
15	SAN ANDRES F11	$ 65.249.241,94	EJECUTADO	SINTÉTICO	
16	SAN ANDRES F5	$ 20.971.470,77	EJECUTADO	SINTÉTICO	
17	CARMELO F11	$ 87.096.934,44	EJECUTADO	SINTÉTICO	
18	CARMELO F5	$ 17.040.040,06	EJECUTADO	SINTÉTICO	
19	MALLAS FRAGUA	$ 5.954.603,45	EJECUTADO	SINTÉTICO	
20	MALLAS FONTANAR F11	$ 5.954.603,45	EJECUTADO	SINTÉTICO	
21	MALLAS FONTANAR F5	$ 1.944.800,33	EJECUTADO	SINTÉTICO	
22	ASPERSORES TABORA	$ 1.720.530,43	EJECUTADO	NATURAL	
23	FLORENCIA TRONQUITOS	$ 18.282.284,28	EN EJECUCION	SINTÉTICO	
24	LA EUROPA	$ 14.658.300,51	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
25	NORMANDIA	$ 38.661.226,80	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
26	VILLAS DE MADRIGAL	$ 18.428.895,50	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
27	MARSELLA F5 - SINTÉTICA	$ 19.076.255,58	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
28	CAFAM SUBA GAVILANES	$ 41.516.961,24	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
29	VILLA SAUCES	$ 18.838.390,57	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
30	NUEVO MUZU - MALLAS CERRAMIENTO, ARCOS Y MNTO ARCOS	$ 10.907.277,44	PROGRAMADO	SINTETICO	Mallas de cerramiento y arcos, mantenimiento arcos, solicitud Arq. Liliana
31	CARVAJAL - MALLAS CERRAMIENTO, ARCOS Y MNTO ARCOS	$ 10.571.823,83	PROGRAMADO	SINTÉTICO	Mallas de cerramiento y arcos, mantenimiento arcos, solicitud Arq. Liliana
32	GAITANA GRAMA NATURAL	$ 65.282.132,04	PROGRAMADO	NATURAL	
33	ALQUERÍA GRAMA NATURAL	$ 58.491.300,65	EN EJECUCIÓN	NATURAL	
34	JUAN AMARILLO GRAMA NATURAL	$ 58.454.824,26	PROGRAMADO	NATURAL	
35	MARSELLA GRAMA NATURAL	$ 71.565.948,02	PROGRAMADO	NATURAL	
36	PRO PLAYA - ROTOVO	$ 1.754.746,27	PROGRAMADO	OTRO	
37	COMPLEJO ACUÁTICO - ROTOVO	$ 613.887,74	PROGRAMADO	OTRO	
38	CIUDAD MONTES PLAYA - ROTOVO	$ 1.134.816,25	PROGRAMADO	OTRO	
39	CIUDAD MONTES SOTBOL - ROTOVO Y POLVO DE LADRILLO	$ 5.300.019,62	PROGRAMADO	OTRO	
40	UDS PLAYA - ROTOVO	$ 1.291.162,18	PROGRAMADO	OTRO	
41	UDS SOFTBOL - ROTOVO Y POLVO DE LADRILLO	$ 5.738.296,47	PROGRAMADO	OTRO	
42	UDS BEISBOL - ROTOVO Y POLVO DE LADRILLO	$ 6.686.836,33	PROGRAMADO	OTRO	
43	TUNAL SOFTBOL - ROTOVO Y POLVO DE LADRILLO	$ 5.282.473,04	PROGRAMADO	OTRO	
44	FONTANAR MINI BEISBOL - POLVO DE LADRILLO	$ 1.381.352,73	PROGRAMADO	OTRO	
45	GAITANA PLAYA - ROTOVO	$ 1.281.676,14	PROGRAMADO	OTRO	
46	GORGONZOLA	$ 59.038.164,07	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
47	HAYUELOS F8	$ 45.189.116,76	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
48	HAYUELOS F5	$ 27.833.071,83	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
49	LOMBARDIA - SUBA	$ 16.677.421,35	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
50	CHICALÁ	$ 64.087.766,88	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
51	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS - MALLAS CERRAMIENTO, ARCOS Y MNTO ARCOS	$ 4.386.693,42	PROGRAMADO	SINTÉTICO	Mallas de cerramiento y arcos, mantenimiento arcos
52	MILENTA TEJAR - SINTÉTICA	$ 70.456.455,76	PROGRAMADO	SINTÉTICO	

53	JAZMIN	$	69.247.690,00	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
54	ALFONSO LOPEZ	$	26.568.706,93	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
55	LUCES VILLA RICA	$	43.080.315,85	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
56	SANTA ISABEL I	$	27.995.938,81	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
57	SANTA ISABEL 2	$	16.735.641,70	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
58	PRADERA SUR	$	15.110.628,57	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
59	AMERICAS OCC	$	59.165.936,12	PROGRAMADO	SINTÉTICO	
60	PORVENIR I - MALLAS CERRAMIENTO Y ARCOS	$	2.012.399,31	PROGRAMADO	SINTÉTICO	Mallas de cerramiento y arcos
61	PORVENIR MINI - MALLAS CERRAMIENTO Y ARCOS	$	2.012.399,31	PROGRAMADO	SINTÉTICO	Mallas de cerramiento y arcos
	GASTOS CONTINGENTES - POR ASIGNAR	$	118.436.346,63			
	TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$	3.385.177.035			
	TOTAL MANTENIMIENTO A 28-02-2025	$	5.200.000.000			
	VALOR CONTRACTUAL	$	5.200.000.000			
	SALDO ACTUAL	$	-			

RESUMEN	Sintética	Natural	Arena	Beisbol	Softbol	Subtotal	% ejecución	Valor ejecución correctivos
Total canchas intervenidas	21	1	0	0	0	22	36%	$ 2.242.120.604,19
Total canchas programadas	25	4	5	2	3	39	64%	$ 1.024.620.084,18
Total canchas con presupuesto contractual	**46**	**5**	**5**	**2**	**3**	**61**	**100%**	**$ 3.266.740.688,37**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

545

PARQUE TOBERIN COD: 01-079

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	4191,20	$ 1.722,58	$ 1.235,00	$ 5.176.131,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	4191,20	$ 1.188,37	$ 852,00	$ 3.570.902,00
01.05.01	10561	01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	2,00	$ 4.495.037,30	$ 3.222.711,00	$ 6.445.422,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.002,79	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	3,00	$ 112.935,56	$ 80.969,00	$ 242.907,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	111,05	$ 16.769,68	$ 12.023,00	$ 1.335.154,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000,00	$ 3.707,38	$ 2.658,00	$ 13.290.000,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	40,00	$ 218.993,36	$ 157.007,00	$ 6.280.280,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	40,00	$ 33.886,67	$ 24.295,00	$ 971.800,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 39.634.875,00**
						AIU	**$ 15.647.849,00**
						VALOR TOTAL	**$ 55.282.724,00**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE ALAMEDA CALLE 170 COD: 01-540

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIL)	Valor unitario OFERTADO Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,45	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	961,86	$ 1.722,58	$ 1.235,00	$ 1.187.897,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	961,86	$ 1.188,37	$ 852,00	$ 819.505,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	108,50	$ 16.769,68	$ 12.023,00	$ 1.304.496,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.707,38	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
01.12.02.07.01	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	78,94	$ 218.993,36	$ 157.007,00	$ 12.394.133,00
01.12.02.07.04	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	78,94	$ 33.886,67	$ 24.295,00	$ 1.917.847,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 25.175.978,00
						AIU	$ 9.939.476,11
						VALOR TOTAL	$ 35.115.454,11

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE VERBENAL COD: 01-313

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,45	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	678,16	$ 1.722,58	$ 1.235,00	$ 837.527,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	678,16	$ 1.188,37	$ 852,00	$ 577.792,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	84,25	$ 16.739,68	$ 12.023,00	$ 1.012.938,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.707,38	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	43,20	$ 218.993,36	$ 157.007,00	$ 6.782.702,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	43,20	$ 33.886,67	$ 24.295,00	$ 1.049.544,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 17.812.603,00**
						AIU	**$ 7.032.415,66**
						VALOR TOTAL	**$ 24.845.018,66**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE CEDRITOS COD: 01-031

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,45	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	2253,30	$ 1.722,58	$ 1.235,00	$ 2.782.826,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	2253,30	$ 1.188,37	$ 852,00	$ 1.919.812,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 1.386.630,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 2.788.644,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80,40	$ 16.739,68	$ 12.023,00	$ 966.649,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	3000,00	$ 3.707,38	$ 2.658,00	$ 7.974.000,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	22,00	$ 218.993,36	$ 157.007,00	$ 3.454.154,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	22,00	$ 33.886,67	$ 24.295,00	$ 534.490,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 23.667.274,00**
						AIU	**$ 9.343.839,78**
						VALOR TOTAL	**$ 33.011.113,78**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE SERVITA F11 COD: 01-023

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	8267,20	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 10.212.493,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	8267,20	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 7.041.464,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 462.210,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	280,50	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 3.372.516,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 13.292.228,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	16,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 2.512.108,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	16,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 388.724,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 38.721.562,00
						AIU	$ 15.287.272,68
						VALOR TOTAL	$ 54.008.834,68

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE PIJAOS COD: 18-090

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.09	12492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	5276,88	$ 17.447,55	$ 12.509,00	$ 66.008.492,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	2,00	$ 529.421,45	$ 379.568,00	$ 759.136,00
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	8,00	$ 93.115,45	$ 66.759,00	$ 534.072,00
01.05.01	10561	01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	2,00	$ 4.495.037,30	$ 3.222.711,00	$ 6.445.422,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.690,51	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.002,79	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	146,25	$ 16.769,68	$ 12.023,00	$ 1.758.364,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	5276,88	$ 218.993,36	$ 157.007,00	$ 828.507.098,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	5276,88	$ 33.883,67	$ 24.295,00	$ 128.201.800,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA		$ 1.034.157.095,00
						AIU	$ 408.285.221,11
						VALOR TOTAL	$ 1.442.442.316,11

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE PALERMO SUR COD: 18-035

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor Unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.09	12492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	714,61	$ 17.447,55	$ 12.509,00	$ 8.939.056,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,45	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	8,00	$ 93.115,45	$ 66.759,00	$ 534.072,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.690,51	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.800,33	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	88,00	$ 16.769,68	$ 12.023,00	$ 1.058.024,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	714,61	$ 218.993,36	$ 157.007,00	$ 112.198.772,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	714,61	$ 33.886,67	$ 24.295,00	$ 17.361.450,00
						VALOR OFERTA ECONÓMICA	**$ 142.327.474,00**
						AIU	**$ 56.190.886,74**
						VALOR TOTAL	**$ 198.518.360,74**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE MIRAVALLE F8-1 COD: 05-042

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,03	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	854,96	$ 1.722,58	$ 1.235,00	$ 1.055.876,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	854,96	$ 1.188,37	$ 852,00	$ 728.426,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.800,33	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80,00	$ 16.769,88	$ 12.023,00	$ 961.840,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.707,38	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
01.12.02.07.(	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	1,00	$ 218.993,36	$ 157.007,00	$ 157.007,00
						VALOR OFERTA ECONÓMICA	$ 11.135.932,00
						AIU	$ 4.396.465,95
						VALOR TOTAL	$ 15.532.397,95

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE MIRAVALLE F8-2 COD: 05-042

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1350,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.667.250,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1350,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 1.150.200,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 1.386.630,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 2.788.644,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	119,50	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.436.749,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	1500,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 3.987.000,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	20,00	$ 218.993,00	$ 157.007,00	$ 3.140.140,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	20,00	$ 33.887,00	$ 24.295,00	$ 485.900,00
						VALOR OFERTA ECONÓMICA	$ 18.962.833,00
						AIU	$ 7.486.526,47
						VALOR TOTAL	$ 26.449.359,47

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE MIRAVALLE F5 COD: 05-042

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	600,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 741.000,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	600,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 511.200,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 961.840,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	1000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 2.658.000,00
						VALOR OFERTA ECONÓMICA	$ 7.788.823,00
						AIU	$ 3.075.027,32
						VALOR TOTAL	$ 10.863.850,32

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE MARRUECOS COD: 18-041

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1315,84	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.625.062,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1315,84	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 1.121.096,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 961.840,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
01.12.02.07.(	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	20,00	$ 218.993,00	$ 157.007,00	$ 3.140.140,00
01.12.02.07.(	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	20,00	$ 33.887,00	$ 24.295,00	$ 485.900,00
						VALOR OFERTA ECONOMICA	**$ 15.946.389,00**
						AIU	**$ 6.295.634,38**
						VALOR TOTAL	**$ 22.242.023,38**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE BURGOS BRITALIA - 1 COD: 11-058

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1050,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.296.750,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1050,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 894.600,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	127,50	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.532.933,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	141,78	$ 218.993,00	$ 157.007,00	$ 22.260.452,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	141,78	$ 33.887,00	$ 24.295,00	$ 3.444.545,00
						VALOR OFERTA ECONÓMICA	**$ 38.041.631,00**
						AIU	**$ 15.018.835,92**
						VALOR TOTAL	**$ 53.060.466,92**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE BURGOS BRITALIA - 2 COD: 11-058

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1050,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.296.750,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1050,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 894.600,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120,50	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.448.772,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
						VALOR OFERTA ECONÓMICA	**$ 11.872.905,00**
						AIU	**$ 4.687.422,89**
						VALOR TOTAL	**$ 16.560.327,89**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE TIBABUYES 2 COD: 11-084

I. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.948,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	2400,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 2.964.000,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	2400,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 2.044.800,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	2,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 924.420,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 2.788.644,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	12,00	$ 112.935,00	$ 80.969,00	$ 971.628,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	162,50	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.953.738,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	4000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 10.632.000,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	60,00	$ 218.993,00	$ 157.007,00	$ 9.420.420,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	60,00	$ 33.887,00	$ 24.295,00	$ 1.457.700,00
						VALOR OFERTA ECONÓMICA	**$ 34.597.169,00**
						AIU	**$ 13.658.962,32**
						VALOR TOTAL	**$ 48.256.131,32**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE ANDRES F11 COD: 10-234

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	7200,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 8.892.000,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	7200,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 6.134.400,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	149,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.791.427,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	10000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 26.580.000,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 46.780.357,00**
						AIU	**$ 18.468.884,94**
						VALOR TOTAL	**$ 65.249.241,94**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD		PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%		35,48%
1,00%		1,00%
3,00%		3,00%
39,48%		**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE SAN ANDRÉS F5 COD: 10-234

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1515,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.871.025,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1515,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 1.290.780,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	81,75	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 982.880,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	3000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 7.974.000,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 15.035.468,00**
						AIU	**$ 5.936.002,77**
						VALOR TOTAL	**$ 20.971.470,77**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

CARMELO F11 COD: 10-169

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.478.838,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 529.421,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	8750,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 15.076.250,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	8750,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 10.395.000,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 644.691,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 2.065.003,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	215,25	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 3.609.743,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 18.540.000,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	39,96	$ 218.993,00	$ 157.007,00	$ 8.750.960,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	39,96	$ 33.887,00	$ 24.295,00	$ 1.354.125,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 62.444.031,00**
						AIU	**$ 24.652.903,44**
						VALOR TOTAL	**$ 87.096.934,44**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE CARMELO F5 COD: 10-169

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1433,71	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.770.632,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1433,71	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 1.221.521,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	82,50	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 991.898,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
						VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)	**$ 12.216.834,00**
						AIU	**$ 4.823.206,06**
						VALOR TOTAL	**$ 17.040.040,06**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE FRAGUA F11 COD: 15-040

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 2.788.644,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 4.269.145,00**
						AIU	**$ 1.685.458,45**
						VALOR TOTAL	**$ 5.954.603,45**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE FONTANAR F11 COD:

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 2.788.644,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 4.269.145,00**
						AIU	**$ 1.685.458,45**
						VALOR TOTAL	**$ 5.954.603,45**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE FONTANAR F11 COD:

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)							$ 1.394.322,00
						AIU	$ 550.478,33
						VALOR TOTAL	$ 1.944.800,33

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE TABORA COD:

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.09.06	12479	06 Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	UN	2,00	$ 860.265,00	$ 616.766,00	$ 1.233.532,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 1.233.532,00**
						AIU	**$ 486.998,43**
						VALOR TOTAL	$ 1.720.530,43

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE FLORENCIA TRONQUITOS COD: 10-028

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1008,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.244.880,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1008,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 858.816,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	199,50	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 2.398.589,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 13.114.636,00**
						AIU	**$ 5.177.658,29**
						VALOR TOTAL	**$ 18.292.294,29**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE LA EUROPA COD: 10-045

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	840,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.037.400,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	840,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 715.680,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	122,50	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.472.818,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	1500,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 3.987.000,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 10.509.249,00**
						AIU	**$ 4.149.051,51**
						VALOR TOTAL	**$ 14.658.300,51**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE NORMANDIA COD: 10-190

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	5000,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 6.175.000,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	5000,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 4.260.000,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	95,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.142.185,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	4800,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 12.758.400,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 27.718.115,00**
						AIU	**$ 10.943.111,80**
						VALOR TOTAL	**$ 38.661.226,80**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE VILLAS DE MADRIGAL COD: 10-002

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1200,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.482.000,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1200,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 1.022.400,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	101,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.214.323,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	5,00	$ 218.993,00	$ 157.007,00	$ 785.035,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	4,00	$ 33.887,00	$ 24.295,00	$ 97.180,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 13.213.289,00**
						AIU	**$ 5.216.606,50**
						VALOR TOTAL	**$ 18.429.895,50**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD		PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%		35,48%
1,00%		1,00%
3,00%		3,00%
39,48%		**39,48%**

CONSTRUCTORA INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE MARSELLA F5 COD: 08-066

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1309,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.616.615,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1309,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 1.115.268,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 1.394.322,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	194,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 2.332.462,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 5.316.000,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 13.676.696,00**
						AIU	**$ 5.399.559,58**
						VALOR TOTAL	**$ 19.076.255,58**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD: 11-1101

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	5000,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 6.175.000,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	5000,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 4.260.000,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2		$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ -
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	6000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 15.948.000,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 29.765.530,00**
						AIU	**$ 11.751.431,24**
						VALOR TOTAL	**$ 41.516.961,24**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE VILLA DE LOS SAUCES COD: 08-180

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1500,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 1.852.500,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1500,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 1.278.000,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	0,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ -
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	0,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ -
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 961.840,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	3000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,00	$ 7.974.000,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 13.506.159,00**
						AIU	**$ 5.332.231,57**
						VALOR TOTAL	**$ 18.838.390,57**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE NUEVO MUZU COD: 06-017

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 1.386.630,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 2.788.644,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	180,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 2.164.140,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 7.819.915,00
						AIU	$ 3.087.302,44
						VALOR TOTAL	$ 10.907.217,44

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD		PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%		35,48%
1,00%		1,00%
3,00%		3,00%
39,48%		**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE CARVAJAL COD:

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 1.386.630,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 2.788.644,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.05.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	160,00	$ 16.770,00	$ 12.023,00	$ 1.923.680,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 7.579.455,00
						AIU	$ 2.992.368,83
						VALOR TOTAL	$ 10.571.823,83

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE GAITANA NATURAL COD:

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 492.946,00	$ 353.417,00	$ -
01.02.03	10723	03 Relleno en arena de rio suelta**	M3	36,00	$ 388.517,00	$ 278.547,00	$ 10.027.692,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.03.06	12468	06 Verticutter + ayudante **	M2	7523,00	$ 1.358,00	$ 974,00	$ 7.327.402,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	7523,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 9.290.905,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	7523,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 6.409.596,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	7523,00	$ 247,00	$ 177,00	$ 1.331.571,00
01.04.06	12164	06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	300,00	$ 5.635,00	$ 4.040,00	$ 1.212.000,00
01.04.08	12352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	7523,00	$ 840,00	$ 602,00	$ 4.528.846,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 1.386.630,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,00	$ 2.788.644,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	8,00	$ 112.935,00	$ 80.969,00	$ 647.752,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 46.811.107,00**
						AIU	**$ 18.481.025,04**
						VALOR TOTAL	**$ 65.292.132,04**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE ALQUERIA NATURAL COD:

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.02.03	10723	03 Relleno en arena de rio suelta**	M3	36,00	$ 388.517,00	$ 278.547,00	$ 10.027.692,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.03.06	12468	06 Verticutter + ayudante **	M2	8000,00	$ 1.358,00	$ 974,00	$ 7.792.000,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	8000,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 9.880.000,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	8000,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 6.816.000,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	8000,00	$ 247,00	$ 177,00	$ 1.416.000,00
01.04.06	12164	06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	200,00	$ 5.635,00	$ 4.040,00	$ 808.000,00
01.04.08	12352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	8000,00	$ 840,00	$ 602,00	$ 4.816.000,00
		VALOR OFERTA ECONOMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 41.935.260,00**
						AIU	**$ 16.556.040,65**
						VALOR TOTAL	**$ 58.491.300,65**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE JUAN AMARILLO NATURAL COD:

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.02.03	10723	03 Relleno en arena de rio suelta**	M3	36,00	$ 388.517,00	$ 278.547,00	$ 10.027.692,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.03.06	12468	06 Verticutter + ayudante **	M2	7888,00	$ 1.358,00	$ 974,00	$ 7.682.912,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	7888,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 9.741.680,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	7888,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 6.720.576,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	7888,00	$ 247,00	$ 177,00	$ 1.396.176,00
01.04.06	12164	06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	300,00	$ 5.635,00	$ 4.040,00	$ 1.212.000,00
01.04.08	12352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	7888,00	$ 840,00	$ 602,00	$ 4.748.576,00
		VALOR OFERTA ECONOMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 41.909.180,00**
						AIU	**$ 16.545.744,26**
						VALOR TOTAL	**$ 58.454.924,26**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE MARSELLA F11 NATURAL COD: 08-066

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.02.03	10723	03 Relleno en arena de rio suelta**	M3	36,00	$ 388.517,00	$ 278.547,00	$ 10.027.692,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,00	$ 379.568,00
01.03.06	12468	06 Verticutter + ayudante **	M2	8045,00	$ 1.358,00	$ 974,00	$ 7.835.830,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	8045,00	$ 1.723,00	$ 1.235,00	$ 9.935.575,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	16090,00	$ 1.188,00	$ 852,00	$ 13.708.680,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	8045,00	$ 247,00	$ 177,00	$ 1.423.965,00
01.04.06	12164	06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	300,00	$ 5.635,00	$ 4.040,00	$ 1.212.000,00
01.04.08	12352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	8045,00	$ 840,00	$ 602,00	$ 4.843.090,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,00	$ 462.210,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,00	$ 1.480.501,00
		VALOR OFERTA ECONOMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 51.309.111,00**
						AIU	**$ 20.256.837,02**
						VALOR TOTAL	**$ 71.565.948,02**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE PRD PLAYA COD: 12-091

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	8,00	$ 148.238,00	$ 106.279,04	$ 850.232,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	159,60	$ 247,00	$ 177,09	$ 28.263,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 1.258.063,00
						AIU	$ 496.683,27
						VALOR TOTAL	$ 1.754.746,27

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE COMPLEJO ACUÁTICO COD: 12-1000

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN		$ 529.421,00	$ 278.547,00	$ -
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	4,00	$ 148.238,00	$ 106.279,00	$ 425.116,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	84,80	$ 247,00	$ 177,00	$ 15.010,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					$ 440.126,00
						AIU	$ 173.761,74
						VALOR TOTAL	$ 613.887,74

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE CIUDAD MONTES PLAYA COD: 16-112

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	4,00	$ 148.238,00	$ 106.279,00	$ 425.116,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	50,40	$ 247,00	$ 177,00	$ 8.921,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 813.605,00
						AIU	$ 321.211,25
						VALOR TOTAL	$ 1.134.816,25

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE CIUDAD MONTES SOFTBOL COD: 16-112

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.02.10	760	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	8,00	$ 460.451,00	$ 330.119,73	$ 2.640.958,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	5,00	$ 148.238,00	$ 106.279,04	$ 531.395,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	1400,00	$ 247,00	$ 177,09	$ 247.921,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 3.799.842,00**
						AIU	**$ 1.500.177,62**
						VALOR TOTAL	**$ 5.300.019,62**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE UDS PLAYA COD: 10-290

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	5,00	$ 148.238,00	$ 106.279,04	$ 531.395,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	83,20	$ 247,00	$ 177,09	$ 14.734,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 925.697,00
						AIU	$ 365.465,18
						VALOR TOTAL	$ 1.291.162,18

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE UDS SOFTBOL COD: 10-290

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.02.10	760	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	8,00	$ 460.451,00	$ 330.119,73	$ 2.640.958,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	5,00	$ 148.238,00	$ 106.279,04	$ 531.395,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	3174,40	$ 247,00	$ 177,09	$ 562.143,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 4.114.064,00**
						AIU	**$ 1.624.232,47**
						VALOR TOTAL	**$ 5.738.296,47**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE UDS BEISBOL COD: 10-290

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.02.10	760	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	8,00	$ 460.451,00	$ 330.119,73	$ 2.640.958,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	6,00	$ 148.238,00	$ 106.279,04	$ 637.674,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	6413,68	$ 247,00	$ 177,09	$ 1.135.775,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 4.793.975,00**
						AIU	**$ 1.892.661,33**
						VALOR TOTAL	**$ 6.686.636,33**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE TUNAL SOFTBOL COD: 06-063

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.02.10	760	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	8,00	$ 460.451,00	$ 330.119,73	$ 2.640.958,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	5,00	$ 148.238,00	$ 106.279,04	$ 531.395,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	1328,96	$ 247,00	$ 177,09	$ 235.341,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 3.787.262,00
						AIU	$ 1.495.211,04
						VALOR TOTAL	$ 5.282.473,04

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE FONTANAR MINI BEISBOL COD: 06-063

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.02.10	760	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	3,00	$ 460.451,00	$ 330.119,73	$ 990.359,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 990.359,00**
						AIU	**$ 390.993,73**
						VALOR TOTAL	$ 1.381.352,73

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE GAITANA PLAYA COD: 10-290

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	5,00	$ 148.238,00	$ 106.279,04	$ 531.395,00
01.04.04	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	44,80	$ 247,00	$ 177,09	$ 7.933,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 918.896,00**
						AIU	**$ 362.780,14**
						VALOR TOTAL	**$ 1.281.676,14**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

590

PARQUE GORGONZOLA COD: 16-126

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1364,76	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 1.685.892,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1364,76	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 1.162.414,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 1.386.631,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 2.788.645,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	6,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 485.812,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.442.787,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	6000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 15.950.674,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	80,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 12.560.539,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	80,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 1.943.619,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 42.327.333,00**
						AIU	**$ 16.710.831,07**
						VALOR TOTAL	**$ 59.038.164,07**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE HAYUELOS F8 COD: 11-084

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	2947,58	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 3.641.153,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	2947,58	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 2.510.557,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 1.386.631,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 2.788.645,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	6,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 485.812,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 961.858,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 13.292.228,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	25,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 3.925.168,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	20,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 485.905,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 32.398.277,00**
						AIU	**$ 12.790.839,76**
						VALOR TOTAL	**$ 45.189.116,76**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE HAYUELOS F5 COD: 11-084

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1121,90	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 1.385.886,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1121,90	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 955.562,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 1.394.322,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	0,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ -
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	2,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 161.937,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.442.787,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 5.316.891,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	40,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 6.280.270,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	40,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 971.810,00
		VALOR OFERTA ECONOMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 19.811.494,00**
						AIU	**$ 7.821.577,83**
						VALOR TOTAL	**$ 27.633.071,83**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE LOMBARDIA COD: 11-052

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	600,00	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 741.182,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	600,00	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 511.041,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 1.394.322,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	0,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ -
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	2,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 161.937,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 961.858,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	1000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 2.658.446,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	20,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 3.140.135,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	20,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 485.905,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 11.956.855,00**
						AIU	**$ 4.720.566,35**
						VALOR TOTAL	**$ 16.677.421,35**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE CHICALÁ COD: 07-292

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	3910,00	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 4.830.033,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	3910,00	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 3.330.284,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 1.386.631,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 2.788.645,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	12,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 971.623,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	160,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.923.717,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 13.292.228,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	80,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 12.560.539,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	80,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 1.943.619,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 45.947.639,00**
						AIU	**$ 18.140.127,88**
						VALOR TOTAL	**$ 64.087.766,88**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS COD:

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 462.210,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	100,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.202.323,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 3.145.034,00
						AIU	$ 1.241.659,42
						VALOR TOTAL	$ 4.386.693,42

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE MILENTA TEJAR SINT COD: 16-099

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluído AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.568,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	5520,00	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 6.818.870,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	5520,00	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 4.701.577,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 1.386.631,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 2.788.645,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.442.787,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	6000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 15.950.674,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	80,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 12.560.539,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	80,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 1.943.619,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 50.513.662,00**
						AIU	**$ 19.942.793,76**
						VALOR TOTAL	**$ 70.456.455,76**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE JAZMIN SINT COD: 16-204

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	6032,00	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 7.451.345,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	6032,00	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 5.137.666,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 1.386.631,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 2.788.645,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.442.787,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	8000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 21.267.565,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	40,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 6.280.270,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	40,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 971.810,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 49.647.039,00**
						AIU	**$ 19.600.651,00**
						VALOR TOTAL	**$ 69.247.690,00**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE ALFONSO LOPEZ COD: 05-141

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	812,39	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 1.003.547,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	812,39	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 691.941,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 1.394.322,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	14,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 1.133.560,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	140,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.683.252,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	1500,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 3.987.668,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	40,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 6.280.270,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	40,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 971.810,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 19.048.399,00**
						AIU	**$ 7.520.307,93**
						VALOR TOTAL	**$ 26.568.706,93**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE LUCES VILLA RICA COD: 08-533

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	3297,00	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 4.072.793,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	3297,00	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 2.808.170,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 1.386.631,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 2.788.645,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	6,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 485.812,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	180,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 2.164.181,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	4000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 10.633.783,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	20,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 3.140.135,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	20,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 485.905,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 30.886.375,00**
						AIU	**$ 12.193.940,85**
						VALOR TOTAL	**$ 43.080.315,85**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE SANTA ISABEL 1 COD: 15-021

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	1472,00	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 1.818.365,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1472,00	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 1.253.754,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 1.386.631,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 2.788.645,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	6,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 485.812,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.442.787,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	3000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 7.975.337,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 20.071.651,00**
						AIU	**$ 7.924.287,81**
						VALOR TOTAL	**$ 27.995.938,81**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE SANTA ISABEL 2COD: 15-021

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	620,00	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 765.888,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	620,00	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 528.076,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 1.394.322,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	2,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 161.937,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 961.858,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	1000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 2.658.446,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	20,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 3.140.135,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	20,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 485.905,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 11.998.596,00**
						AIU	**$ 4.737.045,70**
						VALOR TOTAL	**$ 16.735.641,70**

FORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE PRADERA SUR COD: 16-153

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	816,63	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 1.008.785,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	816,63	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 695.552,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 462.210,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 1.394.322,00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	2,00	$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ 161.937,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	140,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.683.252,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	1500,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 3.987.668,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 10.833.545,00**
						AIU	**$ 4.277.083,57**
						VALOR TOTAL	**$ 15.110.628,57**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE AMERICAS OCCIDENTAL COD: 08-127

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	3,00	$ 492.946,00	$ 353.416,98	$ 1.060.251,00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1,00	$ 529.421,00	$ 379.567,68	$ 379.568,00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	2800,00	$ 1.723,00	$ 1.235,30	$ 3.458.847,00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	2800,00	$ 1.188,00	$ 851,74	$ 2.384.858,00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3,00	$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ 1.386.631,00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2,00	$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ 2.788.645,00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1,00	$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ 1.480.501,00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	140,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.683.252,00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000,00	$ 3.708,00	$ 2.658,45	$ 13.292.228,00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	80,00	$ 218.993,00	$ 157.006,74	$ 12.560.539,00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	80,00	$ 33.887,00	$ 24.295,24	$ 1.943.619,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)					**$ 42.418.939,00**
						AIU	**$ 16.746.997,12**
						VALOR TOTAL	**$ 59.165.936,12**

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE PORVENIR MINI COD: 07-391

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO		$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ -
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO		$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ -
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO		$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ -
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN		$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ -
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.442.787,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 1.442.787,00**
						AIU	**$ 569.612,31**
						VALOR TOTAL	**$ 2.012.399,31**

FORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

PARQUE PORVENIR 1 COD: 07-391

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor unitario OFERTADO (Sin AIU)	Valor Total
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO		$ 644.691,00	$ 462.210,35	$ -
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO		$ 1.944.801,00	$ 1.394.322,48	$ -
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO		$ 2.065.003,00	$ 1.480.501,15	$ -
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN		$ 112.935,00	$ 80.968,60	$ -
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120,00	$ 16.770,00	$ 12.023,23	$ 1.442.787,00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		**$ 1.442.787,00**
						AIU	**$ 569.612,31**
						VALOR TOTAL	**$ 2.012.399,31**


PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35,48%	35,48%
1,00%	1,00%
3,00%	3,00%
39,48%	**39,48%**

CONSORCIO INNOVAPARQUES
DIRECTOR DE OBRA
JAVIER LINARES

CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO

5.2. PROGRAMACIÓN DE OBRA


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1		**CONSORCIO INNOVAPARQUES CONTRATO IDRD 4041 DE 2024 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CAMPOS SINTETICOS**	**191,44 días**	**mar 19/11/24**	**sáb 19/07/25**	**$ 5.200.000.000,00**	
2		INICIO	0 días	mar 19/11/24	mar 19/11/24	$ 0,00	
3		**INICIO MANTENIMIENTO**	**189,31 días**	**jue 21/11/24**	**sáb 19/07/25**	**$ 5.200.000.000,00**	
4		**CAMPOS SINTETICOS USAQUEN**	**53,81 días**	**mar 26/11/24**	**jue 30/01/25**	**$ 202.263.147,49**	
5		**CAMPO TOBERIN COD: 01-079**	**9,94 días**	**mar 26/11/24**	**vie 6/12/24**	**$ 55.282.723,23**	
11		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 26/11/24	mar 26/11/24	$ 529.421,45	
6		04 MallaProtecc Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mar 26/11/24	mié 27/11/24	$ 1.862.273,01	
7		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	$ 1.355.466,64	11
8		02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	mié 27/11/24	jue 28/11/24	$ 8.759.734,54	7
13		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	$ 18.536.892,00	7
14		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	$ 4.980.693,82	7
12		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	$ 7.219.666,69	8
9		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	$ 644.691,00	14
10		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	$ 338.806,68	14
15		01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	1 día	lun 2/12/24	mar 3/12/24	$ 8.990.074,61	10
16		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	5,06 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	$ 2.065.002,79	10
17		**CAMPO ALAMEDA CALLE 170 COD: 01-540**	**7,63 días**	**jue 28/11/24**	**vie 6/12/24**	**$ 35.115.453,93**	
23		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	$ 529.421,45	6
19		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	$ 17.287.336,12	23
21		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	$ 644.691,00	23
20		02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	1 día	sáb 30/11/24	lun 2/12/24	$ 2.675.013,41	19
24		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 2/12/24	mar 3/12/24	$ 1.656.878,65	20
22		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	$ 0,00	21
25		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	$ 7.414.756,80	24
18		04 MallaProtecc Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mié 4/12/24	jue 5/12/24	$ 1.819.510,32	22
26		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 4/12/24	jue 5/12/24	$ 1.143.045,18	25
27		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	0,81 días	vie 6/12/24	vie 6/12/24	$ 1.944.801,00	18
28		**CAMPO VERBENAL COD: 01-313**	**6,56 días**	**vie 29/11/24**	**vie 6/12/24**	**$ 24.845.020,35**	
32		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	$ 644.691,00	
33		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	sáb 30/11/24	lun 2/12/24	$ 0,00	32
30		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1 día	lun 2/12/24	mar 3/12/24	$ 1.463.903,97	32
34		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	lun 2/12/24	mar 3/12/24	$ 529.421,45	33
29		04 MallaProtecc Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	$ 1.412.845,57	30
31		02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc arena+cau	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	$ 9.460.513,31	30

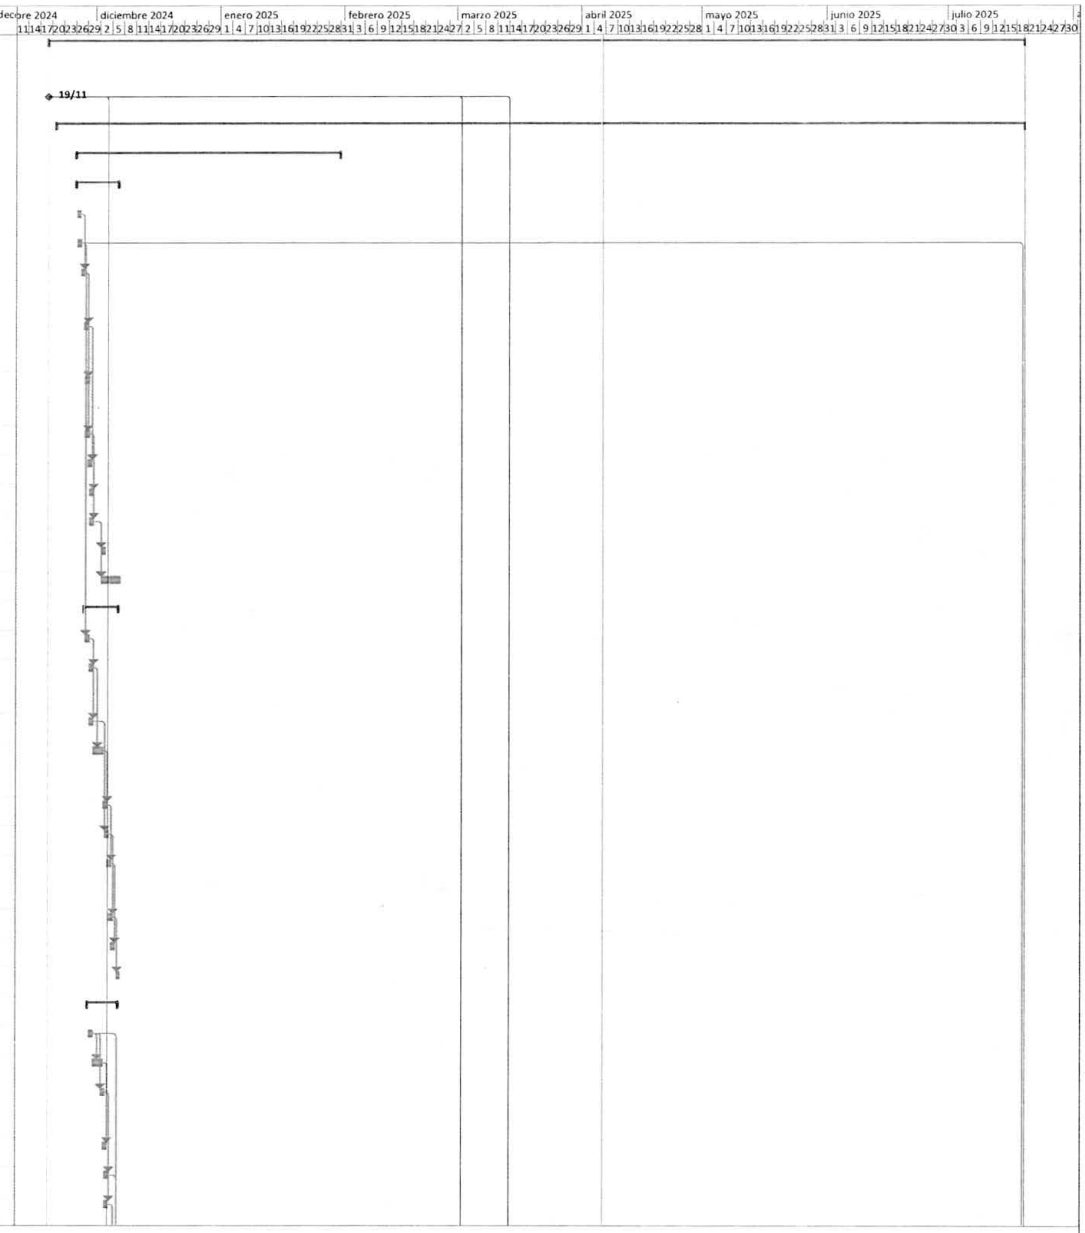

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
35		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mié 4/12/24	jue 5/12/24	$ 1.168.182,85	31
36		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	$ 7.414.756,80	35,31
37		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	0,88 días	vie 6/12/24	vie 6/12/24	$ 805.904,40	36
38		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	0,81 días	vie 6/12/24	vie 6/12/24	$ 1.944.801,00	29;32
39		**CAMPO CEDRITOS COD: 01-031**	**2,94 días**	**lun 9/12/24**	**mié 11/12/24**	**$ 33.011.115,29**	
40		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	$ 1.348.282,30	
41		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION I	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	$ 745.506,65	
42		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+cau	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	$ 4.817.854,00	
43		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	$ 1.934.073,00	
44		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	$ 0,00	
45		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	$ 529.421,45	
49		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	$ 3.889.602,00	
50		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	$ 2.065.003,00	
46		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	$ 3.881.484,47	42
48		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	$ 2.677.753,22	42
47		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasi	1,88 días	mar 10/12/24	mié 11/12/24	$ 11.122.135,20	42
51		**CAMPO SERVITA F11 COD: 01-023**	**9 días**	**mar 21/01/25**	**jue 30/01/25**	**$ 54.008.834,69**	
53		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION I	1 día	mar 21/01/25	mié 22/01/25	$ 542.192,24	
54		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+cau	1 día	mar 21/01/25	mié 22/01/25	$ 3.503.888,24	
58		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 21/01/25	mié 22/01/25	$ 529.421,45	
59		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 14.244.385,24	54
61		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 9.821.433,99	54
52		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 4.703.985,32	
57		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 1.478.838,09	
60		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 18.539.999,61	54
55		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	2 días	jue 23/01/25	vie 24/01/25	$ 644.690,51	61
56		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	$ 0,00	55
62		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	$ 0,00	
63		**CAMPOS SINTÉTICOS PIJAOS Y PALERMO SUR**	**86,06 días**	**mié 4/12/24**	**jue 20/03/25**	**$ 1.640.960.676,87**	
64		**CONSORCIO INNOVAPARQUES CONTRATO IDRD 4041 DE 2024 RECAMBIO GRAMA SINTETICA**	**86,06 días**	**mié 4/12/24**	**jue 20/03/25**	**$ 1.640.960.676,87**	
65		**INICIO MANTENIMIENTO**	**86,06 días**	**mié 4/12/24**	**jue 20/03/25**	**$ 1.640.960.676,87**	
66		**CAMPOS SINTETICOS RECAMBIO GRAMA**	**86,06 días**	**mié 4/12/24**	**jue 20/03/25**	**$ 1.640.960.676,87**	
67		**CAMPO PALERMO SUR COD: 18-035**	**19,56 días**	**mié 4/12/24**	**sáb 28/12/24**	**$ 190.510.360,76**	
72		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y	1,88 días	mié 4/12/24	jue 5/12/24	$ 529.421,45	2
69		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPO	2 días	mié 11/12/24	jue 12/12/24	$ 24.215.750,46	72
71		06 Grava Triturada 1-3/4 (Suministro e Instalac.)	3 días	vie 13/12/24	mar 17/12/24	$ 0,00	69
73		04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	$ 744.923,63	69
74		09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomb	2 días	mié 18/12/24	vie 20/12/24	$ 12.468.195,31	73
75		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc ar	2 días	vie 20/12/24	lun 23/12/24	$ 156.494.847,19	74

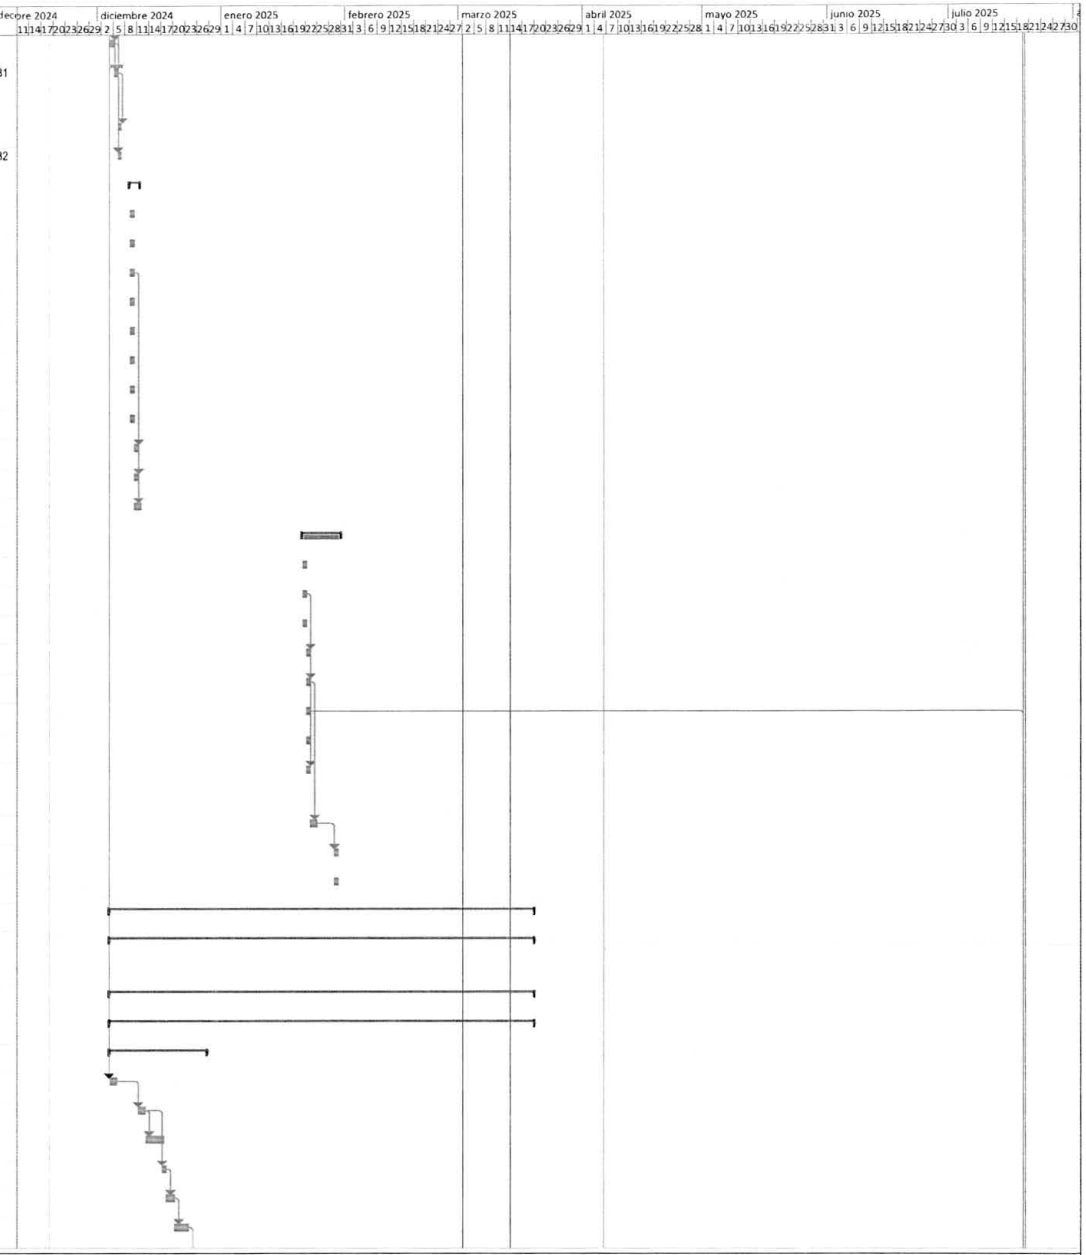

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
70		01 GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Made	2 días	lun 23/12/24	jue 26/12/24	$ 0,00	75
78		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Insta	1,88 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 1.944.800,33	
68		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya	2 días	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	$ 1.475.731,88	
76		02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	2 días	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	$ 644.690,51	70
77		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	2,31 días	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	$ 0,00	
79		**CAMPO PIJAOS COD: 18-090**	**52,88 días**	**mar 17/12/24**	**mié 19/02/25**	**$ 1.442.442.316,11**	
85		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y	2 días	mar 17/12/24	jue 19/12/24	$ 1.058.842,89	
82		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPO	9,25 días	jue 19/12/24	mar 31/12/24	$ 178.815.870,64	85
84		06 Grava Triturada 1-3/4 (Suministro e Instalac.)	3 días	mié 1/01/25	vie 3/01/25	$ 0,00	82
86		04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)	3 días	vie 3/01/25	mié 8/01/25	$ 744.923,63	84
87		09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba	3 días	mié 8/01/25	sáb 11/01/25	$ 92.068.644,64	86
88		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc an	9,13 días	sáb 11/01/25	mié 22/01/25	$ 1.155.601.700,29	87
80		01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	$ 8.990.074,61	
83		01 GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Made	4 días	jue 30/01/25	mar 4/02/25	$ 0,00	88
89		02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	2,94 días	mié 5/02/25	vie 7/02/25	$ 644.690,51	83
90		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	2,31 días	vie 7/02/25	mar 11/02/25	$ 0,00	89
92		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Ins	3 días	mar 11/02/25	vie 14/02/25	$ 2.065.002,79	90
91		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Insta	3 días	vie 14/02/25	mar 18/02/25	$ 0,00	92
81		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya	3 días	mar 18/02/25	vie 21/02/25	$ 2.452.566,11	91
93		TERMINACION	21,38 días	vie 21/02/25	jue 20/03/25	$ 0,00	78;81
94		**PRIORIZACIÓN DE CAMPOS DICIEMBRE - ENERO**	**87,81 días**	**mar 17/12/24**	**vie 4/04/25**	**$ 268.894.447,70**	
95		**CANCHAS PRIORIZADAS DICIEMBRE - ENERO**	**87,81 días**	**mar 17/12/24**	**vie 4/04/25**	**$ 268.894.447,70**	
96		**TABORA**	**1 día**	**mar 17/12/24**	**mié 18/12/24**	**$ 1.720.530,43**	
98		06 Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	$ 1.720.530,43	
99		FIN	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	$ 0,00	
97		INICIO	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 0,00	
100		**FONTANAR F5**	**1 día**	**jue 26/12/24**	**vie 27/12/24**	**$ 1.944.800,33**	
101		INICIO	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 0,00	
102		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 1.944.800,33	
103		FIN	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 0,00	
104		**FONTANAR F11**	**1 día**	**jue 26/12/24**	**vie 27/12/24**	**$ 5.954.603,44**	
105		INICIO	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 0,00	
106		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 3.889.600,65	
107		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 2.065.002,79	
108		FIN	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 0,00	
223		**LA FRAGUA**	**1 día**	**lun 20/01/25**	**mar 21/01/25**	**$ 5.954.603,44**	
224		INICIO	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 0,00	
225		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 3.889.600,65	
226		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 2.065.002,79	
227		FIN	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 0,00	
109		**PARQUE MIRAVALLE F8-1 COD: 05-042**	**12,63 días**	**lun 20/01/25**	**lun 3/02/25**	**$ 15.532.397,94**	

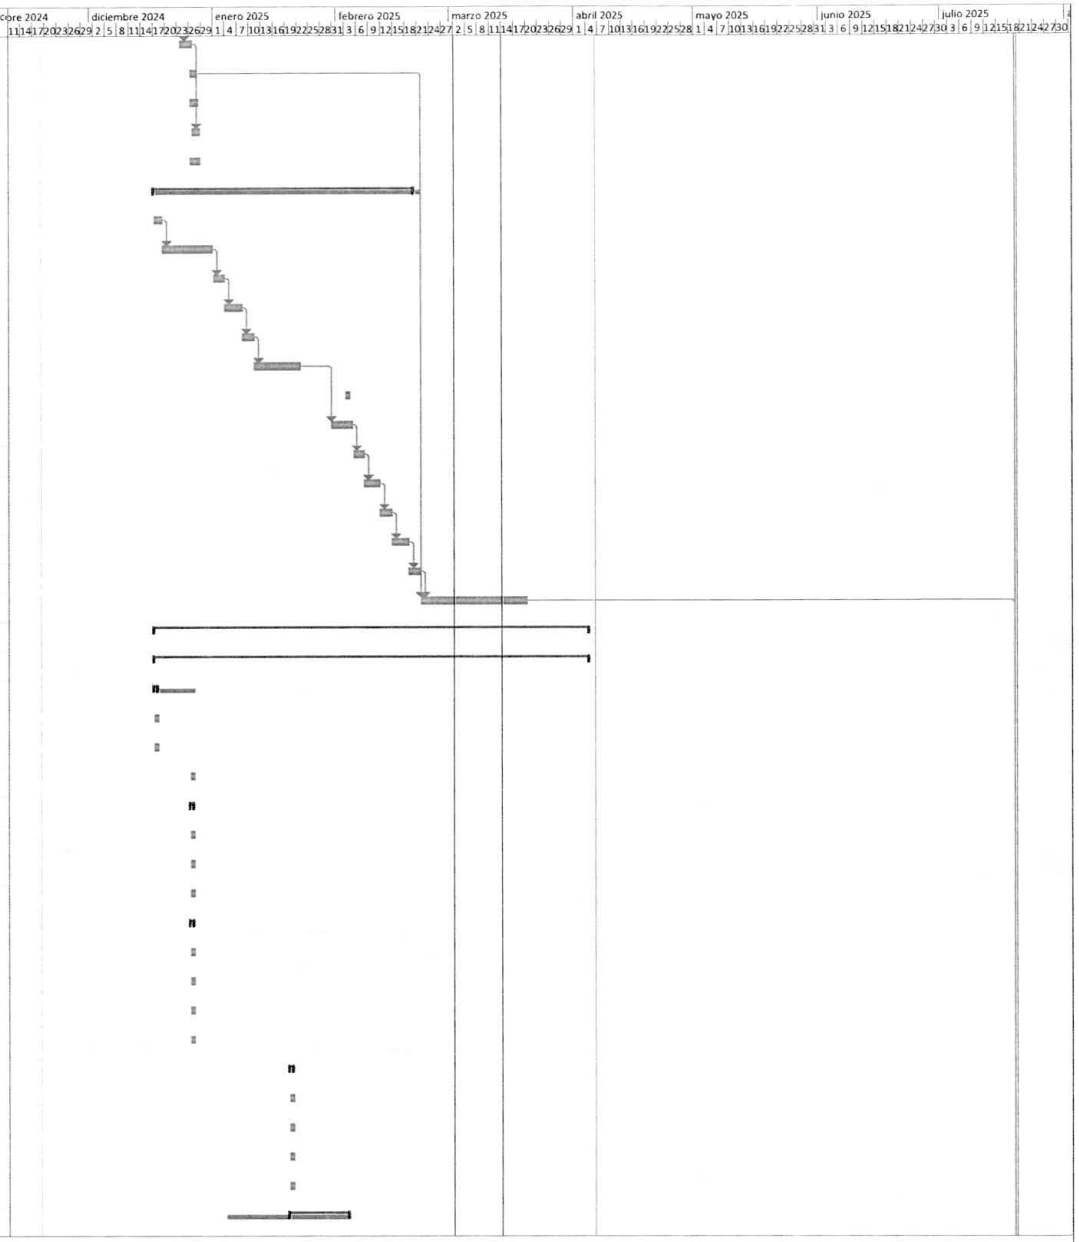

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · Resumen · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · Sólo fin · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
Hito · Tareas externas · Hito inactivo · Sólo duración · Sólo el comienzo · Progreso


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
110		INICIO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 0,00	
121		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICIO	1 día	mar 21/01/25	mar 21/01/25	$ 0,00	110
112		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regres	1 día	mar 21/01/25	mié 22/01/25	$ 0,00	121
120		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+c	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 218.993,36	112
113		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	jue 23/01/25	vie 24/01/25	$ 1.472.735,84	120
119		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1 día	vie 24/01/25	lun 27/01/25	$ 7.414.756,80	113
111		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	$ 1.478.838,09	119
114		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mar 28/01/25	mié 29/01/25	$ 1.016.008,58	111
115		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	$ 644.690,51	114
117		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	115
116		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 1.944.800,33	117
118		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	2,5 días	vie 3/01/25	lun 3/02/25	$ 1.341.574,43	117
122		FIN	0 días	vie 3/01/25	lun 3/02/25	$ 0,00	120;11
123		**PARQUE MIRAVALLE F8-2 COD: 05-042**	**12,63 días**	**lun 20/01/25**	**lun 3/02/25**	**$ 26.449.359,46**	
124		INICIO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 0,00	110
136		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICIO	1 día	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 677.733,32	124
135		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+c	1 día	mar 21/01/25	mié 22/01/25	$ 4.379.867,27	136
126		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regres	1 día	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 529.421,45	135
127		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	jue 23/01/25	jue 23/01/25	$ 2.325.480,30	126
134		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	$ 5.561.067,60	127
125		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	vie 24/01/25	lun 27/01/25	$ 1.478.838,09	134
128		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	$ 1.604.298,96	125
129		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mar 28/01/25	mié 29/01/25	$ 1.934.071,52	128
132		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	$ 0,00	129
130		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	$ 3.889.600,65	132
131		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	$ 2.065.002,79	132
133		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	3 días	mié 29/01/25	sáb 1/02/25	$ 2.003.977,51	132
137		FIN	0 días	lun 3/02/25	lun 3/02/25	$ 0,00	135;13
138		**PARQUE MIRAVALLE F5 COD: 05-042**	**12,63 días**	**lun 20/01/25**	**lun 3/02/25**	**$ 10.863.850,32**	
139		INICIO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 0,00	137
142		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	vie 24/01/25	sáb 25/01/25	$ 1.033.546,80	141
140		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	$ 1.478.838,09	148
143		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	$ 713.021,76	140
148		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	$ 3.707.378,40	142
144		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mar 28/01/25	mié 29/01/25	$ 644.690,51	143
146		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	$ 0,00	144
141		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regres	1 día	vie 31/01/25	sáb 1/02/25	$ 0,00	139
145		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	vie 31/01/25	sáb 1/02/25	$ 1.944.800,33	146
147		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	1 día	vie 31/01/25	sáb 1/02/25	$ 1.341.574,43	
149		FIN	0 días	lun 3/02/25	lun 3/02/25	$ 0,00	147
185		**PARQUE BURGOS BRITALIA - 1 COD: 11-058**	**9 días**	**lun 3/02/25**	**mié 12/02/25**	**$ 53.060.466,93**	

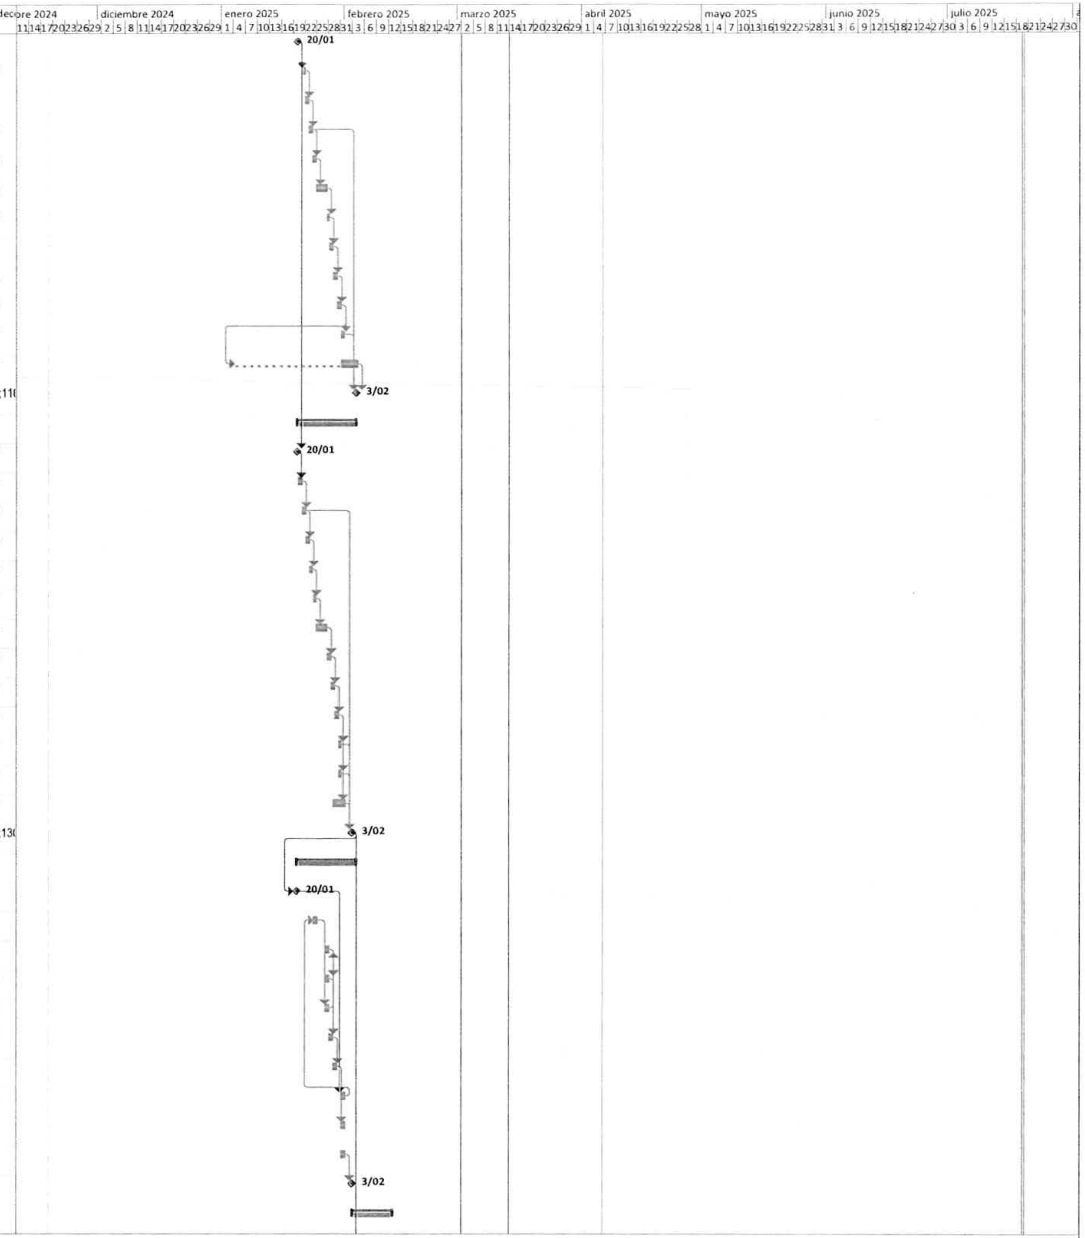

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
186		INICIO	0 días	lun 3/02/25	lun 3/02/25	$ 0,00	163
188		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regres	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	$ 529.421,45	196
196		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICIO	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	$ 4.804.451,37	186
195		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+c	1 día	mar 4/02/25	mié 5/02/25	$ 31.048.878,45	188
189		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mié 5/02/25	jue 6/02/25	$ 1.808.706,90	195
190		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 5/02/25	jue 6/02/25	$ 1.247.788,08	187
194		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1 día	mié 5/02/25	jue 6/02/25	$ 7.414.756,80	189
187		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	jue 6/02/25	vie 7/02/25	$ 1.478.838,09	194
191		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	jue 6/02/25	vie 7/02/25	$ 644.690,51	190
192		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/25	$ 1.944.800,33	
193		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	1 día	mar 11/02/25	mié 12/02/25	$ 2.138.134,95	
107		FIN	0 días	mié 12/02/25	mié 12/02/25	$ 0,00	193
198		**PARQUE BURGOS BRITALIA - 2 COD: 11-058**	**9 días**	**lun 3/02/25**	**mié 12/02/25**	**$ 16.560.327,90**	
199		INICIO	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	$ 0,00	186
201		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	$ 1.808.706,90	199
202		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 5/02/25	jue 6/02/25	$ 1.247.788,08	201
206		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1,88 días	mié 5/02/25	jue 6/02/25	$ 7.414.756,80	201
200		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	jue 6/02/25	vie 7/02/25	$ 1.478.838,09	206
203		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	jue 6/02/25	vie 7/02/25	$ 644.690,51	202
204		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/25	$ 1.944.800,33	
205		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/25	$ 2.020.747,19	
207		FIN	0 días	mié 12/02/25	mié 12/02/25	$ 0,00	204,205
150		**PARQUE MARRUECOS COD: 18-041**	**12,63 días**	**lun 3/02/25**	**lun 17/02/25**	**$ 22.242.023,38**	
151		INICIO	0 días	lun 3/02/25	lun 3/02/25	$ 0,00	137
153		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regres	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	$ 529.421,45	151
161		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+c	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	$ 4.379.867,27	162
162		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICIO	1 día	lun 3/02/25	mar 4/02/25	$ 677.733,32	153
154		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mar 4/02/25	mié 5/02/25	$ 2.266.636,48	161
155		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 5/02/25	jue 6/02/25	$ 1.563.704,70	154
160		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1 día	mié 5/02/25	jue 6/02/25	$ 7.414.756,80	154
152		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	vie 7/02/25	sáb 8/02/25	$ 1.478.838,09	160
156		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/25	$ 644.690,51	152
158		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 11/02/25	mié 12/02/25	$ 0,00	156
157		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	vie 14/02/25	sáb 15/02/25	$ 1.944.800,33	158
159		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	1 día	vie 14/02/25	sáb 15/02/25	$ 1.341.574,43	158
163		FIN	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	$ 0,00	159
208		**PARQUE TIBABUYES 2 COD: 11-084**	**10 días**	**mié 12/02/25**	**lun 24/02/25**	**$ 48.256.132,32**	
209		INICIO	0 días	mié 12/02/25	mié 12/02/25	$ 0,00	
211		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regres	1 día	mié 12/02/25	jue 13/02/25	$ 529.421,45	
220		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+c	1 día	jue 13/02/25	vie 14/02/25	$ 13.139.601,82	221
221		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICIO	1 día	jue 13/02/25	vie 14/02/25	$ 2.033.199,96	211

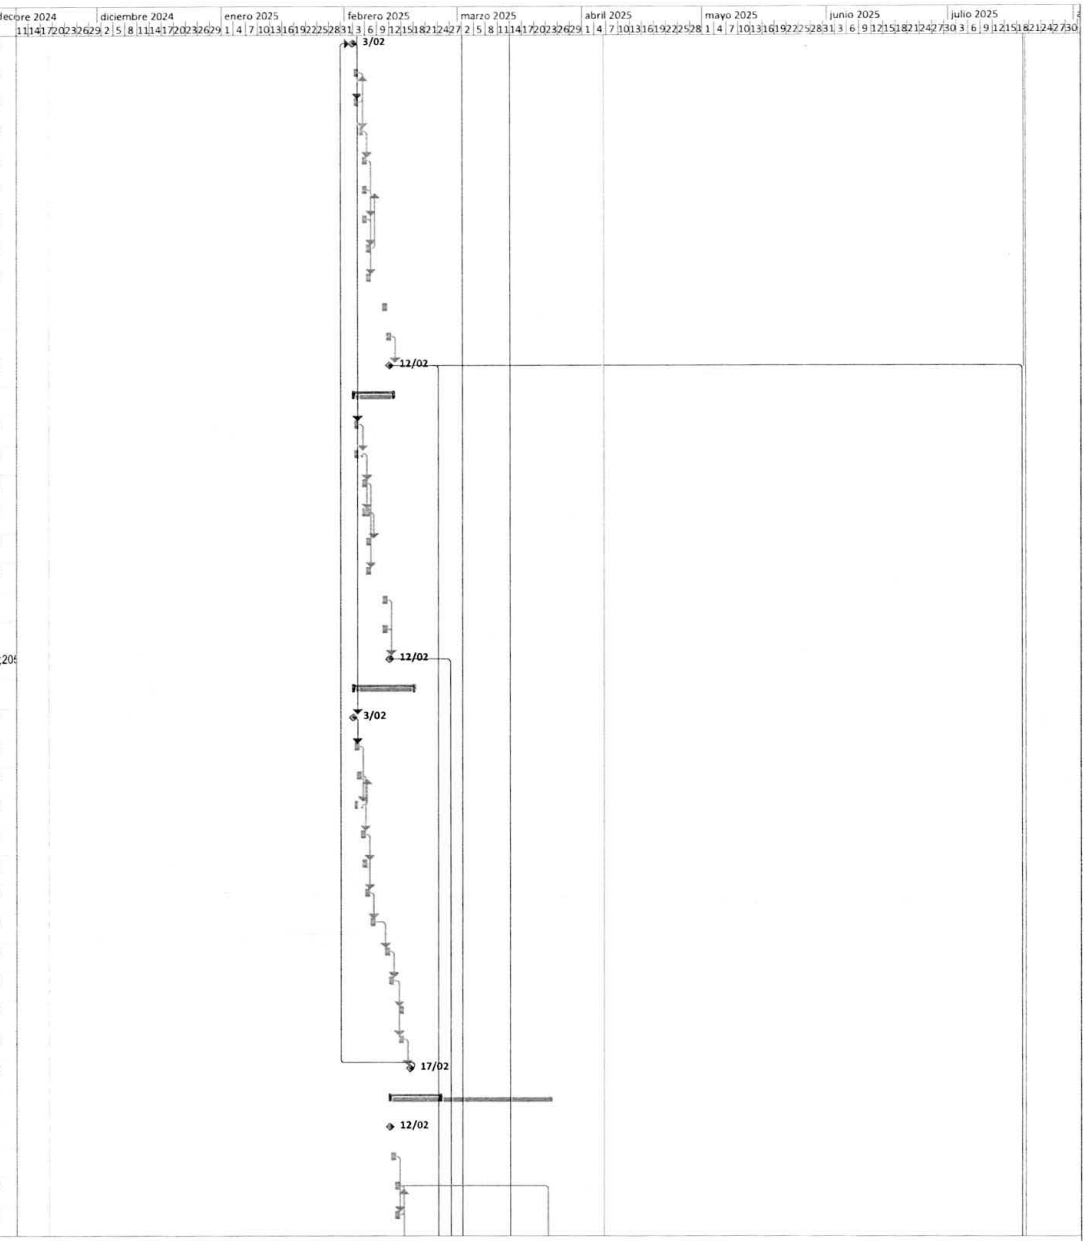


Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

819


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
212		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	vie 14/02/25	sáb 15/02/25	$ 4.134.187,20	220
213		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	sáb 15/02/25	lun 17/02/25	$ 2.852.087,04	210
219		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	$ 14.829.513,60	212
210		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mar 18/02/25	mié 19/02/25	$ 1.478.838,09	219
214		01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	213
215		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	$ 1.289.381,02	214
217		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	$ 1.355.226,73	215
216		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	vie 21/02/25	sáb 22/02/25	$ 3.889.601,65	217
218		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 2.725.073,76	217
222		FIN	0 días	lun 24/03/25	lun 24/03/25	$ 0,00	216;218
173		**PARQUE CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD: 11-**	**6,88 días**	**vie 28/02/25**	**vie 7/03/25**	**$ 41.516.961,24**	
174		INICIO	0 días	vie 28/02/25	vie 28/02/25	$ 0,00	207
176		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regres	1 día	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	$ 529.421,45	174
177		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	$ 8.612.890,00	176
178		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	$ 5.941.848,00	175
183		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1 día	sáb 1/03/25	lun 3/03/25	$ 22.244.270,40	177
175		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$ 1.478.838,09	183
179		01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$ 0,00	178
180		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$ 644.690,51	179
181		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$ 2.065.002,79	180
182		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	1 día	jue 6/03/25	vie 7/03/25	$ 0,00	180
184		FIN	0 días	vie 7/03/25	vie 7/03/25	$ 0,00	181;183
164		**PARQUE VILLA DE LOS SAUCES COD: 08-180**	**10,94 días**	**vie 21/03/25**	**vie 4/04/25**	**$ 18.838.390,57**	
165		INICIO	0 días	vie 21/03/25	vie 21/03/25	$ 0,00	222
167		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regres	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 529.421,45	165
168		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 2.583.867,00	167
166		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	lun 24/03/25	mar 25/03/25	$ 1.478.838,09	171
171		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+tr	1 día	lun 24/03/25	mar 25/03/25	$ 11.122.135,20	168
169		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 26/03/25	jue 27/03/25	$ 1.782.554,40	166
172		FIN	0 días	mié 2/04/25	mié 2/04/25	$ 0,00	170
170		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc	1 día	mié 2/04/25	jue 3/04/25	$ 1.341.574,43	
231		**PRIORIZACIÓN ENGATIVÁ**	**45,75 días**	**mar 25/02/25**	**jue 24/04/25**	**$ 299.475.659,89**	
232		**PARQUE SAN ANDRES F11**	**6,88 días**	**mar 25/02/25**	**mar 4/03/25**	**$ 65.249.241,94**	
233		INICIO	0 días	mar 25/02/25	mar 25/02/25	$ 0,00	197
235		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 25/02/25	mié 26/02/25	$ 529.421,45	233
236		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mar 25/02/25	mié 26/02/25	$ 12.402.561,60	
237		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 26/02/25	jue 27/02/25	$ 8.556.261,12	234
241		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1 día	mié 26/02/25	jue 27/02/25	$ 37.073.784,00	236
234		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	jue 27/02/25	vie 28/02/25	$ 1.478.838,09	241
238		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	$ 644.690,51	
239		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	$ 2.065.002,79	

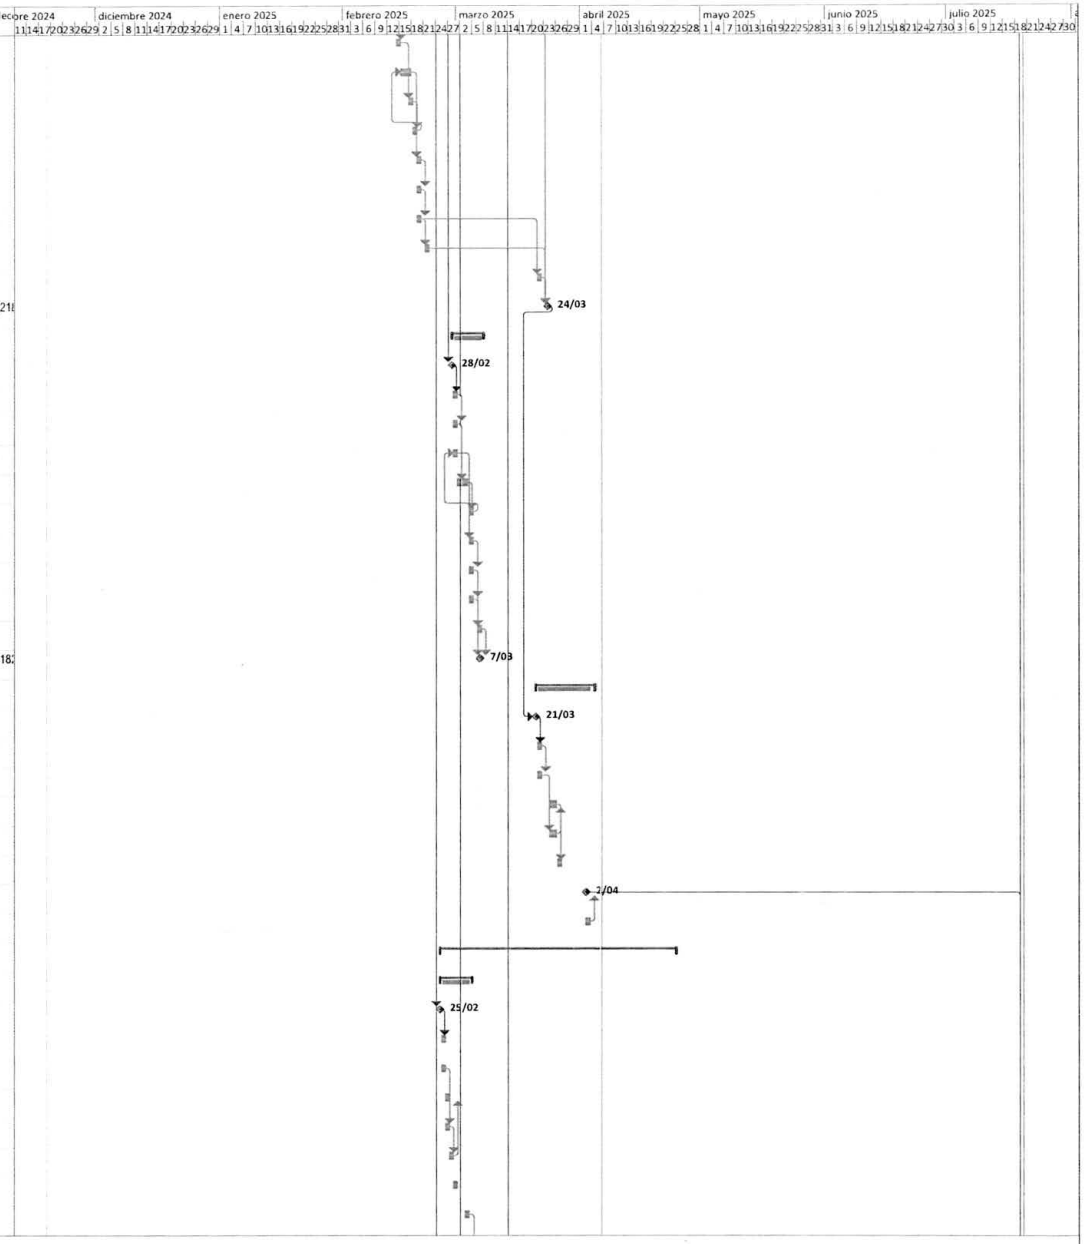

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
240		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	$ 2.498.682,38	239
242		FIN	0 días	mar 4/03/25	mar 4/03/25	$ 0,00	240
243		**PARQUE SAN ANDRES F5**	**6,88 días**	**mar 25/02/25**	**mar 4/03/25**	**$ 20.971.470,76**	
244		INICIO	0 días	mar 25/02/25	mar 25/02/25	$ 0,00	197
246		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mar 25/02/25	mié 26/02/25	$ 2.609.705,67	
247		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 26/02/25	jue 27/02/25	$ 1.800.379,94	245
251		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1 día	mié 26/02/25	jue 27/02/25	$ 11.122.135,20	246
245		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	jue 27/02/25	vie 28/02/25	$ 1.478.838,09	251
248		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	$ 644.690,51	247
252		FIN	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	$ 0,00	
249		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	$ 1.944.800,33	
250		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	$ 1.370.921,02	249
319		**VILLAS DE MADRIGAL**	**8 días**	**mar 11/03/25**	**jue 20/03/25**	**$ 18.429.895,50**	
320		INICIO	0 días	mar 11/03/25	mar 11/03/25	$ 0,00	280
322		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 529.421,45	320
330		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+cau	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 1.094.966,82	331
331		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION I	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 135.546,66	322
323		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mié 12/03/25	jue 13/03/25	$ 2.067.093,60	330
324		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	jue 13/03/25	vie 14/03/25	$ 1.426.043,52	321
329		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 7.414.756,80	323
321		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	$ 1.478.838,09	329
325		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 644.690,51	324
326		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 1.944.800,33	327
327		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 0,00	325
328		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mié 19/03/25	jue 20/03/25	$ 1.693.737,72	326
332		FIN	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	$ 0,00	328
293		**CARMELO F11**	**14,75 días**	**mar 4/03/25**	**jue 20/03/25**	**$ 87.096.934,44**	
294		INICIO	0 días	mar 4/03/25	mar 4/03/25	$ 0,00	252
296		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$ 738.436,41	294
304		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+cau	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$ 1.888.733,55	305
305		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION I	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$ 12.205.839,01	296
297		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 21.028.353,50	304
298		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 12/03/25	jue 13/03/25	$ 14.498.946,00	295
303		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1 día	jue 13/03/25	vie 14/03/25	$ 25.859.592,00	297
295		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 2.062.683,24	303
299		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 899.215,01	298
300		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 2.880.266,18	301
301		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 0,00	299
302		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mié 19/03/25	jue 20/03/25	$ 5.034.869,54	300
306		FIN	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	$ 0,00	302
253		**FLORENCIA_TRONQUITOS**	**11,56 días**	**mar 11/03/25**	**lun 24/03/25**	**$ 18.292.294,30**	

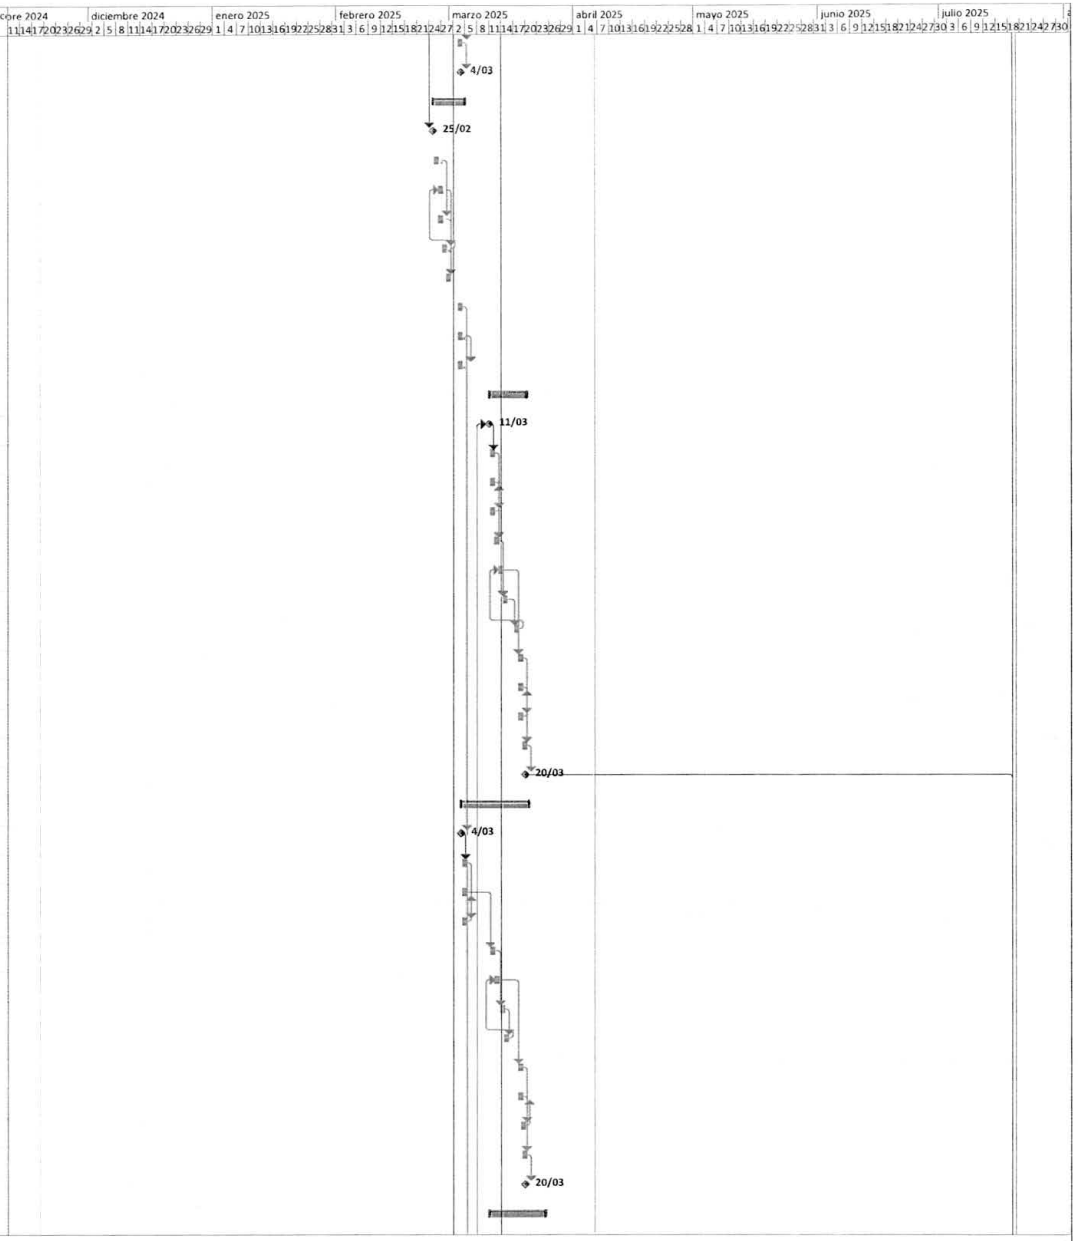


Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · Resumen · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · Sólo fin · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
Hito · Tareas externas · Hito inactivo · Sólo duración · Sólo el comienzo · Progreso

619


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
254		INICIO	0 días	mar 11/03/25	mar 11/03/25	$ 0,00	318
256		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 529.421,45	254
265		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 0,00	256
264		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+cau	1 día	mié 12/03/25	jue 13/03/25	$ 0,00	265
257		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	jue 13/03/25	vie 14/03/25	$ 1.736.358,62	264
258		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 1.197.876,56	255
263		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 7.414.756,80	257
255		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	$ 1.478.838,09	263
259		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 19/03/25	jue 20/03/25	$ 644.690,51	258
261		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mié 19/03/25	jue 20/03/25	$ 0,00	259
260		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 1.944.800,33	261
262		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 3.345.551,94	260
266		FIN	0 días	lun 24/03/25	lun 24/03/25	$ 0,00	262
307		**CARMELO F5**	**17,31 días**	**mar 4/03/25**	**lun 24/03/25**	**$ 17.040.040,06**	
308		INICIO	0 días	mar 4/03/25	mar 4/03/25	$ 0,00	252
310		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	$ 0,00	308
311		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 2.469.677,51	310
312		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	mié 12/03/25	jue 13/03/25	$ 1.703.777,49	309
317		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1 día	jue 13/03/25	vie 14/03/25	$ 7.414.756,80	311
309		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 1.478.838,09	317
313		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 644.690,51	312
314		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 1.944.800,33	315
315		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 0,00	313
316		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 1.383.499,33	314
318		FIN	0 días	lun 24/03/25	lun 24/03/25	$ 0,00	316
267		**NORMANDIA**	**4,75 días**	**jue 20/03/25**	**mié 26/03/25**	**$ 38.661.226,80**	
268		INICIO	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	$ 0,00	266
270		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 529.421,45	268
279		06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 0,00	270
278		02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+cau	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 0,00	279
271		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	sáb 22/03/25	mar 25/03/25	$ 8.612.890,00	278
272		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	sáb 22/03/25	mar 25/03/25	$ 5.941.848,00	
269		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 1.478.838,09	
273		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 644.690,51	272
274		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 2.065.002,79	275
275		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 0,00	273
276		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 1.593.119,64	274
277		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1,25 días	lun 24/03/25	mié 26/03/25	$ 17.795.416,32	
280		FIN	0 días	mié 26/03/25	mié 26/03/25	$ 0,00	276
333		**MARSELLA F5**	**11,94 días**	**jue 20/03/25**	**vie 4/04/25**	**$ 19.076.255,59**	
334		INICIO	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	$ 0,00	280

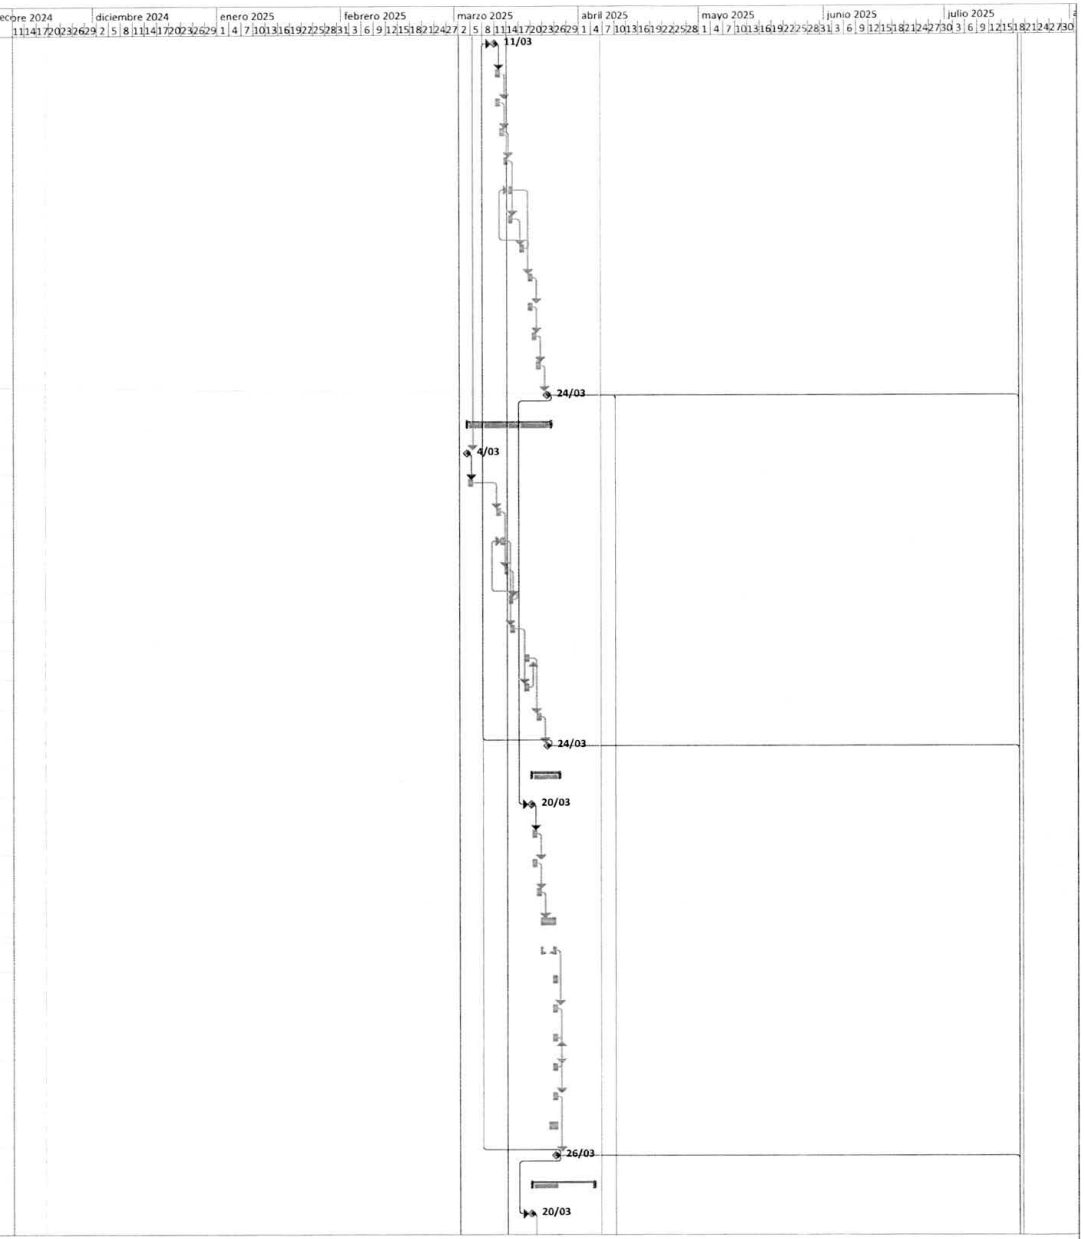

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
336		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 529.421,45	334
337		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 2.254.854,60	
338		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 1.555.575,81	335
342		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1 día	lun 24/03/25	mar 25/03/25	$ 7.414.756,80	337
335		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 1.478.838,09	342
339		02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 644.690,51	338
340		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 1.944.800,33	
341		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 3.253.318,00	340
343		FIN	0 días	mié 26/03/25	mié 26/03/25	$ 0,00	341
281		**LA EUROPA**	**9,44 días**	**vie 11/04/25**	**jue 24/04/25**	**$ 14.658.300,50**	
282		INICIO	0 días	vie 11/04/25	vie 11/04/25	$ 0,00	266
284		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	vie 11/04/25	sáb 12/04/25	$ 529.421,45	282
285		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1 día	lun 14/04/25	mar 15/04/25	$ 1.446.965,50	284
286		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	lun 14/04/25	mar 15/04/25	$ 998.230,46	283
283		05 Cepillado de Campo Sintético**	1 día	mar 15/04/25	mié 16/04/25	$ 1.478.838,10	291
291		05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasl	1 día	mar 15/04/25	mié 16/04/25	$ 5.561.067,60	285
287		02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	1 día	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 644.690,51	286
289		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 22/04/25	mar 22/04/25	$ 0,00	287
288		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mié 23/04/25	mié 23/04/25	$ 1.944.800,33	289
290		04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	1 día	mié 23/04/25	jue 24/04/25	$ 2.054.286,55	288
292		FIN	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	$ 0,00	290
344		**CANCHAS NATURALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRIORIZADO MARZO**	**47,44 días**	**lun 3/03/25**	**lun 5/05/25**	**$ 253.804.304,94**	
345		**ALQUERÍA**	**18 días**	**lun 3/03/25**	**sáb 22/03/25**	**$ 58.491.300,65**	
346		INICIO	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	$ 0,00	2
348		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	$ 529.421,45	346
354		08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	2 días	mar 4/03/25	jue 6/03/25	$ 6.717.356,80	348
349		06 Verticutter + ayudante **	2 días	jue 6/03/25	vie 7/03/25	$ 10.868.281,60	354
350		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	2 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	$ 13.780.624,00	349
351		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	2 días	mar 11/03/25	jue 13/03/25	$ 9.506.956,80	350
347		03 Relleno en arena de rio suelta**	2 días	jue 13/03/25	sáb 15/03/25	$ 13.986.624,80	351
352		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	2 días	sáb 15/03/25	mar 18/03/25	$ 1.975.036,80	347
353		06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y O	2 días	mar 18/03/25	jue 20/03/25	$ 1.126.998,40	352
355		FIN	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	$ 0,00	353
369		**GAITANA NATURAL**	**15 días**	**lun 17/03/25**	**vie 4/04/25**	**$ 65.292.132,03**	
370		INICIO	0 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	$ 0,00	355
372		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	$ 529.421,45	370
378		08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	2 días	lun 17/03/25	mié 19/03/25	$ 6.316.834,40	372
373		06 Verticutter + ayudante **	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 10.220.260,31	378
374		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 12.958.954,29	373
371		03 Relleno en arena de rio suelta**	2 días	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	$ 13.986.624,80	375

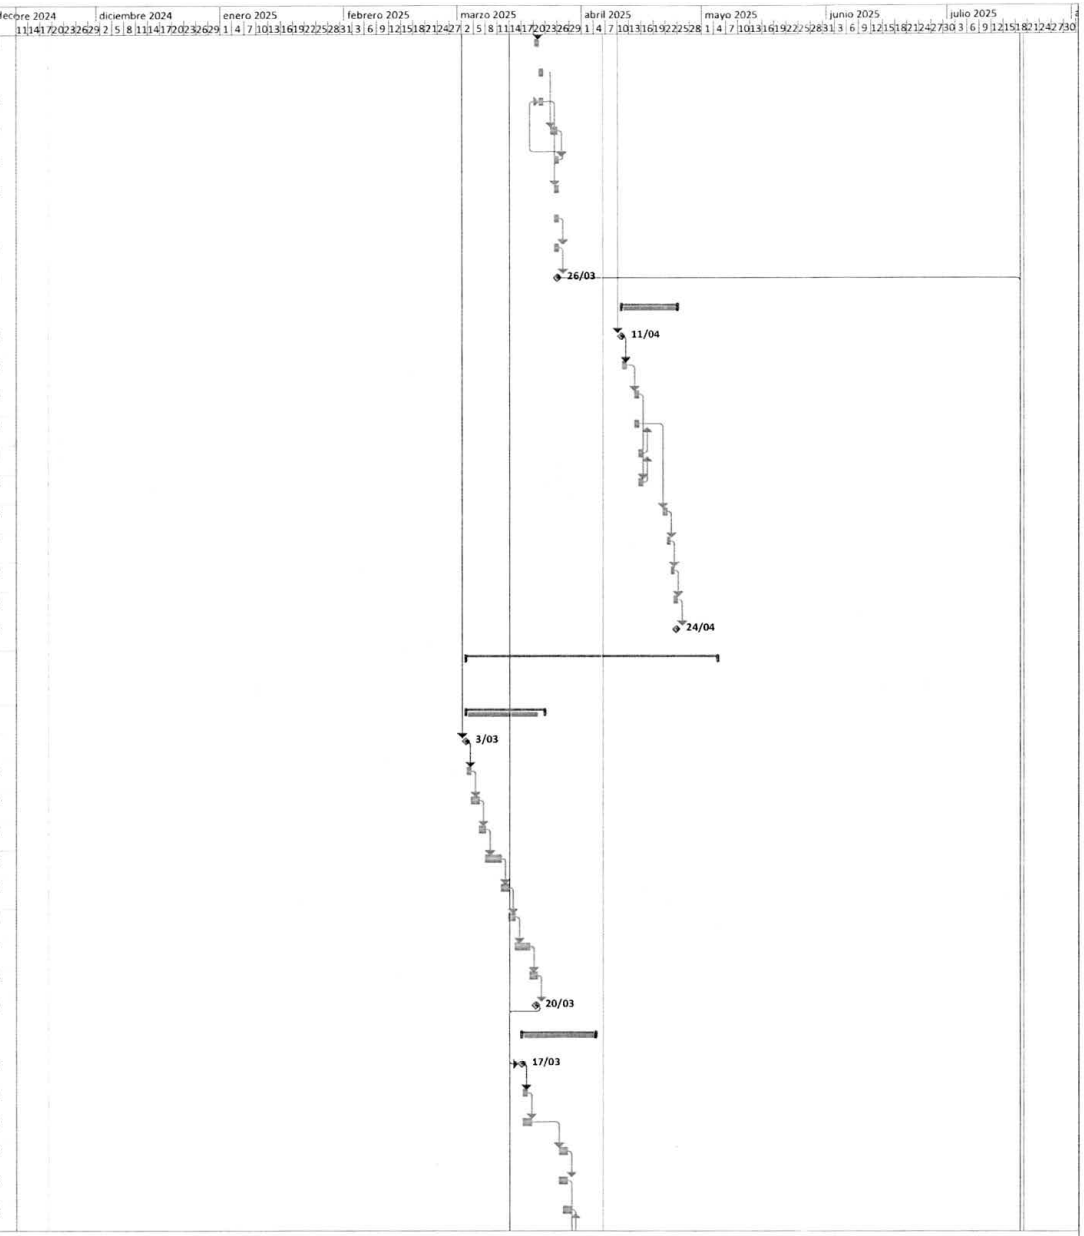

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
375		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	2 días	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	$ 8.940.104,50	374
376		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	2 días	vie 28/03/25	lun 31/03/25	$ 1.857.275,23	371
377		06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y O	2 días	vie 28/03/25	lun 31/03/25	$ 1.690.497,60	376
382		08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1 día	mar 1/04/25	mié 2/04/25	$ 903.484,49	381
379		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	2 días	mar 1/04/25	jue 3/04/25	$ 1.934.071,52	377
380		03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	mié 2/04/25	jue 3/04/25	$ 3.889.600,65	379
381		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	jue 3/04/25	vie 4/04/25	$ 2.065.002,79	380
383		FIN	0 días	vie 4/04/25	vie 4/04/25	$ 0,00	382
384		**JUAN AMARILLO**	**22 días**	**lun 31/03/25**	**mar 29/04/25**	**$ 58.454.924,25**	
385		INICIO	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	$ 0,00	
387		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	lun 31/03/25	mar 1/04/25	$ 529.421,45	385
393		08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	3 días	mar 1/04/25	jue 3/04/25	$ 6.623.313,80	387
388		06 Verticutter + ayudante **	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 10.716.125,66	393
389		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	3 días	mar 8/04/25	vie 11/04/25	$ 13.587.695,26	388
390		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	3 días	vie 11/04/25	mar 15/04/25	$ 9.373.859,40	389
386		03 Relleno en arena de rio suelta**	3 días	mar 15/04/25	mar 22/04/25	$ 13.986.624,80	390
391		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	3 días	mar 22/04/25	jue 24/04/25	$ 1.947.386,28	386
392		06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y O	3 días	jue 24/04/25	mar 29/04/25	$ 1.690.497,60	391
394		FIN	0 días	mar 29/04/25	mar 29/04/25	$ 0,00	392
356		**MARSELLA NATURAL**	**14 días**	**lun 14/04/25**	**lun 5/05/25**	**$ 71.565.948,01**	
357		INICIO	0 días	lun 14/04/25	lun 14/04/25	$ 0,00	
359		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	lun 14/04/25	mar 15/04/25	$ 529.421,45	357
365		08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	2 días	mar 15/04/25	sáb 19/04/25	$ 6.755.141,93	359
360		06 Verticutter + ayudante **	2 días	sáb 19/04/25	mar 22/04/25	$ 10.929.415,68	365
361		02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	2 días	mar 22/04/25	jue 24/04/25	$ 13.858.140,01	360
362		03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1 día	jue 24/04/25	vie 25/04/25	$ 19.120.866,86	361
358		03 Relleno en arena de rio suelta**	1 día	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	$ 13.986.624,80	362
363		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	sáb 26/04/25	lun 28/04/25	$ 1.986.146,38	358
364		06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y O	2 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	$ 1.690.497,60	363
366		02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1 día	mié 30/04/25	vie 2/05/25	$ 644.690,51	364
367		04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1 día	vie 2/05/25	lun 5/05/25	$ 2.065.002,79	366
368		FIN	0 días	lun 5/05/25	lun 5/05/25	$ 0,00	367
397		**PRIORIZACIÓN MARZO**	**92,38 días**	**vie 14/03/25**	**lun 14/07/25**	**$ 606.065.984,90**	
639		**UDS PLAYA - ROTOVO**	**2 días**	**vie 14/03/25**	**lun 17/03/25**	**$ 1.280.886,69**	
640		INICIO	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	$ 0,00	
642		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 529.421,45	640
641		FIN	0 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	$ 0,00	
643		03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	1 día	sáb 15/03/25	lun 17/03/25	$ 741.189,75	642
644		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	sáb 15/03/25	lun 17/03/25	$ 10.275,49	643
645		**UDS SOFTBALL - ROTOVO**	**2 días**	**vie 14/03/25**	**lun 17/03/25**	**$ 5.346.257,25**	
646		INICIO	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	$ 0,00	

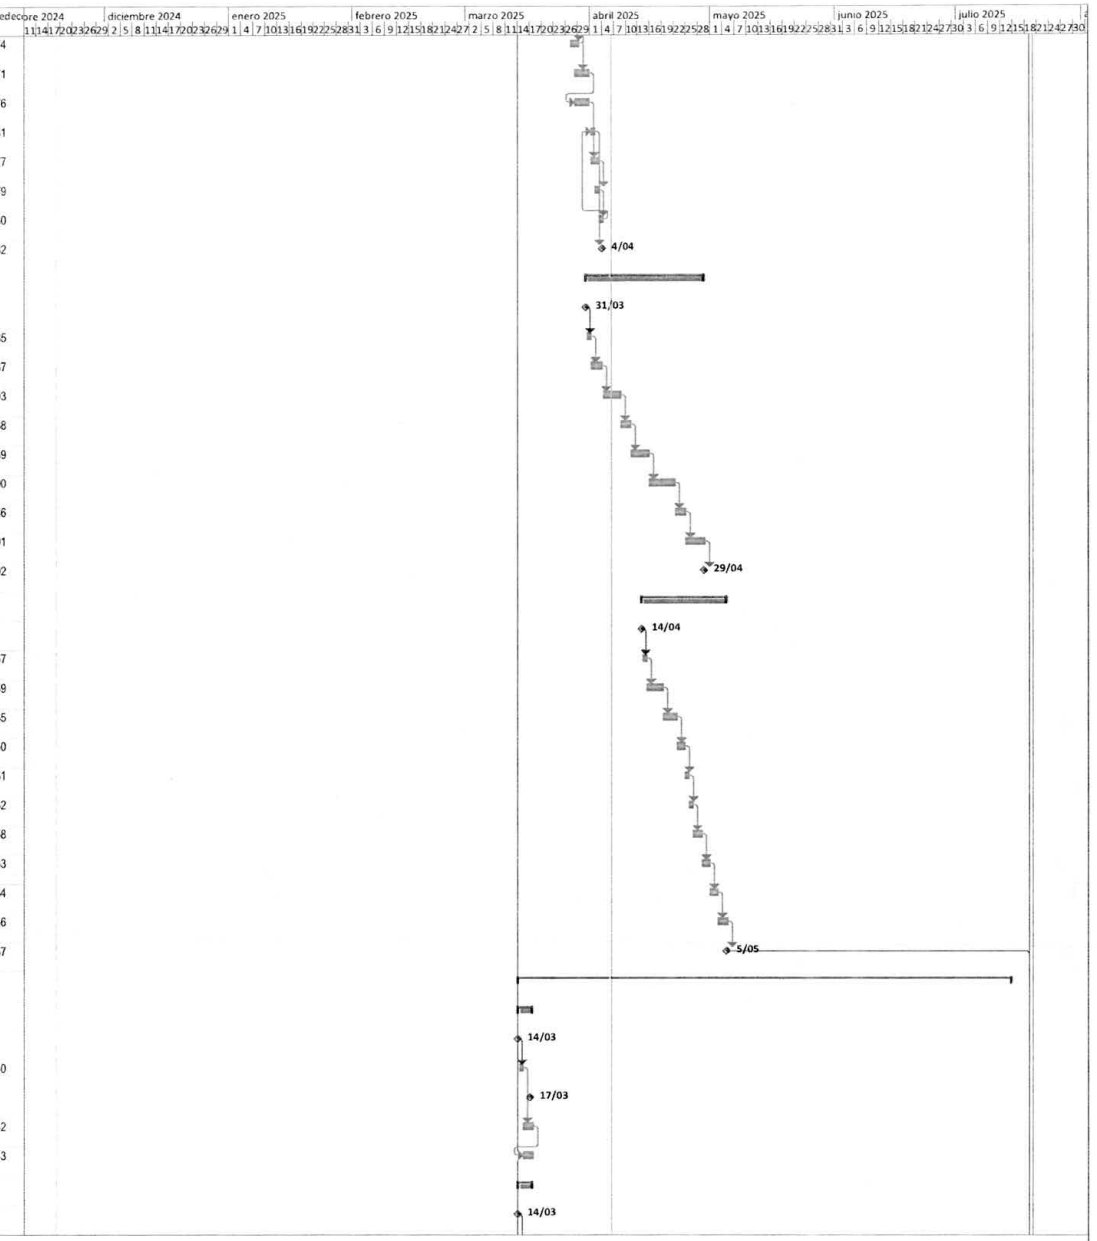


Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · Resumen · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · Sólo fin · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
Hito · Tareas externas · Hito inactivo · Sólo duración · Sólo el comienzo · Progreso

619

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
647		10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 3.683.608,22	
649		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 529.421,45	646
650		03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 741.189,75	649
651		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 392.037,83	650
648		FIN	0 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	$ 0,00	651FC-
485		**PRD PLAYA - ROTOVO**	**2 días**	**lun 17/03/25**	**mié 19/03/25**	**$ 1.754.746,27**	
486		INICIO	0 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	$ 0,00	
488		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 529.421,45	486
489		03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 1.185.903,59	488
490		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 39.421,23	489
487		FIN	0 días	mié 19/03/25	mié 19/03/25	$ 0,00	490FC-
621		**COMPLEJO ACUATICO ROTOVO**	**2 días**	**lun 17/03/25**	**mié 19/03/25**	**$ 697.419,77**	
622		INICIO	0 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	$ 0,00	
623		FIN	0 días	mié 19/03/25	mié 19/03/25	$ 0,00	
624		03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	1 día	lun 17/03/25	mié 19/03/25	$ 592.951,80	
625		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	lun 17/03/25	mié 19/03/25	$ 104.467,97	624
658		**UDS BEISBOL - ROTOVO**	**2 días**	**lun 17/03/25**	**mié 19/03/25**	**$ 5.894.546,16**	
659		INICIO	0,81 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	$ 0,00	
660		10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 3.683.608,22	
662		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 529.421,45	659
663		03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 889.427,70	662
661		FIN	0 días	mié 19/03/25	mié 19/03/25	$ 0,00	664
664		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 792.088,79	663
652		**GAITANA VOLEY PLAYA - ROTOVO**	**2 días**	**jue 20/03/25**	**sáb 22/03/25**	**$ 1.281.676,15**	
653		INICIO	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	$ 0,00	
654		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 529.421,45	
655		03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 741.189,75	
656		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	vie 21/03/25	sáb 22/03/25	$ 11.064,95	
657		FIN	0 días	sáb 22/03/25	sáb 22/03/25	$ 0,00	
626		**CIUDAD MONTES VOLEY PLAYA - ROTOVO**	**2 días**	**mar 25/03/25**	**jue 27/03/25**	**$ 1.134.816,26**	
627		INICIO	0 días	mar 25/03/25	mar 25/03/25	$ 0,00	
629		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 529.421,45	627
630		03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 592.951,80	629
631		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	mié 26/03/25	jue 27/03/25	$ 12.443,01	630
628		FIN	0 días	jue 27/03/25	jue 27/03/25	$ 0,00	631FC-
632		**CIUDAD MONTES SOFTBALL - ROTOVO**	**2 días**	**mar 25/03/25**	**jue 27/03/25**	**$ 5.300.019,63**	
633		INICIO	0 días	mar 25/03/25	mar 25/03/25	$ 0,00	
634		10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 3.683.608,22	
636		02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 529.421,45	633
637		03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$ 741.189,75	636
638		04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	mié 26/03/25	jue 27/03/25	$ 345.800,21	637

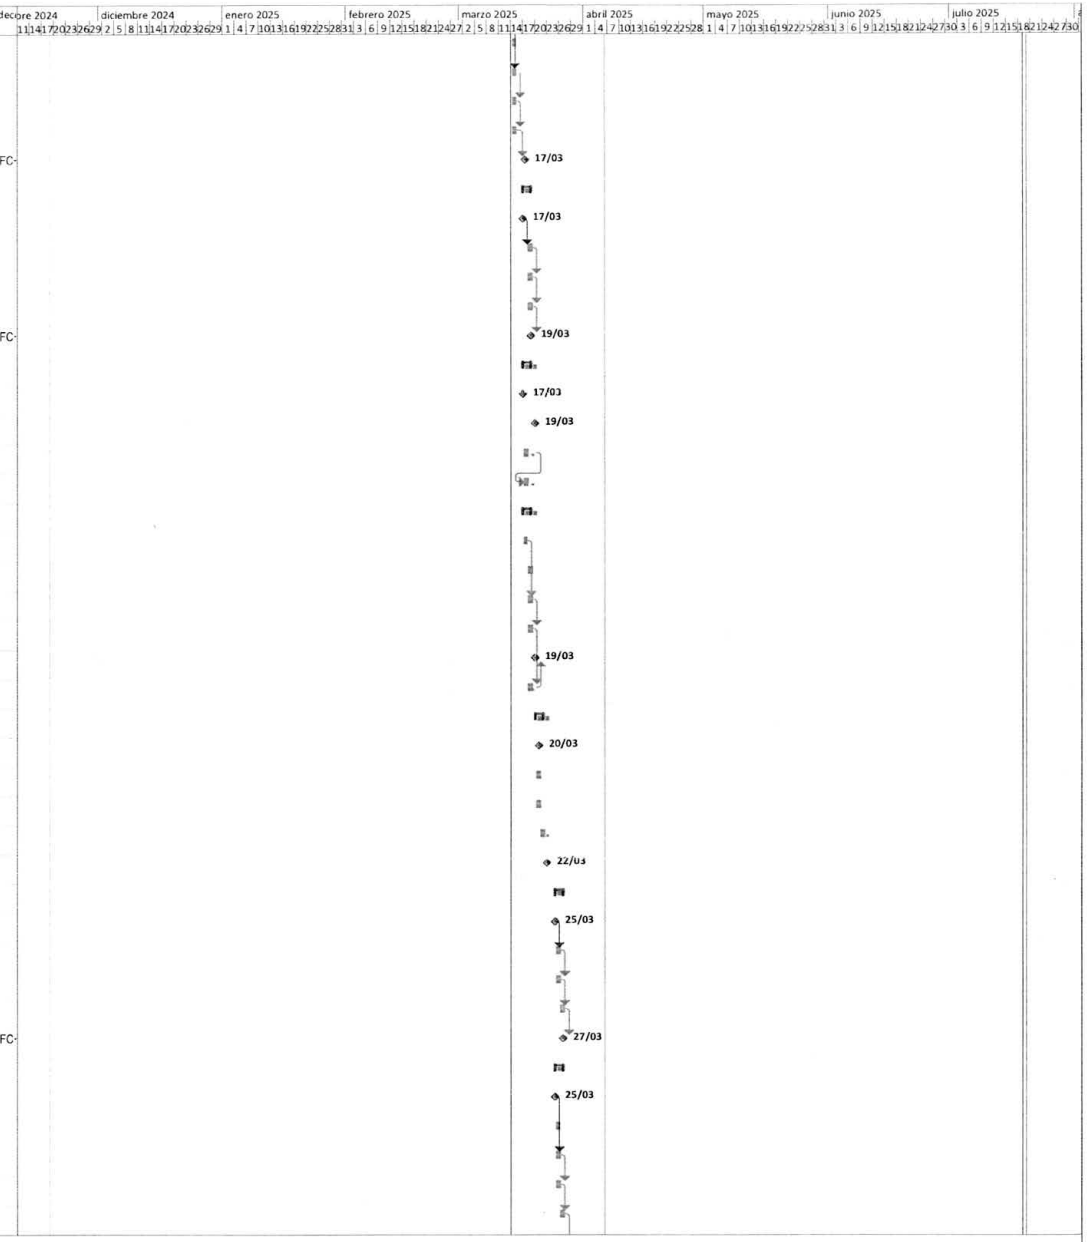

Proyecto: INNOVAPARQUES MAN
Fecha: dom 6/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

219
