GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEPARTAMENTAL

SUPERVISIÓN DEL CONVENIO No GN4106-2024 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL 28 JUNIO DEL 2025 AL 27 DE JULIO DEL 2025

“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR”

INFORME MENSUAL No 4

Los Andes, 28 de julio de 2025

Tabla de contenido

INFORMACIÓN BÁSICA 3

Condiciones Actuales 3

AVANCE DEL CONTRATO 5

OBRAS EJECUTADAS: 7

REUNIONES. 7

VISITAS 7

ACTAS DE MODIFICACIÓN 7

INFORMACIÓN BÁSICA
RECURSOS:

- GOBERNACIÓN DE NARIÑO
- ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS ANDES

CONTRATO O CONVENIO No: GN4106-2024
VALOR: $250.999.352,25
PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL

Condiciones iniciales

ELEMENTOS	CONDICIONES INICIALES	ACTO ADITIVO
No Contrato	4106 del 31 de diciembre del 2024	
Fecha Contrato	31 de diciembre de 2024	
Valor del contrato $	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($250.999.352,25) MDA/CTE	
Objeto	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"	
Plazo	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	
Supervisor	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE	
Fecha de Iniciación	27 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación	27 de agosto del 2025	
Póliza	Póliza No 775-47-994000001047	
Vigencia cumplimiento	31-12-2024 hasta 30-11-2025	
Vigencia Anticipo	31-12-2024 hasta 30-11-2025	

Contratos derivados

ELEMENTOS	CONDICIONES INICIALES	ACTO ADITIVO
No Contrato	CS-001-2025	
Fecha Contrato	16 de junio de 2025	
Valor del contrato $	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($255.999.352,25) MDA/CTE	
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS Y EL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO SOTOMAYOR- LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO	
Plazo	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRESTRUTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS**	Código SIVEYC.FTO.03 Versión:1.0
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISÓN	Vig.26/10/14

Supervisor	YULY XIMENA VACA DIAZ Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
Fecha de Iniciación	16 de junio de 2025	
Fecha de Terminación	16 de agosto del 2025	
Póliza	Póliza No 41-44-101294742	
Vigencia cumplimiento	16-06-2025 hasta 16-08-2028	
Vigencia Anticipo	16-06-2025 hasta 16-12-2025	

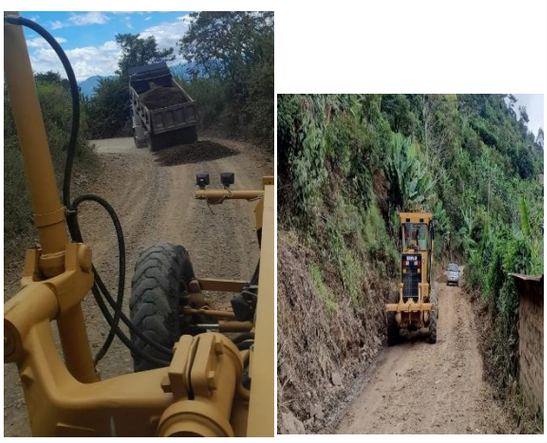
AVANCE DEL CONTRATO

A. Durante el periodo comprendido en el presente contrato se evidencia un retraso en el cronograma presentado, debido a inconvenientes contractuales que se debían subsanar con la Junta de Acción comunal, pero que a la fecha ya se encuentran resueltos y se avanza en la ejecución de la obra, sin contratiempos.
B. Componentes:

Componente Técnico

Durante la fecha comprendida entre 28 de junio al 27 de julio del presente año se realizó el respectivo acompañamiento y verificación de las siguientes actividades realizadas por el contratista:

- **ITEM 1 Conformación de calzada:** Esta actividad consistió en la preparación y estructuración de la superficie en la cual con ayuda de la motoniveladora se removió la capa superficial del terreno existente para proceder con la extensión y nivelación del material de afirmado sobre la vía, y el cuneteo lateral que garantice un adecuado drenaje, posteriormente se pasó con vibro compactador para garantizar el afirmamiento final del tramo intervenido.

LIMPIEZA DE VIA	ESCARIFACION
	
NIVELACION	COMPACTACION
	

- **ITEM 2 Suministro de material de afirmado:** dentro de esta actividad se incluyeron el corte y transporte del material granular desde la fuente de acopio hasta el sitio de intervención.

Todas las actividades se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, logrando un avance físico del 92.22%

CORTE DE MATERIAL	CORTE DE MATERIAL
	
TRANSPORTE DE MATERIAL	TRANSPORTE DE MATERIAL
	 

Componente PMA

El material producto del desmonte fue apilado de forma ordenada en sitios previamente definidos, con el fin de facilitar su recolección y disposición final

Componente SST

Durante el periodo evaluado se verifico las afiliaciones de seguridad social.

Avance de obra

De acuerdo al seguimiento realizado, el porcentaje de avance de obra programado hasta la fecha es del 100 % según el cronograma presentado, y el porcentaje de ejecución evaluado según el seguimiento de las actividades corresponde al 92.22%. De esta manera se evidencia que aún hay un retraso en las labores programadas, pero se realizaron las actividades pertinentes para dar celeridad al proyecto y alcanzar al máximo el cumplimiento de las mismas.

OBRAS EJECUTADAS:

En el mes se ejecutaron las siguientes cantidades de obra:

Resumen de Actividades			
Periodo		28/06/2025 – 27/07/2025	
N°	Descripción	Und	Cant
1	Conformación de calzada	M2	2.564.65
2	Suministro de material de afirmado	M3	900.81

OBRAS EJECUTADAS ACUMULADO:

A la fecha se ejecutaron las siguientes cantidades de obra:

Resumen de Actividades			
Periodo		28/06/2025 – 27/07/2025	
N°	Descripción	Und	Cant
1	Conformación de calzada	M2	5.309,3
2	Suministro de material de afirmado	M3	1.351,06

REUNIONES.

Durante el presente periodo, no se realizaron reuniones

VISITAS

Durante los días 30, 4, 9, 15, 21 y 25 de julio se efectuaron visitas técnicas al área de intervención con el objetivo de constatar el avance de las actividades en terreno y evaluar posibles ajustes que contribuyan a optimizar el desarrollo de la obra.

ACTAS

Actas de pago

En el presente periodo no se han presentado actas de pago.

Actas de modificación

En el presente periodo no se efectuaron actas de modificación.

Actas de acuerdo a precios

En el presente periodo no se pactaron actas de acuerdo de precios.

Actas de recibo final

No se elaboran actas de recibo final de obra.

YULY XIMENA VACA DIAZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
LOS ANDES
