SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcegomez	CLAUDIA ELENA GOMEZ CABRALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-86568	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-12:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2025 de fecha 2025-02-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2025	**Fecha Registro:**	2025-06-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-86568 MUNICIPIO DE PUERTO ASIS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	1.972.056.463,72	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.972.056.463,72	**Saldo x Obligar:**	1.972.056.463,72	

TERCERO

Identificacion:	901919778	**Razon Social:**	CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45100004220	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	18127336	**Nombre:**	JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ	**Cargo:**	ALCALDE

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	LP-007-2024	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-02-28

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-86568 MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	00PI-2102-1900-2024-86568-0079 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Nación	PI86568	CSF	2025-06-13	1.972.056.463,72	0,00		
					Total:	1.972.056.463,72	0,00	1.972.056.463,72	1.972.056.463,72

Objeto:	OBRA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-86568	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	SGR-IPAZ	INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ	2025-06-16	1.972.056.463.72	1.972.056.463,72	NINGUNO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL REGALIAS
2025100003

Fecha	2025-02-28	**Identificacion**	901919778
Tercero	CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025		
Dirección	CA JTO 20013 BRR LOS CRISTALES	**Telefono**	3223654724
Detalle	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		

Codigo	Nivel	Nombre	Doc	VALOR
2.3	CCPET	Inversión	2025100001	0.00
2.3.V2.3	CCPET	Inversión	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005	CCPET	Servicios de la construcción	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017	Auxiliares	Implementacion de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas del municipio de puerto asis	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16	Sección presupuestal	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00	Fuentes	FISCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2	Situación de Fondos	SIN SITUACION DE FONDOS	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2.21	Sectores	Minas y Energía	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2.21.2102	Programa	Consolidacion productiva del sector de energia electrica	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2.21.2102.058	Producto	Unidades de generacion fotovoltaica de energia electrica instaladas	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2.21.2102.058.2024865680079	Bpin	Implementacion de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas del municipio de puerto asis		1,972,056,463.72

DANE (1,972,056,463.72)	VALOR
54699 - Otros servicios de instalación n.c.p.	1,972,056,463.72

TOTAL 1,972,056,463.72

SON : MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

Claudia Elena Gomez Cabrales
Elaboró

Aprobó

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL REGALIAS
2025100003

Fecha 2025-02-28 **Identificacion** 901919778
Tercero CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025
Dirección CA JTO 20013 BRR LOS CRISTALES **Telefono** 3223654724
Detalle IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

Codigo	Nivel	Nombre	Doc	VALOR
2.3	CCPET	Inversión	2025100001	0.00
2.3.V2.3	CCPET	Inversión	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005	CCPET	Servicios de la construcción	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017	Auxiliares	Implementacion de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas del municipio de puerto asis	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16	Sección presupuestal	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00	Fuentes	FISCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2	Situación de Fondos	SIN SITUACION DE FONDOS	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2.21	Sectores	Minas y Energía	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2.21.2102	Programa	Consolidacion productiva del sector de energia electrica	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2.21.2102.058	Producto	Unidades de generacion fotovoltaica de energia electrica instaladas	2025100001	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.017.16.2.2.6.2.00.2.21.2102.058.2024865680079	Bpin	Implementacion de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas del municipio de puerto asis		1,976,038,696.92

DANE (1,976,038,696.92)	VALOR
54699 - Otros servicios de instalación n.c.p.	1,976,038,696.92

TOTAL 1,976,038,696.92

SON : MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

1.972.056.463,72

Claudia Elena Gomez Cabrales
Elaboró

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No. FVZN 1
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 10

Fecha de Validación: 28/07/2025 11:16 AM
Fecha de Generación: 28/07/2025 11:16 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025
Razón Social: CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025
NIT: 901919778-5
Teléfono: + (57) 3223654724
Correo Electrónico: gilce91@gmail.com
Dirección: CA JTO 20013 BRR LOS CRISTALES
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: PUERTO ASÍS

Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
Razón Social MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
NIT: 891200461-3
Teléfono: +(57) 311 2327498
Correo Electrónico:
alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co
Dirección: CR 19 CL 10 ESQ BRR CENTRO
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: PUERTO ASÍS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	5	REPLANTEO DE OBRA	REPLANTEO DE OBRA	74.00	unidad	92,015.00	6,809,110.00	0	0.00	**6,809,110.00**
2	6	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE DOS PANELES - POSTE	Suministrar e instalar la estructura de soporte de dos paneles. incluye poste galvanizado de 3", altura de 3m, incluye soporte, tornillería y cimentación en concreto reforzado con resistencia de 28 Mpa.	74.00	unidad	1,832,240.00	135,585,760.00	0	0.00	**135,585,760.00**
3	7	MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS 1,100Wp	Suministrar e instalar los módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 1,100Wp (2 paneles de 550Wp cada uno) con las siguientes características: η=21,28% condiciones STC. garantía de producción a 12 años del 91.4% y del 84,8% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºc +85ºc, certificación IEC61730, IEC 61215 de conformidad de producto internacional	74.00	unidad	3,256,364.00	240,970,936.00	0	0.00	**240,970,936.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764093508774 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo FVZN con vigencia entre las fechas 2025-05-23 al 2027-05-23.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
4	22	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SOSTEMA DE FOTOVOLTAICOS	Suministrar e instalar sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico con varilla de cobre de 5/8" x 2,4 metros con preparación de suelo.	74.00	cada	946,670.00	70,053,580.00	0	0.00	**70,053,580.00**
5	23	ACOMEDIDAS INTERNAS PARA VIVIENDAS	Suministrar e instalar acometidas internas para viviendas incluye 4 luminarias y 5 tomacorrientes hasta 40 metros de tubería EMT 3/4" y 40 metros de cable trenzado 3x12 AWG.	74.00	unidad	1,275,726.00	94,403,724.00	0	0.00	**94,403,724.00**
6	2	ADMINISTRACIÓN 32%	ADMINISTRACIÓN 32%	1.00	unidad	175,303,396.00	175,303,396.00	0	0.00	**175,303,396.00**
7	3	IMPREVISTOS 1%	IMPREVISTOS 1%	1.00	unidad	5,478,231.00	5,478,231.00	0	0.00	**5,478,231.00**
8	4	UTILIDAD 5%	UTILIDAD 5%	1.00	unidad	27,391,156.00	27,391,156.00	0	0.00	**27,391,156.00**
9	24	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	1.00	unidad	1,690,407.00	1,690,407.00	0	0.00	**1,690,407.00**
10	25	PMA	PMA	1.00	unidad	2,111,772.00	2,111,772.00	0	0.00	**2,111,772.00**

Detalles:
Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS
CUFE :
be3a3a8d604db73e8ce1791ecf13adfb634d24ca775bb9e7b358cc3982c780b911c8491b2c831e68f09e1484524be053

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 759,798,072.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 759,798,072.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 759,798,072.00
Total:	COP 759,798,072.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764093508774 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo FVZN con vigencia entre las fechas 2025-05-23 al 2027-05-23.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

CONTRATO DE OBRA No. 135 de 2025
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

GILMA CORDOBA ACOSTA identificada con cedúlala de ciudadanía No. 39.842.163 en mi condición de representante legal del CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025 identificado con el NIT 901.919.778-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por el consorcio durante el último mes de ejecución del contrato de obra No. 135 de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ROBINSON FAVIAN MORAN identificado con CC. 1.122.782.074, y con tarjeta profesional No. 304457-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador del CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025 identificado con el NIT 901.919.778-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Putumayo, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por el consorcio durante el último mes de ejecución del contrato de obra No. 135 de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Puerto Asís, Putumayo, a los 12 días del mes de julio de 2025.

GILMA CORDOBA ACOSTA
CC. 39.842.163
Representante Legal

ROBINSON FAVIAN MORAN
CC. 1.122.782.074
TP-304457-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EC3DA3CBFD30085B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON FAVIAN MORAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122782074 de SIBUNDOY (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 304457-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

304457-T



ROBINSON FAVIAN MORAN
C.C. 1122782074
RES. INSCRIPCION 3916 DEL 29/11/2022
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

353203 354384

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:			
OCIAL:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901919778
	PUERTO ASIS	DEPARTAMENTO:	CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025 PUTUMAYO
	CA JTO 20013 B/ LOS CRISTALES	TELÉFONO:	5555555
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
TACIÓN:	ÚNICO		
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7976340935	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1583135042

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	3	$ 805.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.600	$ 0	$ 805.600
25-14 COLPENSIONES	1	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 0	$ 336.000
231001-COLFONDOS	1	$ 237.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.600	$ 0	$ 237.600
									$ 1.379.200	**$ 0**	**$ 1.379.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 262.500
EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 629.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.500	$ 0	$ 0	$ 629.500
ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 185.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.700	$ 0	$ 0	$ 185.700
												$ 1.077.700	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.077.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 45.200	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 45.200
								$ 45.200	**$ 0**	**$ 0**	**$ 45.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	5	$ 344.800	$ 0	$ 344.800
		$ 344.800	**$ 0**	**$ 344.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 258.700	$ 0	$ 258.700
PASENA - SENA	5	$ 172.400	$ 0	$ 172.400
		$ 431.100	**$ 0**	**$ 431.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: RES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			NO	30																
	DEPEND		$ 1.484.967	FIJO			NO	30																
BA	DEPEND		$ 1.484.967	FIJO			NO	30																
IDA	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			NO	30																
IA UINS IANA	DEPEND		$ 1.450.000	FIJO			NO	30																

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000
231001-COLFONDOS	30	$ 1.484.967	$ 237.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 237.600
230301-PORVENIR	30	$ 1.484.967	$ 237.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 237.600
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000
230301-PORVENIR	30	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.100.000	$ 262.500	$ 0	$ 262.500
ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.484.967	$ 185.700	$ 0	$ 185.700
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.484.967	$ 185.700	$ 0	$ 185.700
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.100.000	$ 262.500	$ 0	$ 262.500
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.450.000	$ 181.300	$ 0	$ 181.300

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000		$ 11.000
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.484.967		$ 7.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.484.967		$ 7.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000		$ 11.000
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.450.000		$ 7.600

PARAFISCALES: CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 2.100.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 84.000	$ 42.000	$ 63.000	$ 0	$ 0
30	$ 1.484.967	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 59.400	$ 29.700	$ 44.600	$ 0	$ 0
30	$ 1.484.967	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 59.400	$ 29.700	$ 44.600	$ 0	$ 0
30	$ 2.100.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 84.000	$ 42.000	$ 63.000	$ 0	$ 0
30	$ 1.450.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 58.000	$ 29.000	$ 43.500	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.278.000

USUARIO: SOI CC39841880

n línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	1	CV INGENIERIA ELECTROMECANICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CV INGENIERIA PRINCIPAL2	CRA 28A N 15 30	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	3142923515	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	1483006418	9485361158	E	2025/05/19	2025/05/15	BANCOLOMBIA	0	$698,600

DETALLADA DE APORTES

EADO	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
INGENIERIA PRINCIPAL2 (2 Afiliados)				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
: RIESGO 1 (2 Afiliados)				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
EL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
ARIAS ISRAEL		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
RODRIGUEZ MARLON		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
s(2)				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	1	CV INGENIERIA ELECTROMECANICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CV INGENIERIA PRINCIPAL2	CRA 28A N 15 30	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	3142923515	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	1483006418	9485361158	E	2025/05/19	2025/05/15	BANCOLOMBIA	0	$698,600

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$0	$15,000
APAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,000	$0	$0	$15,000
ADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
	CCF68	800,231,969	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
DORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
				2	$698,600	$0	$0	$698,600

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141163541776

(415)7707212489984(8020) 000014116354177 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 9 7 7 8	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

41. Dirección principal
CA JTO 20013 BRR LOS CRISTALES

42. Correo electrónico gilce91@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 3 6 5 4 7 2 4	3 1 0 4 3 8 7 8 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 1 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	5	5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de *tratamiento de datos ley 1581 de 2012.*

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANTAMARIA NINCO ANGELA MARIA

985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141163541776

(415)7707212489984(8020) 000014116354177 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 9 7 7 8	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 1 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 1 2 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	5 6 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 1 2 0	
81. Hasta	2 0 2 7 0 2 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141163541776

(415)7707212489984(8020) **000014116354177 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 9 7 7 8	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	3 9 8 4 2 1 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORDOBA	ACOSTA	GILMA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 0 6 6 7 2 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	MARTINEZ	JULIAN	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163541776

(415)7707212489984(8020) **000014116354177 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 9 7 7 8	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 1 8 9 7 6	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MULTISERVICIOSS J&S S.A.S ZOMAC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
197,205,646	1 0	2 0 2 5 0 1 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 6 0 6 7 2	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ELECTROLED DE COLOMBIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,774,850,817	9 0	2 0 2 5 0 1 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Puerto Asis, 17 de Marzo de 2025

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI identificado(a) con NIT No. 901919778 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	45100004220	2025/03/17	A ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos 866 379 97 14

CONSORCIO PTO ASIS ZNI 2025
NIT 901919778-5

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

NIT 891.200.461-3

MARLON DENNIS RODRIGUEZ LIZCANO

Representante Legal Interventoría

CV INGENIERÍA SAS

Informe de obra mensual No. 1

Contrato de Obra 135 de 2025

GILMA CORDOBA ACOSTA

Representante Legal Contratista

CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025

NIT 901.919.778-5

Periodo comprendido entre el 13 de junio al 12 de julio de 2025

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA 4
1.1. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 4
1.2. LOCALIZACIÓN Y ALCANCE 5
1.3. CUADRO DE GARANTIAS Y VIGENCIA 6
2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 6
2.1. INFORME ADMINISTRATIVO 6
2.2. BALANCE FINANCIERO 7
2.3. INFORME TÉCNICO Y MATERIALES 8
3. CRONOGRAMA 15
4. CONCLUSIONES 18
5. ANEXOS 19

Índice de gráfica

Gráfica 1. Mapa del municipio beneficiario 5
Gráfica 2. Bodegas ubicadas en el municipio de Puerto Asís – Barrio Villa Rosa 8
Gráfica 3. Descargue de paneles solares fotovoltaicos – Bodegas en Puerto Asís 10
Gráfica 4. Coordenadas de beneficiarios iniciales – Municipio de Puerto Asís 11
Gráfica 5. Entrega de materiales eléctricos en las veredas La Paz y La Palmera – Puerto Asís 12
Gráfica 6. Entrega de materiales eléctricos en la vereda La Argentina – Puerto Asís 13
Gráfica 7. Instalaciones internas, instalación de paneles solares y SPT en el municipio de Puerto Asís 14
Gráfica 8. Cronograma de obra y flujo de fondos 16
Gráfica 9. Ejecución por cantidades – Mes 1 17

Índice de tabla

Tabla 1. Ficha técnica del contrato 4
Tabla 2. Cantidad de usuarios por veredas 5
Tabla 3. Cuadro de garantías y vigencia 6
Tabla 4. Proyección Financiera del Contrato No. 344 de 2024 8
Tabla 5. Número de usuarios, instalaciones internas y puestas en servicio realizadas entre mayo y junio de 2025 14

1. GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA

El CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025, se permite presentar la descripción de las actividades ejecutadas como avance del contrato de obra No. 135 de 2025 correspondiente al informe No. 1 ejecutado entre el periodo de tiempo del 13 de junio al 12 de julio de 2025.

El contrato de obra No. 135 de 2025, fue suscrito entre la entidad contratante ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS y la empresa CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025, el veintiocho (28) de febrero de 2025. A partir de esta fecha se expidieron las garantías las garantías contractuales, posteriormente el contrato dio inicio el día 13 de junio de 2025.

1.1. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	135 de 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT 891.200.461-3
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025 NIT 901.919.778-5
REPRESENTANTE	GILMA CORDOBA ACOSTA CC 39.842.163
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.972.056.463,72
FECHA DE CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO:	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tabla 1. Ficha técnica del contrato


1.2. LOCALIZACIÓN Y ALCANCE

El departamento del Putumayo representa aproximadamente el 2% del territorio Nacional, con extensión territorial aproximada de 2,5 millones de hectáreas. En lo que respecta a su composición político – administrativa, el Putumayo se encuentra conformado por 13 municipios: Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguizamo.

El proyecto se encuentra localizado en las zonas no interconectadas del municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Se instalarán un total de 74 soluciones solares fotovoltaicas individuales para beneficiar las viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio.

Municipio	Veredas Beneficiadas	Cantidad Soluciones Solares
PUERTO ASÍS	La Argentina	11
	La Palmera	24
	La Paz	39
TOTAL SOLUCIONES SOLARES		**74**

Tabla 2. Cantidad de usuarios por veredas

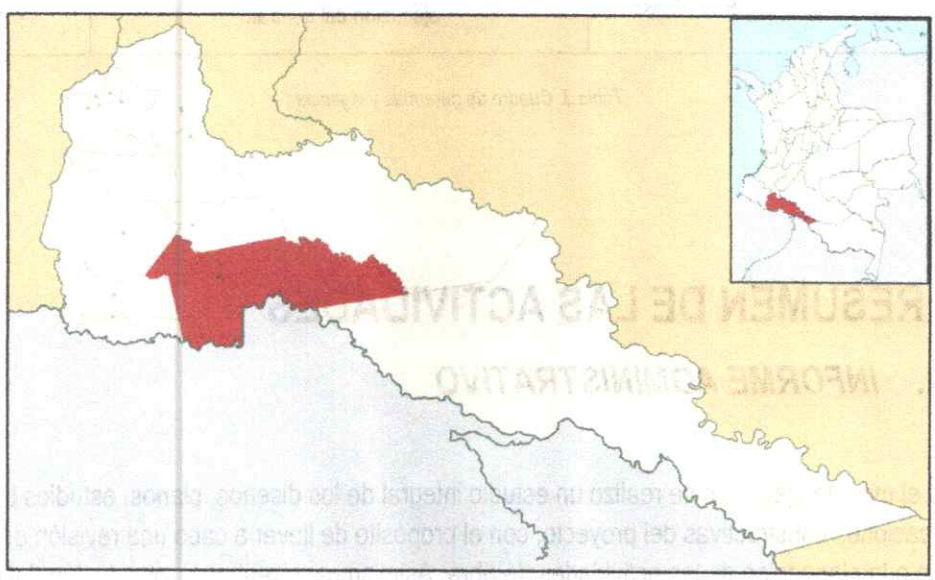

Gráfica 1. Mapa del municipio beneficiario

1.3. CUADRO DE GARANTIAS Y VIGENCIA

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nit 860.009.578-6
No. DE LA POLIZA	61-40-101021225 ANEXO 1
FECHA DE EXPEDICION	18 DE JULIO DE 2025
POLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	23/06/2025	23/09/2025	$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	23/06/2025	23/09/2025	$ 284.700.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/06/2025	23/09/2025	$ 284.700.000

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nit 860.009.578-6
No. DE LA POLIZA	61-40-101058167 ANEXO 1
FECHA DE EXPEDICION	18 DE JULIO DE 2025
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	23/06/2025	23/09/2025	$ 197.205.646,37
SALARIOS	23/06/2025	23/09/2025	$ 98.602.823,19
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Ampara 5 años e inicia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato		$ 394.411.292,74

Tabla 3. Cuadro de garantías y vigencia

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

2.1. INFORME ADMINISTRATIVO

Durante el mes de ejecución se realizó un estudio integral de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones constructivas del proyecto, con el propósito de llevar a cabo una revisión detallada y dar inicio a la planeación de las actividades de obra. Asimismo, se realizó la vinculación del personal técnico responsable de ejecutar las labores contempladas en el cronograma, asegurando el

cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el contrato. Esto garantiza la puesta en marcha de las instalaciones solares fotovoltaicas previstas para el municipio de Puerto Asís.

Ver Anexo 2: Certificado de pagos de parafiscales

Paralelamente, se inició la estructuración de los canales de comunicación necesarios para implementar los procesos de socialización del proyecto con todos los actores involucrados. El objetivo es que, antes del inicio de la ejecución física de las obras, la comunidad esté informada sobre el alcance contractual y se hayan habilitado los espacios pertinentes para resolver cualquier inquietud que pueda surgir.

Finalmente, como parte de la planificación técnica y administrativa para la ejecución del proyecto, se presentaron a consideración de la interventoría los formatos de replanteo de beneficiarios y el acta de entrega e instalación de los kits fotovoltaicos

Ver Anexo 3: Formatos de replanteo y ejecución de la obra

2.2. *BALANCE FINANCIERO*

Las condiciones de pago establecidas en el contrato de obra No. 135 de 2025 son mencionadas a continuación:

- El Municipio de Puerto Asís **NO** entregara un anticipo en el presente proceso de Selección.
- La primera acta se pagará al alcanzar un avance parcial de obra mayor o igual al 30% de ejecución.
- Hasta el 90%, se pagará mediante actas parciales de avance de obra.
- El 10% como pago final, previa acta de recibo a satisfacción de la obra por parte de la interventoría, previo cumplimiento de los procedimientos legales, la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social, ARL y previo cumplimiento de lista de chequeo documental.

El balance financiero del contrato se especifica a continuación:


Descripción	Total	Costo Real	Saldo	% Facturación
Valor inicial	**$ 1.972.056.463,72**			

Descripción	Total	Costo Real	Saldo	% Facturación
Acta Parcial No. 1	$ 591.616.939,12	$ 591.616.939,12	$ 1.380.439.524,60	30%
Acta Parcial No. 2	$ 591.616.939,12			
Acta Parcial No. 3	$ 591.616.939,12			
Liquidación Final	$ 197.205.646,37			
VALOR TOTAL	**$ 1.972.056.463,72**	**$ 591.616.939,12**	**$ 1.380.439.524,60**	**30%**

Tabla 4. Proyección Financiera del Contrato No. 344 de 2024

2.3. *INFORME TÉCNICO Y MATERIALES*

En este mes de ejecución se adelantaron las órdenes de compra y adquisición de equipos solares y materiales requeridos para la etapa inicial de la obra, como lo son: paneles solares, reguladores, inversores, y baterías. Es relevante destacar la presencia de dos bodegas estratégicamente situadas en la zona urbana de Puerto Asís, las cuales facilitarán el almacenamiento de grandes cantidades de insumos. Además, su proximidad a las veredas minimizará los retrasos en la distribución de materiales y equipos. Estas bodegas están localizadas en la calle principal del barrio Villa Rosa.

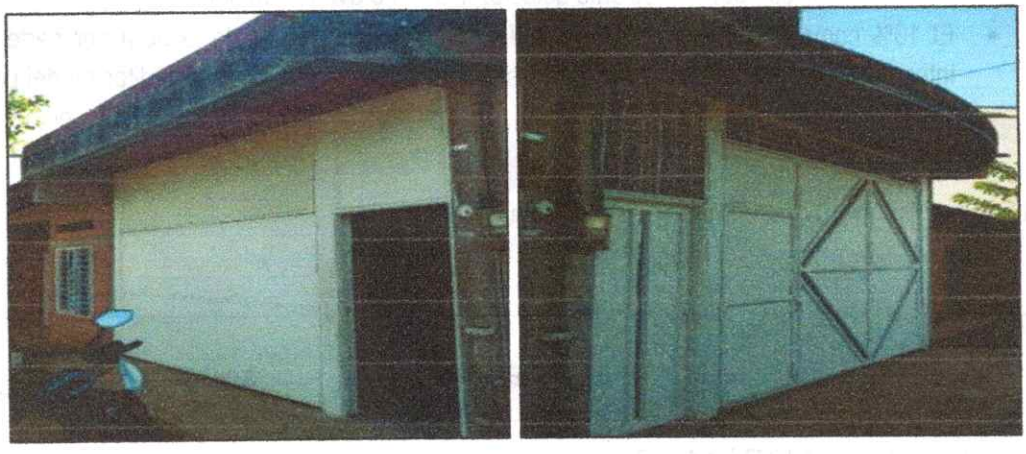

Gráfica 2. Bodegas ubicadas en el municipio de Puerto Asís – Barrio Villa Rosa

Es importante destacar que, se realizó la recepción del 100% de los módulos solares fotovoltaicos, los cuales fueron verificados y cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas exigidas en el marco de la ejecución contractual. Cada módulo cuenta con su respectivo certificado de calidad, que respalda su óptimo desempeño y conformidad con los estándares internacionales aplicables a este tipo de equipos.

Adicionalmente, se recibieron los materiales destinados a las instalaciones eléctricas internas y a la estructura de soporte de los paneles, los cuales fueron almacenados en las bodegas previamente descritas. Cada componente eléctrico fue inspeccionado, garantizando su cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y contando con sus respectivos certificados de calidad, lo cual asegura su idoneidad para la correcta ejecución del contrato de obra.

A continuación, se presenta el registro fotográfico que documenta el proceso de descarga tanto de los materiales como de los paneles solares, evidenciando el manejo cuidadoso que se aplicó durante el traslado y almacenamiento en sitio, con el objetivo de preservar su integridad física.








Gráfica 3. Descargue de paneles solares fotovoltaicos – Bodegas en Puerto Asis

Ver Anexo 4: Ficha técnica y certificado de conformidad – Materiales eléctricos y paneles solares

En relación con los reguladores, baterías e inversores, se avanzó en la definición de la fecha estimada para completar y garantizar la entrega oportuna de estos equipos, lo que permitirá dar continuidad al cronograma establecido y asegurar el cumplimiento de las actividades programadas.

Adicionalmente, a partir del listado preliminar de beneficiarios, que incluye datos como nombre, número de identificación y georreferenciación de las viviendas, se procedió a ingresar las coordenadas en la aplicación Google Maps. Esta acción permitió generar un mapa detallado de las ubicaciones previstas para las instalaciones solares fotovoltaicas, lo cual facilitó la identificación de las áreas de influencia del proyecto.

A continuación, se muestra el mapeo de las coordenadas iniciales por municipio:

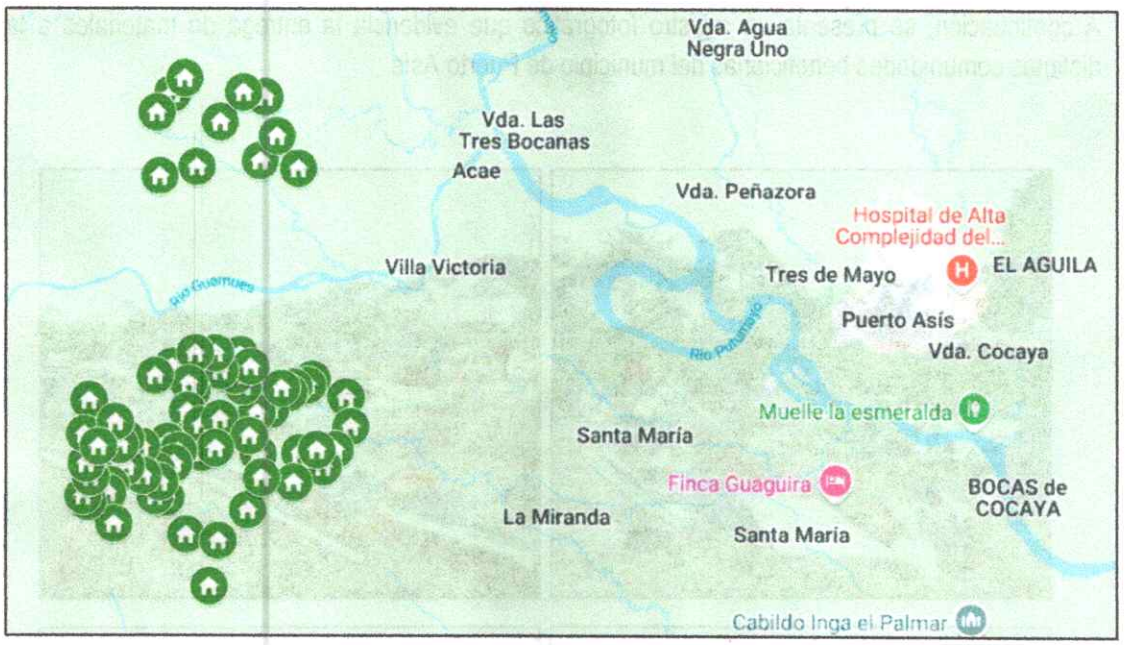

Gráfica 4. Coordenadas de beneficiarios iniciales – Municipio de Puerto Asís

Con base en este análisis, se inició la ejecución de la etapa previa denominada replanteo, orientada a conocer las condiciones geográficas y sociales del proyecto. Esta labor concluyó a finales de junio de 2025, y permitió corroborar la existencia de 74 viviendas en zonas rurales que serán beneficiadas con sistemas solares fotovoltaicos, dado que actualmente no cuentan con acceso al servicio de energía eléctrica. Esta intervención representa un aporte significativo al cierre de brechas de desigualdad energética en el municipio de Puerto Asís, y contribuye directamente al mejoramiento de la calidad de vida en estas comunidades.

Cabe destacar que, durante el proceso de replanteo, se identificó una demanda energética superior a la prevista inicialmente en el proyecto, lo que constituye un insumo técnico valioso para la planificación de futuras iniciativas de energización en la región.

Ver Anexo 5: Informe de replanteo

Una vez finalizada la etapa de replanteo, se dio inicio al proceso de entrega e instalación de los sistemas solares fotovoltaicos, incluyendo sus estructuras de soporte, el sistema de puesta a tierra (SPT) y las instalaciones internas en las viviendas beneficiadas del municipio de Puerto Asís. A la fecha, se ha completado el 100% de las instalaciones internas, correspondiente a un total de 74 viviendas, lo cual representa un avance físico del 39% en la ejecución de la obra contratada.

A continuación, se presenta un registro fotográfico que evidencia la entrega de materiales a las distintas comunidades beneficiarias del municipio de Puerto Asís.



Gráfica 5. Entrega de materiales eléctricos en las veredas La Paz y La Palmera – Puerto Asís



Gráfica 6. Entrega de materiales eléctricos en la vereda La Argentina – Puerto Asis

Finalmente, la siguiente tabla presenta la relación de veredas y el número de usuarios en los que se ejecutaron las actividades de instalación de internas, paneles solares con sus respectivas estructuras de soporte y sistemas de puesta a tierra (SPT), correspondientes a los 74 beneficiarios del municipio de Puerto Asís, durante el período comprendido entre mayo y junio de 2025

Municipio	Veredas Beneficiadas	Cantidad Soluciones Solares	Instalaciones Internas	Puestas en Servicio
PUERTO ASÍS	La Argentina	11	11	0
	La Palmera	24	24	0
	La Paz	39	39	0
TOTAL SOLUCIONES SOLARES		**74**	**74**	**0**

Tabla 5. Número de usuarios, instalaciones internas y puestas en servicio realizadas entre mayo y junio de 2025

Ver Anexo 6: Consolidado de Usuarios

A continuación, se muestra el registro fotográfico de los trabajos de campo realizados en las diferentes veredas del municipio de Puerto Asís.



Gráfica 7. Instalaciones internas, instalación de paneles solares y SPT en el municipio de Puerto Asís

3. CRONOGRAMA

El cronograma muestra las actividades principales para el desarrollo del proyecto: i) importación de equipos y materiales, ii) replanteo con las comunidades, iii) instalación de los sistemas solares y, iv) recibido para el cierre de contrato. El mismo se ha establecido teniendo en cuenta la fecha de llegada de los equipos solares, indicada por el proveedor de los mismos, teniendo en cuenta que estos hacen parte de materiales de importación.

A la fecha, el proyecto presenta un avance financiero del 39%, lo cual refleja un desempeño consistente con las actividades ejecutadas y programadas. Este avance corresponde principalmente a la adquisición de materiales eléctricos y equipos fotovoltaicos, así como a su transporte desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Puerto Asís, y posteriormente hasta las veredas beneficiarias. Asimismo, incluye la instalación de 74 soluciones internas, paneles solares con sus respectivas estructuras de soporte y sistemas de puesta a tierra (SPT), distribuidos en tres comunidades del municipio. Este progreso se ve reflejado tanto en los flujos financieros del proyecto como en la ejecución de las cantidades programadas en el cronograma de obra.

Ver Anexo 7: Cronograma de actividades.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO"

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS

CONTRATO DE OBRA 344 DE 2024				ACTA DE AVANCE			ACUMULADO
				13/06/2025-12/07/2025	13/07/2025-12/08/2025	13/08/2025-12/09/2025	
				ETAPA DE IMPORTACION DE EQUIPOS			
ITEM	ACTIVIDAD	COSTO INICIAL ($)	PROGRAMACION	1	2	3	
1	Replanteo de Obra		PROGRAMADO	$ 6.809.110	$ -	$ -	$ 6.809.110
			EJECUTADO	$ 6.809.110	$ -	$ -	$ 6.809.110
1,1	Replanteo de Obra	$ 6.809.110,00	PROGRAMADO	$ 6.809.110	$ -	$ -	$ 6.809.110
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 6.809.110	$ -	$ -	$ 6.809.110
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00
2	SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR		PROGRAMADO	$ 446.610.276	$ 43.702.609	$ 830.349.575	$ 1.320.662.460
			EJECUTADO	$ 446.610.276	$ -	$ -	$ 446.610.276
2,1	Suministrar e instalar la estructura de soporte de dos paneles incluye poste galvanizado de 3", altura de 3m, incluye soporte, tornillería y cimentación en concreto reforzado con resistencia de 28 Mpa	$ 135.585.760,00	PROGRAMADO	$ 135.585.760			$ 135.585.760
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 135.585.760	$ -	$ -	$ 135.585.760
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00
2,2	Suministrar e instalar los modulos solares fotovoltaicos monocristalinos 1,100Wp (2 paneles de 550Wp cada uno) con las siguientes caracteristicas: n=21,28% condiciones STC, garantia de producción a 12 años del 91.4% y del 84,8% a 25 años, temperatura	$ 240.970.936,00	PROGRAMADO	$ 240.970.936			$ 240.970.936
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 240.970.936	$ -	$ -	$ 240.970.936
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00
2,3	Suministrar e instalar regulador de carga, 100V/80A, eficiencia del 98%, apto para cargar baterias tipo LiFePO4	$ 109.030.638,00	PROGRAMADO		$ 5.451.532	$ 103.579.106	$ 109.030.638
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
2,4	Suministrar e instalar bateria de ión- litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200Ah 24 VDC 3600 ciclos hasta el 80% DOD.	$ 483.142.300,00	PROGRAMADO		$ 24.157.115	$ 458.985.185	$ 483.142.300
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
2,5	Suministrar e instalar inversor tipo "off- grid" onda sencidal pura, potencia de 2.000W, 24VDC input 110VAC output, f=60 Hz, protección y desconexión por bajo voltaje en la bateria (incluye transporte)	$ 101.729.576,00	PROGRAMADO		$ 5.086.479	$ 96.643.097	$ 101.729.576
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
2,6	Suministrar e instalar gabinete en lámina galvanizada C16, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones electricas, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior con grado de protección IP56	$ 127.645.560,00	PROGRAMADO		$ 6.382.278	$ 121.263.282	$ 127.645.560
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
2,7	Suministrar e instalar sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico con varilla de cobre de 5/8" x 2,4 metros con preparación de suelo.	$ 70.053.580,00	PROGRAMADO	$ 70.053.580			$ 70.053.580
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 70.053.580	$ -	$ -	$ 70.053.580
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00
3	SISTEMA DE MEDICIÓN		PROGRAMADO	$ -	$ 2.625.206	$ 49.878.905	$ 52.504.110
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
3,1	Suministrar, instalar y poner en marcha un sistema de monitoreo con medidor prepago monofásico calibrado con plataforma de visualización de datos.	$ 52.504.110,00	PROGRAMADO		$ 2.625.206	$ 49.878.905	$ 52.504.110
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
4	INSTALACIÓN REDES INTERNAS		PROGRAMADO	$ 94.403.724	$ -	$ -	$ 94.403.724
			EJECUTADO	$ 94.403.724	$ -	$ -	$ 94.403.724
4,1	Suministrar e instalar acometidas internas para viviendas incluye 4 luminarias y 5 tomacorrientes hasta 40 metros de tuberia EMT 3/4" y 40 metros de cable trenzado 3x12 AWG.	$ 94.403.724,00	PROGRAMADO	$ 94.403.724			$ 94.403.724
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 94.403.724	$ -	$ -	$ 94.403.724
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00

COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.421.875.294,00	PROGRAMADO	$ 547.823.110	$ 43.702.609	$ 830.349.575	$ 1.421.875.294,00
COSTOS INDIRECTOS OBRA AUI 38%	$ 540.312.611,72		$ 208.172.782	$ 16.606.991	$ 315.532.038	$ 540.312.611,72
CAPACITACION	$ 4.387.452,00		$ 1.462.484	$ 1.462.484	$ 1.462.484	$ 4.387.452,00
PMA	$ 5.481.106,00		$ 1.827.035	$ 1.827.035	$ 1.827.035	$ 5.481.106,00
COSTO TOTAL OBRA	$ 1.972.056.463,72		$ 759.285.411	$ 63.599.120	$ 1.149.171.933	$ 1.972.056.463,72
INVERSION MENSUAL ACUMULADA			$ 759.285.411	$ 822.884.531	$ 1.972.056.464	
INVERSION MENSUAL EN % SEGÚN CONTRATO INICIAL			39%	42%	100%	

COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.421.875.294,00	EJECUTADO	$ 547.823.110,00	$ -	$ -	$ 547.823.110,00
COSTOS INDIRECTOS OBRA AUI 38%	$ 540.312.611,72		$ 208.172.781,80	$ -	$ -	$ 208.172.781,80
CAPACITACION	$ 4.387.452,00		$ 1.690.406,75	$ -	$ -	$ 1.690.406,75
PMA	$ 5.481.106,00		$ 2.111.772,97	$ -	$ -	
COSTO TOTAL OBRA	$ 1.972.056.463,72		$ 759.798.070,53	$ -	$ -	$ 759.798.070,53
INVERSION MENSUAL ACUMULADA			$ 759.798.071	$ 759.798.070,53	$ 759.798.070,53	
INVERSION MENSUAL EN % SEGÚN CONTRATO INICIAL			38,53%	38,53%	38,53%	

Gráfica 8. Cronograma de obra y flujo de fondos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA 135 - 2025

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO"

Id	NOMBRE DE LA TAREA	CANTIDAD FINAL	COSTO ($)	PESO ACTIVIDAD (%)	ACUMULADO				MES 1			
					EJECUTADO UNIDADES	% EJECUTADO POR ACTIVIDAD	VALOR EN PESOS	% AVANCE OBRA	EJECUTADO UNIDADES	% EJECUTADO POR ACTIVIDAD	VALOR EN PESOS	% AVANCE OBRA
1	Replanteo de Obra		6.809.119,00	0,48%			$ 6.809.119	0,48%				0,48%
2	Replanteo de Obra	24	6.809.119	0,48%			$ 6.809.119	0,48%		5,02%	$ 6.809.119	0,48%
3	MATERIALES	24	348.000	0,02%	24	100,00%	$ 348.000	0,02%	24	100,00%	$ 348.000	0,02%
4	TRANSPORTE	24	2.220.000	0,16%	24	100,00%	$ 2.220.000	0,16%	24	100,00%	$ 2.220.000	0,16%
5	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	4.241.119,00	0,30%	24	100,00%	$ 4.241.119	0,30%	24	100,00%	$ 4.241.119	0,30%
6	SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR		1.269.158.950,00	89,73%				31,29%				31,29%
7	Suministrar e instalar la estructura de soporte de dos paneles. Incluye poste galvanizado de 3", altura de 3m, incluye soporte, tornillería y cimentación en concreto reforzado con resistencia de 25 Mpa.	24	135.585.780	9,48%			$ 135.585.780	9,48%		100,00%	$ 135.585.780	9,48%
8	MATERIALES	24	97.644.422	6,83%	24	100,00%	$ 97.644.422	6,83%	24	100,00%	$ 97.644.422	6,83%
9	TRANSPORTE	24	28.398.240	1,99%	24	100,00%	$ 28.398.240	1,99%	24	100,00%	$ 28.398.240	1,99%
10	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	9.543.098	0,67%	24	100,00%	$ 9.543.098	0,67%	24	100,00%	$ 9.543.098	0,67%
11	Suministrar e instalar los módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 1,109Wp (2 paneles de 555Wp cada uno) con las siguientes características: η=21,28% condiciones STC, garantía de producción a 12 años del 91,4% y del 84,8% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +85ºC, certificación IEC61730, IEC 61215 de conformidad de producto internacional	24	240.870.936	16,86%			$ 240.870.936	16,86%		100,00%	$ 240.870.936	16,86%
12	MATERIALES	24	213.294.840	14,93%	24	100,00%	$ 213.294.840	14,93%	24	100,00%	$ 213.294.840	14,93%
13	TRANSPORTE	24	14.199.120	0,99%	24	100,00%	$ 14.199.120	0,99%	24	100,00%	$ 14.199.120	0,99%
14	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	13.477.176	0,94%	24	100,00%	$ 13.477.176	0,94%	24	100,00%	$ 13.477.176	0,94%
15	Suministrar e instalar regulador de carga, 160V/80A, eficiencia del 98%, apto para cargar baterías tipo LiFePO4.	24	109.093.668	7,64%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
16	MATERIALES	24	102.899.300	7,20%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
17	TRANSPORTE	24	1.429.912	0,10%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
18	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	4.757.426	0,33%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
19	Suministrar e instalar batería de ión- litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200Ah 24 VDC 3800 ciclos hasta el 80% DOD.	24	421.142.300,00	29,83%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
20	MATERIALES	24	465.482.925	32,59%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
21	TRANSPORTE	24	11.032.800	0,81%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
22	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	3.826.775	0,26%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
23	Suministrar e instalar inversor tipo "off- grid" onda senoidal pura, potencia de 2.200W, 24VDC input 110VAC output, f=60 Hz, protección y desconexión por bajo voltaje en la batería. (Incluye transporte)	24	101.329.576	7,13%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
24	MATERIALES	24	93.348.840	6,66%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
25	TRANSPORTE	24	1.076.476	0,22%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
26	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	3.564.270	0,25%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
27	Suministrar e instalar gabinete en lámina galvanizada C16, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior con grado de protección IP54.	24	122.645.566	8,91%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
28	MATERIALES	24	105.418.800	7,66%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
29	TRANSPORTE	24	9.068.080	0,66%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
30	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	8.260.672	0,60%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
31	Suministrar e instalar sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico con varilla de cobre de 5/8" x 2,4 metros con preparación de suelo.	24	70.053.588	4,99%			$ 70.053.588	4,99%		100,00%	$ 70.053.589	4,99%
32	MATERIALES	24	55.604.385	3,85%	24	100,00%	$ 55.604.385	3,85%	24	100,00%	$ 55.604.385	3,85%
33	TRANSPORTE	24	8.282.820	0,58%	24	100,00%	$ 8.282.820	0,58%	24	100,00%	$ 8.282.820	0,58%
34	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	6.766.375	0,47%	24	100,00%	$ 6.766.375	0,47%	24	100,00%	$ 6.766.375	0,47%
	SISTEMA DE MEDICIÓN		52.504.310	3,67%				0,00%				0,00%
35	Suministrar, instalar y poner en marcha un sistema de monitoreo con medidor propago monofásico calibrado con plataforma de visualización de datos.	24	52.504.310	3,67%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
36	MATERIALES	24	49.640.817	3,48%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
37	TRANSPORTE	24	473.304	0,03%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
38	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	2.390.169	0,17%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
39	INSTALACIÓN REDES INTERNAS		94.403.724	6,61%				6,61%				6,61%
40	Suministrar e instalar acometidas internas para viviendas incluye 4 luminarias y 5 tomacorrientes hasta 40 metros de tubería EMT 3/4" y 40 metros de cable trenzado 3x12 AWG.	24	94.403.724	6,61%			$ 94.403.724	6,61%		100,00%	$ 94.403.724	6,61%
41	MATERIALES	24	89.572.210	6,27%	24	100,00%	$ 89.572.210	6,27%	24	100,00%	$ 89.572.210	6,27%
42	TRANSPORTE	24	8.282.820	0,58%	24	100,00%	$ 8.282.820	0,58%	24	100,00%	$ 8.282.820	0,58%
43	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	24	16.548.694	1,16%	24	100,00%	$ 16.548.694	1,16%	24	100,00%	$ 16.548.694	1,16%
	COSTOS DIRECTOS		1.421.875.394				547.829.110				547.829.110	38,38%
	COSTOS INDIRECTOS AIU 38%		540.312.632				208.172.782				208.172.782	38,53%
	CAPACITACION		4.387.452	0,2%			1.690.407				1.690.407	38,53%
	PMA		5.401.306	0,3%			2.111.777				2.111.777	38,53%
	AVANCE TOTAL DE OBRA		1.972.056.464	100%			759.798.071	38,53%			759.798.071	38,53%
	PORCENTAJE AVANCE MENSUAL							38,53%				38,53%
	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO											38,53%

Gráfica 9. Ejecución por cantidades – Mes 1

4. CONCLUSIONES

- Durante las primeras semanas de ejecución del proyecto se llevaron a cabo actividades para garantizar una planeación estructurada y una comunicación efectiva con las partes del proyecto. La revisión detallada de los documentos técnicos permitió establecer un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de obra, mientras que la socialización del proyecto con las comunidades aseguró su comprensión y participación activa. Adicionalmente, fueron presentados a interventoría los formatos administrativos necesarios para evidenciar las obligaciones contractuales.

- Durante el periodo reportado, la vinculación del personal requerido conforme a los criterios técnicos y administrativos del contrato permitió dar inicio de manera organizada a las actividades programadas. Esto garantiza el cumplimiento progresivo de los objetivos del proyecto y respalda la futura entrada en operación de los sistemas solares fotovoltaicos en el municipio de Puerto Asís.

- Se cuenta con dos bodegas en Puerto Asís, las cuales son clave para garantizar la logística eficiente del proyecto, facilitando tanto el almacenamiento adecuado de insumos como la distribución oportuna hacia las áreas de trabajo en la zona rural del municipio. En estas fueron descargados un total de 148 paneles solares, junto con materiales eléctricos y estructurales destinados a las soluciones individuales, todos estos elementos debidamente certificados y conformes con los estándares técnicos requeridos. En lo referente a los reguladores, baterías e inversores, se ha avanzado significativamente en la evaluación y análisis de las opciones más adecuadas para su adquisición, priorizando el cumplimiento de los requerimientos técnicos y la eficiencia del proyecto.

- La ejecución y culminación de la actividad de replanteo permitió identificar con precisión a los 74 beneficiarios del proyecto, mientras que la recepción técnica de los materiales, los cuales cuentan con certificados de calidad, aseguró su idoneidad para la correcta ejecución de la obra. Estas acciones fortalecen la viabilidad técnica y la trazabilidad del proceso constructivo.

- A finales de mayo e inicios del mes de junio de 2025, se dio inicio al proceso de entrega e instalación de los paneles solares fotovoltaicos, los sistemas de puesta a tierras e internas. De este modo, hasta la fecha se han intervenido la totalidad de las viviendas beneficiadas, lo que refleja un progreso tangible del proyecto y demuestra una ejecución efectiva de las actividades planificadas.

- Se cuenta un avance financiero del proyecto del 39%, el cual es justificado en la compra, transporte e instalación de los equipos solares fotovoltaicos y materiales eléctrico como: paneles solares, SPT, estructura y soporte de paneles, e internas. Importante destacar que se plantea iniciar las puestas en servicio de los sistemas fotovoltaicos en el municipio de Puerto Asís a finales del mes de junio del 2025.

5. ANEXOS

Anexo 1. Pólizas
Anexo 2: Certificado de pagos de parafiscales
Anexo 3: Formatos de replanteo y ejecución de la obra
Anexo 4: Ficha técnica y certificado de conformidad – Materiales eléctricos y paneles solares
Anexo 5: Informe de replanteo
Anexo 6: Consolidado de Usuarios
Anexo 7: Cronograma de actividades

CAMILO GOMEZ
Residente de Obra
Consorcio Puerto Asís ZNI 2028

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

Informe residente obra

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101058167	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	23	06	2025	00:00	23	09	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025	NIT: 901.919.778-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 5 - 45	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA NRO 135-2025 CELEBRADO R LAS PARTES, RELACIONADO IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL NICIPIO DE PUERTO ASS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**23/06/2025**	**23/02/2026**	**$197,205,646.37**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**23/06/2025**	**23/09/2028**	**$98,602,823.19**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$394,411,292.74**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 23 DE JUNIO DE 2025 SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS.
LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,610,235.00	$ ******28,000.00	$ *****881,264.00	$ *********5,519,500.00	$ ******690,219,762.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101058167

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Gilma Cordoba

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101058167	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	23	06	2025	00:00	23	09	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025		NIT: 901.919.778-5
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 5 - 45	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3
DIRECCIÓN: PUERTO ASIS	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO		TELÉFONO 0

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED

GranGrano | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,610,235.00	$ ******28,000.00	$ *****881,264.00	$ *********5,519,500.00	$ ******690,219,762.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PUEDE ENVIAR TODAS SUS NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015003848962(3900)000005519500(96)20260623

REFERENCIA PAGO:
1101500384896-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101058167	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	23	06	2025	00:00	23	09	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025		NIT: 901.919.778-5
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 5 - 45	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3
DIRECCIÓN: PUERTO ASIS	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ELECTROLED DE COLOMBIA SAS	900560672-6	90.00
MULTISERVICIOS J & S SAS ZOMAC	901618976-5	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-44-101058167

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Gilma Cordoba

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113270B

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101058167	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025	NIT: 901.919.778-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 5 - 45	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA NRO 135-2025 CELEBRADO R LAS PARTES, RELACIONADO IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL NICIPIO DE PUERTO ASS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 23 DE JUNIO DE 2025 SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS.
LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(4,610,235.00)	$ ****(28,000.00)	$ ***(881,264.00)	$ *******(5,519,500.00)	$ ****(690,219,762.30)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101058167

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Silma Cordoba

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101058167	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025	NIT: 901.919.778-5	CL 10 NRO. 5 - 45	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3	PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(4,610,235.00)	$ ****(28,000.00)	$ ***(881,264.00)	$ *******(5,519,500.00)	$ ****(690,219,762.30)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PUEDE ENVIAR TODAS SUS NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101058167	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025		NIT: 901.919.778-5
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 5 - 45	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3
DIRECCIÓN: PUERTO ASIS	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ELECTROLED DE COLOMBIA SAS	900560672-6	90.00
MULTISERVICIOS J & S SAS ZOMAC	901618976-5	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-44-101058167

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Gilma Cordoba

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113270B

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101021225	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025	NIT: 901.919.778-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 5 - 45	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE PLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO 135-2025 REFERENTE A IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO.

TOMADOR:CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025
ASEGURADO:MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 23 DE JUNIO DE 2025 SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS.
LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(179,400.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(34,656.00)	$ *********(217,056.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101021225
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

Gilma Cordoba
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101021225	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025	NIT: 901.919.778-5	CL 10 NRO. 5 - 45	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3	PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(179,400.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(34,656.00)	$ *********(217,056.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PUEDE ENVIAR TODAS SUS NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101021225	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025		NIT: 901.919.778-5
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 5 - 45	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3
DIRECCIÓN: PUERTO ASIS	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ELECTROLED DE COLOMBIA SAS	900560672-6	90.00
MULTISERVICIOS J & S SAS ZOMAC	901618976-5	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-40-101021225

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Silma Cordoba

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113270B

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101021225	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025	NIT: 901.919.778-5	CL 10 NRO. 5 - 45	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3	PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE PLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO 135-2025 REFERENTE A IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO.

TOMADOR:CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025
ASEGURADO:MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 23 DE JUNIO DE 2025 SE ACTUALIZA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS.
LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INMODIFICABLES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(179,400.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(34,656.00)	$ *********(217,056.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101021225
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Gilma Cordoba
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101021225	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025	NIT: 901.919.778-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 5 - 45	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(179,400.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(34,656.00)	$ *********(217,056.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	113270	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PUEDE ENVIAR TODAS SUS NOTIFICACIONES *LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -*

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101021225	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	07	2025	11	04	2025	00:00	12	07	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025		NIT: 901.919.778-5
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 5 - 45	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELEFONO:**	3223654724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3
DIRECCIÓN: PUERTO ASIS	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ELECTROLED DE COLOMBIA SAS	900560672-6	90.00
MULTISERVICIOS J & S SAS ZOMAC	901618976-5	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-40-101021225

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL

NIT 891.200.461-3

MARLON DENNIS RODRIGUEZ LIZCANO

Representante Legal Interventoría

CV INGENIERÍA SAS

INFORME DE REPLANTEO Y VALIDACIÓN DE USUARIOS

Contrato de Obra 135 de 2025

GILMA CORDOBA ACOSTA

Representante Legal Contratista

CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025

NIT 901.919.778-5

PUERTO ASÍS

JULIO DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
1.1. LOCALIZACIÓN Y ALCANCE 4
1.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 5
2. REPLANTEO DE USUARIOS 6
2.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES 6
2.2. LISTADO DE USUARIOS INICIALES 7
2.3. OBSERVACIONES 10
2.4. LISTADO DE POSIBLES NUEVOS BENEFICIARIOS 11
2.5. GEOLOCALIZACIÓN DE LOS USUARIOS 12
3. CONCLUSIONES 14
4. ANEXOS 15

Índice de gráfica

Gráfica 1. Mapa del municipio beneficiario 5
Gráfica 2. Características de los beneficiarios 6
Gráfica 3. Cantidad de beneficiarios identificados por sus condiciones 7
Gráfica 4. Beneficiarios replanteo por vereda 11
Gráfica 5. Beneficiarios iniciales confirmados 13
Gráfica 6. Beneficiarios iniciales retirados 13
Gráfica 7. Beneficiarios finales 14

Índice de tabla

Tabla 1. Cantidad de usuarios por veredas 4
Tabla 2. Ficha Técnica del contrato 5
Tabla 3. Condiciones de retiro de los beneficiarios iniciales 7
Tabla 4. Beneficiarios iniciales del municipio de Puerto Asís 10
Tabla 5. Listado de posibles nuevos beneficiarios 12

1. INTRODUCCIÓN

Una vez finalizada la actividad de identificación de los usuarios del proyecto en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, se presenta el siguiente informe de replanteo, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Contrato de Obra No. 135 de 2025, suscrito entre la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS y el CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025

El propósito de este documento es exponer el panorama actual de las zonas veredales incluidas en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO".

Este informe presenta los resultados del proceso de replanteo, en el cual se verificaron los puntos de localización de las viviendas beneficiarias y se identificaron observaciones relevantes, incluyendo cambios en los beneficiarios inicialmente definidos.

1.1. LOCALIZACIÓN Y ALCANCE

El proyecto se desarrolla en las zonas no interconectadas del municipio de Puerto Asís, Putumayo. En total, se instalarán 74 soluciones solares fotovoltaicas individuales, con el objetivo de beneficiar a igual número de viviendas rurales ubicadas en estas áreas.

La instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos se llevará a cabo en 3 comunidades del municipio, las cuales se detallan en la siguiente tabla.

Municipio	Veredas Beneficiadas	Cantidad Soluciones Solares
PUERTO ASÍS	La Argentina	11
	La Palmera	24
	La Paz	39
TOTAL SOLUCIONES SOLARES		**74**

Tabla 1. Cantidad de usuarios por veredas



Gráfica 1. Mapa del municipio beneficiario

1.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra No. 135 de 2025, fue suscrito entre la entidad contratante ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS y la empresa CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025, el veintiocho (28) de febrero de 2025. A partir de esta fecha se expidieron las garantías las garantías contractuales, posteriormente el contrato dio inicio el día 13 de junio de 2025. A continuación, se presentan los datos generales del proyecto:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	135 de 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT 891.200.461-3
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025 NIT 901.919.778-5
REPRESENTANTE	GILMA CORDOBA ACOSTA CC 39.842.163
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.972.056.463,72
FECHA DE CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO:	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025


Tabla 2. Ficha Técnica del contrato

2. REPLANTEO DE USUARIOS

2.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES

La actividad de replanteo en el municipio de Puerto Asís se llevó a cabo entre el 13 y el 23 de junio de 2025. Durante este proceso, se identificaron 74 beneficiarios iniciales, lo que representa el 100 % de la meta establecida para esta etapa del proyecto.

Del total identificado, 60 beneficiarios se mantienen sin ninguna novedad, lo que corresponde al 81,08 % del listado inicial. En los casos restantes, las personas no cumplen con las condiciones requeridas para la energización, debido a las siguientes situaciones: El usuario no existe, (ii) el usuario ya cuenta con servicio de energía, (iii) el usuario renuncia a la instalación, (iv) el usuario no cuenta con vivienda, (v) el usuario no hace parte de la vereda beneficiada.

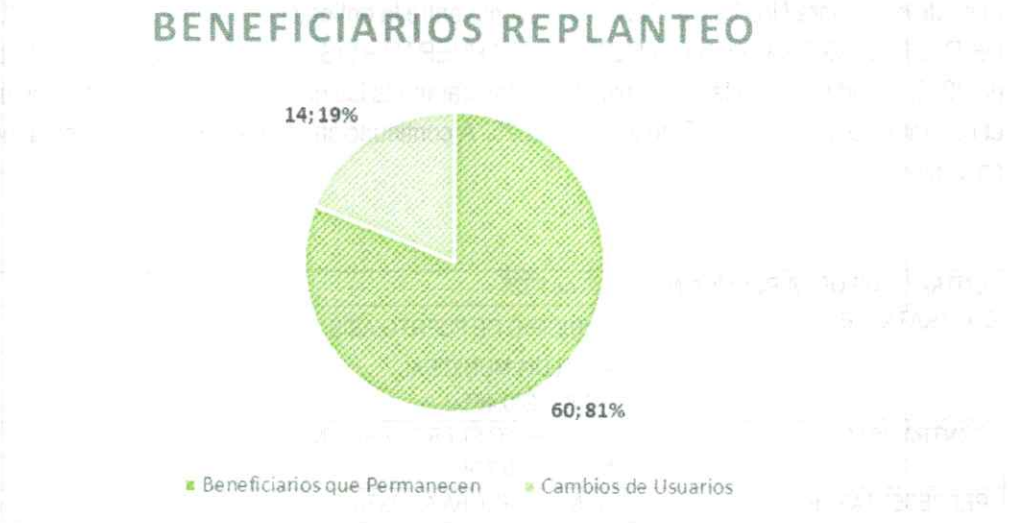

Gráfica 2. Características de los beneficiarios

Teniendo en cuenta las novedades identificadas durante el trabajo en campo, se ha elaborado la siguiente tabla, en la cual se detallan las condiciones que justifican el retiro de algunos usuarios inicialmente seleccionados.

Ítem	Condición presentada	No. Usuarios
1	El beneficiario ya cuenta con servicio de energía	1
2	El beneficiario NO existe	11
3	El beneficiario RENUNCIA a la instalación	2
	TOTAL	14

Tabla 3. Condiciones de retiro de los beneficiarios iniciales

Se verificó que la condición más frecuente corresponde a ***"usuario NO existe".*** En total, 11 beneficiarios iniciales presentan esta situación, lo que significa que el usuario propuesto no figura en el libro de socios de la Junta de Acción Comunal ni es reconocido en la zona de influencia del proyecto, por lo cual no puede ser considerado beneficiario del programa de energización.



Gráfica 3. Cantidad de beneficiarios identificados por sus condiciones

2.2. LISTADO DE USUARIOS INICIALES

En las siguientes tablas se presenta el listado de beneficiarios iniciales del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, destacando aquellos usuarios con observaciones, las cuales se especifican al final de cada tabla.

LISTADO INICIAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS						
ID	NOMBRES INICIALES	CEDULA INICIALES	VEREDA	LON	LAT	OBSERVACIONES
1	JADELLY ALEXANDRA GOMEZ	1123204405	LA ARGENTINA	0,5336485	-76,6401500	El usuario NO existe
2	DIFRAN ALTAMIRANO	1004695350	LA ARGENTINA	0,5320300	-76,6544100	El usuario NO existe
3	WILLIAN CARATAR	10066660111	LA ARGENTINA	0,5421081	-76,6491450	Ninguna
4	HELMI YANINA HERRERA LOPEZ	1006847220	LA ARGENTINA	0,5477131	-76,6393940	Ninguna
5	LUZ FANI GUERRERO LOPEZ	41182457	LA ARGENTINA	0,5299988	-76,6625970	Ninguna
6	OLGA MARINA GETIAL	1123312139	LA ARGENTINA	0,5482736	-76,6598730	Ninguna
7	SORAIDA EMILCE RODRIGUEZ LOPEZ	59652681	LA ARGENTINA	0,5319670	-76,6318210	Ninguna
8	DEISY YURANI TEZ ALTAMIRANO	1007180893	LA ARGENTINA	0,5485082	-76,6440350	Ninguna
9	EMICENO MAVISOY	18184411	LA ARGENTINA	0,5516756	-76,6570700	El usuario NO existe
10	OSCAR ANDRES FIGUEROA CHALACAN	1123200324	LA ARGENTINA	0,5440503	-76,6631190	Ninguna
11	JHONATAN DAVID YONDA LOPEZ	1130144736	LA ARGENTINA	0,5388494	-76,6365920	Ninguna
12	NURY SULEIMY ROA JACOBO	1083890970	LA PALMERA	0,4808100	-76,6210000	El usuario NO existe
13	RAMIRO COSTAIN	97437265	LA PALMERA	0,4846500	-76,6285000	Ninguna
14	EVARISTO CRIOLLO DIAZ	18186343	LA PALMERA	0,4835000	-76,6295900	Ninguna
15	NEIDA MARI CARRERA	69022815	LA PALMERA	0,4742323	-76,6199650	Ninguna
16	CLERIO ESTRADA	13067266	LA PALMERA	0,4683400	-76,6313500	El usuario NO existe
17	RONAL PLAZA RUIZ	1120096888	LA PALMERA	0,4690705	-76,6233020	Ninguna
18	MARIA ELISABET CRIOLLO ROMO	69028965	LA PALMERA	0,4832200	-76,6325600	Ninguna
19	JOSE MEREGILDO DIAZ CARRERA	1125409910	LA PALMERA	0,4815319	-76,6337430	Ninguna
20	SUSANA RODRIGUEZ	69040076	LA PALMERA	0,4779600	-76,6379500	El usuario NO existe
21	OMAIRA RODRIGUEZ	52404244	LA PALMERA	0,4773700	-76,6408400	El usuario NO existe
22	RODRIGO ANDRES ACOSTA ORTEGA	97445092	LA PALMERA	0,4826594	-76,6353990	Ninguna
23	JESUS CERON	87454735	LA PALMERA	0,4830100	-76,6439500	Ninguna
24	JHONY DANIEL MONTENEGRO	1123311492	LA PALMERA	0,4854100	-76,6458300	Ninguna
25	HECTOR LIBARDO DAZA	87947926	LA PALMERA	0,4902900	-76,6447500	Ninguna
26	ROLAN RONALDO RUALES	1123200255	LA PALMERA	0,4876500	-76,6423000	Ninguna
27	JOSE ISAURO GIRALDO PEREZ	1006815441	LA PALMERA	0,4653555	-76,6262480	Ninguna
28	MANUEL DAVID ALTAMIRANO	5341813	LA PALMERA	0,4688500	-76,6275900	Ninguna

LISTADO INICIAL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS						
ID	NOMBRES INICIALES	CEDULA INICIALES	VEREDA	LON	LAT	OBSERVACIONES
29	ELBIN MANUEL RUIZ PASTRANA	18188529	LA PALMERA	0,4554392	-76,6431620	El usuario renuncia a la instalación
30	YINET PATIÑO BONILLA	69010819	LA PALMERA	0,4619045	-76,6327330	Ninguna
31	SARA ZAMBRANO PARREÑO	27538044	LA PALMERA	0,4502252	-76,6567180	Ninguna
32	LEIDY VANESSA ARIAS ARBOLEDA	1125409874	LA PALMERA	0,4488695	-76,6496270	El usuario NO existe
33	JOHANA PATRICIA TIMANA CAPAZ	1122783702	LA PALMERA	0,4679527	-76,6407110	Ninguna
34	ROSAURA MONTENEGRO RODRIGUEZ	69028918	LA PALMERA	0,4629473	-76,6398240	Ninguna
35	JOSE ARMANDO CRIOLLO DIAZ	1006842168	LA PALMERA	0,4383373	-76,6517130	Ninguna
36	JOSE GUILLERMO ANDRADE	874706414	LA PAZ	0,4866200	-76,6493500	Ninguna
37	ROSA MEDILA CABRERA	27140478	LA PAZ	0,4906042	-76,6502790	Ninguna
38	ROBINSON DANIAN DIAZ	112332888	LA PAZ	0,4875019	-76,6598730	Ninguna
39	MARIA OLGA ANDRADE	27191659	LA PAZ	0,4905520	-76,6546850	Ninguna
40	TELMO GUERREO URBANO	18108776	LA PAZ	0,4818900	-76,6552200	Ninguna
41	ALBA ANDRADE	69021585	LA PAZ	0,4839000	-76,6561500	Ninguna
42	JOSE LUIS VALLEJOS	5373033	LA PAZ	0,4774400	-76,6565500	Ninguna
43	LUIS ALEXANDER LOPEZ	97435928	LA PAZ	0,4712800	-76,6557000	Ninguna
44	JOSE GERMAN ANDRADE	1007268272	LA PAZ	0,4681645	-76,6532510	Ninguna
45	JHON ANDERON ANDRADE	1123313201	LA PAZ	0,4744200	-76,6531800	Ninguna
46	ROBERTO CARLOS ANDRADE	97435853	LA PAZ	0,4758552	-76,6492750	Ninguna
47	JOSE LUIS ARTEAGA	98415315	LA PAZ	0,4719773	-76,6426470	El usuario NO existe
48	HOGO CANAMEJOY	18184711	LA PAZ	0,4693800	-76,6500700	El usuario renuncia a la instalación
49	REBECA MOSQUERA	69040029	LA PAZ	0,4707100	-76,6609600	Ninguna
50	WILMER HOYOS MOSQUERA	1123202863	LA PAZ	0,4684969	-76,6583540	Ninguna
51	JORGE CASTAÑEDA RINCON	17616280	LA PAZ	0,4659100	-76,6594100	Ninguna
52	ROBINSON TRUJILLO	1119203010	LA PAZ	0,4582200	-76,6610800	Ninguna
53	CLAUDIO FAVIAN CANAMEJOY	98367921	LA PAZ	0,4587800	-76,6637700	Ninguna
54	VIVIANA PATRICIA OCHOA	1097721049	LA PAZ	0,4640200	-76,6634500	Ninguna
55	JHON JAROL MADROÑERO	112306519	LA PAZ	0,4695900	-76,6666200	Ninguna

LISTADO INICIAL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS						
ID	NOMBRES INICIALES	CEDULA INICIALES	VEREDA	LON	LAT	OBSERVACIONES
56	LIBIA NARVAEZ	27140965	LA PAZ	0,4616405	-76,6627150	Ninguna
57	ALBERTO TREJOS NARVAEZ	12747092	LA PAZ	0,4629831	-76,6664300	Ninguna
58	LUIS GUEVARA	108107114	LA PAZ	0,4651404	-76,6701710	Ninguna
59	ROSALINO ZAMBRANO	97455117	LA PAZ	0,4713400	-76,6703000	Ninguna
60	RUBEN DARIO CRIOLLO	1123306231	LA PAZ	0,4700500	-76,6715800	Ninguna
61	MONICA LORENA NARVAEZ	1007705949	LA PAZ	0,4622600	-76,6752300	Ninguna
62	MOISES PRADA	5831078	LA PAZ	0,4609500	-76,6735100	Ninguna
63	ARLEY ARTURO NARVAEZ	1123200781	LA PAZ	0,4570300	-76,6754200	Ninguna
64	ROLANDO BERNARDO NARVAEZ	1006844219	LA PAZ	0,4592200	-76,6741900	Ninguna
65	JUAN PABLO ROSERO TAQUEZ	97480964	LA PAZ	0,4524313	-76,6729210	Ninguna
66	LUIS ANTIDIO NARVAEZ	1085689538	LA PAZ	0,4571500	-76,6787100	El usuario NO existe
67	DAGO BERTO CAMPOS NIETO	10592916	LA PAZ	0,4585900	-76,6796700	Ninguna
68	LALO FERNANDO NARVAEZ	1007765947	LA PAZ	0,4627600	-76,6779800	Ninguna
69	MAURO ZAMBRANO	16757914	LA PAZ	0,4800068	-76,6784680	Ninguna
70	ALEXANDER RAMOS	10878603	LA PAZ	0,4659600	-76,6790700	El usuario se encuentra interconectado al SIN
71	DIANA INES DIAZ VALLE	1123205911	LA PAZ	0,4725443	-76,6794520	Ninguna
72	LEIDY YULIANA GONZALEZ SILVA	1006665209	LA PAZ	0,4853674	-76,6637050	El usuario NO existe
73	LUIS EUGENIO CAPERA CHOA	1122732097	LA PAZ	0,4752523	-76,6725690	Ninguna
74	YESICA NATALIA ESCOBAR MEDINA	1007851620	LA PAZ	0,4694941	-76,6764800	Ninguna

Tabla 4. Beneficiarios iniciales del municipio de Puerto Asís

2.3. OBSERVACIONES


Finalizada la identificación de los usuarios, se ha planteado la reasignación de aquellos beneficiarios que presentaron novedades, dado que durante los trabajos de campo se constató la existencia de un número considerable de personas que cumplen con las condiciones para ser incluidos como

potenciales beneficiarios del proyecto. Esta reasignación se realizará previa certificación por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal correspondiente.

Ver Anexo 1: Actas de Replanteo - Municipio de Puerto Asís

Ver Anexo 2: Registro Fotográfico de las Viviendas

Teniendo en cuenta lo anterior, la vereda con el mayor porcentaje de usuarios a reasignar es La Palmera, con un 8,11 %, lo que equivale a 6 beneficiarios con novedades. Por su parte, la vereda con mayor número de beneficiarios sin novedades es La Paz, que registra 34 beneficiarios iniciales, correspondientes al 45,95 %. La siguiente gráfica ilustra esta información.

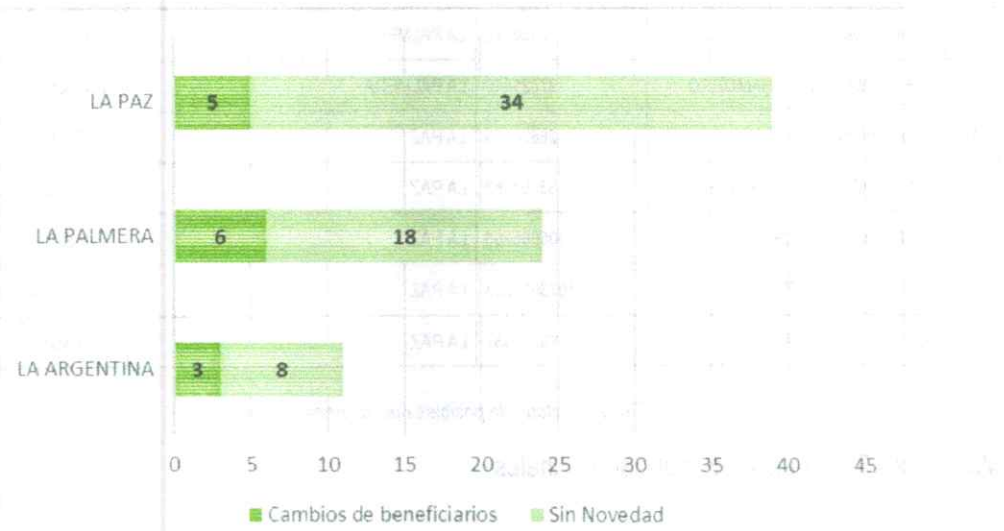

Gráfica 4. Beneficiarios replanteo por vereda

2.4. LISTADO DE POSIBLES NUEVOS BENEFICIARIOS

A continuación, se presenta una tabla con los nuevos beneficiarios propuestos por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de cada vereda correspondiente.

LISTADO DE POSIBLES NUEVOS BENEFICIARIOS					
ID	NOMBRES FINALES	CEDULAS FINALES	VEREDA FINAL	LAT	LON
1	MARIA TERESA YELA GETIAL	59650323	LA ARGENTINA	0,5439210	-76,6533360
2	MILLER AYALA MERA	1006666011	LA ARGENTINA	0,5420190	-76,6492350
9	FABIAN DARIO MAVISOY MORALES	1006844381	LA ARGENTINA	0,5354430	-76,6480930
12	MICHAEL ALEJANDRO FERNANDEZ OJEDA	1006846471	LA PALMERA	0,4842990	-76,6287830
16	JHON JAINER SOTELO RUIZ	1123207316	LA PALMERA	0,4700490	-76,6265450
20	LIZETH ANABEL CARRERA ACOSTA	1123305400	LA PALMERA	0,4775530	-76,6373060
21	ROSALBA ASCURILLO	1148195473	LA PALMERA	0,4835200	-76,6389280
29	MONICA JANETH VALLEJO CORAL	69020775	LA PALMERA	0,4852050	-76,6255300
32	ELSA EDILFA DIAZ CHAMORRO	27321410	LA PALMERA	0,4830510	-76,6314710
47	BELEN HOYOS MONTAÑO	26624665	LA PAZ	0,4713660	-76,6671750
48	SANDI NAZARET CAPERA CHOA	1133154068	LA PAZ	0,4678000	-76,6475810
66	LUCELY CLAROS CRUZ	1006665208	LA PAZ	0,4655910	-76,6774410
70	CARLOS RUIZ DIAZ	1073997703	LA PAZ	0,4646430	-76,6799980
72	LUIZ ARTEMIO CUASPUD	98361937	LA PAZ	0,4708750	-76,6578040

Tabla 5. Listado de posibles nuevos beneficiarios

Ver Anexo 3: Listado de Beneficiarios Finales


2.5. GEOLOCALIZACIÓN DE LOS USUARIOS

A continuación, se presenta la ubicación de los beneficiarios vinculados al proyecto en las diferentes veredas del municipio de Puerto Asís, visualizados en la plataforma Google Maps. Los beneficiarios se identifican mediante el siguiente código de colores:

- En color verde para aquellos beneficiarios del listado inicial validados y confirmados
- En color rojo para aquellos beneficiarios iniciales que tuvieron que ser retirados.
- En color azul para aquellos beneficiarios finales.



Gráfica 5. Beneficiarios iniciales confirmados

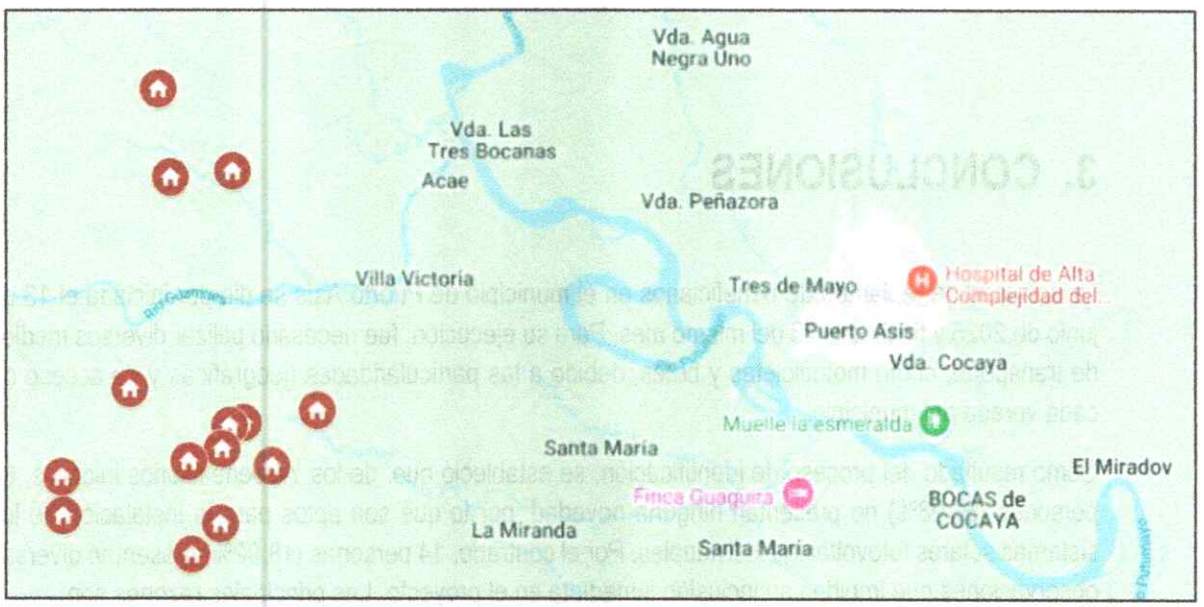

Gráfica 6. Beneficiarios iniciales retirados



Gráfica 7. Beneficiarios finales

Ver Anexo 4: Mapas de usuarios municipio de Puerto Asís

3. CONCLUSIONES

La actividad de replanteo de beneficiarios en el municipio de Puerto Asís se dio por iniciada el 13 de junio de 2025 y finalizó el 23 del mismo mes. Para su ejecución, fue necesario utilizar diversos medios de transporte, como motocicletas y botes, debido a las particularidades geográficas y de acceso de cada vereda del municipio.

Como resultado del proceso de identificación, se estableció que, de los 74 beneficiarios iniciales, 60 personas (81,08%) no presentan ninguna novedad, por lo que son aptos para la instalación de los sistemas solares fotovoltaicos individuales. Por el contrario, 14 personas (18,92%) presentan diversas observaciones que impiden su inclusión inmediata en el proyecto. Las principales razones son:

- El beneficiario ya cuenta con servicio de energía
- El beneficiario no existe
- El beneficiario desiste de la instalación

Cabe resaltar que la observación más frecuente corresponde a la condición de ***"usuario NO existe"***, que afecta a 11 beneficiarios iniciales. Esto implica que el usuario propuesto: i) No se encuentra dentro del libro de socios de la Junta de Acción Comunal, ii) No es conocido en la zona de influencia del proyecto.

Ante este panorama, se ha propuesto la reasignación de los 14 beneficiarios con observaciones, considerando que, durante el trabajo de campo, se identificó un número significativo de personas que sí cumplen con los requisitos establecidos y que actualmente no cuentan con acceso al servicio de energía eléctrica. Esta reasignación estará sujeta a la validación y certificación por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal y del ente territorial correspondiente.

4. ANEXOS

Anexo 1: Actas de Replanteo - Municipio de Puerto Asís
Anexo 2: Registro Fotográfico de las Viviendas
Anexo 3: Listado de Beneficiarios Finales
Anexo 4: Mapas de Usuarios - Municipio de Puerto Asís
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1oeH8RF14G8r39oforSWmTMbpjI4limg&usp=sharing

CAMILO GOMEZ
Residente de Obra
Consorcio Puerto Asís ZNI 2028

ID	VEREDA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO NUEVO	IDENTIFICACIÓN FINAL	LATITUD FINAL	LONGITUD FINAL
12	LA PALMERA	MICHAEL ALEJANDRO FERNANDEZ OJEDA	1006846471	0,4842990	-76,6287830
13	LA PALMERA	RAMIRO COSTAIN	97437265	0,4846500	-76,6285000
14	LA PALMERA	EVARISTO CRIOLLO DIAZ	18186343	0,4835000	-76,6295900
15	LA PALMERA	NEIDA MARI CARRERA	69022815	0,4742323	-76,6199650
16	LA PALMERA	JHON JAINER SOTELO RUIZ	1123207316	0,4700490	-76,6265450
17	LA PALMERA	RONAL PLAZA RUIZ	1120096888	0,4690705	-76,6233020
18	LA PALMERA	MARIA ELISABET CRIOLLO ROMO	69028965	0,4832200	-76,6325600
19	LA PALMERA	JOSE MEREGILDO DIAZ CARRERA	1125409910	0,4815319	-76,6337430
20	LA PALMERA	LIZETH ANABEL CARRERA ACOSTA	1123305400	0,4775530	-76,6373060
21	LA PALMERA	ROSALBA ASCURILLO	1148195473	0,4835200	-76,6389280
22	LA PALMERA	RODRIGO ANDRES ACOSTA ORTEGA	97445092	0,4826594	-76,6353990
23	LA PALMERA	JESUS CERON	87454735	0,4830100	-76,6439500
24	LA PALMERA	JHONY DANIEL MONTENEGRO	1123311492	0,4854100	-76,6458300
25	LA PALMERA	HECTOR LIBARDO DAZA	87947926	0,4902900	-76,6447500
26	LA PALMERA	ROLAN RONALDO RUALES	1123200255	0,4876500	-76,6423000
27	LA PALMERA	JOSE ISAURO GIRALDO PEREZ	1006815441	0,4653555	-76,6262480
28	LA PALMERA	MANUEL DAVID ALTAMIRANO	5341813	0,4688500	-76,6275900
29	LA PALMERA	MONICA JANETH VALLEJO CORAL	69020775	0,4852050	-76,6255300
30	LA PALMERA	YINET PATIÑO BONILLA	69010819	0,4619045	-76,6327330
31	LA PALMERA	SARA ZAMBRANO PARREÑO	27538044	0,4502252	-76,6567180
32	LA PALMERA	ELSA EDILFA DIAZ CHAMORRO	27321410	0,4830510	-76,6314710
33	LA PALMERA	JOHANA PATRICIA TIMANA CAPAZ	1122783702	0,4679527	-76,6407110
34	LA PALMERA	ROSAURA MONTENEGRO RODRIGUEZ	69028918	0,4629473	-76,6398240
35	LA PALMERA	JOSE ARMANDO CRIOLLO DIAZ	1006842168	0,4383373	-76,6517130
36	LA PAZ	JOSE GUILLERMO ANDRADE	874706414	0,4866200	-76,6493500
37	LA PAZ	ROSA MEDILA CABRERA	27140478	0,4906042	-76,6502790
38	LA PAZ	ROBINSON DANIAN DIAZ	112332888	0,4875019	-76,6598730
39	LA PAZ	MARIA OLGA ANDRADE	27191659	0,4905520	-76,6546850
40	LA PAZ	TELMO GUERREO URBANO	18108776	0,4818900	-76,6552200
41	LA PAZ	ALBA ANDRADE	69021585	0,4839000	-76,6561500
42	LA PAZ	JOSE LUIS VALLEJOS	5373033	0,4774400	-76,6585500
43	LA PAZ	LUIS ALEXANDER LOPEZ	97435928	0,4712800	-76,6557000
44	LA PAZ	JOSE GERMAN ANDRADE	1007268272	0,4681645	-76,6532510
45	LA PAZ	JHON ANDERON ANDRADE	1123313201	0,4744200	-76,6531800
46	LA PAZ	ROBERTO CARLOS ANDRADE	97435853	0,4758552	-76,6492750
47	LA PAZ	BELEN HOYOS MONTAÑO	26624665	0,4713660	-76,6671750
48	LA PAZ	SANDI NAZARET CAPERA CHOA	1133154068	0,4678000	-76,6475810
49	LA PAZ	REBECA MOSQUERA	69040029	0,4707100	-76,6609600
50	LA PAZ	WILMER HOYOS MOSQUERA	1123202863	0,4684969	-76,6583540
51	LA PAZ	JORGE CASTAÑEDA RINCON	17616280	0,4659100	-76,6594100
52	LA PAZ	ROBINSON TRUJILLO	1119203010	0,4582200	-76,6610800
53	LA PAZ	CLAUDIO FAVIAN CANAMEJOY	98367921	0,4587800	-76,6637700
54	LA PAZ	VIVIANA PATRICIA OCHOA	1097721049	0,4640200	-76,6634500
55	LA PAZ	JHON JAROL MADROÑERO	112306519	0,4695900	-76,6666200
56	LA PAZ	LIBIA NARVAEZ	27140965	0,4616405	-76,6627150
57	LA PAZ	ALBERTO TREJOS NARVAEZ	12747092	0,4629831	-76,6664300
58	LA PAZ	LUIS GUEVARA	108107114	0,4651404	-76,6701710
59	LA PAZ	ROSALINO ZAMBRANO	97455117	0,4713400	-76,6703000
60	LA PAZ	RUBEN DARIO CRIOLLO	1123306231	0,4700500	-76,6715800
61	LA PAZ	MONICA LORENA NARVAEZ	1007705949	0,4622600	-76,6752300
62	LA PAZ	MOISES PRADA	5831078	0,4609500	-76,6735100
63	LA PAZ	ARLEY ARTURO NARVAEZ	1123200781	0,4570300	-76,6754200
64	LA PAZ	ROLANDO BERNARDO NARVAEZ	1006844219	0,4592200	-76,6741900
65	LA PAZ	JUAN PABLO ROSERO TAQUEZ	97480964	0,4524313	-76,6729210
66	LA PAZ	LUCELY CLAROS CRUZ	1006665208	0,4655910	-76,6774410
67	LA PAZ	DAGO BERTO CAMPOS NIETO	10592916	0,4585900	-76,6796700
68	LA PAZ	LALO FERNANDO NARVAEZ	1007765947	0,4627600	-76,6779800
69	LA PAZ	MAURO ZAMBRANO	16757914	0,4800068	-76,6784680
70	LA PAZ	CARLOS RUIZ DIAZ	1073997703	0,4646430	-76,6799980
71	LA PAZ	DIANA INES DIAZ VALLE	1123205911	0,4725443	-76,6794520
72	LA PAZ	LUIZ ARTEMIO CUASPUD	98361937	0,4708750	-76,6578040
73	LA PAZ	LUIS EUGENIO CAPERA CHOA	1122732097	0,4752523	-76,6725690
74	LA PAZ	YESICA NATALIA ESCOBAR MEDINA	1007851620	0,4694941	-76,6764800

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA 135 - 2025

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO"

					ACUMULADO				MES 1			
Id	NOMBRE DE LA TAREA	CANTIDAD FINAL	COSTO ($)	PESO ACTIVIDAD (%)	EJECUTADO UNIDADES	% EJECUTADO POR ACTIVIDAD	VALOR EN PESOS	% AVANCE OBRA	EJECUTADO UNIDADES	% EJECUTADO POR ACTIVIDAD	VALOR EN PESOS	% AVANCE OBRA
1	Replanteo de Obra		6.809.110,00	0,48%			$ 6.809.110	0,48%				0,48%
2	Replanteo de Obra	74	6.809.110	0,48%			$ 6.809.110	0,48%		5,02%	$ 6.809.110	0,48%
3	MATERIALES	74	148.000	0,01%	74	100,00%	$ 148.000	0,01%	74	100,00%	$ 148.000	0,01%
4	TRANSPORTE	74	2.220.000	0,16%	74	100,00%	$ 2.220.000	0,16%	74	100,00%	$ 2.220.000	0,16%
5	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	4.441.110,00	0,31%	74	100,00%	$ 4.441.110	0,31%	74	100,00%	$ 4.441.110	0,31%
6	SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR		1.268.158.350,00	88,74%				31,25%				31,25%
7	Suministrar e instalar la estructura de soporte de dos paneles. Incluye poste galvanizado de 3", altura de 3m, incluye soporte, tornillería y cimentación en concreto reforzado con resistencia de 28 Mpa.	74	135.585.760	9,49%			$ 135.585.760	9,49%		100,00%	$ 135.585.760	9,49%
8	MATERIALES	74	97.644.421	6,83%	74	100,00%	$ 97.644.421	6,83%	74	100,00%	$ 97.644.421	6,83%
9	TRANSPORTE	74	28.398.240	1,99%	74	100,00%	$ 28.398.240	1,99%	74	100,00%	$ 28.398.240	1,99%
10	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	9.543.099	0,67%	74	100,00%	$ 9.543.099	0,67%	74	100,00%	$ 9.543.099	0,67%
11	Suministrar e instalar los módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 1,100Wp (2 paneles de 550Wp cada uno) con las siguientes características: ŋ=21,28% condiciones STC. garantía de producción a 12 años del 91.4% y del 84,8% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºc +85ºc, certificación IEC61730, IEC 61215 de conformidad de producto internacional	74	240.970.936	16,86%			$ 240.970.936	16,86%		100,00%	$ 240.970.936	16,86%
12	MATERIALES	74	213.294.640	14,93%	74	100,00%	$ 213.294.640	14,93%	74	100,00%	$ 213.294.640	14,93%
13	TRANSPORTE	74	14.199.120	0,99%	74	100,00%	$ 14.199.120	0,99%	74	100,00%	$ 14.199.120	0,99%
14	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	13.477.176	0,94%	74	100,00%	$ 13.477.176	0,94%	74	100,00%	$ 13.477.176	0,94%
15	Suministrar e instalar regulador de carga, 100V/60A, eficiencia del 98%, apto para cargar baterías tipo LiFePO4.	74	109.030.638	7,63%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
16	MATERIALES	74	102.893.300	7,20%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
17	TRANSPORTE	74	1.419.912	0,10%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
18	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	4.717.426	0,33%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
19	Suministrar e instalar batería de ión- litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200Ah 24 VDC 3600 ciclos hasta el 80% DOD.	74	483.142.300,00	33,81%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
20	MATERIALES	74	465.682.925	32,59%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
21	TRANSPORTE	74	11.832.600	0,83%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
22	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	5.626.775	0,39%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
23	Suministrar e instalar inversor tipo "off- grid" onda senoidal pura, potencia de 2.000W, 24VDC input 110VAC output, f=60 Hz, protección y desconexión por bajo voltaje en la batería. (incluye transporte)	74	101.729.576	7,12%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
24	MATERIALES	74	95.148.830	6,66%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
25	TRANSPORTE	74	3.076.476	0,22%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
26	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	3.504.270	0,25%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
27	Suministrar e instalar gabinete en lámina galvanizada C16, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior con grado de protección IP56.	74	127.645.560	8,93%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
28	MATERIALES	74	109.418.805	7,66%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
29	TRANSPORTE	74	9.466.080	0,66%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
30	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	8.760.675	0,61%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
31	Suministrar e instalar sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico con varilla de cobre de 5/8" x 2,4 metros con preparación de suelo.	74	70.053.580	4,90%			$ 70.053.580	4,90%		100,00%	$ 70.053.580	4,90%
32	MATERIALES	74	55.004.385	3,85%	74	100,00%	$ 55.004.385	3,85%	74	100,00%	$ 55.004.385	3,85%
33	TRANSPORTE	74	8.282.820	0,58%	74	100,00%	$ 8.282.820	0,58%	74	100,00%	$ 8.282.820	0,58%
34	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	6.766.375	0,47%	74	100,00%	$ 6.766.375	0,47%	74	100,00%	$ 6.766.375	0,47%
	SISTEMA DE MEDICIÓN		52.504.110	3,67%				0,00%				0,00%
35	Suministrar, instalar y poner en marcha un sistema de monitoreo con medidor prepago monofásico calibrado con plataforma de visualización de datos.	74	52.504.110	3,67%			$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
36	MATERIALES	74	49.840.637	3,49%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
37	TRANSPORTE	74	473.304	0,03%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
38	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	2.190.169	0,15%	0	0,00%	$ -	0,00%	0	0,00%	$ -	0,00%
39	INSTALACIÓN REDES INTERNAS		94.403.724	6,61%				6,61%				6,61%
40	Suministrar e instalar acometidas internas para viviendas incluye 4 luminarias y 5 tomacorrientes hasta 40 metros de tubería EMT 3/4" y 40 metros de cable trenzado 3x12 AWG.	74	94.403.724	6,61%			$ 94.403.724	6,61%		100,00%	$ 94.403.724	6,61%
41	MATERIALES	74	69.572.210	4,87%	74	100,00%	$ 69.572.210	4,87%	74	100,00%	$ 69.572.210	4,87%
42	TRANSPORTE	74	8.282.820	0,58%	74	100,00%	$ 8.282.820	0,58%	74	100,00%	$ 8.282.820	0,58%
43	MANO DE OBRA + EQUIPOS & H	74	16.548.694	1,16%	74	100,00%	$ 16.548.694	1,16%	74	100,00%	$ 16.548.694	1,16%
	COSTOS DIRECTOS		1.421.875.294				547.823.110				547.823.110	38,53%
	COSTOS INDIRECTOS AUI 38%		540.312.612				208.172.782				208.172.782	38,53%
	CAPACITACION		4.387.452	0,2%			1.690.407				1.690.407	38,53%
	PMA		5.481.106	0,3%			2.111.772				2.111.772	38,53%
	AVANCE TOTAL DE OBRA		1.972.056.464	100%			759.798.071	38,53%			759.798.071	38,53%
	PORCENTAJE AVANCE MENSUAL							38,53%				38,53%
	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO											38,53%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO"

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS

CONTRATO DE OBRA 344 DE 2024				ACTA DE AVANCE			ACUMULADO
				13/06/2025-12/07/2025	13/07/2025-12/08/2025	13/08/2025-12/09/2025	
				ETAPA DE IMPORTACION DE EQUIPCS			
ITEM	ACTIVIDAD	COSTO INICIAL ($)	PROGRAMACION	1	2	3	
1	Replanteo de Obra		PROGRAMADO	$ 6.809.110	$ -	$ -	$ 6.809.110
			EJECUTADO	$ 6.809.110	$ -	$ -	$ 6.809.110
1,1	Replanteo de Obra	$ 6.809.110,00	PROGRAMADO	$ 6.809.110	$ -	$ -	$ 6.809.110
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 6.809.110	$ -	$ -	$ 6.809.110
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00
2	SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR		PROGRAMADO	$ 446.610.276	$ 43.702.609	$ 830.349.575	$ 1.320.662.460
			EJECUTADO	$ 446.610.276	$ -	$ -	$ 446.610.276
2,1	Suministrar e instalar la estructura de soporte de dos paneles. incluye poste galvanizado de 3", altura de 3m, incluye soporte, tornillería y cimentación en concreto reforzado con resistencia de 28 Mpa.	$ 135.585.760,00	PROGRAMADO	$ 135.585.760			$ 135.585.760
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 135.585.760	$ -	$ -	$ 135.585.760
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00
2,2	Suministrar e instalar los módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 1,100Wp (2 paneles de 550Wp cada uno) con las siguientes características: η=21,28% condiciones STC. garantía de producción a 12 años del 91.4% y del 84,8% a 25 años, temperatura de trabajo de -40°c +85°c, certificación IEC61730, IEC 61215 de conformidad de producto internacional	$ 240.970.936,00	PROGRAMADO	$ 240.970.936			$ 240.970.936
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 240.970.936	$ -	$ -	$ 240.970.936
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00
2,3	Suministrar e instalar regulador de carga, 100V/60A, eficiencia del 98%, apto para cargar baterías tipo LiFePO4.	$ 109.030.638,00	PROGRAMADO		$ 5.451.532	$ 103.579.106	$ 109.030.638
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
2,4	Suministrar e instalar batería de ión- litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200Ah 24 VDC 3800 ciclos hasta el 80% DOD.	$ 483.142.300,00	PROGRAMADO		$ 24.157.115	$ 458.985.185	$ 483.142.300
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
2,5	Suministrar e instalar inversor tipo "off- grid" onda senoidal pura, potencia de 2.000W, 24VDC input 110VAC output, f=60 Hz, protección y desconexión por bajo voltaje en la batería. (incluye transporte)	$ 101.729.576,00	PROGRAMADO		$ 5.086.479	$ 96.643.097	$ 101.729.576
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
2,6	Suministrar e instalar gabinete en lámina galvanizada C16, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior con grado de protección IP56.	$ 127.645.560,00	PROGRAMADO		$ 6.382.278	$ 121.263.282	$ 127.645.560
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
2,7	Suministrar e instalar sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico con varilla de cobre de 5/8" x 2,4 metros con preparación de suelo.	$ 70.053.580,00	PROGRAMADO	$ 70.053.580			$ 70.053.580
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 70.053.580	$ -	$ -	$ 70.053.580
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00
3	SISTEMA DE MEDICIÓN		PROGRAMADO	$ -	$ 2.625.206	$ 49.878.905	$ 52.504.110
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
3,1	Suministrar, instalar y poner en marcha un sistema de monitoreo con medidor prepago monofásico calibrado con plataforma de visualización de datos.	$ 52.504.110,00	PROGRAMADO		$ 2.625.206	$ 49.878.905	$ 52.504.110
			UND PROGRAMADAS		4	70	74,00
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -
			UND EJECUTADAS	-	-	-	-
4	INSTALACIÓN REDES INTERNAS		PROGRAMADO	$ 94.403.724	$ -	$ -	$ 94.403.724
			EJECUTADO	$ 94.403.724	$ -	$ -	$ 94.403.724
4,1	Suministrar e instalar acometidas internas para viviendas incluye 4 luminarias y 5 tomacorrientes hasta 40 metros de tubería EMT 3/4" y 40 metros de cable trenzado 3x12 AWG.	$ 94.403.724,00	PROGRAMADO	$ 94.403.724			$ 94.403.724
			UND PROGRAMADAS	74			74,00
			EJECUTADO	$ 94.403.724	$ -	$ -	$ 94.403.724
			UND EJECUTADAS	74	-	-	74,00

	COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.421.875.294,00	PROGRAMADO	$ 547.823.110	$ 43.702.609	$ 830.349.575	$ 1.421.875.294,00
	COSTOS INDIRECTOS OBRA AUI 38%	$ 540.312.611,72		$ 208.172.782	$ 16.606.991	$ 315.532.838	$ 540.312.611,72
	CAPACITACION	$ 4.387.452,00		$ 1.462.484	$ 1.462.484	$ 1.462.484	$ 4.387.452,00
	PMA	$ 5.481.106,00		$ 1.827.035	$ 1.827.035	$ 1.827.035	$ 5.481.106,00
	COSTO TOTAL OBRA	$ 1.972.056.463,72		$ 759.285.411	$ 63.599.120	$ 1.149.171.933	$ 1.972.056.463,72
	INVERSION MENSUAL ACUMULADA			$ 759.285.411	$ 822.884.531	$ 1.972.056.464	
	INVERSION MENSUAL EN % SEGÚN CONTRATO INICIAL			39%	42%	100%	

	COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.421.875.294,00	EJECUTADO	$ 547.823.110,00	$ -	$ -	$ 547.823.110
	COSTOS INDIRECTOS OBRA AUI 38%	$ 540.312.611,72		$ 208.172.781,80	$ -	$ -	$ 208.172.78
	CAPACITACION	$ 4.387.452,00		$ 1.690.406,75	$ -	$ -	$ 1.690.4
	PMA	$ 5.481.106,00		$ 2.111.772,07	$ -	$ -	$ 2.111.7
	COSTO TOTAL OBRA	$ 1.972.056.463,72		$ 759.798.070,63	$ -	$ -	$ 759.7
	INVERSION MENSUAL ACUMULADA			$ 759.798.071	$ 759.798.070,63	$ 759.798.070,63	
	INVERSION MENSUAL EN % SEGÚN CONTRATO INICIAL			38,53%	38,53%	38,53%	

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NO. 135 DE 2025

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO

CONTRATISTA : CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025 — CV INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

En Puerto Asis, a los (18) dias del mes de julio del año 2025 se reunieron el Representante Legal de la firma Constructora y el Representante legal de la firma Interventora del Contrato No. 135 de 2025, para dejar constancia por medio de la presente acta N°1 del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	Replanteo de Obra												
0	Replanteo de Obra	UND	74	$ 92.015	$ 6.809.110	0	74	74	$ 0	$ 6.809.110	$ 6.809.110	0	$ 0
	SUBTOTAL REPLANTEO DE OBRA				**$ 6.809.110**				**$ 0**	**$ 6.809.110**	**$ 6.809.110**		**$ 0**
1	**Sistema de Generación Solar**												
1.1	Suministrar e instalar la estructura de soporte de dos paneles. Incluye poste galvanizado de 3", altura de 3m, incluye soporte, tornilleria y cimentación en concreto reforzado con resistencia de 28 Mpa	UND	74	$ 1.832.240	$ 135.585.760	0	74	74	$ 0	$ 135.585.760	$ 135.585.760	0	$ 0
1.2	Suministrar e instalar los módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 1,100Wp (2 paneles de 550Wp cada uno) con las siguientes caracteristicas. η=21,28% condiciones STC. garantia de producción a 12 años del 91,4% y del 84,8% a 25 años, temperatura de trabajo de -40°c +85°c, certificación IEC61730, IEC 61215 de conformidad de producto internacional	UND	74	$ 3.256.364	$ 240.970.936	0	74	74	$ 0	$ 240.970.936	$ 240.970.936	0	$ 0
1.3	Suministrar e instalar regulador de carga, 100V/60A, eficiencia del 98%, apto para cargar baterias tipo LiFePO4.	UND	74	$ 1.473.387	$ 109.030.638	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	74	$ 109.030.638
1.4	Suministrar e instalar bateria de ión- litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200Ah 24 VDC 3600 ciclos hasta el 80% DOD.	UND	74	$ 6.528.950	$ 483.142.300	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	74	$ 483.142.300
1.5	Suministrar e instalar inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2.000W, 24VDC input 110VAC output, f=60 Hz, protección y desconexión por bajo voltaje en la bateria. (incluye transporte)	UND	74	$ 1.374.724	$ 101.729.576	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	74	$ 101.729.576
1.6	Suministrar e instalar gabinete en lámina galvanizada C16, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior con grado de protección IP56.	UND	74	$ 1.724.940	$ 127.645.560	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	74	$ 127.645.560
1.7	Suministrar e instalar sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico con varilla de cobre de 5/8" x 2,4 metros con preparación de suelo.	UND	74	$ 946.670	$ 70.053.580	0	74	74	$ 0	$ 70.053.580	$ 70.053.580	0	$ 0
	SUBTOTAL SISTEMA SOLAR VIVIENDA TIPO				**$ 1.268.158.360**				**$ 0**	**$ 446.810.276**	**$ 446.810.276**		**$ 821.848.074**
2	**Sistema de Medición**												
2.1	Suministrar, instalar y poner en marcha un sistema de monitoreo con medidor prepago monofásico calibrado con plataforma de visualización de datos.	UND	74	$ 709.515	$ 52.504.110	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	74	$ 52.504.110
	SUBTOTAL SISTEMA DE MEDICIÓN				**$ 52.504.110**				**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 52.504.110**
3	**Instalación redes internas**												
3.1	Suministrar e instalar acometidas internas para viviendas incluye 4 luminarias y 5 tomacorrientes hasta 40 metros de tuberia EMT 3/4" y 40 metros de cable trenzado 3x12 AWG	UND	74	$ 1.275.726	$ 94.403.724	0	74	74	$ 0	$ 94.403.724	$ 94.403.724	0	$ 0
	SUBTOTAL CONEXIONES INTERNAS VIVIENDAS				**$ 94.403.724**				**$ 0**	**$ 94.403.724**	**$ 94.403.724**		**$ 0**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				**$ 1.421.876.294**				**$ 0**	**$ 647.823.110**	**$ 647.823.110**		**$ 874.052.184**
	ADMINISTRACIÓN	32%			$ 455.000.094				$ 0	$ 175.303.395,20	$ 175.303.395,20		$ 279.696.699
	IMPREVISTOS	1%			$ 14.218.753				$ 0	$ 5.478.231,10	$ 5.478.231,10		$ 8.740.522
	UTEJDAD	5%			$ 71.093.765				$ 0	$ 27.391.155,50	$ 27.391.155,50		$ 43.702.609
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO				**$ 540.312.612**				**$ 0**	**$ 208.172.781,80**	**$ 208.172.781,80**		**$ 332.139.830**
	CAPACITACIÓN	0,22%			$ 4.387.452				$ 0	$ 1.690.406,75	$ 1.690.406,75		$ 2.697.045
	PMA	0,28%			$ 5.481.106				$ 0	$ 2.111.772,07	$ 2.111.772,07		$ 3.369.334
	TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO				**$ 1.972.056.463,72**				**$ 0,00**	**$ 759.798.070,63**	**$ 759.798.070,63**		**$ 1.212.258.393,09**
	PORCENTAJE TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS								**0%**	**39%**	**39%**		**61%**

BALANCE PRESUPUESTAL

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO			PAGADO ACUMULADO	
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 1.972.056.463,72	VALOR ANTICIPO		$ 0,00	ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 759.798.070,63		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 0,00		ACTAS ANTERIORES	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 1.212.258.393,09		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0,00		PRESENTE ACTA	$ 759.798.070,63
			SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00			
SUMAS IGUALES	$ 1.972.056.463,72	$ 1.972.056.463,72	SUMAS IGUALES	$ 0,00	$ 0,00	TOTAL	$ 759.798.070,63

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 759.798.070,63
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 759.798.070,63

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Para el trámite del pago se deberán anexar los pagos de aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista.

GILMA CORDOBA ACOSTA
RL CONSORCIO PUERTO ASÍS ZNI 2025
CONTRATISTA DE OBRA

MARLON DENNIS RODRIGUEZ LIZCANO
RL CV INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
INTERVENTORÍA

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ASÍS
SUPERVISOR CONTRATO

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

B&R 0375-25

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que, el establecimiento **CONSORCIO PUERTO ASIS ZNI 2025** NIT:901.919.778-5 Representación Legal de la señora **CORDOBA ACOSTA GILMA** identificado (a) con **C.C. No** 39.842.163 presentó la declaración privada de Industria y Comercio y canceló el Impuesto de Industria y Comercio del periodo gravable Año **2024.**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de **INDUSTRIA Y COMERCIO** del periodo gravable Año **2024.**

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), a los veintidós (22) días del mes de julio 2025.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

Proyecto:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Nancy Yolima Rojas Cabrera PA Oficina Rentas Municipal	Víctor Wilmer Perenguez Narváez Jefe de Bienes y Rentas	José Fabian Flórez Hoyos Secretario De Hacienda

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

B&R 0373-25

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que, el establecimiento **MULTISERVICIOS J&S S.A.S. ZOMAC** NIT:901.618.976-5 Representación Legal de la señora **CORDOBA ACOSTA GILMA** identificado (a) con **C.C. No** 39.842.163 presentó la declaración privada de Industria y Comercio y canceló el Impuesto de Industria y Comercio del periodo gravable Año **2024.**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de **INDUSTRIA Y COMERCIO** del periodo gravable Año **2024.**

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), a los veintidós (22) días del mes de julio 2025.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

Proyecto:	**Reviso:**	**Aprobó:**
Nancy Yolima Rojas Cabrera PA Oficina Rentas Municipal	Víctor Wilmer Perenguez Narváez Jefe de Bienes y Rentas	José Fabian Flórez Hoyos Secretario De Hacienda

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

B&R 0374-25

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que, el establecimiento **ELECTROLED DE COLOMBIA S.A.S.** NIT:900.560.672-6 Representación Legal del señor **HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN FELIPE** identificado (a) con **C.C. No** 1.130.667.203 presentó la declaración privada de Industria y Comercio y canceló el Impuesto de Industria y Comercio del periodo gravable Año **2024.**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de **INDUSTRIA Y COMERCIO** del periodo gravable Año **2024.**

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), a los veintidós (22) días del mes de julio 2025.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

Proyecto:	Reviso:	Aprobó:
Nancy Yolima Rojas Cabrera PA Oficina Rentas Municipal	Victor Wilmer Perenguez Narváez Jefe de Bienes y Rentas	José Fabian Flórez Hoyos Secretario De Hacienda

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas
