LISTA DE CHEQUEO CONVENIO SOLIDARIO
INFORMES MENSUALES AL CONVENIO

112-ECP-FR-200-V04
09/09/2024

CONVENIO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

INFORMES MENSUALES AL CONVENIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO SOLIDARIO	112-ECP-FR-262	SI
INFORME MENSUAL DE JAC	Papelería de la JAC	SI
BITACORA CONVENIO SOLIDARIO (ORIGINAL)	112-ECP-FR-086 ó libro de bitacora que llevo en obra	SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos entregables de cada informe mensual, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta convenio solidario que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	-	SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: LOZARELLY MONZON DIAZ
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25700-52133

Firma
Nombre: DARWIN JOEL GUALTEROS MORALES
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 25202-348483 CND

V°B°
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
REVISÓ

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO SOLIDARIO

112-ECP-FR-262-V2
09/09/2024

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

Periodo de 01/11/2024 a 25/11/2024
Fecha de Presentación: 25/11/2024

INFORMACIÓN BASICA CONVENIO SOLIDARIO	
OBJETO DEL CONVENIO SOLIDARIO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO MELUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR DEL CONVENIO SOLIDARIO:	$ 40.360.701,00
VALOR ADICIONAL:	NA
VALOR ACTUALIZADO:	$ 40.360.701,00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL:	VEREDA BAJO MELUA
NIT:	900.123.599-2
REPRESENTANTE LEGAL:	RUBEN DARIO MUÑOS MOTTA
CORREO ELECTRONICO:	rubendariomunozmotta@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO		
FECHA DE INICIACIÓN:		30/08/2024
PRÓRROGA:		NA
SUSPENSIÓN:		NA
TIEMPO:		NA
REINICIO:		NA
FECHA DE TERMINACIÓN:		29/12/2024
TIEMPO DE EJECUCION ACTUALIZADO:	**4 meses**	**Días**

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	LUZ NELLY MONZON DIAZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	281 DE 2024
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	DARWIN JOEL GUALTEROS MORALES

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

AVANCE OBRA

N ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	HA	$ 1.409.459,72	0.29	0.29	$ 408.743.12	$ 408.743.12
2	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFECLASIFICADO TAM MAX3" SUMINISTRO. EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION.	M3	$ 22.604,89	540,00	540,00	$ 12.206.641,89	$ 12.206.641,89
3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	$ 1.743,19	9180,00	9180,00	$ 16.002.523,89	$ 16.002.523,89
4	CONFORMACIÒN DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	$ 2.556.254,65	3.60	3.60	$ 9.238.516,61	$ 9.238.516,61
					COSTO DIRECTO	$ 37.856.425,07	$37.856.425,07
					ADMINISTRACIÓN 6,62%	$ 2.504.275,03	$2.504.275,03
					COSTO TOTAL	$ 40.360.701,00	$ 40.360.701,00
					PORCENTAJE EJECUTADO	100%	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

265

266

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

A. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONVENIO SOLIDARIO N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/S

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTÍAS:
POLIZAS DE PERFECCIONAMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV – 100043453
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV – 100011584
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	28/08/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/08/2024	05/04/2025	$ 4.036.070,10
PAGO ANTICIPADO	05/08/2024	05/04/2025	$ 20.180.350,50

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

PRESTACIONES SOCIALES	05/08/2024	05/12/2027	$ 2.018.035,05
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/08/2024	05/12/2029	$ 4.036.070,10
PREDIOS, LABORES Y OPERACIOANES	05/08/2024	05/04/2025	$ 260.000.000,00
PATRONAL	05/08/2024	05/04/2025	$ 260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	05/08/2024	05/04/2025	$ 260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	05/08/2024	05/04/2025	$ 260.000.000,00

<PÓLIZAS DE ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INCIO>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100043453**
ANEXO N°	**2**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100011584**
ANEXO N°	**2-3**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**26/09/2024**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/08/2024	30/04/2025	$ 4.036.070,10
PAGO ANTICIPADO	30/08/2024	30/04/2025	$ 20.180.350,50
PRESTACIONES SOCIALES	30/08/2024	30/12/2027	$ 2.018.035,05
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/08/2024	30/12/2029	$ 4.036.070,10
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	30/08/2024	01/05/2025	$ 260.000.000,00
PATRONAL	30/08/2024	01/05/2025	$ 260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30/08/2024	01/05/2025	$ 260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/08/2024	01/05/2025	$ 260.000.000,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

B. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1	1528	09/10/2024	50%	$ 20.180.350,50	NA	NA	$20.180.350,50
2	1777	12/11/2024	40%	$16.144.280,40	NA	NA	$16.144.280,40
		TOTALES	90%	$ 36.324.630,90	NA	NA	$36.324.630,90

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01/11/2024 a 25/11/2024

Avance financiero programado 100% y avance financiero ejecutado 90%

C. AVANCE CONVENIO SOLIDARIO

1. AVANCE FISICO

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
SEPTIEMBRE	50%	$20.180.350,50	50%	$ 20.180.350,50	0%	$0	0%	$0
OCTUBRE	40%	$16.144.280,40	90%	$ 36.324.630,90	100%	$40.360.701,00	100%	$40.360.701,00
NOVIEMBRE	10%	4.036.070,10	100%	$40.360.701,00				

Avance físico programado 100% y avance físico ejecutado 100%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5


INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO SOLIDARIO

112-ECP-FR-262-V2
09/09/2024

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

GRAFICA:

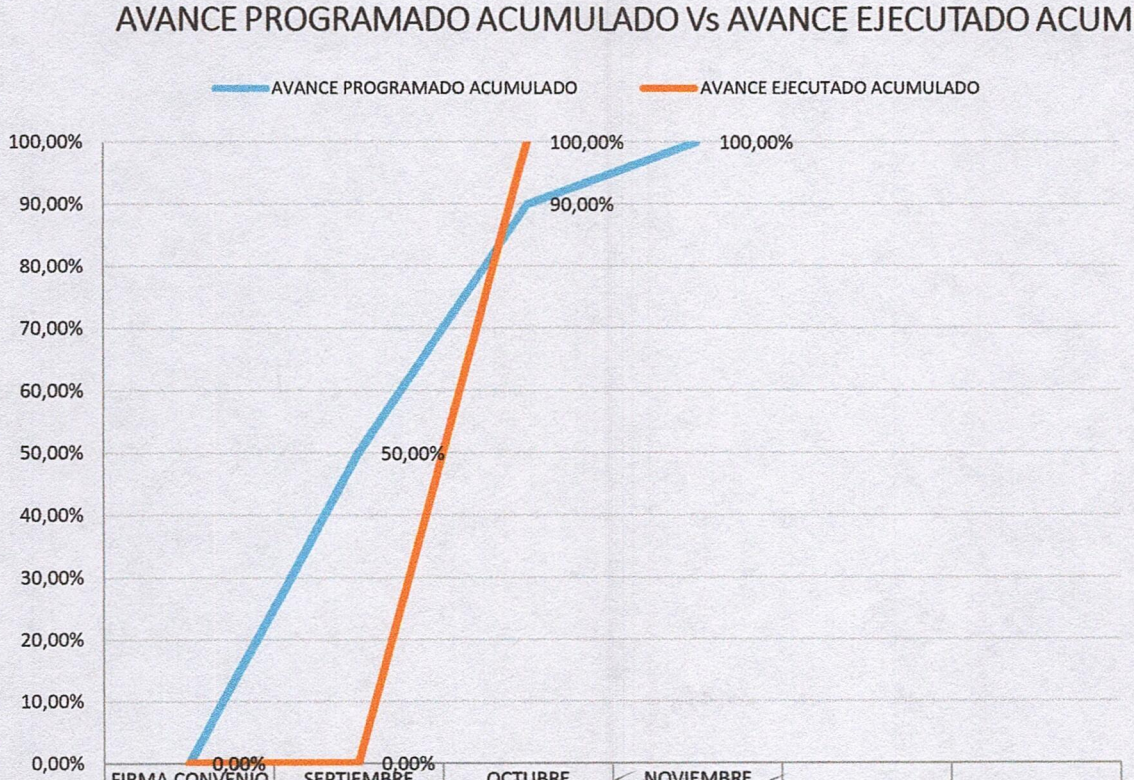

	FIRMA CONVENIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
ANCE PROGRAMADO ACUMULADO	0,00%	50,00%	90,00%	100,00%		
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	0,00%	0,00%	100,00%			

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	EJECUTADO (HA)	%
		0.29	100%
1.1	  		
	OBSERVACIONES: La junta de acción comunal, realizó inicio de actividades **COORDENADAS: LATITUD 3°3'44.50" - LONGITUD 74°14'53.00"O**		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE CLASIFICADO TAM MAX 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO.	EJECUTADO (M3)	%
		540,00	100%
1.2	  		
	OBSERVACIONES: La junta de acción comunal, realizó inicio de actividades con el traslado de materiales al punto de intervenir. **COORDENADAS: LATITUD 3°3'44.50" - LONGITUD 74°14'53.00"O**		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONVENIO SOLIDARIO
112-ECP-FR-262-V2
09/09/2024

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONFORMACION DE LA BANCADA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	EJECUTADO (KM)	%
		3,60	100%
1.3	  		
	OBSERVACIONES: La junta de acción comunal, realizó las actividades de escarificar, perfilar, extender, cuentear, riego y compactación **COORDENADAS: LATITUD 3°3'44.50" - LONGITUD 74°14'53.00"O**		

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

213

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	EJECUTADO (M3/KM)	%
		9180	100%
1.4	 		
	OBSERVACIONES: La junta de acción comunal, realizó inicio de actividades de traslado de materiales al punto de intervenir. **COORDENADAS: LATITUD 3°3'44.50" - LONGITUD 74°14'53.00"O**		

G. COMENTARIOS, NOVEDADES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta un avance físico de ejecución de obra de 100% de las actividades contractuales establecidas en el clausulado, el cual se puede evidenciar en el REGISTRO FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN identificación de personal y costos directos.
  - La actividad de rocería manual a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad se realizó 0.21 Ha, se ejecutó al 100% esta actividad.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO SOLIDARIO
112-ECP-FR-262-V2
09/09/2024

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO N°	191 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

- Material de prestamo y/o arrecife clasificado tam max 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento, y compactación se ejecutó el 100% de la conformación de la banca existente (incluye: escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación) realizando 2.60 km.
- Se ejecutó el 100% de la actividad de transporte granular realizando 8190,00

Las actividades de mantenimiento vial se han realizado en la junta de acción comunal vereda BAJO MELUA del municipio de Puerto López, Meta, entre las coordenadas: **3°3'44.50" - LONGITUD 74°14'53.00"O**

Se presentaron demoras en la suscripción del acta terminación por parte del representante legal, ya que en la zona presenta problemas de comunicación, igualmente se suscribe el acta terminación y acta entrega y recibo definitivo del convenio 191 de 2024 el día 25/11/2024.

H. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 25 días del mes de noviembre del 2024.

Firma	Firma V°B°
Nombre: LUZ NELLY MONZON DIAZ	Nombre: DARWIN JOEL GUALTEROS MORALES
SUPERVISOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 25700 - 52133	N° Matrícula Profesional: 25202-348483 CND

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO MELUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
DEPARTAMENTO DEL META
PERSONERÍA JURÍDICA No. 780 DE 23/07/1991

NINFORME MENSUAL N° 3

RUBEN DARIO MUÑOS MOTTA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.081.698.659 en mi condición de Representante Legal de la Junta de Acción comunal VEREDA BAJO MELUA identificada con el Nit. No. 900.123.599-2 y ubicada en la jurisdicción del Municipio de Puerto López del Departamento del Meta, certifico que a la fecha la J.A.C VEREDA BAJO MELUA tuvo gastos correspondientes a la ejecución del convenio N 191 de 2024.

Los cuales representan un avance de 100% en cumplimiento de las actividades contenidas en el clausulado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADO
1,1	ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	HA	0.29	0.29
1,2	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFECLASIFICADO TAM MAX3" SUMINISTRO. EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M3	540	540
1,3	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	3.60	3.60
1,4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	9180	9180

Observaciones: se realizó el 100% de las actividades contractuales, igualmente se suscribe el acta de entrega y recibo definitivo, acta de terminación del convenio 191 de 2024.

Se firma en el municipio de Puerto López, Departamento del Meta; el día 25 de noviembre de 2024.

Ruben Dario Muñoz

RUBEN DARIO MUÑOS MOTTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.081.698.659
