Bogotá D.C., mayo 5 de 2025

BYR-SGI-124-114-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD CIV 12001889

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad EN ORIGINAL levantadas en el CIV 12001889, junto con el inventario predial correspondiente (en 39 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1kE3r3Fhuvjrfx0phENCuYOx5NmEHFGiQ

ACTA #	N° DEL ANEXO TÉCNICO	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, de folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
1	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 62	N/A	3
2	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 54	Luis Alfonso Lozana	4
3	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 44	José Antonio Cruz	3
4	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 42	N/A	4
5	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 32	Angela López	3
6	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 30	María Soraida Flores	3

ACTA #	N° DEL ANEXO TÉCNICO	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, de folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
7	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C-28b- 40	N/A	3
8	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 27	Alba Penagos	3
9	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 39	John Alexander López	3
10	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 49	Wilder Duarte	3
11	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 # 71 C- 51-59	Leonicia Gil	4
12	33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	KR 29 entre CL 71 C hasta CL 72	Espacio público	3

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR-SG-BU001

Recibido 09/05/2025

C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Anexo ACTAS EN ORIGINAL FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD (39) TREINTA Y NUEVE CIV 12001889 NÚMERO 33

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., mayo 3 de 2025

BYR-SGI-124-113-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD CIV 12003240

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad EN ORIGINAL levantadas en el CIV 12003240, junto con el inventario predial correspondiente (en 16 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1zkA8F8Tyby2wToT8qKlGkdslF25vACuV

ACTA #	N° DEL ANEXO TÉCNICO	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, de folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
1	22	12003240	CL 73	KR 22	NA	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SAN FELIPE	CL 73 #21-60	Marco Antonio Riaño director de Sistemas	4
2	22	12003240	CL 73	KR 22	NA	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SAN FELIPE	CL 73 #22-52	Luis Franco coordinador de logistica	3
3	22	12003240	CL 73	KR 22	NA	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SAN FELIPE	CL 73 #22-46	N/A	3
4	22	12003240	CL 73	KR 22	NA	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SAN FELIPE	CL 73 #22-42	N/A	3
5	22	12003240	CL 73	KR 22	NA	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SAN FELIPE	Espacio Público	N/A	3

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

Recibí 09/05/2025

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR-SG-BU001

C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Anexo ACTAS EN ORIGINAL FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD (16) DIECISÉIS CIV 12003240 NÚMERO 22

CONSORCIO BYR SG BU 001

Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., mayo 2 de 2025

BYR-SGI-124-112-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISIÓN DE INFORME TÉCNICO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2025 - VERSIÓN 0

Respetado ingeniero,

En cumplimiento de las obligaciones del contratista, se remite el informe mensual técnico No 3 contemplado entre el 20 de marzo al 19 de abril del 2025. Lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Director de obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS.** ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION.
Anexos: carpeta comprimida
Proyectó: C.T

Gmail

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>

OFICIO BYR-SGI-124-112-2025 REMISIÓN DE INFORME TÉCNICO No 3 DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2025 - VERSIÓN 0

1 mensaje

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com> 2 de mayo de 2025, 7:09 p.m.
Para: Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com>, consorciomm2024ya@gmail.com
CC: directorvias@gmail.com, dianasandoval.byr@gmail.com

Buenas noches

Ingenieros

Cordial saludo

Adjunto envió el oficio del asunto para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Ing. Cristian Torres
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

INFORME No 3.zip

OFICIO BYR-SGI-124-112-2025 REMISIÓN DE INFORME TÉCNICO No 3.pdf
100K

Bogotá D.C., mayo 2 de 2025

BYR-SGI-124-111-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD CIV 12002698

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad EN ORIGINAL levantadas en el CIV 12002698, junto con el inventario predial correspondiente (en 25 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1duOviiEbUYW3_69mgnd44cFIslKjHbe7

ACTA #	N° DEL ANEXO TÉCNICO	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, de folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
1	7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA	CL 65 # KR 14 -45	Luis Eduardo Martínez	3
2	7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA	CL 65 # KR 14 -37	Jorge Burgos Vargas	4
3	7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA	CL 65 # KR 14 -44	Héctor José Tavera	3
4	7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA	CL 65 # KR 14 - 52	Jorge García	4

ACTA #	N° DEL ANEXO TÉCNICO	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, de folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
5	7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA	CL 65 # KR 14 - 54	Jaime Sánchez Amaya	5
6	7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA	KR 14 A # 65 -08	No registra	3
7	7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA	CL 65 entre KR 14 A y AV 14	Espacio Público	3

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR-SG-BU001

C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

Anexo ACTAS EN ORIGINAL FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD (25) VEINTE Y CINCO CIV 12002698 NÚMERO 7

Recibido 29/05/2025

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., Abril 30 de 2025

BYR-SGI-124-110-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C.

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Asunto: REMISION DE INFORME DE GESTIÓN SST No 3 - VERSION 0, CONTRATO DE OBRA No. 491-2024 (120329).

Respetado ingeniero,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se adjunta al presente el informe de Gestión de Seguridad y Salud al Trabajo No 3 versión 0, del contrato de obra No. 491-2024 COP (120329).

Lo anterior para su revisión y comentarios

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR SG BU 001
ANEXO DIGITAL: UNA (1) CARPETA COMPRIMIDA
ELABORÓ: JARC

Gmail in:sent

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Más

Etiquetas

COMPONENTE DE RCD
COMPONENTE SOCIAL
GESTION AMBIENTAL
GESTION SST
MEV
PMT
TECNICO

OFICIO BYR-SGI-124-110-2025 REMISION DE INFORME DE GESTIÓN SST No

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>
para Consorcio

Cordial saludo

Adjunto envío de oficio de asunto para su revisión y aprobación

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Informe Gestion SST No 3 v0.rar

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



OFICIO BYR-SGI-..

Informe Gestion S...
No se analizó en busc

Responder Reenviar

CONSORCIO BYR SG BU 001

Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., mayo 6 de 2025

BYR-SGI-124-109-2025

Señora:
Luz Marina López
KR 29 B # 66- 25
Luzmalopezg@hotmail.com
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD ARREGLO DEL SARDINEL FRENTE A LOS PREDIOS KR **29 B # 66-25**

Respetada propietaria y/o encargada,


En atención a la solicitud realizada por usted el día 25 de abril de 2025 mediante el WhatsApp del Punto de Atención al Ciudadano PAC, se informa que una vez analizada la solicitud se procede con la verificación del archivo fotográfico y fílmico realizado por el contratista del Consorcio BYR SG BU 001 el 17 y 21 de marzo de 2025, contrastándolo con el registro fotográfico suministrado por el usuario de lo cual se determina que no es procedente realizar los arreglos solicitados por las siguientes razones:

1. El andén en mención se encontraba con múltiples fisuras, adicional presentaba fisura de forma longitudinal a borde de la calzada, por lo cual, con este precedente el desprendimiento del material era inevitable. Se presenta el siguiente registro fotográfico lo cual certifica lo mencionado.





2. El andén encontrado en sitio se encuentra construido con materiales no convencionales para uso en el **espacio público**, de igual manera como se puede observar en el siguiente registro fotográfico esta construcción o modificación al espacio público se encuentra por fuera del alineamiento del sardinel invadiendo el área de la calzada vehicular.

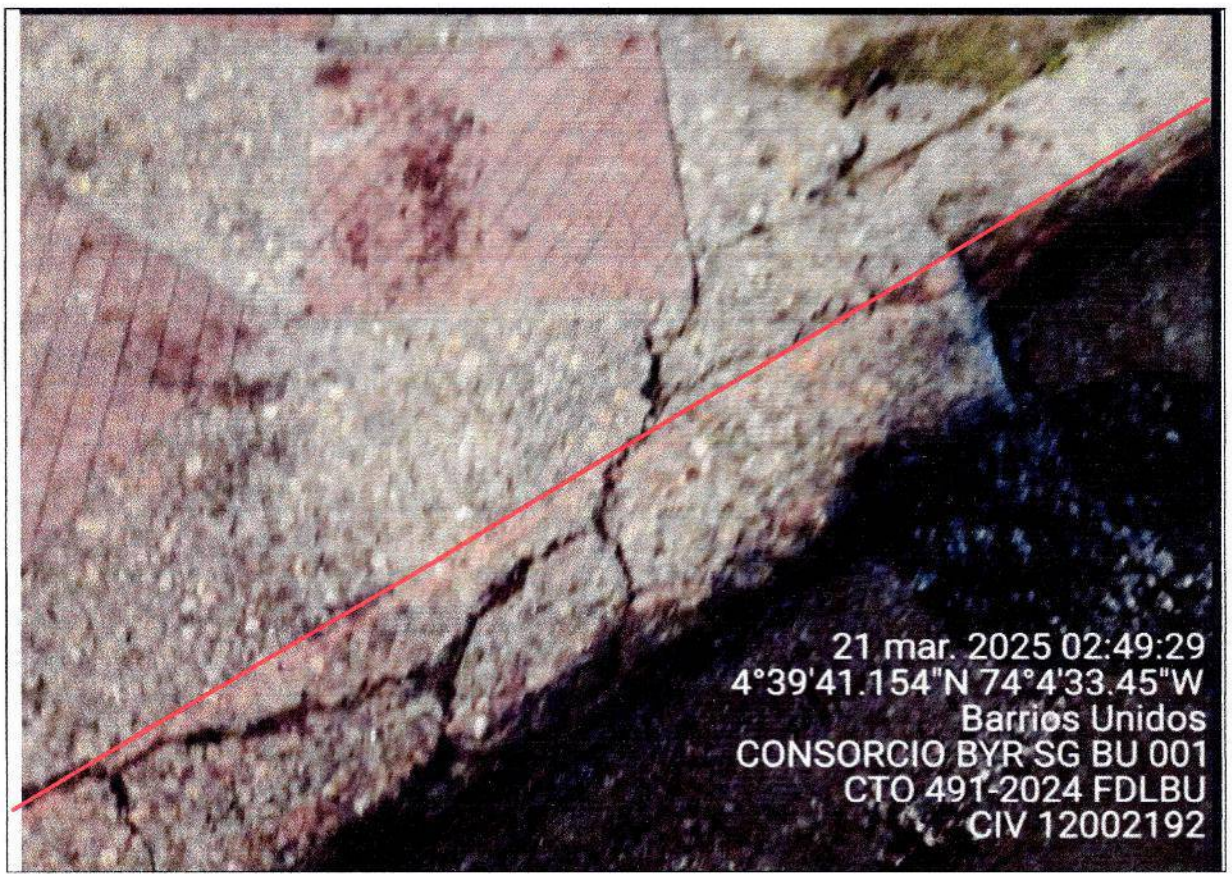



Por los motivos anteriormente expuestos y en virtud que se tiene una preexistencia de daños severos, aunado a que los materiales y alineamiento de la intervención del andén realizada por el usuario no cumple con la normativa vigente, el contratista de obra no realizara adecuaciones ni intervenciones, ni reparaciones que no se puedan garantizar y que vayan en contravía del Manual del Espacio Público aplicado para la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Director de Obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001

CC INTERVENTORÍA CONSORCIO MM 2024
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

CONSORCIO BYR SG BU 001

Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., mayo 6 de 2025

BYR-SGI-124-108-2025

Señores:
Compresores G&G
Att Sra. Beatriz Elena Correa
Att Sr. Alfredo González Gómez
KR 29 B # 66-41 - KR 29 B # 66-35
bettycorrea70@gmail.com
compresoresg.g@hotmail.com
Alfredo.gon2370@gmail.com
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD ARREGLO DEL SARDINEL FRENTE A LOS PREDIOS - KR 29 B # 66-35- KR 29 B # 66-41

Respetados Señores propietarios y/o encargados,

En atención a la solicitud realizada por ustedes el día 24 de abril de 2025 mediante el WhatsApp del Punto de Atención al Ciudadano PAC, se informa que una vez analizada la solicitud se procede con la verificación del archivo fotográfico y fílmico realizado por el contratista de obra Consorcio BYR SG BU 001 el 17 de marzo de 2025, contrastándolo con el registro fotográfico suministrado por el usuario de lo cual se determina que no es procedente realizar los arreglos solicitados por las siguientes razones:

1. El andén en mención se encontraba con múltiples fisuras, adicional presentaba fisura de forma longitudinal a borde de calzada, por lo cual, con este precedente el desprendimiento del material era inevitable. Se presenta el siguiente registro fotográfico lo cual certifica lo mencionado.



2. El andén encontrado en sitio se encuentra construido con materiales no convencionales para uso en el ***espacio público***, de igual manera como se puede observar en el siguiente registro fotográfico esta construcción o modificación al espacio público se encuentra por fuera del alineamiento del sardinel invadiendo el área de la calzada vehicular.


TINTO - PERICO
CHOCOLISTO - JUGO
AROMATICA
17/03/2025 4:26:41 p. m.
66-23 Carrera 29B
Bogotá
Distrito Capital
Consorcio BYR SG BU 001
Número de índice: 491
17/03/2025 4:26:49 p. m.
66-23 Carrera 29B
Bogotá
Distrito Capital
Consorcio BYR SG BU 001
Número de índice: 491

Por lo motivos anteriormente expuestos y en virtud que se tiene una preexistencia de daños severos, aunado a que los materiales y el alineamiento de la intervención del andén realizada por el usuario no cumple con la normatividad vigente, el contratista de obra no realizara adecuaciones, ni intervenciones, ni reparaciones que no se puedan garantizar y que vayan en contravía del Manual del Espacio Publico aplicado para la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Director de Obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001

CC INTERVENTORÍA CONSORCIO MM 2024
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

CONSORCIO BYR SG BU 001

Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., abril 28 de 2025

BYR-SGI-124-107-2025

Señores
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB
Atn.: Ing. CESAR AUGUSTO QUINTERO GIRALDO
Gerente Planta Externa
Carrera 8 No. 20-99
Email: cesaquig@etb.com.co
Bogotá - D.C.

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Asunto: SOLICITUD DE DELEGADO ETB RESPUESTA COMUNICADO **2025-252-ECC-EIGC**

Respetado ingeniero,

En atención al comunicado del asunto muy cordialmente se informa que mediante el contrato de obra 491-2024 suscrito entre la ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS y CONSORCIO BYR-SG-BU 001, se realizarán las obras necesarias para conservar la malla vial en la localidad de Barrios Unidos, en cuarenta y dos (42) segmentos viales pertenecientes a la localidad.

Para su conocimiento y fines que considere pertinentes, a continuación, se relacionan los datos generales y de contacto del contratista de obra e interventoría:

CONTRATO DE OBRA	
No. CONTRATO	COP-491-2024
OBJETO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ".
CONTRATISTA	CONSORCIO BYR-SG-BU 001
NIT	901.901.203-3
R/LEGAL	ING. GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
DIRECCIÓN	CARRERA 55 No. 152B – 68 - BOGOTÁ D.C.
CORREO ELECTRONICO	consorciobyrsgbu001@gmail.com
TELEFONO	601 218 1754
PLAZO	SEIS (6) MESES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
No. CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758)
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".
CONTRATISTA	CONSORCIO MM 2024
NIT	901.901.627-2
R/LEGAL	ING. GILBERTO MARTÍNEZ ARGUELLAS
DIRECCIÓN	CL 1 A No. 24 – 86 - PUERTO COLOMBIA
CORREO ELECTRONICO	consorciomm2024bu@gmail.com
TELEFONO	301 786 2238
PLAZO	SEIS (6) MESES

De acuerdo con la solicitud relacionada en el comunicado **2025-252-ECC-EIGC** se describen a continuación los tramos viales a intervenir:

ORDEN DE INTERVENCIÓN	CIV	Eje	Desde	Hasta	TIPO DE INTERVENCIÓN INICIAL	UPZ	Nombre UPZ	Nombre Sector Catastral	PROFUNDIDAD INTERVENCIÓN (cm)
1	12000329	CL 93 A	KR 60 B	TV 60 C	Acción de movilidad	UPZ 21	LOS ANDES	RIO NEGRO	12,00
2	12000201	CL 94	KR 65	KR 64	Acción de movilidad	UPZ 21	LOS ANDES	LOS ANDES	12,00
3	12000359	TV 60 C	CL 90	CL 93	Acción de movilidad	UPZ 21	LOS ANDES	RIO NEGRO	12,00
4	12000511	CL 90	KR 58	KR 50	Mantenimiento	UPZ 21	LOS ANDES	RIO NEGRO	12,00
5	12000392	CL 93	KR 58	KR 57	Acción de movilidad	UPZ 21	LOS ANDES	RIO NEGRO	12,00
6	12000458	CL 91 A	KR 58	KR 50	Mantenimiento	UPZ 21	LOS ANDES	RIO NEGRO	12,00
7	12000858	KR 49 A	CL 85	CL 85 A	Acción de movilidad	UPZ 21	LOS ANDES	LA PATRIA	12,00
8	12000076	CL 99	KR 48	KR 49	Mantenimiento	UPZ 21	LOS ANDES	LA CASTELLANA	12,00
9	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA	20,00
10	12003240	CL 73	KR 22	NA	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SAN FELIPE	12,00
11	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	Mantenimiento	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA MERCED NORTE	12,00
12	12002192	KR 21	CL 89	CL 87	Mantenimiento	UPZ 98	LOS ALCAZARES	LA PAZ	12,00
13	12002472	CL 66	KR 22	KR 21	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SIETE DE AGOSTO	12,00

ORDEN DE INTERVENCIÓN	CIV	Eje	Desde	Hasta	TIPO DE INTERVENCIÓN INICIAL	UPZ	Nombre UPZ	Nombre Sector Catastral	PROFUNDIDAD INTERVENCIÓN (cm)
14	12002498	KR 20	CL 66	CL 67	Mantenimiento	UPZ 98	LOS ALCAZARES	RAFAEL URIBE	12,00
15	12000497	CL 79 BIS	KR 63	KR 64	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	SIMON BOLIVAR	12,00
16	12000797	KR 67	CL 67 G	NA	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	12,00
17	12000816	KR 67	CL 67 F	NA	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	12,00
18	12001652	CL 70 A	KR 55	KR 54	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO	12,00
19	12001694	KR 55	CL 70 BIS	CL 70	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO	12,00
20	12001030	CL 74 A	KR 58	KR 60	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	12,00
21	12000891	KR 55 B	CL 78	CL 79	Mantenimiento	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JORGE ELIECER GAITAN	12,00
22	12003134	DG 76 BIS	KR 52	KR 51	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JORGE ELIECER GAITAN	12,00
23	12000661	CL 87	KR 49 A	KR 49	Acción de movilidad	UPZ 21	LOS ANDES	LA PATRIA	12,00
24	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	12,00
25	12002432	KR 14 A	CL 70 A	CL 70	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	CONCEPCIÓN NORTE	12,00
26	12002479	CL 63 F	KR 27 A	KR 27	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SIETE DE AGOSTO	12,00
27	12002478	CL 63 F	KR 27	NA	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SIETE DE AGOSTO	12,00
28	12001860	KR 54	CL 67ABIS	CL 67ABISA	Mantenimiento	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	12,00
29	12000809	CL 85 A	KR 50	KR 49 A	Acción de movilidad	UPZ 21	LOS ANDES	LA PATRIA	12,00
30	12003383	KR 51	DG 71 BIS	DG 71 BIS	Puente	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	12,00
31	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	Acción de movilidad	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	12,00
32	12000850	KR 21	CL 89	CL 87	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB	30,00
33	12001510	KR 21	CL 82	NA	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB	12,00
34	12001341	CL 83	KR 22 A	KR 24	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB	12,00
35	12001351	CL 83	KR 22 A	KR 22	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB	12,00
36	12001409	KR 21	CL 83	NA	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB	12,00
37	12000922	CL 86 A	AV 24	KR 23	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB	12,00
38	12000741	KR 22	CL 89	CL 88	Acción de movilidad	UPZ 98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB	12,00

ORDEN DE INTERVENCIÓN	CIV	Eje	Desde	Hasta	TIPO DE INTERVENCIÓN INICIAL	UPZ	Nombre UPZ	Nombre Sector Catastral	PROFUNDIDAD INTERVENCIÓN (cm)
39	12002070	DG 74 BIS	KR 20 B	CL 75	Mantenimiento	UPZ 98	LOS ALCAZARES	SAN FELIPE	12,00
40	12000239	KR 58	CL 94 B	CL 94 C	Mantenimiento	UPZ 21	LOS ANDES	RIO NEGRO	12,00
41	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	Mantenimiento	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	12,00
42	12000849	CL 79 A	KR 55	KR 55	Mantenimiento	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JORGE ELIECER GAITAN	12,00
43	12001383	KR 27	CL 83 BIS	CL 82	Mantenimiento	UPZ 98	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	12,00

Conforme lo anterior, muy respetuosamente se requiere la designación del Profesional delegado de su Entidad con el objeto de realizar seguimiento a todos los asuntos que en materia de su infraestructura surjan durante la ejecución de los contratos.

En espera de su amable colaboración

Cordialmente,

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Director de Obra

C.C. **CONSORCIO MM 2024.** ING. GILBERTO MARTÍNEZ ARGUELLAS. REPRESENTANTE LEGAL
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS.** ING. FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., Abril 23 de 2025

BYR-SGI-124-106-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C.

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Asunto: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA No 491 – 2024

Respetado ingeniero,

Se adjunta al presente, la documentación de los siguientes trabajadores, para revisión, autorización e ingreso al Contrato No 491-2024.

No	NOMBRE	CARGO
1	Brayan Rodrigo Medina Martínez	Pintor / Instalador
2	Alejandro Medina Torres	Soldador / Instalador
3	Nixon Zarate Romero	Soldador / instalador

Lo anterior para su revisión y comentarios

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR SG BU 001
ANEXO DIGITAL: UNA (1) CARPETA COMPRIMIDA
ELABORÓ JARC

Gmail

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>

OFICIO BYR-SGI-124-106-2025 REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA No 491 - 2024

1 mensaje

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com> 23 de abril de 2025, 5:08 p.m.
Para: Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com>

Buenas tardes

Envío oficio del asunto para su revisión y fines pertinentes

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

2 archivos adjuntos

OFICIO BYR-SGI-124-106-2025 REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA No 491 - 2024.pdf
107K

Doc. Personal 21-01-2025.rar
1378K

CONSORCIO BYR SG BU 001

Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., Abril 23 de 2025

BYR-SGI-124-105-2024

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°3

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de referencia y en concordancia con los lineamientos ambientales y normativos aplicables, nos permitimos remitir el **Informe No. 3 de Gestión Ambiental** , correspondiente al período comprendido entre el 19 de marzo al 19 de abril de 2025.

Lo anterior para su revisión y aprobación

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR-SG-BU001
Anexo Informe de gestión ambiental N°3 (162) Folios y WIN RAR con 9 Anexos

Gmail

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>

OFICIO BYR-SGI-124-105-2025 REMISION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°3

1 mensaje

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com> 23 de abril de 2025, 4:27 p.m.
Para: Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com>

Cordial saludo

Adjunto envío de oficio de asunto para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

ing Julieth González

3- INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°3.pdf

3. INFORME AMBIENTAL N°3 ANEXOS.rar

Ingeniera Ambiental

CONSORCIO BYR SG BU 001

Ingenieros contratistas

OFICIO BYR-SGI-124-105-2025 REMISION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°3.pdf
101K

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., abril 23 de 2025

BYR-SGI-124-104-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION INFORME N°3 VERSIÓN 0 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN POBLACIONAL

Respetado ingeniero,

En cumplimiento de las obligaciones de contrato y del apéndice E de Gestión Social, se adjunta al presente el informe N°3 versión 0 del Plan de Gestión Social e Intervención Poblacional con sus respectivos anexos, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de marzo al 19 de abril de 2025.

Lo anterior para su revisión y aprobación

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR-SG-BU001
Anexo PDF EN CIENTO VEINTIUNO (121) FOLIOS Y CARPETA COMPRIMIDA CON LOS ANEXOS.
Proyecto. YP

C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

Gmail

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>

OFICIO BYR-SGI-124-104-2025 REMISION INFORME 3 V0 DEL PGS E INTERVENCIÓN POBLACIONAL 491-2024

1 mensaje

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com> 23 de abril de 2025, 4:15 p.m.
Para: Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com>, Maritza Ibañez <consorciomm2024bumi@gmail.com>

Cordial saludo,

Se adjunta el oficio del asunto con el anexo descrito en el documento para su conocimiento y fines pertinentes.

cordialmente

Residente social
Consorcio BYR SG BU 001

FDLBU -informe 3 social V0 con anexos- CTO COP-491-2024 .pdf

OFICIO BYR-SGI-124-104-2025 REMISION INFORME 3 V0.zip

—

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

CONSORCIO BYR SG BU 001

Ingenieros contratistas

OFICIO BYR-SGI-124-104-2025 REMISION INFORME 3 V0 DEL PGS E INTERVENCIÓN POBLACIONAL 491-2024 .pdf
120K

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., abril 22 de 2025

BYR-SGI-124-103-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn.ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISIÓN ACTA DE OBRA No. 2 Y DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA PAGO.

Respetado ingeniero,

En atención a las obligaciones contractuales se adjunta al presente el acta parcial de obra No. 2 con los documentos soporte relacionados a continuación:

- Informe mensual de actividades contractuales No 2.
- Certificado de cumplimiento pago No 2.
- Planillas de pagos de los aportes al régimen de seguridad social Pago No 2.
- Certificación de aporte de pagos parafiscales.
- Factura electrónica de venta 2.
- Acta parcial de obra No 2 y memorias de cálculo.
- RUT.
- Resolución de facturación.
- Certificación bancaria.
- Documentos representante legal y contador.
- Minuta de contrato.
- Acta de inicio.
- Pólizas de cumplimiento.
- Informe mensual Técnico No 2.
- Informe mensual SST No 2 y sus anexos.
- Informe mensual Ambiental No 2 y sus anexos.
- Informe mensual Social No 2 y sus anexos.

CARRERA 55 No. 152B - 68 ofi 503 - TELÉFONOS.: 2181754 CEL 3215457354 - BOGOTÁ, D.C.COLOMBIA
E-mail: administracion@byrconstrucciones.co

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Atentamente,

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Director de obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**, ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION.
Proyectó: C.T

CARRERA 55 No. 152B - 68 ofi 503 - TELÉFONOS.: 2181754 CEL 3215457354 - BOGOTÁ, D.C.COLOMBIA
E-mail: administracion@byrconstrucciones.co

Gmail

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>

OFICIO BYR-SGI-124-103-2025 REMISIÓN ACTA DE PAGO No 2 Y DOCUMENTOS DE SOPORTE.

1 mensaje

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com> 22 de abril de 2025, 4:27 p.m.
Para: Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com>, consorciomm2024ya@gmail.com
CC: directorvias@gmail.com, dianasandoval.byr@gmail.com

Buenas tardes

Ingenieros

Cordial saludo

Adjunto envió los documentos del asunto para su revisión y radicación al Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.

Cordialmente,

Ing. Cristian Torres
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

2. DOCUMENTOS ACTA PARCIAL DE OBRA - DEFINITIVA.zip

OFICIO BYR-SGI-124-103-2025 REMISIÓN ACTA DE OBRA No. 2 Y DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA PAGO..pdf
111K

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., Abril 21 de 2025

BYR-SGI-124-102-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C.

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Asunto: REMISION DE INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD AL TRABAJO No 2 - VERSION 1, DEL CONTRATO DE OBRA No. 491-2024 COP (120329).

Respetado ingeniero,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se adjunta al presente el informe de Gestión de Seguridad y Salud al Trabajo No 2 en su versión No 1 del Contrato de obra No. 491-2024, correspondiente al período entre el 20 de febrero a 19 de marzo de 2025, adicionando las actas de reunión de las mesas de trabajo entre los profesionales de la interventoría y contratista de los componentes Ambiental y Seguridad y Salud al Trabajo.

Lo anterior para su revisión y comentarios

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR SG BU 001
ANEXO DIGITAL: UNA (1) CARPETA COMPRIMIDA
ELABORÓ: JARC

Gmail

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>

OFICIO BYR-SGI-124-102-2025 REMISION DE INFORME DE GESTIÓN SST No 2 - VERSION 1 CONTRATO DE OBRA No. 491-2024

1 mensaje

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com> 21 de abril de 2025, 10:20 a.m.
Para: Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com>
CCO: juanrincon.byr@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto envío de oficio de asunto para su revisión y aprobación

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Informe Gestion SST No 2 v1.rar

OFICIO BYR-SGI-124-102-2025 REMISION DE INFORME DE GESTIÓN SST No 2 - VERSION 1 CONTRATO DE OBRA No. 491-2024.pdf
118K

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., abril 21 de 2025

BYR-SGI-124-101-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn.ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION INFORME N°2 VERSIÓN 1 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN POBLACIONAL

Respetado ingeniero,

En cumplimiento de las obligaciones de contrato y del apéndice E de Gestión Social, se adjunta al presente el informe N°2 versión 1 del Plan de Gestión Social e Intervención Poblacional con sus respectivos anexos, correspondiente al período comprendido entre el 20 de febrero al 19 de marzo de 2025, se incluyó en el documento las actas de seguimiento del componente, realizadas entre las profesionales de la interventoría y el contratista.

Lo anterior para su revisión y aprobación

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR-SG-BU001
Anexo PDF EN DOSCIENTOS SETENTA (251) FOLIOS Y CARPETA COMPRIMIDA CON LOS ANEXOS.
Proyecto: YP

C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

Gmail

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>

OFICIO BYR-SGI-124-101-2025 REMISION INFORME 2 V1 DEL PGS E INTERVENCIÓN POBLACIONAL 491-2024

1 mensaje

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com> 21 de abril de 2025, 9:46 a.m.
Para: Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com>, Maritza Ibañez <consorciomm2024bumi@gmail.com>

Cordial saludo,

Se adjunta el oficio del asunto con el anexo descrito en el documento para su conocimiento y fines pertinentes.

cordialmente

Residente social
Consorcio BYR SG BU 001

FDLBU -informe 2 social V1- CON ANEXOS.pdf

INFORME # 2 V1 SOCIAL Y ANEXOS.zip

--
Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

2 archivos adjuntos

FDLBU -informe 2 social V1- CTO COP-491-2024.pdf
1169K

OFICIO BYR-SGI-124-101-2025 REMISION INFORME 2 V1 DEL PGS E INTERVENCIÓN POBLACIONAL 491-2024 -_page-0001.pdf
131K

ANEXO 3.2
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CMM-47-2025

Bogotá, 16 de mayo de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001
Atn. Sr, Geovanny A. Paez
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 520-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

Asunto: Aprobación del Informe N° 3 del Plan de Gestión Social e Intervención Poblacional

En atención al Informe N° 3 del Plan de Gestión Social e Intervención Poblacional, correspondiente al contrato COP-491-2024, presentado el día 23 de abril de 2025 por medio de oficio BYR-SGI-124-104-2025, para revisión y aprobación, nos permitimos informarle que, tras un análisis detallado del contenido, este ha sido **aprobado**.

Dicho informe ha sido evaluado conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y a las disposiciones normativas aplicables, verificando que las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2025 cumplen con los objetivos planteados dentro del Plan de Gestión Social e Intervención Poblacional.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Director de obra CONSORCIO MM 2024.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.
CC: ING. ESTEBAN MEDRANO ESPINOSA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-47-2025 APROBACION INFORME MENSUAL SOCIAL 3

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 16 de mayo de 2025, 3:50 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Maritza Ibañez <consorciomm2024bumi@gmail.com>

PSI

3. INFORME DE GESTION SOCIAL N°3.pdf

CMM-47-2025 APROBACION INFORME MENSUAL SOCIAL 3.pdf
215K

CMM-46-2025

Bogotá, mayo 16 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: AVAL INFORME TECNICO 3 DE LA ETAPA DE OBRA

Cordial Saludo.

En cumplimiento del contrato de referencia, esta interventoría emite la aprobación del informe técnico 3 correspondiente a la etapa de obra, en el cual el contratista ha cumplido con la entrega de todos los soportes necesarios que permitieron avanzar en esta fase del contrato.

Quedamos atentos

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Elaboro:. Yenniffer Acosta Salgado – Residente Técnica de Interventoría.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.
CC: ING. ESTEBAN MEDRANO ESPINOSA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-46-2025 APROBACIÓN INFORME MENSUAL 3

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 16 de mayo de 2025, 3:24 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Yenniffer Acosta Residente Interventoria <consorciomm2024ya@gmail.com>

PSI

2 archivos adjuntos

CMM-46-2025 APROBACIÓN INFORME MENSUAL 3.pdf
209K

INFORME TECNICO MENSUAL No. 3 COP - 491-2024.pdf
3293K

CMM-45-2025

Bogotá, Mayo 16 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Respuesta a comunicación BYR-SGI-124-119-2024 – Aprobación Informe mensual Ambiental No. 3 V.2

Cordial saludo,

Esta Interventoría en ejercicio de sus obligaciones contractuales dentro del contrato marco de la referencia y en seguimiento del contrato de Obra No. 491 de 2024 una vez revisada la segunda subsanación de observaciones del informe mensual Ambiental correspondiente al periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2025 en su versión 2 y entregado de manera digital mediante comunicación BYR-SGI-124-119-2024, se aprueba para radicación.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Proyecto: VIVIANA CASTRO – ESPECIALISTA SST INTEVENTORIA.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-45-2025 APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL 3 V.2

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 16 de mayo de 2025, 3:16 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Viviana Castro Ambiental SST Interventoria <consorciomm2024buvc@gmail.com>

PSI

3- INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°3 v2.pdf

CMM-45-2025 APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL 3 V.2.pdf
212K

CMM-44-2025

Bogotá, Mayo 16 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Respuesta a comunicación BYR-SGI-124-121-2025 – Aprobación Informe mensual SST No. 3.

Cordial saludo,

Esta Interventoría en ejercicio de sus obligaciones contractuales dentro del contrato marco de la referencia y en seguimiento del contrato de Obra No. 491 de 2024 una vez revisado el informe mensual SST correspondiente al periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2025 entregado de manera digital mediante comunicación BYR-SGI-124-121-2025, en su versión 1, se aprueba para radicación.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Proyecto: VIVIANA CASTRO – ESPECIALISTA SST INTEVENTORIA.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-44-2025 APROBACIÓN INFORME SST 3 V.1

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 16 de mayo de 2025, 3:06 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Viviana Castro Ambiental SST Interventoria <consorciomm2024buvc@gmail.com>

PSI

1. Informe SST No 3 v1.zip

CMM-44-2025 APROBACIÓN INFORME SST 3 V.1.pdf
201K

CMM-43-2025

Bogotá, Mayo 13 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Respuesta a comunicación BYR-SGI-124-118-2024 – Atención de observaciones Informe mensual Ambiental No. 3 V.1

Cordial saludo,

Esta Interventoría en ejercicio de sus obligaciones contractuales dentro del contrato marco de la referencia y en seguimiento del contrato de Obra No. 491 de 2024 una vez revisada la primera subsanación de observaciones del informe mensual Ambiental correspondiente al periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2025 en su versión 1 y entregado de manera digital mediante comunicación BYR-SGI-124-118-2024, se solicita sean atendidas las observaciones pendientes a los documentos, para lo cual en el informe anexo a la presente se encontraran los detalles a ajustar y complementar.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Proyecto: VIVIANA CASTRO – ESPECIALISTA SST INTEVENTORIA.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-43-2025 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL 3 V.1

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 13 de mayo de 2025, 3:14 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Viviana Castro Ambiental SST Interventoria <consorciomm2024buvc@gmail.com>, Junyor Salamanca <junyor.salamanca@gobiernobogota.gov.co>, "infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co" <infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

3- INFORME DE GESTION AMBIENTAL NÂ°3 v1...

3 archivos adjuntos

CMM-43-2025 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL 3 V.1.pdf
203K

ANEXO 3-FOAC55_PLANILLA_RESIDUOS_ .pdf
240K

FOAC53-CONTROL DE METERIALES .pdf
137K

CMM-43-2025

42

Bogotá, Mayo 9 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Respuesta a comunicación BYR-SGI-124-110-2025 – Observaciones Informe mensual SST No. 3.

Cordial saludo,

Esta Interventoría en ejercicio de sus obligaciones contractuales dentro del contrato marco de la referencia y en seguimiento del contrato de Obra No. 491 de 2024 una vez revisado el informe mensual SST correspondiente al periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2025 entregado de manera digital mediante comunicación BYR-SGI-124-110-2025, emite observaciones a los documentos, por lo cual de manera atenta solicitamos realizar su subsanación, para lo cual en el informe anexo a la presente se encontraran los detalles a ajustar y complementar.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Proyecto: VIVIANA CASTRO – ESPECIALISTA SST INTEVENTORIA.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-42-2025 OBSERVACIONES INFORME SST 3

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 9 de mayo de 2025, 4:28 p.m.
Para: Viviana Castro Ambiental SST Interventoria <consorciomm2024buvc@gmail.com>, Junyor Salamanca <junyor.salamanca@gobiernobogota.gov.co>, Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

3 archivos adjuntos

CMM-42-2025 OBSERVACIONES INFORME SST 3.pdf
202K

Listado_Informe_No3 v0.pdf
398K

SST Informe No 3 CTO 491-2024 - v0.pdf
2726K

CONSORCIO MM 2024

***NIT** 901901627-2*

CMM-41-2025

Bogotá, mayo 8 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Respuesta a comunicación BYR-SGI-124-105-2024 – Observaciones Informe mensual Ambiental No. 3.

Cordial saludo,

Esta Interventoría en ejercicio de sus obligaciones contractuales dentro del contrato marco de la referencia y en seguimiento del contrato de Obra No. 491 de 2024 una vez revisado el informe mensual ambiental correspondiente al periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2025 entregado de manera digital mediante comunicación BYR-SGI-124-105-2024, emite observaciones a los documentos, por lo cual de manera atenta solicitamos realizar su subsanación, para lo cual en el informe anexo a la presente se encontraran los detalles a ajustar y complementar.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Elaboró: Viviana Castro - Profesional Ambiental

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-41-2025 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL 3

2 mensajes

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 8 de mayo de 2025, 3:57 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Viviana Castro Ambiental SST Interventoria <consorciomm2024buvc@gmail.com>, Junyor Salamanca <junyor.salamanca@gobiernobogota.gov.co>, "infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co" <infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

3- INFORME DE GESTION AMBIENTAL 3.pdf

CMM-41-2025 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL 3.pdf
222K

Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com> 9 de mayo de 2025, 9:20 a.m.
Para: directorvias@gmail.com

PSI
[Texto citado oculto]

--
Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

CMM-41-2025 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL 3.pdf
222K

CONSORCIO MM 2024

***NIT** 901901627-2*

CMM-40-2025

Bogotá, mayo 5 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: APROBACIÓN CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA Y BALANCE GENERAL AJUSTADO

Cordial Saludo

En relación con el contrato de referencia y en cumplimiento de sus disposiciones, esta interventoría confirma su aprobación al cronograma detallado, que incluye los ítems no previstos previamente aprobados, así como el flujo de caja y el balance general.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Elaboro:. YENNIFFER ACOSTA SALGADO-RESIDENTE DE INTERENTORIA

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.
CC: ING. ESTEBAN MEDRANO ESPINOSA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-40-2025 APROBACIÓN CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA Y BALANCE GENERAL AJUSTADO

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 5 de mayo de 2025, 2:34 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Junyor Salamanca <junyor.salamanca@gobiernobogota.gov.co>, "infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co" <infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co>, Yenniffer Acosta Residente Interventoria <consorciomm2024ya@gmail.com>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-40-2025 APROBACIÓN CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA Y BALANCE GENERAL AJUSTADO.pdf
202K

CONSORCIO MM 2024

***NIT** 901901627-2*

CMM-39-2025

Bogotá, abril 22 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: APROBACION INFORME 2 GESTION SST RESPUESTA OFICIO BYR-SGI-124-102-2025

Cordial Saludo.

Dando alcance al contrato de la referencia y en cumplimiento de este, emitimos respuesta al oficio del asunto, dando aprobación al informe mensual #2, teniendo en cuenta que este cumple con los requisitos contractuales.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Elaboro: GERALDINE CERINZA ESPINEL – PROFESIONAL SST INTERVENTORIA.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.
CC: ING. ESTEBAN MEDRANO ESPINOSA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-39-2025 APROBACION INFORME 2 GESTION SST OFICIO BYR-SGI-124-102-2025.doc

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 22 de abril de 2025, 9:41 a.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, "infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co" <infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co>, Junyor Salamanca <junyor.salamanca@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-39-2025 APROBACION INFORME 2 GESTION SST OFICIO BYR-SGI-124-102-2025.doc.pdf
204K

CONSORCIO MM 2024

***NIT** 901901627-2*

CMM-38-2025

Bogotá, abril 22 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Respuesta a comunicación BYR-SGI-124-095-2024 y BYR-SGI-124-100-2024 – Aprobación Informe mensual Ambiental No. 2 y Gestión RCD 1.

Cordial saludo,

Esta Interventoría en ejercicio de sus obligaciones contractuales dentro del contrato marco de la referencia y en seguimiento del contrato de Obra No. 491 de 2024 una vez revisado el informe mensual ambiental correspondiente al periodo del 20 de febrero al 19 de marzo de 2025 entregado de manera digital mediante comunicación BYR-SGI-124-100-2024 y plan de gestión RCD entregado de manera digital mediante comunicación BYR-SGI-124-095-2024, se informa que no se encuentran observaciones a los documentos, por lo que se considera que cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el contrato, por lo anterior; se otorga aprobación a los informes mencionados.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y que sean requeridas por Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Elaboró: Christian Rodríguez - Profesional Ambiental

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-38-2025 APROBACION INFORME AMBIENTAL 2 y GESTION RCD 1

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 22 de abril de 2025, 9:30 a.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, "infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co" <infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co>, Junyor Salamanca <junyor.salamanca@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-38-2025 APROBACION INFORME AMBIENTAL 2 y GESTION RCD 1.pdf
225K

CONSORCIO MM 2024

Nit:901.901.627-2

CMM-37-2025

Bogotá, 22 de abril de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001
Atn. Sr, Geovanny A. Paez
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 520-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

Asunto: Aprobación del Informe N°2 del Plan de Gestión Social e Intervención Poblacional

Cordial saludo,

En atención al Informe N° 2 del Plan de Gestión Social e Intervención Poblacional, correspondiente al contrato COP-491-2024, presentado el día 21 de abril de 2025 por medio de oficio BYR-SGI-124-101-2025, para revisión y aprobación, nos permitimos informarle que, tras un análisis detallado del contenido, este ha sido **aprobado**.

Dicho informe ha sido evaluado conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y a las disposiciones normativas aplicables, verificando que las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 19 de marzo de 2025 cumplen con los objetivos planteados dentro del Plan de Gestión Social e Intervención Poblacional.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Director de obra CONSORCIO MM 2024.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-37-2025 APROBACION INFORME MENSUAL SOCIAL 2

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 22 de abril de 2025, 9:14 a.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Maritza Ibañez <consorciomm2024bumi@gmail.com>, "infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co" <infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co>, Junyor Salamanca <junyor.salamanca@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-37-2025 APROBACION INFORME MENSUAL SOCIAL 2.pdf
213K

CONSORCIO MM 2024

***NIT** 901901627-2*

CMM-36-2025

Bogotá, abril 21 de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: AVAL INFORME TECNICO 2 DE LA ETAPA DE OBRA PARA EL CONTRATO FDLBU COP 491-2024.

Cordial Saludo.

En cumplimiento del contrato de referencia, esta interventoría emite la aprobación del informe técnico 2 correspondiente a la etapa de obra, en el cual el contratista ha cumplido con la entrega de todos los soportes necesarios que permitieron avanzar en esta fase del contrato.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

Elaboro:. Yenniffer Acosta Salgado – Residente Técnica de Interventoría.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-36-2025 APROBACIÓN INFORME MENSUAL 2

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 21 de abril de 2025, 7:13 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Yenniffer Acosta Residente Interventoria <consorciomm2024ya@gmail.com>, Junyor Salamanca <junyor.salamanca@gobiernobogota.gov.co>, "infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co" <infraestructura.bunidos@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-36-2025 APROBACIÓN INFORME MENSUAL 2.pdf
208K

CMM-35-2025

Bogotá, 21 de abril de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 520-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Aprobación actas de vecindad oficio BYR-SGI-124-080-2025

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se informa que se recibió el día 15 de marzo de 2025 por medio de oficio BYR-SGI-080-2025 en donde remitían las actas de vecindad del CIV 12000392, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la interventoría.

De la misma manera se adjunto el acta de compromiso del predio Calle 93 No 57 37, la cual será firmada por la interventoría una vez se surta el debido proceso de seguimiento por medio de las tres visitas reglamentarias, en el caso de no cumplirse el compromiso por parte de los propietarios del predio se deberá remitir el acta con los soportes del mismo a la interventoría quien a su vez los remitirá al FDLBU para que por parte de la entidad se realicen los trámites legales a que haya lugar.

Las actas de vecindad velan por que los predios vecinos permanezcan en las mismas condiciones físicas que se encontraban antes del inicio de la intervención, por lo que, en caso de presentarse alguna reclamación, será únicamente responsabilidad de la firma contratista la verificación de la situación con los soportes recopilados en el levantamiento del acta.

En este sentido, la Interventoría velará por la revisión de la documentación, pero ni esta interventoría ni la entidad contratante, en este caso el FDLBU, tendrán ninguna responsabilidad respecto a las solicitudes de la comunidad en cuanto a requerimientos de supuestos daños presentados. En caso de que se presenten estas solicitudes, corresponderá a la firma contratista realizar la debida gestión para dar respuesta.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-35-2025 APROBACION ACTAS DE VECINDAD OFICIO BYR-SGI-124-080-2025

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 21 de abril de 2025, 6:43 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Maritza Ibañez <consorciomm2024bumi@gmail.com>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-35-2025 APROBACION ACTAS DE VECINDAD OFICIO BYR-SGI-124-080-2025.pdf
215K

CMM-34-2025

Bogotá, 21 de abril de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 520-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Aprobación actas de vecindad oficio BYR-SGI-124-074-2025

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se informa que se recibió el día 15 de marzo de 2025 por medio de oficio BYR-SGI-074-2025 en donde remitían las actas de vecindad del CIV 12000458, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la interventoría.

Las actas de vecindad velan por que los predios vecinos permanezcan en las mismas condiciones físicas que se encontraban antes del inicio de la intervención, por lo que, en caso de presentarse alguna reclamación, será únicamente responsabilidad de la firma contratista la verificación de la situación con los soportes recopilados en el levantamiento del acta.

En este sentido, la Interventoría velará por la revisión de la documentación, pero ni esta interventoría ni la entidad contratante, en este caso el FDLBU, tendrán ninguna responsabilidad respecto a las solicitudes de la comunidad en cuanto a requerimientos de supuestos daños presentados. En caso de que se presenten estas solicitudes, corresponderá a la firma contratista realizar la debida gestión para dar respuesta.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-34-2025 APROBACION ACTAS DE VECINDAD OFICIO BYR-SGI-124-074-2025

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 21 de abril de 2025, 6:43 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Maritza Ibañez <consorciomm2024bumi@gmail.com>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-34-2025 APROBACION ACTAS DE VECINDAD OFICIO BYR-SGI-124-074-2025.pdf
214K

CMM-33-2025

Bogotá, 21 de abril de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 520-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Aprobación actas de vecindad oficio BYR-SGI-124-071-2025

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se informa que se recibió el día 15 de marzo de 2025 por medio de oficio BYR-SGI-071-2025 en donde remitían las actas de vecindad del CIV 12000076, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la interventoría.

Las actas de vecindad velan por que los predios vecinos permanezcan en las mismas condiciones físicas que se encontraban antes del inicio de la intervención, por lo que, en caso de presentarse alguna reclamación, será únicamente responsabilidad de la firma contratista la verificación de la situación con los soportes recopilados en el levantamiento del acta.

En este sentido, la Interventoría velará por la revisión de la documentación, pero ni esta interventoría ni la entidad contratante, en este caso el FDLBU, tendrán ninguna responsabilidad respecto a las solicitudes de la comunidad en cuanto a requerimientos de supuestos daños presentados. En caso de que se presenten estas solicitudes, corresponderá a la firma contratista realizar la debida gestión para dar respuesta.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-33-2025 APROBACION ACTAS DE VECINDAD OFICIO BYR-SGI-124-071-2025

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 21 de abril de 2025, 6:42 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Maritza Ibañez <consorciomm2024bumi@gmail.com>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-33-2025 APROBACION ACTAS DE VECINDAD OFICIO BYR-SGI-124-071-2025.pdf
214K

CONSORCIO MM 2024

Nit: 901.901.627-2

CMM-32-2025

Bogolá. 21 de abril de 2025.

Señores
CONSORCIO BYR SG BU 001.
Atn. Ing. Geovanny Alexander Páez Hernández.
Representante Legal.
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 520-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA E. CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ASUNTO: Aprobación actas de vecindad oficio BYR-SGI-124-069-2025

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se informa que se recibió el día 15 de marzo de 2025 por medio de oficio BYR-SGI-080-2025 en donde remitían las actas de vecindad del CIV 12000329. las cuales fueron revisadas y aprobadas por la interventoría.

De la misma manera se adjuntó las actas de compromiso de los predios:

Calle 93 A No 60 B 75
Calle 93 A No 60 B 71
Calle 93 A No 60 B 53
Calle 93 A No 60 B 14

Las cuáles serán firmadas por la interventoría una vez se surta el debido proceso de seguimiento por medio de las tres visitas reglamentarias, en el caso de no cumplirse el compromiso por parte de los propietarios del predio se deberá remitir el acta con los soportes del mismo a la interventoría quien a su vez los remitirá al FDLBU para que por parte de la entidad se realicen los trámites legales a que haya lugar.

Las actas de vecindad velan por que los predios vecinos permanezcan en las mismas condiciones físicas que se encontraban antes del inicio de la intervención, por lo que, en caso de presentarse alguna reclamación, será únicamente responsabilidad de la firma contratista la verificación de la situación con los soportes recopilados en el levantamiento del acta.

En este sentido, la Interventoría velará por la revisión de la documentación, pero ni esta interventoría ni la entidad contratante, en este caso el FDLBU, tendrán ninguna responsabilidad respecto a las solicitudes de la comunidad en cuanto a requerimientos de supuestos daños presentados. En caso de que se presenten estas solicitudes, corresponderá a la firma contratista realizar la debida gestión para dar respuesta.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

CONSORCIO MM 2024

Nit: 901.901.627-2

Cordialmente.

ANDRES MURILLO MAYORGA.
Rep. Legal (S) CONSORCIO MM 2024.

CC: Dra ANDREA MELISSA MORALES CANO – ALCALDESA LOCAL.
CC: ING FRANCISCO GRANADOS - LIDER INFRESTRUCTURA.
CC: ING. GUILLERMO SALAMANCA – CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLBU.

Gmail **Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>**

CMM-32-2025 APROBACION ACTAS DE VECINDAD OFICIO BYR-SGI-124-069-2025

1 mensaje

Consorcio MM 2024 Barrios Unidos <consorciomm2024bu@gmail.com> 21 de abril de 2025, 6:41 p.m.
Para: Consorcio BYR-SG BU 001 <consorciobyrsgbu001@gmail.com>, Maritza Ibañez <consorciomm2024bumi@gmail.com>

Cordial saludo

Anexo a la presente el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

ANDRES MURILLO

CMM-32-2025 APROBACION ACTAS DE VECINDAD OFICIO BYR-SGI-124-069-2025.pdf
219K

ANEXO 3.3
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA EPS

Bogotá D.C.

Señora
JENNY ALEXANDRA PIRA BARRETO
Apoderada del trámite
Teléfono: (+57) 304 617 4760
Dirección: Calle 23 No. 75-33
Correo electrónico: proyectos@jpdisenos.com
Ciudad.

ASUNTO: **CA Concepto técnico de viabilidad.** Ejecución de obras mínimas en diez (10) segmentos viales, en la localidad de Barrios Unidos. **Radicado IDPC No.** 20255110021492 del 12 de marzo de 2025.

Respetada señora Pira, reciba un cordial saludo.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) evaluó la solicitud de autorización de intervención de espacio público del asunto y considera que es **viable,** teniendo en cuenta que:

1. La propuesta no compromete los valores históricos, arquitectónicos, tipológicos ni urbanos de los Sectores de Interés Urbanístico (SIU) Polo y Popular Modelo Norte.

2. Las actividades formuladas garantizan la conservación de la malla vial y mejoran las condiciones de la infraestructura vial y la movilidad vehicular en los SIU mencionados.

3. La propuesta cumple con los principios generales de intervención establecidos en el artículo 2.4.1.4.3 del Decreto Nacional 1080 de 2015[1] de la siguiente manera: *"La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias para la conservación del espacio público, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las fuentes de deterioro"*.

4. En el marco de la propuesta no se afectan ni intervienen las redes de servicios públicos, ni se contempla la intervención de andenes y sardineles.

5. La viabilidad que emite el IDPC se da en el marco de la evaluación de la propuesta y de la no afectación ni alteración de los valores patrimoniales. No obstante, el

1 Decreto Nacional 1080 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura".*

solicitante deberá cumplir con la demás normativa aplicable y deberá tramitar los demás permisos que le correspondan, como Plan de Manejo de Tránsito (PMT), entre otros.

Los aspectos técnicos y normativos que hacen parte de la propuesta fueron evaluados por la arquitecta Paula Castellanos, identificada con tarjeta profesional No. A242018-1014234916, profesional de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio del IDPC, y se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN NORMATIVA Y TÉCNICA DE LA SOLICITUD			
Descripción de la propuesta		Reparcheos en asfalto sobre diez (10) segmentos viales ubicados en la localidad de Barrios Unidos.	
Entidad contratante		Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos	
Contrato		Contrato de obra 491-2024 *"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable para la conservación de la malla vial local e intermedia y puentes sobre cuerpos de agua de la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá D.C."*	
Solicitante		Consorcio BYR-SG-BU001	
Apoderada		Jenny Alexandra Pira Barreto C.c. 52.827.303	
IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO OBJETO DE LA INTERVENCIÓN			
Segmento		**CIV**	**Elemento**
KR 22 entre CL 88 y CL89		12000741	PK_ID_CALZADA 178870
KR 21 entre CL 87 y CL 89		12000850	PK_ID_CALZADA 178898
CL 86A entre AK 24 y KR23		12000922	PK_ID_CALZADA 179962
CL 83 entre AK 24 y KR 22A		12001341	PK_ID_CALZADA 179899
CL 83 entre KR 22A y KR 22		12001351	PK_ID_CALZADA 179898
KR 21 entre CL 83 y fin de calzada		12001409	PK_ID_CALZADA 178892
KR 21 entre CL 82 y fin de calzada		12001510	PK ID_CALZADA 178891
KR 27 entre CL 82 y CL 83BIS		12001383	PK_ID_CALZADA 178668
KR 54 entre CL67ABIS y CL67ABISA		12001860	PK_ID_CALZADA 12001860
CL 66B entre KR56B y KR 56		12001917	PK_ID_CALZADA 179246
Localidad	Barrios Unidos	**Unidad de**	33- Barrios Unidos.

		Planeamiento Local (UPL)	
Condición patrimonial		SIU Popular Modelo Norte y SIU el Polo y su Área de Protección del Entorno Patrimonial (APEP).	
Marco normativo		Decreto Distrital 555 de 2021[2] y Decreto Nacional 2358 de 2019[3]	
Modalidad de intervención Decreto Nacional 2358 de 2019		Obras mínimas en espacio público: cambios de superficies de la carpeta asfáltica (cambio de rodadura).	

Finalmente, el IDPC hace las siguientes recomendaciones, las cuales deberán tenerse en cuenta al momento de realizar la intervención:

1. Durante la ejecución de las actividades de intervención, el interesado deberá velar por la integridad de los elementos que hacen parte del espacio público y acogerse a los procedimientos adecuados para la intervención según las características arquitectónicas y constructivas del espacio público.

2. Las herramientas, materiales y demás insumos utilizados en las actividades de intervención no deberán causar ninguna afectación a los elementos que hacen parte integral del espacio público, ni a los bienes muebles e inmuebles localizados en el contexto.

3. No deberán emplearse anclajes ni apoyos que afecten los materiales y acabados de las superficies ni de los elementos que componen el espacio público en general.

4. Deberá tenerse especial cuidado al momento de utilizar y manipular equipos o maquinaria pesada, para evitar daños o averías en las superficies y de los elementos que conforman el espacio público que no haga parte de la intervención.

5. El espacio público objeto de la solicitud deberá ser entregado en perfecto estado de orden y aseo.

6. Quien ejecute una intervención en elementos de la Estructura Integradora de Patrimonios (EIP) deberá sujetarse estrictamente a lo aprobado por esta entidad y prestar toda la colaboración necesaria para que se adelante, si así se considera, el seguimiento efectivo de la obra, permitiendo el acceso a la intervención y brindando

2 Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021 *"Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C."*

3 Decreto 2358 de 2019 "*Por el cual se modifica y se adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Material e Inmaterial*."

toda la información requerida para comprobar el cumplimiento de la norma urbanística.

7. Cualquier modificación, complementación o adición a las intervenciones autorizadas mediante el presente concepto, por requerimientos normativos, técnicos y/o jurídicos, deberá surtir nuevamente el proceso de aprobación ante el IDPC, quien de acuerdo con las competencias previamente señaladas evaluará las modificaciones propuestas y emitirá un nuevo concepto.

8. Remitir a este Instituto un registro fotográfico que evidencie el estado de los espacios públicos antes, durante y después del desarrollo de las actividades, dando cuenta de las condiciones en las que se recibieron y se entregaron los espacios públicos objeto de la presente solicitud.

Responsabilidad y vigencia

1. La decisión que adopta esta entidad en el presente concepto no constituye una licencia de construcción ni de ocupación e intervención del espacio público en ninguna de sus modalidades, ni reconoce usos no autorizados por las entidades competentes.

2. La viabilidad del presente concepto no exime al interesado de tramitar las respectivas licencias de construcción, intervención y ocupación de espacio público y/o excavación, así como sus respectivas prórrogas, si ellas resultaren pertinentes.

3. Cualquier afectación sobre terceros es responsabilidad del solicitante quien responderá directamente en caso de presentarse algún tipo de conflicto en cualquiera de las instancias judiciales.

4. Según lo estipulado en el artículo 19 del Decreto Nacional 2358 de 2019, el presente concepto tiene una vigencia de **treinta y seis (36) meses**, contados a partir de su ejecutoria y podrá prorrogarse por doce (12) meses, previa solicitud escrita del interesado, la cual deberá presentarse dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a su vencimiento.

Sin otro particular, en caso de requerir información adicional, podrá solicitar una cita de atención al ciudadano para recibir asesoría técnica personalizada al correo electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co o a la línea telefónica (601) 355 0800 extensión 5029. De igual manera, se informa que, la radicación de solicitudes podrá realizarse de forma presencial en la calle 12B No. 2-91 Casa Pardo, de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm en jornada continua o de manera virtual en formato PDF al correo electrónico

correspondencia@idpc.gov.co. Tenga en cuenta que, las solicitudes enviadas al correo electrónico después de las 5:00pm serán recibidas y radicadas el día hábil siguiente a la fecha de envío.

Atentamente,

Documento 20253010031571 firmado electrónicamente por:	
MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ	Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO Fecha firma: 19-05-2025 13:33:03
Aprobó:	JOHAN ALBERTO GARZÓN CASTAÑEDA - Profesional especializado - Espacio Público
Revisó:	MARILUZ LOAIZA CANTOR - contratista - Asesoría Anteproyectos
Proyectó:	PAULA MARCELA CASTELLANOS VÉLEZ - - Espacio Público

c5799f00161ba83f954fa8a723563856cdd2955bf3037ee5a8d385592ceb7238
Codigo de Verificación CV: f2873

ANEXO 4
BITACORAS

ANEXO 4.1
BITACORA PUENTE

COP - 491 - 2024

Bitácora Actividades de Obra.

Contrato De Obra

No. Contrato: COP-491-2024
Contratista: Consorcio BYR SG BU 001
NIT: 901.901.203-3
R/Legal: Ing. Geovanny Paez
Dirección: Carrera 55 No. 152B-68
Correo: consorciobyrsgbu001@gmail.com
Telefono: 6012181754
Plazo: 6 Meses

Contrato De Interventoria

No. Contrato: CIN-510-2024
Contratista: Consorcio MM 2024
NIT: 901.901.627-2
R/Legal: Ing. Gilberto Martinez Arguelles
Dirección: CL 1 A #24-86
Telefono: 3017862238
Plazo: 6 Meses

Entidad Contratante

Fondo De Desarrollo Local De Barrios Unidos

Apoyo a la supervisión: Guillermo Salamanca
Firmas:

Director De Obra

Director De Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

05 de abril de 2025

Clima: No se presentaron lluvias durante la jornada

Personal Contratista
1 Inspector de Obra
2 Oficiales
2 Ayudantes
2 Auxiliar de Trafico

Actividades de Obra: Se inicia la construcción de las rampas en el costado occidental en el area de adoquín CIV 12003442

Equipo: Herramienta menor

RF

Contratista: IT

22 - de abril - 2015.

Clima: se presentan lluvias a partir de 2:30 pm con intensidad alta.

Personal.
Oficial - 3.
Ayudante - 8
Cabo - 4
Rx Pronto - 2.
Op. Bombeo 1
Topografo 1
Operario 3.

Equipo: 1 mini cargador, 1 mini excavadora, 1 vibro mixto, 1 vehiculo operativo "camioneta" Volquetas retiradas: se demuele concreto existente en aproche sur del puente, se inicia excavación para tratamiento superficial en zona acondicionada o que presenta falla, se realiza corte de la carpeta con disco diamantado.
Las actividades se ejecutan por alta plasticidad.

Dentro de actividades varias se adelanta la limpieza y protección de sumideros adyacentes al sector en intervención.

Las actividades de mantenimiento de bombeo existente y/o renovación de la misma, inicia con el desmonte de los tramos que requieren ser cambiados, adicionalmente se inicia la perforación de anclajes para fijación de los mismos.

Kar Ruiz II

Jaime Ruiz.

23 de abril de 2025.

Clima: se presentan lluvias leves e intermitentes durante toda la jornada.

- Personal:
Oficial -3
Ayudantes - 8
Real - 1
Fontanero - 2
Ing Residente - 1
Topografo - 1
Operarios -3.

Equipo - minicargador - Vibrocompactador Mixto, 1 Vehiculo operativo "camión" 1 Extendedora de Asfalto" y marmita de imprimación, Herramientas

Actividades:
Debido a la inclemencia respecto a las lluvias se procede a retirar el material granular instalado en jornada anterior y se procede con la adición de cemento, buscando de esta manera dar estabilidad a la estructura existente, la compactación es acorde a los agregados en el proceso.
- El procedimiento empleado no da los resultados esperados y se procede a la demolición de la sub estructura mediante apiques de mayor profundidad.
- Las actividades tendientes al mantenimiento y reparación de bermas, cunetas se cumplen durante la jornada en el sector oriental.

Ing. Residente

Inspector II

24-de abril de 2025.

Clima: se tiene lluvias leves en la mañana.

Personal.

Oficiales 2	Ing Residente 1
Ayudantes 1	Topografo 1
Real 1	Operarios 2
Tractor 1.	

Equipo: Mini excavador, Vibro compactador mixto camión ó vehículo operativo, Volquetes, compactadora manual mixta menor.

Actividades: Se continua con el proceso de compactación de material granular existente mejorado con cemento.

Al realizar prueba de carga se determina la incapacidad definitiva de la estructura esta debido a problemas de base estructural con sobresaturación en las capas inferiores debido a esto se realiza comité de obra en compañía de interventoría con quienes se determina un proceso mas contundente el cual radica en el mejoramiento de la subrasante mediante un tratamiento mas profundo acordado en 70 cm para capas mejoradas este se realizara hasta se obtenga un nuevo PMT y CBR aprobado para esta nueva intervención en el tramo.

Las actividades de adecuación y mantenimiento de barandas continuan su curso, durante el dia se realiza imprimación y entrega en 7ª mano para formaleta

Ing. Residente II

Maestro de Obra

5 de Mayo de 2015

Clima: se presentan lluvias fuertes durante toda la jornada.

Personal:

1 capital	1 Ing Ambiental
2 ayudantes	1 Ing SST
2 Hix transito	1 Ing Tecnico Residente.
1 topografo	1. conductor Camión
1 operario	2. conductor Volqueta.
1 Inspector, equipos.	

- Actividades

Se inicia excavación y retiro de material existente a una profundidad de 0,4mts. Instalación material de mejoramiento en una distancia de 2.50 mtrs por frente del Bo+000 extremo sur del proyecto

- Equipo: Retrocargador, mini cargador, martillo, vibro compactador tandut, volqueta, Camión "vehiculo operativo"
- Debido a la condición climatica, la que no fue muy favorable, las actividades fueron mínimas.

Durante la instalación del rajón se presentan las siguientes observaciones

- El rajon llegó sobredimensionado el cual no da cumpliendo con la norma
- Se dieron indicaciones de demolición del rajón en tamaños aproximados de 30 cm, ya que durante la instalación de dicho material se encontró tamaños superiores a 40 cm, los cuales se hicieron retirar para su demolición.
- Se encontró una tubería luminaria durante la excavación se hace la recomendación de realizar cargamo para su debida Protección,

Inspector Interventoria:

6 de mayo de 2025.

Clima: se presentan lluvias intermitentes con intensidad variable a partir de 11:00a.

Personal

1 capital
3 auxiliares
2 auxiliar técnico
2 operario de maquinaria
2 conductores de volqueta
1 conductor de camión
1 Ing. SST.
1 insp. cuadrilla
1 topógrafo
1 Ing Residente.

Equipos.

2 volqueta, 1 rodillo tandem, 1 pisón, 1 cargador con martillo, 1 Retrocargador "Rapidito", 1 cortadora, 1 Plancha vibratoria "Rano"

Actividades: El proceso de excavación continua en curso para mejoramiento de estructura a una profundidad de 0,70mts
Instalación de material de mejoramiento.

Las actividades de pintura para bermas del puente, se adelantan realizando algunas adecuaciones finales en previo de su entrega a interventoría.

- Se continua con la instalación de rajón dando cumplimiento a la norma
- En cuanto al zarzamo recomendado se optó por realizar un encamado (Protección) en material granular reciclado para proteger la tubería así evitar daños a la misma.

Inspector Interventoría: Yeu Rui Ru OP

ANEXO 4.2
BITACORA ACCIONES DE MOVILIDAD

FECHA 16 DE ABRIL 2025.
CIV- 1200104.
Dirección - Kra 69. entre dg 68 y dg 67 (3) barrio 5
Clima - frio - sin precipitaciones
Personal -
1- oficial
1- ayudante
1 Aux. topico
1- Cabo
1- Conductor de camión
1- Ingeniero

Actividades.
Se realiza limpieza general del tramo y 4 sumideros, 2 de los cuales no se lograron destapar, motivo por el cual solo se limpiaron superficialmente, este tramo en la zona de intervención presenta 4 sumideros, dos de ellos requieren adecuación y/o reubicación de marco y rejillas.

Equipos: Herramienta menor y camión para logística y transporte de personal

CIV-1200392 dg 93 Kra 58-Kra 57 tramo # 11.
Actividades:
Se realiza limpieza de tramo intervenido junto a limpieza de 1 sumidero ubicado en zona intervenida, este sumidero requiere de reubicación de rejilla.

II

FECHA ACTIVI 21 DE ABRIL 2025.
CIV-12000458 Dic. 97a Bra58-Bra50 tramo #36
CIV-12000279 Bra 29B Dic 66-Dic 67 tramo #40
Clima: se presentan lluvias de poca intensidad y duración a partir de medio día y hasta horas de la noche.

Personal
1 oficial
1- Ayudante-
1 conductor de camión
1. Aux. de tránsito
1. Boal
1 Ingeniero Residente.
1 SST.
Equipos: Vehículo operativo - Herramientas menor.

Actividades:
Se realiza limpieza de tres sumideros y el tramo intervenido en general. #36.
Se realiza nivelación de manholes existente en el tramo, En tramo #40 las actividades son suspendidas debido a indisposición de los moradores del tramo, los cuales alegan derecho al trabajo y no permiten la limpieza de sumideros ya que esta actividad obstaculiza el parqueo de vehículos en la calzada y no lo pueden atender mediante su actividad comercial.-

FIRMAS,

II

FECHA: 25 DE ABRIL /2023

CIV-12000891 Kra 55B. clle 78 / clle 79 tramo #47
CIV-12001030 clle 74A. Kra 58 / Kra 60 tramo # 25
CIV-12001889 Kra 29. clle 77C / clle 72 tramo # 33

Clima: seco en la mañana, nublado en la tarde con lluvias fuertes a partir de 4:10 pm.

Personal en actividades: realizaron esta jornada
1 oficial
1 ayudante
1 Boad
1 Aux. topico
1 Conductor de camión
1 Ing Residente.
Equipo: 1 camión; herramienta menor.

Actividades:
Se realiza limpieza general de los tramos.
En tramo #47 se presenta imposibilidad de retiro de rejillas, estas se encuentran pegadas y de estos sumideros requieren del cambio del marco y posiblemente de rejillas; motivo por el cual solo se realiza limpieza superficial.
En tramo # 25 se limpian 4 sumideros, 1 de los cuales requiere de reparación de muro en estado nor-oriental.
En tramo # 33 se limpian 2 sumideros, el sumidero ubicado sur oriental requiere la instalación de marco y rejilla ya que actualmente este accesorio es metálico lo que dificulta mucho su mantenimiento, igualmente este sumidero presenta deterioro en la reparación y adecuación de muro de apoyo.

INCIHG

Fecha: 28 de Abril de 2025

CIV: 12001917 Tramo: 38 Jornada: Diurna.

Dirección: CL 66B Kra 56B Kra 56

Clima:

Oficiales: 1+1 Inspector: 0.

Ayudantes: 1+5. Ingenieros: 1.

Operarios 1+2. Topografo: 1

Trafico: 2.

Boal: 1.

Actividades: Se interviene tramo asignado para lo cual se realiza demolición de carpeta, excavación de estructura existente y la instalación de material granular para mejoramiento subrasante.

Equipos:

mini cargador, Vibro compactador mixto, marmita, Volqueta camión ó vehiculo operativo.

Actividades: Se realiza adecuación de muro en sumidero estado norte, esta se hace con la instalación de bordillo dejando perdiente la nivelación de muro interior,

El tramo 38 no tiene estructura, se encontró material granular de 9cm y también se encontró material orgánico el cual tiene fallo. Se recomienda excavar 20 cm para material de demolición de asfalto (en vez de 10cm). Se instaló material granular y se pide Prueba de carga para observar el comportamiento del fallo (el cual presentaba acolchonamiento). Terminada la Prueba Interventoría aprueba la instalación de la mezcla asfaltica —

Inspector Interventoria:

Fecha: 29 de abril de 2025
CIV: 12002070 Tramo: 31 Jornada: Diurna
Dirección: Diagonal 74 B1S Kra 20 B calle 75
clima:
Personal:
Oficial - 2. Inspector - 1
Ayudantes - 6. Ingeniero - 2
Operadores - 3. Topografo - 1
Trafico - 2
Boal - 1
Actividades: Demolición de carpeta asfaltica, nivelación y compactación de la rasante granular; e instalación de nueva carpeta asfaltica; limpieza de sumideros y tramo en general.
Equipos
1 minicargador con martillo demledor, Extendedora de asfalto, rodillo compactador mixto, Volgreeter, marmita, vehiculo operativo.

Se encuentra una tuberia la cual se encuentra a 40cm de Profundidad aproximadamente.
Queda en observación la franja del Km 01 045

Inspector Interventoria:

Fecha: 30 de abril de 2025
CIV: 12000849 Tramo: 39 Jornada: Nocturna
Dirección: Calle 79A Kra 55
Clima: No se presentan lluvias.
Personal:
Oficial - 2
Ayudantes - 6
Operadores - 3
Tractco - 2
Boal - 1
Inspector: 1
Ingeniero: 1
Topografo: 1
Actividades: Demolición de carpeta asfaltica existente corte perimetral de zona a intervenir, nivelación y compactación de la Base granular, imprimación e instalación de nueva carpeta Asfaltica.
Equipos
Minicargador con martillo, compito de compactación, Volquetas, Vibro compactador mixto.

Se realiza nivelación de tramo debido a que la inicial se encontraba tapado sumidero en esquina sur oriental, dejando en servicio la garganta lateral inicialmente taponada.

DANIELA G.

EI

Inspector Interventoria:

FECHA: Mayo 02/2025

CIV-1200197 de 66ª Km 56 / Km 56 tramo # 38.
CIV-1200089 de 79ª Km 55 / Km 55 tramo # 39.
CIV-1200269B de Km 74ª a 74 tramo # 1.
CIV-1200240 de 73 Km 22 / Va tramo # 22.

Clima.
El tiempo se presenta seco en la mañana, con algunas lluvias leves e intermitentes en la tarde.

Equipos
1 camión o vehículo operativo, herramienta menor.

Actividades.
En tramo # 38 se realiza limpieza de 2 sumideros y limpieza de tramo en general, los sumideros presentan parrilla frontal y requieren adecuación de marco.
En tramo # 39 atendido en días anteriores. limpieza general de tramo y limpieza de sumidero, a este sumidero que presenta parrilla frontal, se le realiza adecuación de la misma ya que se encontraba obstruida por mala adecuación en la cuneta de cabina. tramo # 7, limpieza general y limpieza de 2 sumideros ubicados dentro de la zona en intervención, estos sumideros requieren de cambio de marco y adecuación de muro de soporte para rejilla y estructura.

Tramo # 22, limpieza general del tramo. limpieza de 1 sumidero dentro del tramo, este sumidero requiere de adecuación de muro para soporte de marco y rejilla.

Recibió:

FECHA: MAYO 03/2025.
CIV-12000076 de 99 Kra 48 / Kra 49 tramo # 35.
CIV-12001694 Kra 55 de 70 bis / de 70 tramo # 24
Clima.
Se presentan lluvias con intensidad entre baja y media durante toda la mañana.

Personal
1 oficial
1 ayudante
1 Raso
1 Aux tropico
1 Conductor de camión
1 Ing Residente.

Equipo: 1 camión como vehículo operativo herramienta menor.

Actividades:

En tramo # 24 se realiza adecuación de garganta frontal en sumidero, esta adecuación comprende la nivelación de muro a nivel de la corpeta asfaltica para permitir ingreso de caudal
En tramo # 35 se realiza limpieza de sumidero ubicado dentro del area de intervención, este sumidero requiere de adecuación de muro de soporte para reja y rejilla.

16 Mayo 2025.

CIV-12000239 tramo #32 Kra 58 desde Clle 94B a 94C

Clima: Se presentan lluvias intermitentes de poca intensidad durante la mañana, en la tarde se tiene tiempo seco.

Personal:

- 1 oficial
- 1 Ayudante
- 1 Boal
- 1 Aux. tramito
- 1 Ing. Residente
- 1 Conductor de camión

Equipo:

1 Camión como vehículo operativo
herramienta menor.

Actividades:

Se realizan perforaciones en zona peatonal para la fijación de postería para pobservadores

Se realiza adecuación de señalización fija para su posterior instalación.

II. Karen Rey:

11 de mayo 2025.
CSU-220239 Tramo #32
Km 58 entre Calle 94 y Calle 96.

Obra:
En horas de la mañana se hace obra sola.

Personal:
1 oficial — 1 Sig Residente
1 Ayudante — 1 Conductor de Vehículo operativo
1 Real
1 Hex transito.

Equipo
1 Camión para transporte y suministro de insumos.
Herramienta menor.

Actividades:

En tramo #32 se realiza implementación del PEES aprobado por vectores de movilidad. para las intervenciones planteadas en este tramo
Esta implementación corresponde a lo plasmado en diagnostico y materializado en zonas peatonales de la obra.

11 Mayo de 2025.

CIV-12000809.
Tramo # 9 ubicado en el sitio Hacienda 991

Clima: se presenta tiempo seco durante todo la jornada.

Personal:
1 operador — 1 inspector sso
1 Ayudante. — 1 ing. Residente.
1 Peón — 1 Conductor de camión.
1 Peón topógrafo.

Equipos:
1 vehículo operativo tipo camión para suministro y transporte de insumo, personal y herramienta menor.

Actividades.
En tramo # 9 se adelantan actividades para la implementación de cerramiento y señalización según PMT aprobado por secretaría de movilidad. Dentro de estas actividades se tienen la excavación ó perforación de anclajes para la colocación y fijación de bolillos, instalación de polisombra, adicionalmente se delimitan zonas a intervenir así como la fijación de señales informativas en zonas peatonales a la obra.

II [illegible]:

20 Mayo 2025
CIV-12000809 tramo #9
Ubicado en Calle 85a entre carrera 50 y carrera 49a
Clima:
Se presentan lluvias con intensidad variable entre fuerte y moderada durante toda la jornada con una reducción después de 3:30 pm
Personal:
1 ayudante 1. Boal 1 Ing. Residente.
1 oficial 1. Aux topico 1 Conductor de Vehiculo op.
Equipos:
1 Vehiculo operativo tipo camión, herramienta menor.
Actividades:
Se demarcan zona a intervenir en siguiente jornada. desmedes con intervention como zonas conceptibles de. mejoramiento, detectadas mediante prueba de rueda. realizada en jornadas previas.

II

21 Mayo 2025.
CIV-12000809. tramo #9.
Ubicado en Calle 85a, entre Kra 50 y Kra 49a.
Clima:
Se presentan lluvias moderadas en algunos momentos de la jornada.
Personal:
1 oficial 1 Boal 1 Ing Residente.
1 Ayudante. 1 Aux. topico 1 Inspector SISO.
1 Conductor Vehiculo 1 Operario equipo.
Actividades:
Se da inicio al corte de asfalto en zonas delimitadas para mejoramiento, en estas mismas zonas se realiza demolición mecanica de carpeta asfaltica; dicha demolición se transporta hacia sitios autorizados por identidad competente.

II

ANEXO 5
ACTAS DE COMITE

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 79103

Objeto de la reunión:	AVANCE DE OBRA.		
Fecha:	09-05-2025.	**Hora de inicio:** 9:30 AM	**Modalidad:** X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta
Lugar:	INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA A.L.B.U.	**Hora de finalización:** 1:30AM	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1054681599	Guillermo Salamanca R.	/ / /	FDLBU-INTRA			X						X	3104731378	
CC	79758991	Juan Rincón Camilo	/ / /	Consorcio BYRSGBU			X							juanrincon.byr@gmail.com	
CC	53152942	YENNIFFER ACOSTAS		CONSORCIO MM 2024			X							CONSORCIOMM2024YA@GMAIL.COM	
CC	79623104	Andres Triana	"	Consorcio MM 2024			X							consorciomm2024BU@gmail.com	
CC	1110455268	Karen Perdomo O.	"	CONSORCIO MM 2024			X							consorciomm2024ka@gmail.com	
CC	52297911	Yonza Ibanez	"	CONSORCIO MM 2024			X							consorciomm2024.bi@gmail.com	
CC	52749710	YURI PARRA	"	Consorcio BYR SG BU 001			X							borisbrithSGBU2024@gmail.com.	
CC	1.054093355	Julieth Gonzalez.	"	Consorcio BYR SG BU 001			X							Julieth Gonzalez BYR@Gmail.com.	
CC	1022980336	Cristian Torres	"	Consorcio BYR SG BU 001			X							cristian.tres.byrc@gmail.com	
CC	79'638.902	[illegible]		CONSORCIO BYR SG-BU-001.			X							DIRECTRIVIM@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

DESARROLLO

SOCIAL
total de personas en el contrato: 30
femenino 6 que seria 20% del 13.6%
femenino vulnerable: 1
Discapacidad 1 Alejandro Suarez tiene una discapacidad del 51% de movilidad de miembros superiores
jovenes: 3 (< 24 años)
Mano de obra no calificada 8 del 26% de las 30 personas
A la fecha se han entregado volantes de convocatoria de mano de obra no calificada a la comunidad del área de infuencia directa del proyecto con un total de 223 volantes entregados predio a predio, támbien se realizo la respectiva convocatoria con las Juntas de Acción Comunal de la localidad y la Secretaria de Desarrollo Economico, se encuentran volantes publicados en los puntos satelite, a la fecha no se han recibido hojas de vida de la comunidad, ni respuesta de las entidades anteriormente menciondas.
A la fecha se tienen aprobados los volantes de cierre y volantes de finalización de los tramos viales 20, 11, 12, 36, 10, 35 21.
Para la entrega de los tramos viales intervenidos a la fecha se acuerda hacer un solo paquete conformado por las actas de finalización, y plegable de sostenibilidad para ser entregado a la comunidad. respevto al avance de las actas de vecindad al dia de hoy se estan haciedo actas de vecidad en los tramos 15, 16, 17, 13 y 14.
durante la ejecucion del contrato se han recibido 3 PQR, de las cuales a la fecha se tienen dos cerradas y una abierta que corresponde a la señora del anden (TRAMO 20 calle 93A #60b 25/27) quiere granito sobre la contrahuella del sardinel, para la atencion de este caso la entidad solicita programar una visita con la dueña del inmueble.
las dos PQR recibidas y cerradas corrresponden al TRAMO 40 respecto a daños a andenes a los cuales ya se les dió respuesta. Los inmuebles estan ubicados en la carrea 29B # 66-25 y la carrera 29B # 66-41/35.

AMBIENTAL
se entregaron las firmas de interventoria del informe 1 y 2, se recibieron observaciones del informe 3, y el contratista remitira el informe de RCD el dia lunes 12 de mayo de 2025, el PIGA dice que no hay necesidad que se le remita copia de los informes ambientales pero de igual forma ya le fueron remitidos los informes aprobados a la fecha

SST
El informe No 3 está en revision por parte de la interventoria, el dia de hoy se remetiran observaciones.
No se ha reportado ingresos y se sigue haciendo el sistema de gestion instaurado inicialmente, se han dado las respectivas capacitaciones, y se no se han presentado accidentes.

TECNICO
*Poner las actividades de los listados de los componentes (ambiental, social, SST) en los informes, donde se evidencie que se cumplió.
*PMT: se solicitaron los de los frentes del polo (8 en total), tramos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 42. Están pendiente por aprobación. Los cuales se solicitaron por un mes.
*PMT: se esta a la espera de la entrega de este del tramo 32. (se solicita el cierre total debido al tráfico)
*PMT: del puente y tramo 9 aprobados desde el 02 de mayo hasta el 31 de julio de 2025, 24 horas.
*se intervenieron durante la semana anterior los segmentos 38, 39 y 31 (finalizados en su totalidad) y se está interviniendo el tramo 43 el puente (sin finalizar)
*se está haciendo un recorido para una evaluacion de cantidades demarcacion de los tramos que se han intervenido.
*La alcaldia solicita que se realicen entreagas de los tramos ejecutados a la fecha , por lo tanto se debe priorizar el tema de señalizacion y sello de juntas y asi realizar un acta parcial de entrega de tramos.
*Dar cierre a la parte social a lo que se vaya dando entrega.
*avance fisico: 58%
*avance financiero: 43.74%

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ANEXO 6
PMT

COI No. 16
ABRIL 16 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
10880	10005734	10000070	KR 106A CL 63A	KR 106A CL 67	CONSORCIO BYR-SG	11-abr-25	25-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	IDU-1660-2024	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 11-ABR-25 PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O RUTINARIO.	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	ENGATIVA	MARIA C. GALINDO Q.	CORREO ELECTRONICO DEL 11-ABR-25
10881	10004866	N/A	KR 109A CL 67	KR 109A 15m AL NORTE	CONSORCIO BYR-SG	11-abr-25	25-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	IDU-1660-2024	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 11-ABR-25 PARA CIERRE DE BAHIA PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE MAQUINARIA Y/O CAMPAMENTO COMO COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O RUTINARIO.	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	ENGATIVA	MARIA C. GALINDO Q.	CORREO ELECTRONICO DEL 11-ABR-25
10882	12001662	N/A	KR 52 CL 71A	KR 52 CL 71C	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	21-abr-25	12-may-25	07:00-17:00	07:00-17:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (07:00-17:00 HORAS). LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 17:00 HORAS PARA EL TRANSITO HABITUAL.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	20256120124434 2
10883	12002070	N/A	DG 74BIS CL 75	DG 74BIS KR 20B	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	21-abr-25	12-may-25	07:00-17:00	07:00-17:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (07:00-17:00 HORAS). LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 17:00 HORAS PARA EL TRANSITO HABITUAL.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	20256120124434 2

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

COI No. 16
ABRIL 16 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
10884	12000239	N/A	KR 58 CL 94B	KR 58 CL 94C	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	21-abr-25	12-may-25	07:00-17:00	07:00-17:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (07:00-17:00 HORAS). LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 17:00 HORAS PARA EL TRANSITO HABITUAL.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	20256120124434 2
10885	12001917	N/A	CL 66B KR 56	CL 66B KR 56B	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	21-abr-25	12-may-25	07:00-17:00	07:00-17:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (07:00-17:00 HORAS). LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 17:00 HORAS PARA EL TRANSITO HABITUAL.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	20256120124434 2

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

COI No. 16
ABRIL 16 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
10886	12000849	N/A	CL 79A KR 55	CL 79A KR 55BIS	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	21-abr-25	12-may-25	22:00-05:00	22:00-05:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (22:00-05:00 HORAS). LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 05:00 HORAS PARA EL TRANSITO HABITUAL.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	20256120124434 2
10887	50004857	50004856	CL 69C SUR KR 18RBIS	CL 69C SUR KR 18R	CONSORCIO CAPITAL	-	-	-	-	FDLCB-759-2023	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDENES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE CALZADA Y ANDENES. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-MAR-25: 1. DESARROLLAR EL CAPITULO CIRCULACION VEHICULOS DE CARGA E INDICAR LA RUTA DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA DESDE CORREDOR DE MOVILIDAD HASTA EL FRENTE DE OBRA, ASI MISMO PRESENTAR ANEXO TECNICO DE RESTITUCION DE VIAS, INCLUYENDO REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUALIZADO Y FECHADO DE LOS SEGMENTOS VIALES USADOS EN LA RUTA DE INGRESO Y SALIDA. 2. VERIFICAR Y AJUSTAR FECHA FIN REPORTADA EN EL FORMATO COI TENIENDO QUE LA PROPUESTA SE DEBE ARMONIZAR CON EL FRENTE DE OBRA APROBADO SOBRE LA KR 18RBIS Y QUE ESTA VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DEL 2025 BAJO RADICADO 202561200520022 3. ARMONIZAR EL ESQUEMA DE SEÑALIZACION CON EL FRENTE DE OBRA APROBADO SOBRE LA KR 18RBIS Y QUE ESTA VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DEL 2025 BAJO RADICADO 202561200520022 4. VERIFICAR Y PROPONER DE MANERA GENERAL KIT´S DE APROXIMACION SOBRE TODAS LAS BOCA CALLES, TENIENDO EN CUENTA QUE LA SEÑAL DE OBRA “VIA CERRADA A 50M” SE USA UNICAMENTE CUANDO EL KIT DE APROXIMACION SE ENCUENTRA SOBRE EL MISMO EJE DEL SEGMENTO INTERVENIDO, DE LO CONTRARIO SE DEBE USAR LA SEÑAL “OBRA EN LA VIA A 50M”. 5. VERIFICAR Y PROPONER SEÑALIZACION VERTICAL EN LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA PARA EL MANEJO PEATONAL, SE RECUERDA QUE DICHA SEÑALIZACION DEBE ORIENTAR AL PEATON POR EL SENDERO LONGITUDINAL.	NO	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VELANDIA S.	20256120069563 2
10888	9002148	N/A	KR 103 40m AL NORTE DE LA CL 19	N/A	CONSORCIO CC UNIDOS II	18-abr-25	17-jul-25	LUNES A VIERNES 07:00-17:00 SABADOS 07:00-12:00	LUNES A VIERNES 07:00-17:00 SABADOS 07:00-12:00	IPES-403275	NOTAS: 1. EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LAS MANIOBRAS, SALVAGUARDANDO SIEMPRE LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (BAHIA) PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DISTRITAL MERCADO FONTIBON (CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION NI AFECTACION DE CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES O ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL SOBRE ANDENES NI CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.	SI	FONTIBON	MARIA C. GALINDO Q.	20256120126769 2

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente
la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.


B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.


Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) EN TRAMOS DE 1m A 10m DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

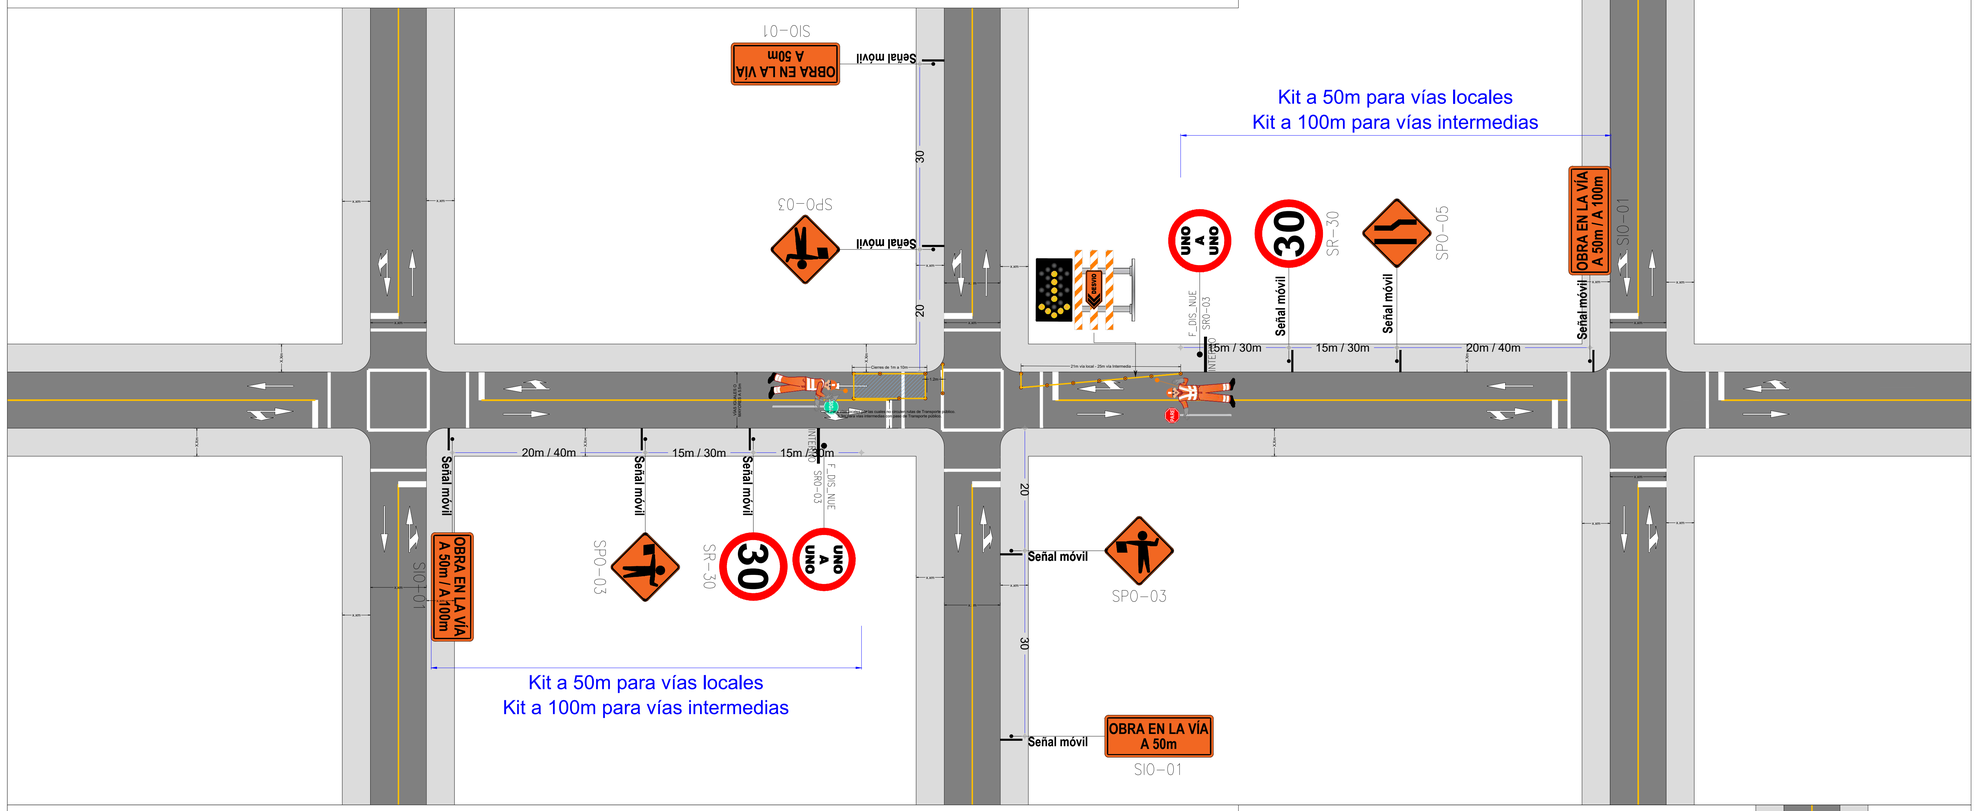

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) EN TRAMOS DE 1m A 10m DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

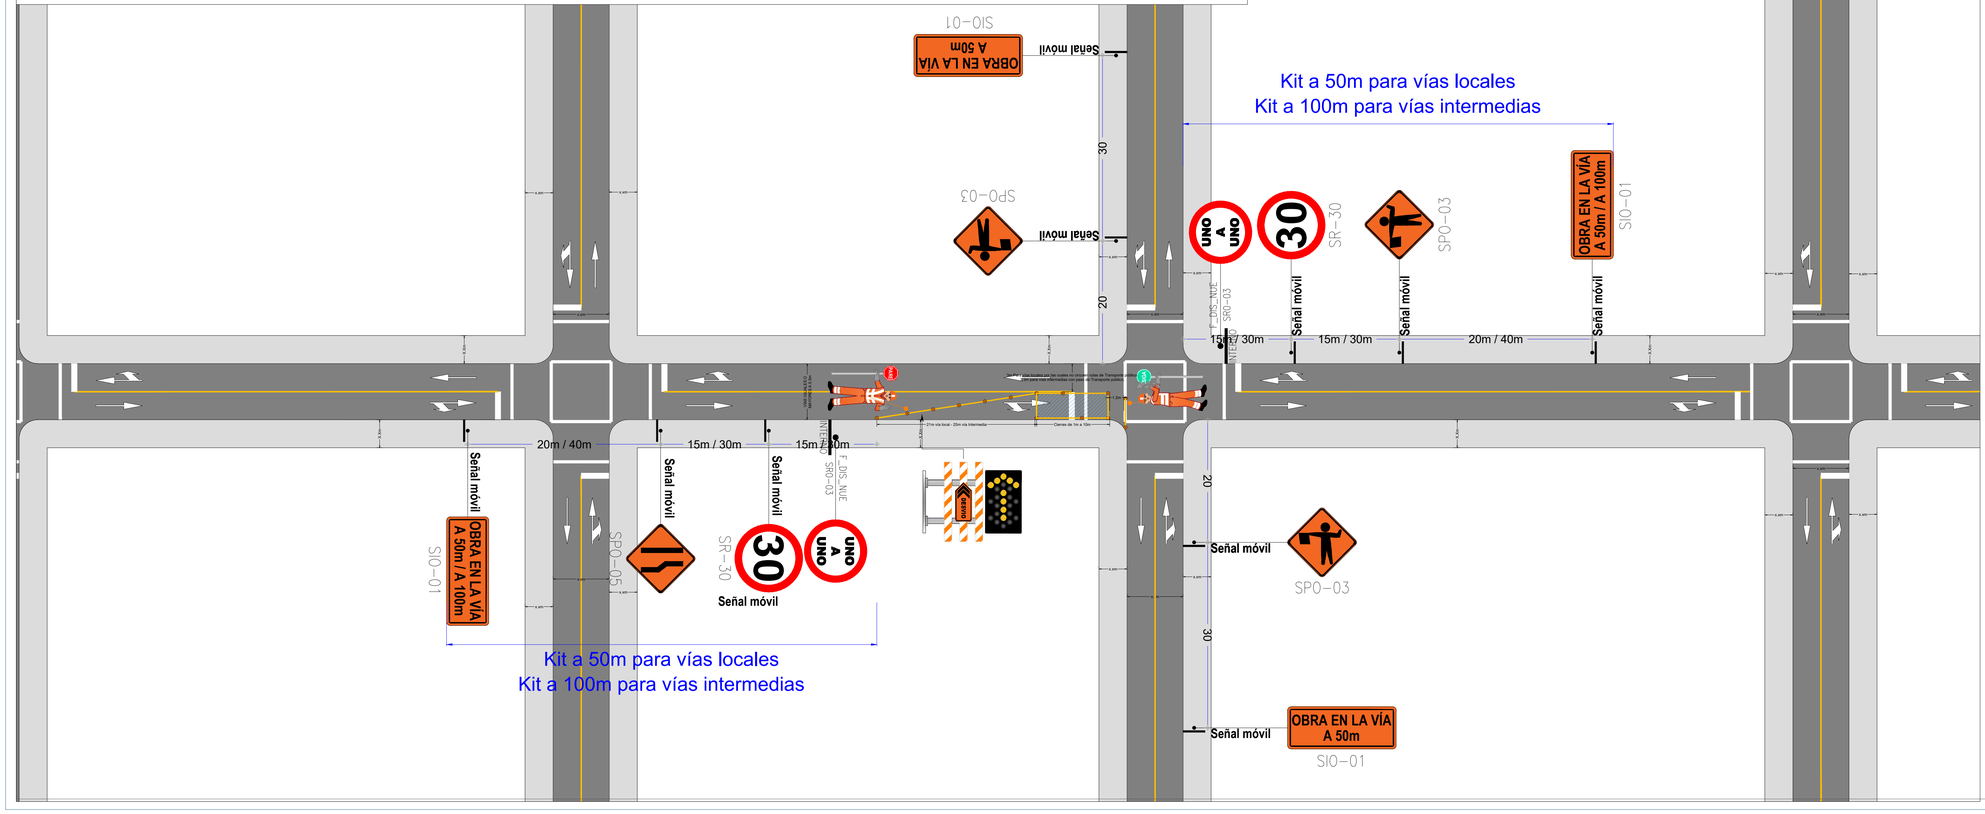

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 3

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES



UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0


FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS POR OBRAS


PLANO 3 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (UNIDIRECCIONAL) EN LA MITAD DE SU DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

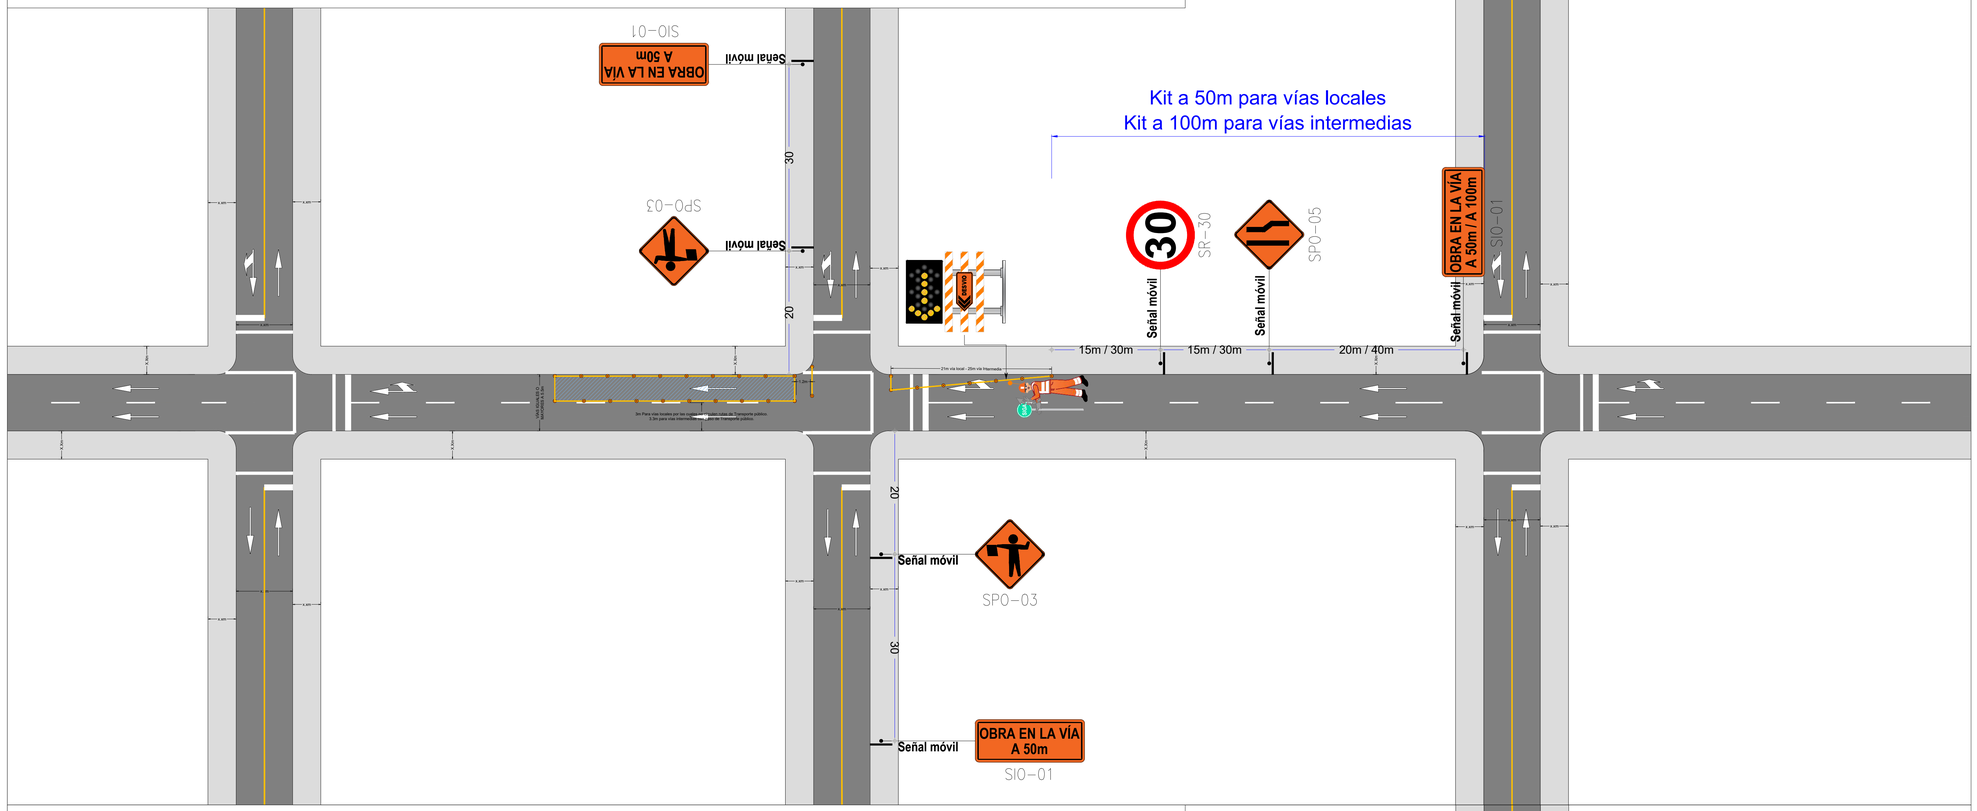

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (UNIDIRECCIONAL) EN LA MITAD DE SU DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

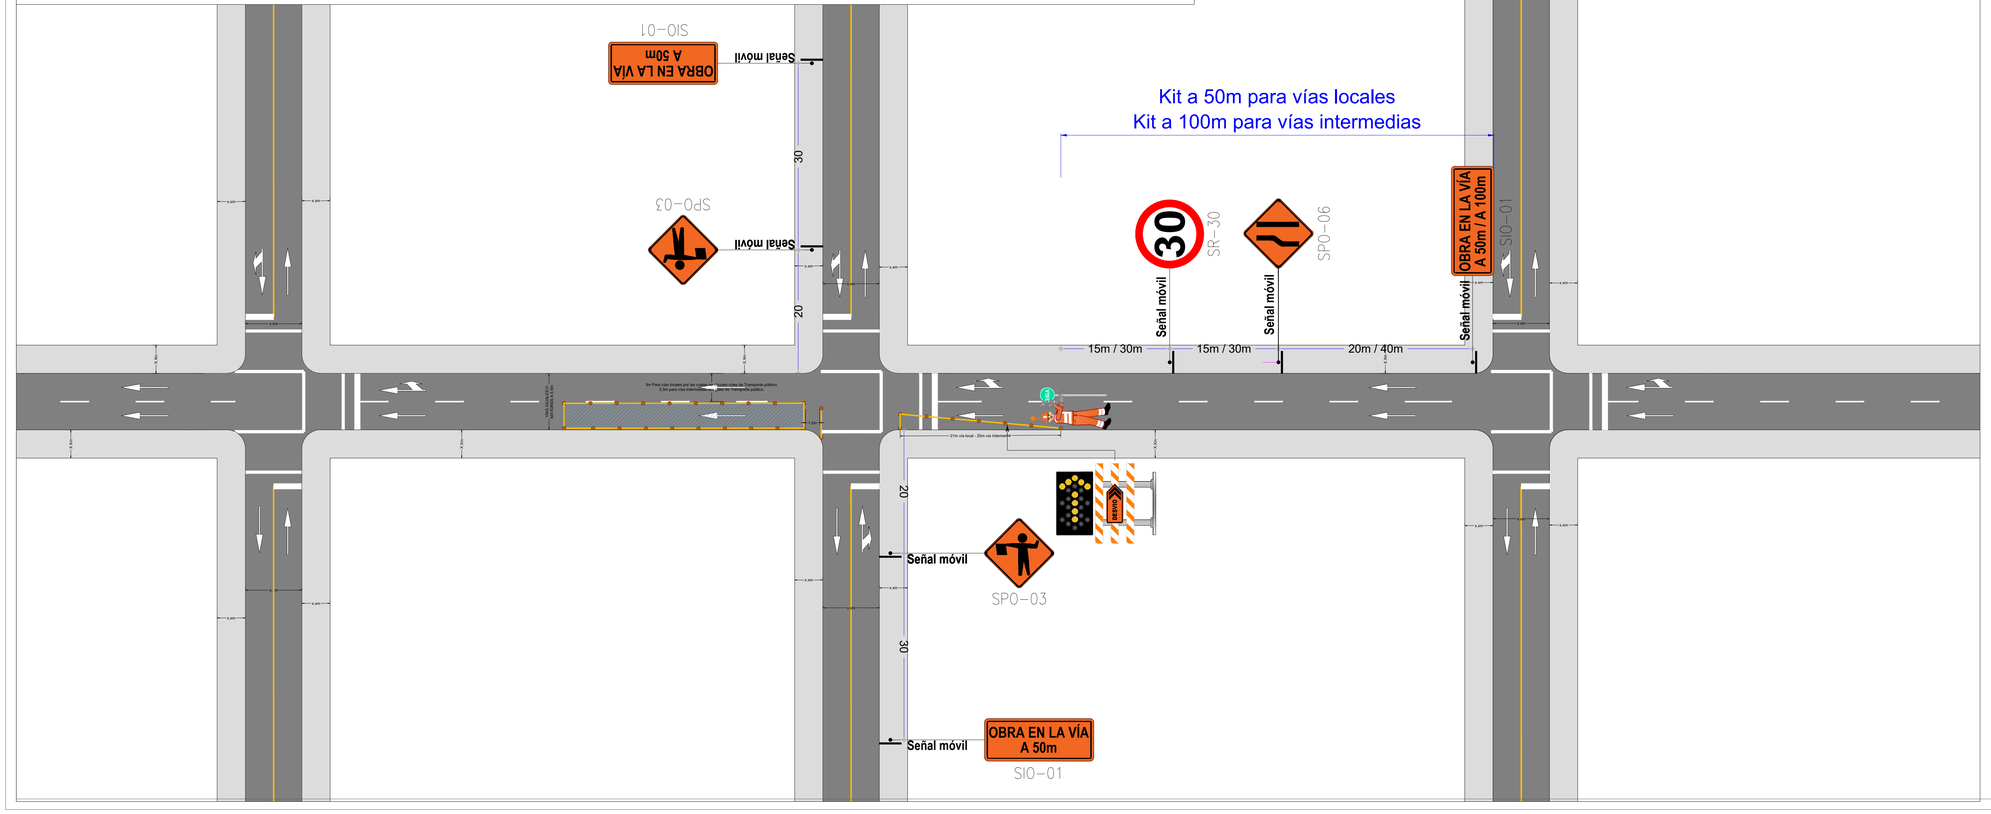

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 5

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SP0-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SP0-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SP0-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SP0-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0


FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA


PLANO 5 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) TRAMO EN T EN SU TOTALIDAD DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

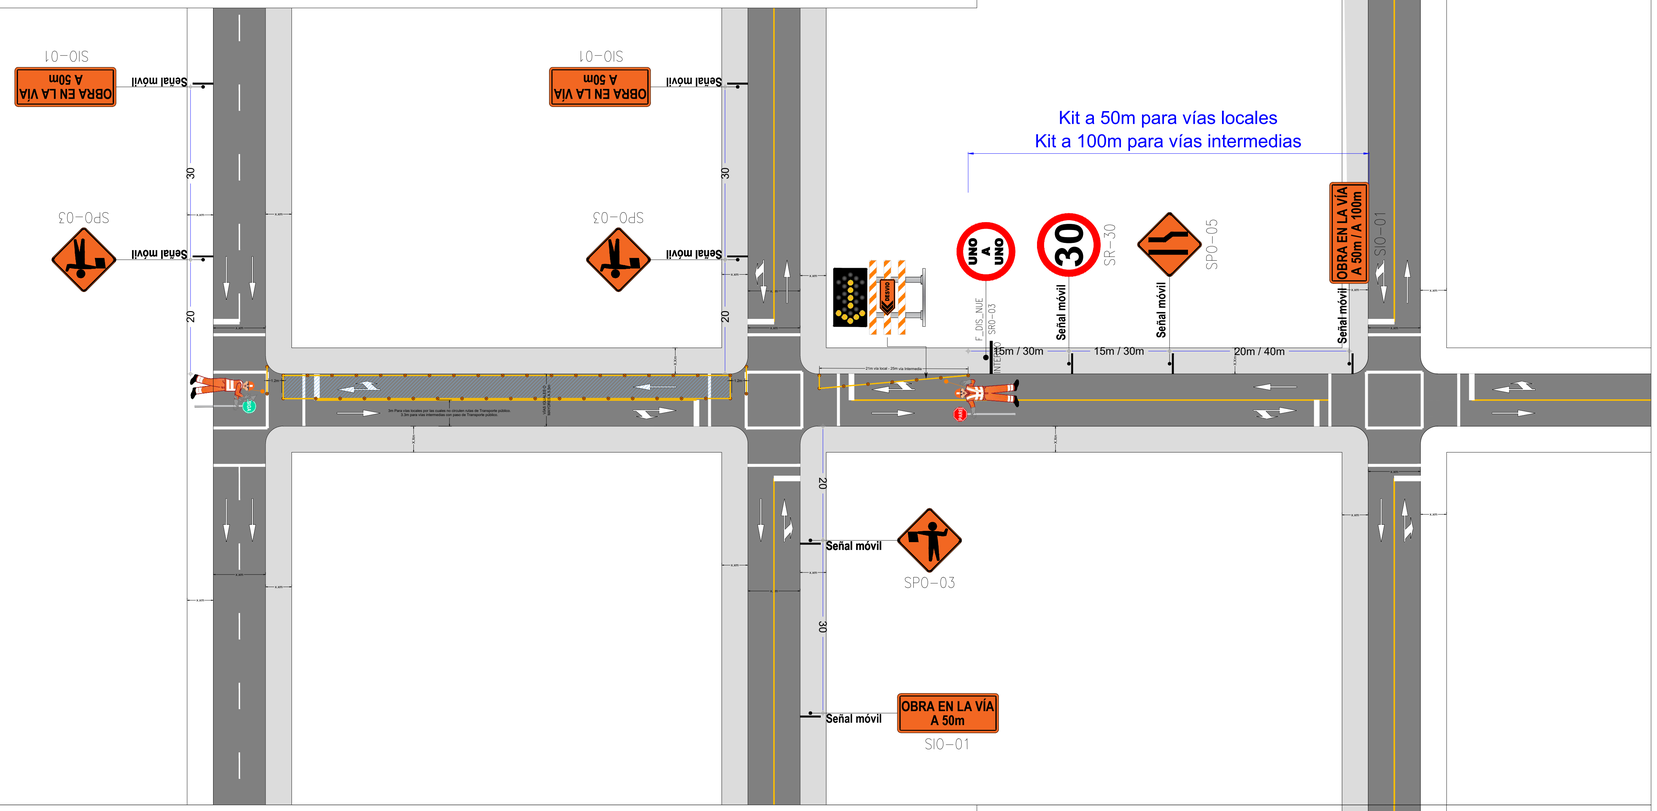

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) TRAMO EN T EN SU TOTALIDAD DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

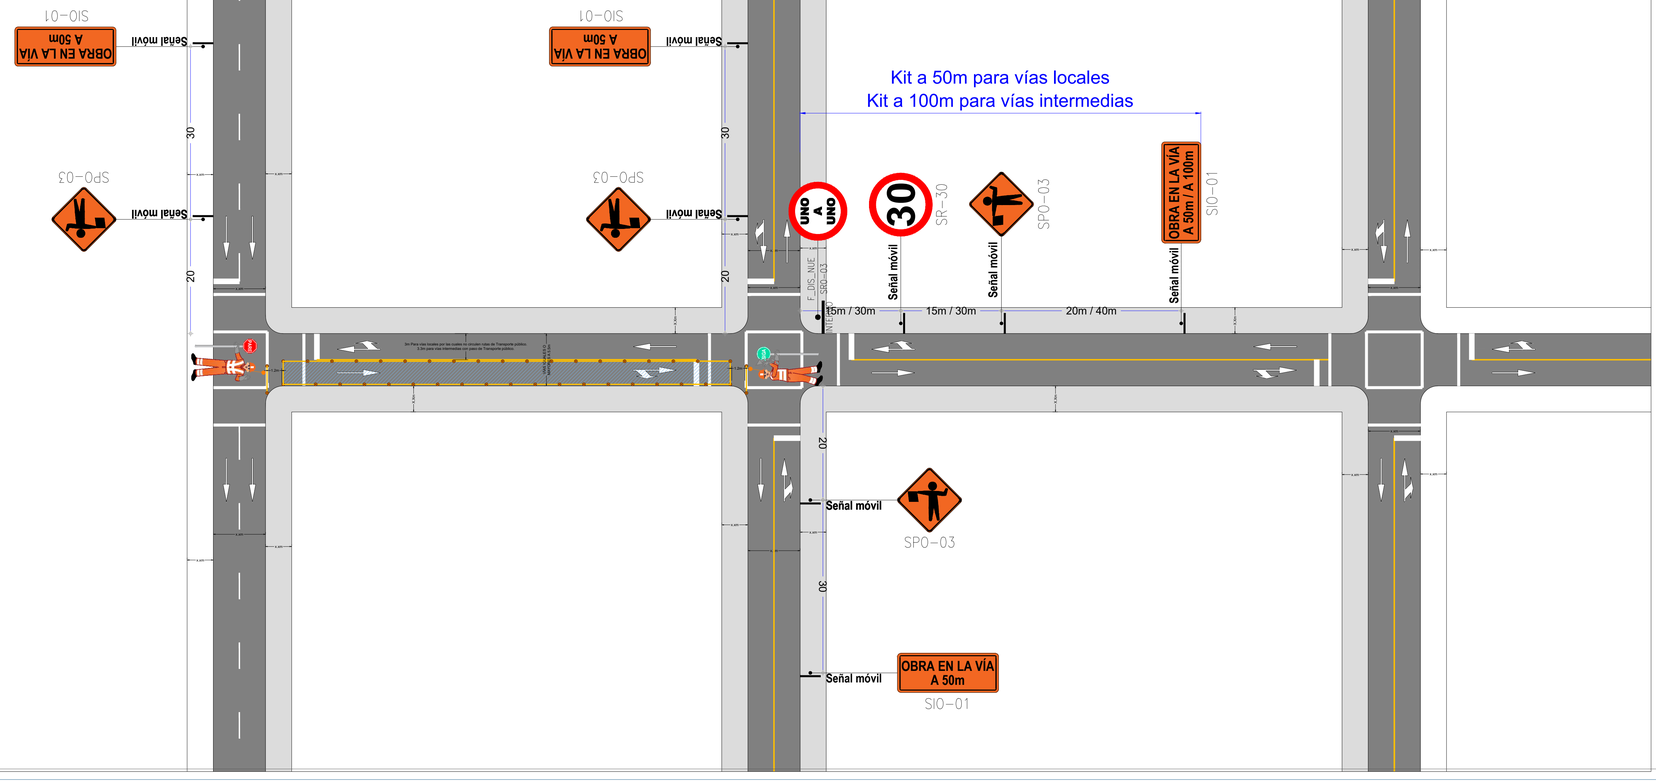

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 7

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES DE ACERO 1"	CONOS 90cm
PLAFONES EN MADERA	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0


FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA


PLANO 7 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL POR TRAMOS SOBRE UNA DOBLE CALZADA TRAMO EN T EN LA TOTALIDAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

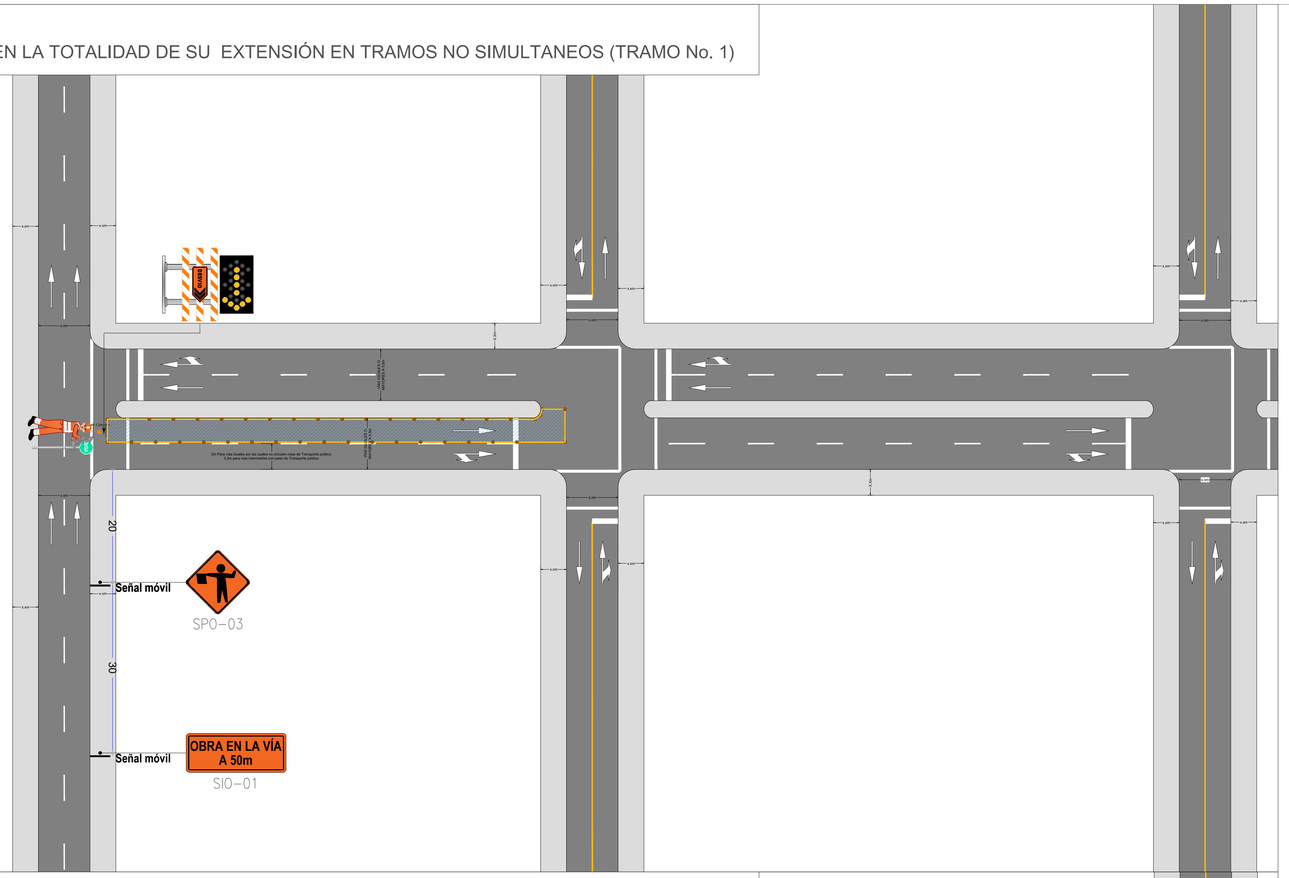

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL POR TRAMOS SOBRE UNA DOBLE CALZADA TRAMO EN T EN LA TOTALIDAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

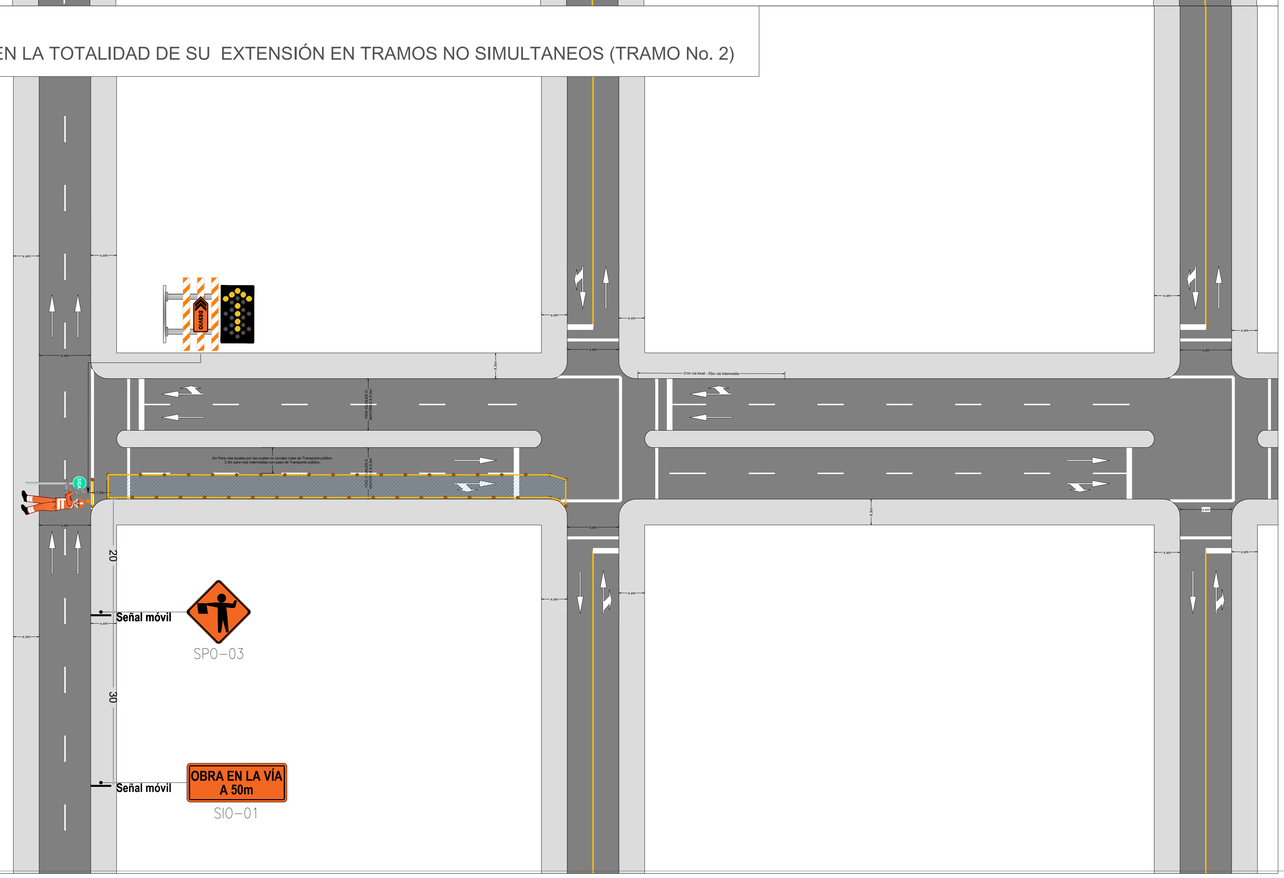

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 11

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES DE ACERO 1"	CONOS 90cm
PLAFONES EN MADERA	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA

PLANO 12 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA DE 3 CARRILES (UNIDIRECCIONAL) EN LA TOTALIDAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA DE 3 CARRILES (UNIDIRECCIONAL) EN LA TOTALIDAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

FASE No. 3:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA DE 3 CARRILES (UNIDIRECCIONAL) EN LA TOTALIDAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 3)



CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 16

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRANSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA

PLANO 17 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

COI No. 18
ABRIL 30 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO


No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
11991	12000809	N/A	CL 85A KR 49A	CL 85A AK 50	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	2-may-25	31-jul-25	07:00-17:00	24 HORAS	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION DE LAS INTERSECCIONES CL 85A POR KR 49A NI CL 85A POR AK 50. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA LA RESTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS EN EL CONTRAFLUJO. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALES DE CONTRAFLUJO DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZAN AFECTACIONES EN ANDENES. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201150132
11992	12000239	N/A	KR 58 CL 94B	KR 58 CL 94C	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	-	-	-	-	FDLBU-491-2024	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA, TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 28-ABR-25 DONDE MANIFIESTA "DESISTIR DEL TRAMITE".	NO	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201380392
11993	30000768	N/A	KR 51 DG 71BIS	KR 51 KR 52	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	2-may-25	17-may-25	07:00-17:00	24 HORAS	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 26-ABR-25 Y 01-MAY-25, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION PARA LA RESTITUCION DEL ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201395182
11994	1006498	N/A	AC 201 200m AL OCCIDENTE DE LA AK 7	N/A	CONSORCIO CC-P 7MA L3	-	-	-	-	IDU-1740-2023	LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 29-24 NUMERAL 22509, PMT PARA PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS QUE PERMITIRAN REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PATIO PORTAL DEL CORREDOR VERDE DE LA 7MA LOTE 3. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO SDM - 202561201399482 DEL 25-ABR-25.	TERMINADO	USAQUEN	ALVARO CAÑON D.	202561201399482

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

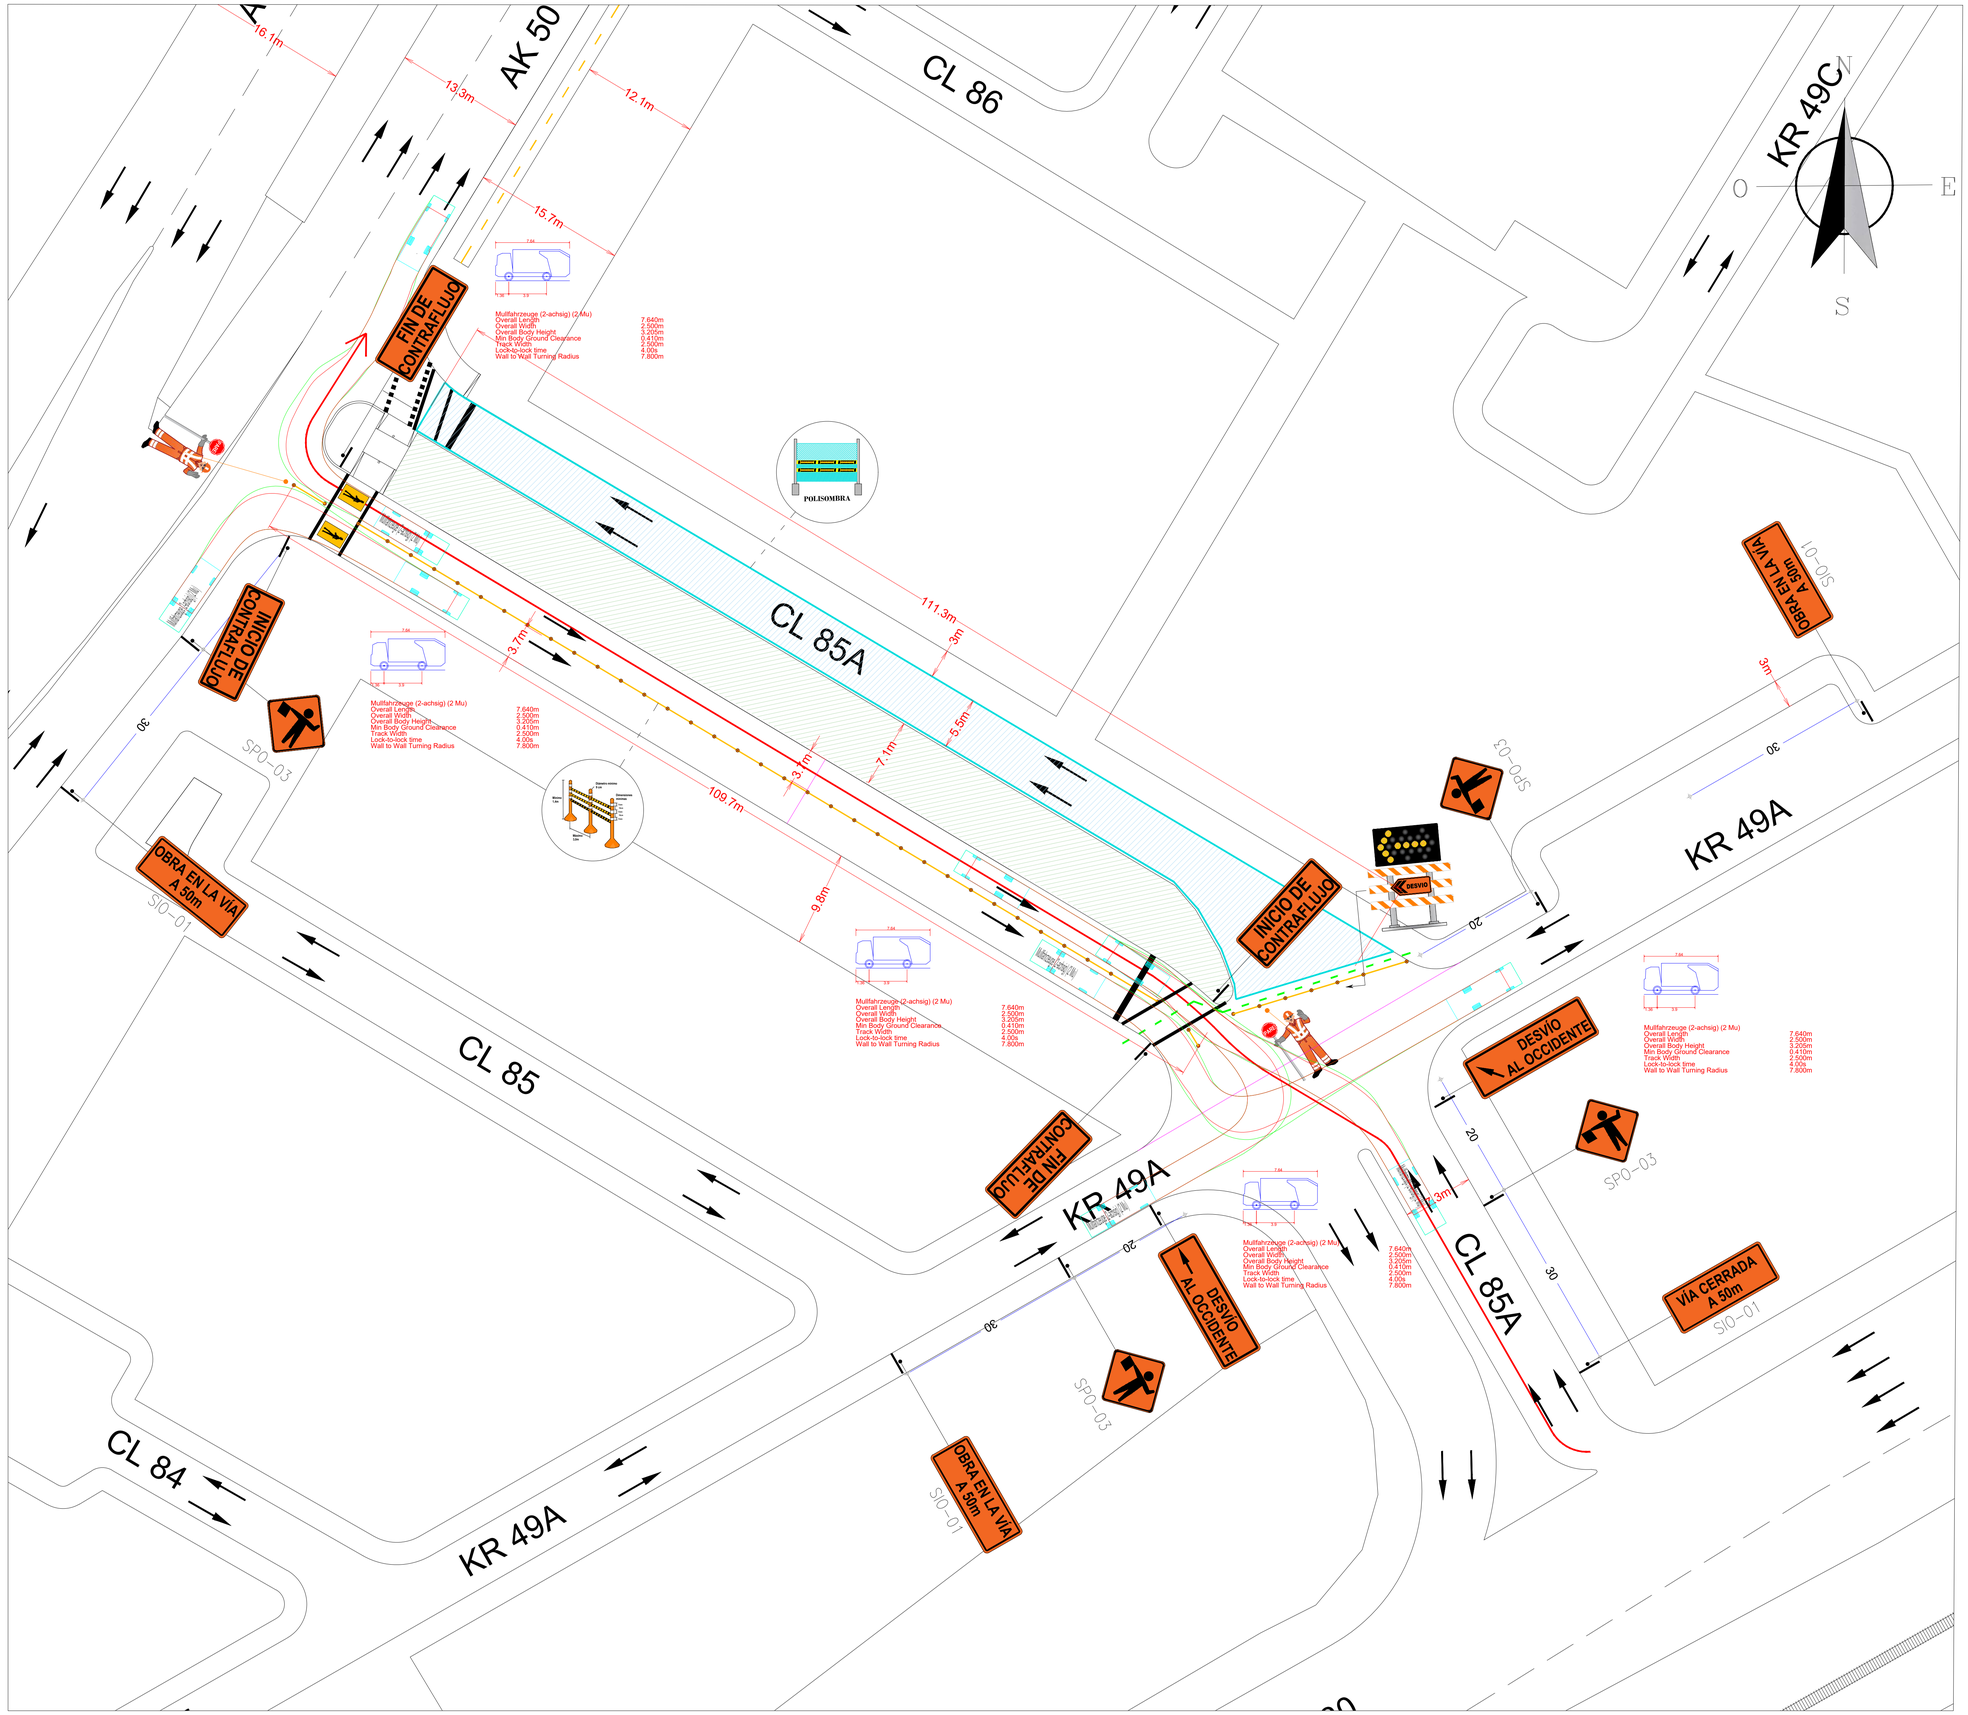

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. CL 85A ENTRE KR 49A Y AK 50
CIV: 12000809

COSTADO: CALZADA NORTE (TOTAL)

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES DE ACERO 1"	CONOS 90cm
PLAFONES EN MADERA	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

COI No. 18
ABRIL 30 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO


No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
11991	12000809	N/A	CL 85A KR 49A	CL 85A AK 50	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	2-may-25	31-jul-25	07:00-17:00	24 HORAS	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION DE LAS INTERSECCIONES CL 85A POR KR 49A NI CL 85A POR AK 50. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA LA RESTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS EN EL CONTRAFLUJO. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALES DE CONTRAFLUJO DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZAN AFECTACIONES EN ANDENES. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201150132
11992	12000239	N/A	KR 58 CL 94B	KR 58 CL 94C	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	-	-	-	-	FDLBU-491-2024	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA, TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 28-ABR-25 DONDE MANIFIESTA "DESISTIR DEL TRAMITE".	NO	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201380392
11993	30000768	N/A	KR 51 DG 71BIS	KR 51 KR 52	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	2-may-25	17-may-25	07:00-17:00	24 HORAS	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 26-ABR-25 Y 01-MAY-25, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION PARA LA RESTITUCION DEL ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201395182
11994	1006498	N/A	AC 201 200m AL OCCIDENTE DE LA AK 7	N/A	CONSORCIO CC-P 7MA L3	-	-	-	-	IDU-1740-2023	LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 29-24 NUMERAL 22509, PMT PARA PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS QUE PERMITIRAN REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PATIO PORTAL DEL CORREDOR VERDE DE LA 7MA LOTE 3. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO SDM - 202561201399482 DEL 25-ABR-25.	TERMINADO	USAQUEN	ALVARO CAÑON D.	202561201399482

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

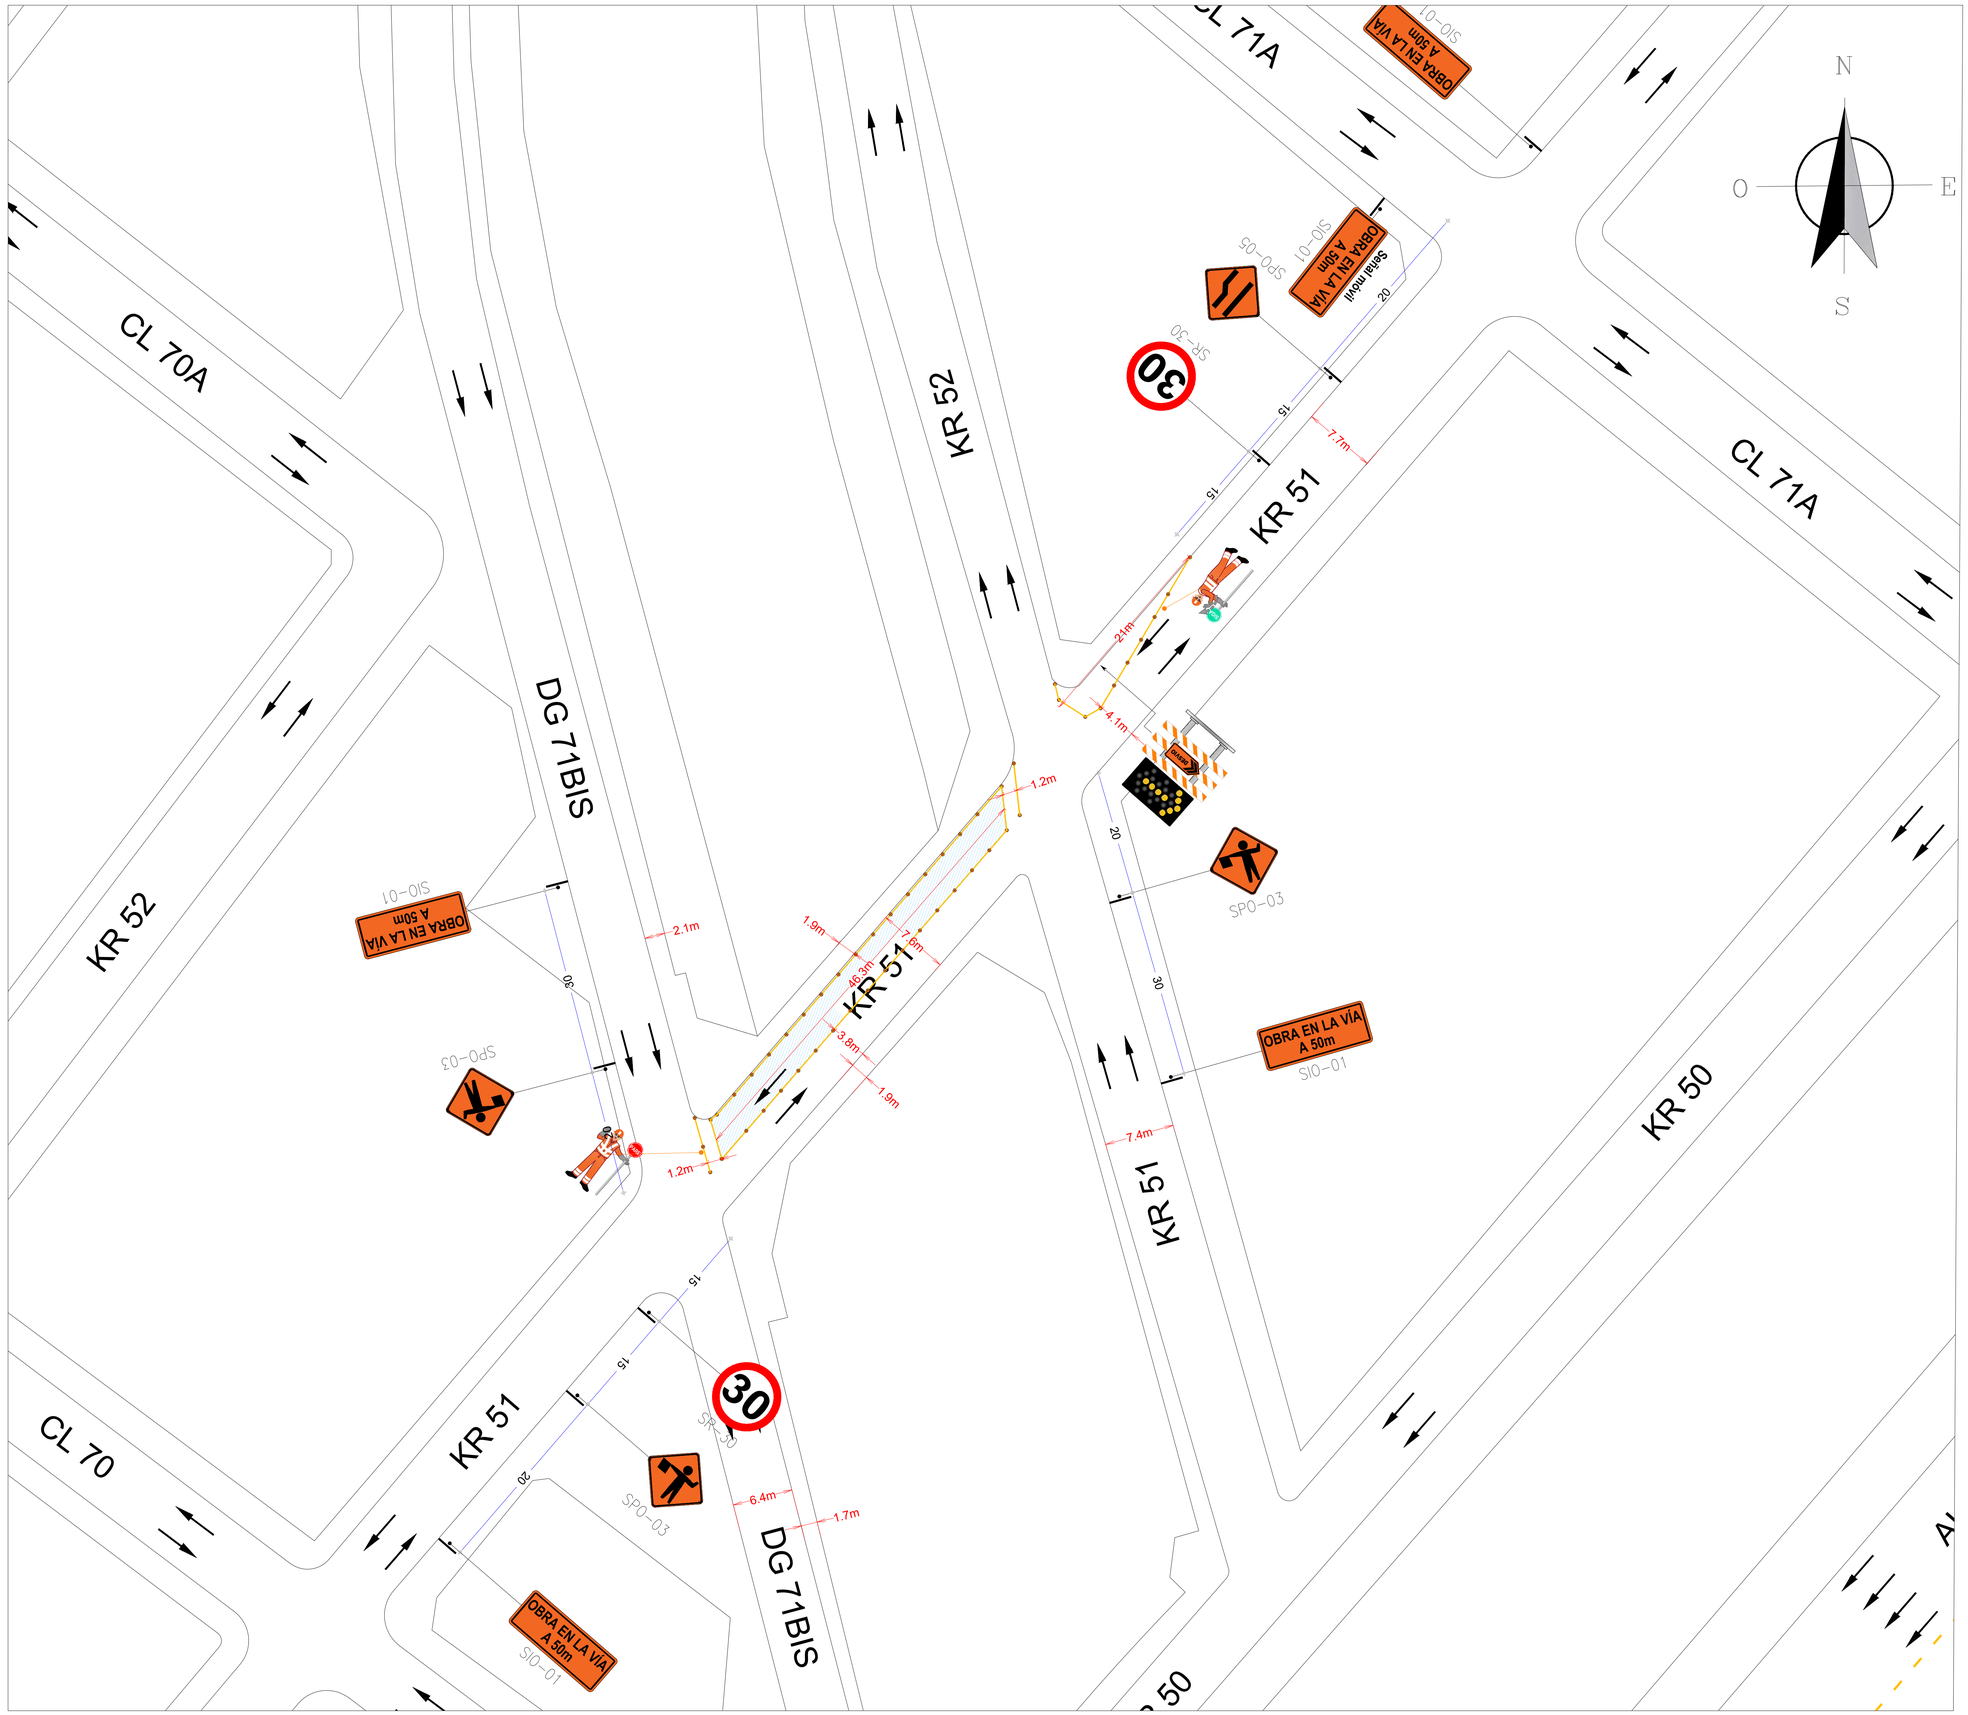

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. DG 71BIS ENTRE KR 50 Y KR 51

CIV: 30000767

COSTADO: OCCIDENTE

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES DE ACERO 1"	CONOS 90cm
PLAFONES EN MADERA	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas


ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 02 DE ABRIL DE 2025

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN
DE CALLES Y CARRETERAS
AFECTADAS POR OBRAS

PLANO 1 DE 2

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

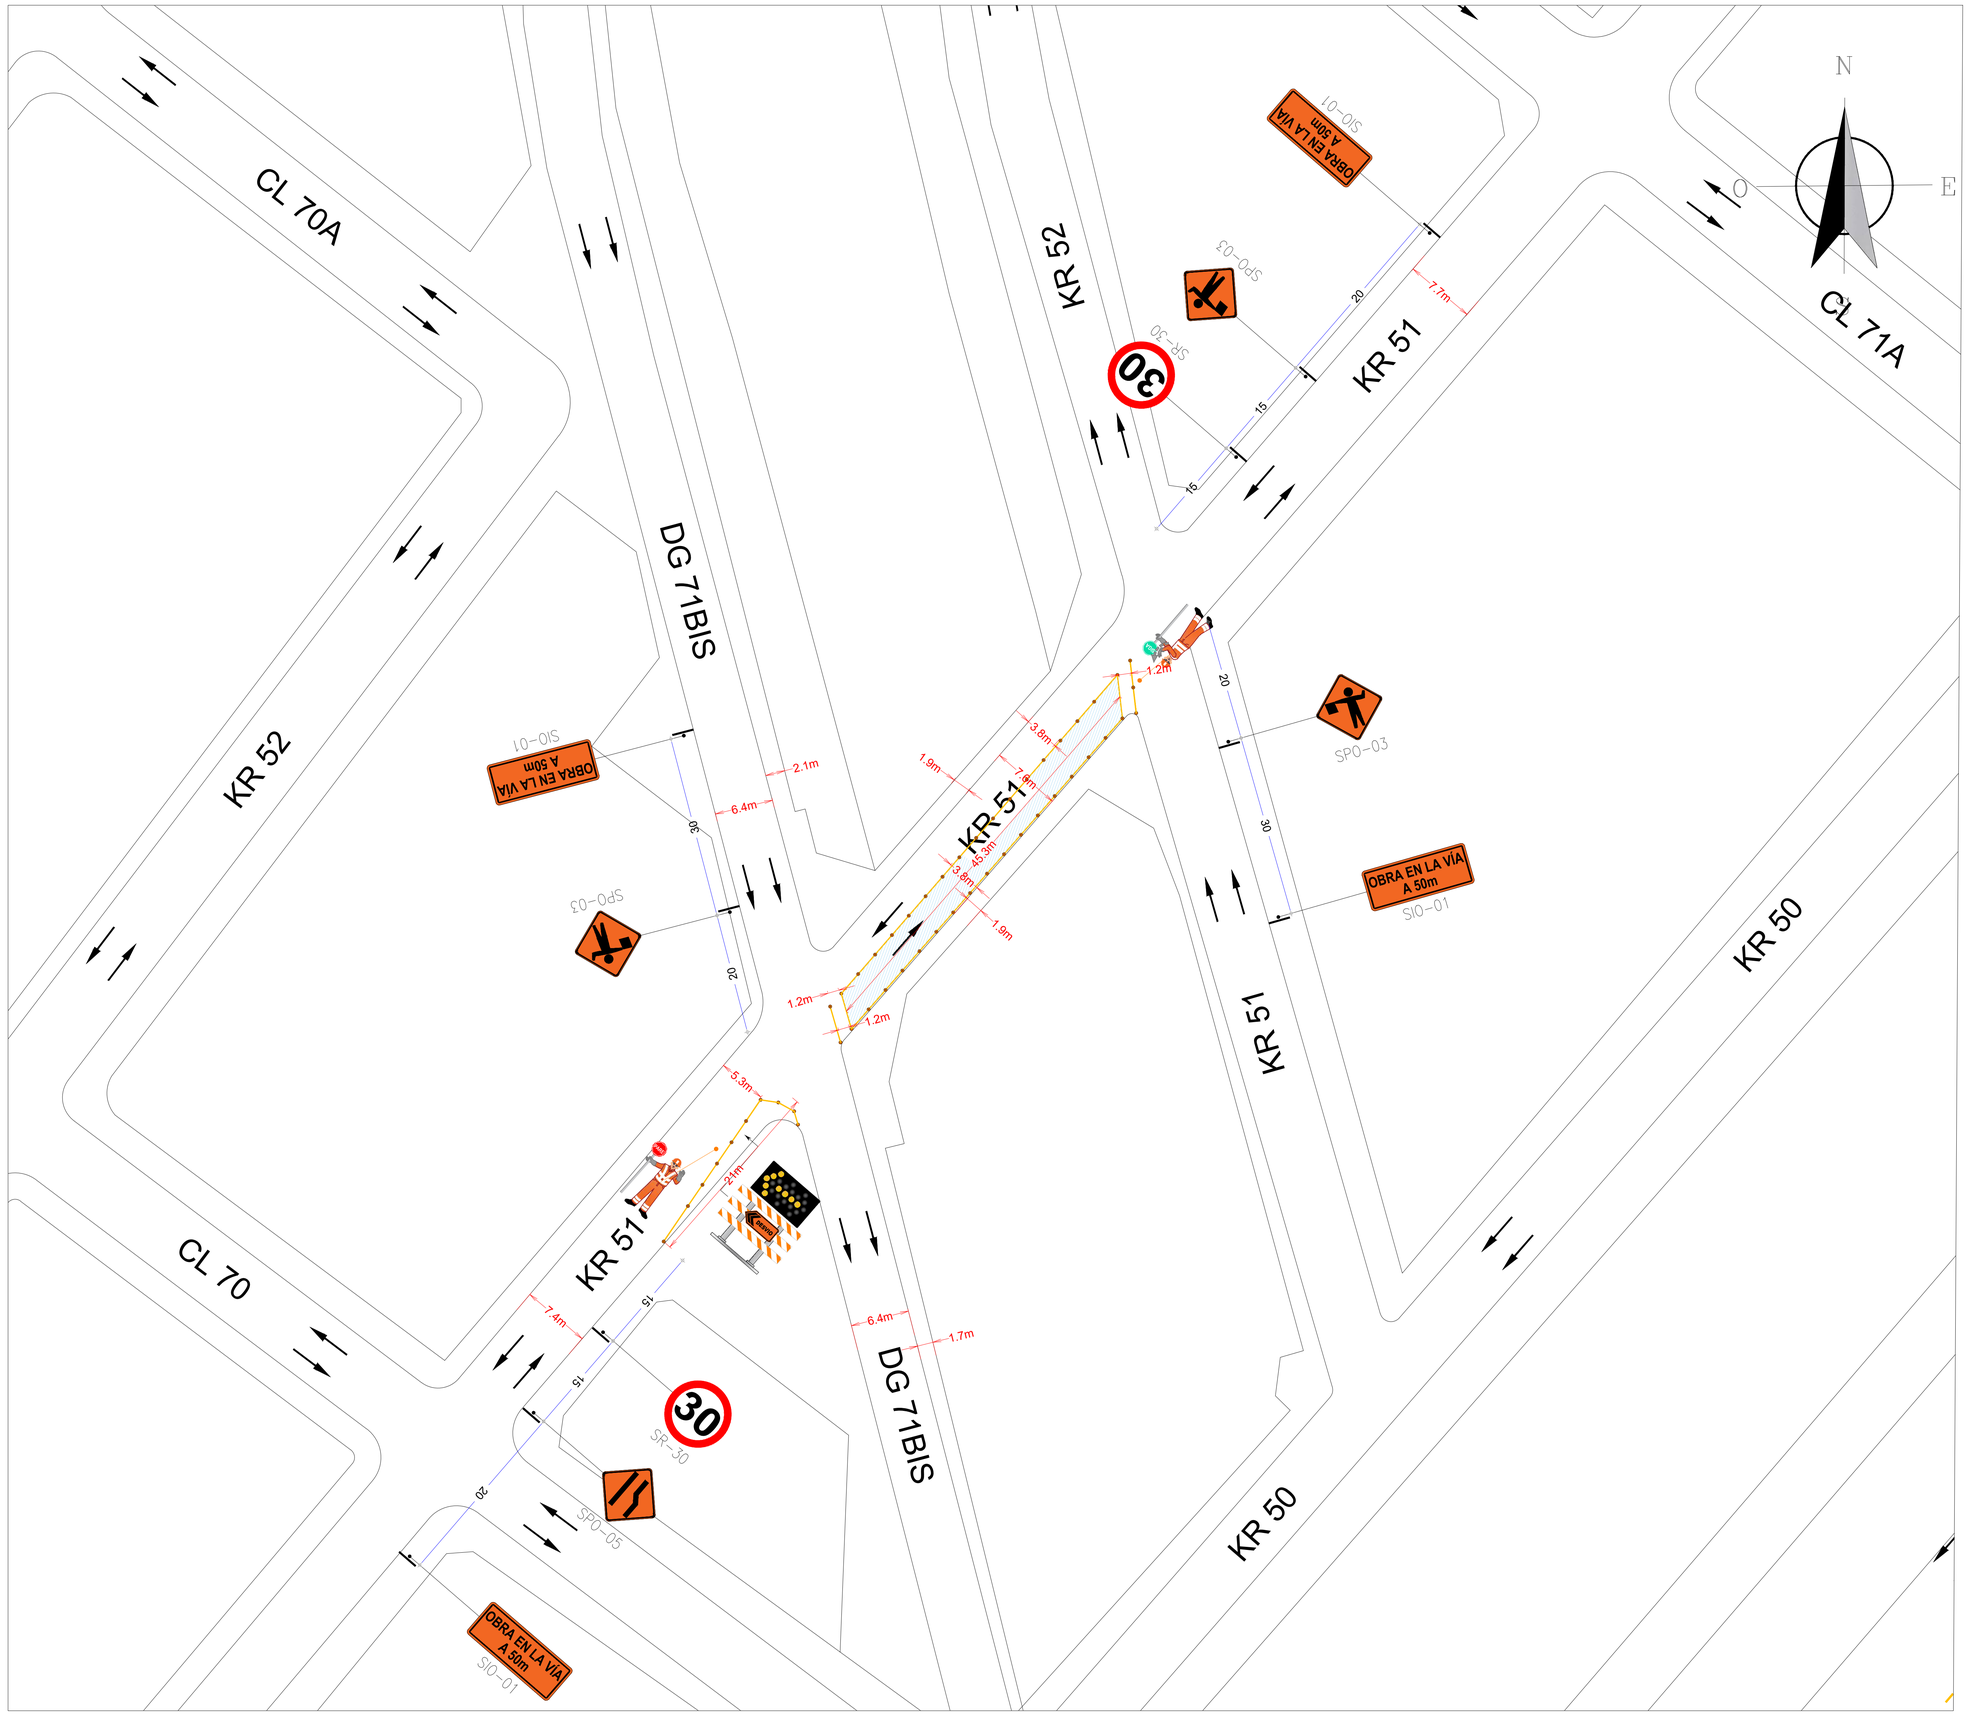

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. DG 71BIS ENTRE KR 50 Y KR 51

CIV: 30000767

COSTADO: ORIENTE

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 02 DE ABRIL DE 2025

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN
DE CALLES Y CARRETERAS
AFECTADAS POR OBRAS

PLANO 2 DE 2

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

COI No. 19
MAYO 08 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
12627	12000239	N/A	KR 58 CL 94B	KR 58 CL 94C	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	9-may-25	30-may-25	07:00-17:00	24 HORAS	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION DE LAS INTERSECCIONES. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA LA RESTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	20256120144092 2
12628	30000241	N/A	CL 59 SUR (AV BOSA) 18m AL ORIENTE DE LA KR 77I	CL 59 SUR (AV BOSA) 75m AL ORIENTE DE LA KR 77I	CONSORCIO CC INTERSECCION AV BOSA	9-may-25	7-ago-25	24 HORAS	24 HORAS	IDU-1013-2022	NOTAS. 1. REALIZAR Y/O ACTUALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE OBRAS CON CONTRATISTAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO. 2. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 3. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO INICIO OBRAS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO DEL SEPARADOR CENTRAL (ZONA VERDE) PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE CICLORUTA PLANO 1 – PRELIMINARES. NO SE AUTORIZA CIERRE DE CICLORUTA. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE VOLQUETAS DEBEN ESTAR SEÑALIZADAS (EN EL ACCESO Y A 50M LOCALIZADAS DE FORMA SEGURA). GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO SUFICIENTES PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y CICLOUSUARIOS DURANTE TODAS LAS MANIOBRAS A REALIZAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL CIERRE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES UNICAMENTE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA. 7. INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM TODO EL TIEMPO.	SI	BOSA	GERMAN A. MARTINEZ I.	20256120138670 2

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.


A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

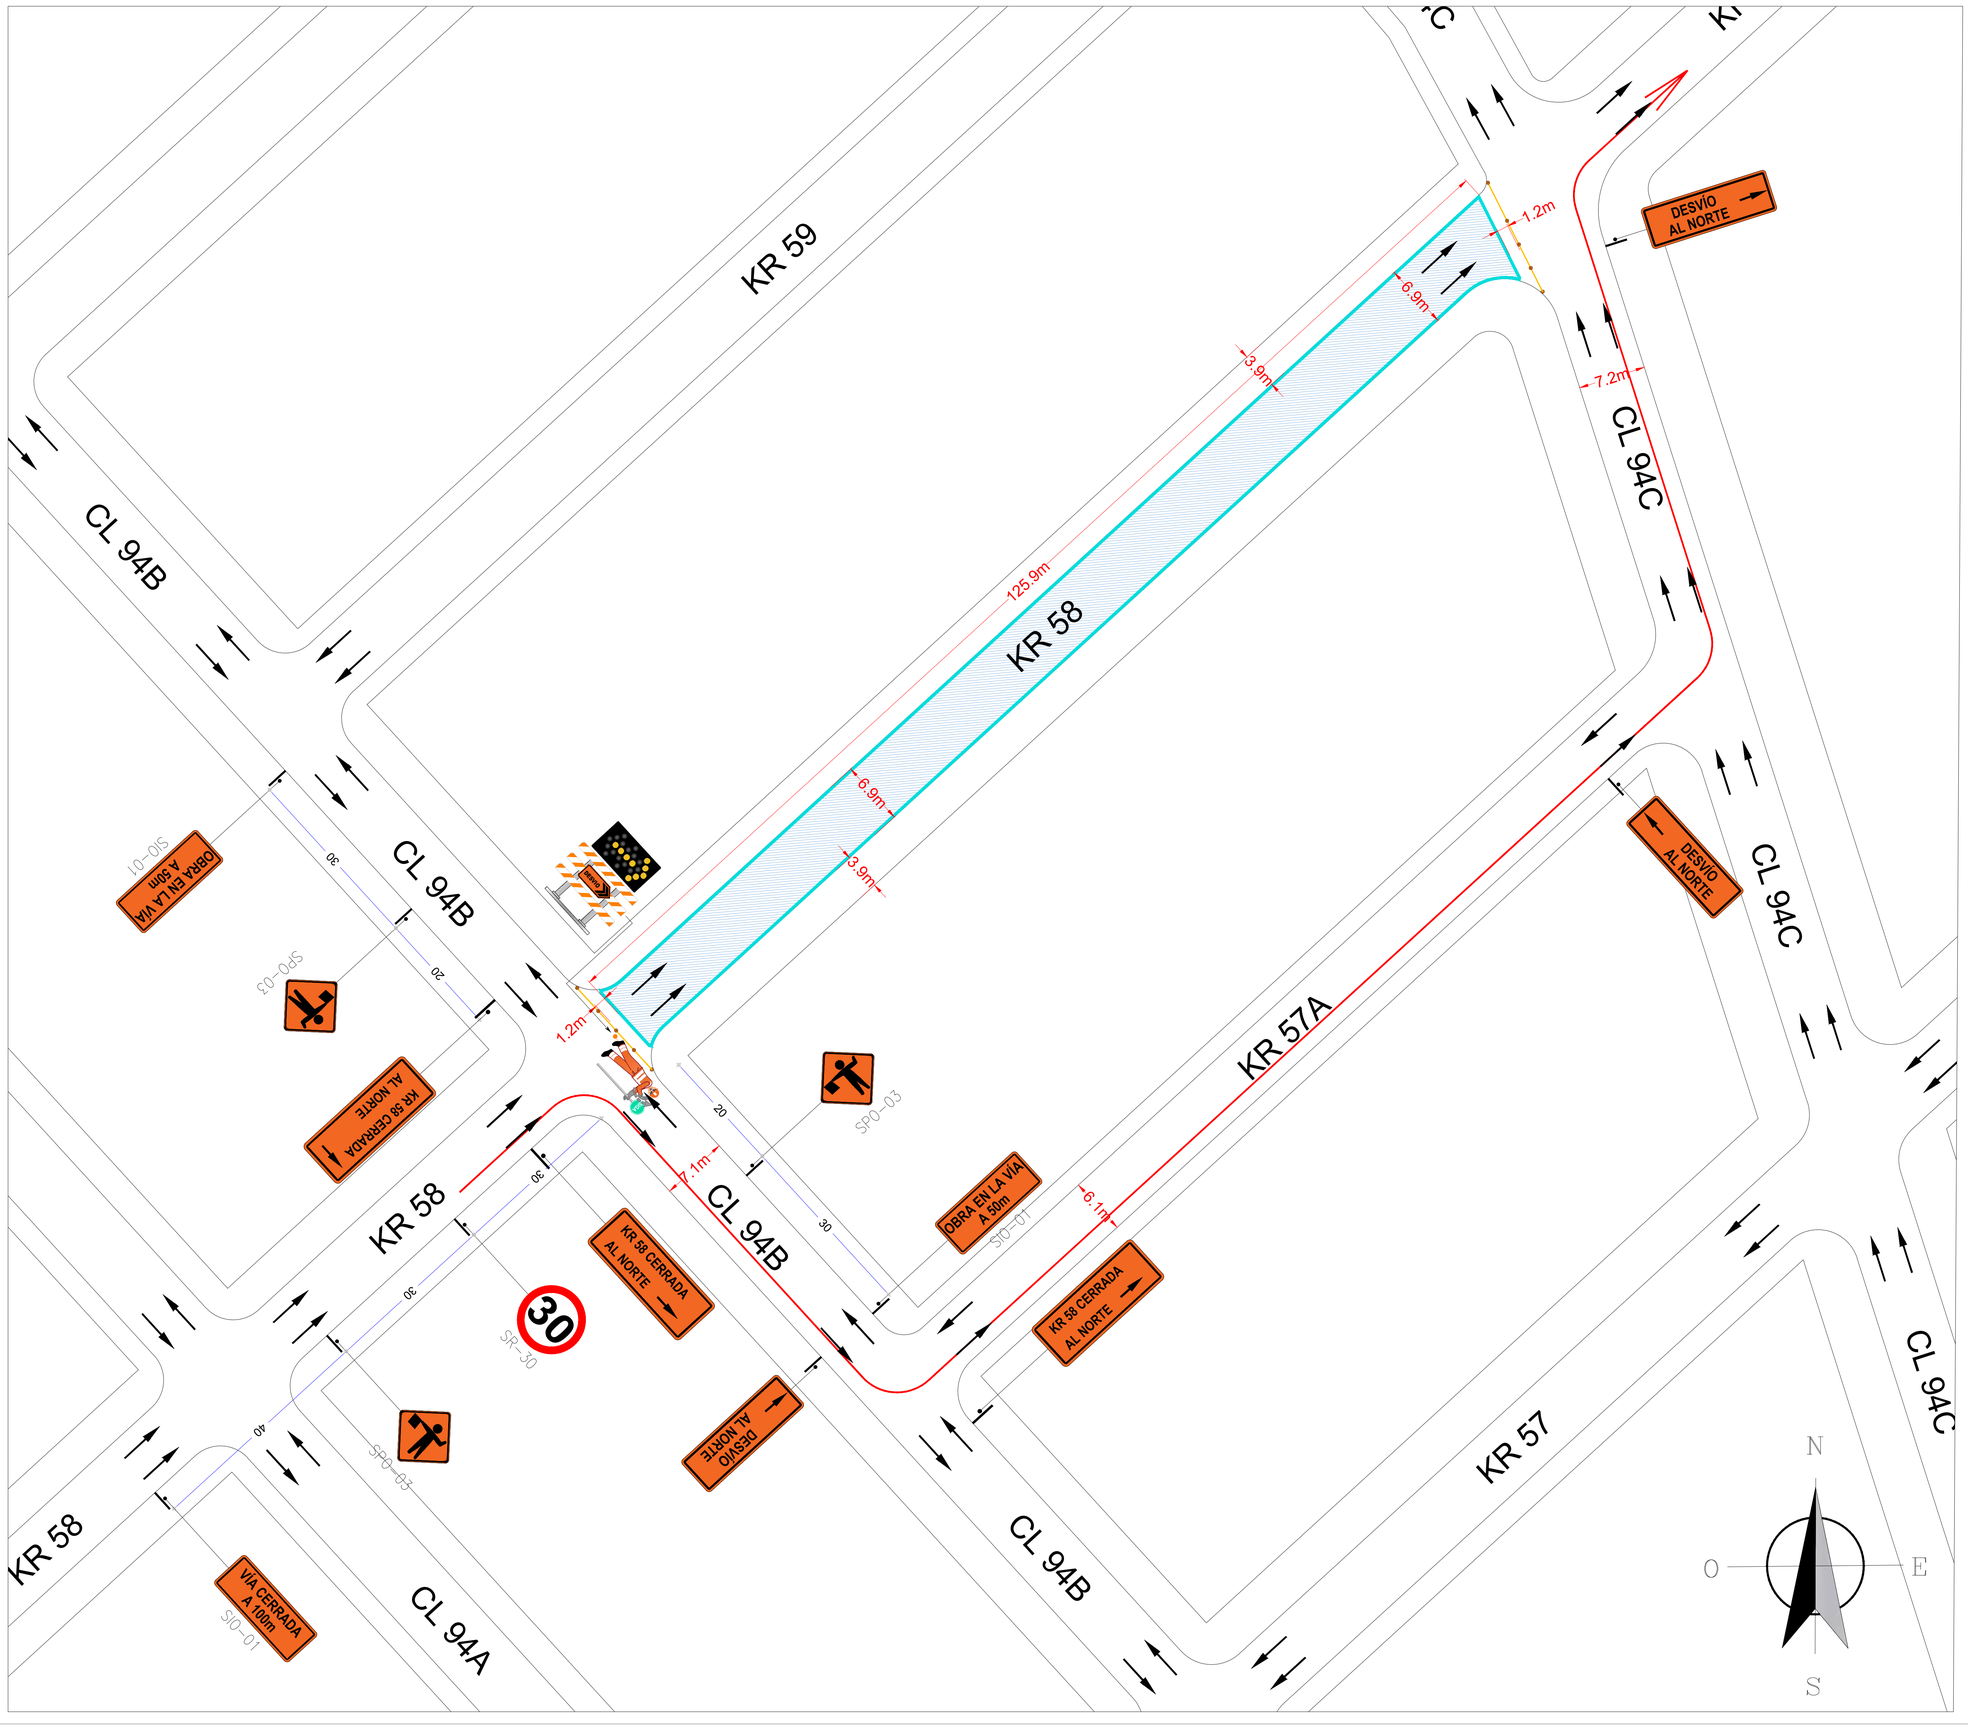

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. KR 58 ENTRE CL 94B Y CL 94C

CIV: 12000239

COSTADO: DOS COSTADOS (TOTAL)

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES DE ACERO 1"	CONOS 90cm
PLAFONES EN MADERA	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

COI No. 20
MAYO 15 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
13351	11001824	N/A	CL 152 15m AL ORIENTE DE LA AV CIUDAD DE CALI (AK 104)	CL 152 55m AL ORIENTE DE LA AV CIUDAD DE CALI (AK 104)	CONSORCIO BYR-SG	20-may-25	14-ago-25	24 HORAS	24 HORAS	IDU-1660-2024	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE BAHIA (COSTADO NORTE) PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO TEMPORAL DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA COMO COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O RUTINARIO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES O ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.	SI	SUBA	MARIA C. GALINDO Q.	202561201565642
13352	12000850	N/A	KR 21 CL 87	KR 21 CL 89	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	16-may-25	6-jun-25	07:00-17:00	07:00-17:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (07:00-17:00 HORAS). 3. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN LAS INTERSECCIONES KR 21 POR CL 87 NI KR 21 POR CL 89. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION PARA LA RESTITUCION DEL ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201478942

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 20
MAYO 15 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
13353	12000741	N/A	KR 22 CL 88	KR 22 CL 89	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	16-may-25	6-jun-25	22:00-05:00	22:00-05:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (22:00-05:00 HORAS). 3. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN LAS INTERSECCIONES KR 22 POR CL 88 NI KR 22 POR CL 89. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION PARA LA RESTITUCION DEL ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201478942
13354	12001510	N/A	KR 21 CL 82	KR 21 49m AL SUR	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	16-may-25	6-jun-25	07:00-17:00	07:00-17:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (07:00-17:00 HORAS). 3. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN LA INTERSECCION KR 21 POR CL 82. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION PARA LA RESTITUCION DEL ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201478942

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 20
MAYO 15 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
13355	12001409	N/A	KR 21 CL 83	KR 21 51m AL SUR	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	16-may-25	6-jun-25	07:00-17:00	07:00-17:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (07:00-17:00 HORAS). 3. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN LA INTERSECCION KR 21 POR CL 83. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION PARA LA RESTITUCION DEL ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201478942
13356	12000922	N/A	CL 86A KR 23	CL 86A AK 24	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	16-may-25	6-jun-25	22:00-05:00	22:00-05:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (22:00-05:00 HORAS). 3. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN LAS INTERSECCIONES CL 86A POR KR 23 NI CL 86A POR AK 24. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION PARA LA RESTITUCION DEL ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201478942

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 20
MAYO 15 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
13357	12001383	N/A	KR 27 CL 82	KR 27 CL 83BIS	CONSORCIO BYR-SG-BU 001	16-may-25	6-jun-25	07:00-17:00	07:00-17:00	FDLBU-491-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SOLICITADO (07:00-17:00 HORAS). 3. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN LA INTERSECCION KR 27 POR CL 82 NI KR 27 POR CL 83BIS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION PARA LA RESTITUCION DEL ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	BARRIOS UNIDOS	ANGELICA M. ROZO M.	202561201478942
13358	19007768	19007722	KR 18RBIS CL 69C SUR	KR 18RBIS DG 69B SUR	CONSORCIO CAPITAL	16-may-25	14-ago-25	06:00-18:00	24 HORAS	FDLCB-759-2023	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 25-ABR-25 Y 15-MAY-25, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDENES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE CALZADA Y ANDENES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN UNICAMENTE AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, COMODOS Y SEGUROS, ESTO INCLUYE DE SER NECESARIO LA IMPLEMENTACION DE RAMPAS Y/O ESCALERAS CON BARANDAS QUE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PEATONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VELANDIA S.	202561201548792

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.


B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.


Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) EN TRAMOS DE 1m A 10m DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

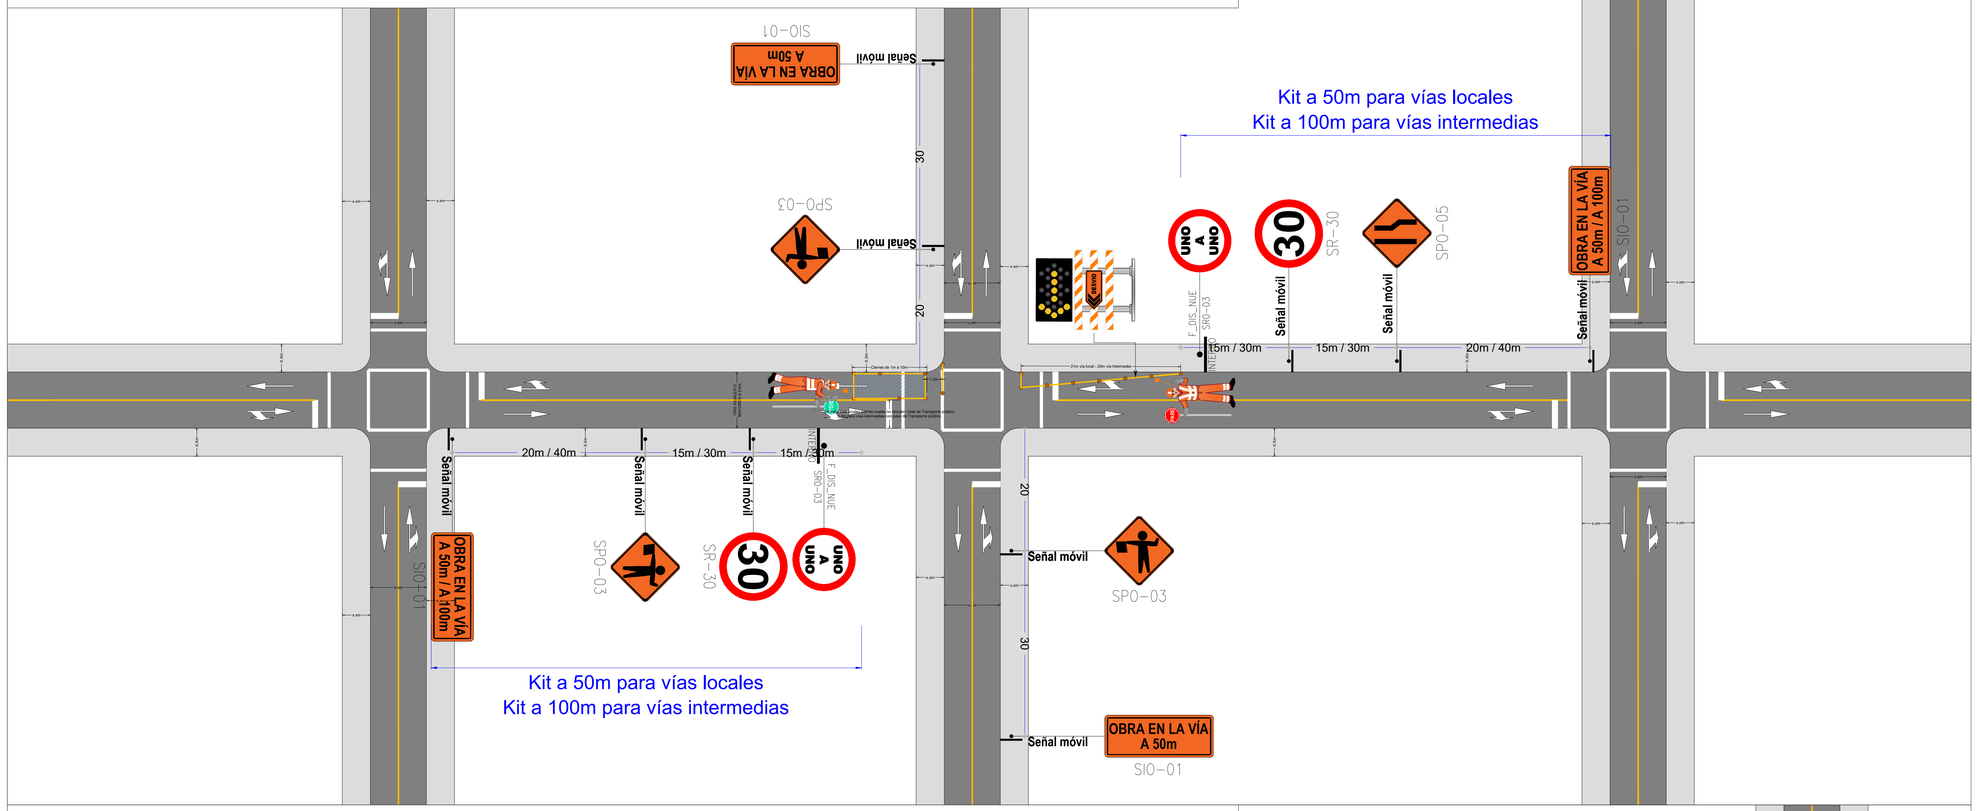

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) EN TRAMOS DE 1m A 10m DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

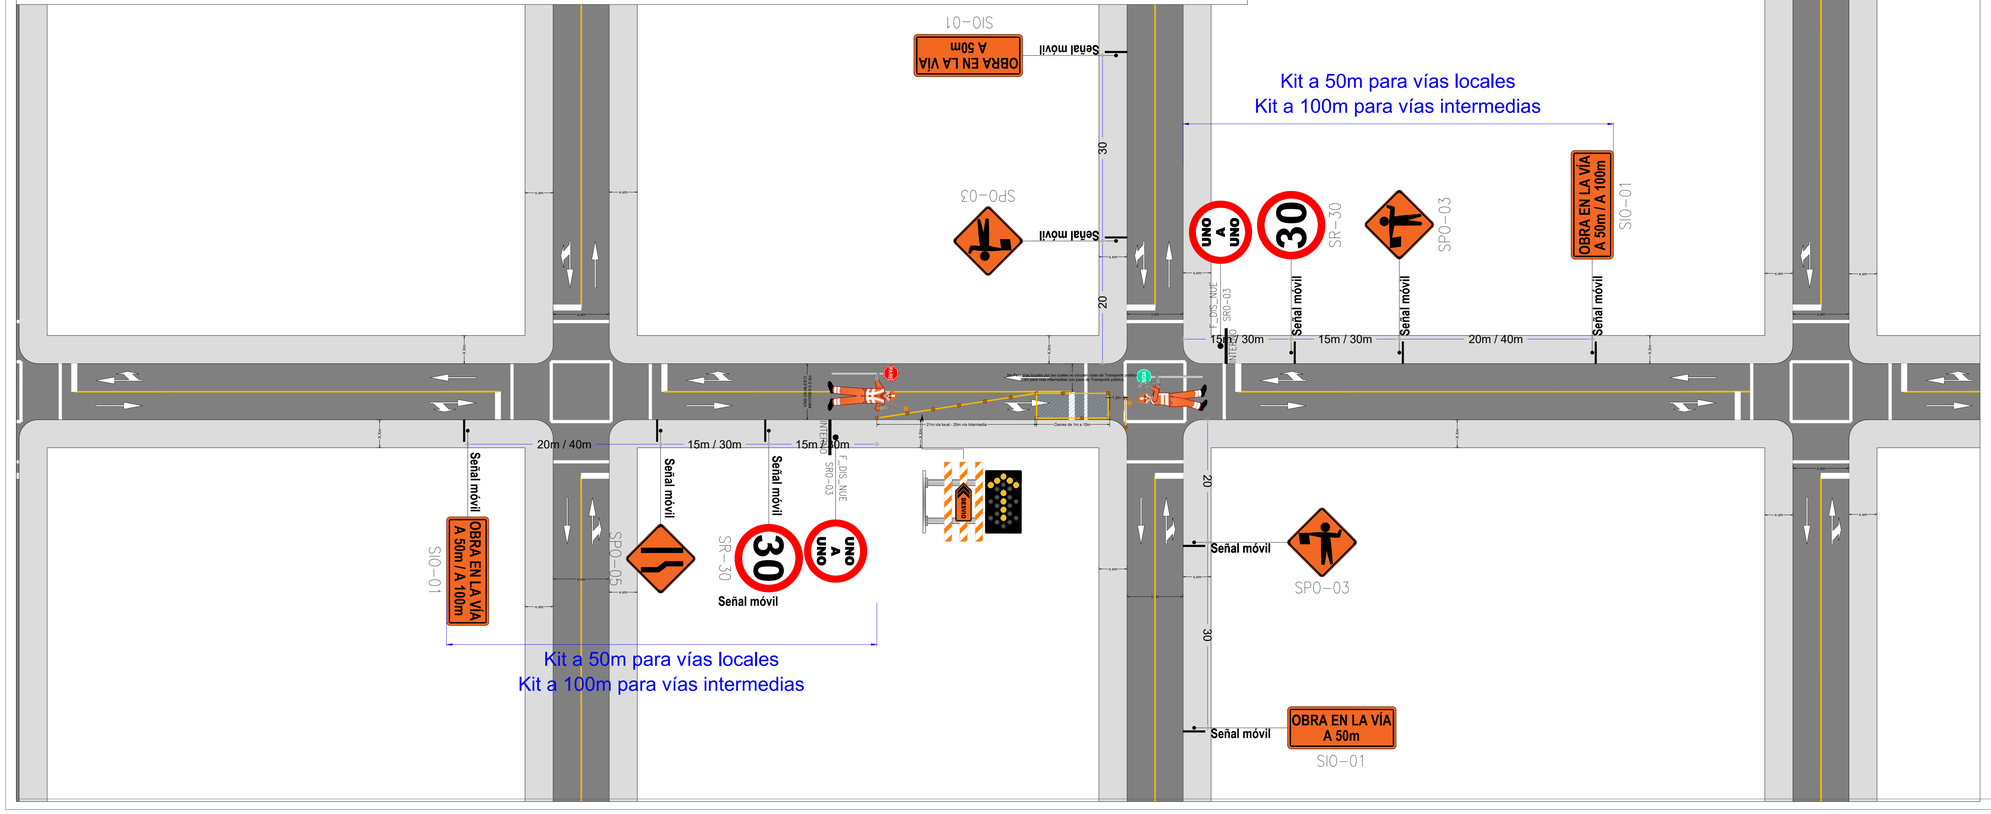

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 3

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA
BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS
FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1"
PLAFONES EN MADERA
CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS
DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA
BARRERAS PLÁSTICAS
INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SI0-01
PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SI0-01
SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SI0-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SI0-04
PEATONES — PEATONES SI0-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SI0-04
TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS
PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SP0-01
CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SP0-03
AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SP0-05
SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SP0-06
BICI-USUARIOS
BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30
CONSERVE LA DERECHA SR0-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0


FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS POR OBRAS


PLANO 3 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) TRAMO EN T EN SU TOTALIDAD DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

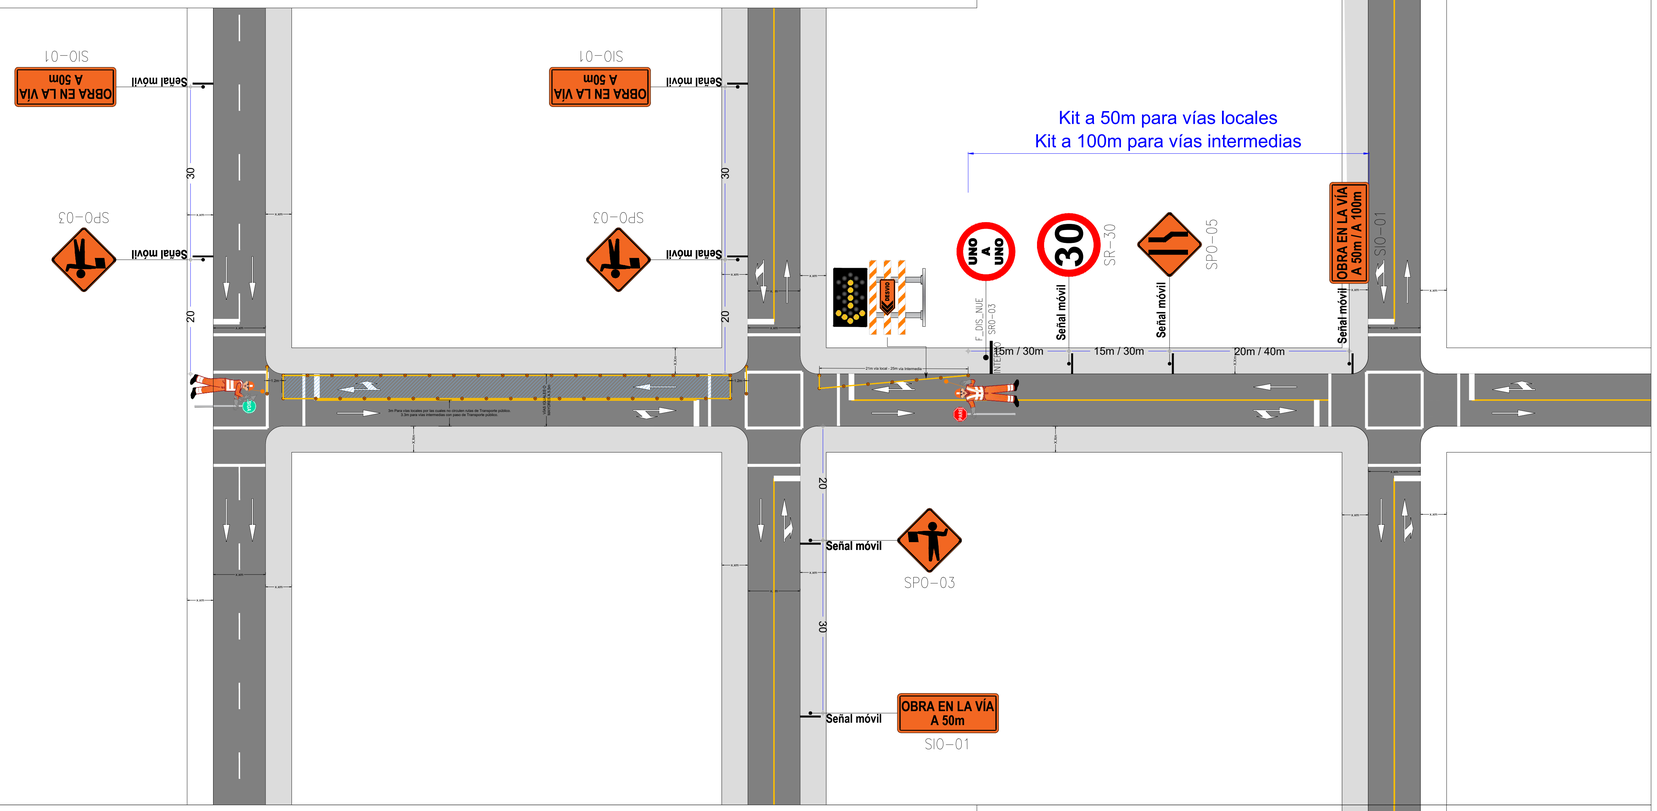

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) TRAMO EN T EN SU TOTALIDAD DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

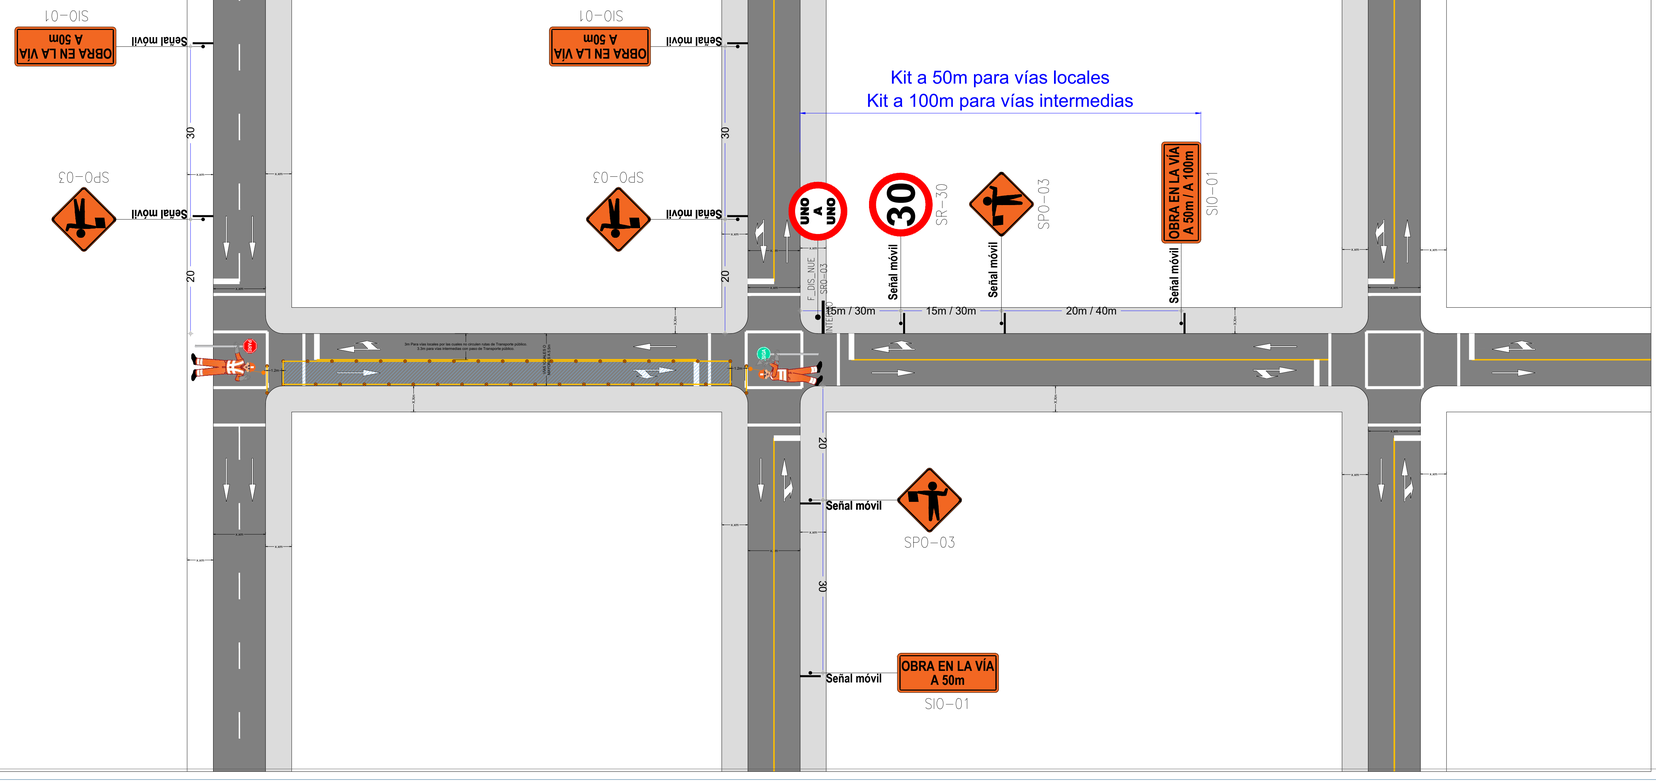

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 7

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES DE ACERO 1"	CONOS 90cm
PLAFONES EN MADERA	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0


FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA


PLANO 7 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) TRAMO EN T EN LA MITAD DE SU DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

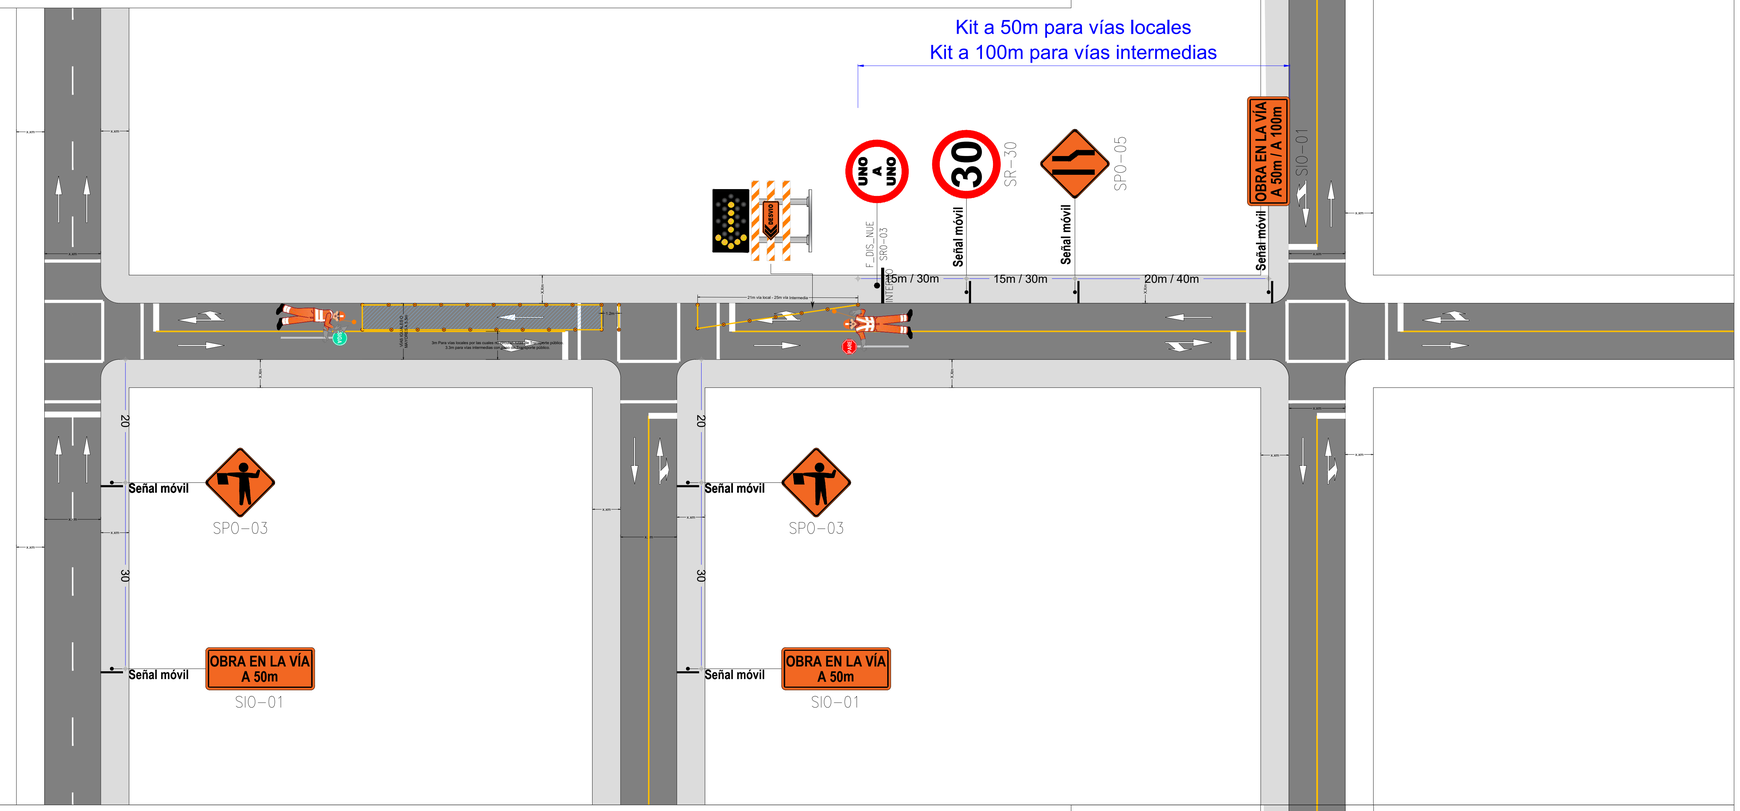

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) TRAMO EN T EN LA MITAD DE SU DE EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

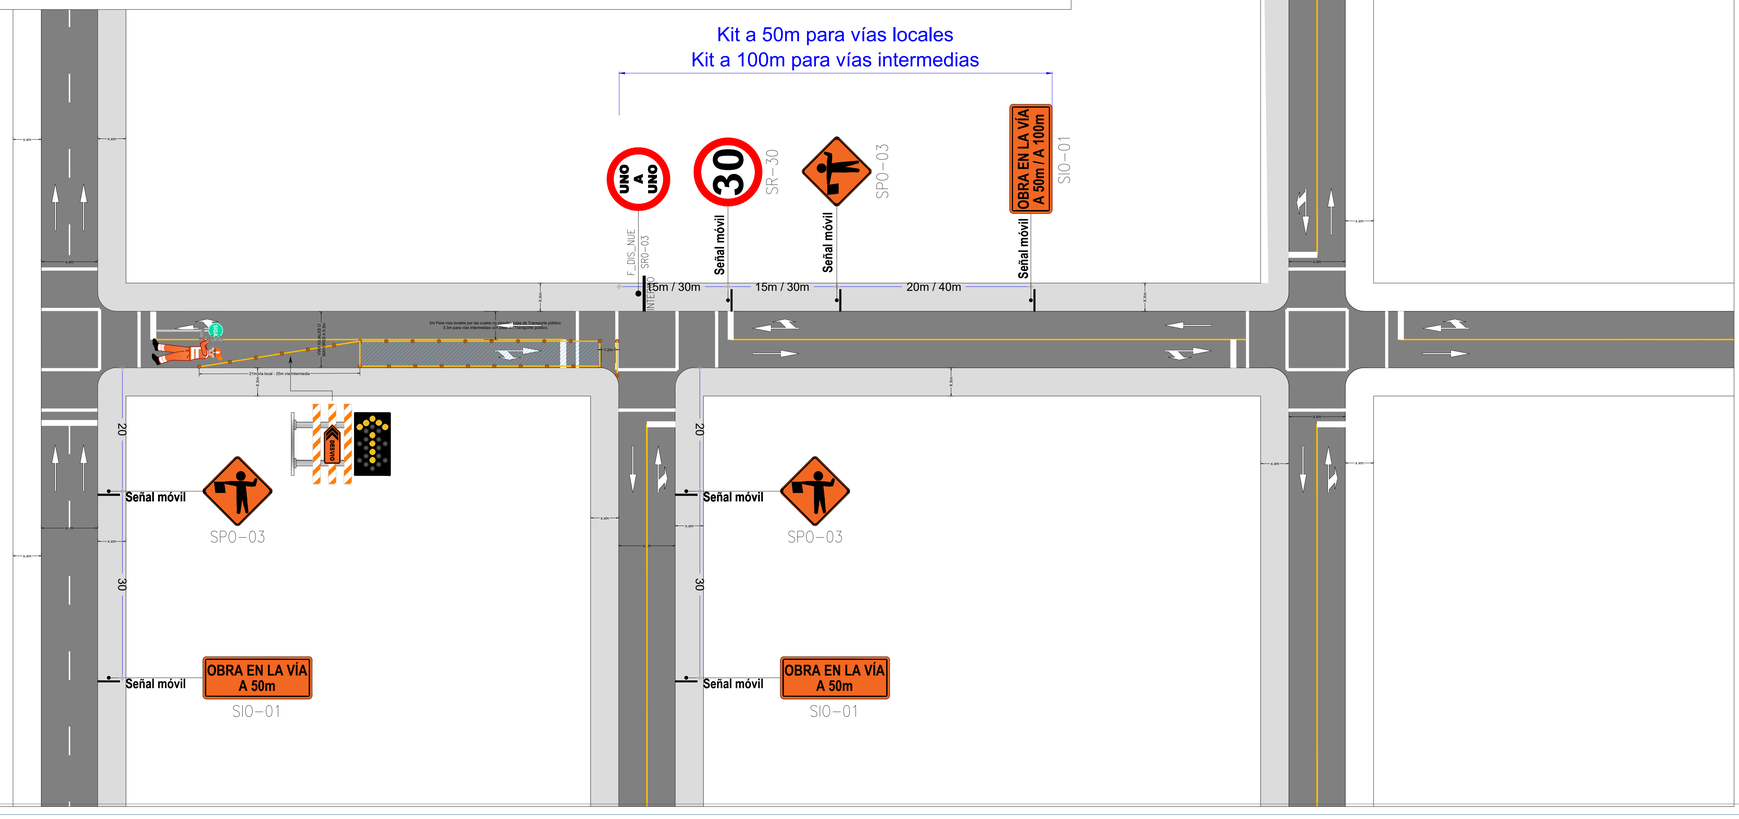

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 9

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0


FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA


PLANO 9 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) TRAMO CON VOLTEADERO EN LA TOTALIDAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

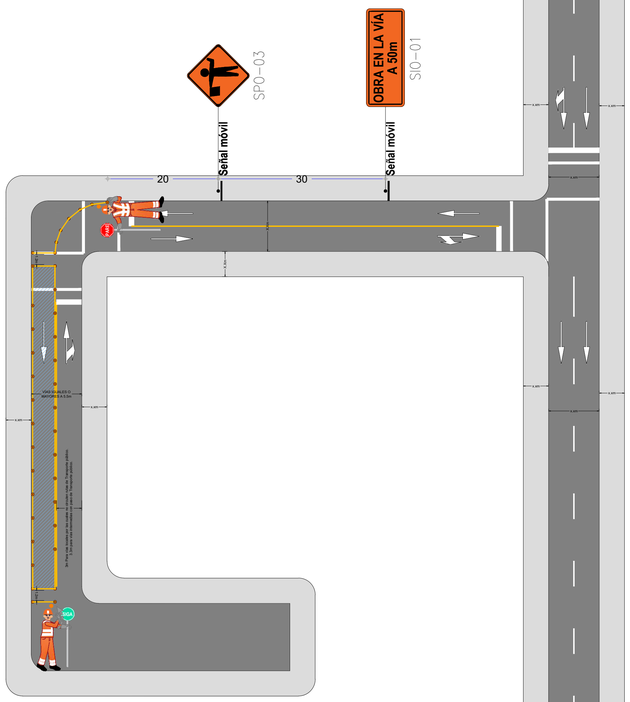

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) TRAMO CON VOLTEADERO EN LA TOTALIDAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

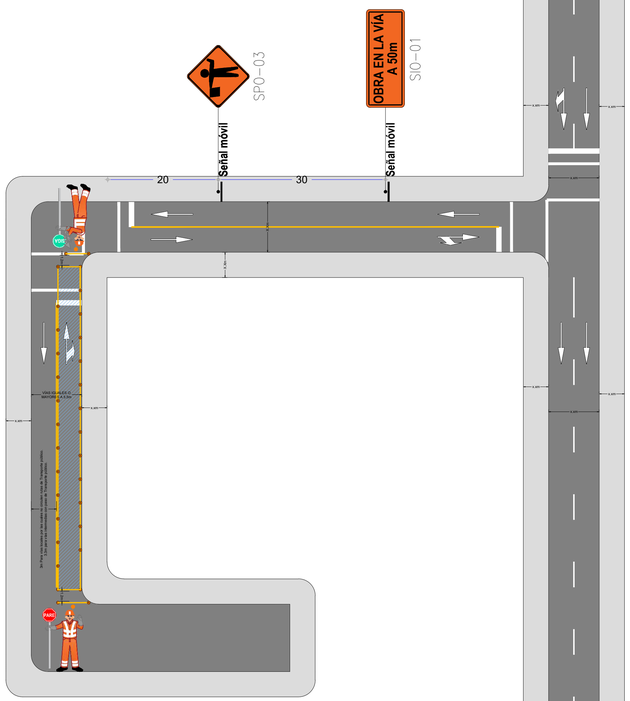

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 12

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0


FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA


PLANO 13 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (UNIDIRECCIONAL) EN LA MITAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 1)

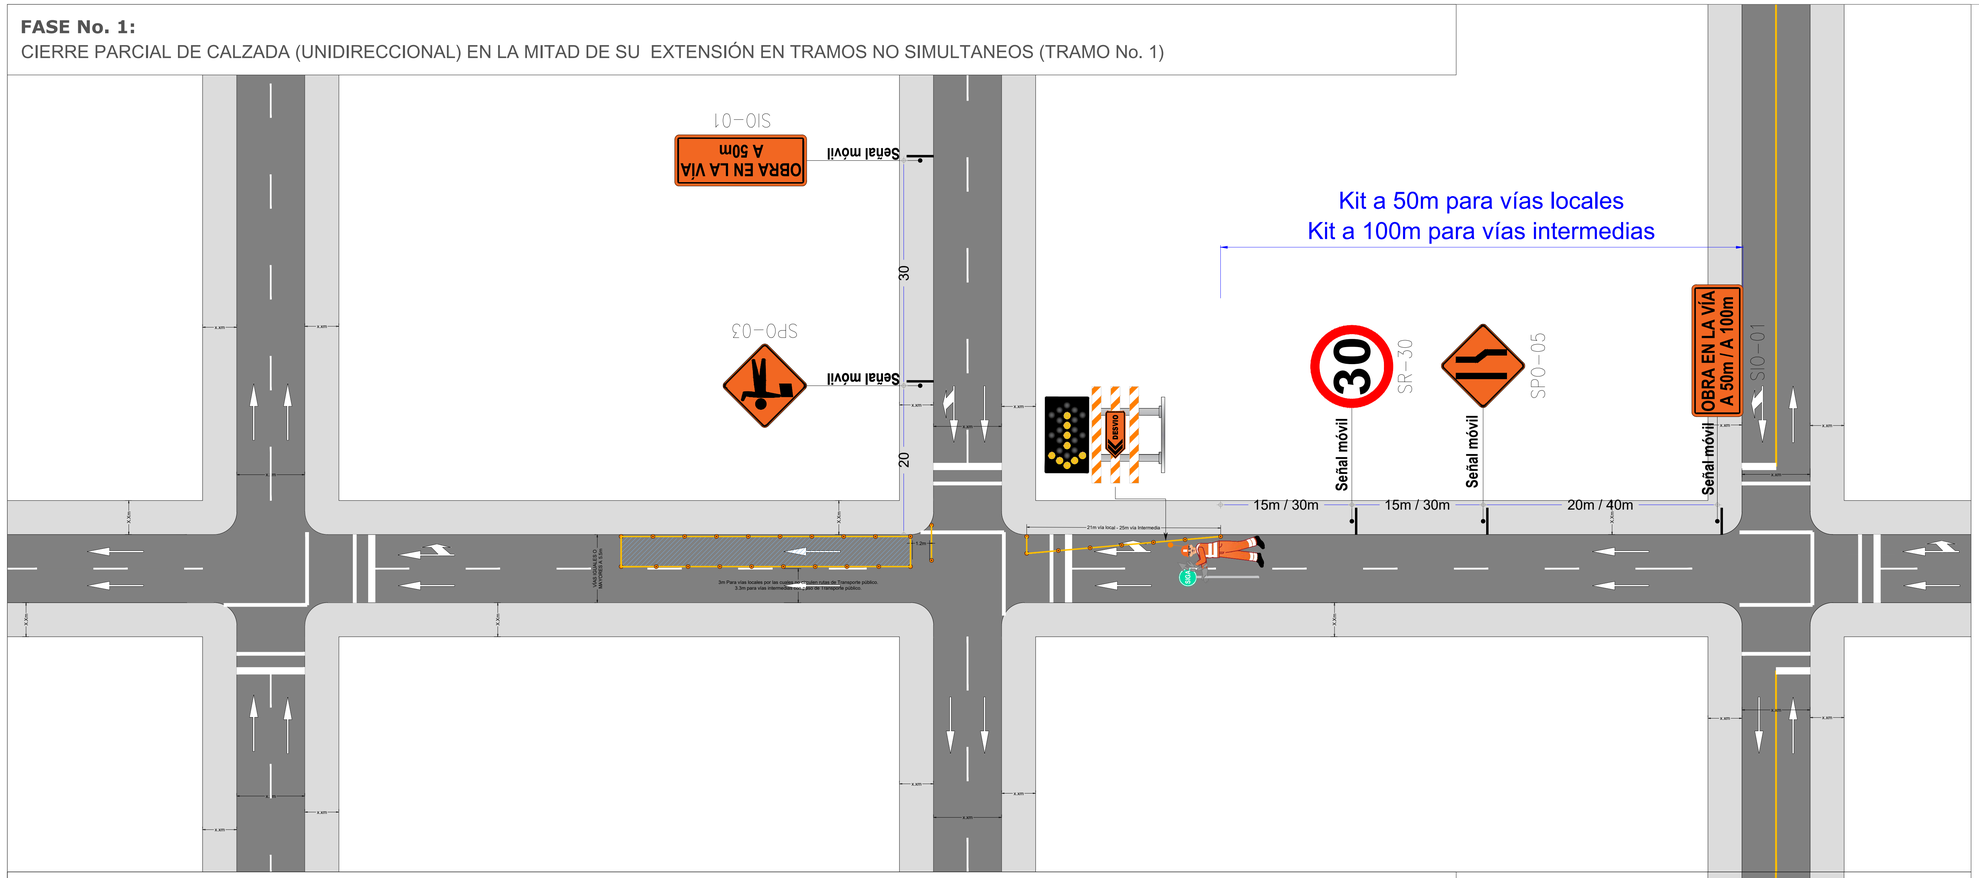

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (UNIDIRECCIONAL) EN LA MITAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS (TRAMO No. 2)

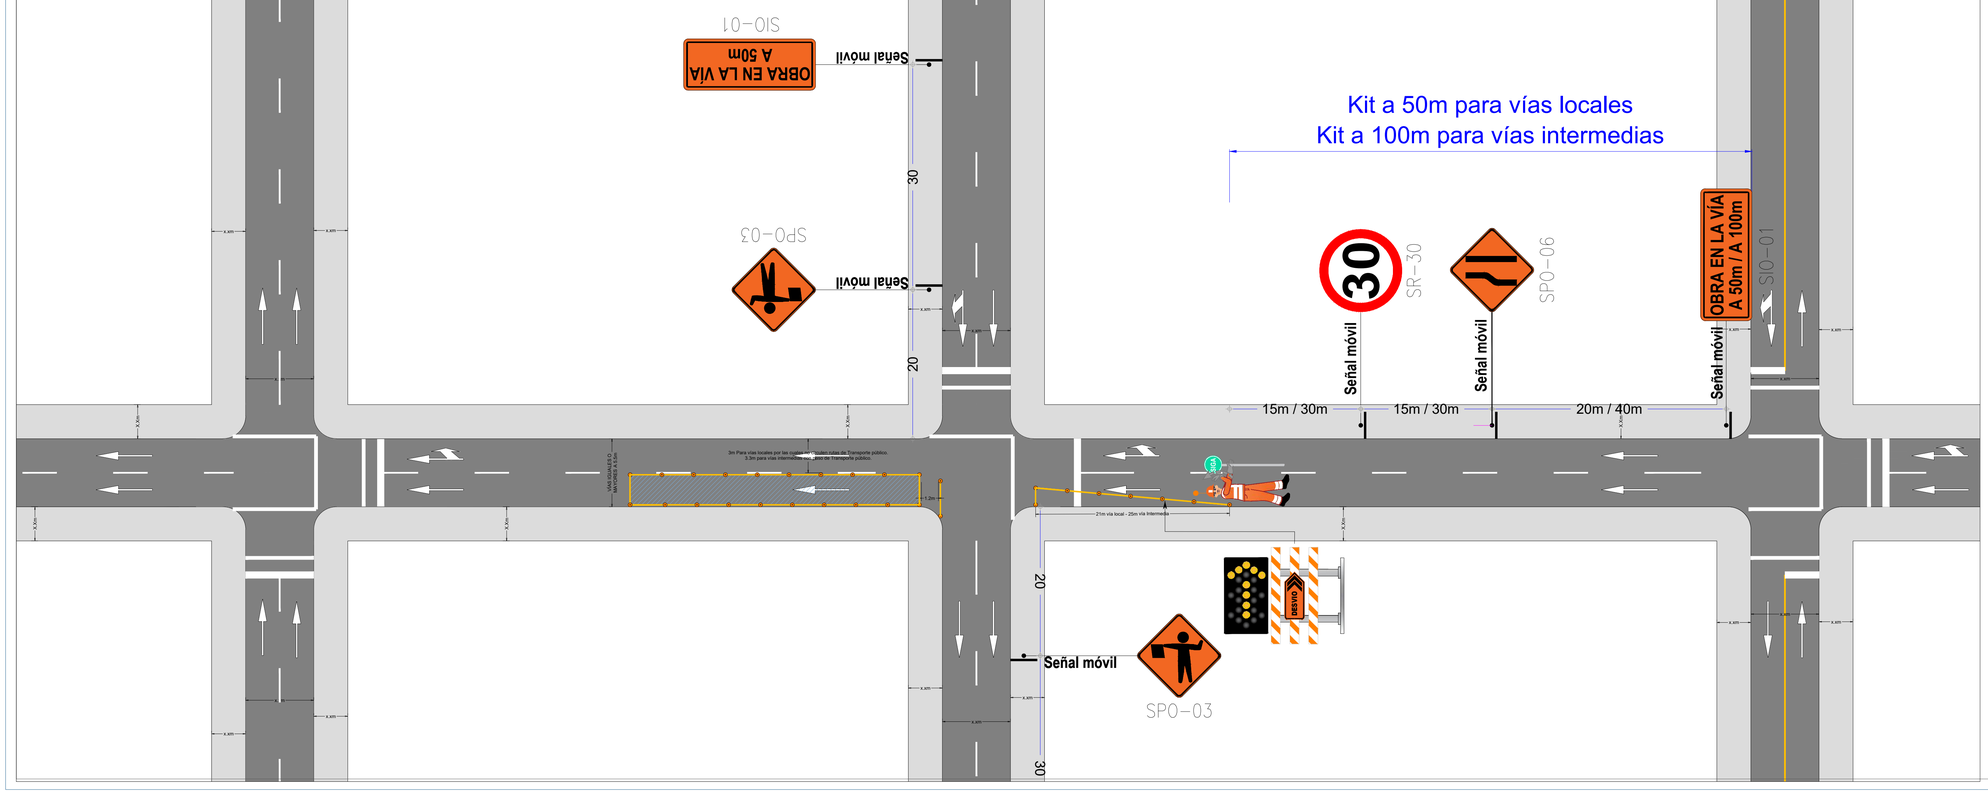

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 15

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES DE ACERO 1"	CONOS 90cm
PLAFONES EN MADERA	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0


FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA


PLANO 16 DE 17

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

FASE No. 1:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) EN LA MITAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS CON INTERSECCIÓN DOBLE CALZADA E INTERSECCIÓN EN T (TRAMO No. 1)

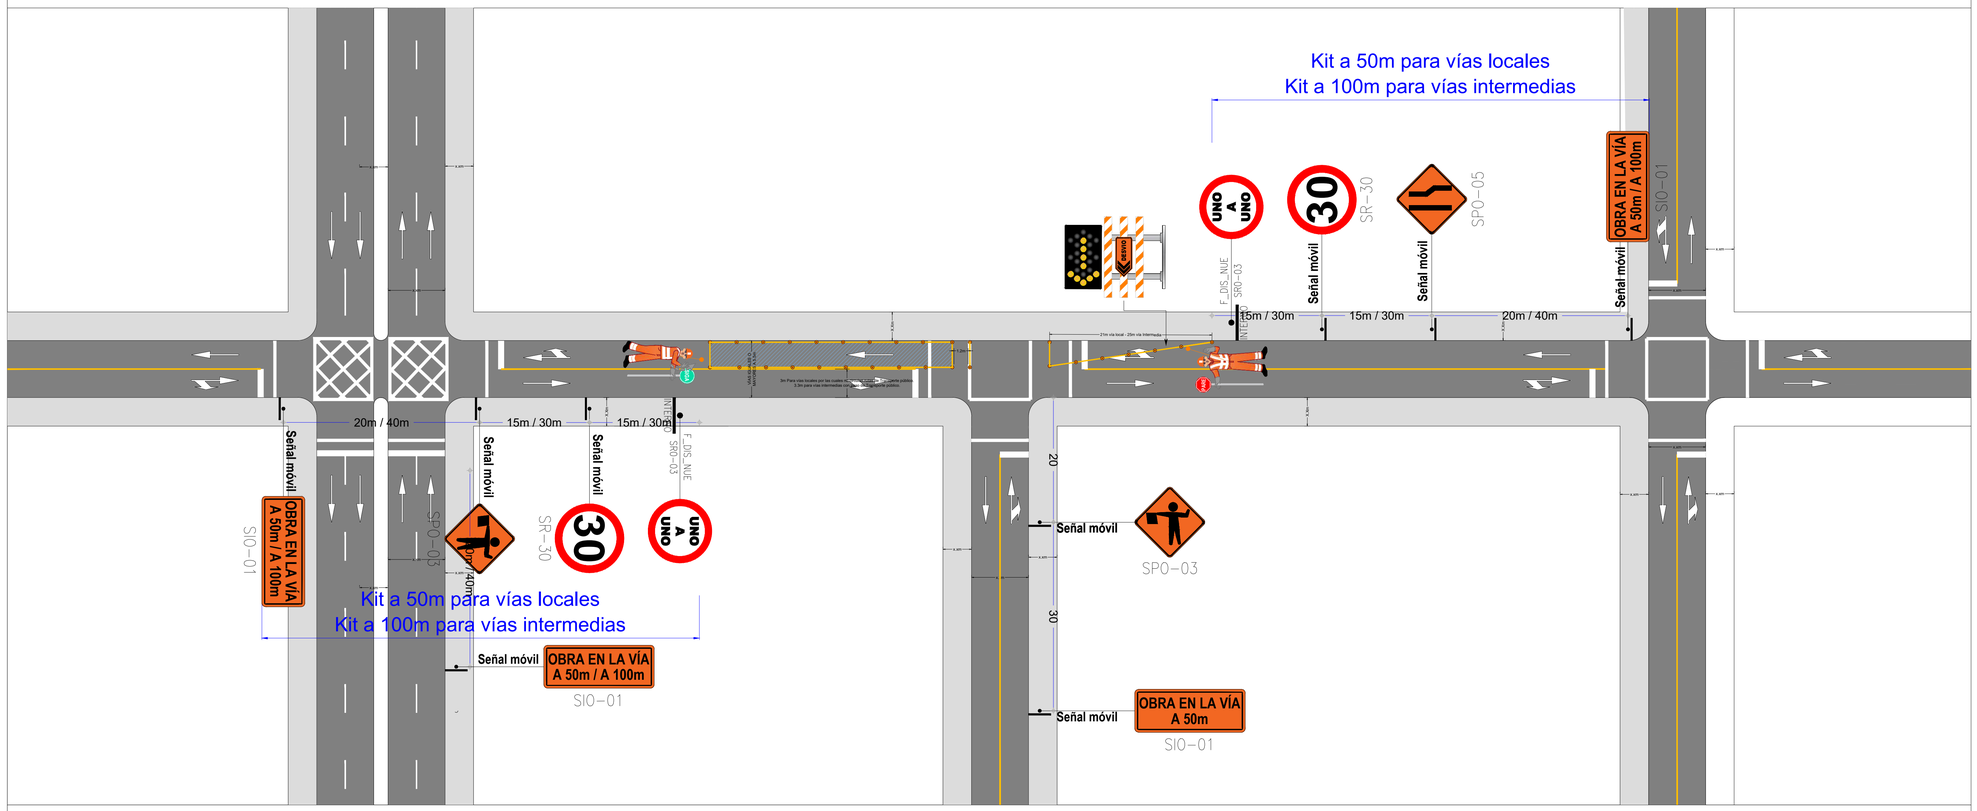

FASE No. 2:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA (BIDIRECCIONAL) EN LA MITAD DE SU EXTENSIÓN EN TRAMOS NO SIMULTANEOS CON INTERSECCIÓN DOBLE CALZADA E INTERSECCIÓN EN T (TRAMO No. 2)

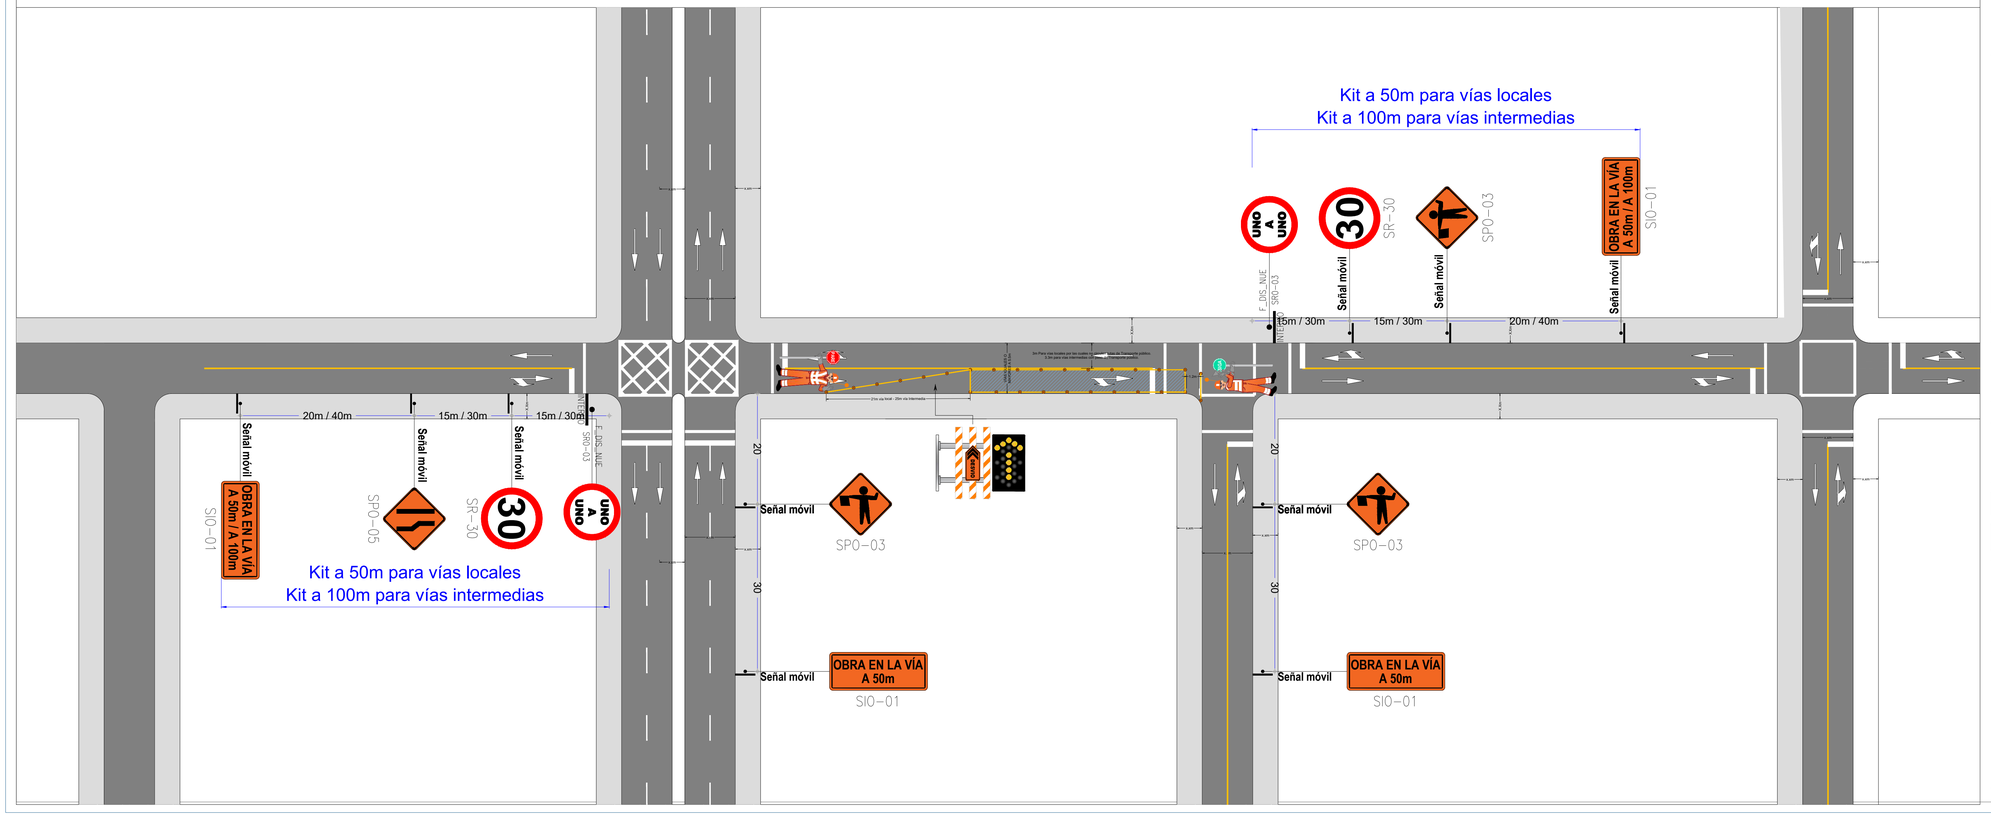

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
TIPOLOGÍA No. 19

COSTADO: AMBOS

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SI0-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SI0-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SI0-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SI0-04	PEATONES — PEATONES SI0-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SI0-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SP0-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SP0-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SP0-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SP0-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

VÍAS LOCALES:
HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 07:00 - 17:00 Horas

VÍAS INTERMEDIAS:
HORARIO: 22:00 - 05:00 Horas
HORARIO CIERRE: 22:00 - 05:00 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0

FECHA: 04 DE MARZO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO
BYR-SG-BU 001

ANEXO 7
RESULTADOS DE LABORATORIOS

Bogotá D.C 2 de mayo de 2025

BO-DP-118-2025
OT. 92-1

SEÑORES:
CONSORCIO BYR -SG-BU001
CIUDAD

Ref. **CONTRATO-491-2024 - LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS**

Asunto: Resultados de ensayos de laboratorio

Respetado (a) ingeniero (a):

Con toda atención estamos remitiendo informe de ensayos de laboratorio, Compresión de Cilindros, a la obra de referencia.

Gustosamente suministraremos información sobre cualquier inquietud adicional al contenido del presente.
(Folios 1)

Cordialmente,

DAPCIL S.A.S.
DISEÑOS - ASESORIAS - PROYECTOS
CONSULTORIAS - INTERVENTORIAS
LABORATORIO DE SUELOS - PAVIMENTOS Y CONCRETOS



LUIS ALIRIO AWAZACKO REYES
Gerente Técnico

DAPCIL S. A. S.
INGENIEROS CONSULTORES
SUELOS Y PAVIMENTOS

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
23-LAB-049

Informe de ensayo


RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

Norma Ref. I.N.V E-410-13

PROYECTO: **LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS**
UBICACIÓN: LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS
CLIENTE: CONSORCIO BYR - SG - BU001
Dir. CLIENTE:

OT: **92-1**
FECHA DE EMISION: 2025-05-02

PROB 'No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD (Dias)	FECHA ROTURA	AST. (Pulg)	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA (kN)	DIMENSIONES			PESO (kg)	PESO UNITARIO (kg/m^3)	RESISTENCIA		% DESARROLLO	PATRON DE FRACTURA
								Long (mm)	Diametro (mm)	Area (mm^2)			$f'c$ (psi)	$f'c$ (MPa)		
227	2025-03-29	CIV 12003442	7	2025-04-05	6 "	3000	341,10	301,23	152,20	18193,6	12,145	2216,1	2719	18,7	91	Tipo 2
228	2025-03-29	CIV 12003442	14	2025-04-12	6 "	3000	396,20	302,10	152,26	18208,0	12,286	2233,6	3156	21,8	105	Tipo 3
229	2025-03-29	CIV 12003442	28	2025-04-26	6 "	3000	409,10	302,56	152,36	18231,9	12,365	2241,6	3254	22,4	108	Tipo 3
230	2025-03-29	CIV 12003442	28	2025-04-26	6 "	3000	426,30	302,43	152,20	18193,6	12,365	2247,2	3398	23,4	113	Tipo 6



DAPCIL S.A.S.
Laboratorio de suelos y pavimentos
fasterrestorda

Reviso:
Ing. Luis Fernando Osorio C.
Director Técnico

Aprobó:
Luis Alirio Awasakco Reyes
Gerente Técnico

Observciones:

Descargos de responsabilidad:
1. El presente informe de ensayo no podrá ser reproducido parcial ni totalmente sin previa autorización escrita del laboratorio que lo emite.
2. El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el presente informe, excepto cuando la información la suministre el cliente información que puede afectar la validez de los resultados.
3. El laboratorio no es responsable de la etapa de muestreo
4. Los resultados de los ensayos fueron obtenidos en las condiciones en las cuales se recibe la muestra en el laboratorio.
5. Este informe es válido únicamente si presenta firma de quien Reviso o Aprobó con sello del laboratorio que lo emite en original.

Calle 143 No 46 - 55, Telefono (601) 245 17 77 Movil: 310 806 10 72 Bogota DC - Colombia
e-mail: laboratorio@dapcil.com

ANEXO 8
INFORMES SEMANALES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 11 Del: 28 de abril de 2025 Al: 4 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **104** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **28.89%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO OBRA NO. 491-2024 - CONSORCIO BYR SG BU 001		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLBU-CMA-510-2024 (120758) - CONSORCIO MM 2024**	
Contratista	**CONSORCIO VBYR SG BU 001**	**Interventor**	**CONSORCIO INTERVIAL 2024**
Objeto del Contrato	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**	**Objeto del Contrato**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**
Nit	901.901.203-3	**Nit**	901845467-0
Contrato No.	491-2025	**Contrato No.**	510-2024
Representante Legal	ING. GEOVANNY PAEZ	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	ANDRES MURILLO MAYORGA
Fecha de suscripción del contrato	20/12/2024	**Fecha de suscripción del contrato**	21/12/2024
Valor Inicial	**$ 4,278,022,774**	**Valor Inicial**	**$ 531,463,226.00**
Adición al contrato de obra	$ -	**Adición al contrato de interventoría**	$ -
Valor Actualizado	**$ 4,278,022,774**	**Valor Actualizado**	**$ 531,463,226.00**
Plazo Inicial	6 MESES	**Plazo Inicial**	6 MESES
Plazo Actualizado	6 MESES	**Plazo Actualizado**	6 MESES
prorroga 1	0	**prorroga 1**	0
Fecha de Iniciación	20/01/2025	**Fecha de Iniciación**	20/01/2025
Fecha de Terminación inicial	20/07/2025	**Fecha de Terminación**	20/07/2025
fecha de terminación final	20/07/2025	**fecha de terminación final**	20/07/2025

INFORMACIÓN POLIZAS


CONTRATO DE OBRA


AMPARO	**VIGENCIAS**	**VALOR**
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO		
CUMPLIMIENTO	20/01/2025 - 20/11/2025	$ 855,604,554.80
PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025 - 20/07/2028	$ 427,802,277.40
CALIDAD DEL SERVICIO	20/07/2025 - 20/07/2027	$ 35,205,674.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/07/2025 - 20/07/2028	$ 694,525,655.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/07/2025 - 20/07/2026	$ 553,675,504.00
POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
PATRONAL	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
CONTRATISTAS	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2025- 19/11/2025	$ 106.292.645,20
PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025- 20/07/2028	$ 26.573.161,30
CALIDAD DEL SERVICIO	20/07/2025- 20/07/2030	$ 159.438.967,80

GRAFICA % PROGRAMADO VS EJECUTADO

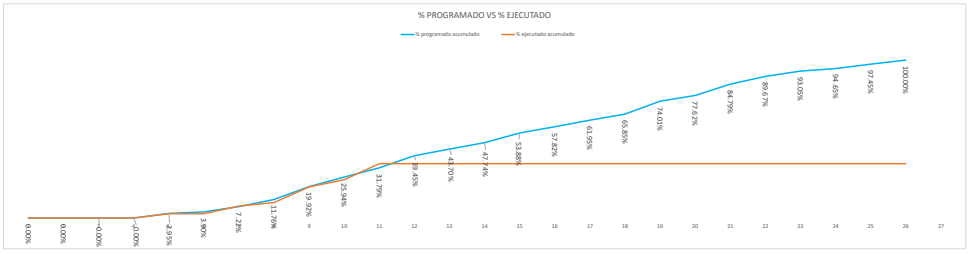



ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO

FRENTE DE OBRA	**% AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO**				
	% PROGRAMADO TOTAL DE OBRA	% ATRASO O ADELANTO TOTAL DE OBRA	Valor Presupuestado Total	Valor total Ejecutado Total	Valor Total por Ejecutar
ACCIONES DE MOVILIDAD	36.14%	**6.54%**	$ 4,278,022,774	$ 1,825,678,546	$ 2,452,344,228
			100%	42.68%	57.32%

RESUMEN

PORCENTAJE SEMANAL PROGRAMADO	3.33%	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO DE OBRA	36.14%
VR. EJECUTADO OBRA EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 183,549,615	VR. EJECUTADO TOTAL OBRA	$ 1,825,678,546.00
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO SEMANA	4.29%	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	42.68%
PORCENTAJE DE ATRASO / ADELANTO SEMANAL	**0.97%**	PORCENTAJE DE ATRASO/ ADELANTO TOTAL DE OBRA	**6.54%**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

	FRENTE DE OBRA	**% AVANCE SEMANAL DE OBRA**				
		% Avance Programado Semanal	**% Avance Ejecutado Semanal**	**Valor Programado Semanal**	**Valor Ejecutado Semanal**	**atraso en la Semana**
1	ACCIONES DE MOVILIDAD	**3.33%**	**4.29%**	**$ 142,248,547**	**$ 183,549,615**	**$ 41,301,068**
				100.0%		**0.97%**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 11 Del: 28 de abril de 2025 Al: 4 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **104** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **28.89%**


Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO


AVANCE EJECUTADO SEMANAL

Semana Anterior (S)	Semana Actual (S)
$ 52,149,741	$ 183,549,615.00

OBSERVACIONES: Para la presente semana se reaaliza el ajuste de la programación, actualizandola de acuerdo al balance presentando incluyendo los NP aprobados

GRAFICA VALOR TOTAL PROGRAMADO VS EJECUTADO





1	INFORME TÉCNICO						
No	**Ubicación de la actividad**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**%avance de cada actividad realizada por CIV semanalmente**	**Jornada de Intervencio**	**Tipo de interención**	**Descripción de la Actividad**
El contratista presentó el balance actualizado, incluyendo los No Previstos (NP), junto con el cronograma actualizado. Esta interventoría dio su aval a dicho balance. El presente informe se ajusta a esta actualización, por lo tanto, ya no se presentan atrasos en las actividades, ya que estos ítems han sido incorporados.							
1	12002432	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
2	12001662	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	
3	12003134	mar 08/04/25	mie 09/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
4	12000797	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
5	12001109	Mie 09/04/25	Vie 11/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
6	12000816	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
7	12002698	Lun 17/03/25	Lun 17/03/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
8	12000661	sab 12/04/25	dom 13/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
9	12000809	jue 27/03/25	abierto	20.0%	Intervenido, pendiente concepto de especialistas por fallos que se presentaron y se requiere el PMT diurno	Acción de movilidad	Este segmento vial se encuentra pendiente, puesto que en el momento que se iniciaron actividades, se evidenciaron varias zonas con problemas estructurales, se esta a la espera del concepto por parte del especialista, la actualización del PMT a Diurno
10	12000858	vie 14/03/25	sab 15/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
11	12000201	mar 11/03/25	mie 12/03/25	90.0%	nocturno (herradura)	Acción de movilidad	
12	12000359	mar 11/03/25	mie 12/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
13	12000850	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
14	12001510	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
15	12001341	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
16	12001351	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
17	12001409	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
18	12000922	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
19	12000741	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
20	12000329	lun 10/03/2	lun 10/03/2	70.0%	Diurno	Acción de movilidad	
21	12000392	jue 13/03/25	jue 13/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
22	12003240	lun 17/03/25	mar 18/03/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
23	12001652	jue 03/04/25	jue 03/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
24	12001694	vie 04/04/25	vie 04/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
25	12001030	sab 25/04/25	sab 25/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 11 Del: 28 de abril de 2025 Al: 4 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: 104 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 28.89%

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

26	12002479	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
27	12002478	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
28	12002472	vie 21/03/025	sab 22/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
29	12000497	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	la comunidad no permite intervenirlo	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
30	12002498	vie 21/03/25	sab 22/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
31	12002070	mar 30/04/2025	mie 30/04/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	En este segmento se llevaron a cabo actividades de fresado en las áreas designadas para mantenimiento, seguido de la compactación de la base existente. Posteriormente, se extiende asfalto con su respectiva compactación
32	12000239	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Mantenimiento	
33	12001889	mar 18/03/25	jue 20/03/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
34	12001860	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	No se ejecutó	Mantenimiento	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
35	12000076	sab 15/03/25	dom 16/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
36	12000458	jue 13/03/25	vie 14/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
37	12000511	mar 11/03/25	mar 11/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
38	12001917	lun 28/04/2025	mar 29/04/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	En este segmento se llevaron a cabo actividades de fresado en las áreas designadas para mantenimiento. Este segmento presento fallo, se realiza atención a cada uno, realizandole el mejoramiento, seguido de la compactación de la base existente. Posteriormente, se extiende asfalto con su respectiva compactación
39	12000849	mie 30/04/2025	jue 01/04/2025	90.0%	nocturno	Mantenimiento	En este segmento se llevaron a cabo actividades de fresado en las áreas designadas para mantenimiento. Este segmento presento fallo, se realiza atención a cada uno, realizandole el mejoramiento, seguido de la compactación de la base existente. Posteriormente, se extiende asfalto con su respectiva compactación
40	12002192	jue 20/03/25	vie 21/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
41	12000891	lun 07/04/25	lun 07/04/25	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
42	12001383	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Mantenimiento	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
43	12003442	semana del 21 al 25 de abril	Aun estan en actividades	45.0%	en ejecucion	Puente	Esta semana se retomaron las actividades de mantenimiento de las barandas del puente, que incluyeron: el retiro de la pintura existente, la aplicación de un anticorrosivo y la pintura amarilla final. También se realizó el reemplazo de secciones de la baranda. Se iniciaron las actividades de fresado; sin embargo, debido al mal estado de la estructura (se evidenciaron fallos en un alto porcentaje del área) de las rampas de acceso al puente, es necesario llevar a cabo un mejoramiento del relleno y el sellado, tal como lo recomendó el especialista. Dado que el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) tiene vigencia hasta el 25 de abril, se dejará abierto el segmento para renovar el PMT y proceder con el mejoramiento de dicha estructura. (Aun se mantiene esta observación)

SEGMENTOS VIALES EN INTERVENCION

No.	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	VALOR	KM CARRIL	% AVANCE
1	12002432	KR 14 A	CL 70 A	CL 70		**0.262**	**0**
2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C		**0.229**	**0**
3	12003134	DG 76 BIS	KR 52	KR 51	$ 22,919,614.00	**0.127**	**90**
4	12000797	KR 67	CL 67 G	NA	$ 44,745,363.00	**0.192**	**90**
5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	$ 151,372,303.00	**0.319**	**90**
6	12000816	KR 67	CL 67 F	NA	$ 31,687,349.00	**0.053**	**90**
7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	$ 12,502,202.00	**0.147**	**90**
8	12000661	CL 87	KR 49 A	KR 49	$ 57,425,300.00	**0.094**	**90**
9	12000809	CL 85 A	KR 50	KR 49 A	$ -	**0.315**	**20**
10	12000858	KR 49 A	CL 85	CL 85 A	$ 63,857,445.00	**0.082**	**90**
11	12000858	CL 94	KR 65	KR 64	$ 5,487,352.00	**0.112**	**90**
12	12000359	TV 60 C	CL 90	CL 93	$ 11,765,641.00	**0.201**	**90**
13	12000850	KR 21	CL 89	CL 87		**0.384**	**0**
14	12001510	KR 21	CL 82	NA		**0.094**	**0**
15	12001341	CL 83	KR 22 A	KR 24		**0.271**	**0**
16	12001351	CL 83	KR 22 A	KR 22		**0.109**	**0**
17	12001409	KR 21	CL 83	NA		**0.104**	**0**
18	12000922	CL 86 A	AV 24	KR 23		**0.169**	**0**
19	12000741	KR 22	CL 89	CL 88		**0.139**	**0**
20	12000329	CL 93 A	KR 60 B	TV 60 C	$ 132,539,566.00	**0.299**	**70**
21	12000392	CL 93	KR 58	KR 57	$ 59,733,819.00	**0.212**	**90**
22	12003240	CL 73	KR 22	NA	$ 47,100,962.00	**0.048**	**90**
23	12001652	CL 70 A	KR 55	KR 54	$ 45,259,746.00	**0.169**	**90**
24	12001694	KR 55	CL 70 BIS	CL 70	$ 71,247,081.00	**0.139**	**90**
25	12001030	CL 74 A	KR 58	KR 60	$ 29,892,624.00	**0.172**	**90**
26	12002479	CL 63 F	KR 27 A	KR 27		**0.219**	**0**
27	12002478	CL 63 F	KR 27	NA		**0.039**	**0**
28	12002472	CL 66	KR 22	KR 21	$ 59,611,647.00	**0.218**	**90**
29	12000497	CL 79 BIS	KR 63	KR 64		**0.192**	**0**
30	12002498	KR 20	CL 66	CL 67	$ 18,908,062.00	**0.33**	**90**
31	12002070	DG 74 BIS	KR 20 B	CL 75	$ 54,205,403.00	**0.104**	**0**
32	12000239	KR 58	CL 94 B	CL 94 C		**0.301**	**0**
33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	$ 148,522,641.00	**0.215**	**90**
34	12001860	KR 54	CL 67ABIS	CL 67ABISA		**0.102**	**0**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 11 Del: 28 de abril de 2025 Al: 4 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **104** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **28.89%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

35	12000076	CL 99	KR 48	KR 49	$	68,951,482.00	**0.213**	**90**
36	12000458	CL 91 A	KR 58	KR 50	$	44,499,353.00	**0.115**	**90**
37	12000511	CL 90	KR 58	KR 50	$	8,761,909.00	**0.067**	**90**
38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	$	14,403,629.00	**0.156**	**0**
39	12000849	CL 79 A	KR 55	KR 55	$	21,485,905.00	**0.111**	**0**
40	12002192	KR 21	CL 89	CL 87	$	70,887,906.00	**0.384**	**90**
41	12000891	KR 55 B	CL 78	CL 79	$	23,208,458.00	**0.31**	**90**
42	12001383	KR 27	CL 83 BIS	CL 82			**0.274**	**0**
43	12003442	KR 51	DG 71 BIS	DG 71 BIS	$	74,338,372.00	**0.28**	**45**

VALOR A LA FECHA DE LOS SEGMENTOS INTERVENIDOS $ 1,395,321,134.00

TOTAL KM CARRIL DEL CONTRATO	**8.072**
TOTAL KM CARRIL EJECUTADO	**0.371**

COMPONENTE SOCIAL

EMPLEOS POBLACIÓN VULNERABLE
Total de empleos generados: 50
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 50
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD:1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 1 ALEJANDRO SUAREEZ QUE TIENE EL 51% DE MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES
JOVENES MENORES DE 24 AÑOS: 3

EMPLEOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Total de empleos generados:50
Total de mano de obra no calificada:15
Total de mano de obra no calificada de la localidad: 0
PORCENTAJE 0%
A LA FECHA SE HAN ENTREGADO 223 VOLANTES EN LA LOCALIDAD CON LA CONVOCATORIA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

EMPLEOS PARA LA MUJER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:50
TOTAL MUJERES: 7
% MUJERES QUE SERIA EL 14% DEL 13.8%

ING. YENNIFFER ACOSTA SALGADO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. ANDRES MURILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **111** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **30.83%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO OBRA NO. 491-2024 - CONSORCIO BYR SG BU 001		CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLBU-CMA-510-2024 (120758) - CONSORCIO MM 2024	
Contratista	**CONSORCIO VBYR SG BU 001**	**Interventor**	**CONSORCIO INTERVIAL 2024**
Objeto del Contrato	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**	**Objeto del Contrato**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**
Nit	901.901.203-3	**Nit**	901845467-0
Contrato No.	491-2025	**Contrato No.**	510-2024
Representante Legal	ING. GEOVANNY PAEZ	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	ANDRES MURILLO MAYORGA
Fecha de suscripción del contrato	20/12/2024	**Fecha de suscripción del contrato**	21/12/2024
Valor Inicial	**$ 4,278,022,774**	**Valor Inicial**	**$ 531,463,226.00**
Adición al contrato de obra	$ -	**Adición al contrato de interventoría**	$ -
Valor Actualizado	**$ 4,278,022,774**	**Valor Actualizado**	**$ 531,463,226.00**
Plazo Inicial	6 MESES	**Plazo Inicial**	6 MESES
Plazo Actualizado	6 MESES	**Plazo Actualizado**	6 MESES
prorroga 1	0	**prorroga 1**	0
Fecha de Iniciación	20/01/2025	**Fecha de Iniciación**	20/01/2025
Fecha de Terminación inicial	20/07/2025	**Fecha de Terminación**	20/07/2025
fecha de terminación final	20/07/2025	**fecha de terminación final**	20/07/2025

INFORMACIÓN POLIZAS


CONTRATO DE OBRA


AMPARO	VIGENCIAS	VALOR
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO		
CUMPLIMIENTO	20/01/2025 - 20/11/2025	$ 855,604,554.80
PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025 - 20/07/2028	$ 427,802,277.40
CALIDAD DEL SERVICIO	20/07/2025 - 20/07/2027	$ 35,205,674.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/07/2025 - 20/07/2028	$ 694,525,655.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/07/2025 - 20/07/2026	$ 553,675,504.00
POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
PATRONAL	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
CONTRATISTAS	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2025- 19/11/2025	$ 106.292.645,20
PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025- 20/07/2028	$ 26.573.161,30
CALIDAD DEL SERVICIO	20/07/2025- 20/07/2030	$ 159.438.967,80

GRAFICA % PROGRAMADO VS EJECUTADO

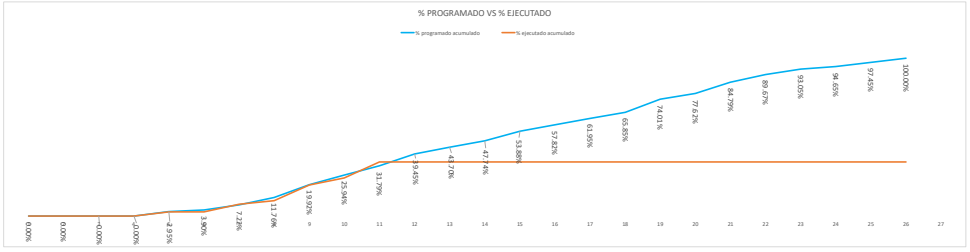



ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO

FRENTE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO				
	% PROGRAMADO TOTAL DE OBRA	% ATRASO O ADELANTO TOTAL DE OBRA	Valor Presupuestado Total	Valor total Ejecutado Total	Valor Total por Ejecutar
ACCIONES DE MOVILIDAD	39.46%	**4.28%**	$ 4,278,022,774	$ 1,871,074,096	$ 2,406,948,678
			100%	43.74%	56.26%

RESUMEN

PORCENTAJE SEMANAL PROGRAMADO	3.32%	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO DE OBRA	39.46%
VR. EJECUTADO OBRA EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 45,395,550	VR. EJECUTADO TOTAL OBRA	$ 1,871,074,096.00
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO SEMANA	1.06%	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	43.74%
PORCENTAJE DE ATRASO / ADELANTO SEMANAL	**-2.26%**	PORCENTAJE DE ATRASO/ ADELANTO TOTAL DE OBRA	**4.28%**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

	FRENTE DE OBRA	% AVANCE SEMANAL DE OBRA				
		% Avance Programado Semanal	% Avance Ejecutado Semanal	Valor Programado Semanal	Valor Ejecutado Semanal	atraso en la Semana
1	ACCIONES DE MOVILIDAD	**3.32%**	**1.06%**	**$ 142,241,442**	**$ 45,395,550**	**-$ 96,845,892**
				100.0%		**-2.26%**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **111** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **30.83%**


Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

AVANCE EJECUTADO SEMANAL	
Semana Anterior (S)	Semana Actual (S)
$ 183,549,615	$ 45,395,550.00

OBSERVACIONES: Esta semana se registraron intensas lluvias y el fallo observado en el segmento del puente se amplió, lo que provocó la necesidad de una mayor intervención.
El contrato lleva a la fecha un avance fisico real de 58%, un avance financiero del 43.74%

GRAFICA VALOR TOTAL PROGRAMADO VS EJECUTADO





1	INFORME TÉCNICO						
No	**Ubicación de la actividad**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**%avance de cada actividad realizada por CIV semanalmente**	**Jornada de Intervencio**	**Tipo de interención**	**Descripción de la Actividad**
El contratista presentó el balance actualizado, incluyendo los No Previstos (NP), junto con el cronograma actualizado. Esta interventoría dio su aval a dicho balance. El presente informe se ajusta a esta actualización, por lo tanto, ya no se presentan atrasos en las actividades, ya que estos ítems han sido incorporados.							
1	12002432	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
2	12001662	jue 8/05/2025	-	50.0%	Diurno	Acción de movilidad	Se iniciaron actividades de corte, demolición y retiro del material. Debido a las intensas lluvias, este tramo permanecerá abierto para concluir las actividades la próxima semana.
3	12003134	mar 08/04/25	mie 09/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
4	12000797	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
5	12001109	Mie 09/04/25	Vie 11/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
6	12000816	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
7	12002698	Lun 17/03/25	Lun 17/03/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
8	12000661	sab 12/04/25	dom 13/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
9	12000809	jue 27/03/25	abierto	20.0%	Intervenido, pendiente concepto de especialistas por fallos que se presentaron y se requiere el PMT diurno	Acción de movilidad	Este segmento vial se encuentra pendiente, puesto que en el momento que se iniciaron actividades, se evidenciaron varias zonas con problemas estructurales, se esta a la espera del concepto por parte del especialista, la actualización del PMT a Diurno
10	12000858	vie 14/03/25	sab 15/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
11	12000201	mar 11/03/25	mie 12/03/25	90.0%	nocturno (herradura)	Acción de movilidad	
12	12000359	mar 11/03/25	mie 12/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
13	12000850	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
14	12001510	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
15	12001341	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
16	12001351	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
17	12001409	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
18	12000922	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
19	12000741	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
20	12000329	lun 10/03/2	lun 10/03/2	70.0%	Diurno	Acción de movilidad	
21	12000392	jue 13/03/25	jue 13/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
22	12003240	lun 17/03/25	mar 18/03/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
23	12001652	jue 03/04/25	jue 03/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
24	12001694	vie 04/04/25	vie 04/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
25	12001030	sab 25/04/25	sab 25/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: 111 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 30.83%

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

26	12002479	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
27	12002478	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
28	12002472	vie 21/03/025	sab 22/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
29	12000497	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	la comunidad no permite intervenirlo	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
30	12002498	vie 21/03/25	sab 22/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
31	12002070	mar 30/04/2025	mie 30/04/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
32	12000239	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Mantenimiento	
33	12001889	mar 18/03/25	jue 20/03/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
34	12001860	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	No se ejecutó	Mantenimiento	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
35	12000076	sab 15/03/25	dom 16/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
36	12000458	jue 13/03/25	vie 14/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
37	12000511	mar 11/03/25	mar 11/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
38	12001917	lun 28/04/2025	mar 29/04/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
39	12000849	mie 30/04/2025	jue 01/04/2025	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
40	12002192	jue 20/03/25	vie 21/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
41	12000891	lun 07/04/25	lun 07/04/25	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
42	12001383	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Mantenimiento	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
43	12003442	semana del 21 al 25 de abril	Aun estan en actividades	45.0%	en ejecucion	Puente	Esta semana se continuaron las actividades de intervención del segmento; sin embargo, se evidenció que el tramo contenía una cantidad considerable de material arcilloso en su estructura, lo que resultó en una excavaciónpara realizar un mejoramiento de 40 cm de rajon y 20 cm de sello. Debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante la semana, al intentar extender la primera capa de mezcla asfáltica, se observaron dos fallos. Por lo tanto, esta interventoría solicitó el retiro de dicha mezcla y la realización de un mejoramiento en el sello instalado. Esta actividad se llevará a cabo la próxima semana, ya que las lluvias continúan, lo que podría causar más daños en la estructura

SEGMENTOS VIALES EN INTERVENCION

No.	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	VALOR	KM CARRIL	% AVANCE
1	12002432	KR 14 A	CL 70 A	CL 70		**0.262**	**0**
2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	$ 1,123,112.00	**0.229**	**90**
3	12003134	DG 76 BIS	KR 52	KR 51	$ 27,333,434.00	**0.127**	**90**
4	12000797	KR 67	CL 67 G	NA	$ 48,482,402.00	**0.192**	**90**
5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	$ 151,372,303.00	**0.319**	**90**
6	12000816	KR 67	CL 67 F	NA	$ 94,369,100.00	**0.053**	**90**
7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	$ 13,889,437.00	**0.147**	**90**
8	12000661	CL 87	KR 49 A	KR 49	$ 60,805,901.00	**0.094**	**90**
9	12000809	CL 85 A	KR 50	KR 49 A	$ -	**0.315**	**20**
10	12000858	KR 49 A	CL 85	CL 85 A	$ 68,288,103.00	**0.082**	**90**
11	12000858	CL 94	KR 65	KR 64	$ 5,491,015.00	**0.112**	**90**
12	12000359	TV 60 C	CL 90	CL 93	$ 11,765,641.00	**0.201**	**90**
13	12000850	KR 21	CL 89	CL 87		**0.384**	**0**
14	12001510	KR 21	CL 82	NA		**0.094**	**0**
15	12001341	CL 83	KR 22 A	KR 24		**0.271**	**0**
16	12001351	CL 83	KR 22 A	KR 22		**0.109**	**0**
17	12001409	KR 21	CL 83	NA		**0.104**	**0**
18	12000922	CL 86 A	AV 24	KR 23		**0.169**	**0**
19	12000741	KR 22	CL 89	CL 88		**0.139**	**0**
20	12000329	CL 93 A	KR 60 B	TV 60 C	$ 135,179,092.00	**0.299**	**70**
21	12000392	CL 93	KR 58	KR 57	$ 59,510,046.00	**0.212**	**90**
22	12003240	CL 73	KR 22	NA	$ 51,474,997.00	**0.048**	**90**
23	12001652	CL 70 A	KR 55	KR 54	$ 45,259,746.00	**0.169**	**90**
24	12001694	KR 55	CL 70 BIS	CL 70	$ 76,200,985.00	**0.139**	**90**
25	12001030	CL 74 A	KR 58	KR 60	$ 35,424,108.00	**0.172**	**90**
26	12002479	CL 63 F	KR 27 A	KR 27		**0.219**	**0**
27	12002478	CL 63 F	KR 27	NA		**0.039**	**0**
28	12002472	CL 66	KR 22	KR 21	$ 63,985,683.00	**0.218**	**90**
29	12000497	CL 79 BIS	KR 63	KR 64		**0.192**	**0**
30	12002498	KR 20	CL 66	CL 67	$ 19,470,029.00	**0.33**	**90**
31	12002070	DG 74 BIS	KR 20 B	CL 75	$ 59,398,506.00	**0.104**	**0**
32	12000239	KR 58	CL 94 B	CL 94 C		**0.301**	**0**
33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	$ 152,896,676.00	**0.215**	**90**
34	12001860	KR 54	CL 67ABIS	CL 67ABISA		**0.102**	**0**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **111** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **30.83%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

35	12000076	CL 99	KR 48	KR 49	$	73,382,139.00	**0.213**	**90**
36	12000458	CL 91 A	KR 58	KR 50	$	44,499,353.00	**0.115**	**90**
37	12000511	CL 90	KR 58	KR 50	$	8,761,909.00	**0.067**	**90**
38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	$	23,070,693.00	**0.156**	**0**
39	12000849	CL 79 A	KR 55	KR 55	$	23,274,670.00	**0.111**	**0**
40	12002192	KR 21	CL 89	CL 87	$	75,261,940.00	**0.384**	**90**
41	12000891	KR 55 B	CL 78	CL 79	$	66,672,691.00	**0.31**	**90**
42	12001383	KR 27	CL 83 BIS	CL 82			**0.274**	**0**
43	12003442	KR 51	DG 71 BIS	DG 71 BIS	$	75,303,730.00	**0.28**	**47**

VALOR A LA FECHA DE LOS SEGMENTOS INTERVENIDOS $ 1,571,947,441.00

TOTAL KM CARRIL DEL CONTRATO	**8.072**
TOTAL KM CARRIL EJECUTADO	**0.371**

COMPONENTE SOCIAL

EMPLEOS POBLACIÓN VULNERABLE
Total de empleos generados: 30
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 30
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD:1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 1 ALEJANDRO SUAREZ QUE TIENE EL 51% DE MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES
JOVENES MENORES DE 24 AÑOS: 3

EMPLEOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Total de empleos generados:30
Total de mano de obra no calificada:8 del 26% de las 30 personas
Total de mano de obra no calificada de la localidad: 0
PORCENTAJE 0%
A LA FECHA SE HAN ENTREGADO 223 VOLANTES EN LA LOCALIDAD CON LA CONVOCATORIA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

EMPLEOS PARA LA MUJER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:30
TOTAL MUJERES: 6
% MUJERES QUE SERIA EL 20% DEL 13.8%

ING. YENNIFFER ACOSTA SALGADO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. ANDRES MURILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 13 Del: 12 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **118** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **32.78%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO OBRA NO. 491-2024 - CONSORCIO BYR SG BU 001		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLBU-CMA-510-2024 (120758) - CONSORCIO MM 2024**	
Contratista	**CONSORCIO VBYR SG BU 001**	**Interventor**	**CONSORCIO INTERVIAL 2024**
Objeto del Contrato	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**	**Objeto del Contrato**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**
Nit	901.901.203-3	**Nit**	901845467-0
Contrato No.	491-2025	**Contrato No.**	510-2024
Representante Legal	ING. GEOVANNY PAEZ	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	ANDRES MURILLO MAYORGA
Fecha de suscripción del contrato	20/12/2024	**Fecha de suscripción del contrato**	21/12/2024
Valor Inicial	**$ 4,278,022,774**	**Valor Inicial**	**$ 531,463,226.00**
Adición al contrato de obra	**$ -**	**Adición al contrato de interventoría**	**$ -**
Valor Actualizado	**$ 4,278,022,774**	**Valor Actualizado**	**$ 531,463,226.00**
Plazo Inicial	6 MESES	**Plazo Inicial**	6 MESES
Plazo Actualizado	6 MESES	**Plazo Actualizado**	6 MESES
prorroga 1	0	**prorroga 1**	0
Fecha de Iniciación	20/01/2025	**Fecha de Iniciación**	20/01/2025
Fecha de Terminación inicial	20/07/2025	**Fecha de Terminación**	20/07/2025
fecha de terminación final	20/07/2025	**fecha de terminación final**	20/07/2025

INFORMACIÓN POLIZAS


CONTRATO DE OBRA


AMPARO	**VIGENCIAS**	**VALOR**
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO		
CUMPLIMIENTO	20/01/2025 - 20/11/2025	$ 855,604,554.80
PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025 - 20/07/2028	$ 427,802,277.40
CALIDAD DEL SERVICIO	20/07/2025 - 20/07/2027	$ 35,205,674.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/07/2025 - 20/07/2028	$ 694,525,655.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/07/2025 - 20/07/2026	$ 553,675,504.00
POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
PATRONAL	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
CONTRATISTAS	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2025- 19/11/2025	$ 106.292.645,20
PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025- 20/07/2028	$ 26.573.161,30
CALIDAD DEL SERVICIO	20/07/2025- 20/07/2030	$ 159.438.967,80

GRAFICA % PROGRAMADO VS EJECUTADO

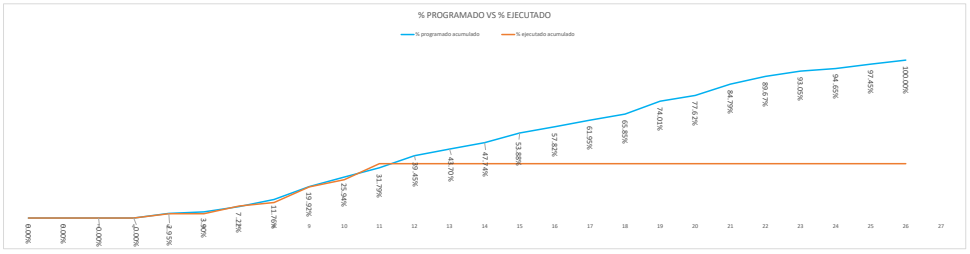



ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO

FRENTE DE OBRA	**% AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO**				
	% PROGRAMADO TOTAL DE OBRA	% ATRASO O ADELANTO TOTAL DE OBRA	Valor Presupuestado Total	Valor total Ejecutado Total	Valor Total por Ejecutar
ACCIONES DE MOVILIDAD	42.43%	**3.26%**	$ 4,278,022,774	$ 1,954,931,399	$ 2,323,091,375
			100%	45.70%	54.30%

RESUMEN

PORCENTAJE SEMANAL PROGRAMADO	2.97%	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO DE OBRA	42.43%
VR. EJECUTADO OBRA EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 83,857,303	VR. EJECUTADO TOTAL OBRA	$ 1,954,931,399.00
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO SEMANA	1.96%	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	45.70%
PORCENTAJE DE ATRASO / ADELANTO SEMANAL	**-1.01%**	PORCENTAJE DE ATRASO/ ADELANTO TOTAL DE OBRA	**3.26%**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

	FRENTE DE OBRA	**% AVANCE SEMANAL DE OBRA**				
		% Avance Programado Semanal	**% Avance Ejecutado Semanal**	**Valor Programado Semanal**	**Valor Ejecutado Semanal**	**atraso en la Semana**
1	ACCIONES DE MOVILIDAD	**2.97%**	**1.96%**	**$ 127,162,717**	**$ 83,857,303**	**-$ 43,305,414**
				100.0%		**-1.01%**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 13 Del: 12 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **118** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **32.78%**


Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO


AVANCE EJECUTADO SEMANAL

Semana Anterior (S)	Semana Actual (S)
$ 45,395,550	$ 83,857,303.00

OBSERVACIONES:Esta semana continuaron las lluvias, se realizo la estabilización de los fallos que se evidenciaron la semana despues de realizar la instalación de la primera capa de asfalto instalado en el tramo correspondiente al puente.
El contrato lleva a la fecha un avance fisico real de 66%, un avance financiero del 45.70%

GRAFICA VALOR TOTAL PROGRAMADO VS EJECUTADO





1	INFORME TÉCNICO						
No	**Ubicación de la actividad**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**%avance de cada actividad realizada por CIV semanalmente**	**Jornada de Intervencio**	**Tipo de interención**	**Descripción de la Actividad**
El contratista presentó el balance actualizado, incluyendo los No Previstos (NP), junto con el cronograma actualizado. Esta interventoría dio su aval a dicho balance. El presente informe se ajusta a esta actualización, por lo tanto, ya no se presentan atrasos en las actividades, ya que estos ítems han sido incorporados.							
1	12002432	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
2	12001662	jue 8/05/2025	-	50.0%	Diurno	Acción de movilidad	Se iniciaron actividades de corte, demolición y retiro del material. Debido a las intensas lluvias, este tramo permanecerá abierto para concluir las actividades la próxima semana.
3	12003134	mar 08/04/25	mie 09/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
4	12000797	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
5	12001109	Mie 09/04/25	Vie 11/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
6	12000816	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
7	12002698	Lun 17/03/25	Lun 17/03/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
8	12000661	sab 12/04/25	dom 13/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
9	12000809	jue 27/03/25	abierto	20.0%	Intervenido, pendiente concepto de especialistas por fallos que se presentaron y se requiere el PMT diurno	Acción de movilidad	Este segmento vial se encuentra pendiente, puesto que en el momento que se iniciaron actividades, se evidenciaron varias zonas con problemas estructurales, se esta a la espera del concepto por parte del especialista, la actualización del PMT a Diurno. Este viernes 16 de mayo de inicio la instalación del nuevo PMT, para inicio el dia 9 de mayo, la intervención va a realizarse con cierre total y diurno.
10	12000858	vie 14/03/25	sab 15/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
11	12000201	mar 11/03/25	mie 12/03/25	90.0%	nocturno (herradura)	Acción de movilidad	
12	12000359	mar 11/03/25	mie 12/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
13	12000850	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
14	12001510	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
15	12001341	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
16	12001351	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
17	12001409	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
18	12000922	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
19	12000741	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
20	12000329	lun 10/03/2	lun 10/03/2	70.0%	Diurno	Acción de movilidad	
21	12000392	jue 13/03/25	jue 13/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
22	12003240	lun 17/03/25	mar 18/03/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
23	12001652	jue 03/04/25	jue 03/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
24	12001694	vie 04/04/25	vie 04/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 13 Del: 12 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: 118 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 32.78%

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

25	12001030	sab 25/04/25	sab 25/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
26	12002479	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
27	12002478	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
28	12002472	vie 21/03/025	sab 22/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
29	12000497	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	la comunidad no permite intervenirlo	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
30	12002498	vie 21/03/25	sab 22/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
31	12002070	mar 30/04/2025	mie 30/04/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
32	12000239	Sab 17/05/2025	abierto	0.0%	Diurno	Mantenimiento	El dia Sabado 17 de mayo se inicia la instalación del PMT aprobado, las actividades de obra se realizaran en jornada diurna y el cierre es total del tramo.
33	12001889	mar 18/03/25	jue 20/03/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
34	12001860	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	No se ejecutó	Mantenimiento	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
35	12000076	sab 15/03/25	dom 16/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
36	12000458	jue 13/03/25	vie 14/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
37	12000511	mar 11/03/25	mar 11/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
38	12001917	lun 28/04/2025	mar 29/04/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
39	12000849	mie 30/04/2025	jue 01/04/2025	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
40	12002192	jue 20/03/25	vie 21/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
41	12000891	lun 07/04/25	lun 07/04/25	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
42	12001383	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Mantenimiento	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
43	12003442	semana del 21 al 25 de abril	Mie 14/05/2025	95.0%	en ejecucion	Puente	Esta semana se continuaron las actividades de intervención en el segmento. Se llevaron a cabo los mantenimientos de las áreas que presentaron fallos la semana pasada, tras la aplicación de la primera capa de asfalto, y se realizó el correspondiente mejoramiento de la base. Además, se siguió con el fresado de la carpeta asfáltica que estaba pendiente por intervenir y se llevaron a cabo pruebas de carga en la estructura restante. Se instaló asfalto en dos capas, asegurando su adecuada compactación y sellado. Adicionalmente, esta interventoría recibió las actividades de pintura de los módulos que forman parte de las barandas (pasamanos) del puente. Se observó que una baranda está algo suelta y requiere un ajuste, mientras que otro módulo necesita un mejor acabado en la base, ya que el concreto está suelto y abierto, dejando expuesta la base de la baranda.

SEGMENTOS VIALES EN INTERVENCION

No.	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	VALOR	KM CARRIL	% AVANCE
1	12002432	KR 14 A	CL 70 A	CL 70		**0.262**	**0**
2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	$ 815,002.00	**0.229**	**95**
3	12003134	DG 76 BIS	KR 52	KR 51	$ 27,333,434.00	**0.127**	**95**
4	12000797	KR 67	CL 67 G	NA	$ 48,482,402.00	**0.192**	**95**
5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	$ 151,372,303.00	**0.319**	**95**
6	12000816	KR 67	CL 67 F	NA	$ 94,369,100.00	**0.053**	**95**
7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	$ 13,889,437.00	**0.147**	**95**
8	12000661	CL 87	KR 49 A	KR 49	$ 60,805,901.00	**0.094**	**95**
9	12000809	CL 85 A	KR 50	KR 49 A	$ -	**0.315**	**20**
10	12000858	KR 49 A	CL 85	CL 85 A	$ 68,288,103.00	**0.082**	**95**
11	12000858	CL 94	KR 65	KR 64	$ 5,491,015.00	**0.112**	**95**
12	12000359	TV 60 C	CL 90	CL 93	$ 11,765,641.00	**0.201**	**95**
13	12000850	KR 21	CL 89	CL 87		**0.384**	**0**
14	12001510	KR 21	CL 82	NA		**0.094**	**0**
15	12001341	CL 83	KR 22 A	KR 24		**0.271**	**0**
16	12001351	CL 83	KR 22 A	KR 22		**0.109**	**0**
17	12001409	KR 21	CL 83	NA		**0.104**	**0**
18	12000922	CL 86 A	AV 24	KR 23		**0.169**	**0**
19	12000741	KR 22	CL 89	CL 88		**0.139**	**0**
20	12000329	CL 93 A	KR 60 B	TV 60 C	$ 135,179,092.00	**0.299**	**70**
21	12000392	CL 93	KR 58	KR 57	$ 59,510,046.00	**0.212**	**95**
22	12003240	CL 73	KR 22	NA	$ 51,474,997.00	**0.048**	**95**
23	12001652	CL 70 A	KR 55	KR 54	$ 45,259,746.00	**0.169**	**95**
24	12001694	KR 55	CL 70 BIS	CL 70	$ 76,200,985.00	**0.139**	**95**
25	12001030	CL 74 A	KR 58	KR 60	$ 35,424,108.00	**0.172**	**95**
26	12002479	CL 63 F	KR 27 A	KR 27		**0.219**	**0**
27	12002478	CL 63 F	KR 27	NA		**0.039**	**0**
28	12002472	CL 66	KR 22	KR 21	$ 63,985,683.00	**0.218**	**95**
29	12000497	CL 79 BIS	KR 63	KR 64		**0.192**	**0**
30	12002498	KR 20	CL 66	CL 67	$ 19,470,029.00	**0.33**	**95**
31	12002070	DG 74 BIS	KR 20 B	CL 75	$ 59,398,506.00	**0.104**	**0**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 13 Del: 12 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **118** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **32.78%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

32	12000239	KR 58	CL 94 B	CL 94 C			**0.301**	**0**
33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	$	152,896,676.00	**0.215**	**95**
34	12001860	KR 54	CL 67ABIS	CL 67ABISA			**0.102**	**0**
35	12000076	CL 99	KR 48	KR 49	$	73,382,139.00	**0.213**	**95**
36	12000458	CL 91 A	KR 58	KR 50	$	44,499,353.00	**0.115**	**95**
37	12000511	CL 90	KR 58	KR 50	$	8,761,909.00	**0.067**	**95**
38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	$	19,471,740.00	**0.156**	**0**
39	12000849	CL 79 A	KR 55	KR 55	$	23,274,670.00	**0.111**	**0**
40	12002192	KR 21	CL 89	CL 87	$	75,261,940.00	**0.384**	**95**
41	12000891	KR 55 B	CL 78	CL 79	$	66,672,691.00	**0.31**	**95**
42	12001383	KR 27	CL 83 BIS	CL 82			**0.274**	**0**
43	12003442	KR 51	DG 71 BIS	DG 71 BIS	$	116,417,212.00	**0.28**	**95**

VALOR A LA FECHA DE LOS SEGMENTOS INTERVENIDOS $ 1,609,153,860.00

TOTAL KM CARRIL DEL CONTRATO	**8.072**
TOTAL KM CARRIL EJECUTADO	**0.371**

COMPONENTE SOCIAL

EMPLEOS POBLACIÓN VULNERABLE
Total de empleos generados: 30
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 30
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD:1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 1 ALEJANDRO SUAREZ QUE TIENE EL 51% DE MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES
JOVENES MENORES DE 24 AÑOS: 3

EMPLEOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Total de empleos generados:30
Total de mano de obra no calificada:8 del 26% de las 30 personas
Total de mano de obra no calificada de la localidad: 0
PORCENTAJE 0%
A LA FECHA SE HAN ENTREGADO 223 VOLANTES EN LA LOCALIDAD CON LA CONVOCATORIA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

EMPLEOS PARA LA MUJER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:30
TOTAL MUJERES: 6
% MUJERES QUE SERIA EL 20% DEL 13.8%

ING. YENNIFFER ACOSTA SALGADO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. ANDRES MURILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 14 Del: 19 de mayo de 2025 Al: 25 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **125** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **34.72%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO OBRA NO. 491-2024 - CONSORCIO BYR SG BU 001		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLBU-CMA-510-2024 (120758) - CONSORCIO MM 2024**	
Contratista	**CONSORCIO VBYR SG BU 001**	**Interventor**	**CONSORCIO INTERVIAL 2024**
Objeto del Contrato	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**	**Objeto del Contrato**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 510-2024 CINT (120758) – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**
Nit	901.901.203-3	**Nit**	901845467-0
Contrato No.	491-2025	**Contrato No.**	510-2024
Representante Legal	ING. GEOVANNY PAEZ	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	ANDRES MURILLO MAYORGA
Fecha de suscripción del contrato	20/12/2024	**Fecha de suscripción del contrato**	21/12/2024
Valor Inicial	**$ 4,278,022,774**	**Valor Inicial**	**$ 531,463,226.00**
Adición al contrato de obra	$ -	**Adición al contrato de interventoría**	$ -
Valor Actualizado	**$ 4,278,022,774**	**Valor Actualizado**	**$ 531,463,226.00**
Plazo Inicial	6 MESES	**Plazo Inicial**	6 MESES
Plazo Actualizado	6 MESES	**Plazo Actualizado**	6 MESES
prorroga 1	0	**prorroga 1**	0
Fecha de Iniciación	20/01/2025	**Fecha de Iniciación**	20/01/2025
Fecha de Terminación inicial	20/07/2025	**Fecha de Terminación**	20/07/2025
fecha de terminación final	20/07/2025	**fecha de terminación final**	20/07/2025

INFORMACIÓN POLIZAS


CONTRATO DE OBRA


AMPARO	**VIGENCIAS**	**VALOR**
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO		
CUMPLIMIENTO	20/01/2025 - 20/11/2025	$ 855,604,554.80
PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025 - 20/07/2028	$ 427,802,277.40
CALIDAD DEL SERVICIO	20/07/2025 - 20/07/2027	$ 35,205,674.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/07/2025 - 20/07/2028	$ 694,525,655.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/07/2025 - 20/07/2026	$ 553,675,504.00
POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
PATRONAL	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
CONTRATISTAS	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/12/2024 - 20/07/2025	$ 569,400,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2025- 19/11/2025	$ 106.292.645,20
PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025- 20/07/2028	$ 26.573.161,30
CALIDAD DEL SERVICIO	20/07/2025- 20/07/2030	$ 159.438.967,80

GRAFICA % PROGRAMADO VS EJECUTADO

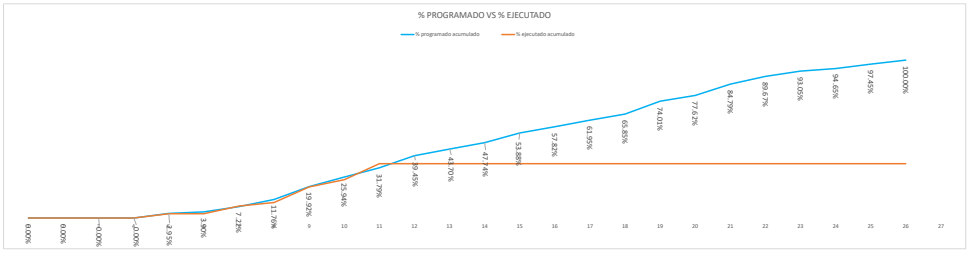



ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO

FRENTE DE OBRA	**% AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO**				
	% PROGRAMADO TOTAL DE OBRA	% ATRASO O ADELANTO TOTAL DE OBRA	Valor Presupuestado Total	Valor total Ejecutado Total	Valor Total por Ejecutar
ACCIONES DE MOVILIDAD	47.13%	**3.32%**	$ 4,278,022,774	$ 2,157,996,989	$ 2,120,025,785
			100%	50.44%	49.56%

RESUMEN

PORCENTAJE SEMANAL PROGRAMADO	4.69%	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO DE OBRA	47.13%
VR. EJECUTADO OBRA EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 203,065,590	VR. EJECUTADO TOTAL OBRA	$ 2,157,996,989.00
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO SEMANA	4.75%	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	50.44%
PORCENTAJE DE ATRASO / ADELANTO SEMANAL	**0.05%**	PORCENTAJE DE ATRASO/ ADELANTO TOTAL DE OBRA	**3.32%**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

	FRENTE DE OBRA	**% AVANCE SEMANAL DE OBRA**				
		% Avance Programado Semanal	**% Avance Ejecutado Semanal**	**Valor Programado Semanal**	**Valor Ejecutado Semanal**	**atraso en la Semana**
1	ACCIONES DE MOVILIDAD	**4.69%**	**4.75%**	**$ 200,757,014**	**$ 203,065,590**	**$ 2,308,576**
				100.0%		**0.05%**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 14 Del: 19 de mayo de 2025 Al: 25 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **125** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **34.72%**


Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO


AVANCE EJECUTADO SEMANAL

Semana Anterior (S)	Semana Actual (S)
$ 83,857,303	$ 203,065,590.00

OBSERVACIONES: Esta semana se registraron intensas lluvias
El contrato lleva a la fecha un avance un avance financiero del 50.44%

GRAFICA VALOR TOTAL PROGRAMADO VS EJECUTADO





1	INFORME TÉCNICO						
No	**Ubicación de la actividad**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**%avance de cada actividad realizada por CIV semanalmente**	**Jornada de Intervencio**	**Tipo de interención**	**Descripción de la Actividad**
El contratista presentó el balance actualizado, incluyendo los No Previstos (NP), junto con el cronograma actualizado. Esta interventoría dio su aval a dicho balance. El presente informe se ajusta a esta actualización, por lo tanto, ya no se presentan atrasos en las actividades, ya que estos ítems han sido incorporados.							
1	12002432	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
2	12001662	jue 8/05/2025	-	50.0%	Diurno	Acción de movilidad	Se iniciaron actividades de corte, demolición y retiro del material. Debido a las intensas lluvias, este tramo permanecerá abierto para concluir las actividades la próxima semana.
3	12003134	mar 08/04/25	mie 09/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
4	12000797	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
5	12001109	Mie 09/04/25	Vie 11/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
6	12000816	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
7	12002698	Lun 17/03/25	Lun 17/03/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
8	12000661	sab 12/04/25	dom 13/04/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
9	12000809	jue 27/03/25	abierto	20.0%	Intervenido, pendiente concepto de especialistas por fallos que se presentaron y se requiere el PMT diurno	Acción de movilidad	Este segmento vial se encuentra pendiente, puesto que en el momento que se iniciaron actividades, se evidenciaron varias zonas con problemas estructurales, se esta a la espera del concepto por parte del especialista, la actualización del PMT a Diurno
10	12000858	vie 14/03/25	sab 15/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
11	12000201	mar 11/03/25	mie 12/03/25	90.0%	nocturno (herradura)	Acción de movilidad	
12	12000359	mar 11/03/25	mie 12/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
13	12000850	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
14	12001510	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
15	12001341	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
16	12001351	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
17	12001409	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
18	12000922	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
19	12000741	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Acción de movilidad	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
20	12000329	lun 10/03/2	lun 10/03/2	70.0%	Diurno	Acción de movilidad	
21	12000392	jue 13/03/25	jue 13/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
22	12003240	lun 17/03/25	mar 18/03/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
23	12001652	jue 03/04/25	jue 03/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
24	12001694	vie 04/04/25	vie 04/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	
25	12001030	sab 25/04/25	sab 25/04/25	90.0%	Diurno	Acción de movilidad	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 14 Del: 19 de mayo de 2025 Al: 25 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: 125 Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: 34.72%

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

26	12002479	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
27	12002478	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	no se han iniciado	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
28	12002472	vie 21/03/025	sab 22/03/25	90.0%	nocturno	Acción de movilidad	
29	12000497	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	la comunidad no permite intervenirlo	Acción de movilidad	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
30	12002498	vie 21/03/25	sab 22/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
31	12002070	mar 30/04/2025	mie 30/04/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
32	12000239	mie 21/05/2025	en ejecucion	40.0%	Diurno	Mantenimiento	Se iniciaron las actividades de corte, demolición y retiro de material. Debido a las intensas lluvias, se evidenciaron tres fallos que se están tratando. Según lo observado en el sitio, el remanente tras el fresado se encuentra en perfecto estado. Sin embargo, al momento de realizar el mejoramiento conforme a la sugerencia del especialista del contratista, se constató que el tipo de material presente en el lugar no es óptimo y no presenta un comportamiento adecuado al aplicar el cemento al 3%. Para abordar esta situación, se procederá con el fresado, la compactación y el mejoramiento de las zonas puntuales, así como la aplicación de una estructura de asfalto en dos capas..
33	12001889	mar 18/03/25	jue 20/03/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
34	12001860	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	No se ejecutó	Mantenimiento	Segmento vial posible exclusion del listado de priorización inicial
35	12000076	sab 15/03/25	dom 16/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
36	12000458	jue 13/03/25	vie 14/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
37	12000511	mar 11/03/25	mar 11/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
38	12001917	lun 28/04/2025	mar 29/04/2025	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
39	12000849	mie 30/04/2025	jue 01/04/2025	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
40	12002192	jue 20/03/25	vie 21/03/25	90.0%	nocturno	Mantenimiento	
41	12000891	lun 07/04/25	lun 07/04/25	90.0%	Diurno	Mantenimiento	
42	12001383	aun no se ha iniciado	aun no se ha iniciado	0.0%	Falta aprobación del IDPC	Mantenimiento	Segmento se encuentra pendiente por aprobación por IDPC para dar inicio a las actividades
43	12003442	semana del 21 al 25 de abril	Aun estan en actividades	80.0%	en ejecucion	Puente	Esta semana se continuaron las actividades de intervención del segmento; sin embargo, se evidenció que el tramo contenía una cantidad considerable de material arcilloso en su estructura, lo que resultó en una excavaciónpara realizar un mejoramiento de 40 cm de rajon y 20 cm de sello. Debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante la semana, al intentar extender la primera capa de mezcla asfáltica, se observaron dos fallos. Por lo tanto, esta interventoría solicitó el retiro de dicha mezcla y la realización de un mejoramiento en el sello instalado. Esta actividad se llevará a cabo la próxima semana, ya que las lluvias continúan, lo que podría causar más daños en la estructura Este tramo no se ha recibido a satisfacción, hasta que el contratista atienda las observaciones realizadas en la carpeta instalada

TOS VIALES EN INTERVENCION

No.	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	VALOR	KM CARRIL	% AVANCE
1	12002432	KR 14 A	CL 70 A	CL 70		**0.262**	**0**
2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	$ -	**0.229**	**90**
3	12003134	DG 76 BIS	KR 52	KR 51	$ 27,333,434.00	**0.127**	**90**
4	12000797	KR 67	CL 67 G	NA	$ 48,482,402.00	**0.192**	**90**
5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	$ 151,372,303.00	**0.319**	**90**
6	12000816	KR 67	CL 67 F	NA	$ 94,369,100.00	**0.053**	**90**
7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	$ 13,889,437.00	**0.147**	**90**
8	12000661	CL 87	KR 49 A	KR 49	$ 60,805,901.00	**0.094**	**90**
9	12000809	CL 85 A	KR 50	KR 49 A	$ -	**0.315**	**20**
10	12000858	KR 49 A	CL 85	CL 85 A	$ 68,288,103.00	**0.082**	**90**
11	12000858	CL 94	KR 65	KR 64	$ 5,491,015.00	**0.112**	**90**
12	12000359	TV 60 C	CL 90	CL 93	$ 11,765,641.00	**0.201**	**90**
13	12000850	KR 21	CL 89	CL 87		**0.384**	**0**
14	12001510	KR 21	CL 82	NA		**0.094**	**0**
15	12001341	CL 83	KR 22 A	KR 24		**0.271**	**0**
16	12001351	CL 83	KR 22 A	KR 22		**0.109**	**0**
17	12001409	KR 21	CL 83	NA		**0.104**	**0**
18	12000922	CL 86 A	AV 24	KR 23		**0.169**	**0**
19	12000741	KR 22	CL 89	CL 88		**0.139**	**0**
20	12000329	CL 93 A	KR 60 B	TV 60 C	$ 135,179,092.00	**0.299**	**70**
21	12000392	CL 93	KR 58	KR 57	$ 59,510,046.00	**0.212**	**90**
22	12003240	CL 73	KR 22	NA	$ 51,474,997.00	**0.048**	**90**
23	12001652	CL 70 A	KR 55	KR 54	$ 45,259,746.00	**0.169**	**90**
24	12001694	KR 55	CL 70 BIS	CL 70	$ 76,200,985.00	**0.139**	**90**
25	12001030	CL 74 A	KR 58	KR 60	$ 35,424,108.00	**0.172**	**90**
26	12002479	CL 63 F	KR 27 A	KR 27		**0.219**	**0**
27	12002478	CL 63 F	KR 27	NA		**0.039**	**0**
28	12002472	CL 66	KR 22	KR 21	$ 63,985,683.00	**0.218**	**90**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 14 Del: 19 de mayo de 2025 Al: 25 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **125** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **34.72%**

Nombre del Supervisor: ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría: ING. ANDRES MURILLO

SEGMENTO

29	12000497	CL 79 BIS	KR 63	KR 64			**0.192**	**0**
30	12002498	KR 20	CL 66	CL 67	$	19,470,029.00	**0.33**	**90**
31	12002070	DG 74 BIS	KR 20 B	CL 75	$	59,398,506.00	**0.104**	**0**
32	12000239	KR 58	CL 94 B	CL 94 C	$	230,345,827.00	**0.301**	**0**
33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	$	152,896,676.00	**0.215**	**90**
34	12001860	KR 54	CL 67ABIS	CL 67ABISA			**0.102**	**0**
35	12000076	CL 99	KR 48	KR 49	$	73,382,139.00	**0.213**	**90**
36	12000458	CL 91 A	KR 58	KR 50	$	44,499,353.00	**0.115**	**90**
37	12000511	CL 90	KR 58	KR 50	$	8,761,909.00	**0.067**	**90**
38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	$	19,471,740.00	**0.156**	**0**
39	12000849	CL 79 A	KR 55	KR 55	$	23,274,670.00	**0.111**	**0**
40	12002192	KR 21	CL 89	CL 87	$	75,261,940.00	**0.384**	**90**
41	12000891	KR 55 B	CL 78	CL 79	$	66,672,691.00	**0.31**	**90**
42	12001383	KR 27	CL 83 BIS	CL 82			**0.274**	**0**
43	12003442	KR 51	DG 71 BIS	DG 71 BIS	$	116,417,212.00	**0.28**	**47**

VALOR A LA FECHA DE LOS SEGMENTOS INTERVENIDOS $ 1,838,684,685.00

TOTAL KM CARRIL DEL CONTRATO	**8.072**
TOTAL KM CARRIL EJECUTADO	**0.371**

COMPONENTE SOCIAL

EMPLEOS POBLACIÓN VULNERABLE
Total de empleos generados: 30
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 30
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD:1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 1 ALEJANDRO SUAREZ QUE TIENE EL 51% DE MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES
JOVENES MENORES DE 24 AÑOS: 3

EMPLEOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Total de empleos generados:30
Total de mano de obra no calificada:8 del 26% de las 30 personas
Total de mano de obra no calificada de la localidad: 0
PORCENTAJE 0%
A LA FECHA SE HAN ENTREGADO 223 VOLANTES EN LA LOCALIDAD CON LA CONVOCATORIA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

EMPLEOS PARA LA MUJER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:30
TOTAL MUJERES: 6
% MUJERES QUE SERIA EL 20% DEL 13.8%

ING. YENNIFFER ACOSTA SALGADO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. ANDRES MURILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 9.
REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 11 Del: 28 de abril de 2025 Al: 4 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **104** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **28.89%**


Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 01

CIV 12002070
Se realizo fresado

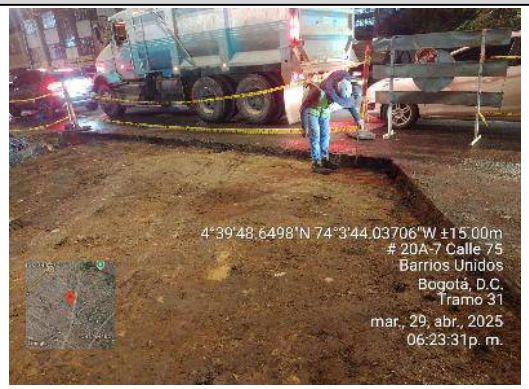

Fotografía 02

CIV 12002070
Se toma niveles y espesores del area a intervenir



Fotografía 03

CIV 12002070
Compactación de la base que se le realiza mejoramiento



Fotografía 04

CIV 12002070
Se realiza instalación de la mezcla asfaltica

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 11 Del: 28 de abril de 2025 Al: 4 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **104** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **28.89%**


Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 05

CIV 12002070
Se realiza imprimación

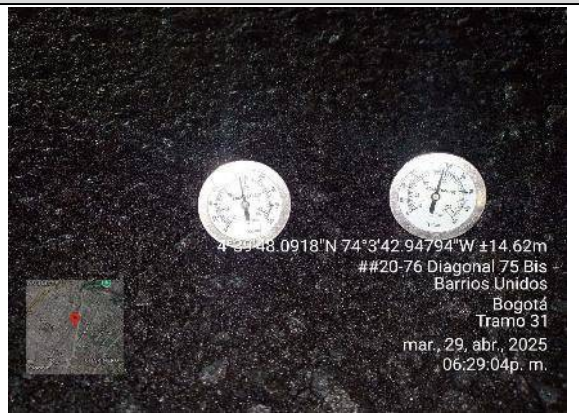

Fotografía 06

CIV 12002070
Se realiza toma de temperaturas al descargue de la mezcla en obra



Fotografía 07

CIV 12000849
Se realiza corte de las areas definidas para mantenimiento



Fotografía 08

CIV 12000849
Se realiza demolicion con minicargador

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 11 Del: 28 de abril de 2025 Al: 4 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **104** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **28.89%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fotografía 09

CIV 12000849
Se realiza compactación a la base y prueba de carga



Fotografía 10

CIV 12000849
Se toman niveles

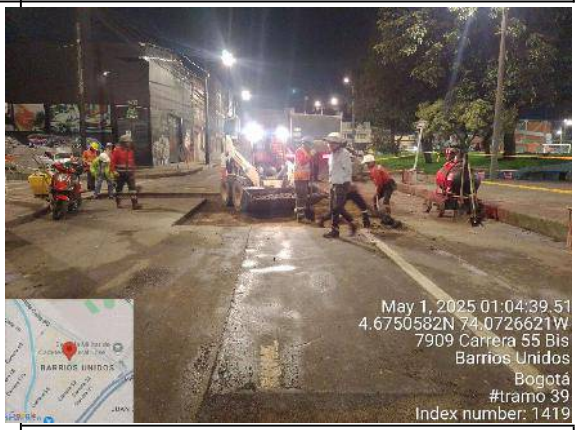

Fotografía 11

CIV 12000849
Se realiza retiro escombro y material remanente



Fotografía 12

CIV 12000849
Se extiende la primera capa mezcla asfaltico

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 11 Del: 28 de abril de 2025 Al: 4 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **104** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **28.89%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

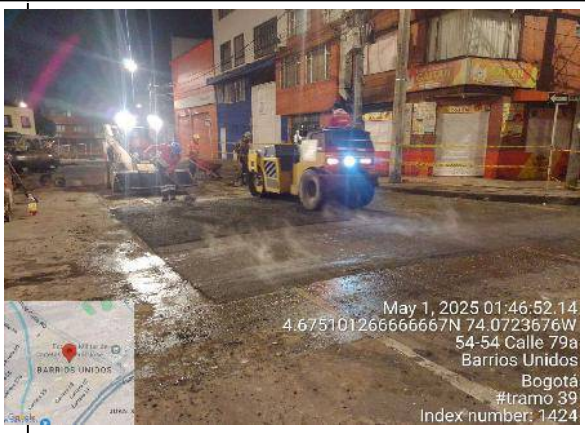

Fotografía 13

CIV 12000849

Nivelación y compactación de mezcla asfaltica del area intervenida



Fotografía 14

CIV 12000849

Compactación de la mezcla asfaltica

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **111** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **30.83%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 01

CIV 12003442
Se iniciaa las actividades de excavación en la base del puente, costado sur del tramo



Fotografía 02

CIV 12003442
Cargue de material excavado, se evidenció la presencia de material en mal estado, con una alta cantidad de arcilla que presenta características de alta plasticidad



Fotografía 03

CIV 12003442
Demolición de material de mejoramiento (rajón), en pro de que cumpla con las medidas reglamentarias.



Fotografía 04

CIV 12003442
En el tramo se encontraron tres ductos de 3 pulgadas correspondientes a la red de luminarias existente, ubicados a ambos lados del puente. Estos ductos resultaron afectados durante la excavación debido a que se encontraban expuestos. Se organizó el trabajo y se procedió a repararlos.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **111** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **30.83%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 05

CIV 12003442

Instalación de material de mejoramiento (rajón)



Fotografía 06

CIV 12003442

Instalación de material granular, que sera parte del sello



Fotografía 07

CIV 12003442

Toma de medidas de profundidad de excavación



Fotografía 08

CIV 12003442

Se realiza protección de la red de luminaria existente

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **111** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **30.83%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 09

CIV 12003442
Se hace la inspeccion (acabado de pintura, soldadura) de los modulos de las barandas del puente.



Fotografía 10

CIV 12003442
Continuación de instalación de material granular.



Fotografía 11

CIV 12003442
Compactacón del material granular



Fotografía 12

CIV 12003442
Toma de niveles.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **111** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **30.83%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 13

CIV 12003442
estabilizacion de un fallo con cemento



Fotografía 14

CIV 12003442
Instalación de la mezcla asfaltica



Fotografía 15

CIV 12003442
Compactación de mezcla asfaltic



Fotografía 16

CIV 12003442
Despues de realizada la instalación de asfalto, se evidencio presencia de agrietamiento y alcochamiento de la mezcla MDC instalada

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 12 Del: 5 de mayo de 2025 Al: 11 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **111** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **30.83%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 17

CIV 12003442

Se realizaron las pruebas de carga correspondientes y se evidenció un posible daño en la estructura, lo que requiere una mayor intervención.



Fotografía 18

CIV 12003442

Actividades de limpieza



Fotografía 19

CIV 12001662

Se dio inicio a las actividades en el CIV 12001662, que incluyen corte, demolición y carga de material



Fotografía 20

CIV 12001662

ISe dio inicio a las actividades en el CIV 12001662, que incluyen corte, demolición y carga de material

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 13 Del: 12 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **118** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **32.78%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 01

CIV 12003442
Se reinicia las actividades de mejoramiento de las areas que presentaron fallos despues de instalada la primera capa de asfalto



Fotografía 02

CIV 12003442
Se realiza el mejoramiento de las areas que presentaron fallos despues de instalada la primera capa de asfalto



Fotografía 03

CIV 12003442
Se realiza corte de las areas remanentes de las zonas de mayor intervención



Fotografía 04

CIV 12003442
Se inicia las actividades de fresado en las areas pendientes

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 13 Del: 12 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **118** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **32.78%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 05

CIV 12003442
Se realiza imprimación



Fotografía 06

CIV 12003442
Toma de niveles y marcación



Fotografía 07

CIV 12003442
Imprimación



Fotografía 08

CIV 12003442
Se instala mezcla asfaltica

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 13 Del: 12 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **118** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **32.78%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fotografía 09

CIV 12003442
Compactación de la mezcla asfaltica instalada



Fotografía 10

CIV 12003442
Sello de la mezcla asfaltica instalada

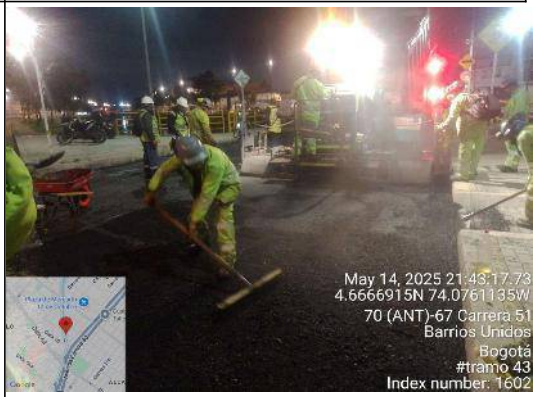

Fotografía 11

CIV 12003442
Constinuación de la instalación de la mezcla asfaltica



Fotografía 12

CIV 12003442
Sello de la mezcla asfaltica instalada

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 13 Del: 12 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **118** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **32.78%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 13

CIV 12003442

Sello de la mezcla asfaltica instalada



Fotografía 14

CIV 12003442

Retiro de la maquinaria, limpieza y organización del segmento intervenido en la noche anterior

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 14 Del: 19 de mayo de 2025 Al: 25 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **125** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **34.72%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 01

CIV 12000239
Se inicia las actividades de fresado



Fotografía 02

CIV 12000239
Cargue de material fresado



Fotografía 03

CIV 12000239
Se realiza el mejoramiento del material en sitio de acuerdo a las especificaciones dadas por el especialisat ddel pavimentos del contratista.



Fotografía 04

CIV 12000239
Se realiza apiques para verificar el estado de la estructura

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Semana Número: 14 Del: 19 de mayo de 2025 Al: 25 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días transcurridos: **125** Plazo total: 6 MESES % de tiempo transcurrido: **34.72%**

Nombre del Supervisor ING. GUILLERMO SALAMANCA Nombre del Director Interventoría ING. ANDRES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

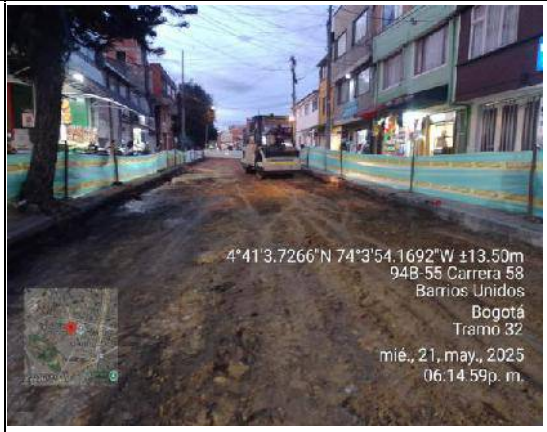

Fotografía 05

CIV 12000239
Se realiza compactación del material



Fotografía 06

CIV 12000239
Se realiza cargue del material fresado



Fotografía 07

CIV 12000239
Se realiza compactación




Fotografía 08

CIV 112000239
Se realiza retiro de los fallos que se presentron despues de una jornada de lluvias

ANEXO 10
CRONOGRAMA – BALANCE GENERAL – FLUJO DE INVERSION

ANEXO 10.1
CRONOGRAMA ACTUALIZADO


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
0	**0**	**CRONOGRAMA DETALLADO_COP_491_2024**	**155 días**	**lun 20/01/25**	**vie 18/07/25**	**$ 4.278.022.774,00**		
1	1	Hojas de Vida del Recurso Humano	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 0,00		2CC;3CC;4CC;5CC;6
2	2	(Hito) Aprobar hojas de vida y documentacción de ingreso	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 0,00	1CC	6
3	3	Documentos correspondientes a la maquinaria mínima exigida	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 0,00	1CC	6
4	4	(Hito) Aprobar documentos correspondientes a la maquinaria mínima exigida	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 0,00	1CC	6
5	5	ACTA DE INICIO	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 0,00	1CC	6;9;11;13;15;17;19;21;23;2
6	6	Visita de reconocimiento de los segmentos identificados como prioridad con asistencia de la interventoria y el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, Director de Obra, especialistas.	9 días	lun 20/01/25	jue 30/01/25	$ 0,00	5;1;2;3;4	45
7	**7**	**Actividades etapa previa**	**28 días**	**lun 20/01/25**	**jue 20/02/25**	**$ 117.352.245,00**		
8	**7.1**	**Documentos preliminares**	**28 días**	**lun 20/01/25**	**jue 20/02/25**	**$ 0,00**		
9	7.1.1	Cronograma General del Proyecto V0 (Incluye Etapa Previa y Etapa de Ejecución).	6 días	lun 20/01/25	lun 27/01/25	$ 0,00	5	10
10	7.1.2	(Hito) Aprobar Cronograma General del Proyecto V0 (Incluye Etapa Previa y Etapa de Ejecución).	6 días	lun 27/01/25	lun 3/02/25	$ 0,00	9	45
11	7.1.3	Desglose del A.I.U.	25 días	lun 20/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	5	12
12	7.1.4	(Hito) Aprobar desglose del A.I.U.	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	11	45
13	7.1.5	Análisis de Precios Unitarios Contractuales.	25 días	lun 20/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	5	14
14	7.1.6	(Hito) Análisis de Precios Unitarios Contractuales.	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	13	45
15	7.1.7	Plan Anual de Caja – PAC	6 días	lun 20/01/25	lun 27/01/25	$ 0,00	5	16
16	7.1.8	(Hito) Aprobar Plan Anual de Caja – PAC	6 días	lun 27/01/25	lun 3/02/25	$ 0,00	15	45
17	7.1.9	Plan de Calidad del proyecto, así como el Plan de Inspección de Ensayos de laboratorio para el control de calidad de materiales y producto terminado	25 días	lun 20/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	5	18
18	7.1.10	(Hito) Aprobar plan de calidad	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	17	45
19	7.1.11	Programa de implementación de manejo Ambiental en Obra	10 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	5	20
20	7.1.12	(Hito) Aprobar programar de implementación de manejo ambiental en obra	18 días	vie 31/01/25	jue 20/02/25	$ 0,00	19	45
21	7.1.13	Programa de Manejo Ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD)	10 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	5	22
22	7.1.14	(Hito) aprobar programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición RCD	3 días	vie 31/01/25	mar 4/02/25	$ 0,00	21	45
23	7.1.15	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	25 días	lun 20/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	5	24
24	7.1.16	(Hito) Aprobar Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	23	45
25	7.1.17	Plan de manejo de tráfico (PMT) general y/o específicos del proyecto de los segmentos que serán intervenidos durante la Etapa de Construcción	25 días	lun 20/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	5	26
26	7.1.18	(Hito) Aprobar Plan de manejo de trafico (PMT)	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	25	45
27	7.1.19	Plan de Gestión Social	5 días	lun 20/01/25	sáb 25/01/25	$ 0,00	5	28
28	7.1.20	(Hito) Aprobar Plan de Gestión Social	5 días	sáb 25/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	27	29
29	7.1.21	Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto	15 días	vie 31/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	28	30
30	7.1.22	(Hito) Aprobar acta de vecindad	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	29	45
31	**7.2**	**Actividades de diagnostico**	**28 días**	**lun 20/01/25**	**jue 20/02/25**	**$ 117.352.245,00**		
32	7.2.1	Replanteo general a nivel planimétrico y altimétrico del listado de segmentos viales	25 días	lun 20/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	5	33
33	7.2.2	(Hito) Aprobar replanteo general a nivel planimétrico y altimétrico del listado de segmentos viales	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	32	45
34	7.2.3	Fichas de reconocimiento por segmento vial.	25 días	lun 20/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	5	35;36CC+5 días
35	7.2.4	(Hito) Aprobación de fichas de reconocimiento por segmento vial	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	34	45
36	7.2.5	Actas y/o hojas de vida de cada segmento	20 días	sáb 25/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	34CC+5 días	37;38CC+5 días
37	7.2.6	(Hito) Aprobación actas y/o hojas de vida de cada segmento	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	36	45
38	7.2.7	Presupuesto (por segmento vial y compilado) y cronograma de obra definitivo y detallado para la ejecución de las obras en los segmentos viales establecidos por el FDLBU	15 días	vie 31/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	36CC+5 días	39
39	7.2.8	(Hito) Aprobación presupuesto por segmento vial y compilado y cronograma definitivo dompilado) y cronograma de obra definitivo y detallado para la ejecución de las obras en los segmentos viales establecidos por el FDLBU	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	38	45
40	7.2.9	Informe ejecutivo de inspección visual de redes húmedas de campo por CIV	10 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	5	41
41	7.2.10	(Hito) Aprobación informe ejecutivo de inspección visual de redes húmedas de campo por CIV	10 días	vie 31/01/25	mar 11/02/25	$ 0,00	40	45
42	7.2.11	Información de intervenciones a las diferentes empresas de servicios públicos (EAAB, ETB, CODENSA, GAS NATURAL)	10 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	5	45
43	7.2.12	Informe de actividades de diagnostico desarrolladas en etapa previa.	25 días	lun 20/01/25	lun 17/02/25	$ 0,00	5	44
44	7.2.13	(Hito) aprobación informe de actividades de diagnostico desarrolladas en etapa previa	3 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 117.352.245,00	43	45
45	7.2.14	(Hito) Fin actividades previas	0 días	jue 20/02/25	jue 20/02/25	$ 0,00	10;12;14;16;18;20;22;24;2	47FC+1 día
46	**8**	**ACTIVIDADES DE OBRA**	**125 días**	**vie 21/02/25**	**vie 18/07/25**	**$ 3.393.973.077,00**		
47	8.1	(Hito) Inicio de actividades de obra	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00	45FC+1 día	49;50;718;755;756;757;75
48	**8.2**	**Acciones de movilidad**	**125 días**	**vie 21/02/25**	**vie 18/07/25**	**$ 3.171.660.785,00**		
49	**8.2.1**	**12000329 (20)**	**83 días**	**vie 21/02/25**	**jue 29/05/25**	**$ 141.604.444,00**	**47**	
50	8.2.1.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	vie 21/02/25	jue 27/02/25	$ 972.586,00	47	52;81CC+5 días
51	8.2.1.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 5.970.996,00	65CC	70
52	8.2.1.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 268.385,00	50	53CC;55CC;69CC
53	8.2.1.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 361.530,00	52CC	54CC
54	8.2.1.5	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACION	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 791.807,00	53CC	70
55	8.2.1.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 1.155.975,00	52CC	56CC;68CC
56	8.2.1.7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 95.042.720,00	55CC	57CC;58;65CC
57	8.2.1.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 2.370.305,00	56CC	70
58	8.2.1.9	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	2 días	jue 22/05/25	sáb 24/05/25	$ 751.400,00	56;462	59;64CC;80

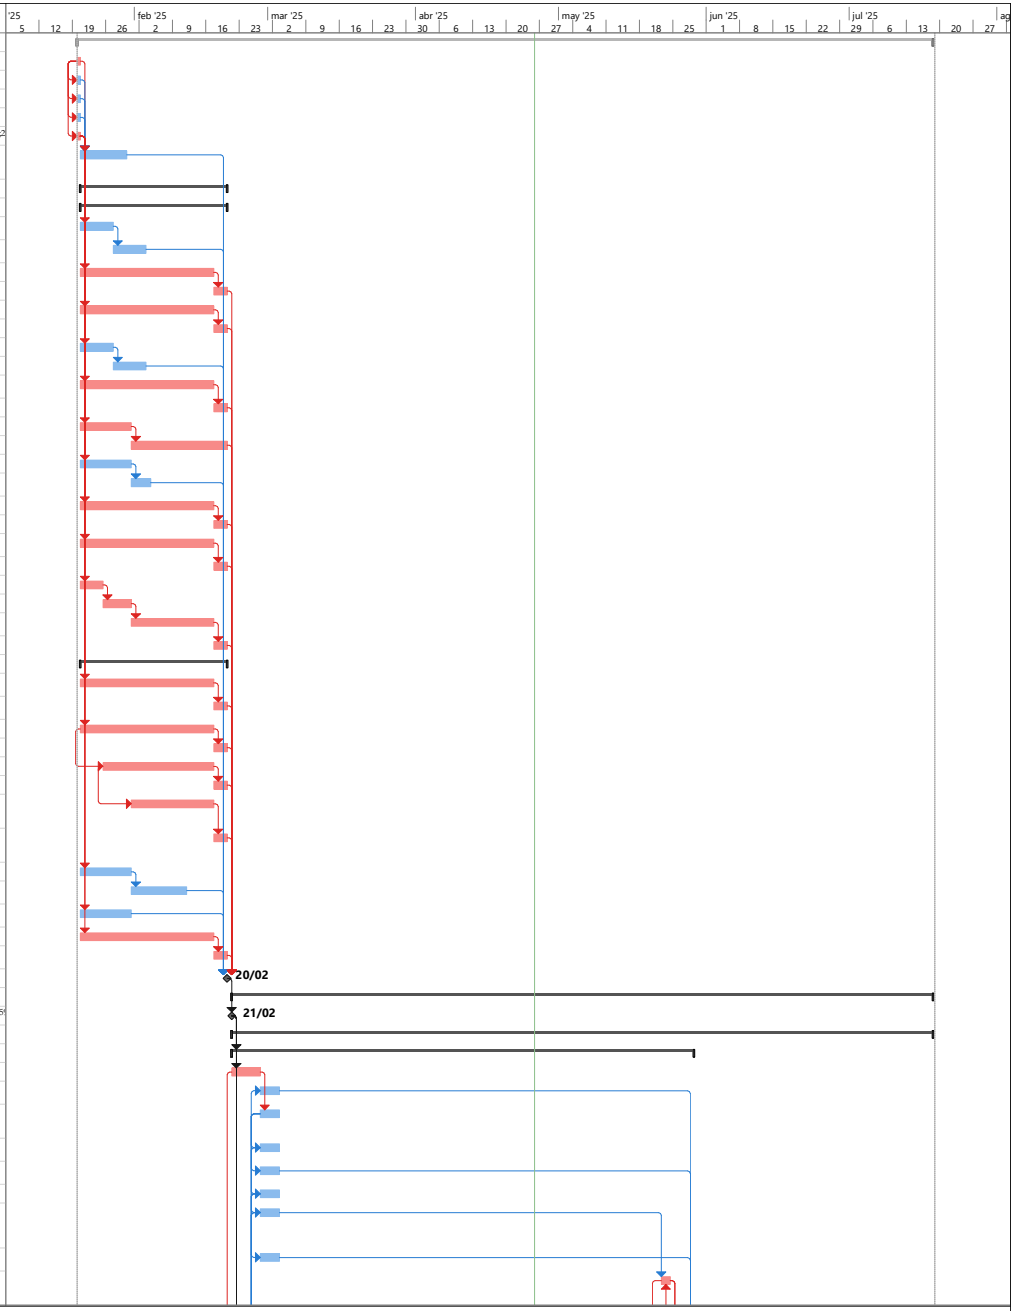

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
59	8.2.1.10	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	2 días	sáb 24/05/25	mar 27/05/25	$ 123.854,00	58	60
60	8.2.1.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	mar 27/05/25	jue 29/05/25	$ 1.219.386,00	59	61CC
61	8.2.1.12	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	2 días	mar 27/05/25	jue 29/05/25	$ 595.005,00	60CC	62CC
62	8.2.1.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	2 días	mar 27/05/25	jue 29/05/25	$ 292.967,00	61CC	63CC
63	8.2.1.14	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	2 días	mar 27/05/25	jue 29/05/25	$ 9.759.155,00	62CC	66CC
64	8.2.1.15	RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA DE SUMIDERO SL-100. CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LA PLACA DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE ANCLAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, ADHESIVO ESTRUCTURAL, CURADO, MARCO Y	2 días	jue 22/05/25	sáb 24/05/25	$ 1.686.155,00	58CC	70
65	8.2.1.16	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 10.600.442,00	56CC	51CC
66	8.2.1.17	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	mar 27/05/25	jue 29/05/25	$ 5.643.077,00	63CC	67CC
67	8.2.1.18	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	mar 27/05/25	jue 29/05/25	$ 1.917.696,00	66CC	70
68	8.2.1.19	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 246.590,00	55CC	70
69	8.2.1.20	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 1.834.413,00	52CC	70
70	8.2.1.21	Fin intervención CIV 12000329	0 días	jue 29/05/25	jue 29/05/25	$ 0,00	67;68;69;64;57;54;51	761
71	**8.2.2**	**12000201 (11)**	**77 días**	**jue 27/02/25**	**mié 28/05/25**	**$ 13.314.077,00**		
72	8.2.2.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	jue 27/02/25	sáb 1/03/25	$ 515.714,00	78CC	86
73	8.2.2.2	SELLO DE FISURAS	2 días	sáb 24/05/25	mar 27/05/25	$ 61.872,00	80CC	86
74	8.2.2.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓ	2 días	jue 27/02/25	sáb 1/03/25	$ 241.020,00	75CC	86
75	8.2.2.4	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	jue 27/02/25	sáb 1/03/25	$ 99.840,00	78CC	74CC
76	8.2.2.5	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	jue 27/02/25	sáb 1/03/25	$ 144.200,00	81CC	77CC;85CC
77	8.2.2.6	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN.	2 días	jue 27/02/25	sáb 1/03/25	$ 303.391,00	76CC	78CC
78	8.2.2.7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	jue 27/02/25	sáb 1/03/25	$ 8.404.623,00	77CC	79CC;72CC;80;75CC
79	8.2.2.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	jue 27/02/25	sáb 1/03/25	$ 204.720,00	78CC	86
80	8.2.2.9	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	2 días	sáb 24/05/25	mar 27/05/25	$ 353.600,00	58;78	82;73CC;93
81	8.2.2.10	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	3 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 56.160,00	50CC+5 días	76CC;94CC+3 días
82	8.2.2.11	DEMARCACIÓN PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	mar 27/05/25	mié 28/05/25	$ 86.010,00	80	83CC
83	8.2.2.12	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS,	1 día	mar 27/05/25	mié 28/05/25	$ 842.885,00	82CC	84CC
84	8.2.2.13	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 27/05/25	mié 28/05/25	$ 165.629,00	83CC	86
85	8.2.2.14	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	jue 27/02/25	sáb 1/03/25	$ 1.834.413,00	76CC	86
86	8.2.2.15	Fin intervención CIV 12000201	0 días	mié 28/05/25	mié 28/05/25	$ 0,00	72;73;74;79;84;85	761
87	**8.2.3**	**12000359 (12)**	**77 días**	**lun 3/03/25**	**sáb 31/05/25**	**$ 14.024.075,00**		
88	8.2.3.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	mié 5/03/25	jue 6/03/25	$ 513.028,00	97CC	101
89	8.2.3.2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 5/03/25	jue 6/03/25	$ 99.382,00	97CC	91CC;100CC
90	8.2.3.3	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	mié 5/03/25	jue 6/03/25	$ 111.935,00	94	97CC
91	8.2.3.4	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mié 5/03/25	jue 6/03/25	$ 8.360.849,00	89CC	92CC;93
92	8.2.3.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mié 5/03/25	jue 6/03/25	$ 203.782,00	91CC	101
93	8.2.3.6	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	2 días	mar 27/05/25	jue 29/05/25	$ 300.560,00	80;91	95;108
94	8.2.3.7	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	2 días	lun 3/03/25	mié 5/03/25	$ 234.000,00	81CC+3 días	90;109CC+3 días
95	8.2.3.8	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	jue 29/05/25	sáb 31/05/25	$ 78.990,00	93	96CC
96	8.2.3.9	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	2 días	jue 29/05/25	sáb 31/05/25	$ 839.022,00	95CC	98CC
97	8.2.3.10	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	1 día	mié 5/03/25	jue 6/03/25	$ 917.694,00	90CC	89CC;88CC
98	8.2.3.11	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 29/05/25	vie 30/05/25	$ 365.550,00	96CC	99CC
99	8.2.3.12	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 29/05/25	vie 30/05/25	$ 164.870,00	98CC	101
100	8.2.3.13	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	mié 5/03/25	jue 6/03/25	$ 1.834.413,00	89CC	101
101	8.2.3.14	Fin intervención CIV 12000359	0 días	vie 30/05/25	vie 30/05/25	$ 0,00	92;99;100;88	761
102	**8.2.4**	**12000511(37)**	**73 días**	**jue 6/03/25**	**vie 30/05/25**	**$ 9.893.625,00**		
103	8.2.4.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	$ 454.555,00	106CC	112

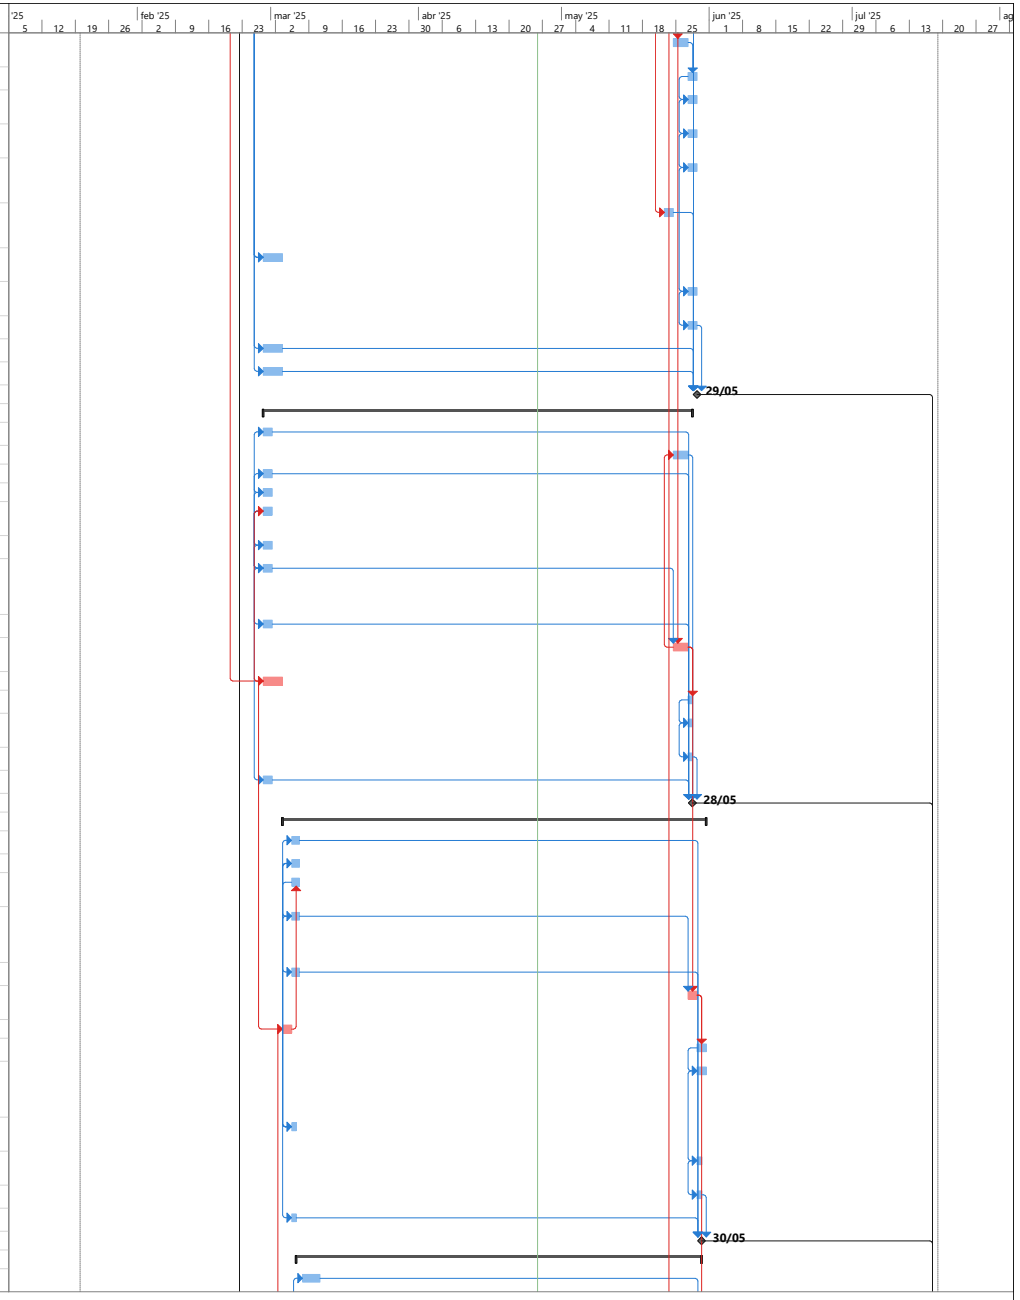

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
104	8.2.4.2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	$ 64.376,00	109	105CC;111CC;115
105	8.2.4.3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	vie 7/03/25	lun 10/03/25	$ 244.398,00	104CC	106CC
106	8.2.4.4	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	$ 6.770.391,00	105CC	107CC;110CC;103CC;108
107	8.2.4.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	$ 132.002,00	106CC	112
108	8.2.4.6	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	jue 29/05/25	vie 30/05/25	$ 88.400,00	93;106	112;119
109	8.2.4.7	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	2 días	jue 6/03/25	vie 7/03/25	$ 58.500,00	94CC+3 días	104;120
110	8.2.4.8	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	2 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	$ 246.590,00	106CC	112
111	8.2.4.9	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	$ 1.834.413,00	104CC	112
112	8.2.4.10	Fin intervención CIV 12000359	0 días	vie 30/05/25	vie 30/05/25	$ 0,00	107;103;108;110;111	761
113	**8.2.5**	**12000392 (21)**	**73 días**	**vie 7/03/25**	**mar 3/06/25**	**$ 64.264.316,00**		
114	8.2.5.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 2.479.392,00	126CC	130
115	8.2.5.2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 513.008,00	120;104	116CC;129CC
116	8.2.5.3	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 30.570,00	115CC	117CC
117	8.2.5.4	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 43.190.426,00	116CC	118CC;119;126CC
118	8.2.5.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 1.051.913,00	117CC	130
119	8.2.5.6	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	$ 954.720,00	108;117	121;138
120	8.2.5.7	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	2 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	$ 456.300,00	109	115;139
121	8.2.5.8	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRILICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 103.212,00	119	122CC
122	8.2.5.9	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 389.260,00	121CC	123CC
123	8.2.5.10	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 541.147,00	122CC	124CC
124	8.2.5.11	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 292.967,00	123CC	125CC
125	8.2.5.12	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 4.330.997,00	124CC	127CC
126	8.2.5.13	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	2 días	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 4.740.618,00	117CC	114CC
127	8.2.5.14	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 2.504.322,00	125CC	128CC
128	8.2.5.15	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 851.051,00	127CC	130
129	8.2.5.16	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 1.834.413,00	115CC	130
130	8.2.5.17	Fin intervención CIV 12000511	0 días	mar 3/06/25	mar 3/06/25	$ 0,00	114;118;128;129	761
131	**8.2.6**	**12000458 (36)**	**72 días**	**mar 11/03/25**	**mié 4/06/25**	**$ 47.946.074,00**		
132	8.2.6.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$ 2.479.392,00	144CC	148
133	8.2.6.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓ	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$ 241.020,00	134CC	148
134	8.2.6.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 12/03/25	jue 13/03/25	$ 374.828,00	136CC	133CC
135	8.2.6.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$ 12.618,00	139	136CC;144CC;147CC
136	8.2.6.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$ 31.546.520,00	135CC	137CC;138;134CC
137	8.2.6.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$ 768.577,00	136CC	148
138	8.2.6.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$ 141.440,00	119;136	140;155
139	8.2.6.8	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	2 días	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$ 327.600,00	120	135;156
140	8.2.6.9	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 389.260,00	138	141CC
141	8.2.6.10	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 406.663,00	140CC	142CC
142	8.2.6.11	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLAST	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 292.967,00	141CC	143CC
143	8.2.6.12	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 3.164.429,00	142CC	145CC
144	8.2.6.13	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	1 día	mié 12/03/25	jue 13/03/25	$ 3.462.573,00	135CC	132CC
145	8.2.6.14	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 1.881.956,00	143CC	146CC
146	8.2.6.15	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 621.818,00	145CC	148
147	8.2.6.16	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$ 1.834.413,00	135CC	148
148	8.2.6.17	Fin intervención CIV 12000359	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25	$ 0,00	132;133;137;146;147	761
149	**8.2.7**	**12000858 (10)**	**71 días**	**mié 12/03/25**	**jue 5/06/25**	**$ 69.531.238,00**		

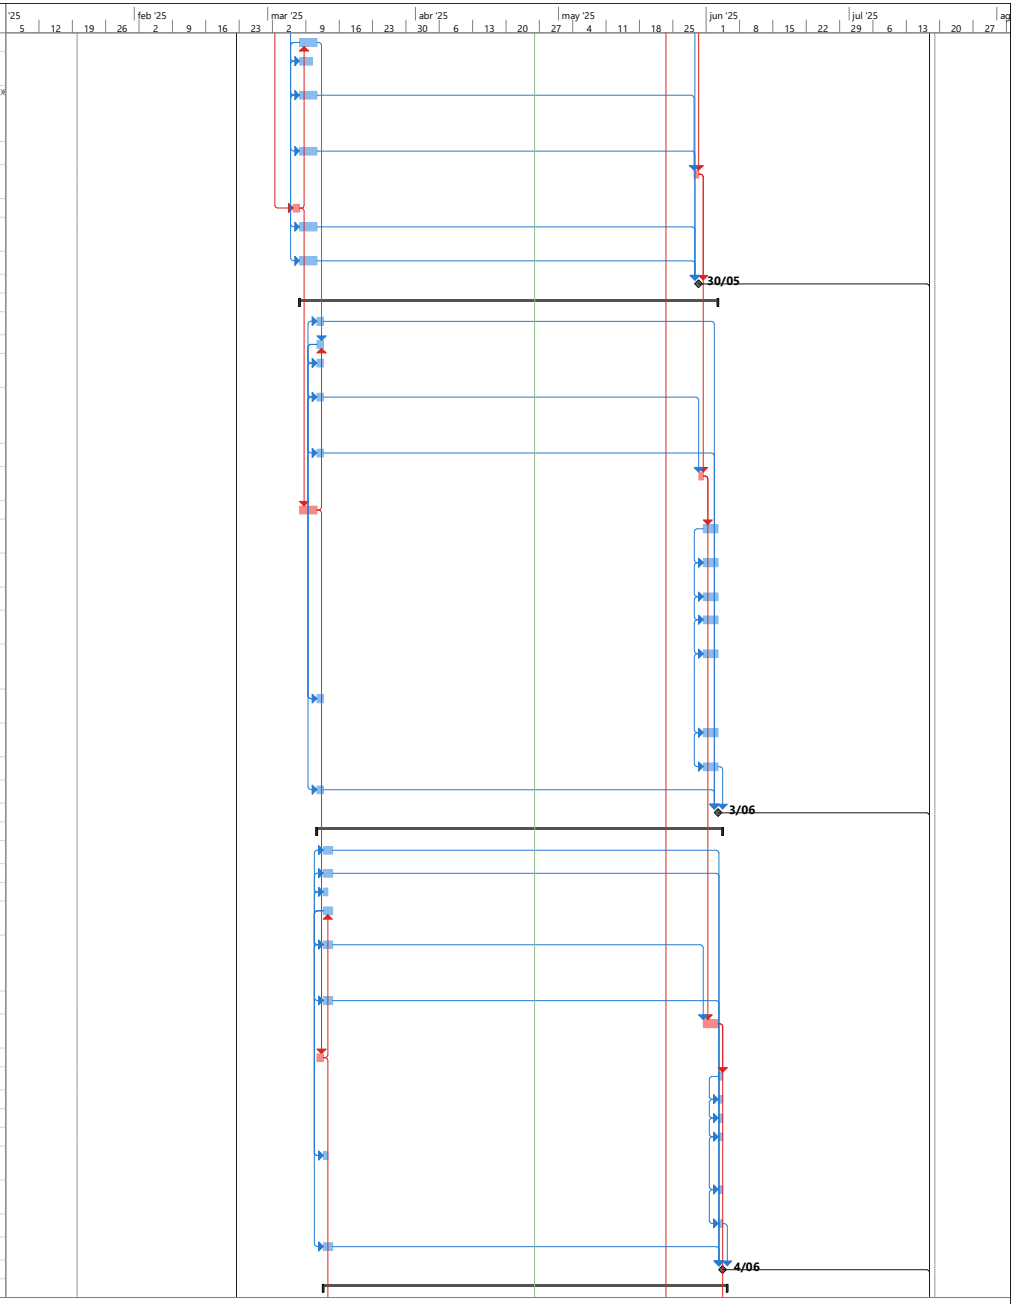

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
150	8.2.7.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 2.479.392,00	153CC	167
151	8.2.7.2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 552.885,00	152CC	
152	8.2.7.3	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 89.945,00	156	151CC;153CC;166CC
153	8.2.7.4	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 46.546.438,00	152CC	154CC;155;163CC;150CC
154	8.2.7.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 1.133.680,00	153CC	
155	8.2.7.6	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	$ 176.800,00	138;153	157;175
156	8.2.7.7	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$ 351.000,00	139	152;176
157	8.2.7.8	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 189.222,00	155	158CC
158	8.2.7.9	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 611.694,00	157CC	159CC
159	8.2.7.10	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 707.908,00	158CC	160CC
160	8.2.7.11	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 595.005,00	159CC	161CC
161	8.2.7.12	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 292.967,00	160CC	162CC
162	8.2.7.13	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 4.667.650,00	161CC	164CC
163	8.2.7.14	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 5.108.976,00	153CC	167
164	8.2.7.15	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 3.276.059,00	162CC	165CC
165	8.2.7.16	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 917.204,00	164CC	167
166	8.2.7.17	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 1.834.413,00	152CC	167
167	8.2.7.18	Fin intervención CIV 12000858	0 días	jue 5/06/25	jue 5/06/25	$ 0,00	150;163;165;166	761
168	**8.2.8**	**12000076 (35)**	**70 días**	**vie 14/03/25**	**vie 6/06/25**	**$ 74.787.901,00**		
169	8.2.8.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	8 días	vie 14/03/25	mar 25/03/25	$ 3.856.832,00	183CC	187
170	8.2.8.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 120.510,00	171CC	187
171	8.2.8.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 584.626,00	172CC	170CC
172	8.2.8.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 86.232,00	176CC	173CC;171CC;186CC
173	8.2.8.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 49.216.657,00	172CC	174CC;183CC
174	8.2.8.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 1.198.764,00	173CC	187
175	8.2.8.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 1.348.277,00	155	177;196CC
176	8.2.8.8	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	5 días	vie 14/03/25	jue 20/03/25	$ 440.271,00	156	172CC;189
177	8.2.8.9	DEMARCACIÓN PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 129.015,00	175	178CC
178	8.2.8.10	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 472.672,00	177CC	179CC
179	8.2.8.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 590.255,00	178CC	180CC
180	8.2.8.12	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 595.005,00	179CC	181CC
181	8.2.8.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 292.967,00	180CC	182CC
182	8.2.8.14	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 4.920.808,00	181CC	184CC
183	8.2.8.15	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	2 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 5.402.062,00	173CC	169CC
184	8.2.8.16	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 2.731.585,00	182CC	185CC
185	8.2.8.17	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 966.950,00	184CC	187
186	8.2.8.18	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	vie 14/03/25	sáb 15/03/25	$ 1.834.413,00	172CC	187
187	8.2.8.19	Fin intervención CIV 12000076	0 días	vie 6/06/25	vie 6/06/25	$ 0,00	186;185;174;169;170	761
188	**8.2.9**	**12002698 (7)**	**65 días**	**jue 20/03/25**	**vie 6/06/25**	**$ 14.754.347,00**		
189	8.2.9.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	jue 20/03/25	sáb 22/03/25	$ 298.100,00	176	190;202
190	8.2.9.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	2 días	sáb 22/03/25	mié 26/03/25	$ 86.950,00	189	191CC;193CC;199CC
191	8.2.9.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	2 días	sáb 22/03/25	mié 26/03/25	$ 319.726,00	190CC	192CC
192	8.2.9.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	sáb 22/03/25	mié 26/03/25	$ 241.020,00	191CC	200
193	8.2.9.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	sáb 22/03/25	mar 25/03/25	$ 121.161,00	190CC	194CC

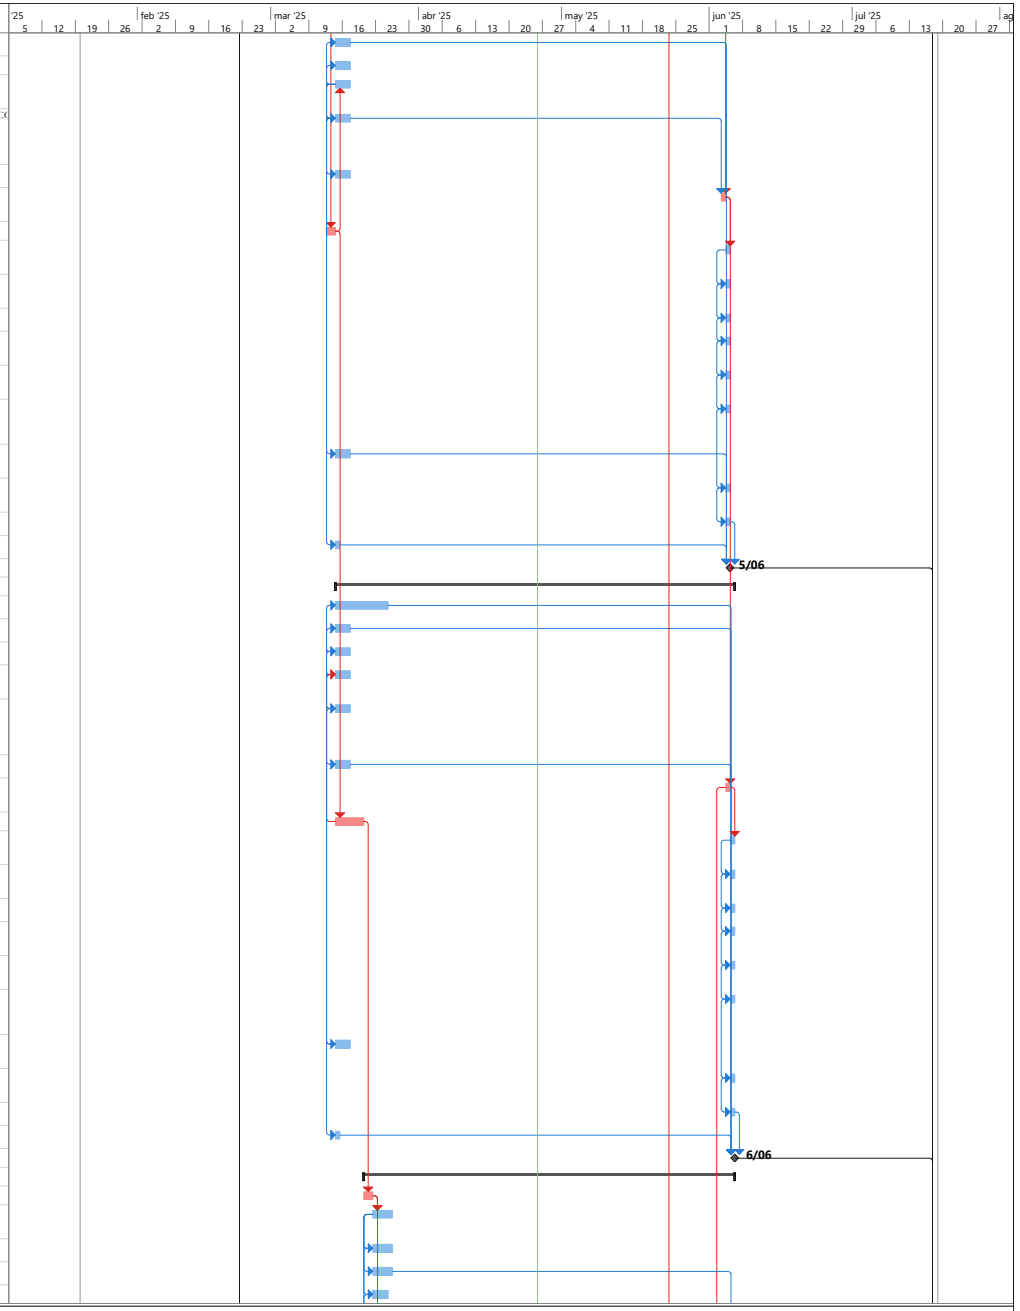

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
194	8.2.9.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	sáb 22/03/25	mié 26/03/25	$ 9.947.491,00	193CC	195CC;196
195	8.2.9.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	1 día	sáb 22/03/25	mar 25/03/25	$ 248.439,00	194CC	200
196	8.2.9.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 433.160,00	175CC;194	197;209
197	8.2.9.9	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 1.022.887,00	196	198CC
198	8.2.9.10	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 201.000,00	197CC	200
199	8.2.9.11	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	sáb 22/03/25	mar 25/03/25	$ 1.834.413,00	190CC	200
200	8.2.9.12	Fin intervención CIV 12002698	0 días	vie 6/06/25	vie 6/06/25	$ 0,00	192;195;198;199	761
201	**8.2.10**	**12003240 (22)**	**63 días**	**sáb 22/03/25**	**vie 6/06/25**	**$ 32.288.721,00**		
202	8.2.10.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	sáb 22/03/25	mié 26/03/25	$ 156.681,00	189	204;214
203	8.2.10.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 1.552.513,00	210CC	212
204	8.2.10.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 106.726,00	202	205CC;206CC
205	8.2.10.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 120.510,00	204CC	212
206	8.2.10.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 300.643,00	204CC	207CC
207	8.2.10.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 24.711.962,00	206CC	208CC;209
208	8.2.10.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 616.463,00	207CC	210CC
209	8.2.10.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	$ 132.600,00	196;207	212;221
210	8.2.10.9	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 2.756.210,00	208CC	211CC;203CC
211	8.2.10.10	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 1.834.413,00	210CC	212
212	8.2.10.11	Fin intervención CIV 12003240	0 días	vie 6/06/25	vie 6/06/25	$ 0,00	205;209;211;203	761
213	**8.2.11**	**12001889 (33)**	**63 días**	**mié 26/03/25**	**lun 9/06/25**	**$ 157.995.126,00**		
214	8.2.11.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	mié 26/03/25	mar 1/04/25	$ 671.668,00	202	216;242
215	8.2.11.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 8.471.256,00	228CC	
216	8.2.11.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 65.291,00	214	218CC;217CC
217	8.2.11.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 241.020,00	216CC	
218	8.2.11.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 1.288.810,00	216CC	219CC
219	8.2.11.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 105.973.559,00	218CC	220CC;221;228CC
220	8.2.11.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 2.642.679,00	219CC	
221	8.2.11.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	vie 6/06/25	sáb 7/06/25	$ 159.120,00	209;219	222;241
222	8.2.11.9	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 240.828,00	221	223CC
223	8.2.11.10	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 945.345,00	222CC	224CC
224	8.2.11.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 1.598.547,00	223CC	225CC
225	8.2.11.12	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 595.005,00	224CC	226CC
226	8.2.11.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 292.967,00	225CC	227CC
227	8.2.11.14	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 10.879.623,00	226CC	229CC
228	8.2.11.15	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 11.819.596,00	219CC	231CC;215CC
229	8.2.11.16	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 7.397.757,00	227CC	230CC
230	8.2.11.17	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 2.137.871,00	229CC	
231	8.2.11.18	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 739.771,00	228CC	232CC
232	8.2.11.19	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 1.834.413,00	231CC	233
233	8.2.11.20	Fin intervención CIV 12001889	0 días	vie 4/04/25	vie 4/04/25	$ 0,00	232	761
234	**8.2.12**	**12002192 (40)**	**58 días**	**mar 1/04/25**	**lun 9/06/25**	**$ 65.353.909,00**		
235	8.2.12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 3.094.281,00	243CC	245
236	8.2.12.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 120.510,00	238CC	245
237	8.2.12.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 599.056,00	239CC	245
238	8.2.12.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 136.990,00	242	239CC;236CC

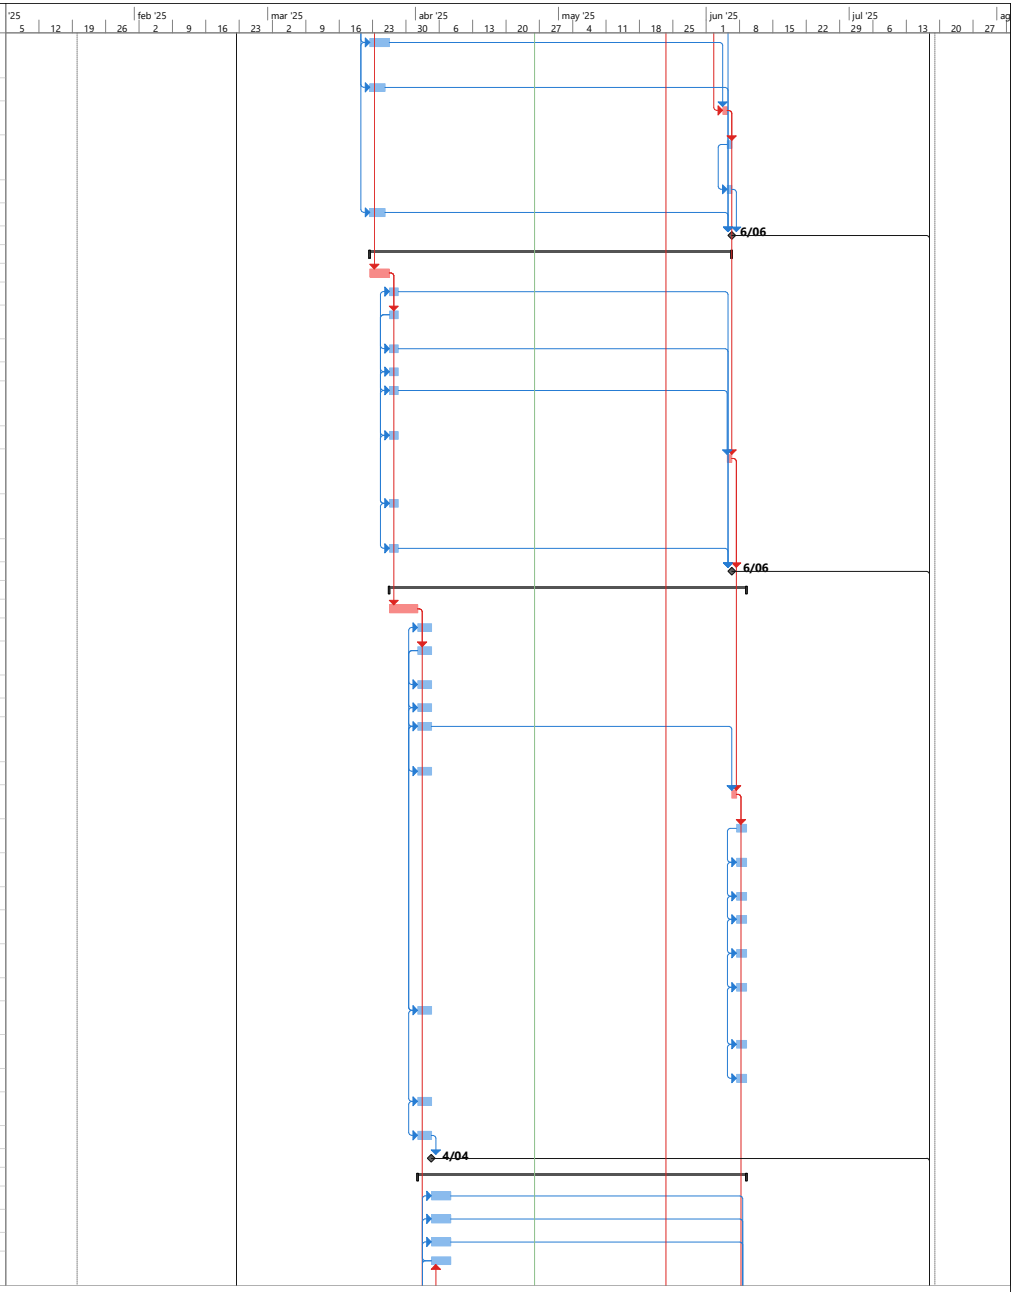

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
239	8.2.12.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 50.427.740,00	238CC	240CC;243CC;241;237CC
240	8.2.12.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 1.228.352,00	239CC	245
241	8.2.12.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	$ 1.028.180,00	221;239	245;253
242	8.2.12.8	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	$ 1.349.396,00	214	238;254
243	8.2.12.9	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 5.534.991,00	239CC	244CC;235CC
244	8.2.12.10	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 1.834.413,00	243CC	245
245	8.2.12.11	Fin intervención CIV 12002192	0 días	lun 9/06/25	lun 9/06/25	$ 0,00	235;236;237;240;241;244	761
246	**8.2.13**	**12002472 (28)**	**57 días**	**vie 4/04/25**	**mié 11/06/25**	**$ 59.893.317,00**		
247	8.2.13.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	mar 8/04/25	mié 9/04/25	$ 2.664.520,00	256CC	259
248	8.2.13.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	mar 8/04/25	mié 9/04/25	$ 361.530,00	249CC	259
249	8.2.13.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mar 8/04/25	mié 9/04/25	$ 515.757,00	250CC	248CC
250	8.2.13.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	mar 8/04/25	mié 9/04/25	$ 594.825,00	254	251CC;256CC;249CC
251	8.2.13.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mar 8/04/25	mié 9/04/25	$ 43.423.887,00	250CC	252CC;253
252	8.2.13.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mar 8/04/25	mié 9/04/25	$ 1.057.549,00	251CC	259
253	8.2.13.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	lun 9/06/25	mar 10/06/25	$ 1.458.600,00	241;251	259;255;268
254	8.2.13.8	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	$ 766.479,00	242	250;269
255	8.2.13.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 10/06/25	mié 11/06/25	$ 435.252,00	253	257CC
256	8.2.13.10	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	2 días	mar 8/04/25	mié 9/04/25	$ 4.766.243,00	250CC	247CC;258CC
257	8.2.13.11	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 10/06/25	mié 11/06/25	$ 2.014.262,00	255CC	259
258	8.2.13.12	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	mar 8/04/25	mié 9/04/25	$ 1.834.413,00	256CC	259
259	8.2.13.13	Fin intervención CIV 12002472	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00	247;248;252;253;257;258	761
260	**8.2.14**	**12002498 (30)**	**54 días**	**mar 8/04/25**	**mié 11/06/25**	**$ 20.244.162,00**		
261	8.2.14.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	$ 1.377.440,00	265CC	271
262	8.2.14.2	SELLO DE FISURAS	1 día	mar 10/06/25	mié 11/06/25	$ 2.887.360,00	268CC	271
263	8.2.14.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	$ 156.957,00	264CC	265CC
264	8.2.14.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	$ 24.730,00	269	263CC
265	8.2.14.5	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	2 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	$ 198.573,00	263CC	266CC;261CC
266	8.2.14.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	$ 13.219.772,00	265CC	267CC;268
267	8.2.14.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	$ 321.837,00	266CC	270CC
268	8.2.14.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	mar 10/06/25	mié 11/06/25	$ 106.080,00	253;266	262CC;280
269	8.2.14.9	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	3 días	mar 8/04/25	jue 10/04/25	$ 117.000,00	254	264;273
270	8.2.14.10	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	$ 1.834.413,00	267CC	271
271	8.2.14.11	Fin intervención CIV 12002498	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00	261;262;270	761
272	**8.2.15**	**12000797 (4)**	**55 días**	**jue 10/04/25**	**lun 16/06/25**	**$ 73.657.203,00**		
273	8.2.15.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	jue 10/04/25	lun 14/04/25	$ 476.960,00	269	275;289
274	8.2.15.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 1.377.440,00	283CC	287
275	8.2.15.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 62.780,00	273	276CC
276	8.2.15.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 120.510,00	275CC	277CC
277	8.2.15.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 624.000,00	276CC	278CC
278	8.2.15.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 51.305.112,00	277CC	279CC;280
279	8.2.15.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 1.279.500,00	278CC	283CC
280	8.2.15.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	$ 106.080,00	268;278	281;296
281	8.2.15.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 12/06/25	jue 12/06/25	$ 789.900,00	280	282CC
282	8.2.15.10	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	jue 12/06/25	jue 12/06/25	$ 5.267.664,00	281CC	284CC

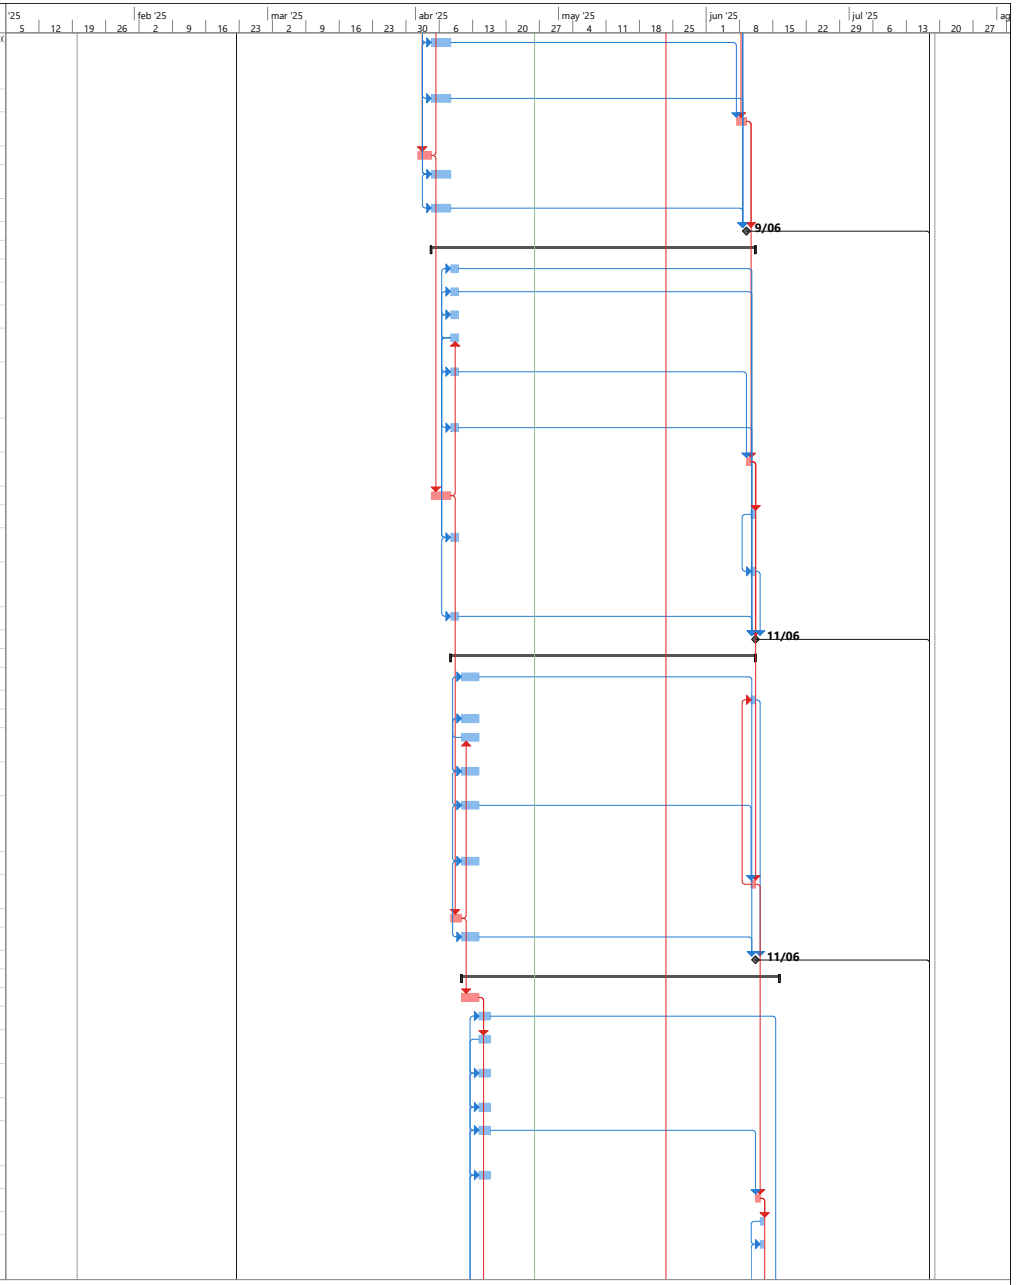

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
283	8.2.15.11	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 5.722.236,00	279CC	274CC
284	8.2.15.12	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 12/06/25	jue 12/06/25	$ 3.655.500,00	282CC	285CC
285	8.2.15.13	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 12/06/25	jue 12/06/25	$ 1.035.108,00	284CC	286CC
286	8.2.15.14	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	3 días	jue 12/06/25	lun 16/06/25	$ 1.834.413,00	285CC	287
287	8.2.15.15	Fin intervención CIV 12000797	0 días	lun 16/06/25	lun 16/06/25	$ 0,00	274;286	761
288	**8.2.16**	**12000816 (6)**	**52 días**	**lun 14/04/25**	**vie 13/06/25**	**$ 40.609.346,00**		
289	8.2.16.1	REPLANTEO GENERAL	3 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 260.160,00	273	291;305
290	8.2.16.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	3 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 2.479.392,00	299CC	303
291	8.2.16.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	3 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 34.843,00	289	292CC
292	8.2.16.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 120.510,00	291CC	293CC
293	8.2.16.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 318.531,00	292CC	294CC
294	8.2.16.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 26.194.110,00	293CC	295CC;299CC;296
295	8.2.16.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 653.142,00	294CC	303
296	8.2.16.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	jue 12/06/25	jue 12/06/25	$ 106.080,00	280;294	297;312
297	8.2.16.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 417.857,00	296	298CC
298	8.2.16.10	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 2.787.315,00	297CC	300CC
299	8.2.16.11	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 2.921.519,00	294CC	302CC;290CC
300	8.2.16.12	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 1.933.760,00	298CC	301CC
301	8.2.16.13	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 547.714,00	300CC	303
302	8.2.16.14	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	mié 16/04/25	jue 17/04/25	$ 1.834.413,00	299CC	303
303	8.2.16.15	Fin intervención CIV 12000816	0 días	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 0,00	290;295;301;302	761
304	**8.2.17**	**12001652 (23)**	**51 días**	**mié 16/04/25**	**mar 17/06/25**	**$ 43.238.232,00**		
305	8.2.17.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	mié 16/04/25	sáb 19/04/25	$ 542.000,00	289	307;323
306	8.2.17.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	$ 2.479.392,00	316CC	321
307	8.2.17.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 83.309,00	305	308CC;309CC
308	8.2.17.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 241.020,00	307CC	321
309	8.2.17.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 439.296,00	307CC	310CC
310	8.2.17.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	$ 25.481.539,00	309CC	311CC;319CC
311	8.2.17.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 900.768,00	310CC	321
312	8.2.17.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 901.680,00	296	313;331
313	8.2.17.9	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	2 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	$ 958.824,00	312	314CC
314	8.2.17.10	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 526.600,00	313CC	315CC
315	8.2.17.11	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 2.616.455,00	314CC	316CC
316	8.2.17.12	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 2.842.044,00	315CC	317CC;306CC
317	8.2.17.13	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 2.437.000,00	316CC	318CC
318	8.2.17.14	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 514.139,00	317CC	321
319	8.2.17.15	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	$ 439.753,00	310CC	320CC
320	8.2.17.16	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 1.834.413,00	319CC	321
321	8.2.17.17	Fin intervención CIV 12001652	0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 0,00	306;308;311;318;320	761

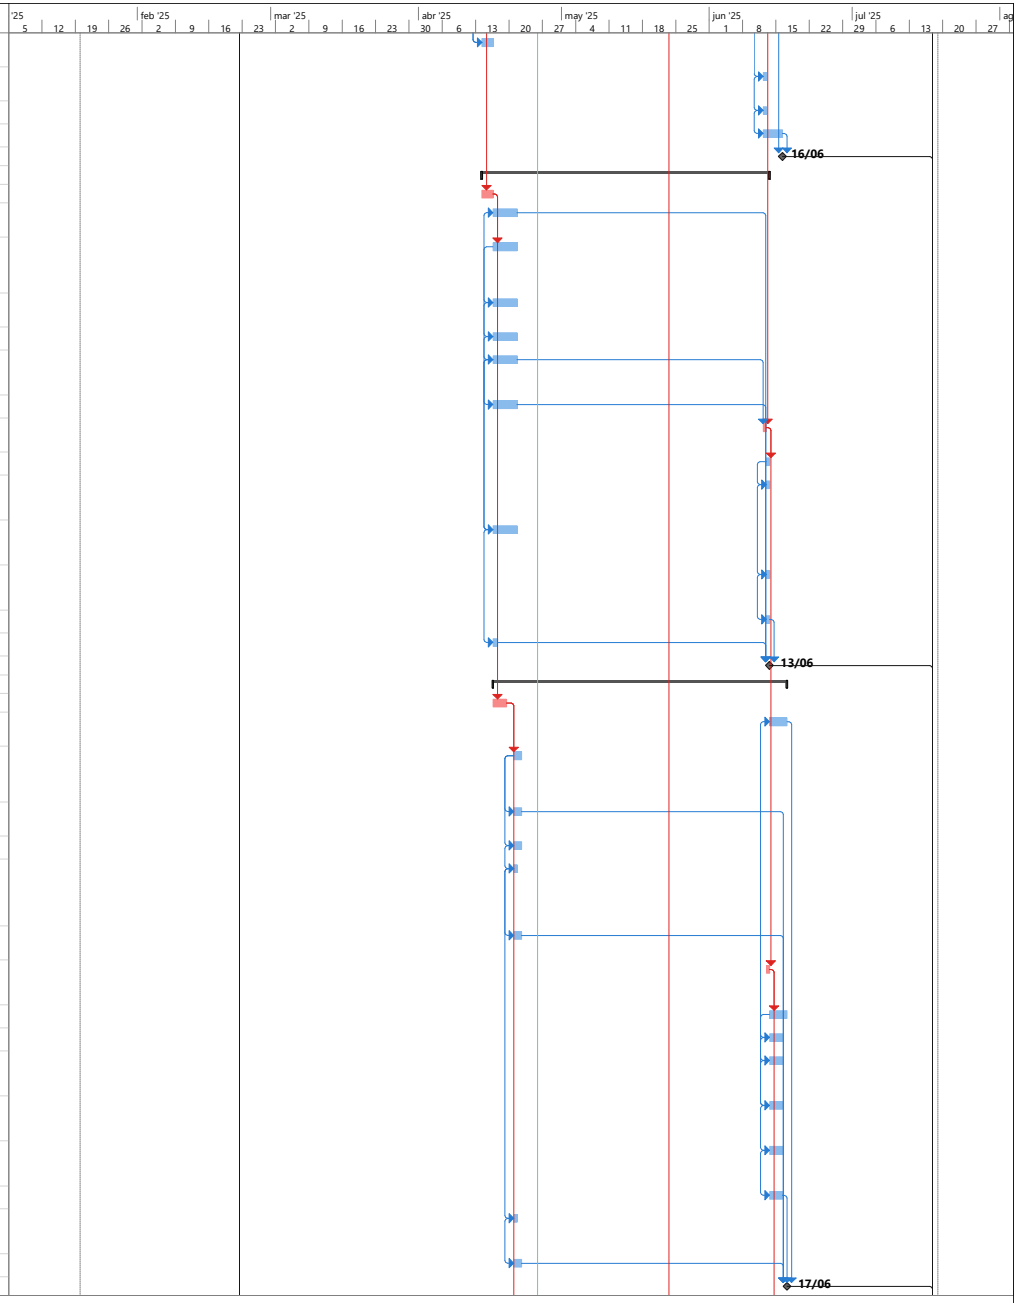

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
322	**8.2.18**	**12001694 (24)**	**50 días**	**lun 21/04/25**	**mar 17/06/25**	**$ 92.350.372,00**		
323	8.2.18.1	REPLANTEO GENERAL	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	$ 650.400,00	305	325;345
324	8.2.18.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	sáb 26/04/25	mar 29/04/25	$ 2.479.392,00	339	343
325	8.2.18.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	2 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 73.735,00	323	327CC;329CC
326	8.2.18.4	SELLO DE FISURAS	2 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	$ 618.720,00	331CC	343
327	8.2.18.5	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 241.020,00	325CC	328CC
328	8.2.18.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 708.011,00	327CC	343
329	8.2.18.7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 58.217.051,00	325CC	330CC;331;339CC
330	8.2.18.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 1.451.763,00	329CC	343
331	8.2.18.9	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	2 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	$ 1.060.800,00	312;329	326CC;332;352
332	8.2.18.10	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 240.828,00	331	333CC
333	8.2.18.11	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 799.020,00	332CC	334CC
334	8.2.18.12	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 778.519,00	333CC	335CC
335	8.2.18.13	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 1.254.151,00	334CC	336CC
336	8.2.18.14	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 595.005,00	335CC	337CC
337	8.2.18.15	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 292.967,00	336CC	338CC
338	8.2.18.16	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 7.319.225,00	337CC	340CC
339	8.2.18.17	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	mié 23/04/25	sáb 26/04/25	$ 6.493.148,00	329CC	324;342CC
340	8.2.18.18	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 5.803.959,00	338CC	341CC
341	8.2.18.19	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 1.438.245,00	340CC	343
342	8.2.18.20	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	3 días	mié 23/04/25	sáb 26/04/25	$ 1.834.413,00	339CC	343
343	8.2.18.21	Fin intervención CIV 12001694	0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 0,00	341;342;324;326;328;330	761
344	**8.2.19**	**12001030 (25)**	**47 días**	**mié 23/04/25**	**mar 17/06/25**	**$ 30.757.631,00**		
345	8.2.19.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 552.840,00	323	347;356
346	8.2.19.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	vie 25/04/25	lun 28/04/25	$ 1.377.440,00	348CC	354
347	8.2.19.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	2 días	vie 25/04/25	lun 28/04/25	$ 42.847,00	345	348CC
348	8.2.19.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	2 días	vie 25/04/25	lun 28/04/25	$ 777.328,00	347CC	349CC;346CC
349	8.2.19.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	vie 25/04/25	lun 28/04/25	$ 294.133,00	348CC	350CC
350	8.2.19.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	$ 24.184.660,00	349CC	351CC;352
351	8.2.19.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	vie 25/04/25	lun 28/04/25	$ 603.114,00	350CC	353CC
352	8.2.19.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 1.090.856,00	331;350	354;364
353	8.2.19.9	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	vie 25/04/25	lun 28/04/25	$ 1.834.413,00	351CC	354
354	8.2.19.10	Fin intervención CIV 12001030	0 días	mar 17/06/25	mar 17/06/25	$ 0,00	353;352;346	761
355	**8.2.20**	**12000891 (41)**	**49 días**	**vie 25/04/25**	**sáb 21/06/25**	**$ 28.813.132,00**		
356	8.2.20.1	REPLANTEO GENERAL	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	$ 867.200,00	345	358;379
357	8.2.20.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 1.377.440,00	367CC	
358	8.2.20.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	1 día	mar 29/04/25	mié 30/04/25	$ 141.318,00	356	360CC;367CC
359	8.2.20.4	SELLO DE FISURAS	2 días	mié 18/06/25	jue 19/06/25	$ 1.237.440,00	364CC	370
360	8.2.20.5	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 241.020,00	358CC	361CC
361	8.2.20.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 211.328,00	360CC	362CC
362	8.2.20.7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 17.375.331,00	361CC	363CC;364
363	8.2.20.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 433.324,00	362CC	370
364	8.2.20.9	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	2 días	mié 18/06/25	jue 19/06/25	$ 777.920,00	352;362	365;359CC;378
365	8.2.20.10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	1 día	jue 19/06/25	vie 20/06/25	$ 292.967,00	364	366CC

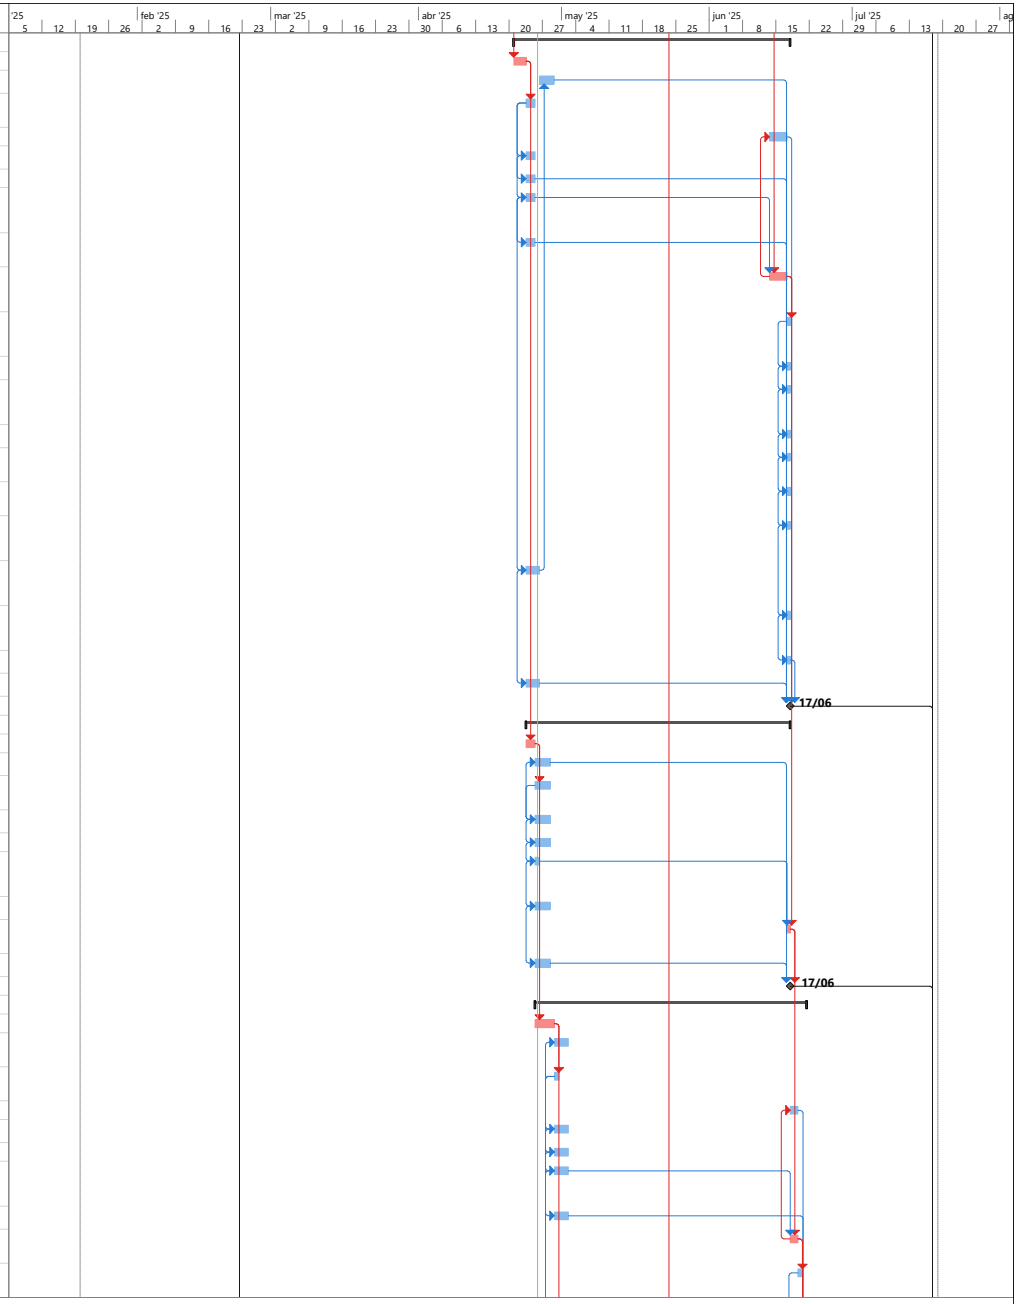

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
366	8.2.20.11	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	2 días	jue 19/06/25	sáb 21/06/25	$ 1.742.997,00	365CC	368CC
367	8.2.20.12	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 1.937.931,00	358CC	369CC;357CC
368	8.2.20.13	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	jue 19/06/25	sáb 21/06/25	$ 342.503,00	366CC	370
369	8.2.20.14	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	mar 29/04/25	mié 30/04/25	$ 1.834.413,00	367CC	370
370	8.2.20.15	Fin intervención CIV 12000891	0 días	sáb 21/06/25	sáb 21/06/25	$ 0,00	359;363;368;369	761
371	**8.2.21**	**12003134 (3)**	**45 días**	**mar 29/04/25**	**vie 20/06/25**	**$ 26.668.158,00**		
372	8.2.21.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTO	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 1.377.440,00	380CC	382
373	8.2.21.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 241.020,00	375CC	374CC
374	8.2.21.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 231.816,00	373CC	382
375	8.2.21.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 28.624,00	379CC	373CC;376CC;380CC
376	8.2.21.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 19.596.196,00	375CC	377CC;378
377	8.2.21.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 475.334,00	376CC	382
378	8.2.21.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	1 día	jue 19/06/25	vie 20/06/25	$ 556.920,00	364;376	382;391
379	8.2.21.8	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 175.500,00	356	375CC;392
380	8.2.21.9	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 2.150.895,00	375CC	372CC;381CC
381	8.2.21.10	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	$ 1.834.413,00	380CC	382
382	8.2.21.11	Fin intervención CIV 12003134	0 días	vie 20/06/25	vie 20/06/25	$ 0,00	372;374;377;378;381	761
383	**8.2.22**	**12001109 (5)**	**45 días**	**vie 2/05/25**	**mar 24/06/25**	**$ 182.991.206,00**		
384	8.2.22.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 8.815.616,00	398CC	403
385	8.2.22.2	SELLO DE FISURAS	1 día	vie 20/06/25	sáb 21/06/25	$ 721.840,00	391CC	403
386	8.2.22.3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 482.040,00	389CC	403
387	8.2.22.4	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 1.418.768,00	389CC	403
388	8.2.22.5	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 50.831,00	392CC	389CC;402CC
389	8.2.22.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 118.759.079,00	388CC	390CC;387CC;386CC;391
390	8.2.22.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 2.909.157,00	389CC	403
391	8.2.22.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	vie 20/06/25	sáb 21/06/25	$ 1.060.800,00	378;389	385CC;393;411
392	8.2.22.9	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	3 días	vie 2/05/25	mar 6/05/25	$ 1.521.000,00	379	388CC;412
393	8.2.22.10	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	$ 430.050,00	391	394CC
394	8.2.22.11	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	$ 2.237.256,00	393CC	395CC
395	8.2.22.12	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	$ 2.657.165,00	394CC	396CC
396	8.2.22.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	$ 585.934,00	395CC	397CC
397	8.2.22.14	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	$ 8.412.429,00	396CC	399CC
398	8.2.22.15	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 13.035.097,00	389CC	384CC
399	8.2.22.16	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	$ 12.296.829,00	397CC	400CC
400	8.2.22.17	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	$ 1.653.062,00	399CC	403
401	8.2.22.18	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 4.109.840,00	389CC	403
402	8.2.22.19	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	4 días	vie 2/05/25	mié 7/05/25	$ 1.834.413,00	388CC	403
403	8.2.22.20	Fin intervención CIV 12001109	0 días	mar 24/06/25	mar 24/06/25	$ 0,00	384;385;386;387;390;400;	761
404	**8.2.23**	**12000661 (8)**	**45 días**	**mar 6/05/25**	**vie 27/06/25**	**$ 72.280.926,00**		
405	8.2.23.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 2.479.392,00	419CC	424
406	8.2.23.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 482.040,00	408CC	407CC
407	8.2.23.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 566.800,00	406CC	409CC
408	8.2.23.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 39.655,00	412	406CC;419CC

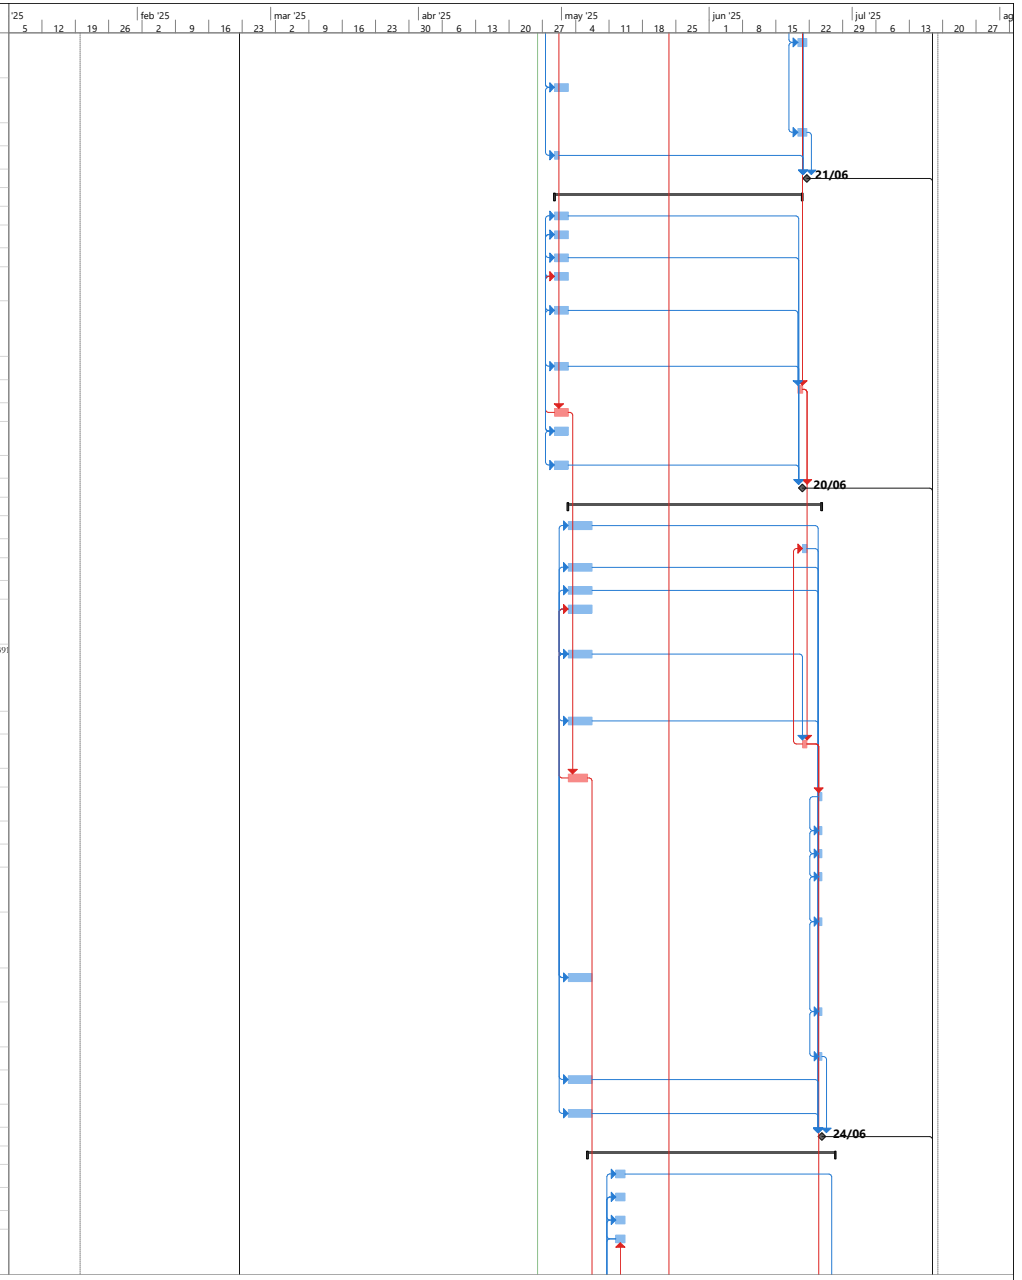

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
409	8.2.23.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 47.305.189,00	407CC	410CC;411
410	8.2.23.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 1.162.213,00	409CC	424
411	8.2.23.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	3 días	mar 24/06/25	jue 26/06/25	$ 97.240,00	391;409	413;435
412	8.2.23.8	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	5 días	mar 6/05/25	lun 12/05/25	$ 318.825,00	392	408;426
413	8.2.23.9	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 189.222,00	411	414CC
414	8.2.23.10	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 611.694,00	413CC	415CC
415	8.2.23.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 811.069,00	414CC	416CC
416	8.2.23.12	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 595.005,00	415CC	417CC
417	8.2.23.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 292.967,00	416CC	418CC
418	8.2.23.14	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 4.958.621,00	417CC	420CC
419	8.2.23.15	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 5.192.258,00	408CC	422CC;405CC
420	8.2.23.16	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 3.753.467,00	418CC	421CC
421	8.2.23.17	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 974.380,00	420CC	424
422	8.2.23.18	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 616.476,00	419CC	423CC
423	8.2.23.19	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 1.834.413,00	422CC	424
424	8.2.23.20	Fin intervención CIV 12000661	0 días	vie 27/06/25	vie 27/06/25	$ 0,00	405;410;421;423	761
425	**8.2.24**	**12001662 (2)**	**41 días**	**lun 12/05/25**	**sáb 28/06/25**	**$ 9.362.036,00**		
426	8.2.24.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 23.252,00	412	428;442
427	8.2.24.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 134.300,00	429CC	440
428	8.2.24.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 56.502,00	426	429CC
429	8.2.24.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 68.709,00	428CC	431CC;432CC;439CC;427
430	8.2.24.5	SELLO DE FISURAS	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 2.062.400,00	435CC	440
431	8.2.24.6	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 241.020,00	429CC	440
432	8.2.24.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 44.617,00	429CC	433CC
433	8.2.24.8	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 3.662.615,00	432CC	434CC
434	8.2.24.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 91.487,00	433CC	440
435	8.2.24.10	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 106.080,00	411	436;430CC;450
436	8.2.24.11	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	$ 585.948,00	435	437CC
437	8.2.24.12	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	$ 376.675,00	436CC	438CC
438	8.2.24.13	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	$ 74.018,00	437CC	440
439	8.2.24.14	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 1.834.413,00	429CC	440
440	8.2.24.15	Fin intervención CIV 12001662	0 días	sáb 28/06/25	sáb 28/06/25	$ 0,00	427;430;431;434;438;439	761
441	**8.2.25**	**12001917 (38)**	**41 días**	**mié 14/05/25**	**mié 2/07/25**	**$ 24.376.389,00**		
442	8.2.25.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	mié 14/05/25	jue 15/05/25	$ 506.326,00	426	443;457
443	8.2.25.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	$ 43.946,00	442	445CC;447CC;454CC
444	8.2.25.3	SELLO DE FISURAS	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	$ 5.156.000,00	450CC	455
445	8.2.25.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	$ 241.020,00	443CC	446CC
446	8.2.25.5	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	$ 791.807,00	445CC	452CC
447	8.2.25.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	$ 123.755,00	443CC	448CC
448	8.2.25.7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	$ 10.175.514,00	447CC	449CC;450;451CC
449	8.2.25.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	$ 253.757,00	448CC	455
450	8.2.25.9	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	3 días	vie 27/06/25	mié 2/07/25	$ 141.440,00	435;448	444CC;464

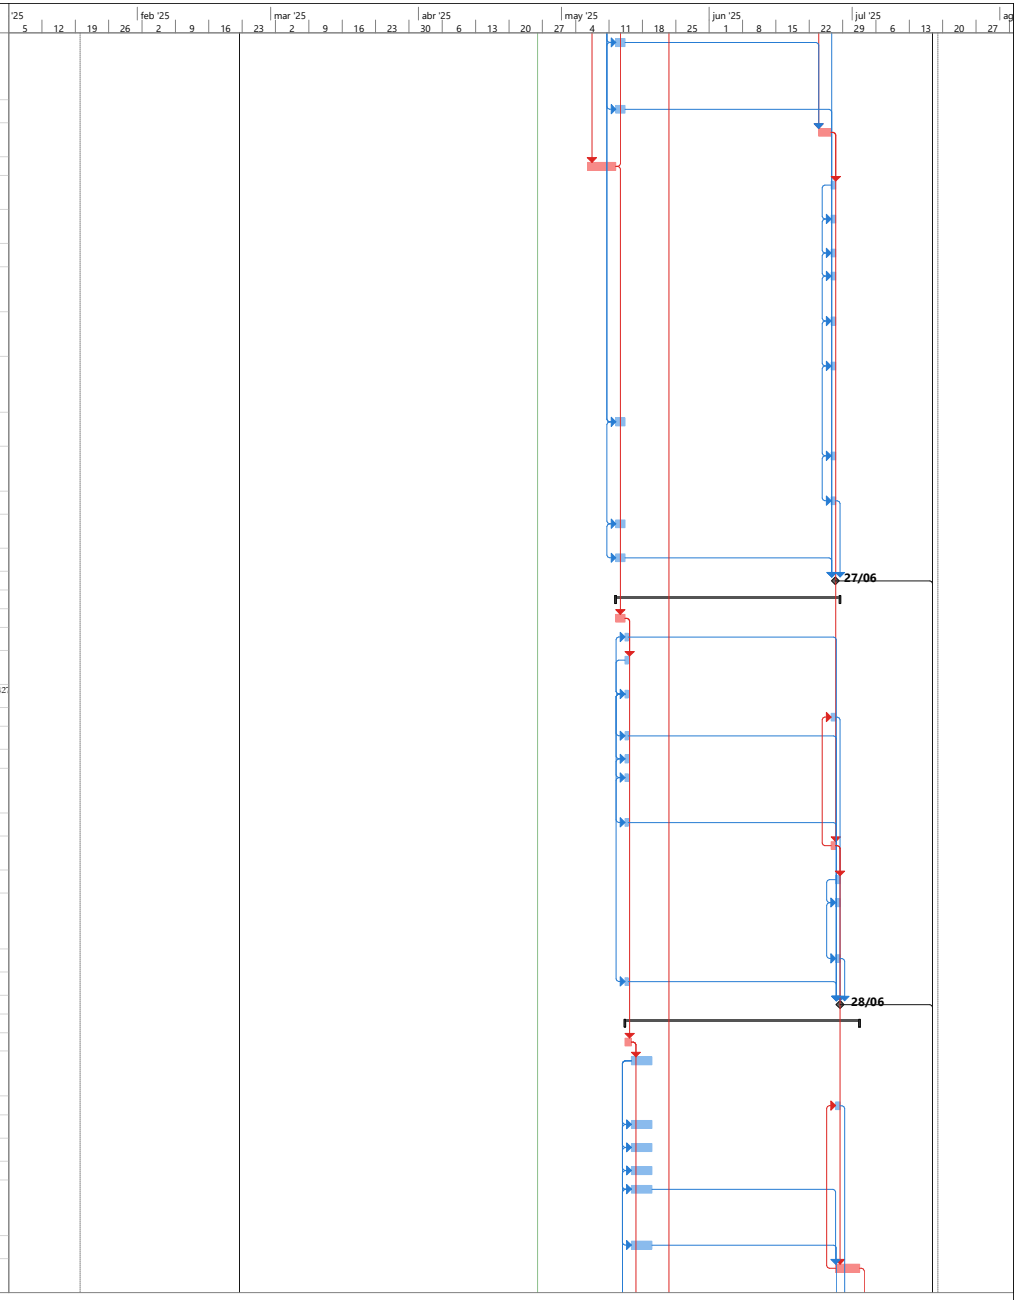

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
451	8.2.25.10	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 15/05/25	vie 16/05/25	$ 104.820,00	448CC	453CC
452	8.2.25.11	RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA DE SUMIDERO SL-100. CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LA PLACA DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE ANCLAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, ADHESIVO ESTRUCTURAL, CURADO, MARCO Y	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	$ 1.686.155,00	446CC	455
453	8.2.25.12	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	jue 15/05/25	vie 16/05/25	$ 3.317.436,00	451CC	455
454	8.2.25.13	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	jue 15/05/25	vie 16/05/25	$ 1.834.413,00	443CC	455
455	8.2.25.14	Fin intervención CIV 12001917	0 días	sáb 28/06/25	sáb 28/06/25	$ 0,00	444;449;452;453;454	761
456	**8.2.26**	**12002070 (31)**	**41 días**	**jue 15/05/25**	**vie 4/07/25**	**$ 78.577.118,00**		
457	8.2.26.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	$ 336.940,00	442	459;476
458	8.2.26.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	4 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25	$ 3.339.603,00	470CC	474
459	8.2.26.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	4 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25	$ 43.507,00	457	460CC
460	8.2.26.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	4 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25	$ 241.020,00	459CC	461CC
461	8.2.26.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25	$ 646.526,00	460CC	462CC
462	8.2.26.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	4 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25	$ 53.157.797,00	461CC	463CC;470CC;58
463	8.2.26.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	4 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25	$ 1.325.690,00	462CC	474
464	8.2.26.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 122.522,00	450	465;482
465	8.2.26.9	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRILICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	$ 258.030,00	464	466CC
466	8.2.26.10	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	$ 834.128,00	465CC	467CC
467	8.2.26.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	$ 654.669,00	466CC	468CC
468	8.2.26.12	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	$ 292.967,00	467CC	469CC
469	8.2.26.13	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	$ 5.458.206,00	468CC	471CC
470	8.2.26.14	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	4 días	lun 19/05/25	jue 22/05/25	$ 5.928.872,00	462CC	473CC;458CC
471	8.2.26.15	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	$ 3.029.678,00	469CC	472CC
472	8.2.26.16	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	$ 1.072.550,00	471CC	474
473	8.2.26.17	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	lun 19/05/25	lun 19/05/25	$ 1.834.413,00	470CC	474
474	8.2.26.18	Fin intervención CIV 12002070	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25	$ 0,00	458;463;472;473	761
475	**8.2.27**	**12000849 (39)**	**40 días**	**lun 19/05/25**	**sáb 5/07/25**	**$ 25.903.053,00**		
476	8.2.27.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	$ 361.883,00	457	478;499
477	8.2.27.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	$ 1.014.416,00	486CC	489CC
478	8.2.27.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	2 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	$ 59.641,00	476	479CC;486CC
479	8.2.27.4	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	$ 196.420,00	478CC	480CC
480	8.2.27.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	$ 16.146.859,00	479CC	481CC;482
481	8.2.27.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	$ 402.756,00	480CC	490
482	8.2.27.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	$ 328.318,00	464;480	483;498
483	8.2.27.8	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	$ 209.376,00	482	484CC
484	8.2.27.9	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	$ 595.005,00	483CC	485CC
485	8.2.27.10	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	$ 1.658.250,00	484CC	487CC
486	8.2.27.11	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	2 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	$ 1.800.915,00	478CC	477CC
487	8.2.27.12	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	$ 968.951,00	485CC	488CC
488	8.2.27.13	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	$ 325.850,00	487CC	490
489	8.2.27.14	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	$ 1.834.413,00	477CC	490
490	8.2.27.15	Fin intervención CIV 12000849	0 días	sáb 5/07/25	sáb 5/07/25	$ 0,00	481;488;489	761

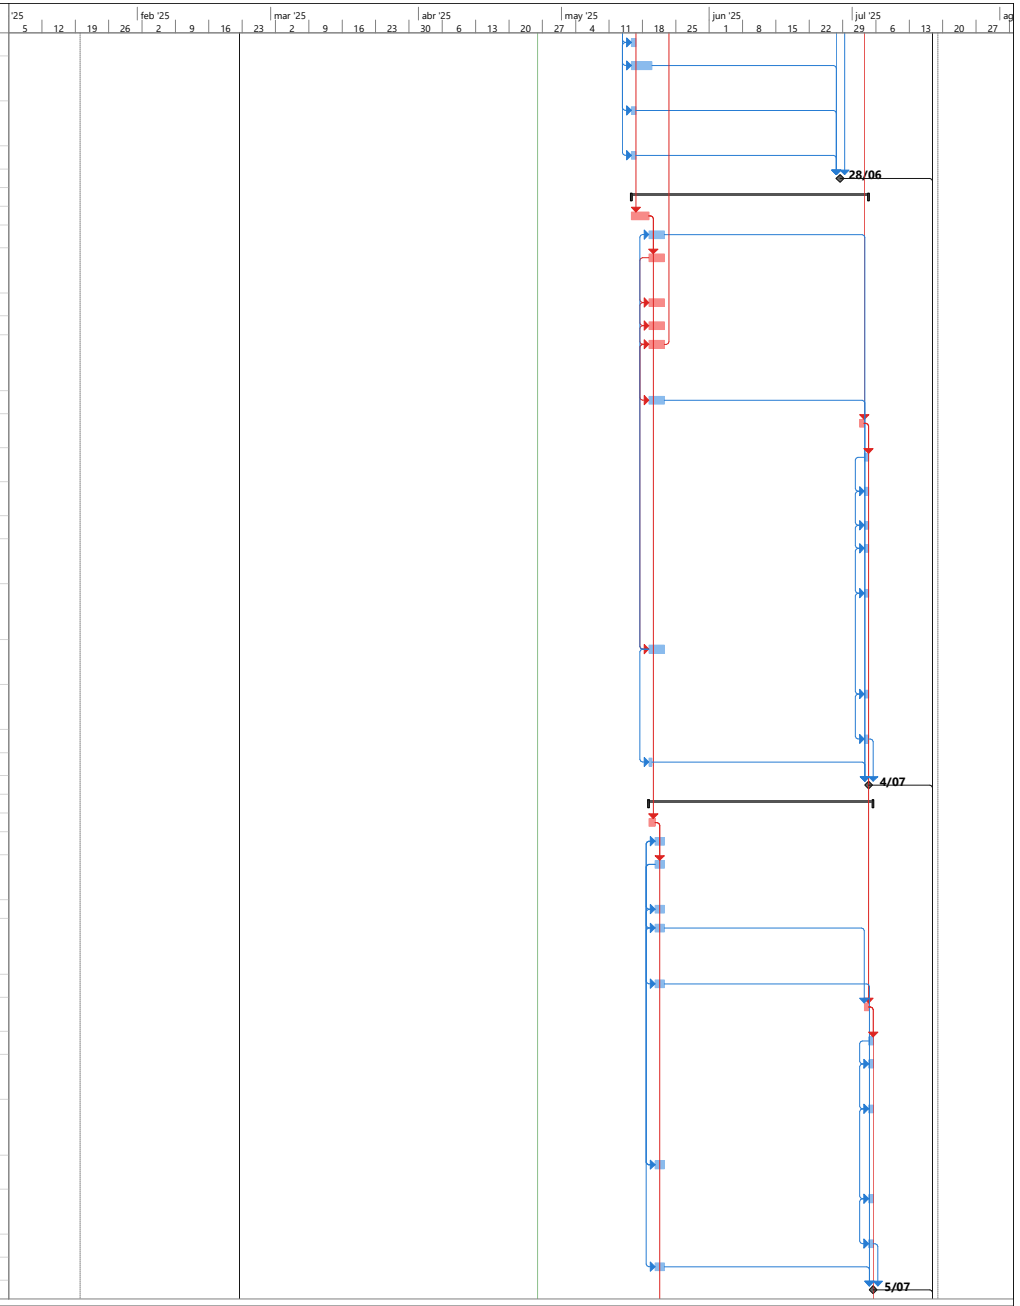

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
491	**8.2.28**	**12000239 (32)**	**40 días**	**mar 20/05/25**	**mar 8/07/25**	**$ 306.722.420,00**		
492	8.2.28.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 9.712.605,00	504CC	509
493	8.2.28.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 482.040,00	495CC	509
494	8.2.28.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 1.880.237,00	495CC	496CC;504CC
495	8.2.28.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 86.520,00	499	493CC;494CC
496	8.2.28.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 197.844.250,00	494CC	497CC;498
497	8.2.28.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 3.855.389,00	496CC	509
498	8.2.28.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	$ 123.760,00	482;496	500;517
499	8.2.28.8	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	3 días	mar 20/05/25	vie 23/05/25	$ 1.057.633,00	476	495;519
500	8.2.28.9	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	2 días	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	$ 240.828,00	498	501CC
501	8.2.28.10	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	2 días	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	$ 778.519,00	500CC	502CC
502	8.2.28.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	$ 2.720.205,00	501CC	503CC
503	8.2.28.12	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	2 días	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	$ 15.873.628,00	502CC	505CC
504	8.2.28.13	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 17.373.723,00	494CC	507CC;492CC
505	8.2.28.14	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	$ 12.588.567,00	503CC	506CC
506	8.2.28.15	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	$ 3.119.204,00	505CC	509
507	8.2.28.16	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 37.150.899,00	504CC	508CC
508	8.2.28.17	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	6 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	$ 1.834.413,00	507CC	509
509	8.2.28.18	Fin intervención CIV 12000239	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	$ 0,00	492;493;497;506;508	761
510	**8.2.29**	**12000809 (9)**	**38 días**	**vie 23/05/25**	**mié 9/07/25**	**$ 434.451.658,00**		
511	8.2.29.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 22.726.505,00	525CC	531
512	8.2.29.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	mié 28/05/25	sáb 31/05/25	$ 723.060,00	514CC	531
513	8.2.29.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 1.707.763,00	514CC	531
514	8.2.29.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 126.175,00	519	515CC;518CC;512CC;513
515	8.2.29.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	30 días	mié 28/05/25	vie 4/07/25	$ 309.640.332,00	514CC	516CC
516	8.2.29.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 3.501.736,00	515CC	531
517	8.2.29.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	sáb 5/07/25	lun 7/07/25	$ 265.200,00	498	520;541
518	8.2.29.8	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 503.136,00	514CC	525CC;526CC
519	8.2.29.9	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	4 días	vie 23/05/25	mié 28/05/25	$ 960.617,00	499	514;533
520	8.2.29.10	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	2 días	lun 7/07/25	mié 9/07/25	$ 236.011,00	517	521CC
521	8.2.29.11	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	2 días	lun 7/07/25	mié 9/07/25	$ 762.949,00	520CC	522CC
522	8.2.29.12	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	lun 7/07/25	mié 9/07/25	$ 2.006.346,00	521CC	523CC
523	8.2.29.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	2 días	lun 7/07/25	mié 9/07/25	$ 585.934,00	522CC	524CC
524	8.2.29.14	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	2 días	lun 7/07/25	mié 9/07/25	$ 15.292.740,00	523CC	527CC
525	8.2.29.15	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	$ 33.986.384,00	518CC	530CC;511CC
526	8.2.29.16	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	$ 19.904.616,00	518CC	529CC
527	8.2.29.17	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	lun 7/07/25	mié 9/07/25	$ 9.284.970,00	524CC	528CC
528	8.2.29.18	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	lun 7/07/25	mié 9/07/25	$ 3.005.059,00	527CC	531

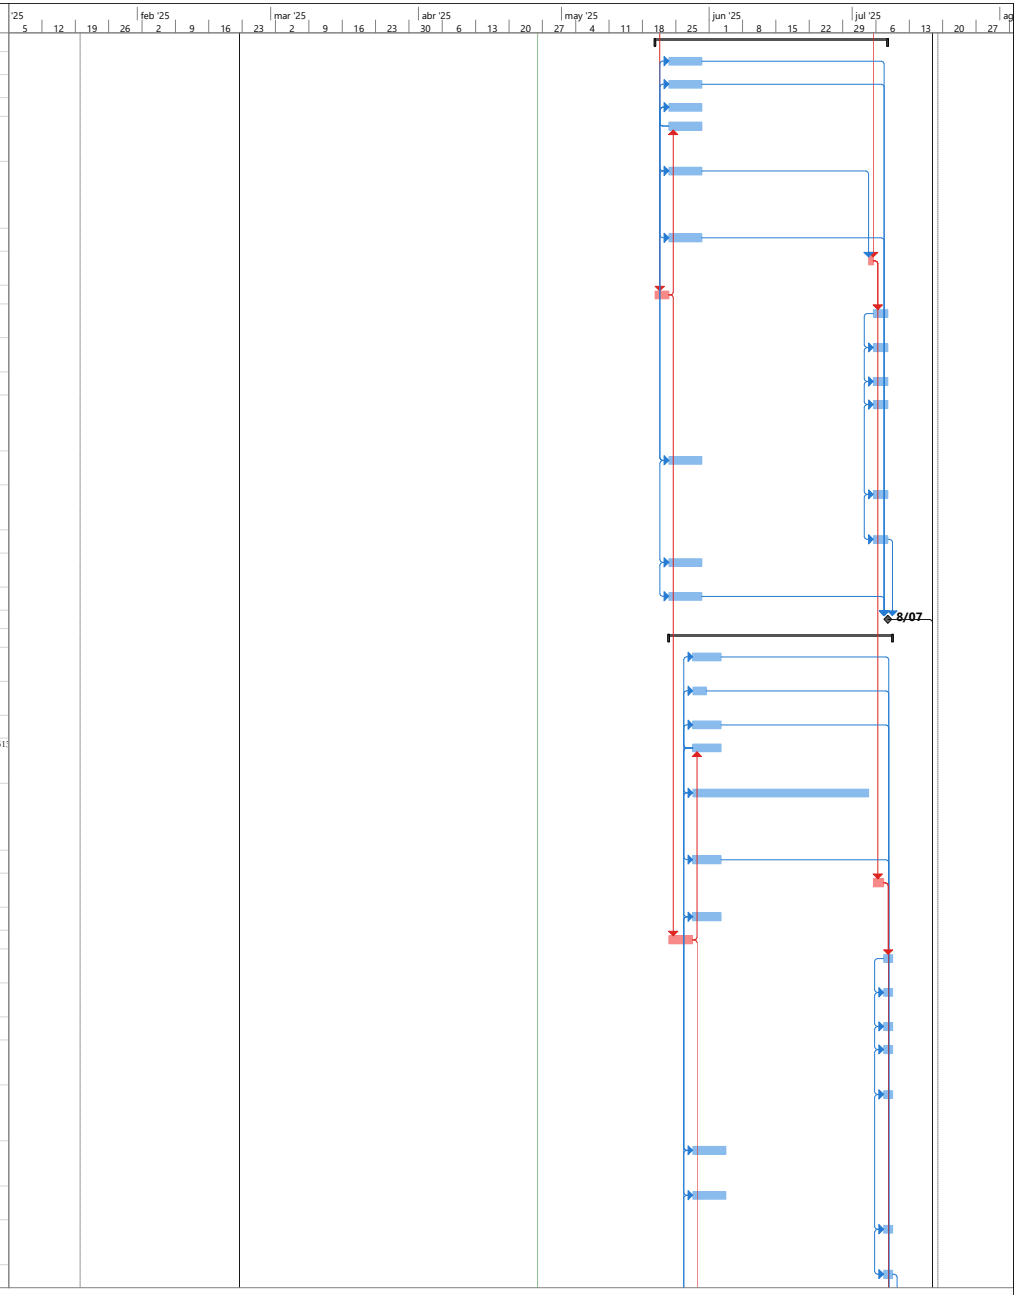

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
529	8.2.29.19	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 7.397.712,00	526CC	531
530	8.2.29.20	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	$ 1.834.413,00	525CC	531
531	8.2.29.21	Fin intervención CIV 12002432	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	$ 0,00	511;512;513;516;528;529;...	761
532	**8.2.30**	**12000497 (29)**	**33 días**	**mié 28/05/25**	**mar 8/07/25**	**$ 24.103.740,00**		
533	8.2.30.1	REPLANTEO GENERAL	3 días	mié 28/05/25	sáb 31/05/25	$ 624.742,00	519	535;545
534	8.2.30.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 958.010,00	536CC	543
535	8.2.30.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 193.049,00	533	536CC
536	8.2.30.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 490.124,00	535CC	537CC;534CC
537	8.2.30.5	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 482.040,00	536CC	538CC
538	8.2.30.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 222.548,00	537CC	539CC
539	8.2.30.7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 18.298.823,00	538CC	540CC;541;542CC
540	8.2.30.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 456.331,00	539CC	543
541	8.2.30.9	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	lun 7/07/25	mar 8/07/25	$ 543.660,00	517;539	543;552
542	8.2.30.10	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	$ 1.834.413,00	539CC	543
543	8.2.30.11	Fin intervención CIV 12000497	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	$ 0,00	534;540;541;542	761
544	**8.2.31**	**12001341 (15)**	**32 días**	**sáb 31/05/25**	**jue 10/07/25**	**$ 257.221.087,00**		
545	8.2.31.1	REPLANTEO GENERAL	4 días	sáb 31/05/25	vie 6/06/25	$ 879.774,00	533	547;565
546	8.2.31.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 11.626.833,00	559CC	563
547	8.2.31.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 56.502,00	545	548CC;559CC
548	8.2.31.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 361.530,00	547CC	549CC
549	8.2.31.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 1.688.128,00	548CC	550CC
550	8.2.31.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 185.068.940,00	549CC	551CC;552
551	8.2.31.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 3.461.474,00	550CC	563
552	8.2.31.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	mar 8/07/25	mié 9/07/25	$ 159.120,00	541;550	553;572
553	8.2.31.9	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 258.030,00	552	554CC
554	8.2.31.10	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 417.064,00	553CC	555CC
555	8.2.31.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 2.279.335,00	554CC	556CC
556	8.2.31.12	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 595.005,00	555CC	557CC
557	8.2.31.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 292.967,00	556CC	558CC
558	8.2.31.14	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 14.251.777,00	557CC	560CC
559	8.2.31.15	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 20.641.377,00	547CC	546CC
560	8.2.31.16	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 10.548.311,00	558CC	561CC
561	8.2.31.17	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 2.800.507,00	560CC	562CC
562	8.2.31.18	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 1.834.413,00	561CC	563
563	8.2.31.19	Fin intervención CIV 12001341	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0,00	546;551;562	761
564	**8.2.32**	**12001351 (16)**	**29 días**	**vie 6/06/25**	**vie 11/07/25**	**$ 105.617.412,00**		
565	8.2.32.1	REPLANTEO GENERAL	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 354.403,00	545	567;585
566	8.2.32.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	3 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	$ 4.683.503,00	579CC	583
567	8.2.32.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	3 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	$ 56.502,00	565	568CC;569CC;579CC
568	8.2.32.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	$ 120.510,00	567CC	583
569	8.2.32.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	$ 680.035,00	567CC	570CC
570	8.2.32.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	$ 74.549.178,00	569CC	571CC;572

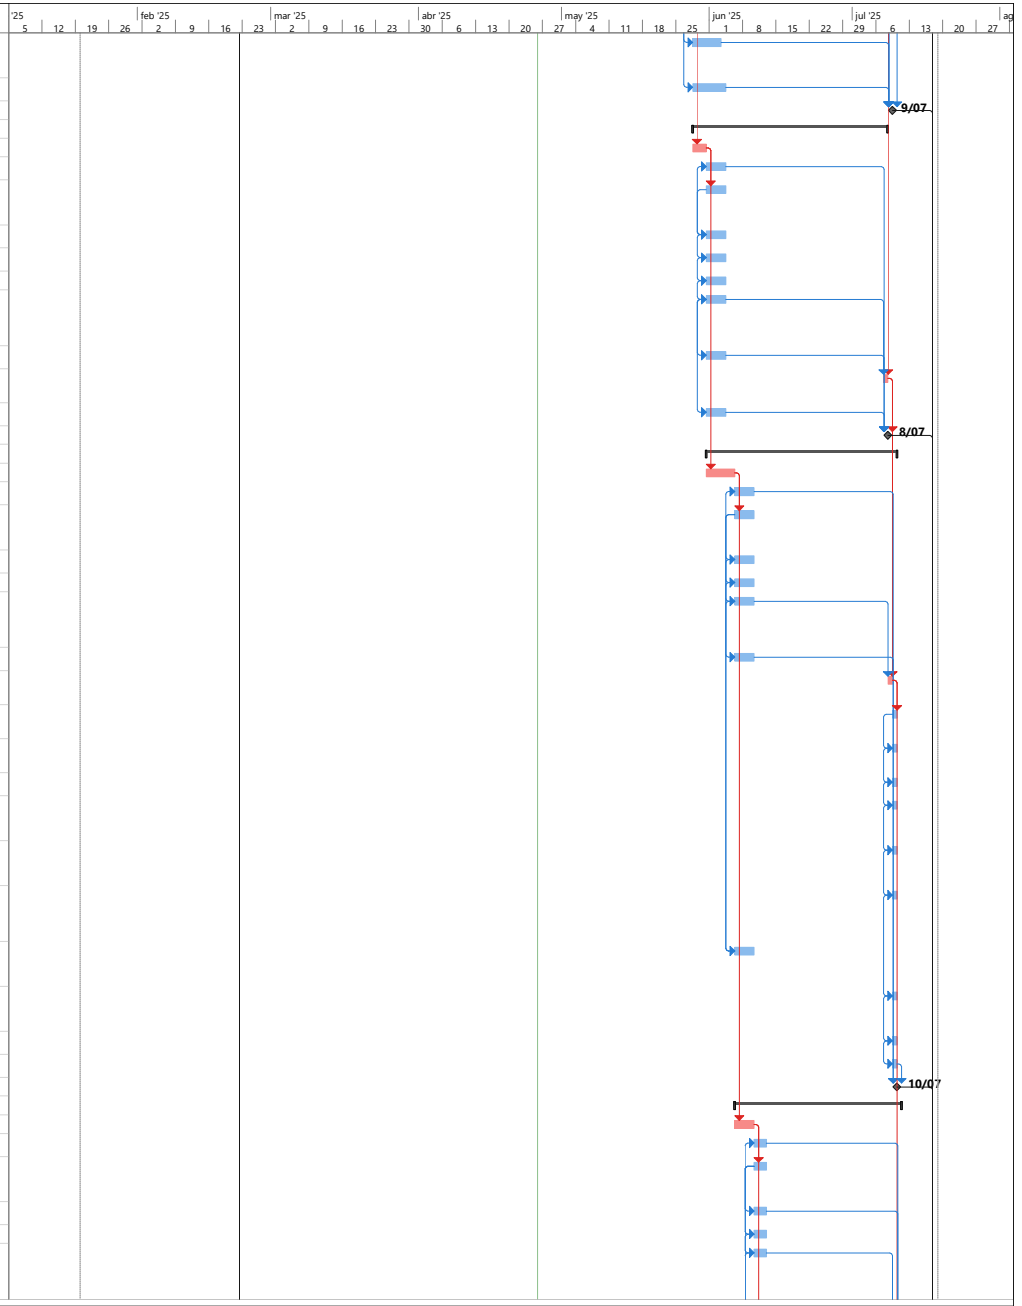

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
571	8.2.32.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	$ 1.394.399,00	570CC	583
572	8.2.32.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	$ 159.120,00	552;570	573;592
573	8.2.32.9	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 129.015,00	572	574CC
574	8.2.32.10	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 417.064,00	573CC	575CC
575	8.2.32.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 918.180,00	574CC	576CC
576	8.2.32.12	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 595.005,00	575CC	577CC
577	8.2.32.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 292.967,00	576CC	578CC
578	8.2.32.14	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 5.741.099,00	577CC	580CC
579	8.2.32.15	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	$ 8.314.727,00	567CC	566CC
580	8.2.32.16	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 4.249.153,00	578CC	581CC
581	8.2.32.17	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 1.128.139,00	580CC	582CC
582	8.2.32.18	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 1.834.413,00	581CC	583
583	8.2.32.19	Fin intervención CIV 12001351	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/25	$ 0,00	566;568;571;582	761
584	**8.2.33**	**12001409 (17)**	**27 días**	**mar 10/06/25**	**sáb 12/07/25**	**$ 30.453.575,00**		
585	8.2.33.1	REPLANTEO GENERAL	3 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	$ 336.593,00	565	587;598
586	8.2.33.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 1.409.259,00	594CC	596
587	8.2.33.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	2 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 183.004,00	585	588CC;594CC
588	8.2.33.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 361.530,00	587CC	589CC
589	8.2.33.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 272.899,00	588CC	590CC
590	8.2.33.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 22.431.735,00	589CC	591CC;592
591	8.2.33.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 559.575,00	590CC	596
592	8.2.33.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	$ 515.372,00	572;590	593;605
593	8.2.33.9	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	vie 11/07/25	sáb 12/07/25	$ 47.306,00	592	596
594	8.2.33.10	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	2 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 2.501.889,00	587CC	595CC;586CC
595	8.2.33.11	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 1.834.413,00	594CC	596
596	8.2.33.12	Fin intervención CIV 12001409	0 días	sáb 12/07/25	sáb 12/07/25	$ 0,00	586;591;593;595	761
597	**8.2.34**	**12001510 (14)**	**24 días**	**vie 13/06/25**	**sáb 12/07/25**	**$ 24.396.463,00**		
598	8.2.34.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	$ 304.105,00	585	600;617
599	8.2.34.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 1.105.740,00	606CC	608
600	8.2.34.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 182.062,00	598	601CC;606CC
601	8.2.34.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 241.020,00	600CC	602CC
602	8.2.34.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 214.017,00	601CC	603CC
603	8.2.34.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 17.600.504,00	602CC	604CC;605
604	8.2.34.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 438.837,00	603CC	608
605	8.2.34.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	vie 11/07/25	sáb 12/07/25	$ 512.720,00	592;603	608;616
606	8.2.34.9	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 1.963.045,00	600CC	607CC;599CC
607	8.2.34.10	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	vie 13/06/25	lun 16/06/25	$ 1.834.413,00	606CC	608
608	8.2.34.11	Fin intervención CIV 12001510	0 días	sáb 12/07/25	sáb 12/07/25	$ 0,00	604;605;607;599	761
609	**8.2.35**	**12000922 (18)**	**26 días**	**vie 13/06/25**	**mié 16/07/25**	**$ 33.403.394,00**		
610	8.2.35.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	$ 1.428.956,00	620CC	623
611	8.2.35.2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	$ 241.020,00	617	612CC

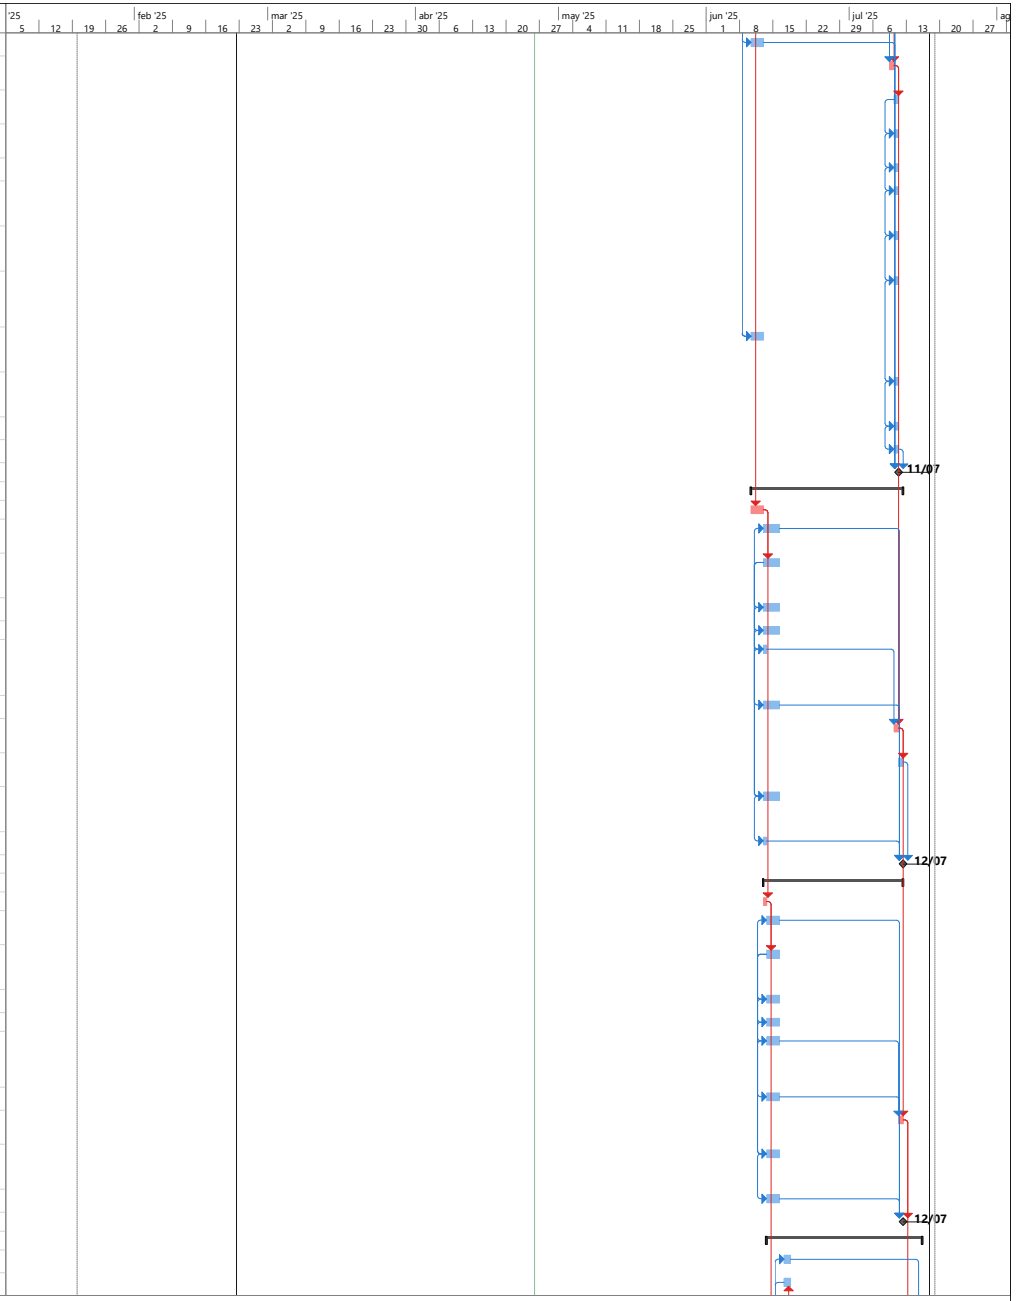

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
612	8.2.35.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	$ 276.635,00	611CC	613CC
613	8.2.35.4	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	$ 216.300,00	612CC	614CC;620CC
614	8.2.35.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	$ 23.287.811,00	613CC	615CC
615	8.2.35.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	$ 567.234,00	614CC	623
616	8.2.35.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	2 días	sáb 12/07/25	mar 15/07/25	$ 530.400,00	605	618;630
617	8.2.35.8	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	2 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	$ 594.933,00	598	611;631
618	8.2.35.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	$ 280.151,00	616	619CC
619	8.2.35.10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	$ 292.967,00	618CC	621CC
620	8.2.35.11	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	$ 2.556.090,00	613CC	610CC
621	8.2.35.12	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	$ 1.296.484,00	619CC	622CC
622	8.2.35.13	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	$ 1.834.413,00	621CC	623
623	8.2.35.14	Fin intervención CIV 12000922	0 días	mié 16/07/25	mié 16/07/25	$ 0,00	610;615;622	761
624	**8.2.36**	**12000741 (19)**	**26 días**	**mar 17/06/25**	**jue 17/07/25**	**$ 107.864.832,00**		
625	8.2.36.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	4 días	jue 19/06/25	mié 25/06/25	$ 4.467.727,00	637CC	642
626	8.2.36.2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	$ 864.968,00	627CC	628CC
627	8.2.36.3	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	$ 445.578,00	631	626CC;637CC
628	8.2.36.4	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	$ 72.810.886,00	626CC	629CC;630
629	8.2.36.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	$ 1.773.600,00	628CC	642
630	8.2.36.6	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	2 días	mar 15/07/25	jue 17/07/25	$ 1.096.160,00	616;628	632;651
631	8.2.36.7	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	3 días	mar 17/06/25	jue 19/06/25	$ 486.545,00	617	627;644
632	8.2.36.8	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRILICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 154.818,00	630	633CC
633	8.2.36.9	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 1.056.562,00	632CC	634CC
634	8.2.36.10	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 921.971,00	633CC	635CC
635	8.2.36.11	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 585.934,00	634CC	636CC
636	8.2.36.12	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 7.302.368,00	635CC	638CC
637	8.2.36.13	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	$ 7.991.784,00	627CC	640CC;641CC;625CC
638	8.2.36.14	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 4.266.700,00	636CC	639CC
639	8.2.36.15	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 1.434.932,00	638CC	642
640	8.2.36.16	MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	$ 369.886,00	637CC	642
641	8.2.36.17	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	3 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	$ 1.834.413,00	637CC	642
642	8.2.36.18	Fin intervención CIV 12000741	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 0,00	625;629;639;640;641	761
643	**8.2.37**	**12000850 (13)**	**24 días**	**jue 19/06/25**	**vie 18/07/25**	**$ 148.223.706,00**		
644	8.2.37.1	REPLANTEO GENERAL	4 días	jue 19/06/25	mié 25/06/25	$ 1.250.210,00	631	646;661
645	8.2.37.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	3 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	$ 6.754.415,00	656CC	659
646	8.2.37.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	3 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	$ 799.817,00	644	647CC;656CC
647	8.2.37.4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	$ 241.020,00	646CC	648CC
648	8.2.37.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	$ 1.307.707,00	647CC	649CC
649	8.2.37.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	mié 25/06/25	jue 26/06/25	$ 107.512.712,00	648CC	650CC;651
650	8.2.37.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	$ 2.681.429,00	649CC	659
651	8.2.37.8	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	$ 2.280.720,00	630;649	652;670

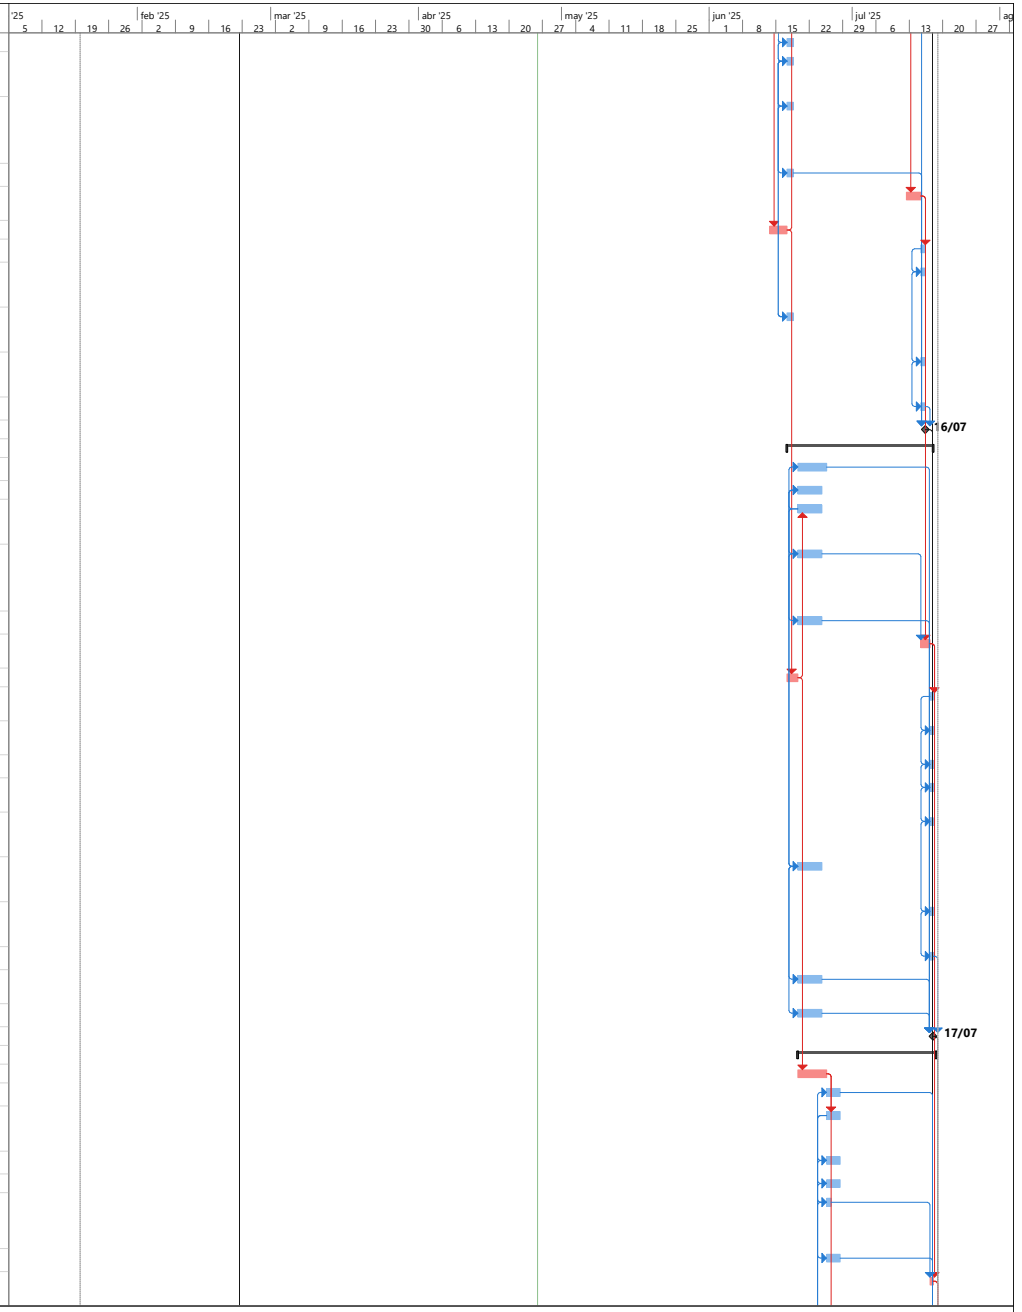

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
652	8.2.37.9	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 240.828,00	651	653CC
653	8.2.37.10	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 389.260,00	652CC	654CC
654	8.2.37.11	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 1.891.848,00	653CC	655CC
655	8.2.37.12	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 292.967,00	654CC	657CC
656	8.2.37.13	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	3 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	$ 11.991.263,00	646CC	658CC;645CC
657	8.2.37.14	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 8.755.097,00	655CC	659
658	8.2.37.15	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	3 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	$ 1.834.413,00	656CC	659
659	8.2.37.16	Fin intervención CIV 12000850	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 0,00	645;650;657;658	761
660	**8.2.38**	**12001383 (42)**	**20 días**	**mié 25/06/25**	**vie 18/07/25**	**$ 15.733.945,00**		
661	8.2.38.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	mié 25/06/25	vie 27/06/25	$ 892.045,00	644	663;674
662	8.2.38.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	$ 570.329,00	664CC	671
663	8.2.38.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	$ 134.977,00	661	664CC
664	8.2.38.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	$ 291.784,00	663CC	666CC;662CC
665	8.2.38.5	SELLO DE FISURAS	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 2.578.000,00	670CC	672
666	8.2.38.6	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	$ 361.530,00	664CC	667CC
667	8.2.38.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	$ 101.922,00	666CC	668CC
668	8.2.38.8	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	$ 8.379.835,00	667CC	669CC;670;671
669	8.2.38.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	$ 208.990,00	668CC	672
670	8.2.38.10	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 380.120,00	668;651	665CC
671	8.2.38.11	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	mar 1/07/25	jue 3/07/25	$ 1.834.413,00	668;662	672
672	8.2.38.12	Fin intervención CIV 12001383	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 0,00	665;669;671	761
673	**8.2.39**	**12002479 (26)**	**2 días**	**vie 27/06/25**	**mar 1/07/25**	**$ 94.702.624,00**		
674	8.2.39.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	$ 489.719,00	661	675;684
675	8.2.39.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	$ 677.700,00	674	676CC
676	8.2.39.3	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	1 día	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	$ 4.673.033,00	675CC	677CC
677	8.2.39.4	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	$ 939.682,00	676CC	678CC
678	8.2.39.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	$ 77.260.368,00	677CC	679CC;680CC
679	8.2.39.6	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	1 día	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	$ 118.208,00	678CC	
680	8.2.39.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	1 día	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	$ 1.926.799,00	678CC	681CC
681	8.2.39.8	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	1 día	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	$ 8.617.115,00	680CC	682
682	8.2.39.9	Fin intervención CIV 12002479	0 días	mar 1/07/25	mar 1/07/25	$ 0,00	681	
683	**8.2.40**	**12002478 (27)**	**2 días**	**sáb 28/06/25**	**mié 2/07/25**	**$ 11.508.674,00**		
684	8.2.40.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	$ 37.940,00	674	685;695
685	8.2.40.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 121.903,00	684	686CC
686	8.2.40.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 161.695,00	685CC	687CC
687	8.2.40.4	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 839.206,00	686CC	688CC
688	8.2.40.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 72.800,00	687CC	689CC
689	8.2.40.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 4.033.152,00	688CC	690CC
690	8.2.40.7	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 21.233,00	689CC	691CC
691	8.2.40.8	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE: OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 6.186.737,00	690CC	692CC
692	8.2.40.9	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 34.008,00	691CC	693
693	8.2.40.10	Fin intervención CIV 12002478	0 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	$ 0,00	692	
694	**8.2.41**	**12001860 (34)**	**16 días**	**mar 1/07/25**	**vie 18/07/25**	**$ 61.777.121,00**		
695	8.2.41.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	$ 145.638,00	684	696

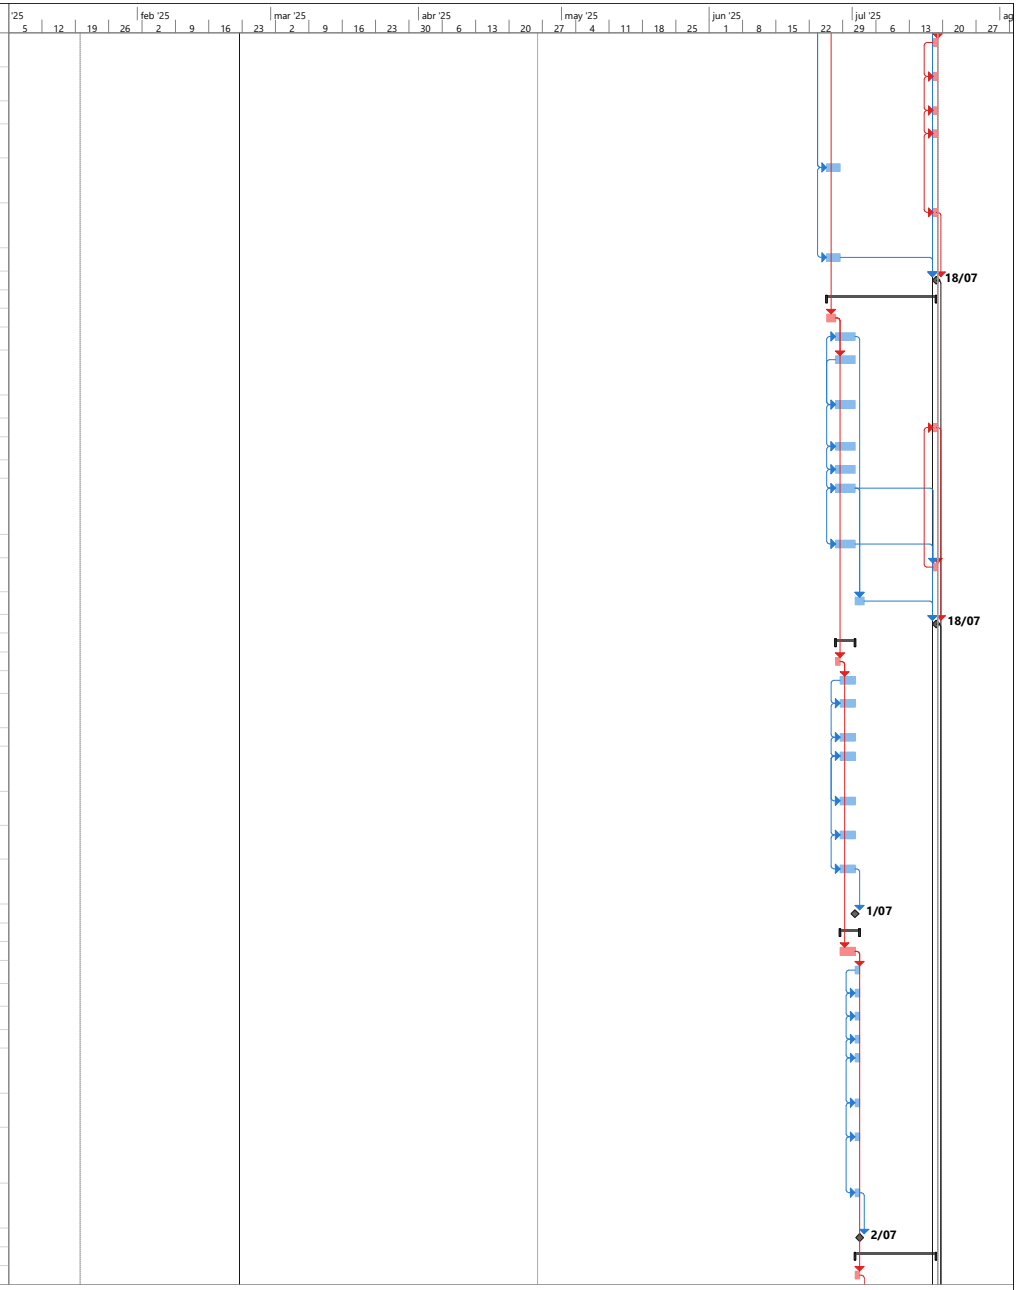

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
696	8.2.41.2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 473.151,00	695	697CC
697	8.2.41.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 530.053,00	696CC	698CC;703CC
698	8.2.41.4	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 3.263.800,00	697CC	699CC
699	8.2.41.5	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 241.020,00	698CC	700CC
700	8.2.41.6	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 1.583.614,00	699CC	701CC
701	8.2.41.7	GEODREN VIAL DE 100MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL E= 30CM Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN.	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 1.945.405,00	700CC	702CC;706CC
702	8.2.41.8	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 566.473,00	701CC	713
703	8.2.41.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 15.676.562,00	697CC	704CC
704	8.2.41.10	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 82.591,00	703CC	705CC
705	8.2.41.11	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 24.061.153,00	704CC	707FC+13 días;712CC
706	8.2.41.12	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 139.760,00	701CC	713
707	8.2.41.13	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 133.757,00	705FC+13 días	708CC
708	8.2.41.14	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 2.450.328,00	707CC	709CC
709	8.2.41.15	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 4.853.510,00	708CC	710CC
710	8.2.41.16	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 229.808,00	709CC	711CC
711	8.2.41.17	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 5.268.030,00	710CC	713
712	8.2.41.18	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 132.468,00	705CC	713
713	8.2.41.19	Fin intervención CIV 12002478	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 0,00	712;711;706;702	715
714	**8.2.42**	**12002432 (I)**	**0 días**	**vie 18/07/25**	**vie 18/07/25**	**$ 0,00**		
715	8.2.42.1	SEGMENTO INTERVENIDO POR OTRO CONTRATO	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 0,00	713	
716	**8.3**	**Actividades de conservación (Puente Vehicular)**	**125 días**	**vie 21/02/25**	**vie 18/07/25**	**$ 222.312.292,00**		
717	**8.3.1**	**12003442**	**125 días**	**vie 21/02/25**	**vie 18/07/25**	**$ 222.312.292,00**		
718	8.3.1.1	REPLANTEO GENERAL	15 días	vie 21/02/25	mar 11/03/25	$ 811.949,00	47	738
719	8.3.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	10 días	vie 21/03/25	jue 3/04/25	$ 12.143.560,00	738;739	720CC;722CC;723
720	8.3.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	15 días	vie 21/03/25	mié 9/04/25	$ 7.162.688,00	719CC	752
721	8.3.1.4	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	5 días	sáb 31/05/25	sáb 7/06/25	$ 40.807,00	741	745
722	8.3.1.5	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	5 días	vie 21/03/25	vie 28/03/25	$ 241.020,00	719CC	752
723	8.3.1.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	jue 3/04/25	lun 7/04/25	$ 851.838,00	719	740
724	8.3.1.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	10 días	sáb 3/05/25	mié 14/05/25	$ 4.262.492,00	746	726CC
725	8.3.1.8	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	3 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	$ 70.031.478,00	727CC	728FC+20 días;735
726	8.3.1.9	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)	10 días	sáb 3/05/25	mié 14/05/25	$ 1.212.375,00	724CC	742
727	8.3.1.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	3 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	$ 1.746.677,00	745	725CC
728	8.3.1.11	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	5 días	vie 11/07/25	jue 17/07/25	$ 159.120,00	725FC+20 días	729
729	8.3.1.12	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 280.393,00	728	730CC
730	8.3.1.13	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 906.419,00	729CC	731CC
731	8.3.1.14	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 793.850,00	730CC	732CC
732	8.3.1.15	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 595.005,00	731CC	733CC
733	8.3.1.16	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 292.967,00	732CC	734CC
734	8.3.1.17	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 7.191.519,00	733CC	747CC

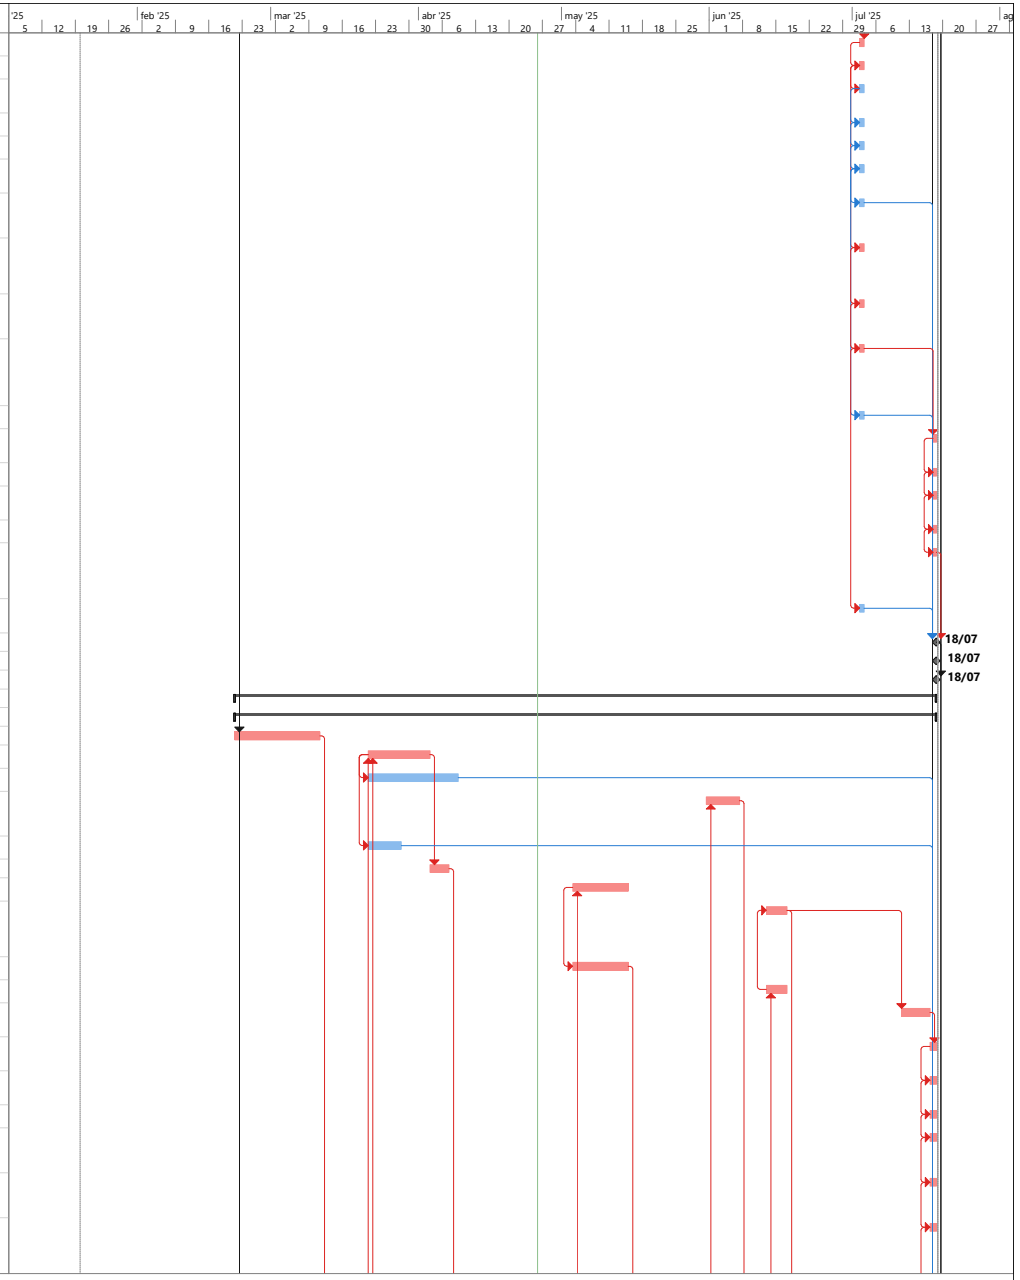

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
735	8.3.1.18	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	20 días	mar 17/06/25	vie 11/07/25	$ 41.317.482,00	725	736CC
736	8.3.1.19	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE: LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS.	20 días	mar 17/06/25	vie 11/07/25	$ 2.724.480,00	735CC	752
737	8.3.1.20	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	5 días	mar 11/03/25	sáb 15/03/25	$ 428.565,00	738CC	752
738	8.3.1.21	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	5 días	mar 11/03/25	sáb 15/03/25	$ 373.412,00	718	719;739;737CC
739	8.3.1.22	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA	5 días	lun 17/03/25	vie 21/03/25	$ 300.975,00	738	719
740	8.3.1.23	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	lun 7/04/25	mié 9/04/25	$ 3.177.105,00	723	746
741	8.3.1.24	ANDEN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	15 días	jue 15/05/25	sáb 31/05/25	$ 9.065.074,00	742CC	744CC;721
742	8.3.1.25	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	15 días	jue 15/05/25	sáb 31/05/25	$ 15.479.221,00	726;746	741CC;743CC;750CC
743	8.3.1.26	RAMPA TIPO A (BS) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.4(	15 días	jue 15/05/25	sáb 31/05/25	$ 5.966.056,00	742CC	751CC
744	8.3.1.27	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACIÓN)	15 días	jue 15/05/25	sáb 31/05/25	$ 2.509.746,00	741CC	752
745	8.3.1.28	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	5 días	sáb 7/06/25	jue 12/06/25	$ 7.810.852,00	721	727
746	8.3.1.29	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	20 días	mié 9/04/25	sáb 3/05/25	$ 15.475.839,00	740	724;742
747	8.3.1.30	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 3.673.778,00	734CC	748CC
748	8.3.1.31	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 1.413.150,00	747CC	749CC
749	8.3.1.32	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	$ 1.834.413,00	748CC	752
750	8.3.1.33	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	15 días	jue 15/05/25	sáb 31/05/25	$ 1.130.324,00	742CC	752
751	8.3.1.34	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	15 días	jue 15/05/25	sáb 31/05/25	$ 907.663,00	743CC	752
752	8.3.1.35	Fin intervención CIV 12003442	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 0,00	749;750;751;744;736;737;	761;753
753	8.4	(Fin) Actividades de obra	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 0,00	752	761
754	9	**COMPONENTES DE GESTIÓN**	125 días	vie 21/02/25	vie 18/07/25	$ 455.953.123,00		
755	9.1	Componente Gestión Ambiental Y SST	125 días	vie 21/02/25	vie 18/07/25	$ 207.524.772,00	47	761
756	9.2	Componente Gestión Social	125 días	vie 21/02/25	vie 18/07/25	$ 90.387.716,00	47	761
757	9.3	Componente Plan de Manejo de Trafico - PMT	125 días	vie 21/02/25	vie 18/07/25	$ 158.040.635,00	47	761
758	10	AJUSTES	125 días	vie 21/02/25	vie 18/07/25	$ 310.744.329,00		
759	10.1	Provisión por cambio de vigencia	125 días	vie 21/02/25	vie 18/07/25	$ 105.054.650,00	47	761
760	10.2	Provisión adicional a los ajustes por cambio de vigencia (según nota 8 presupuesto proponente)	125 días	vie 21/02/25	vie 18/07/25	$ 205.689.679,00	47	761
761	11	Fin contrato	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 0,00	70;86;672;659;642;623;60	

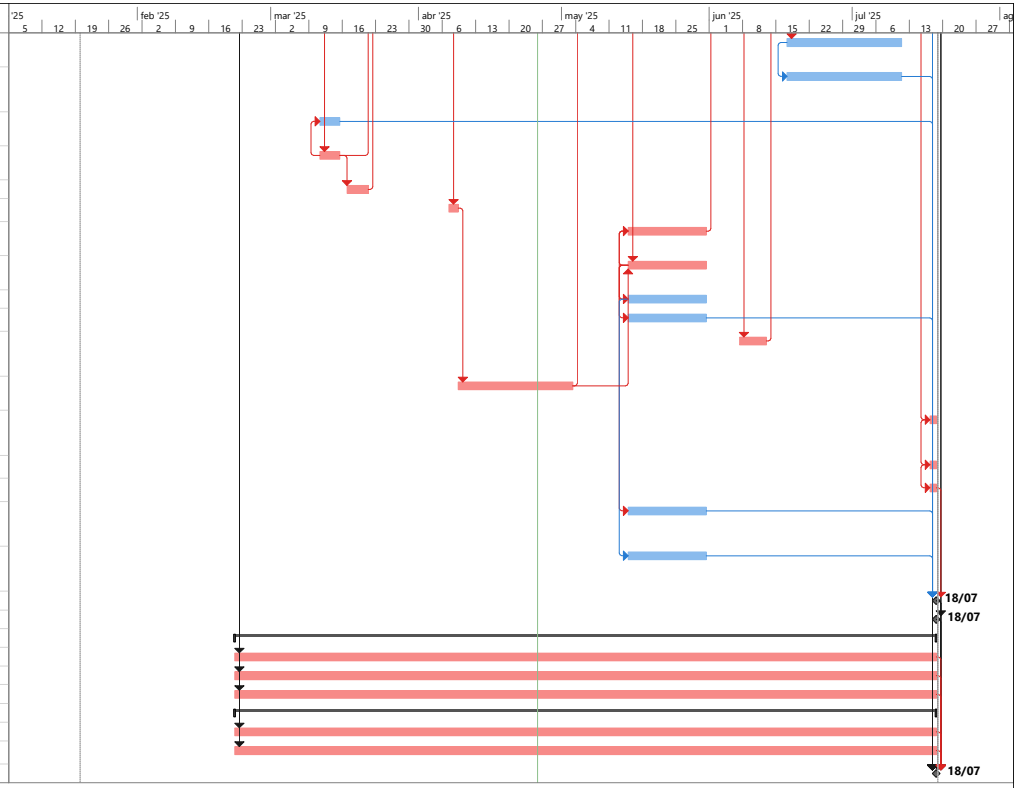

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: sáb 26/04/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	

ANEXO 10.2
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

BALANCE GENERAL DE OBRA - COP-491-2024

OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	FECHA	31/03/2025

PRESUPUESTO OFICIAL									BALANCE GENERAL							
									(+/-) CANTIDADES			ACUMULADAS		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	+ -	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		GENERAL	PARTICULAR												
1	3007	IDU		REPLANTEO GENERAL	M2	9.059,00	$ 1.084,00	$ 9.819.956,00	+	2.756,42	$ 2.987.959,00	+	$ 12.807.915,00	11815,42	$ 12.807.915,00
2	4390	IDU		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	58,00	$ 122.418,00	$ 7.100.244,00	+	41,20	$ 5.043.622,00	+	$ 12.143.866,00	99,2	$ 12.143.866,00
3	4613	IDU		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	495,88	$ 68.872,00	$ 34.152.247,00	+	1.515,40	$ 104.368.629,00	+	$ 138.520.876,00	2011,28	$ 138.520.876,00
4	4158	IDU		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$ 223.862,00	$ 223.862,00	-	-1,00	$ 223.862,00		$ -	0	$ -
5	3864	IDU		IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	4.080,00	$ 3.869,00	$ 15.785.520,00	-	-3.943,00	$ 15.255.467,00	+	$ 530.053,00	137	$ 530.053,00
6	3867	IDU		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	461,00	$ 4.440,00	$ 2.046.840,00	-	-461,00	$ 2.046.840,00		$ -	0	$ -
7	3811	IDU		CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	1,00	$ 3.139,00	$ 3.139,00	+	896,26	$ 2.813.360,00	+	$ 2.816.499,00	897,26	$ 2.816.499,00
8	3010	IDU		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.282,73	$ 45.806,00	$ 58.756.730,00	-	-1.236,68	$ 56.647.364,00	+	$ 2.109.366,00	46,05	$ 2.109.366,00
9	4758	IDU		SELLO DE FISURAS	ML	13,00	$ 10.312,00	$ 134.056,00	+	1.473,00	$ 15.189.576,00	+	$ 15.323.632,00	1486	$ 15.323.632,00
10	4160	IDU		SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	987,08	$ 197.926,00	$ 195.368.796,00	-	-942,74	$ 186.592.757,00	+	$ 8.776.039,00	44,34	$ 8.776.039,00
11	4598	IDU		SELLO DE GRIETAS	ML	2,00	$ 12.028,00	$ 24.056,00	-	-2,00	$ 24.056,00		$ -	0	$ -
12	3724	IDU		LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	27,00	$ 120.510,00	$ 3.253.770,00	+	48,00	$ 5.784.480,00	+	$ 9.038.250,00	75	$ 9.038.250,00
13	4712	IDU		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	37,80	$ 1.853.768,00	$ 70.072.430,00	-	-37,80	$ 70.072.430,00		$ -	0	$ -
14	6449	IDU		MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27,00	$ 791.807,00	$ 21.378.789,00	-	-23,00	$ 18.211.561,00	+	$ 3.167.228,00	4	$ 3.167.228,00
15	4567	IDU		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS).	M3	1,00	$ 1.388.752,00	$ 1.388.752,00	-	-1,00	$ 1.388.752,00		$ -	0	$ -
16	3800	IDU		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	4.980,00	$ 2.080,00	$ 10.358.400,00	+	6.237,54	$ 12.974.083,00	+	$ 23.332.483,00	11217,54	$ 23.332.483,00
17	4905	IDU		GEODREN VIAL DE 100MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL E= 30CM Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN..	ML	363,97	$ 141.484,00	$ 51.495.931,00	-	-350,22	$ 49.550.526,00	+	$ 1.945.405,00	13,75	$ 1.945.405,00
18	6438	IDU		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML	604,29	$ 24.726,00	$ 14.941.675,00	-	-581,38	$ 14.375.202,00	+	$ 566.473,00	22,91	$ 566.473,00
19	3027	IDU		SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1,00	$ 96.699,00	$ 96.699,00	+	43,08	$ 4.165.793,00	+	$ 4.262.492,00	44,08	$ 4.262.492,00
20	4159	IDU		SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$ 188.461,00	$ 188.461,00	-	-1,00	$ 188.461,00		$ -	0	$ -
21	8613	IDU		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	695,18	$ 1.425.142,00	$ 990.730.216,00	+	92,40	$ 131.683.121,00	+	$ 1.122.413.336,00	787,58	$ 1.122.413.336,00
22	4047	IDU		BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)	ML	1,00	$ 80.987,00	$ 80.987,00	+	13,97	$ 1.131.388,00	+	$ 1.212.375,00	14,97	$ 1.212.375,00
23	7788	IDU		CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	1.370,60	$ 3.605,00	$ 4.941.013,00	-	-691,61	$ 2.493.254,00	+	$ 2.447.759,00	678,99	$ 2.447.759,00
24	7798	IDU		DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1,00	$ 52.672,00	$ 52.672,00	+	13,17	$ 693.690,00	+	$ 746.362,00	14,17	$ 746.362,00
25	7791	IDU		BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	31,40	$ 235.608,00	$ 7.398.091,00	-	-31,40	$ 7.398.091,00		$ -	0	$ -
26	8619	IDU		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1.005,48	$ 1.459.136,00	$ 1.467.132.065,00	-	-237,49	$ 346.530.209,00	+	$ 1.120.601.857,00	767,99	$ 1.120.601.857,00
27	6464	IDU		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	1,00	$ 4.265,00	$ 4.265,00	+	11.181,54	$ 47.689.268,00	+	$ 47.693.533,00	11182,54	$ 47.693.533,00
28	7790	IDU		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.	M3	2,00	$ 70.401,00	$ 140.802,00	-	-2,00	$ 140.802,00		$ -	0	$ -
29	7789	IDU		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	1,00	$ 8.840,00	$ 8.840,00	+	2.331,03	$ 20.606.305,00	+	$ 20.615.145,00	2332,03	$ 20.615.145,00
30	7793	IDU		IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	1,00	$ 3.902,00	$ 3.902,00	-	-1,00	$ 3.902,00		$ -	0	$ -
31	7796	IDU		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	M3	241,00	$ 6.988,00	$ 1.684.108,00	-	-134,00	$ 936.392,00	+	$ 747.716,00	107	$ 747.716,00
32	7800	IDU		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1,00	$ 1.459.135,00	$ 1.459.135,00	-	-1,00	$ 1.459.135,00		$ -	0	$ -
33	7803	IDU		REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1,00	$ 1.170,00	$ 1.170,00	+	7.923,58	$ 9.270.589,00	+	$ 9.271.759,00	7924,58	$ 9.271.759,00
34	7807	IDU		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2,00	$ 224.410,00	$ 448.820,00	-	-2,00	$ 448.820,00		$ -	0	$ -
35	8615	IDU		BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	1,00	$ 251.321,00	$ 251.321,00	-	-1,00	$ 251.321,00		$ -	0	$ -
36	3180	IDU		DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	1,00	$ 8.601,00	$ 8.601,00	+	414,94	$ 3.568.899,00	+	$ 3.577.500,00	415,94	$ 3.577.500,00
37	3490	IDU		FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	UN	3,00	$ 74.604,00	$ 223.812,00	-	-3,00	$ 223.812,00		$ -	0	$ -
38	3491	IDU		FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	UN	3,00	$ 59.288,00	$ 177.864,00	-	-3,00	$ 177.864,00		$ -	0	$ -
39	3492	IDU		FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR	UN	1,00	$ 107.706,00	$ 107.706,00	-	-1,00	$ 107.706,00		$ -	0	$ -
40	3872	IDU		DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	1.150,12	$ 3.065,00	$ 3.525.118,00	-	-1.106,48	$ 3.391.361,00	+	$ 133.757,00	43,64	$ 133.757,00
41	4569	IDU		ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	2.393,00	$ 13.317,00	$ 31.867.581,00	-	-1.865,00	$ 24.836.205,00	+	$ 7.031.376,00	528	$ 7.031.376,00
42	4867	IDU		DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	1.150,12	$ 111.217,00	$ 127.912.896,00	-	-1.018,72	$ 113.298.982,00	+	$ 14.613.914,00	131,4	$ 14.613.914,00
43	5225	IDU		PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.230,12	$ 5.266,00	$ 6.477.812,00	+	3.506,04	$ 18.462.807,00	+	$ 24.940.619,00	4736,16	$ 24.940.619,00
44	10264	IDU		BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	2,00	$ 268.800,00	$ 537.600,00	-	-2,00	$ 537.600,00		$ -	0	$ -
45	5409	IDU		FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	UN	1,00	$ 595.005,00	$ 595.005,00	+	9,00	$ 5.355.045,00	+	$ 5.950.050,00	10	$ 5.950.050,00
46	5729	IDU		DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPLASTICA E=2.3MM. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS).	UN	1,00	$ 2.001.885,00	$ 2.001.885,00	-	-1,00	$ 2.001.885,00		$ -	0	$ -
47	5850	IDU		FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	UN	1,00	$ 292.967,00	$ 292.967,00	+	20,00	$ 5.859.340,00	+	$ 6.152.307,00	21	$ 6.152.307,00
48	8566	IDU		PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	391,00	$ 175.601,00	$ 68.659.991,00	+	474,29	$ 83.285.798,00	+	$ 151.945.789,00	865,29	$ 151.945.789,00
49	7967	IDU		TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	822,73	$ 9.634,00	$ 7.926.181,00	-	-805,45	$ 7.759.705,00	+	$ 166.476,00	17,28	$ 166.476,00

BALANCE GENERAL DE OBRA - COP-491-2024

OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	FECHA	31/03/2025

50	6287	IDU		SELLADO DE FISURAS DE ESPESOR MAYOR A 0,5 MM, CON MASILLA ELÁSTICA, SELLANTE DE UN COMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD DEL AMBIENTE. MEDIANTE INSTALACIÓN DE BOQUILLAS Y APLICACIÓN DE GEL SELLANTE SUPERFICIAL, RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSIÓN MODIFICADO CON RESINA ACRÍLICA DE DOS COMPONENTES QUE IMPIDA LA OXIDACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, BOQUILLAS, APLICACIÓN, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	2,00	$ 31.114,00	$ 62.228,00	-	-2,00	-$ 62.228,00		$ -	0	$ -
51	6288	IDU		SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYECCIÓN DE RESINA EPÓXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA, INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MÓDULO ELÁSTICO SEGÚN NORMA ASTM C-88-1-90 TIPO IV. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	39,33	$ 24.137,00	$ 949.308,00	-	-39,33	-$ 949.308,00		$ -	0	$ -
52	3466	IDU		CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	51,00	$ 658.630,00	$ 33.590.130,00	-	-51,00	-$ 33.590.130,00		$ -	0	$ -
53	8953	IDU		BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	ML	71,00	$ 666.411,00	$ 47.315.181,00	-	-9,00	-$ 5.997.699,00	+	$ 41.317.482,00	62	$ 41.317.482,00
54	6294	IDU		REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE: LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS.	ML	131,00	$ 49.536,00	$ 6.489.216,00	-	-76,00	-$ 3.764.736,00	+	$ 2.724.480,00	55	$ 2.724.480,00
55	3011	IDU		DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	121,00	$ 7.291,00	$ 882.211,00	-	-62,22	-$ 453.646,00	+	$ 428.565,00	58,78	$ 428.565,00
56	7801	IDU		DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	105,00	$ 78.308,00	$ 8.222.340,00	-	-100,23	-$ 7.848.811,00	+	$ 373.529,00	4,77	$ 373.529,00
57	4592	IDU		RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA	M2	2,00	$ 2.043,00	$ 4.086,00	+	145,32	$ 296.889,00	+	$ 300.975,00	147,32	$ 300.975,00
58	4581	IDU		RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO	M2	277,00	$ 3.357,00	$ 929.889,00	-	-277,00	-$ 929.889,00		$ -	0	$ -
59	4671	IDU		GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	381,00	$ 11.145,00	$ 4.246.245,00	-	-95,93	-$ 1.069.140,00	+	$ 3.177.105,00	285,07	$ 3.177.105,00
60	3207	IDU		SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	UN	121,00	$ 70.409,00	$ 8.519.489,00	-	-121,00	-$ 8.519.489,00		$ -	0	$ -
61	3210	IDU		BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	2,00	$ 82.621,00	$ 165.242,00	-	-2,00	-$ 165.242,00		$ -	0	$ -
62	5415	IDU		RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN).	M3	2,00	$ 123.708,00	$ 247.416,00	-	-2,00	-$ 247.416,00		$ -	0	$ -
63	4792	IDU		RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	2,00	$ 117.560,00	$ 235.120,00	-	-2,00	-$ 235.120,00		$ -	0	$ -
64	4562	IDU		RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	23,80	$ 163.975,00	$ 3.902.605,00	-	-23,80	-$ 3.902.605,00		$ -	0	$ -
65	3425	IDU		ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	105,00	$ 98.512,00	$ 10.343.760,00	-	-12,98	-$ 1.278.686,00	+	$ 9.065.074,00	92,02	$ 9.065.074,00
66	4051	IDU		ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2,00	$ 93.823,00	$ 187.646,00	-	-2,00	-$ 187.646,00		$ -	0	$ -
67	3745	IDU		PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	277,00	$ 121.301,00	$ 33.600.377,00	-	-149,39	-$ 18.121.156,00	+	$ 15.479.221,00	127,61	$ 15.479.221,00
68	8723	IDU		LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, ANCHO=0.4 m EN COLOR AMARILLO SEGÚN NTC 5610 (Incluye limpieza y alistamiento de superficie, suministro e instalación).	ML	2,00	$ 232.706,00	$ 465.412,00	-	-2,00	-$ 465.412,00		$ -	0	$ -
69	4902	IDU		RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40M).	UN	5,00	$ 1.491.514,00	$ 7.457.570,00	-	-1,00	-$ 1.491.514,00	+	$ 5.966.056,00	4	$ 5.966.056,00
70	4817	IDU		MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	2,00	$ 12.507,00	$ 25.014,00	-	-2,00	-$ 25.014,00		$ -	0	$ -
71	4818	IDU		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE CORTE RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.	M2	2,00	$ 116.717,00	$ 233.434,00	-	-2,00	-$ 233.434,00		$ -	0	$ -
72	4680	IDU		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO	M2	2,00	$ 130.048,00	$ 260.096,00	-	-2,00	-$ 260.096,00		$ -	0	$ -
73	4234	IDU		MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=7MM, 7MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	2,00	$ 8.913,00	$ 17.826,00	-	-2,00	-$ 17.826,00		$ -	0	$ -
74	4233	IDU		MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	2,00	$ 8.913,00	$ 17.826,00	+	279,58	$ 2.491.897,00	+	$ 2.509.723,00	281,58	$ 2.509.723,00
75	4235	IDU		MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	191,00	$ 8.913,00	$ 1.702.383,00	-	-191,00	-$ 1.702.383,00		$ -	0	$ -
76	5242	IDU		RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1M, ANCHO 30CM, ANCHO 4.5CM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	9,00	$ 295.361,00	$ 2.658.249,00	-	-9,00	-$ 2.658.249,00		$ -	0	$ -
							Subtotal	$ 3.393.973.078,00		0,00	-$ 537.028.661,00		$ 2.856.944.417,00		$ 2.856.944.417,00
ITEMS NO PREVISTOS															
NP-1	3722	IDU		NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN		$ 172.896,00	$ 0,00		0,00	$ -		$ -	0	$ -
NP-2	7870	IDU		RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA DE SUMIDERO SL-100. CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LA PLACA DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE ANCLAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, ADHESIVO ESTRUCTURAL, CURADO, MARCO Y REJILLA) ALTURA=20 CM.	UN		$ 1.686.155,00	$ 0,00	+	2,00	$ 3.372.310,00	+	$ 3.372.310,00	2	$ 3.372.310,00
NP-3	7751	IDU		FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3		$ 158.951,00	$ 0,00	+	721,37	$ 114.662.483,00	+	$ 114.662.483,00	721,37	$ 114.662.483,00
NP-4	7792	IDU		FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3		$ 160.156,00	$ 0,00	+	700,69	$ 112.219.708,00	+	$ 112.219.708,00	700,69	$ 112.219.708,00
NP-5	-	IDU		AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 276.453,00	$ 0,00	+	139,98	$ 38.697.891,00	+	$ 38.697.891,00	139,98	$ 38.697.891,00
NP-6	9042	IDU		DESMONTE DE BARRERAS METÁLICAS (A TODO COSTO)	ML		$ 99.128,00	$ 0,00		0,00	$ -		$ -	0	$ -
NP-7	5220	IDU		PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 24.370,00	$ 0,00	+	4.692,52	$ 114.356.712,00	+	$ 114.356.712,00	4692,52	$ 114.356.712,00
NP-8	5227	IDU		PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 34.506,00	$ 0,00	+	835,29	$ 28.822.517,00	+	$ 28.822.517,00	835,29	$ 28.822.517,00
NP-9	6247	IDU		ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA. (incluye la detección de refuerzo para perforacion, la perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ET o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)	CM.PER		$ 2.843,00	$ 0,00		0,00	$ -		$ -	0	$ -
NP-10	-	IDU		MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador).	M3		$ 205.492,00	$ 0,00	+	249,73	$ 51.317.517,00	+	$ 51.317.517,00	249,73	$ 51.317.517,00
NP-11	9706	IDU		TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		$ 611.471,00	$ 0,00	+	117,00	$ 71.542.107,00	+	$ 71.542.107,00	117	$ 71.542.107,00
NP-12	9707	IDU		TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		$ 1.060.715,00	$ 0,00		0,00	$ -		$ -	0	$ -
NP-13	9708	IDU		TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		$ 1.622.270,00	$ 0,00		0,00	$ -		$ -	0	$ -
NP-14	8229	IDU		FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML		$ 27.542,00	$ 0,00	+	41,04	$ 1.130.324,00	+	$ 1.130.324,00	41,04	$ 1.130.324,00
NP-15	8169	IDU		CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2		$ 142.849,00	$ 0,00	+	6,35	$ 907.091,00	+	$ 907.092,00	6,35	$ 907.092,00

BALANCE GENERAL DE OBRA - COP-491-2024

OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	FECHA	31/03/2025

			Subtotal	$ 0,00	$ 537.028.660,00	$ 537.028.661,00	$ 537.028.661,00
			SUBTOTAL VALORES OFERTADOS (Ver Nota 9)	**$ 3.393.973.078,00**	**-$ 1,00**	**$ 3.393.973.078,00**	**$ 3.393.973.078,00**
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)			$ 3.393.973.078,00	$ -	$ 3.393.973.078,00	$ 3.393.973.078,00
	COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST (INCLUYE A.I.U.)	GLB	1	$ 207.524.771,00	$ -	$ 207.524.771,00	$ 207.524.771,00
	COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE A.I.U.)	GLB	1	$ 90.387.716,00	$ -	$ 90.387.716,00	$ 90.387.716,00
	COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - PMT (INCLUYE A.I.U.)	GLB	1	$ 158.040.635,00	$ -	$ 158.040.635,00	$ 158.040.635,00
	PRESUPUESTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	GLB	1	$ 117.352.245,00	$ -	$ 117.352.245,00	$ 117.352.245,00
	PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA	GLB	1	$ 105.054.650,00	$ -	$ 105.054.650,00	$ 105.054.650,00
	PROVISIÓN ADICIONAL A LOS AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver nota 8)	GLB	1	$ 205.689.679,00	$ -	$ 205.689.679,00	$ 205.689.679,00
			VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	**$ 4.278.022.774,00**	**$ -**	**$ 4.278.022.774,00**	**$ 4.278.022.774,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará	**ADMINISTRACION**	**A=**	23,79%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
NOTA 4: Los precios unitarios no deberán sobrepasar los precios tope del anexo, utilizados por la Entidad.	**UTILIDAD**	**U=**	5,00%
NOTA 5: Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en este Formulario	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	29,79%
NOTA 6: Los valores que corresponden a los componentes Social, Ambiental, SST,PMT incluyen AUI y son precios fijos (No se pueden modificar)			
NOTA 7: Los valores que corresponden a la etapa de DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, como también la PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA son precios fijos y NO SUJETO A OFERTA (			
NOTA 8: Teniendo en cuenta que el valor de ejecución del contrato es el definido por la entidad y que además el contrato es a monto agotable, la diferencia entre los valores de SUBTOTAL OBRAS			
NOTA 9: Para el procedimiento de evaluación indicado en el numeral 4.1.OFERTA ECONÓMICA del documento base del pliego de condiciones, se utilizara el valor ofertado por los proponentes,			


ING. GEOVANNY ALEXANDER YAEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

ING. ANDRES MURILLO MAYORGA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 10.3
FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO

Flujo de Caja Contrato COP - 491 -2024 (Cronograma Detallado CLB 3 - Inclusión items no previstos)						
Año	**Mes**	**Fecha**	**Costo**	**Costo Mes**	**Costo acumulado**	**%**
2025	Enero	20/01/2025	$ -		$ -	
		27/01/2025	$ -		$ -	
	Febrero	3/02/2025	$ -	$ 125.330.028,44	$ -	
		10/02/2025	$ -		$ -	
		17/02/2025	$ -		$ -	
		24/02/2025	$ 125.330.028,44		$ 125.330.028	2,93%
	Marzo	3/03/2025	$ 150.066.647,70	$ 528.631.596,94	$ 275.396.676	6,44%
		10/03/2025	$ 74.707.771,80		$ 350.104.448	8,18%
		17/03/2025	$ 201.227.702,11		$ 551.332.150	12,89%
		24/03/2025	$ 102.629.475,33		$ 653.961.625	15,29%
		31/03/2025	$ 84.161.474,93		$ 738.123.100	17,25%
	Abril	7/04/2025	$ 215.638.164,30	$ 749.713.236,98	$ 953.761.265	22,29%
		14/04/2025	$ 146.812.187,34		$ 1.100.573.452	25,73%
		21/04/2025	$ 121.443.795,90		$ 1.222.017.248	28,57%
		28/04/2025	$ 181.657.614,51		$ 1.403.674.862	32,81%
	Mayo	5/05/2025	$ 142.248.547,22	$ 1.020.499.081,49	$ 1.545.923.410	36,14%
		12/05/2025	$ 142.241.442,01		$ 1.688.164.852	39,46%
		19/05/2025	$ 127.162.716,71		$ 1.815.327.568	42,43%
		26/05/2025	$ 200.757.013,80		$ 2.016.084.582	47,13%
		2/06/2025	$ 408.089.361,75		$ 2.424.173.944	56,67%
	Junio	9/06/2025	$ 290.409.612,31	$ 1.338.351.514,80	$ 2.714.583.556	63,45%
		16/06/2025	$ 447.925.038,97		$ 3.162.508.595	73,92%
		23/06/2025	$ 271.934.402,75		$ 3.434.442.998	80,28%
		30/06/2025	$ 328.082.460,77		$ 3.762.525.459	87,95%
	Julio	7/07/2025	$ 252.230.559,21	$ 515.497.315,82	$ 4.014.756.018	93,85%
		14/07/2025	$ 161.773.657,72		$ 4.176.529.676	97,63%
		21/07/2025	$ 101.493.098,89		$ 4.278.022.774	100,00%
Total			**$ 4.278.022.774**			

GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO BYR SG BU 001

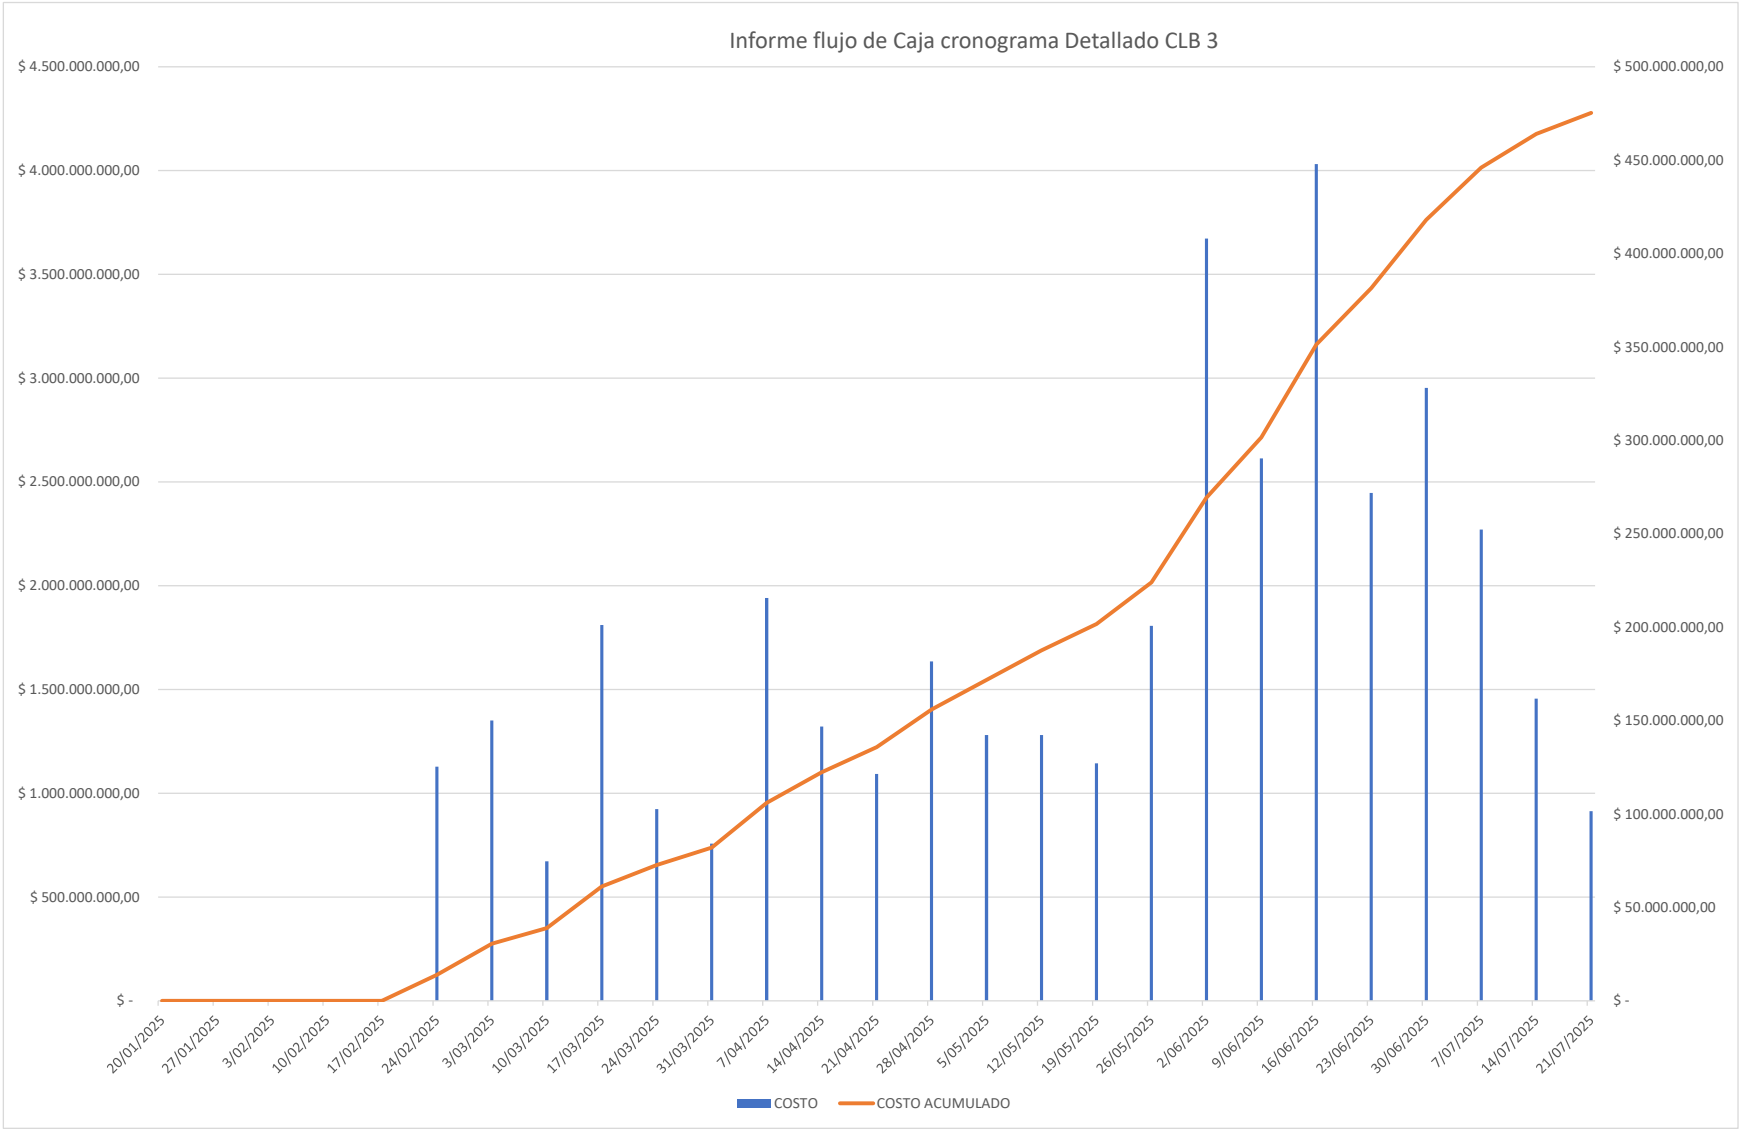
Informe flujo de Caja cronograma Detallado CLB 3
$ 4.500.000.000,00
$ 4.000.000.000,00
$ 3.500.000.000,00
$ 3.000.000.000,00
$ 2.500.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 1.500.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ -
$ 500.000.000,00
$ 450.000.000,00
$ 400.000.000,00
$ 350.000.000,00
$ 300.000.000,00
$ 250.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ 100.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ -
20/01/2025
27/01/2025
3/02/2025
10/02/2025
17/02/2025
24/02/2025
3/03/2025
10/03/2025
17/03/2025
24/03/2025
31/03/2025
7/04/2025
14/04/2025
21/04/2025
28/04/2025
5/05/2025
12/05/2025
19/05/2025
26/05/2025
2/06/2025
9/06/2025
16/06/2025
23/06/2025
30/06/2025
7/07/2025
14/07/2025
21/07/2025
COSTO
COSTO ACUMULADO

ANEXO 11
REGISTRO FOTOGRAFICO
ANTES Y DESPUES

FDLBU COP 491 DE 2024 (120329).

No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
20	12000329	CL 93 A	KR 60 B	TV 60 C	Calzada	180088

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000329

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
11	12000201	CL 94	KR 65	KR 64	Calzada	180113

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000201

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
12	12000359	TV 60 C	CL 90	CL 93	Calzada	178149

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000359

ANTES





DESPUES



No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
37	12000511	CL 90	KR 58	KR 50	Calzada	180029


REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000511

ANTES





DESPUES

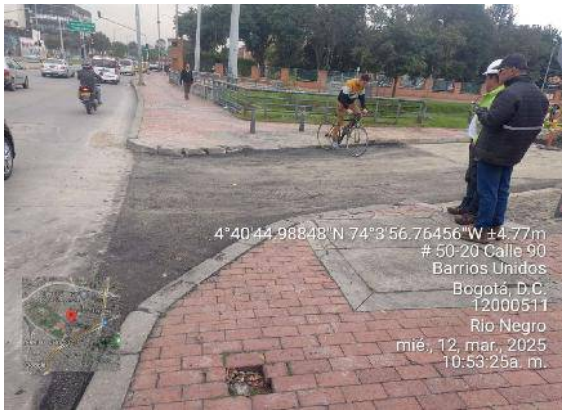

No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
21	12000392	CL 93	KR 58	KR 57	Calzada	180076


REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000392

ANTES





DESPUES

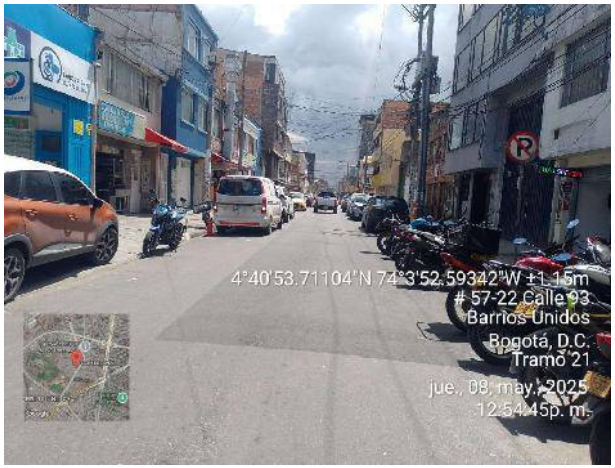



No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
36	12000458	CL 91 A	KR 58	KR 50	Calzada	180065

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000458

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
10	12000858	KR 49 A	CL 85	CL 85 A	Calzada	178433

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000858

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
35	12000076	CL 99	KR 48	KR 49	Calzada	180212

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000076

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
22	12003240	CL 73	KR 22	NA	Calzada	91017826

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12003240

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
7	12002698	CL 65	KR 14 A	AV 14	Calzada	179127

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12002698

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
33	12001889	KR 29	CL 71 C	CL 72	Calzada	178508

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12001889

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
40	12002192	KR 21	CL 89	CL 87	Calzada	178484

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12002192

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
28	12002472	CL 66	KR 22	KR 21	Calzada	179187

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12002472

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
30	12002498	KR 20	CL 66	CL 67	Calzada	178907

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12002498

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
4	12000797	KR 67	CL 67 G	NA	Calzada	177772

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000797

ANTES





DESPUES



No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
6	12000816	KR 67	CL 67 F	NA	Calzada	177771

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000816


ANTES





DESPUES



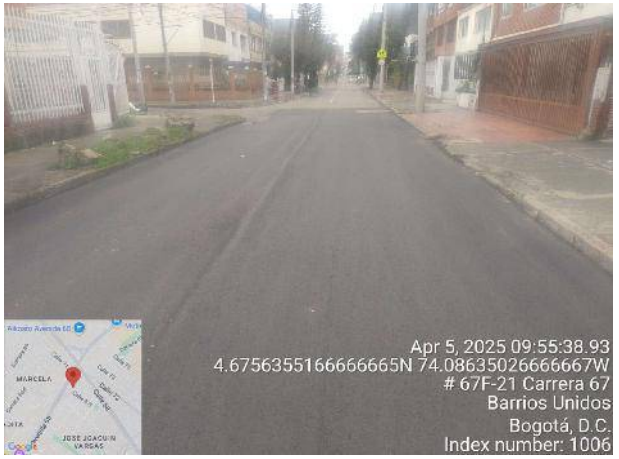

No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
24	12001694	KR 55	CL 70 BIS	CL 70	Calzada	178211

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12001694

ANTES





DESPUES






No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
23	12001652	CL 70 A	KR 55	KR 54	Calzada	179430

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12001652

ANTES



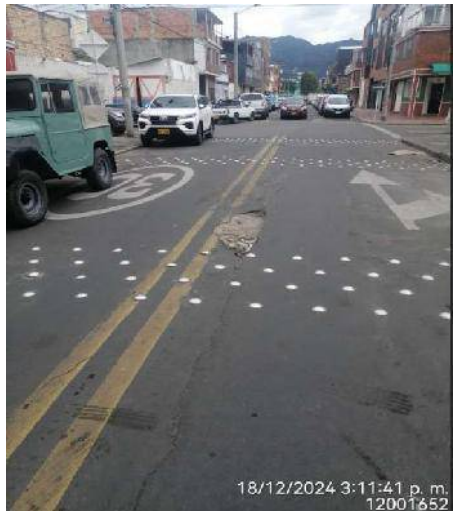

DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
25	12001030	CL 74 A	KR 58	KR 60	Calzada	179618

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12001030

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
41	12000891	KR 55 B	CL 78	CL 79	Calzada	178182

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000891

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
3	12003134	DG 76 BIS	KR 52	KR 51	Calzada	91017774

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12003134

ANTES





DESPUES






No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	Calzada	177846

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12001109

ANTES



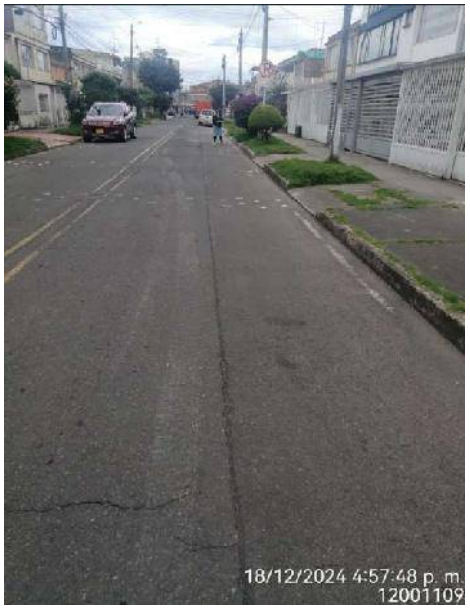

DESPUES






No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
8	12000661	CL 87	KR 49 A	KR 49	Calzada	179945

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000661

ANTES

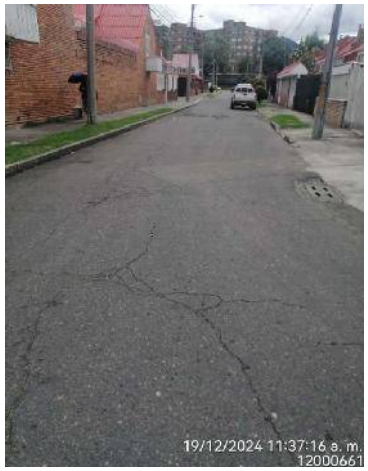



DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	Calzada	179246

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12001917

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
39	12000849	CL 79 A	KR 55	KR 55	Calzada	179817

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12000849

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
31	12002070	DG 74 BIS	KR 20 B	CL 75	Calzada	179602

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12002070

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
43	12003383	KR 51	DG 71 BIS	DG 71 BIS	Puente	24119363

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12003383

ANTES





DESPUES





No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	Calzada	178287

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CIV 12001662

ANTES





DESPUES


No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
9	12000809	CL 85 A	KR 50	KR 49 A	Calzada	179925

ANTES





DESPUES

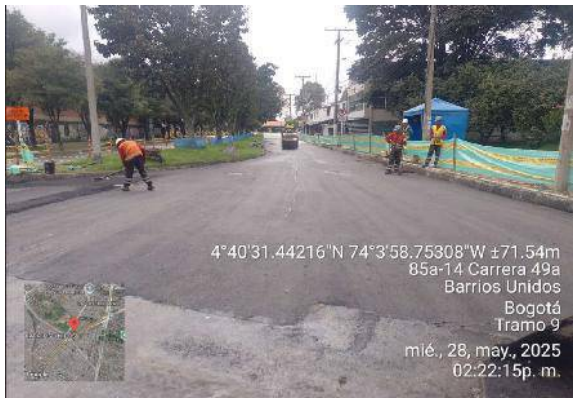



No.	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	ELEMENTO	PK-ID
32	12000239	KR 58	CL 94 B	CL 94 C	Calzada	178310

ANTES





ANEXO 12
APROBACIÓN INFORME CONTRATISTA
