CONTRATO No. 3654-2023

OBJETO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No 9

PERIODO INFORME: 01/12/2024 AL 30/12/2024

San Juan de Pasto, Diciembre de 2024

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	17-jul-25			CORTE	31/12/2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	**CM003-2023**				
CONTRATO No:	GN3654-2023				
CDP DEPARTAMENTAL No.:	2023030039	FECHA:	6-mar-23	VALOR	$ 400.000.000,00
REGISTRO DEPARTAMENTAL No:	2023070809	FECHA:	31-jul-23	VALOR	$ 295.743.798,00
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**				
CONTRATISTA DE CONSULTORIA:	CONSORCIO NOGAC R.L. ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA - Nit. 901737531-1				
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	HELBER VALENCIA MEJIA Nit: 79745984-7				
SUPERVISOR	**GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS				
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	**JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**				
META FISICA	DISEÑO 7 PUENTES FASE II				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 295.743.798,00				
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26-jul-23				
APORTE DEPARTAMENTO CONTRATO:	$ 295.743.798,00				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) Meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	20-dic-23				
FECHA DE ACTA INICIO:	12-abr-24				
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	11-sep-24				
MODIFICATORIO No 1:	11-sep-24 Prórroga del plazo de ejecucion contractual por tres (3) meses				
FECHA DE TERMINACION MOD No 1:	10-dic-24				
FECHA MODIFICATORIO No 1:	10-dic-24				
FECHA DE TERMINACION MOD No 2:	**31-dic-24**				
ACTA RECIBO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	**30-dic-24**				
PORCENTAJE ANTICIPO	20% del valor del contrato				

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

TOTAL ANTICIPO 20%	$	59.148.759,60			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTICIPO	$	-			
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
PÓLIZA No.:	18-44-101091264				
% AVANCE FISICO CONTRATO:	% PROGRAMADO:	100%	% EJECUTADO:	100%	
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	100%	% EJECUTADO	60%	
META FISICA A LA FECHA	DISEÑO 7 PUENTES FASE II		% EJECUTADO	100%	

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: El alcance del contrato incluye el Diseño Fase II (Fase Factibilidad) de Siete (7) Puentes Vehiculares en Territorio Unipa, los volúmenes tecnicos a entregar son: Volumen I Estudio de Tránsito, Volumen II Levantamiento Topográfico, Volumen III Estudio y Diseño Geométrico, Volumen IV Estudio Geologia y Geomorfologia, Volumen V Estudio Geotécnico, Volumen VI Estudio de Estabilidad de Taludes, Volumnen VII Estudio de Pavimentos, Volumen VIII Estudio Hidrológico e Hidráulico, Volumen IX Estudio Estructural, Volumen X Estudio Impacto Ambiental, Volúmen XI Estimacion Costos, Volúmen XII Documentacion SGR, Volumen XIII Informe Final. **ABRIL 2024:** Se adelanta Evaluacion del Equipo Profesional de Trabajo (**08-04-2024**), Comite Técnico (**24-04-2024**) Unipa-Gobernacion-Consultor para Coordinacion Visitas de Campo. Visitas de Campo: Guiza, Pulgande, Rio Nulpe, Rio Ñambi, Rio Telembí, Palvi y Guelmambi. **MAYO 2024:** Se presenta Informe de Visita de Campo (**31-05-2024**), donde se puede identificar las condiciones de cada una de las siete zonas a intervenir. Según comite celebrado con Unipa-Contratistas-SIMD, la organizacion UNIPA plantea los tipos de puente asi: **1. Puentes Vehiculares:** Guiza, Pulgande, Nulpe, Ñambi, Telembí y Guelmambi. **2. Puentes Peatonales:** Palvi. El informe de Visita de Campo identifico que no existe accesibilidad vehícular en ninguna de las 7 zonas a intervenir, por lo anteriormente expresado se adelantará comites tecncos con UNIPA para dar claridad a la viabilidad tecnica de ejecutar puentes vehículares. **JUNIO 2024:** Se adelantan Comites Técnicos con la organizacion **UNIPA** y la **SIMD** con el propósito de socializar los hallazgos de las Visitas de Campo y el tipo de puentes a implementarse. **UNIPA** manifiesta que existen compromisos con **INVIAS**, en virtud del **AUTO 620 de 2017,** segun el cual se obliga al Gobierno Nacional a la Proteccion de los derechos fundamentales de los pueblos indigenas y se ordena a la Vicepresidencia de la Republica de Colombia a adelantar obras de infraestructura vial en los territorios jurisdicción de la organizacion **UNIPA.** Entre dichos compromisos esta la adecuacion de corredores para transito vehicular en los cuales se encuentran ubicados algunos de los puentes objeto del presente proceso. **JULIO 2024:** Se adelantan Comites Técnicos con INVIAS y VICEPRESIDENCIA de la República con el propósito de identificar cuales de los puentes a diseñarse estan sobre corredores viales a adecuarse como vehiculares dentro de compromisos del **AUTO 620 de 2017**. Una vez adelantados dichos comites y articulada la informacion de la consultoria con los compromisos del **INVIAS** y el **VICEMINISTERIO**, se concluyó lo siguiente: **1.** Puentes Vehiculares: **Guiza, Pulgande, Nulpe, Ñambi y Telembí 2.** Puentes Peatonales: **Palvi y Guelmambi.** Se presentan los productos de Topografia y Estudio de Tránsito, por parte del Consultor, debidamente avalados por Interventoria. **AGOSTO 2024:** La definicion del tipo de Puentes a diseñarse en cada una de las 7 zonas, se reafirma y valida por parte de la Organizacion **UNIPA,** mediante comunicado **UNIPA-CONSMAY-2024-621** (**14-08-2024**). Lo anterior ha atrazado la ejecucion contractual del proyecto. La consultoria presenta los perfiles transversales de Puente Vehicular y Peatonal; se requiere a interventoria para su aprobación segun **SIM-1272-2020** (**28-08-2024**).

SEPTIEMBRE 2024: Interventoria segun documento **HMV-OF-02-3884** (**02-09-2024**) aprueba los perfiles transversales de los puentes vehiculares y peatonales. El contratista solicita prórroga al plazo de ejecucion contractual con lo cual se hace necesario reprogramar la entrega de productos. Se continua con la ejecucion contractual de la consultoria. **OCTUBRE 2024:** Para este periodo de informe, se deben entregar por parte del Consultor los Estudios Hidráulicos de Cuatro (**4**) Puentes y los Estudios Geotécnicos de Cuatro (**4**) Puentes. **NOVIEMBRE 2024:** Se entrega revisados y aprobados por parte de Interventoria, los productos del mes de Octubre de 2024, segun Cronograma del Modificatorio No 1; relacionados asi: **VOLUMEN V - GEOTECNIA (Guelmambi, Palbí, Nulpe, Pulgande). VOLUMEN VII - HIDRÁULICA E HIDROLOGIA (Guelmambi, Palbí. Guiza, Nulpe, Ñambí, Pulgande).** Es importante mencionar que para este periodo de informe se entregán los Estudios Geotécnicos de dos (2) puentes mas. **DICIEMBRE 2024: Se entregan los volúmenes de los siete (7) puentes, sin embargo en virtud a observaciones de la Secretaría de Infraestructura y Minas y de la organizacion UNIPA. VIGENCIA 2025: Solamente una vez adelantadas las subsanaciones según los siguientes comites y requerimientos: UNIPA-CONSMAY-2025-141 (13-02-2025), SIM-0172-2025 (21-02-2025), UNIPA-CONSMAY-2025-469 (02-04-2025), Requerimiento Complemento (22-04-2025), Acta Compromisos Consultor (30-04-2025), SIM-0522-2025 (21-05-2025) Reiteracion Ajustes, Comite Tecnico (10-06-2025), SIM-0823-2025 (15-07-2025).**

Se adelanta el recibo a satisfacion de los productos por parte de INTERVENTORIA. Los puentes entregados son:

1. PUENTE VEHICULAR PULGANDE (L=50m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
2. PUENTE VEHICULAR NULPE (L=140m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
3. PUENTE VEHICULAR GUIZA (L=120m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
4. PUENTE PEATONAL GUELMAMBI (L=70m) Volúmenes I-II-IV-V-VI-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
5. PUENTE VEHICULAR ÑAMBI (L=100m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
6. PUENTE PEATONAL PALBI (L=70m) Volúmenes I-II-IV-V-VI-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
7. PUENTE VEHICULAR TELEMBI (L=80m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII

ASPECTOS FINANCIEROS: Según la forma de pago establecida en el anexo contractual, se pactó la entrega de un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato (**$ 59'148.759,60**), Pagos Parciales Mensuales con amortizacion de anticipo, de acuerdo a consultoria ejecutada, recibida, revisada y aprobada por Interventoria. **ABRIL 2024:** Plan de Inversion Anticipo (**22-04-2024** Aprobacion Anticipo Interventoria (**22-04-2024**). **MAYO 2024:** El Contratista realiza solicitud de cambio de Cuenta Bancaria (**03-04-2024**). La cual se tramita segun **SIM-0390-2024** (**04-05-2024**). Pago Anticipo (**$ 59'148.759,60**) (**16-05-2024**). **JUNIO 2024:** No se adelantó tramites de pago durante este periodo de informe. **JULIO 2024:** Se adelantó suscripción documentacion de Pago Parcial No 1 (**12-07-2024**). **AGOSTO 2024:** Se da trámite al Pago Parcial No **1** en **SISCAR. SEPTIEMBRE 2024:** Se adelantó suscripción documentacion de Pago Parcial No **2** (**23-09-2024**). **OCTUBRE 2024:** Se dá trámite al Pago Parcial No **2** en **SISCAR. NOVIEMBRE 2024: Se entregan por parte de Tesoreria el Comprobante de Egreso del Anticipo (16-05-2024), Comprobante de Egreso Parcial No 1 (11-09-2024), Comprobante Egreso Parcial No 2 (05-11-2024). DICIEMBRE 2024: Se entrega por parte de Tesoreria el Comprobante de Egreso Parcial No 5 (27-12-2025). Es importante mencionar que los Pagos Parciales No 3, No 4, No 5 y No 6, fueron autorizados por la SIMD, pero los mismos por cierre de vigencia no fueron pagados por las Dependencias financieras de la Gobernacion de Nariño, a excepcion del Pago Parcial No 5. El avance financiero establecido en este informe hace referencia al recurso efectivamente desembolsado y los cuales cuentan con comprobante de egreso.**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: ABRIL 2024: Acta Inicio (**12-04-2024**). Comité Técnico (**24-04-2024**). Informe Interventoria No 1. **MAYO 2024:** Comité Tecnico (**28-05-2024**). **JUNIO 2024: Comité Tecnico (14-06-2024). Comité Tecnico (24-06-2024). JULIO 2024:** Comité Técnico Vicepresidencia (**07-07-2024**), Comite Técnico **Vicepresidencia-INVIAS** (**26-07-2024**), **Comite Técnico Vicepresidencia-INVIAS** (**30-07-2024**). **SIM-1045-2024** (**19-07-2024**) Tipo Puentes, Acta Parcial No 1 (**12-07-2024**), Certifcacion Parcial Cumplimiento No **1** (**17-07-2024**). **AGOSTO 2024: SIM-1187-2024** (**18-08-2024**) Certificado Ingreso Almacén. Comite Técnico (**23-08-2024**) Perfiles Puentes. **SEPTIEMBRE 2024:** Informe Supervision Modificatorio No **1** (**10-09-2024**). Modificatorio No **1** (**09-11-2024**) Prórroga tres (**3**) meses. Acta Parcial No **2** (**23-09-2024**), Certifcacion Parcial Cumplimiento No **2** (**23-09-2024 OCTUBRE 2024:** Se adelanta por parte de Interventoria la revision de los productos entregados por el Consultor. Se realiza Ingreso a Almacen del Acta Parcial No **2** (**01-10-2024**). Se adelanta Comite Técnico con Vicepresidencia, en virtud del **AUTO 620** de **2017** (**09-10-2024**). **NOVIEMBRE 2024:Se suscribe Acta Parcial No 3 (22-11-2024), Certificacion Cumplimiento Parcial No 3 (22-11-2024), Acta Parcial No 4 (22-11-2024), Certificacion Cumplimiento Parcial No 4 (22-11-2024), Acta Parcial No 5 (22-11-2024), Certificacion Cumplimiento Parcial No 5 (22-11-2024), Acta Parcial No 6 (22-11-2024), Certificacion Cumplimiento Parcial No 6 (22-11-2024). DICIEMBRE 2024: Se suscribe el Modificatorio No 1 (10-12-2025); se proyecta el Acta Parcial No 7 (30-12-2024) y Acta Parcial No 8 (30-12-2024), en virtud a la forma de pago establecida. VIGENCIA 2025: Se suscribe la Certificacion Cumplimieto Pago No 7 (17-07-2025) y Certificacion Cumplimiento Final (17-07-2025)**

ASPECTOS LEGALES: ABRIL 2024: Certificado Legalizacion Inicial (**30-12-2023**), Correo Trámite Póliza (**16-04-2024**). **MAYO 2024:** Radicacion Poliza Acta Inicio (**01-05-2024**), la cual se remite al DAC para legalizacion. **JUNIO 2024:** Se aprueba Póliza Acta Inicio por el **DAC. JULIO 2024:** No se adelantan legalizaciones durante este periodo de informe. **AGOSTO 2024:** No se adelantan legalizaciones durante este periodo de informe. **SEPTIEMBRE 2024:** Se solicita al contratista trámite de póliza en virtud del Modificatorio No **1**, la cual es aprobada por el **DAC. OCTUBRE 2024:** Se legaliza por parte del **DAC** el Modificatorio No **1** del Contrato de Consultoria **GN3654-2023**, mediante Certificado de Legalizacion del **29-10-2024. NOVIEMBRE 2024:** No se adelantan legalizaciones durante este periodo de informe. **DICIEMBRE 2024: Se remite para legalizacion al DAC la documentacion del Modificatorio No 1. VIGENCIA 2025: Se legaliza por parte del DAC el Modificatorio No 2 del Contrato de Consultoria GN3654-2023, mediante Certificado de Legalizacion del 16-06-2025**

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe debe hacer entrega de la VERSION FINAL AJUSTADA, a la organizacion UNIPA, en virtud al AUTO 620 de 2017. Se recomienda una vez tramitados los pagos pendientes, avanzar en la liquidacion del presente Contrato.

Proyecto: Ing. **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**
Contratista Apoyo a la Supervisión - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**
Subsecretario de Infraestructura y Vias - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

4. REGISTRO PRODUCTOS

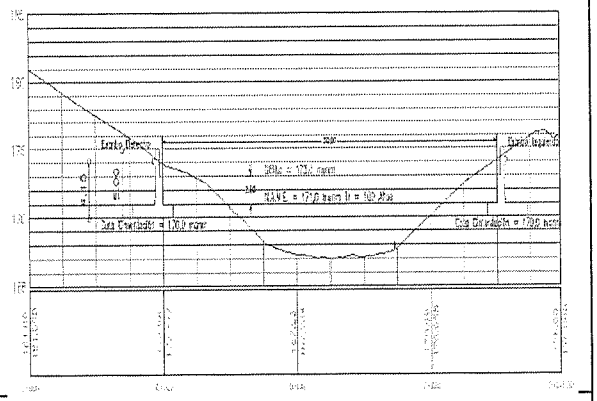


Imagen 1: Puente Pulgande

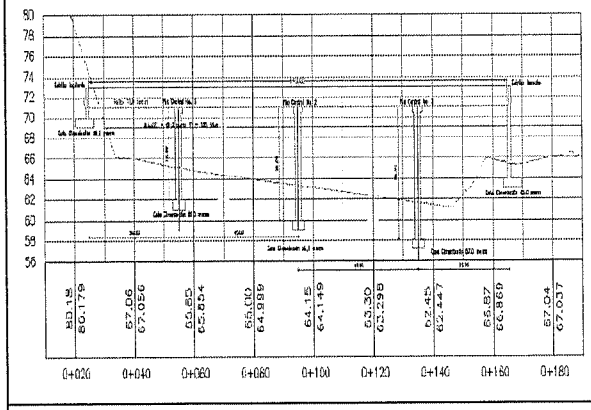


Imagen 2: Puente Nulpe

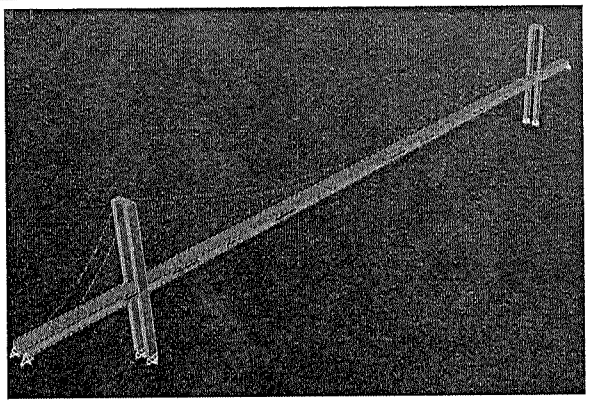


Imagen 3: Puente Guelmambi

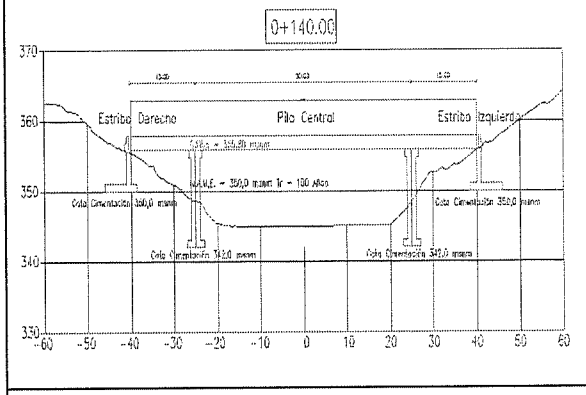


Imagen 4: Puente Guelmambi

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No:	GN3654-2023

ACTAS	FECHA	VALOR TOTAL	ACUMULADO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	VALOR EGRESO	TOTAL DESCUENTOS	COM EGRESO No	FECHA PAGO
ANTICIPO	16/05/2024				$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	2024002931	16/05/2024
ACTA PARCIAL No 1	12/07/2024	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ 11.829.751,92	$ 47.319.007,68	$ 40.434.007,68	$ 6.885.000,00	2024007871	11/09/2024
ACTA PARCIAL No 2	23/09/2024	$ 59.148.759,60	$ 118.297.519,20	$ 11.829.751,92	$ 47.319.007,68	$ 40.434.007,68	$ 6.885.000,00	2024010084	5/11/2024
ACTA PARCIAL No 3	22/11/2024	$ 29.574.379,80	$ 147.871.899,00	$ 5.914.875,96					
ACTA PARCIAL No 4	22/11/2024	$ 29.574.379,80	$ 177.446.278,80	$ 5.914.875,96					
ACTA PARCIAL No 5	22/11/2024	$ 29.574.379,80	$ 207.020.658,60	$ 5.914.875,96	$ 23.659.503,84	$ 20.217.503,84	$ 3.442.000,00	24015928	27/12/2024
ACTA PARCIAL No 6	22/11/2024	$ 29.574.379,80	$ 236.595.038,40	$ 5.914.875,96					
ACTA PARCIAL No 7	17/07/2025	$ 29.574.379,80	$ 266.169.418,20	$ 5.914.875,96					
ACTA PARCIAL No 8	17/07/2025	$ 29.574.379,80	$ 295.743.798,00	$ 5.914.875,96					
TOTAL		**$ 295.743.798,00**		**$ 59.148.759,60**	**$ 177.446.278,80**	**$ 160.234.278,80**	**$ 17.212.000,00**		

AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	60%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No:	GN3654-2023
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
POLIZA No:	18-44-101091264

AMPARO	VALOR	TIEMPO
Cumplimiento del Contrato	20% del valor del contrato	Hasta liquidacion del contrato
Buen Manejo Anticipo	100% del valor del anticipo	Hasta liquidacion del contrato o hasta amortización anticipo
Salarios, Prestaciones Sociales	10% del valor del contrato	Plazo ejecucion del contrato y 3 años mas
Calidad Servicio	30% del valor del contrato	Plazo ejecucion contrato y 3 años mas

ANEXO 0			FECHA APROBACION	19/12/2023	FECHA EXPEDICION	1/08/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 59.148.760,00	20%	31-jul-23	30-jun-24	Póliza Inicial del Contrato	(382)
Buen Manejo Anticipo	$ 59.148.760,00	100%	31-jul-23	30-jun-24	Póliza Inicial del Contrato	(382)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 29.574.380,00	10%	31-jul-23	31-dic-26	Póliza Inicial del Contrato	532
Calidad Servicio	$ 88.723.139,40	30%	31-jul-23	31-dic-26	Póliza Inicial del Contrato	532

ANEXO 1			FECHA APROBACION	18/04/2024	FECHA EXPEDICION	18/04/2024
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 59.148.760,00	20%	12-abr-24	13-mar-25	Poliza Acta de Inicio	(126)
Buen Manejo Anticipo	$ 59.148.760,00	100%	12-abr-24	13-mar-25	Poliza Acta de Inicio	(126)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 29.574.380,00	10%	12-abr-24	13-sep-27	Poliza Acta de Inicio	788
Calidad Servicio	$ 88.723.139,40	30%	12-abr-24	13-sep-27	Poliza Acta de Inicio	788

ANEXO 3			FECHA APROBACION	18/04/2024	FECHA EXPEDICION	18/09/2024
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 59.148.760,00	20%	12-abr-24	10-jun-25	Poliza Modificatorio No 1	(37)
Buen Manejo Anticipo	$ 59.148.760,00	100%	12-abr-24	10-jun-25	Poliza Modificatorio No 1	(37)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 29.574.380,00	10%	12-abr-24	10-dic-27	Poliza Modificatorio No 1	876
Calidad Servicio	$ 88.723.139,40	30%	12-abr-24	10-dic-27	Poliza Modificatorio No 1	876

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016


ANEXO 4			FECHA APROBACION	22/05/2025	FECHA EXPEDICION	26/12/2024
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 59.148.760,00	20%	12-abr-24	30-jun-25	Poliza Modificatorio No 2	(17)
Buen Manejo Anticipo	$ 59.148.760,00	100%	12-abr-24	30-jun-25	Poliza Modificatorio No 2	(17)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 29.574.380,00	10%	12-abr-24	31-dic-27	Poliza Modificatorio No 2	897
Calidad Servicio	$ 88.723.139,40	30%	12-abr-24	31-dic-27	Poliza Modificatorio No 2	897

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION	Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION

CONTRATO No.:	GN3654-2023

CAP.	ACTIVIDAD	DETALLE - ACTIVIDADES	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	MES 1	Visita Campo-Informe Visita	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	100,00%
2	MES 2	Tránsito-Topografia	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	100,00%
3	MES 3	Definicion Tipo Puentes INVIAS-UNIPA-MIN TRANSPORTE	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ -	100,00%
4	MES 4	Definicion Tipo Puentes INVIAS-UNIPA-MIN TRANSPORTE	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ -	100,00%
5	MES 5	Hidrológico-Geologia-Geotecnia	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ -	100,00%
6	MES 6	Hidrológico-Geologia-Geotecnia	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ -	100,00%
7	MES 7	Geométrico-Hidrologico-Ambiental-Geotecnia-Estructural	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ -	100,00%
8	MES 8	Geométrico-Ambiental-Estructural-Costos-SGR-Informe Final	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ 29.574.379,80	$ -	100,00%
9	FINAL	COSTO TOTAL	$ 295.743.798,00	$ 295.743.798,00	$ 295.743.798,00	$ -	100,00%

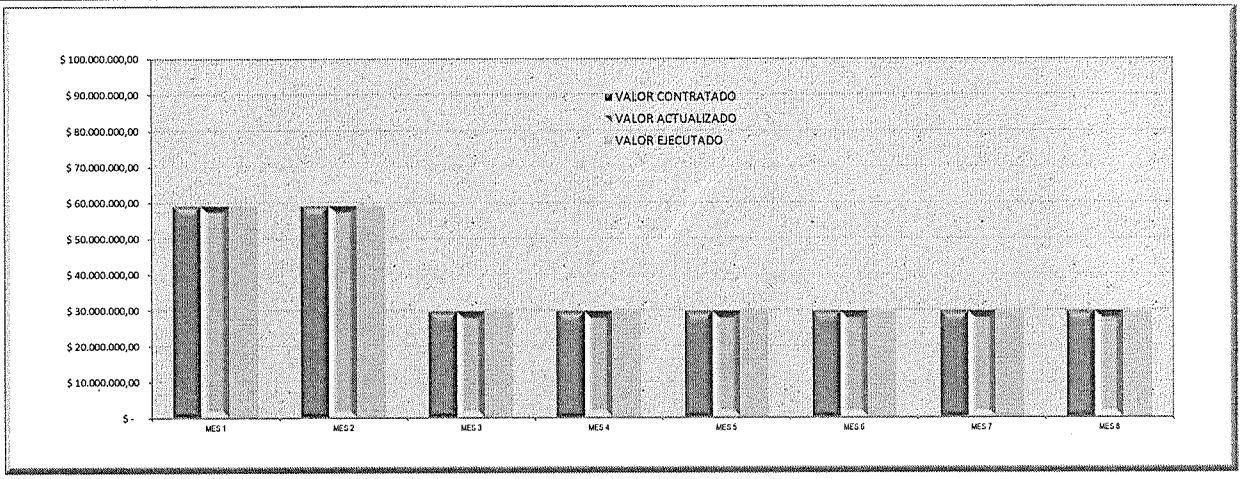

CODIGO.	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	VISITA A CAMPO	7 PUENTES							
2	TOPOGRAFÍA		7 PUENTES						
3	ESTUDIO DE TRANSITO		7 PUENTES						
4	DISEÑO GEOMETRICO							4 PUENTES	4 PUENTES
5	ESTUDIO HIDRAULICO					1 PUENTE	3 PUENTES	3 PUENTES	
5	AMBIENTAL							4 PUENTES	4 PUENTES
6	GEOTECNIA					1 PUENTE	3 PUENTES	3 PUENTES	
7	DISEÑO ESTRUCTURAL							3 PUENTES	4 PUENTES
8	PRESUPUESTO								7 PUENTES
9	INFORME FINAL								7 PUENTES
