CONTRATO No. 1704 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2



CONTRATO No. 1704-2024
DOCUMENTO No. 50255-IM-03_V0
INFORME MENSUAL No. 2 TOLIMA LOTE 2 V1
01/07/2024 al 31/07/2024
VERSIÓN 1
VOLUMEN 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA. MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPOR MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678-2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454-2023, 4469-2023, 3247-2023. **Municipios:** Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan en el Departamento del Tolima.

Contrato de Interventoría No. 1704 de 2024 **Interventoría:** ING INGENIERIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3, 62-78
1	**INTRODUCCIÓN**		13
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		14
2.3	Inventario y estado inicial de la via		23
2.4	Características técnicas del proyecto		24
3	**MODULO TECNICO**		
3.1	Información general del contrato		24
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		40
3.3	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	52, 80-249
3.5	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		53
3.6	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	53, 250-300
3.7	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	53, 301-317
3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	53
3.9	Seguimiento Programa de Obra		53
3.10	Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	54,318-323
3.11	Acta de aprobación definitiva de estudios y diseños		54, 324-357
4	**MODULO FINANCIERO**		
4.1	Informe de inversión y buen manejo del desembolso convenio		54, 358-391
4.2	Plan de inversión desembolso convenios		54, 392-393
4.3	Trazabilidad de comité operativo (con soportes)		54
5	**MODULO SST**		
5.1	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	55
5.2	Informe sst		55
6	**MODULO SOCIAL**		
6.1	Caracterización socioeconómico	Anexo 2. Ficha de Caracterización socioeconómico	55
		Anexo 3. Matriz de Consolidación de datos socioeconómico	56
		Anexo 11. Acta de Reunión (MEPI-MN1-IN-14-FR-2) y Regis	56
		Anexo 12. Listado de Asistencia	56
		Anexo 16- Acta de conformación de Veeduría	56
6.2	Formatos Manual de interventoría	MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RADICACION Y ACTUALIZACION SOCIAL DE PROYECTOS_OAC	56
		MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION	56
7	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
7.1	Información general del contrato		57
7.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		58
7.3	Informes especialistas y profesionales		59
8	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
8.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	59, 394
8.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	59, 395
8.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	59, 396
8.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	59, 397
8.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	59, 400
8.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	60, 402
9	**Conclusiones y recomendaciones**		61
10	**Anexos**		
10.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		403
10.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		404
10.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		406

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: SERGIO ANTONIO RODRIGUES CESPEDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1835 de fecha 27 mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al registro resumido del estado general de ejecución del contrato, este formato se encuentra en el **anexo 10.1**. Resumen mensual estado general del proyecto, pero como no se ha empezado la ejecución física del proyecto, solo están diligenciados los datos iniciales o básicos de cada convenio.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCCIÓN 13
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14
2.1. LOCALIZACIÓN 14
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 14
2.2.1. ALVARADO 15
2.2.2. FLANDES 15
2.2.3. GUAMO 16
2.1.4. IBAGUÉ 17
2.1.5. MELGAR 21
2.1.6. SANTA ISABEL 22
2.1.7. VALLE DE SAN JUAN 23
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 23
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 24
3. MÓDULO TÉCNICO 24
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 24
3.1.1. ALVARADO 24
3.1.2. FLANDES 25
3.1.3. GUAMO 26
3.1.4. IBAGUÉ 29
3.1.5. MELGAR 35
3.1.6. SANTA ISABEL 37
3.1.7. VALLE DE SAN JUAN 39
3.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 40
3.2.1. ALVARADO 40
3.2.2. FLANDES 41
3.2.3. GUAMO 42
3.2.4. IBAGUÉ 44
3.2.5. MELGAR 49

3.2.6. SANTA ISABEL 50
3.2.7. VALLE DE SAN JUAN 52
3.3. INFORMES SEMANALES 52
3.4. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 52
3.5. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 53
3.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 53
3.7. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 53
3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 53
3.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 53
3.10. ACTAS DE REUNIÓN 54
3.11. ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 54
4. MÓDULO FINANCIERO 54
4.1. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMOLSO DEL CONVENIO 54
4.2. PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS 54
4.3. TRAZABILIDAD DE COMITÉ OPERATIVO 54
IBAGUÉ 55
5. MÓDULO SST 55
5.1. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 55
5.2. Informe SST 55
6. MÓDULO SOCIAL 55
6.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 55
6.1.1. ANEXO 2. FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICO . 55
6.1.2. ANEXO 3. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE DATOS SOCIOECONÓMICOS 56
6.1.3. ANEXO 11. ACTA DE REUNIÓN (MEPI-MN1-IN-14-FR-2) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 56
6.1.4. ANEXO 12. LISTADO DE ASISTENCIA 56
6.1.5. ANEXO 16. ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA 56

6.2. FORMATOS MANUAL DE INTERVENTORÍA 56

6.2.1. MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RADICACION Y ACTUALIZACION SOCIAL DE PROYECTOS_OAC 56

6.2.2. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL_OAC 56

7. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 56

7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 57

7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 58

7.3. INFORMES ESPECIALISTAS 59

8. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 59

8.1. EQUIPOS Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 59

8.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 59

8.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 59

8.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 59

8.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 59

8.6. Otros documentos de seguimiento mensual 60

Plan de cargas o reprogramación al Plan de Cargas Aprobado 60

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61

10. ANEXOS 62

10.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 63

10.1.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado 63

10.1.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes 64

10.1.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo 65

10.1.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo 66

10.1.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo 67

10.1.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 68

10.1.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué 69

10.1.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué 70
10.1.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué 71
10.1.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 72
10.1.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué 73
10.1.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué 74
10.1.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar 75
10.1.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar 76
10.1.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel 77
10.1.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel 78
10.1.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan 79
10.2. INFORMES SEMANALES 80
10.2.1. Vereda Cruce de los Guayabos, Municipio de Alvarado 80
10.2.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes 90
10.2.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo 100
10.2.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo 110
10.2.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo 120
10.2.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 130
10.2.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué 140
10.2.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué 150
10.2.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué 160
10.2.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 170
10.2.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué 180
10.2.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué 190
10.2.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar 200
10.2.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar 210
10.2.15. Vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel 220
10.2.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel 230
10.2.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan 240

10.3. SEGUIMIENTO GARANTÍAS, CONVENIOS Y PÓLIZAS 250
10.3.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado 250
10.3.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes 253
10.3.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo 256
10.3.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo 259
10.3.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo 262
10.3.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 265
10.3.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué 268
10.3.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué 271
10.3.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué 274
10.3.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 277
10.3.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué 280
10.3.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué 283
10.3.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar 286
10.3.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar 289
10.3.15. Vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel 292
10.3.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel 295
10.3.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan 298
10.4. ENSAYOS DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 301
10.4.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado 301
10.4.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes 302
10.4.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo 303
10.4.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo 304
10.4.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo 305
10.4.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 306
10.4.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué 307
10.4.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué 308
10.4.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué 309

10.4.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 310
10.4.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué 311
10.4.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué 312
10.4.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar 313
10.4.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar 314
10.4.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel 315
10.4.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel 316
10.4.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan 317
10.5. ACTAS DE REUNIÓN 318
10.5.1. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 318
10.5.2. Vereda Cataima, municipio de Ibagué..... 320
10.5.3. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 322
10.6. ACTA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 324
10.6.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado 324
10.6.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes 326
10.6.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo 328
10.6.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo 330
10.6.5. Vereda Tovar, municipio de guamo 332
10.6.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 334
10.6.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué 336
10.6.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué 338
10.6.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué 340
10.6.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 342
10.6.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué 344
10.6.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué 346
10.6.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar 348
10.6.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar 350

10.6.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel 352
10.6.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel 354
10.6.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan 356
10.7. INFORME MANEJO INVERSIÓN MANEJO DE DESEMBOLSO 358
10.7.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado 358
10.7.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes 360
10.7.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo 362
10.7.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo 364
10.7.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo 366
10.7.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 368
10.7.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué 370
10.7.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué 372
10.7.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué 374
10.7.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 376
10.7.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué 378
10.7.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué 380
10.7.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar 382
10.7.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar 384
10.7.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel 386
10.7.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel 388
10.7.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan 390
10.8. ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO 392
10.8.1. Llano del Combeima, municipio de Ibagué 392
10.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES 393
10.10. EQUIPOS Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 394
10.11. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 395

10.12. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396

10.13. SEGUIMIENTO GARANTÍAS, CONVENIOS Y PÓLIZAS INTERVENTORÍA 397

10.14. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 400

10.15. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 402

10.16. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 403

10.17. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVADADES REALIZADOS .. 404

10.18. COPIA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 406

Listado de Tablas

Tabla 1. Información general Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado 24
Tabla 2. Información General vereda Paradero II, municipio de Flandes 25
Tabla 3. Información general vereda Loma de Luisa Jagualito, municipio de Guamo 26
Tabla 4. Información general vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo 27
Tabla 5. Información general vereda Tovar, municipio de Guamo 28
Tabla 6. Información general vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 29
Tabla 7.Información general vereda Cataima, municipio de Ibagué 30
Tabla 8. Información general vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué .. 31
Tabla 9. Información general vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué 32
Tabla 10. Información general vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 33
Tabla 11. Información general vereda La Isabela, municipio de Ibagué 34
Tabla 12. Información general vereda San Antonio, municipio de Ibagué 35
Tabla 13. Información general vereda El Águila, municipio de Melgar 35
Tabla 14. Información general vereda Águila Alta, municipio de Melgar 36
Tabla 15. Información general vereda Lucia, municipio de Santa Isabel 37
Tabla 16. Información general vereda Colón, municipio de Santa Isabel 38
Tabla 17. Información general vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan 39
Tabla 18. Información General Interventoría 57
Tabla 19. Relación de correspondencia 403

Listado de Imágenes

Imagen 1. Departamento Tolima 14
Imagen 2. Localización Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado .. 15
Imagen 3. Localización Vereda Paradero II, municipio de Flandes 15
Imagen 4. Localización Vereda Loma Luisa Jagualito, municipio de Guamo 16
Imagen 5. Localización Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo 17
Imagen 6. Localización vereda Tovar, municipio de Guamo 17
Imagen 7. Localización vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué 18
Imagen 8. Localización vereda Cataima, municipio de Ibagué 18
Imagen 9. Localización vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué 19
Imagen 10. Localización vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué 19
Imagen 11. Localización vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué 20
Imagen 12. Localización vereda La Isabela, municipio de Ibagué 20
Imagen 13. Localización vereda San Antonio, municipio de Ibagué 21
Imagen 14. Localización vereda El Águila, municipio de Melgar 21
Imagen 15. Localización vereda Águila Alta, municipio de Melgar 22
Imagen 166. Localización vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel 22
Imagen 17. Localización vereda Colón, municipio de Santa Isabel 23
Imagen 18.Localización vereda El Neme, municipio Valle de San Juan 23

1. INTRODUCCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría 1704 de 2024 que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2, ING INGENIERÍA SAS presenta al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS el Informe Mensual de Interventoría, cuyo principal objetivo es dar a conocer el desarrollo del proyecto y el control sobre las actividades de los convenios solidarios 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4662-2023, 4678-2023, 4686-2023, 4756-2023, 4786-2023, 4000-2023, 4504-2023, 4454-2023, 4469-2023, 3247-2023 suscritos con los municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel, Valle de San Juan en el Departamento de Tolima.

En el presente informe se consignan las actividades realizadas por los Organismo de Acción Comunal, la Interventoría, conclusiones y recomendaciones y las evidencias que muestran el desarrollo del proyecto (Gráficos, Actas, Formatos, Cuadros de control, etc.) en el lapso de tiempo comprendido entre el 01 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El Departamento de Tolima está situado al Centro de la República de Colombia y sus territorios hacen parte de la región Andina, localizado entre 02°52'48" y 05°19'03" de latitud norte y 74°28'51" y 76°07'26" de longitud oeste, tiene una extensión de 23.582 kilómetros cuadrados (Km2) lo que corresponde a 2,06 % del territorio nacional y limita por el Norte con el departamento de Caldas, al Este con el departamento de Cundinamarca, al Sur con los departamentos del Huila y Cauca y al Oeste con los departamentos del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Imagen 1. Departamento Tolima



Fuente: https://n9.cl/6gaz

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto realizar obras de infraestructura vial que permitan mejorar las condiciones de transitabilidad en vías terciarias de 17 veredas de los municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan del departamento de Tolima que tienen un convenio suscrito con el Invías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total para la construcción de pavimentos con placa huella, y teniendo en cuenta la guía de diseño de pavimentos con placa-huellas ofrecen una solución para vías terciarias de carácter veredal que tienen volúmenes de tránsito bajo, y constructivamente posibilita la reducción de costos de construcción y mantenimiento debido a que las modificaciones a la geometría de la vía son mínimas y permite la utilización de materiales y mano de obra local y su mantenimiento consiste en la limpieza de obras de drenaje y rocería de zonas laterales, junto con la ejecución de obras

de drenaje para controlar y redirigir el exceso de caudal y así preservar y evitar daños estructurales a la malla vial, recuperar los niveles de servicio y capacidad vial, reducir los costos de operación vehicular, reducir tiempos de viaje, mejorar la comodidad para circulación vehicular, reducir niveles de accidentalidad y contribuir con el desarrollo de los procesos productivos que ayudan a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

Dentro del departamento de Tolima se tiene a intervenir los siguientes municipios con la localización del corredor vial:

2.2.1. ALVARADO

Vereda Cruce de los Guayabos

En la Vereda Cruce de los Guayabos, ubicada en el municipio de Alvarado se tiene planeado construir 167 metros lineales de placa huella y 1 alcantarillas

Imagen 2. Localización Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado




Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

2.2.2. FLANDES

Vereda Paradero 2

En la Vereda Paradero 2 ubicada en el municipio de Flandes se tiene planeado construir 185 metros lineales de placa huella.

Imagen 3. Localización Vereda Paradero II, municipio de Flandes

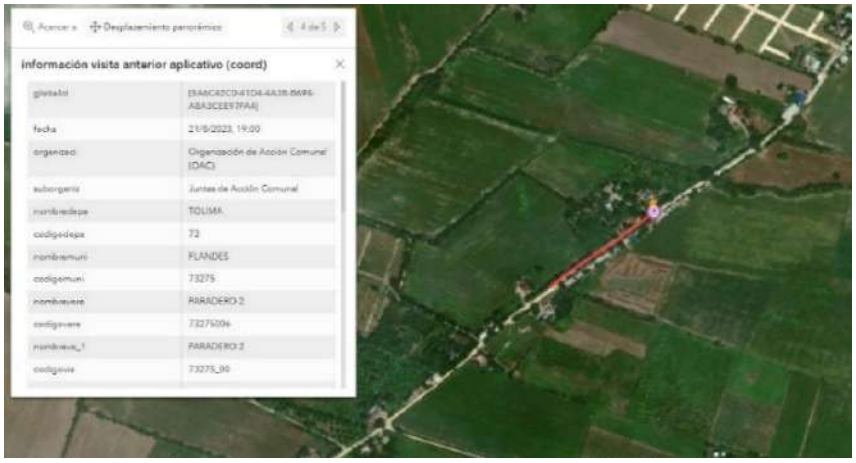

Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.


2.2.3. GUAMO

En el municipio de Guamo se tienen tres convenios suscritos, los cuales son:

Vereda Loma de Luisa Jagualito

En la Vereda Loma de Luisa Jagualito ubicada en el municipio de Guamo se tiene planeado construir 167 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 4. Localización Vereda Loma Luisa Jagualito, municipio de Guamo

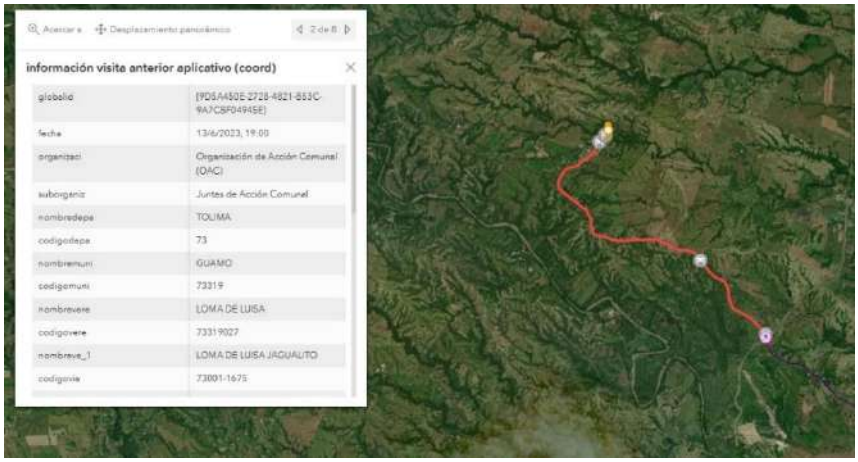


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir

En La Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir ubicada en el municipio de Guamo se tiene planeado 167 metros lineales de placa huela y 1 alcantarilla.

Imagen 5. Localización Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

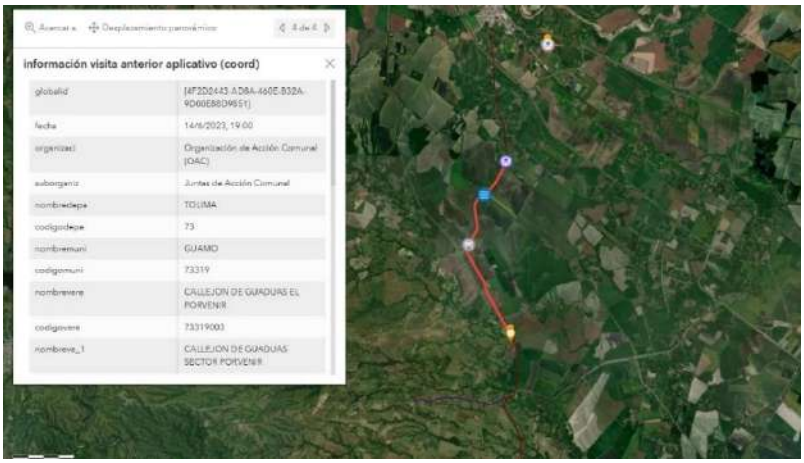


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Tovar

En la Vereda Tovar ubicada en el municipio de Guamo se tiene planeado construir 71 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas.

Imagen 6. Localización vereda Tovar, municipio de Guamo

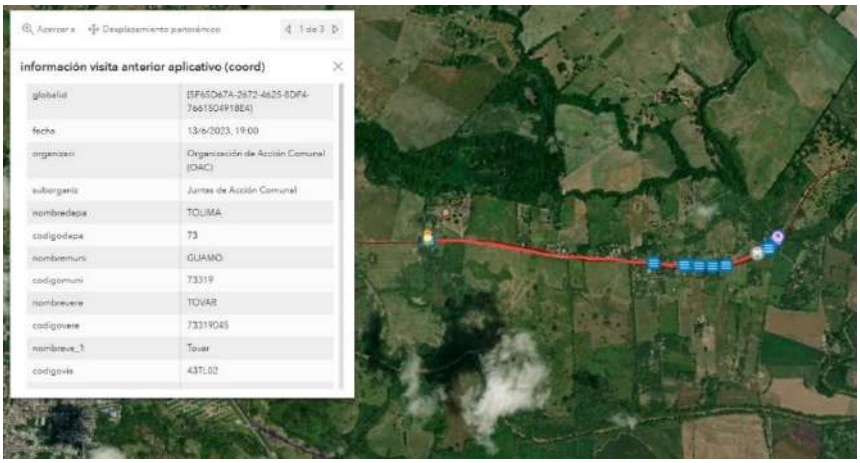

Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.


2.1.4. IBAGUÉ

En el municipio de Ibagué se encuentran siete (7) convenios suscritos, los cuales son:

Vereda Loma de Cocora

En la Vereda Loma de Cocora ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 147 m de placa huella y 1 alcantarilla

Imagen 7. Localización vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

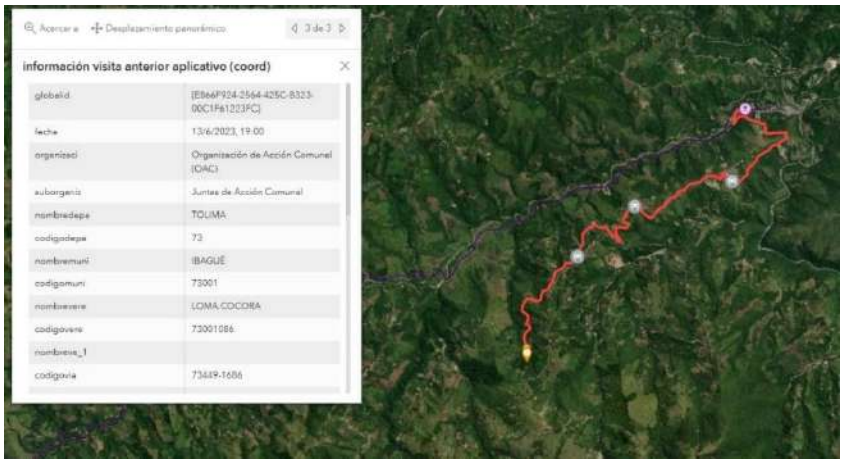


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Cataima

En la Vereda Cataima Parte Baja ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 5 alcantarillas y 2 box-culvert.

Imagen 8. Localización vereda Cataima, municipio de Ibagué

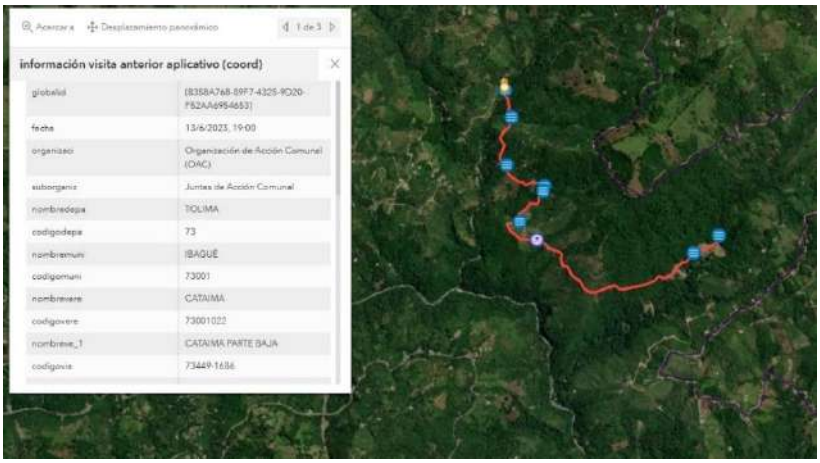


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Llano de Combeima

En la Vereda de Llano de Combeima ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 7 alcantarillas.

Imagen 9. Localización vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

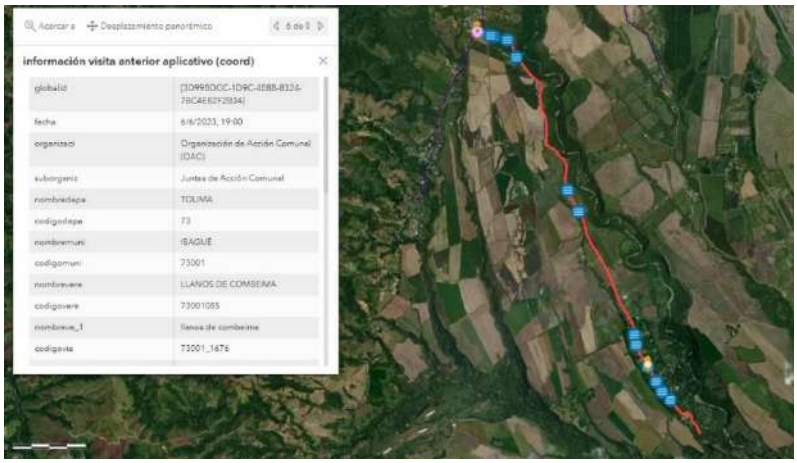


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda San Juan de la China

En la Vereda San Juan de la China ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 97 metros lineales de placa huella y 3 alcantarillas.

Imagen 10. Localización vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

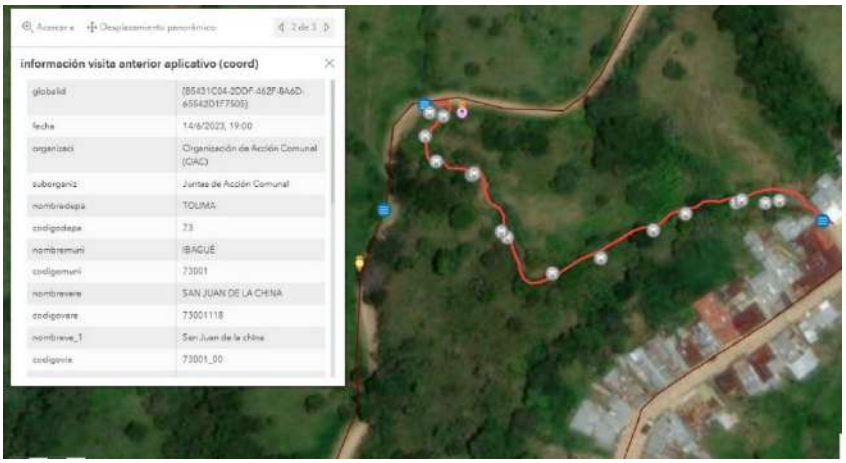


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Inspección Departamental de Dantas

En la Vereda de la Inspección Departamental de Dantas ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 100 metros lineales de placa y 3 alcantarillas.

Imagen 11. Localización vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

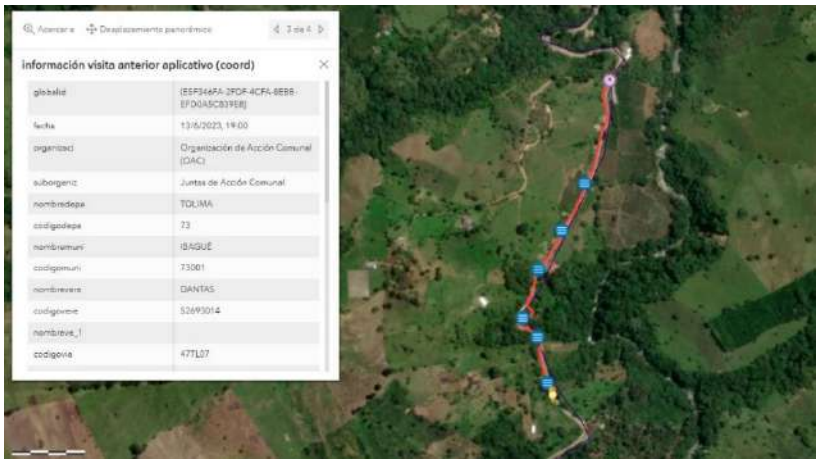


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda La Isabela

En la Vereda La Isabela ubicada en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 128 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

Imagen 12. Localización vereda La Isabela, municipio de Ibagué

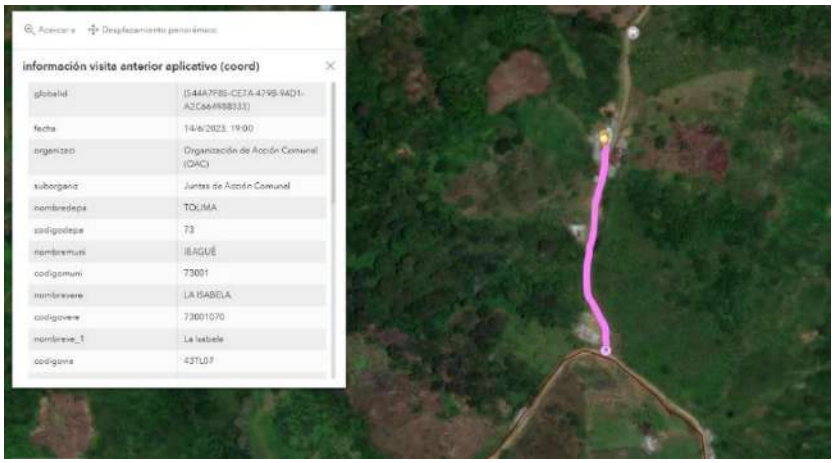


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda San Antonio

En la Vereda San Antonio en el municipio de Ibagué se tiene planeado construir 120 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

Imagen 13. Localización vereda San Antonio, municipio de Ibagué

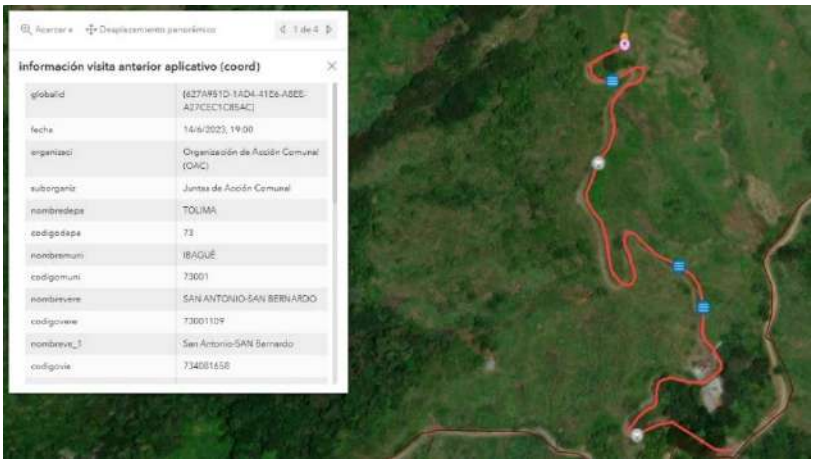

Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.


2.1.5. MELGAR

En el municipio de Melgar se encuentran dos (2) convenios suscritos, los cuales son:

Vereda El Águila

En la Vereda El Águila: ubicada en el municipio de Melgar se tiene planeado construir 155 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 14. Localización vereda El Águila, municipio de Melgar

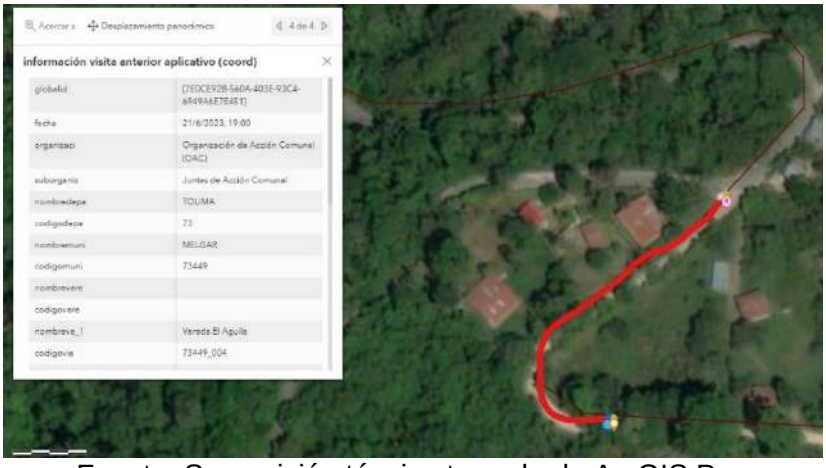


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Águila Alta

En la Vereda Águila Alta ubicada en el municipio de Melgar se tiene planeado construir 152 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 15. Localización vereda Águila Alta, municipio de Melgar

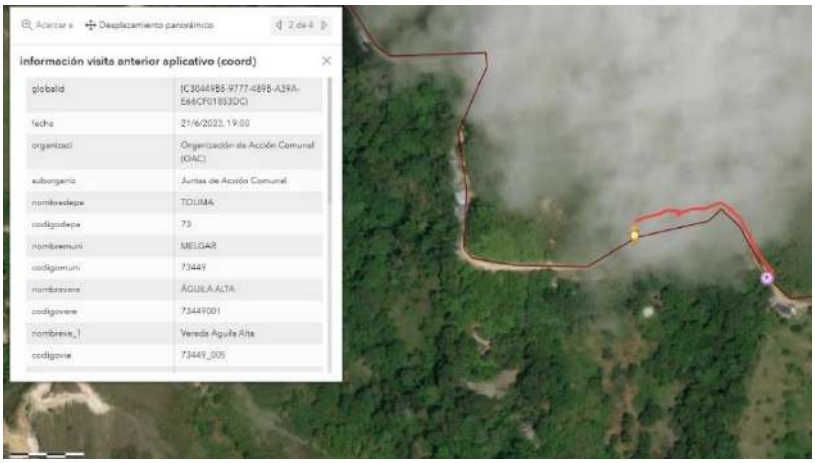


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

2.1.6. SANTA ISABEL

Vereda Santa Lucia

En la vereda de Santa Lucia ubicada en el municipio de Santa Isabel se tiene planeado construir 113 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

Imagen 166. Localización vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel

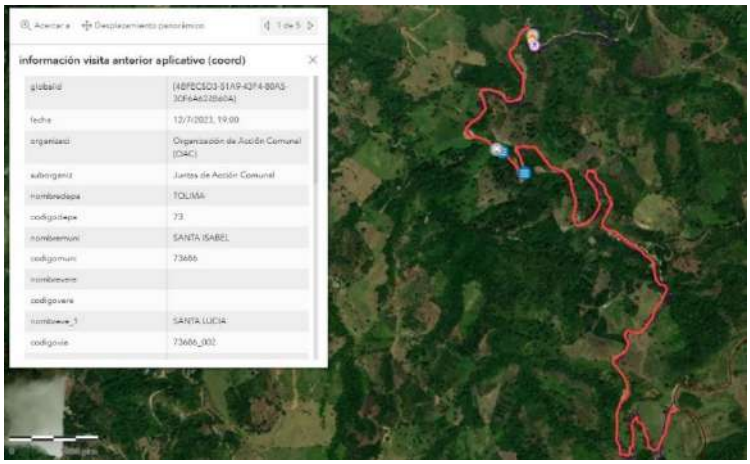


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

Vereda Colón

En la Vereda Colón ubicada en el municipio de Santa Isabel se tiene planeado construir 155 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla.

Imagen 17. Localización vereda Colón, municipio de Santa Isabel

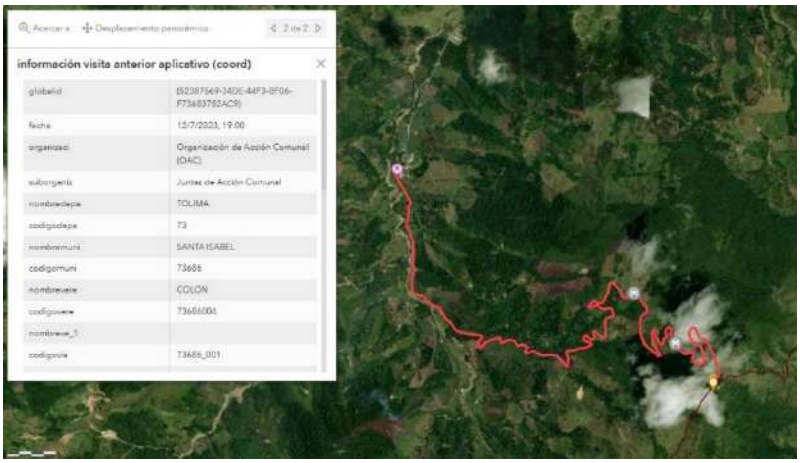


Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

2.1.7. VALLE DE SAN JUAN

Vereda de El Neme

En la vereda de El Neme ubicada en el municipio de Valle de San Juan se tiene planeado construir 30 metros lineales de placa huela y 2 alcantarillas y 2 box-culvert.

Imagen 18.Localización vereda El Neme, municipio Valle de San Juan

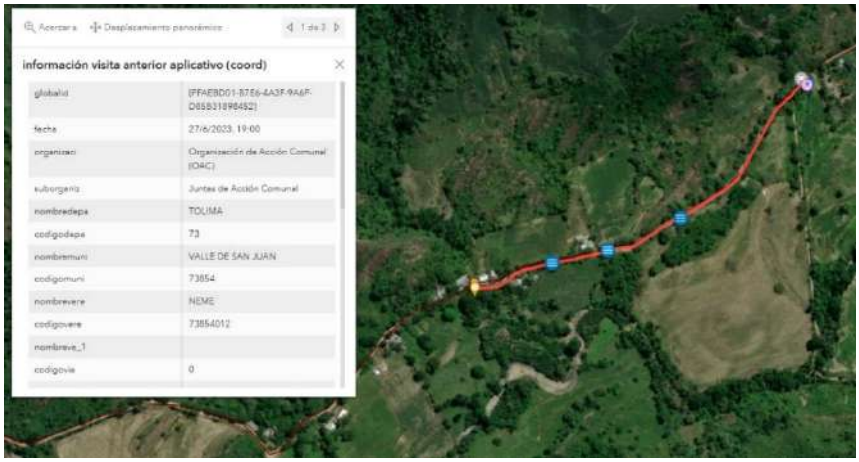

Fuente. Supervisión técnica tomada de ArcGIS Pro.

La información de las obras a ejecutar por cada uno de los convenios se obtuvo de acuerdo con el *anexo 22: Presupuesto de obra en formato xlxs.*

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En los tramos viales de intervención de cada una de las Veredas que tienen un convenio solidario adscrito al contrato 1704 de 2024, se observa que tienen un ancho de plataforma

de entre 4,0 y 6.5 metros, en los cuales algunas cuentan con estructuras hidráulicas tipo alcantarilla y cunetas, y ninguna cuenta con señalización a la largo de las vías existentes; además, la mayoría de estos tramos tienen presencia de un material afirmado. La topografía de estos puntos en su mayoría es plana o de pendientes bajas y no presenta accidentes geográficos relevantes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro los convenios suscritos con los diferentes municipios de Tolima, para el mejoramiento integral de la infraestructura vial se realizarán actividades propias de construcción y mantenimientos, etapas que se definen a continuación:

Construcción:

Para los proyectos está definido la construcción de placa huella, alcantarillas y box coulvert.

Mantenimiento Rutinario

Dentro de las actividades previstas se tiene rocería y limpieza de alcantarillas y rectificación de descoles.

Mantenimiento Periódico

Dentro de las actividades previstas se encuentra la conformación de calzada.

De igual forma se aclara una vez se finalice la etapa de estudios y diseños se enunciará los parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y tipificación de los diferentes sectores.

3. MÓDULO TÉCNICO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

A continuación, se presenta la información general de los convenios solidarios celebrados con los organismos de acción comunal del departamento de Tolima:

3.1.1. ALVARADO

Vereda Cruce de los Guayabos

Tabla 1. Información general Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-624-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4001 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/2/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024
PRORROGA 1	6/6/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 199,698,099.00
REPRESENTANTE LEGAL	YASMIN CASTAÑEDA
TELÉFONO	3102289016

Fuente. Elaboración propia

3.1.2. FLANDES

Vereda Paradero 2

Tabla 2. Información General vereda Paradero II, municipio de Flandes

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-937-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4517 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	29/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,927,246.00
REPRESENTANTE LEGAL	NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL
TELÉFONO	3113629009

Fuente. Elaboración propia

3.1.3. GUAMO

Vereda Loma de Luisa Jagualito

Tabla 3. Información general vereda Loma de Luisa Jagualito, municipio de Guamo

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-601-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3963 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 199,481,796.00
REPRESENTANTE LEGAL	YIMER MURILLO LEIVA
TELÉFONO	3214957949

Fuente. Elaboración propia

Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir

Tabla 4. Información general vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-859-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4395 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	4/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,201,281.00
REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES HERNANDEZ LOZANO
TELÉFONO	3112794559

Fuente. Elaboración propia

Vereda Tovar

Tabla 5. Información general vereda Tovar, municipio de Guamo

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-913-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4485 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,008,033.00
REPRESENTANTE LEGAL	ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ
TELÉFONO	3122542012

Fuente. Elaboración propia

3.1.4. IBAGUÉ

Vereda Loma de Cocora

Tabla 6. Información general vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1085-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4756-2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 198,108,085.00
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA
TELÉFONO	3125935525

Fuente. Elaboración propia

Vereda Cataima

Tabla 7.Información general vereda Cataima, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1028-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4756-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 195,828,659.00
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MILENA LOZANO MACANA
TELÉFONO	3132357149

Fuente. Elaboración propia

Vereda Llano de Combeima

Tabla 8. Información general vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1045-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4662-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 198,826,145.00
REPRESENTANTE LEGAL	MOISES MAX MEDINA
TELÉFONO	3208531378

Fuente. Elaboración propia

Vereda San Juan de la China

Tabla 9. Información general vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1103-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4786-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024

FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 198,145,372.00
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY MARITZA MONTOYA
TELÉFONO	3025709238

Fuente. Elaboración propia

Vereda Inspección Departamental de Dantas

Tabla 10. Información general vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-512-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3819 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024

PRORROGA 1	5/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 196,712,232.00
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ
TELÉFONO	3228183070

Fuente. Elaboración propia

Vereda La Isabela

Tabla 11. Información general vereda La Isabela, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-930-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4507-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 198,631,123.00
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN
TELÉFONO	3166447286

Fuente. Elaboración propia

Vereda San Antonio

Tabla 12. Información general vereda San Antonio, municipio de Ibagué

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1041-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4678-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 199,739,662.00
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS
TELÉFONO	3213109747

Fuente. Elaboración propia

3.1.5. MELGAR

Vereda El Águila

Tabla 13. Información general vereda El Águila, municipio de Melgar

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-928-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4504 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	28/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	70
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 199,759,372.00
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA
TELÉFONO	3142105851

Fuente. Elaboración propia

Vereda Águila Alta

Tabla 14. Información general vereda Águila Alta, municipio de Melgar

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-623-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4000 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,743,783.00
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA
TELÉFONO	3124176606

Fuente. Elaboración propia

3.1.6. SANTA ISABEL

Vereda Santa Lucia

Tabla 15. Información general vereda Lucia, municipio de Santa Isabel

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-892-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4454 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,258,472.00
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MORENO VILLARRAGA
TELÉFONO	3186411694

Fuente. Elaboración propia

Vereda Colón

Tabla 16. Información general vereda Colón, municipio de Santa Isabel

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-900-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4469 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,250,666.00
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY RIOS VANEGAS
TELÉFONO	3123227386

Fuente. Elaboración propia

3.1.7. VALLE DE SAN JUAN

Vereda El Neme

Tabla 17. Información general vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3247 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 198,430,649.00
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ANTONIO GUZMAN
TELÉFONO	321 2117193

Fuente. Elaboración propia

3.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades por municipio y vereda:

3.2.1. ALVARADO

Vereda Cruce de los Guayabos

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.

- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

3.2.2. FLANDES

Vereda Paradero 2

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

3.2.3. GUAMO

Vereda Loma de Luisa Jagualito

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.

- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda Tovar

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

3.2.4. IBAGUÉ

Vereda Loma de Cocora

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

El 11 de julio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento de la presidenta de la JAC María Aminta Collazo Herrera, donde se identificaron, ubicaron y georrefenciaron puntos de interés, como el lugar donde se construirá la placa huella y la alcantarilla, las entradas a los predios en el tramo, entre otros, y esta visita quedo registrada en el Acta de reunión No 1.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda Cataima

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

El 12 de julio de 2024 se realizó una visita de campo de reconocimiento del sitio de intervención con el acompañamiento de la presidenta de la JAC, Diana Milena Lozano Macana, donde se identificaron, ubicaron y georrefenciaron puntos de interés, como el lugar donde se construirán las alcantarillas y el box-culvert, las entradas a los predios en el tramo, entre otros y esta visita quedo registrada en el Acta de reunión No 1.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda Llano de Combeima

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.

- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

El día 30 de julio de 2024 se realizó el primer comité operativo de la vereda Llano de Combeima, donde se aprobó la devolución o reintegro del dinero de la póliza, se concilió el salario de los profesionales *ingeniero residente y contador*, por último se aprobaron las propuestas económicas para de las actividades de topografía y estudios y diseños, también se solicitó a la JAC actualizar las cotizaciones para el ítem de laboratorio ya que las cotizaciones presentadas tienen un costó mayor al aprobado en el presupuesto.

Vereda San Juan de la China

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda Inspección Departamental de Dantas

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda La Isabela

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.

- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda San Antonio

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

El día 30 de julio de 2024 se realizó una reunión con el presidente de la junta de acción comunal de la vereda de San Antonio, municipio de Ibagué, la contadora y la ingeniera residente en la cual la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S le pidió celeridad a la junta con la conformación de la veeduría, además se aclararon dudas e inquietudes con respecto a los comités operativos y los comités técnicos.

3.2.5. MELGAR

Vereda El Águila

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda Águila Alta

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

3.2.6. SANTA ISABEL

Vereda Santa Lucia

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

Vereda Colón

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

3.2.7. VALLE DE SAN JUAN

Vereda El Neme

El día 10 de julio de 2024, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S asistió a una reunión programada por el Instituto Nacional de Vías Invías Tolima, en donde se trataron temas como:

- El avance contractual de los convenios.
- La aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador.
- El proceso de cambio de la firma de la cuenta conjunta existente entre el Invías y las juntas de acción comunal.
- Las socializaciones que se deben programar junto con la comunidad.
- La programación del primer comité operativo para iniciar las fases de levantamiento topográfico y estudios y diseños.

Este mismo día la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S realizó el proceso de actualización del cambio de firma de la cuenta conjunta entre el Invías y las Juntas de acción comunal, y a partir del lunes 15 de julio una vez el componente social de Invías Tolima entregó las cartas correspondientes a la entidad bancaria, se informó a los representantes de las JACs para que se acercaran a realizar este mismo trámite.

En la semana del 15 al 19 de julio de 2024 desde el componente social de ING INGENIERÍA S.A.S se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas y su posterior radicación ante la Personería.

Entre los días 17 al 24 de julio de 2024 se contactó vía telefónica a los presidentes de las juntas de acción comunal para informarles que las hojas de vida del ingeniero residente y del contador habían sido aprobadas por la interventoría, posteriormente se les indicó que debían adelantar el proceso de actualización del RUT ante la DIAN, proceso que les permite realizar obras civiles.

3.3. INFORMES SEMANALES

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al seguimiento semanal al programa aprobado realizado por la interventoría, este formato tiene diligenciado la póliza de acta de inicio, este formato se encuentra en el anexo 10.2. Informes semanales, los cuales corresponden desde el 01 hasta el 31 de julio de 2024.

3.4. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se ha tramitado ningún APU no previsto en ninguno de los convenios, dado el caso de requerirse una actividad no contemplada en el presupuesto de los contratos en mención y de ser aprobado por las Entidades se realizará es respectivo seguimiento.

3.5. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Para el inicio de los contratos de obras en cada uno de los municipios, se requiere la entrega de los siguientes documentos:

- Cronograma de actividades.
- Plan de Inversión.
- Hojas de vida de personal.
- Relación de equipos.
- Plan de Manejo de tráfico PMT
- Plan de Calidad.
- APUs.
- Arte de valla

3.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al seguimiento de garantías y seguros de contrato, este formato tiene diligenciado la póliza de acta de inicio, este formato se encuentra en el anexo 10.3. Seguimiento garantías, convenios y pólizas.

3.7. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al registro resumido de los ensayos de laboratorio requeridos para que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones aprobadas, este formato se encuentra en el anexo 10.4. Ensayos de laboratorio control de calidad, pero como no se ha empezado la ejecución física del proyecto, no se han realizado ensayos de laboratorios y, por ende, solo están diligenciados los datos iniciales o básicos de cada convenio.

3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe no se presenta por parte de las diferentes Juntas de Acción Comunal no presentan plan de calidad de los convenios adscritos al contrato 1704 de 2024.

3.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

A la fecha del presente informe no se presenta programación puesto que no se ha iniciado obra en los diferentes municipios de Tolima, una vez se dé inicio de obra se presentará en Project con el respectivo PDT con el cual se realizará el corte y se presentará los avances respectivos.

3.10. ACTAS DE REUNIÓN

En el presente informe correspondiente al período del mes de julio de 2024, se presentan tres (3) actas de reunión, las cuales tenían como propósito realizar visitas de reconocimiento en las veredas de Loma de Cocora, Cuaima e Inspección Departamental de Dantas.

Las actas de reunión se encuentran diligenciadas con el formato ***MEPI-MN1-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, ya que este formato se utiliza cuando la reunión no corresponda a un comité de obra, este formato se encuentra en el anexo 10.5. ACTAS DE REUNIÓN.

3.11. ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-1-FR-5 ACTA APROB DEFINITIVA EST Y DIS,*** del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde a la aprobación de estudios y diseños, este formato se encuentra en el anexo 10.6. Acta de aprobación de estudios y diseños, pero como no se han presentado estudios y diseños por parte de las organizaciones de acción comunal, solo están diligenciados los datos iniciales o básicos de cada convenio.

4. MÓDULO FINANCIERO

4.1. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMOLSO DEL CONVENIO

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al plan de inversión del anticipo, este formato se encuentra en el anexo 10.7. Informe manejo de inversión manejo de desembolso, pero como no se ha empezado la ejecución física del proyecto, solo están diligenciados los datos iniciales o básicos de cada convenio.

4.2. PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

A la fecha de corte del presente informe no se han realizado desembolsos a ninguna de las Veredas con convenios solidarios suscritos al contrato 1704-2024.

4.3. TRAZABILIDAD DE COMITÉ OPERATIVO

Las actas de los comités operativos realizado en el mes de julio se encuentran diligenciados en los anexos 10.8. Actas de comité operativo.

IBAGUÉ

Llano del Combeima

Tabla 18. trazabilidad comité operativo Llano del Combeima, municipio de Ibagué

No.	FECHA	ANEXO	OBSERVACIÓN
1	30/07/24	10.8.1	En espera de las firmas del presidente de la JAC y del comité de Veeduría Ciudadana

Fuente. Elaboración propia

NOTA: Por solicitud del Presidente de la Junta de Acción Comunal y de la Presidenta del Comité de veeduría Ciudadana de la Vereda Llano del Combeima, el primer comité operativo se realizó de manera virtual, posteriormente esta Interventoría diligenció y envió el formato de reunión de comité operativo y se encuentra a la espero de la remisión del mismo con las firmas correspondientes.

5. MÓDULO SST

5.1. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde a la verificación del personal, control aportes legales y seguridad social del contrato de obra, pero como no se ha empezado la ejecución física del proyecto, es decir, ninguno de los convenios cuenta con personal contrato.

5.2. Informe SST

No se presenta informe de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a que, a la fecha del presente informe, en ninguno de los convenios solidarios adscritos al contrato 1704-2024 ha comenzado con la ejecución física de obra de los proyectos.

6. MÓDULO SOCIAL

6.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

6.1.1. ANEXO 2. FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICO

A la fecha de corte del presente informe, el componente social de esta Interventoría no ha diligenciado la ficha de caracterización socioeconómica, por lo cual, no se anexa al este informe.

6.1.2. ANEXO 3. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE DATOS SOCIOECONÓMICOS

A la fecha de corte del presente informe, el componente social de esta Interventoría no ha diligenciado la matriz de consolidación de datos socioeconómicos, por lo cual, no se anexa al este informe.

6.1.3. ANEXO 11. ACTA DE REUNIÓN (MEPI-MN1-IN-14-FR-2) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

A la fecha de corte del presente informe, el componente social no realizó reuniones y/o socializaciones con las diferentes Juntas de Acción Comunal, por lo tanto, no se diligenció el formato ***MEPI-MN1-IN-14 ACTA DE COMITE Y DE REUNION***.

6.1.4. ANEXO 12. LISTADO DE ASISTENCIA

A la fecha de corte del presente informe, el componente social no realizó reuniones y/o socializaciones con las diferentes Juntas de Acción Comunal, por lo tanto, no se anexan los listados de asistencia del formato ***MEPI-MN1-IN-14 ACTA DE COMITE Y DE REUNION***.

6.1.5. ANEXO 16. ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA

A la fecha del presente informe no las diferentes Juntas de Acción Comunal no han remitido las resoluciones de aprobación de veedurías ciudadanas remitidas por las Organizaciones de Acción Comunal.

6.2. FORMATOS MANUAL DE INTERVENTORÍA

6.2.1. MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RADICACION Y ACTUALIZACION SOCIAL DE PROYECTOS_OAC

A la fecha del presente informe el componente social de interventoría, no presenta el formato ***MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA RADICACION Y ACTUALIZACION SOCIAL DE PROYECTOS***, del ***MANUAL INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, del componente social.

6.2.2. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL_OAC

A la fecha del presente informe el componente social de interventoría, no presenta formato ***MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL*** del ***MANUAL INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, del componente social, debido a que la Junta de Acción Comunal no ha enviado la información necesaria para el diligenciamiento del mismo.

7. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la información general del contrato de Interventoría celebrado con el Instituto Nacional de Vías INVIAS:

7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 19. Información General Interventoría

Resolución No	1558 del 8 de mayo de 2024
No concurso de méritos	CMA-DEO-SVR-CCPT-012-2024
No de contrato	1704 de 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
PLAZO INICIAL	28/05/2024
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27/09/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan departamento de Tolima
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR INICIAL	$ 601.665.190,00
CONTRATISTA	ING INGENIERÍA NIT 890.405.995-1
TELÉFONO 1	3138870345
TELÉFONO 2	3138870331
CORREO ELECTRÓNICO	info@ingingenieria.com.co

Fuente. Elaboración propia

7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Dentro de las obligaciones contractuales adquiridas por esta Interventoría, se encuentra los siguientes alcances:

- Técnico

Para el periodo del presente informe no se ha iniciado obra en ninguno de los municipios por lo cual no se reporta actividades de construcción y mantenimiento.

- Administrativo

A la fecha del presente informe esta Interventoría tanto el componente técnico como el componente social han realizado el acompañamiento a las Organizaciones de Acción Comunal con:

- El proceso de actualización del RUT, proceso que les permite realizar obras civiles.
- El proceso de conformación y radicación del acta de conformación de Veeduría Ciudadana ante la personería, ya que con la Veeduría Ciudadana se programan comités operativos que permiten autorizar el desembolso de dinero para las actividades relacionadas al convenio.
- También esta Interventoría se comunicó con los representantes de las Organizaciones de Acción Comunal para informarles la aprobación de los profesionales que si vincularán al convenio (ingeniero residente y contador).

Además, está Interventoría realizó las visitas de reconocimiento a las veredas de Inspección Departamental de Dantas, Loma de Cocora y Cataima ubicadas en Ibagué, para identificar el sector a intervenir y georrefenciar puntos de interés como la ubicación de la placa huella, alcantarillas, y entradas a viviendas.

Por último, se realizó el primer comité operativo con la vereda Llano del Combeima, donde se trataron los siguientes puntos como: el reintegro rubro pago de la póliza, el personal profesional para vincular (Residente de Obra – Contador), los contratos del personal profesional, la revisión y aprobación cotizaciones Ensayos de Laboratorio, Topografía y Diseños y la aprobación del ítem de Subsidio al Dignatario para Transporte

- Financiero

A la fecha de presente informe no se ha tramitado cobros del contrato de Interventoría.

- Ambiental

A la fecha del presente informe no ha desarrollado actividades de gestión ambiental.

7.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Durante el periodo del presente informe no se requirió conceptos por parte de los diferentes especialistas, por lo cual no se presenta informe de las diferentes áreas.

8. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.1. EQUIPOS Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al registro diario de vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados en el presente mes, este formato se encuentra en el anexo 10.10. Equipos y vehículos contrato de interventoría.

8.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría del presente mes, este formato se encuentra en el anexo 10.11. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

8.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al control financiero y presupuestal del contrato de interventoría del presente mes, este formato se encuentra en el anexo 10.12. Seguimiento garantías, convenios y pólizas interventoría.

8.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al seguimiento de garantías y seguros de contrato de interventoría, este formato tiene diligenciado la póliza de acta de inicio, este formato se encuentra en el anexo 10.13. Seguimiento garantías, convenios y pólizas interventoría.

8.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD INT***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al seguimiento al plan de calidad del contrato de

interventoría, este formato se encuentra en el anexo 10.14. Seguimiento garantías, convenios y pólizas interventoría.

8.6. Otros documentos de seguimiento mensual

Plan de cargas o reprogramación al Plan de Cargas Aprobado

En esta sección se diligencia el formato ***MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS***, del ***MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 2022***, de la GESTIÓN TÉCNICA, que corresponde al plan de cargar inicial, reprogramación al plan de cargas y plan de cargas de final, este formato se encuentra en el anexo 10.15. Seguimiento garantías, convenios y pólizas interventoría.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha del presente informe no se han iniciado obra en las veredas que tienen convenios suscritos en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del lote 2 en el departamento de Tolima.
- A la fecha del presente informe la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S aprobó las hojas de vidas para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por las juntas de acción comunal, además se realizó acompañamiento en el proceso de conformación de las veedurías y se le solicitó a cada OAC actualizar el RUT ante la DIAN para que puedan realizar obras civiles.
- A la fecha de corte del presente informe mensual se realizó el primer comité operativo con la vereda Llano de Combeima, donde se conciliaron los salarios para el ingeniero residente y el contador, también se autorizó la topografía y realización de estudios y diseños.

10. ANEXOS

10.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

10.1.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4001 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	25/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,698,099.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199,698,099.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150,800,006.00		$ 150,800,006.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,524,000.00		$ 4,524,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,603,240.00		$ 44,603,240.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,927,246.00		$ 199,927,246.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4517 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.927.246,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.927.246,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150,800,006.00		$ 150,800,006.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,524,000.00		$ 4,524,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,603,240.00		$ 44,603,240.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,927,246.00		$ 199,927,246.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor, Dirección Territorial

10.1.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3963 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	199,481,796.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	-
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	199,481,796.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149,402,085.00		$ 149,402,085.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,482,063.00		$ 4,482,063.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,597,648.00		$ 44,597,648.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198,481,796.00		$ 198,481,796.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4395 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	200,201,281.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	-
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	200,201,281.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150,097,912.00		$ 150,097,912.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,502,937.00		$ 4,502,937.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,600,432.00		$ 44,600,432.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,201,281.00		$ 199,201,281.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4485 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	200,008,033.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	-
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	200,008,033.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149,911,018.00		$ 149,911,018.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,497,331.00		$ 4,497,330.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,599,684.00		$ 44,599,684.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,008,033.00		$ 199,008,032.54

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4756-2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	198,108,085.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	-
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	198,108,085.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149,089,018.00		$ 149,089,018.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,472,671.00		$ 4,472,671.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,596,396.00		$ 44,596,396.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198,158,085.00		$ 198,158,085.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4756-2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	195,828,659.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	-
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	195,828,659.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146,836,188.00		$ 146,836,188.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,405,086.00		$ 4,405,086.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,587,385.00		$ 44,587,385.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 195,828,659.00		$ 195,828,659.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4662-2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	198,826,145.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	-
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	198,826,145.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149,735,112.00		$ 149,735,112.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,492,053.00		$ 4,492,053.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,598,980.00		$ 44,598,980.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198,826,145.00		$ 198,826,145.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4786-2023

OBJETO: "ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198,145,372.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198,145,372.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149,076,723.00		$ 149,076,723.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,472,302.00		$ 4,472,302.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,596,347.00		$ 44,596,347.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198,145,372.00		$ 198,145,372.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ene-00

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3819 DE 2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 196,712,232.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 196,712,232.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 147,739,160.00		$ 147,739,160.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,432,175.00		$ 4,432,175.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,540,997.00		$ 44,540,997.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 196,712,332.00		$ 196,712,332.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4507-2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198,631,123.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198,631,123.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149,546,502.00		$ 149,546,502.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,486,395.00		$ 4,486,395.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,598,226.00		$ 44,598,226.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198,631,123.00		$ 198,631,123.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4678-2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, NIT. 809.005.809-9

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,739,662.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199,739,662.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150,618,590.00		$ 150,618,590.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,518,558.00		$ 4,518,558.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,602,514.00		$ 44,602,514.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,739,662.00		$ 199,739,662.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4504 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	28/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	70
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,759,372.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199,759,372.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149,670,534.00		$ 149,670,534.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,490,116.00		$ 4,490,116.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,598,722.00		$ 44,598,722.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198,759,372.00		$ 198,759,372.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4000 DE 2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200,743,783.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200,743,783.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150,622,576.00		$ 150,622,576.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,518,677.00		$ 4,518,677.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,602,530.00		$ 44,602,530.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,743,783.00		$ 199,743,783.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	8/08/2024

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4454 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200,258,472.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200,258,472.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150,153,222.00		$ 150,153,222.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,504,597.00		$ 4,504,597.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,600,653.00		$ 44,600,653.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,258,472.00		$ 199,258,472.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4469 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200,250,666.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200,250,666.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150,145,673.00		$ 150,145,673.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,504,370.00		$ 4,504,370.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,600,623.00		$ 44,600,623.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,250,666.00		$ 199,250,666.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.1.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3247 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7

PLAZO INICIAL:	4.00 MESES
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198,430,649.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198,430,649.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 148,433,858.23		$ 148,433,858.23
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4,453,016.00		$ 4,453,016.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,593,775.00		$ 44,593,775.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 197,480,649.23		$ 197,480,649.23

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

10.2. INFORMES SEMANALES

10.2.1. Vereda Cruce de los Guayabos, Municipio de Alvarado

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/6/2024 al 3/7/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 169 ml de placa huella con un ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

INTEGRANTES: JASMIN CASTAÑEDA DELGADO

CONTRATO No.	4001 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,698,099.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,698,099.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/2/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024		
PRORROGA 1	6/6/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/9/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,698,099.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,698,099.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,611,276.00 *	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 82,545.97	1.00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.00%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%
Meta Física Ejecutada % 0.00%
Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia -------	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167.00	$ 127,302,625	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	$ 21,373,891	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo	Total
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total	**0**	**0**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de accion comunal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

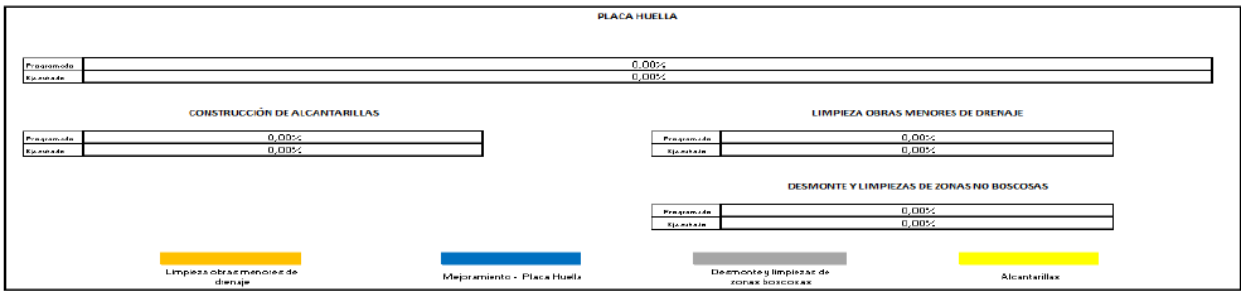

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

0

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 10/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/7/2024 al 10/7/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 169 ml de placa huella con un ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

INTEGRANTES: JASMIN CASTAÑEDA DELGADO

CONTRATO No.	4001 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.698.099,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.698.099,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/2/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024		
PRORROGA 1	6/6/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/9/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.698.099,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.698.099,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.611.276,00 *	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 0,06%
Avance o Atraso Físico % 0,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	$ 127.302.625	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.373.891	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo	Total
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total	**0**	**0**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

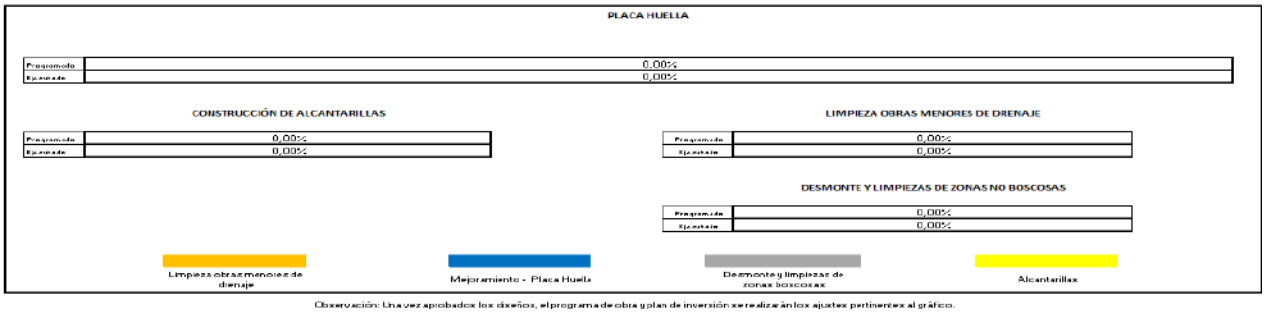

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/7/2024 al 17/7/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 169 ml de placa huella con un ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

INTEGRANTES: JASMIN CASTAÑEDA DELGADO

CONTRATO No.	4001 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.698.099,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.698.099,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/2/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024		
PRORROGA 1	6/6/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/9/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.698.099,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.698.099,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.611.276,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.623.268,00	3,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.623.268,00)	-3,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 750.000,00	9,09%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.623.268,00	3,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.873.268,00)	-3,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,76%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -3,26%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	$ 127.302.625	2023	2024	Prog	$ 120.745,00	$ -	$ -	$ 120.745,00	0,08%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.373.891	2023	2024	Prog	$ 5.502.523,00	$ -	$ -	$ 5.502.523,00	3,68%	25,74%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo	Total
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total	**0**	**0**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	.....	NO	.....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	.....	NO	.....

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará el primer comité técnico de obra con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

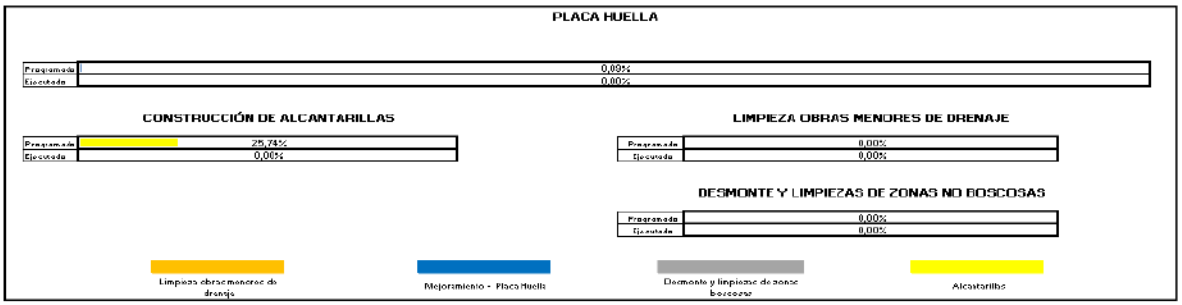

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondrá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/7/2024 al 24/7/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 169 ml de placa huella con un ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

INTEGRANTES: JASMIN CASTAÑEDA DELGADO

CONTRATO No.	4001 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.698.099,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.698.099,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/2/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024		
PRORROGA 1	6/6/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/9/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.698.099,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.698.099,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.698.099,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.938.818,00	4,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.938.818,00)	-4,50%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.688.818,00	6,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.751.318,00)	-5,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193,755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913,169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913,169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,39% — Avance o Atraso Físico % -5,91%
Meta Física Ejecutada % 0,47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia -------	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	$ 127.302.625	2023	2024	Prog	$ 120.745,00	$ -	$ -	$ 120.745,00	0,06%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.373.891	2023	2024	Prog	$ 8.818.073,00	$ -	$ -	$ 8.818.073,00	4,44%	41,26%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo	Total
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total	**0**	**0**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

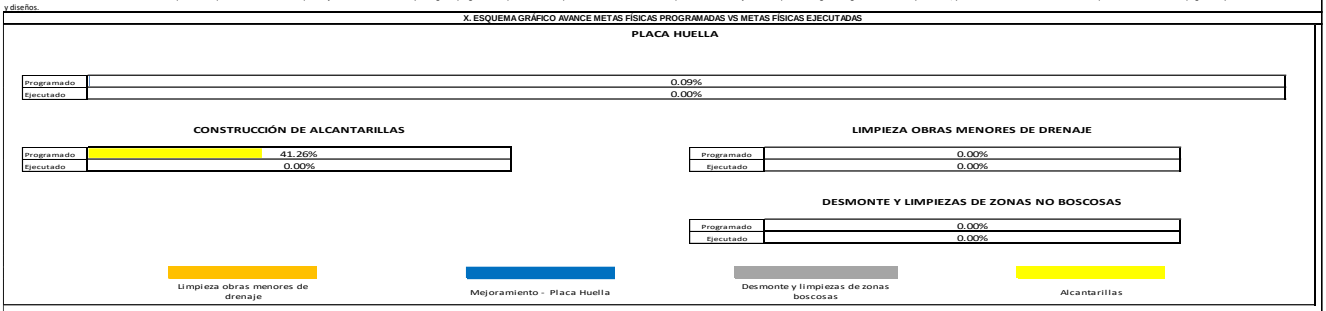

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/7/2024 al 31/7/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 167 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

INTEGRANTES: JASMIN CASTAÑEDA DELGADO

CONTRATO No.	4001 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.698.099,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.698.099,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/2/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024		
PRORROGA 1	6/6/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/9/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.698.099,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.698.099,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.698.099,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.623.380,40	9,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18.623.380,40)	-9,37%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.373.380,40	11,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21.285.880,40)	-10,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,26%
Meta Física Ejecutada % 0,55%
Avance o Atraso Físico % -10,71%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	$ 127.302.625	2023	2024	Prog	$ 7.401.538,60	$ -	$ -	$ 7.401.538,60	3,73%	5,81%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.373.891	2023	2024	Prog	$ 11.221.841,80	$ -	$ -	$ 11.221.841,80	5,65%	52,50%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo	Total
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total	**0**	**0**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuentran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

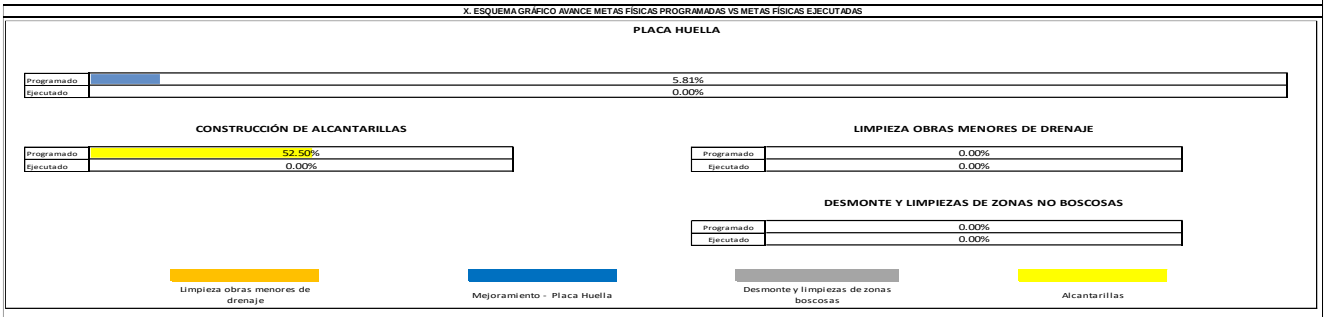

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 ml de placa huella con u ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9
INTEGRANTES:	NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL
CONTRATO No.	4517 de 2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DIAS DE SUSPENSION 1	60
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DIAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	29/05/2024
VALOR INICIAL:	$ 200,927,246.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200,927,246.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT
CONVENIO No.	1704 DE 2024
FECHA DE INICIO:	28/05/2024
PLAZO INICIAL	4 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024
VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,927,246.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,927,246.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150,800,006.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012.113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0.05%
Meta Física Ejecutada %: 0.05%
Avance o Atraso Físico %: 0.05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	$ 149,864,154	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECH APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de accion comunal

OBSERVACIONESs:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

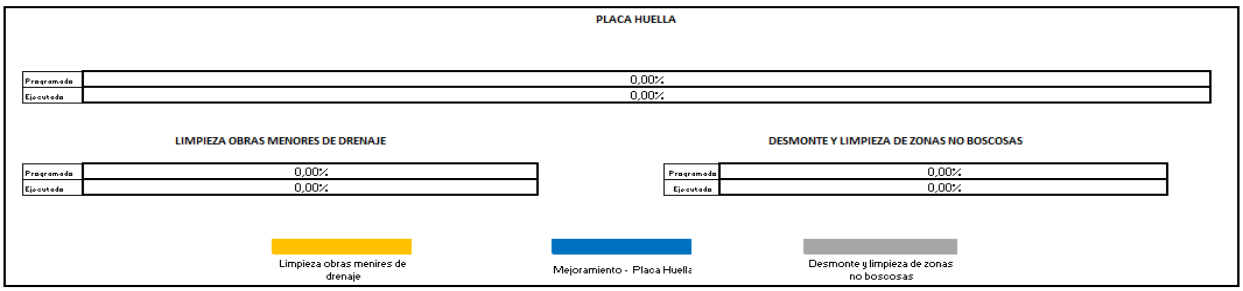

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 ml de placa huella con u ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT: 809.003.141-9

INTEGRANTES: NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL

CONTRATO No.	4517 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.927.246,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.927.246,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	29/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.927.246,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.927.246,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.800.006,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,05%
Meta Física Ejecutada %: 0,05%
Avance o Atraso Físico %: 0,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	$ 149.864.154	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de Ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

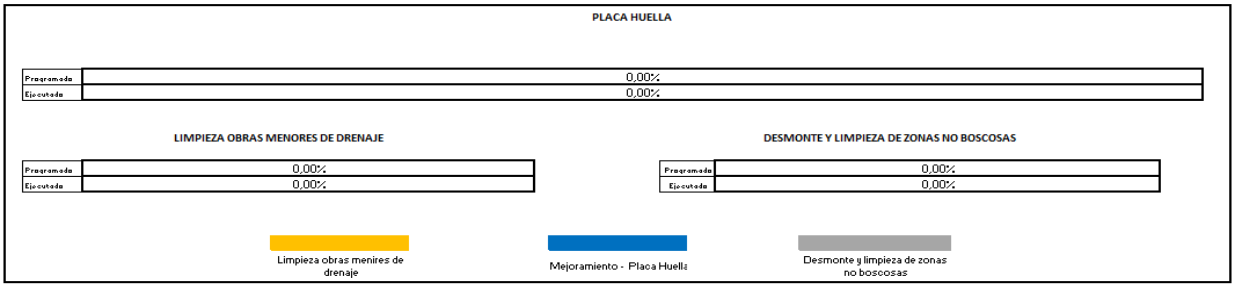

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 ml de placa huella con u ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT: 809.003.141-9

INTEGRANTES: NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL

CONTRATO No.	4517 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.927.246,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.927.246,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	29/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.927.246,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.927.246,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.800.006,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 145.329,00	0,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (145.329,00)	-0,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 145.329,00	0,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (604.671,00)	-0,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,10%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % 0,40%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	$ 149.864.154	2023	2024	Prog	$ 145.329,00	$ -	$ -	$ 145.329,00	0,10%	0,10%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	-
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI -	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (E: OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

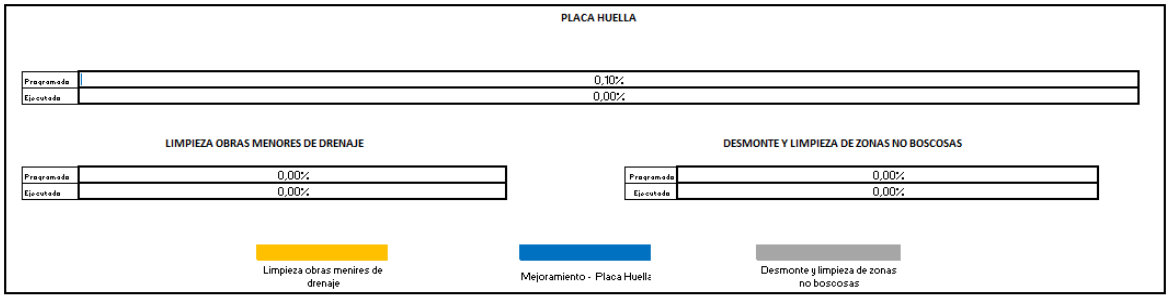

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 200 ml de placa huella con u ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT: 809.003.141-9

INTEGRANTES: NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL

CONTRATO No.	4517 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.927.246,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.927.246,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	29/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.927.246,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.927.246,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.927.246,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.672.511,80	4,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.672.511,80)	-4,84%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.422.511,80	6,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 12.485.011,80	6,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,71%
Meta Física Ejecutada % 0,47%
Avance o Atraso Físico % -6,24%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	$ 149.864.154	2023	2024	Prog	$ 9.672.511,80	$ -	$ -	$ 9.672.511,80	4,84%	6,45%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (E:OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA

Programado	6.45%
Ejecutado	0.00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

Limpieza obras menires de drenaje
Mejoramiento - Placa Huella
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 185 ml de placa huella con un ancho de 5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT: 809.003.141-9

INTEGRANTES: NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL

CONTRATO No.	4517 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.927.246,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.927.246,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	29/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.927.246,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.927.246,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.927.246,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 32.765.607,00	16,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (32.765.607,00)	-16,39%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,54%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.515.607,00	18,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 35.428.107,00	17,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 18,26%
Meta Física Ejecutada % 0,54%
Avance o Atraso Físico % -17,72%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	200	$ 149.864.154	2023	2024	Prog	$ 32.765.607,00	$ -	$ -	$ 32.765.607,00	16,39%	21,86%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAPROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA

Programado	21.86%
Ejecutado	0.00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

Limpieza obras menires de drenaje — Mejoramiento - Placa Huella — Desmonte y limpieza de zonas no boscosas

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CESPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 ml de placa huella con anchos ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1

INTEGRANTES: YIMER MURILLO LEIVA

CONTRATO No.	3963 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,481,796.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,481,796.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,481,796.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,481,796.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,402,085.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0.06%
Meta Física Ejecutada %: 0.06%
Avance o Atraso Físico %: 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167	$ 127,717,253	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	$ 20,753,827	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIO CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de accion comunal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

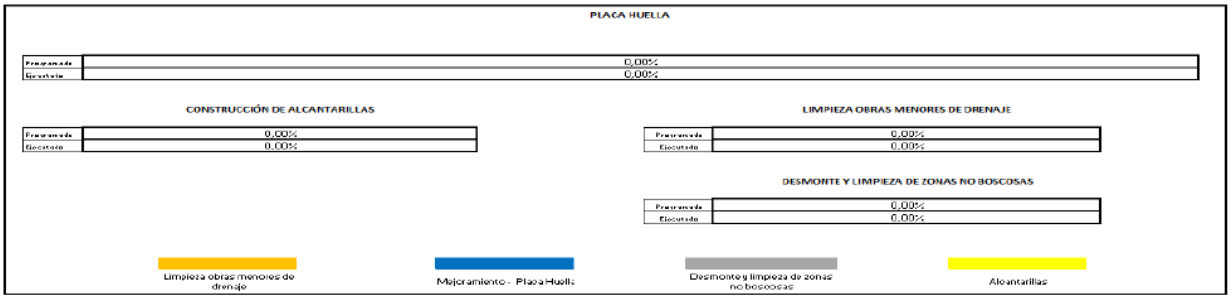

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matricula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 ml de placa huella con anchos ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1		
INTEGRANTES:	YIMER MURILLO LEIVA		
CONTRATO No.	3963 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.481.796,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.481.796,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.481.796,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.481.796,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.402.085,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %: 0,06%
Avance o Atraso Físico %: 0,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167	$ 127.717.253	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.753.827	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

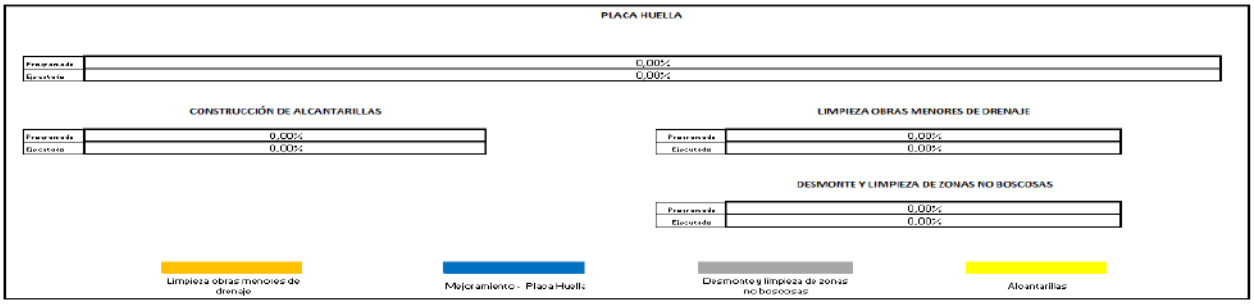

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matricula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 ml de placa huella con anchos ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1

INTEGRANTES: YIMER MURILLO LEIVA

CONTRATO No.	3963 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.481.796,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.481.796,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.481.796,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.481.796,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.402.085,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.620.381,00	3,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.620.381,00)	-3,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.620.381,00	3,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.870.381,00)	-3,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,76%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -3,26%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167	$ 127.717.253	2023	2024	Prog	$ 117.495,00	$ -	$ -	$ 117.495,00	0,08%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.753.827	2023	2024	Prog	$ 5.502.886,00	$ -	$ -	$ 5.502.886,00	3,68%	26,52%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

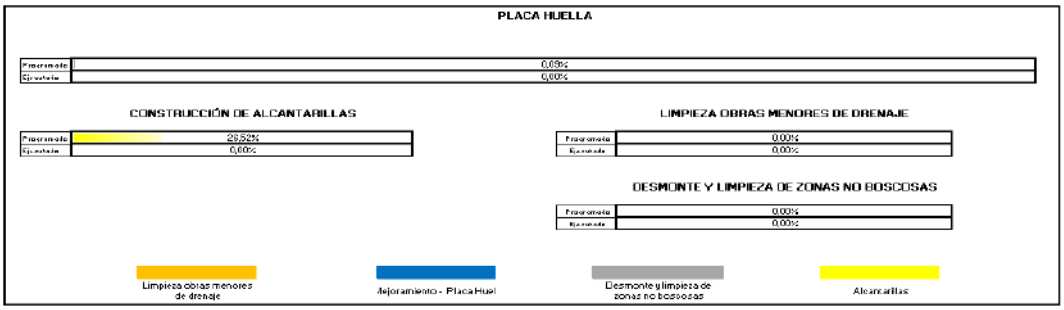

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra u plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al caso.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 ml de placa huella con anchos ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1		
INTEGRANTES:	YIMER MURILLO LEIVA		
CONTRATO No.	3963 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.481.796,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.481.796,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.481.796,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.481.796,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.481.796,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.860.756,00	4,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.860.756,00)	-4,46%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.610.756,00	6,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.673.256,00)	-5,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,35% — Avance o Atraso Físico % -5,88%
Meta Física Ejecutada % 0,47%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167	$ 127.717.253	2023	2024	Prog	$ 117.495,00	$ -	$ -	$ 117.495,00	0,06%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.753.827	2023	2024	Prog	$ 8.743.261,00	$ -	$ -	$ 8.743.261,00	4,41%	42,13%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA

Programado	0.09%
Ejecutado	0.00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Programado	42.13%
Ejecutado	0.00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

Limpieza obras menores de drenaje | Mejoramiento - Placa Huella | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | Alcantarillas

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 ml de placa huella con anchos ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1

INTEGRANTES: YIMER MURILLO LEIVA

CONTRATO No.	3963 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.481.796,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.481.796,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.481.796,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.481.796,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.481.796,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.569.191,80	9,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18.569.191,80)	-9,36%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.319.191,80	11,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21.231.691,80)	-10,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,24%
Meta Física Ejecutada % 0,55%
Avance o Atraso Físico % -10,70%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167	$ 127.717.253	2023	2024	Prog	$ 7.477.515,00	$ -	$ -	$ 7.477.515,00	3,77%	5,85%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.753.827	2023	2024	Prog	$ 11.091.676,80	$ -	$ -	$ 11.091.676,80	5,59%	53,44%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (E: OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

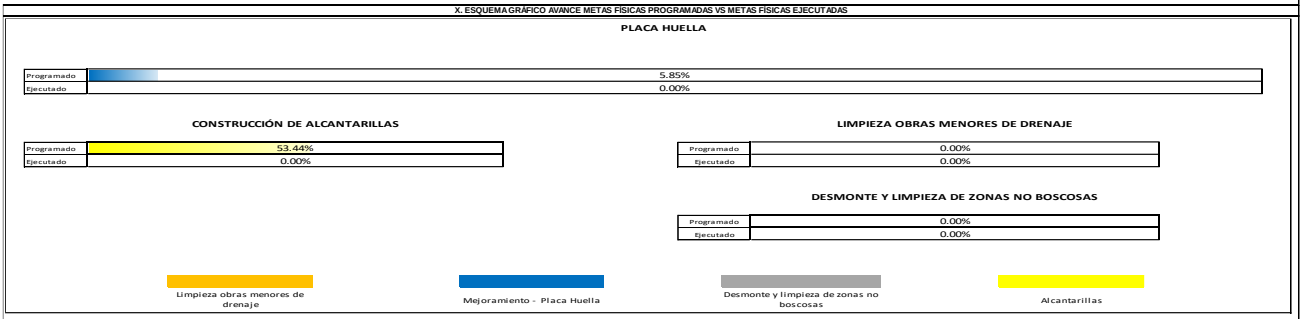

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla, la construcción de 167 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huela serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5

INTEGRANTES: MERCEDES HERNANDEZ LOZANO

CONTRATO No.	4395 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,201,281.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,201,281.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	4/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,201,281.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,201,281.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150,097,912.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0.05%

Avance o Atraso Físico % 0.05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167.00	$ 128,413,108	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	un	1.00	$ 20,753,827	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECH APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de accion comunal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

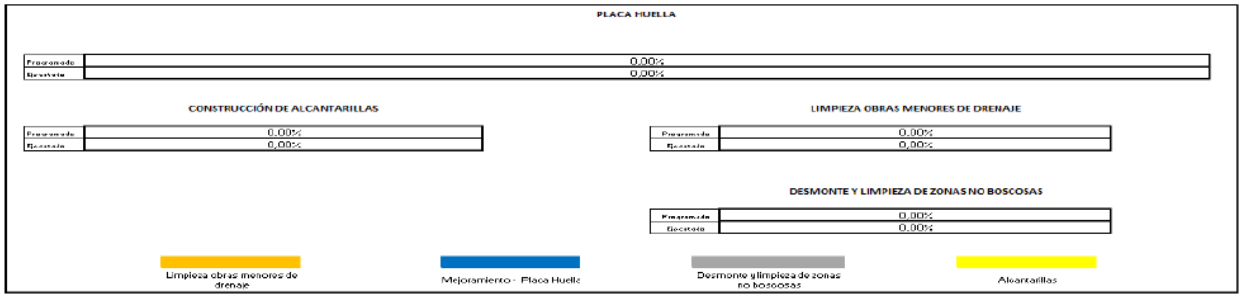

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla, la construcción de 167 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5

INTEGRANTES: MERCEDES HERNANDEZ LOZANO

CONTRATO No.	4395 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.201.281,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.201.281,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	4/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.281,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.281,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.097.912,00 *	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367,418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913,169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913,169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,05%
Meta Física Ejecutada %: 0,05%
Avance o Atraso Físico %: 0,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	$ 128.413.108	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	un	1,00	$ 20.753.827	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (E:OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos específicamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

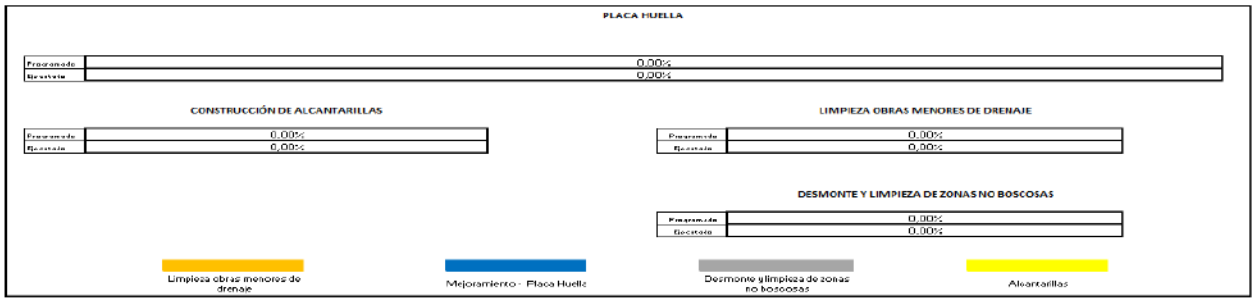

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla, la construcción de 167 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5

INTEGRANTES: MERCEDES HERNANDEZ LOZANO

CONTRATO No.	4395 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.201.281,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.201.281,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	4/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.281,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.281,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.097.912,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.620.381,00	3,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.620.381,00)	-3,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.620.381,00	3,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.870.381,00)	-3,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,74%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -3,24%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ———	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base: Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	$ 128.413.108	2023	2024	Prog	$ 117.495,00	$ -	$ -	$ 117.495,00	0,08%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	un	1,00	$ 20.753.827	2023	2024	Prog	$ 5.502.886,00	$ -	$ -	$ 5.502.886,00	3,67%	26,52%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

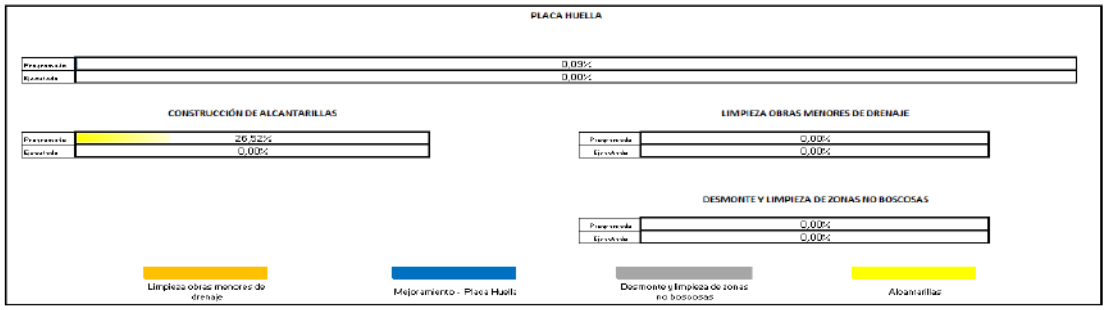

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondrá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla, la construcción de 167 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5

INTEGRANTES: MERCEDES HERNANDEZ LOZANO

CONTRATO No.	4395 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.201.281,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.201.281,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	4/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.201.281,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.201.281,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.201.281,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.860.756,00	4,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.860.756,00)	-4,45%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.610.756,00	6,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.673.256,00)	-5,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,33%
Meta Física Ejecutada % 0,47%
Avance o Atraso Físico % -5,86%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	$ 128.413.108	2023	2024	Prog	$ 117.495,00	$ -	$ -	$ 117.495,00	0,06%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	un	1,00	$ 20.753.827	2023	2024	Prog	$ 8.743.261,00	$ -	$ -	$ 8.743.261,00	4,39%	42,13%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA

Programado	0.09%
Ejecutado	0.00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Programado	42.13%
Ejecutado	0.00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

Limpieza obras menores de drenaje | Mejoramiento - Placa Huella | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | Alcantarillas

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a aguas lluvias, la construcción de 167 ml de placa huella con anchos ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5		
INTEGRANTES:	MERCEDES HERNANDEZ LOZANO		
CONTRATO No.	4395 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.201.281,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.201.281,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	4/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.201.281,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.201.281,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.201.281,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.753.053,40	9,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18.753.053,40)	-9,41%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.503.053,40	11,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21.415.553,40)	-10,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,30%
Meta Física Ejecutada % 0,55%
Avance o Atraso Físico % -10,75%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	167,00	$ 128.413.108	2023	2024	Prog	$ 7.661.376,60	$ -	$ -	$ 7.661.376,60	3,85%	5,97%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	un	1,00	$ 20.753.827	2023	2024	Prog	$ 11.091.676,80	$ -	$ -	$ 11.091.676,80	5,57%	53,44%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Ej: OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

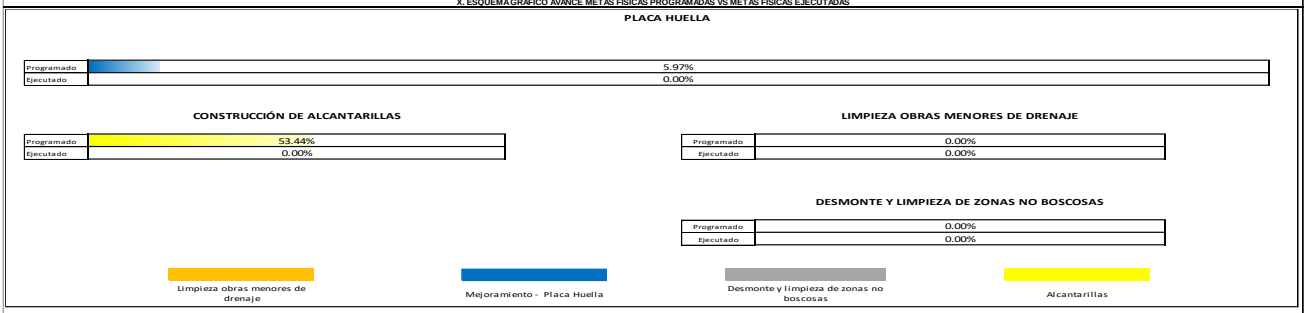

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se dará autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diametros de 36¨ , la construcción de 71 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT.800.101.999-8		
INTEGRANTES:	ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ		
CONTRATO No.	4485 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,008,033.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,008,033.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,008,033.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,008,033.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,911,018.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____
Meta Física Ejecutada %: 0.06%

Avance o Atraso Físico %: 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	71.00	$ 52,602,452	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5.00	$ 96,374,172	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Rusteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1: ____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ____	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	-
UBICACIÓN: ____	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	____
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
APROVECHAPROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
CONCESIÓCONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	____
OCUPACIÓOCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	____
VERTIMIENVERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	____
EMISIONESEMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	____
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	____

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remisión por parte de la junta de accion comunal

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338783 CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diametros de 36¨ , la construcción de 71 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT.800.101.999-8

INTEGRANTES: ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ

CONTRATO No.	4485 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.008.033,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.008.033,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.008.033,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.008.033,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.911.018,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367,418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913,169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913,169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,06%
Meta Física Ejecutada % 0,06%
Avance o Atraso Físico % 0,06%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	71,00	$ 52.602.452	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5,00	$ 96.374.172	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

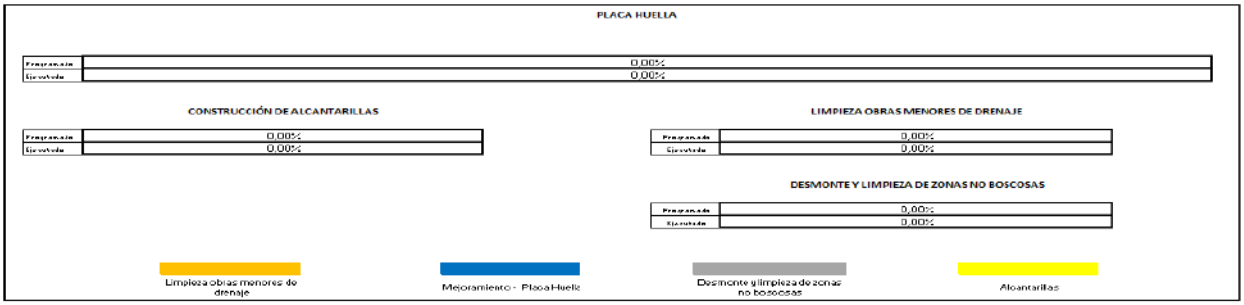

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diametros de 36¨ , la construcción de 71 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8

INTEGRANTES: ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ

CONTRATO No.	4485 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.008.033,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.008.033,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.008.033,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.008.033,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.911.018,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 15.982.956,00	10,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15.982.956,00)	-10,66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.982.956,00	10,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.232.956,00)	-10,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10,66%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -10,16%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ———	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base: Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	71,00	$ 52.602.452	2023	2024	Prog	$ 50.988,00	$ -	$ -	$ 50.988,00	0,03%	0,10%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5,00	$ 96.374.172	2023	2024	Prog	$ 15.931.968,00	$ -	$ -	$ 15.931.968,00	10,63%	16,53%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

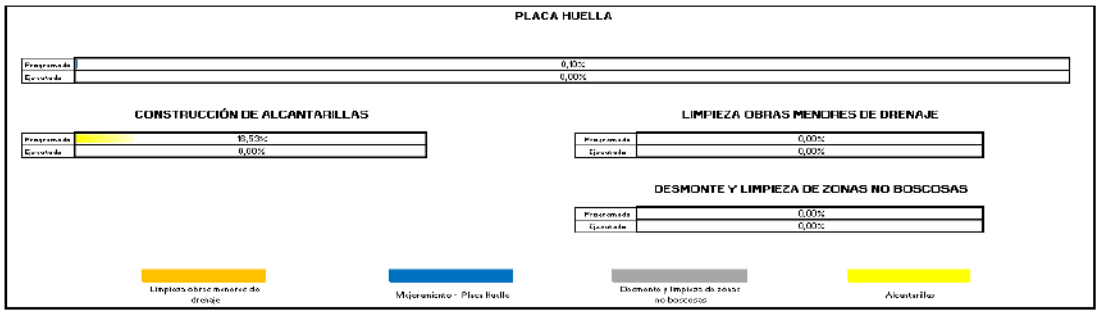

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se visualizarán los ítems pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondrá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diametros de 36¨ , la construcción de 71 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8		
INTEGRANTES:	ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ		
CONTRATO No.	4485 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.008.033,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.008.033,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.008.033,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.008.033,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.008.033,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.342.703,50	19,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (38.342.703,50)	19,27%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 42.092.703,50	21,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (41.155.203,50)	-20,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 21,15% — Avance o Atraso Físico % -20,68%
Meta Física Ejecutada % 0,47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	71,00	$ 52.602.452	2023	2024	Prog	$ 2.939.970,00	$ -	$ -	$ 2.939.970,00	1,48%	5,59%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5,00	$ 96.374.172	2023	2024	Prog	$ 35.402.733,50	$ -	$ -	$ 35.402.733,50	17,79%	36,73%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

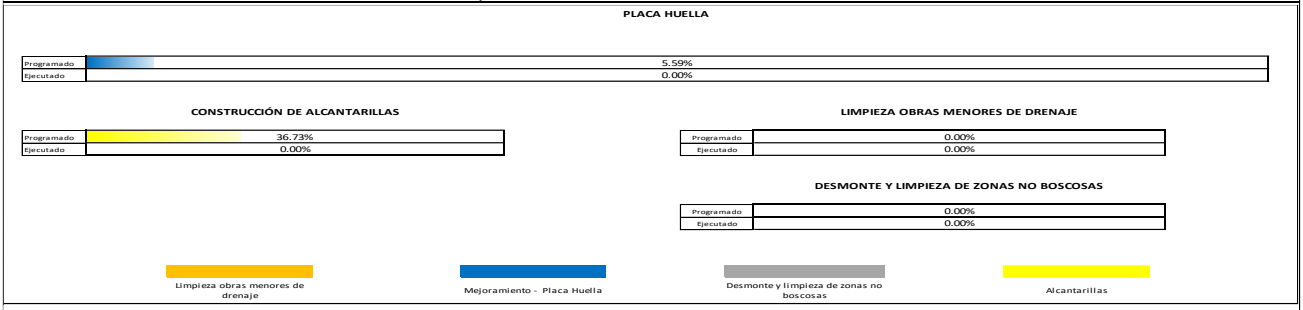

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarillas con diámetros de 36¨, la construcción de 71 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8		
INTEGRANTES:	ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ		
CONTRATO No.	4485 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.008.033,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.008.033,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	42		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.008.033,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.008.033,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.008.033,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.432.578,00	20,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (41.432.578,00)	20,82%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45.182.578,00	22,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (44.095.078,00)	-22,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 22,70% — Avance o Atraso Físico % -22,16%
Meta Física Ejecutada % 0,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	71,00	$ 52.602.452	2023	2024	Prog	$ 4.865.958,00	$ -	$ -	$ 4.865.958,00	2,45%	9,25%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	5,00	$ 96.374.172	2023	2024	Prog	$ 36.566.620,00	$ -	$ -	$ 36.566.620,00	18,37%	37,94%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de acción comunal se encuntran en tramites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para el convenio no se requiere permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

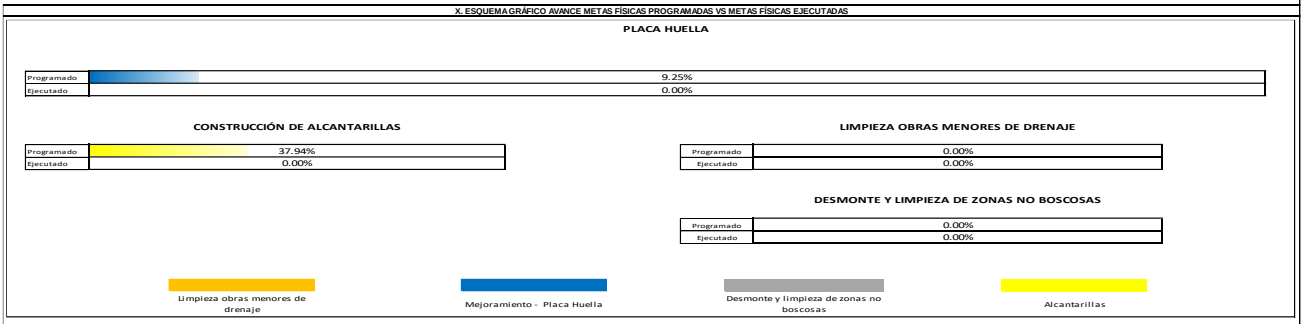

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 80 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

INTEGRANTES: MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 198,108,085.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,108,085.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,108,085.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,108,085.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,670,534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % .....
Meta Física Ejecutada % 0.06%

Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80.00	$ 126,681,316	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	$ 21,475,295	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOS PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ..... 6 .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

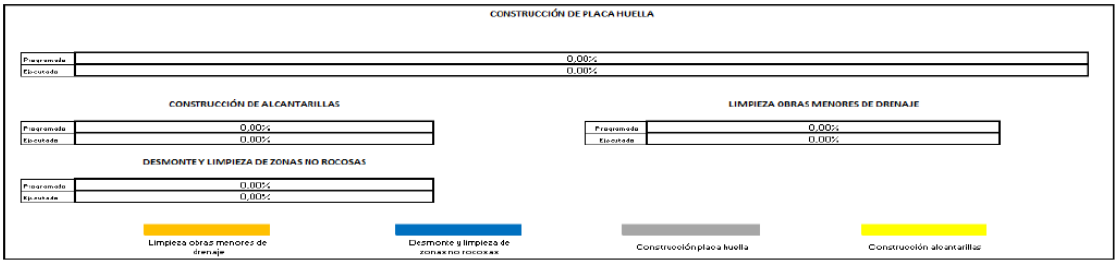

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 80 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

INTEGRANTES: MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.108.085,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.108.085,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.108.085,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.108.085,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,06%
Meta Física Ejecutada % 0,06%
Avance o Atraso Físico % 0,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80,00	$ 126.681.316	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.475.295	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	-	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

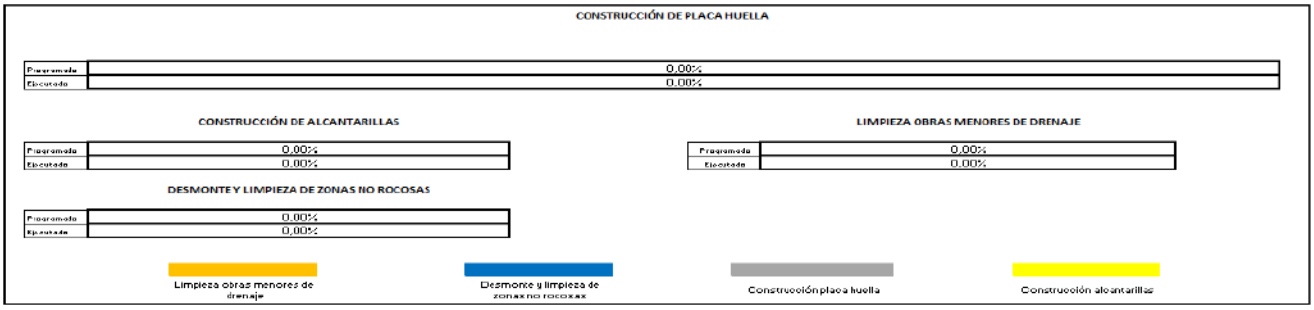

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizará visitas de campo de reconocimiento en las veredas donde se ejecutarán las obras intervención, con el fin de identificar y georreferenciar los puntos de interés, como lo son: el inicio y fin de las placas huellas, alcantarillas, entradas a predios, etc.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 147 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

INTEGRANTES: MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.108.085,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.108.085,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.108.085,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.108.085,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.607.079,00	3,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.607.079,00)	-3,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.607.079,00	3,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.857.079,00)	-3,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,75%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -3,25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80,00	$ 126.681.316	2023	2024	Prog	$ 104.193,00	$ -	$ -	$ -		$ 104.193,00	0,07%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.475.295	2023	2024	Prog	$ 5.502.886,00	$ -	$ -	$ -		$ 5.502.886,00	3,68%	25,62%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una visita de reconocimiento en el sitio donde se ejecutarán las obras, con el fin de identificar y georreferenciar los puntos de interés, como lo son: el inicio y fin de las placas huellas, alcantarillas, entradas a predios, etc

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

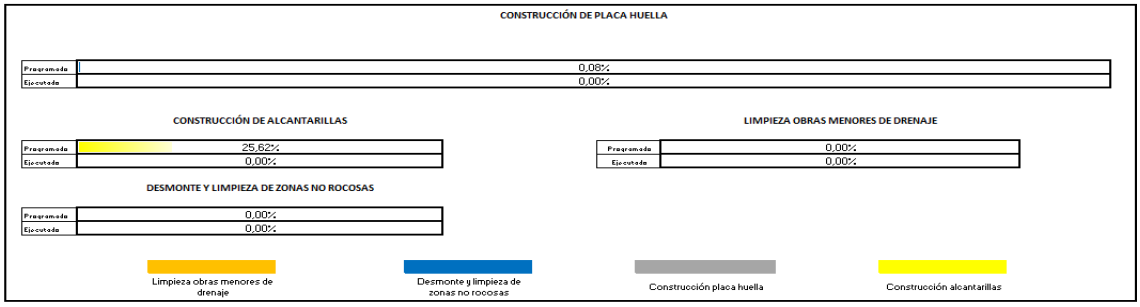

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inspección estado de la vía



Visita de reconocimiento



Inspección estado de la vía



Inspección estado de la vía



Inspección estado de la vía



Inspección de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 147 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

INTEGRANTES: MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.158.085,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.158.085,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.158.085,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.158.085,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.158.085,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.568.922,00	4,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.568.922,00)	-4,83%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.318.922,00	6,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.381.422,00)	-6,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,72% — Avance o Atraso Físico % -6,25%
Meta Física Ejecutada % 0,47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector n (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80,00	$ 126.681.316	2023	2024	Prog	$ 104.193,00	$ -	$ -	$ -	$ 104.193,00	0,05%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.475.295	2023	2024	Prog	$ 9.464.729,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.464.729,00	4,78%	44,07%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
-	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

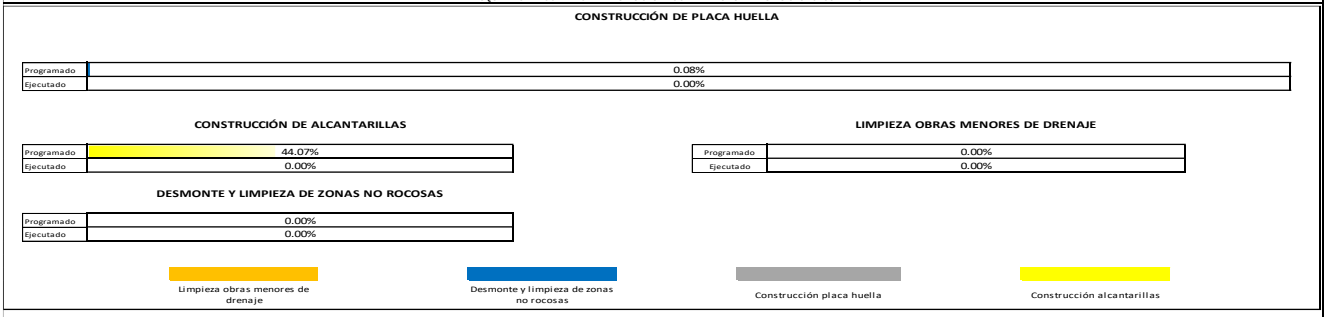

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondera mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 147 ml de placa huella con un ancho de 4,5m y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

INTEGRANTES: MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.158.085,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.158.085,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.158.085,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.158.085,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.158.085,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 22.794.052,60	11,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (22.794.052,60)	-11,50%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.544.052,60	13,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (25.456.552,60)	-12,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 13,40% — Avance o Atraso Físico % -12,85%
Meta Física Ejecutada % 0,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -		$ -		$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -		$ -		$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	80,00	$ 126.681.316	2023	2024	Prog	$ 10.980.907,80		$ -		$ -	$ 10.980.907,80	5,54%	8,67%
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.475.295	2023	2024	Prog	$ 11.813.144,80		$ -		$ -	$ 11.813.144,80	5,96%	55,01%
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (E: OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

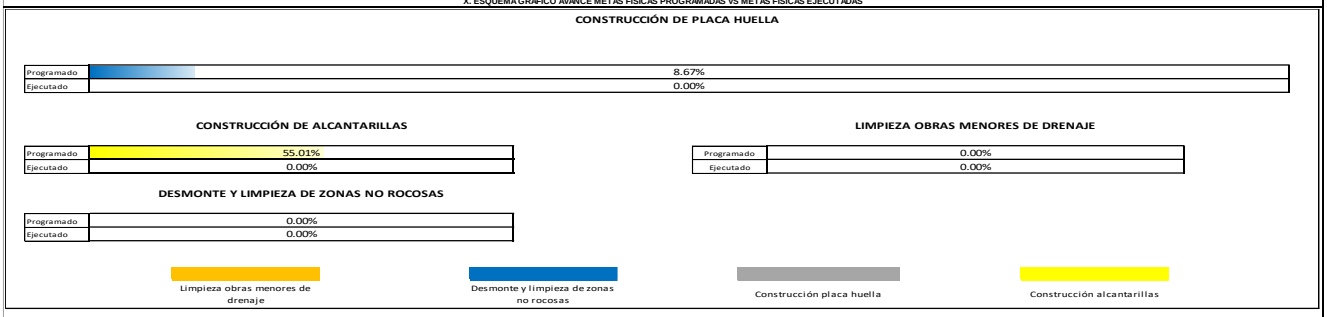

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 6 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box coulvvert y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5		
INTEGRANTES:	DIANA MILENA LOZANO MACANA		
CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 195,828,659.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 195,828,659.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,828,659.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,828,659.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,670,534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % .....
Meta Física Ejecutada % 0.06%

Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (m)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ml	6.00	$ 94,200,568	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2.00	$ 51,700,867	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Rutiadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENVERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONESEMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

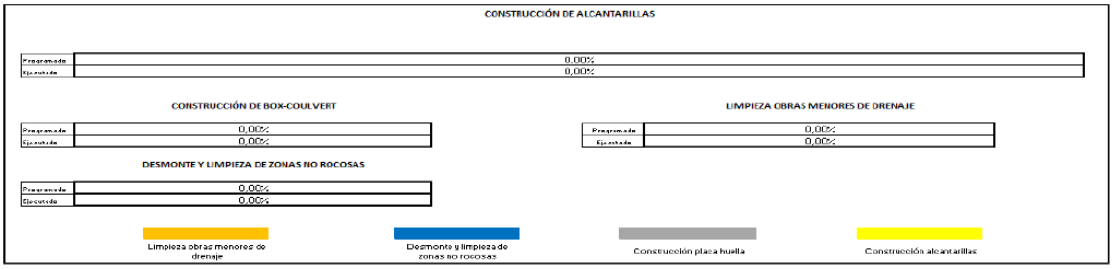

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Tramo 1:

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Tramo 1:

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Tramo 1:

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 6 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box coulvert y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

INTEGRANTES: DIANA MILENA LOZANO MACANA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.828.659,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 195.828.659,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.828.659,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.828.659,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,06%
Meta Física Ejecutada %: 0,06%
Avance o Atraso Físico %: 0,06%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ml	6,00	$ 94.200.568	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2,00	$ 51.700.867	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	-	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOS PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	-	N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos específicamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

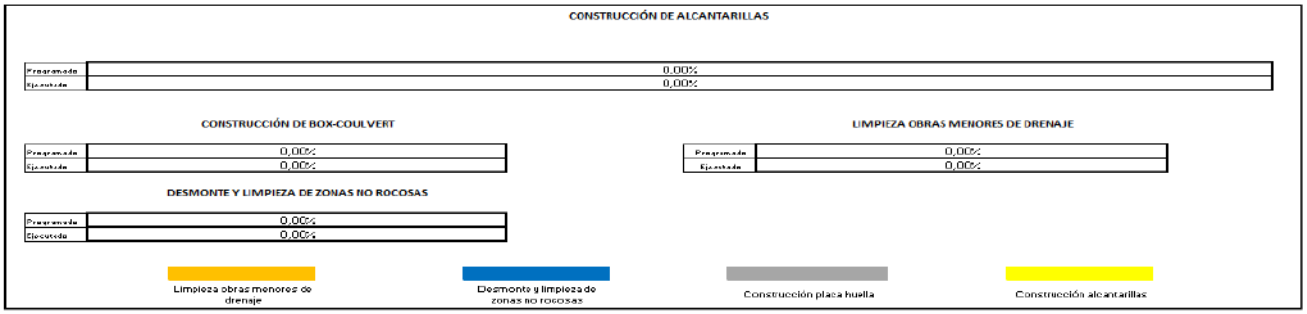

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
Tramo 1:	**Tramo 1:**	**Tramo 1:**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizará visitas de campo de reconocimiento en las veredas donde se ejecutarán las obras intervención, con el fin de identificar y georreferenciar los puntos de interés, como lo son: el inicio y fin de las placas huellas, alcantarillas, entradas a predios, etc.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box coulvert y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

INTEGRANTES: DIANA MILENA LOZANO MACANA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.828.659,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 195.828.659,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.828.659,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.828.659,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.596.996,00	3,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.596.996,00)	-3,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.596.996,00	3,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.846.996,00)	-3,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,74%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -3,24%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ml	6,00	$ 94.200.568	2023	2024	Prog	$ 5.596.996,00	$ -	$ -	$ -		$ 5.596.996,00	3,74%	5,94%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2,00	$ 51.700.867	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una visita de reconocimiento en el sitio donde se ejecutarán las obras, con el fin de identificar y georreferenciar los puntos de interés, como lo son: el inicio y fin de las placas huellas, alcantarillas, entradas a predios, etc

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

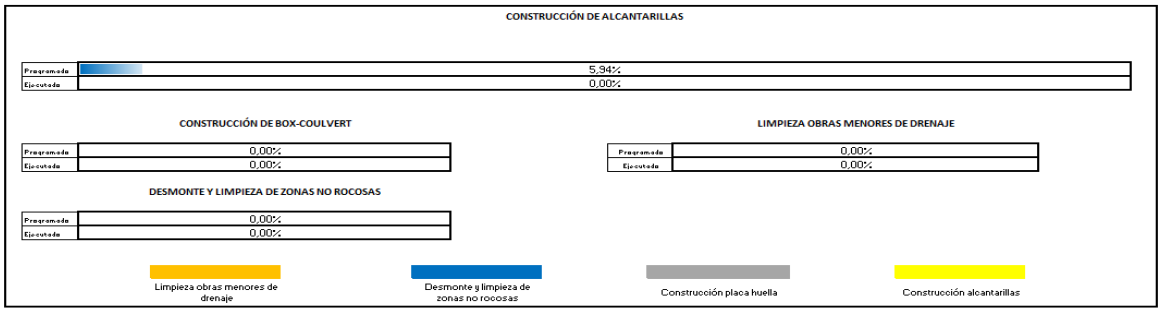

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita de reconocimiento



Inspección de alcantarilla



Inspección de alcantarilla



Inspección de alcantarilla



Inspección de alcantarilla



Inspección de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box coulvert y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

INTEGRANTES: DIANA MILENA LOZANO MACANA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.828.659,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 195.828.659,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.828.659,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.828.659,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195.828.659,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.815.545,00	12,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.815.545,00)	-12,16%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,48%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.565.545,00	14,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (26.628.045,00)	-13,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14,08%
Meta Física Ejecutada % 0,48%
Avance o Atraso Físico % -13,60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ml	6,00	$ 94.200.568	2023	2024	Prog	$ 23.815.545,00	$ -	$ -	$ -		$ 23.815.545,00	12,16%	25,28%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2,00	$ 51.700.867	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

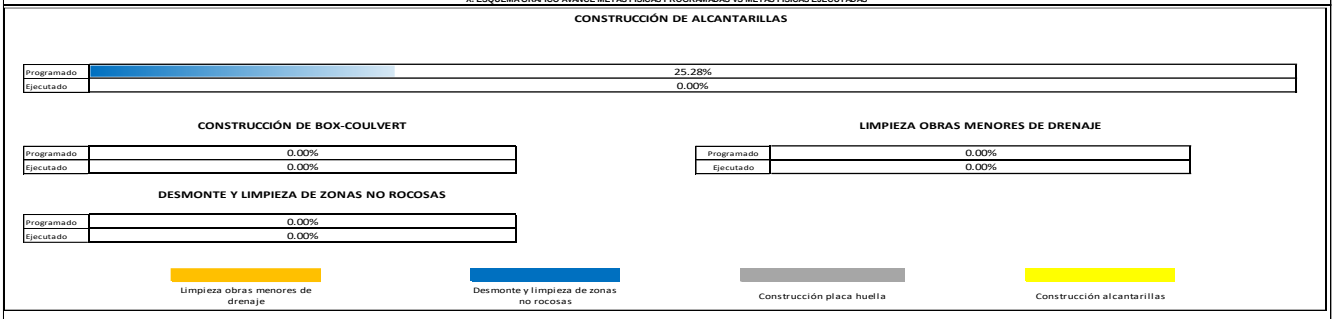

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 5 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 2 box-culvert y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

INTEGRANTES: DIANA MILENA LOZANO MACANA

CONTRATO No.	4756-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.828.659,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 195.828.659,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195.828.659,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.828.659,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195.828.659,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.974.605,00	14,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (27.974.605,00)	-14,29%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,56%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.724.605,00	16,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (30.637.105,00)	-15,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 16,20%
Meta Física Ejecutada % 0,56%
Avance o Atraso Físico % -15,64%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ml	6,00	$ 94.200.568	2023	2024	Prog	$ 27.974.605,00	$ -	$ -	$ -		$ 27.974.605,00	14,29%	29,70%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT	un	2,00	$ 51.700.867	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAPROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

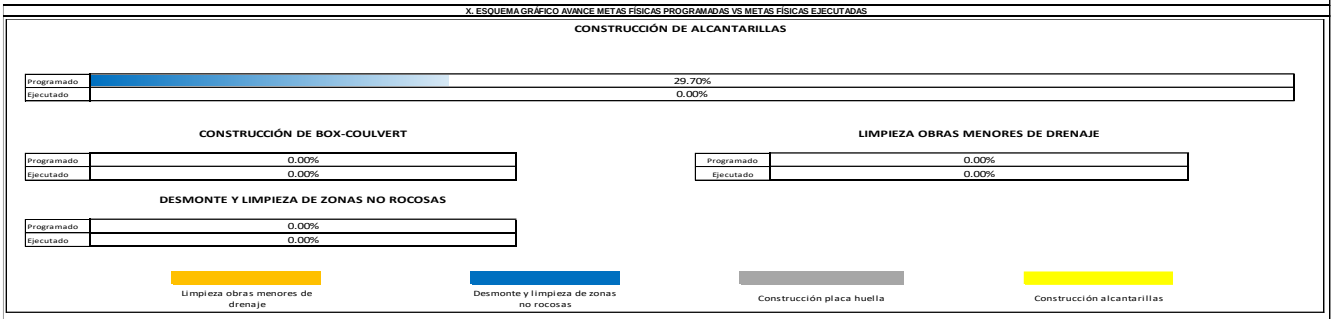

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA. NIT. 800.167.437-4.		
INTEGRANTES:	MOISES MAX MEDINA		
CONTRATO No.	4662-2023	VALOR INICIAL:	$ 198,826,145.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,826,145.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,826,145.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,826,145.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,670,534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0.06%
Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (fi)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (fi)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	un	7.00	$ 144,884,306	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
			#¡REF!	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		#¡REF!
						Ejec		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		#¡REF!

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especifícar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

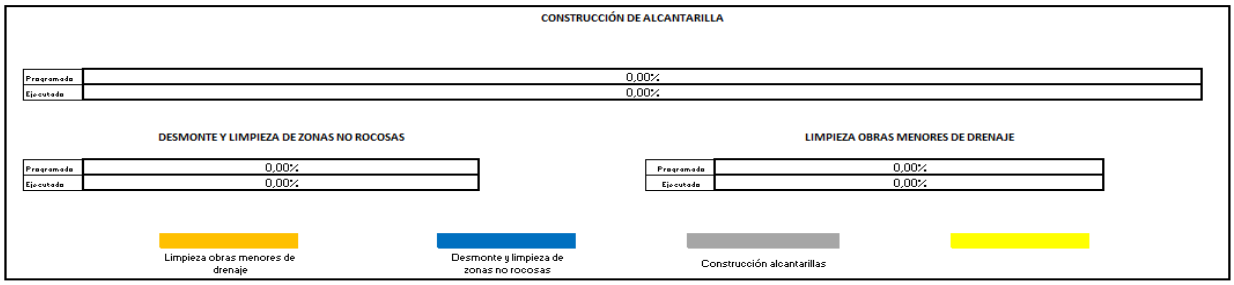

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.

INTEGRANTES: MOISES MAX MEDINA

CONTRATO No.	4662-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.826.145,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.826.145,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.826.145,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.826.145,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,06%
Meta Física Ejecutada %: 0,06%
Avance o Atraso Físico %: 0,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	un	7,00	$ 144.884.306	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
			#¡REF!	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		#¡REF!
						Ejec		$ -	$ -	$ -		$ -		#¡REF!

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE: ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ:CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ:OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN:VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

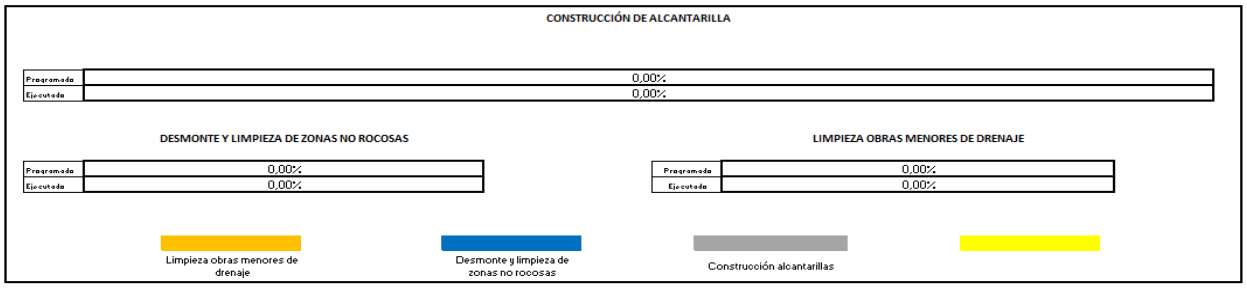

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.

INTEGRANTES: MOISES MAX MEDINA

CONTRATO No.	4662-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.826.145,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.826.145,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.826.145,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.826.145,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.376.176,00	5,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.376.176,00)	-5,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	0,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.376.176,00	5,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7.626.176,00)	-5,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 5,60%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -5,10%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	un	7,00	$ 144.884.306	2023	2024	Prog	$ 8.376.176,00	$ -		$ -		$ 8.376.176,00	5,60%	5,78%
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

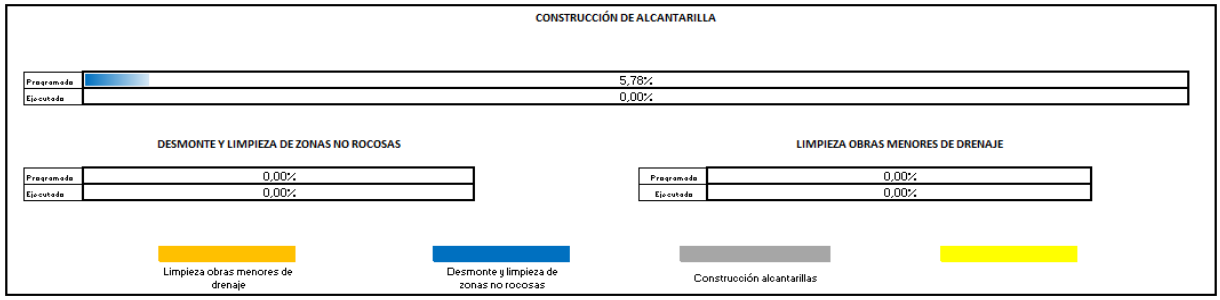

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondera mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.

INTEGRANTES: MOISES MAX MEDINA

CONTRATO No.	4662-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.826.145,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.826.145,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.826.145,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.826.145,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.826.145,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 34.712.192,00	17,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (34.712.192,00)	-17,46%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.462.192,00	19,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (37.524.692,00)	-18,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 19,34%
Meta Física Ejecutada % 0,47%
Avance o Atraso Físico % -18,87%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	un	7,00	$ 144.884.306	2023	2024	Prog	$ 34.712.192,00	$ -		$ -		$ 34.712.192,00	17,46%	23,96%
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA

Programado	23.96%
Ejecutado	0.00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

Limpieza obras menores de drenaje
Desmonte y limpieza de zonas no rocosas
Construcción alcantarillas

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 7 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.

INTEGRANTES: MOISES MAX MEDINA

CONTRATO No.	4662-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.826.145,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.826.145,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	60/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.826.145,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.826.145,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.826.145,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 42.657.032,00	21,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (42.657.032,00)	-21,45%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.407.032,00	23,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (45.319.532,00)	-22,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23,34%
Meta Física Ejecutada % 0,55%
Avance o Atraso Físico % -22,79%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -		$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	un	7,00	$ 144.884.306	2023	2024	Prog	$ 42.657.032,00	$ -		$ -		$ 42.657.032,00	21,45%	29,44%
						Ejec	$ -	$ -		$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE :ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ:CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ:OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN:VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vias Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.
El día 30 de julio de 2024 se realizó el primer comité operativo, donde se aprobó la devolución o reintegro del dinero de la póliza a la JAC de Llanos de Combeima, se conciliò el salario de los profesionales (ingeniero residente y contador , por último se aprobaron las propuestas económicas para de las actividades de topografía y estudios y diseños, también se solicitó a la JAC actualizar las cotizaciones para el ítem de laboratorio ya que las cotizaciones presentadas tienen un costó mayor al aprobado en el presupuesto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

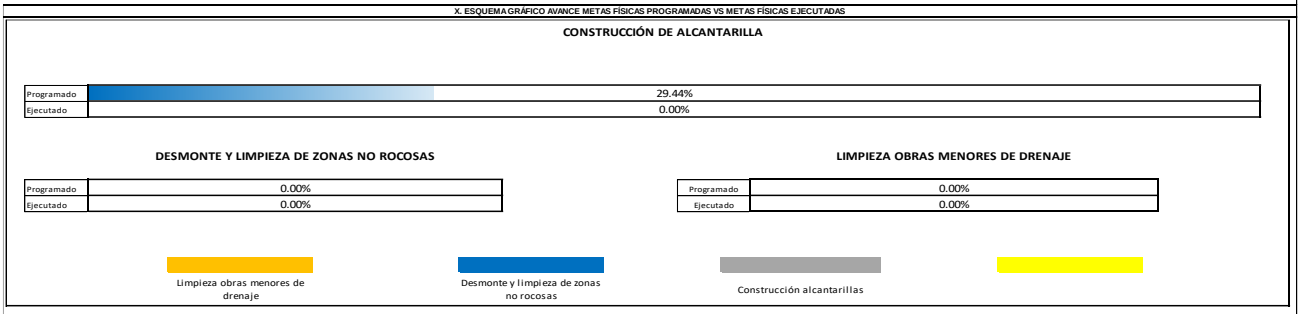

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

INTEGRANTES: LEIDY MARITZA MONTOYA

CONTRATO No.	4786-2023	VALOR INICIAL:	$ 198,145,372.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,145,372.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,145,372.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,145,372.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,670,534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0.06%

Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97.00	$ 90,058,045	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3.00	$ 58,083,766	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Ej OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción coumnal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

INTEGRANTES: LEIDY MARITZA MONTOYA

CONTRATO No.	4786-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.145.372,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.145.372,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.145.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.145.372,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,06%
Meta Física Ejecutada % 0,06%
Avance o Atraso Físico % 0,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97,00	$ 90.058.045	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	$ 58.083.766	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE: ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECH APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

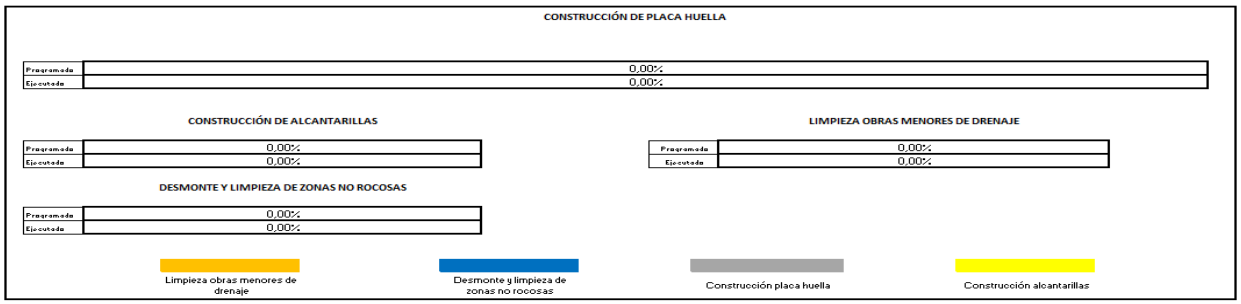

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACION:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

INTEGRANTES: LEIDY MARITZA MONTOYA

CONTRATO No.	4786-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.145.372,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.145.372,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.145.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.145.372,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.574.805,00	11,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16.574.805,00)	-11,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.574.805,00	11,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.824.805,00)	-10,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,07%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -10,57%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97,00	$ 90.058.045	2023	2024	Prog	$ 68.723,00	$ -	$ -	$ -		$ 68.723,00	0,05%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	$ 58.083.766	2023	2024	Prog	$ 16.506.082,00	$ -	$ -	$ -		$ 16.506.082,00	11,03%	28,42%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Ej: OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

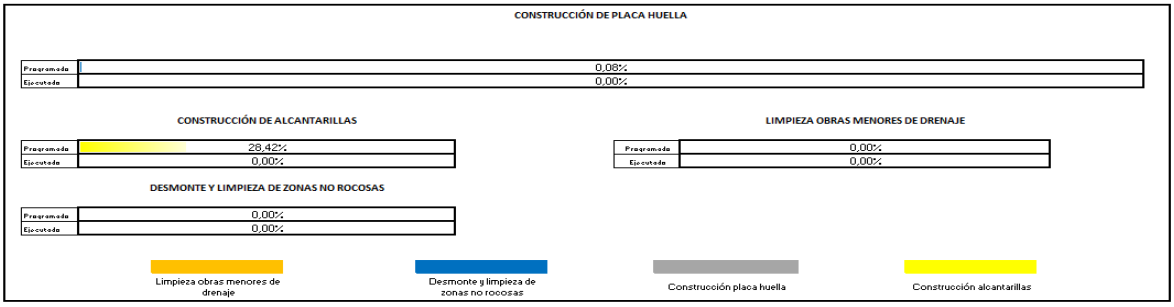

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

INTEGRANTES: LEIDY MARITZA MONTOYA

CONTRATO No.	4786-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.145.372,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.145.372,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.145.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.145.372,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.145.372,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 22.243.458,00	11,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (22.243.458,00)	-11,23%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.993.458,00	13,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (25.055.958,00)	-12,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 13,12% — Avance o Atraso Físico % -12,65%
Meta Física Ejecutada % 0,47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -		$ -		$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -		$ -		$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97,00	$ 90.058.045	2023	2024	Prog	$ 68.723,00		$ -		$ -	$ 68.723,00	0,03%	0,08%
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	$ 58.083.766	2023	2024	Prog	$ 22.174.735,00		$ -		$ -	$ 22.174.735,00	11,19%	38,18%
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	-
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI -	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE :ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓ:CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓ:OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIEN:VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONESEMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

Programado	0.08%
Ejecutado	0.00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Programado	38.18%
Ejecutado	0.00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS

Programado	0.00%
Ejecutado	0.00%

Limpieza obras menores de drenaje | Desmonte y limpieza de zonas no rocosas | Construcción placa huella | Construcción alcantarillas

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 97 ml de placa huella con un ancho de 4,5m y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

INTEGRANTES: LEIDY MARITZA MONTOYA

CONTRATO No.	4786-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.145.372,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.145.372,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.145.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.145.372,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.145.372,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.539.302,00	19,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (38.539.302,00)	-19,45%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 42.289.302,00	21,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (41.201.802,00)	-20,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 21,34% — Avance o Atraso Físico % -20,79%
Meta Física Ejecutada % 0,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -		$ -		$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -		$ -		$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	97,00	$ 90.058.045	2023	2024	Prog	$ 9.333.113,60		$ -		$ -	$ 9.333.113,60	4,71%	10,36%
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	$ 58.083.766	2023	2024	Prog	$ 29.206.188,40		$ -		$ -	$ 29.206.188,40	14,74%	50,28%
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI -	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE :ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓ:CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓ:OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIEN:VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONESEMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vias Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

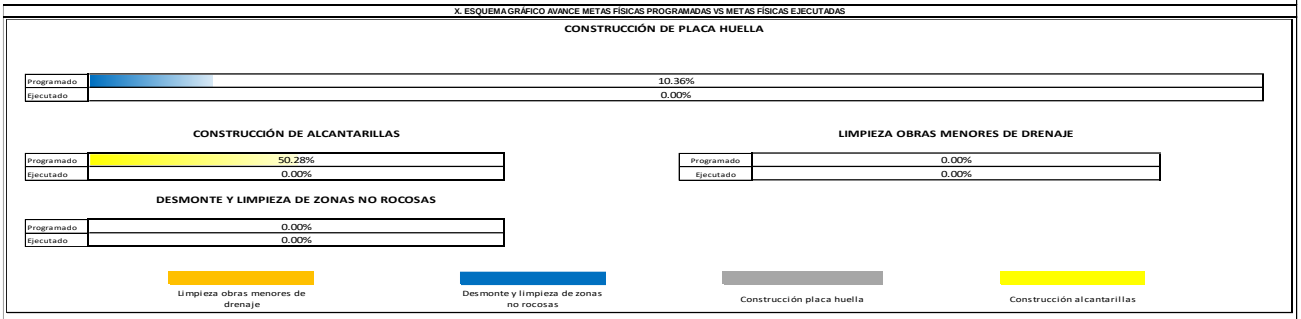

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0		
INTEGRANTES:	CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ		
CONTRATO No.	3819 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196,712,232.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196,712,232.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	5/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196,712,232.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196,712,232.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,670,534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % .....
Meta Física Ejecutada % 0.06%

Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	100.00	$ 87,869,001	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3.00	$ 58,937,089	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	.....	NO	-
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	.....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOS PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ..... 6 .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

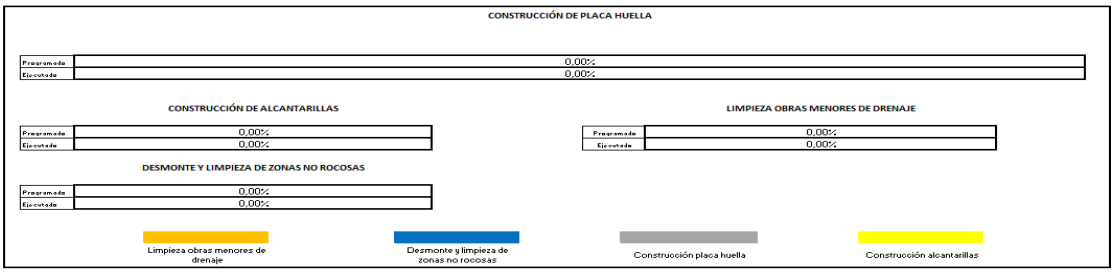

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Tramo 1:

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Tramo 1:

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Tramo 1:

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0

INTEGRANTES: CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ

CONTRATO No.	3819 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.712.232,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.712.232,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	5/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.712.232,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.712.232,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,06%
Meta Física Ejecutada %: 0,06%
Avance o Atraso Físico %: 0,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	100,00	$ 87.869.001	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	$ 58.937.089	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos específicamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
Tramo 1:	**Tramo 1:**	**Tramo 1:**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizará visitas de campo de reconocimiento en las veredas donde se ejecutarán las obras intervención, con el fin de identificar y georreferenciar los puntos de interés, como lo son: el inicio y fin de las placas huellas, alcantarillas, entradas a predios, etc.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0

INTEGRANTES: CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ

CONTRATO No.	3819 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.712.232,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.712.232,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	5/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.712.232,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.712.232,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 147.739.160,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.577.022,00	11,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16.577.022,00)	-11,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.577.022,00	11,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.827.022,00)	-10,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,22%
Meta Física Ejecutada % 0,51%
Avance o Atraso Físico % -10,71%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	100,00	$ 87.869.001	2023	2024	Prog	$ 70.940,00	$ -	$ -	$ -		$ 70.940,00	0,05%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	$ 58.937.089	2023	2024	Prog	$ 16.506.082,00	$ -	$ -	$ -		$ 16.506.082,00	11,17%	28,01%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECH APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS realizó una visita de reconocimiento en el sitio donde se ejecutarán las obras, con el fin de identificar y georreferenciar los puntos de interés, como lo son: el inicio y fin de las placas huellas, alcantarillas, entradas a predios, etc

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

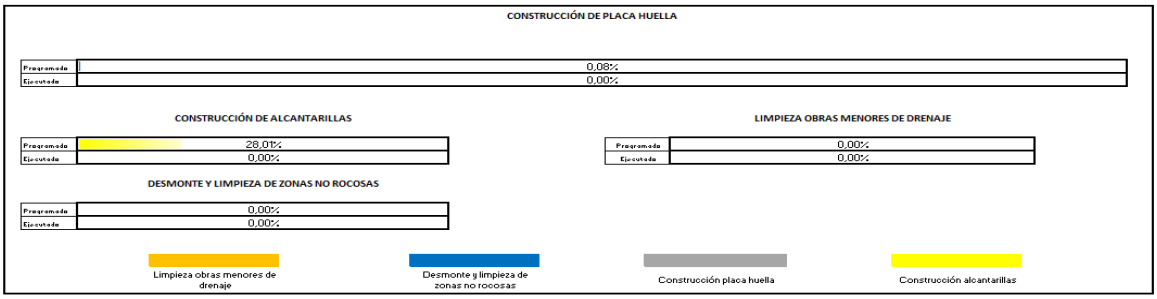

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inspección estado de la vía



Inspección estado de la vía



Inspección de alcantarilla



Visita de reconocimiento



Visita de reconocimiento



Inspección de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 100 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0			INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ			INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONTRATO No.	3819 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.712.332,00	CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.712.332,00	PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024						
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024						
DIAS DE SUSPENSION 2	43						
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024						
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024						
PRORROGA 1	5/06/2024						

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.712.332,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.712.332,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 196.712.332,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.098.998,00	11,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.098.998,00)	-11,74%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.848.998,00	13,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (25.911.498,00)	-13,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 13,65% — Avance o Atraso Físico % -13,17%
Meta Física Ejecutada % 0,48%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -		$ -		$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -		$ -		$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	100,00	$ 87.869.001	2023	2024	Prog	$ 70.940,00		$ -		$ -	$ 70.940,00	0,04%	0,08%
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	$ 58.937.089	2023	2024	Prog	$ 23.028.058,00		$ -		$ -	$ 23.028.058,00	11,71%	39,07%
						Ejec	$ -		$ -		$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

Programado	0,08%
Ejecutado	0,00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Programado	39,07%
Ejecutado	0,00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

Limpieza obras menores de drenaje | Desmonte y limpieza de zonas no rocosas | Construcción placa huella | Construcción alcantarillas

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondera mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 3 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 100 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0				
INTEGRANTES:	CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ				
CONTRATO No.	3819 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.712.232,00		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.712.232,00		
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -		
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024				
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024				
DIAS DE SUSPENSION 2	43				
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024				
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024				
PRORROGA 1	5/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.712.232,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.712.232,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 196.712.232,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.170.020,00	19,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (38.170.020,00)	-19,40%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.920.020,00	21,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (40.832.520,00)	-20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 21,31% — Avance o Atraso Físico % -20,76%
Meta Física Ejecutada % 0,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector n (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	100,00	$ 87.869.001	2023	2024	Prog	$ 8.110.508,60		$ -	$ -	$ -	$ 8.110.508,60	4,12%	9,23%
						Ejec	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	3,00	$ 58.937.089	2023	2024	Prog	$ 30.059.511,40		$ -	$ -	$ -	$ 30.059.511,40	15,28%	51,00%
						Ejec	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	.....	NO	-
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
EMISIONES EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A .....

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vias Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

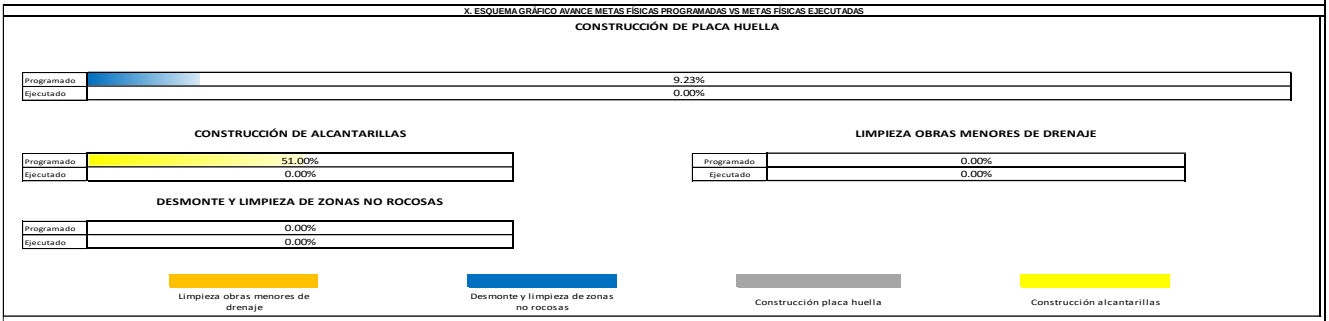

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN

CONTRATO No.	4507-2023	VALOR INICIAL:	$ 198,631,123.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,631,123.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,631,123.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,631,123.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,670,534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0.06%

Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (fi)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (fi)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128.00	$ 108,431,459	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	$ 40,179,330	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓCONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Ei OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

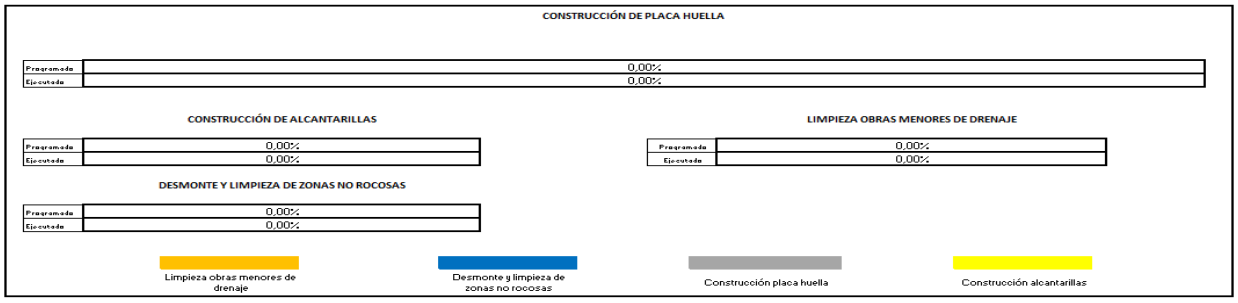

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN

CONTRATO No.	4507-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.631.123,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.631.123,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.631.123,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.631.123,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,06%
Meta Física Ejecutada %: 0,06%
Avance o Atraso Físico %: 0,06%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128,00	$ 108.431.459	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 40.179.330	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ-CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ-OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN-VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos específicamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

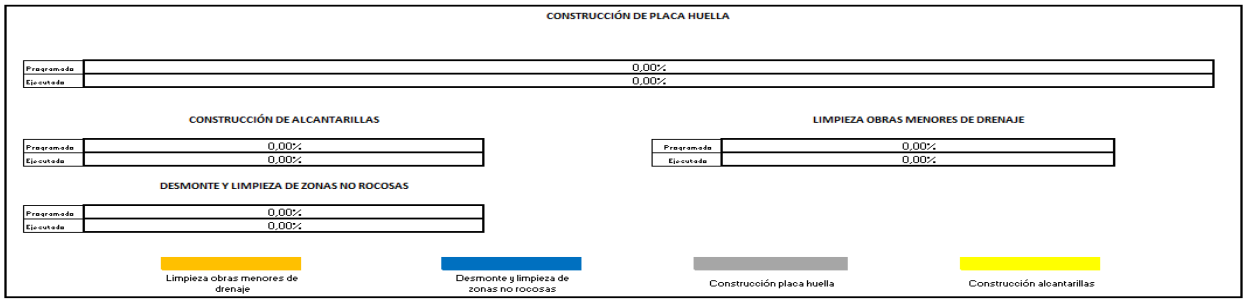

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN

CONTRATO No.	4507-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.631.123,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.631.123,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.631.123,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.631.123,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.094.088,00	7,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.094.088,00)	-7,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.094.088,00	7,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (10.344.088,00)	-6,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,41%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -6,91%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128,00	$ 108.431.459	2023	2024	Prog	$ 90.892,00	$ -	$ -	$ -		$ 90.892,00	0,06%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 40.179.330	2023	2024	Prog	$ 11.003.196,00	$ -	$ -	$ -		$ 11.003.196,00	7,35%	27,39%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (E: OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

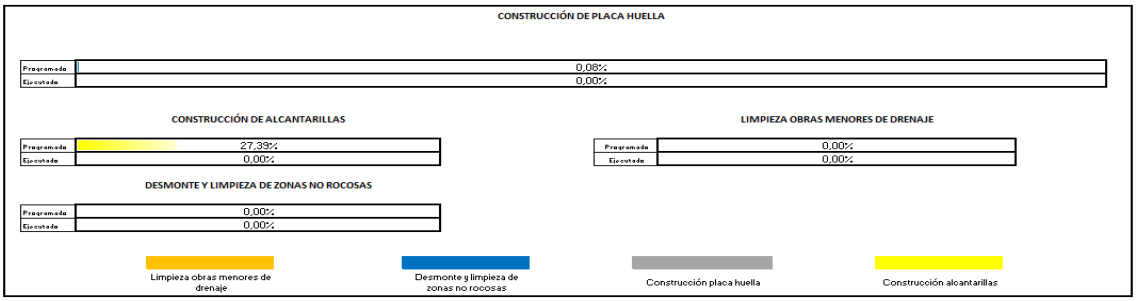

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 128 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN

CONTRATO No.	4507-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.631.123,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.631.123,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.631.123,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.631.123,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.631.123,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.371.757,00	8,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16.371.757,00)	-8,24%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.121.757,00	10,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (19.184.257,00)	-9,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10,13%
Meta Física Ejecutada % 0,47%
Avance o Atraso Físico % -9,66%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128,00	$ 108.431.459	2023	2024	Prog	$ 90.892,00	$ -	$ -	$ -		$ 90.892,00	0,05%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 40.179.330	2023	2024	Prog	$ 11.003.196,00	$ -	$ -	$ -		$ 16.280.865,00	8,20%	40,52%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

Programado	0,08%
Ejecutado	0,00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Programado	40,52%
Ejecutado	0,00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO ROCOSAS

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

Limpieza obras menores de drenaje | Desmonte y limpieza de zonas no rocosas | Construcción placa huella | Construcción alcantarillas

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 128 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

INTEGRANTES: LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN

CONTRATO No.	4507-2023	VALOR INICIAL:	$ 198.631.123,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198.631.123,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.631.123,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.631.123,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.631.123,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29.724.765,20	14,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.724.765,20)	14,96%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33.474.765,20	16,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (32.387.265,20)	16,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 16,85%
Meta Física Ejecutada % 0,55%
Avance o Atraso Físico % -16,31%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	128,00	$ 108.431.459	2023	2024	Prog	$ 8.760.862,60	$ -	$ -	$ -		$ 8.760.862,60	4,41%	8,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 40.179.330	2023	2024	Prog	$ 20.963.902,60	$ -	$ -	$ -		$ 20.963.902,60	10,55%	52,18%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

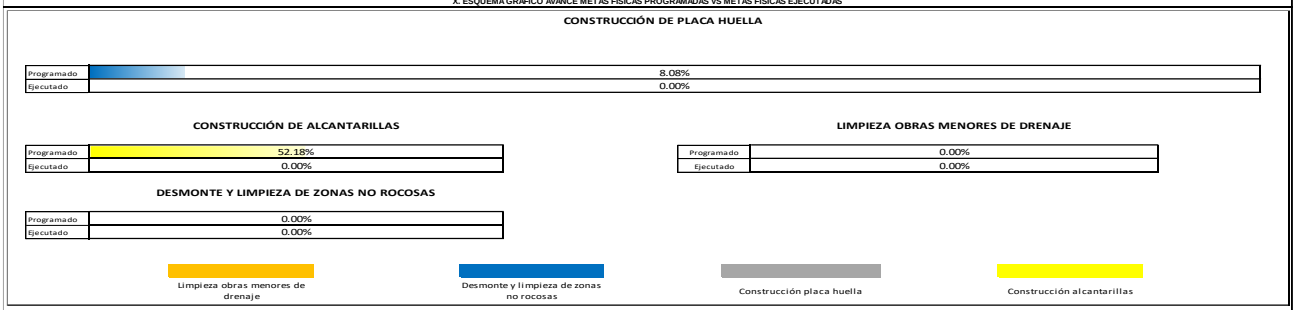

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

INTEGRANTES: ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS

CONTRATO No.	4678-2023	VALOR INICIAL:	$ 199,739,662.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,739,662.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,739,662.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,739,662.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,670,534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0.06%

Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	120.00	$ 110,378,243	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	$ 39,304,031	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -				
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -				

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Rutiadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspasor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AUCENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECH APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	.....
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	.....

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
Visita de reconocimiento		
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338703 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

INTEGRANTES: ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS

CONTRATO No.	4678-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.739.662,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.739.662,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.739.662,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.739.662,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0,06%
Avance o Atraso Físico % 0,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	120,00	$ 110.378.243	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 39.304.031	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Ei OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
Visita de reconocimiento		
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

INTEGRANTES: ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS

CONTRATO No.	4678-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.739.662,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.739.662,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.739.662,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.739.662,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.089.654,00	7,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.089.654,00)	-7,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.089.654,00	7,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (10.339.654,00)	-6,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,41%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -6,91%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	120,00	$ 110.378.243	2023	2024	Prog	$ 86.458,00	$ -	$ -	$ -		$ 86.458,00	0,06%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 39.304.031	2023	2024	Prog	$ 11.003.196,00	$ -	$ -	$ -		$ 11.003.196,00	7,35%	28,00%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (E: OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

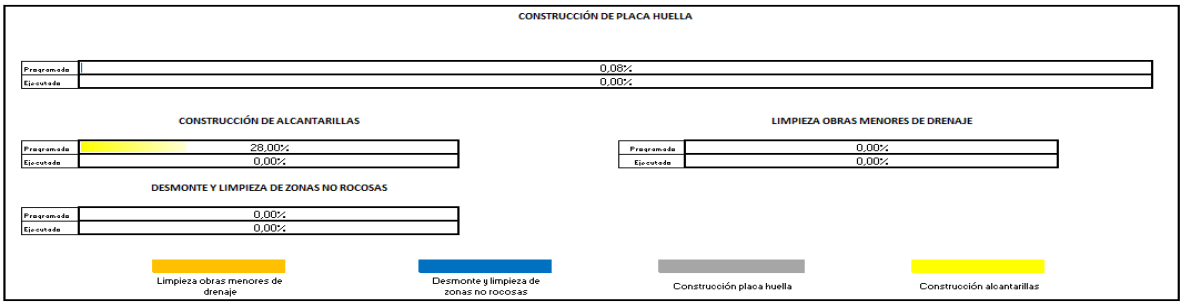

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
Visita de reconocimiento		
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 120 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

INTEGRANTES: ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS

CONTRATO No.	4678-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.739.662,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.739.662,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.739.662,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.739.662,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.739.662,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 15.492.024,00	7,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15.492.024,00)	-7,76%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.242.024,00	9,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18.304.524,00)	-9,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 9,63%
Meta Física Ejecutada % 0,47%
Avance o Atraso Físico % -9,16%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	120,00	$ 110.378.243	2023	2024	Prog	$ 86.458,00	$ -	$ -	$ -		$ 86.458,00	0,04%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 39.304.031	2023	2024	Prog	$ 11.003.196,00	$ -	$ -	$ -		$ 15.405.566,00	7,71%	39,20%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes via WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

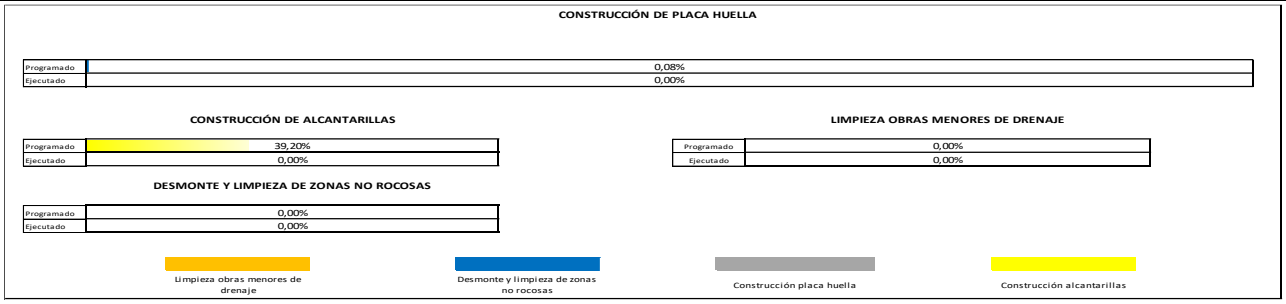

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 120 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

INTEGRANTES: ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS

CONTRATO No.	4678-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.739.662,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.739.662,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	59	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	26/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	43		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.739.662,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.739.662,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.739.662,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 30.851.419,00	15,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (30.851.419,00)	-15,45%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,54%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.601.419,00	17,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (33.513.919,00)	-16,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 17,32%
Meta Física Ejecutada % 0,54%
Avance o Atraso Físico % -16,78%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	120,00	$ 110.378.243	2023	2024	Prog	$ 10.762.815,40	$ -	$ -	$ -		$ 10.762.815,40	5,39%	9,75%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 39.304.031	2023	2024	Prog	$ 20.088.603,60	$ -	$ -	$ -		$ 20.088.603,60	10,06%	51,11%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI	NO	-
	-	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (E:OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.
El día 30 de julio de 2024 se realizó una reunión con el presidente de la junta, la contadora y la ingeniera residente en la cual la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S le pidió celeridad a la junta con la conformación de la veeduría, además se aclararon dudas e inquietudes con respecto a los comités operativos y los comités técnicos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

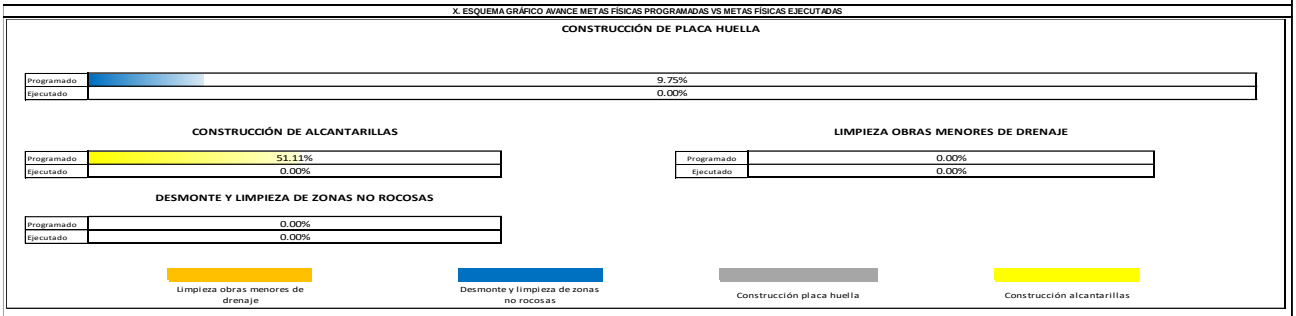

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

INTEGRANTES: HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA

CONTRATO No.	4504 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,759,372.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,759,372.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	70		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	26/05/2024		
PRORROGA 1	5/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,759,372.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,759,372.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149,670,534.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0.06%

Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155.00	$ 127,793,473	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	$ 20,687,900	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A .....

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ..... N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ..... N/A
AVALÚOS APROBADOS: ..... N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: ..... N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

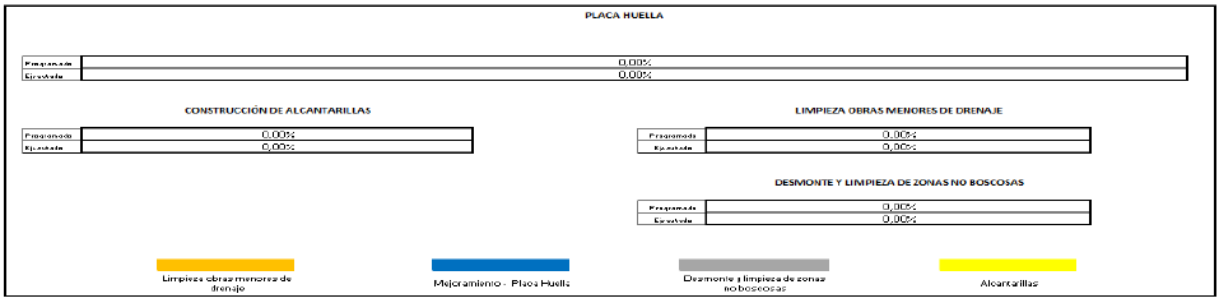

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Foto 1: Visita de reconocimiento

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

INTEGRANTES: HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA

CONTRATO No.	4504 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.759.372,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.759.372,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	70		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	5/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.759.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.759.372,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,06%
Meta Física Ejecutada %: 0,06%
Avance o Atraso Físico %: 0,06%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155,00	$ 127.793.473	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.687.900	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

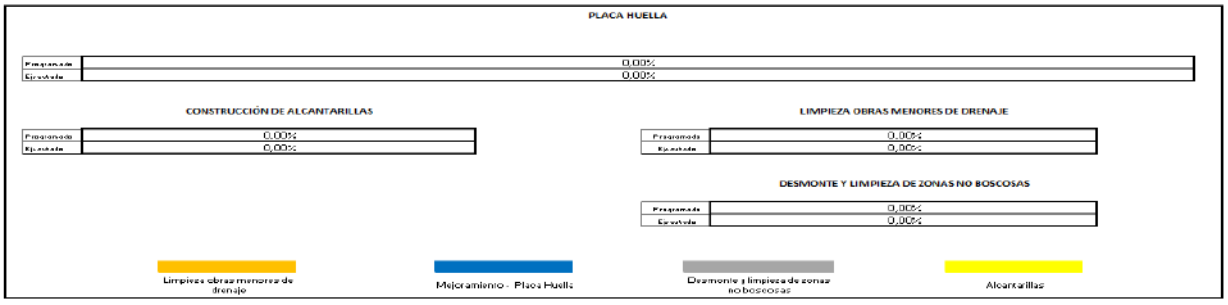

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Foto 1: Visita de reconocimiento

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

INTEGRANTES: HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA

CONTRATO No.	4504 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.759.372,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.759.372,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	70		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	5/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.759.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.759.372,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 149.670.534,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.611.513,00	3,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.611.513,00)	-3,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.611.513,00	3,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.861.513,00)	-3,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,75%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -3,25%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155,00	$ 127.793.473	2023	2024	Prog	$ 108.627,00	$ -	$ -	$ -		$ 108.627,00	0,07%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.687.900	2023	2024	Prog	$ 5.502.886,00	$ -	$ -	$ -		$ 5.502.886,00	3,68%	26,60%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES. El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

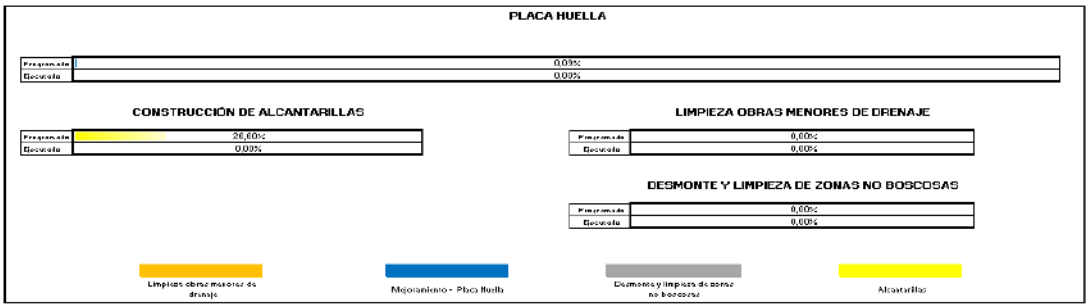

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
Foto 1: Visita de reconocimiento		
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

INTEGRANTES: HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA

CONTRATO No.	4504 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.759.372,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.759.372,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	70		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	5/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.759.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.759.372,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.759.372,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.785.961,00	4,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.785.961,00)	-4,42%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.535.961,00	6,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.598.461,00)	-5,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,31% — Avance o Atraso Físico % -5,84%
Meta Física Ejecutada % 0,47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155,00	$ 127.793.473	2023	2024	Prog	$ 108.627,00	$ -	$ -	$ -		$ 108.627,00	0,05%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.687.900	2023	2024	Prog	$ 5.502.886,00	$ -	$ -	$ -		$ 8.677.334,00	4,37%	41,94%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES. El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

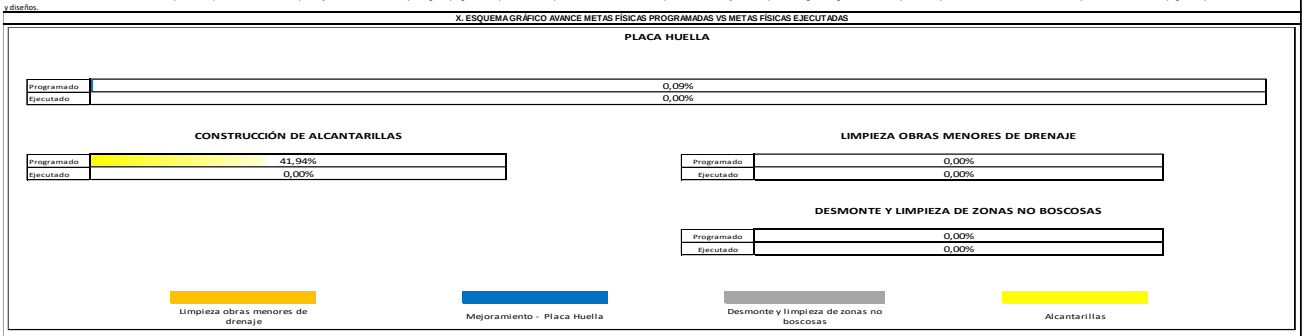

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
Foto 1: Visita de reconocimiento		
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

INTEGRANTES: HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA

CONTRATO No.	4504 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.759.372,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.759.372,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	70		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	5/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.759.372,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.759.372,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.759.372,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.915.533,60	10,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.915.533,60)	-10,47%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,54%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.665.533,60	12,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (23.578.033,60)	-11,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12,35%
Meta Física Ejecutada % 0,54%
Avance o Atraso Físico % -11,80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155,00	$ 127.793.473	2023	2024	Prog	$ 9.889.783,80	$ -	$ -	$ -		$ 9.889.783,80	4,95%	7,74%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.687.900	2023	2024	Prog	$ 11.025.749,80	$ -	$ -	$ -		$ 11.025.749,80	5,52%	53,30%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación.

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES. El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

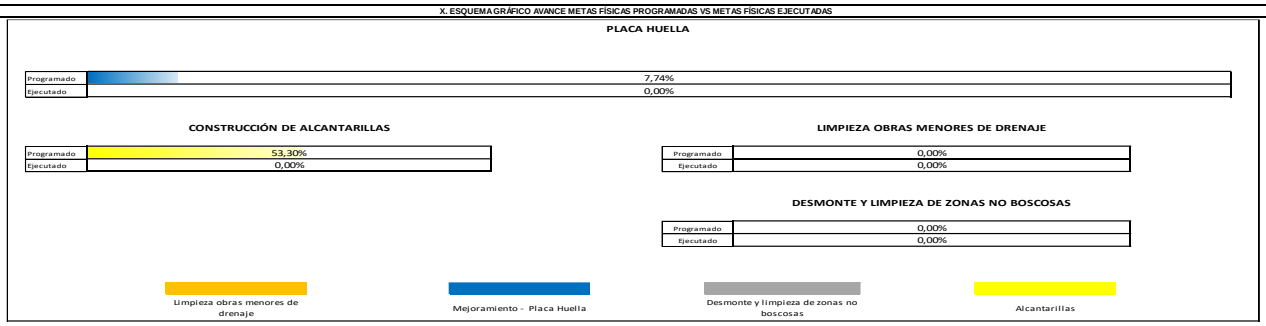

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

Foto 1: Visita de reconocimiento

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

INTEGRANTES: IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA

CONTRATO No.	4000 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,743,783.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200,743,783.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,743,783.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,743,783.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150,622,576.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 0.05%

Avance o Atraso Físico % 0.05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152.00	$ 129,021,498	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	$ 20,665,924	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Ciralla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....
UBICACIÓN: -	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A .....
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
EMISIONES EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A .....

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

INTEGRANTES: IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA

CONTRATO No.	4000 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.743.783,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.743.783,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.743.783,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.743.783,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.622.576,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367,418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913,169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913,169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,05%
Meta Física Ejecutada %: 0,05%
Avance o Atraso Físico %: 0,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152,00	$ 129.021.498	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.665.924	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos específicamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

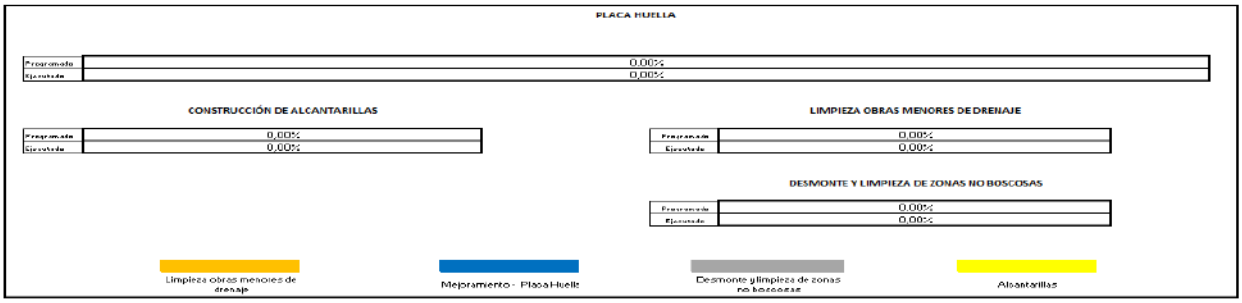

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

INTEGRANTES: IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA

CONTRATO No.	4000 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.743.783,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.743.783,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.743.783,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.743.783,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.622.576,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.611.513,00	3,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.611.513,00)	-3,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.611.513,00	3,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.861.513,00)	-3,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,73%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -3,23%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base: Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152,00	$ 129.021.498	2023	2024	Prog	$ 108.627,00	$ -	$ -	$ 108.627,00	0,07%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.665.924	2023	2024	Prog	$ 5.502.886,00	$ -	$ -	$ 5.502.886,00	3,65%	26,63%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (E:OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

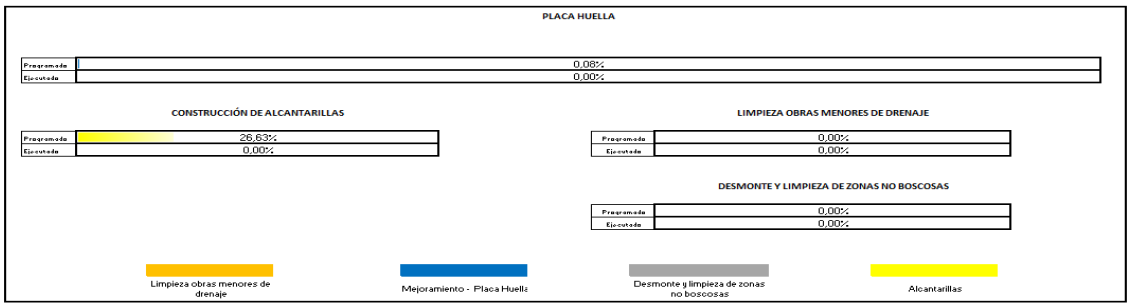

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

INTEGRANTES: IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA

CONTRATO No.	4000 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.743.783,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.743.783,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.743.783,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.743.783,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.743.783,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.763.985,00	4,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.763.985,00)	-4,39%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.513.985,00	6,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.576.485,00)	-5,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,27% — Avance o Atraso Físico % -5,80%
Meta Física Ejecutada % 0,47%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base: Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152,00	$ 129.021.498	2023	2024	Prog	$ 108.627,00	$ -	$ -	$ 108.627,00	0,05%	0,08%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.665.924	2023	2024	Prog	$ 5.502.886,00	$ -	$ -	$ 8.655.358,00	4,33%	41,88%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI -	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAPROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA

Programado	0,08%
Ejecutado	0,00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Programado	41,88%
Ejecutado	0,00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

Limpieza obras menores de drenaje | Mejoramiento - Placa Huella | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | Alcantarillas

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 152 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

INTEGRANTES: IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA

CONTRATO No.	4000 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.743.783,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.743.783,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	42	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	9/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	59		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.743.783,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.743.783,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.743.783,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.191.016,60	10,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.191.016,60)	10,56%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,54%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.941.016,60	12,42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (23.853.516,60)	11,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12,42% — Avance o Atraso Físico % -11,88%
Meta Física Ejecutada % 0,54%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ———	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base: Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	152,00	$ 129.021.498	2023	2024	Prog	$ 10.187.242,80	$ -	$ -	$ 10.187.242,80	5,07%	7,90%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 20.665.924	2023	2024	Prog	$ 11.003.773,80	$ -	$ -	$ 11.003.773,80	5,48%	53,25%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAPROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación.

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vias Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

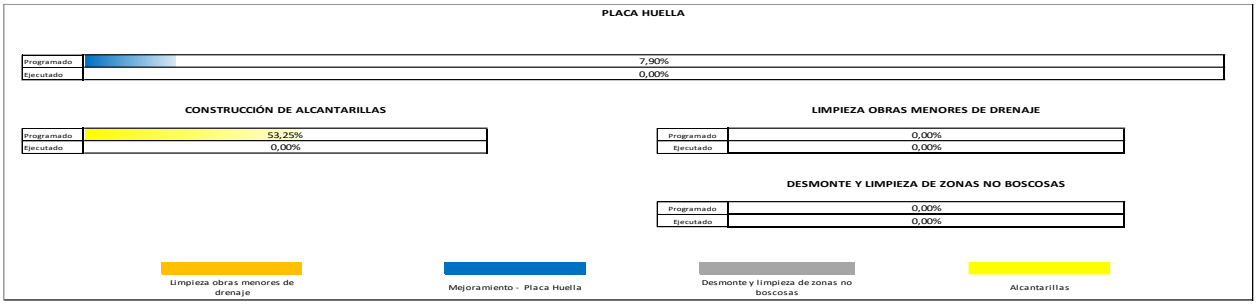

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.15. Vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36´ de diámetro, la construcción de 113 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1

INTEGRANTES: OMAR MORENO

CONTRATO No.	4454 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,258,472.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,258,472.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,258,472.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,258,472.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150,153,222.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.05%
Meta Física Ejecutada % 0.05%
Avance o Atraso Físico % 0.05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	113.00	$ 91,146,852	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2.00	$ 40,091,427	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION	un	1.00	$ 17,979,435	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓCONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

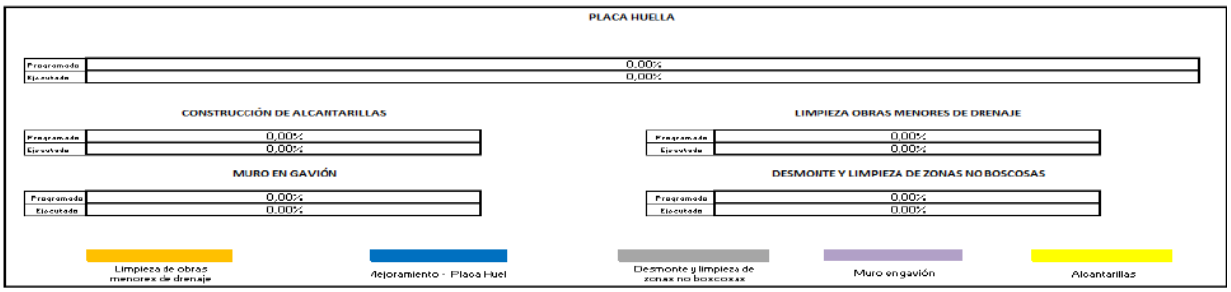

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36¨ de diámetro, la construcción de 113 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1			INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	OMAR MORENO			INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONTRATO No.	4454 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.258.472,00	CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.258.472,00	PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024						
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024						
DIAS DE SUSPENSION 2	69						
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024						
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024						
PRORROGA 1	6/06/2024						

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.258.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.258.472,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.153.222,00 *	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 82.545,97	1,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % —
Meta Física Ejecutada % 0,05%
Avance o Atraso Físico % 0,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	113,00	$ 91.146.852	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 40.091.427	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION	un	1,00	$ 17.979.435	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos específicamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

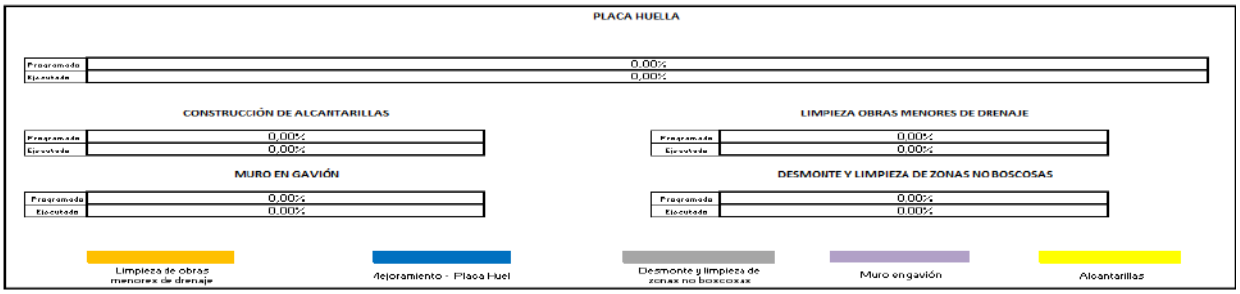

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36¨ de diámetro, la construcción de 113 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1

INTEGRANTES: OMAR MORENO

CONTRATO No.	4454 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.258.472,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.258.472,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	29/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	29/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.258.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.258.472,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.153.222,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.083.004,00	7,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.083.004,00)	-7,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.083.004,00	7,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (10.333.004,00)	-6,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,38%
Meta Física Ejecutada % 0,50%
Avance o Atraso Físico % -6,88%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	113,00	$ 91.146.852	2023	2024	Prog	$ 79.808,00	$ -	$ -	$ 79.808,00	0,05%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 40.091.427	2023	2024	Prog	$ 11.003.196,00	$ -	$ -	$ 11.003.196,00	7,33%	27,45%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION	un	1,00	$ 17.979.435	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE: ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

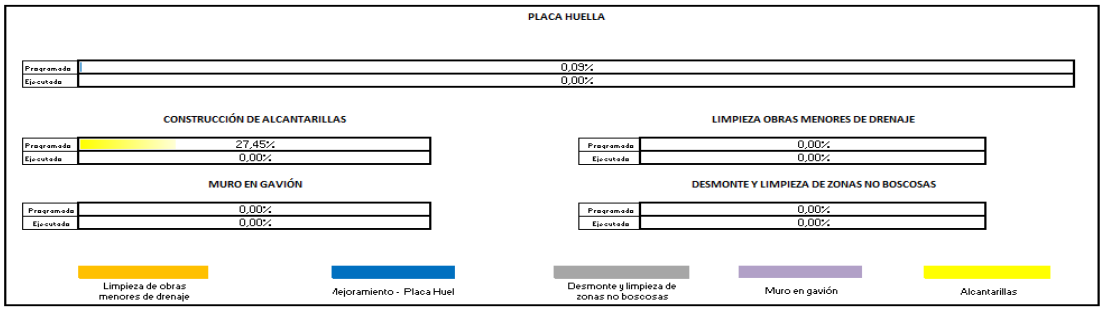

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36¨ de diámetro, la construcción de 113 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1		
INTEGRANTES:	OMAR MORENO		
CONTRATO No.	4454 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.258.472,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.258.472,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.258.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.258.472,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.258.472,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.433.380,00	13,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (27.433.380,00)	-13,77%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.183.380,00	15,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (30.245.880,00)	-15,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 15,65%
Meta Física Ejecutada % 0,47%
Avance o Atraso Físico % -15,18%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	113,00	$ 91.146.852	2023	2024	Prog	$ 11.216.690,00	$ -	$ -	$ 11.216.690,00	5,63%	12,31%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 40.091.427	2023	2024	Prog	$ 16.216.690,00	$ -	$ -	$ 16.216.690,00	8,14%	40,45%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION	un	1,00	$ 17.979.435	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

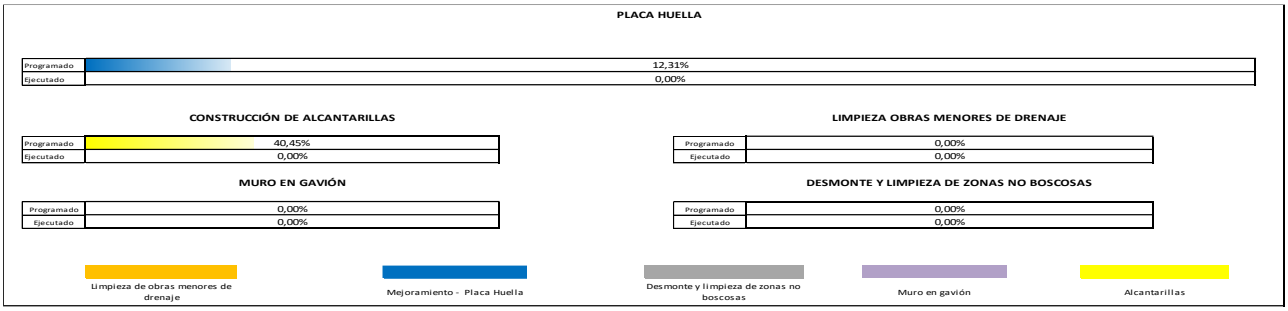

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondrá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro para dar manejo a las aguas lluvias, la construcción de 113 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml, un muro en gavión de 4 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1		
INTEGRANTES:	OMAR MORENO		
CONTRATO No.	4454 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.258.472,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.258.472,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.258.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.258.472,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.258.472,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 48.078.869,60	24,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (48.078.869,60)	-24,01%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,54%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 51.828.869,60	25,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (50.741.369,60)	-25,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,88%
Meta Física Ejecutada % 0,54%
Avance o Atraso Físico % -25,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	113,00	$ 91.146.852	2023	2024	Prog	$ 27.202.870,00	$ -	$ -	$ 27.202.870,00	13,58%	29,85%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	2,00	$ 40.091.427	2023	2024	Prog	$ 20.875.999,60	$ -	$ -	$ 20.875.999,60	10,42%	52,07%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION	un	1,00	$ 17.979.435	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación.

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vías Invías.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

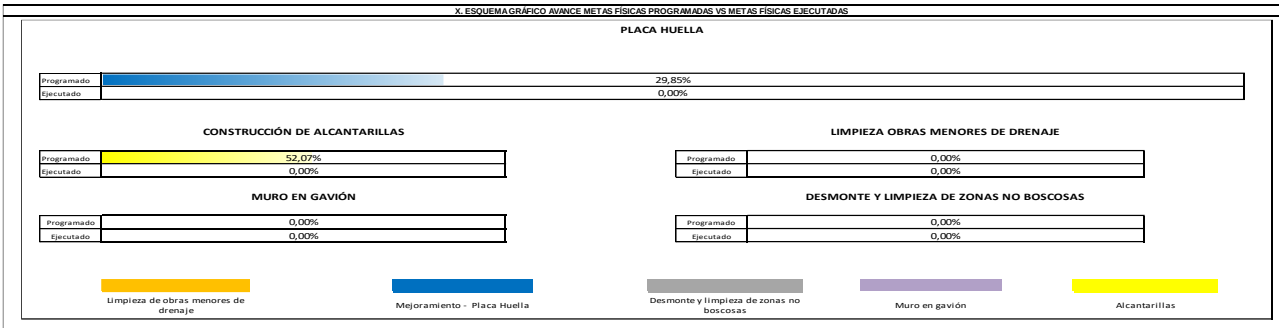

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

Semana 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6				
INTEGRANTES:	JHON FREDY RIOS VANEGAS				
CONTRATO No.	4469 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,250,666.00		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,250,666.00		
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -		
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024				
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024				
DIAS DE SUSPENSION 2	69				
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024				
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024				
PRORROGA 1	6/06/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,250,666.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,250,666.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150,145,673.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0.05%
Meta Física Ejecutada %: 0.05%
Avance o Atraso Físico %: 0.05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	$ 1,136,628	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155.00	$ 127,310,823	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	$ 21,519,247	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Ciralla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	.....	NO	.....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	.....	NO	.....
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	.....	NO	.....

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6

INTEGRANTES: JHON FREDY RIOS VANEGAS

CONTRATO No.	4469 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.250.666,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.250.666,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.250.666,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.250.666,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.145.673,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,05%
Meta Física Ejecutada % 0,05%
Avance o Atraso Físico % 0,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	$ 1.136.628	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155,00	$ 127.310.823	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.519.247	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	-
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE :ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECH-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ:CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ:OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN:VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos específicamente en ítems como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

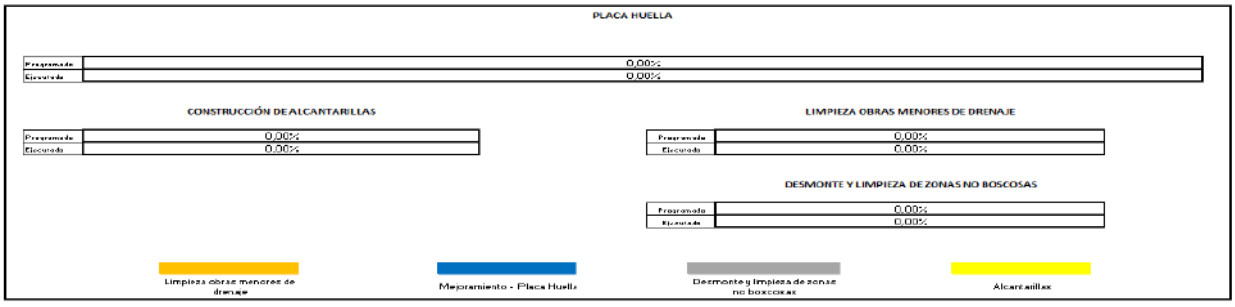

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, ríostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6

INTEGRANTES: JHON FREDY RIOS VANEGAS

CONTRATO No.	4469 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.250.666,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.250.666,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.250.666,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.250.666,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 150.145.673,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.611.513,00	3,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.611.513,00)	-3,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.611.513,00	3,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.861.513,00)	-3,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,74% — Avance o Atraso Físico % -3,24%
Meta Física Ejecutada % 0,50%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	$ 1.136.628	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155,00	$ 127.310.823	2023	2024	Prog	$ 108.627,00	$ -	$ -	$ -	$ 108.627,00	0,07%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.519.247	2023	2024	Prog	$ 5.502.886,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.502.886,00	3,67%	25,57%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI-APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

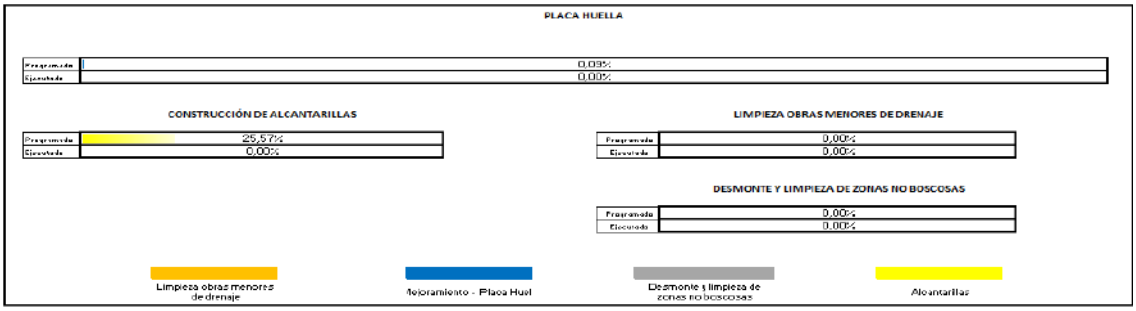

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6

INTEGRANTES: JHON FREDY RIOS VANEGAS

CONTRATO No.	4469 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.250.666,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.250.666,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.250.666,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.250.666,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.250.666,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.617.308,00	4,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.617.308,00)	-4,83%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.367.308,00	6,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.429.808,00)	-6,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,71%
Meta Física Ejecutada % 0,47%
Avance o Atraso Físico % -6,24%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base: Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	$ 1.136.628	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155,00	$ 127.310.823	2023	2024	Prog	$ 108.627,00	$ -	$ -	$ 108.627,00	0,05%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.519.247	2023	2024	Prog	$ 9.508.681,00	$ -	$ -	$ 9.508.681,00	4,77%	44,19%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA

Programado	0,09%
Ejecutado	0,00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Programado	44,19%
Ejecutado	0,00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

Limpieza obras menores de drenaje | Mejoramiento - Placa Huella | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | Alcantarillas

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36" de diámetro, la construcción de 155 ml de placa huella con un ancho de 4,5 ml y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6

INTEGRANTES: JHON FREDY RIOS VANEGAS

CONTRATO No.	4469 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.250.666,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.250.666,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.250.666,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.250.666,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.250.666,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.846.199,20	10,91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.846.199,20)	-10,91%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,54%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.596.199,20	12,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.508.699,20)	-12,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12,78% — Avance o Atraso Físico % -12,24%
Meta Física Ejecutada % 0,54%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	18	$ 1.136.628	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	155,00	$ 127.310.823	2023	2024	Prog	$ 9.989.102,40	$ -	$ -	$ 9.989.102,40	4,99%	7,85%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 21.519.247	2023	2024	Prog	$ 11.857.096,80	$ -	$ -	$ 11.857.096,80	5,92%	55,10%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONESEMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación.

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la Interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

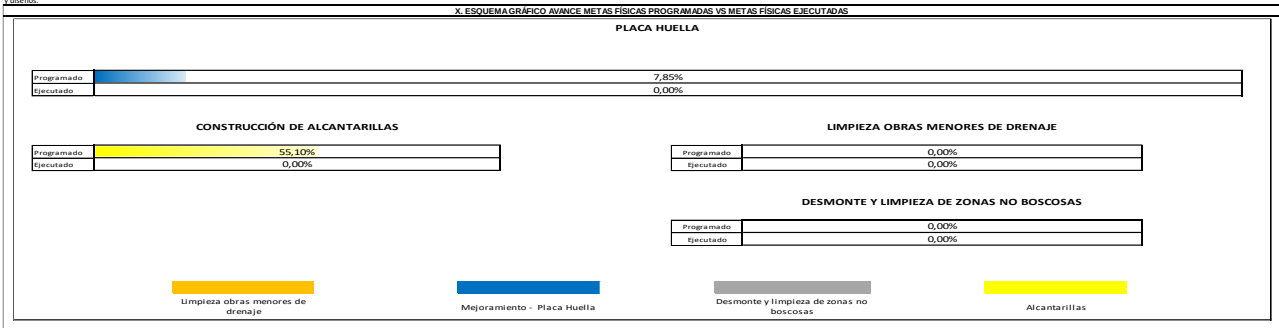

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondrá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.2.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

Semana 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 5 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36´ de diámetro, 2 Box Coulvert , la construcción de 30 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7

INTEGRANTES: ANGEL ANTONIO GUZMAN

CONTRATO No.	3247 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,430,649.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,430,649.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601,665,190.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601,665,190.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,430,649.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,430,649.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601,665,190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601,665,190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 148,433,858.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82,545.97	1.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,545.97	0.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82,545.97	0.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601,665,190	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,012,113	13.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,372,552	4.38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % —
Meta Física Ejecutada % 0.06%
Avance o Atraso Físico % 0.06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757,752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177,008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	30.00	$ 51,326,699	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1.00	$ 37,150,026	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT	un	2.00	$ 59,024,432	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
-	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECH APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (ESOTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En espera de remision por parte de la junta de acción comunal.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión virtual el 29 de junio de 2024 junto con los representantes de la junta de acción en la cual se informó y explicó sobre el desglose de los gastos administrativos, y a partir del martes 2 de julio de 2024 se programarán reuniones con cada una de las veredas en las cuales se discutirán ítems como lo son topografía y estudios y diseños. Además, se creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación más directo con los representantes de las veredas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal para su evaluación y posible aprobación de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.


La interventoría ING INGENIERÍA SAS entre los días 26, 27 y 28 de junio de 2024 se comunicó con los representantes de las juntas de acción comunal para agendar una reunión virtual la cual se realizó el día 29 de junio de 2024, esta reunión tenía el fin de informar y explicar el desglose del presupuesto, haciendo énfasis en cada uno de los ítems de los costos administrativos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra u plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS abrió un canal de comunicación directo (chat grupal de WhatsApp) con los representantes de las juntas de acción comunal para atender preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener en relación con la ejecución del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 6 del 4/07/2024 al 10/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36¨ de diámetro, 2 Box Coulvert , la construcción de 30 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7

INTEGRANTES: ANGEL ANTONIO GUZMAN

CONTRATO No.	3247 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.430.649,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.430.649,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.430.649,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.430.649,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 148.433.858,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 82.545,97	1,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.545,97	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.545,97	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.367.418	25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico % 0,06%
Meta Física Ejecutada % 0,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	30,00	$ 51.326.699	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 37.150.026	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT	un	2,00	$ 59.024.432	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas en las cuales se tratarán temas del presupuesto del rubro de gastos administrativos especificamente en items como lo son topografía y estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas de los representantes de las juntas de acción comunal con el fin de responder preguntas, dudas e inquietudes con respecto al desarrollo contractual del proyecto.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programó una reunión con la parte social del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) el día 5 de julio de 2024, donde se dio información general sobre las socializaciones y formatos a diligenciar.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales se están en proceso de evaluación y a las cuales se dará respuesta de su posible aprobación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS seguirá evaluando y dará respuesta a los representantes de las juntas de acción comunal sobre si las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador fueron aprobados de acuerdo a los requisitos establecidos en el pliego de peticiones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará reuniones con cada una de las veredas para examinar temas ítems de los costos administrativos, entre los cuales están topografía y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

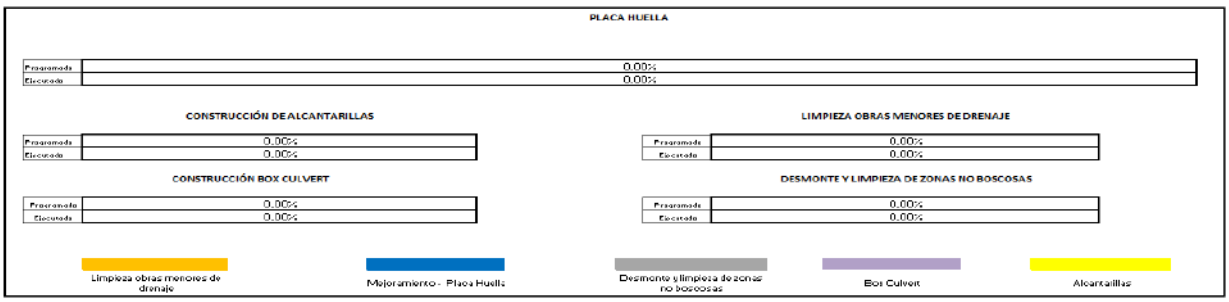

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra u plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se comunicará con los representantes de las juntas de acción comunal para informar si las hojas de vida de los profesionales fueron aprobadas o no y para examinar temas referentes a los costos administrativos, tales como topografía y estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo

NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL

Matrícula Profesional No. 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	17/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 7 del 11/07/2024 al 17/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36¨ de diámetro, 2 Box Coulvert , la construcción de 30 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7

INTEGRANTES: ANGEL ANTONIO GUZMAN

CONTRATO No.	3247 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.430.649,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.430.649,00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	29/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	29/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS

INTEGRANTES: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.430.649,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.430.649,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 148.433.858,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.568.644,00	6,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.568.644,00)	-6,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 750.000,00	9,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.568.644,00	6,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.000,00	0,51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8.818.644,00)	-5,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.280.586	33,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 6,45%
Meta Física Ejecutada % 0,51%
Avance o Atraso Físico % -5,94%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	30,00	$ 51.326.699	2023	2024	Prog	$ 44.338,00	$ -	$ -	$ 44.338,00	0,03%	0,09%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 37.150.026	2023	2024	Prog	$ 9.524.306,00	$ -	$ -	$ 9.524.306,00	6,42%	25,64%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT	un	2,00	$ 59.024.432	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	-	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECI APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con la parte social del Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024 para que se respondieran preguntas, sobre las socializaciones que se deben hacer con la junta de acción comunal una vez aprobadas las hojas de vida y sobre el desarrollo del cronograma de socializaciones.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS se reunió con Instituto Nacional de Vías de la Dirección Territorial Tolima el 10 de julio de 2024, en esta reunión se pidió celeridad a la interventoría para realizar el primer comité operativo de obra, donde se deberá comunicar a la junta de acción comunal sobre la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y contador) y la autorización para comenzar con las etapas levantamientos topográficos y de estudios y diseños.
La interventoría ING INGENIERÍA SAS continua con el proceso de revisión y evaluación de hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador remitidas por parte de la junta de acción comunal, las cuales será aprobadas o se les hará algunas observaciones y así subsanar, y así cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará una reunión con la junta de acción comunal donde se informará si se aprobaron las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y consecuentemente para dar autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

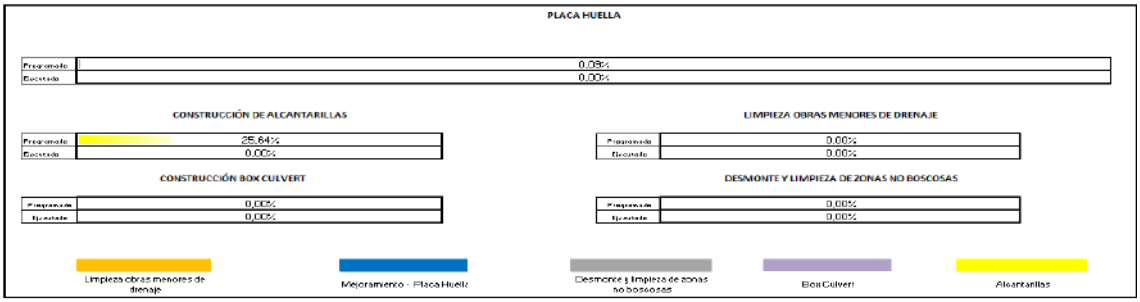

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo de obra para informar sobre: la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas, y la autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y respondera mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 8 del 18/07/2024 al 24/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 1 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36¨ de diámetro, 2 Box Coulvert , la construcción de 30 ml de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7		
INTEGRANTES:	ANGEL ANTONIO GUZMAN		
CONTRATO No.	3247 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 197.430.649,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197.430.649,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.430.649,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 197.430.649,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.430.649,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.208.725,00	10,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.208.725,00)	-10,74%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 937.500,00	0,47%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.958.725,00	12,64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 937.500,00	0,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.021.225,00)	-12,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha realizado entrega de la reprogramación de obra actualizada a la nueva fecha de terminación, es por ello que a la fecha se reporta un porcentaje del 100% correspondiente a la fecha de terminación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.193.755	40,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 12,64% — Avance o Atraso Físico % -12,17%
Meta Física Ejecutada % 0,47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	30,00	$ 51.326.699	2023	2024	Prog	$ 7.957.164,00	$ -	$ -	$ 7.957.164,00	4,03%	15,50%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 37.150.026	2023	2024	Prog	$ 13.251.561,00	$ -	$ -	$ 13.251.561,00	6,71%	35,67%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE BOX CULVERT	un	2,00	$ 59.024.432	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAPROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (EsOTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El área social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS acompañó a la junta de acción comunal en el proceso de radicación frente al Invías para la aprobación de la veeduría.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS aprobó las hojas de vida remitidas por parte de la junta de acción comunal para los cargos de ingeniero residente y contador, además esto se les comunicó a al presidente donde también se pidió celeridad en el proceso ante la DIAN para el cambio de códigos y así pueden afiliar al personal contratado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA

Programado	15,50%
Ejecutado	0,00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Programado	35,67%
Ejecutado	0,00%

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

Programado	0,00%
Ejecutado	0,00%

Limpieza obras menores de drenaje | Mejoramiento - Placa Huella | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | Box Culvert | Alcantarillas

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA | SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Semana 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 9 del 25/07/2024 al 31/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance físico contractual inicial, corresponde a la construcción de 2 alcantarilla en tubería de concreto reforzado de 36¨ de diámetro, 2 box-culvert , la construcción de 30 ml de placa huella con ancho de 5 m y actividades de mantenimiento periódico.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA: Compuesta por franjas de concreto reforzado, franjas de concreto ciclópeo o piedra pegada, berma cunetas en concreto reforzado, riostras o vigas transversales cada 3 metros de distancia, y una capa de material granular como soporte de la capa de rodadura. Los espesores de las capas de la estructura de placa huella serán aprobados luego de la revisión de los estudios y diseños.
ALCANTARILLAS: Sumidero subterráneo que permite la recolección de aguas lluvias, comprende su construcción con concreto y acero de refuerzo.
BOX COULVERT: Compuesto por concreto reforzado de sección rectangular y aletas y/o pocetas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7		
INTEGRANTES:	ANGEL ANTONIO GUZMAN		
CONTRATO No.	3247 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.430.649,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.430.649,00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
DIAS DE SUSPENSION 1	60	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024		
DIAS DE SUSPENSION 2	69		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024		
PRORROGA 1	6/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ING INGENIERÍA SAS		
INTEGRANTES:	ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1		
CONVENIO No.	1704 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 601.665.190,00
FECHA DE INICIO:	28/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 601.665.190,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.430.649,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.430.649,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 601.665.190			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 601.665.190			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.430.649,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 34.565.260,20	17,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (34.565.260,20)	-17,42%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.750.000,00	1,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.087.500,00	0,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.315.260,20	19,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.087.500,00	0,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (37.227.760,20)	-18,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.665.190	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 291.106.923	48,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.913.169	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $		N.A.
Amortizado $		N.A.
Saldo $		N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 19,31%
Meta Física Ejecutada % 0,55%
Avance o Atraso Físico % -18,76%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Valor	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	Tramo y/o sector (n)	Total	% Contrato	% Obra
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	ml	12	$ 757.752	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	1	$ 177.008	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	30,00	$ 51.326.699	2023	2024	Prog	$ 16.630.661,60	$ -	$ -	$ 16.630.661,60	8,38%	32,40%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	un	1,00	$ 37.150.026	2023	2024	Prog	$ 17.934.598,60	$ -	$ -	$ 17.934.598,60	9,04%	48,28%
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		
CONSTRUCCION DE BOX CULVERT	un	2,00	$ 59.024.432	2023	2024	Prog	$ -	$ -	$ -	$ -		
						Ejec	$ -	$ -	$ -	$ -		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual		-
Mezcladora de concreto 1 bulto		-
Cizalla manual		-
Carrotanque de agua		-
Vibrocompactador		-
Motoniveladora		-
Ruteadora		-
Compresor		-
Camioneta		-
Retroexcavadora sobre llantas		-
Vibrador de concreto		-
Aspesor manual		-
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Observaciones:

TRAMO Y/O SECTOR 1:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	-	NO	-
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las Juntas de Acción Comunal se encuentran en trámites de la documentación de las canteras.

PERMISOSPERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA ALICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAPROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓ CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓ OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIEN VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Es OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio no se requiere de permisos ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En observación.

OBSERVACIONES: El profesional ambiental de la interventoría está revisando si es necesario o no la implementación del PAGA de acuerdo a la complejidad del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA		INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -

OBSERVACIONES:
El componente social de la interventoría ING INGENIERÍA SAS ha realizado el diligenciamiento de documentación con respecto al área social requerido por el Instituto Nacional de Vias Invias.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales, ya que el proyecto se desarrollará sobre la calzada existente.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo al alcance del proyecto a ejecutar, este componente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atendió llamadas y respondió mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS estará a la espera de la aprobación de la veeduría para la junta de acción comunal y enseguida programará el primer comité operativo donde se informará la aprobación de las hojas de vida para los cargos de ingeniero residente y contador, y dará autorización al comienzo de las etapas de levantamientos topográficos y estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

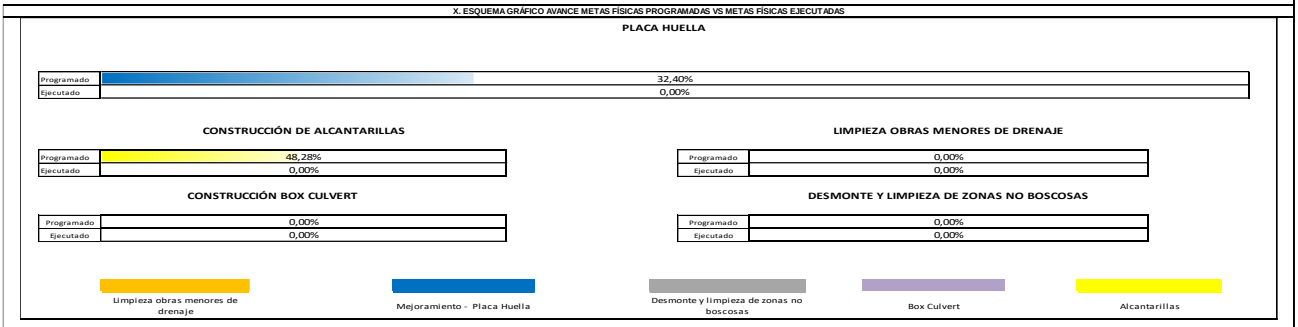

Observación: Una vez aprobados los diseños, el programa de obra y plan de inversión se realizarán los ajustes pertinentes al gráfico.

OBSERVACIÓN:

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA
SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA	SE DEBE COLOCAR LA ABSCISA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría ING INGENIERÍA SAS una vez aprobada la veeduría, programará de manera virtual con las juntas de acción comunal el primer comité operativo para informar a la junta sobre la aprobación de hojas de vida del ingeniero residente y del contador remitidas y así continuar con el proceso contractual del convenio, en este comité también se daría autorización para continuar con la fase de levantamiento topográfico y de estudios y diseños.

La interventoría ING INGENIERÍA SAS atenderá llamadas y responderá mensajes vía WhatsApp de los representantes de las juntas de acción comunal para responder preguntas, dudas e inquietudes que estos tuvieran con respecto al desarrollo del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alejandro Galindo
NOMBRE: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.3. SEGUIMIENTO GARANTÍAS, CONVENIOS Y PÓLIZAS

10.3.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4001 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNTARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199,698,099.00
VALOR ACUMULADO: $ 199,698,099.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 39,939,619.80	19	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,984,904.95	19	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,909,429.70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027912
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	19	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006491 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: fHRRuPFyaHJDxwB+1zDWRw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-D001

No. PÓLIZA	I-100027912	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18095455	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	No. DOC. IDENTIDAD	900.383.062-4
DIRECCIÓN	VDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	TELÉFONO	3102289816
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4001 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS
GUAYABOS, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 900.383.062-4 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.939.619,80	144.767,44
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.984.904,95	111.926,68
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.909.429,70	1.049.563,97
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.833.954,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.306.258,09
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.306.258,09
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	249.671,04
TOTAL A PAGAR	$	1.563.729,13

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PPSA - APF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: +a6/Eps1HBU8VsWBd1zw8g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100006491	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18095452	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	No. DOC. IDENTIDAD	900.383.062-4
DIRECCIÓN	VDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	TELÉFONO	3102289016
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.383.062-4
DIRECCIÓN	VDA CRUCE DE LOS GUAYABOS	TELÉFONO	3102289016
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4001 DE 2023, CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	162.400,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	162.400,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	162.400,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	31.806,00
TOTAL A PAGAR	$	199.206,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

10.3.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4517 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,927,246.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,927,246.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento		$ 40,185,449.20	17 / 11 / 2023	31 / 10 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,046,362.30	17 / 11 / 2023	31 / 12 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,278,173.80	31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028290
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	17 / 11 / 2023	31 / 12 / 2023
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006615 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 1PVblEx3SHwSowZ4FZKSHg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100028290	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	1809480	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.141-9
DIRECCIÓN	VDA PARADERO II VIA ANTIGUA ESPINAL	TELÉFONO	3113629009
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B-60	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B-60	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4517 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA A JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIE, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. . 809.003.141-9 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.185.449,20	134.483,63
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.046.362,30	109.821,88
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.278.173,80	1.056.024,06
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.509.985,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.300.329,57
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.300.329,57
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	248.544,62
TOTAL A PAGAR	$	1.556.674,19

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ECath06AiuUGhIDqCIrBOQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100006615	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096479	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.141-9
DIRECCIÓN	VDA PARADERO II VIA ANTIGUA ESPINAL	TELÉFONO	3113629009
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.141-9
DIRECCIÓN	VDA PARADERO II VIA ANTIGUA ESPINAL	TELÉFONO	3113629009
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/LA JUNTA	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4517 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES,), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,60
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	97.885,53
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	97.885,53
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	19.548,25
TOTAL A PAGAR	$	122.433,78

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3963 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199,481,796.00
VALOR ACUMULADO: $ 199,481,796.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento		$ 39,896,359.20	17 / 11 / 2023	31 / 10 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,974,089.80	17 / 11 / 2023	31 / 12 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,844,538.80	31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028370
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	17 / 11 / 2023	31 / 12 / 2023
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006647 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: cToxDxTSjTGtjkLcTjOUhQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-D0BI

No. PÓLIZA	I-100028370	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	1809690	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.043-1
DIRECCIÓN	VDA LOMA DE LUISA JAGUALITO FCA LA ESPERANZA	TELÉFONO	3133847308
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3963 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 901.658.043-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.896.359,20	133.516,17
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.974.089,80	109.031,83
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.844.538,80	1.048.427,13
		TOTAL ASEGURADO	$ 189.714.987,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.298.975,13
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.298.975,13
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	246.767,27
TOTAL A PAGAR	$	1.545.542,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: GMhkBSu2JBDhYdBXANaerw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100086647	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096691	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.043-1
DIRECCIÓN	VDA LOMA DE LUISA JAGUALITO FCA LA ESPERANZA	TELÉFONO	3133847308
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO/INSTITUO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.658.043-1
DIRECCIÓN	VDA LOMA DE LUISA JAGUALITO FCA LA ESPERANZA	TELÉFONO	3133847308
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3963 DE 2023 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO,DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	97.884,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	97.884,93
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	19.548,14
TOTAL A PAGAR	$	122.433,07

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) | 8 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4395 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,201,281.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,201,281.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento		$ 40,040,256.20	15 / 11 / 2023	31 / 10 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,010,064.05	15 / 11 / 2023	31 / 12 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,060,384.30	31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028369
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	15 / 11 / 2023	31 / 12 / 2023
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006546 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: fFSaXjLJevB9fNJ/3uTRtg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100028369	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096682	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PO	No. DOC. IDENTIDAD	901.019.747-5
DIRECCIÓN	VDA CALLEJON DE GUADAS SECTOR SEC PORVENIR	TELÉFONO	3112794559
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4395 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 901.019.747-5

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.040.256,20	134.765,63
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.010.064,05	109.617,06
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.060.384,30	1.052.208,57
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.110.704,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.296.591,26
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.296.591,26
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	247.834,34
TOTAL A PAGAR	$	1.552.225,60

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: PinJ/TWCevcS/2HImnYprA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100086646	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096684	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PO	No. DOC. IDENTIDAD	901.019.747-5
DIRECCIÓN	VDA CALLEJON DE GUADAS SECTOR SEC PORVENIR	TELÉFONO	3112794559
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PO/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.019.747-5
DIRECCIÓN	VDA CALLEJON DE GUADAS SECTOR SEC PORVENIR	TELÉFONO	3112794559
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4395 DE 2023, CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 901116769-2 Y EL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	102.334,25
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	102.334,25
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	102.334,25
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	20.393,51
TOTAL A PAGAR	$	127.727,76

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4485 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,008,033.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,008,033.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,001,606.60	17	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,000,401.65	17	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,002,409.90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028371
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006648 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: URfuAX7+e1E1018KHV1PfQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-D001

No. PÓLIZA	I-100028371	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096692	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.101.999-8
DIRECCIÓN	VDA TOVAR ESCUELA SALON COMUNAL	TELÉFONO	3122542012
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4485 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑIA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOVAR, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.101.999-8 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 17/11/23 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.001.606,60	133.868,39
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.000.401,65	109.319,46
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.002.409,90	1.051.192,90
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.004.418,15	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.294.380,75
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.294.380,75
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	247.414,34
TOTAL A PAGAR	$	1.549.595,09

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zckOH4uGZ6rwsWlGgj1MRA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100006648	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096693	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.101.999-8
DIRECCIÓN	VDA TOVAR ESCUELA SALON COMUNAL	TELÉFONO	3122542012
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR/INSTITUO NACIONA DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.101.999-8
DIRECCIÓN	VDA TOVAR ESCUELA SALON COMUNAL	TELÉFONO	3122542012
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4485 DE 2023, CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (nombre del contratista), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	97.884,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	97.884,93
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	19.548,14
TOTAL A PAGAR	$	122.433,07

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

OBJETO DEL CONTRATO:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198,108,085.00
VALOR ACUMULADO: $ 198,108,085.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,821,617.00	2	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,955,404.25	2	12	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,732,425.50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028760
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	2	12	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006755 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zsffe2h6Q9PF41bJNczd/A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-D001

No. PÓLIZA	I-100028760	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18097713	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIM	No. DOC. IDENTIDAD	809.000.463-1
DIRECCIÓN	VDA LA LOMA DE COCORA FCA LA ESMERALDA	TELÉFONO	3125935525
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4756 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.000.463-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/12/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.821.617,00	127.538,27
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.955.404,25	187.395,63
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.732.425,50	1.046.463,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 189.509.446,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.281.396,90
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.281.396,90
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	244.947,41
TOTAL A PAGAR	$	1.534.144,31

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: cTKL97myxdYRPWV54oHBkg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100006755	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	1809710	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIM	No. DOC. IDENTIDAD	809.000.463-1
DIRECCIÓN	VDA LA LOMA DE COCORA FCA LA ESMERALDA	TELÉFONO	3125935525
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA /INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	809.000.463-1
DIRECCIÓN	VDA LA LOMA DE COCORA FCA LA ESMERALDA	TELÉFONO	3125935525
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4756 DE 2023, CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	64.515,07
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	64.515,07
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	64.515,07
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	13.207,86
TOTAL A PAGAR	$	82.722,93

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 28/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 195,828,659.00
VALOR ACUMULADO: $ 195,828,659.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,365,731.80	27	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,841,432.95	27	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,048,597.70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028366
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	27	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006644 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: LjUDQXnFPtx9VX1hFrCB3g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS28000000059-D0BI

No. PÓLIZA	I-100028366	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096673	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	No. DOC. IDENTIDAD	809.000.557-5
DIRECCIÓN	CL 17 6 20 BRR INTERLAKEN	TELÉFONO	3132357149
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 29-259 AV. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4662 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809005336-7 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.365.731,80	127.965,59
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.841.432,95	186.637,99
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.048.597,70	1.034.482,98
		TOTAL ASEGURADO	$ 188.255.762,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.269.086,48
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.269.086,48
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	242.608,43
TOTAL A PAGAR	$	1.519.494,91

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: HSGDPrekUb9XJU2C7H+pxA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100086644	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096675	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	No. DOC. IDENTIDAD	809.000.557-5
DIRECCIÓN	CL 17 6 20 BRR INTERLAKEN	TELÉFONO	3132357149
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	809.000.557-5
DIRECCIÓN	CL 17 6 20 BRR INTERLAKEN	TELÉFONO	3132357149
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DELCONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4662 DE 2023, CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	75.638,36
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	75.638,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	75.638,36
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	15.321,29
TOTAL A PAGAR	$	95.959,65

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4662-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.

OBJETO DEL CONTRATO:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198,826,145.00
VALOR ACUMULADO: $ 198,826,145.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,965,229.00	28	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,991,307.25	28	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,947,843.50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028398
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	28	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006651 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KfoWsonxHbRsysuspH1HTQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100028398	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	1096750	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.167.437-4
DIRECCIÓN	VDA LLANO DEL COMBEIMA FCA EL PARAISO	TELÉFONO	3208531378
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25G 73B-90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25G 73B-90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4686 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.167.437-4. TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.965.229,00	129.531,14
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.991.307,25	108.166,17
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.947.843,50	1.050.236,95
		TOTAL ASEGURADO	$ 189.904.379,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.287.934,26
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.287.934,26
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	246.189,51
TOTAL A PAGAR	$	1.541.923,77

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 3/nAe1s0133xwsy/hVbYPQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100086651	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	1896748	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.167.437-4
DIRECCIÓN	VDA LLANO DEL COMBEIMA FCA EL PARAISO	TELÉFONO	3208531378
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.167.437-4
DIRECCIÓN	VDA LLANO DEL COMBEIMA FCA EL PARAISO	TELÉFONO	3208531378
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4686 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ,DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	83.901,37
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	83.901,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	83.901,37
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.891,26
TOTAL A PAGAR	$	105.792,63

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4786-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198,145,372.00
VALOR ACUMULADO: $ 198,145,372.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,829,074.40	1	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,957,268.60	1	12	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,743,611.60	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028825
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	1	12	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006786 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma: Alejandro Galindo
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ZuIloKmooTF7FfEcoQwwOg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS28000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100028825	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18097896	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	No. DOC. IDENTIDAD	809.006.806-1
DIRECCIÓN	CASERIO DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	TELÉFONO	3025709238
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4786 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA., EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. . 809.006.806-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/12/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.829.074,40	127.944,08
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.957.268,60	187.511,22
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.743.611,60	1.046.658,97
		TOTAL ASEGURADO	$ 189.529.954,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.282.114,27
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.282.114,27
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	245.083,71
TOTAL A PAGAR	$	1.534.997,98

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: E2w8npstl1oT+6CmafyKQA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100006786	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18097895	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/12/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	No. DOC. IDENTIDAD	809.006.806-1
DIRECCIÓN	CASERIO DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	TELÉFONO	3025709238
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	809.006.806-1
DIRECCIÓN	CASERIO DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	TELÉFONO	3025709238
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4786 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	66.739,73
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	66.739,73
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	66.739,73
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	13.630,55
TOTAL A PAGAR	$	85.370,28

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3819 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 196,712,232.00
VALOR ACUMULADO: $ 196,712,232.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,542,466.40	12	10	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,885,616.60	12	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,313,699.60	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027261
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	12	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006287 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: kU9Nf6QQtJpwFPFMPcG1Fw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D0DI

No. PÓLIZA	I-100027261	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18093613	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DEPARTAMENTAL DE DA	No. DOC. IDENTIDAD	800.253.117-0
DIRECCIÓN	URB AMBALA IN 4 CA 88	TELÉFONO	3228183870
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DEPARTAMENTAL DE	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3819 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.253.117-0 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/10/2023	24:00 Horas Del 30/10/2024	39.542.466,40	145.602,94
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2026	9.885.616,60	185.694,85
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.313.699,60	979.748,57
		TOTAL ASEGURADO	$ 188.741.782,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.231.046,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.231.046,36
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	233.898,81
TOTAL A PAGAR	$	1.464.945,17

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 0AVzDzN53A6Sw22dbD+f5Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100006287	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18093612	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DEPARTAMENTAL DE DA	No. DOC. IDENTIDAD	800.253.117-0
DIRECCIÓN	URB AMBALA IN 4 CA 88	TELÉFONO	3228183070
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DEPARTAMENTAL DE DANTAS/ INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.253.117-0
DIRECCIÓN	URB AMBALA IN 4 CA 88	TELÉFONO	3228183070
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS /INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3819 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	152.547,95
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	152.547,95
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	152.547,95
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	29.934,11
TOTAL A PAGAR	$	187.482,06

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4507-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

OBJETO DEL CONTRATO:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 28/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198,631,123.00
VALOR ACUMULADO: $ 198,631,123.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,926,244.60	27	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,981,561.15	27	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,889,366.90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028317
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	27	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006624 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: G1TpZWsmP+T48hSS9G4Hqg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100028317	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096539	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA	No. DOC. IDENTIDAD	809.002.398-1
DIRECCIÓN	VDA LA ISABELA CRR 11	TELÉFONO	3166447286
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B-60	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B-60	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4507 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.002.390-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.926.244,60	129.787,64
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.981.561,15	108.156,37
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.889.366,90	1.049.212,48
		TOTAL ASEGURADO	$ 189.797.172,65	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.287.156,49
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.287.156,49
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	246.041,73
TOTAL A PAGAR	$	1.540.998,22

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 9fQSvvtdiufMQMrvlTlN2Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100006624	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096538	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA	No. DOC. IDENTIDAD	809.002.398-1
DIRECCIÓN	VDA LA ISABELA CRR 11	TELÉFONO	3166447286
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	809.002.398-1
DIRECCIÓN	VDA LA ISABELA CRR 11	TELÉFONO	3166447286
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4507 DE 2023 , CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	75.638,36
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	75.638,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	75.638,36
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	15.321,29
TOTAL A PAGAR	$	95.959,65

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4678-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

OBJETO DEL CONTRATO:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 28/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199,738,662.00
VALOR ACUMULADO: $ 199,738,662.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,147,932.40	24	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,036,983.10	24	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,221,898.60	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028424
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	24	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006667 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: LjymVF9SelynXYaa2RZbMw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2800000059-D001

No. PÓLIZA	I-100028424	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	1896819	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO	No. DOC. IDENTIDAD	809.005.809-9
DIRECCIÓN	VDA SAN ANTONIO FCA EL MIRADOR CORR SAN BERNARDO	TELÉFONO	3213109747
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NO.4678 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809005809-9 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.147.932,40	131.663,22
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.036.983,10	109.045,63
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.221.898,60	1.055.038,17
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.406.814,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.295.747,02
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.295.747,02
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	247.673,93
TOTAL A PAGAR	$	1.551.220,95

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: OIpIyIRxk7LBoTeAl04a+g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100086667	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	1896820	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO	No. DOC. IDENTIDAD	809.005.809-9
DIRECCIÓN	VDA SAN ANTONIO FCA EL MIRADOR CORR SAN BERNARDO	TELÉFONO	3213109747
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	809.005.809-9
DIRECCIÓN	VDA SAN ANTONIO FCA EL MIRADOR CORR SAN BERNARDO	TELÉFONO	3213109747
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NO.4678 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONA DE VIAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONA DE VIAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONA DE VIAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	82.312,33
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	82.312,33
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	82.312,33
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	16.589,34
TOTAL A PAGAR	$	103.901,67

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4504 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199,759,372.00
VALOR ACUMULADO: $ 199,759,372.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,951,874.40	23	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,987,968.60	23	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,927,811.60	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028402
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	23	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006654 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KIxqwotq37jEEJUtvBBMzg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS28000000059-D0BI

No. PÓLIZA	I-100028402	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096762	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA	No. DOC. IDENTIDAD	900.071.934-2
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR PALESTINA	TELÉFONO	3142269824
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807-2/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90 BOGOTA, DC	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4504 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 900.071.934-2 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.951.874,40	131.483,36
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.987.968,60	108.608,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.927.811,60	1.049.886,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.867.654,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.289.898,26
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.289.898,26
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	246.562,67
TOTAL A PAGAR	$	1.544.260,93

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Qq112qU1uyQNQ3UBC1/PTg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100086654	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096767	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA	No. DOC. IDENTIDAD	900.071.934-2
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR PALESTINA	TELÉFONO	3142269824
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.071.934-2
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA MEDIA SECTOR PALESTINA	TELÉFONO	3142269824
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4504 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	84.536,99
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	84.536,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	84.536,99
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	17.012,03
TOTAL A PAGAR	$	106.549,02

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

10.3.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4000 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 21/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,743,783.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,743,783.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,148,756.60	19	10	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,037,189.15	19	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,223,134.90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027355
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	19	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006317 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: dHDmEOa1+PuzASrzaoa17Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-DOBI

No. PÓLIZA	I-100027355	**No. ANEXO**	0	**No. CERTIFICADO**	18093852	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	25/10/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.001.783-8
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA ALTA	**TELÉFONO**	3124176606
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4000 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.001.783-8. TIENE LA CALIDAD DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2023	24:00 Horas Del 30/10/2024	40.148.756,60	145.140,51
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.037.189,15	112.512,77
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.223.134,90	1.055.059,82
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.409.080,65	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.312.713,10
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.312.713,10
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	250.897,49
TOTAL A PAGAR	$	1.571.410,59

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: vVaWuldbbG9TjXN0W/0Pbg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100006317	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18093842	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.783-8
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA ALTA	TELÉFONO	3124176606
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA/INSTITUTO NACIONA DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.783-8
DIRECCIÓN	VEREDA AGUILA ALTA	TELÉFONO	3124176606
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4000 DE 2023, CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	139.200,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	139.200,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	139.200,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	27.398,00
TOTAL A PAGAR	$	171.598,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.15. Vereda Santa Lucia, municipio de Santa Isabel

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4454 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,258,472.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,258,472.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,051,694.40	17	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,012,923.60	17	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,077,541.60	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028771
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	17	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006761 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KbAxAQoFn4P4CG9USHzMbg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-DOBI

No. PÓLIZA	I-100028771	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	1809748	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.641-1
DIRECCIÓN	VDA SANTA LUCIA	TELÉFONO	3186411694
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4454 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.003.641-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.051.694,40	134.036,01
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.012.923,60	109.456,34
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.077.541,60	1.052.509,15
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.142.159,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.296.001,50
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.296.001,50
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	247.722,29
TOTAL A PAGAR	$	1.551.523,79

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

HOJA No.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: l1q2W0AqwWQ9LLOOKv1igA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100006761	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18097754	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.641-1
DIRECCIÓN	VDA SANTA LUCIA	TELÉFONO	3186411694
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G 73 B 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4454 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A MITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	97.884,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	97.884,93
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	19.548,14
TOTAL A PAGAR	$	122.433,07

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCA - AFF

10.3.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4469 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,250,666.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,250,666.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,050,133.20	17	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,012,533.30	17	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,075,199.80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028342
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	17	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006636 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: iuonpIAB2PTifFGm4RBEDg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100028342	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096603	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.073-6
DIRECCIÓN	VDA COLON	TELÉFONO	3123227386
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B - 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO 73B - 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4469 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.003.073-6. TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.050.133,20	134.030,79
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.012.533,30	109.452,08
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.075.199,80	1.052.468,12
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.137.866,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.295.950,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.295.950,99
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	247.712,69
TOTAL A PAGAR	$	1.551.463,68

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: m/WK2GjVIBMBQlru7pzvfw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100086636	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18096684	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.073-6
DIRECCIÓN	VDA COLON	TELÉFONO	3123227386
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON/INSTITUTO NACIONA DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	809.003.073-6
DIRECCIÓN	VDA COLON	TELÉFONO	3123227386
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.818.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4469 DE 2023, CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (809.003.073-6.), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	97.884,93
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	97.884,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	97.884,93
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	19.548,14
TOTAL A PAGAR	$	122.433,07

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCIA - AFF

10.3.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3247 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023
PLAZO INICIAL: 4 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198,430,649.00
VALOR ACUMULADO: $ 198,430,649.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,686,129.80	13	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9,921,532.45	13	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59,529,194.70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100026747
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	13	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006112 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:


OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza de garantía única de cumplimiento

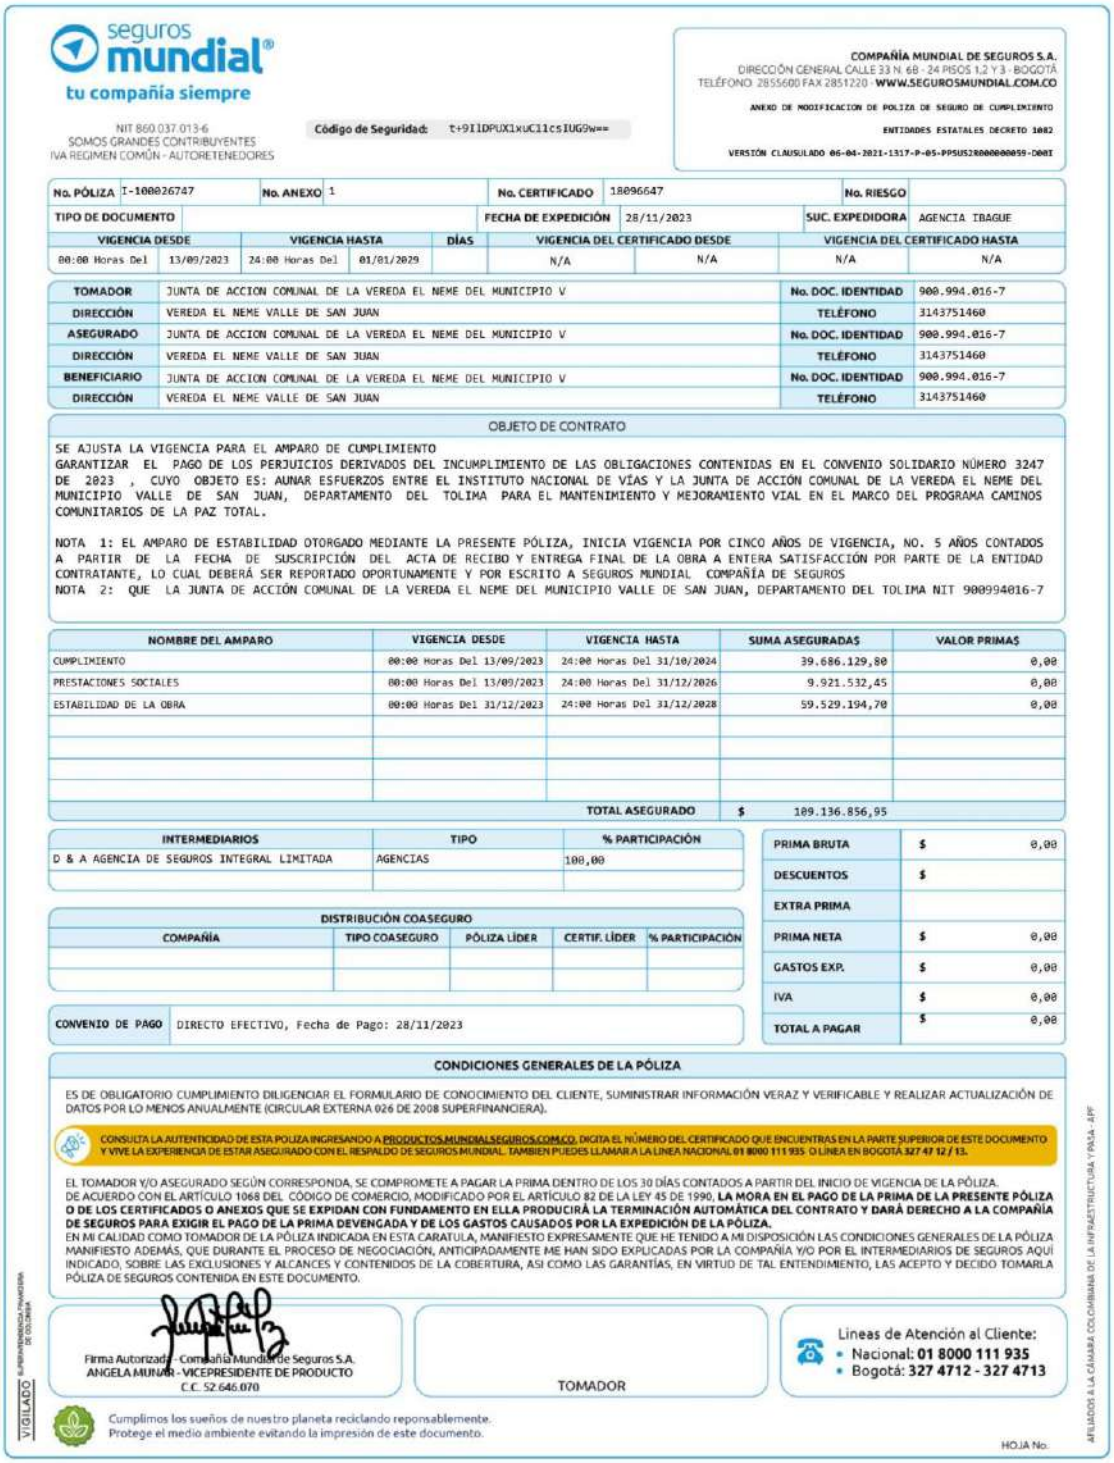

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: t+9IlDPUX1kuC11csIUG9w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100026747	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18096647	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	01/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO V	No. DOC. IDENTIDAD	900.994.016-7
DIRECCIÓN	VEREDA EL NEME VALLE DE SAN JUAN	TELÉFONO	3143751460
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO V	No. DOC. IDENTIDAD	900.994.016-7
DIRECCIÓN	VEREDA EL NEME VALLE DE SAN JUAN	TELÉFONO	3143751460
BENEFICIARIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO V	No. DOC. IDENTIDAD	900.994.016-7
DIRECCIÓN	VEREDA EL NEME VALLE DE SAN JUAN	TELÉFONO	3143751460

OBJETO DE CONTRATO

SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3247 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 900994016-7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/09/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	39.686.129,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	9.921.532,45	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	59.529.194,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 189.136.856,95	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCA - AFF

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: WHz1nebj6QoJU+aP16Gv8g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100006112	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18092322	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	04/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO V	No. DOC. IDENTIDAD	900.994.016-7
DIRECCIÓN	VEREDA EL NEME VALLE DE SAN JUAN	TELÉFONO	3143751460
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90	TELÉFONO	7056000
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3247 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN,DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 900994016-7), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	207.846,58
PATRONAL	0,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	207.846,58
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	207.846,58
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	40.440,85
TOTAL A PAGAR	$	253.287,43

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

10.4. ENSAYOS DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD

10.4.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4001 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4517 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3963 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4395 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4485 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4662-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4786-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3819 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-1900 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4507-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4678-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4504 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ. TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4000 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4454 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4469 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.4.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3247 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el mes de julio de 2024 no se entregaron resultados de ensayos de laboratorios porque los convenios se encuentran en las fases de topografía y estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-338793 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.5. ACTAS DE REUNIÓN

10.5.1. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: Tolima

CONTRATO DE OBRA No. 1756-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción comunal la Loma de Cocora

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la JAC de la vereda Loma de Cocora corregimiento 3 del municipio Ibagué, departamento de Tolima para el mejoramiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz (CCP)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: IN6 Ingeniería SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Visita de reconocimiento previa al inicio de obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Realizar recorrido de reconocimiento al sitio de ejecución de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1 Se realizó el recorrido de reconocimiento de la vía Terciaria al objeto del convenio donde se construirán. 80 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maria constanza collazos	presinta	JAC la manga	
Javier M Sanchez	ING Residente	- C gac - talaver	
Juan Camilo Cerca B.	Ing. residente	ING - Ingeniería	Juan Camilo Cerca.
Daniel felipe Quiñonez	Ing. residente	ING Ingeniería	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

10.5.2. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Tolima DIRECCIÓN TERRITORIAL: Tolima

CONTRATO DE OBRA No. 462 - 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción comunal Cataima

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la JAC vereda de cataima corregimiento 03 del municipio de Ibagué, Departamento del Tolima para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la prosperidad

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 - 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ING. Ingeniería. SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Visita de reconocimiento previa al inicio de obra

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Realizar recorrido de reconocimiento al sitio de ejecución de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Se realizó el recorrido de reconocimiento de la vía terciaria al objeto del convenio donde se construirán 6 alcantarillas y 2 box-culvert.

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Dayna Milen Lozano	Viseprecidente	JAC Catumi	
Juan Camilo Correa B	Ing. residente	ING Ingeniería	Juan Camilo Correa
Daniel Felipe Quiroga	Ing. residente	ING Ingeniería	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

10.5.3. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____ (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: ____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: Tolima

CONTRATO DE OBRA No. 3819 - 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción comunal Inspección Departamental de Dantas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la JAC de la Inspección Departamental de Dantas del municipio de Ibagué Departamento del Tolima para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la Red Terciaria.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704 - 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: IN6 Ingeniería SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Visita de reconocimiento previo al inicio de obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Realizar recorrido de reconocimiento al sitio de ejecución de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Se realizó el recorrido de reconocimiento de la vía Terciarica del objeto del convenio donde se construirán 3 alcantarillas y 100 metros lineales de placa huella.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Luis [illegible] Florido	Ing. Residente	OACDOVIAS	
Juan Camilo Correa B.	Ing. residente	ING Ingeniería	Juan Camilo Correa
Daniel felipe Quintero	Ing residente	ING Ingeniería	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

10.6. ACTA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

10.6.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4001 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 199,698,099.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 19 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4517 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 200,927,246.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 3963 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 199,481,796.00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 27 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4395 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 200,201,281.00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.5. Vereda Tovar, municipio de guamo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4485 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 200,008,033.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4756-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 198,108,085.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4756-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 195,828,659.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 28 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4662-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 198,826,145.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4786-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 198,145,372.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 3819 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 196,712,232.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4507-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 198,631,123.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 28 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA



Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4678-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 199,739,662.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 28 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA



Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4504 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 200,743,783.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4000 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 200,743,783.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 21 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/07/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4454 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 200,258,472.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 27 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA



Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/07/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 4469 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 200,250,666.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA



Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.6.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/07/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONVENIO No: 3247 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 198,430,649.00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 27 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 13 (Día) DE 09 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: ING INGENIERÍA SAS NIT 890.405.995-1 **CONTRATO No.** 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales Diseño geométrico Condiciones climáticas e hidrológicas Caracterización de materiales Concepto del tránsito Revisión estructural y demás conceptos de especialistas.				
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio caracterización de materiales				
ANEXO 2	Levantamiento topográfico (carteras y planos impresos y en medio magnético).				
ANEXO 3	Memorias de cálculo y planos del proyecto				

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

10.7. INFORME MANEJO INVERSIÓN MANEJO DE DESEMBOLSO

10.7.1. Vereda Cruce de los Guayabos, municipio de Alvarado

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4001 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.2. Vereda Paradero II, municipio de Flandes

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4517 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.3. Vereda Loma Luisa de Jagualito, municipio de Guamo

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3963 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.4. Vereda Callejón de Guaduas Sector Porvenir, municipio de Guamo

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4395 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.5. Vereda Tovar, municipio de Guamo

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4485 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.6. Vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4756-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.7. Vereda Cataima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4756-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.8. Vereda Llano de Combeima, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4662-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.9. Vereda San Juan de la China, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4786-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.10. Vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3819 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.11. Vereda La Isabela, municipio de Ibagué

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4507-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.12. Vereda San Antonio, municipio de Ibagué

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4678-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.13. Vereda El Águila, municipio de Melgar

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4504 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.14. Vereda Águila Alta, municipio de Melgar

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4000 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.15. Vereda Santa Lucía, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4454 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.16. Vereda Colón, municipio de Santa Isabel

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4469 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.7.17. Vereda El Neme, municipio de Valle de San Juan

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 2 **MES:** Julio **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3247 DE 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

DESEMBOLSO OTORGADO: 0 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

En el periodo en mención no se ha realizó ningún tipo de movimiento financiero en el convenio, por ende no han existido desembolsos, ni inversiones ni manejos con respecto a anticipos para el desarrollo del proyecto.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: Carlos Alberto Bello Avena
Representante legal o apoderado
Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.8. ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

10.8.1. Llano del Combeima, municipio de Ibagué

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL RECURSO DEL CONVENIO	PÁGINA 1 DE 1

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

MUNICIPIO: IBAGUÉ **DEPARTAMENTO:** TOLIMA

DATOS GENERALES

COMITÉ N°:	1	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2023
		FECHA DE INICIO:	26/12/2023
		FECHA DE VENCIMIENTO:	13/09/2024
CONVENIO N°:	4686 de 2023 (Indicar número y año)	**PLAZO ACUMULADO:**	257
PORCENTAJE OTORGADO:	0.83% **%**		
PORCENTAJE ACUMULADO:	0.83% **%**		
VALOR OTORGADO:	**$ 1,647,716.40**	**(M/CTE)**	

OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA:	J.A.C. LLANO DEL COMBEIMA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1704 de 2024 (Indicar número y año)
INTERVENTOR:	ING INGENERÍA S.A.S
VEEDOR DE LA OAC:	YINETH DAYANA DUQUE

DESARROLLO DEL COMITÉ OPERATIVO

Hoy 30 de julio de 2024, se realiza el comité Operativo No. 1 en donde se encuentran presentes la Interventoría ING INGENIERÍA S.A.S, el presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda Llano del Combeima y la presidenta del Comité de Veeduría del convenio suscrito para la Vereda Llano del Combeima.

Para el presente comité se van a tratar los siguientes puntos:

1. Reintegro rubro pago de la póliza.
2. Personal Profesional para vincular (Residente de Obra – Contador).
3. Contratos Personal Profesional.
4. Revisión y aprobación cotizaciones Ensayos de Laboratorio, Topografía y Diseños.
5. Aprobación del ítem de Subsidio al Dignatario para Transporte

A continuación, se desarrolla cada uno de los puntos:

1. En el primer punto con respecto al valor de la póliza, la Interventoría brinda información para el reintegro del pago de la póliza, en donde se indica al Presidente de la Junta de Acción Comunal que se deben enviar los soportes del pago de la póliza y los documentos pertinentes. Una vez hecho esto, la Interventoría enviará un oficio al correo electrónico de la Junta de Acción Comunal para que se encarguen de terminar este proceso.

2. En el segundo punto, sobre el personal a vincular en el convenio, se concilió el salario para el ingeniero residente y el contador, los cuales deben estar alineados a los costos administrativos del presupuesto; el salario del ingeniero residente es el establecido en el presupuesto del convenio con una dedicación del 100%, sin embargo, debido a que el contador también estará vinculado al convenio de la Junta de Acción Comunal de Loma de Cocora, el salario del contador se deberá fijar entre las dos veredas para que cada una pague una parte del salario, esto con el fin de optimizar los recursos de los convenios, además la Interventoría indicó que la duración del contrato del contador y del ingeniero residente deberá ser hasta la liquidación del convenio.

3. En el tercer punto se trató la legalización de los contratos del personal a vincular, en donde la Interventoría indicó que el presidente de la Junta de Acción Comunal debe revisar los contratos y estos deben corresponder a las necesidades del proyecto, con respecto a la duración de los contratos del personal vinculado se estableció que debe ser igual a la duración del convenio. Estos serán enviados a la Interventoría para su revisión, dada la aprobación, se firmarán y legalizarán.

4. El cuarto punto tiene que ver con la aprobación de las mejores propuestas o cotizaciones para los ítems de Topografía, de Estudios y Diseños y para esto, en donde las cotizaciones deben estar acopladas al rubro correspondiente y tengan el alcance adecuado para el convenio.

Para la Topografía se preaprobó la propuesta de Javier Martin Sánchez Guerrero, para hacer la debida aprobación, se indica que el levantamiento topográfico tiene que estar georreferenciado en el espacio.

Para el tema de Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, se aprobó la propuesta de Javier Martin Sánchez Guerrero, con la salvedad que el presupuesto y APUs actualizados estarán a cargo del ingeniero residente contratado por la Junta de Acción Comunal.

Debido a que la Topografía y la Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños lo realizará la misma persona, se debe conciliar que se pueda hacer un único pago cuando se entreguen todos los diseños; y este se debe legalizar con un contrato de prestación de servicios.

En relación con los Ensayos de Laboratorio, no se aprobó ninguna de las propuestas debido a que exceden el rubro indicado en los costos administrativos del presupuesto, y el alcance de las cotizaciones presentadas no corresponde al alcance inicial del convenio, que son siete alcantarillas, además se solicita a la Junta de Acción Comunal que se ajusten las cotizaciones, de manera que el laboratorio debe especificar el valor de cada uno de los ensayos de laboratorio a realizar y no solo presentar un valor total para la propuesta.

5. Con respecto a la aprobación del ítem de Subsidio al Dignatario para Transporte se debe legalizar revisando la necesidad del presidente la Junta de Acción Comunal para su desplazamiento en relación con el convenio, y se sugirió en el comité redactar un comunicado en compañía con la veeduría indicando la relación de los desplazamientos que se han hecho, el valor que se invirtió para estos desplazamientos y los comprobantes, para evaluarlo y retribuirlo de manera mensual.

Otros temas relacionados al convenio que se trataron en el comité fueron:

• Se solicitó al presidente la Junta de Acción Comunal con apoyo del ingeniero residente que se vinculará al convenio buscar canteras cercanas al proyecto, realizar cotizaciones de materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, todo esto se debe cotizar con proveedores que puedan legalizar la compra con factura electrónica, exámenes de ingreso y egreso del personal, la afiliación y presentación de documentos de seguridad social y ARL del ingeniero residente y del contador.

• Por último, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S indica que el ítem Chequeras (100 cheques o token) no se va a ejecutar y por ende, se debe buscar en dónde se podrá invertir ese rubro; además, se aclara que el convenio no va a tener PAGA, sin embargo, se debe invertir en el plan de gestión social, para esto se debe buscar una necesidad social que tenga la comunidad para utilizar este rubro, antes de ejecutarlo se tiene que solicitar e informar al Instituto Nacional de Vías – Invías.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN PARA DESEMBOLSO

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	TIPO DE CONTRATO O ACTIVIDAD	COTIZACION	POR VALOR DE:	OBSERVACIONES
1	PAGO PÓLIZA CUMPLIMIENTO	JAC LLANO DEL COMBEIMA	N/A	I-100028398	$ 1,541,923.77	
2	PAGO PÓLIZA RCE	JAC LLANO DEL COMBEIMA	N/A	I-100006651	$ 105,792.63	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
Adjuntar con este formato cotizaciones

OBSERVACIONES GENERALES:

Firma:
Nombre: Moisés Máx Medina
Representante Legal de la OAC
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Veeduría

Firma:
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Original: Informe Manejo Desembolso
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES

A la fecha de corte del presente informe no se han desarrollado actividades socio ambientales por lo cual no se anexa registro fotográfico y fílmico. En cuanto, a las actividades prediales no están incluidas en el alcance del objeto contractual de los diferentes contratos.

10.10. EQUIPOS Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Julio

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1704-2024

INTERVENTORÍA: ING INTERVENTORÍA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. N/A

CONTRATISTA:

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA 2.5L PLACA WNU509	CHEVROLET DMAX MODELO 2016	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTOCICLETA PLACA UUY28U	PULSAR 180 GT BSIV, MODELO 2019	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTOCICLETA PLACA EMZ 52G	VICTORY VENOM 250 PRO, MODELO 2023	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
PC LENOVO LEGION	COMPUTADOR PORTÁTIL DE OFICINA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC CORE INTEL CORE I5 4a GENERACIÓN	COMPUTADOR DE OFICINA DE ESCRITORIA OFFICE 365	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
PC CORE INTEL CORE I5 4a GENERACIÓN	COMPUTADOR DE OFICINA DE ESCRITORIA OFFICE 365	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
PC ASUS VIVOBOOK INTEL CORE I3 10a GENERACIÓN	COMPUTADOR PORTÁTIL DE OFICINA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC ASUS X450C INTEL CORE I5 3a GENERACIÓN	COMPUTADOR PORTÁTIL DE OFICINA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ~~Henry Alejandro Galindo Madrigal~~
Director ~~de~~ Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-338793 CND**

Firma
Nombre: **Sergio Antonio Rodriguez Cespedes**
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 225202-15615 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

10.11. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 de 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: N/A **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---

10.12. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 de 2024 — **INTERVENTOR:** ING INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No: N/A — **CONTRATISTA:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	459924	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	Principal	$ 589,631,886.00	$ 584,358,306.00
2024	459924	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	NACION	Principal	$ 12,033,304	$ -
			TOTAL			**$ 601,665,190.00**	**$ 584,358,306.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **601,665,190.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha 863121 (19/10/2021)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
										$ 601,665,190		Contrato Inicial
								459924 24/05/2024	12,033,304.00			
1	**may-24**	768,000.00	145,920.00	913,920.00					11,119,384.00	600,751,270.00		
2	**jun-24**	9,344,020.17	1,775,363.83	11,119,384.00					-	589,631,886.00		
								459924 24/05/2024	589,631,886.00			
2	**jun-24**	4,431,579.83	842,000.17	5,273,580.00					584,358,306.00	584,358,306.00		
3	**jul-24**	49,092,400.00	9,327,556.00	58,419,956.00					525,938,350.00	525,938,350.00		
TOTALES		**63,636,000.00**	**12,090,840.00**	**75,726,840.00**					**525,938,350.00**	**525,938,350.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTO DE PERSONAL	39,742,400.00	7,551,056.00	47,293,456.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	9,350,000.00	1,776,500.00	11,126,500.00
*			
VALOR TOTAL	49,092,400.00	9,327,556.00	58,419,956.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **Henry Alejandro Galindo Madrigal**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-338793 CND**

Firma
Nombre: **Sergio Antonio Rodriguez Cespedes**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 225202-15615 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

10.13. SEGUIMIENTO GARANTÍAS, CONVENIOS Y PÓLIZAS INTERVENTORÍA

CALIDAD INVÍAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 **INTERVENTOR:** ING INGENIERÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

FECHA DE INICIO: 28/05/2024

PLAZO INICIAL: 4 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 601.665.190,00

VALOR ACUMULADO: $ 601.665.190,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 60.166.519,00	28	5	2024	28	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 101.120.200,00	28	5	2024	28	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 120.333.038,00	28	5	2024	28	9	2027
Calidad del servicio		$ 180.499.557,00	28	5	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101225884

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Henry Alejandro Galindo Madrigal
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Firma
Nombre: Sergio A. Rodriguez C.
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-15615 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Póliza acta de inicio

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101225884	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	06	2024	28	05	2024	00:00	28	09	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ING INGENIERIA SAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 890.405.995-1
DIRECCIÓN: ANILLO VIAL KM 12 PUERTA DE LAS AMERICAS ZONA FRANCA — CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR — TELÉFONO: 3138870345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3770600
ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO NUMERO 1704 DE 2024,CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 2.

LAS VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO VAN HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
EL VALOR DE ANTICIPO SE TOMA SOBRE 10% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO $490.522.000,00

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD ES IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA CINCO (5) AÑOS AL ACTA DE RECIBO FINAL.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2024	28/03/2025	$60,166,519.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	28/05/2024	28/03/2025	$101,120,200.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2024	28/09/2027	$120,333,038.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	28/05/2024	28/09/2029	$180,499,557.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIADE LA POLIZA ARIBBA CITADA SEGUN ORDEN DE INICIO DE FECHA 28-05-2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR O CNTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,804,623.00	$ ******28,000.00	$ *****538,198.00	$ *********3,370,822.00	$ *******462,119,314.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GLADYS CASALLAS MARTINEZ	61287	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101225884
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2188977, 601-6019330 — DLF061287A — 1

10.14. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 DE 2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INTERVENTOR: ING INGENIERIA S.A.S

FECHA DE INICIO: 28-may-24 (Indicar dia, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: - (Indicar número y año)

CONTRATISTA: -

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ----- APROBADO: SI X NO ----- VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: 31/05/2023

OBSERVACIONES:

Ninguna

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ----- NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N/A

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ----- NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 28/11/2024

OBSERVACIONES:

No se han realizados auditorias internas debido a que estas se programan apartir de la firma del acta de inicio y al cumplimiento de los 6 meses de ejecución del contrato.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ---------- NO X APROBADO: SI ----- NO ----- FECHA DE APROBACIÓN: N/A

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 0 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO -----

OBSERVACIONES:

A la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio por parte de la Interventoria.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

No se han presentado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

No se han presentado quejas ni reclamos.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Índice de Satisfacción del Cliente	>= 4	Mantener la percepción del cliente en niveles satisfactorios.
IG2: Índice de gestión 2 = Cumplimiento entrega de Informes a tiempo.	80%	Cumplir con los requisitos técnicos, financieros, de entrega oportuna y de calidad definidos para la prestación del servicio.
IG3: Índice de gestión 3 = Cumplimiento informes exigidos	100%	Cumplir con los requisitos técnicos, financieros, de entrega oportuna y de calidad definidos para la prestación del servicio.
IG4: Índice de gestión 4 = Desempeño de proveedores	75%	Cumplir con los requisitos técnicos, financieros, de entrega oportuna y de calidad definidos para la prestación del servicio.
IG5: Índice de gestión 5 = Desempeño de contratistas.	80%	Cumplir con los requisitos técnicos, financieros, de entrega oportuna y de calidad definidos para la prestación del servicio.
IG6: Índice de gestión 6 = Desempeño del Personal	90%	Mantener y mejorar la competencia del personal para la implementación eficaz del SGC, prestación del servicio y control de los procesos.
IG7: Índice de gestión 7 = Cumplimiento Programa de Capacitación	80%	Mantener y mejorar la competencia del personal para la implementación eficaz del SGC, prestación del servicio y control de los procesos.
IG8: Índice de gestión 8 = Auto evaluación de estándares mínimos del SG-SST	> 85%	Alcanzar el nivel aceptable en la evaluación de los estándares mínimos del SG-SST definidos en la normatividad legal vigente
IG9: Índice de gestión 9 = Compromisos Revisión gerencial (R.G)	80%	Mejorar el desempeño del sistema de gestión de la calidad.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Ninguna

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

No se cuenta con equipos en el presente periodo.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Firma
Nombre: HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND

Firma
Nombre: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 225202-15615 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

10.15. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 | 1 | 1 | 06/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704-2024
PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 601,665,190.00 (Según contrato principal)
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO ROGRÍGUEZ CÉSPEDES
RESOLUCIÓN No.: 916 DE 27/03/2024 (Indicar día/mes/año)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 601,665,190.00
CONTRATO DE OBRA No.: N/A CONTRATISTA: OAC Tolima lote 2
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				2024										TOTAL	
							MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
	1	Director de Interventoría	$ 6,000,000.00	$ -	2.000	$ 12,000,000	0.05	$ 300,000	0.50	$ 3,000,000	0.50	$ 3,000,000	0.50	$ 3,000,000	0.45	$ 2,700,000	2.00	$ 12,000,000.00
	3	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,900,000.00	$ -	9.000	$ 44,100,000	0.00	$ -	1.00	$ 4,900,000	3.00	$ 14,700,000	3.00	$ 14,700,000	2.00	$ 9,800,000	9.00	$ 44,100,000.00
	2	Profesional Ambiental	$ 3,400,000.00	$ -	5.000	$ 17,000,000	0.00	$ -	0.50	$ 1,700,000	2.00	$ 6,800,000	2.00	$ 6,800,000	0.50	$ 1,700,000	5.00	$ 17,000,000.00
	2	Profesional Social	$ 3,000,000.00		6.000	$ 18,000,000	0.00	$ -	0.50	$ 1,500,000	2.00	$ 6,000,000	2.00	$ 6,000,000	1.50	$ 4,500,000	6.00	$ 18,000,000.00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 8,550,000.00	$ -	1.000	$ 8,550,000												
	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5,700,000.00	$ -		$ -		$ -	0.25	$ 1,425,000							0.25	$ 1,425,000.00
	1	Especialista en Estructuras	$ 5,700,000.00	$ -		$ -		$ -	0.25	$ 1,425,000							0.25	$ 1,425,000.00
	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5,700,000.00	$ -		$ -		$ -	0.25	$ 1,425,000							0.25	$ 1,425,000.00
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5,700,000.00	$ -		$ -		$ -	0.25	$ 1,425,000							0.25	$ 1,425,000.00
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5,700,000.00	$ -		$ -		$ -	0.25	$ 1,425,000							0.25	$ 1,425,000.00
	1	Especialista en Ambiental	$ 5,700,000.00	$ -		$ -		$ -	0.25	$ 1,425,000							0.25	$ 1,425,000.00
		PERSONAL TÉCNICO																
	2	Inspector SST	$ 2,000,000.00	$ -	6.000	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 4,000,000	2.00	$ 4,000,000	2.00	$ 4,000,000	6.00	$ 12,000,000.00
	12	Inspector	$ 1,800,000.00	$ -	30.000	$ 54,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -	12.00	$ 21,600,000	12.00	$ 21,600,000	6.00	$ 10,800,000	30.00	$ 54,000,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															0.00	
	1	Técnico Administrativo	$ 1,300,000.00	$ -	3.500	$ 4,550,000	0.00	$ -	0.50	$ 650,000	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000	3.50	$ 4,550,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 170,200,000	$ 300,000.00		$ 20,300,000.00		$ 57,400,000.00		$ 57,400,000.00		$ 34,800,000.00		$ 170,200,000	
FACTOR MULTIPLICADOR					2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 401,672,000	$ 708,000.0		$ 47,908,000.0		$ 135,464,000.0		$ 135,464,000.0		$ 82,128,000.0		$ 401,672,000	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024 MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIÁTICOS																
	1	Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200,000.00	Día	16.000	$ 3,200,000	0.00	$ -	4.00	$ 800,000	4.00	$ 800,000	4.00	$ 800,000	4.00	$ 800,000	16.000	$ 3,200,000.00
	1	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5,500,000.00	Mes	3.000	$ 16,500,000	0.00	$ -	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	1.00	$ 5,500,000	0.00	$ -	3.000	$ 16,500,000.00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650,000.00	Mes	41.000	$ 26,650,000	0.00	$ -	6.00	$ 3,900,000	13.00	$ 8,450,000	16.00	$ 10,400,000	6.00	$ 3,900,000	41.000	$ 26,650,000.00
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,000,000.00	Mes	4.000	$ 24,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 6,000,000	1.50	$ 9,000,000	1.00	$ 6,000,000	0.50	$ 3,000,000	4.000	$ 24,000,000.00
	1	Ensayos de laboratorios.	$ 1,200,000.00	Mes	6.000	$ 7,200,000	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 3,600,000	2.00	$ 2,400,000	1.00	$ 1,200,000	6.000	$ 7,200,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 850,000.00	Mes	5.000	$ 4,250,000	1.00	$ 850,000	1.00	$ 850,000	1.00	$ 850,000	1.00	$ 850,000	1.00	$ 850,000	5.000	$ 4,250,000.00
		OTROS COSTOS																
	1	Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1,350,000.00	Mes	3.000	$ 4,050,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,350,000	1.00	$ 1,350,000	1.00	$ 1,350,000	0.00	$ -	3.000	$ 4,050,000.00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300,000.00	Mes	4.000	$ 1,200,000	0.20	$ 60,000	1.00	$ 300,000	1.00	$ 300,000	1.00	$ 300,000	0.80	$ 240,000	4.000	$ 1,200,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax correo, internet, etc)	$ 300,000.00	Mes	4.000	$ 1,200,000	0.20	$ 60,000	1.00	$ 300,000	1.00	$ 300,000	1.00	$ 300,000	0.80	$ 240,000	4.000	$ 1,200,000.00
	1	Vivienda Técnica Comunitaria	$ 150,000.00	Mes	4.000	$ 600,000	0.00	$ -	1.00	$ 150,000	1.50	$ 225,000	1.00	$ 150,000	0.50	$ 75,000	4.000	$ 600,000.00
		* TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 88,850,000	$ 970,000		$ 19,150,000		$ 30,375,000		$ 28,050,000		$ 10,305,000		$ 88,850,000	
		* SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS				$ 490,522,000	$ 708,000		$ 47,908,000		$ 135,464,000		$ 135,464,000		$ 82,128,000		$ 401,672,000	
		* PROVISIÓN PARA AJUSTE Y/O FRENTE ADICIONAL				$ 15,079,000	$ -		$ 5,026,333		$ 5,026,333		$ 5,026,333		$ -		$ 15,079,000.00	
		* TOTAL COSTOS BÁSICOS				$ 505,601,000	$ 1,678,000		$ 72,084,333		$ 170,865,333		$ 168,540,333		$ 92,433,000		$ 505,601,000	
		* IVA = 19%				$ 96,064,190	$ 318,820		$ 13,696,023		$ 32,464,413		$ 32,022,663		$ 17,562,270		$ 96,064,190	
		* COSTO TOTAL				$ 601,665,190	$ 1,996,820		$ 85,780,357		$ 203,329,747		$ 200,562,997		$ 109,995,270		$ 601,665,190	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS										

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **ING INGENIERÍA**
Matrícula Profesional No.: **1320227141 BLV**

Firma:
Nombre: **Sergio Antonio Rodriguez Céspedes**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 225202-15615 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

10.16. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Tabla 20. Relación de correspondencia

CONSECUTIVO	RADICADO	FECHA	EMPRESA	DIRIGIDO A	ASUNTO
INGI-50255-002-24	2024E-VUVRAZ-061461	8/07/2014	ING INGENIERÍA S.A.S	SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS	SOLICITUD CAMBIO DE INGENIERO RESIDENTE 1 E INGENIERO RESIDENTE 2 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1704-2024.
INGI-50255-003-24	2024E-VUVRAZ-061475	8/07/2014	ING INGENIERÍA S.A.S	SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS	REMISION DE HOJAS DE VIDA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1704-2024
INGI-50255-004-24	2024E-VUVRAZ-062190	9/07/2014	ING INGENIERÍA S.A.S	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1 V1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
INGI-50255-005-24	2024E-VUVRAZ-065037	17/07/2024	ING INGENIERÍA S.A.S	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	REMISION APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS EN EL MARCO

Fuente. Elaboración propia

10.17. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVADADES REALIZADOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO - CONTRATO 1704-2024 LOTE 2

1 de julio de 2024 a 31 de julio de 2023



FOTOGRAFÍA 1: Visita de reconocimiento, vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 2: Visita de reconocimiento, vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 3 Visita de reconocimiento, vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 4: Visita de reconocimiento, vereda Loma de Cocora, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 5: Visita de reconocimiento, vereda Cataima, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 6: Visita de reconocimiento, vereda Cataima, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 7: Visita de reconocimiento, vereda Cataima, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 8: Visita de reconocimiento, vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 9: Visita de reconocimiento, vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.



FOTOGRAFÍA 10: Visita de reconocimiento, vereda Inspección Departamental de Dantas, municipio de Ibagué.

10.18. COPIA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

A la fecha de corte del presente informe ninguno de los convenios solidarios ha comenzado con la ejecución de obra de los diferentes proyectos, por lo tanto, no se presenta la copia de la bitácora del mes de agosto de 2024.
