CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO

NIT: 901721099-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 46 143 36, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3125255859

Email. contabilidad@hapil.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764079400861 válida desde 2024-09-12 hasta 2025-09-12 rango desde FJHQ5 hasta FJHQ50.

Carrera 46 No.143 - 36
Teléfono celular 3164728237
Correo: comprasquindiojh@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Razón Social: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT : 890001639
Dirección: CALLE 20 # 13-22, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6067359919
Email: contabilidad@quindio.gov.co

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FJHQ13**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:09:21-05:00**
FECHA FIRMADO:	**29/07/2025 17:09:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2025	–	--	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	COSTO DIRECTO Acta de obra No.15 correspondiente al periodo del 01 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025 Contrato de Obra No.008 de 2023, Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.	WSD	1,00	$478.830.181,00				0,00	$478.830.181,00
2	04	ADMINISTRADOR 33.31%	WSD	1,00	$159.498.333,00				0,00	$159.498.333,00
3	05	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$4.788.302,00				0,00	$4.788.302,00
4	06	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$23.941.509,00				0,00	$23.941.509,00
5	07	PMT	WSD	1,00	$842.800,00				0,00	$842.800,00
6	08	PGIO	WSD	1,00	$867.247,00				0,00	$867.247,00

Notas:

SON: (seiscientos sesenta y ocho millones setecientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos)
CUFE: 393a10fb28d08488772836O014dbf4884b0838c39ba97dd90fb5f18da839f7c84ad3ec7a8cf3fcc48311c5c08a3e7ea9

Subtotal:	$668.768.372,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$668.768.372,00

Firma Digital: Im4dv2fIDoFoOHQwJpkKGPLfeyPJWVzOsIPVJadyw8cV+n+wAVRGITPcbx9/mB6D
b1mTvlxvZ8OXbTZgaTrAMzwlgT+fjms2BnKth9EgpCqQKc5qe
GAm4KXY6MZ+oeC 8kF4M/Les8F+3+BDrRo1dOZkN8JLHr/lhm3cwZVP83qjFlWg/xZ3v/CYiaDIlj2Jz DAsY7/BLnmLMjrPtvbnls5rkXTHFpfl45EC
MJT5371L1JezsAPK36SGE/TAPaGel nAOtPuNRToNT+gfccxU9gngN3DhkjGpnXVX1jGlUEgQqMAQ1/1JGJ9npsAFYEPlz EVSKsL1Uca8nMct4MOtE
uA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/07/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/04 **Recibo Nº** **8352500132190**

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

PRO DESARROLLO	$13.375.400
PRO HOSPITAL	$13.375.400
PRO CULTURA	$6.687.700
PRO ADULTO MAYOR	$20.063.100
Total	**$53.501.600**
	$00
Total a Pagar	**$53.501.600**

Con destino a: Gobernación de Quindío

Contribuyente
Tipo de Doc. N.I.
Número 9017210990
Nombre CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500132190(3900)000000535016O0(96)20250804

VALOR TOTAL CONTRATO	4.225.000.218
FECHA CONTRATO	26/06/2023
VALOR ORDEN DE PAGO	668.768.372
NUMERO ORDEN DE PAGO	15
VALOR BASE	668.768.372
NRO. CONTRATO	08

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500132190**

Fecha de Expedición 2025/07/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/04

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

PRO DESARROLLO	$13.375.400
PRO HOSPITAL	$13.375.400
PRO CULTURA	$6.687.700
PRO ADULTO MAYOR	$20.063.100
Total	**$53.501.600**
	$00
Total a Pagar	**$53.501.600**

Con destino a: Gobernación de Quindío

Contribuyente
Tipo de Doc. N.I.
Número 9017210990
Nombre CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500132190(3900)000000535016O0(96)20250804

VALOR TOTAL CONTRATO	4.225.000.218
FECHA CONTRATO	26/06/2023
VALOR ORDEN DE PAGO	668.768.372
NUMERO ORDEN DE PAGO	15
VALOR BASE	668.768.372
NRO. CONTRATO	08

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500132190**

Fecha de Expedición 2025/07/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/04

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

PRO DESARROLLO	$13.375.400
PRO HOSPITAL	$13.375.400
PRO CULTURA	$6.687.700
PRO ADULTO MAYOR	$20.063.100
Total	**$53.501.600**
	$00
Total a Pagar	**$53.501.600**

Con destino a: Gobernación de Quindío

Contribuyente
Tipo de Doc. N.I.
Número 9017210990
Nombre CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500132190(3900)000000535016O0(96)20250804

VALOR TOTAL CONTRATO	4.225.000.218
FECHA CONTRATO	26/06/2023
VALOR ORDEN DE PAGO	668.768.372
NUMERO ORDEN DE PAGO	15
VALOR BASE	668.768.372
NRO. CONTRATO	08

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

Armenia, 30 de junio del 2025

Señores:
Gobernación del Quindío

Atn. Andrés Mauricio Olarte Valderrama
Jefe de Contabilidad Gobernación del Quindío.
Armenia, Quindío

Referencia: *CONTRATO No. LP006-INF008-OBRA-2023*

Objeto: *"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"*

Asunto: Aclaración Amortización de anticipos y pago de actas parcial #15

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito realizar aclaración con respecto a giros de anticipo y amortización de los RP # 27 de fecha 01 de enero de 2024 por valor de $ 2.841.500.218 y el RP 6380 de fecha 6 de septiembre de 2024 por valor de $ 1.383.500.000 para el proceso de contabilización del acta en trámite #15 por valor a pagar de $ 452.260.343,21.

Teniendo en cuenta lo anterior:

• Afectar el RP # 6380 de fecha 6 de septiembre de 2024 realizando el pago del Acta #15 por valor a pagar de Cuatrocientos cincuenta y dos millones doscientos sesenta mil trescientos cuarenta y tres pesos con venti uno (centavos)$ 452.260.343,21

• Afectar el RP # 27 de fecha 01 de enero de 2024 Amortizando el anticipo Doscientos diez y seis millones quinientos ocho mil cero veinte ocho pesos con setenta y nueve (centavos) $216.508.028,79

Agradecemos de antemano su atención a este asunto.

Sin otro particular, atentamente

CLAUDIA FERNANDA TORO RODAS
Jefe oficina Infraestructura Social
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Supervisor contrato de obra, No. 008-2023

Señores

GOBERNACION DEL QUINDIO
Calarcá - Quindío

REF: Contrato de obra N 008 de 2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

Respetados señores

Por medio de la presente solicitamos que el pago del acta N.15 Por valor de Valor a pagar: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VENTI UNO (CENTAVOS O CENTÉSIMOS) M/CTE ($ 452.260.343,21)sea consignada a la cuenta corriente No.19300001864 de Bancolombia a nombre de CONSORCIO JCB-006 QUINDIO NIT 901.721.099-0.

CORDIALMENTE

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
C.C 7.228.304 de Duitama
CONSORCIO JCB 006 QUINDIO.

INFORME MENSUAL DE OBRA No 15

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



CALLE 45 # 28-00

ESTADIO GUILLERMO JARAMILLO PALACIO

PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DATOS GENERALES 5
3. DATOS DEL CONTRATO DE LA OBRA 5
3.1. Contrato de obra 5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 6
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO 7
6.1. Pólizas contrato de obra 10
7. RESUMEN DE PAGOS 13
7.1. Estado de pagos 13
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 13
8.1. Valor contrato de obra 13
9. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA 14
9.1. Control de ejecución 14
9.2. Proyecciones de Avance para el siguiente Periodo 14
10. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 15
10.1. COMITÉS DE OBRA 15
10.2. CONTROL DE PERSONAL 15
10.2.1. Relación de personal 15
11. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 15
11.1. Correspondencia enviada 15
11.2. Correspondencia recibida 15
12. COMPONENTE TÉCNICO 16
12.1. INFORMES SEMANALES DE OBRA 16
12.2. GESTIÓN AMBIENTAL 16
12.3. GESTIÓN SOCIAL 16
12.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 17
12.5. INFORMES SST 17
13. COMPONENTE PRESUPUESTAL 17

13.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL 17
13.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS 17

ÍNDICE DE IMAGÉNES

Imagen 1 Curva de avance a 30 de Junio de 2025 14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos generales 5
Tabla 2 Datos generales contrato de obra 6
Tabla 3 Localizacion del proyecto 6
Tabla 4 Informacion polizas del contrato 11
Tabla 5 Informacion polizas del contrato 11
Tabla 6 Informacion Polizas del contrato 12
Tabla 7 Informacion polizas del contrato 12
Tabla 8 Estado de pagos 13
. Tabla 9 Informacion del personal 15
Tabla 10 Informacion Semanales Marzo 16

1. INTRODUCCIÓN

En el Departamento del Quindío el Calarcá (Quindío) a través de la secretaria de infraestructura del Departamento, adelantó el proceso mediante LP006-INF008-OBRA-2023, adjudicó al contratista CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO el CONTRATO DE OBRA N°. 008 DE 2023 suscrito entre la GOBERNACIÓN DEL QUINDIO Y CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO Que el presupuesto aprobado por un valor inicial de e DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 2.841.500.218) incluido IVA y AIU. El plazo contractual inicial para la ejecución del proyecto es de 6 meses. Se realiza adición N°1 al contrato por (Mil trescientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos m/cte. ($1.383.500.000), para un valor total de cuatro mil doscientos veinticinco millones doscientos diez y ocho pesos m/cte. ($ 4.225.000.218) y la nueva fecha de terminación de obra es el 29 de julio de 2025.

Se realiza prórroga del contrato mediante modificatorio #9 mediante el cual se modifica el plazo del contrato hasta el día 29 de julio de 2025

Se realiza el informe mensual # 15 del contratista CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO, comprendido entre 01 de Mayo al 30 de Junio del 2025, dando cumplimiento a lo referenciado en el contrato de obra. El presente informe contempla descripción de las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo de referencia.

2. DATOS GENERALES

PERIODO No.	PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	El proyecto se adelantará en la zona urbana del municipio de Calarcá Quindío. CALLE 45 # 28-00 ESTADIO GUILLERMO JARAMILLO PALACIO

Tabla 1 Datos generales

3. DATOS DEL CONTRATO DE LA OBRA

3.1. Contrato de obra

Número de Contrato:	LP006-INF008-OBRA-2023
Nombre del Contratista:	**CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO**
Nit No.	901.721.099-0
Objeto:	Realizar la CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Valor del Contrato:	$ 2.841.500.218,00
Adición N° 1	$1.383.500.000
Valor total	$4.225.000.000
Acta de inicio:	1 de agosto de 2023
Plazo Inicial Total Contrato:	4 meses y 20 días
Fecha de vencimiento del contrato	20 de diciembre de 2023
Prórroga N° 1	Nueve (9) días
Nueva fecha de terminación del contrato	29 de diciembre de 2023
Prórroga N° 2	Sesenta (60) días
Nueva fecha de terminación	27 de febrero de 2024

del contrato modificatorio 4	
Fecha de suspensión:	20 de febrero de 2024
Fecha de reanudación:	06 de septiembre de 2024
fecha de terminación del contrato modificatorio 5	31 de diciembre de 2024
Nueva fecha de terminación del contrato modificatorio 7	30 de mayo de 2025
Prórroga N° 3	Sesenta (60) días
Nueva fecha de terminación del contrato modificatorio 9	29 de julio de 2025

Tabla 2 Datos generales contrato de obra

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DIRECCIÓN:	CARRERA 45 # 28-00
MUNICIPIO:	Calarcá
DEPARTAMENTO:	Quindío
ÁREA DEL PREDIO	19.527 m2
MATRICULA INMOBILIARIA	No. 282-38817
TOPOGRAFÍA	Ondulada
USO DE SUELO	Urbano
CUMPLIMIENTO NORMA URBANA	
USO	Equipamiento Institucional

Tabla 3 Localizacion del proyecto

5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Para el presente periodo se realizan las siguientes actividades con respecto al cronograma de trabajo.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

En el período del informe el contratista realizó las siguientes actividades

PRIMERA SEMANA DE MAYO 2025

- Continua la instalación de estructura de muros internos de bloque #2 acorde a planos de puertas y ventanas y fachadas recepción y baños bloque 2, recepción
- Instalación lamina fachada posterior bloque 2
- Se finaliza la actividad de llenos con material importado
- Se instalan enchapes de pared cuartos de reciclaje
- Soporte para alambrón cada metro. Fijado en cubierta con pegante o anclaje impermeabilizado
- Aplicación estuco muros externos
- Instalación cielo raso aleros
- Se realizo instalación de bordillo anden bloque No.3
- Se inicio construcción anden Bloque No.3

SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2025

- Continuo y termino instalación de estructura de muros internos de bloque #2 acorde a planos de puertas y ventanas y fachadas recepción y baños bloque 2, recepción
- Se inicio construcción cárcamo aguas lluvias bloque No.3
- Se inicio instalación enchape pasillo
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, N0.3
- Se realizo instalación barras abatibles baños PMR.
- Se realizo instalación aparatos sanitarios baños bloque No.3
- Se continuó termino construcción anden bloque No.3
- Se continuó construcción anden bloque No.3

TERSERA SEMANA DE MAYO 2025

- Se continuo instalación muros livianos, cielo raso Bloque No.2
  Recepción
  Aleros
- Se continuo aplicación estuco, pintura muros cielos rasos bloque No.2

- Se continuo termino instalación estuco y pintura bloque No.3, muros
- Se continuo aplicación estuco, pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- Se continua construcción cárcamo aguas lluvias bloque No.3
- Se realizo instalación aparatos sanitarios bloque No.3
- Se realizo acabado rampa Bloque No.3
- Se continúo acabado pasillos piso Bloque No.3, No.2
- Se continuo construcción Adén bloque No.3
- Se inicio construcción cárcamo aguas lluvias bloque No.2
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, N0.3

CUARTA SEMANA DE MAYO 2025

- Se continuo instalación muros livianos, cielo raso Bloque No.2
  Recepción
  Aleros
- Se continúo aplicación estuco, pintura muros cielos rasos bloque No.2
- Se continúo termino instalación estuco y pintura bloque No.3, muros
- Se continúo aplicación estuco, pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- Se continua construcción cárcamo aguas lluvias bloque No.3
- Se realizo instalación aparatos sanitarios bloque No.3
- Se realizo acabado rampa Bloque No.3
- Se continúo acabado pasillos piso Bloque No.3, No.2
- Se continúo construcción Adén bloque No.3
- Se continúo termino construcción cárcamo aguas lluvias bloque No.2
- Se inicio instalación muebles en acero inoxidable
- Se realizo instalación divisiones en acero inoxidable baños
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, N0.3

PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2025

- Se continúo aplicación estuco, pintura muros cielos rasos bloque No.2
- Se continúo instalación estuco y pintura bloque No.3, muros
- Se continúo aplicación estuco, pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- Se realizo instalación aparatos sanitarios bloque No.3
- Se realizo acabado rampa Bloque No.3
- Se continúo acabado pasillos piso Bloque No.3, No.2

- Se instalo loseta táctil guía y alerta en Andén bloque No.3
- Se continúo con acabado de cárcamo aguas lluvias bloque No.3
- Se instalo rejilla en polímero sobre cárcamo bloque 3
- Se inicio instalaciones muebles (mesones) en acero inoxidable
- Se realizo instalación divisiones en acero inoxidable baños
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, N0.3

SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2025

- Se continúo aplicación estuco, pintura muros cielos rasos bloque No.2
- Se continúo instalación estuco y pintura bloque No.3, muros
- Se continúo aplicación estuco, pintura pedestal concreto bloque No.3
- Se continúo con acabado de cárcamo aguas lluvias bloque No.2
- Se instalo rejilla en polímero sobre cárcamo bloque 2
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, N0.3
- Se continuó termino construcción anden bloque No.3
- Se continuó construcción anden bloque No.3
- Se continua con excavación e instalación ducto apara derivadas acometidas bloque 2 y 3.
- Se instalo poste en concreto para ubicación transformador.

TERCERA SEMANA DE JUNIO 2025

- Se realizo instalación 01 aparato sanitario bloque No.2
- Se realizo instalación de desagües de lavaplatos en mesones acero inoxidable
- Se continúo aplicación estuco, pintura muros cielos rasos bloque No.2
- Se continúo instalación estuco y pintura bloque No.3, muros
- Se continúo aplicación estuco, pintura pedestal concreto bloque No.3
- Se continuo aplicación estuco, pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- Se instalo loseta táctil guía y alerta en Andén bloque No.3
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, N0.3
- Se continuo con cableado interno bloque 2 y 3 e instalación de luminarias

- Se continua con cama de arena y lleno en ducto para derivadas acometidas bloque 2 y 3.
- Se instalo transformador, Cableado y accesorios acometida desde poste de derivación principal EDEQ a poste transformador

CUARTA SEMANA DE JUNIO 2025

- Se continúo acabado en muros livianos, cielo raso Bloque No.3 Aleros y eje de puertas principales
- Se continúo aplicación estuco, pintura cielo rasos bloque No.2, No.3
- Se continúo construcción de rampa en Andén bloque No.3
- Se continuó instalación ornamentación en aluminio y madera (ventanas y puertas), Bloque No.2, N0.3
- Se continua con instalación de luminarias en bloque 2 y 3.

ESTADO DE GARANTÍAS

6.1. Pólizas contrato de obra

◈ Las pólizas presentadas por el Consorcio son las siguientes, se relacionan las iniciales con la firma del contrato de obra.

◈ Están expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.

CUMPLIMIENTO: PÓLIZA No. 51-40-101008204
RCE: PÓLIZA No. 51-40-101008204

◈ Se realizó actualización de las mismas con la firma del acta de inicio, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *009-BTA-SASL* del 14 de agosto de 2023.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	22/07/2025	$ 569.400.000,00
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	22/07/2025	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00

Tabla 4 Informacion polizas del contrato

- Se realizó cuarta actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 29 de Julio de 2025, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *259-BTA-YHCM* del 06 de junio de 2025.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	22/12/2025	$ 845.000.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	22/08/2028	$ 633.750.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	30/07/2030	$ 845.000.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	22/09/2025	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	22/09/2025	$ 569.400.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	22/09/2025	$ 569.400.000,00

Tabla 5 Informacion polizas del contrato.

- Se realizó tercera actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 27 de febrero de 2024, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *077-BTA-OALG* del 04 de enero de 2024.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	11/07/2024	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	10/03/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00

Tabla 6 Informacion Polizas del contrato

- *Actualización de las pólizas después de la suspensión.*

CONCEPTO	PÓLIZA Nº	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado Nº 51-44-101023744	1/08/2023	2/02/2025	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	Seguros del Estado Nº 51-44-101023744	1/08/2023	11/03/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Seguros del Estado Nº 51-44-101023744	10/02/2024	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Seguros del Estado Nº 51-40-101008204	1/08/2023	2/11/2024	$ 464.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Seguros del Estado Nº 51-40-101008204	1/08/2023	2/11/2024	$ 464.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Seguros del Estado Nº 51-40-101008204	1/08/2023	2/11/2024	$ 464.000.000,00

Tabla 7 Informacion polizas del contrato

7. RESUMEN DE PAGOS

7.1. Estado de pagos

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	VALOR MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR PAGAR
VALOR INICIAL	$ 2.841.500.218,00			$ 2.841.500.218,00
ACTA N° 001		$ 122.053.948,00		$ 2.719.446.270,00
ACTA N° 002		$ 206.426.312,00		$ 2.513.019.958,00
ACTA N° 003		$ 184.227.618,00		$ 2.328.792.340,00
ACTA N° 004		$ 36.173.435,00		$ 2.292.618.905,00
ACTA N° 005		$ 61.802.565,00		$ 2.230.816.340,00
ACTA N° 006		$ 50.416.242,00		$ 2.180.400.098,00
ADICION (MOD N°5)	$ 1.383.500.000,00			$ 3.563.900.098,00
ACTA N°007 (ANTICIPO 8%)		$ 338.000.017,44		$ 3.563.900.098,00
ACTA N° 008		$ 522.405.151,00	$ 41.792.412,08	$ 3.041.494.947,00
ACTA N° 009		$ 459.521.102,00	$ 36.761.688,16	$ 2.581.973.845,00
ACTA N° 010		$ 348.949.497,00	$ 27.915.959,76	$ 2.233.024.348,00
ACTA N° 011 (anticipo 17%)		$ 718.250.037,06		$ 2.233.024.348,00
ACTA N° 012		$ 369.366.940,00	$ 244.423.988,57	$ 1.863.657.408,00
ACTA N° 013		$ 501.948.294,00	$ 244.423.988,57	$ 1.361.709.114,00
ACTA N° 014		$ 480.018.940,00	$ 244.423.988,57	$ 881.690.174,00
ACTA N° 015	94,96%	$ 668.768.372,00	$ 216.508.028,79	$ 212.921.802,00
TOTAL	**$ 4.225.000.218,00**	**$ 4.012.078.416,00**	**$ 1.056.250.054,50**	**$ 212.921.802,00**

Tabla 8 Estado de pagos

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

8.1. Valor contrato de obra

El valor del contrato de la obra está por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE $ 2.841.500.218,00, se realiza adición N°1 al contrato por (Mil trescientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos m/cte. ($1.383.500.000), para un valor total de cuatro mil doscientos veinticinco millones doscientos diez y ocho pesos m/cte. ($ 4.225.000.218)

9. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo con las actividades ejecutadas para el presente período y relacionadas en el numeral 6 del presente informe.

9.1. Control de ejecución

El porcentaje de avance ejecutado a la fecha del presente informe es de 95.00%
EL valor ejecutado en recursos a la fecha es de $ 4.013.750.207,00

9.2. Proyecciones de Avance para el siguiente Periodo

Para el mes de junio se tiene previsto realizar las actividades de acabados

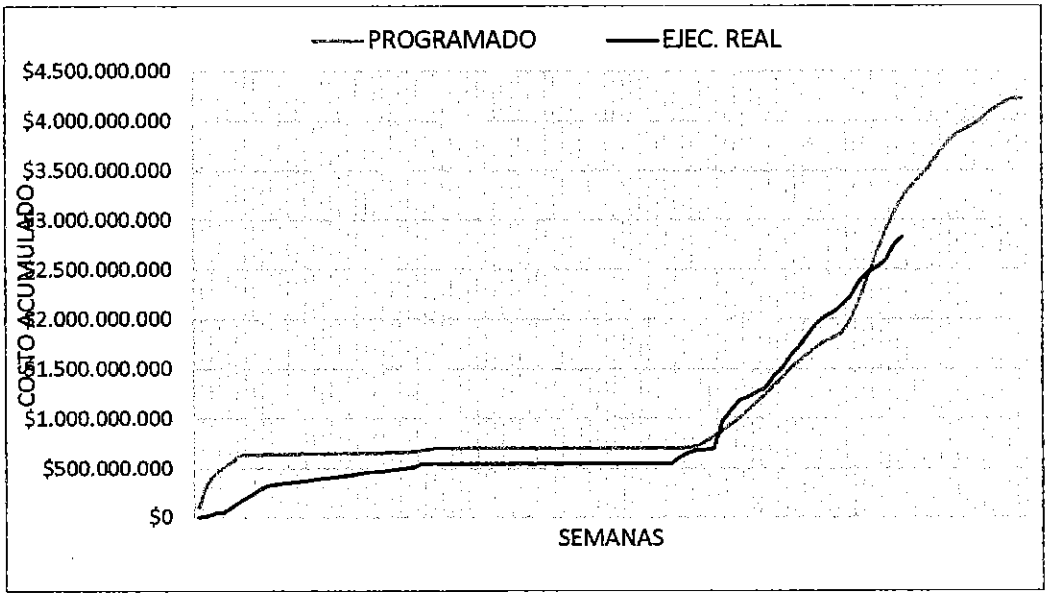


Imagen 1 Curva de avance a 30 de junio de 2025

10. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

10.1. COMITÉS DE OBRA

Durante este periodo se realizaron comités de seguimiento al contrato de obra.

ACTA	FECHA
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #54	4 DE MAYO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #55	16 DE MAYO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #56	30 DE MAYO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #57	9 DE JUNIO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #58	Recorrido en obra
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #59	20 DE JUNIO DE 2025

Tabla 9 Comites mayo-junio

10.2. CONTROL DE PERSONAL

10.2.1. Relación de personal

CANT	CARGO	PROFESIONAL
1	Director de Obra	Yefer Hernando Cuevas Montoya
1	Residente de Obra	Armando Ibáñez Vásquez
1	Residente SST PAGA	Jesica González Upegui
1	Residente Social	Luz Angélica Moreno Martínez

. Tabla 8 Informacion del personal

11. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

11.1. Correspondencia enviada

En documento anexo se relaciona toda la correspondencia enviada se adjunta en el informe mensual de cada periodo.

11.2. Correspondencia recibida

En documento anexo se relaciona toda la correspondencia enviada se adjunta en el informe mensual de cada periodo.

12. COMPONENTE TÉCNICO

12.1. INFORMES SEMANALES DE OBRA

Durante el presente periodo se generaron dos informes semanales en los cuales se registran las actividades adelantadas durante la semana. Los informes adjuntos al presente informe son los siguientes:

INFORME	PERIODO
53	Semanal del 25 de Abril al 2de Mayo de 2025
54	Semanal del 02 de Mayo al 09 de Mayo de 2025
55	Semanal del 10 de Mayo al 23 de Mayo de 2025
56	Semanal del 24 de Mayo al 30 de Mayo de 2025
57	Semanal del 31 de Mayo al 06 de Junio de 2025
58	Semanal del 07 de Junio al 13 de Junio de 2025
59	Semanal del 14 de Junio al 20 de Junio de 2025
60	Semanal del 21 de Junio al 27 de Junio de 2025

Tabla 9 Informacion Semanales Mayo-Junio

12.2. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el presente periodo se continuaron con las actividades de ejecución de obra; en el presente informe se adjuntan en el anexo las actividades y seguimiento realizado a las actividades y a su impacto ambiental.

12.3. GESTIÓN SOCIAL

Durante el presente periodo el contratista de obra continuo con el desarrollo de las actividades de componente social según cronograma presentado, las actividades adelantadas por parte de la profesional Social y la trazabilidad del seguimiento a los compromisos se adjuntan al presente informe. Los informes del componente social se adjuntan como anexo.

12.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En el período se realizaron ensayos a la compresión del concreto para los concretos estructurales mediante el laboratorio LECIV SAS, se realizaron laboratorios de soldaduras con el laboratorio CONSTRUINSPEC.

12.5. INFORMES SST

En el presente mes de actividades en obra se registró el seguimiento al personal que ingreso a las obras y a los colaboradores que laboraron durante todo el periodo correspondiente. Los informes de seguimiento de Salud y Seguridad en el Trabajo SST se adjuntan como anexo al presente informe.

13. COMPONENTE PRESUPUESTAL

13.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Se realizo balance del contrato los recursos contratados a la fecha del presente informe ascienden a la suma de $ 4.225.000.218

13.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS


Durante este periodo no se presentaron obras complementarias.

Firma
Director de Obra
Ing. Yefer Cuevas Montoya

Firma
Residente de obra
Arq. Armando Ibáñez Vásquez



- Foto 1 Se realiza la instalación de sardinel anden facha principal.

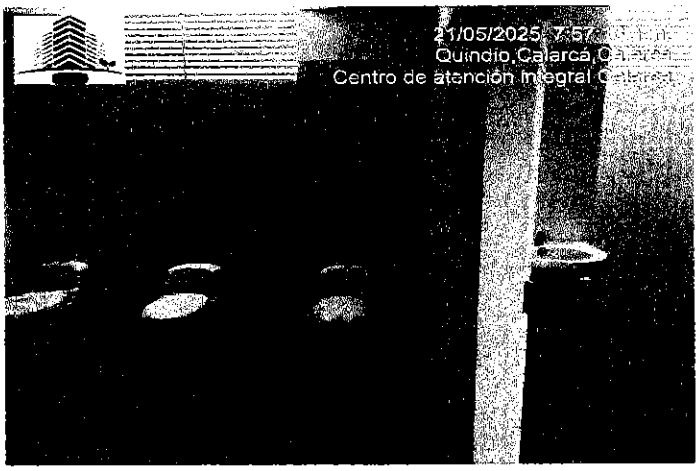

- Foto 2 Se realizo la instalación de sanitarios en Bloque No.2 y No.3



- Foto 3 Continua la instalación de celosía en aluminio en el bloque # 3 acorde a las dimensiones específicas de puertas.



- Foto 4 Instalación lamina fachada posterior bloque 2.



- Foto 5 Instalación pasillo Bloque No.2 Instalación pasillo Bloque No.3




- Foto 6 Se realiza la instalación de enchape de piso pasillos.



- Foto 7 Se realiza instalación de malla electrosoldada y andenes.



- Foto 8 Se realiza los trabajos de pintura en cielo falso interior en los bloques 2 y 3.

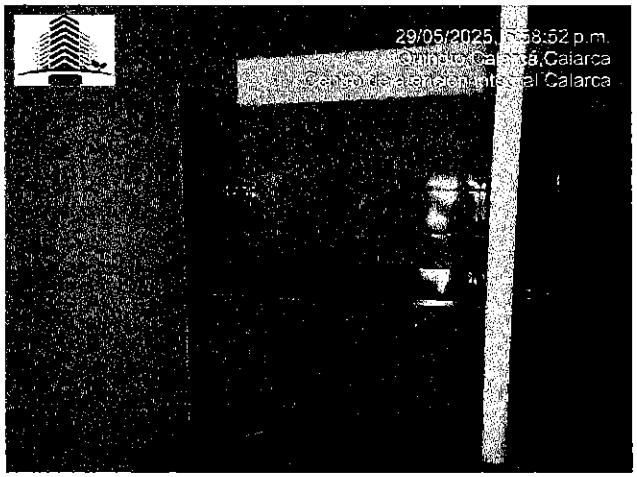


- Foto 9 Se realiza instalación mesón sala de atención No.3, No.4, No.5.



- Foto 10 Se realizo fundida anden bloque No.3.



- Foto 11 Se realizo fundida construcción cárcamo, Bloque No.3

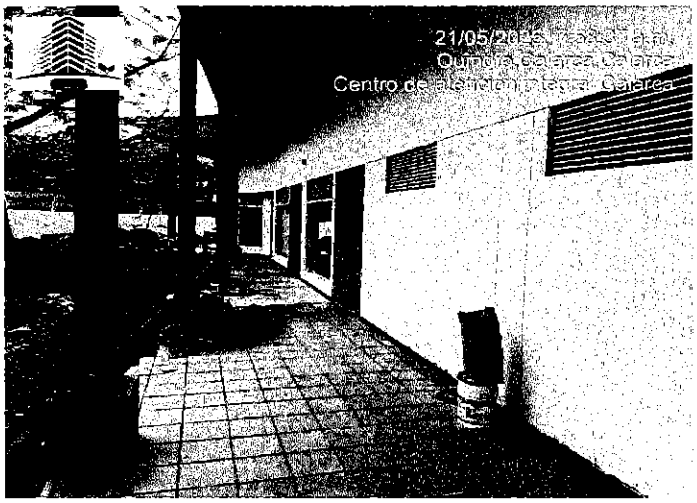

- Foto 12 Instalación pisos pasillos Bloque No.3



Foto 13 Instalación lamina fachada posterior bloque 2, Instalación lamina muros baños de hombres y de mujeres de bloque 2



Foto 14 Instalación pasillo Bloque No.2



Foto 15 Instalación pasillo Bloque No 3.



Foto 16 Se realiza la instalación de enchape de piso salas de atención, baños de bloque 2.

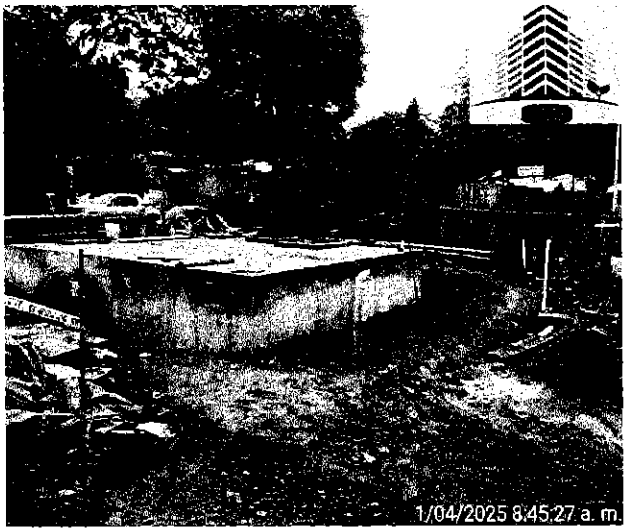


Foto 17 Se finaliza la actividad de llenos con material importado

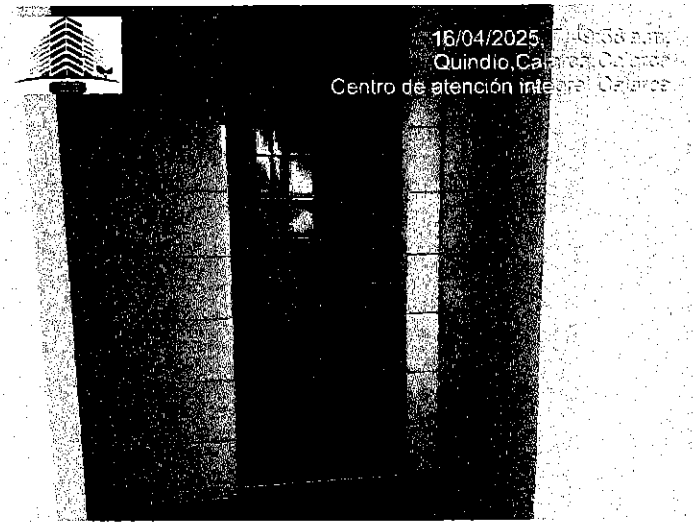


Foto 16 Se instalan enchapes de pared, baños Bloque No.2



Foto 17 La instalación de estructura de muros internos de bloque #2 acorde a planos de puertas y ventanas y fachadas recepción y baños bloque 2, recepción



Foto 18 Se realiza instalación de cielo falso en bloque 2 Sala de espera, Salas de atención de bloque 2, Cafetería bloque 3, Baño cafetería, Cuartos de reciclaje, Cielo raso entre los bloques No.2 y No.3



Foto 19 Instalación lamina fachada posterior bloque 2, Instalación lamina muros baños de hombres y de mujeres de bloque 2.



Foto 20 Instalación pasillo Bloque No.2, Instalación pasillo Bloque No.3

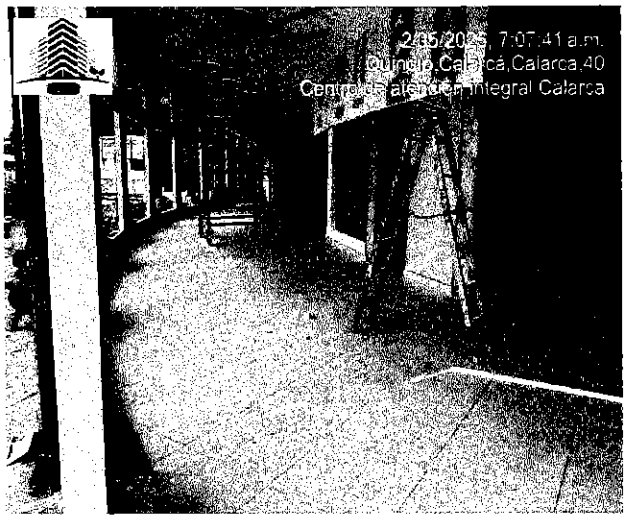


Foto 21 Se realiza la instalación de enchape de piso salas de atención, baños de bloque 2.



Foto 24 Se realizo lleno con material importado.

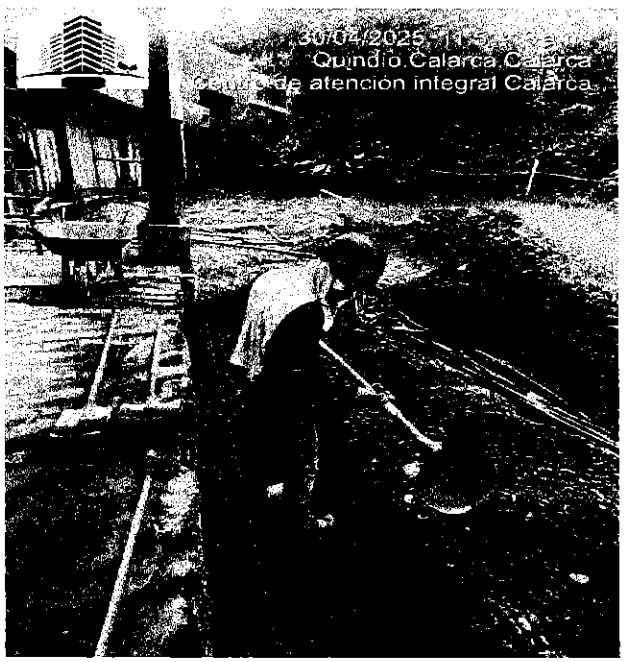


Foto 25 Se realizo excavación cárcamo aguas lluvias, Se realizo reboce cuarto de maquina, Se realizo excavación instalación Bordillo anden



- Foto 1 Se realiza la instalación de loseta táctil guia anden costado bloque N°3.



- Foto 2 Se realizo la instalación de rejilla sobre carcamo en Bloque No.2 y No.3



- Foto 3 Continua la instalación de celosía en aluminio en el bloque # 3 acorde a las dimensiones específicas de puertas.




- Foto 4 Instalación lamina en puertas ingreso posterior bloque N°3.




- Foto 5 Acabado estuco en pedestal pasillo Bloque No.3




- Foto 6 7 Acabado pintura en pedestal pasillo Bloque No.2

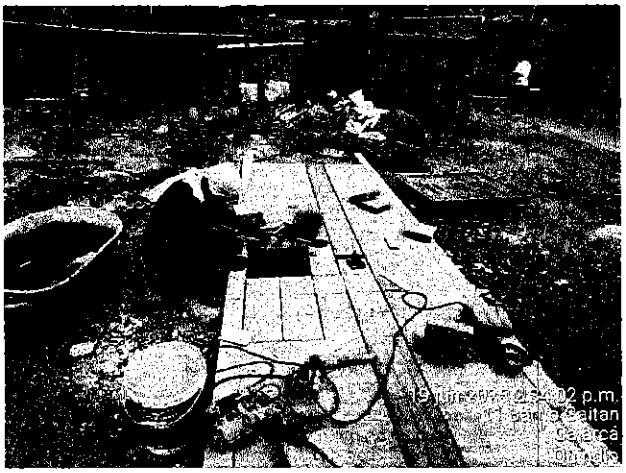

- Foto 8 Se realiza la instalación de loseta táctil guía y alerta en anden sendero peatonal.

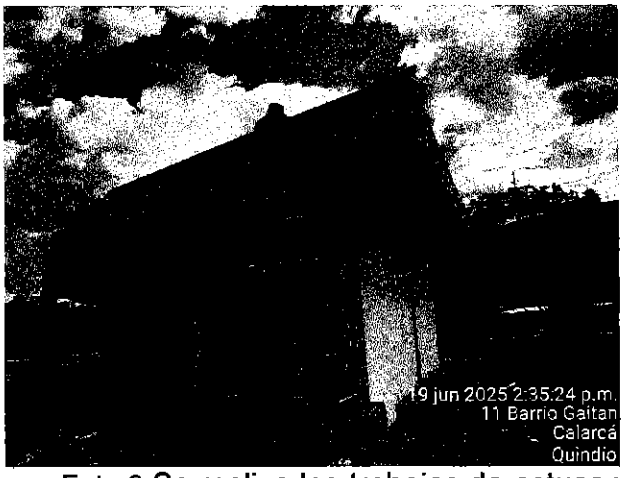


- Foto 9 Se realiza los trabajos de estuco y pintura en mampara en los bloques 2 y 3.

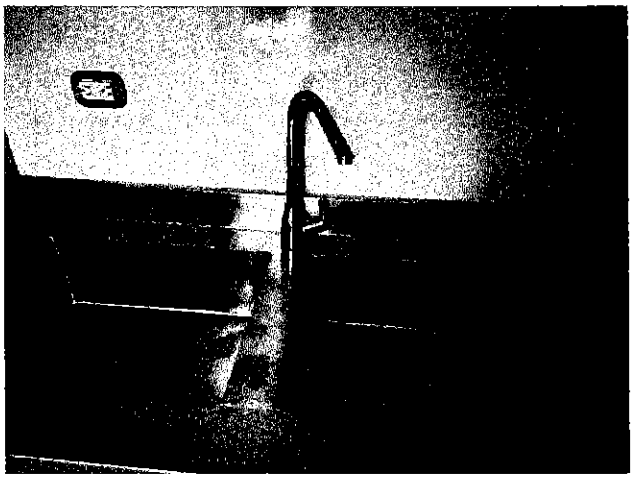

- Foto 10 Se realiza instalación desagüe y grifería en mesón sala de atención No.1. No.2 No.3, No.4, No.5.



- Foto 11 Se realizo instalación loseta tactil anden bloque No.3.

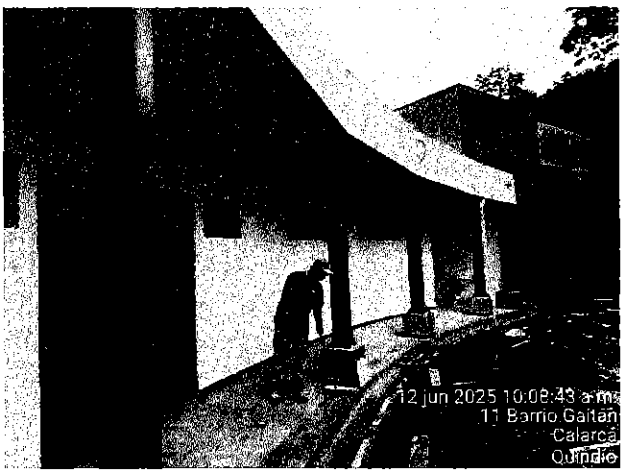

- Foto 12 Se realizo instalación de rejilla sobre cárcamo, Bloque No.2



- Foto 13 Instalación pisos pasillos Bloque No.3

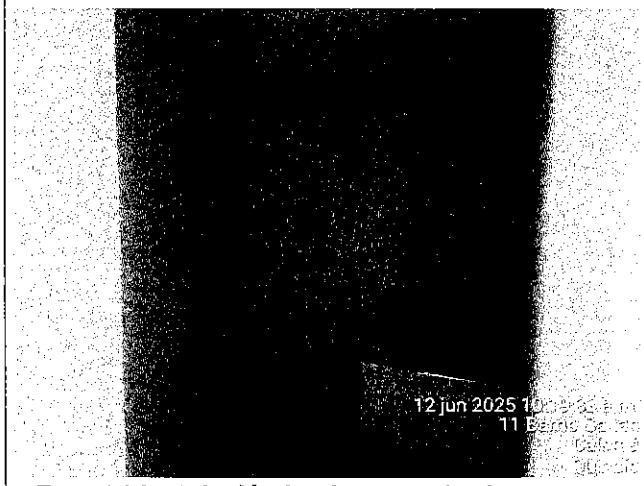


Foto 14 Instalación lamina y acabado estuco y pintura muros cuarto aseo de bloque 2

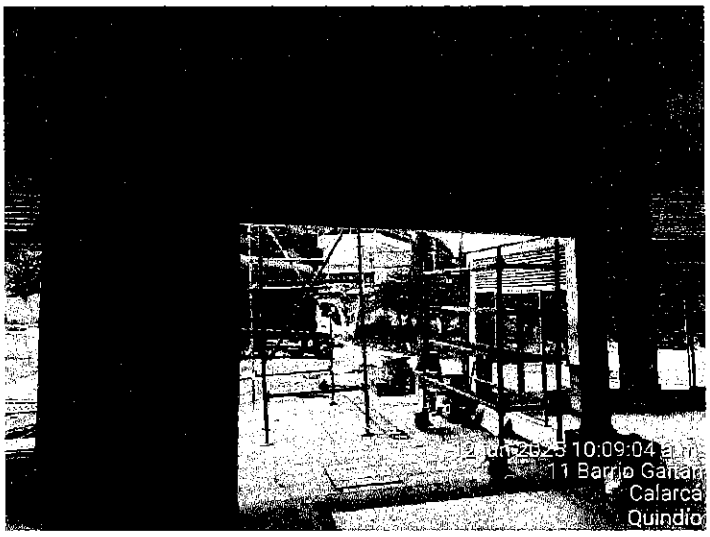


Foto 15 Instalación lamina y acabado estuco y pintura pasillo entre Bloque No.2 y 3



Foto 16 Acabado de pintura en muros fachadas pasillo Bloque No 2.



Foto 16 17 Acabado de pintura en muros fachadas pasillo Bloque No 2.



Foto 17 Continuan con acabado estuco y pintura a nivel de mampara cubierta



Foto 18 Se continúan con excavación, instalación ducteria eléctrica de acometida Bloque No.2



Foto 19 Se continúan con excavación, instalación ducteria eléctrica de acometida Bloque No.3



Foto 20 Se realiza instalación de luminarias emergencia en los bloques No.2 y No.3

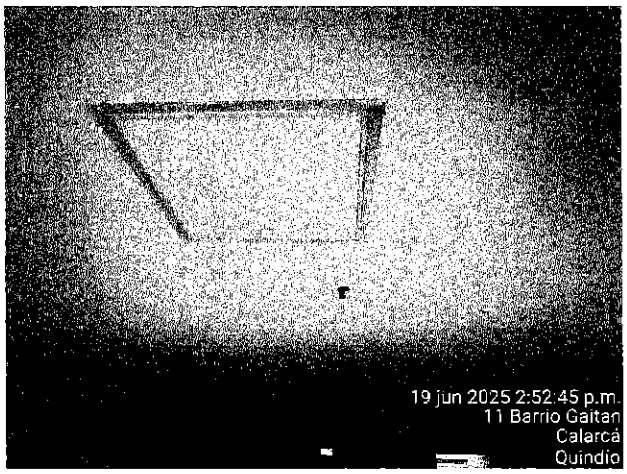


Foto 21 Instalación de luminarias panel led 60x60 en bloque 2 y 3



Foto 22 Construcción de caja eléctrica R06 junto poste de transformador.



Foto 23 Se realiza la instalación de poste para transformador.



Foto 24 Se realizo instalación para acometida principal.



Foto 25 Se realizo instalación de transformador.

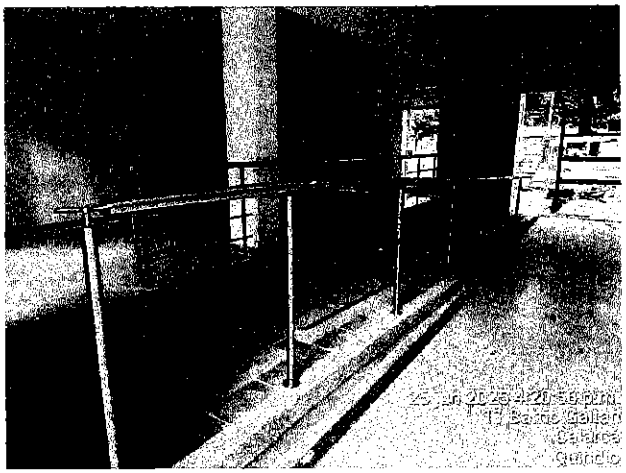


Foto 26 Se inicia instalación de barandas en acero inoxidable

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141154911761

(415)7707212489984(8020) 000014115491176 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 1 0 9 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 46 143 36

42. Correo electrónico comprasquindiojh@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 9 4 3 2 2 5	3 1 4 2 6 4 5 9 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 5 2 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CUEVAS MONTOYA YEFER HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: [illegible] 2025 01:53:18PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141154911761

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 1 0 9 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéfico	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 4 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 4 2 6	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 4 2 6
81. Hasta	2 0 2 4 1 0 2 6

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 0 %
87. Extranjero privado	0 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. Pais	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141154911761

(415)7707212469984(8020) 000014115491176 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 1 0 9 9	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 1 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 2 2 8 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUEVAS	MONTOYA	YEFER	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 0 0 1 6 4 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANDOVAL	LOPEZ	SERGIO	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141154911761

(415)7707212489984(8020) 000014115491176 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 1 0 9 9	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 9 8 7 9 8	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: HAPIL INGENIERIA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,420,750,109	5 0	2 0 2 3 0 4 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 6 9 3 1 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: JCB CONSULTORIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,420,750,109	5 0	2 0 2 3 0 4 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

6

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO TO DOCUMENTO SIN COSTO

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDIO
Martha Sorely Tobón Alvarez
NOTARIA (E)

Como Notario Primero del Circulo de Calarcá Q., CERTIFICO que la presente es Fiel copia del original que tuve a la vista.
DOY FE. 16 ENE 2025
NOTARIO PRIMERO

ACTA DE CONSORCIADOS No. 3

Reunidos el día **14 *de Enero de 2025*** en la Ciudad de Bogotá en las oficinas del ***CONSORCIO JCB – 006 - QUINDIO*** ubicadas en la Cra 46 #143 - 36, se reunieron ***Javier Eduardo Moreno Prada***, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y en calidad de Representante Legal Suplente de ***JCB CONSULTORIA S.A.S***, ***Luis Carlos Hani Pira***, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y en calidad de Representante Legal de ***HAPIL INGENIERIA S.A.S***, para tratar el tema del cambio de Representante Legal y cambio de Representante Legal Suplente del ***CONSORCIO JCB – 006 - QUINDIO*** del contrato de Obra Pública **No. LP-006-2023.**

1- Llamado de asistencia y verificación del cuórum.
2- Nombramiento del nuevo Representante Legal.
3- Nombramiento del nuevo Representante Legal Suplente.

Desarrollo del Acta.

Se llamó a lista a todos y a cada uno de los integrantes del ***CONSORCIO JCB – 006 - QUINDIO*** y a sus respectivos representantes, verificando que estaban la totalidad de los mismos y de acuerdo con su participación accionaria se verifico la totalidad de la asistencia del 100% a saber:

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	DEFINICIÓN DE LOS ASOCIADOS DEL CONSORCIO
JCB CONSULTORIA S.A.S	***50%***	***ASOCIADO 1***
HAPIL INGENIERIA S.A.S.	***50%***	***ASOCIADO2***

Se procede a designar a ***Yefer Hernando Cuevas Montoya*** como Representante Legal, a ***Sergio Alejandro Sandoval Lopez*** como Representante Legal Suplente del ***CONSORCIO JCB – 006 - QUINDIO***, para la ejecución del contrato de contrato de Obra Pública **No. LP-006-2023,** cuyo objeto es: *"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO."*, lo cual es aceptado por la totalidad de los miembros del consorcio, por ***Yefer Hernando Cuevas Montoya*** y por ***Sergio Alejandro Sandoval Lopez.***

En virtud de lo anterior LAS PARTES ACUERDAN que a partir de la fecha ***Yefer Hernando Cuevas Montoya*** es el Representante Legal y ***Sergio Alejandro Sandoval Lopez*** es el

Representante Legal Suplente del ***CONSORCIO JCB – 006 - QUINDIO***, quedando autorizados y facultados de manera amplia y suficiente para suscribir todos los documentos relacionados con el mismo y demás documentos necesarios para el desarrollo del contrato sin limitación alguna, así como para representar al ***CONSORCIO JCB – 006 – QUINDIO*** judicial o extrajudicialmente, ante cualquier autoridad pública o privada, para todo lo concerniente al desarrollo del contrato de Obra Pública No. **LP-006-2023**, que se desarrolla en el Departamento del Quindío.

Confidencialidad. LAS PARTES, el Representante Legal y el Representante Legal Suplente se comprometen frente a **GOBERNACIÓN DEL QUINDIO** a no utilizar información relacionada con el objeto para propósitos distintos de la ejecución del contrato.

Para constancia se firma por quienes intervienen a los *14* días del mes de *Enero* de *2025.*

Representante Legal Suplente
JCB CONSULTORIA S.A.S
NIT. 901.269.311-1
Javier Eduardo Moreno Prada
C.C. 1.098.779.562 de Bucaramanga
Dirección: Calle 150 No 16-56 CC Cedritos Oficina 308-6 - Bogotá D.C.
Teléfonos: 702 80 90 - 314 2645967
Fax: 601 702 80 90

Como Notario Primero del Círculo de Calarcá Q. CERTIFICO que la presente es Fiel copia del original que tuve a la vista.
DOY FE. 16 ENE 2025
NOTARIO PRIMERO

Representante Legal
HAPIL INGENIERIA S.A.S.
NIT. 830.098.798-0
Luis Carlos Hani Pira
C.C. 79.518.636 DE BOGOTA
Dirección: Cra 46 #143 - 33
Teléfonos: 316 4728237

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDIO
Martha Sorely Tobón Alvarez
NOTARIA (E)

Como Notario Primero del Círculo de Calarcá Q., CERTIFICO que la presente es Fiel copia del original que tuve a la vista.
DOY FE. 16 ENE 2025
NOTARIO PRIMERO

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDIO
Martha Sorely Tobón Alvarez
NOTARIA (E)

Aceptación Representación Legal

Representante Legal
CONSORCIO JCB – 006 – QUINDIO
NIT. 901.721.099-0
Yefer Hernando Cuevas Montoya
C.C. 7.228.304 de Duitama
Dirección: Calle 150 No 16-56 CC Cedritos Oficina 308-6.- Bogotá D.C.
Teléfonos: 601702 80 90- 314 2645967

Aceptación de la Suplencia de Representación Legal

Representante Legal Suplente
CONSORCIO JCB – 006 – QUINDIO
NIT. 901.721.099-0
Sergio Alejandro Sandoval Lopez
C.C. 1.070.016.429 de Cajicá, Cundinamarca
Dirección: Calle 150 No 16-56 CC Cedritos Oficina 308-6 - Bogotá D.C.
Teléfonos: 601702 80 90 – 314 2645967

Notaría 60

385-51288420

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

En el despacho de la Notaría Sesenta del círculo de Bogotá, D.C. el día 2025-01-14 12:17:02 se presentó

CUEVAS MONTOYA YEFER HERNANDO

quien se identificó con la C.C. 7228304

y dijo que reconoce el anterior documento como cierto, y que la firma es de su puño y letra. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas dactilares y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Cod Verificación


X


FIRMA

HENRY CADENA FRANCO
NOTARIO 60 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

Notaría 60 HENRY CADENA FRANCO

PRIMERA COPIA

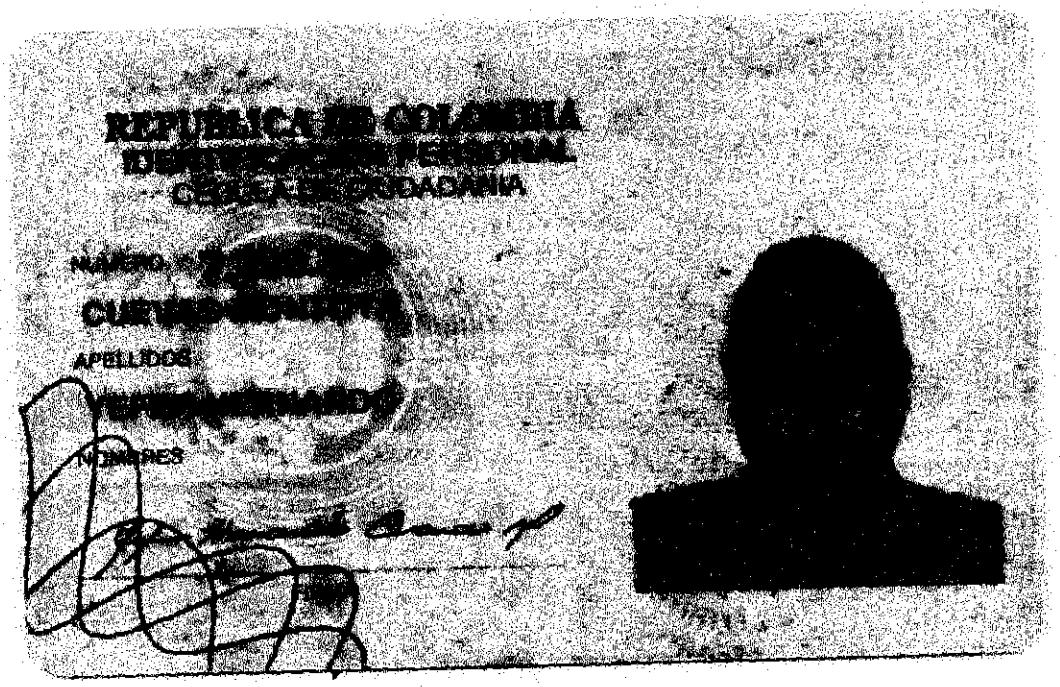
APELLIDOS
NOMBRES

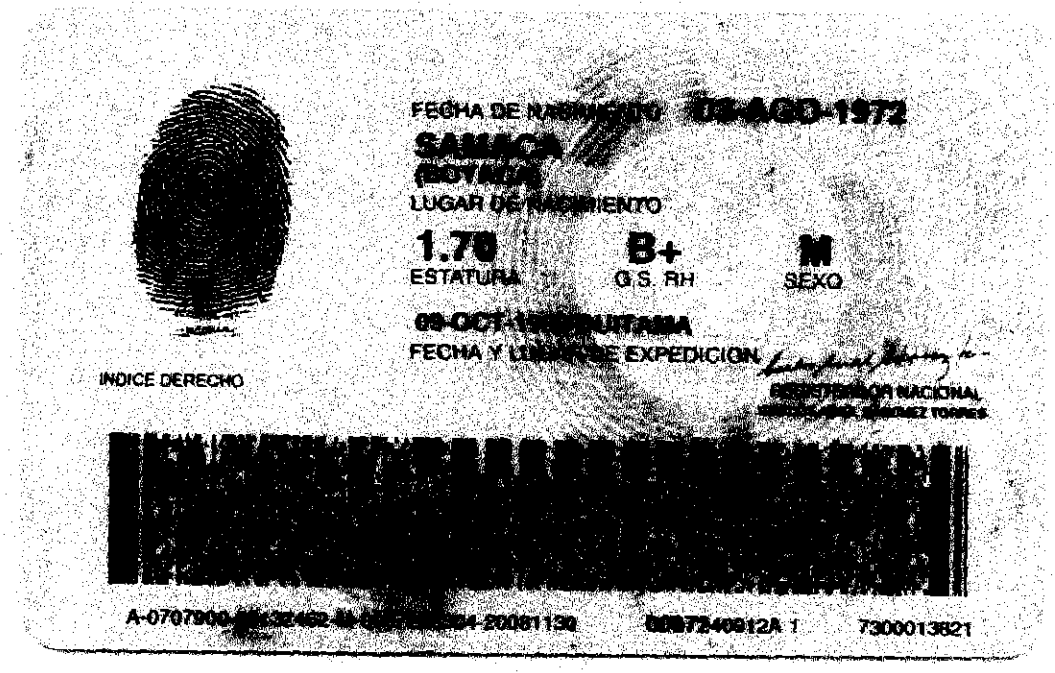
FECHA DE NACIMIENTO
SAMACA
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO		Cr46 143 36	3153468876	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	01/07/2025	87349763	$9.613.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	324.700	0		0		0	6	1.300	0	326.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	455.000	0		0		0	6	1.800	0	456.800	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	160.000	0		0		0	6	700	0	160.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	147.800	0		0		0	6	600	0	148.200	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	85.500	0		0		0	6	400	0	85.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.321.100	0	0	0	0	6	5.100	0	1.326.200	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.156.900	0	0	0	0	6	8.300	0	2.165.200	8
231001	Colfondos	800227940-6	937.400	0	0	0	0	6	3.600	0	941.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	867.800	0	0	0	0	6	3.400	0	871.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.926.800				1.926.800	6	7.400	1.934.200			19.268	1.934.200	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	1.193.900	6	4.600	1.198.500	17

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721009-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO		Cr48 143 36	3153488876	recursoshumanos@lvapll.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 col			QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	01/07/2025	87349763	$9.613.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IQE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.172.800	1.177.600
Pensión	4	5.283.200	5.303.600
Riesgos Laborales	1	1.926.800	1.934.200
CCF	1	1.193.900	1.198.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	9.576.700	9.613.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721086-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO		Cr48 143 38	3153488876	recursoshumanos@bapll.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 col			QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-05	E	01/07/2025	67349763	$9.613.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1005253224	ESPINOSA RODRIGUEZ JEFFERSON ANDRES	1	0			6																	230201	1.423.500	227.500	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF43	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1005253301	AGUIRRE VARGAS ANDRES FELIPE	1	0			6																	25-14	1.423.500	227.500	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF43	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1045226484	IBAÑEZ VASQUEZ ARMANDO JOSE	1	0			3																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS010	4.000.000	160.000	14-7	4.000.000	5	278.400	CCF43	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
CC	1070016429	SANDOVAL LOPEZ SERGIO ALEJANDRO	1	0			3	X							X									230301	853.800	136.700	0	0	0	0	EPS005	853.800	34.200	14-7	853.800	5	59.500	CCF43	853.334	23.400	0	0	0	0	0
CC	1070016429	SANDOVAL LOPEZ SERGIO ALEJANDRO	1	0			3								X									230301	1.283.334	205.400	0	0	0	0	EPS005	1.283.334	0	14-7	1.283.334	5	0	CCF43	1.283.334	0	0	0	0	0	0
CC	1070016429	SANDOVAL LOPEZ SERGIO ALEJANDRO	1	0			3											X						230301	1.633.334	261.400	0	0	0	0	EPS005	1.633.334	65.400	14-7	1.633.334	5	0	CCF43	1.633.333	65.400	0	0	0	0	0
CC	1084950597	DELGADO ROJAS RUBEN DARIO	1	0			3	X																230301	106.667	17.100	0	0	0	0	EPS005	106.667	4.300	14-7	106.667	5	7.500	CCF43	146.666	5.000	0	0	0	0	0
CC	1094854305	GONZALEZ UPEGUI YESICA	1	0			3																	230201	1.500.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	64.000	14-7	1.500.000	5	111.400	CCF43	1.500.000	64.000	0	0	0	0	0
CC	1094963628	BOTELO CAITA EDISON FERNANDO	1	0			3								X									230301	1.459.845	233.600	0	0	0	0	EPS037	1.459.845	58.400	14-7	1.459.845	5	101.700	CCF43	1.459.845	58.400	0	0	0	0	0
CC	1097392317	GUEVARA VINASCO EDIER GABRIEL	1	0			3								X									230201	1.459.845	233.600	0	0	0	0	EPS005	1.459.845	58.400	14-7	1.459.845	5	101.700	CCF43	1.459.845	58.400	0	0	0	0	0
CC	1098311862	RODRIGUEZ TOVAR SEBASTIAN	1	0			6	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-7	711.750	5	49.800	CCF43	773.040	31.000	0	0	0	0	0
CC	1130622943	ROJAS URIBE JOHN JAMER	1	0			6																	230301	373.334	59.800	0	0	0	0	EPS005	373.334	15.000	14-7	373.334	5	26.000	CCF43	373.334	15.000	0	0	0	0	0
CC	1130622943	ROJAS URIBE JOHN JAMER	1	0			3								X									230301	2.426.667	388.300	0	0	0	0	EPS005	2.426.667	0	14-7	2.426.667	5	0	CCF43	2.426.667	0	0	0	0	0	0
CC	12603542	FERNANDEZ TERRAZA LUIS RAFAEL	1	0			6	X							X									231001	2.359.723	377.400	0	0	0	0	EPS002	2.359.723	94.400	14-7	2.359.723	5	164.200	CCF43	2.677.400	107.100	0	0	0	0	0
CC	17584286	MESA SEPULVEDA JUAN MANUEL	1	0			3																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF43	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	39481569	MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0			6								X									230301	1.917.500	306.800	0	0	0	0	EPS005	1.917.500	76.700	14-7	1.917.500	5	133.500	CCF43	1.917.500	76.700	0	0	0	0	0
CC	4375568	ARANZALES HOLGUIN JAIRO ARNULFO	1	0			3																	231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS002	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.500	CCF43	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	79335050	CADENA CAMARGO HUGO	1	0			3	X						X										230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-7	711.750	5	49.500	CCF43	803.818	32.200	0	0	0	0	0
CC	87713523	BOTELO HUGO GERMAN	1	0			3								X									230201	2.256.170	361.000	0	0	0	0	EPS002	2.256.170	90.300	14-7	2.256.170	5	157.100	CCF43	2.256.170	90.300	0	0	0	0	0
CC	93406759	LIZCANO CRUZ JOHN FREDY	1	0			3	X							X									230201	1.516.667	242.700	0	0	0	0	EPS037	1.516.667	60.700	14-7	1.516.667	5	105.500	CCF43	1.788.611	72.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN A. ES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7228304
DESDE JUNIO 2025 HASTA JUNIO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901269311
ÓN SOCIAL:			JCB CONSULTORIA SAS
IPIO.	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
	CALLE 150 18 66 LOCAL 1074 TELÉFONO:		7028090
TE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE.		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA.		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	7228304
APELLIDOS.	CUEVAS MONTOYA NOMBRES.	YEFER HERNANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:	NO
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR.	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN.	NO
TIPO DE SALARIO.	FIJO	
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI

| | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721089-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO		Cr46 143 36	3153458876	recursoshumanos@hapit.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 col			QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	26/07/2025	88073148	$4,766,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	120.700	0		0		0	3	300	0	121.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	233.000	0		0		0	3	500	0	233.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	160.000	0		0		0	3	300	0	160.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. B.A. MOV	900156264-2	13.300	0		0		0	3	100	0	13.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800220739-0	689.000	0	0	0	0	3	1.700	0	690.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	850.300	0	0	0	0	3	1.600	0	851.900	4
231001	Colfondos	800227940-9	130.700	0	0	0	0	3	300	0	131.000	1
25-14	Colpensiones	800336004-7	670.400	0	0	0	0	3	1.300	0	671.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.016.300				1.016.300	3	1.900	1.018.200			10.163	1.018.200	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	616.400	3	1.200	617.600	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721089-0	CONSORCIO JCB - 008 QUINDIO	Cr46 143 36	3153468876	recursoshumanos@hepll.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 col			QUINDIO	CALARCÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	26/07/2025	88073148	$4.786.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	584.000	585.400
Pensión	4	2.540.400	2.545.300
Riesgos Laborales	1	1.016.300	1.016.200
CCF	1	616.400	617.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.757.100	4.786.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721009-0	CONSORCIO JCB - 005 QUINDIO		Cr46 143 38	3153488878	recursoshumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 11 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-08	E	25/07/2025	88073148	$4.766.500

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Suspensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1048226484	IBAREZ VASQUEZ ARMANDO JOSE	1	0		8																	25-14	4,000,000	640,000	0	0	0	0	EPS010	4,000,000	160,000	14-7	4,000,000	5	278,400	CCF43	4,000,000	160,000	0	0	0	0	0
CC	1130622943	ROJAS URIBE JOHN JAMER	1	0		8	X																230301	466,667	74,700	0	0	0	0	EPS005	466,667	18,700	14-7	466,667	5	32,500	CCF43	822,223	24,900	0	0	0	0	0
CC	17594268	MESA SEPULVEDA JUAN MANUEL	1	0		8																	230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-7	2,000,000	5	139,000	CCF43	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
CC	38461569	MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0		8																	230301	237,250	38,000	0	0	0	0	EPS005	237,250	9,500	14-7	237,250	5	16,500	CCF43	237,250	9,500	0	0	0	0	0
CC	38461569	MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0		8										X							230301	1,186,250	189,800	0	0	0	0	EPS005	1,186,250	0	14-7	1,186,250	5	0	CCF43	1,186,250	0	0	0	0	0	0
CC	1094954305	GONZALEZ UPEGUI YESICA	1	0		8																	230201	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS005	1,600,000	64,000	14-7	1,600,000	5	111,400	CCF43	1,600,000	64,000	0	0	0	0	0
CC	1005253301	AGUIRRE VARGAS ANDRES FELIPE	1	0		8	X																25-14	189,800	30,400	0	0	0	0	EPS005	189,800	7,600	14-7	189,800	5	13,300	CCF43	344,012	13,300	0	0	0	0	0
CC	1097392317	QUEVARA VINASCO EDIER GABRIEL	1	0		8																	230201	1,328,500	212,500	0	0	0	0	EPS005	1,328,500	53,200	14-7	1,328,500	5	92,500	CCF43	1,328,500	53,200	0	0	0	0	0
CC	1097392317	QUEVARA VINASCO EDIER GABRIEL	1	0		8										X							230201	94,900	15,200	0	0	0	0	EPS005	94,900	0	14-7	94,900	5	0	CCF43	94,900	0	0	0	0	0	0
CC	1094963625	BOTELO CAITA EDISON FERNANDO	1	0		8																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-7	1,423,500	5	98,100	CCF43	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	87713623	BOTELO HUGO DEIMAN	1	0		8																	230201	2,200,000	352,000	0	0	0	0	EPS002	2,200,000	88,000	14-7	2,200,000	5	153,200	CCF43	2,200,000	88,000	0	0	0	0	0
CC	4375668	ARANZALES HOLGUIN JAIRO ARNULFO	1	0		8	X																231001	816,667	130,700	0	0	0	0	EPS002	816,667	32,700	14-7	816,667	5	56,000	CCF43	1,210,417	40,500	0	0	0	0	0
CC	1005253224	ESPINOSA RODRIGUEZ JEFFERSON ANDRES	1	0		8	X																230201	332,150	53,200	0	0	0	0	EPS041	332,150	13,300	14-7	332,150	5	23,200	CCF43	436,936	17,500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7228304
DESDE JULIO 2025 HASTA JULIO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901269311
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JCB CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.T.C.	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 150 18 68 LOCAL 1074	TELÉFONO:	7228308
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7228304
APELLIDOS:	CUEVAS MONTOYA	NOMBRES:	YEFER HERNANDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.T.C.	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7977214127	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	Julio - 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	Julio - 2025	FECHA DE PAGO:	03/07/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	JCB SAS - - 14 - 009

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES			
																PENSIÓN										SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																			PSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 4.500.000																25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.500.000		$ 313.200	30	$ 4.500.000	CCF21-CAFAM	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.393.200

Entregado por:

Recibido por:

Certificado
Bancario

Viernes, 13 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO JCB 006 QUINDIO identificado(a) con NIT 901721099, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19300001864	2023/06/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
NIT.901.721.099-0

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALY DE APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003

Señores
Gobernación del Quindío
CIUDAD

REF: **Contrato suscrito entre Gobernación del Quindío y Consorcio JCB 006 Quindio, Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTEO DEL QUINDIO.**

Yo, **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA** identificado con Cedula de Ciudadanía No.7.228.304 de Duitama , en calidad de representante legal - Suplente del CONSORCIO JCB 006 QUINDIO y **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** identificada con cedula de Ciudadanía No.36.576.270, en calidad de contador público del CONSORCIO JCB 006 QUINDIO, DECLARAN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que el CONSORCIO JCB 006 QUINDIO ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los aportes del mes de junio de 2025, con las Empresas Promotoras de Salud EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de julio de 2025.

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
Representante Legal -
C.C. 7.228.304 de Duitama
CONSORCIO JCB 006 QUINDIO

ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA
Contador Público
T.P. No.81932-T





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1972
SAN SEBASTIAN BUENAVIST
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO


17-MAY-1991 SAN SEBASTIAN BUENAVIST
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RONGITO LOPEZ



A-1500102-47142472-F-0035576270-20000201 07883060318 02 203576542


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
81932-T
FECHA 08/11/97

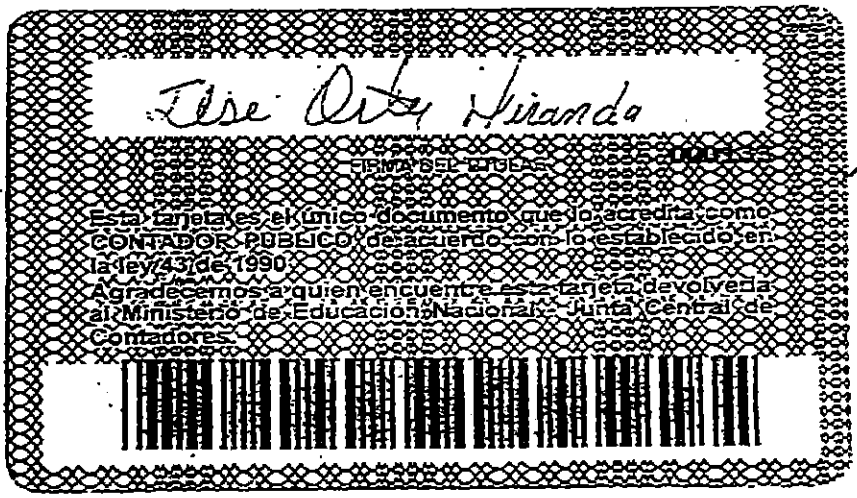
Elsa Ortiz Miranda
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 4 9 6 4 0 6 9 7 8 6 0 8 1 2 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36576270 de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 81932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Valerio Contreras Carrillo
Revisor Fiscal.
Especialista en Alta Gerencia

VAL-2025-037

VALERIO CONTRERAS CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía 11.431.393 expedida en Facatativá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **HAPIL INGENIERIA S.A.S. NIT.830.098.798-0** Por medio de la presente

CERTIFICO QUE

HAPIL INGENIERIA S.A.S. NIT.830.098.798-0 ha cumplido en los últimos seis meses, con corte de nómina al **mes de junio de 2025**, quedando a **PAZ Y SALVO**, con el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 10 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

La presente certificación se firma en Bogotá, el 3 de julio de 2025 a solicitud del interesado.

VALERIO CONTRERAS CARRILLO
Revisor Fiscal.
Tarjeta Professional N. 95533-T

Bogotá: carrera 14 No. 94 A-44 OF. 401. Celular: 3183307179
Email: valeriocontrerasc@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 11.431.393
CONTRERAS CARRILLO

APELLIDOS

VALERIO

NOMBRES

FIRMA

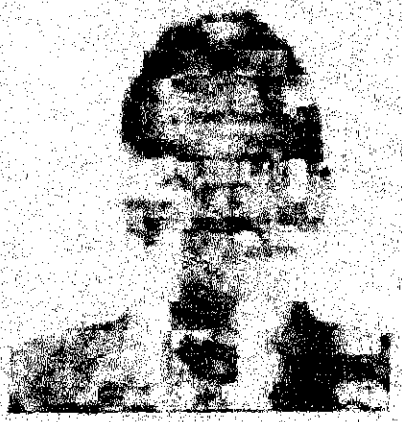




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1963
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-SEP-1981 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500750-00196302-M-0011431393-20091119 0018120047A 1 1490324351

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

95533-T



VALERIO
CONTRERAS CARRILLO
C.C. 11451393
RES. INSCRIPCION 173 DEL 26/09/2003
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

388009 **105342**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 3 3 E 2 F 3 B 8 E D 7 0 A 8 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VALERIO CONTRERAS CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11431393 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 95533-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JCB CONSULTORÍA S.A.S.
Nit. No. 901.269.311-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo **ANA MILENA MONSALVE MORENO,** identificada con Cedula de Ciudadanía **No. 63.484.572**, en calidad de representante legal de la empresa **JCB CONSULTORÍA S.A.S**. con **Nit 901.269.311-1 y JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 79.718.265** y Tarjeta Profesional **No. 136824-T** en calidad de revisor fiscal de la misma empresa **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, manifiesta que ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** a la fecha, con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.



Firma
Nombre: ANA MILENA MONSALVE MORENO
Identificación No. 63.484.572
Nit. No. 63.484.572-7




Firma
Nombre: JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA
Identificación No. 79.718.265
Tarjeta Profesional 136824-T

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., **01 de julio de 2025**

Bogotá Calle 150#16-56 Oficina 308-6 Centro Comercial Cedritos Telefax: 7028090-CL: 314-2645967
Correo Electrónico: contabilidad.jcb@hotmail.com





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1975**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.68 ESTATURA **A-** G.S. RH **M** SEXO

05-MAY-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00004241-M-0079718265-20080331 0000109621A 1 1690008719

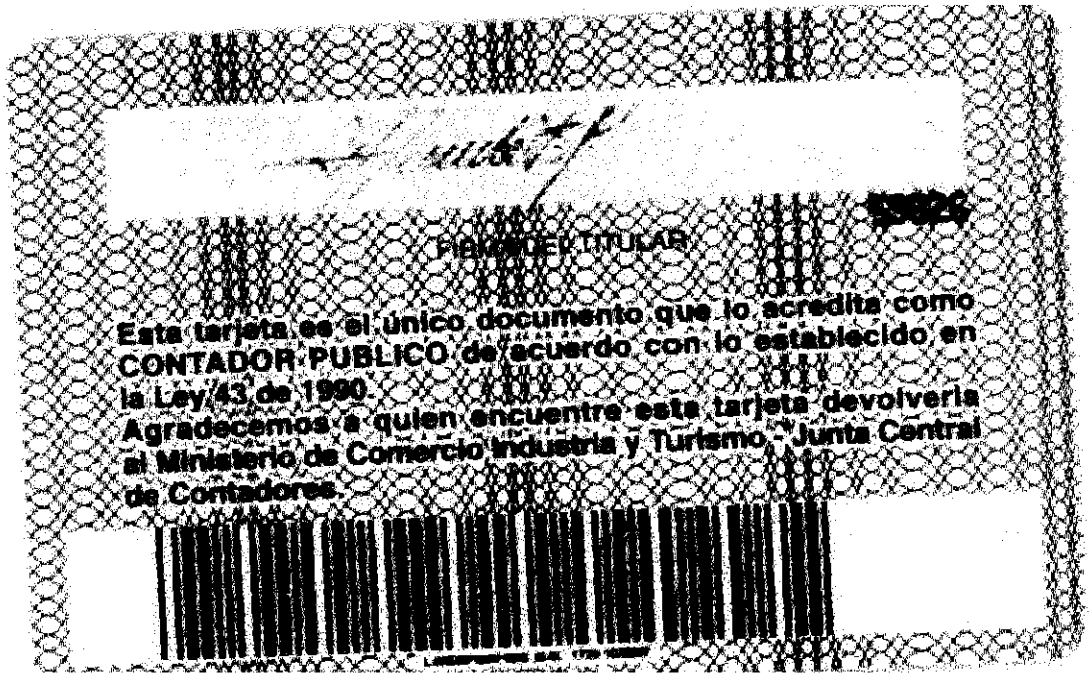


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7F5D8A02C9860D4BB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79718265 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RELACION DE IMPREVISTOS ACTA No.15


Objeto: *"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO*


A continuación, se presenta la relación de actividades realizadas en el periodo, y correspondientes a imprevistos con su respectivas evidencias y costos.

IMPREVISTO 1

Durante el periodo de ejecución correspondiente acta de cobro No.15, se realizó LLENOS MANUALES CON MATERIAL IMPORTADO, COMPACTADOS, en área parqueadero Bloque No.2

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

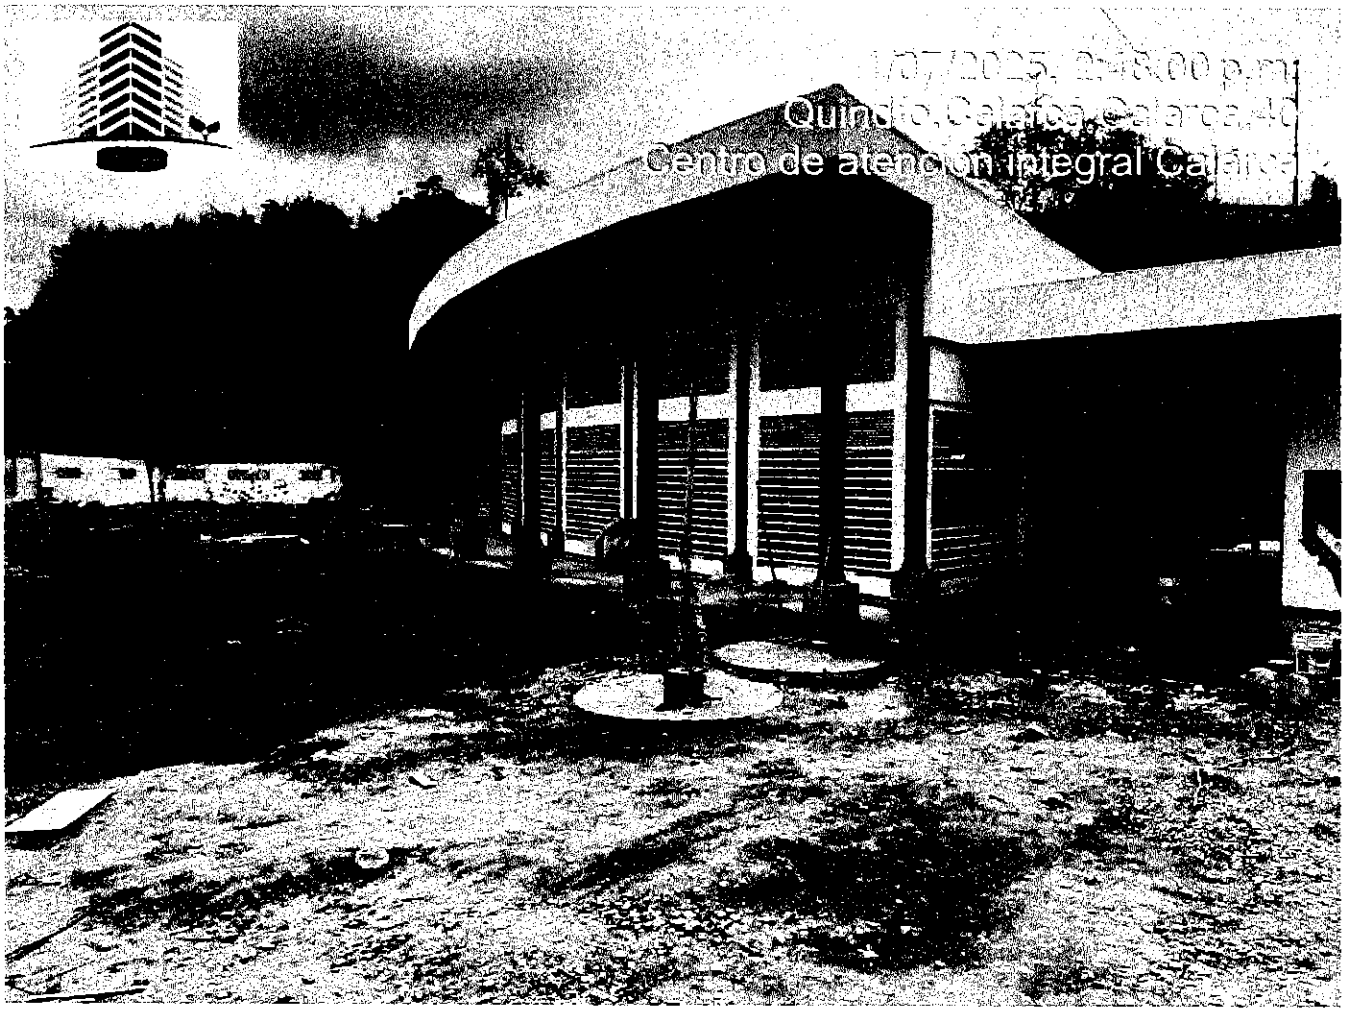

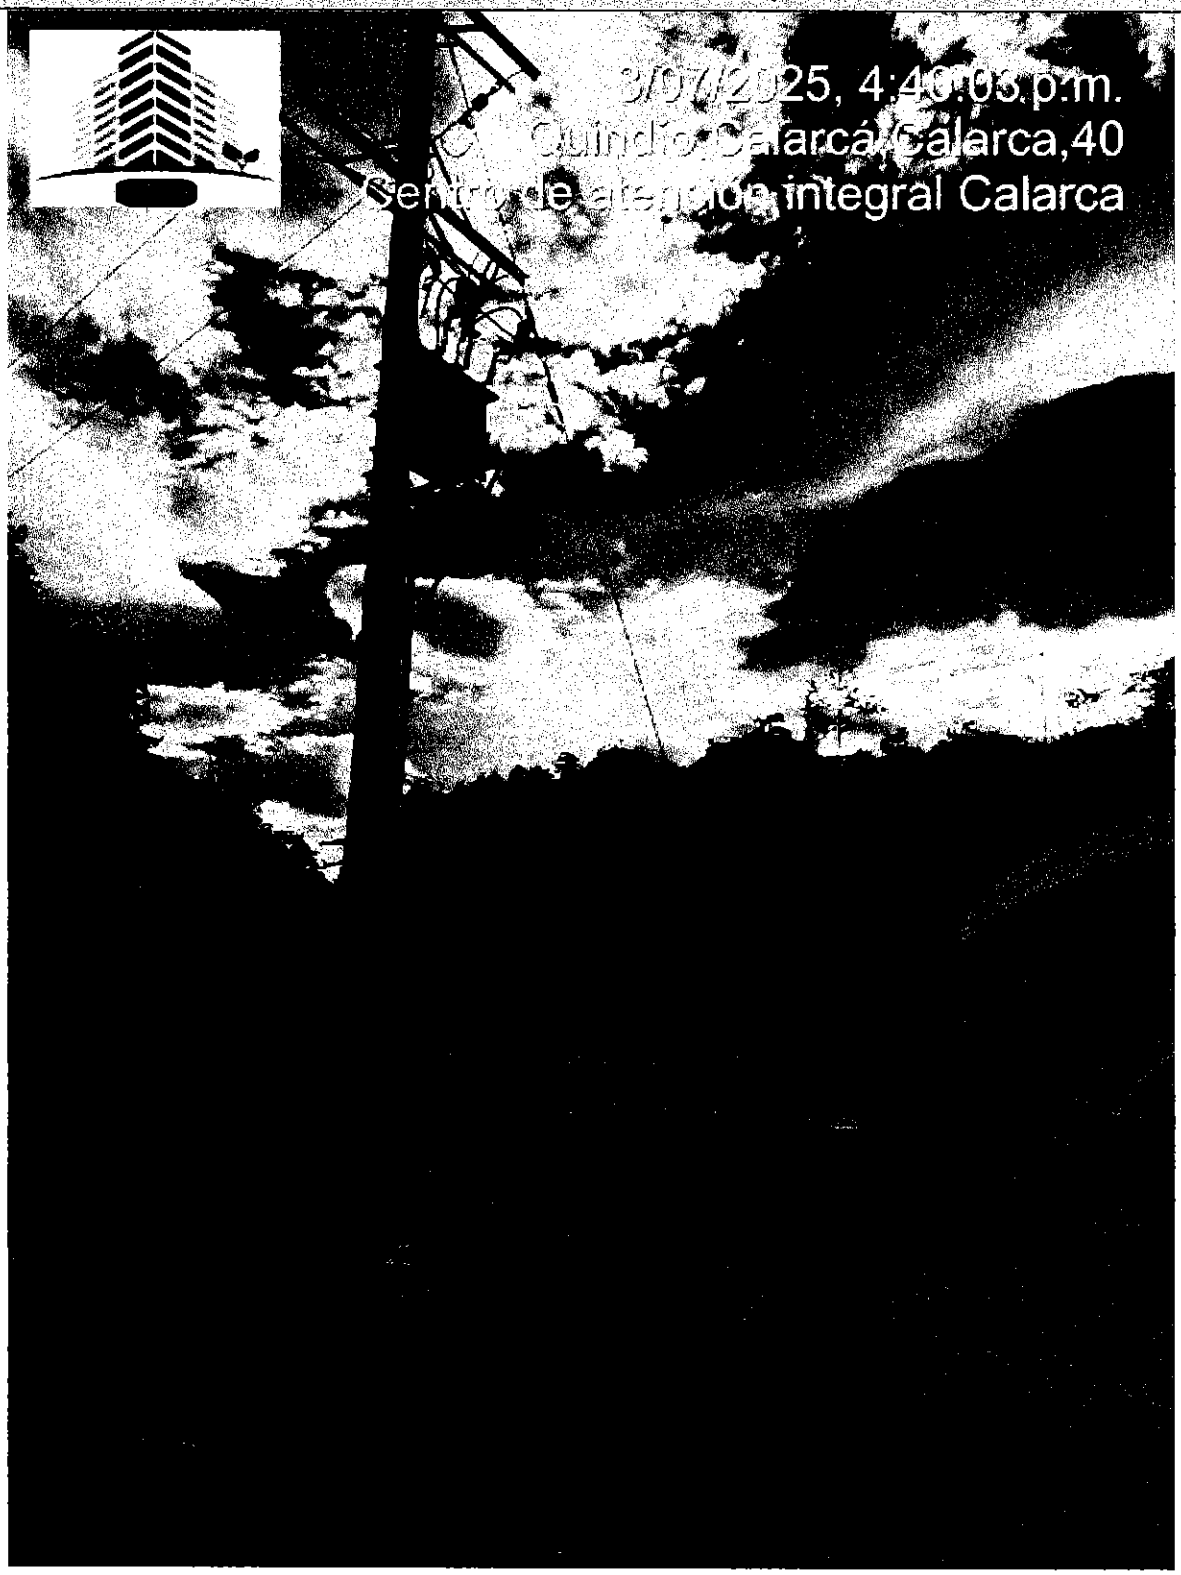
3/07/2025, 4:40:03 p.m.
Quindío, Calarcá, Calarca, 40
Centro de atención integral Calarca

COSTOS IMPREVISTO 1:

ACTIVIDAD EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCIÓN - MANO DE OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR HORA	LLUVIA (HORAS)	VALOR TOTAL
INP 3.07	LLENOS MANUALES CON MATERIAL IMPORTADO, COMPACTADOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	16,10	$ 164.083,00			$ 2.641.951,52
	VALOR TOTAL MANO DE OBRA					$ 2.641.951,52

RESUMEN VALOR IMPREVISTOS	
VALOR TOTAL	$ 4.022.264,00

VALOR: TCUATRO MILLONES VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma


Residente de Obra
Contratista

Residente de Obra
Supervision

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA | Hoja: _____ de: _____ | Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	2,01	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO E=0,12 MTS. NO INCLUYE RETIRO.	Unidad:	M2	Cantidad total:	13,34

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones: Largo	Ancho	Alto	Área / Volumen	Cantidad
	MAS DE JUNIORS DEL 90					13,34
	PLACA ACCESO PRINCIPAL LOTE - RED ACOMETIDA AGUA POTABLE	9,20	0,44		1,0	4,05
	RED ELECTRICA - ACOMETIDA PRINCIPAL	12,20	0,60		1,00	7,32
	CRUCE VIA RED ELECTRICA CAJA 1 - 2	4,70	0,42		1,00	1,97
						
						
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	13,34	

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Fernando Isaac Vasquez

Aprobó a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallace


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA


Hoja: 1 de:
Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	Unidad:	M3	Cantidad total:	2,97

Croquis y récord fotográfico



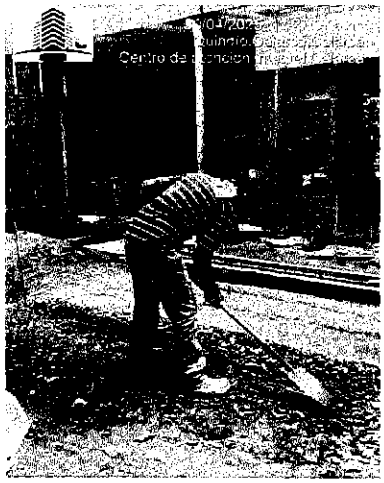

Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	Largo	*Ancho*	*Alto*	*Volúmen*	
MES DE JUNIO 01 DEL 30					**2,97**
BLOQUE No.2					
CARCAMO AGUAS LLUVIAS - FACHADA PRINCIPAL	11,60	0,50	0,15	1,00	0,87
	4,80	0,50	0,15	1,00	0,36
FACHADA PRICIPAL BLOQUE No.3	52,63	0,20	0,10	1,00	1,06
	14,80	0,20	0,10	2,00	0,59
	2,30	0,20	0,10	2,00	0,09

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	4,03
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	3,11
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,96
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,14
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	37,71
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	8,24
	PRESENTE ACTA N°15	2,97

Observaciones:


Contratista
Nombre: Armando Ibanez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA | Hoja: 1 de: | Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	6,07	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL FIJA DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	Unidad:	UND	Cantidad total:	8,00





Croquis y Alcord fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDA	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL
	BAÑES DE JUNTOS DE 80					4,00
	BLOQUE No.1					-
	BAÑO SALA DE ATENCION No.1	1,00			1,00	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.2	1,00			1,00	1,00
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS	1,00			2,00	2,00
	BLOQUE No.1					
	BAÑO SALA DE ATENCION No.3	1,00			1,00	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.4	1,00			1,00	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.5	1,00			1,00	1,00
	BAÑO HOMBRES - BATERIA DE BAÑO	1,00			1,00	1,00
	BAÑO HOMBRES - MUJERES	1,00			1,00	1,00


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	8,00

Observaciones:

Contratista: Ingeniero Civil

Aprobó la Supervisión: Monsalve Ludo Cesar Wallenis

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 6,07

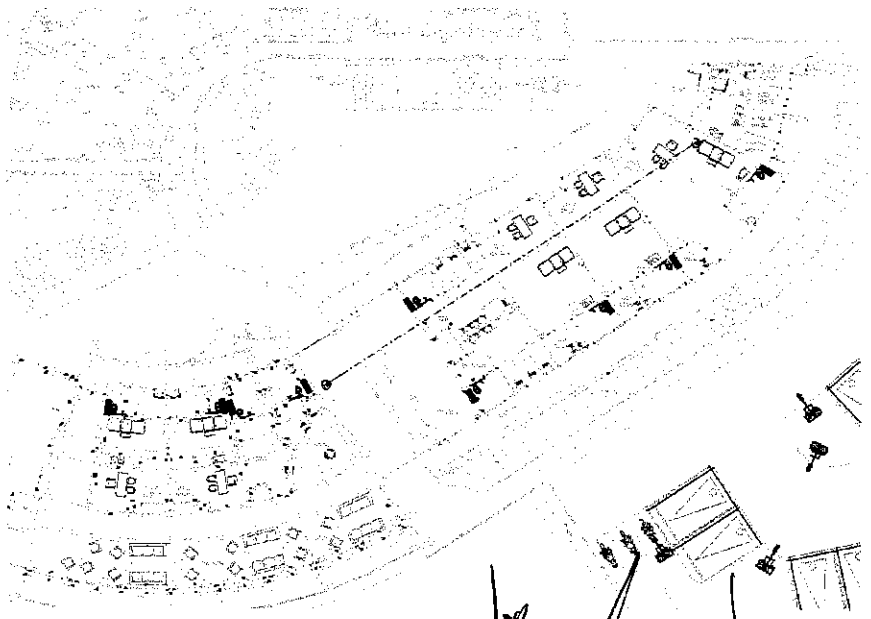


Observaciones:

Contratista: Ingeniero Civil

Aprobó la Supervisión: Monsalve Ludo Cesar Wallenis

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 3,03

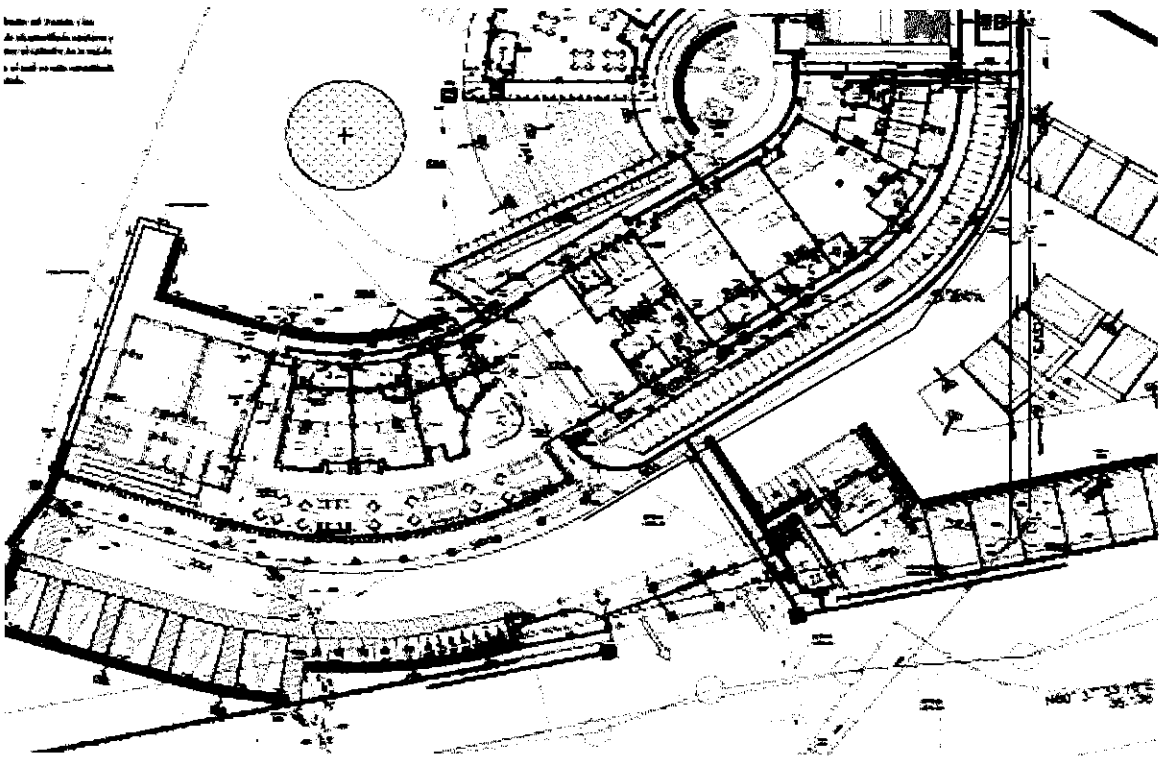

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Emiliano Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Arellanos


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	6,08	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	9,00

Croquis y récord fotográfico

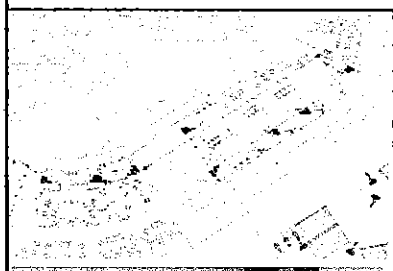

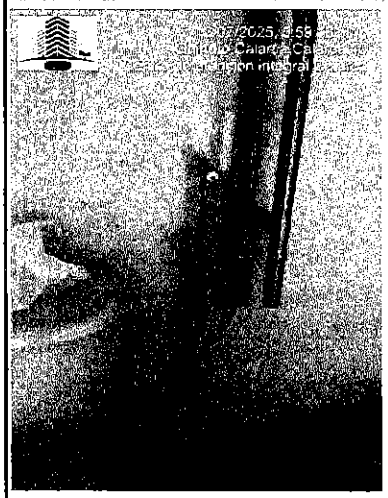



Descripción	Dimensiones				TOTAL
	UNIDA	Ancho	Alto	CANTIDAD	
MES DE JUNIO AL DEL 30					9,00
BLOQUE No.1					
BAÑO SALA DE ATENCION No.1	1,00			1,00	1,00
BAÑO SALA DE ATENCION No.2	1,00			1,00	1,00
BAÑO TALLAS PEQUEÑAS	1,00			2,00	2,00
BLOQUE No.1					
BAÑO SALA DE ATENCION No.3	1,00			1,00	1,00
BAÑO SALA DE ATENCION No.4	1,00			1,00	1,00
BAÑO SALA DE ATENCION No.5	1,00			1,00	1,00
BAÑO HOMBRES - BATERIA DE BAÑO	1,00			1,00	1,00
BAÑO HOMBRES - MUJERES	1,00			1,00	1,00

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°15	9,00

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Jorge Enrique Benitez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 6,08



Observaciones:

Contratista:

Apoyo a la Supervisión:


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA

Hoja: 1 de:
Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	6,17	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 0.98 x 0.6	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	15,74

Croquis y record fotográfico

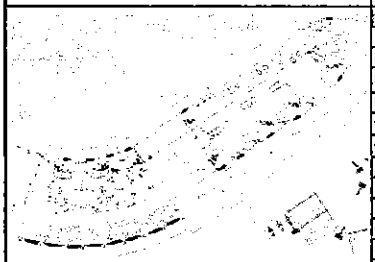



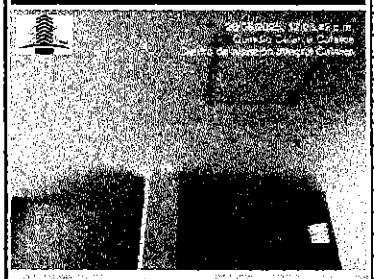



Descripción	Dimensiones				TOTAL UNIDAD
	LONGITUD	Ancho	CATIDAD	AREA CONTRATADA	
MES DE JUNIO DEL 30					**15,74**
BLOQUE No.2 - PUERTAS					
BAÑO SALA DE ATENCION No.1	0,98	0,45	1,00	0,59	0,76
BAÑO SALA DE ATENCION No.2	0,99	0,45	1,00	0,59	0,78
BAÑO TALLAS PEQUEÑAS	0,98	0,45	2,00	0,59	1,52
CUARTO DE ASEO	0,99	0,45	1,00	0,59	0,76
CUARTO TECNICO	0,98	0,45	1,00	0,59	0,76
BLOQUE No.3 - PUERTAS					
BAÑO SALA DE ATENCION No.3	0,98	0,45	2,00	0,59	1,52
BAÑO SALA DE ATENCION No.4	0,98	0,45	2,00	0,59	1,52
BAÑO SALA DE ATENCION No.5	0,98	0,45	2,00	0,59	1,52
BAÑO HOMBRES - BATERIA DE BAÑO	0,99	0,45	1,00	0,59	0,76
BAÑO HOMBRES - MUJERES	0,99	0,45	1,00	0,59	0,76
COCINA	0,98	0,45	1,00	0,59	0,76
CUARTO TECNICO	0,99	0,45	1,00	0,59	0,76
CUARTO DE ASEO No.1	0,99	0,45	1,00	0,59	0,76
CUARTO DE ASEO No.2	0,99	0,45	1,00	0,59	0,79
CUARTO DE ASEO No.3	0,99	0,45	1,00	0,59	0,76
BAÑ - COCINA	0,85	0,45	2,00	0,59	1,30


	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°15	**15,74**

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Fernando Ramírez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 6,17

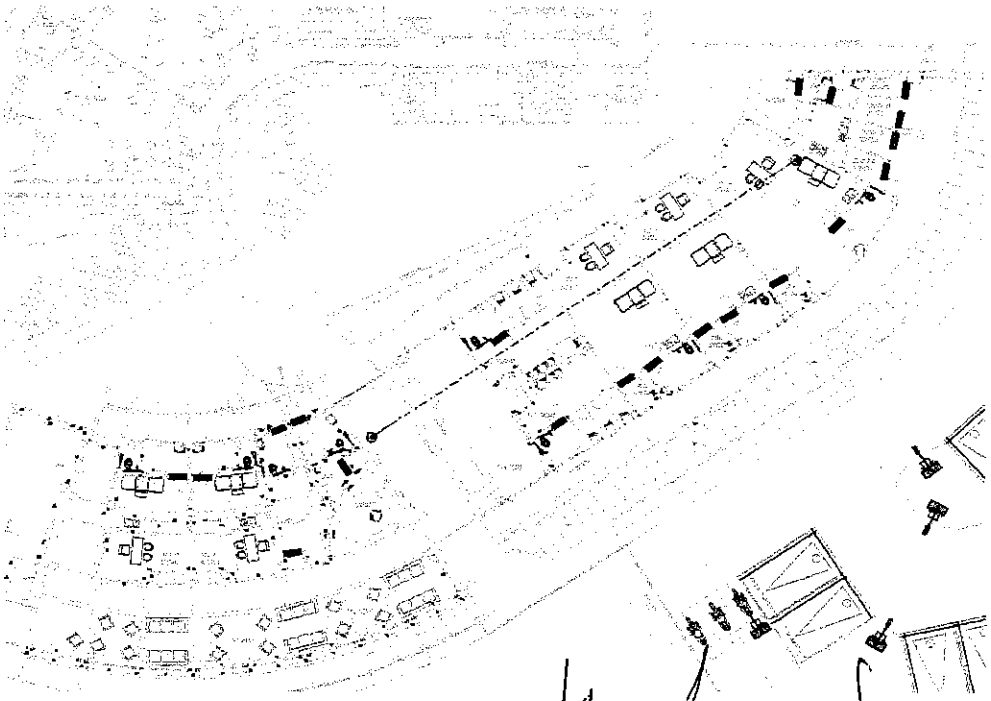

Observaciones:

Contratista:

Aprobo e la Supervisión:
Nombre Julio Cesar Watkins


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA


Hoja: 1 de:
Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


ITEM:	6,19	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.58 x 0.6	Unidad:	UND	Cantidad total:	5,25

Croquis y récord fotográfico



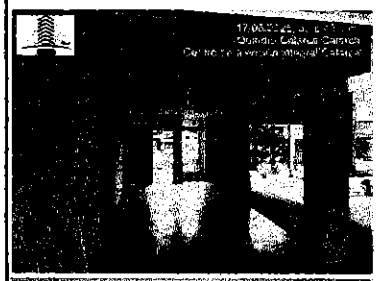



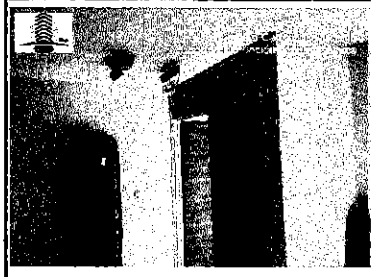

Descripción	Dimensiones				TOTAL UNIDAD
	LONGITUD	Ancho	CATIDAD	AREA CONTRATADA	
MES DE JUNIO/24 DEL 30					5,25
BLOQUE No.2					
SALA DE ATENCION No.1	1,58	0,45	1,00	0,95	0,75
SALA DE ATENCION No.2	1,58	0,45	1,00	0,95	0,75
BLOQUE No.3					
SALA DE ATENCION No.3	1,58	0,45	1,00	0,95	0,75
SALA DE ATENCION No.4	1,58	0,45	1,00	0,95	0,75
SALA DE ATENCION No.5	1,58	0,45	1,00	0,95	0,75
ACCESO BATERIA DE BAÑOS	1,58	0,45	2,00	0,95	1,50

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	5,25

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ramírez Vásquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 6,19



Observaciones:


Contratista:
Nombre: Alejandro Fernando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wellens

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	7,01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	Unidad:	m3	Cantidad total:	7,94





Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			Volumen	Cantidad
		Longitud	Ancho	Alto		
	MES DE MAYO 01 - 30				7,94	
	BLOQUE No.2					
	PLAZOLETA LLEGADA	4,45	4,75	0,15	3,17	1
	PASILLO - RAMPA No.1	10,75	3,68	0,08	3,16	1
	PASILLO ACCESO BAÑOS TALLAS PEQUEÑAS	20,09	1,00	0,08	1,61	1

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	61,69
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	45,95
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	7,29
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	7,29
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	122,22
PRESENTE ACTA N°15	7,94

Observaciones:

Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Interventoría: Nombre: Julio Cesar Valeros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA				Hoja: 2 de: 2 Fecha:	
Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023, CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.					
ITEM:	7,01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	**Unidad:**	m3	**Cantidad total:** 0,00

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 7.01



Observaciones:

Contratista:
Nombre:

Apoyo a la Supervisión
Nombre: Juan Cesar Viveros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	7,02	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (COLOR BEIGE, GRIS CLARO ó BLANCO) - FORMATO 60 x 0.1. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE PARA JUNTA DE 1mm)	**Unidad:**	ML	**Cantidad total:**	94,52

Croquis y récord fotográfico



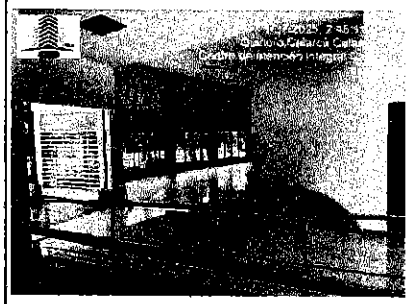

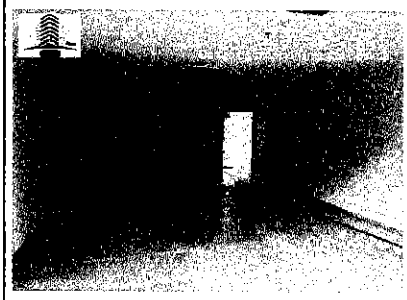

Descripción	*Dimensiones*		*Cantidad*	*Cantidad*
	LONGITUD	*ALTO*		
MES DE JUNIO 01 DEL 30				**94,52**
BLOQUE No.2				
PASILLO FACHADA PRINCIÁL	1,42		8,00	11,36
				0
ACCESO BLOQUE No.2 - No3	2,70		2,00	5,4
	6,64		1,00	6,64
	-			0
ACCESO BAÑOS BLOQUE No.3	9,30		2,00	18,6
	1,58		2,00	3,16
				0
PASILLO ACCESO BAÑOS	1,57		11,00	17,27
	1,18		1,00	1,18
	11,60		2,00	23,6
BLOQUE No.3				
PASILLO ACCESO SALAS DE ATENCION	1,07		1,00	1,07
	1,40		1,00	1,4
	1,67		2,00	3,34
	1,50		1,00	1,5
				0
				0

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**243,17**
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**
PRESENTE ACTA N°15	**94,52**


Observaciones:

Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Interventoría: Nombre: Julio Cesar Valbuena

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 7.02

BLOQUE No.3

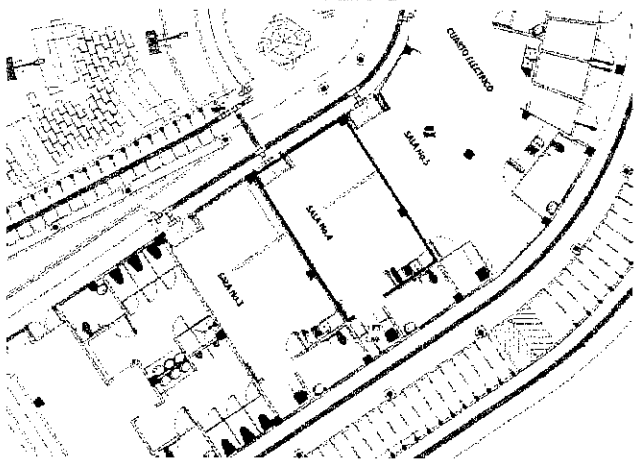

BLOQUE No.2

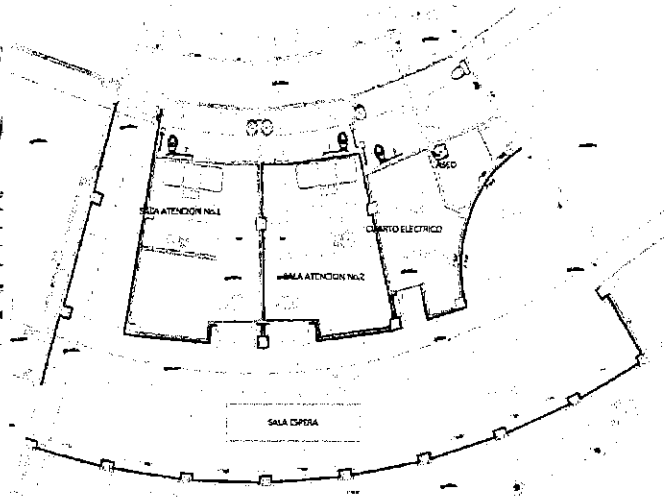

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Williams

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	7,03	MORTERO NIVELACIÓN 1:4 e=3CM	Unidad:	M2	Cantidad total:	160,81

Croquis y récord fotográfico







Descripción	*Dimensiones*				*Cantidad*	*Cantidad*
	LONGITUD	*ALTO*	*ANCHO*	*No. ELEMENTOS*		
MES DE JUNIO 01 DEL 30						160,81
BLOQUE No.2						
PASILLO COMUNICACIÓN BLQOUE No.1 - No.2	9,84		4,75	1,00	1,00	46,79
PLAZOLETA LLEGADA	4,45		4,75	1,00	1,00	21,14
ACCESO PRINCIPAL No.1	4,67		1,65	1,00	1,00	7,71
RAMPA	10,85		3,70	1,00	1,00	40,15
PASILLO FACHADA PRINCIPAL	24,61		1,87	1,00	1,00	46,02


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	236,44
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	294,63
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	142,94
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	674,01
PRESENTE ACTA N°15	160,81

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando [illegible]

Interventoría:
Nombre: Julio Cesar Valteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 7.03

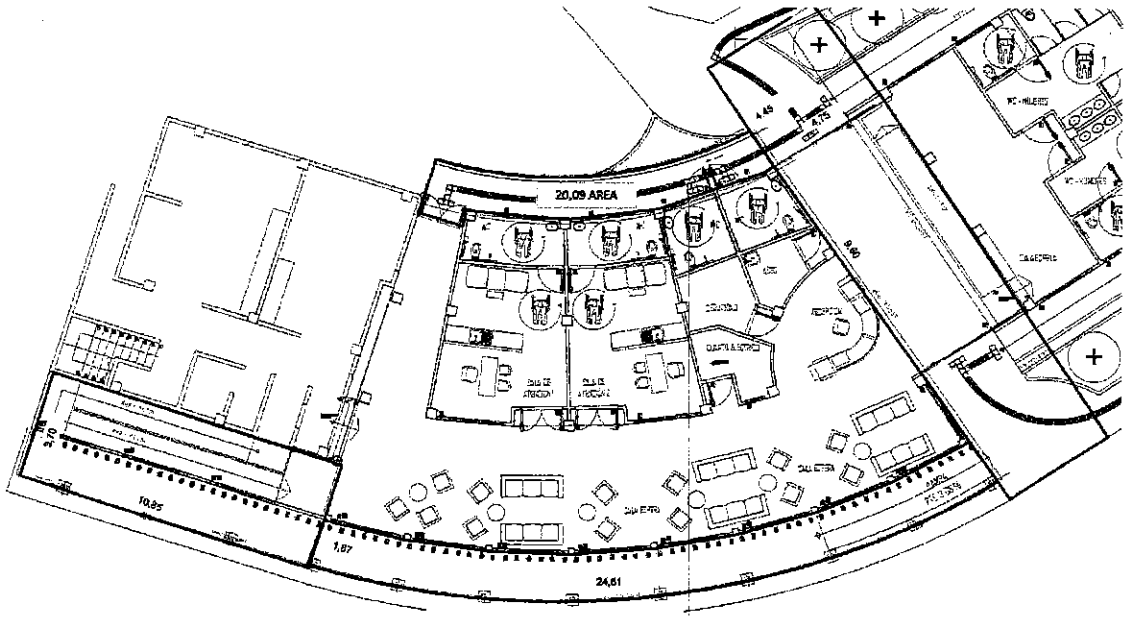

Observaciones:

Contratista:


Apoyo a la Supervisión:

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


ITEM:	7.04	ACABADO PARA SUELO EN PORCELANATO ANTI DESLIZANTE COLOR BEIGE GRIS Y BLANCO - FORMATO 60 x 60, (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE, GRIS ó BLANCO PARA CON JUNTA DE 1mm Y PEGANTE ESPECAL PARA PORCELANATO)	**Unidad:**	m2	**Cantidad total:**	27,84

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones					Cantidad
		Longitud					
	MES DE JUNIO DE DEC 30	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	27,84
	BLOQUE No.2, No.3						
	ACCESO PRINCIPAL	9,60		2,90	1,00	1,00	27,84

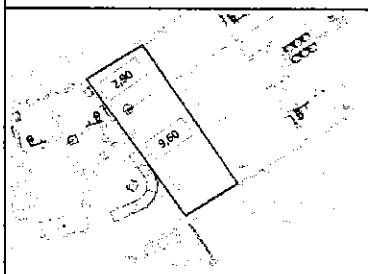



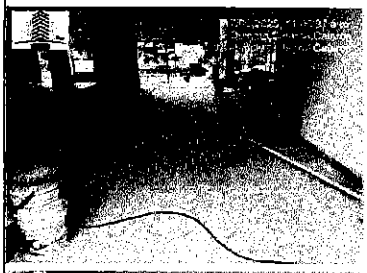

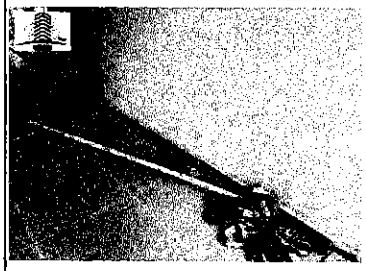

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	243,03
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	226,20
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	469,23
	PRESENTE ACTA N°15	27,84

Observaciones:

Contratista:


Apoyo en Supervisión:

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 6 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	**Unidad:**	m2	**Cantidad total:**	-289,14

Croquis y récord fotográfico

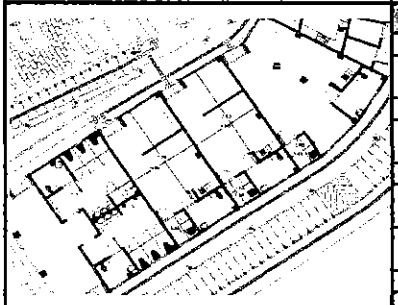





Descripción	Dimensiones Longitud				No. ELEMENTOS	Cantidad
MES DE JUNIO DEL CIELO RASO	LONGITUD	ACTO	ANCHO	CANTIDAD		-289,14
BLOQUE No.3						
SALA DE ATENCION No.3	7,76		4,86	1,00	1,00	37,71
SALA DE ATENCION No.4	7,63		7,85	1,00	1,00	59,9
SALA DE ATENCION No.5	50,92		1,00	1,00	1,00	50,92
CUARTO ELECTRICO	7,24		1,00	1,00	1,00	7,24
DESCUENTO COLUMNA	0,35		0,35	1,00	1,00	-0,12
DESCUENTA COLUMNA	0,35		0,20	1,00	16,00	-1,12
DESCUENTO PAGO EN ACTAS ANTERIORES	443,67		1,00	1,00	1,00	-443,67

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
VIENE MEMORIA 3	350,44
PRESENTE ACTA N°15	61,30

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Ibañez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 6 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1

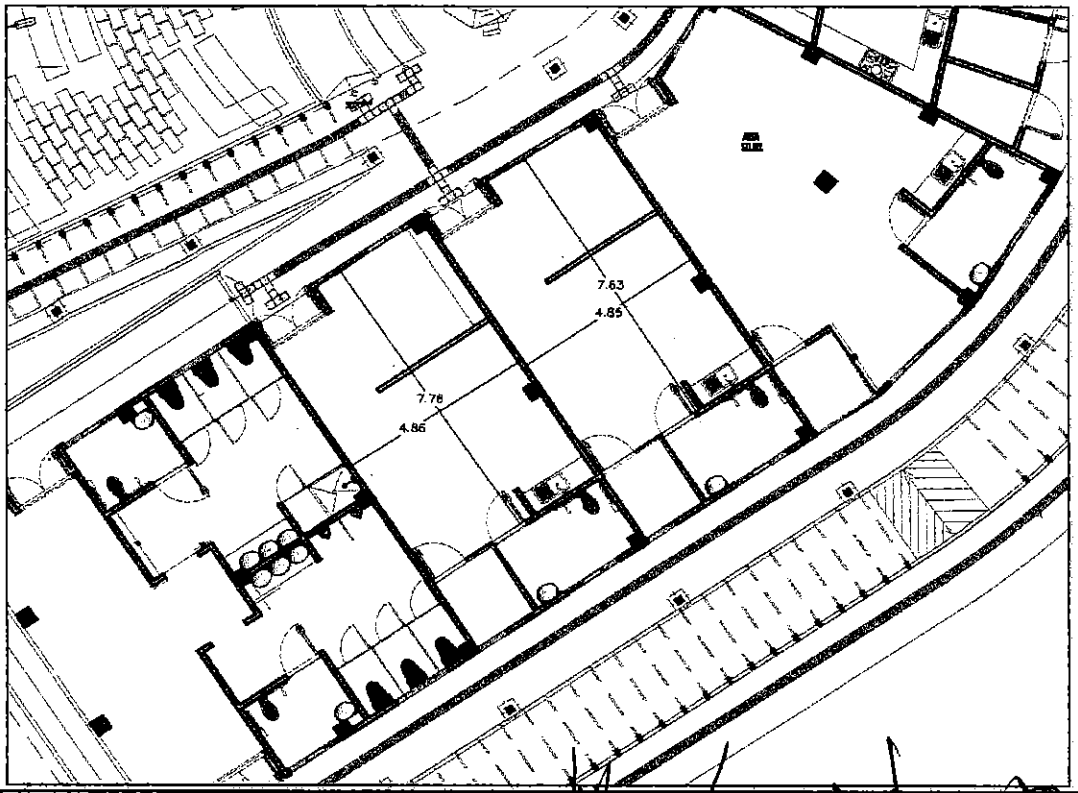

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Ricardo Ochoa Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 3 de: 6 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	**Unidad:**	m2	**Cantidad total:**	204,16

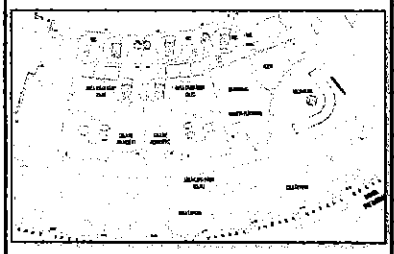Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones					Cantidad
		Longitud					
	MES DE JUNIO DEL 01 AL 30	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	204,16
	**BLOQUE No.2**						
	SALA ESPERA	136,31		1,00	1,00	1,00	136,31
	SALA DE ATENCION No.1	25,20		1,00	1,00	1,00	25,2
	SALA DE ATENCION No.2	25,20		1,00	1,00	1,00	25,2
	DESCUENTO COLUMNA	0,35		0,35	1,00	4,00	-0,49
	DESCUENTA COLUMNA	0,35		0,20	1,00	5,00	-0,35
	CUARTO ELECTRICO	12,84		1,00	1,00	1,00	12,84
	LAVA TRAPERO	5,45		1,00	1,00	1,00	5,45
							
							
							

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**0,00**
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**
	VIENE **MEMORIA** **5**	**146,28**
	PRESENTE ACTA N°15	**350,44**

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Ibáñez Vásquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 4 de: 6 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1

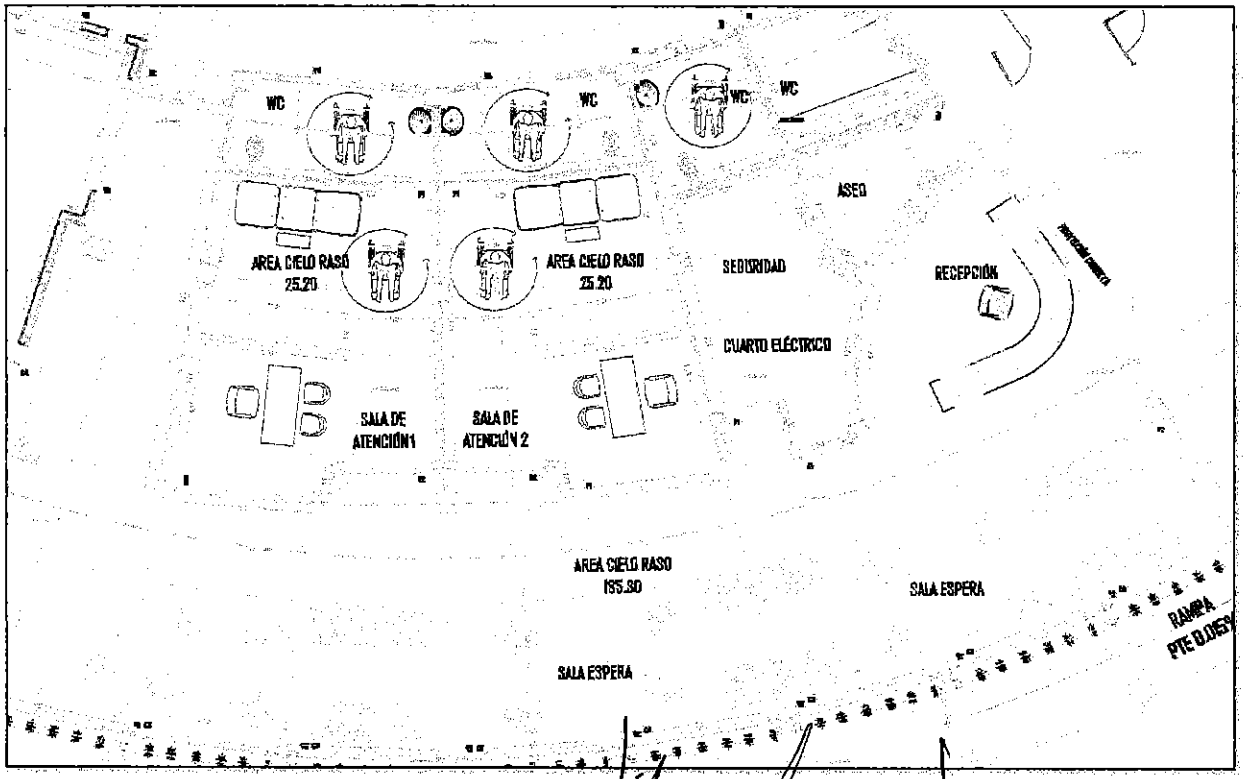

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Sanz Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Viveros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 5 de: 6 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	**Unidad:**	m2	**Cantidad total:**	146,28

Croquis y récord fotográfico

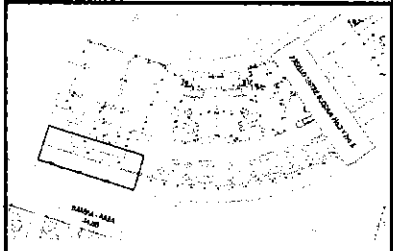





Descripción	Dimensiones Longitud					Cantidad
MES DE JUNIO DEL 01 AL 30	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	146,28
BLOQUE No.3						
PASILLO ENTRE BLOQUE No2 - No.3	66,66		1,00	1,00	1,00	66,66
SALA ESPERA	9,81		3,20	1,00	1,00	31,39
	1,98		1,70	1,00	1,00	3,37
BLOQUE No.2						
RAMPA	44,86		1,00	1,00	1,00	44,86

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
VIENE	MEMORIA 0,00
PRESENTE ACTA N°15	146,28

Observaciones:


Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión: Nombre: Juan Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 6 de: 6 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 9.01

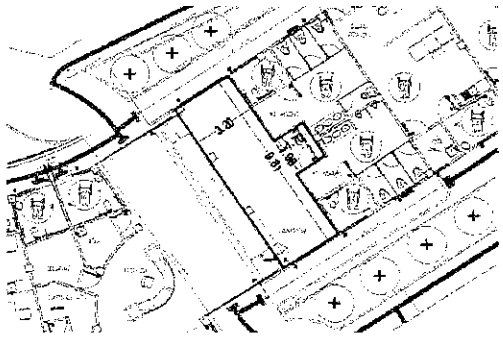

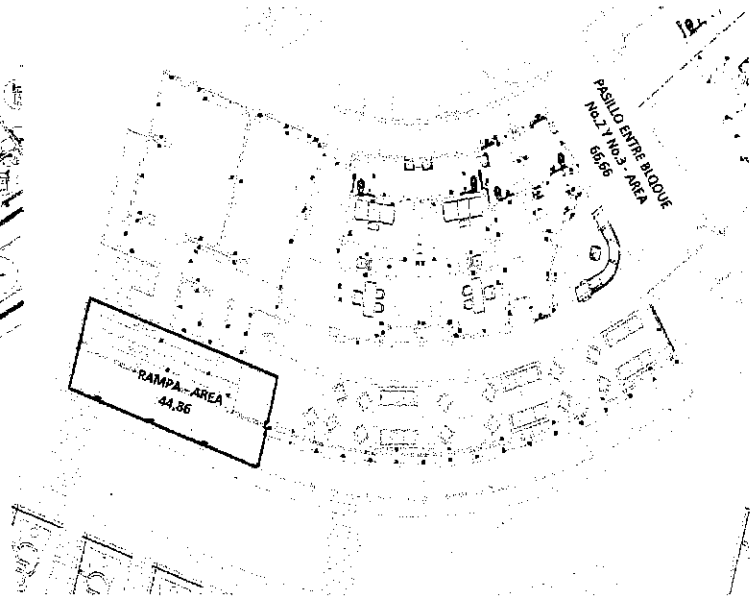

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Aprobó la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 4 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA


ITEM:	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	Unidad: m2	Cantidad total:	-294,96

Croquis y récord fotográfico

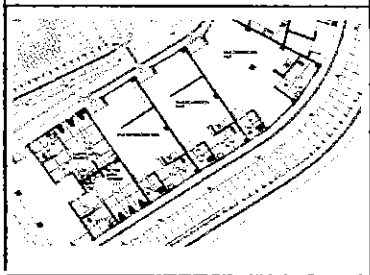







Descripción	Dimensiones: Longitud	Dimensiones: Altura		Area	Cantidad
MES DE JUNIO DEL 01 AL 30					-294,96
BLOQUE No.3					
BAÑO MUJERES	5,10	3,09		1,00	15,76
	0,78	1,00		1,00	0,78
	2,48	1,95		1,00	4,84
	2,36	1,91		1,00	4,51
DEPOSITO - SALA DE ATENCION No.3	1,90	1,85		1,00	3,15
BAÑO - SALA DE ATENCION No.3	3,08	1,89		1,00	5,82
DEPOSITO - SALA DE ATENCION No.4	1,69	1,85		1,00	3,12
BAÑO - SALA DE ATENCION No.4	3,08	1,89		1,00	5,82
					0,00
DEPOSITO - SALA DE ATENCION No.5	1,69	1,85		1,00	3,12
BAÑO - SALA DE ATENCION No.5	3,08	1,89		1,00	5,82
DESCUENTA COLUMNA	0,35	0,20	1,00	4,00	-0,28
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES		347,42		1	-347,42

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
VIENE MEMORIA 3	386,33
PRESENTE ACTA N°15	91,37

Observaciones:

Contratista: Alexander Armando Ibarra Vasquez


Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Wilches

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 4 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA

ITEM:	9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	Unidad:	m2	Cantidad total:	0,00

PLANO ANEXO No.1

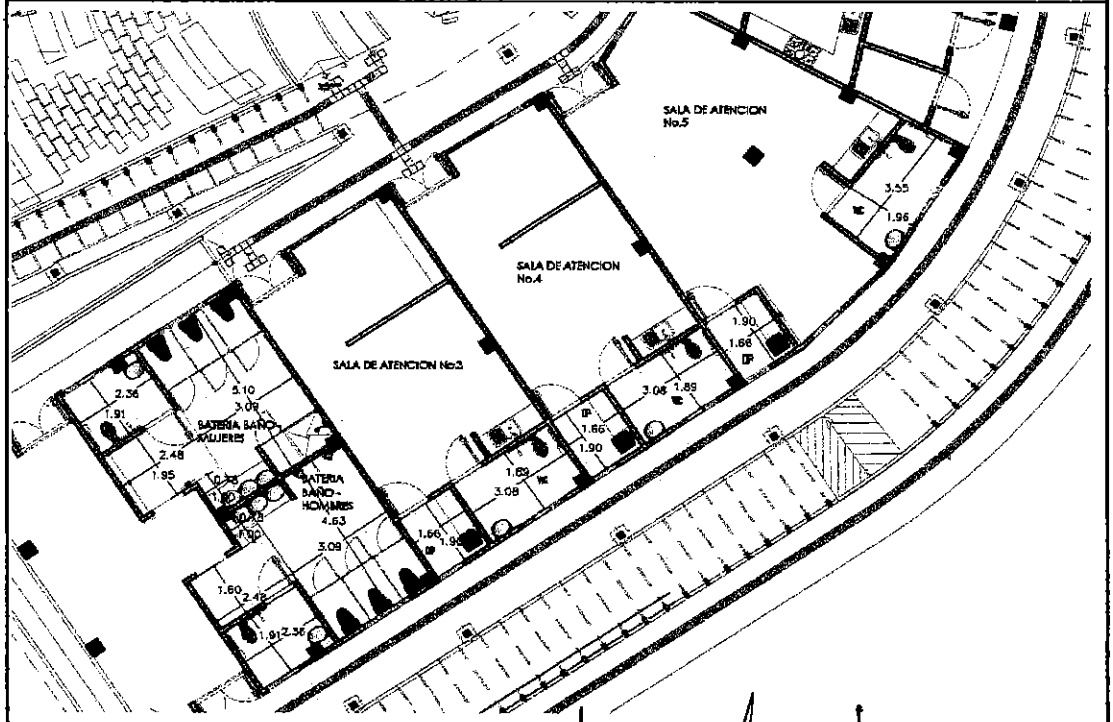

Observaciones:


Contratista:

Apoyo de la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Medina

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 3 de: 4 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	Unidad:	m2	Cantidad total:	386,33

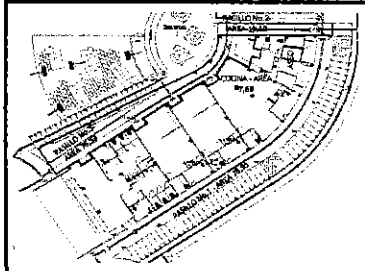Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	MES DE JUNIO DEL 01 AL 30				386,33
	BLOQUE No.3				
	PASILLO No.1	67,05	1,00	1,00	67,05
	CUARTO SE ASEO No.1	3,40	1,00	1,00	3,40
	CUARTO SE ASEO No.2	3,40	1,00	1,00	3,40
	CUARTO DE ASEO No.3	2,83	1,00	1,00	2,83
	PASILLO No.2	19,50	1,00	1,00	19,50
	PASILLO No.3	78,90	1,00	1,00	79,90
	BAÑO COCINA	5,20	1,00	1,00	5,20
	COCINA	7,88	1,00	1,00	7,88
	BAÑO HOMBRES	4,63	3,09	1,00	14,31
		1,00	0,78	1,00	0,78
		1,60	2,48	1,00	3,97
		1,91	2,36	1,00	4,51
	BLOQUE No.2				
	PASILLO No.2	39,52	1,00	1,00	39,52
	PASILLO No.1	85,87	1,00	1,00	85,87
		8,04	1,00	1,00	8,04
	BAÑO SALA ATENCION No.1	1,75	3,70	1,00	6,48
	BAÑO SALA ATENCION No.2	1,75	3,54	1,00	6,20
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS No.1	2,42	2,35	1,00	5,69
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS No.2	2,33	2,82	1,00	6,57
	PASILLO FACHADA PRINCIPAL	38,57	0,40	1,00	15,43
					
					

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	386,33

Observaciones:


Contratista: Nombre: Armando Rendon Vasquez

Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Velasco


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 4 de: 4 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 9.02

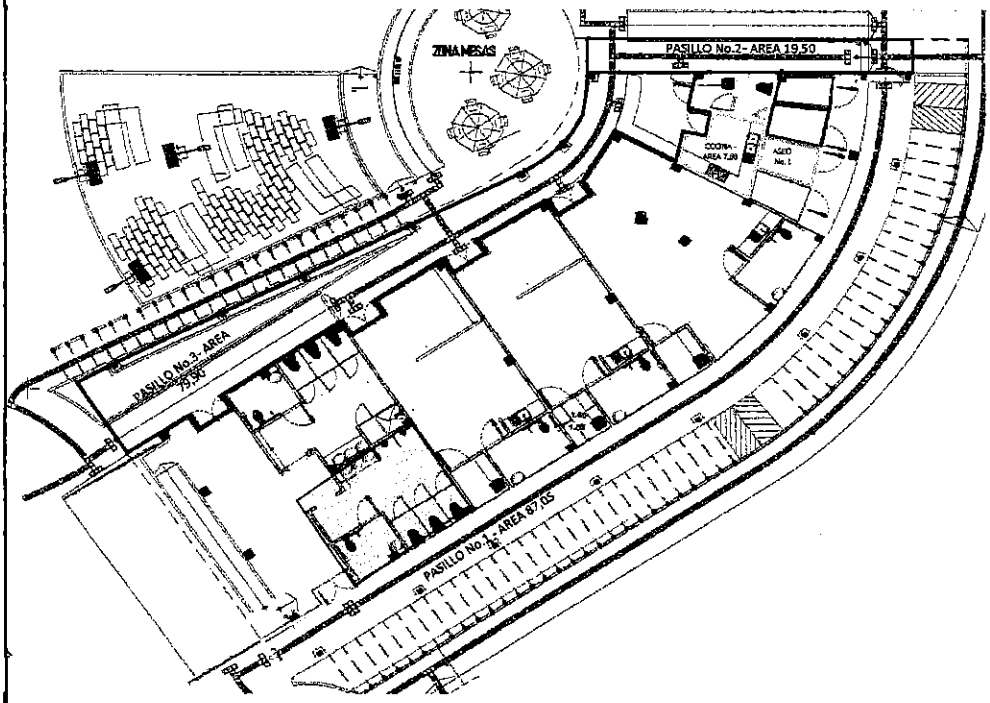

BLOQUE No.2

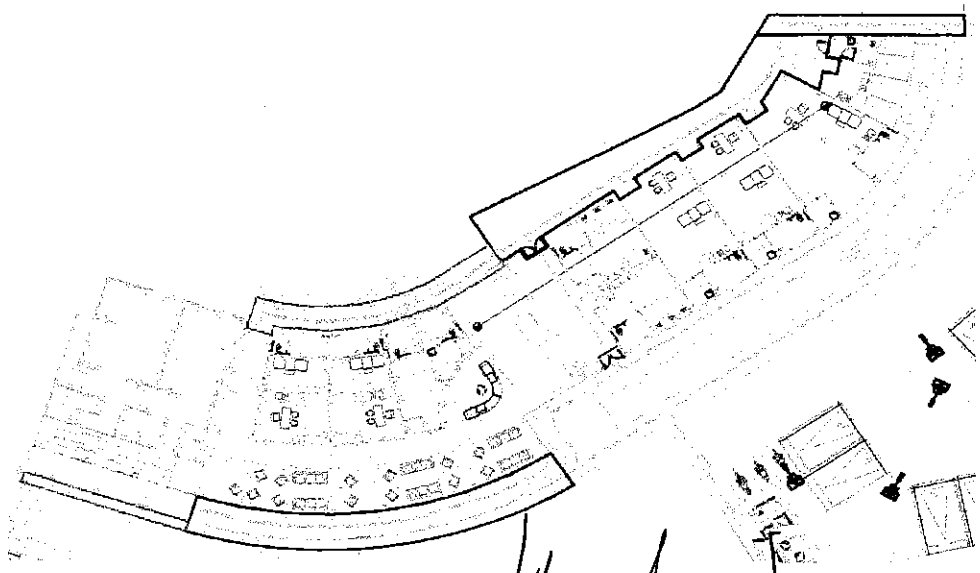

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Tello Valencia


Aprobó la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Herrera

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA TAPA LATERAL DE CUBIERTA CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	Unidad:	M2	Cantidad total:	73,40

Croquis y récord fotográfico

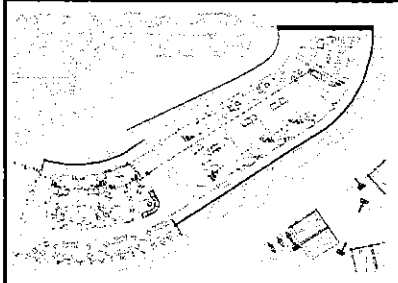






Descripción	Dimensiones Longitud					Cantidad
MES DE JUNIO DEL 01 AL 30	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	73,40
BLOQUE No.3						
PASILLO No.1	39,80	0,89		1,00		35,42
PASILLO No.2	13,00	0,89		1,00		11,57
PASILLO No.3	27,30	0,89		1,00		24,3
REMATE CUBIERTA BLOQUE No.2 - No.3	3,15	0,73		1,00		2,3
	3,68	0,59		1,00		2,17
	3,44	0,89		1,00		3,06
	12,30	0,90		1,00		11,07
						0
BLOQUE No.2						
PASILLO No.2	20,02	0,87		1,00		17,42
PASILLO No.1	38,23	0,87		1,00		33,26
REMATE CUBIERTA BLOQUE No.2 - No.3	2,20	0,60		1,00		1,32
	1,03	2,05		1,00		2,11
	6,50	0,87		1,00		5,66
PAGADO EN ACTA No.14	76,26	1,00		1,00		-76,26

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 9.03


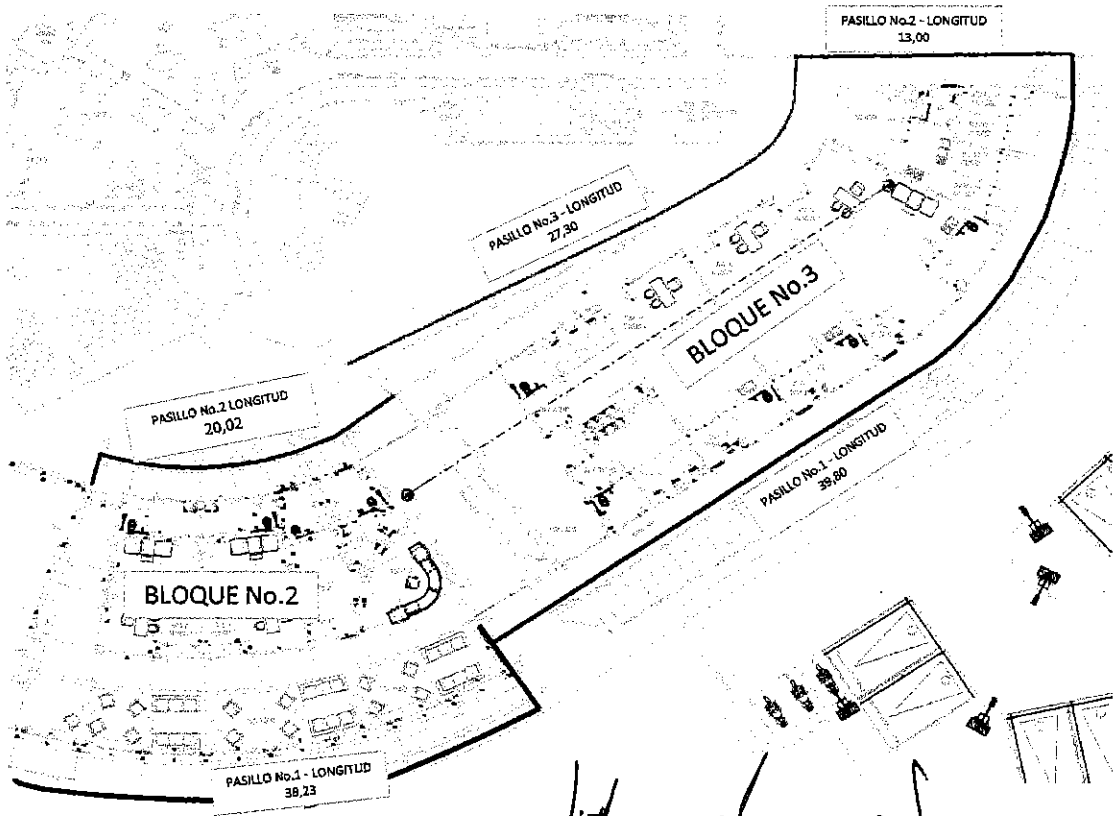


Observaciones:	Contratista Nombre: Alexandra Ortiz Vasquez	Apoyo a la Supervisión Nombre: Julio Cesar Velasco

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	9,04	ESTRUCTURA LIVIANA PARA MUROS EN DRY WALL A DOS CARAS 12mm	Unidad:	m2	Cantidad total:	96,24

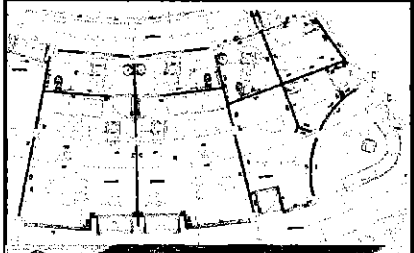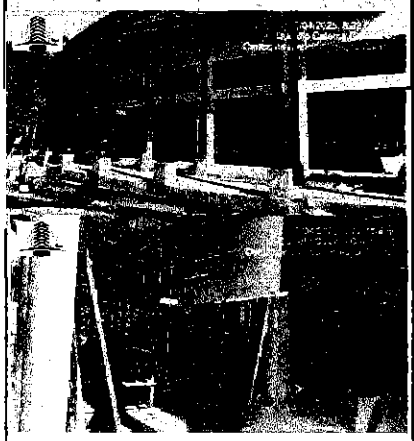Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	**BLOQUE No.3**				
	COCINA - MUEBLE CAMPANA	0,30	0,71	2,00	0,43
		0,76	0,29	1,00	0,22
		0,23	0,77	1,00	0,18
	RED CONTRAINCENDIO	0,65	1,24	1,00	0,81
		1,00	0,90	1,00	0,90
	ACCESO ORINCIPAL	3,22	3,55	1,00	11,43
		0,79	0,79	1,00	-0,62
		3,30	1,06	2,00	7,00
		3,30	0,17	1,00	0,56
		0,40	3,58	1,00	1,43
	ACCESO ORINCIPAL No.2	2,19	3,50	1,00	7,67
		4,75	1,04	1,00	4,94
		4,75	0,17	1,00	0,81
		0,63	0,39	1,00	0,25
	ACCESO SALA DE ESPERA	1,91	2,44	1,00	4,66
	MURO RAMPA	5,04	1,11	1,00	5,59
		4,50	1,08	1,00	4,86
	BLOQUE No.2				
	MURO PASILLO GABINETE	1,24	2,88	1,00	3,57
		1,64	2,03	1,00	3,33
		0,81	0,81	1,00	-0,66
	MURO RECEPCION	6,14	3,97	1,00	24,38
	CUARTO ASEO	0,39	2,44	1,00	0,95
		0,20	2,44	1,00	0,49
	**BLOQUE EXISTENTE - ADOSADO AL BLOQUE No.2**				
	MURO No1	2,22	1,53	1,00	3,40
	MURO No2	0,80	1,92	1,00	1,54
	MURO No3	1,94	2,00	1,00	3,88
	MURO No4	0,94	2,06	1,00	1,94
	CUPULA ENTRE BLOQUE No.2 - No.3	4,90	0,47	1,00	2,30

	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	503,55
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	203,64
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	707,19
PRESENTE ACTA N°15	96,24

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Gomez Henriquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Williams

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPER BOARD PARA MURO DE 6 mm DE ESPESOR	Unidad:	m2	Cantidad total:	143,30

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	**BLOQUE No.3**				
	COCINA - MUEBLE CAMPANA	0,30	0,71	4,00	0,85
		0,76	0,29	1,00	0,22
		0,23	0,77	1,00	0,18
	RED CONTRAINCENDIO	0,65	1,24	1,00	0,81
		1,00	0,90	1,00	0,90
	ACCESO ORINCIPAL	3,22	3,55	1,00	11,43
		0,79	0,79	1,00	-0,62
		3,30	1,06	2,00	7,00
		3,30	0,17	1,00	0,56
		0,40	3,58	1,00	1,43
	ACCESO PRINCIPAL No.2	2,19	3,50	2,00	15,33
		4,75	1,04	2,00	9,88
		4,75	0,17	1,00	0,81
		0,53	0,39	1,00	0,25
	ACCESO SALA DE ESPERA	1,91	2,44	2,00	9,32
	MURO RAMPA	5,04	1,11	1,00	5,59
		4,50	1,08	1,00	4,86
	BLOQUE No.2				
	MURO PASILLO GABINETE	1,24	2,88	2,00	7,14
		1,64	2,03	1,00	3,33
		0,81	0,81	1,00	-0,66
	MURO RECEPCION	6,14	3,97	2,00	48,75
	CUARTO ASEO	0,39	2,44	2,00	1,90
		0,20	2,44	2,00	0,98
	BLOQUE EXISTENTE - ADOSADO AL BLOQUE No.2				
	MURO No1	2,22	1,53	1,00	3,40
	MURO No2	0,80	1,92	1,00	1,54
	MURO No3	1,94	2,00	1,00	3,88
	MURO No4	0,94	2,06	1,00	1,94
	CUPULA ENTRE BLOQUE No.2 - No.3	4,90	0,47	1,00	2,30

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	458,13
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	24,20
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	482,33
PRESENTE ACTA N°15	143,30

Observaciones:




Contratista:
Nombre: Fernando Ramírez Vásquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallejos

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 3 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	165,04

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	DESDE JUNIO DEL 01 AL 30				165,04
	BLOQUE No.2 - MURO				
	FACHADA PORTAL DE INGRESO	3,55	1,08	1,00	3,84
		4,76	1,05	1,00	5,05
		2,10	2,485	1,00	5,22
		3,93	3,71	1,00	14,65
		0,90	2,43	1,00	-2,19
		4,45	1,16	1,00	5,16
		4,76	1,22	1,00	5,81
		2,71	2,49	1,00	6,73
		2,49	0,15	1,00	0,37
	PACHA EJE B ENTRE LOS EJES 1 - 4	11,73	2,43	1,00	28,50
		1,50	0,60	2,00	-1,80
		0,60	0,60	2,00	-0,80
		0,99	2,43	2,00	-4,81
	FACHA EJE B ENTRE LOS EJES 1 - 4 (N±2,43)	11,73	0,89	1,00	10,44
		1,52	0,14	1,00	0,21
		1,23	2,84	2,00	7,04
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 6 - 5	3,58	3,48	1,00	12,46
		2,40	2,20	1,00	-5,28
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 6 - 5	3,57	3,68	1,00	13,03
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	0,44	1,00	1,06
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 5 - 4	2,36	3,82	1,00	11,39
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	0,70	1,00	1,68
	FACHADA EJE 7 ENTRE LOS EJES F - F'	3,57	3,54	1,00	12,64
		1,69	3,93	1,00	6,60
		1,19	2,39	1,00	-2,60
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 4' - 4	2,80	3,93	1,00	11,00
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 4 - 3'	2,66	4,16	1,00	11,06
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 3'' - 3	2,85	4,66	1	13,05
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 3 - 2	2,83	4,38	1,00	13,05
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 2 - 1''	2,85	4,73	1,00	13,48
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 1'' - 1'	2,84	4,85	1,00	13,77
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 1' - 1	2,45	4,92	1,00	12,05
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 1' - 1	2,83	4,98	1,00	14,09
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PASAN DE MEMORIA No. 2	250,71
PRESENTE ACTA N°15	415,75



Observaciones:

Contratista
Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallace

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de. 8 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	-313,99

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	MES DE JUNIO DEL 2024				-313,99
	BLOQUE No.2 - MURO				
	EJE 1 ENTRE EJES F - E	2,54	3,41	1,00	8,66
		2,10	2,20	1,00	-4,62
	COLUMNA PEDESTAL	1,20	0,60	2,00	1,44
		0,80	0,45	2,00	0,72
		0,80	0,06	2,00	0,10
		1,23	0,58	1,00	0,71
		1,23	0,06	1,00	0,07
		0,33	0,38	1,00	0,13
		0,33	0,06	1,00	0,02
		1,84	0,49	8,00	7,21
		1,84	0,06	8,00	0,85
		0,85	0,37	8,00	2,48
		1,52	0,35	5,00	3,19
		1,82	0,06	5,00	0,55
					
	BAÑO SALA ATENCION No.1	0,47	0,40	1,00	3,39
	BAÑO SALA ATENCION No.2	0,24	0,40	1,00	3,30
	CUARTO ELECTRICO	13,33	2,43	1,00	32,39
	CUARTO ASEO	6,81	2,43	1,00	19,46
		1,89	1,27	1,00	2,40
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS No.1	9,29	0,40	1,00	3,31
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS No.2	7,55	0,40	1,00	3,05
					
	RAMPA	3,50	3,13	1,00	10,96
		3,54	3,14	1,00	11,12
		3,58	3,63	1,00	13,00
		1,90	3,57	1,00	6,78
					0,00
	MURO PASILLO EJE 4 - GABINETE	2,82	3,59	1,00	10,97
		3,75	3,16	1,00	11,85
		3,71	2,80	1,00	10,76
					
	MURO PASILLO EJE 4' - GABINETE	8,14	3,15	1,00	25,64
		0,80	0,80	1,00	-0,64
		4,87	0,26	1,00	1,17
	SALA DE ESPERA	15,19	2,43	1,00	36,91
		2,50	2,13	2,00	-10,65
		13,24	1,56	1,00	20,66
	MURO RECEPCION	6,15	3,97	1,00	24,42
	DESCUENTO PAGO EN ACTAS ANTERIORES	575,78	1,00	1,00	-575,78
					0,00
					0,00
					0,00

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PASAN DE MEMORIA No. 3	564,67
PRESENTE ACTA N°15	250,71

Observaciones:

Contratista: Ing. [illegible] Interventoría: Arq. Yuly Sarmiento Ortiz

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 3 de: 8 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	94,46

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	BLOQUE DE SUMIDERO EN CAL 30				
	BLOQUE No.2 - MURO				
	SALA DE ATENCION No.1	21,23	2,43	1,00	51,58
		2,50	2,13	1,00	-5,33
		3,51	0,330	1,00	1,16
		8,47	0,40	1,00	3,39
	SALA DE ATENCION No.2	18,85	2,43	1,00	45,08
		2,50	2,43	1,00	-6,08
		8,24	0,40	1,00	3,30
		3,38	0,40	1,00	1,35







Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14		0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS		0,00
PASAN DE	MEMORIA No. 4	470,21
PRESENTE ACTA N°15		564,67

Observaciones:


Contratista:
Ingeniero Residente de Obra

Apoyo a la Supervisión:
Ingeniero Auxiliar Interventoría

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 4 de: 8 Fecha:

Contrato de obra No LP008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	154,63

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones Longitud					Cantidad
	DESDE HASTA DEL 01 AL 30					No. ELEMENTOS	154,63
	BLOQUE No.3						
	SALA DE ATENCION No.3	7,76		4,88	1,00	1,00	37,71
	SALA DE ATENCION No.4	7,63		7,85	1,00	1,00	59,9
	SALA DE ATENCION No.5	50,92		1,00	1,00	1,00	50,92
	CUARTO ELECTRICO	7,24		1,00	1,00	1,00	7,24
	DESCUENTO COLUMNA	0,35		0,35	1,00	1,00	-0,12
	DESCUENTA COLUMNA	0,35		0,20	1,00	16,00	-1,12
							

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	332,15
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	332,15
	PASAN DE MEMORIA No. 6	345,09
	PRESENTE ACTA N°15	470,21


Observaciones:

Contratista: [illegible]
Apoyo a la Supervisión: [illegible]

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 5 de: 8 Fecha:

Contrato de obra No LF006-INF006-OBRA-2023, CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO ITEM No.9,07

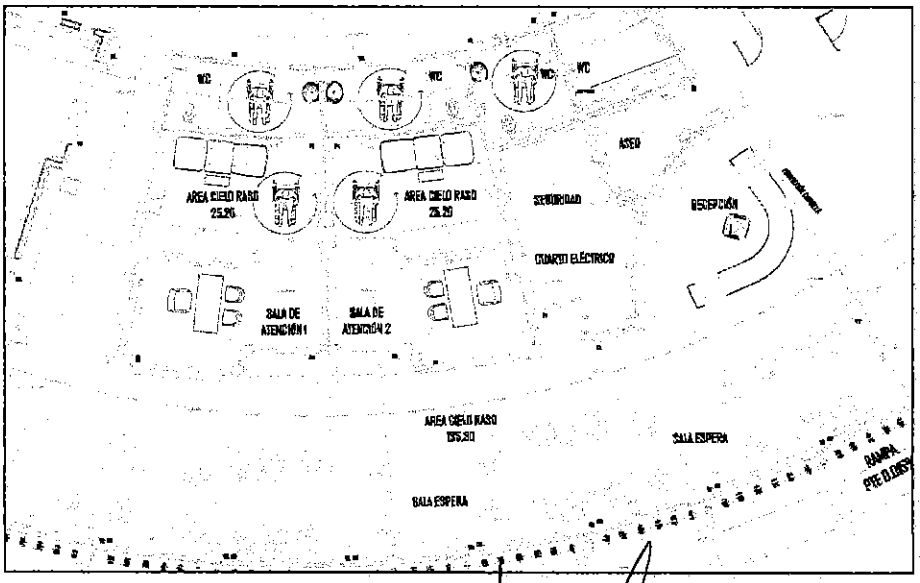

Observaciones:

Consultor: [illegible]
Nombre, cargo y firma


Apoyo a la Supervisión TIC
Nombre, cargo y firma

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 6 de: 8 Fecha:


Contrato de obra No LP008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	Unidad:	m2	Cantidad total:	204,16

Croquis y Registro fotográfico	Descripción	Dimensiones					Cantidad
		Longitud					
	EJES DE LINDEROS EN PLANO	CONCEPTO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	Total
	BLOQUE No.2						
	SALA ESPERA	135,31		1,00	1,00	1,00	135,31
	SALA DE ATENCION No.1	25,20		1,00	1,00	1,00	25,2
	SALA DE ATENCION No.2	25,20		1,00	1,00	1,00	25,2
	DESCUENTO COLUMNA	0,35		0,35	1,00	4,00	-0,49
	DESCUENTA COLUMNA	0,35		0,20	1,00	5,00	-0,35
	CUARTO ELECTRICO	12,64		1,00	1,00	1,00	12,64
	LAVA TRAPERO	5,45		1,00	1,00	1,00	5,45







Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PASAN DE MEMORIA No. 8	111,52
PRESENTE ACTA N°15	315,68

Observaciones:


Contratista: Arnaldo Ibañez Vasquez

Aprobó la Supervisión: Nestor Julio Mejia Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 7 de: 8 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO ITEM No.9,07

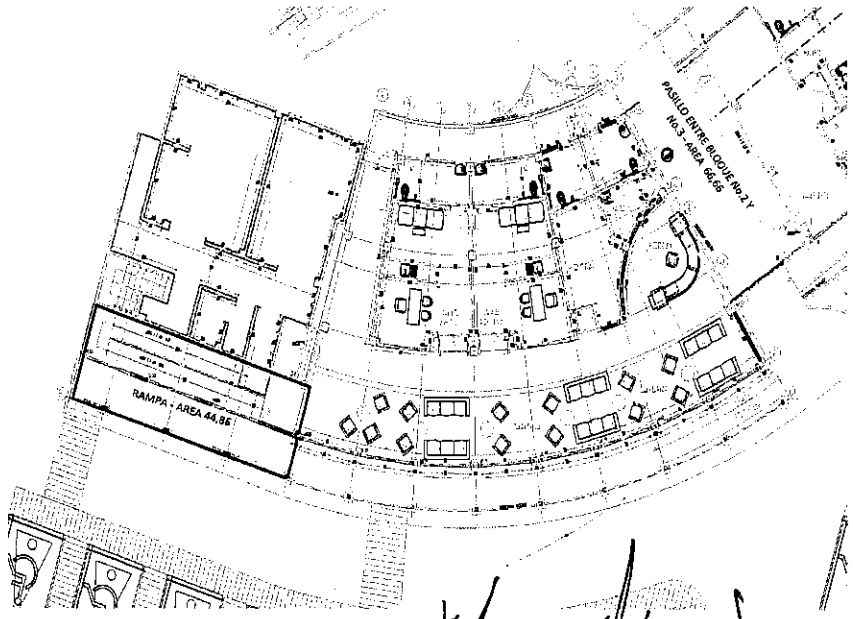

Observaciones:

Consultor: [illegible]
Nombre: [illegible]

Apoyo a la supervisión:
Nombre: Julio Cesar Vivas

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 8 de: 8 Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023: CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9.07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	111,52

Croquis y record fotográfico







Descripción	Dimensiones Longitud					Cantidad
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	PARCIAL
BLOQUE No.3						
PASILLO ENTRE BLOQUE No2 - No.3	66,66		1,00	1,00	1,00	66,66
BLOQUE No.2						
RAMPA	44,86		1,00	1,00	1,00	44,86

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PASAN DE MEMORIA No.	
PRESENTE ACTA N°15	111,52

Observaciones:

Apoyo Por Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valero

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 9
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,06	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	370,49









Croquis y/o Registro fotográfico	Descripción	Dimensiones Longitud	Dimensiones Altura	Area	Cantidad
					370,49
	BLOQUE No.3 - MURO				
	FACHADA EJE D (MURO GABINTE)	1,94	3,94	1,00	7,45
		3,30	0,05	1,00	0,16
		0,80	0,80	1,00	-0,64
	ACCESO SALA DE ESPERA EJE 7 - 8	1,74	2,45	1,00	4,29
		0,80	2,13	1,00	-1,70
	EJE B ENTRE LOS EJES 1 - 7	34,64	2,43	1,00	84,18
		0,80	2,43	4,00	-7,62
		1,50	0,50	5,00	-3,75
		2,50	2,13	1,00	-5,33
		0,80	2,13	3,00	-5,11
	EJE B ENTRE LOS EJES 1 - 2 (No2,43)	11,58	1,17	1,00	13,55
	EJE B ENTRE LOS EJES 2 - 8 (No2,43)	23,40	0,79	1,00	18,53
	COLUMNA PEDESTAL	1,83	0,45	9,00	7,41
		1,63	0,60	9,00	8,80
		1,38	2,43	1,00	3,35
		1,00	2,43	1,00	2,43
	FACHADA EJE 1 ENTRE LOS EJES A - E	7,27	3,44	1,00	17,74
	FACHADA EJE 1 ENTRE LOS EJES A - E (No2,43)	7,27	1,75	1,00	12,72
	COCINA	10,50	0,40	1,00	4,20
	BAÑO COCINA	10,53	0,40	1,00	4,21
	CAFETERIA	7,94	2,43	1,00	19,29
		3,99	1,93	1,00	7,70
		2,69	1,62	1,00	5,44
	EJE A ENTRE LOS EJES 1 - 8	22,34	2,43	1,00	54,29
		1,50	2,13	1,00	-3,20
		2,50	2,13	2,00	-10,65
		1,50	0,60	2,00	-1,80
		0,80	2,13	1,00	-1,70
	COLUMNAS PEDESTAL	1,83	0,45	7,00	5,76
	EJE A ENTRE LOS EJES 1 - 8 (No2,43)	22,79	1,93	1,00	43,93
					0,00
	SALA DE ESPERA	15,86	2,43	1,00	38,05
		0,80	2,13	2,00	-3,41
		1,50	2,43	2,00	-7,29
	COLUMNAS	1,50	2,43	2	7,29
	BAÑO MUJERES	19,83	0,40	1,00	7,93
		6,08	0,40	1,00	2,43
					0,00
	BAÑO HOMBRES	18,18	0,40	1,00	7,27
		6,08	0,40	1,00	2,43
	BAÑO SALA ATENCION No.3 - No.4	7,65	0,40	2,00	6,26
	BAÑO SALA ATENCION No.5	8,54	0,40	1,00	3,42
					0,00
	CUARTO ASEO No.1	6,05	0,40	1,00	2,42
	CUARTO ASEO No.2	6,48	0,40	1,00	2,59
	CUARTO ASEO No.3	6,53	0,40	1,00	2,61
	CUARTO ELECTRICO	6,25	2,43	1,00	15,19

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 15		0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS		0,00
PASAN DE	MEMORIA No. 2	717,85
PRESENTE ACTA N°16		1088,13

Observaciones:

Contratista: [illegible]

Apoyo a la Supervisión:
Nombre Juan Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LP008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.




ITEM:	9,05	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	370,48

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LP008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,06	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	165,04

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	MURO DE CERRADO EL QUIMBO				165,04
	BLOQUE No.2 - MURO				
	FACHADA PORTAL DE INGRESO	3,56	1,08	1,00	3,84
		4,78	1,06	1,00	5,05
		2,10	2,485	1,00	5,22
		3,05	3,71	1,00	14,85
		0,80	2,43	1,00	-2,19
		4,45	1,16	1,00	5,16
		4,75	1,22	1,00	5,81
		2,71	2,48	1,00	6,73
		2,46	0,16	1,00	0,37
	FACHADA EJE B ENTRE LOS EJES 1 - 4	11,73	2,43	1,00	28,50
		1,50	0,50	2,00	-1,50
		0,60	0,50	2,00	-0,60
		0,99	2,43	2,00	-4,81
	FACHADA EJE B ENTRE LOS EJES 1 - 4 (N=2,43)	11,73	0,89	1,00	10,44
		1,52	0,14	1,00	0,21
		1,23	2,88	2,00	7,04
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 6' - 6	3,52	3,48	1,00	12,25
		2,40	2,20	1,00	-5,28
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 6 - 5	3,57	3,65	1,00	15,03
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	0,44	1,00	1,06
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 5 - 4	2,98	3,82	1,00	11,38
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	0,70	1,00	1,68
	FACHADA EJE 7 ENTRE LOS EJES F - F'	3,57	3,54	1,00	12,64
		1,68	3,93	1,00	6,60
		1,16	2,20	1,00	-2,60
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 4' - 4	2,80	3,93	1,00	11,00
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 4 - 3'	2,65	4,16	1,00	11,86
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 3' - 3	2,85	4,52	1	13,06
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 3 - 2	2,85	4,58	1,00	13,05
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 2 - 1'	2,85	4,73	1,00	13,48
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 1'' - 1'	2,84	4,85	1,00	13,77
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 1''' - 1''	2,45	4,92	1,00	12,05
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40
	FACHADA EJE F ENTRE LOS EJES 1' - 1	2,83	4,99	1,00	14,09
		2,40	2,20	1,00	-5,28
		2,40	1,00	1,00	-2,40

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PASAN DE MEMORIA No. 3	552,61
PRESENTE ACTA N°15	717,65


Observaciones:

Contratista: Alfredo [illegible] Apoyo a la Supervisión: Nicolás [illegible]

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA				Hoja: 1 de: 9 Fecha:	
Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.					
ITEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	570,48

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA				Hoja: 3 de: 9 Fecha:	
Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.					
ITEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	88,83

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	MEMORIA EJE NIVEL CLAUSO				88,83
	BLOQUE No.2 - MURO				
	EJE 1 ENTRE EJES F - E	2,54	3,41	1,00	8,66
		2,10	2,20	1,00	4,62
	COLUMNA PEDESTAL	1,20	0,60	2,00	1,44
		0,90	0,45	2,00	0,72
		0,80	0,06	2,00	0,19
		1,23	0,58	1,00	0,71
		1,23	0,06	1,00	0,07
		0,39	0,36	1,00	0,13
		0,33	0,06	1,00	0,02
		1,84	0,49	8,00	7,21
		1,84	0,06	8,00	0,88
		0,85	0,57	8,00	2,48
		1,82	0,35	5,00	3,16
		1,82	0,06	5,00	0,55
	BAÑO SALA ATENCION No.1	8,47	0,40	1,00	3,39
	BAÑO SALA ATENCION No.2	8,24	0,40	1,00	3,30
	CUARTO ELECTRICO	13,33	2,43	1,00	32,39
	CUARTO ASEO	8,01	2,43	1,00	19,46
		1,89	1,27	1,00	2,40
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS No.1	3,29	0,40	1,00	3,31
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS No.2	7,66	0,40	1,00	3,06

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PASAN DE MEMORIA No. 4	468,78
PRESENTE ACTA N°15	552,61

Observaciones:

Contratista: Apoyo a la Supervisión:

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


ÍTEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	570,48


Croquis y/record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 4 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA

ÍTEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	-58,79

Croquis y/record fotográfico	Descripción	Dimensiones			Area	Cantidad
		Longitud		Altura		
	RESTA DE BLOQUES DE ATRÁS					-58,79
	BLOQUE No.3 - CIELO RASO					
	BAÑO MUJERES	5,10		3,00	1,00	15,76
		0,78		1,00	1,00	0,78
		2,48		1,95	1,00	4,84
		2,36		1,91	1,00	4,51
	DEPOSITO - SALA DE ATENCION No.6	1,80		1,66	1,00	3,15
	BAÑO - SALA DE ATENCION No.3	3,06		1,89	1,00	5,82
	DEPOSITO - SALA DE ATENCION No.4	1,89		1,65	1,00	3,12
	BAÑO - SALA DE ATENCION No.4	3,08		1,88	1,00	5,82
	DEPOSITO - SALA DE ATENCION No.5	1,69		1,65	1,00	3,12
	BAÑO - SALA DE ATENCION No.5	3,08		1,09	1,00	5,82
	DESCUENTA COLUMNA	0,35	0,20	1,00	4,00	-0,28
	DESCUENTO RASO EN ACTAS ANTERIORES	109,24		1,00	1,00	-109,24







Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PASAN DE MEMORIA No. A 6	525,58
PRESENTE ACTA N°15	463,78

Observaciones:

Contratista: Fernando Zapata Valencia

Apoyo a la Supervisión:
Nombre, sello y cargo

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LPC06-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


ITEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA, BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	370,48

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 5 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LPC06-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO ITEM No.9,08

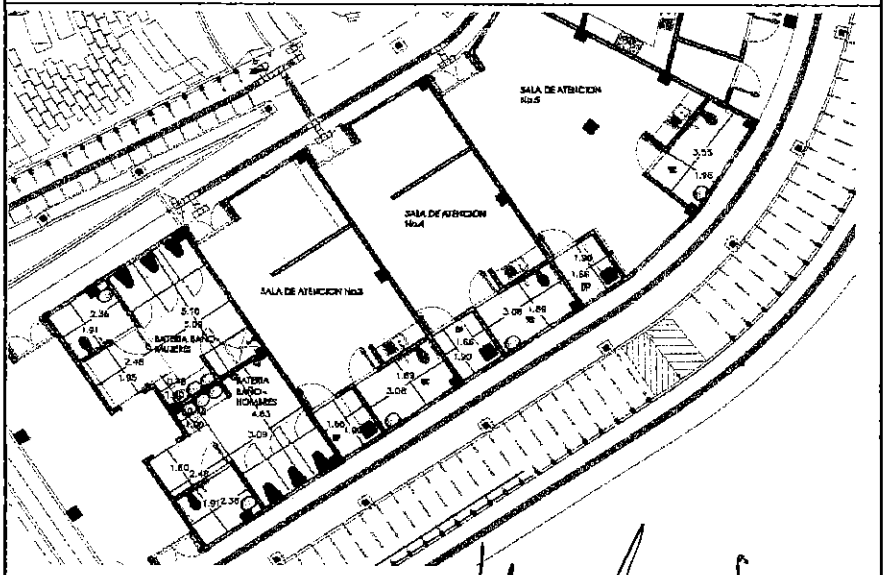

Observaciones:

Contratista: Apoyo a la Supervisión:
Nombre, Apellidos Cargo: Nombre, Apellidos Cargo:

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.



ITEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	370,48

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 6 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	370,90

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		
	**MEMORIA DEL CÁLCULO**				370,90
	BLOQUE No.1 - CIELO RASO				
	PASILLO No.1	87,05	1,00	1,00	87,05
	CUARTO DE ASEO No.1	3,40	1,00	1,00	3,40
	CUARTO DE ASEO No.2	3,40	1,00	1,00	3,40
	CUARTO DE ASEO No.3	2,83	1,00	1,00	2,83
	PASILLO No.2	19,50	1,00	1,00	19,50
	PASILLO No.3	79,90	1,00	1,00	79,90
	BAÑO COCINA	5,20	1,00	1,00	5,20
	COCINA	7,68	1,00	1,00	7,68
	BAÑO HOMBRES	4,53	3,09	1,00	14,51
		1,00	0,78	1,00	0,78
		1,60	2,48	1,00	3,97
		1,91	2,36	1,00	4,51
					
	BLOQUE No.2 CIELO RASO				
	PASILLO No.2	39,52	1,00	1,00	39,52
	PASILLO No.1	55,87	1,00	1,00	55,87
		9,04	1,00	1,00	9,04
	BAÑO SALA ATENCION No.1	1,75	3,70	1,00	6,48
	BAÑO SALA ATENCION No.2	1,75	3,54	1,00	6,20
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS No.1	2,42	2,35	1,00	5,69
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS No.2	2,35	2,82	1,00	6,57
					
					

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PASAN DE MEMORIA No. 6	149,68	
PRESENTE ACTA N°15	520,58	

Observaciones:


Contratista: Apoyo a la Supervisión:

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA					Hoja: 1 de: 9 Fecha:	
Contrato de obra No LPD06-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.						
ITEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad:	m2	Cantidad total:	570,48


Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 7 de: 9 Fecha:
Contrato de obra No LPD06-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	

PLANO ANEXO ITEM No.9,08

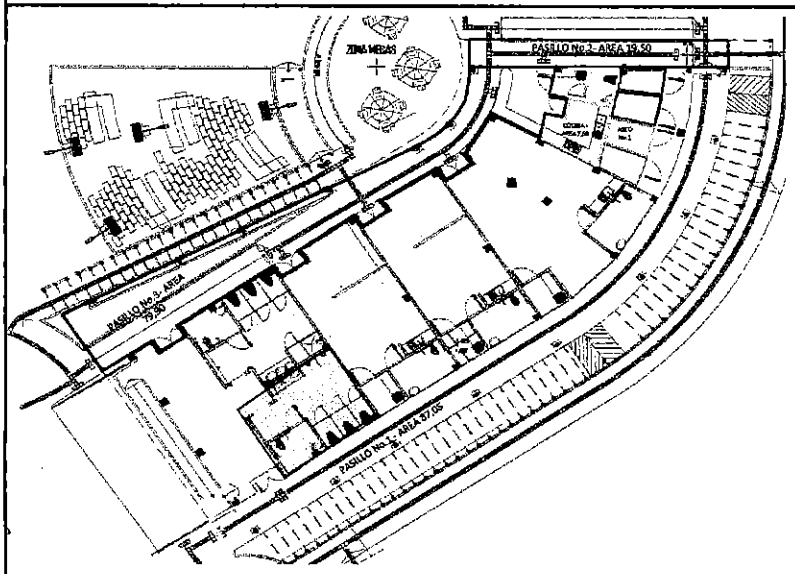

BLOQUE No.2

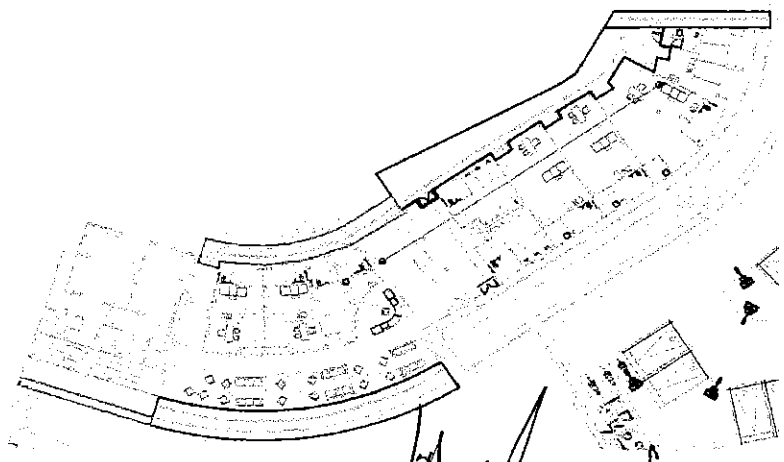

Observaciones:

Contratista: [illegible]
Apoyo a la Supervisión
Nombre: Jhon Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 7 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023, CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


ITEM:	9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	Unidad: m2	Cantidad total:	370,48

Croquis y/o Registro fotográfico	Descripción	Dimensiones		Area	Cantidad
		Longitud	Altura		

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 8 de: 9 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023, CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO ITEM No.9,08

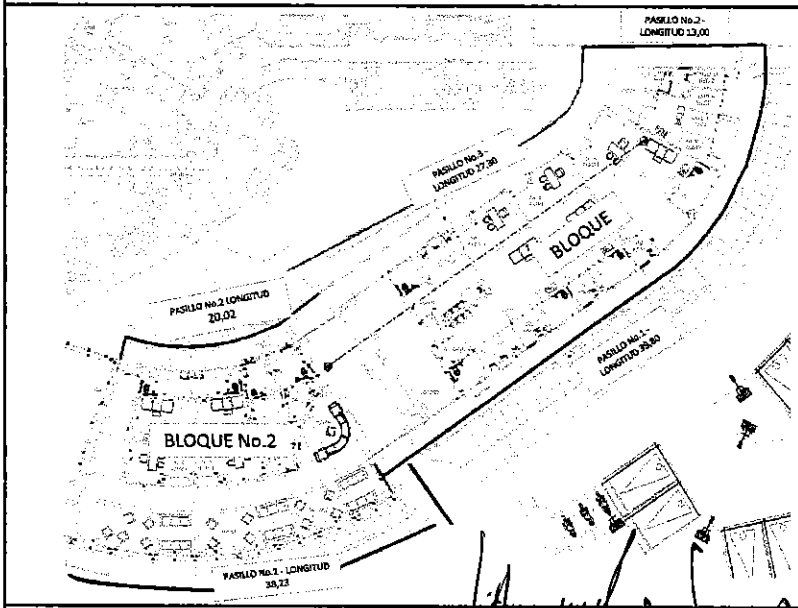

Observaciones:

Ocupación de Supervisión



Apoyo a la Supervisión

Nombre: Julio Cesar Velasco

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	10,04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CORONA AQUA FLOW-COVER GLOSS	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	9,00

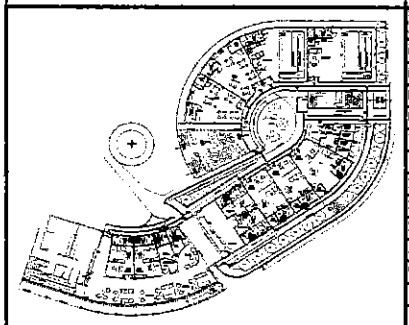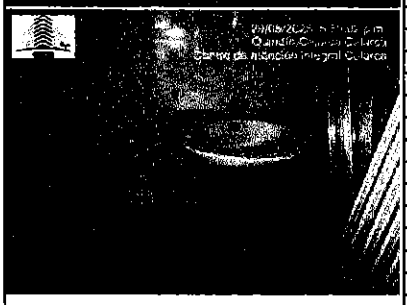Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones					Cantidad
		Longitud					
	MES DE JUNIO 01 DEL 20	UNIDAD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	9,00
	BLOQUE No.2						
	BAÑO SALA DE ATENCION No.1	1,00				1,00	1,0
	BAÑO SALA DE ATENCION No.2	1,00				1,00	1,0
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS	1,00				1,00	1,0
	BAÑO PMR	1,00				1,00	1,0
	BLOQUE No.3						
	BAÑO SALA DE ATENCION No.3	1,00				1,00	1,0
	BAÑO SALA DE ATENCION No.4	1,00				1,00	1,0
	BAÑO SALA DE ATENCION No.5	1,00				1,00	1,0
	BAÑO HOMBRES - BATERIA DE BAÑO	1,00				1,00	1,0
	MULERES HOMBRES - BATERIA DE BAÑO	1,00				1,00	1,0
							
							

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°16	9,00

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 10,04

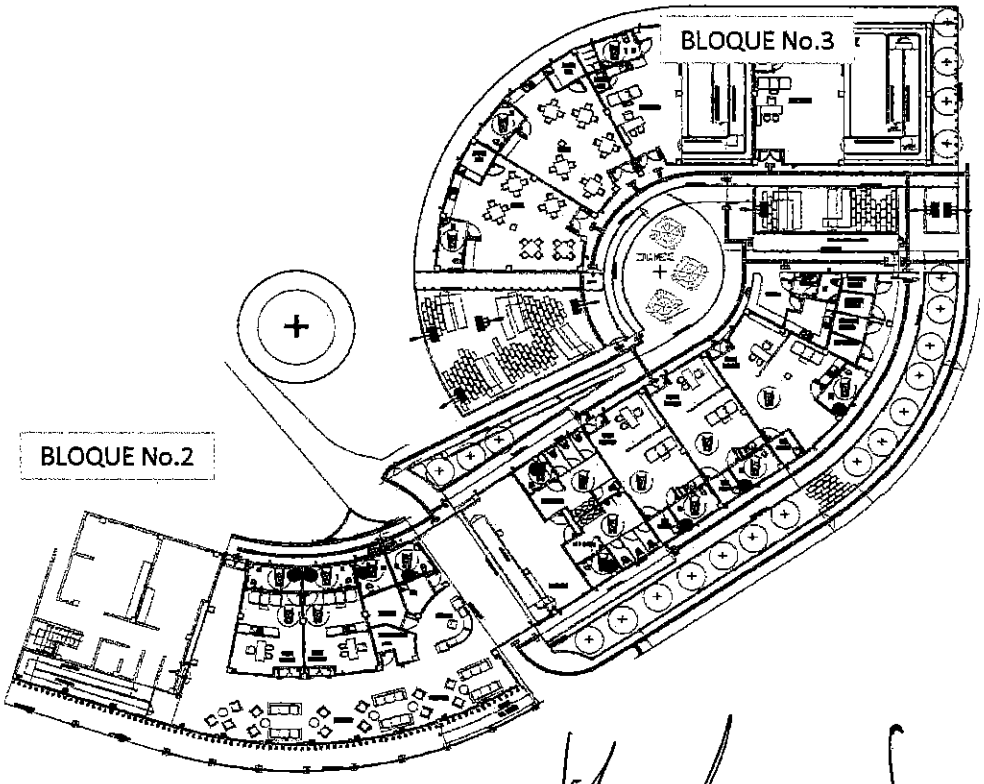

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Fernando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, INCLUYE GRIFERÍA	Unidad:	UND	Cantidad total:	1,00

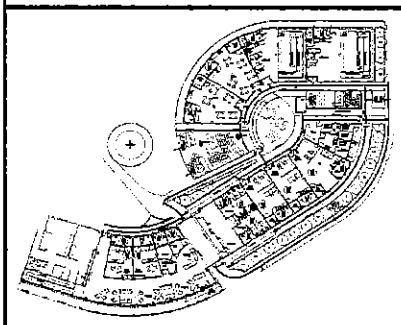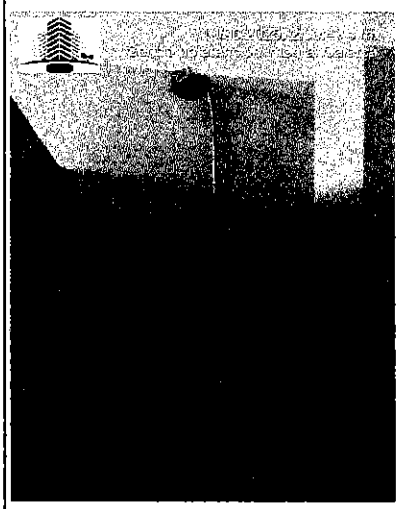Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones					Cantidad
		Longitud					
	MES DE JUNIO DEL 20	UNIDAD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	1,00
	BLOQUE No.3						
	BAÑO MUJERES - BATERIA	1,00				1,00	1
							

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA Nº15	1,00

Observaciones:


Contratista
Nombre: Alfonso Ibañez Vasquez

Aprobó la Supervisión
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 10,05

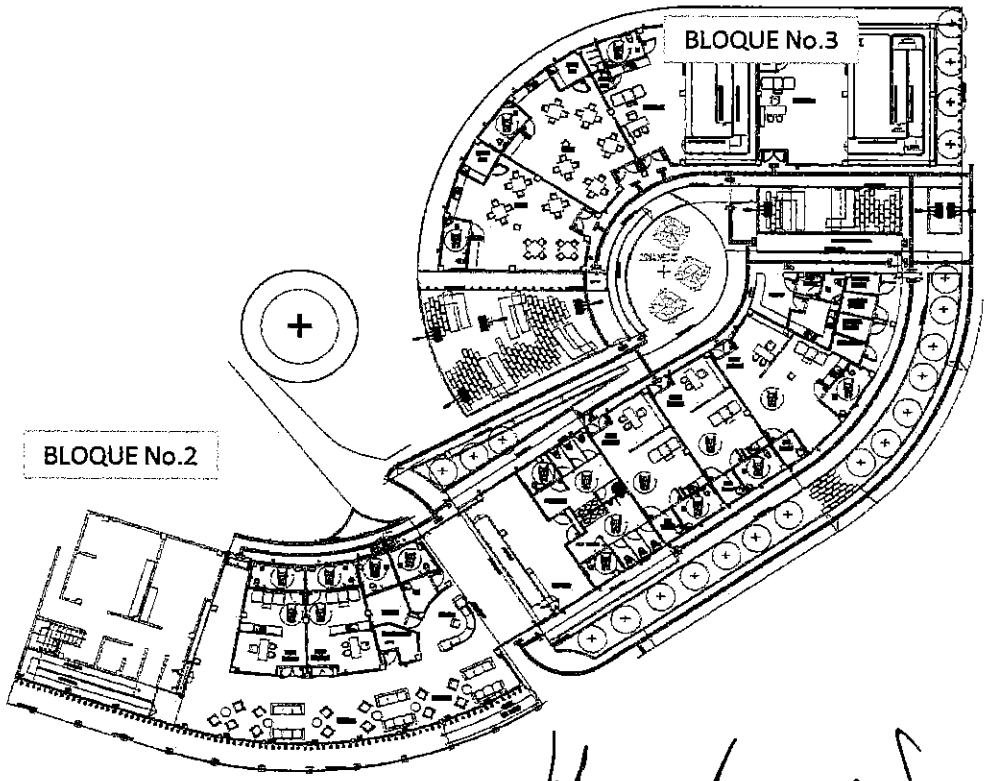


Observaciones:	Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Valero


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	19,02	LAMPARA PANEL LED DE 60X60	Unidad:	UND	Cantidad total:	33,00

Croquis y récord fotográfico

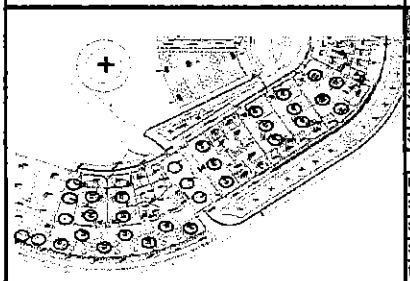

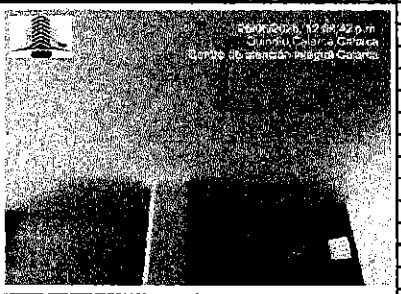



Descripción	Dimensiones					Cantidad
		Longitud				
MES DE JUNIO 01 DEL 30	UNIDAD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	No. ELEMENTOS	33,00
BLOQUE No.3						
SALA DE ATENCION No.3	1,00				3,00	3,0
SALA DE ATENCION No.4	1,00				3,00	3,0
SALA DE ATENCION No.5	1,00				4,00	4,0
SALA DE ESPERA	1,00				3,00	3,0
BLOQUE No.2						
SALA DE ATENCION No.1	1,00				2,00	2,0
SALA DE ATENCION No.2	1,00				2,00	2,0
SALA DE ESPERA	1,00				10,00	10,0
PASILLO INGRESO BLOQUE No.2 - No.3	1,00				3,00	3,0
RAMPA	1,00				3,00	3,0

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA Nº15	33,00

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Eduardo Isaza Cardona

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallace

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 19.02

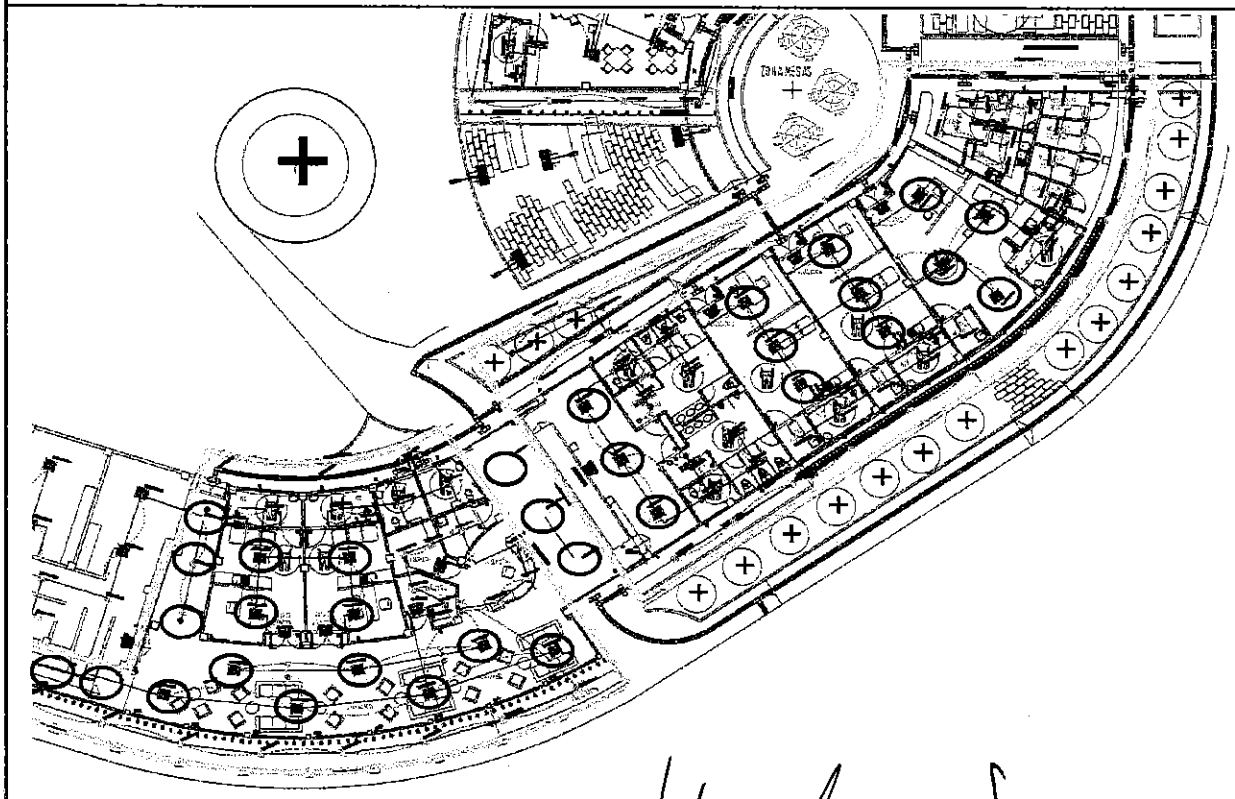

Observaciones:

Contratista
Nombre: Armando Ibarra Vasquez


Apoyo a la Supervisión
Nombre: Julio Cesar Valtierra

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP2.01	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM	Unidad:	M2	Cantidad total:	8,48

Croquis y récord fotográfico

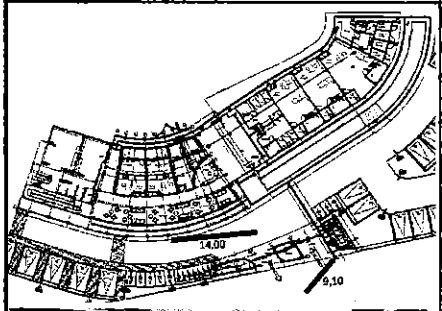





Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	Longitud	Ancho	Alto	Unidad	
MES DE JUNIO 01 DEL 30					8,48
URBANISMO					
RED ACOMETIDA HIDRAULICA	9,10	0,44		1,00	4,00
ACOMETIDA – RED ELECTRICA	14,00	0,32		1,00	4,48

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	60,68
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	18,01
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	6,67
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	22,22
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	16,72
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	124,30
PRESENTE ACTA N°15	8,48

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ignacio Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP2.02	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO COMUN	Unidad:	M2	Cantidad total:	54,19







Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		Longitud	Altura	kg por bolsa		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					54,19
	BLOQUE ABRAZAR - EXISTENTE					
	Muro paramento - Guayana colegio	4,60	2,90			13,34
		18,10	1,00			18,1
	Muro Graderia	6,50	3,50			22,75


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	54,19

Observaciones:

Contratista: Nombre: Alejandro Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión: Nombre: Juan Cesar Valleros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 2,02

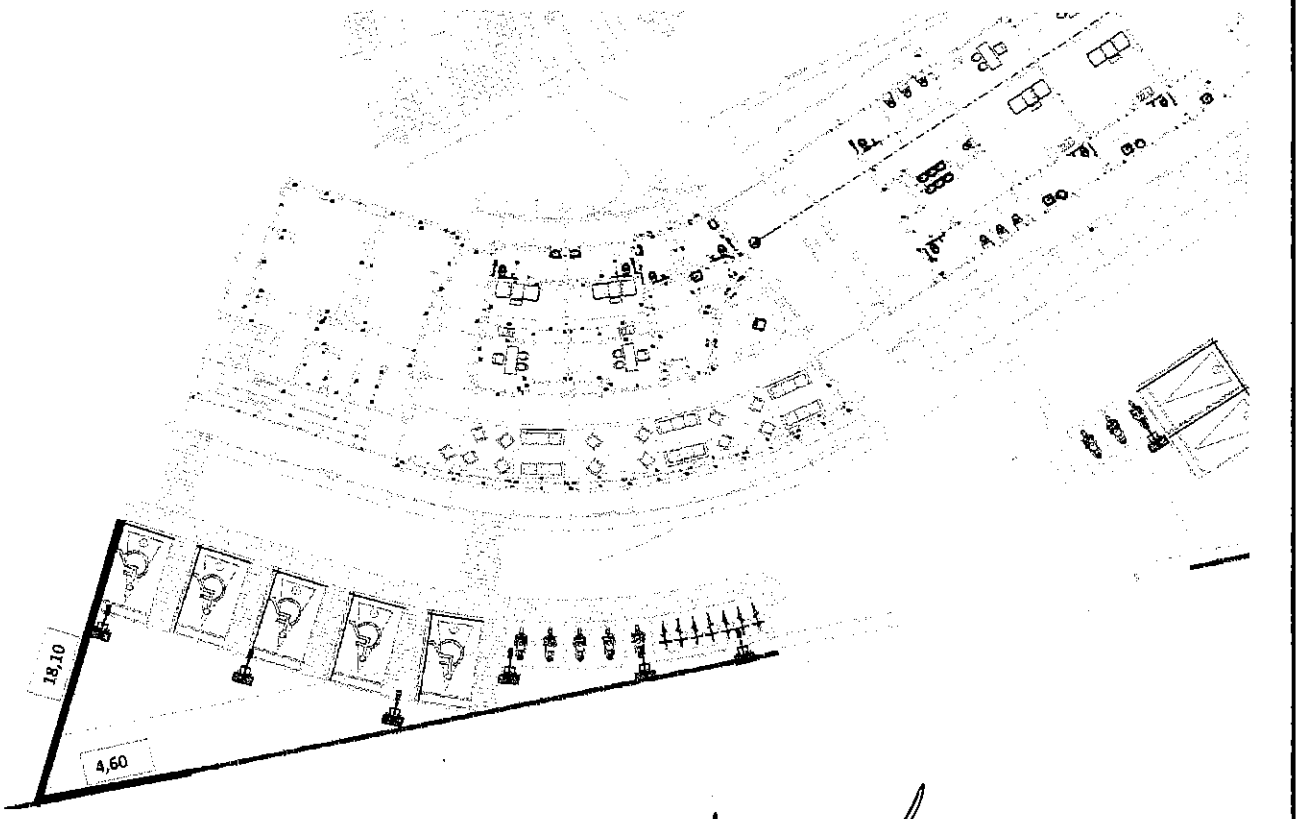


Observaciones:

Contratista:
Nombre: Jeremias Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valtierra

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA				Hoja: 1 de:
				Fecha:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.				
ÍTEM:	INP 2.17	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES TIPO RCD EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	Unidad: M3	Cantidad total: 39,00

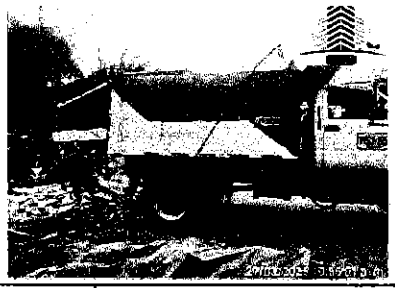Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
		Volumén	Ancho	Alto	Unidad	
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					39
	RETIRO MATERIAL					
	RECIBO No166587	7,00			1,00	7
	RECIBO No173258	8,00			1,00	8
	RECIBO No173257	8,00			1,00	8
	RECIBO No173256	8,00			1,00	8
	RECIBO No173255	8,00			1,00	8
						

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	14,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	7,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	21,00
	PRESENTE ACTA N°15	39,00

Observaciones:

Contratista: Nombre: Fernando Ibañez Vasquez

Aprobó la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 2,17

NIT. 900.488.489-7
CEL: 317 366 03 39

VERSION TS 02

N° 173256

TRANSPORTE Y SUMINISTRO

Fecha :

Obra: Placa:

Trayecto: Desde Hasta:

Ciudad / Municipio:

MATERIAL	MTS	MATERIAL	MTS	MATERIAL	MTS
ARENA		BASE		SUB-BASE	
PIEDRA		BALASTRO		TIERRA	
AFIRMADO		TRITURADO		ESCOMBROS	
ASFALTO		FRESADO		OTROS	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE OBRA

C.C.

NOMBRE CONDUCTOR

NIT. 900.488.489-7
CEL: 317 366 03 39

VERSION TS 02

N° 173256

TRANSPORTE Y SUMINISTRO

Fecha :

Obra: Placa:

Trayecto: Desde Hasta:

Ciudad / Municipio:

MATERIAL	MTS	MATERIAL	MTS	MATERIAL	MTS
ARENA		BASE		SUB-BASE	
PIEDRA		BALASTRO		TIERRA	
AFIRMADO		TRITURADO		ESCOMBROS	
ASFALTO		FRESADO		OTROS	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE OBRA

C.C.

NOMBRE CONDUCTOR

NIT. 900.488.489-7
CEL: 317 366 03 39

VERSION TS 02

N° 173256

TRANSPORTE Y SUMINISTRO

Fecha :

Obra: Placa:

Trayecto: Desde Hasta:

Ciudad / Municipio:

MATERIAL	MTS	MATERIAL	MTS	MATERIAL	MTS
ARENA		BASE		SUB-BASE	
PIEDRA		BALASTRO		TIERRA	
AFIRMADO		TRITURADO		ESCOMBROS	
ASFALTO		FRESADO		OTROS	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE OBRA

C.C.

NOMBRE CONDUCTOR

NIT. 900.488.489-7
CEL: 317 366 03 39

VERSION TS 02

N° 173256

TRANSPORTE Y SUMINISTRO

Fecha :

Obra: Placa:

Trayecto: Desde Hasta:

Ciudad / Municipio:

MATERIAL	MTS	MATERIAL	MTS	MATERIAL	MTS
ARENA		BASE		SUB-BASE	
PIEDRA		BALASTRO		TIERRA	
AFIRMADO		TRITURADO		ESCOMBROS	
ASFALTO		FRESADO		OTROS	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE OBRA

C.C.



NOMBRE CONDUCTOR

Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 3.03	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD DE 0-2 M; INCLUYE BOLAS DE ROCA DE HASTA 0,35 M3,	Unidad:	M3	Cantidad total:	32,82

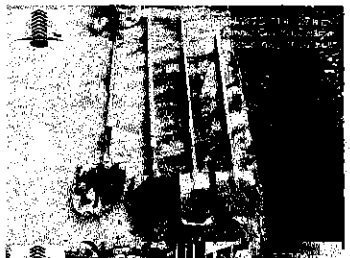Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			Área / Volumen	Cantidad
		Largo	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO DEL 20					32,82
	URBANISMO					
	CARCAMO AGUAS LLUVIAS - FACHADA PRINCIPAL	11,60	0,70	0,70	1,00	5,68
		4,80	0,70	0,50	1,00	1,68
	RED ACOMETIDA AGUA POTABLE	2,10	0,50	0,80	1,00	0,84
		7,00	0,50	0,80	1,00	2,80
		4,60	0,50	0,80	1,00	1,84
		2,60	0,50	0,80	1,00	1,04
	FACHADA PRICIPAL BLOQUE No.3 - BORDILLO	52,83	0,20	0,20	1,00	2,11
		14,90	0,20	0,20	2,00	1,18
		2,30	0,20	0,20	2,00	0,18
	ACOMETIDA - RED ELECTRICA	14,00	0,32	0,50	1,00	2,24
		15,00	0,50	0,80	1,00	6,00
	CAJA MEDIDOR	0,90	0,90	0,90	1,00	0,73
	CAJA TIPO EDEP - RED ELECTRICA	1,20	1,20	0,90	1,00	1,30
	CAJA No.1 A LA CAJA No.2	13,00	0,50	0,80	1,00	5,20


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	32,82	

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Arnaldo Ibeth Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valtierra

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 3,03

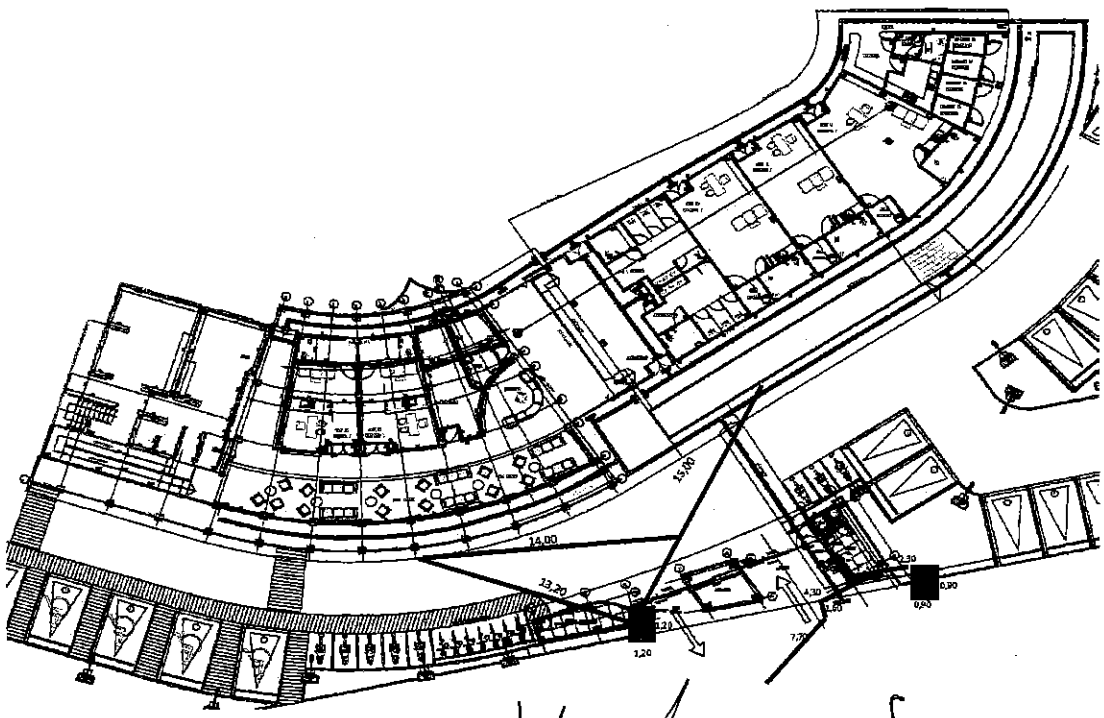


Observaciones:

Contratista:

Apoyo a la Supervisión:

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA					Hoja: 1 de:	
					Fecha:	
Contrato de obra No LP005-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.						
ITEM:	INP 3.06	LLENOS MANUALES CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	**Unidad:**	M3	**Cantidad total:**	14,76


Croquis y record fotográfico	*Descripción*	*Dimensiones*			*Área / Volumen*	*Cantidad*
		Largo	*Ancho*	*Alto*		
	MES DE JUNIO 01 DEL 23					14,76
	REDES EXTERIORES					
	RED ACOMETIDA AGUA POTABLE	2,10	0,50	0,80	1,00	0,84
		7,00	0,50	0,80	1,00	2,80
		4,60	0,50	0,80	1,00	1,84
		2,60	0,50	0,80	1,00	1,04
	ACOMETIDA - RED ELECTRICA	14,00	0,32	0,50	1,00	2,24
		15,00	0,50	0,80	1,00	6,00
	B L O Q U E N o . 3					

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	119,27
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	19,13
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	138,40
	PRESENTE ACTA N°15	14,76

Observaciones:

Contratista: *Interventoría:*
Nombre: *Nombre:* Julio Cesar Williams

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 3,06

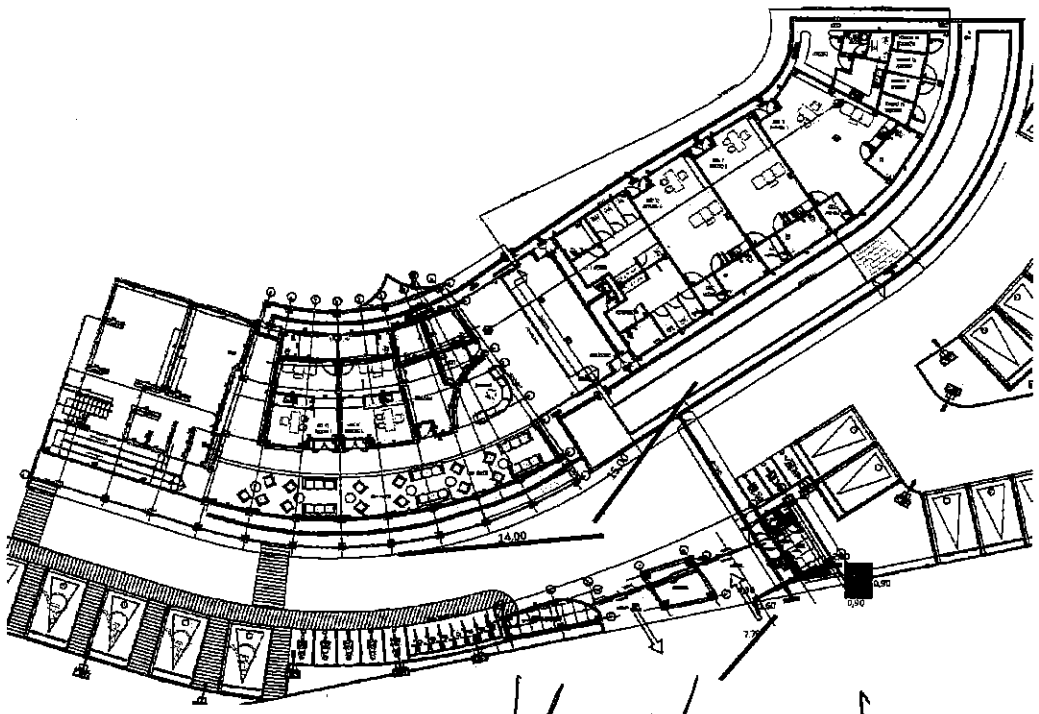

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallerio


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 5,02	CAJA DE INSPECCION DE 0,60 M X 0,60 M EN CONCRETO DE 21 MPA(ALCANTARILLADO) CONCRETO 21 MPA, TAPA EN CONCRETO CON MARCO METALICO H=1,50	Unidad:	UN	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico

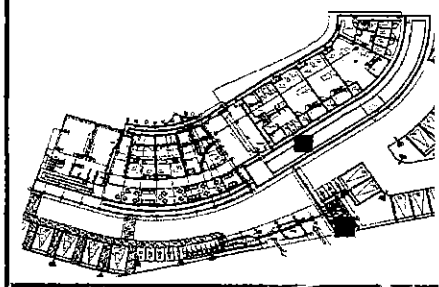

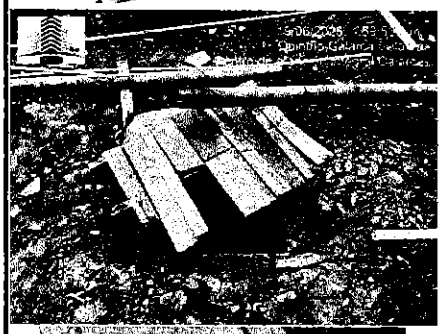

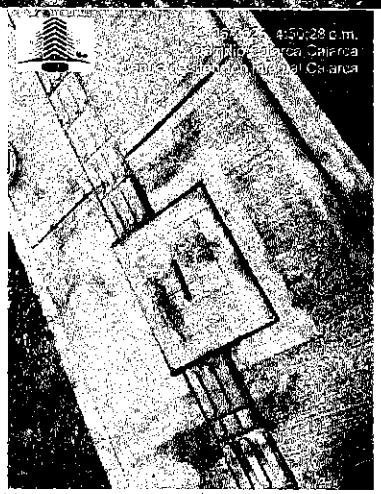

Descripción	Dimensiones				TOTAL
	UNIDAD	Ancho	Alto	CANTIDAD	
MES DE JUNIO 01 DEL 30					2
Caja Registro Control de 2 1/2" - ANDEN BLOQUE No.3	1,00			1,00	1,0
Caja Medidor agua potable - Cuarto de Maquina	1,00			1,00	1,0

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	2,00

Observaciones:

Contratista: Nombre: Hernando Ibañez Vasquez


Interventoría: Nombre: Julia Cesa Valleros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA			Hoja: 1 de:
			Fecha:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 5.05	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO FORMATO DE 10 CM X 30 CM	Unidad:	ML	Cantidad total:	1,37

Croquis y récord fotográfico

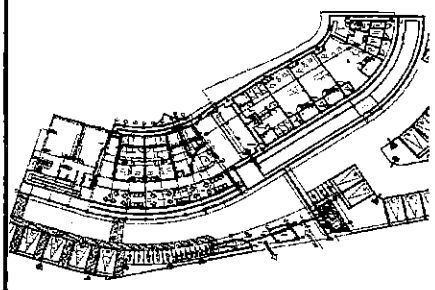

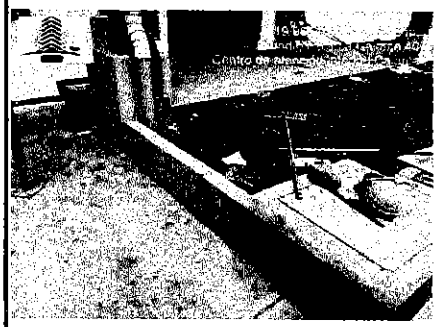

Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	Longitud		kg por bolsa		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					1,37
FACHADA PRICIPAL BLOQUE No.3	1,37		1,00		1,37

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	82,43
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	82,43
PRESENTE ACTA N°15	1,37

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Julio Andres Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 5.06	ANDEN EN CONCRETO ESCOBIADO ESPESOR 15 CM CON DILATACIONES APROXIMADA CADA 1,30 CON MARCO PERIMETRAL Y DILATACION EN ACABADO RATONIADO	Unidad:	UND	Cantidad total:	100,80

Croquis y récord fotográfico

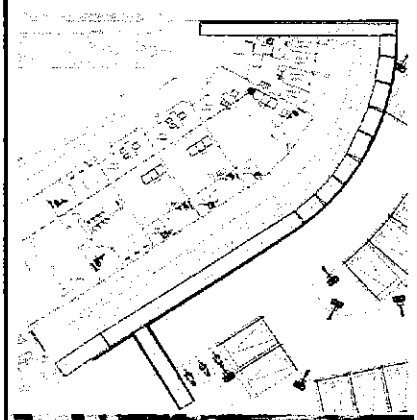





Descripción	Dimensiones				TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto	No. ELEMENTOS	
MES DE JUNIO-01 DEL 24					100,80
BLOQUE No.3					
ANDEN No.1	17,13	1,30		1,00	22,27
ANDEN No.2	3,85	1,30		1,00	5,01
	1,23	1,30		1,00	1,6
	3,61	1,30		1,00	4,69
	1,80	1,30		1,00	2,34
	3,63	1,30		1,00	4,72
	1,22	1,30		1,00	1,59
	5,72	1,30		1,00	7,44
	19,10	1,30		1,00	24,83
ANDEN No.3	4,44	1,82		1,00	8,08
ANDEN No.4	14,02	1,30		1,00	18,23


	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°15	100,80

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ramírez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 5,06

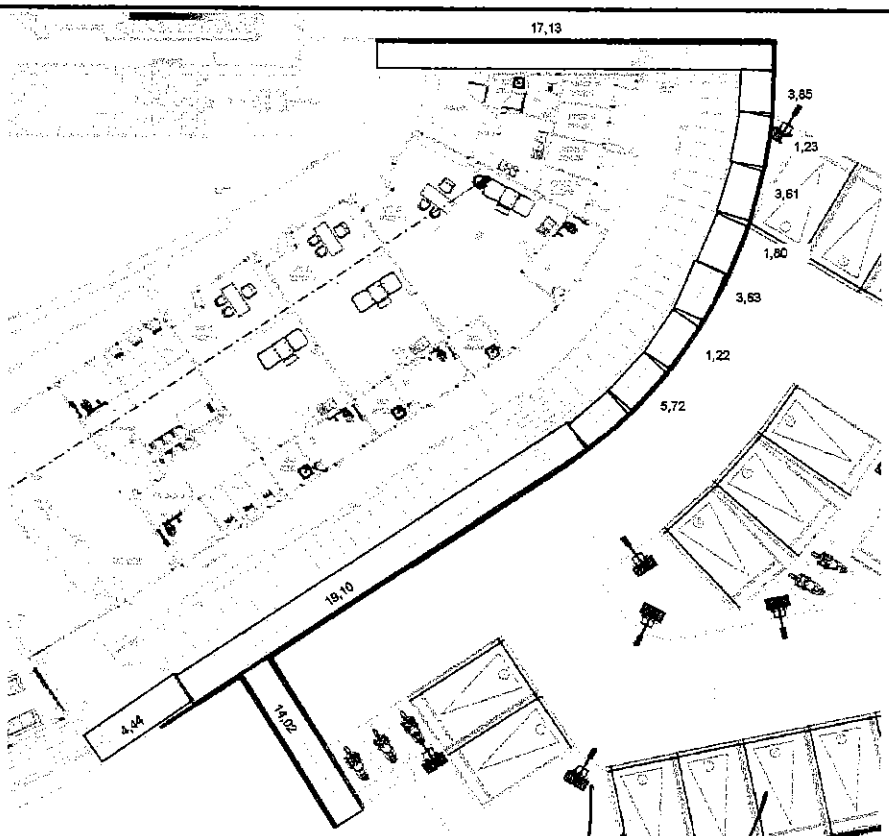

Observaciones:

Contratista:
Nombre:

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Watson


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA


Hoja: 1 de:
Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 5.09	CENEFA EN LOSETA TACTIL	**Unidad:**	ML	**Cantidad total:**	80,39

Croquis y récord fotográfico

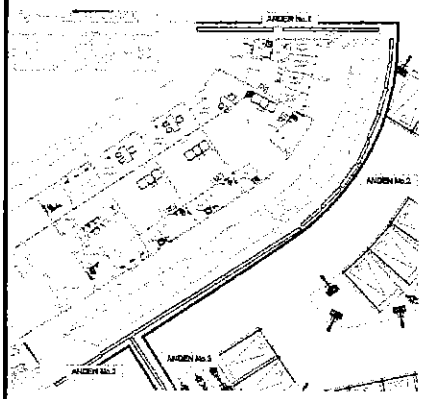

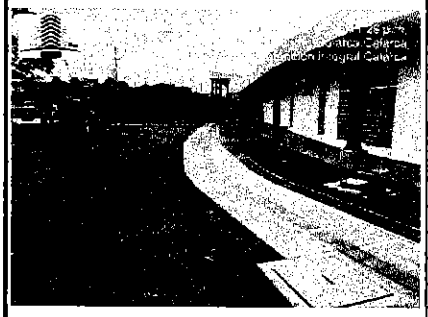



Descripción	*Dimensiones* Longitud	Ancho	Alto	No. ELEMENTOS	TOTAL
MES DE ENERO DEL 30					80,39
BLOQUE No.3					
ANDEN No.1	6,27			1,00	6,27
	7,80			1,00	7,8
	0,36			1,00	0,36
	1,06			1,00	1,06
ANDEN No.2	5,04			1,00	5,04
	5,23			1,00	5,23
	3,82			1,00	3,82
	1,22			1,00	1,22
	5,70			1,00	5,7
	0,40			1,00	0,4
	1,05			1,00	1,05
	8,53			1,00	8,53
	9,88			1,00	9,88
	3,20			1,00	3,2
	2,91			1,00	2,91
	1,18			1,00	1,18
ANDEN No.3	14,50			1,00	14,5
	0,20			1,00	0,2
	1,02			1,00	1,02
	1,02			1,00	1,02


	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°15	80,39

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Bosquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 5,09

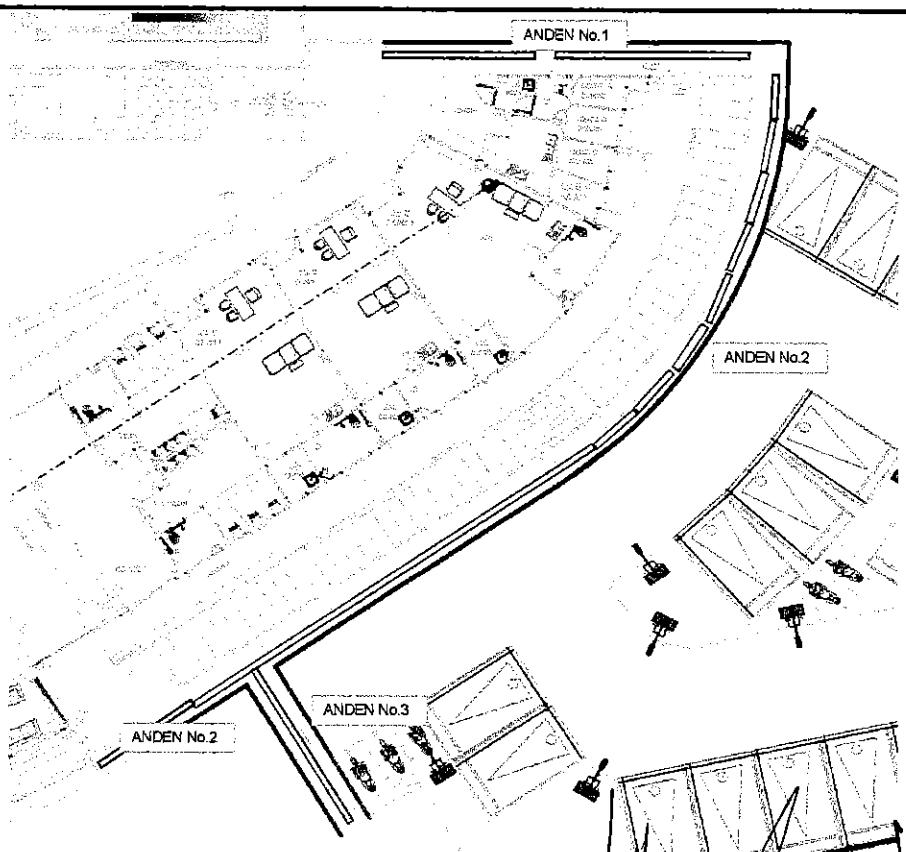

Observaciones:

Contratista:
Nombre: [illegible]


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Juan Cesar Wellers

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 6.01	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE 0,99 x 2,00, CON 4 BISAGRAS , CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,99 X 2 M, MARCO METALICO CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO" , TIPO P1	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	5,00

Croquis y récord fotográfico

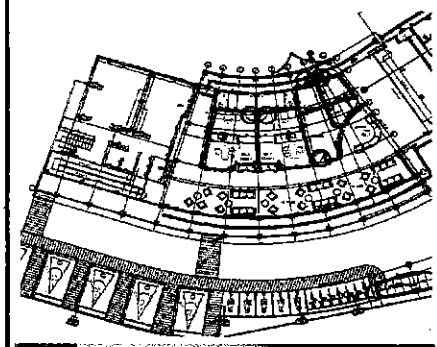



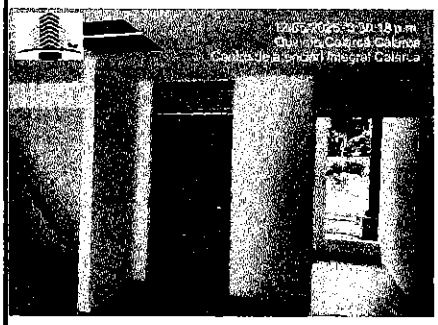

Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	UNIDAD		kg por bolsa		
MES DE JUNIO DEL 30					5
BLOQUE No.3					
BAÑO SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1,00
BAÑO SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1,00
CUARTO TECNICO	1,00			1,00	1,00
BAÑO TALLAS PEQUEÑA	1,00			2,00	2,00


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	14,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	14,00
PRESENTE ACTA N°15	**5,00**

Observaciones:

Contratista
Nombre: Alejandro Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 6,01

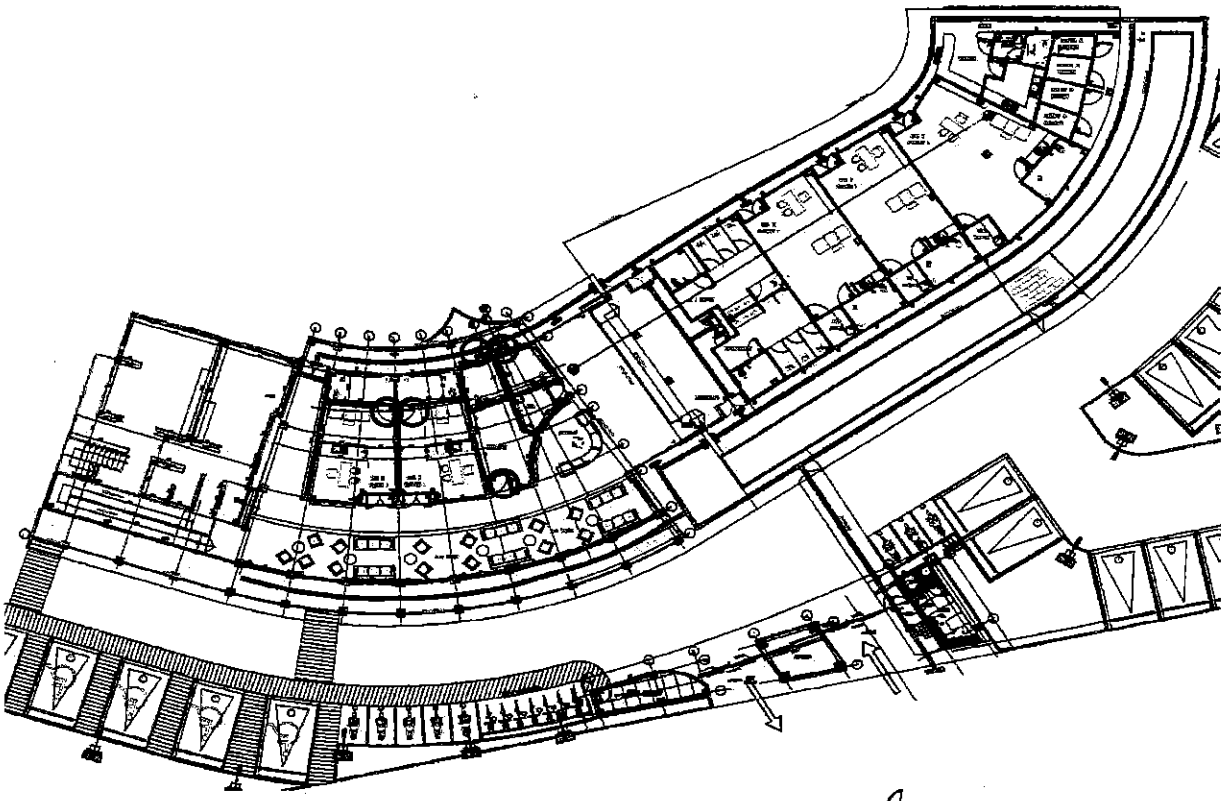

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibáñez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valderas


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 6.02	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE DOBLE 1,59 x 2,00, CON 4 BISAGRAS CADA NAVE, CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,75 X 2 M C/U, MARCO EN MET CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA DE 2 1/2" , TIPO P2	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	7,00

Croquis y récord fotográfico

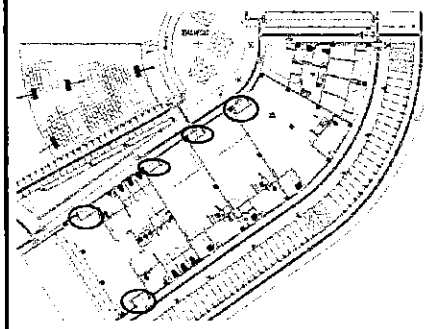

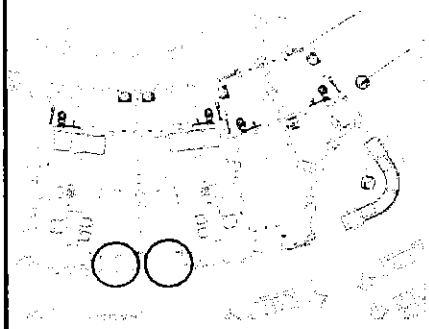



Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	UNIDAD		kg por bolsa		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					7
BLOQUE No.3					
SALA ATENCION No.3	1,00			1,00	1,00
SALA ATENCION No.4	1,00			1,00	1,00
SALA ATENCION No.5	1,00			1,00	1,00
ACCESO BARERIA BAÑO	1,00			2,00	2,00
BLOQUE No.2					
SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1,00
SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1,00

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	7,00

Observaciones:

Contratista:
Nombre: [illegible] Vásquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Jhon Cesar Vallejo

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 6.03	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE 0,85 x 2,00, CON 4 BISAGRAS , CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,85 X 2 M, MARCO METALICO CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO" , TIPO P3	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	2,00

Croquis y récord fotográfico

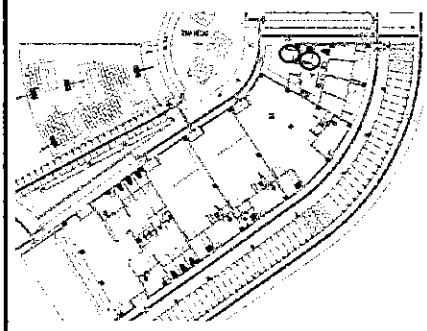



Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	UNIDAD		kg por bolsa		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					2
BLOQUE No.3					
BAÑO - COCINA	1,00			2,00	2,00

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°15	2,00

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Aprobó la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros)

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 6.04	PUERTA COLGANTE CORREDIZA COLOR NATURAL DE 1 NAVE FIJA - 2 NAVES CORREDIZAS, PERFIL METALICO 4*10 COMO REFUERZO CON MODULOS FIJOS MOTOR ELECTRICO AVALON DE ACCESMATIC DE 3,27M X 2,50M CON VIDRIO LAMINADO 3MM + 3MM CLARO TIPO P5	Unidad:	UND	Cantidad total:	0,40

Croquis y récord fotográfico

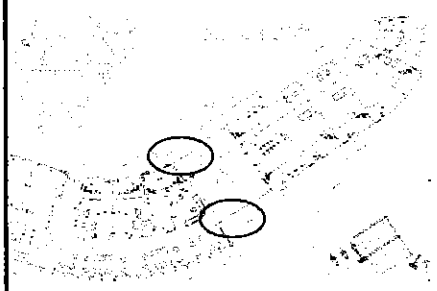



Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	UNIDAD		kg por bolsa		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					0,4
BLOQUE No.2 - No.3					
ACCESO PRINCIPAL	1,00			0,40	0,40

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	1,60
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	1,60
	PRESENTE ACTA N°15	0,40

Observaciones:

Contratista
Nombre: Arnaldo Ibarra Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 6.07	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE Y LATERAL EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1"1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" ¾ DE 2,50M X 2,20 M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V2	Unidad:	UND	Cantidad total:	-10,15

Croquis y récord fotográfico







Descripción	Dimensiones					TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto	AREA CONTRATADA	CANTIDAD	
MES DE JUNIO 01 DEL 30						**-10,15**
BLOQUE No.3						
SALA ATENCION No.3	2,50		2,14	5,50	1,00	0,97
SALA ATENCION No.4	2,50		2,14	5,50	1,00	0,97
SALA ATENCION No.5	2,50		2,14	5,50	1,00	0,97
BLOQUE No.2						
SALA ATENCION No.1	2,50		2,14	5,50	1,00	0,97
SALA ATENCION No.2	2,50		2,14	5,50	1,00	0,97
DESCUENTO PAGO - EN ACTA No.14	1,00				-15,00	-15,00


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	15,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	15,00
PRESENTE ACTA N°15	**-10,15**

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Juan Cesar Valbuena

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 6.07

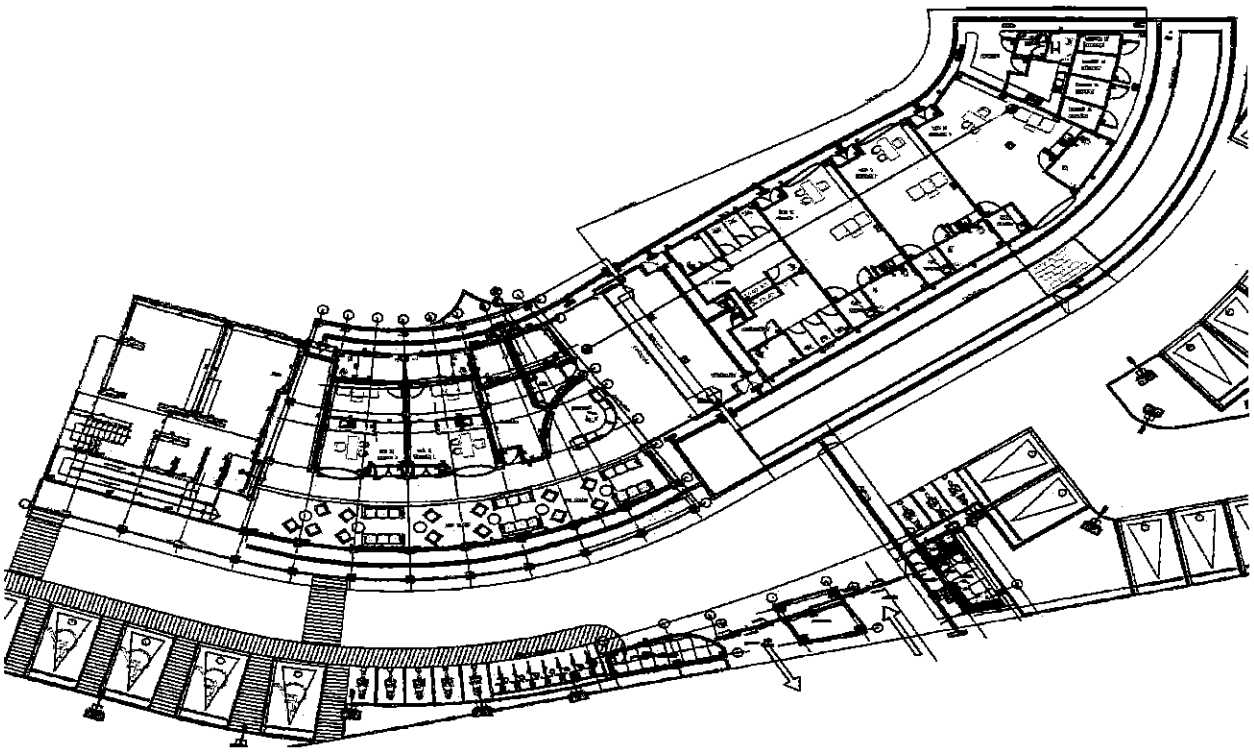


Observaciones:						Contratista: Nombre: Fernando Ibañez Vasquez	Apoyo a la Supervisión: Nombre: Juan Cesar Martinez

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 6.10	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1"1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" 3/4 DE 2,22 X 1,55M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V8	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	20,51

Croquis y récord fotográfico

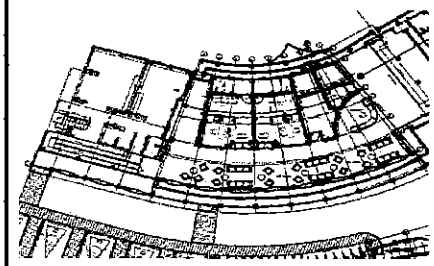





Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	LONGITUD	*ALTO*	*AREA CONTRATADA*		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					**20,51**
BLOQUE No.2					
SALA ESPERA	2,40	2,20	3,44	9,00	13,81
	2,115	2,20	3,44	1,00	1,35
RAMPA	2,40	2,20	3,44	3,00	4,6
	1,18	2,20	3,44	1,00	0,75


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	**20,51**

Observaciones:

Contratista:
Hernando Ospina Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 6.10

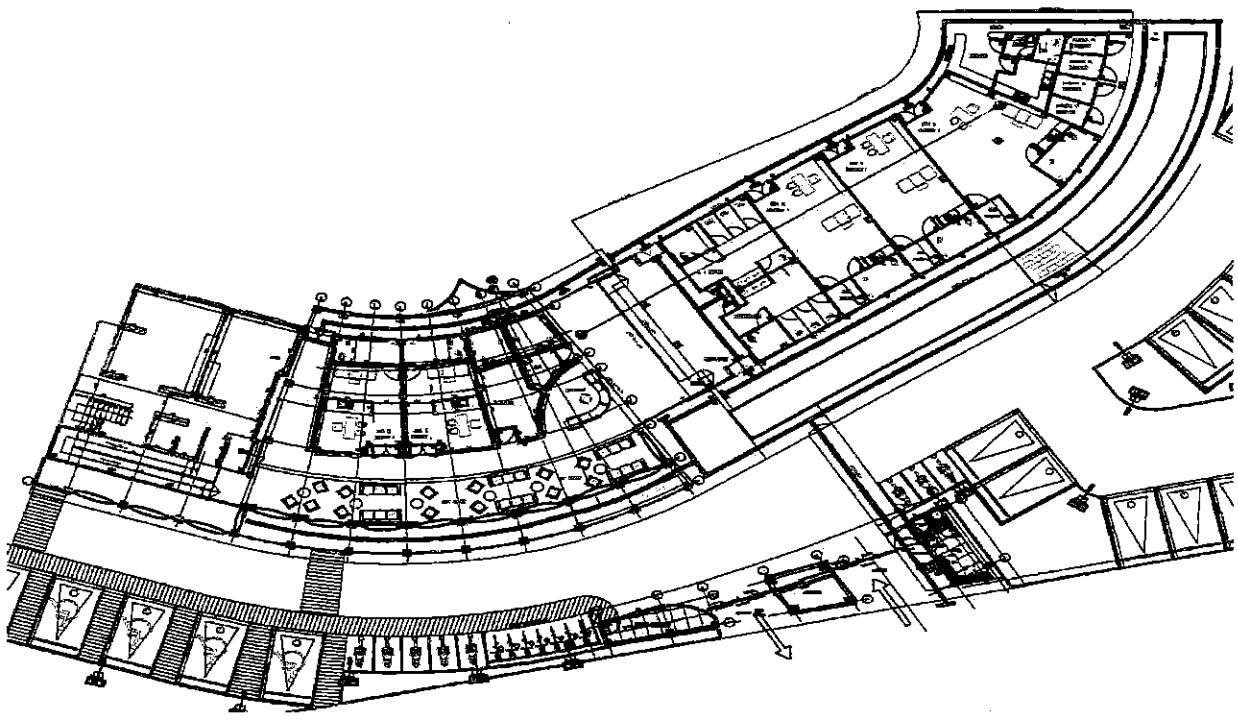


Observaciones:	Contratista. Nombre: Alejandro Ibañez Vasquez	Apoyo a la Supervisión: Nombre: Luis Cesar Helleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 6.11	CELOSIA CON LAMAS FIJAS FIJO EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO DE 1,00M X 2,50M (TIPO C3)	Unidad: UND	Cantidad total:	14,04

Croquis y récord fotográfico

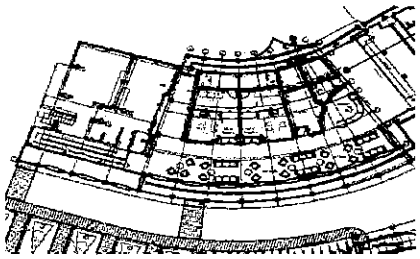





Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	LONGITUD	ALTO	AREA CONTRATADA		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					14,04
BLOQUE No.2					
SALA ESPERA	2,40	1,00	2,50	9,00	8,64
	2,115	1,00	2,50	1,00	0,85
RAMPA	2,40	0,70	2,50	1,00	0,67
	2,40	0,46	2,50	1,00	0,44
BAÑO SALA ATENCION No.1	1,50	0,50	2,50	1,00	0,3
BAÑO SALA ATENCION No.2	1,50	0,50	2,50	1,00	0,3
BAÑO TALLAS PEQUEÑAS	0,80	0,53	2,50	2,00	0,34
BLOQUE No.3					
BATERIA BAÑO - MUJERES	1,50	0,50	2,50	2,00	0,6
BATERIA BAÑO - HOMBRES	1,50	0,50	2,50	2,00	0,6
BAÑO SALA ATENCION No.3	1,50	0,50	2,50	1,00	0,3
BAÑO SALA ATENCION No.4	1,50	0,50	2,50	1,00	0,3
BAÑO SALA ATENCION No.5	1,50	0,50	2,50	1,00	0,3
BAÑO COCINA	0,80	0,49	2,50	1,00	0,16
CUARTO DE MAQUINA					
MUROS	0,53	0,28	2,50	4,00	0,24


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	14,04

Observaciones:

Contratista: Nombre: Armando Herrera Vasquez

Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 6.11

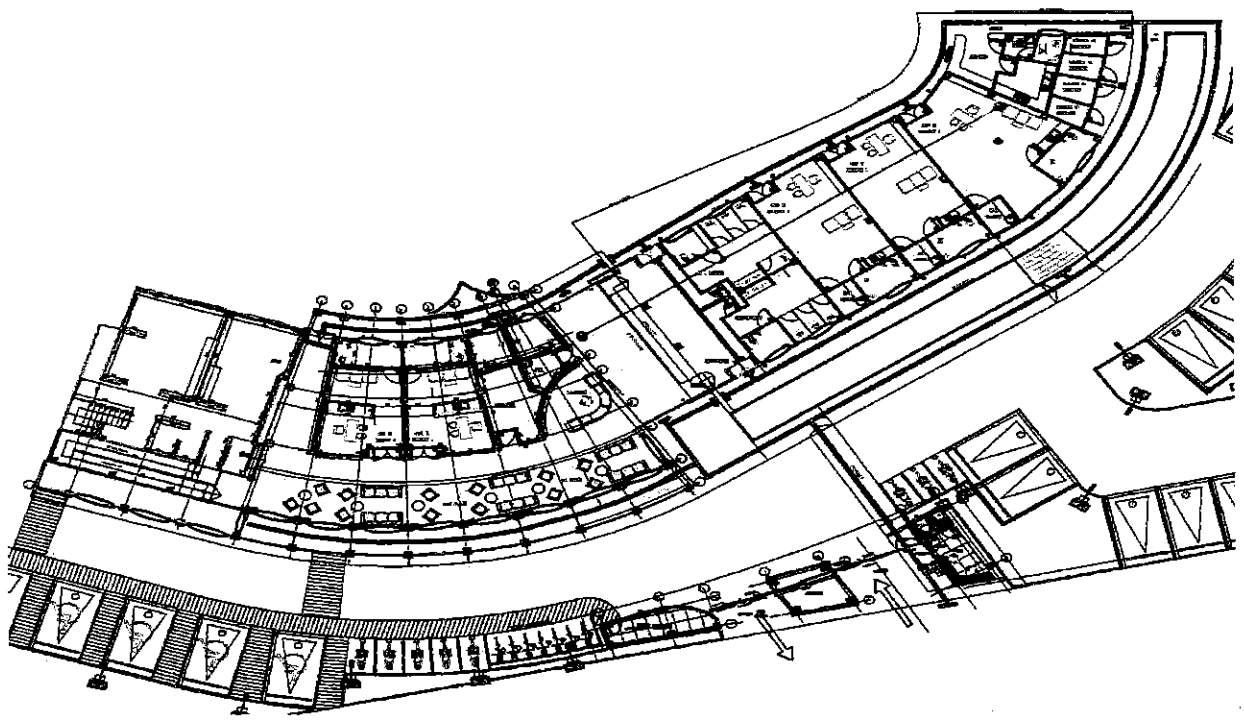


Observaciones:	Contratista: Nombre: Armando Ibañez Velasquez	Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Welteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 6.14	BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE R304 PARA ESCALERAS Y RAMPAS FABRICADO EN TUBERIA 2".	Unidad:	ML	Cantidad total:	27,10

Croquis y récord fotográfico

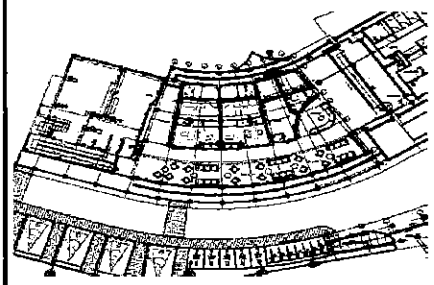





Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	LONGITUD	ALTO	AREA CONTRATADA		
MES DE JUNIO DE DEL 30					27,1
BLOQUE No.3					
RAMPA	8,16			1,00	8,16
	1,740			1,00	1,74
	7,93			1,00	7,93
BLOQUE No.2					
RAMPA	7,37			1,00	7,37
	1,90			1,00	1,9


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA Nº15	**27,10**

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Orlando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 6.14

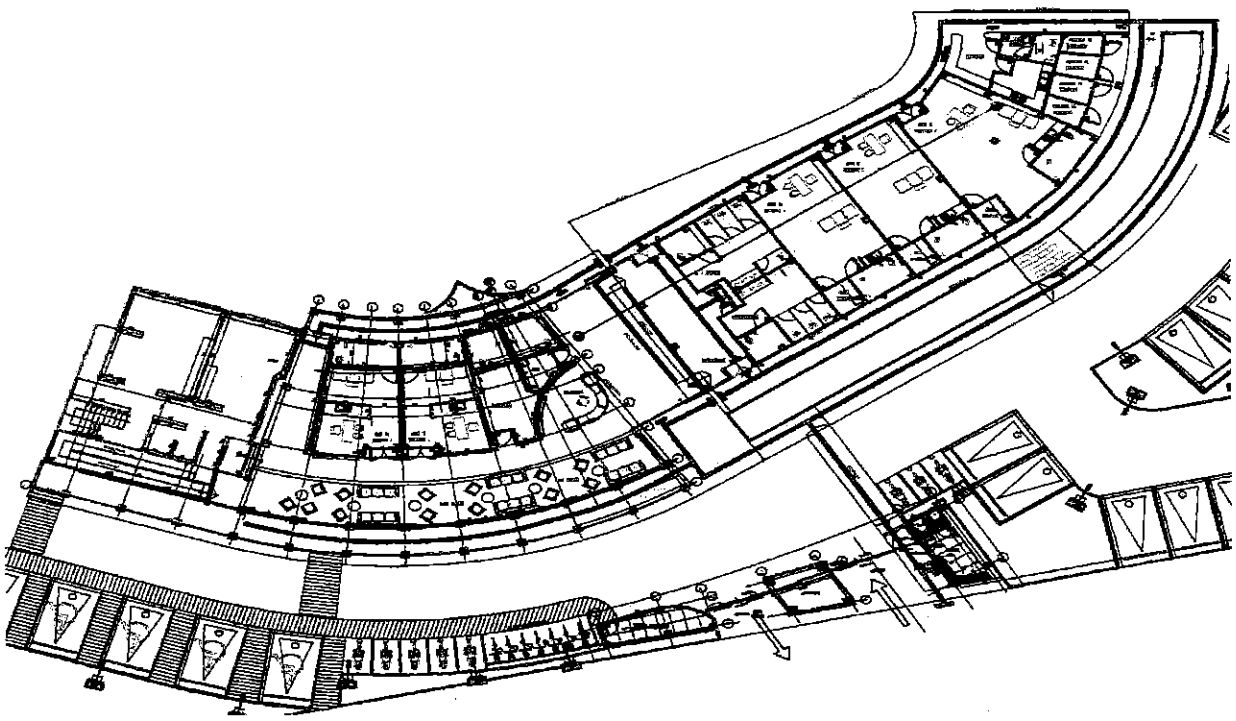

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Fernando Tellez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walleros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 6.16	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304. MEDIDA VARIABLE (L X 0.60 X 0.80); (Largo, Ancho, Alto); (Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18, Entrepaño piso y medio fabricados en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 20	Unidad:	ML	Cantidad total:	5,50

Croquis y récord fotográfico

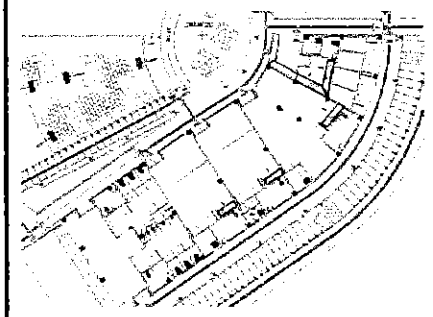

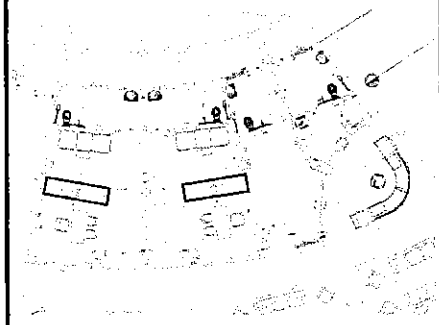

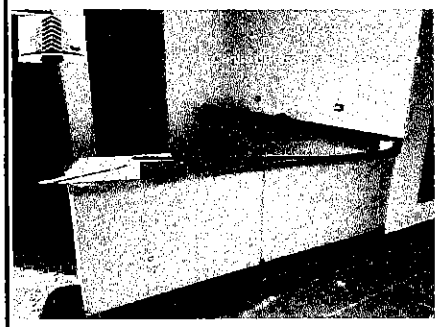

Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	UNIDAD		kg por bolsa		
MES DE JUNIO AL DEL 30					3,5
BLOQUE No.3					
SALA ATENCION No.3	1,27			1,00	1,27
SALA ATENCION No.4	1,30			1,00	1,3
SALA ATENCION No.5	1,53			1,00	1,53
COCINA	2,29			1,00	2,29
	2,34			1,00	2,34
	2,60			1,00	2,6
	2,90			1,00	2,9
BLOQUE No.2					
SALA ATENCION No.1	2,10			1,00	2,1
SALA ATENCION No.2	2,03			1,00	2,03
PAGADO EN ACTA No.14	12,86			1,00	-12,86


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	12,86
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	12,86
PRESENTE ACTA N°15	5,50


Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Aprobó la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros


PLANO ANEXO No.1 - ITEM 6.16

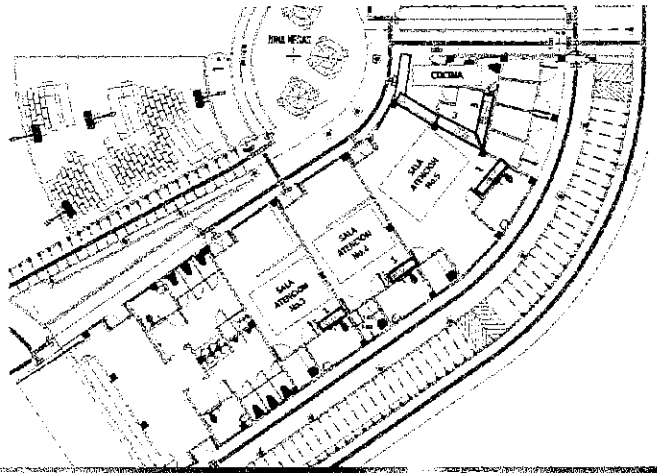

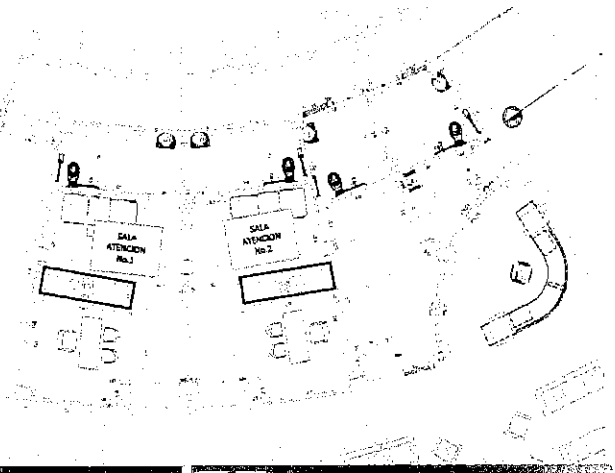



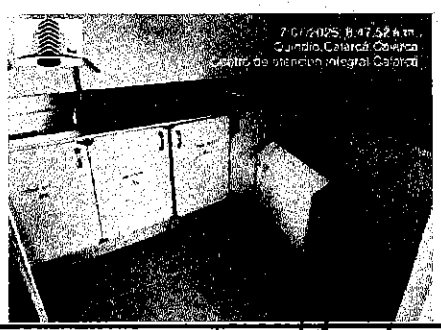



Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 6.17	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE DE 5 PUESTOS PARA EMPOTRAR DE 73X51CM	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	1,00

Croquis y récord fotográfico

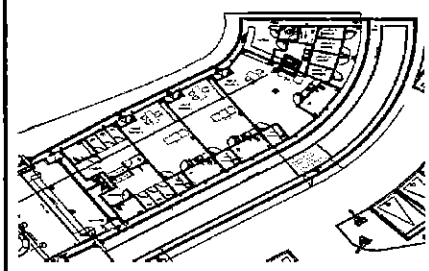

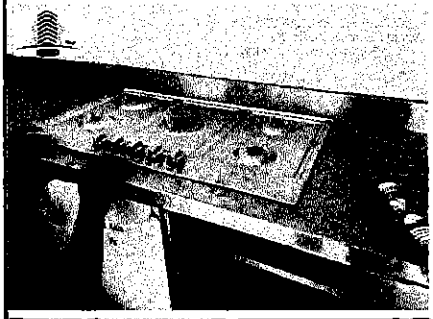

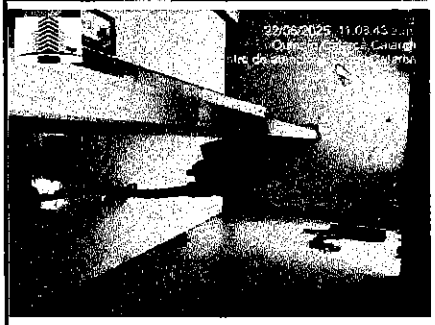

Descripción	Dimensiones				TOTAL
	UNIDAD	ALTO	AREA CONTRATADA	CANTIDAD	
MES DE JUNIO DE DEL 30					1
BLOQUE No.3					
COCINA - MESON	1,00			1,00	1,00

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	1,00

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Aprobó e la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 6.18	CAMPANA EXTRACTORA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE 60CM 170M3/H WH60	Unidad:	UND	Cantidad total:	1,00

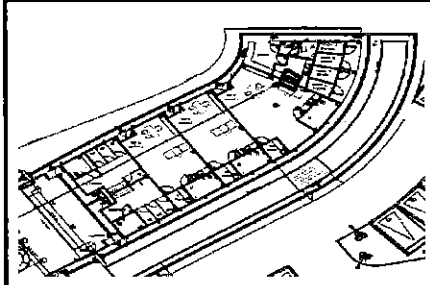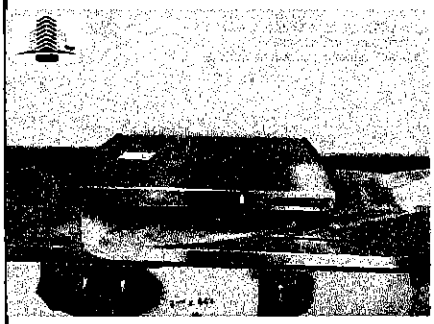Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones				TOTAL
		UNIDAD	ALTO	AREA CONTRATADA	CANTIDAD	
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					1
	BLOQUE No.3					
	COCINA - MESON	1,00			1,00	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	1,00

Observaciones:

Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 7.03	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA PARED EN FORMATO 30 X 60	Unidad:	M2	Cantidad total:	1,90

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones		Cantidad	Cantidad
		LONGITUD	ALTO		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30				**1,90**
	BLOQUE No.3				
	MURO LAVA TRAPERO	0,95	1,00	2,00	1,9

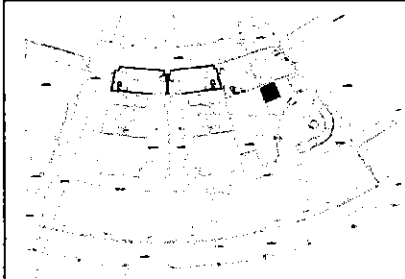

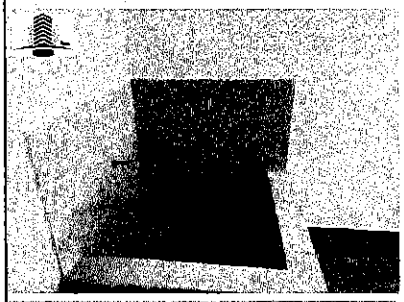

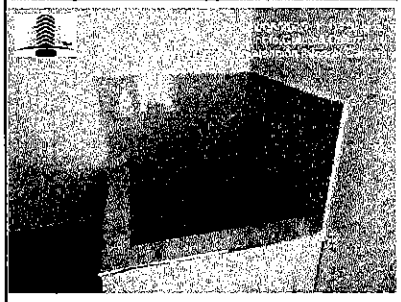

Imagen


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	352,53
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	352,53
PRESENTE ACTA N°15	1,90

Observaciones:

Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Interventoría: Nombre: Julio Cesar Valencia

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 7.03

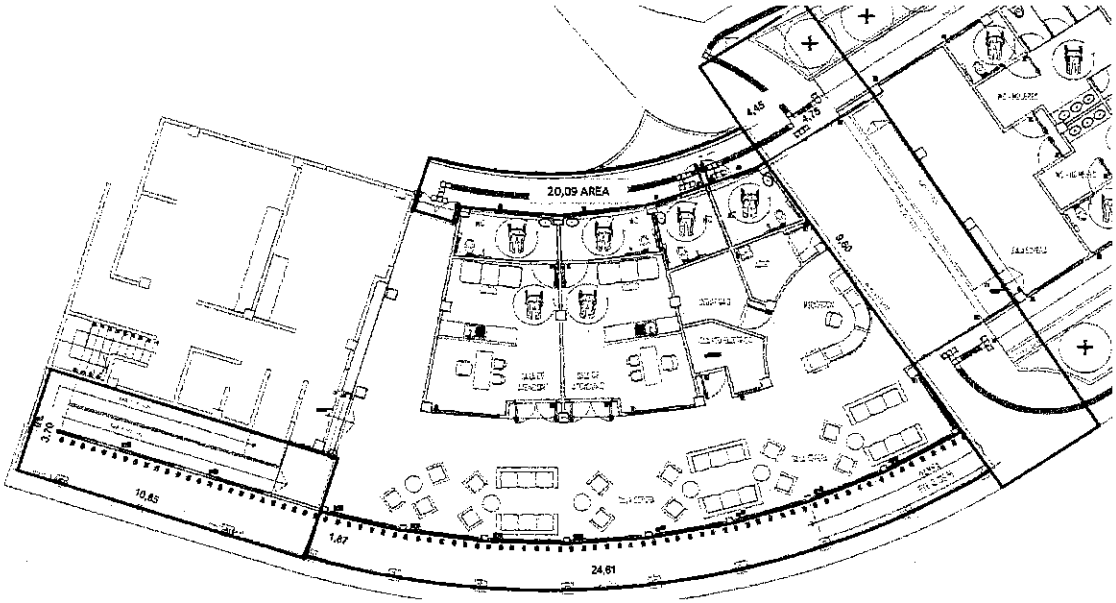

Observaciones:	Contratista:	Apoyo a la Supervisión:
	Nombre: Armando Ramírez Vasquez	Nombre: Julio Cesar Wellmore


Adv.


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 8.02	SUMINSTRO E INSTALACION FLANCHE - SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS =32	Unidad:	ML	Cantidad total:	160,93

Croquis y récord fotográfico

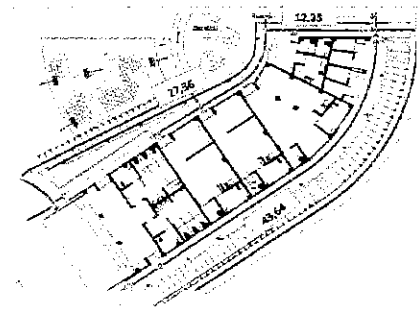

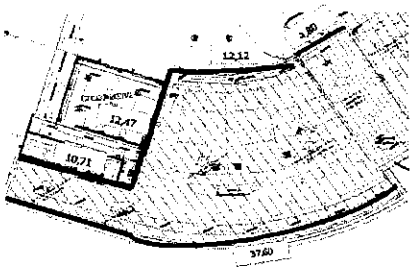



Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	LONGITUD		kg por bolsa		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					160,93
BLOQUE No.3					
ALERO No.1	43,64			1,00	43,64
ALERO No.2	12,23			1,00	12,23
ALERO No.3	27,36			1,00	27,36
BLOQUE No.2					
ALERO No.1	37,60			1,00	37,6
ALERO No.2	10,71			1,00	10,71
ALERO No.3	12,47			1,00	12,47
ALERO No.4	12,12			1,00	12,12
ALERO No.5	4,80			1,00	4,80

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	160,93

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Fernando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallerds

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 9.02	REVOQUE DE SUPERFICIE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	Unidad:	M2	Cantidad total:	45,87

Croquis y récord fotográfico







Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
	LONGITUD		ALTURA		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					45,87
BLOQUE No.2					
EJE F EN LOS EJES 1 - 4	38,08		0,55	1,00	20,94
RAMPA	6,79		0,45	1,00	3,06
PASILLO FACHADA PRINCIPAL	36,50		0,35	1,00	12,78
BLOQUE No.3					
EJE F EN LOS EJES 1 - 8	38,08		0,15	1,00	5,71
RAMPA	5,50		0,45	1,00	2,48
	1,80		0,50	1,00	0,9


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	45,87

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la supervisión:
Nombre: Julio Cesar Molleros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 9,02

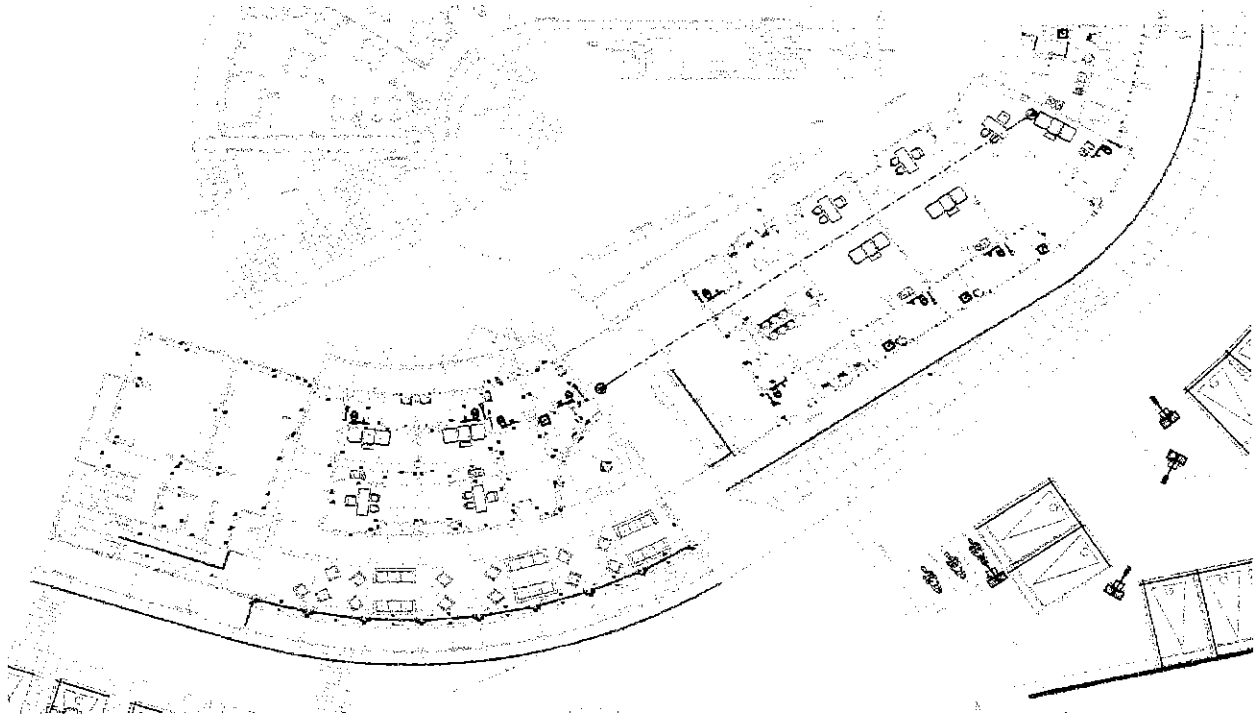

Observaciones:	Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 11.01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A-500 (INCLUYE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA)	Unidad:	KG	Cantidad total:	379,94

Croquis y /ó card fotográfico	Descripción	Dimensiones TIPO	Largo	Peso (Kg/m)	Cantidad	Peso (Kg)	Cantidad de elementos
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					379,94	
	ESTRUCTURA - PUERTAS ACCESO	TP1	4,00	19,58	2,00	356,74	2,0
	REFUERZO PUERTA - CUARTO ASEO		2,00	4,64	2,00	18,55	1,0
			1,00	4,64	1,00	4,64	1,0
							
	COLUMNA	HSS 200X200X5		30,61	1,00	0,00	1
	COLUMNETA	HSS 150X150X8		28,36	1,00	0,00	1
	VIGA	HS200X100X4		18,58	1,00	0,00	1
	CORREA			7,03		0,00	1
						0,00	1
						0,00	1
							1

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	9116,31
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	6519,03
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	2274,69
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	15910,03
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	1282,93
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	2808,76
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	506,65
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	35709,74
PRESENTE ACTA N°15	379,94

Observaciones:

Contratista:
Nombre:

Apoyo a la Supervisión:
Ingeniero Julio Cesar Viasteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 11,02	UNIONES EN ACERO A36 PARA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE PLATINAS, PERFORACIONES, CORTES EN PLASMA, Y CONSUMIBLES)	**Unidad:**	KG	**Cantidad total:**	86,45

Croquis y récord fotográfico







Descripción	*Dimensiones*				*ESPESOR*	*CANTIDAD*
	Largo	*Ancho*	*Área*	*KG*		
MES DE JUNIO DE DEL 30						
BLOQUE 3						86,45
Platinas sobre base superior de columnas bloque 2. Cal-18	Largo(m)	Ancho(m)	Peso m2	Cal	Peso platina	Cantidad
Columna - Viga portal de Ingreso	4,80		9,01	18,00	86,45	2

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	779,07
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	6,40
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	785,47
PRESENTE ACTA N°15	86,45

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Fernando Ibañez Vazquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Montero


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M335	**Unidad:**	KG	**Cantidad total:**	746,80

Croquis y récord fotográfico

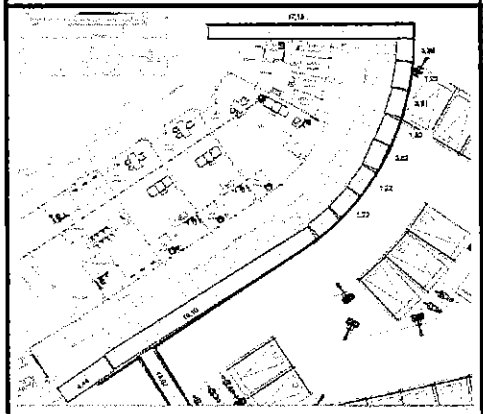

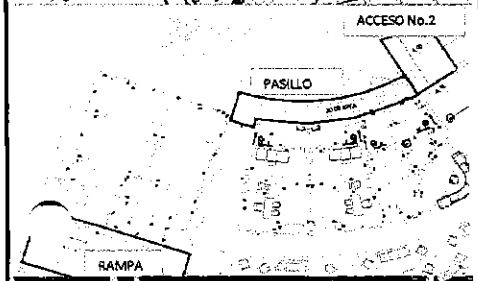



Descripción	*Dimensiones*			*Volumen*	*Cantidad*
	Longitud	*Ancho*	*kp/M2*		
MES DE JUNIO 01 DEL 30				746,80	
ANDEN No.1	17,13	1,30	1,33	59,24	2
ANDEN No.2	3,85	1,30	1,33	13,31	2
	1,23	1,30	1,33	4,25	2
	3,61	1,30	1,33	12,48	2
	1,80	1,30	1,33	6,22	2
	3,63	1,30	1,33	12,55	2
	1,22	1,30	1,33	4,22	2
	5,72	1,30	1,33	19,78	2
	19,10	1,30	1,33	66,05	2
ANDEN No.3	4,44	1,82	1,33	21,49	2
ANDEN No.4	14,02	1,30	5,33	194,29	2
RAMPA	3,68	10,69	5,33	209,68	1
PASILLO	2,09	1,00	5,33	11,14	1
ACCESO 2	4,40	4,78	5,33	112,10	1

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**6776,77**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**4483,29**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**825,18**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**293,85**
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**12379,09**
PRESENTE ACTA N°15	**746,80**


Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Interventoría:
Nombre: Julio Cesar Wallaes

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 11.03

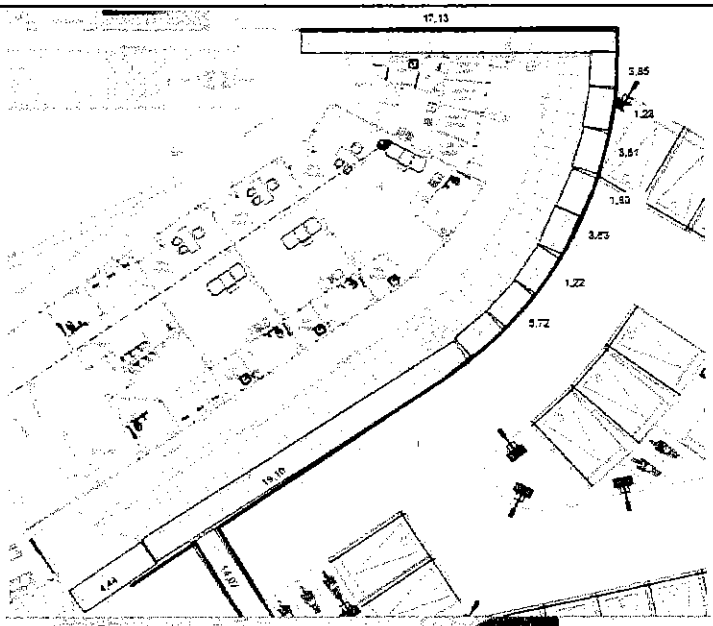




Sidenal

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR

Actualización 30/03/2015



DESCRIPCION Y USOS

Paneles formados por grafiles transversales y longitudinales electrosoldados en todos los puntos de encuentro, fabricados bajo la norma NTC 5806.

Utilizada para refuerzo de concreto en muros de carga, prefabricados, entrepisos, placas, losas de cimentación, pisos, etc.

EMPAQUE Y ROTULADO

Cada paquete de paneles planos tiene una etiqueta con: Nombre del fabricante, descripción del material, lote de fabricación, nombre de la obra, designación de la norma, esquema, peso y número de pedido.

Los paquetes planos tienen un máximo de 50 paneles, amarrados de manera firme y segura.

Características Dimensionales

Designación	Nº de Barras por Malla		Diámetro		Separación		Peso Nominal	Longitud Pales	
	Longitudinal	Transversal	Longitudinal	Transversal	Longitudinal	Transversal		Long	Trans
	6,00 m	2,35 m	mm	mm	mm	mm	kg		
XY-084	16	24	4,0	4,0	150	250	13,1	125	50
XY-106	16	24	4,5	4,0	150	250	17,6	125	50
XY-131	16	24	5,0	4,0	150	250	20,4	150	50
XY-158	16	24	5,5	4,0	150	250	23,5	125	50
XY-221	16	24	6,5	4,0	150	250	30,6	125	50
XY-257	16	24	7,0	5,0	150	250	37,7	125	50
XY-335	16	24	8,0	5,0	150	250	46,6	125	50
XY-378	16	24	8,5	5,0	150	250	51,5	125	50
XX-050	10	24	4,0	4,0	250	250	11,5	125	50
XX-063	12	30	4,0	4,0	200	200	14,1	100	75
XX-084	16	40	4,0	4,0	150	150	18,8	75	50
XX-106	16	40	4,5	4,5	150	150	23,8	75	50
XX-131	16	40	5,0	5,0	150	150	29,3	75	50
XX-159	16	40	5,5	5,5	150	150	35,5	75	50
XX-188	16	40	6,0	6,0	150	150	42,2	75	50
XX-221	16	40	6,5	6,5	150	150	49,6	75	50
XX-257	16	40	7,0	7,0	150	150	57,4	75	50
XX-295	16	40	7,5	7,5	150	150	65,9	75	50
XX-335	16	40	8,0	8,0	150	150	74,9	75	50
XX-378	16	40	8,5	8,5	150	150	84,7	75	50

Propiedades Mecánicas


Resistencia a la tracción mínima Mpa	550
Resistencia a la fluencia mínima Mpa	485
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO	

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.2 - ITEM 11.03

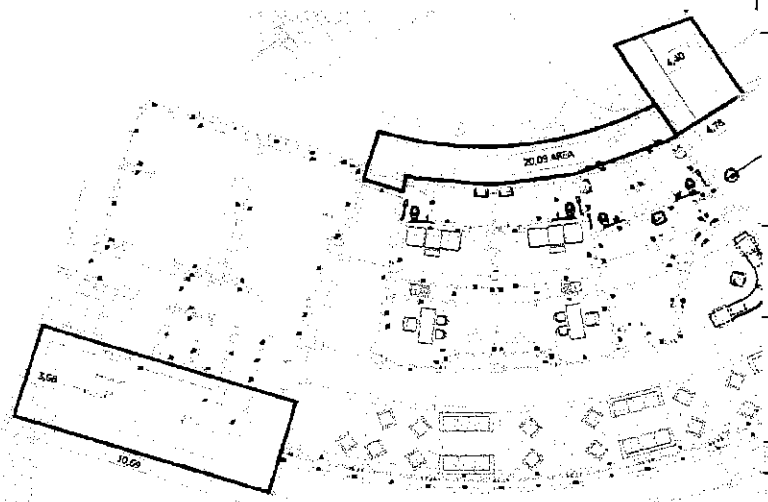




Sidenal

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR

Actualización 20/03/2015



DESCRIPCION Y USOS	Paneles formados por grafiles transversales y longitudinales electrosoldados en todos los puntos de encuentro, fabricados bajo la norma NTC 5806. Utilizada para refuerzo de concreto en muros de carga, prefabricados, entrepisos, placas, losas de cimentación, pisos, etc.
EMPAQUE Y ROTULADO	Cada paquete de paneles planos tiene una etiqueta con: Nombre del fabricante, descripción del material, lote de fabricación, nombre de la obra, designación de la norma, esquema, peso y número de pedido. Los paquetes planos tienen un máximo de 50 paneles, amarrados de manera firme y segura.

Caracteristicas Dimensionales

Designación	Nº de Barras por Malla		Diámetro		Separación		Peso Nominal	Longitud Pales	
	Longitudinal	Transversal	Longitudinal	Transversal	Longitudinal	Transversal			
	6,00 m	2,35 m	mm	mm	mm	mm	Kg	Long	Transv
XY-084	16	24	4,0	4,0	150	250	15,1	125	50
XY-106	16	24	4,5	4,0	150	250	17,6	125	50
XY-131	16	24	5,0	4,0	150	250	20,4	150	50
XY-158	16	24	5,5	4,0	150	250	23,5	125	50
XY-221	16	24	6,5	4,0	150	250	30,6	125	50
XY-257	16	24	7,0	5,0	150	250	37,7	125	50
XY-335	16	24	8,0	5,0	150	250	46,6	125	50
XY-378	16	24	8,5	5,0	150	250	51,5	125	50
XX-050	10	24	4,0	4,0	250	250	11,5	125	50
XX-063	12	30	4,0	4,0	200	200	14,1	100	75
XX-084	16	40	4,0	4,0	150	150	18,8	75	50
XX-106	16	40	4,5	4,5	150	150	23,8	75	50
XX-133	16	40	5,0	5,0	150	150	29,3	75	50
XX-159	16	40	5,5	5,5	150	150	35,5	75	50
XX-188	16	40	6,0	6,0	150	150	42,2	75	50
XX-221	16	40	6,5	6,5	150	150	49,6	75	50
XX-257	16	40	7,0	7,0	150	150	57,4	75	50
XX-295	16	40	7,5	7,5	150	150	65,9	75	50
XX-335	16	40	8,0	8,0	150	150	74,1	75	50
XX-378	16	40	8,5	8,5	150	150	84,7	75	50

Propiedades Mecánicas

Resistencia a la tracción mínima Mpa	550
Resistencia a la fluencia mínima Mpa	485

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:


Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023, CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 13.12	TAPA REGISTRO DE 20X20 CM PLASTICA	**Unidad:**	UN	**Cantidad total:**	12,00

Croquis y récord fotográfico





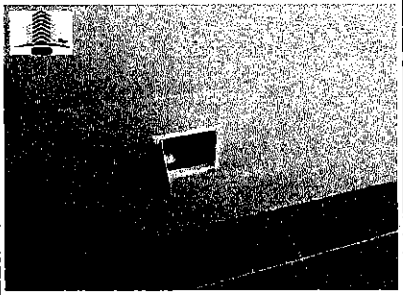

Descripción	*Dimensiones*			*UNIDAD*	*TODAL*
	Unidad	*Ancho*	*Longitud*		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					12,00
BLOQUE No.2					
BAÑO SALA ATENCION No.1	1,00			1	1,00
BAÑO SALA ATENCION No.2	1,00			1	1,00
BAÑO TALLAS PEQUEÑAS	1,00			1	1,00
BAÑO GENERAL	1,00			1	1,00
BLOQUE No.3					
BAÑO SALA ATENCION No.3	1,00			1	1,00
BAÑO SALA ATENCION No.4	1,00			1	1,00
BAÑO SALA ATENCION No.5	1,00			1	1,00
COCINA	1,00			1	1,00
BAÑO COCINA	1,00			1	1,00
BATERIA BAÑO - HOMBRES	1,00			1	1,00
BATERIA BAÑO - MUJERES	1,00			1	1,00
BLOQUE EXISTENTE					
COCINA	1,00			1	1,00

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**0,00**
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**
PRESENTE ACTA N°15	**12,00**

Observaciones:


Contratista
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Interventoría
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 2 de: 2 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 13.12

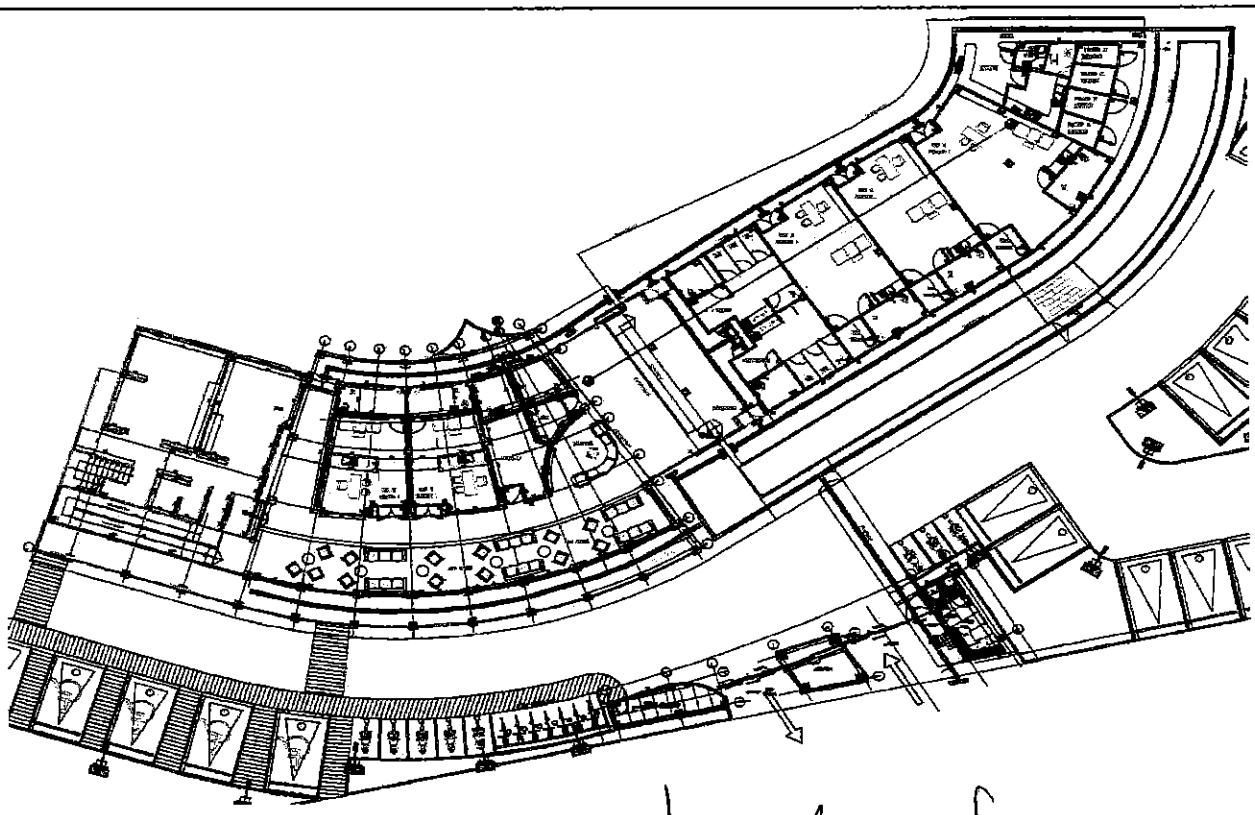

Observaciones:	Contratista Nombre: Armando Ibañez Vasquez	Apoyo a la Supervisión Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 14.22	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL(PARA TUBERIA HORIZONTAL CON SUJETADOR PORTANTE DE 1" Y SOPORTE UNIVERSAL)	Unidad:	UND	Cantidad total:	8,00

Croquis y Registro fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Dimensiones Longitud	CANTIDAD	Cantidad
	NIVEL DE UNIDAD DEL 30				8,00
	BLOQUE No.3				
	RED RCI	1,00		4	4,00
	BLOQUE No.2				
	RED RCI	1,00		2	2,00
					

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	8,00

Observaciones:


Contratista: Ingeniero Armando Ibañez Vergara

Interventoría: Ingeniero Edgar Wallace

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de: 1
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 14.22

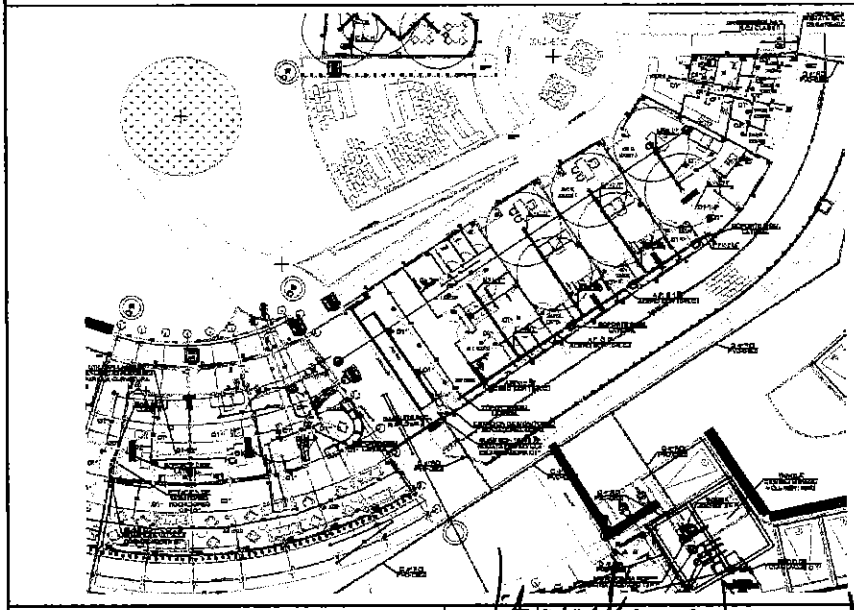

Observaciones:


Contratista:

Interventoría:

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 21.15	SALIDA SANITARIA PVC SIFON 2"	Unidad:	UN	Cantidad total:	13,00

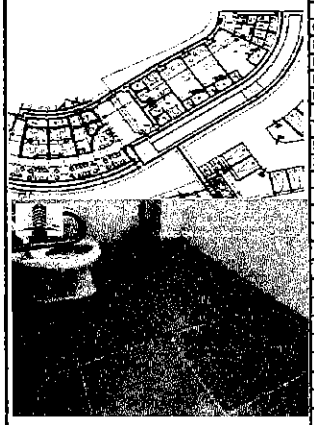Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL
	**ESPECIFICACIONES**					
	BLOQUE No.2					
	CUARTO DE ASEO	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1
	BAÑO GENERAL	1,00			1,00	1
	BAÑO - TALLAS PEQUEÑAS	1,00			1,00	1
	BLOQUE No.2					
	BATERIA BAÑO	1,00			4,00	4
	BAÑO - SALA ATENCION No.3	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.4	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.5	1,00			1,00	1
	BAÑO COCINA	1,00			1,00	1


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	4,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	4,00
PRESENTE ACTA N°15	13,00

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Alberto Barbosa Vergara

Interventoría:
Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Villalba

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 21.15

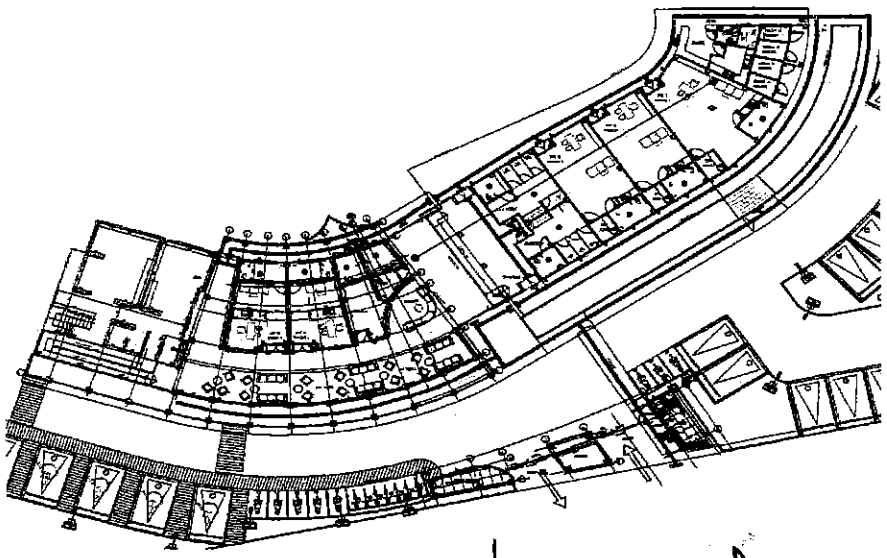

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Alberto Barbosa Vergara

Interventoría:
Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Villalba

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023, CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 21,16	SUMINISTRO E INSTALACION Rejilla Anticucaracha con cuello de 3"x 2".	Unidad:	UN	Cantidad total:	13,00

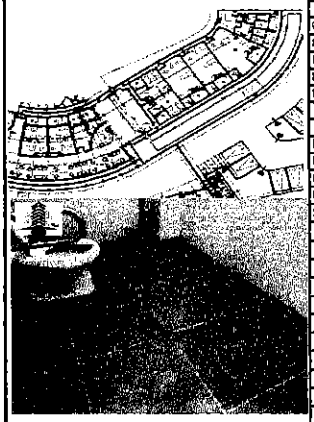
Croquis y/ó card fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		
	MESDEJUNIO DE 30					0,00
	BLOQUE No.2					
	CUARTO DE ASEO	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1
	BAÑO GENERAL	1,00			1,00	1
	BAÑO - TALLAS PEQUEÑAS	1,00			1,00	1
	BLOQUE No.2					
	BATERIA BAÑO	1,00			4,00	4
	BAÑO - SALA ATENCION No.3	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.4	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.5	1,00			1,00	1
	BAÑO COCINA	1,00			1,00	1

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	4,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	4,00
PRESENTE ACTA N°15	13,00

Observaciones:

Contratista:
Interventoría:
Ing. Julio Cesar Valleros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 21,16

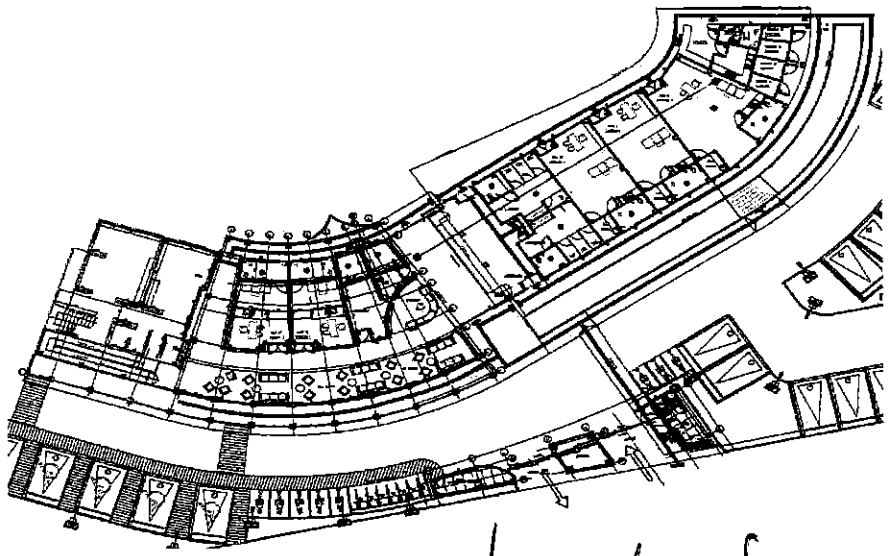



Observaciones:

Contratista:
Apoyo a la Supervisión:
Ing. Julio Cesar Valleros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GAS INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN	Unidad:	UND	Cantidad total:	0,13

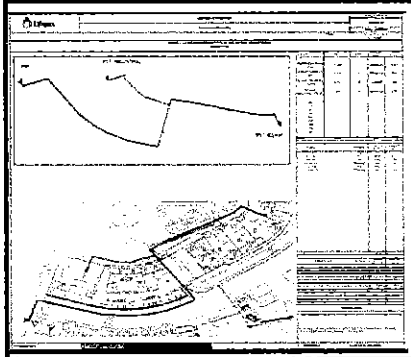Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			Cantidad	Cantidad
		area		UNIDAD		
	**MES DE JUNIO 01 DEL 30**					0,13
	BLOQUE No.3 - No.2			0,13		
						
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,87
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,87
PRESENTE ACTA N°15	0,13

Observaciones:

Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez


Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Walteros


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.04	Soldadura exotermica carga de 170gr a 200gr. Incluye Chispero	Unidad:	UND	Cantidad total:	0,00	3,00

Croquis y récord fotográfico



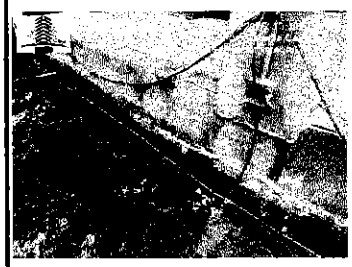



Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
	UIDAD		Longitud		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					3
BLOQUE No.2					0
EJE F ENTRE LOS EJES 1'- 2	1,00			2	2
BLOQUE No.3					
EJE F ENTRE LOS EJES 1	1,00			1	1

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	5,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	6,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	11,00
PRESENTE ACTA N°15	3,00

Observaciones:


Contratista: Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Interventoría: Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.08	Varilla de polo a tierra 2.4m x ⅝" cobre-cobre	Unidad:	UND	Cantidad total:	0,00	2,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		UIDAD		Longitud		
	MES DE OCTUBRE DEL 30					2
	BLOQUE No.2					0
	EJE F ENTRE LOS EJES 1 - 2	1,00			1	1
	BLOQUE No.3					
	EJE F ENTRE LOS EJES 1	1,00			1	1
						
						

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	5,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	6,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	11,00
	PRESENTE ACTA N°15	2,00

Observaciones:

Contratista: Nombre: Orlando Ibáñez Vasquez


Interventoría: Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.11	Banco directo 2d3" PVC TDP desde Cámara de RS06 hacia Transferencia automática regulable	Unidad: ML	Cantidad total:	85,44

Croquis y/ó registro fotográfico	Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
		Largo	Ancho	Alto	Longitud total	
	MES DE SUMIDERO 03 DEL 30					85,44
	BLOQUE No.2					
	Caja No.1 a la Caja No.2	17,30			1,00	17,3
		17,30			0,50	8,65
	Caja No.2 a la Caja No.3	11,00			0,50	5,5
	Caja No.1 a la Caja No.4	22,40			0,50	11,2
	Caja No.3 a la Caja No.4	18,25			1,00	18,25
	Caja No.4 a la Caja No.5	24,54			1,00	24,54






Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	85,44

Observaciones:

Contratista: Hernando Rafael Valencia

Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Valencia

PLANO ANEXO No.1 - ITEM 23.11

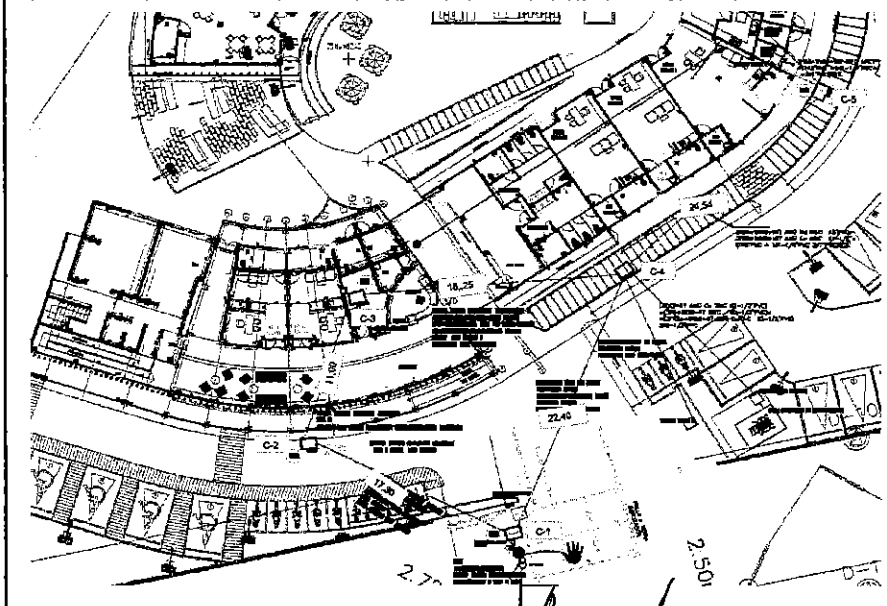

Observaciones:


Contratista: Hernando Rafael Valencia

Apoyo a la Supervisión: Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.22	Banco ducto 2x(1 ½" PVC CAFETERÍA	Unidad:	ML	Cantidad total:	36,50


Croquis y/o contratográfico	Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
		Largo	Ancho	Alto	Longitud total	
	MES DE JUNIO/24 DEL 30					36,50
	Caja No.3 a la Caja No.4	18,25			2,00	36,5
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	36,50

Observaciones:

Contratista: Interventoría:

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.22

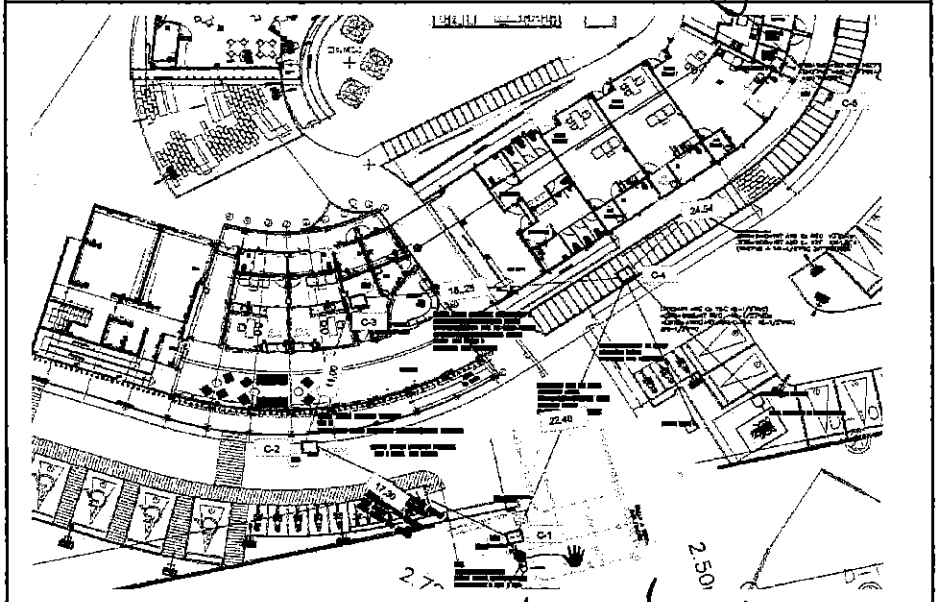


Observaciones:

Contratista: Apoyo a la Supervisión:

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.23	Banco dueto 2x(1 ½" PVC FASE 2	Unidad:	ML	Cantidad total:	54,59


Croquis y registro fotográfico	Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
		Largo	Ancho	Alto	Longitud total	
	MEDIDAS EN METROS LINEALES					54,59
	Caja No.4 a la Caja No.5	24,54			1,00	24,54
	Caja No.5 a Cuarto Tecnico	6,30			1,00	6,3
	Caja No.5 a Cocina	14,50			1,00	14,5
	Caja No.4 a la Cuarto de Maquina	10,25			1,00	10,25

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	54,59

Observaciones:

Contratista: [illegible] Interventoría: [illegible]

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.23

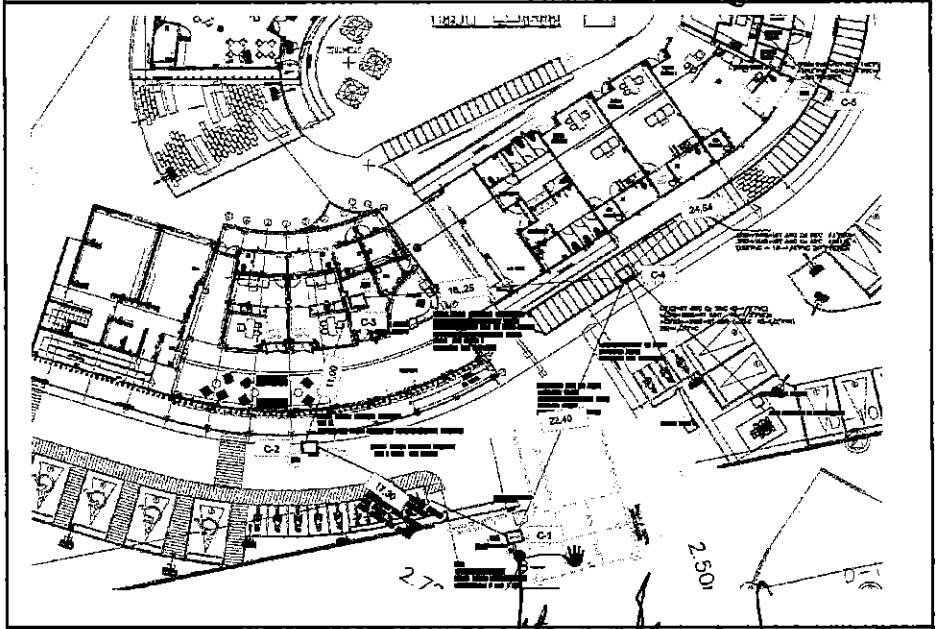


Observaciones:

Contratista: [illegible] Aprobó a la Supervisión: [illegible]

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.31	Cámara de piso RS06. Incluye Tapa y marco	Unidad:	UN	Cantidad total:	2,00


Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones				CANTIDAD
		Unidad	Ancho	Alto	Longitud total	
	MES DE JUNIO del 2024					2,00
	Caja No.1 Poste	1,00			1,00	1,0
	Caja No.3 - Cuarto de Maquina	1,00			1,00	1,0

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	3,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	3,00
PRESENTE ACTA N°15	2,00

Observaciones:

Contratista: [illegible] Interventoría: Ingeniero Julio Cesar Wallenius

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.31

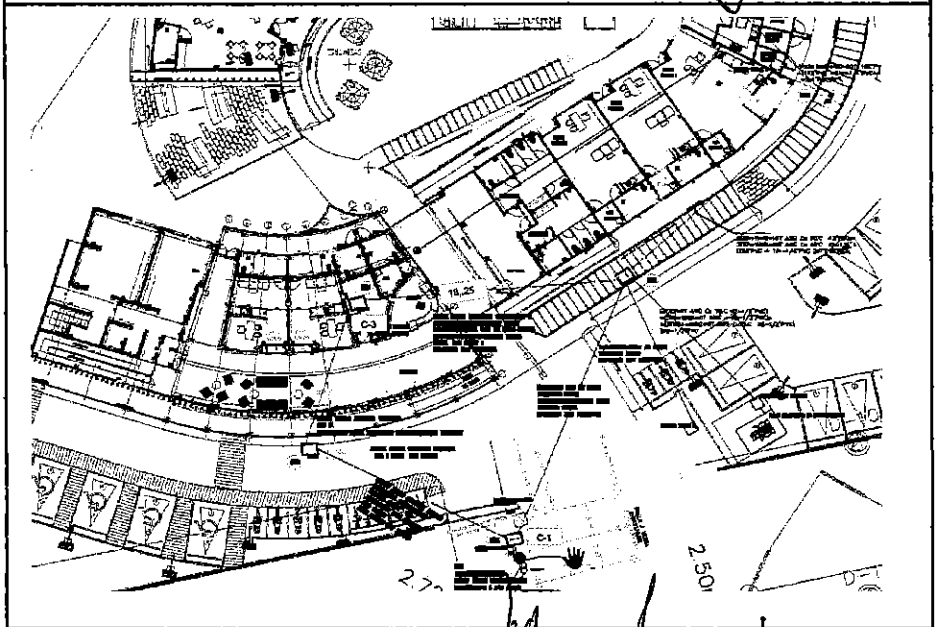



Observaciones:

Contratista: [illegible] Apoyo a la Supervisión: Ingeniero Julio Cesar Wallenius

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.60	Caja inspeccionable 2400 inyectada en aluminio con tapa en acero inoxidable	Unidad:	UN	Cantidad total:	11,00


Croquis y Registro fotográfico	Descripción	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
		Unidad	Ancho	Alto		
	MOBILIARIO DEL 30					#¡VALOR!
	BLOQUE NO.2	3,00			1,00	3,0
	BLOQUE No.3	8,00			1,00	8,0
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	11,00

Observaciones:

Contratista: [illegible] Apoyo a la Supervisión: [illegible]

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.60

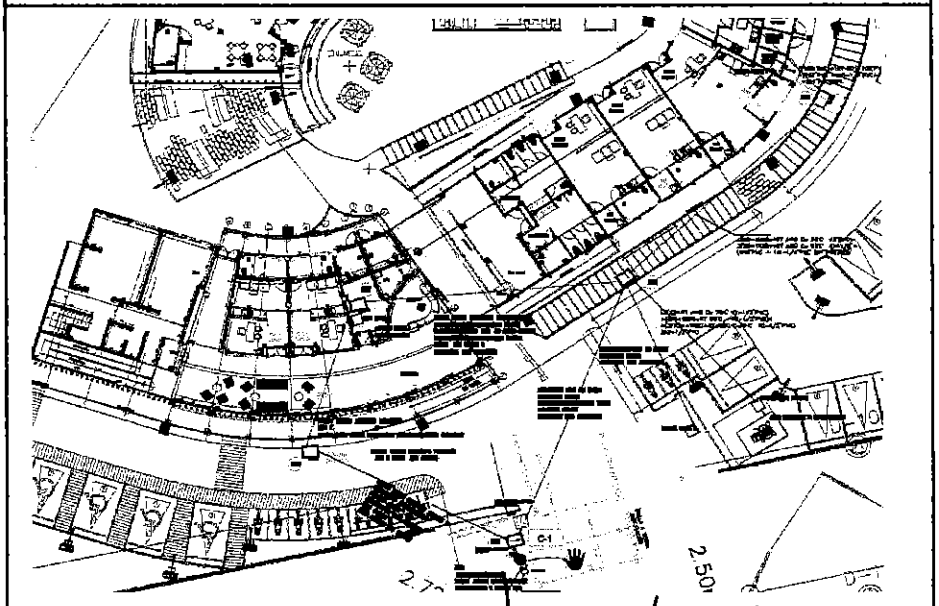



Observaciones:

Contratista: [illegible] Apoyo a la Supervisión: [illegible]

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.71	Salida de tomacorriente GFCI 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m. máximo 5.5m	Unidad:	UND	Cantidad total:	3,00

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Ancho	Alto	Cant/Med	TOTAL
	MEP DE EDIFICIO OBRA 3					3,00
	BLOQUE No.3					
	CAFETERIA	1,00			3,00	3
						


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	14,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	14,00
PRESENTE ACTA N°15	3,00

Observaciones:

Contratista: Ingeniero Residente Alejandro Ibarra Velásquez

Revisó y/o Supervisión: Ingeniero Arq. Cesar Ramírez

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.71

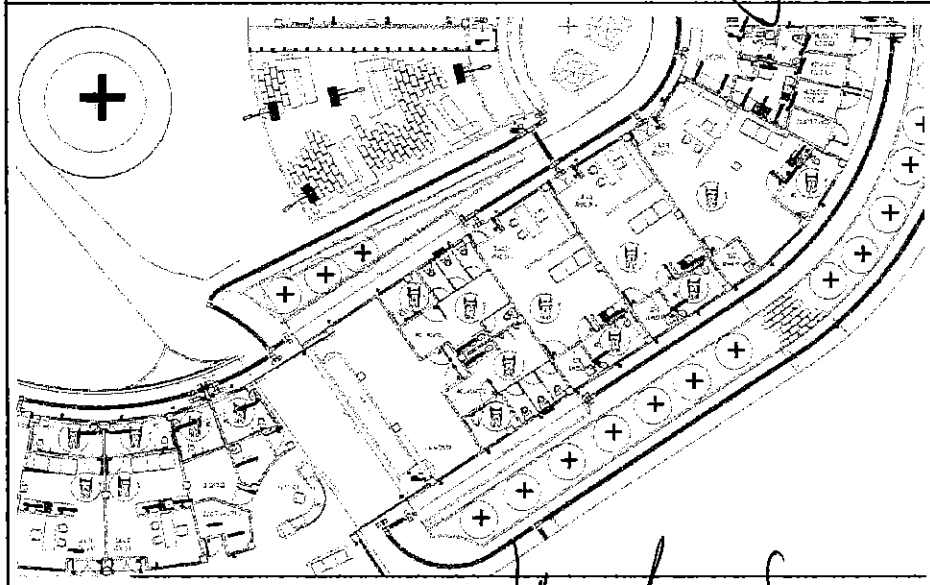

Observaciones:



Contratista: Ingeniero Residente Alejandro Ibarra Velásquez

Revisó y/o Supervisión: Ingeniero Arq. Cesar Ramírez

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF005-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.81	Salida de tomacorriente regulado 127/15A con polo a tierra aislado, incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o ENT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	Unidad:	UND	Cantidad total:	5,00

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Cantidad	TOTAL
	BLOQUE No.2					
	SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1
	SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1
	BLOQUE No.3					
	SALA ATENCION No.3	1,00			1,00	1
	SALA ATENCION No.4	1,00			1,00	1
	SALA ATENCION No.5	1,00			1,00	1
						


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	5,00

Observaciones:

Contratista: Ingeniero Armando Isaacs Vasquez

Interventoría: Ingeniero Julio Cesar Wallach

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.81

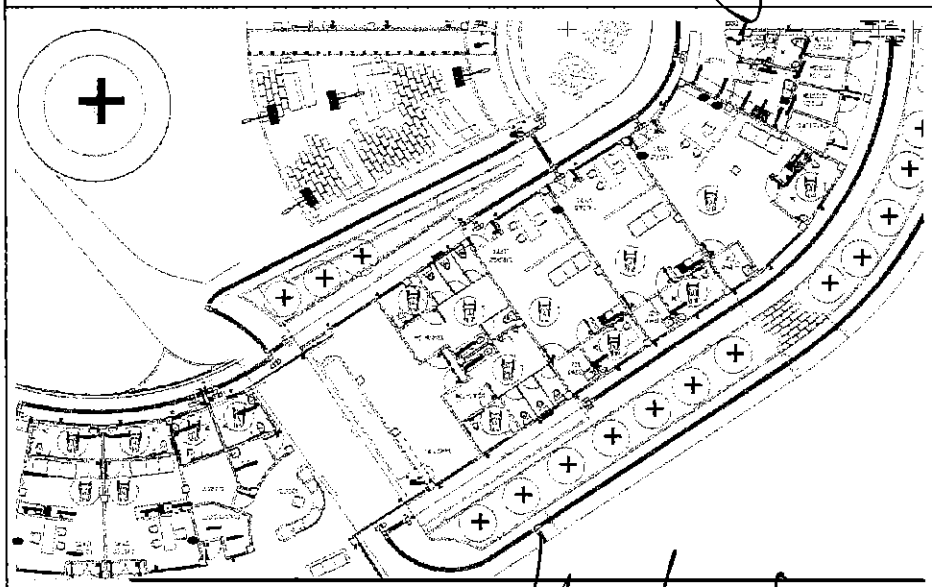

Observaciones:




Contratista: Ingeniero Armando Isaacs Vasquez

Apoyo a la Supervisión: Ingeniero Julio Cesar Wallach

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.85	Luminaria de 30x30 [cm] cuadrada. Suministro e instalación con balasto. De empotrar	Unidad:	UND	Cantidad total:	59,00

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
	**LUMINARIA DE 30**					**59,00**
	BLOQUE No.2					
	BAÑO - SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS	1,00			1,00	1
	BAÑO PMR	1,00			1,00	1
	CUARTO TECNICO	1,00			4,00	4
	SALA DE ESPERA	1,00			3,00	3
	PASILLO FACHADA PRINCIPAL	1,00			6,00	6
	PASILLO No.2	1,00			4,00	4
	CUARTO ASEO	1,00			1,00	1
	BLOQUE No.3					
	BAÑO, DEPOSITO - SALA ATENCION No.3	1,00			2,00	2
	BAÑO, DEPOSITO - SALA ATENCION No.4	1,00			2,00	2
	BAÑO, DEPOSITO - SALA ATENCION No.5	1,00			2,00	2
	COCINA	1,00			3,00	3
	BAÑO - COCINA	1,00			2,00	2
	CAFETERIA	1,00			2,00	2
	PASILLO FACHADA PRICIPAL	1,00			12,00	12
	PASILLO No.2	1,00			2,00	2
	PASILLO No.3	1,00			6,00	6
	CUARTO TECNICO	1,00			1,00	1
	CUARTO ASEO No.1	1,00			1,00	1
	CUARTO ASEO No.2	1,00			1,00	1
	CUARTO ASEO No.3	1,00			1,00	1


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	59,00

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Fernando Ibañez Vasquez

Interventoría:
Nombre: Julio Cesar Waterloo

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.85

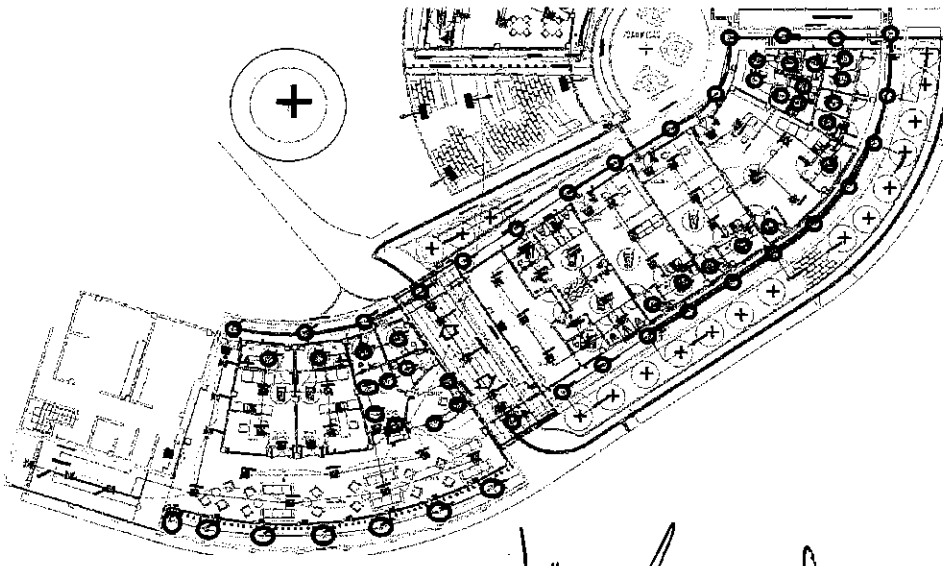

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Fernando Ibañez Vasquez

Aprobó la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Waterloo

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 23.86	Luminaria de emergencia con letrero de SALIDA de dos focos. Suministro e instalación con basisto. De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	Unidad:	UND	Cantidad total:	11,00

Croquis y/o registro fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Cantidad	TOTAL
	BLOQUE No.2					11,00
	BAÑO - SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1
	SALA DE ESPERA	1,00			1,00	1
	**BLOQUE No.3**					
	SALA ATENCION No.3	1,00			1,00	1
	SALA ATENCION No.4	1,00			1,00	1
	SALA ATENCION No.5	1,00			1,00	1
	PORTAL ACCESO BLOQUES	1,00			2,00	2
	SALA ESPERA	1,00			2,00	2
	CUARTO TECNICO	1,00			1,00	1


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	11,00

Observaciones:

Contratista: Ingeniero Armando Ibañez Vasquez

Interventoría: Nombre: Cesar Valencia

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.86

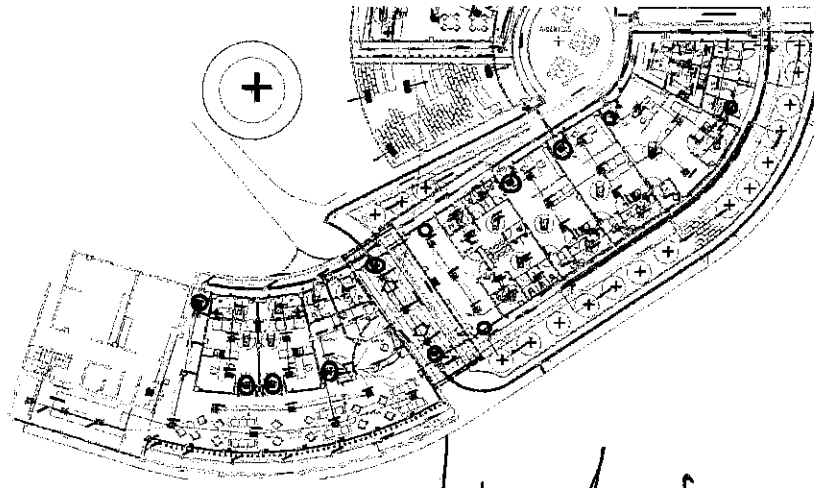

Observaciones:


Contratista: Ingeniero Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión: Nombre: Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INF 23.87	Luminaria de emergencia de focos. Suministro e instalación con balasto. De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	Unidad:	UNO	Cantidad total:	17,00

Croquis y/o/and fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Ancho	Alto	Cantidad	TOTAL
						17,00
	BLOQUE No.2					
	BAÑO - SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1
	BAÑO - SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1
	SALA DE ESPERA	1,00			2,00	2
	**BLOQUE No.3**					
	SALA ATENCION No.3	1,00			1,00	1
	SALA ATENCION No.4	1,00			1,00	1
	SALA ATENCION No.5	1,00			1,00	1
	PORTAL ACCESO BLOQUES	1,00			2,00	2
	SALA ESPERA	1,00			2,00	2
	CUARTO TECNICO	1,00			1,00	1
	CUARTO ASEO No.1	1,00			1,00	1
	CUARTO ASEO No.2	1,00			1,00	1
	CUARTO ASEO No.3	1,00			1,00	1
	CAFETERIA	1,00			1,00	1
	COCINA	1,00			1,00	1


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	17,00

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Rafael Ossa

Aprobó el Supervisor:
Nombre: Julio Cesar Williams

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INF 23.87

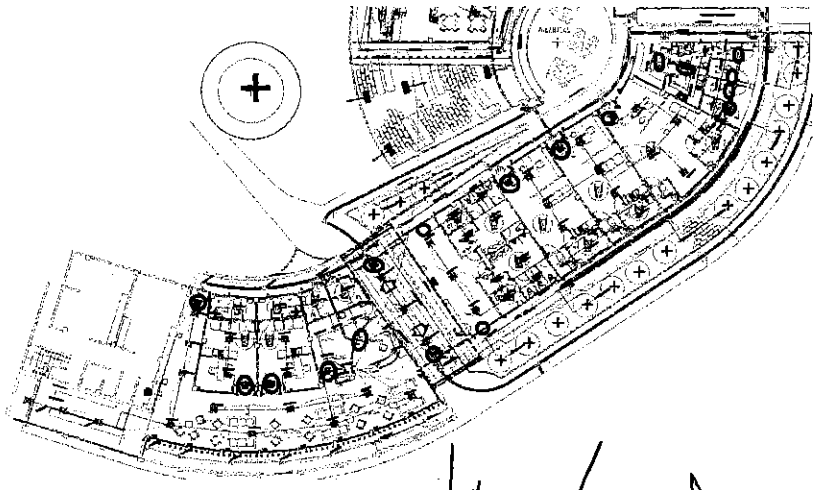

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Rafael Ossa


Aprobó el Supervisor:
Nombre: Julio Cesar Williams

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.89	Luminaria TIPO PEDESTAL, Suministro e Instalación, incluye caja de conexiones	Unidad:	UND	Cantidad total:	6,00

Croquis y Registro fotográfico	Descripción	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	LUMINARIA TIPO PEDESTAL					6,00
	BLOQUE No.3					
	JARDINERA	1,00			6,00	6






Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	6,00

Observaciones:

Contratista:

Apoyo a la Supervisión:

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.89

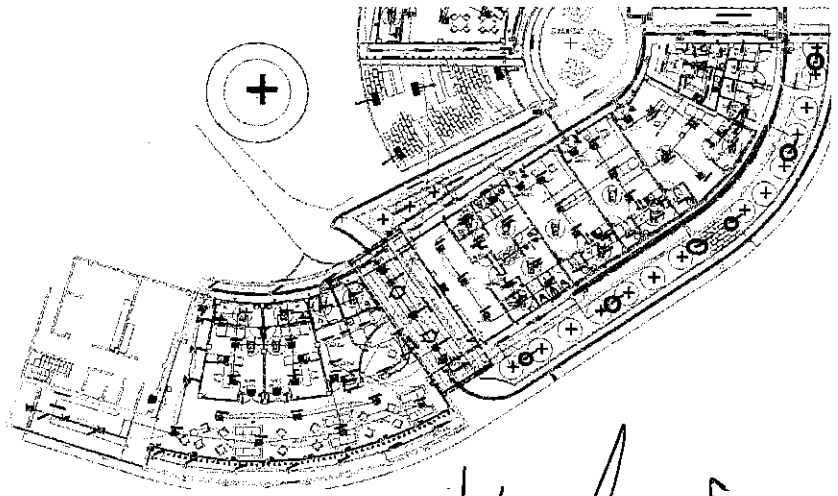

Observaciones:

Contratista:


Apoyo a la Supervisión:


MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:


Contrato de obra No LPCOS-INFCOS-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.90	Luminaria Hermética 1,20m de largo. Suministro e Instalación. Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, tornacontante y elementos de suspensión, fijación y anclaje	Unidad:	UND	Cantidad total:	8,00

Croquis y registro fotográfico	Descripción	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	UBICACIÓN DEL ÍTEM:					8,00
	BLOQUE No.3					
	BAÑO MUJERES	1,00			4,00	4
	BAÑO HOMBRES	1,00			4,00	4








Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	8,00

Observaciones:

Contratista: Ingeniero Residente Obra

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallace

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.90

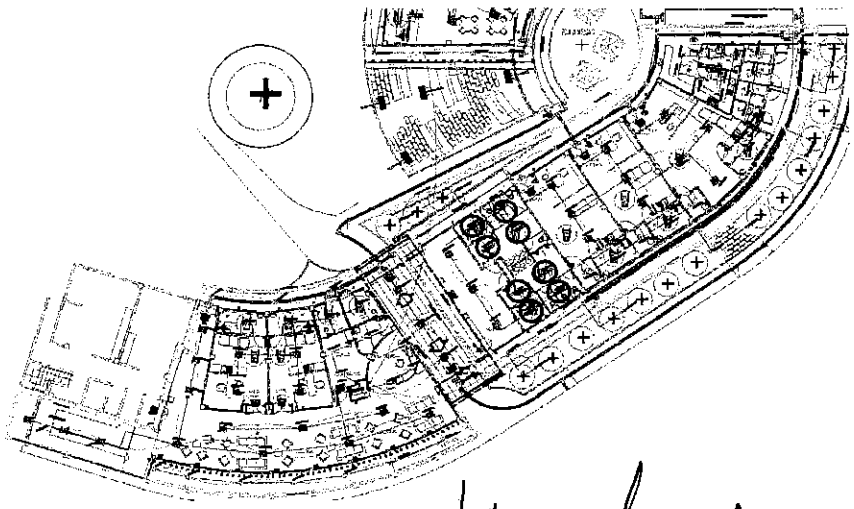

Observaciones:



Contratista: Ingeniero Residente Obra

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallace

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 23.91	Luminaria LED 9W. Suministro e instalación. Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, fijación y anclaje. Sistema mecánico de fijación de empotra	Unidad:	UND	Cantidad total:	6,00

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Cantidad	TOTAL
	**MES DE JUNIO 01 DEL 30**					6,00
	BLOQUE No.2					
	BAÑO SALA ATENCION No.1	1,00			1,00	1
	BAÑO SALA ATENCION No.2	1,00			1,00	1
	CUARTO DE ASEO	1,00			1,00	1
	BLOQUE No.2					
	BAÑO SALA ATENCION No.3	1,00			1,00	1
	BAÑO SALA ATENCION No.4	1,00			1,00	1
	BAÑO SALA ATENCION No.5	1,00			1,00	1
						


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**0,00**
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**
PRESENTE ACTA N°15	**6,00**

Observaciones:

Contratista: Nombre: Ingeniero Isaías Vasquez

Interventoría: Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 23.91

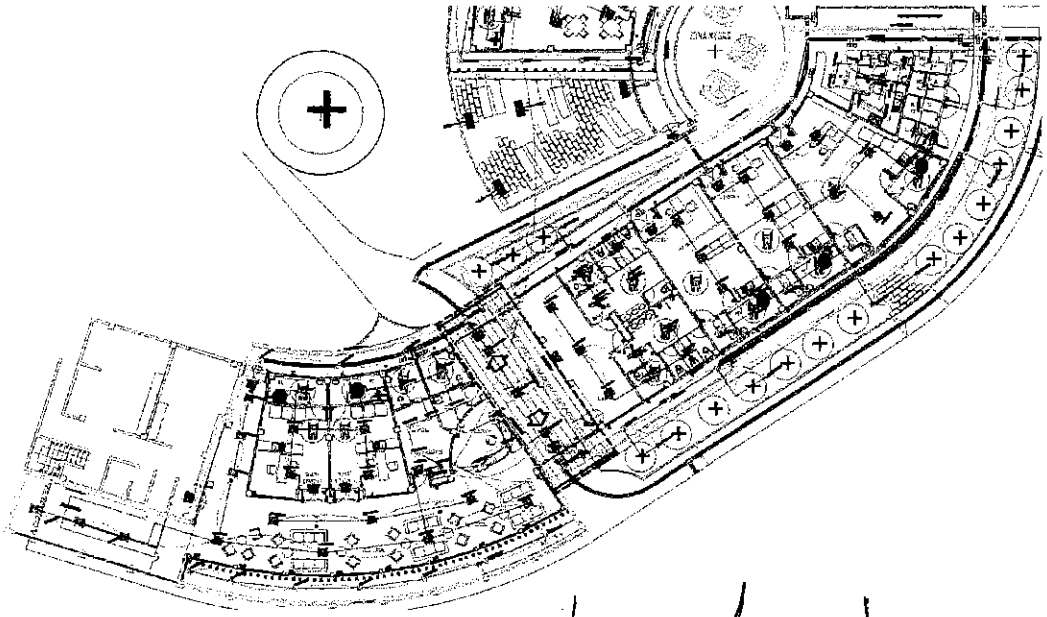


Observaciones:

Contratista: Nombre: Ingeniero Isaías Vasquez

Interventoría: Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA				Hoja: 1 de:	
				Fecha:	
DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.					
ITEM:	INP 23.140	EQUIPO CONTRA INCENDIO INCLUYE BOMBA JOCKEY, INSTALACION ELECTRICA, SUCCION Y DESCARGA EN 4", TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	Unidad: UN	Cantidad total:	0,19

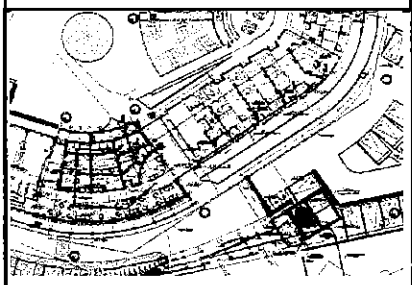Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			Cantidad	Cantidad
		area		UNIDAD		
	**MES DE JUNIO 01 DEL 30**					0,19
	CUARTO DE MAQUINA			0,19		

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,81
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,81
	PRESENTE ACTA N°15	0,19

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Rafael Vergara


Aprobó la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallerstein

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA | Hoja: _____ de: _____ | Fecha: _____

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.3	RETENIDA DIRECTA A TIERRA PARA MEDIA TENSION - LA209-2	Unidad:	UN	Cantidad total:	2,00

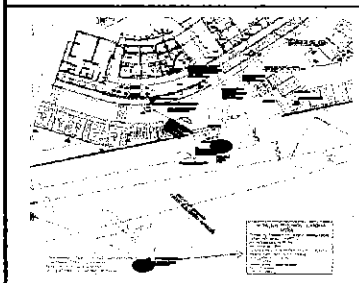

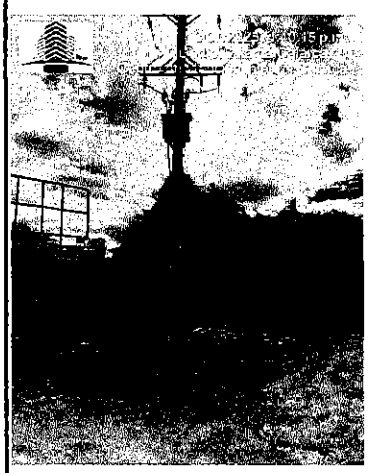

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Cantidad	Total
	RES DE 20 KV DEL 30					2,00
	RED NUEVA PORTAL DE INGRESO	1,00			1,0	1,00
	RED EXISTENTE VIA NACIONAL - LA LINEA	1,00			1,00	1,00

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	2,00	

Observaciones:


Contratista: Hernando Hoyos Vasquez

Apoyo a la Supervisión: Nombre Ulia Oscar Wellens

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OSRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.4	SUMINISTRO E INSTALACION SUBESTACION AEREA PARA TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFASICA	Unidad:	UN	Cantidad total:	1,00

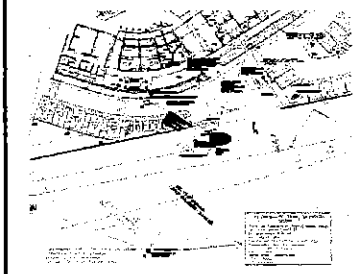Croquis y ricard fotográfico	Descripción	Dimensiones: UNIDAD	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					1,00
	BLOQUE No.2 - No.3					0,00
	POSTE DE INICIO	1,00			1,00	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	1,00	

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Armando Ibarra Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Cesar Mallerino

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de. _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INF 24.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED TRIFASICA EN CABLE ACSR AL 3NO 1/0 AWG	**Unidad:**	ML	**Cantidad total:**	50,00

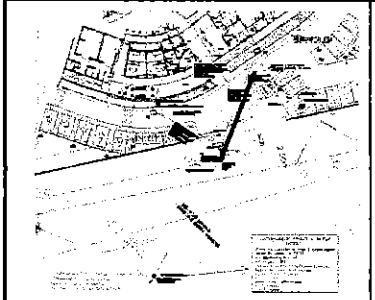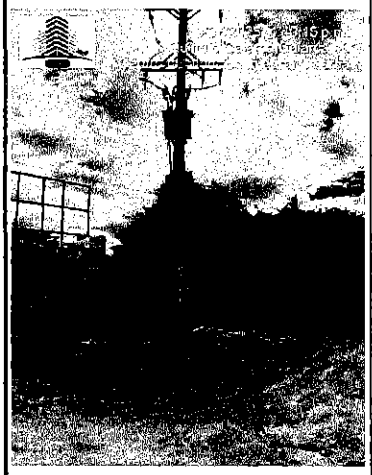Croquis y record fotográfico	*Descripción*	*Dimensiones*			*Área / Volumen*	*Cantidad*
		LONGITUD	*Ancho*	*Alto*		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					**50,00**
	POSTE EXISTENTE VIA NACIONAL - LALINEA A POSTE NUEVO	50,00			1,0	50,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**0,00**	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**	
PRESENTE ACTA N°15	**50,00**	

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Ricardo Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INº 24.6	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE EMBEBIDO EN ACEITE 45KVA 13,2KV / 220V /127V	Unidad:	UN	Cantidad total:	1,00

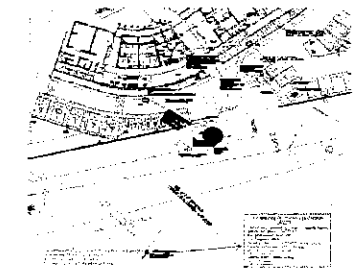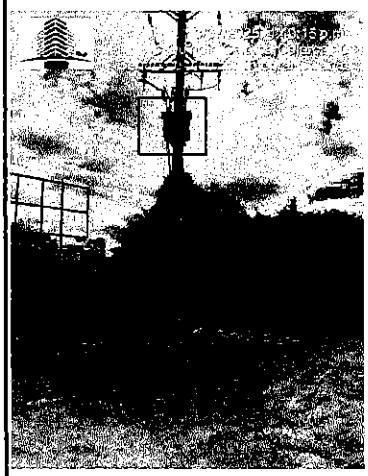Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			Área / Volumen	Cantidad
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO DEL '30.					1,00
	RED NUEVA	1,00			1,0	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA Nº15	1,00	

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Alcides Ambrocio Ibarra Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 M X 1050 KGF PARA SUBESTACION AEREA DE 45 KVA	Unidad:	UN	Cantidad total:	1,00

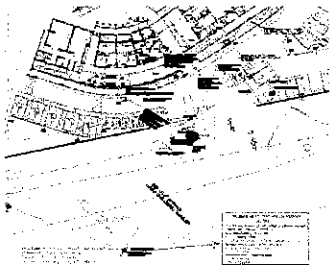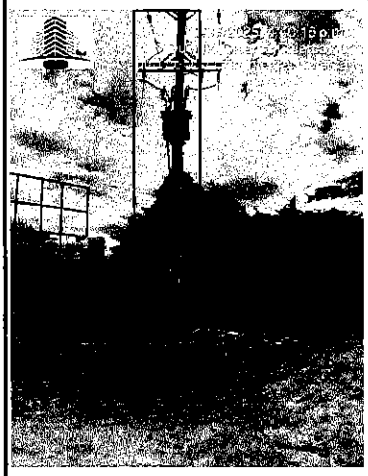Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones: UNIDAD	Ancho	Alto	Área / Volumen	Cantidad
	MES DE JUNIO 01 DEL 20					0,00
	RED NUEVA	1,00			1,0	1,00
						

	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
	Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
	TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
	PRESENTE ACTA N°15	1,00

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Fernando Ibarra Vasquez

Apoyo a la supervisión:
Nombre: Ing. Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBO IMC DE 2" INCLUTYE ACCCESORIOS DE FIJACIÓN	Unidad:	UN	Cantidad total:	4,00

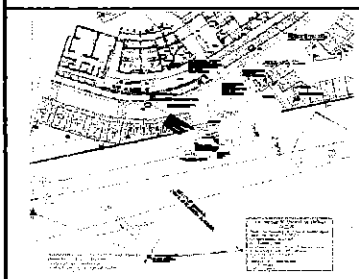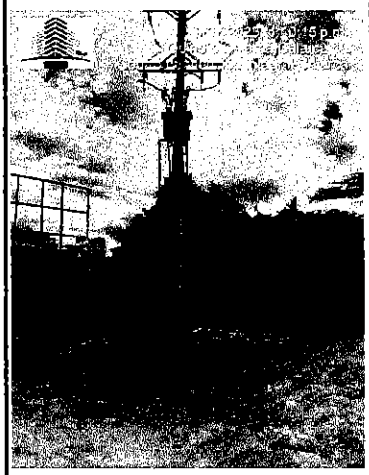Croquis y /ó card fotográfico	Descripción	Dimensiones			Área / Volumen	Cantidad
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					4,00
	POSTE - ACOMETIDA NUEVA	4,00			1,0	4,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	4,00	

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Alexander Tejeiro Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3NO 2 + 1NOST AWG - THHW	**Unidad:**	ML	**Cantidad total:**	56,57

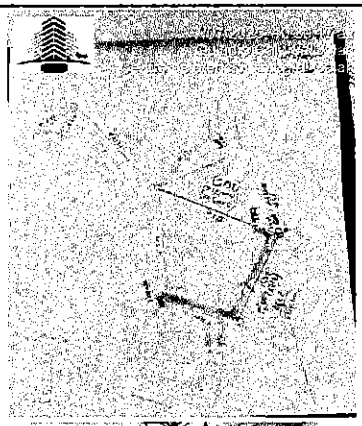Croquis y récord fotográfico	*Descripción*	*Dimensiones*			*CAMTIDAD*	*TOTAL*
		LONGITUD	*Ancho*	*Alto*		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					56,57
	POSTE - GABINETE CUARTO TECNICO - BLOQUE No.2	56,57			1,0	56,57
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	56,57	

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.10	SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3 NO 2+ 1NO 2N + 1NO8T AWG	Unidad:	ML	Cantidad total:	20,00

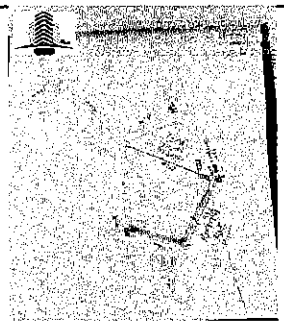Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		LONGITUD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					20,00
	ACOMETIDA RED - PLANTA	20,00			1,0	20,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	20,00

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Johan Stiven Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.11	SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE CU 3 NO 1/0+ 1NO 1/0N + 1NO 6T AWG	Unidad:	ML	Cantidad total:	22,00

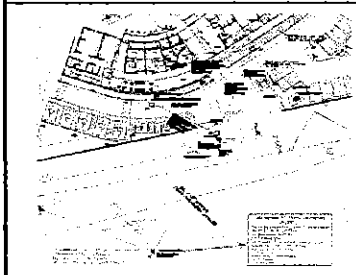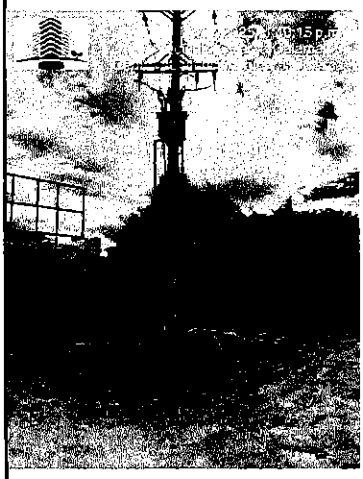Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			Área / Volumen	Cantidad
		LONGITUD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					22,00
	ACOMETIDA RED - POSTE GABINETE DE MEDIDA	22,00			1,0	22,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	22,00	

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Fernando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Vallejos

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MEDIDORES MEDIDA SEMIDIRECTA BCI	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	1,00

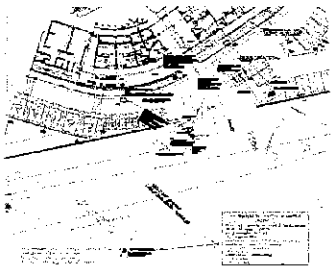Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			Área / Volumen	Cantidad
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					1,00
	POSTE	1,00			1,0	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	1,00	

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Ernesto Heriberto Hernandez


Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wallace

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.16	TABLERO DE MEDIDA SEMI DIRECTA/220 VAC/USO EXTERIOR.	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	1,00

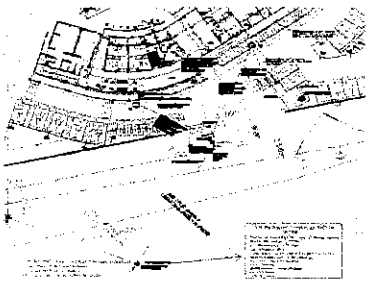

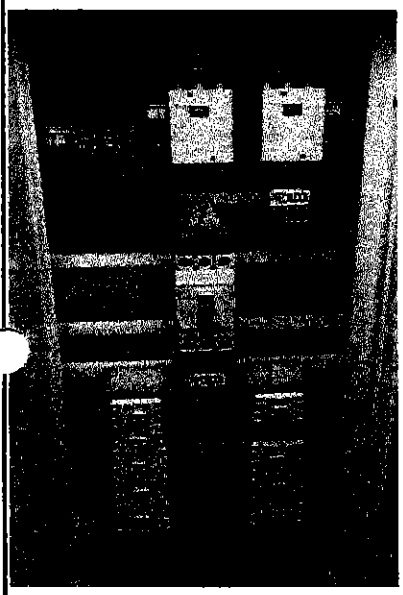

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Área / Volumen	Cantidad
	MES DE JUNIO 01 DEL 20					1,00
	CUARTO TECNICO	1,00			1,0	1,00

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	1,00

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Aprobó la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Wellbros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

ITEM:	INP 24.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUNDATERMOENCOGIBLE PARA TUBERIA	Unidad:	ML	Cantidad total:	33,69

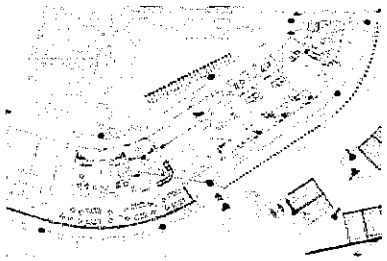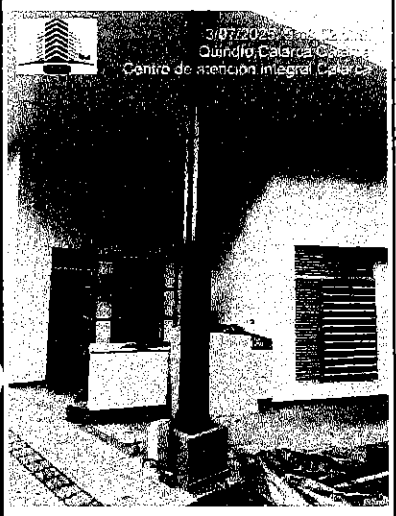Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		LONGITUD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					33,69
	BLQQUE No.2					30,64
	EJE A-3	3,05			1,00	3,05
	EJE F-2	4,70			1,00	4,70
	EJE F-4	3,78			1,00	3,78
						0,00
	BLQQUE No.3					
	EJE A - 8	4,27			1,00	4,27
	EJE A - 2	4,28			1,00	4,28
	EJE A - 1	4,53			1,00	4,53
	EJE D - 1	3,43			1,00	3,43
	EJE D - 4	2,80			1,00	2,80
	EJE D - 8	2,85			1,00	2,85
						


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	33,69	

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Arnaldo Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24.19

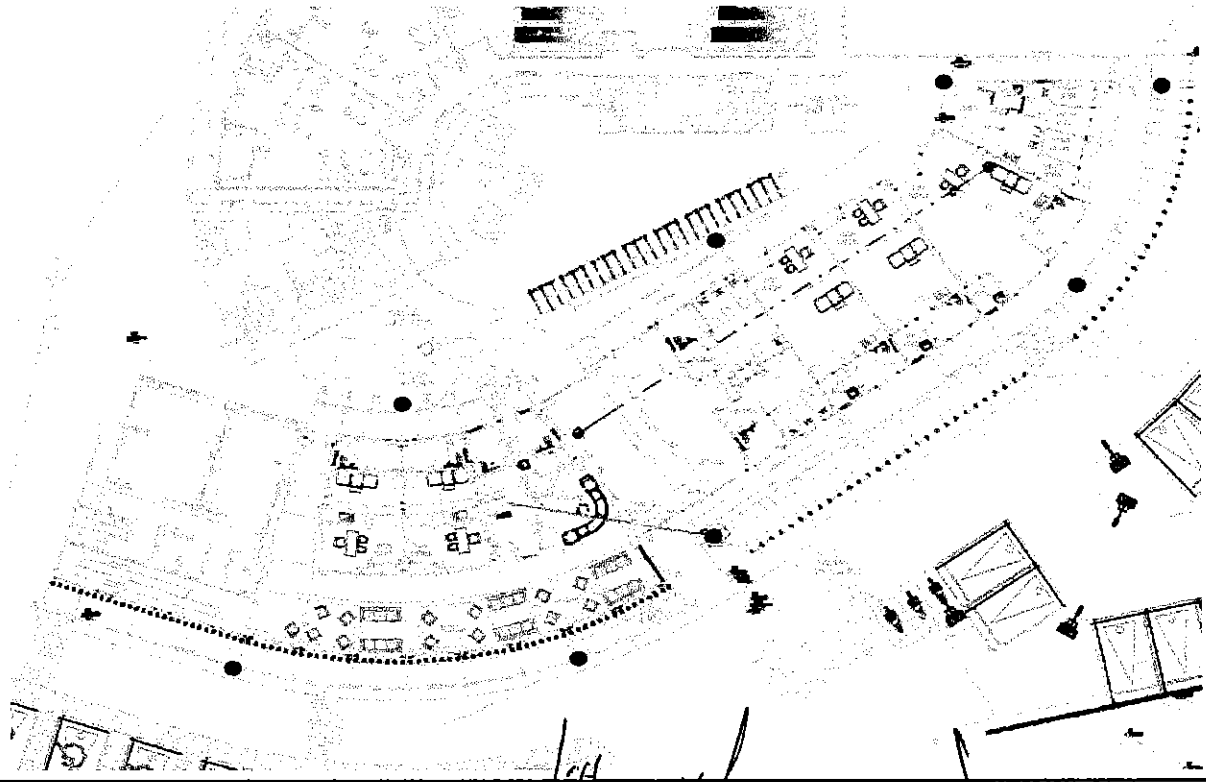

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Vallejos

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2 PESADA"	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	2,00

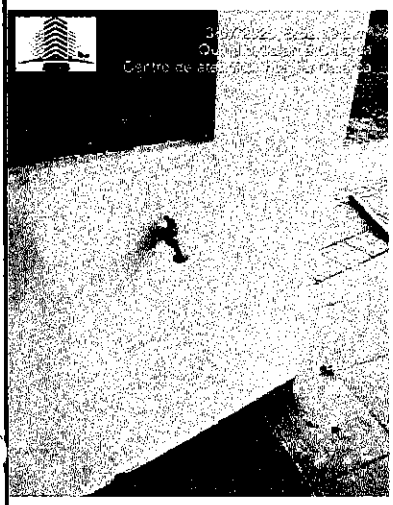Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					2,00
	LAVA TRAPERO - BLOQUE No.2	1,00			1,00	1,00
	CUARTO ASEO No.1 - BLQOUE No.3	1,00			1,00	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13		0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14		0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS		0,00
PRESENTE ACTA N°15		2,00

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Ramírez Vásquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TELEFONO	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	3,00

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	MES DE AÑO 01 DEL 30					3,00
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS - BLOQUE No.2	1,00			1,00	1,00
	BAÑO GENERAL - BLOQUE No.2	1,00			1,00	1,00
	BAÑO MUJERES - BLOQUE No.3	1,00			1,00	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	3,00	

Observaciones:


Contratista:
Ing. Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valderos

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	1NP 24.21	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO POWER ONE	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	1,00

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	BLOQUE No.2					1,00
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS - BLOQUE No.2	1,00			1,00	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	1,00	

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Eduardo Isaías Pasaje

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE TUBERIA DE 2" CALIBRE 18 PEGADO CON SOPORTE A LA PARED CON FLANCHE Y ESCUDO	Unidad:	ML	Cantidad total:	23,27

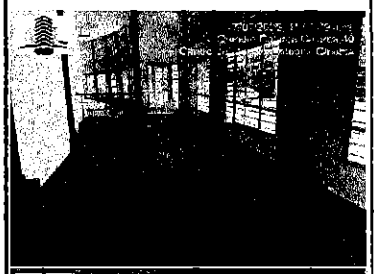Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	Cantidad
		LONGITUD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO DEL '25					23,27
	BLOQUE No.2					
	RAMPA	1,88			1,00	1,88
		10,47			1,00	10,47
		3,43			1,00	3,43
		7,51			1,00	7,51
						
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	23,27	

Observaciones:


Contratista: Alejandro Arnulfo Ibañez Vesga

Apoyo a la Supervisión: Ramiro Julio Cesar Valderas

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.24	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO LAVAMANOS FREE DRYWAL DENTRO DE MURO EN SISTEMA LIVIANO , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE A PISO	**Unidad:**	UNIDAD	**Cantidad total:**	9.00

Croquis y record fotográfico	*Descripción*	*Dimensiones*			*CANTIDAD*	*TOATL*
		UNIDAD	*Ancho*	*Alto*		
	MES DE JUNIO DEL 20					**0,00**
	BLOQUE No.2					
	BAÑO SALA DE ATENCION No.1	1,00			1,00	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.2	1,00			1,00	1,00
	BAÑO TALLAS PEQUEÑA	1,00			1,00	1,00
	BAÑO SOCIAL	1,00			1,00	1,00
	BLOQUE No.3					
	BAÑO SALA DE ATENCION No.3	1,00			1,00	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.4	1,00			1,00	1,00
	BAÑO SALA DE ATENCION No.5	1,00			1,00	1,00
	BAÑO PMR - BATERIA DE BAÑO	1,00			2,00	2,00
						
						
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**0,00**	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**	
PRESENTE ACTA N°15	**9,00**	

Observaciones:


Contratista
Nombre: Armando Ibarra Wallace

Apoyo a la Supervisión
Nombre: Julio Cesar Wallaros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.25	MANEJO, RETIRO Y REUBICACION DE UNA COLMENA DE ABEJAS	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	1,00

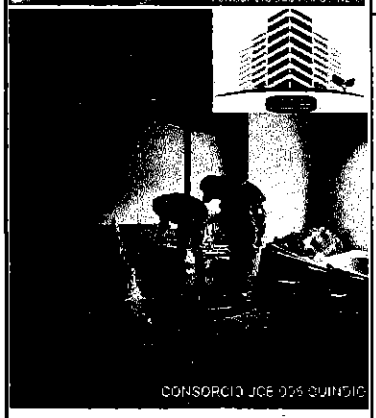Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO DEL 20					1,00
	EDIFICIO EXISTENTE	1,00			1,00	1,00
						
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	1,00

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibarra Vasquez


Aprobó la Supervisión:
Nombre: Julie Cruz Navarro

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha: _____

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PODOTACTIL GUIA DE (20 CM X 20 CM o 20 CM X 40 CM RAYAS-BOLAS) ACORDE A PLANO DE PISOS	Unidad:	ML	Cantidad total:	123,34

Croquis y Hoord fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		LONGITUD	Ancho	Alto		
	BLOQUE No.3					0,00
	FACHADA PRINCIPAL	37,68			1,00	37,68
	FACHADA ACCESO SALAS	36,58			1,00	36,58
	PASILLO INGRESO BAÑOS	15,88			1,00	15,88
	BLOQUE No.2					
	PASILLO PRINCIPAL	33,22			1,00	33,22

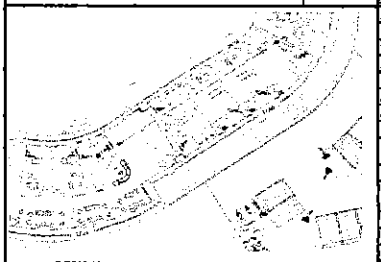




Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	123,34


Observaciones:


Contratista: [illegible]
Nombre: Alberto Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valbuena

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24,27

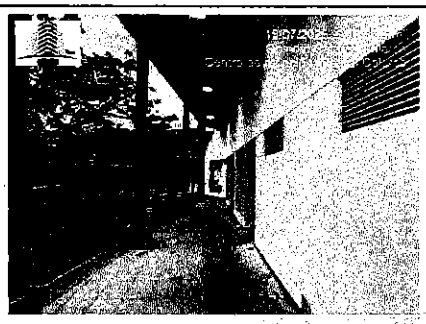



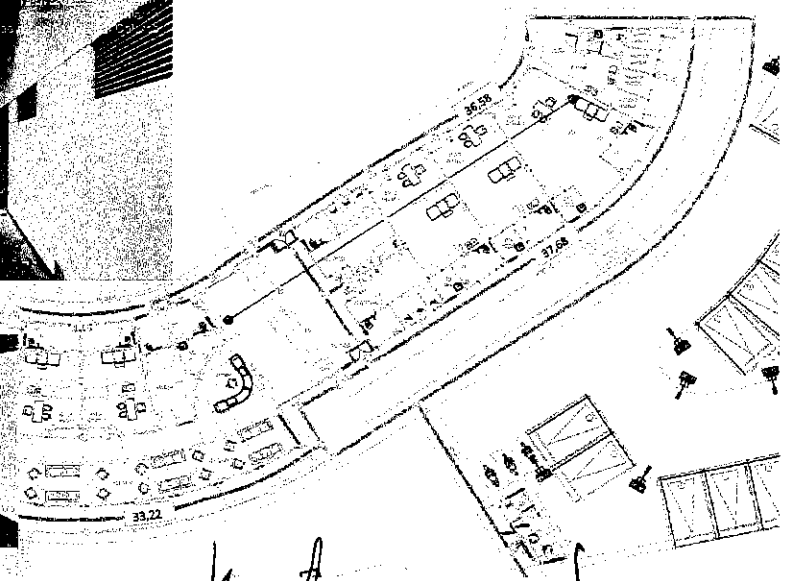

Observaciones:




Contratista: [illegible]

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valbuena

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

ITEM:	INP 24.27	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE EQUIPO EYECTOR	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	1,00

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones UNIDAD	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Área / Volumen	Cantidad
	MES DE JUNIO DEL 26					1,00
	CUARTO DE MAQUINA - FOZ DE INYECCION	1,00			1,00	1,00
						
						
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	1,00

Observaciones:



Contratista: Hernando Armando Ibarra Trasloc

Apoyo a la Supervisión: Jhonatan Julio Cesar Valencia

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA DE ø 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	1,00

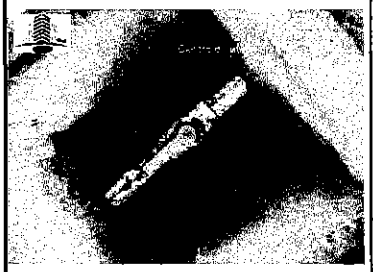Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			Área / Volumen	Cantidad
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					1,00
	ACOMETIDA HIDRAULICA ENDEN - BLQOUE No.3	1,00			1,00	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	1,00

Observaciones:



Contratista:
Nombre: Fernando Ibañez Vasquez

Apoyo de la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Mallarino

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.29	VALVULA CHECK ANTIRETORNO PARA DRENAJE 4"	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	2,00

Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		UNIDAD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO DEL 30					2,00
	CUARTO DE MAQUINA - FOZ DE INYECCION	1,00			2,00	2,00
						
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA Nº 15	2,00

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Fernando Ochoa Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valero

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACANTO EN ALUMINIO ARCO 10 MM	Unidad:	ML	Cantidad total:	21,20

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			CATIDAD	TOTAL
		LONGITUD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					21,20
	BLOQUE No.2					
	MESON SALA No.1	2,12			2,00	4,24
	MESON SALA No.2	2,12			2,00	4,24
	BLOQUE No.3					
	MESON SALA No.3	2,12			2,00	4,24
	MESON SALA No.4	2,12			2,00	4,24
	MESON SALA No.5	2,12			2,00	4,24
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°13	21,20	

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Villalba

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24.31



Observaciones:



Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Villalba

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No 1.P008-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.31	CARCAMO EN CONCRETO CON MUROS DE 10 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 21 MPA INCLUYE REJILLA EN POLIPROPILENO	Unidad:	ML	Cantidad total:	77,86

Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		LONGITUD	Ancho	Alto		
	MES DE JUNIO DE 2024					**77,86**
	**BLOQUE No.2**					
	EJE A ENTRE LOS EJES 1 - 4'	11,75			1,00	11,75
	BLOQUE No.2 - No.3					
	ACCESO	4,80			1,00	4,80
	BLOQUE No.3					
	EJE A ENTRE LOS EJES 1 - 5	25,67			1,00	25,67
	EJE A ENTRE LOS EJES 1 - 5	36,64			1,00	36,64
						
						


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00	
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00	
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00	
PRESENTE ACTA N°15	77,86	

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Alvaro Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Juan Cesar Williams

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24.32

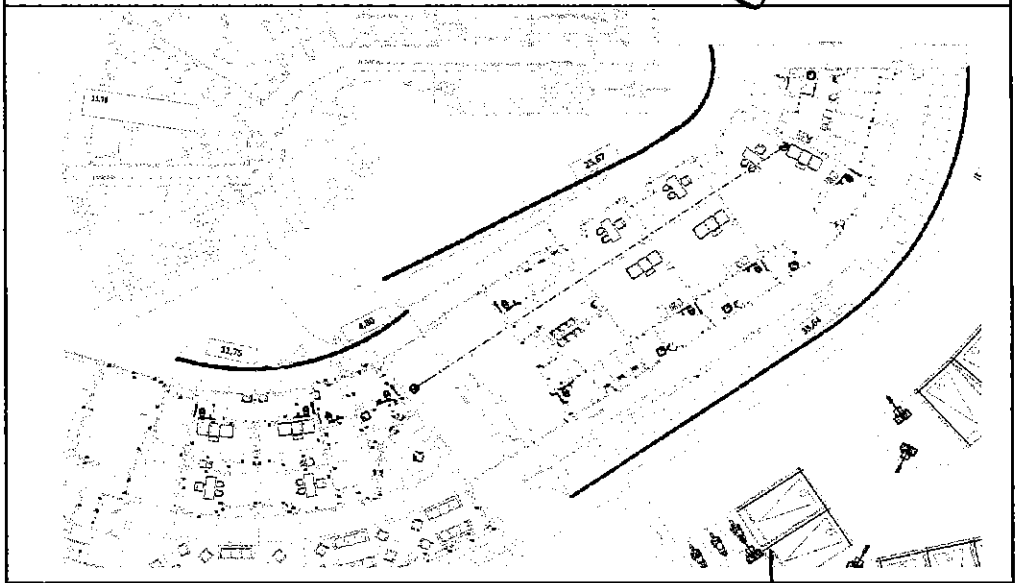

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Alvaro Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Juan Cesar Williams

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LPOOS-IN.F006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RECTANGULAR DE PISO TRADICIONAL 160 CM X 10 CM X 2" ACERO 304	Unidad:	UND	Cantidad total:	3.00

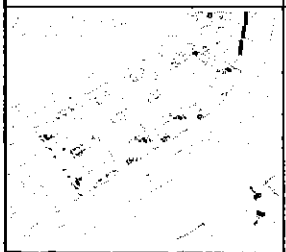Croquis y record fotográfico	Descripcion	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		UND	Ancho	Alto		
	[illegible]					3,00
	BLOQUE No.3					
	CUARTO ASEO No.1	1,00			1,00	1,00
	CUARTO ASEO No.2	1,00			1,00	1,00
	CUARTO ASEO No.3	1,00			1,00	1,00
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	3,00

Observaciones:




Contratista:
[illegible]

Aprobado Supervisión:
[illegible]

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.33	SUMINISTRO E INSTALACION TABLON SAHARA FORMATO (30 X 30 - 15 X 30) INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	**Unidad:**	M2	**Cantidad total:**	255,03

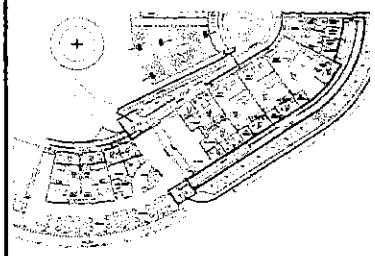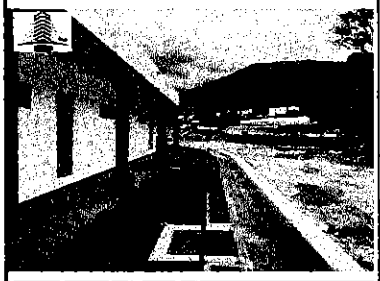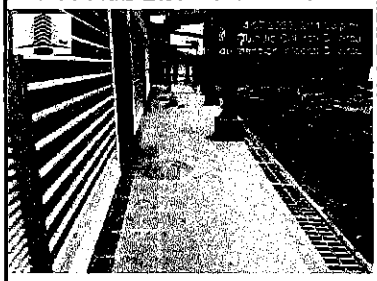Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones AREA	Dimensiones Ancho	Dimensiones ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
	MES DE JUNIO (1 DEL 30)					255,03
	PASILLO BLOQUE No.3	76,60			1,00	76,60
		79,68			1,00	79,68
	PASILLO BLOQUE No.2	21,01			1,00	21,01
		46,80			1,00	46,80
	ACCESO PRINCIPAL	4,67		1,65	1,00	7,71
		4,78		4,40	1,00	21,03
						
						


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA Nº15	255,03

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Humberto Alfredo Ibañez Velasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Valencia

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24.34

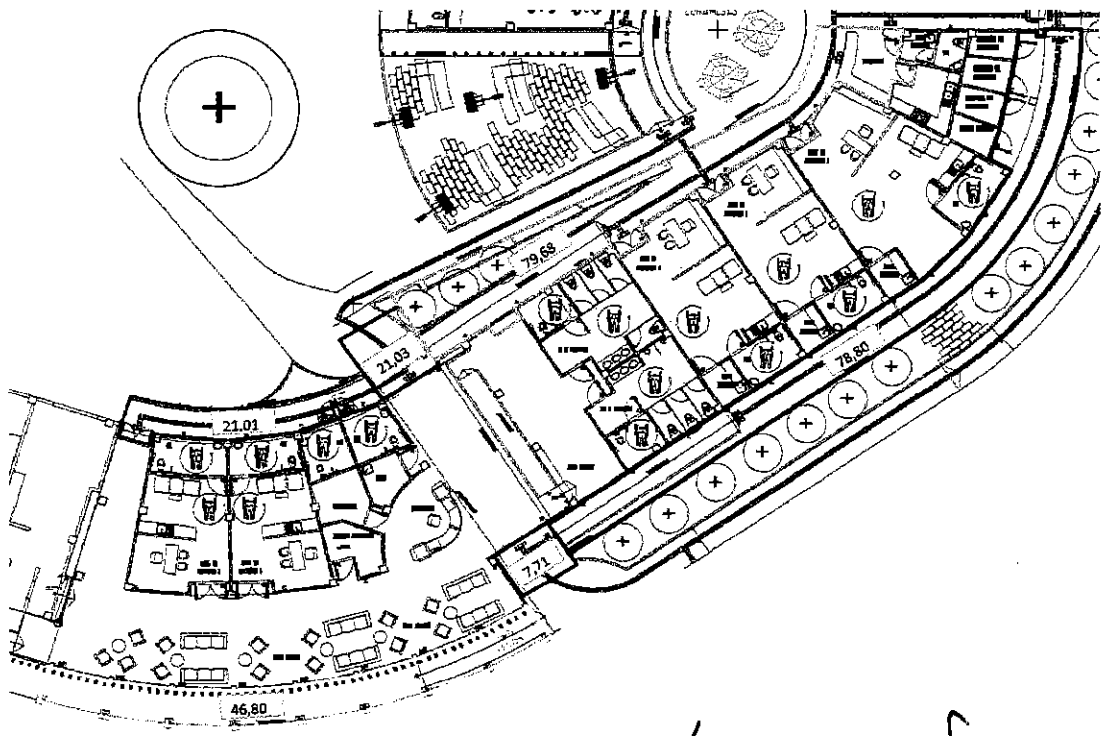

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Vaquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walters

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.34	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA EN TABLON FORMATO 30 X 7 INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	Unidad:	ML	Cantidad total:	213,05

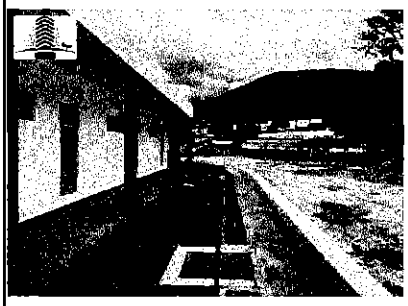Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones		Cantidad	Cantidad
		LONGITUD	ALTO		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30				213,05
	BLOQUE No.3				
	PASILLO ACCESO SALA DE ATENCION	1,82		7,00	12,74
		4,90		1,00	4,9
		7,50		2,00	15
		1,90		1,00	1,9
		2,02		1,00	2,02
		18,47		1,00	18,47
					0
	RAMPA	6,76		1,00	6,76
					0
	PASILLO FACHA PRINCIPAL	43,22		1,00	43,22
					0
	BLOQUE No.2				
	PASILLO BAÑOS	1,82		4,00	7,28
		3,21		1,00	3,21
					0
	RAMPA	35,18		1,00	35,18
					0
	PASILLO FACHADA PRINCIPAL	40,20		1,00	40,2
	RAMPA	6,76		1,00	6,76
					0
	PASILLO ACCESO BLOQUE No.2 - No.3				
	PASILLO	8,45		1,00	8,45
	ACCESO	6,96		1,00	6,96
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Imagen					0
					0


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	213,05

Observaciones:

Contratista: Nombre: Jhonatan Cadavid Valencia

Interventoría: Nombre: Julio Cesar Williams

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24.35

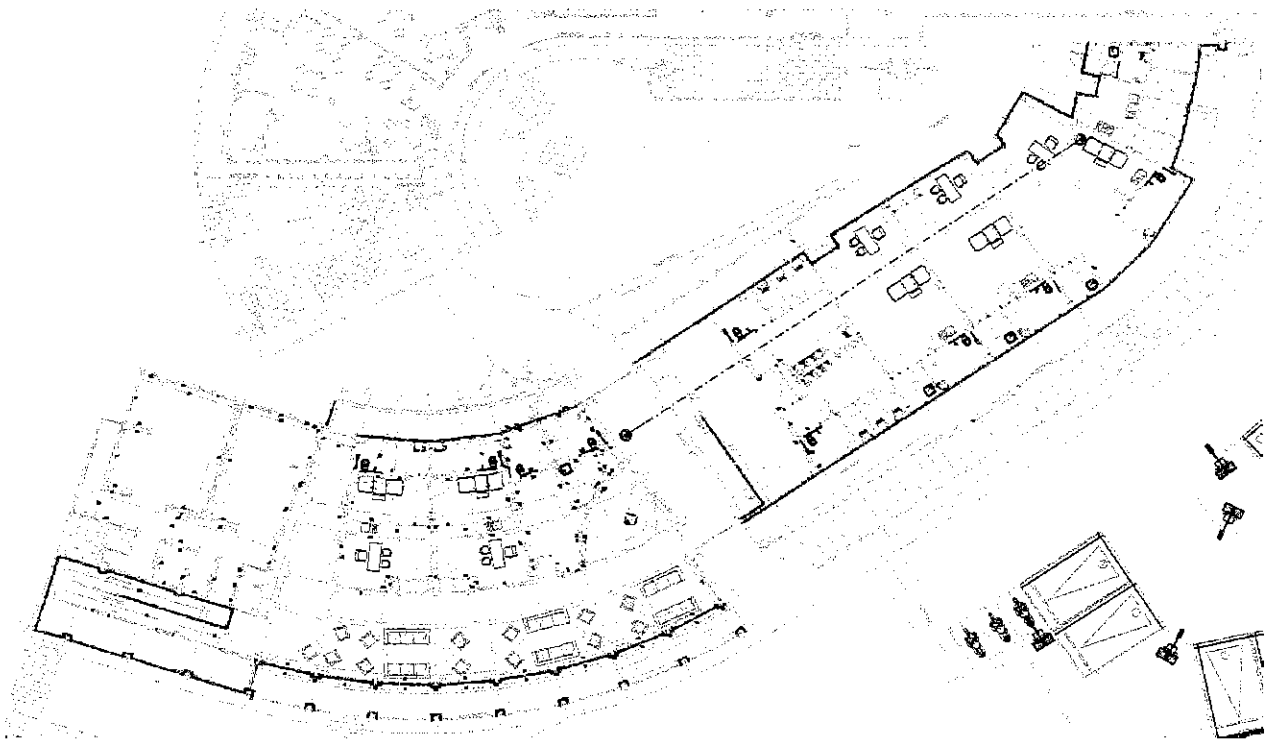

Observaciones:



Contratista
Nombre: Fernando Ramos Figueroa

Aprobado la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walkiria

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INF 24.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT RECUBIERTA EN PVC 3/4"	Unidad:	ML	Cantidad total:	13,50

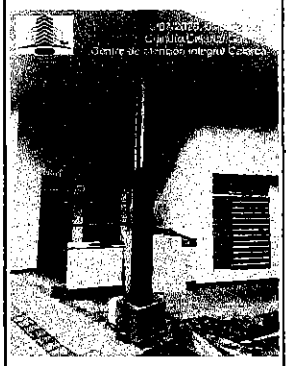Croquis y record fotográfico	Descripción	Dimensiones			Área / Volumen	Cantidad
		LONGITUD	Ancho	Alto		
	[illegible]					13,50
	BAJANTE - SISTEMA APANTALLEMIENTO BLOQUE No.3	1,50			6,00	8,00
	BAJANTE - SISTEMA APANTALLEMIENTO BLOQUE No.3	1,50			3,00	4,50
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	13,50

Observaciones:


Contratista: [illegible]

Apoyo de Supervisión: Hernán Julio Oliver Willerns

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA | Hoja: _____ de: _____ | Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.36	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO DE SOBRE PONER COBERTURA 6 M	**Unidad:**	UND	**Cantidad total:**	6,00

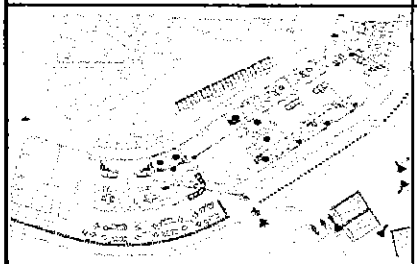





Croquis y récord fotográfico	*Descripción*	*Dimensiones*				*TOTAL*
		UNIDAD	*Ancho*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	MES DE JUNIO 01 DEL 20					**6,00**
	BLOQUE No.2					
	BAÑO TALLAS PEQUEÑAS	1,00			1,00	1,00
	BAÑO GENERAL	1,00			1,00	1,00
	BLOQUE No.3 - BATERIA DE BAÑO					
	BAÑO MUJERES	1,00			1,00	1,00
	BAÑO PMR - MUJERES	1,00			1,00	1,00
	BAÑO HOMBRES	1,00			1,00	1,00
	BAÑO PMR - HOMBRES	1,00			1,00	1,00


Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**0,00**
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**
PRESENTE ACTA N°15	**6,00**

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Isaías Rodríguez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walleros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24.37

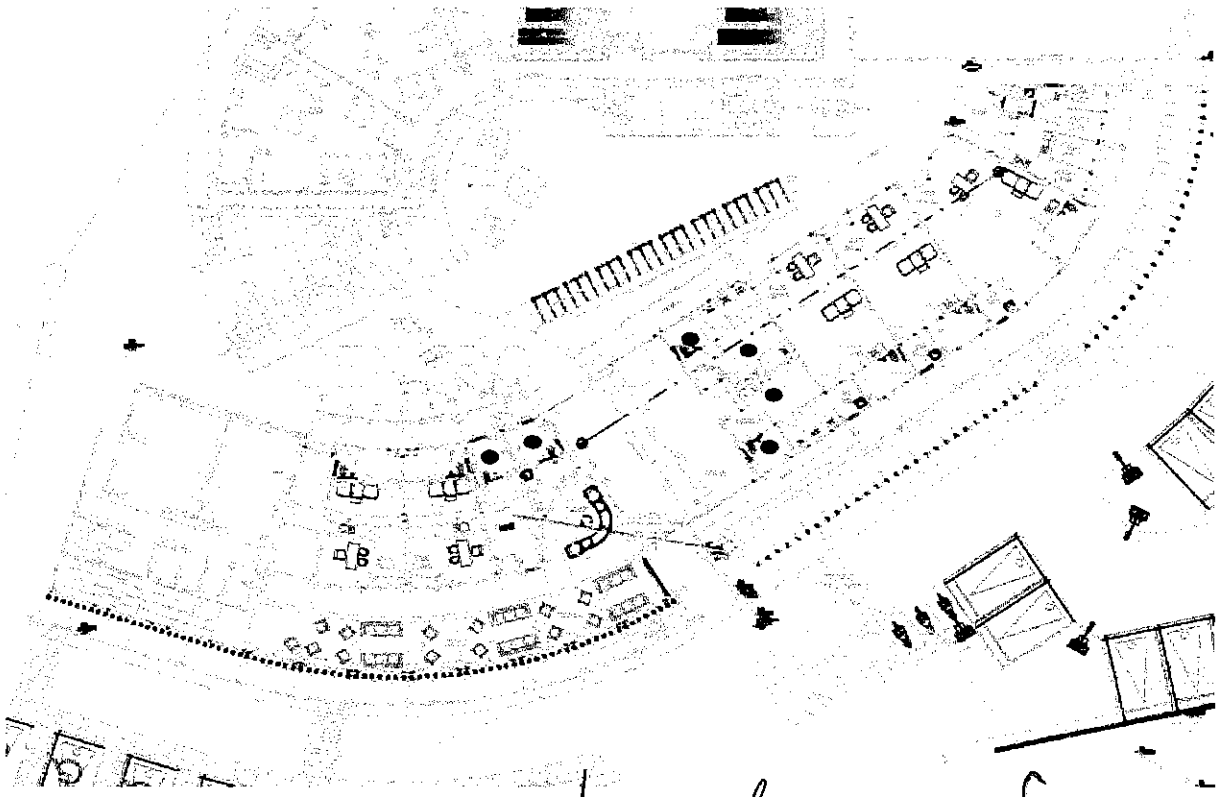

Observaciones:


Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Fasanez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ÍTEM:	INP 24.37	PISO EN GRAVILLA LAVADA + PISO SAHARA (0,15X0,30 - 0,30X0,30)	**Unidad:**	M2	**Cantidad total:**	57,17

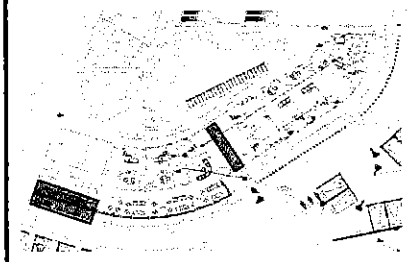Croquis y récord fotográfico	*Descripción*	*Dimensiones*				*TOTAL*
		LONGITUD	*ANCHO*	*Alto*	*CANTIDAD*	
	MES DE JUNIO DEL 30					57,17
	BLOQUE No.2					
	RAMPA	10,80	3,66		1,00	39,53
	BLOQUE No.5					
	RAMPA	9,80	1,80		1,00	17,64
						

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	**0,00**
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	**0,00**
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	**0,00**
PRESENTE ACTA N°15	**57,17**

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Arnaldo Ibañez Vasquez

Aprobó a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Willeros

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA					Hoja: 1 de:	
					Fecha:	
DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.						
ÍTEM:	PGIO	PGIO	Unidad:	UNIDAD	Cantidad total:	0,06

Croquis y récord fotográfico





Descripción	*Dimensiones*			*Cantidad*	*Cantidad*
	area		*UNIDAD*		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					
PGIO				0,06	

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,43
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,21
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,30
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,94
PRESENTE ACTA N°15	0,06

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Fernando Ramírez Vásquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Gallegos

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: 1 de:
	Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF006-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON

ITEM:	PMT	PMT	Unidad: UNIDAD	Cantidad total:	0,07

Croquis y registro fotográfico



Descripcion	Dimensiones			Cantidad	Cantidad
	ancho		UNIDAD		
MES DE JUNIO 01 DEL 30					
PMT				0,07	

Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,43
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,21
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,29
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,93
PRESENTE ACTA N°15	0,07

Observaciones:

Contratista: Nombre: [illegible]


Apoyo a la supervision: Nombre: Juan Cesar Wallerio


= 1 GV.

MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Hoja: _____ de: _____ Fecha:

Contrato de obra No LP006-INF008-OBRA-2023. CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

ITEM:	INP 24.38	ESCOTILLA EN LA MINA ALFAJOR INCUYE (ELEMENTOS DE FIJACION, BASE Y PINTURA DE ACABADO)	Unidad:	M2	Cantidad total:	3,26

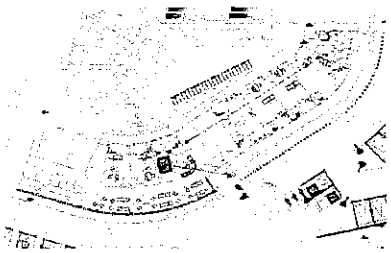Croquis y récord fotográfico	Descripción	Dimensiones			CANTIDAD	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	Alto		
	MES DE JUNIO 01 DEL 30					3,26
	CUARTO DE MAQUINA	1,30	1,00		1,00	1,30
	TANQUE ALMACENAMIENTO	0,90	0,90		1,00	0,81
	BLOQUE No.2					
	CUARTO TECNICO - CARCAMO RED ELECTRICA	1,20	0,96		1,00	1,15

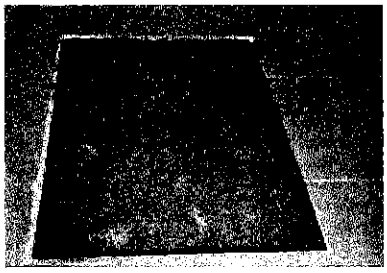




Menos (-) Cantidad Pagada Acta 1	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 2	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 3	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 4	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 5	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 6	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 7	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 8	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 9	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 10	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 11	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 12	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 13	0,00
Menos (-) Cantidad Pagada Acta 14	0,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO ACTAS	0,00
PRESENTE ACTA N°15	3,26

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Eduardo Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Diego Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24.38

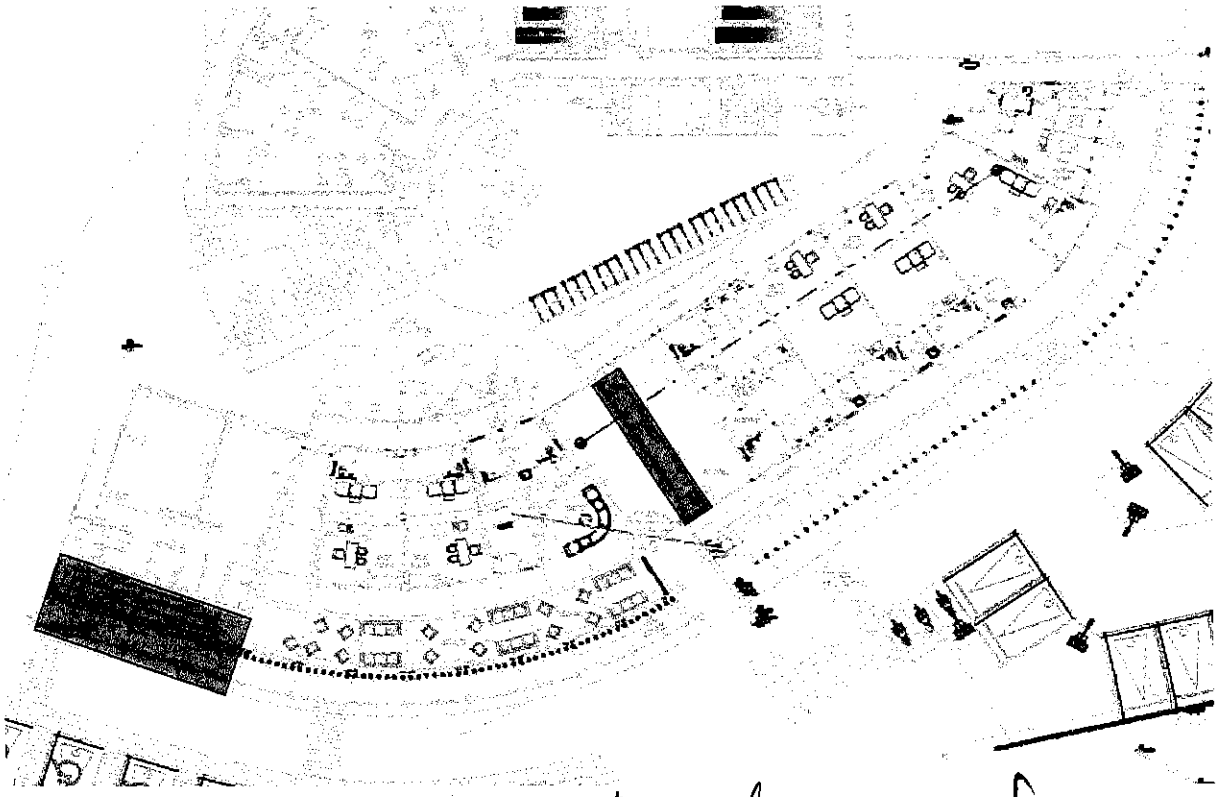


Observaciones:

Contratista:
Nombre: Armando Ibañez Pasquel

Apoyo de Supervisión:
Nombre: Julio Cesar Walteros

PLANO ANEXO No.1 - ITEM INP 24.39

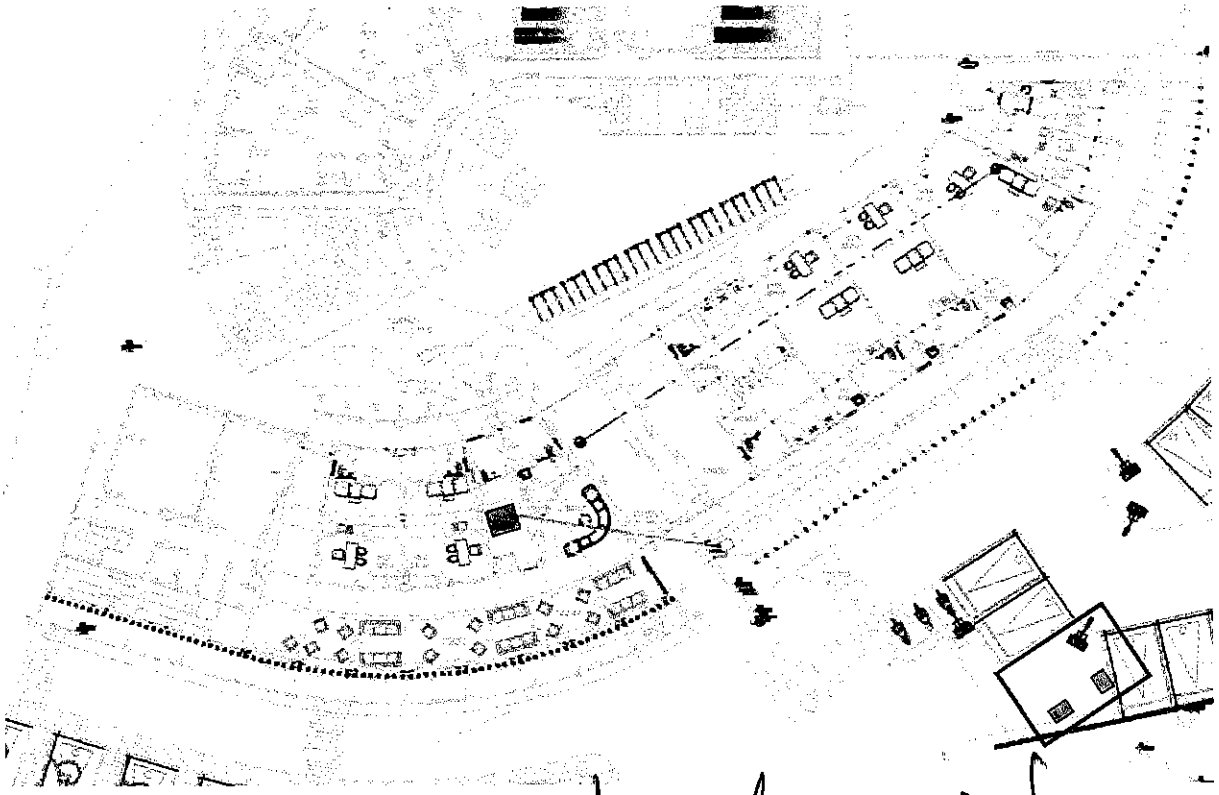

Observaciones:

Contratista:
Nombre: Ramiro Ibañez Vasquez

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: Ing. Cesar Walteros

• JUEVES 01 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO =

- (1) Residente de obra
- (1) Ingeniero apoyo
- (1) Profesional SST
- (1) Plomero
- (2) Oficiales obra civil
- (4) Ayudantes
- (2) Enchapadores

→ PERSONAL MARMESAN =

- (2) Instaladores.

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ

- (1) Contratista
- (1) Encargado
- (3) Oficiales pintura

• CLIMA: Templado

• Equipos: Herramienta menor, Concretadora, pulidora.

• ACTIVIDADES:


→ Excavación e instalación de sardinel

→ Enchape pasillos bloque 3

→ Estuco y pintura bloque 2

→ Instalacion mesones bateria baño bloque 3

→ Orden y aspo campamento.



• VIERNES 02 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO =

- (1) Residente de obra
- (1) Profesional SST
- (1) Almacenista
- (1) Ingeniero Apoyo
- (1) plomero
- (2) oficiales obra civil
- (2) Enchapadores

→ PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS

- (2) Almadores
- (2) soldadores
- (1) Oficial Estructural

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ
- ④ Instaladores cielo raso
- ③ Oficiales pintura

→ PERSONAL SUPERVISION
- ① Ingeniero

• Clima = NUBLADO
• EQUIPOS = herramienta menor, pulidora, taladro, concretadora, andamio
• ACTIVIDADES =
→ Excavación e instalación Sardinel
→ Enchape pisos
→ Orden y aseo
→ Instalación muros estructura liviana
→ Instalación aleros
→ Instalación cielo raso
→ Estuco y pintura en muros y cielo raso

— Se solicita al contratista realizar la reposición de la Rejilla del sumidero de aguas lluvias ubicado en el costado izquierdo de la obra afectado en proceso.

• SABADO 03 MAYO 2025
→ PERSONAL CONSORCIO =
- ① Residente obra
- ① Almacenista
- ① Ingeniero apoyo
- ① Profesional SST
- ① Plomero
- ② Oficiales obra civil
- ④ Ayudantes obra civil

→ PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAS =
- ① Armador
- ② Soldadores
- ① Oficial estructura liviana

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- ④ Instaladores cielo raso
- ③ Oficiales Pintura
- ① contratista

Powered by CamScanner

- CLIMA: Lluvioso
- EQUIPOS: Herramienta menor, andamios, polidora, taladro
- ACTIVIDADES:
  - Excavación e instalación Sardinel
  - Orden y aseo
  - Instalacion muros super board
  - Estuco y pintura
  - Instalación aleros
  - Instalación cielo raso.

- LUNES 05 MAYO 2025
  - PERSONAL CONSORCIO:
    - ① Residente de obra
    - ① Ingeniero apoyo
    - ① Almacenista
    - ① Profesional SST
    - ① Plomero
    - ① Oficial
    - ④ Ayudantes
  - PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS:
    - ② Armadores
    - ② Soldadores
    - ① Oficial estructura liviana
    - ① Contratista
  - PERSONAL EDILBERTO PEREZ:
    - ① Contratista
    - ④ Instaladores cielo raso
    - ③ Oficiales pintura
  - PERSONAL MARMESAN:
    - ② Instaladores.
- CLIMA = Lluvioso
- EQUIPOS: Herramienta menor, polidora, taladro, andamios, concretadora
- ACTIVIDADES:
  - Instalación aparatos sanitarios
  - Llenos Caricamo

→ Desencofrado Carcamo
→ Instalación formaleta para Carcamo
→ Andenes.

lectura del manometro Bloque 2. almuerzo. 152 PSi, 5:00 PM.

• MARTES 06 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO=
- (1) Residente de obra
- (1) Ingeniero Apoyo
- (1) Almacenista
- (1) Profesional SST
- (1) Oficial Plomeria
- (1) Técnico electrico
- (2) Oficiales obra civil
- (5) Ayudantes
- (2) Enchapadores.

→ PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAS=
- (2) Armadores
- (2) Soldadores
- (1) Oficial estructura liviana

- Se revisó prueba de presion. a la 7:30 am. Encontrando 150 psi en el manometro, a espera del informe del contratista

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ RAMIREZ=
- (4) Instaladores cielo raso
- (3) Oficiales pintura.

→ PERSONAL SUPERVISIÓN=
- (1) Ingeniero

• CLIMA= TEMPLADO
• EQUIPOS= Concretadora, pulidora, herramienta menor, andamio multidireccional
• ACTIVIDADES=
→ Instalación aparatos Sanitarios
→ Lleno para Carcamos
→ Excavación para Carcamos
→ Desencofrado Carcamo
→ Instalación formaleta Carcamo

Powered by CamScanner

→ Andenes
→ Adecuacion cableado para luminarias
→ Enchape Pisos
→ Instalación cielo raso
→ Instalación muros livianos
→ Pintura y estuco muros

• MIERCOLES 07 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO=
- (1) Residente de obra
- (1) Ingeniero apoyo
- (1) Almacenista
- (1) Profesional SST
- (1) Plomero
- (1) Oficial plomeria
- (2) Oficiales obra civil
- (5) Ayudantes
- (2) Enchapadores

→ PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES=
- (2) Armadores
- (1) Soldador
- (1) Oficial estructura liviana
- (1) Contratista

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ=
- (1) Contratista
- (1) Encargado
- (4) Instaladores Cielo raso
- (3) Oficiales Pintura

→ PERSONAL SUPERVISIÓN=
- (1) Ingeniero

• CLIMA = Nublado
• Equipos = Herramienta menor, herramienta electrica, Concretadora, andamios
• ACTIVIDADES=
→ Se continua con instalación aparatos Sanitarios
→ Llenos por cargamos y excavación

Powered by CamScanner

→ Enrofrado y desenrofrado de Carcamos
→ Andenes
→ Enchape pisos
→ Instalación cielo raso
→ Instalación muros livianos
→ Estuco y pinturas de muros

• JUEVES 08 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Residente obra
- (1) Profesional SST
- (1) Almacenista
- (1) Ingeniero Apoyo
- (1) Oficial plomeria
- (2) Oficiales obra civil
- (5) Ayudantes obra civil
- (2) Enchapadores

→ PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAS =
- (2) Armadores
- (1) Soldador
- (1) Oficial estructura liviana

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ R =
- (3) Instaladores cielo raso
- (3) Oficiales pintura

• CLIMA: TEMPLADO
• EQUIPOS: Herramienta menor, herramienta electrica, concretadora, andamios
• ACTIVIDADES =
- Instalación aparatos Sanitarios
- Llenos para Carcamo
- Excavacion Carcamo
- Desenrofrado Carcamo
- Instalación formaleta carcamo
- Andenes
- Enchape pisos
- Instalación muros supa board
- Instalación Alivios
- Instalación cielo raso
- Estuco y pintura muros y cielo raso

• VIERNES 09 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO=

- ① Profesional SST
- ① Residente obra
- ① Ingeniero Apoyo
- ① Oficial plomería
- ① oficial obra civil
- ⑤ Ayudantes
- ② Enchapadores.

→ PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =

- ② Armadores
- ① Soldador
- ① Oficial Estructura liviana

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ

- ② Instaladores cielo raso
- ③ Pintores

• CLIMA : Soleado

• Equipos: Herramienta menor, herramienta electrica, Concretadora, andamios

• ACTIVIDADES :

- Se continua con instalación aparatos sanitarios
- Llenos para carcamos
- Excavación Carcamos
- Desencofrado y encofrado Carcamos
- Andenes
- Enchape Pisos
- Se realiza Fundicion alistado de Pisos
- Se realiza Fundición contra piso
- Instalación cielo raso
- Instalación muros super board
- Estuco y pintura cielo raso y muros
- Instalación aleros.

Nota El día de hoy se realiza primer mantenimiento a los individuos arboreos plantados.

- SABADO 10 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO=

- (1) Residente de obra
- (1) Ingeniero apoyo
- (1) Profesional SST
- (1) plomero
- (2) oficiales consorcio
- (5) Ayudantes
- (2) Enchapadores

→ PERSONAL SADOVAL CONSTRUCCIONES SAS=

- (2) Armadores
- (1) Soldador
- (1) Oficial estructura liviana

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ=

- (4) Instaladores cielo raso.
- (3) Oficiales pintura

→ PERSONAL SUPERVISION=

- (1) Ingeniero

- CLIMA = Soleado
- EQUIPOS : Herramienta menor, herramienta electrica, concretadora, andamios
- ACTIVIDADES:

- Fundicion contra piso
- Fundicion alistado de pisos
- Enchape pisos
- Andenes
- Instalación formaleta carcamo
- Excavación carcamo
- Llenos para carcamo
- Instalación aparatos sanitarios

- LUNES 12 MAYO 2025

→ ¡NOTA! : El dia Domingo 11 Mayo del 2025, en horas de la noche, aproximadamente 8:20pm se explota el transformador que suministra la corriente a la obra, dejando sin energia el area, Hoy lunes 12 Mayo 2025 se verifica y se realiza llamada a la Edeq empresa publica de energia para darle solución, el daño fue solucionado a las 11:20am, por lo cual la obra permanecio sin energia desde el inicio de labores hasta esa hora : 11:20am

- SABADO 10 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO=
- ① Residente de obra
- ① Ingeniero apoyo
- ① Profesional SST
- ① plomero
- ② oficiales consorcio
- ⑤ Ayudantes
- ② Enchapadores

→ PERSONAL SADOVAL CONSTRUCCIONES SAS=
- ② Armadores
- ① Soldador
- ① Oficial estructura liviana

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ=
- ④ Instaladores cielo raso.
- ③ Oficiales pintura

→ PERSONAL SUPERVISION=
- ① Ingeniero

- CLIMA = Soleado
- EQUIPOS : Herramienta menor, herramienta electrica, concretadora, andamios
- ACTIVIDADES:
- Fundicion contra piso
- Fundicion al ristado de Pisos
- Enchape pisos
- Andenes
- Instalación formaleta carcamo
- Excavación carcamo
- Llenos para carcamo
- Instalación aparatos sanitarios

- LUNES 12 MAYO 2025

→ ¡NOTA! : El dia Domingo 11 Mayo del 2025, en horas de la noche, aproximadamente 8:20pm se explota el transformador que suministra la corriente a la obra, dejando sin energia el area, Hoy lunes 12 Mayo 2025 se verifica y se realiza llamada a la Edeq empresa publica de energia para pronta solución, el daño fue solucionado a las 11:20am, por lo cual la obra permanecio sin energia desde el inicio de labores hasta esa hora : 11:20am

- SABADO 10 MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO =

- ① Residente de obra
- ① Ingeniero apoyo
- ① Profesional SST
- ① plomero
- ② oficiales consorcio
- ⑤ Ayudantes
- ② Enchapadores

→ PERSONAL SADOVAL CONSTRUCCIONES SAS =

- ② Almadores
- ① Soldador
- ① Oficial estructura liviana

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ =

- ④ Instaladores cielo raso.
- ③ Oficiales pintura

→ PERSONAL SUPERVISION =

- ① Ingeniero

- CLIMA = Soleado
- EQUIPOS : Herramienta menor, herramienta electrica, concretadora, andamios
- ACTIVIDADES :

- Fundición contra piso
- Fundición alistado de pisos
- Enchape pisos
- Andenes
- Instalación formaleta carcamo
- Excavación carcamo
- Llenos para carcamo
- Instalación aparatos sanitarios

- LUNES 12 MAYO 2025

→ ¡NOTA! : El dia Domingo 11 Mayo del 2025, en horas de la noche, aproximadamente 8:20pm se explota el transformador que suministra la corriente a la obra, dejando sin energia el area, Hoy lunes 12 Mayo 2025 se verifica y se realiza llamada a la Edeq empresa publica de energia para pronta solución, el daño fue solucionado a las 11:20am, por lo cual la obra permanecio sin energia desde el inicio de labores hasta esa hora : 11:20am

→ PERSONAL CONSORCIO =

- ① Residente obra
- ① Ingeniero apoyo
- ① Almacenista
- ① Profesional SST
- ① Técnico Electrico
- ① Plomero
- ① Oficial
- ③ Ayudantes
- ② Enchapadores

→ PERSONAL SADOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =

- ① Contratista
- ② Armadores
- ① Soldador
- ① Oficial estructura liviana

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ

- ① Encargado
- ③ Oficiales pintura

→ PERSONAL SUPERVISIÓN =

- ① Ingeniero

• Clima : Soleado

• Equipos : Herramienta electrica, herramienta menor, andamios

• Actividades =

- Instalacion aparatos Sanitarios
- Llenos Para Carcamo
- Excavación Para carcamos
- Encha de Pisos
- Estuco y pintura muros y cielo raso
- Instalación Provisional energia oficinas bloque 3

1 – Se recuerda al contratista que el anden en concreto de acceso a los Edificios desde la portería de ingreso al centro de atención integral, debe demostrarse como el contrapiso de la edificacion en concreto de 4000 psi y con acero de Refuerzo mallas Electrosoldadas de 3gr de Barra doble a razon del uso previsto para dicho anden, de igual modo se recuerda realizar prueba de

Fundición del muro obtener la densidad del Substrato material de Base compactada a / prodc. 95% a fin de garantizar la Estabilidad de dicha zona lega

- MARTES 13/MAYO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO =

- ① Residente de obra
- ① Profesional SST
- ① Almacenista
- ① Ingeniero Apoyo
- ① Oficial Plomería
- ① Oficial obra civil
- ② Enchapadores
- ① Técnico Electrico

→ PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS.

- ① Contratista
- ② Armadores
- ① Soldador
- ① Oficial estructura Liviana

→ PERSONAL ~~EDILBERTO~~ PEREZ RAMIREZ =

- ⑤ Pintores
- ② Instaladores estructural.

→ PERSONAL SUPERVISIÓN =

- ① Ingeniero.

CLIMA = TEMPLADO

EQUIPOS = Concretadora, herramienta menor, herramienta electrica

ACTIVIDADES =

→ Se continua Con instalación aparatos Sanitarios
→ Llenos Para cargamos
→ Excavación Para Cargamos
→ Enchape Pisos bloque 2 y 3
→ Estuco y Pintura paredes y cielo raso
→ Inicio de traslado antiguo campamento a bloque 2

14 de Mayo de 2025.

Se recuerda al contratista la Entrega del Balance del proyecto. el cual tiene fecha inicial de entrega para el dia 10 de abril de 2025, con aplazamientos sucesivos con fecha perentoria para el dia lunes 12 de mayo de 2025. Se Solicita cordialmente al contratista la Entrega definitiva de mismo.

→ PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Residente de obra
- (1) Profesional SST
- (1) Almacenista
- (1) Ingeniero apoyo
- (1) oficial plomeria
- (2) Oficiales obra civil
- (5) Ayudantes
- (2) Enchapadores

→ PERSONAL HUGO CADENA =
- (1) Oficial
- (1) Enchapador

→ PERSONAL SADOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
- (1) Contratista
- (2) Armadores
- (1) Soldador
- (1) Oficial estructura liviana.

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (5) Pintores
- (2) Instaladores estructura liviana

→ PERSONAL SUPERVISIÓN =
- (1) Ingeniero.

CLIMA = TEMPLADO

EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, andamios, Concretadora

ACTIVIDADES =
- Instalación aparatos sanitarios
- Llenos para Carcamo
- Excavacion Carcamo
- Desencofrado carcamo

- Instalación formaleta carcamo
- Andenes
- Enchape Pisos, Corredor bloque #2 y #3
- Instalación Sardineles.
- Instalación Ventaneria en aluminio
- Instalación, Carpintería
- Instalación estructura liviana
- Estuco y Pintura muros y cielo raso

• JUEVES 15 MAYO 2025 -

- PERSONAL CONSORCIO =
  - (1) Residente de obra
  - (1) Ingeniero apoyo
  - (1) Almacenista
  - (1) Profesional SST
  - (1) Oficial plomeria
  - (1) Oficial Obra civil
  - (4) Ayudantes
  - (1) Enchapador
- PERSONAL HEGO CADENA.
  - (2) Oficiales
  - (1) Enchapador
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES ISAS
  - (1) Contratista
  - (2) Armadores
  - (1) Soldador
  - (1) Oficial estructura liviana
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ R.
  - (5) Pintores
  - (2) Instaladores estructura liviana
- PERSONAL SUPERVISIÓN
  - (1) Ingeniero.

• CLIMA : TEMPLADO

• EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, Concretadora, andamios.

• ACTIVIDADES

- Instalacion malla electro soldada
- Perfilacion andenes
- Fundición Carcamo

- Alistado pisos rampas
- Enchape pasillos
- Pintura muros
- Instalación estructura liviana
- Instalación carpintería aluminio y madera

• VIERNES 16 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO =
  - (1) Residente de obra
  - (1) Almacenista
  - (1) Profesional SST
  - (1) Oficial Plomería
  - (2) Oficial obra civil
  - (4) Ayudantes
  - (1) Enchapador

→ PERSONAL HUGO CADENA =
  - (1) Oficial
  - (1) Enchapador

→ PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
  - (1) Contratista
  - (2) Armadores
  - (1) Soldador
  - (1) oficial estructura liviana

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
  - (1) Contratista
  - (5) pintores
  - (2) Instaladores estructura liviana

→ PERSONAL SUPERVISION =
  - (1) Ingeniero. civil
  - (1) Ingeniero Electrico
  - (1) Ingeniero Ambiental

• CLIMA = Nublado
• EQUIPOS = Herramienta electrica, herramienta menor, concretadora, andamios
• ACTIVIDADES =
- Fundicion anclenes
- Sardineles
- Alistado pisos rampas

- Instalación estructura liviana
- Instalación carpintería aluminio y madera
- Estuco y pintura muros.

• SABADO 17 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO =
  - (1) Residente de obra
  - (1) Almacenista
  - (1) Profesional SST
  - (1) Oficial plomería
  - (1) Oficial obra civil
  - (4) Ayudantes
  - (1) Enchapador.
- PERSONAL HUGO CADENA =
  - (1) Oficial
  - (1) Enchapador.
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
  - (1) Contratista
  - (2) Armadores
  - (1) Soldador
  - (1) Oficial estructura liviana
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ RAMIREZ =
  - (1) Encargado
  - (2) Instaladores estructura liviana
  - (5) Pintores

• CLIMA: Lluvioso

• EQUIPOS: Herramienta menor, herramienta eléctrica, andamios, concretadora


• ACTIVIDADES =

- Fundición de anden
- Enchape pisos corredor
- Instalacion cielo raso
- Pintura y estuco muros
- Pintura y estuco de fachada
- Instalación carpintería aluminio y madera
- Instalación aleros sistema liviana

Entregado.

¡Nota!: Se recibio visita por parte del profesional Ingeniero Carlos Montoya de la empresa certificadora RETIE, Se realizo recorrido e inspección de instalaciones en compañía de los Ing. Arquitecto Armando I y el Ing. Juan carlos

apoyo a diseños, durante la visita se inspeccionó: Toma corrientes, salida de luminarias, soportes de tubería MT, Las recomendaciones dadas por el Profesional RETIE es que se debe instalar o dotar el proyecto de la planta de emergencia dado a que de no ser así no podría certificarse, así mismo se reflejo que el proceso constructivo a la fecha cuenta con los requerimientos para uso final y certificación del mismo.



• LUNES 19 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO =
  - (1) Residente de obra
  - (1) Director de obra
  - (1) Almacenista
  - (1) Social
  - (1) SST
  - (1) Oficial Plomería
  - (1) Oficial obra civil
  - (3) Ayudantes
  - (1) Enchapador
- PERSONAL HUGO CADENA =
  - (1) Oficial
  - (1) Enchapador
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAS =
  - (2) Armadores
  - (1) Soldador
  - (1) Oficial estructura liviana
  - (1) Contratista
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ R =
  - (3) Oficiales de pintura
  - (1) Instalador Estructura liviana
  - (1) Contratista
- PERSONAL SUPERVISIÓN =
  - (1) Ingeniero.

• Clima = Soleado

• Equipos = Concretadora, herramienta eléctrica, herramienta menor, andamios

• Actividades =

→ Fundición de andenes

→ Instalación Sardineles

→ Enchapes

→ Instalación Ventaneria en aluminio
→ Estuco y pintura muros
→ Instalación Cielo raso

- MARTES 20 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO =
  - (1) Director de obra
  - (1) Residente de obra
  - (1) Almacenista
  - (1) Social
  - (1) SST
  - (1) Plomero
  - (4) Ayudantes
  - (1) Enchapador
- PERSONAL HUGO CADENA =
  - (1) Oficial
  - (1) Enchapador
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES SAS =
  - (1) Contratista
  - (2) Armadores
  - (1) Soldador
  - (1) Oficial estructura liviana
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
  - (5) Oficiales pintura
  - (1) Instalador estructura liviana
- PERSONAL SUPERVISIÓN =
  - (1) Ingeniero
  - (1) Arquitecta

- CLIMA = TEMPLADO
- EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, concretadora, andamios
- ACTIVIDADES =

→ Se continua con fundición de andenes
→ Se continua con enchape de pisos
→ Se continua con pintura de muros y cielo raso
→ Se continua con instalacación carpintería de aluminio y madera

• MIERCOLES 21 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO =
  - (1) Director de obra
  - (1) Residente de obra
  - (1) Almacenista
  - (1) Social
  - (1) SST
  - (1) Plomero
  - (1) Oficial
  - (4) Ayudantes
  - (1) Enchapador
- PERSONAL HUGO CADENA C =
  - (2) Oficiales
  - (1) Enchapador
  - (1) Ayudante.
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
  - (1) Contratista
  - (2) Armadores
  - (1) Soldador
  - (1) Pintor.
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
  - (5) pintores
  - (1) Oficial estructura liviana
  - (1) Contratista
- PERSONAL SUPERVISION =
  - (1) Ingeniero.

• CLIMA = TEMPLADO

• EQUIPOS = Herramienta electrica, herramienta menor, Concretadora, andamios

• ACTIVIDADES =

→ Se continua con fundición andenes

→ Se continua con instalación Carpintería aluminio y madera

→ Se continua con enchape pisos

→ Se continua con Pintura muros y cielo raso

→ Se continua con instalación Cielo raso

→ Se continua con instalación Sardineles

→ Se realiza Jornada de Orden y aseo.

Ayudante.

• JUEVES 22 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO:
  - (1) Director de obra
  - (1) Residente de obra
  - (1) Almacenista
  - (1) Social
  - (1) SST
  - (1) Plomero
  - (1) Oficial
  - (3) Ayudantes
  - (1) Enchapador.
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS=
  - (2) Armadores
  - (1) Soldador
  - (1) Oficial Estructura liviana
- PERSONAL EDILBETO PEREZ RAMIREZ =
  - (5) pintores
  - (1) Oficial estructura liviana
  - (1) Contratista
- PERSONAL HUGO CADENA=
  - (2) Oficiales
  - (1) Enchapador.
- PERSONAL SUPERVISION=
  - (1) Ingeniero.

• Clima = Templado
• Equipos = Herramienta electrica, herramienta menor, concretadora, andamios
• ACTIVIDADES=

→ Se continua con fundición andenes
→ Se continua con instalación Carpinteria en aluminio y madera
→ Se continua con enchape pisos
→ Se continua con instalación sardineles
→ Se continua instalación cielo raso
→ Se realiza aplicación granito en rampa

NOTA: Se realiza acompañamiento a mesa de trabajo en oficinas de Contraloria.

para la construcción del anden de acceso al proyecto se recorrera la ruta 1 del dia 12 de Mayo de 2025, Toma de densidad.

• VIERNES 23 MAYO 2025.

PERSONAL CONSORCIO =

- (1) Residente obra
- (1) Almacenista
- (1) Social
- (1) SST
- (1) Plomero
- (1) Oficial
- (3) Ayudantes
- (1) Enchapador

PERSONAL HUGO CADENA =

- (2) Oficiales
- (1) Enchapador
- (1) Ayudante

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAS =

- (1) Contratista
- (2) Armadores
- (1) Soldador
- (1) Oficial estructura liviana

PERSONAL EDILBERTO PEREZ BANIBEZ =

- (1) Contratista
- (1) Encargado
- (5) Pintores
- (1) Oficial estructura liviana

PERSONAL SUPERVISIÓN =

- (1) Ingeniero
- (1) Ingeniero Ambiental
- (1) Arquitecta

• CLIMA = Soleado

• EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, andamios, concretadora

• ACTIVIDADES =

- Se continua con fundición de andenes
- Se continua con instalacion de sardineles
- Se continua con enchape pisos
- Se continua con instalación granito rampa
- Se continua con instalación cielo raso
- Se continua con pintura paredes, cieloraso
- Se continua con instalación carpintería aluminio
- Se realiza instalación de tubería acueducto, entrada.

• SABADO 24 MAYO 2025

PERSONAL CONSORCIO =

- ① Almacenista
- ① Profesional SST
- ① plomero
- ① Oficial
- ③ Ayudantes
- ① Enchapador

PERSONAL HUGO CADENA

- ② Oficiales
- ① Enchapador
- ① Ayudante

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAS =

- ① contratista
- ① Armadores
- ① Soldador
- ① Oficial estructura liviana

PERSONAL EDILBERTO PEREZ RAMIREZ =

- ① contratista
- ⑤ Pintores
- ① Oficial estructura liviana

PERSONAL SUPERVISIÓN =

- ① Ingeniero.

• Clima: TEMPLADO

• EQUIPOS: Herramienta menor, herramienta electrica, andamios, concretadora

• ACTIVIDADES =

- Enchape Pisos
- Ligado de Paredes
- Pintura paredes internas, Fachada y cielo raso
- Instalación Sardineles
- Instalación carpintería en aluminio
- Fundición andenes

• LUNES 26 MAYO 2025

PERSONAL CONSOPICIO=

- (1) Ingeniero Apoyo
- (1) Almacenista
- (1) Profesional SST
- (1) Oficial plomeria
- (1) Oficial obra civil
- (4) Ayudantes
- (1) Enchapador.

PERSONAL HUGO CADENA

- (1) Oficial
- (1) Ayudante

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS=

- (1) contratista
- (2) Armadores
- (1) Soldador
- (1) Oficial estructura liviana.

PERSONAL EDILBERTO PEREZ R

- (1) Oficial estructura liviana
- (5) Pintores

PERSONAL SUPERVISIÓN

- (1) Ingeniero

• CLIMA= Soleado

• EQUIPOS= Herramienta menor, herramienta electrica, Concretadora, andamios

• ACTIVIDADES =

→ Se continua con instalación tuberia aqueducto
→ Se continua con enchape pisos
→ Se continua con instalación granito en rampa sencilla y escaleras acceso
→ Se realiza instalación marcos tapa recamaras
→ Se Continua con instalación cielo raso
→ Se continua con pintura Fachada
→ Se continua con lijado y pintura paredes
→ Se continua con instalacion carpinteria en aluminio
→ Se continua con instalación de planches.

1. Respecto a la construcción del anden del acceso a los Blogues 2. y 3. del proyecto se recuerda en nota # 1 del día 12 de mayo, respecto a la toma de densidades del substrato o base compactada del anden debido a que este anden tiene una gran responsabilidad de tráfico lo cual se ha solicitado con anticipación y cumpame a las Especificaciones técnicas del proyecto.

- MARTES 27 MAYO 2025

PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Ingeniero Apoyo
- (1) Almacenista
- (1) Profesional SST
- (1) Oficial plomería
- (1) Oficial obra civil
- (4) Ayudantes
- (1) Enchapador

PERSONAL HUGO CADENA =
- (2) Oficiales
- (1) Ayudante
- (1) Enchapador

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
- (2) Armadores
- (1) Oficial estructura liviana

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (5) Oficiales Pintura
- (1) Oficial estructura liviana

- CLIMA = Soleado
- EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, conectadora, andamios.
- ACTIVIDADES =

→ Se continua con enchape pisos y aplicación grantto
→ Se continua con instalación de cielo raso
→ Se continua con Pintura muros, fachada y cielo raso
→ Se continua con instalacion de carpintería aluminio y madera
→ Fundicion de anden y cordumo.

• MIERCOLES 28 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO =
  - ① Residente de obra
  - ① Ingeniero apoyo
  - ① Almacenista
  - ① Profesional SST
  - ① Plomero
  - ① Oficial
  - ④ Ayudantes
  - ① Enchapador.
- PERSONAL HUGO CADENA =
  - ② Oficiales
  - ① Enchapador
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
  - ② Armadores
  - ① Soldador
  - ① Oficial estructura L
  - ① Contratista.
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ R =
  - ① Contratista
  - ① Encargado
  - ⑤ Pintores
  - ① Oficial estructura liviana
- PERSONAL SUPERVISION =
  - ① Ingeniero.

• Clima = Soleado

• Equipos = Herramienta menor, Herramienta electrica, Andamio, concretadora.

• ACTIVIDADES =

→ Pintura paredes, fachada
→ Enchape pisos
→ aplicación granito
→ Fundición andenes
→ Compactación de terreno
→ Instalación cielo raso.

• JUEVES 29 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO=
  - ① Residente de obra
  - ① Almacenista
  - ① SST
  - ① Plomero
  - ① Oficial
  - ④ Ayudantes
  - ① Enchapador
- PERSONAL HUGO CADENA =
  - ② Oficiales
  - ① Enchapador.
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
  - ② Armadores
  - ① Soldador
  - ① Oficial estructura liviana
  - ① Contratista
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ R=
  - ⑤ oficiales pintura
- PERSONAL INOXIDEAS =
  - ① Instalador
- PERSONAL SUPERVISIÓN=
  - ① Ingeniero civil
  - ① Ingeniero Electrico
  - ① Arquitecta

• CLIMA =

• EQUIPOS= Herramienta menor, herramienta electrica, concretadora, andamios

• ACTIVIDADES =

→ Se continua con instalacion enchape
→ Se continua con Pintura de fachada y paredes
→ Fundición placa pasillo 2 y 3
→ Instalación mesones de cocina
→ Instalación divisiones de baños
→ Se realiza Orden y aseo

• VIERNES 30 MAYO 2025

PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Residente de obra
- (1) Profesional SST
- (1) Oficial plomería
- (1) Oficial obra civil
- (4) Ayudantes
- (1) Enchapador

PERSONAL HUGO CADENA =
- (1) Oficial, (1) Enchapador

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
- (2) Armadores
- (1) Contratista
- (1) Soldador

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (2) Oficiales pintura
- (1) oficial estructura liviana
- (1) Contratista

PERSONAL INOXIDEAS =
- (1) Instalador

PERSONAL SUPERVISIÓN =
- (1) Ingeniero civil
- (1) Ingeniero electrico.

- CLIMA = SOLEADO
- EQUIPOS = Concretadora, andamios, herramienta menor, herramienta electrica
- ACTIVIDADES =
  - Instalación enchape
  - Instalación granito rampa
  - Fundición anden
  - Fundición Carcamo
  - Instalación carpinteria aluminio
  - Pintura Paredes
  - Pintura Fachada y Muros
  - Instalación mesones
  - Instalación divisiones de baño

• SABADO 31 MAYO 2025

- PERSONAL CONSORCIO =
  - ① Residente de obra
  - ① Profesional SST
  - ① Oficial plomería
  - ① Oficial
  - ④ Ayudantes
  - ① Enchapador
- PERSONAL HUGO CADENA =
  - ① Oficial
  - ① Enchapador
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES SAS
  - ② Armadores
  - ① Soldador
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
  - ⑤ pintores
  - ① contratista
  - ① Oficial estructura liviana
- PERSONAL INOXIDEAS =
  - ① Instalador
- PERSONAL SUPERVISIÓN =
  - ① Ingeniero civil

• CLIMA = Soleado

• EQUIPOS = Concretadora, andamios, herramienta electrica y menor.

• ACTIVIDADES =

- Se continua con instalacion enchape
- Se continua con instalacion granito
- Se realiza Fundición anden
- Se realiza Fundicion Carcamo
- Se continua con instalacion Carpinteria en aluminio
- Se continua con instalacion divisiones de baños y mesones
- Se continua con pintura muros y Fachada

• MARTES 03 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO=
- ① Residente de obra
- ① profesional SST
- ① Almacenista
- ① Oficial
- ② Ayudantes

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES=
- ② Armadores
- ① Soldador

PERSONAL HUGO CADENA=
- ① Enchapador

PERSONAL EDILBERTO PEREZ=
- ② Pintores
- ① Oficial estructura liviana
- ① Contratista

PERSONAL SUPERVISIÓN=
- ① Ingeniero Civil

• CLIMA = TEMPLADO
• EQUIPOS= Herramienta electrica, herramienta menor, concretadora, andamios
• ACTIVIDADES=
- Instalación Enchape piso
- Fundición de anden
- Desencofrado de Carcamo
- Instalación guarda escobas
- Instalación carpinteria en aluminio
- Pintura muros y Fachada

• MIERCOLES 04 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO=
- ① Residente de obra
- ① Almacenista
- ① SST
- ① Oficial
- ① Enchapador
- ④ Ayudantes

Powered by CamScanner

PERSONAL HUGO CADENA =
- (1) Enchapador

PERSONAL SADOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =
- (2) Armadores
- (1) Soldador

PERSONAL EDILBERTO PEREZ R =
- (3) Pintores
- (1) Oficial estructura liviana

PERSONAL SUPERVISION =
- (1) Ingeniero civil
- (1) Ingeniero electrico

CLIMA = TEMPLADO
EQUIPOS = Herramienta electrica, herramienta menor, andamios
ACTIVIDADES =
- Se continua con enchape de piso
- Se continua con pintura muros, fachada y cielo raso
- Se continua con instalacion de ventaneria en aluminio
- Se inicia con acabados, resanes y detalles finales
- Se realiza Oiden y aseo general en obra
- Se realiza entrega de equipos

- JUEVES 05 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO =
(1) Residente de obra
(1) Profesional SST
(1) Almacenista
(1) Oficial
(1) Enchapador
(2) Ayudantes

PERSONAL HUGO CADENA =
(1) Enchapador

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I =
(1) Armador, (1) Soldador

Powered by CamScanner

PERSONAL EDILBERTO =
- (4) Pintores
- (1) Oficial estructura liviana
- (1) Contratista

PERSONAL SUPERVISION =
- (1) Ingeniero civil

• CLIMA - Soleado
• EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica
• ACTIVIDADES =
- Instalación enchape pisos
- Fundición
- Detalles finales
- Instalación guarda escobas
- Orden y aseo
- Entrega equipos
- Instalación Ventaneria
- Estuco y Pintura Fachada, muros y cielo raso

• VIERNES 06 JUNIO 2025 =
PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Residente de obra
- (1) Profesional SST
- (1) Almacenista.
- (1) Oficial
- (1) Enchapador
- (3) Ayudantes

PERSONAL HUGO CADENA =
- (1) Enchapador

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I =
- (1) contratista
- (1) Armador
- (1) Soldador

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (1) Oficial estructura liviana

- ④ Pintores

PERSONAL SUPERVISIÓN =
- ① Ingeniero civil
- ① Ingeniero Electrico
- ① Ingeniero ambiental
- ① Arquitecta
- ① Abogada

• CLIMA = NUBLADO
• EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, bandamios M.
• ACTIVIDADES =
- Instalacion boquilla
- Detalles Finales
- Orden y aseo
- Entrega equipos
- Instalacion carpinteria aluminio.
- Estuco y Pintura Fachada, cielo raso, Muros.

→ Pluviometro = Inicia fuerte lluvia desde las 02:00 pm hasta las 03:30 pm

• SABADO 07 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO =
- ① Residente de obra
- ① Oficial
- ① Almacenista
- ① Enchapador
- ① Profesional SST
- ② Ayudantes

PERSONAL HUGO CADENA =
- ① Enchapador

PERSONAL SADOVAL CONSTRUCCIONES I =
- ① Contratista
- ① Soldador
- ② Armadores

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- ① oficial estructura liviana
- ① Contratista
- ③ Pintores
- ① Encargado.

PERSONAL INOXIDEAS =
- ② Instaladores

Powered by CamScanner

PERSONAL SUPERVISIÓN =

- ① Ingeniero civil

• CLIMA = Soleado

• EQUIPOS = Andamios, herramienta electrica, herramienta menor

• ACTIVIDADES =

→ Se continua con pintura muros y cielo raso

→ Se continua con instalacion cielo raso

→ Se continua con istalación Ventaneria aluminio

→ Se continua con graquilla lavada

→ Se continua con Orden y aseo

→ Se realiza instalación loseta tactil y loseta guia

- Se realiza limpieza y adepro para retiro de material Recalce de zona de demolicion anterior Empalme de compartimentación obra.

• LUNES 09 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO =

- ① Director de obra
- ① Residente de obra
- ① Almacenista
- ① SST
- ① Oficial
- ③ Ayudantes

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS =

- ① Armador
- ① Soldador

PERSONAL EDILBERTO PEREZ R =

- ① Contratista
- ③ Pintores

PERSONAL SUPERVISION =

- ① Ingeniero civil
- ① Ingeniero electrico
- ① Ingeniero ambiental
- ① Arquitecta
- ① Abogada

• CLIMA - Lluvioso

• EQUIPOS = Andamio, herramienta menor, herramienta electrica

• ACTIVIDADES =

Powered by CamScanner

→ Se continua con instalacion de loseta tactil y loseta guia.
→ Se continua con Orden y aseo
→ Se continua con Pintura muros y cielo raso.
→ Asisten instaladores inoxideas y se concluye con la instalacion mesones.

• MARTES 10 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Director obra
- (1) Residente obra
- (1) Almacenista
- (1) SST
- (1) Oficial
- (1) Ayudante.

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES II =
- (1) Soldador
- (1) Armador.

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (1) Contratista
- (3) Pintores

PERSONAL SUPERVISIÓN =
- (1) Ingeniero Director d-
- (1) Ingeniero electrico
- (1) Ingeniero ambiental
- (1) Arquitecta
- (1) Abogada.

• CLIMA = Lluvioso
• EQUIPOS = Herramienta menor y electrica, andamios
• ACTIVIDADES =
→ Instalacion tableta guia y loseta tactil
→ Se continua con pintura muros y cielo raso
→ Se continua con Orden y aseo.

MIERCOLES 11 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO:
- (1) Residente de obra
- (1) Almacenista
- (1) SST
- (1) Oficial
- (3) Ayudantes

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (1) contratista
- (3) Pintores

Nota: El día de hoy ingresa operarios de la gobernación con maquinaria =
- (1) Vibro compactador
- (1) Mini cargador
- (1) Volqueta
- (4) Colaboradores.

Este personal inicia actividades de descapote y nivelación de terreno, así mismo lleno con material excavación zona Parqueaderos.

ACTIVIDADES CONSORCIO =
- Detalles Finales
- Orden y aseo
- Pintura muros, Fachada.
- Retiro material RCD

EQUIPOS: Herramienta menor, Herramienta electrica, andamios.

CLIMA: NUBLADO - LLUVIA

JUEVES 12 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Residente de obra
- (1) Almacenista
- (1) SST
- (1) Oficial
- (2) Ayudantes

PERSONAL EDILBERTO PEREZ:
- (1) Contratista
- (3) Pintores

PERSONAL GOBERNACIÓN =
- (3) operarios
- (1) Vibro compactador y Volqueta

CLIMA = NUBLADO - LLUVIA

EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, andamios

ACTIVIDADES:

→ Detalles finales

→ Orden y aseo

→ Estuco y pintura muros, fachada y cielo raso.

• El personal de la gobernación ejecuta actividades de = Descapote, Nivelación de terreno y lleno con material de excavación en zona de Parqueadores

• VIERNES 13 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO =

- (1) Residente de obra
- (1) SST
- (1) Almacenista
- (1) Oficial
- (2) Ayudantes

PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I =

- (1) Soldador

PERSONAL EDILBERTO PEREZ R =

- (3) Pintores
- (1) Oficial Estructura L

PERSONAL HUGO CADENA -

- (1) Oficial
- (1) Ayudante.

PERSONAL SUPERVISIÓN =

- (1) Ingeniero Civil
- (1) Ingeniero electrico
- (1) Arquitecta
- (1) Secretario

• CLIMA = LLUVIOSO

• EQUIPOS = Herramienta electrica, herramienta menor, andamio

• ACTIVIDADES =

→ Se continua con detalles finales

→ Se continua con Orden y aseo

→ Se continua con pintura y estuco fachada, muros cielo raso

→ Se continua con instalación persianas

→ Se retira Vibrocompactador de la gobernación del qrd

• SABADO 14 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO=
- ① Residente de obra
- ① SST
- ① Almacenista
- ① Oficial
- ② Ayudantes

PERSONAL SANDOVAL C=
- ① Armador
- ① Soldador

PERSONAL EDILBERTO PEREZ R=
- ③ Pintores
- ① Oficial estructura Liv.

PERSONAL HUGO CADENA=
- ① Oficial
- ① Ayudante

PERSONAL SUPERVISIÓN=
- ① Ingeniero civil

• CLIMA = Lluvioso
• EQUIPOS= Herramienta electrica, herramienta menor, andamios M
• ACTIVIDADES=
→ Se continua con Orden y aseo
→ Se continua con detalles finales
→ Se continua con Pintura en Fachada, cielo raso, muros
→ Se continua con instalación Persianas. y vejas
→ no se registra trabajo de maquinaria pesada en la obra.

• LUNES 16 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO=
① Residente de obra
① SST
① Social
① Almacenista
① Oficial
② Ayudantes

PERSONAL EDILBERTO PEREZ=
① Oficial estructura liviana
① pintor

- PERSONAL HUGO CADENA =
  - ① Ayudante
- PERSONAL ELECTRICAS MARTIN =
  - ② Electricos
- EFIGAS =
  - ① Instalador.
- PERSONAL SUPERVISIÓN =
  - ① Ingeniero civil

- CLIMA = NUBLADO
- EQUIPOS = Herramienta electrica, herramienta menor, andamios.
- ACTIVIDADES =
  - → Se continua con detalles finales
  - → Se continua con Orden y aseo
  - → Se continua con Pintura muros
  - → Se continua con remates estructura liviana
  - → Instalación aparatos electricos
  - → Instación de medidor de Gas

- MARTES 17 JUNIO 2025

Se realiza recorrido de obra con la profesional de seguridad y salud en el trabajo, y se verifica la documentación del mes de junio y meses anteriores, como: Inducciones, Capacitaciones, Socializaciones, Permisos, Preoperacionales y temas ambientales. Por otro lado, la profesional SST me manifiesta que el día 17 de junio del presente año al terminar la jornada no realizará mas actividades laborales, por lo cual, dejo constancia la necesidad de reemplazo, ya que en la obra aun continuan laborando y se van a realizar otras actividades de alto riesgo, por lo tanto la supervisión espera documentación de la Persona que quedara a cargo.

Cordialmente = Raol Oyola Cordoba Vargas
17/06/2025

- PERSONAL CONSORCIO =
  - (1) Residente de obra
  - (1) Ayudante
  - (1) Social
  - (1) Almacenista
  - (1) SST
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
  - (3) Pintores
- PERSONAL ELECTRICAS MARTIN =
  - (2) Electricos
- PERSONAL QUINDIAGUAS =
  - (1) Instalador
- PERSONAL SUPERVISIÓN =
  - (1) Ingeniero civil
  - (1) Profesional SST

• CLIMA = Soleado
• EQUIPOS = Herramienta electrica y menor, andamios.
• ACTIVIDADES =
→ Se continua con Pintura muros fachada y cielo raso
→ Se continua con detalles estructura liviana
→ Se continua con instalación aparatos electricos
→ Se continua con detalles finales.

Respuesta Anotación SST: Se deja claridad que no hubo, ausencia de la Profesional SST y que no hay necesidad de reemplazo ya que pertenece al frente de sus labores.

• MIERCOLES 18 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Residente de obra
- (1) Oficial
- (1) Social
- (2) Ayudantes
- (1) Almacenista
- (1) SST

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (3) Pintores

PERSONAL ELECTRICAS MARTIN =
- (2) Electricos

PERSONAL SUPERVISIÓN =
- (1) Ingeniero Civil

PERSONAL OPERATIVO GOBERNCIÓN =
- (9) Operarios.

• CLIMA = Soleado
• EQUIPOS = Andamios, herramienta electrica y menor.
• ACTIVIDADES =
→ Se continua realizando detalles finales, resanes
→ Excavación ductería 3Pulgadas y 1 1/2
→ Se continua con Pintura muros y fachada
→ Se continua con instalación aparatos electricos.
→ La gobernación adelanta actividades de Compactacion terreno, eje, trazo y nivel.

• JUEVES 19 JUNIO 2025
→ PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Residente de obra
- (1) Social
- (1) Almacenista
- (1) SST
- (1) Oficial
- (2) Ayudantes


→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (3) Pintores

→ PERSONAL ELECTRICAS MARTIN =
- (2) Electricos

→ PERSONAL GOBERNACIÓN =
- (1) Ingeniero C.
- (9) Operarios maquinaria P.

• CLIMA = Soleado
• EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, andamios M.
• ACTIVIDADES =
→ Se continua con detalles finales
→ Se continua con Pintura muros y fachada

→ Se continua con excavación
→ La gobernación continua ejecutando labores de excavación, tiraje y compactación.



• VIERNES 20 JUNIO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO =
- ① Residente de obra
- ① Social
- ① SST
- ① Almacenista
- ① Oficial
- ② Ayudantes

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- ① Encargado
- ① Contratista
- ③ Pintores
- ① Oficial estructura locana

→ PERSONAL ELECTRICAS MARTIN
- ② Electricos.

→ PERSONAL EDQ ELETRICOS DEL QUINDIO
- ① Electrico
- ① Ayudante electrico

→ PERSONAL GOBERNACIÓN.
- ① Ingeniero civil
- ① Ingeniero electrio
- ① Ingeniero ambiental
- ① Arquitecta.
- ③ operarios

• CLIMA = SOLEADO
• EQUIPOS: Herramienta electrica, herramienta menor, andamios
• EQUIPOS GOBERNACIÓN = 1 Volqueta, 1 vibrocompactador, ① Minicargador
• ACTIVIDADES =
→ Se continua con Excavación
→ Se continua con detalles finales
→ Se continua con Pintura muros, cielo raso, fachada
→ Se realiza instalación de acometidas
→ Se realiza instalación de poste con grua

Powered by CamScanner

→ la gobernación adelanta actividades de excavación, riego, compactación de terreno.

• SABADO 21 - JUNIO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO JCB =
- (1) Residente de obra
- (1) SST
- (1) Almacenista
- (1) Oficial
- (1) Ayudante.

→ PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (1) Oficial estructura Liv.
- (3) Pintores.

→ PERSONAL ELECTRICAS MARTIN =
- (2) Electricos

→ PERSONAL GOBERNACIÓN =
- (1) Ingeniero civil
- (2) Operarios.

• CLIMA = TEMPLADO
• EQUIPOS = Herramienta menor y electrica, andamios
• EQUIPOS GOBERNACIÓN = (1) Minicargador, (1) Vibrocompactador
• ACTIVIDADES-
→ Se continua con pintura muros, cielo raso
→ Se continua con detalles finales de estructura liviana
→ Se continua con instalación de acometidas
→ Se continua con detalles finales
→ la gobernación continua con riasiego de material y compactación.


- Se solicita al contratista y se recuerda Realizar el Tratamiento de superficie (limpieza, pulido, Retiro de papeles, rebabes de concreto, lesanes, de morteros listos en la superficie del ~~debasto~~. Tecnico para los Equipos del Bombeo, previo a la instalación de estos Equipos con el objetivo de evitar deterioro o daños prematuros en los mismos causados por actividades que ~~pue~~ Contratista.

- Domingo 22 Junio 2025

Personal consorcio JcB =
- (1) Arquitecto residente
- (1) Profesional SST

Personal EDQ Electricos del Quindio =
- (1) Electrico
- (1) Ayudante

- Clima = Lluvioso - Templado
- Equipos = Herramienta electrica, herramienta menor
- Actividades =
  - Se realiza Vestido de poste, instalación de crucetas.




- Lunes 23 Junio 2025

Personal consorcio JcB -
- (1) Arquitecto residente
- (1) Profesional SST

Personal EDQ Electricos del Quindio =
- (1) Electrico
- (1) Ayudante

- Clima = Templado-Nublado
- Equipos = Herramienta electrica, herramienta menor.
- Actividades =
  - Se realiza Terminación de Vestido de poste
  - Se realiza instalación de trasformador
  - Se realiza Cruce de lineas de poste a poste, se realiza control Vehicular con 2 paleteros en ambos sentidos



Powered by CamScanner

• MARTES 24 JUNIO 2025

- PERSONAL CONSORCIO JCB 006 Q =
  - ① Residente de obra
  - ① Almacenista
  - ① SST
  - ① Oficial
  - ② Ayudantes.
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
  - ① contratista
  - ③ Pintores
- PERSONAL ELECTRICAS MARTIN =
  - ② Electricos
- PROVEEDOR ACERINOX DEL QUINDIO -
  - ② Instaladores
- QUINDIAGUAS -
  - ② Instaladores
- SUPERVISION Y GOBERNACIÓN Q -
  - ① Ingeniero civil
  - ① Ingeniero electrico
  - ① Arquitecta
- CLIMA = Nublado
- EQUIPOS = Herramienta menor, herramienta electrica, andamios M.
- ACTIVIDADES =
- Se realiza excavación para tubería electrica
- Se realiza demolición Muro
- Se continua con pintura de muros y cielo raso
- Se continua con instalación aparatos electricos
- Se realiza instalación Pasamanos en rampa de acceso.

— Martes 24 de Junio 2025
En repetidas ocasiones se ha solicitado al Arq. Residente de obra que programe y ejecute la actividad del Resane interno del Muro de concreto del cuarto tecnico de Equipos de Bombeo, el cual presenta mucha Rugosidad, olquines. Superficies del muro con Acabados no

conformar a una Superficie terminada para el uso de una formaleta metalica, como fue especificado en los terminos de la actividad, por lo que se solicita una vez mas Realizar dicho tratamiento de superficie previo a la Instalación de los Equipos de Bombeo lo cual puede generar deterioro de los mismos en el momento de Realizar dicho tratamiento (Retiro de Rebabas de concreto, pulimento, Resanes con Morteros Listos, Reparaciones de hormigones) En cuyo caso el contratista se hace Responsable por la Entrega a satisfacción del cuarto Electrico y de los Equipos de suministro y Bombeo de Agua, para el proyecto.

→ Nota = respecto a la Nota anterior, las recomendaciones solicitadas se atenderan en el menor tiempo posible.

• MIERCOLES 25 JUNIO 2025

- PERSONAL CONSORCIO JCB 006 ☺=
  - ① Arquitecto residente
  - ① Almacenista
  - ① SST
  - ① OFicial
  - ② Ayudantes
- PERSONAL EDILBERTO PEREZ.
  - ③ Pintores
- PERSONAL ELECTRICAS MARTIN.
  - ② Electricos
- PERSONAL SANDOVAL CONSTRUCCIONES I SAS=
  - ① Armador
- PERSONAL SUPERVISIÓN=
  - ① Ingeniero civil

• CLIMA= Soleado

• EQUIPOS= Herramienta electrica, herramienta menor, andamios

• ACTIVIDADES =

→ Se continua con excavación para tubería electrica
→ Se continua con demolición de muro manual
→ Se continua con instalación a paratos electricos
→ Se continua con pintura muros cielo raso
→ Se realiza corte y aplicacion Sikaflex para junta fria en cuarto maquinas y tanque de almacenamiento
→ Se realiza instalación de rejas para ventana y marcos de puerta

Nota = Se recuerda a la supervisión que a la fecha no se ha recibido respuesta del oficio enviado 254 BTA-YHCM "Solicitud documentos para radicar ante EMCA para matricula de servicios públicos", se agradece pronta respuesta para el tramite respectivo, en vista de que la finalización del contrato se acerca y es necesario concluir este tramite. Gracias.

• JUEVES 26 JUNIO 2025

→ PERSONAL CONSORCIO JCB =

- (1) Arquitecto residente
- (1) Almacenista
- (1) SST
- (1) Oficial
- (2) Ayudantes

→ PERSONAL SANDOVAL =

- (1) Armador

→ PERSONAL EDILBERTO P =

- (2) Pintores

→ PERSONAL QUIMDIAGUAS =

- (1) Instalador

→ PERSONAL SUPERVISIÓN =

- (1) Ingeniero Civil

• Clima = Soleado
• EQUIPOS = Herramienta electrica y manual
• ACTIVIDADES =

- Excavación para tubería electrica
- Demolicion manual muro
- Corte y aplicacion Sikaflex para junta fria cuarto de maquinas y tanque de almacenamiento

Powered by CamScanner

- Estuco y pintura fachada, cielo raso y muros
- Instalacion de rejas para ventanas y marcos para puertas
- Instalacion equipo de presion y red contra incendios.

• VIERNES 27 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO JCB =
- (1) Residente de obra
- (1) Oficial
- (1) Almacenista
- (2) Ayudantes
- (1) SST

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (2) Pintores

PERSONAL SANDOVAL C =
- (1) Armador

PERSONAL SUPERVISIÓN =
- (1) Ingeniero Civil

• Clima = Nublado
• EQUIPOS = - Herramienta menor y electrica.
• ACTIVIDADES =
- Se continua con corte y aplicacion de sikaflex para junta fria Cuarto de maquinas y tanque de almacenamiento.
- Aseo general
- Estuco y Pintura muros, fachada y cielo raso

• SABADO 28 JUNIO 2025

PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Residente de obra
- (1) Oficial
- (1) Almacenista
- (1) Ayudante
- (1) SST

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (3) Pintores
- (1) Oficial estructura liviana

Powered by CamScanner

PERSONAL SUPERVISIÓN -
- (1) Ingeniero Civil

• CLIMA= Soleado
• EQUPOS = Herramienta electrica y menor
• ACTIVIDADES=
- Se continua con Aseo General
- Se continua con detalles finales
- Se continua con pintura de muros, fachada y cielo raso
- Se continua con detalles finales de estructura liviana.

• LUNES 30 DE JUNIO 2025
PERSONAL CONSORCIO =
- (1) Arquitecto Residente
- (1) Profesional SST

PERSONAL EDQ Electricos DEL QUINDIO =
- (1) Electrico.

•Clima=Soleado
• EQUIPOS= Herramienta menor y pulidora
• ACTIVIDADES=
- Se realiza Finalización de Vestimiento de Poste

• MARTES 01 DE JULIO 2025
PERSONAL CONSORCIO JCB =
- (1) Arquitecto Residente
- (1) Ingeniero Apoyo
- (1) Almacenista
- (1) SST
- (1) Oficial
- (2) Ayudantes

PERSONAL EDILBERTO PEREZ =
- (1) Pintor

Powered by CamScanner
