INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-006-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Y EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TENDRÁ POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA



Presentado Por:
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA - CÓRDOBA
Secretario de Infraestructura
Ing. Carlos David Peinado Cálao

PERIODO: 19 de diciembre de 2024 al 18 enero de 2025

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

ALCALDÍA SANTA CRUZ DE LORICA

TABLA DE CONTENIDO

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2.INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 5
3.INFORMACION CONTRATACION DERIVADA 5
4.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PROYECTO 6
4.1. CANTIDADES INICIALES DEL PROYECTO 7
4.2. CANTIDADES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO 8
5.SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 8
5.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN 8
5.2. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 9
6.SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 9
6.1. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN 9
6.2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO 9
7.SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO 9
7.1. GESTIÓN TÉCNICA DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 9
7.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO 9
8.FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO 10
9.CONCLUSIONES 10
10.ANEXOS 10
11.SUPERVISOR MUNICIPIO 10

Calle 1 Bis 17 54
Edificio González
Tel. PBX (57+4) 789 2998
E mail: infraestructura@santacruzdelorica-cordoba.gov.co

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


El proyecto denominado **CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA**, identificado bajo el número de registro BPIN 2024234170039, contribuye a la política pública de los planes de desarrollo nacional COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, Infraestructura red vial regional y departamental CÓRDOBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL, así como el plan de desarrollo municipal 2024-2027 TODOS SOMOS LORICA, línea estratégica: Todo por el ordenamiento del territorio sostenible; en el sector: Transporte y vías y el subprograma Infraestructura red vial, el cual tiene como objetivo principal proveer la infraestructura de la red vial Municipal para contribuir a la conectividad interna y regional.

En la actualidad dentro del municipio se presentan dificultades de movilidad en el tránsito vehicular, generando un bajo nivel de servicio en las vías urbanas, medido a través de la baja calidad del flujo vehicular, percibido por los usuarios de los vehículos de transporte y/o pasajeros.

Esta alternativa permitirá que se realice una inversión equitativa de los recursos públicos que contribuya al mejoramiento de la intercomunicación terrestre beneficiando a más de 50,000 personas distribuidos en los barrios de San Carlos, 6 de enero y Bajo Kennedy, zona urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba.


Para la ejecución del proyecto se suscribió el Convenio Interadministrativo SI-006-2024 entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Santa Cruz de Lorica.

BARRIOS BENEFICIADOS:	San Carlos y 6 de Enero

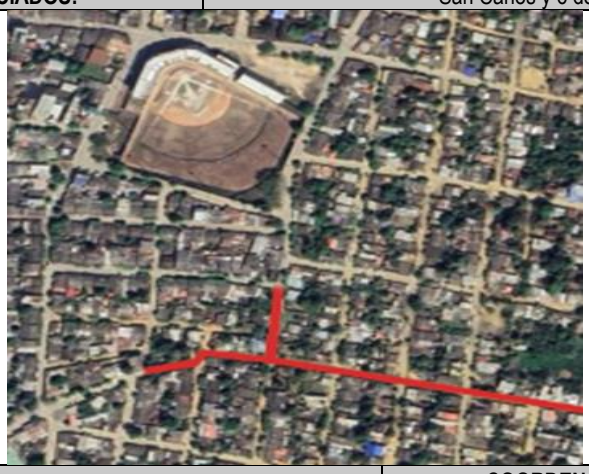

TRAMO	BARRIO	DIRECCIÓN	COORDENADAS		LONGITUD ML
			INICIAL	FINAL	
A-1	SAN CARLOS	CLL 17 ENTRE KR 30 Y KR 31A	75°48'36.11"W 9°14'15.02"N	75°48'34.36"W 9°14'15.49"N	41
A-2	SAN CARLOS	KR 31ª ENTRE CLL 17ª Y CLL 17C	75°48'34.24"W 9°14'15.27"N	75°48'34.18"W 9°14'15.93"N	24
A-3	6 DE ENERO	CLL 17ª ENTRE KR31A Y KR17	75°48'34.36"W 9°14'15.72"N	75°48'22.61"W 9°14'13.48"N	358
A-4	SAN CARLOS	KR 32 ENTRE CLL 17ª Y CALLE 17D	75°48'32.71"W 9°14'15.64"N	75°48'32.47"W 9°14'17.87"N	67,93
				TOTAL APROX.	**490,93**

BARRIOS BENEFICIADOS:	Kennedy

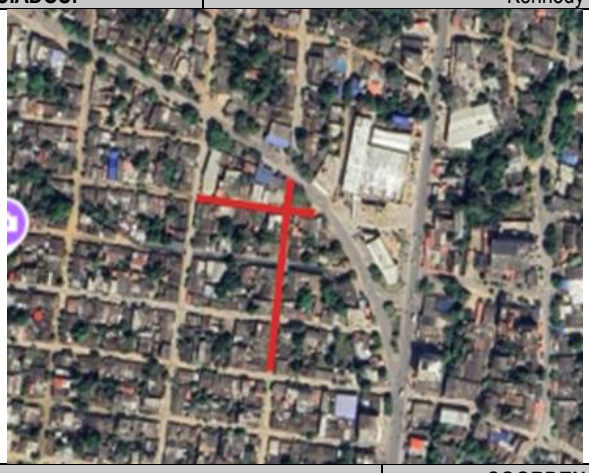

TRAMO	BARRIO	DIRECCIÓN	COORDENADAS		LONGITUD ML
			INICIAL	FINAL	
A-7	KENNEDY	KR 21 ENTRE RUTA 9003 Y CALLE 17	75°48'52.33"W 9°14'20.92"N	75°48'53.02"W 9°14'15.30"N	165,82
A-8	KENNEDY	CALLE 18ª ENTRE RUTA 9003 Y CARRERA 20	75°48'51.38"W 9°14'19.98"N	75°48'55.27"W 9°14'20.22"N	112,50
				TOTAL APROX.	**278,32**

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Y EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TENDRÁ POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA"	
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO	**APORTES MUNICIPIO**	$1.908.000.000,00
	APORTES GOBERNACIÓN	$1.899.394.846,00
	TOTAL, DEL CONVENIO	$ 3.807.394.846,00
CDP	**GOBERNACIÓN**	**MUNICIPIO**
	N°729 25 de noviembre 2024	
FECHA SUSCRIPCION	Cuatro (4) de diciembre de 2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	Diecinueve (19) de diciembre de 2024	
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	Dieciocho (18) de diciembre de 2025	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	Doce (12) meses	
SUPERVISOR DEL CONVENIO	Rafael Rossi Tordecilla	
ESTADO DEL CONVENIO	**EN EJECUCIÓN**	

3. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

- **Contrato de Ejecución**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
	CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA	$3.525.365.598,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$3.525.365.598,00	
NOMBRE CONTRATISTA	No aplica. En proceso de contratación	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	No aplica. En proceso de contratación	
FECHA CESIÓN DEL CONTRATO	No aplica. En proceso de contratación	
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	No aplica. No han sido expedidos los registros presupuestales	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	No aplica. No han sido expedidos los registros presupuestales	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses	
ESTADO DEL CONTRATO	**EN REVISIÓN TECNICA**	

- **Información de Pólizas**

De acuerdo al presente informe no se han celebrado el contrato y no se cuenta con pólizas.

- **Contrato de Ejecución de Interventoría**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA".	$282.029.248,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$282.029.248,00	
NOMBRE CONTRATISTA	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	No aplica. En proceso de contratación	
FECHA CESIÓN DEL CONTRATO	No aplica. En proceso de contratación	
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	No aplica. No han sido expedidos los registros presupuestales	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	No aplica. No han sido expedidos los registros presupuestales	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses	
ESTADO DEL CONTRATO	**EN REVISIÓN TECNICA**	

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PROYECTO

Las actividades contempladas en el proyecto de mejoramiento de vías urbanas son las siguientes:

Barrio San Carlos y 6 de enero

- Construcción de pavimento: Espesor de losa (MR 41 Kg/cm2 = 4.1 MPa): 20 cm. Espesor de la Subbase Granular: 20 centímetros; CBR 30%. Espesor de la Subrasante Mejorada: 15 centímetros; CBR 20%. Ancho de Carril: 2.50 metros a 2.75 metros. Longitud de Losas: 3.00 metros a 3.50 metros, cumpliendo con todas las características exigidas por el INVIAS.

- Construcción de andenes: Sardinel achaflanado 20x50x80. Adoquín de 10x20x06 cm. Plantilla en concreto e=0,08 m, loseta táctil quia 20x20x06 cm, plantilla en concreto e=0,.08m, sub-base granular h=0.15m. bordillo confinamiento de 10x20 cm, cumpliendo con todas las características exigidas por el INVIAS.

- Construcción de rampas de acceso peatonal para personas con movilidad reducida.

- Reposición de sistema de acueducto: 490,93 metros lineales de redes de acueducto con tubería PVC de 3" y acometidas domiciliarias para cada vivienda beneficiada

Barrio Kennedy

- Construcción de pavimento: Espesor de losa (MR 41 Kg/cm'=4.1MPa): 20 cm. Espesor sub-base granular: 20 cm; CBR 30%. Espesor de la sub-rasante mejorada: 15 cm; CBR 20%. Ancho de Carril: 2.75 m a 3.00m. Longitud de losas: 3.50 m, cumpliendo con todas las características exigidas por el INVIAS.

- Construcción de andenes: Sardinel achaflanado 20x50x80. Adoquín de 10x20x06 cm. Plantilla en concreto e=0,08 m, loseta táctil quia 20x20x06 cm, plantilla en concreto e=0,.08m, sub-base granular h=0.15m. bordillo confinamiento de 10x20 cm, cumpliendo con todas las características exigidas por el INVIAS.

- Construcción de rampas de acceso peatonal para personas con movilidad reducida.

- Reposición de sistema de acueducto: 165,82 metros lineales de redes de acueducto con tubería PVC de 3" y acometidas domiciliarias para cada vivienda beneficiada.

4.1. CANTIDADES INICIALES DEL PROYECTO

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	3.985,41
1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y CUNETAS	M3	132,82
1.03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES INCLUYE RETIRO	M3	3.810,28
1.04	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	1.190,59
1.05	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-41.	M3	875,48
1.06	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	28.188,44
1.07	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CRUDO DE CANTERA	M3	985,27
1.08	SARDINEL TIPO ACHAFLANADO TIPO IDU A=50-B=20 L=80, PREFABRICADO	M	1.461,58
1.09	BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, SOLADO (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES Y VIGAS)	M2	426,93
1.10	BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0,10 M, H=0.2	M	1.346,19
1.11	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ESPESOR 8 CM, INCLUYE LINEA DE DEMARCACIÓN VISUAL EN ADOQUIN AMARILLO DE 0.1 X 0.2 X 0.06 M Y FRANJA EN LOSETA TACTIL GUIA DE COLOR AMARILLO DE 0,2 X 0,2 X 0,06 M, INCLUYE RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR Y RAMPAS PARA PMR	M2	1.480,81
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METÁLICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS	UNIDAD	90,00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC NOVAFORT DIAMETRO 200 MM	M	278,32
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOMICIALIARIA DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC DE 6" NOVAFORT	UNIDAD	51,00

1.15	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN, PROFUNDIDAD ≤ 2 M, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	M3	225,81
1.16	REALCE DE MANHOL	UNIDAD	10,00
1.17	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD. INCLUYE RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	M3	420,32
1.18	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	396,92
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC Ø 3" RDE 21	ML	656,75
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA (INCLUYE TUBERIA PF+UAD, COLLAR DE DERIVACION Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO HASTA 6,5 ML	UNIDAD	108,00
1.21	EMPALME DE RED EXISTENTE A TUBERIA PROYECTADA DE PVC 3" Y 4" RDE 21"	UNIDAD	21,00
1.22	RELLENO CON ARENA PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	M3	175,54
1.23	POZO DE INSPECCIÓN H≤2.0 M DE PROFUNDIDAD Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1.2 M EN CONCRETO DE 28 MPA IMPERMEABILIZADO, INCLUYE TAPA Y HERRAJES	UNIDAD	3,00
1.24	POZO DE INSPECCIÓN 2.0<H≤4.0 M DE PROFUNDIDAD Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1.2 M EN CONCRETO DE 28 MPA IMPERMEABILIZADO, INCLUYE TAPA Y HERRAJES	UNIDAD	2,00
1.25	ENTIBADO TEMPORAL PARA EXCAVACIONES DE ALCANTARILLADO MAYORES A 1.5 M DE PROFUNDIDAD (4 USOS)	M2	376,10
1.26	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES EN FALLOS (NT-2500)	M2	2.266,38
1.27	RELLENO CON PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	955,70
1.28	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS DE TERRAZAS EXISTENTES	ML	324,90
1.29	SEÑAL SR-01 COMPLETA KIT POSTE, TORNILLOS, TUERCAS, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CM, CALIBRE 16, DUPLEX, REFLECTIVA	UNIDAD	23,00
1.30	SEÑAL SR-30B COMPLETA KIT POSTE, TORNILLOS, TUERCAS, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CM, CALIBRE 16, DUPLEX, REFLECTIVA	UNIDAD	2,00

4.2. CANTIDADES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO

De acuerdo al presente informe no se han realizado actualizaciones de cantidades.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

5.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN

La labor de la supervisión al convenio, desde el punto de vista administrativo, consistió en:

1. Para el presente proyecto se adelanta proceso de contratación de contrato de obra e interventoría, toda vez que en los proyectos de pavimento se requieren revisiones y estudios previos que deben cumplir con los términos y condiciones indispensables para llevar a cabo la realización del proyecto en mención.

5.2. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

El CONVENIO SI-006-2024, durante el periodo del presente informe, se encuentra como sigue:

- Se firmó el convenio interadministrativo no. SI-006-2024 entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Santa Cruz de Lorica el 4 de diciembre de 2024.

- El municipio de Santa Cruz de Lorica firmó Acta de inicio con la Gobernación del departamento de Córdoba el día 19 de diciembre de 2024.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

6.1. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Dentro del periodo del informe no se han realizado acciones financieras al contrato.

6.2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO

A la fecha del presente informe no se han realizado acciones financieras al convenio.

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO

7.1. GESTIÓN TÉCNICA DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

La labor de la supervisión, desde el punto de vista técnico, consistió en:

- Revisar la documentación necesaria para suscripción de convenio y la firma del acta de inicio.

- Revisar el avance del proceso para firma de acta de inicio del contrato del ejecutor.

7.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Durante este periodo no se ha dado inicio a la ejecución de las actividades.

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO:											
MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
8.3%											

INFORME no.	1
AVANCE EJECUTADO:	0.00%
AVANCE EN TIEMPO:	30 DÍAS
ESTADO CONVENIO:	EN EJECUCIÓN
ESTADO CONTRATO:	EN PERFECCIONAMIENTO

8. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO

No se realizaron visitas al terreno en este periodo.

9. CONCLUSIONES

- Se firmó el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-006-2024 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Y EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE TENDRÁ POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA"

- Se adelanta proceso de contratación de contrato de obra e interventoría, toda vez que en los proyectos de pavimento se requieren revisiones y estudios previos que deben cumplir con los términos y condiciones indispensables para llevar a cabo la realización del proyecto en mención.

- Se firmó acta de inicio CONVENIO SI-006-2024 el día 19 de diciembre de 2024.

- Durante este periodo no se ha dado inicio a la ejecución de las actividades.

10. ANEXOS

- Extracto bancario de enero 2025
- Informe financiero enero 2025

11. SUPERVISOR MUNICIPIO

CARLOS DAVID PEINADO CALAO
SUPERVISOR DEL CONVENIO

Firmado a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2025
