ANEXO III

INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA

Calle 9 No. 3-50 Edif. Megacentro Oficina 228 Neiva - Huila
Email: construmacingenirossas@gmail.com
Teléfonos: 3203546767-3138113711

32

INFORME DE OBRA

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 1439 DE 2024

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL NERISASA

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. **3**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO **4**

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4

1.1.1. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA *4*

1.1.2. ALCANCE DEL CONTRATO *5*

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1439 DE 2024 ..... **9**

2.1. CUADRO DE TRAZABILIDAD 9

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO **10**

3.1. CONTROL DE POLIZAS APROBADAS DEL CONTRATO 10

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO **12**

4.1. INFORMACION DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA 12

4.2. BALANCE FINANCIERO INDICANDO ANTICIPOS, PARCIALES Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPO DE OBRA 12

4.3. ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA 12

5. INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO. **13**

5.01 GRAFICO DE AVANCE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS 13

5.02 CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO 14

5.03 CUADRO RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO 17

5.04 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 17

6. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO **20**

7. INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO **20**

7.01. CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 20

7.02. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 20

8. INCONVENIENTES EN OBRA **20**

9. CONCLUSIONES **36**

INTRODUCCIÓN.

El objetivo del presente informe es dar a conocer, el avance correspondiente al periodo de trabajo del 1 mayo hasta el 31 mayo de 2025, del contrato obra que tiene como objeto (MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA)

Por lo anterior, este tiene como finalidad registrar la información, los procedimientos ejecutados en obra y documentación generada dentro del desarrollo de las actividades del proyecto en mención para el presente periodo; A continuación, se registra un resumen de las actividades desarrolladas, incluyendo los siguientes aspectos: Información General, Aspectos Financieros, Aspectos Técnicos y Económicos y Aspectos Administrativos., Para finalizar se darán las conclusiones que correspondan en los diferentes campos y se relacionarán los anexos que se requieran para soportar la información suministrada.

El Contrato de Obra No. 1439 de 2024, el cual tiene por objeto (MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA) con acta de inicio de obra para el desarrollo de las actividades el día veintiuno (21) de octubre de 2024.

Durante este periodo se intervino el frente del municipio de Neiva y Rivera departamento del Huila.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1.1. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proyecto tiene contemplado desarrollarse en el municipio de Neiva-Rivera-Santa María- Saladoblanco departamento del Huila



Imagen 1. Localización del departamento del Huila

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/huila. Fuente: Imagen Satelital Google Maps.

1.1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO, Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA					
Santa María					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	152.38	$ 5,656.92	$ 862,001.47
2	Demolición de pavimento rígido, 10cm < e < 25cm, incluye cargue y retiro de escombros	M3	124.97	$ 146,339.20	$18,288,009.82
Subtotal					**$19,150,011.29**
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				
3	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	152.38	$ 17,544.16	$ 2,673,379.10
4	Conformación y compactación de la subrasante	M2	803.81	$ 4,512.00	$ 3,626,790.72
Subtotal					**$ 6,300,169.82**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
5	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	120.56	$ 313,664.84	$37,815,433.11
6	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	144.68	$ 947,423.18	$137,073,185.68
7	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	216.28	$ 11,318.54	$ 2,447,973.83
8	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	763.78	$ 11,080.72	$ 8,463,232.32
9	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	205.50	$ 77,847.04	$15,997,566.72
10	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	3.00	$ 1,407,765.62	$ 4,223,296.86
Subtotal					**$206,020,688.53**
	SEÑALIZACION				
12	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	8.00	$ 574,308.04	$ 4,594,464.32
13	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	401.19	$ 3,728.98	$ 1,496,029.49
Subtotal					**$ 6,090,493.81**
Rivera					

	PRELIMINARES				
1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	82.43	$ 5,656.92	$ 466,299.92
Subtotal					**$ 466,299.92**
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	164.43	$ 17,544.16	$ 2,884,786.23
3	Conformación y compactación de la subrasante	M2	412.15	$ 3,810.76	$ 1,570,604.73
Subtotal					**$ 4,455,390.96**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
4	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	61.82	$ 243,655.52	$15,062,784.25
5	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano	M3	74.18	$ 882,783.14	$65,484,853.33
6	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	174.04	$ 11,318.54	$ 1,969,878.70
7	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	587.37	$ 11,080.72	$ 6,508,482.51
8	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	164.86	$ 77,039.58	$12,700,745.16
9	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y recuperacion y colocación marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	1.00	$1,330,756.12	$ 1,330,756.12
Subtotal					**$103,057,500.06**
	SEÑALIZACION				
11	Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste en angulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	4.00	$ 574,308.04	$ 2,297,232.16
12	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	277.29	$ 4,196.16	$ 1,163,553.21
Subtotal					**$ 3,460,785.37**
Saladoblanco					
	PRELIMINARES				
1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	510.81	$ 5,656.92	$ 2,889,611.31
Subtotal					**$ 2,889,611.31**
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	1150.54	$ 17,544.16	$20,185,257.85
3	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2724.44	$ 4,634.20	$12,625,599.85
Subtotal					**$32,810,857.69**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
4	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	408.65	$ 502,221.32	$205,232,742.42

5	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	487.32	$ 974,246.08	$474,769,599.71
6	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	1077.23	$ 11,318.54	$12,192,670.84
7	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	3604.14	$ 11,080.72	$39,936,466.18
8	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	1021.62	$ 78,111.18	$79,799,943.71
9	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	3.00	$1,451,455.88	$ 4,354,367.64
10	Reposición de sumidero de 1.00mx0.80m fundido en sitio incluye rejilla metálica	UND	2.00	$1,400,145.04	$ 2,800,290.08
Subtotal					**$819,086,080.58**
	SEÑALIZACION				
11	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste en angulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	16.00	$ 575,093.88	$ 9,201,502.08
12	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	1688.43	$ 4,196.16	$ 7,084,922.43
Subtotal					**$16,286,424.51**
Neiva					
	PRELIMINARES				
1	Localización, trazado y replanteo de vías.	M	500.99	$ 5,656.92	$ 2,834,060.35
2	Demolición de pavimento rígido, 10cm < e < 25cm, incluye cargue y retiro de escombros	M3	376.61	$ 146,339.20	$55,112,806.11
Subtotal					**$57,946,866.46**
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				
3	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	1404.27	$ 17,544.16	$24,636,737.56
4	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3172.44	$ 3,433.82	$10,893,587.92
Subtotal					**$35,530,325.48**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
5	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	475.07	$ 205,860.94	$97,798,356.77
6	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano	M3	565.26	$ 878,315.32	$496,476,517.78
7	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	1055.27	$ 11,318.54	$11,944,115.71
8	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	3573.00	$ 11,080.72	$39,591,412.56
9	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	1002.01	$ 76,603.42	$76,757,392.87

10	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	6.00	$1,347,302.00	$ 8,083,812.00
11	Reposición de sumidero de 1.00mx0.80m fundido en sitio incluye rejilla metálica	UND	2.00	$1,349,512.88	$ 2,699,025.76
Subtotal					**$733,350,633.45**
	SEÑALIZACION				
12	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste en ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	20.00	$574,784.62	$11,495,692.40
13	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	1691.58	$ 4,196.16	$ 7,098,140.33
				Subtotal	**$18,593,832.73**
				SUBTOTAL OBRAS PROYECTO CONSOLIDADO (AIU Incluido)	**$2,065,495,971.97**
				PAGA	**$19,628,000.00**
				PMT	**$20,142,781.30**
				COSTO TOTAL OBRA	**$2,105,266,753.27**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1439 DE 2024

2.1. CUADRO DE TRAZABILIDAD

CONTRATO DE OBRA N°	1439 DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA**
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL NERISASA
NIT.	NIT 901.854.702-5
REPRESENTANTE LEGAL	CATHERINE CASTILLA CASTILLO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 2.105.266.753,27**
ADICIONAL	**$**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 2.105.266.753,27**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE INICIO
INTERVENTORÍA	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
NIT.	NIT 900.116.571
REPRESENTANTE LEGAL	DANIELA CARRILLO TAVERA
ACTA DE INICIO	21 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 DE MARZO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No 1	14 DE ENERO DE 2025
ACTA DE REINCIO No 1	10 DE ABRIL DE 2025
PRÓRROGA No. 01	N/A

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

3.1. CONTROL DE POLIZAS APROBADAS DEL CONTRATO

POLIZA SEGÚN CONTRATO:

Póliza De Cumplimiento -ANEXO 0
Fecha de expedición: 20/09/2024

PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
N° 61-44-101055700			
DESCRIPCIÓN	**Desde**	**Hasta**	**Suma Asegurada**
Cumplimiento	16/09/2024	16/08/2025	$ 421.053.352
Buen manejo del anticipo	16/09/2024	16/08/2025	$ 631.580.028
Prestaciones sociales	16/09/2024	16/08/2025	$ 210.526.676
Estabilidad de la obra	5 AÑOS		$ 421.053.352

Póliza De responsabilidad civil -ANEXO 0 – Fecha de expedición: 20/09/2024

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
N° 61-40-101020252			
DESCRIPCIÓN	**Limite por evento**	**Limite por vigencia**	**Suma Asegurada**
Amparo básico – Predios, Labores y operaciones	16/09/2024	16/02/2025	$ 390.000.000
Contratistas y subcontratista	16/09/2024	16/02/2025	$ 390.000.000
Vehículos propios y no propios	16/09/2024	16/02/2025	$ 390.000.000

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO:

Póliza De Cumplimiento -ANEXO 2
Fecha de expedición: 23/10/2024

PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
N° 61-44-101055700			
DESCRIPCIÓN	**Desde**	**Hasta**	**Suma Asegurada**
Cumplimiento	21/10/2024	20/09/2024	$ 421.053.352

Buen manejo del anticipo	21/10/2024	20/09/2024	$ 631.580.028
Prestaciones sociales	21/10/2024	20/09/2024	$ 210.526.676
Estabilidad de la obra	5 AÑOS		$ 421.053.352

Póliza De responsabilidad civil -ANEXO 2 Fecha de expedición: 23/10/2024

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
N° 61-40-101020252			
DESCRIPCIÓN	**Limite por evento**	**Limite por vigencia**	**Suma Asegurada**
Amparo básico – Predios, Labores y operaciones	21/10/2024	23/03/2025	$ 390.000.000
Contratistas y subcontratista	21/10/2024	23/03/2025	$ 390.000.000
Vehículos propios y no propios	21/10/2024	23/03/2025	$ 390.000.000

POLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No 1:

Póliza De Cumplimiento -ANEXO 3
Fecha de expedición: 23/04/2025

PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
N° 61-44-101055700			
DESCRIPCIÓN	**Desde**	**Hasta**	**Suma Asegurada**
Cumplimiento	21/10/2024	18/01/2026	$ 421.053.352
Buen manejo del anticipo	21/10/2024	18/01/2026	$ 631.580.028
Prestaciones sociales	21/10/2024	18/07/2028	$ 210.526.676
Estabilidad de la obra	5 AÑOS		$ 421.053.352

Póliza De responsabilidad civil -ANEXO 3 Fecha de expedición: 23/04/2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
N° 61-40-101020252			
DESCRIPCIÓN	**Limite por evento**	**Limite por vigencia**	**Suma Asegurada**
Amparo básico – Predios, Labores y operaciones	21/10/2024	18/06/2025	$ 390.000.000
Contratistas y subcontratista	21/10/2024	18/06/2025	$ 390.000.000
Vehículos propios y no propios	21/10/2024	18/06/2025	$ 390.000.000

Póliza De responsabilidad civil -ANEXO 4 Fecha de expedición: 05/05/2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
N° 61-40-101020252			
DESCRIPCIÓN	**Limite por evento**	**Limite por vigencia**	**Suma Asegurada**
Amparo básico – Predios, Labores y operaciones	21/10/2024	18/06/2025	$ 427.050.000
Contratistas y subcontratista	21/10/2024	18/06/2025	$ 427.050.000
Vehículos propios y no propios	21/10/2024	18/06/2025	$ 427.050.000

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO


4.1. INFORMACION DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
ANTICIPO	05/11/2024			**$ 631,580,025.98**
ACTA PARCIAL No 1	7/12/2024	$ 469,174,363.93	$ 140,752,309	$ 328,422,055
TOTALES		$ 469,174,363.93	$ 140,752,309	
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 2,105,266,753.27		$ 2,105,266,753.27	$ 896.667.616,96	$ 1.208.599.136,36

5. INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO.

5.01 GRAFICO DE AVANCE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS.

Hasta la fecha del corte del período del informe, el proyecto ha alcanzado un avance acumulado del 42.59%.

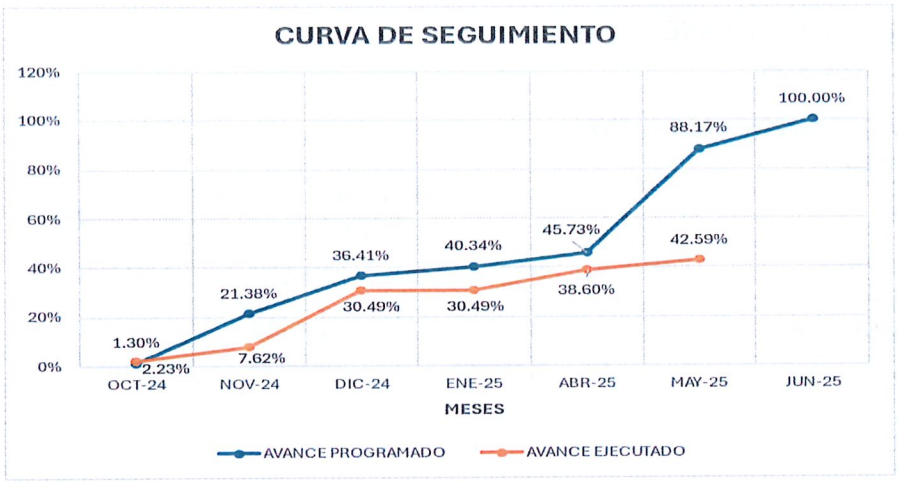

5.02 CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA: 42.59%

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MAYO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
SANTA MARÍA											
	PRELIMINARES										
3,1,1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	152.38	$ 5,656.92	$ 862,001.47	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3,1,2	Demolición de pavimento rígido, 10cm < e < 25cm, incluye cargue y retiro de escombros	M3	124.97	$ 146,339.20	$ 18,288,009.82	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 19,150,011.29		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS										
3,2,1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	152.38	$ 17,544.16	$ 2,673,379.10	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3,2,2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	803.81	$ 4,512.00	$ 3,626,790.72	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 6,300,169.82		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
3,3,1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	120.56	$ 313,664.84	$ 37,815,433.11	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3,3,2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	144.68	$ 947,423.18	$ 137,073,185.68	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3,3,3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	216.28	$ 11,318.54	$ 2,447,973.83	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3,3,4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	763.78	$ 11,080.72	$ 8,463,232.32	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MAYO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3,3,5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	205.50	$ 77,847.04	$ 15,997,566.72	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3,3,6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	3.00	$ 1,407,765.62	$ 4,223,296.86	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 206,020,688.52		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SEÑALIZACION										
3,4,1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	8.00	$ 574,308.04	$ 4,594,464.32	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3,4,2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	401.19	$ 3,728.98	$ 1,496,029.49	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 6,090,493.81		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
RIVERA											
	PRELIMINARES										
4,1,1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	82.43	$ 5,656.92	$ 466,299.92	82.43	$ 466,299.92	0.00	$ 0.00	82.43	$ 466,299.92
					$ 466,299.92		**$ 466,299.92**		**$ 0.00**		**$ 466,299.92**
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS										
4,2,1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	164.43	$ 17,544.16	$ 2,884,786.23	163.39	$ 2,866,540.30	0.00	$ 0.00	163.39	$ 2,866,540.30
4,2,2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	412.15	$ 3,810.76	$ 1,570,604.73	404.20	$ 1,540,309.19	0.00	$ 0.00	404.20	$ 1,540,309.19
					$ 4,455,390.96		**$ 4,406,849.49**		**$ 0.00**		**$ 4,406,849.49**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
4,3,1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	61.82	$ 243,655.52	$ 15,062,784.25	60.63	$ 14,772,834.18	0.00	$ 0.00	60.63	$ 14,772,834.18

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MAYO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
4,3,2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano	M3	74.18	$ 882,783.14	$ 65,484,853.33	72.76	$ 64,227,770.13	0.00	$ 0.00	72.76	$ 64,227,770.13
4,3,3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	174.04	$ 11,318.54	$ 1,969,878.70	56.38	$ 638,139.29	0.00	$ 0.00	56.38	$ 638,139.29
4,3,4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	587.37	$ 11,080.72	$ 6,508,482.51	565.36	$ 6,264,595.86	0.00	$ 0.00	565.36	$ 6,264,595.86
4,3,5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	164.86	$ 77,039.58	$ 12,700,745.16	95.10	$ 7,326,464.06	0.00	$ 0.00	95.10	$ 7,326,464.06
4,3,6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y recuperacion y colocación marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	1.00	$ 1,330,756.12	$ 1,330,756.12	1.00	$ 1,330,756.12	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,330,756.12
					$ 103,057,500.07		**$ 94,560,559.63**		**$ 0.00**		**$ 94,560,559.63**
	SEÑALIZACION										
4,4,1	Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste en angulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	4.00	$ 574,308.04	$ 2,297,232.16	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4,4,2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	277.29	$ 4,196.16	$ 1,163,553.21	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 3,460,785.37		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
SALADOBLANCO											
	PRELIMINARES										
5,1,1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	510.81	$ 5,656.92	$ 2,889,611.31	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 2,889,611.31		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS										
5,2,1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	1150.54	$ 17,544.16	$ 20,185,257.85	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MAYO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
5,2,2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2724.44	$ 4,634.20	$ 12,625,599.85	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 32,810,857.69		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
5,3,1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	408.65	$ 502,221.32	$ 205,232,742.42	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5,3,2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	487.32	$ 974,246.08	$ 474,769,599.71	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5,3,3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	1077.23	$ 11,318.54	$ 12,192,670.84	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5,3,4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	3604.14	$ 11,080.72	$ 39,936,466.18	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5,3,5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	1021.62	$ 78,111.18	$ 79,799,943.71	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5,3,6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	3.00	$ 1,451,455.88	$ 4,354,367.64	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5,3,7	Reposición de sumidero de 1.00mx0.80m fundido en sitio incluye rejilla metálica	UND	2.00	$ 1,400,145.04	$ 2,800,290.08	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 819,086,080.58		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SEÑALIZACION										
5,4,1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste en angulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	16.00	$ 575,093.88	$ 9,201,502.08	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5,4,2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	1688.43	$ 4,196.16	$ 7,084,922.43	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 16,286,424.51		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MAYO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NEIVA											
	PRELIMINARES										
7,1,1	Localización, trazado y replanteo de vías.	M	500.99	$ 5,656.92	$ 2,834,060.35	496.15	$ 2,806,680.86	1.06	$ 5,996.34	497.21	$ 2,812,677.19
7,1,2	Demolición de pavimento rígido, 10cm < e < 25cm, incluye cargue y retiro de escombros	M3	376.61	$ 146,339.20	$ 55,112,806.11	328.33	$ 48,048,125.38	0.00	$ 0.00	328.33	$ 48,048,125.38
					$ 57,946,866.46		**$ 50,854,806.24**		**$ 5,996.34**		**$ 50,860,802.57**
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS										
7,2,1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	1404.27	$ 17,544.16	$ 24,636,737.56	958.26	$ 16,811,866.76	0.00	$ 0.00	958.26	$ 16,811,866.76
7,2,2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3172.44	$ 3,433.82	$ 10,893,587.92	3099.96	$ 10,644,704.65	7.45	$ 25,581.96	3107.41	$ 10,670,286.61
					$ 35,530,325.48		**$ 27,456,571.41**		**$ 25,581.96**		**$ 27,482,153.37**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
7,3,1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	475.07	$ 205,860.94	$ 97,798,356.77	464.99	$ 95,723,278.49	6.92	$ 1,424,557.70	471.91	$ 97,147,836.20
7,3,2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano	M3	565.26	$ 878,315.32	$ 496,476,517.78	462.00	$ 405,781,677.84	88.85	$ 78,038,316.18	550.85	$ 483,819,994.02
7,3,3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	1055.27	$ 11,318.54	$ 11,944,115.71	277.70	$ 3,143,101.97	62.27	$ 704,748.89	339.96	$ 3,847,850.86
7,3,4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	3573.00	$ 11,080.72	$ 39,591,412.56	2525.47	$ 27,984,025.94	583.45	$ 6,465,046.08	3108.92	$ 34,449,072.02
7,3,5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	1002.01	$ 76,603.42	$ 76,757,392.87	934.51	$ 71,586,662.02	0.00	$ 0.00	934.51	$ 71,586,662.02
7,3,6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	6.00	$ 1,347,302.00	$ 8,083,812.00	8.00	$ 10,778,416.00	-2.00	-$ 2,694,604.00	6.00	$ 8,083,812.00

CONSORCIO VIAL NERISASA	GESTION GERENCIA DE OBRA		
	INFORME MES DE MAYO 2025		
	Versión No: 1	Fecha: 30/12/2024	Código: INF-001

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MAYO 2025		EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
7,3,7	Reposición de sumidero de 1.00mx0.80m fundido en sitio incluye rejilla metálica	UND	2.00	$ 1,349,512.88	$ 2,699,025.76	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 733,350,633.45		**$ 614,997,162.26**		**$ 83,938,064.86**		**$ 698,935,227.12**
	SEÑALIZACION										
7,4,1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste en angulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	20.00	$ 574,784.62	$ 11,495,692.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7,4,2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	1691.58	$ 4,196.16	$ 7,098,140.33	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
					$ 18,593,832.73		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

SUBTOTAL OBRAS PROYECTO CONSOLIDADO(AIU Incluido)	**$ 2,065,495,971.97**	**$ 792,742,248.95**	**$ 83,969,643.16**	**$ 876,711,892.11**
PAGA	**$ 19,628,000.00**	**$ 9,840,188.00**	**$ 0.00**	**$ 9,840,188.00**
PMT	**$ 20,142,781.30**	**$ 10,115,536.80**	**$ 0.00**	**$ 10,115,536.80**
COSTO TOTAL OBRA	**$ 2,105,266,753.27**	**$ 812,697,973.75**	**$ 83,969,643.16**	**$ 896,667,616.91**

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	**38.60%**	**3.99%**	**42.59%**
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	**45.73%**	**42.44%**	**88.17%**
RETRASO Y/O AVANCE	**-7.13%**	**-38.45%**	**-45.58%**

5.03 CUADRO RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION	OBSERVACION
Estado actual del contrato	En ejecución
Avance ejecutado	$ 896,667,616.91
Porcentaje ejecutado	42.59%
Plazo ejecutado	137 días

5.04 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron las siguientes actividades enmarcadas en el proyecto de pavimentación:

FRENTE NEIVA

- Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano
- Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte
- Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia
- Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.

6. CONTROL DE MAQUINARIA, EQUIPO, PERSONAL Y LABORATORIOS

Según las actividades contractuales ejecutadas durante este periodo los equipos utilizados fueron los siguientes.

CANT	DESCRIPCION
2	CORTADORA DE PAVIMENTO
1	RETROEXACAVADORA
1	CANGURO
3	VOLQUETAS
1	MOTONIVELADORA
1	VIBRO COMPACTADORA
1	CARRO TANQUE

PERSONAL

En el periodo del informe y en la ejecución de actividades de obra se contó con el siguiente personal por parte del contratista de obra.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	JUAN CARLOS DÍAZ CHARRY
RESIDENTE DE OBRA	ANGIE KATHERINE MUÑOZ LOSADA
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	GERMÁN ESCOBAR MELO
ESPECIALISTA GEOTECNICA VIAL	CLAUDIA HERNANDEZ MURCIA
COORDINADOR HSEQ	MARITZA HERNANDEZ PEÑA
INSPECTOR DE OBRA	WILLIAN JAIR MUÑOZ OSORIO
INSPECTOR DE OBRA	YOAN CERQUERA DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	FRANCY VARGAS PASTRANA
CONDUCTOR	JOSE HENRY RAMÍREZ VELASCO

PERSONAL DE OBRA

CARGO	NOMBRE
OFICIAL	OSCAR IVAN GUITIERREZ
AYUDANTE	JESUS DAVID CORTES ORTIZ
AYUDANTE	ROBINSON FERNANDO LARA
AYUDANTE	GILDARDO CUBILLOS GARZÓN
AYUDANTE	SAMUEL URREA GASPAR

ESTADO DEL TIEMPO

1 DE MAYO 2025 - 30 DE MAYO 2025																														
CLIMA	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	X	X		X		X	X			X				X	X			X		X			X				X	X			
NUBLADO			X		X			X	X		X		X			X	X		X			X		X		X					X
LLUVIOSO												X									X				X				X	X	

RESULTADOS DE LABORATORIOS.

Se informa que los concretos suministrados son premezclados y los proveedores corresponden a Concremex, los resultados de laboratorios se entregarán una vez se obtengan resultados y los informes por parte del laboratorio.

7. INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO

7.01. CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El contratista CONSORCIO VIAL NERISASA ha presentado el Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA) con el fin de llevar control por parte de la Interventoría.

A fecha del presente informe no se han realizado trámites o permisos relacionados con el desarrollo de las actividades de obra propias del contrato de obra No. 1439-2024.

7.02. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.

SE Anexa informe PAGA.

8. CONCLUSIONES

- En el barrio Arismendi, sector Timanco del municipio de Neiva, se presentó una situación relacionada con la reposición de la red de acueducto, ejecutada por parte de las Empresas Públicas de Neiva. Durante el desarrollo del proyecto, y tras el relleno del terreno, las pruebas de densidad realizadas inicialmente arrojaron que no se cumplía con el porcentaje de compactación requerido, lo cual impedía la continuidad del proceso de pavimentación.

  Ante esta situación, las Empresas Públicas de Neiva procedieron con el retiro del material que no cumplía con las especificaciones y llevaron a cabo nuevamente las actividades necesarias de relleno y compactación, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos.

  Una vez subsanada la problemática, se dio continuidad al proceso de pavimentación, el cual fue ejecutado en su totalidad, completando así todas las actividades programadas en este sector.

- Se han presentado lluvias en el mes de mayo, sin embargo, se ha logrado avanzar con la ejecución de las actividades desarrolladas para los Frentes de Neiva y Rivera.

- El avance físico del contrato No. 1439 del 2024 es del 42.59% correspondiente a un valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE CON SETENTA ($ 896,667,616.91).

MARILUZ VARGAS GONZALEZ

R.L.S. CONSORCIO VIAL NERISASA
Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO









Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL

CONSORCIO VIAL NERISASA

CONTRATO DE OBRA NO. 1439 de 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

INFORME SST MENSUAL No. 6



PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025

NEIVA HUILA

CONTROL DE CAMBIOS

V.	FECHA DE REVISION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	NUMERAL DEL DOCUMENTO
Vo.	30/11/2024	Creación del Documento Informe Mensual SST.	Todo el documento

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBACIÓN CONTRATISTA	Ing. Residente Jesús Felipe Camargo Arcila	Ing. Residente Contratista	
	Ing. Maritza Andrea Hernández	Coordinadora HSEQ	

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	Ing. Daniela Carrillo Tavera	Representante Legal	

Tabla de Contenido

1. OBJETIVOS 5
1.1 objetivos generales 5
1.2 objetivo Especifico 5
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
2.2 TIPOLOGIA DE LA VIA A INTERVENIR 11
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.1 Personal SSTMA, social, maquinaria y equipos. 12
4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 13
5. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO 14
6. ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS EN EL PROYECTO. 14
7. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
7.1 Control de Personal de obra 14
7.2 Accidentes e incidentes 15
7.3 Inducción en seguridad y salud en el trabajo 15
7.2 Capacitaciones 16
7.3 Entrega de Elementos de protección Personal 17
7.4 Inspecciones Realizadas en Obra 18
7.5 Señalización frentes de trabajo de obra 19
8. CONCLUSIONES 20
ANEXOS 21

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. *Localización del proyecto* 7
Ilustración 2. *Localización del proyecto* 8
Ilustración 3. *Localización del Proyecto* 9
Ilustración 4. *Localización del Proyecto* 10
Ilustración 5. *inducción al Personal.* 15
Ilustración 6. *Riesgos en la construcción* 16
Ilustración 7. *Manejo de cargas y Hábitos Saludable.* 16
Ilustración 8. *Uso de los elementos de protección personal.* **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 9. *Entrega de Epp.* 17
Ilustración 10. *Uso adecuado de los EPP* 17
Ilustración 8. *Entrega de Epp.* ..... **¡Error! Marcador no definido.**

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. *Información de las vías a intervenir.* 11
Tabla 2. *Información general del Contrato de Obra* 12

1. OBJETIVOS

1.1 objetivos generales

- Prevenir y mitigar los posibles impactos en la Seguridad Industrial y Salud en el trabajo durante el desarrollo del proyecto, para todo el personal involucrado en el mismo.

1.2 objetivo Especifico

- Dar cumplimiento a las de las actividades establecidas en el cronograma de actividades de la gestión SST con el fin de minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores.
- Describir de manera general las actividades desarrolladas, durante el periodo.
- Dar cumplimiento a la normatividad vigente con relación a SST.
- Prevenir o minimizar los accidentes e incidentes de trabajo y/o enfermedades labores en el proyecto.
- Disminuir actos y condiciones inseguras en el desarrollo de las actividades durante el proyecto.
- Determinar los principales riesgos a treves de la relación de inspecciones en los diferentes puestos de trabajo, con el fin de implementar sistemas de control para evitar efectos nocivos en los trabajadores.
- Desarrollar actividades que permitan integrar, recrear y desarrollar física, mental y socialmente a los empleados de la empresa.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente informe reúne el seguimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, documento mediante el cual se realiza una descripción de cada una de las actividades realizadas durante el periodo, por parte del contratista y subcontratistas.


2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en las localidades mencionadas a continuación:

NEIVA es un municipio colombiano, capital del departamento de Huila. Yace entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por los ríos Las Ceibas y del Oro. Su extensión territorial de 1533 km², su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 27.7 °C.5

Su área metropolitana no constituida posee una economía muy dinámica basada en el ecoturismo, gastronomía, industria y comercio. Es una de las conurbaciones colombianas aún no oficiales, pero existentes de facto en el norte del departamento de Huila. Sus municipios satélites son Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja y Campoalegre. Tiene 488.927 habitantes.
Como capital del departamento, Neiva alberga las sedes de la Gobernación de Huila, la Asamblea Departamental, el Tribunal Administrativo de Huila, la fiscalía general, la Contraloría Departamental, la Procuraduría Regional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y otras instituciones y organismos del Estado, así como a nivel educativo superior.

Ilustración 1. *Localización del proyecto*

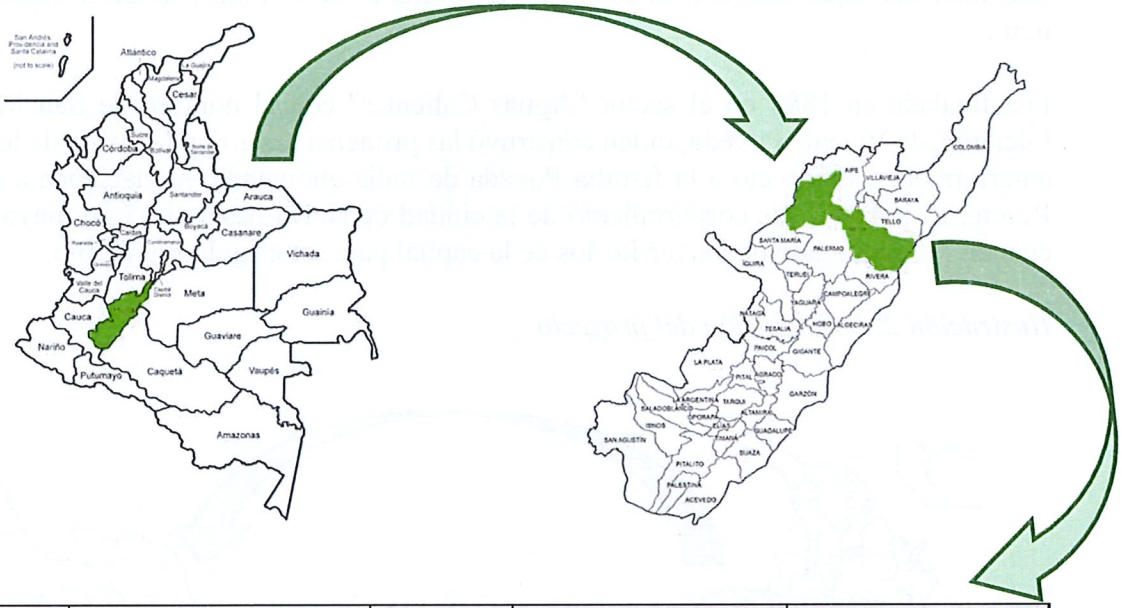


MUNICIPIO	DIRECCIÓN	LONGITUD DE DISEÑO (Metros)	COORDENADAS INICIO		COORDENADAS FIN	
			ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
NEIVA	Carrera 32 entre calle 21 y 21A - Barrio Jardín	94.906	867744.105	817225.960	867747.560	817131.060
	(L) Calle 20 sur entre Cra 31sur y 32Asur - Barrio Manzanares	126.376	867564.999	813436.4253	867675.657	813375.384
	(L) Cra 32a sur entre Calle 19bis Y 20sur Barrio Manzanares	91.930	867709.028	813456.926	867676.656	813370.888
	Carrera 24 con Calle 14Sur y 16Sur- Barrio Timanco	96.671	867127.826	813947.201	867110.424	814042.293
	Carrera 24A entre calle 46 y 45 - Barrio Villa Laurel (entrada al Barrio)	91.125	866426.576	818786.556	866471.618	818707.679

RIVERA es un municipio colombiano ubicado en el nororiente del departamento del Huila. En su territorio se encuentra aguas termales y es una de las zonas de desarrollo del departamento por su cercanía a la capital: Neiva. Es conocido como el «Municipio Verde de Colombia»

En el territorio del municipio se encuentran dos regiones diferentes: una al oriente: montañosa, perteneciente a la vertiente occidental de la cordillera oriental; la otra al occidente: plana, comprendida en el valle del río Magdalena. Hace parte de la región SubNorte del departamento. Su extensión territorial es de 404 km², su altura es de 700 m s. n. m.

Fue fundada en 1888 en el sector "Aguas Calientes" con el nombre de San Mateo, por iniciativa de Vicente Poveda, quien construyó las primeras casas con la ayuda de los vecinos anteriormente perteneció a la familia Poveda de Italia que vendió su hacienda a la familia Rivera. El poblado fue corregimiento de la ciudad de Neiva hasta el 17 de mayo de 1943, cuando fue segregado de los territorios de la capital para ser erigido municipio.

Ilustración 2. *Localización del proyecto*

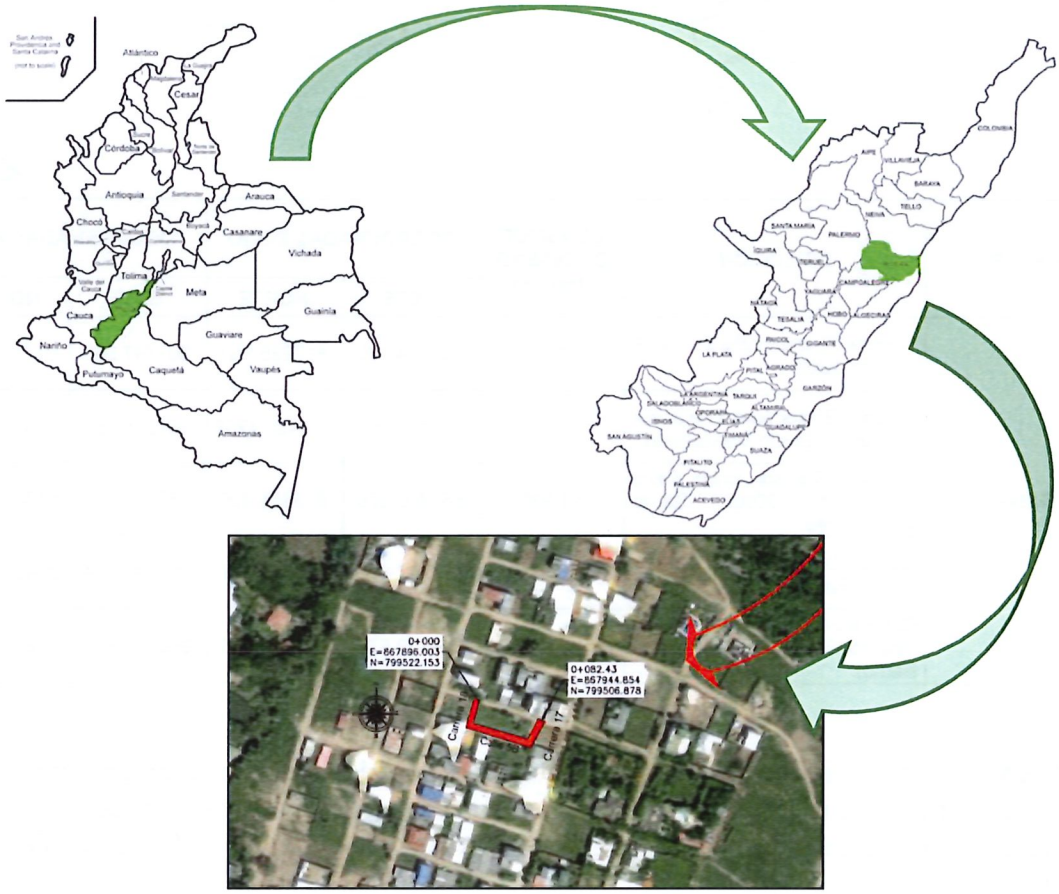

SANTA MARIA es un municipio colombiano ubicado en el noroccidente del departamento del Huila. Yace sobre las estribaciones de la cordillera central. Comprende la cuenca alta del río Baché y un sector de la cuenca alta del río Saldaña; drenando sus aguas al río Magdalena. Su extensión territorial es de 378 km², su altura es de 1320 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.5 Es conocido como Ejemplo de Organización Comunitaria.

Cuenta con una población de 11.744 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019.6 Hace parte de la región SubNorte del departamento. Tiene bajo su jurisdicción el centro poblado: San Joaquín.

Su economía se basa en el sector agrícola, destacándose la producción del café, frijol y frutales (especialmente el aguacate). Además, la extracción y comercialización minera de calizas, gravas, arenas y la manufactura de ladrillos y derivados son renglones importantes para el sector productivo del municipio.


Ilustración 3. *Localización del Proyecto*



SALADOBLANCO es un municipio colombiano localizado al suroeste del departamento del Huila. Yace sobre las ramificaciones de la cordillera central y el flanco oriental, que se define topográficamente en algunas mesetas y colinas; también en parte de las estribaciones de la serranía de las Minas. Hace parte de la región Subsur del departamento. Su extensión territorial es de 448 km², su altura es de 1316 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 22 °C.4

Cuenta con una población de 11.930 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019.5 Su economía está basada en la producción agrícola. El cultivo predominante es el café producto base que, junto a unas pequeñas producciones de otros cultivos, como la Caña de azúcar, Lulo, Plátano, Cacao, Frutales y la Ganadería. Es conocido como «Ciudad Jardín del Huila».

Ilustración 4. *Localización del Proyecto*

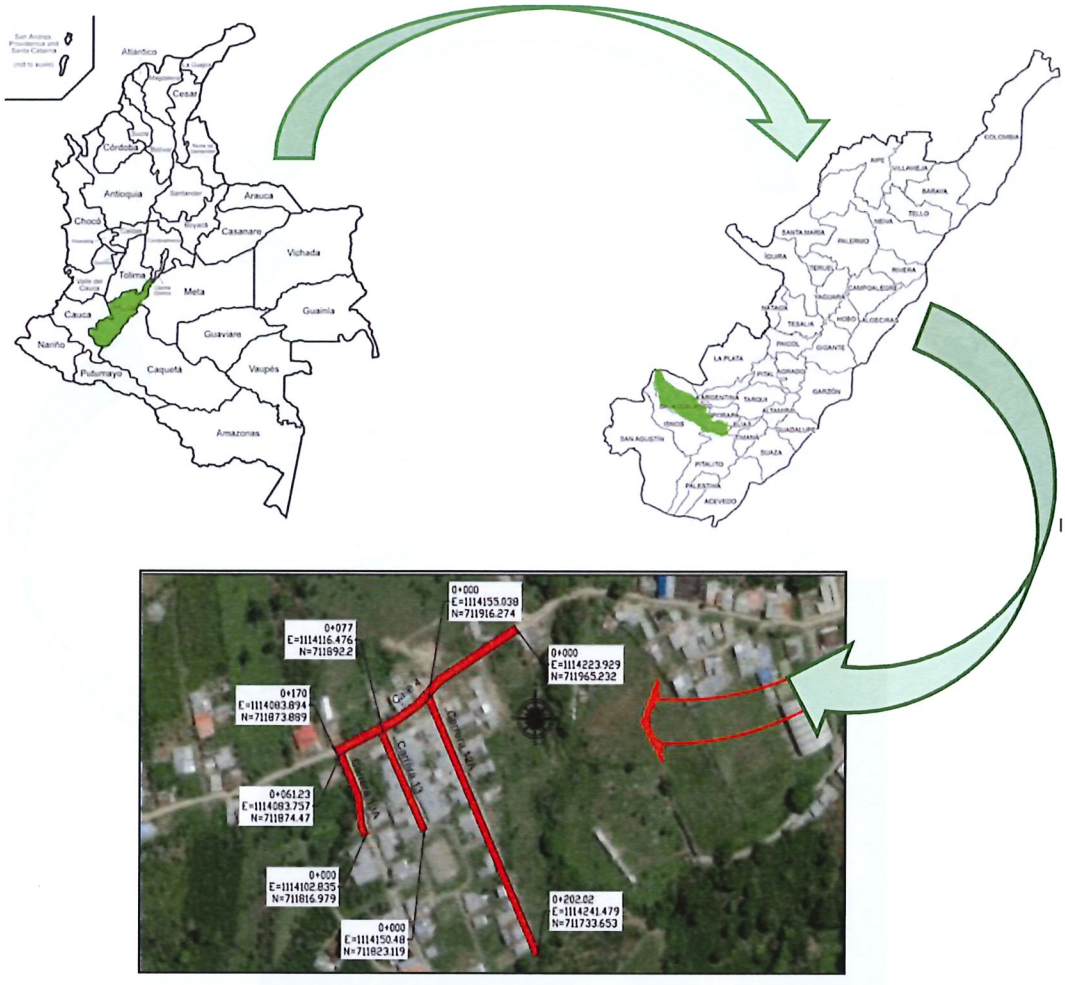

2.2 TIPOLOGIA DE LA VIA A INTERVENIR

Teniendo presente la clasificación de vías según el manual de diseño geométrico de INVIAS se determina así:
Por funcionalidad Según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nación en sus diferentes niveles, según el INVIAS se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias en el marco del sistema vial nacional. El proyecto por ubicarse en una red vial de tercer orden garantizará la comunicación entre la población de la zona urbana de los municipios de los municipios de Rivera, Neiva, Santa María y Saladoblanco.

Tabla 1. *Información de las vías a intervenir.*

VIAS URBANAS			
No.	MUNICIPIO	LONGITUD TOTAL	DIRECCION
1	NEIVA	90.906	BARRIO EL JARDIN – CRA 32 ENTRE CALLE 21 Y 21A
2		126.376	BARRIO MANZANARES CALLE 20 SUR ENTRE CALLE 19 BIS Y 20 SUR
3		91.930	BARRIO MANZANARES CRA 32A SUR ENTRE CALLE 19BIS Y 20SUR
4		96.671	BARRIO TIMANCO CRA 24 CON CALLE 14 SUR Y 16 SUR
5		91.125	BARRIO VILLA LAUREL (ENTRADA AL BARRIO) CRA 24A ENTRE 46 Y 45
6	RIVERA	82.433	BARRIO LOS ANDAQUIES CALLE 5 BIS ENTRE CRA 17 Y 18
7	SALADOBLANCO	202.020	BARRIO LA LIBERTAD CRA 12A ENTRE CLL 2 Y 4
8		77.175	BARRIO LA LIBERTAD CRA 13 CLL 3B Y 4
9		61.225	BARRIO LA LIBERTAD CRA 13A ENTRE CLL 3 Y VIA LAS MORAS
10		171.709	BARRIO LA LIBERTAD CLL 4 ENTRE CRA 12A Y VIA EL ALTO (EMPALMADO PAVIMENTACION)
11	SANTA MARIA	56.913	BARRIO EL CENTRO CRA 3 ENTRE CLL 9 Y 10
12		48.83	CLL 10 ENTRE CRA 3 Y 4

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2. *Información general del Contrato de Obra*

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO DE OBRA 1439 DE 2024	
Contratante	*GOBERNACIÓN DEL HUILA- SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA*
Contratista	*CONSORCIO VIAL NERISASA*
Objeto	***"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA."***
Representante Legal	*CATHERINE CASTILLA CASTILLO*
Valor Inicial del Contrato	DOS MIL CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($2.105.266.753,27) M/CTE AIU Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OCASIONADOS POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO INCLUIDOS
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

3.1 Personal SSTMA, social, maquinaria y equipos.

El personal requerido por el CONSORCIO VIAL NERISASA, se presenta en las siguientes tablas.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
JUAN CARLOS DIAZ CHARRY	DIRECTOR DE OBRA
JESUS FELIPE CAMARGO ARCILA	ING RESIDENTE
GERMAN ESCOBAR MELO	ESP PÁVIMENTOS
CLAUDIA NATALI HERNANDEZ MURCIA	ESP GEOTECNICA VIAL
MARITZA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	COORDINADRO HSEQ

WILLIAN JAIR MUÑOZ OSORIO	INSPECTOR DE OBRA
FRANCY LORENA VARGAS PASTRANA	AUX ADMINISTRATIVA
JOSE HENRY RAMIREZ VELASCO	CONDUCTOR
YOAN CERQUERA DIAZ	INSPECTOR DE OBRA

4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la conceptualización existente en el PAGA, este proyecto que tiene como objeto el ***"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA."*** para lo cual se hace necesario la construcción de obras en la infraestructura existente de la red vial urbana, que permitan una adecuación de la vía a los niveles del servicio requerido por el transito actual y el proyectado.

Las obras de pavimentación son de primordial importancia para preservar las condiciones físicas de las vías y evitar su deterioro prematuro por efecto del agua.

En el proyecto se mejorarán vías urbanas dentro de los cascos urbanos de los municipios relacionados en el proyecto de construcción del pavimento regido, permitirá mejorar las características de esta importante vía y, por ende, el volumen de tránsito vehicular, y de seguridad vial demandado por la población para sus necesidades de movilización. La calzada existente es la parte de la vía por donde se efectúa la circulación de los usuarios ya sea en vehículos, motocicletas, bicicletas, a caballo, a pie y por otros medios y está constituida generalmente por uno o dos carriles. Está conformada por recebo en regular estado de conservación.

5. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO

En el presente informe correspondiente al periodo N°6 etapa constructiva; comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2025 y de acuerdo con las obligaciones, y de acuerdo con las obligaciones contractuales, se desarrollaron las actividades que se asocian en el PLAN DE TRABAJO SST.

A continuación, se relacionan las actividades técnicas ejecutadas en el periodo: A continuación, se relacionan las actividades técnicas ejecutadas en el periodo:

FRENTE NEIVA

- Concreto hidráulico MR-38 - Calle 20 sur entre cra. 31 sur y 32A sur
- Suministro e instalación de acero de refuerzo - Calle 20 sur entre cra. 31 sur y 32A sur
- Suministro e instalación de barras lisas - Calle 20 sur entre cra. 31 sur y 32A sur

6. ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS EN EL PROYECTO.

Con el fin de velar por la Salud y Seguridad del proyecto, con relación a las actividades ejecutadas que se relacionan a continuación:

Con el fin de velar por la Salud y Seguridad del proyecto, con relación a las actividades ejecutadas que se relacionan a continuación:

- Afiliación al sistema de seguridad social.
- Inducción, notificación de riesgo
- Requisición mínima de EPP
- Inspecciones realizadas
- Orden y aseo

7. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1 Control de Personal de obra

Durante este periodo, se informa que el personal relacionado, se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social. (Soporte pagos de seguridad social).

7.2 Accidentes e incidentes

Durante este periodo no hubo ningún tipo de accidente e incidente durante la ejecución de la obra.

7.3 Inducción en seguridad y salud en el trabajo

Durante este periodo no se registró el ingreso de nuevo personal al proyecto, por lo tanto, no se realizaron actividades de inducción. Sin embargo, se llevaron a cabo acciones de seguimiento y control al personal presente en obra, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo el acatamiento de las políticas y objetivos del sistema, el reglamento interno, el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, la política de no alcohol, drogas y tabaco, el manejo ambiental y la notificación de riesgos. Estas acciones permitieron reforzar el compromiso con la seguridad y la prevención de incidentes durante la ejecución del proyecto.

Ilustración 5. *Control y seguimiento al Personal.*



7.2 Capacitaciones

Se les realiza capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de brindar a los trabajadores conocimientos especializados para analizar problemas, identificar sus causas, proponer soluciones, planear o adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales y así mismo evitar incidentes, accidentes en el área laboral. Para cuando se presente una emergencia se actúe de la manera preventiva y correcta. (Formatos Control y asistencia).

Ilustración 6. *Uso adecuado de los Epp*



Ilustración 7. *Ergonomía en el trabajo.*



7.3 Entrega de Elementos de protección Personal

Para el periodo del 01 al 31 de mayo del 2025 se realizó la debida entrega de elementos de protección personal al grupo de trabajo de la obra, con el objetivo de disminuir cualquier tipo de riesgo al cual este expuesto cada trabajador e indicarles cómo se porta debidamente los EPP. También reiterarle a cada uno que estos mismos reducen el riesgo de lesiones derivadas a los peligros como la exposición del polvo, las caídas y los accidentes con la maquinaria. (Formatos entrega de Elementos de protección personal).

Ilustración 8. *Entrega de Epp.*



Ilustración 9. *Entrega de Epp.*



7.4 Inspecciones Realizadas en Obra

Con el fin de dar cumplimiento al Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2025, se realizaron las siguientes inspecciones en el frente de Trabajo:

Botiquín: Se realizó inspección del botiquín, verificando el estado, fechas de vencimiento y cantidad de elementos, reponiendo los faltantes garantizando tener lo necesario en caso de ser requerido para brindar los primeros auxilios.

Camilla: Se inspeccionó la camilla, evidenciando que se encuentra en buenas condiciones para ser utilizada en el momento de prestar los primeros auxilios.

Extintor: Se llevó a cabo inspección del extintor verificando que se encuentra con su recarga adecuada, y elementos como manómetro, pasador, manija, señalización, entre otros en buenas condiciones.

Elementos de protección personal: Con el fin de monitorear el correcto uso de los EPP y ayudar así en la disminución del nivel de riesgo que implica para los trabajadores y/o visitantes estar expuestos a los peligros, se llevaron a cabo inspecciones de EPP, durante la inspección se evidenció que todo el personal en obra, cumplieron con el uso adecuado de EPP en todo momento desde el ingreso, permanencia y salida del lugar de trabajo.

Orden y aseo: En el desarrollo de las actividades de mantenimiento de vías, se implementan medidas estrictas de orden y aseo como parte integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST). Estas acciones tienen como objetivo Mantener un Ambiente de Trabajo Seguro y Limpio, Promover la Higiene y la Salud, Prevención de riesgos laborales, Cumplimiento de estándares de calidad y seguridad en obra. (Formatos Inspecciones Realizadas)

Ilustración 10. *Inspección de Botiquín*



Ilustración 11. *inspección Camilla*



Ilustración 12. *Inspección Camilla*



7.5 Señalización frentes de trabajo de obra

Se realizó en las áreas de Superficie de la zona, la señalización, demarcación y delimitación, reglamentaria, informativa y preventiva. Cumpliendo con lineamientos del PMT y SST. Se restringe el paso o ingreso de intervención de donde se está realizando el trabajo a personas particulares y/o que no estén vinculadas a nuestro personal.

Ilustración 13. *señalización Cierre de la Vía*

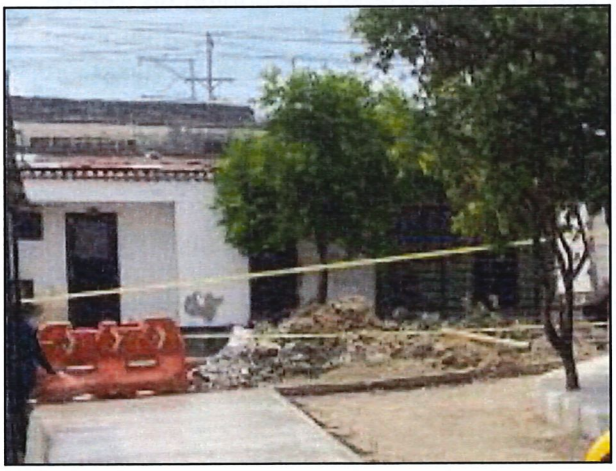


Ilustración 14. *señalización Cierre de la Vía*

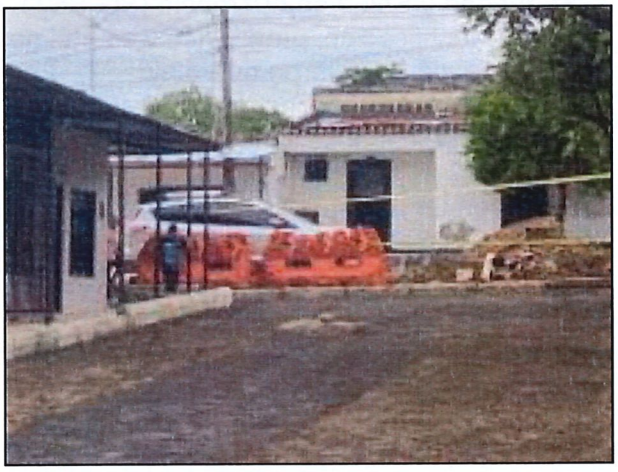


Ilustración 15. *señalización Cierre de la Vía*



Ilustración 16. *señalización Cierre de la Vía*



8. CONCLUSIONES

Durante el seguimiento realizado en la obra del Consorcio NERISASA, se evidenció el cumplimiento progresivo de las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como el compromiso del equipo de trabajo con la identificación, prevención y control de los riesgos presentes en el entorno laboral. No obstante, se detectaron oportunidades de mejora en aspectos clave como la señalización preventiva, el uso constante de elementos de protección personal y la actualización de registros de capacitaciones.

Se recomienda reforzar las jornadas de sensibilización y control, así como mantener el seguimiento periódico a las condiciones de seguridad en campo, con el fin de garantizar un entorno laboral seguro y en cumplimiento con la normativa vigente. La implementación continua de acciones correctivas y preventivas será fundamental para reducir la probabilidad de incidentes y consolidar una cultura de autocuidado en la obra.

ANEXOS

Anexo No1.

Soporte pagos de seguridad social

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854702	5	CONSORCIO VIAL NERISASA	B	0001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 N 3-50 OFICINA 412		3178696471			CONSORCIOVIALNERISASA@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33687019	E	2025-06-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	939.000	3.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	33687019	2025-06-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 83225324	CERQUERA DIAZ YOAN	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
2	CC 7694138	DIAZ CHARRY JUAN CARLOS	1.600.000	F	X	X													0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	320.000	51.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	320.000	12.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	320.000	12.800	320.000	22.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	99.100	S	5421001
3	CC 19293454	ESCOBAR MELO GERMAN	1.450.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.450.000	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.000	58.000	1.450.000	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	217.000	S	5421001
4	CC 1016032445	HERNANDEZ MURCIA CLAUDIA NATALI	1.450.000	F	X	X													0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	290.000	46.400	0	0	SANITAS-EPS005	290.000	11.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	290.000	11.600	290.000	20.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	89.800	S	5421001
5	CC 16835698	RAMIREZ VELASCO JOSE HENRY	1.423.500	F	X	X													0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	284.700	45.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	284.700	11.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	284.700	11.400	284.700	19.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	88.300	S	5421001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854702	5	CONSORCIO VIAL NERISASA	B	0001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 N 3-50 OFICINA 412		3178696471			CONSORCIOVIALNERISASA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33687019	E	2025-06-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	939.000	3.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	33687019	2025-06-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.318.200	3.768.200	3.768.200	3.768.200	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	371.000	0	1.500	0	372.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	45.600	0	200	0	45.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	51.200	0	200	0	51.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	274.200	0	1.100	0	275.300
EPS(Administradoras: 3)				5	150.800	0	700	0	151.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	69.600	0	300	0	69.900
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	11.400	0	100	0	11.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	69.800	0	300	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				5	262.500	0	1.100	0	263.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	262.500	0	1.100	0	263.600
CCF(Administradoras: 1)				5	150.800	0	600	0	151.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	5	150.800	0	600	0	151.400
Gran Total					935.100	0	3.900	0	939.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854702	5	CONSORCIO VIAL NERISASA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 N 3-50 OFICINA 412		3178696471			CONSORCIOVIALNERISASA@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33696278	E	2025-06-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.549.400	6.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33696278	2025-06-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Col.	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36311938	HERNANDEZ PEÑA MARITZA ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
2	CC 1075235704	MUÑOZ LOSADA ANGIE KATHERINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
3	CC 1075230986	MUÑOZ OSORIO WILLIAM JAIR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
4	CC 1084922528	VARGAS PASTRANA FRANCY LORENA	1.423.500	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5421001

PAGADO

5 6

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854702	5	CONSORCIO VIAL NERISASA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 N 3-50 OFICINA 412		3178696471			CONSORCIOVIALNERISASA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33696278	E	2025-06-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.549.400	6.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33696278	2025-06-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.982.250	4.982.250	4.982.250	4.982.250	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	797.300	0	3.100	0	800.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	900	0	228.700
PORVENIR	230301	800224808	8	3	569.500	0	2.200	0	571.700
EPS(Administradoras: 2)				4	199.500	0	900	0	200.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	171.000	0	700	0	171.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	28.500	0	200	0	28.700
ARP(Administradoras: 1)				4	346.900	0	1.400	0	348.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	346.900	0	1.400	0	348.300
CCF(Administradoras: 1)				4	199.500	0	800	0	200.300
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	199.500	0	800	0	200.300
Gran Total					1.543.200	0	6.200	0	1.549.400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7686396-0	OSCAR IVAN GUTIERREZ PALACIOS		carrera 39 nO. 23 - 63	8722431	oscarivan-70@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	87179348	$235.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	15.200	0		0		0	0	0	0	15.200	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	60.800	0	0	0	0	0	0		60.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	30.400	0	0	0	0	0	0		30.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	30.400	0	0	0	0	0	0		30.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	53.200				53.200	0	0	53.200			532	53.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	30.400	0	0	30.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	30.400	30.400
Pensión	3	121.600	121.600
Riesgos Laborales	1	53.200	53.200
CCF	1	30.400	30.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	235.600	235.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	7686396-0	OSCAR IVAN GUTIERREZ PALACIOS		carrera 39 nO. 23 - 63	8722431	oscarivan-70@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			HUILA	NEIVA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	87179348	$235.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	10473455702	CORTES ORTIZ JESUS DAVID	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF32	189.800	7.600	0	0	0	0	0
CC	1109244079	LARA CAVIEDES ROBINSON FERNANDO	1	0			S	X																230201	189.800	30.400	0	0	0	0	MIN002	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF32	189.800	7.600	0	0	0	0	0
CC	12258763	CUBILLOS GARZON GILDARDO	1	0			S	X																230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF32	189.800	7.600	0	0	0	0	0
CC	96361726	URREA GASPAR SAMUEL	1	0			S	X																25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS005	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF32	189.800	7.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo No 2.

Formato de control y Asistencia

CONSORCIO VIAL NERISASA	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30 min
Capacitación	X	Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		05	05	2025		OBRA
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	MARITZA ANDREA HERNANDEZ						CARGO:	ABX SST
TEMA DEL EVENTO:	USO ADECUADO DE LOS EPP							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	JESUS DAVID CORTES	1047345702	AYUDANTE	Jesus Cortez
2	ROBINSON IARA	1109244079	AYUDANTE	Robinson Iara.
3	GILDARDO CUBILLOS	12258763	OFICIAL	
4	SAMUEL URREA	96361726	AYUDANTE	Samuel Urrea.
5	OSCAR IVAN GUNTIERR	7686396	MAESTRO	Oscar Gutierrez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	Maritza Hernández

CONSORCIO VIAL NERISASA	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30 min.
Capacitación	X	Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		26	05	2025		OBRA
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	MARITZA ANDREA HERNANDEZ						CARGO:	PRO.SST
TEMA DEL EVENTO:	ERGONOMIA EN EL TRABAJO							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	JESUS DAVID CORTES	1047345702	AYUDANTE	Jesus Cortes
2	ROBINSON IARA.	1109244079.	AYUDANTE	Robinson Iara
3	GILDARDO CUBILLOS G.	12.258.763.	OFICIAL	
4	SAMUEL URREA	96361726	AYUDANTE	Samuel Urrea
5	OSCAR IBAN GUN	7686396.	MAESTRO	Oscar Gutierrez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	Maritza Hernandez
