



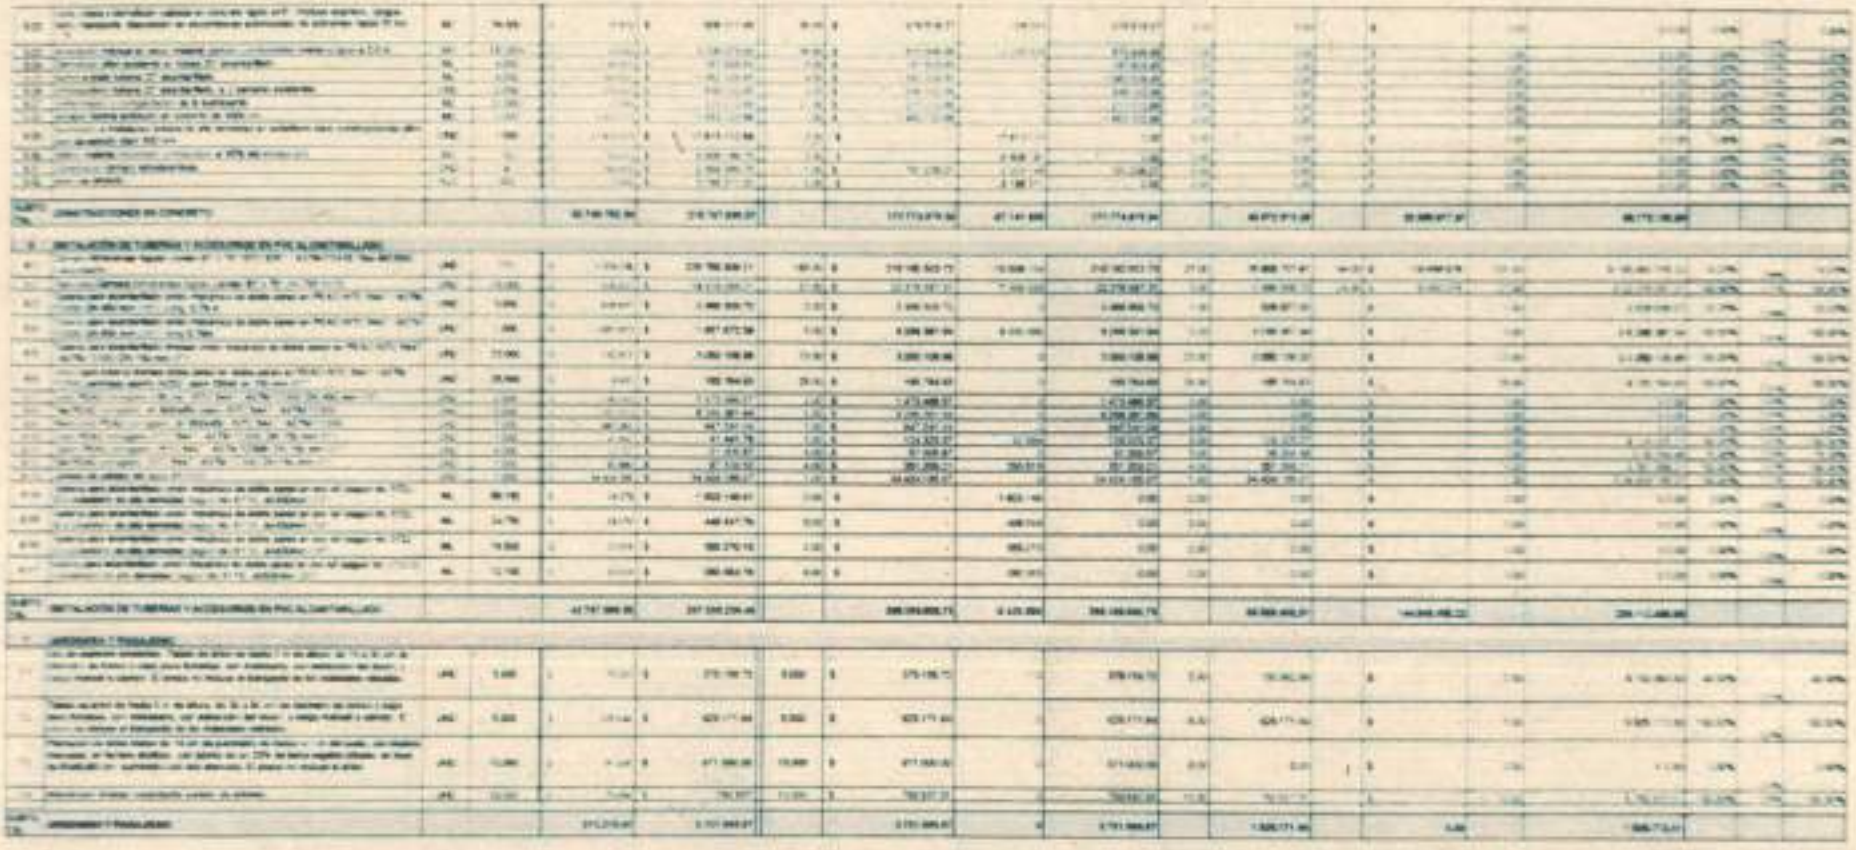

FIRMA
NOMBRE
CARGO
ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE
ISABEL PINZO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

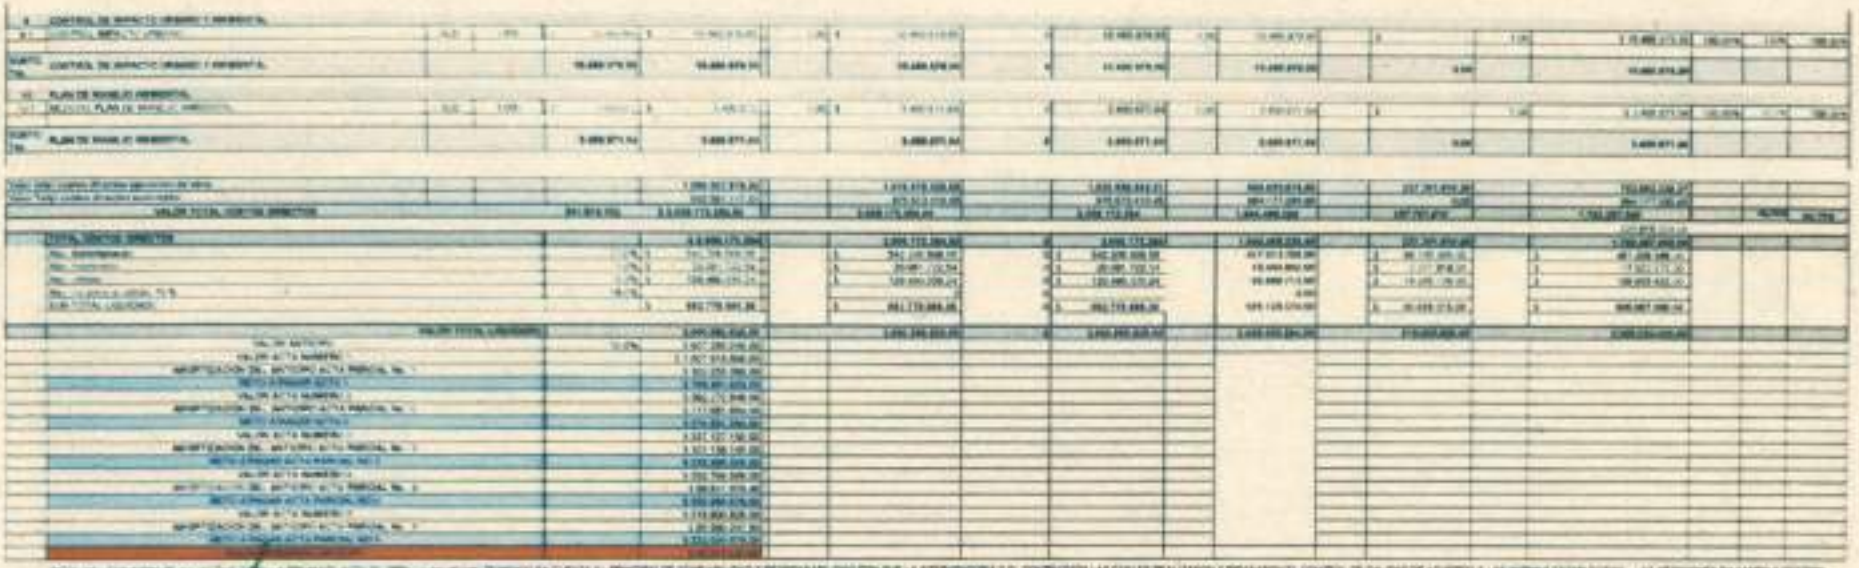


UNIDAD TERRITORIAL PAYAN
NIT: 901.130.900-1
ACTA DE CORTE DE OBRA

Código: APU-FJO-01
Versión: 1
Fecha de vigencia: Abril 2024

OBRA	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 3ª ENTRE CARRERAS 11 Y 14 URBANIZACION PAYAN, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	ACTA DE MODIFICACION No:	0
CONTRATO	CONTRATO 3990-13-PI-002-2023		
CONTRATISTA	UNIDAD TERRITORIAL PAYAN		
INTERVENTOR	GRUPO CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA PORRAS MUÑOZ	FECHA DE CORTE:	28/11/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				BALANCE DE CONTRATO				VR TOTAL HASTA			
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANTIDADES		VALORES		AVANCE ACUMUL	AVANCE ACUMUL	% CONTRATO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	(+)	(-)	CANT.	VR. UNITARIO		
1	SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA												
1.1	Cámaras HDPE, (incluye las cuidado de agua, limpieza de excedentes primarios, Tuberías de conexión)												
1.1.1	[illegible]	UNC	171	$ 4.334.136	$ 738.183.549		-1		$ 4.129.728,36	170,99	$ 732.253.626,11	14,10%	0,10%
1.1.2	[illegible]	UNC	10	$ 3.138.396	$ 40.594.731	10			$ 35.540.347,76	10,00	$ 31.240.388,11	8,10%	0,10%
1.1.3	[illegible]	UNC	6	$ 2.867.957	$ 17.207.740		-6	$ -	$ 8.603.876,70	3,00	$ 8.603.870,70	0,00%	0,10%
1.1.4	[illegible]	UNC	6	$ 6.430.971	$ 38.987.787			$ -	$ -	6,00	$ 38.987.787,16	1,00%	0,10%
1.1.5	[illegible]	UNC	20	$ 543.151	$ 10.321.349			$ -	$ -	20,00	$ 10.321.349,25	0,10%	0,10%
1.1.6	[illegible]	UND	32	$ 20.464	$ 443.729			$ -	$ -	12,00	$ 843.129,37	1,00%	0,10%
1.1.7	[illegible]	UND	1	$ 3.961.137	$ 3.961.137				$ -	1,00	$ 3.961.136,51	0,10%	0,10%
1.1.8	[illegible]	UND	5	$ 5.455.520	$ 27.276.601				$ -	5,00	$ 27.276.600,75	1,00%	0,10%
1.1.9	[illegible]	UND	1	$ 3.654.431	$ 3.654.431					1,00	$ 3.654.427,31	0,10%	0,10%
1.1.10	[illegible]	UND	1	$ 999.999	$ 999.913			$ -		1,00	$ 999.913,47	0,10%	0,10%
1.1.11	[illegible]	UNC	5	$ 54.081	$ 272.497		-1	$ -	$ 54.281,34	4,00	$ 216.125,17	0,10%	0,10%
1.1.12	[illegible]	UND	4	$ 284.340	$ 1.326.370			$ -	$ -	4,00	$ 1.136.372,12	1,00%	0,10%
1.1.13	[illegible]	UNC	1	$ 83.679.113	$ 83.679.113					1,00	$ 83.679.113,42	0,10%	0,10%
SUBTOTAL	SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA			121.746.643,51	992.830.742,94			$ -	$ 11.753.447,91		975.073.415,48		
1.2	OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponden al suministro de todos los elementos de tuberías que conectan cámaras nuevas a la red existente y se hacen con ajuste al sistema de regulación												
1.2.1	[illegible]	MA	98,780	$ 143.200	$ 12.624.402		-98,780		$ 12.634.402,14	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	[illegible]	ML	48,780	$ 164.521	$ 4.128.064		-24,78		$ 4.128.064,44	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.3	[illegible]	ML	16,000	$ 111.033	$ 2.567.929		-16,0		$ 2.567.921,64	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.4	[illegible]	ML	12,100	$ 111.066	$ 4.525.258		-12,10		$ 4.525.253,02	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponden al suministro de todos los elementos de tuberías que conectan cámaras nuevas a la red existente y se hacen con ajuste al sistema de regulación			826.790,20	33.845.343,73			0,00	-33.888.343,73		0,00		
2	PRELIMINARES												
2.1	[illegible]	UND	1.000	$ 2.965.372	$ 2.965.372					1,00	$ 2.965.372,36	0,10%	0,10%
2.2	[illegible]	UNC	2.000	$ 1.342.797	$ 2.685.593		-1		$ 1.342.797,09	1,00	$ 1.342.796,48	0,05%	0,05%
2.3	[illegible]	UNC	2.000	$ 1.953.447	$ 3.906.873		-1		$ 1.953.473,1	0,00	$ 1.953.473,1	0,00%	0,05%
2.4	[illegible]	ML	1.851.000	$ 20.000	$ 34.121.886		-1.287,0		$ 36.121.886,43	0,00	$ 0,00	0,00%	0,10%
2.5	[illegible]	UNI	1,000	$ 723.923	$ 723.923					1,00	$ 723.923,65	0,00%	0,00%
2.6	[illegible]	M2	1.851,000	$ 4.500	$ 8.917.796					1.287,00	$ 8.917.796,25	0,10%	0,10%
2.7	[illegible]	ML	200,000	$ 12.500	$ 2.544.300					200,00	$ 2.544.300,75	0,00%	0,00%
2.8	[illegible]	M2	134,246	$ 4.500	$ 638.111		-66		$ 637.230,14	68,01	$ 410.942,30	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	PRELIMINARES			7.843.950,00	63.183.850,39				$ 41.497.980,64		73.714.839,32		
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
3.1	[illegible]	M3	99,000	$ 11.500	$ 1.139.140			1	1	99,000	$ 1.134.140,75	0,00%	0,00%

Icpr.

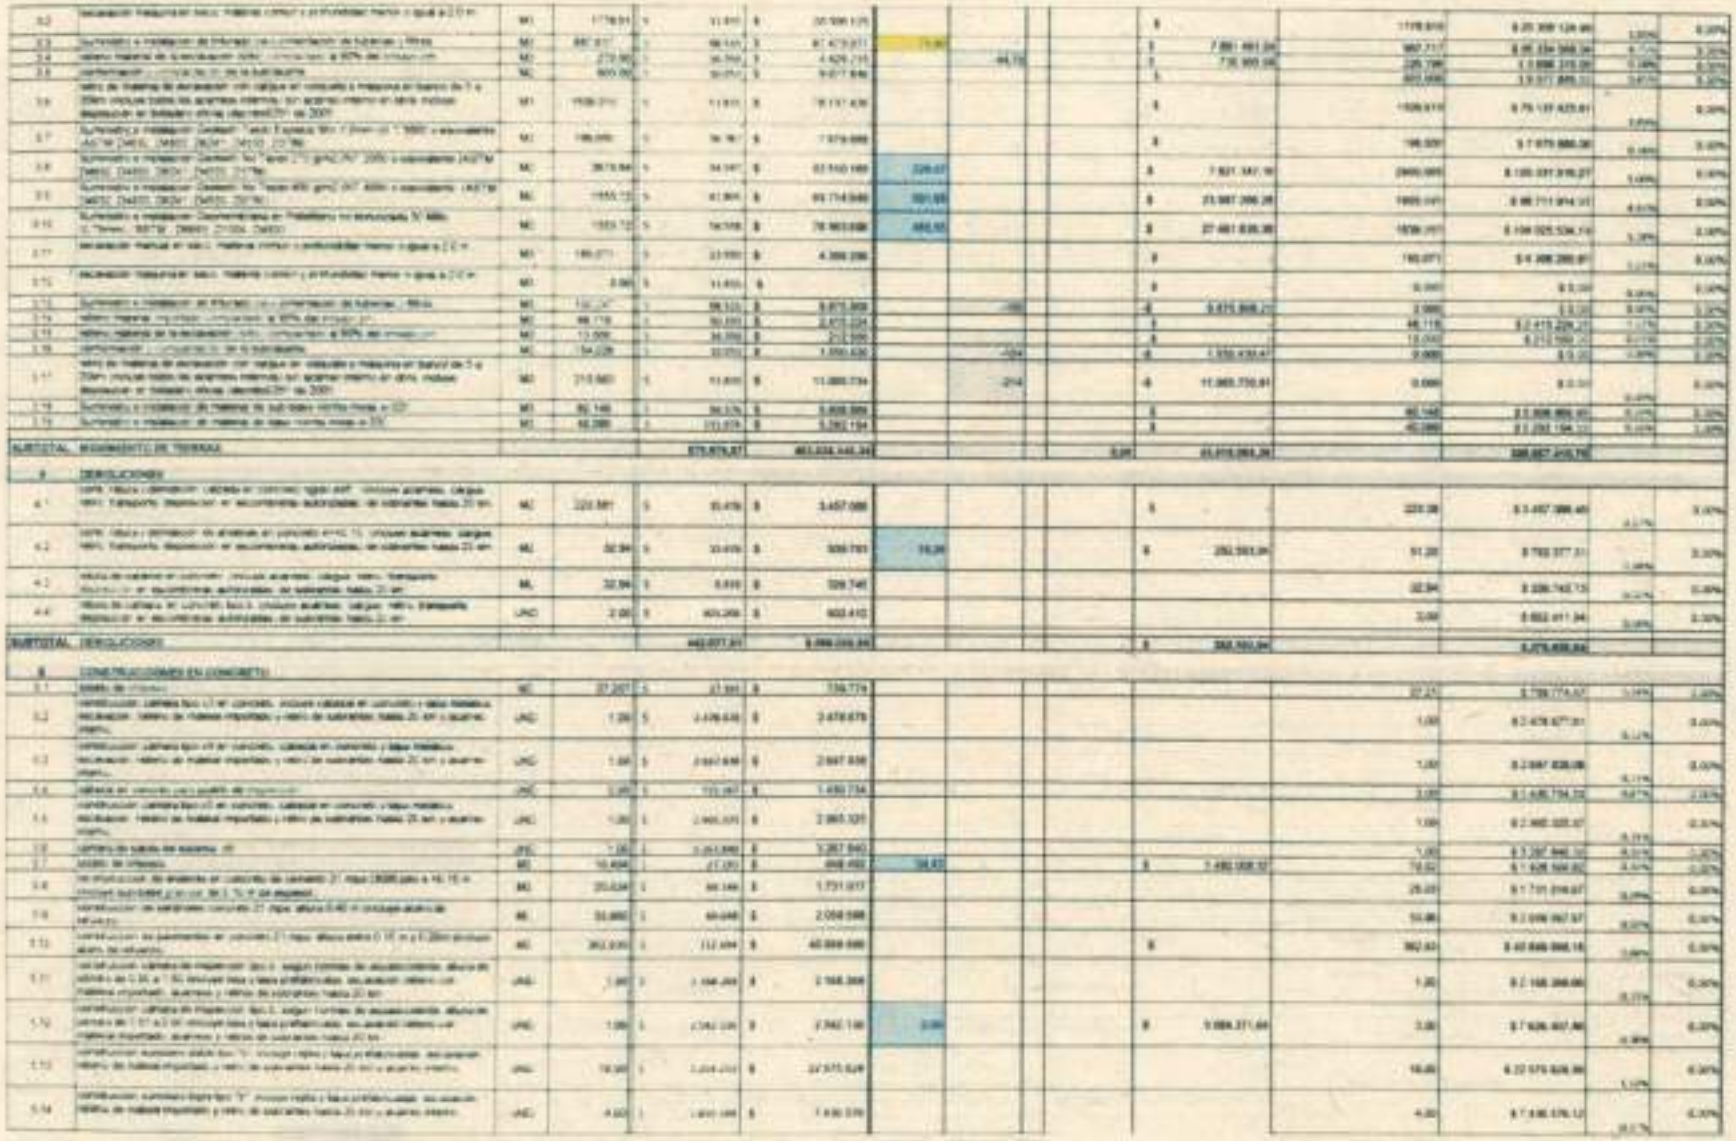

4.10	[illegible]	UND	1.000	$	2.761.819	$	2.761.819					$		1,00	$ 2.761.819,40	0,04%	0,00%
4.11	[illegible]	UND	1,00	$	3.281.731	$	3.281.731							1,00	$ 3.281.730,80	0,04%	0,00%
4.12	[illegible]	M3	112,000	$	236.617	$	24.837.408					$		112,00	$ 24.837.408,80	1,27%	0,33%
4.13	[illegible]	UND	1,00	$	176.151	$	1.372.737					$		1,00	$ 1.372.737,46	0,01%	0,02%
4.14	[illegible]	UND	0,00	$	176.151	$	-					$		0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.15	[illegible]	UND	0,00	$	4.660.997	$	-					$		0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.16	[illegible]	KLS	4.731,00	$	1.000	$	23.580.971					$		4.731,00	$ 23.580.971,76	1,21%	0,32%
4.17	[illegible]	M3	30,96	$	15.474	$	479.518					$		30,96	$ 479.518,27	0,02%	0,00%
4.18	[illegible]	M3	56,90	$	13.564	$	870.447					$		56,91	$ 870.446,99	0,04%	0,00%
4.19	[illegible]	ML	4,00	$	39.507	$	187.830							4,10	$ 187.829,91	0,01%	0,00%
4.20	[illegible]	ML	4,00	$	395.747	$	1.582.990							4,10	$ 1.582.328,99	0,08%	0,00%
4.21	[illegible]	UNI	2,00	$	224.551	$	449.103							2,00	$ 449.102,92	0,02%	0,00%
4.22	[illegible]	ML	21,00	$	10.053	$	211.113							21,01	$ 211.112,93	0,01%	0,00%
4.23	[illegible]	M3	1,00	$	1.414.724	$	1.485.724							1,00	$ 1.485.723,99	0,07%	0,00%
4.24	[illegible]	UNI	0,00	$	11.815.333	$	-					$		0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.25	[illegible]	M3	73,80	$	92.203	$	3.784.813		(1)			$	3.734.213,96	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.26	[illegible]	UNI	1,00	$	399.937	$	791.288,73					$		1,00	$ 791.284,77	0,04%	0,00%
4.27	[illegible]	KLS	0,00	$	7.000	$	-					$		0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	CONSTRUCCIONES EN CONCRETO				31.745.763,64		758.911.636,20					$	3.998.269,60		771.774.875,84		
5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO																
5.1	[illegible]	UNI	170,00	$	1.330.139	$	226.443.470		-7			-6	9.282.999,42	183,00	$ 216.160.505,73	10,73%	5,34%
5.2	[illegible]	UNI	18,00	$	828.837	$	14.919.666		0,00			$	7.455.525,12	27,00	$ 22.375.197,31	1,11%	0,53%
5.3	[illegible]	UNI	3,00	$	828.837	$	2.486.510							3,00	$ 2.486.508,72	0,12%	0,06%
5.4	[illegible]	UNI	5,00	$	1.657.672	$	8.288.362			$	-			5,00	$ 8.288.361,94	0,41%	0,20%
5.5	[illegible]	UNI	23,00	$	132.843	$	3.050.100							23,00	$ 3.050.100,80	2,15%	0,07%
5.6	[illegible]	UNI	25,00	$	6.441	$	160.760							25,00	$ 160.764,00	0,00%	0,00%
5.7	[illegible]	UNI	2,00	$	736.743	$	1.473.487					$	-	2,00	$ 1.473.486,37	0,07%	0,02%
5.8	[illegible]	UNI	5,00	$	1.657.672	$	8.288.362							1,00	$ 8.288.361,94	0,41%	0,20%
5.9	[illegible]	UNI	1,00	$	947.241	$	947.241							1,00	$ 947.241,36	0,05%	0,02%
5.10	[illegible]	UNI	3,00	$	41.442	$	124.325			$	-			3,00	$ 124.322,97	0,01%	0,00%
5.11	[illegible]	UNI	6,00	$	21.751	$	51.048							6,00	$ 51.049,97	0,01%	0,00%
5.12	[illegible]	UNI	4,00	$	87.840	$	351.358			$	-			4,00	$ 351.358,79	0,01%	0,00%
5.13	[illegible]	UNI	1,00	$	34.624.183	$	34.624.183							1,00	$ 34.624.183,07	1,71%	0,53%
5.14	[illegible]	ML	90,10	$	36.139	$	1.003.148		-88			-6	1.003.148	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.15	[illegible]	ML	34,70	$	36.139	$	448.348		-34,7			-6	448.348	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.16	[illegible]	ML	16,00	$	21.519	$	203.679		-16,0			-6	203.679	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.17	[illegible]	ML	12,10	$	21.519	$	260.385		-12,1			-6	260.384,79	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO				42.797.880,68		302.681.190,79				0,00	$	6.481.364,44		306.199.800,79		
7	JARDINERÍA Y PAISAJISMO																
7.1	[illegible]	UNI	5.000	$	75.041	$	375.157					$		5,00	$ 375.156,73	0,02%	0,00%
7.2	[illegible]	UNI	5,000	$	111.943	$	625.171							5,00	$ 625.171,60	0,03%	0,00%
7.3	[illegible]	UNI	10,000	$	87.200	$	871.000							10,00	$ 871.000,00	0,04%	0,00%
7.4	[illegible]	UNI	10,000	$	75.015	$	750.537							10,00	$ 750.537,31	0,04%	0,00%
SUBTOTAL	JARDINERÍA Y PAISAJISMO				373.215,40		2.721.865,67				0,00	$	-		2.721.865,67		
9	CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL																

Iepm.



NOTA: VALLECAUCANA DE ASEURE QUE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE OBRA LO HA HECHO TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON QUE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS LOCALES Y LAS MEDICIONES EN CAMPO Y GESTIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

FIRMA: _____

NOMBRE: UNIÓN TEMPORAL RURAL

ELIA DEGIMETRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE: GRUPO CONSULTEC INGENIERÍA SAS

ISABEL POSSO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DIAMETRO	AREA	VOLUMEN	UNIDADES	PESO	DÍA	HORA	DISTANCIA	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON RECARGA CONTROLADA															
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
3.3	Suministro e instalacion de tricapa para orientacion de tuberias y otros	M3													794,07	
	Items con tricapa de 3/4 para area 30		1			1,35		2019,56	530,185833						411,11	
	Items con tricapa de 3/4 para area 30cm 30cm		1			0,1		2019,56							101,96	
4	DEMOLICIONES															
4.1	corte, romper y demolicion cabeada en concreto rigido e=8". Incluye desmonte, cargue, retiro, transporte, disposicion en escombreras autorizadas de sobrantes hasta 20 km. -	m2													38,03	
	cona demolicion externa 1		1	2,90	1,1	0,2									3,19	
	cona demolicion externa 2		1	2,90	1,1	0,2									3,19	
	cona demolicion externa 3		1	4,33	0,5	0,2									1,19	
	cona demolicion externa 4		1	4,80	0,5	0,2									1,40	
	cona demolicion externa 5		1	1,60	1,8	0,2									1,58	
	cona demolicion externa 6		1	14,80	0,6	0,2									6,34	
	cona demolicion externa 7		1	1,80	1,8	0,2									1,56	
	cona demolicion externa 8		1	2,70	0,9	0,2									2,23	
	cona demolicion externa 9		1	5,90	0,5	0,2									2,65	
	cona demolicion externa 10		1	4,50	0,5	0,2									1,65	
	cona demolicion externa 11		1	4,10	0,5	0,2									2,05	
	cona demolicion externa 12		1	8,20	0,5	0,2									4,15	
5																
5.12	construccion cahara de inspeccion tipo b. segun normas de acueducto/alc: altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada; excavacion relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UNID													2,00	
	cahara para empalme de sumidero 1 y 2	2													2,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
	construccion sumidero doble tipo "c" incluye rejilla y tapa	UNID													4,00	

Fcpm.

6.13	prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno																
	sumidero s1 y s2	2															2,00
	sumideros calle 27A entre carreras 11 y 13	2															2,00
																	0,00
																	0,00



6.14	construccion sumidero triple tipo "S" incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavacion, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	UND															4,00
	sumideros s3, s4, s5 y s6	4															4,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00



6.15	construccion sumidero cuadruple tipo "S" incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavacion, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno	UND															5,00
	sumidero s"	1															1,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00



6 CONSTRUCCIONES EN CONCRETO

6.1	Cámara Alcantarillado Aguas Lluvias 40" x 76" (NTC 4349 / ASTM F2418, Tipo MS3500) o equivalente	UND															94,00
			M														94,00
	instalacion de tuberias alcantarillado																







8.2	Tapa para Camara Almacenaje Aguas Lluvias 45° x 76° (40"MF24 19	UND														24,00	
			24													24,00	
	AREA AFERENTE DEL PROYECTO ENTRE LA CARRERA 34 Y 33 Y CALLES 27 Y 28A																



FIRMA
NOMBRE UNION TEMPORAL TAPAVIAL
ELIA DEISSENTRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE ISABEL
RE POSSO
ISABEL POSSO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL PAPAYAL

CERTIFICA QUE

La **UNION TEMPORAL PAPAYAL**, con NIT 901776660-1, representada legalmente por la señora **ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS**, identificada con C.C. 66.774.037 de Palmira – Valle, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de aportes de nuestros empleados, a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el mes de octubre de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2024, en Palmira Valle.

Cordialmente,

ELIA ORDOÑEZ BOLAÑOS
CC. 66.774.037 de Magüi - Payán

el clima del día es lluvioso, ingresa personal al obra, continúan actividades de relleno de zanja pero por el clima no se puede avanzar. se cierra el día sin novedad.
Juan Felipe O. Edgar [illegible]

23/11/24 Inicia el día en obra sin novedad, el clima es nublado ingresa personal a obra, continúan con instalación de cámaras de almacenamiento y tapas y realizando en obra
Juan Felipe O Edgar Duque
se cierra el día sin novedad en obra

25/11/24 Se inicia el día sin novedad en obra el clima es nublado, ingresa personal a obra, continúan con instalación de cámaras de almacenaje, se realiza chequeo de niveles en el terreno, se inician cortes en la zona de sumideros y cámaras cerca al ingreso del sistema, la cortadora se daña durante el transcurso y toca esperar actividad hasta la revisión de la misma al siguiente día.

se cierra el día con la novedad del daño de la cortadora.
Juan Felipe O. Edgar Duque

26/11/24 Se inicia el día en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continúan actividades de demolición y corte de pavimento, se un

para cámaras.

Edgar Burgos

Se cierra el día sin novedad en obra

27/1/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continúan con corte, demolición y excavación en zona externa de la obra.

Edgar Burgos

Se cierra el día sin novedad en obra

29/1/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continúan con corte demolición continúa se retira escombros y se realiza excavación en zona de tuberías, sumideros y cámaras.

Se cierra el día sin novedad

Edgar Burgos

31/1/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continúan con demolición, excavación y retiro de material, se recibe visita de gas y aguacreidente

Se cierra día en obra sin novedad

Edgar Burgos

2/2/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es soleado, ingresa personal a obra se recibe visita de gases de acueducto para realizar capacitación, continúan con actividades de excavación y retiro de material en

	punto de apoyo, se arregla guarnición. Edgar Vargas
2/12/21	se inicia dia en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continuan con demoliciones, corte y excavacion de cunetas sardinel y tuberias. se cierra el dia sin novedad en obra. Juan Felipe O. Edgar Vargas
3/12/21	se inicia dia en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continuan con actividades de corte, demolicion y excavacion, continuan con retiro en grado y trabajos de mamposteria con el vecino, se realiza visita en el sitio con el trabajador carrilo de apoyo accidente. se cierra dia en obra sin novedad Juan Felipe O. Edgar Vargas
4/12/21	se inicia dia en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continuan con demolicion, excavacion y regado de escombros sobre los carros de almacenamiento se cierra dia en obra sin novedad Juan Felipe O. Edgar Vargas
5/12/21	se inicia dia en obra sin novedad, el clima es nublado, continuan actividades de regado de agua, demoliciones y excavaciones a mano, cargue de escombros se cierra dia sin novedad en obra.

Edgar Bongon

6/12/24 Se inicia día sin novedad en obra, el clima es soleado ingresa personal a obra, continúan con excavación y relleno de zanja del sistema, se retira instalación de filtros se lavan con agua

Se cierra día en obra sin novedad
Juan Felipe Q Edgar Bongon

7/12/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es nublado, continúan con excavación y relleno en zanja en zona del sistema

Se cierra día en obra sin novedad
Juan Felipe O.

9/12/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal, continúan con excavación y relleno de zanja en el sistema.

Se cierra día en obra sin novedad
Juan Felipe O. Edgar Bongon

10/12/24 Se inicia día en obra sin novedad el clima es soleado, ingresa personal a obra, continúan instalando rollos de alcantarillado, tapas y se rellena en zanja, se rellena con material en zona de filtros y se va compactando por capas, se realiza tres descargas doble.

Se cierra día en obra sin novedad
Juan Felipe O Edgar Bongon

11/12/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continúan trabajos de excavación,

	indicadores y registro de gravas en el sistema
	Se cierra día en obra sin novedad Juan Felipe O. Edgar Borgues
13/12/24	Se inicia día en obra sin novedad, ingreso personal a obra, el clima es soleado, se instala geotextil tejido y se instalan cunetas de alcantarillado, llegan material de gravas y se continua regando, se realiza perfilacion de cunetas, y se colocan capas de gravas en excavacion para tuberia externa de areas C1 y C2, se cierra labor en obra sin novedad
	Se cierra el dia sin novedad en obra Juan Felipe O. Edgar Borgues
13/12/24	Se inicia dia en obra sin novedad, el clima es soleado, ingreso personal a obra, continuan actividades de riego de material se instala geotextil tejido para el canal en zona de isolatex, se realiza corte de pavimento para alcantarillado.
	Se cierra dia en obra sin novedad Juan Felipe O. Edgar Borgues
14/12/24	Se inicia el dia sin novedad en obra, el clima es nublado, ingreso personal a obra, continuan actividades de riego de gravas, corte y demolicion de pavimentos y excavacion en zona de sumideros se realiza corte y retiro de concreto.
	Se cierra el dia sin novedad en obra Juan Felipe O. Edgar Borgues

16/12/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es soleado continua actividades de regado y nivelación de grava, se continua con excavación, corte y alineación de concreto y fijado de acero.

Se cierra el día sin novedad en obra.
Juan Felipe O. Edgar Burgos.

17/12/24 Se inicia el día en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, se inicia con instalación de Tee en cerca, se realizan las perforaciones en los topes de las cámaras, se sigue con regado de grava, se adecua pendiente de sendero quintuple.

Se cierra el día sin novedad en obra
Juan Felipe O. Edgar Burgos.

18/12/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continua con regado de grava y nivelación, se instala geotextil sobre grava, se realiza perforación de cámara, se continua con instalación y excavación.

Se cierra el día sin novedad
Juan Felipe O. Edgar Burgos.

19/12/24 Se inicia el día sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, se adecua cámara de almacenamiento, se colocan topes y se hacen perforaciones en tubos, para hacer instalación de las Tee, se unen entre ellas, se aseguran y se sobrepone geotextil, se continua con instalación de geotextil y relleno de material excavado de la zona, se realiza

instalacion de tuberias para cuneta en concreto y sardinel, se rellena con grava hasta el tubo de 24", se instala malla electrosoldada y se realiza fundida de losa, y se funde cuneta, despues de medio dia se presenta lluvia se retiran procesos constructivos

Se cierra el dia sin novedad
Juan Felipe O Edgar Bonilla

22/12/24 Se inicia dia en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continua instalacion de geotextil, relleno y nivelacion de grava, instalacion de tuberia en base en grava, se rellena con material seleccionado y se pasa, queda listo la instalacion de los Tee

Edgar Bonilla

21/12/24 Se inicia dia en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continua con relleno y nivelacion de tuberia, instalacion de geotextil, instalacion de tuberia de 14", 16" y 12" para sardinel, se subpone sobre una capa de grava y se llena a la mitad

Se cierra el dia sin novedad en obra
Juan Felipe O. Edgar Bonilla

23/12/24 Se inicia el dia en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continua con relleno de material de relleno, se realiza nivelacion de cuneta y adicion de tuberia y se compacta

Juan Felipe O. Edgar Bonilla

Se cierra el dia sin novedad

5/17/24 Se inicia el día en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal a obra, continuan trabajos de tritero sobre Geotextil, demoliendo y excavando para sumideros.

se cierra el día sin novedad en obra.
Juan Felipe O. Edgar Barguas

5/18/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal a obra, se realiza analisis de labor en zona de instalacion de sumideros, se continua con vaciado de material de relleno sobre el sistema, se nivela

se cierra el día en obra sin novedad
Juan Felipe O. Edgar Barguas

				EMPRESA VALLE CAUCANA DE AGUAS S.A. ESP **VALLE DEL CAUCA**	
Fecha	21	11	2024	**ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N°14**	Página 1 de 4

Contratista: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL — Contrato N°2000.13.05.002-2023

Interventor: CONSITEC INGENIERÍA S.A.S. — Contrato N°2000.13.12.001-2024

Supervisor: Ing. Miguel Edison Zuluaga y la Ing. Neira Restrepo

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing. Maria Cristina Buelvas – funcionaria SIRUV alcaldía de Palmira	
Ing. Neira- Apoyo a la supervisión por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	
Arq. Erika Olaya – auxiliar residente de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Prof. Ana Mileth Tobar – profesional de salud ocupacional y seguridad en el trabajo UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Prof. Oneida Quiñonez – residente social UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Ing. Isabel Cristina Posso M. – directora interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Marco Hoyos – profesional de apoyo interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	

OBJETO PRESENTE COMITÉ TÉCNICO

Revisar compromisos pendientes y avance de actividades preliminares del CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLES	¿SE CUMPLE?
1. Realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Parcialmente
2. Oficio al municipio de Palmira solicitando defina sitio de compensación forestal viable	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple
3. Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra.	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	No cumple

TEMAS POR TRATAR

1) Revisión compromisos pendientes.
2) Actividades ejecutadas

este requerimiento con el fin de aumentar el rendimiento ya que el contrato está próximo a terminar. Teniendo en cuenta lo anterior, este compromiso continuo pendiente, sin embargo, el contratista se compromete en iniciar estas labores a más tardar el miércoles 27 de noviembre de 2024.

2) ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. Componente técnico

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de técnico se tiene el siguiente reporte:

- Realizan excavación manual para cámaras y tubería.
- Rellenos detrás de muros de contención.
- Fundición de cámaras al interior del parque.
- Instalación de geotextil y geomembrana.
- Relleno de triturado para ubicación de Cámaras de Almacenaje para aguas lluvias
- Instalación de cámaras de almacenaje para aguas lluvias
- Información avance de obra de acuerdo con el cronograma inicial. Programado: 94,83% Ejecutado: 79.78%.

b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST

la interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo SST se tiene el siguiente reporte:

- No se presentaron accidentes en obra.
- No se ha presentado inconvenientes con los trabajadores.
- Programa de contratación: a la fecha: Mano de obra calificada 07 y Mano de obra no calificada: 11
- Se hicieron varias capacitaciones al personal, las cuales son: inducción y reinducción,
- Inspección de EPP e inspección de herramientas.
- Inspección de equipos de emergencia.
- Conformación de brigada de emergencia.
- Se realiza comité de convivencia laboral.

c. Componente social.

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente social se tiene el siguiente reporte:

- Programa Atención a la comunidad: No se han presentado PQRS ni derechos de petición.
- Programa información y divulgación: se mantiene actualizada la cartera informativa.
- Programa de infraestructura predial: No se presentan PQRS por afectación predial.
- Contratación de mano de obra: 7 mano de obra calificad, 11 mano de obra no calificada (54,55% hacen parte del área de influencia).
- Solo está pendiente la socialización de cierre.

d. Componente ambiental.

- Como se menciona en uno de los compromisos, se realiza reunión con el ingeniero Guillermo Arango de la dirección de Medio Ambiente de Palmira el día de hoy en horas de la mañana para definir las áreas en las que se realizará la compensación en la que se dan 5 posibles zonas para realizar la actividad; teniendo en cuenta esta información, se programa realizar la visita para el día de mañana 22 de noviembre de 2024 a las 10 a.m para conocer cada uno de los sitios y definir cuáles serán los utilizados para la siembra de las especies.

3) OBSERVACIONES GENERALES

- Ampliar los frentes de trabajo teniendo en cuenta que la fecha de terminación

a. Componente técnico
b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST
c. Componente social
d. Componente ambiental

3) Observaciones generales.

DESARROLLO DEL COMITÉ



A las 2:25 p.m. inicia el comité en las instalaciones del contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, donde se revisa punto por punto los siguientes temas, así:

1) REVISIÓN COMPROMISOS PENDIENTES

1. **Realizar apique en el punto del sifón. La interventoría informa que el** apique se inició el 13 de noviembre y a la fecha aún se está realizando la actividad, debido al cuidado a tener dado que son tubos de gran capacidad y que se encuentran a diferentes profundidades. El contratista manifiesta que la actividad ha sido difícil porque el terreno está muy compactado, pero ya se encontró la tubería de 10" a 1.5m, por lo que se estima terminar esta labor el lunes 25 de noviembre de 2024. De acuerdo con lo anterior, el compromiso cumple parcialmente.

2. **Oficio al municipio de Palmira solicitando defina sitio de compensación forestal viable** El ingeniero Guillermo Arango de la dirección de Medio ambiente cita al contratista y a la interventoría para verificar las áreas el día de hoy en horas de la mañana junto con la ingeniera Carolina Reina, profesional del contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL y el ingeniero Juan Felipe Osorio Ríos profesional de apoyo de la interventoría CONSITEC INGENIERIA, donde el ingeniero Guillermo Arango presenta las posibles zonas para realizar la compensación, por lo que se define realizar la visita a cada uno de los posibles sitios el día de mañana 22 de noviembre de 2024 a las 10 a.m. y definir cuáles se tomarán para la siembra de las especies: Por lo anterior, el compromiso queda pendiente de acuerdo a la visita que se realice. Este compromiso se cumple, sin embargo, queda pendiente elaborar el acta de la reunión y visita de identificación de los sitios para definir donde se hará la compensación.

3. **Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra.** A la fecha el contratista no ha destinado personal para empezar las actividades de construcción de sumideros y cámaras en las vías circundantes. La interventoría envía oficio CI_INT_PPY-013-2024, solicitando se ponga especial atención a

- Pagos fin de año EVA.
- Formato reformulación, solicitud adición
- Dado que el PMT ya fue aprobado se le solicita al contratista UNION TEMPORAL RESTREPO 2023 incrementar los frentes de trabajo para mejorar el rendimiento de obra.

Siendo las 3:00 pm sin más temas para tratar se da por terminado el comité, quedando pendiente revisar en el próximo comité los siguientes compromisos.

COMPROMISOS PACTADOS PRESENTE COMITÉ

COMPROMISO	RESPONSABLE
1. Realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
2. Oficio dirección de medio ambiente solicitando reunión	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
3. Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

PRÓXIMO COMITÉ O REUNIÓN

FECHA	05	12	2024
	DIA	MES	AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Palmira, a los

veintiuno (21) día del mes de noviembre de 2024

(Dia en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Original: Contrato CI-044_Int. Restrepo Palmira / Comités de obra y reuniones.
Copias: Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y Contratista.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL — Contrato N°2000.13.05.002-2023

Interventor: CONSITEC INGENIERÍA S.A.S. — Contrato N°2000.13.12.001-2024

Supervisor: Ing. Miguel Edison Zuluaga y la Ing. Neira Restrepo

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing. María Cristina Buelvas – funcionaria SIRUV alcaldía de Palmira	
Prof. Ruth Liliana Ramírez - trabajadora social planeación alcaldía de Palmira	
Ing. Neira- Apoyo a la supervisión por parte de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	
Ing., Carolina Reina – ingeniera ambiental UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Ing. Juan Felipe Ríos – profesional de apoyo Interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Marco Hoyos - profesional de apoyo Interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Isabel Cristina Posso m.- directora Interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	

OBJETO PRESENTE COMITÉ TÉCNICO

Revisar compromisos pendientes y avance de actividades preliminares del CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLES	¿SE CUMPLE?
1. Realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Parcialmente
2. Oficio al municipio de Palmira solicitando defina sitio de compensación forestal viable	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple
3. Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra.	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	No cumple

TEMAS POR TRATAR

1) Revisión compromisos pendientes.
2) Actividades ejecutadas
    a. Componente técnico
    b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST
    c. Componente social
    d. Componente ambiental
3) Observaciones generales.

DESARROLLO DEL COMITÉ





A las 10:25am inicia el comité en las instalaciones del contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, donde se revisa punto por punto los temas, así:

1) REVISIÓN COMPROMISOS PENDIENTES

1. **Realizar apique en el punto del sifón.** El apique se inició el 13 de noviembre y a la fecha ya se finalizó, dado que ya se encontraron los tubos de alcantarillado y la tubería de acueducto. Esta labor se realizó con supervisión de personal técnico de AQUAOCCIDENTE. Por lo anterior el compromiso se cumple.

2. **Oficio al municipio de Palmira solicitando defina sitio de compensación forestal viable.** La interventoría informa que el ingeniero Guillermo Arango de la dirección de Medio ambiente citó al contratista y a la interventoría para verificar las áreas el día 5 de diciembre de 2024 en horas de la mañana, visita a la que asistió la ingeniera Carolina Reina, profesional del contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL, el ingeniero Juan Felipe Osorio Ríos profesional de apoyo de la interventoría CONSITEC INGENIERIA y el ingeniero Guillermo Arango de la dirección de Medio Ambiente. Durante la visita el ingeniero Arango presenta las posibles zonas para realizar la compensación, por lo que se define realizar la visita a cada uno de los posibles sitios el 22 de noviembre de 2024 a las 10 a.m., la cual no se puede realizar pero finalmente se realiza el día 26 de noviembre de 2024 entre la ingeniera Carolina Reina y el encargado de la dirección de Medio Ambiente, donde en definitiva se define las áreas de intervención, por lo que inmediatamente el contratista inicia el proceso de cotización para posterior contratación del personal idóneo para realizar la actividad. Teniendo en cuenta lo mencionado ya se tienen las áreas definidas, motivo por lo que no se ve la necesidad de generar el oficio al municipio de Palmira y se da por cumplido el compromiso.

En este punto, se hace la salvedad que la compensación arbórea la debe hacer la UNION TEMPORAL PAPAYAL, y el mantenimiento la administración, directamente la dirección de gestión del medio ambiente del municipio de Palmira, una vez el contratista entregue el informe al municipio.

3. **Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra.** La interventoría informa que a la fecha el contratista ya inicio con las actividades respectivas para la construcción de sumideros, sin embargo, se le ha solicitado abrir más frentes y poder culminar el contrato dentro del tiempo establecido. La interventoría indica que envió al contratista oficio CI_INT_PPY-013-2024, solicitando se ponga especial atención a este requerimiento con el fin de aumentar el rendimiento ya que el contrato está próximo a terminar.

2) ACTIVIDADES EJECUTADAS

Componente técnico

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de técnico se tiene el siguiente reporte:

- Demolición de pavimento para la construcción de sumideros y cámaras de inspección.
- Realizan excavación manual para cámaras, sumideros y tubería.
- Rellenos detrás de muros de contención.
- Fundición de cámaras al interior del parque.
- Instalación de geotextil y geomembrana.
- Relleno de triturado para ubicación de Cámaras de Almacenaje para aguas lluvias
- Instalación de cámaras de Almacenaje para aguas lluvias
- Información avance de obra de acuerdo con el cronograma inicial. Programado: 99,78% Ejecutado: 89,80%.

  En este punto la interventoría informa que el contratista va hacer solicitud de prórroga, la cual será analizada por la interventoría para posterior enviar a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP

Componente seguridad y salud en el trabajo SST

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo SST se tiene el siguiente reporte:

- No se presentaron accidentes en obra.
- No se ha presentado inconvenientes con los trabajadores.
- Programa de contratación a la fecha: Mano de obra calificada 07 y Mano de obra no calificada: 11
- Se hicieron varias capacitaciones al personal, las cuales son: inducción y reinducción al personal de maquinaria y equipos.
- Inspección de EPP e inspección de herramientas.
- Inspección de equipos de emergencia.
- Conformación de brigada de emergencia.
- Se realiza comité de convivencia laboral.

Componente social.

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente social se tiene el siguiente reporte:

- Programa Atención a la comunidad: No se han presentado PQRS ni derechos de petición.
- Programa información y divulgación: se mantiene actualizada la cartera informativa.
- Programa de infraestructura predial: No se presentan PQRS por afectación predial.
- Contratación de mano de obra: 7 mano de obra calificad, 11 mano de obra no calificada (54,55% hacen parte del área de influencia).

Componente ambiental.

Como se menciona en uno de los compromisos, se realiza reunión con el ingeniero Guillermo Arango de la dirección de Medio Ambiente de Palmira el día de hoy en horas de la mañana para definir las áreas en las que se realizará la compensación en la que se dan 5 posibles zonas para realizar la actividad; teniendo en cuenta esta información, se programa realizar la visita para el día de mañana 22 de noviembre de 2024 a las 10 a.m. para conocer cada uno de los sitios y definir cuáles serán los utilizados para la siembra de las especies. En este punto se resalta que el contrista de obra realizara la compensación arbórea y el mantenimiento por parte de la administración.

3) OBSERVACIONES GENERALES

- Se reitera la solicitud al contratista UNION TEMPORAL RESTREPO 2023 incrementar los frentes de trabajo para mejorar el rendimiento de obra.

- Una vez se tenga prorroga organizada y aprobada, se debe organizar una socialización con la comunidad informando la nueva fecha de terminación del contrato. Se propone socialización para el jueves 26 de diciembre de 2024 a las 3pm después del comité técnico.

Siendo las 11:10 am sin más temas para tratar se da por terminado el comité, quedando pendiente revisar en el próximo comité los siguientes compromisos.

COMPROMISOS PACTADOS PRESENTE COMITÉ

COMPROMISO	RESPONSABLE
1. Incrementar frentes de trabajo para avanzar en las obras de sumideros y cámaras en las cuadras cercanas a la obra	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
2. Siembra de arboles	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
3. Socialización comunidad	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

PRÓXIMO COMITÉ O REUNIÓN

FECHA	26	12	2024
	DIA	MES	AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Palmira, a los

Once (11)	días del mes de	diciembre	de	2024
(Día en letras)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Original: Contrato CI-044_Int. Restrepo Palmira / Comités de obra y reuniones.
Copias: Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y Contratista.

CONSITEC INGENIERIA	FORMATO DE ASISTENCIA		FAE-01
	OBJETO DEL CONTRATO CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA"		V1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 2000.13.12.001-2024	**CONTRATO DE OBRA N°:** 2000.13.05.002.-2023
RESOLUCIÓN CESIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 2000.45.03.162-2024	
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA DE OBRA:** UNION TEMPORAL PAPAYAL

TEMA PRINCIPAL: Comite tecnico #35

OTROS TEMAS:

FECHA: 11-12-2024 **HORA I:** 10:30am **HORA F:** **LUGAR:** Oficina de Obra - Urb. Papayal

PERSONA(S) RESPINSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRONICO):

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
1	Maria Cristina Bedoya M	1067888104	3043460469	Srio - Alcaldía - mcristinabedoya@palmira.gov.co	
2	Ruth Liliana Ramirez	66765799	3218508095	T Social / Administrativa	
3	Isabel Cristina Rozo M	38537159	3137119635	Profesional de Interventoría CONSITEC INGE.	
4	Marco Tlayos	9.732.787	3137218443	Ing. Apoyo Interventoria.	
5	Carolina Rama	29661601	3143462542	Ing. Amb / UTP	
6	Neira Restrepo	66'924.706	3006523720	Apoyo Supervision Valle	
7	Juan Felipe Osorio R	1059601568	3003370734	Apoyo Interventoria	

CONSITEC INGENIERIA	ACTA DE REUNIONES	PDA	AR-01 V1

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA N°: 2000.13.05.002-2023G-058-2023	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:** 2000.13.12.001-2024
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	**CONTRATISTA:** CONSITEC INGENIERIA S.A.S

TEMA PRINCIPAL: Inquietud sobre actividades para la construcción del sifón

OTROS TEMAS:

ACTA N°	FECHA:	HORA INICIAL:	HORA FINAL:	LUGAR:
9	04/12/2024	10:15 a.m.	12:00 p.m.	Oficinas AQUAOCCIDENTE

PERSONA(S) RESPONSABLE(S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRÓNICO):
Ing. Marco Hoyos Osorio /Ing. residente de interventoría / comercial@consitecingenieria.com

ASISTENTES:

Miguel Ayala – Ingeniero AQUAOCCIDENTE
Carlos Cortés - Ingeniero AQUAOCCIDENTE
Hector Saavedra - AQUAOCCIDENTE
Neira Restrepo – Supervisora de apoyo Vallecaucana de Aguas
Jonathan Steven Castañeda. – Maestro de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL
Erica X. Olaya – Residente UNION TEMPORAL PAPAYAL
Juan Felipe Osorio – Ingeniero auxiliar interventoría CONSITEC INGENIERIA
Ing. Isabel Cristina Posso M. – directora interventoría CONSITEC INGENIERÍA.
Ing. Marco Hoyos – profesional de apoyo Interventoría CONSITEC INGENIERÍA.



DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:15 a.m. se inicia la reunión dando la bienvenida a todos los asistentes, posteriormente, se realiza la presentación de los participantes; acto seguido el ingeniero Marco Hoyos inicia explicando el motivo de la reunión solicitada, donde se expone que dentro del contrato 2000.13.05.002-2023G cuyo objeto es "**EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA",** se encuentra la construcción de un sifón de acueducto, el cual se encuentra en el presupuesto como el ítem 5.29 *"Suministro e instalacion tuberia de alta densidad en polietileno para construccion de sifon para acueducto diam 500 mm"* el mencionado ítem tiene un valor de $17.813.112 a costo directo y se paga por unidad, dentro del anexo técnico del contrato se encuentra el

diseño del sifón, el cual fue socializado por el ingeniero Miguel Ayala quien actúa como interventor de Aquaoccidente S.A. ESP durante comité técnico de obra N°6 realizado el 1 de agosto de 2024, sin embargo, no se tiene claridad en que incluye dicha actividad teniendo en cuenta que el ítem contractual solo menciona la instalación de una tubería de polietileno de alta densidad de 500mm y que el contratista manifiesta que ha realizado la cotización con los planos entregados para la ejecución de la actividad y se ha observado que los precios propuestos para la construcción del sifón son mucho mayores al contractual debido a que para construir el sifón mencionado se deben tener en cuenta otras actividades y accesorios, razón por lo cual se le solicita a AQUAOCCIDENTE especifique si ese ítem contractual incluye los accesorios y elementos que se requieren para la actividad y si es posible aclarar el alcance del valor presupuestado, por lo anterior, el ingeniero Miguel Ayala indica que el valor del ítem no es el presentado por ellos ante Vallecaucana de Aguas S.A ESP y tendrían que ser ellos los que indiquen que elementos y accesorios se incluyen dentro del ítem y de acuerdo al precio pactado en el contrato, así mismo, el ingeniero indica que si los precios no corresponden al mercado se tendrán que ajustar a las cotizaciones realizadas pues dicha actividad la debe realizar personal capacitado, con experiencia y con el equipo idóneo.

Por lo anterior, la interventoría Consitec Ingeniería SAS junto con la ingeniera Neira Restrepo de Vallecaucana de Aguas SA ESP y el contratista Unión temporal Papayal, solicitan a AQUAOCCIDENTE realizar un listado con las especificaciones técnicas y accesorios que se deben utilizar en la construcción del sifón y así verificar las cotizaciones y corregirlas de ser necesarias, para garantizar que el sifón se construya de manera técnica y con los materiales idóneos. A lo que el ingeniero Miguel Ayala indica que realizará el listado para entregarlo lo más pronto posible.

Sin más temas para tratar se da por terminada la reunión a las 12:00 p.m.

Juan Felipe O.
Juan Felipe Osorio Ríos
Elaboro.

Isabel Cristina Posso.
Isabel Cristina Posso
Aprobo.

CONSITEC INGENIERIA	FORMATO DE ASISTENCIA		FAE-01
	OBJETO DEL CONTRATO CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".		V1

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº: 2000.13.12.001-2024	**CONTRATO DE OBRA Nº:** 2000.13.05.002.-2023
RESOLUCIÓN CESION CONTRATO INTERVENTORÍA Nº: 2000.45.03.162-2024	
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA DE OBRA:** UNION TEMPORAL PAPAYAL

TEMA PRINCIPAL: Sifón - Proyecto Papayal

OTROS TEMAS:

FECHA: 4/12/2024 **HORA I:** 10:15 AM **HORA F:** 12:00 a.m **LUGAR:** Aguaccidente

PERSONA(S) RESPONSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRONICO):

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
1	Jonathan Steven Castañeda	1116288388		Maestro obra Papayal	Jonathan Castañeda
2	Erra X. Olaya S.	1114531390	3165886693	Residente UTP	
3	Miguel Ayala	88200976	3832629445	Ing Aguaccidente	
4	Pedro G Morales	16624627	3006725069	U	
5	Hasbleidy Saavedra	94.316.185	315 521 4375	AGUACCIDENTE	
6	Neira Restrepo	66'924.706	3006523720	Apoyo técnico Supervisión	Neira R.
7	Isabel Cristina Rojas M	38537757	3137214635	Dirección de Interventoría Consitec Ing / Supervisión & Gestión Ambiental	
8	Juan Felipe O.	1059601568	3003370734	Apoyo Interventoria	Juan Felipe O.
9	Marco Reyes Q.	9.732.787	3137218443	Ing. Apoyo Interventoria	

CONSITEC INGENIERIA

NIT. 900.738.802-3

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
NIT. [illegible]
FECHA: NOV 26 2024
HORA: 11:36 am

RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA NOV-26-2024
HORA 11:36 am

CI_INT_PPY-015-2024

Santiago de Cali, 22 de noviembre de 2024

VA 1000 0902 016 59 2024

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero
Director técnico
Avenida 8 Norte N° 24 AN-139
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº 2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **ENTREGA INFORME N°7 DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024.**

Cordial saludo,

De acuerdo con los compromisos contractuales de la interventoría se hace entrega del informe técnico N°7, con los respectivos anexos del periodo correspondiente del 25 de septiembre al 25 de octubre de 2024.

A continuación, se menciona los documentos:

Informe técnico N°7 con los respectivos anexos:

- Seguridad social y certificado cumplimiento de pago del contratista y la interventoria.
- ANEXO 6.1 Aspectos Técnicos (Informe técnico interventoría, Bitácora de obra, actas de comités y reuniones).
- ANEXO 6.2 Control de Calidad (ensayos de laboratorio).
- ANEXO 6.3 Aspectos Ambientales.
- ANEXO 6.4 Aspectos Sociales (Informe gestión y seguimiento social de interventoría).

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

presentación reformulación Papayal

2 mensajes

Neira Viviana Restrepo. Salazar <nr@eva.gov.co> 29 de noviembre de 2024, 16:38
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>, Miguel Edinson Zuluaga Montero <mzm@eva.gov.co>

Señores
Grupo Consitec Ingeniería S.A.S.
Interventoría obra Papayal
La ciudad.

REF: Contrato de obra No. 2000.13.05.002-2023, cuyo objeto es: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA"

Cordial saludo.

Se solicita a la Interventoría hacer una presentación y sustentación formal de la reformulación presentada para la obra referida ante la Supervisión del contrato, en la sala de juntas de Vallecaucana S.A. el próximo lunes 2 de diciembre a las 11:00 a.m.

Esperamos puntual asistencia.

Atentamente,

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 29 de noviembre de 2024, 22:51
Para: Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>, uniontemporalpapayal@gmail.com, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

CONSITEC INGENIERIA

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

[El texto citado está oculto]

RV: Confirmación de radicado

De: <comercial@consitecingenieria.com>
Fecha: 01/15/2025 16:06
Para: <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>

De: Radicaciones PQR <co.noreply.aquaoccidente@veolia.com>
Enviado el: lunes, 2 de diciembre de 2024 1:01 p. m.
Para: comercial@consitecingenieria.com
Asunto: *Confirmación de radicado*

Señor usuario

Le informamos que la PQR enviada por usted a AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P., a través de nuestra página web, le fue asignado el radicado No. 1DAC55802024 (comprobante de la recepción de la solicitud, la cual será objeto de verificación). Lo anterior de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011.

Le recordamos que este correo electrónico es utilizado únicamente para el envío de su radicado. Favor no responder a esta dirección.

Atentamente,

Dpto. Atención al Cliente

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

Sifón Papayal

De: "Ayala Peñaranda, Miguel Eduardo" <mayala@aquaoccidente.com>
Fecha: 12/06/2024 09:07
Para: nri@eva.gov.co
Cc: "uniontemporalpapayal@gmail.com" <uniontemporalpapayal@gmail.com>, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, "gerencia@consitecingenieria.com" <gerencia@consitecingenieria.com>, Carlos Alberto Cortes <carlos-alberto.cortes@veolia.com>, Hector Fabio Saavedra Rivas <hector-fabio.saavedra-rivas@veolia.com>

Buenos dias.
De acuerdo con el compromiso adquirido el dia 4 de diciembre en las instalaciones de la Gerencia Técnica de AQUAOCCIDENTE, estamos adjuntando el listado de actividades que se pueden contemplar para la construcción del sifón de acueducto. Cabe resaltar que las actividades aquí descritas se deberán ajustar a las condiciones encontradas en terreno y de acuerdo a la modalidad de contratación.

Una vez más resaltamos la necesidad de esta obra, ya que es la que permite que el sistema de regulación que se está implementando, tenga un adecuado sistema de drenaje, con esto se garantiza un normal funcionamiento del sistema y la mitigación de posibles inundaciones en el sector.

Quedo atento a sus comentarios.

--

Miguel Eduardo Ayala P.
Ingeniero Interventor
T: 6022688088 (356)
W: www.aquaoccidente.com
facebook twitter
instagram

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

Adjuntos (2 archivos, 1.6 MB)
- Sifon acueducto.xlsx (10.8 KB)
- AL-125_PAPAYAL C_4-4.pdf (1.6 MB)

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Sifón Papayal

2 mensajes

Ayala Peñaranda, Miguel Eduardo <mayala@aquaoccidente.com> 6 de diciembre de 2024, 9:07
Para: nri@eva.gov.co
Cc: "uniontemporalpapayal@gmail.com" <uniontemporalpapayal@gmail.com>, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, "gerencia@consitecingenieria.com" <gerencia@consitecingenieria.com>, Carlos Alberto Cortes <carlos-alberto.cortes@veolia.com>, Hector Fabio Saavedra Rivas <hector-fabio.saavedra-rivas@veolia.com>

Buenos dias.
De acuerdo con el compromiso adquirido el día 4 de diciembre en las instalaciones de la Gerencia Técnica de AQUAOCCIDENTE, estamos adjuntando el listado de actividades que se pueden contemplar para la construcción del sifón de acueducto. Cabe resaltar que las actividades aquí descritas se deberán ajustar a las condiciones encontradas en terreno y de acuerdo a la modalidad de contratación.

Una vez más resaltamos la necesidad de esta obra, ya que es la que permite que el sistema de regulación que se está implementando, tenga un adecuado sistema de drenaje, con esto se garantiza un normal funcionamiento del sistema y la mitigación de posibles inundaciones en el sector.

Quedo atento a sus comentarios.

–

Miguel Eduardo Ayala P.
Ingeniero Interventor
6022688088 (356)
www.aquaoccidente.com

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner

immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

---

2 adjuntos

Sifon acueducto.xlsx
8K

AL-125_PAPAYAL C_4-4.pdf
1173K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 6 de diciembre de 2024, 12:33
Para: nri@eva.gov.co, Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, uniontemporalpapayal@gmail.com

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

CONSITEC INGENIERIA

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **Ayala Peñaranda, Miguel Eduardo** <mayala@aquaoccidente.com>
Fecha: El vie, 6 dic. 2024 a la(s) 9:07 a.m.
Asunto: Sifón Papayal
Para: <nri@eva.gov.co>
Cc: uniontemporalpapayal@gmail.com <uniontemporalpapayal@gmail.com>, <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, gerencia@consitecingenieria.com <gerencia@consitecingenieria.com>, Carlos Alberto Cortes <carlos-alberto.cortes@veolia.com>, Hector Fabio Saavedra Rivas <hector-fabio.saavedra-rivas@veolia.com>
[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

Sifon acueducto.xlsx
8K

AL-125_PAPAYAL C_4-4.pdf
1173K

Respuesta radicado

De: "Ayala Peñaranda, Miguel Eduardo" <mayala@aquaoccidente.com>
Fecha: 12/10/2024 14:35
Para: nri@eva.gov.co, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, "gerencia@consitecingenieria.com" <gerencia@consitecingenieria.com>

Buenas tardes.
Comparto el envío de la respuesta oficial con respecto al Sifón de acueducto.

--

Miguel Eduardo Ayala P.
Ingeniero Interventor
(T) 6022668088 (356)
(W) www.aquaoccidente.com
facebook twitter
instagram

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

Adjuntos (1 archivo, 800.8 KB)
- ACUSO DE ENVIO RESPUESTA SIFON PAPAYAL.pdf (800.8 KB)

Solicitud de tiempo por 30 días del contrato No. 2000.13.05.002.-2023

De: Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: 12/10/2024 16:26
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, gerencia@consitecingenieria.com, SISO Consitec Ingenieria <sisoma@grupoconsitec.com>, juanfeosorio@hotmail.com

Buenas tardes

ingenieros

Cordial saludo

Adjunto envío documento de solicitud de prorroga contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, cuyo objeto es "Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca."

Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier inquietud

Adjuntos (1 archivo, 431.2 KB)
- prorroga diciembre VF.pdf (431.2 KB)

Obra Papayal

De: "Neira Viviana Restrepo. Salazar" <nri@eva.gov.co>
Fecha: 12/10/2024 17:40
Para: uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>, Carolina Reina <caroreinab@gmail.com>
Cc: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>, auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>

Muy buen día.

Se revisa el documento enviado por la ingeniera Carolina, favor completar.

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Adjuntos (1 archivo, 20.4 KB)
- Justificación adición Papayal.docx (20.4 KB)

UNION TEMPORAL PAPAYAL
NIT. 901.776.660-1
CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023

UTP-2024-045

10 de diciembre de 2024

Ingeniera
Isabel Cristina Posso Muñoz
Rp Legal
Consitec Ingenieria

Referencia: Solicitud de prórroga contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, cuyo objeto es **"Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización Papayal municipio de Palmira, Valle del Cauca."**

A través del presente oficio expresamos ante usted en su calidad de representante legal de la interventoría del contrato de obra citado en la referencia una prórroga hasta el 19 de febrero de 2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

A raíz de los eventos climáticos suscitados entre el 16 y 22 de noviembre y del 2 al 4 de diciembre del presente año en la urbanización papayal Municipio de Palmira-Valle del Cauca, afecto directamente el proceso de ejecución de la obra, lo que provoco contratiempos y retrasos, principalmente en las actividades que se están desarrollando, lo que fueron instalación de geotextil, relleno en grava, fundición de cámaras internas del sistema, excavaciones en las zonas externas que conforman los sumideros y cámaras, complementario a ello durante el relleno de grava al ingresar la volqueta a vaciar el material y por la humedad del mismo genero desprendimiento lo que ocasionaron el rasgado de la geomembrana, por lo tanto la zona toco dejarla libre hasta la llegada del técnico contratista y con ello esperar la disponibilidad y traslado hasta el proyecto dado que el contratista está ubicado en Bogotá.









Evidencia fotográfica de los daños causados por la lluvia, donde el terreno genera peso y rasga geomembrana.

Otro punto que cabe mencionar es en cuestión a la construcción del sifón puesto que este es un punto importante del proyecto y además debe ser con personal especializado, y ha

sido difícil encontrar tanto cotización de suministro como mano de obra, y algunas de las que se han logrado, se sobrepasan presupuestalmente el proyectado dado que inicialmente este ítem contemplaba un presupuesto de $17.813113 con el nombre de, **Suministro e instalación tubería de alta densidad en polietileno para construcción de sifón para acueducto diam 500 mm**, pero este punto estaba muy básico para todo lo que contempla la construcción de esta actividad, es por ello que se solicitó durante reunión a Aquaoccidente un despiece detallado de todos los accesorio y trabajos que se debían desarrollar durante la ejecución e instalación del sifón, teniendo esta información fue necesario recotizar los trabajos y con ello ha demandado más tiempo, por lo que ha sido de estudio tanto para contratista, como interventoría para la búsqueda de la mejor opción para esta actividad.

A continuación, se anexa presupuesto detallado del sifón.

PRESUPUESTO

OBJETO					
Sifon DN 160 mm acueducto (Papayal)					
CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	Vlr. Uni.	Sub-Total
1.	Suministro				
1.1	Suministro Union Brida X Universal en HD. DN 500mm PN 10 (incluye empaques y tornillería)	un	2.00		
1.2	Suministro brida universal (brida loca) en HD. DN 500mm PN 10	un	2.00		
1.3	Suministro Tubería PEAD PN10 PE100 DN 500mm	m	6.00		
1.4	Suministro Portaflancho PEAD PN10 PE100 DN 500mm	un	2.00		
1.5	Suministro Codo termoensamblable 45° PEAD PN10 PE100 DN 500mm	un	4.00		
1.6	Suministro Union electrosoldado en PEAD de 500mm PN10	un	1.00		
1.7	Suministro Tee partida para PEAD PN 10 DN 500x75mm	un	1.00		
1.8	Suministro Portaflancho PEAD PN10 PE100 DN 75mm	un	1.00		
1.9	Suministro Brida universal (brida loca) en HD. DN 75mm PN 10	un	1.00		
1.10	Suministro Valvula de compuerta bridada con volante de operación DN 75mm (incluye tornillería y empaquetaduras)	un	1.00		
1.11	Suministro Válvula ventosa extremo brida, triple acción DN 75mm (incluye tornillería y empaquetaduras)	un	1.00		
		un			
2.00	Obra civil e instalación				
2.1	Localización y replanteo	m	12.00		
2.2	Control de agua durante la instalación (incluye abastecimiento)	gl	1.00		
2.3	Corte y retiro de tubería de AC DN 500mm	m	12.00		
2.4	Instalación Unión Brida X Universal en HD. DN 500mm PN 10 (incluye empaques y tornillería)	un	2.00		
2.5	Instalación brida universal (brida loca) en HD. DN 500mm PN 10	un	2.00		
2.6	Instalación Tubería PEAD PN10 PE100 DN 500mm	m	6.00		
2.7	Instalación Portaflancho PEAD PN10 PE100 DN 500mm	un	2.00		
2.8	Instalación Codo termoensamblable 45° PEAD PN10 PE100 DN 500mm	un	4.00		
2.9	Instalación Union electrosoldado en PEAD de 500mm PN10	un	1.00		
2.10	Instalación Tee partida para PEAD PN 10 DN 500x75mm	un	1.00		
2.11	Instalación Portaflancho PEAD PN10 PE100 DN 75mm	un	1.00		
2.12	Instalación Brida universal (brida loca) en HD. DN 75mm PN 10	un	1.00		
2.13	Instalación Valvula de compuerta bridada con volante de operación DN 75mm (incluye tornillería y empaquetaduras)	un	1.00		
2.14	Instalación Válvula ventosa extremo brida, triple accion DN 75mm (incluye tornillería y empaquetaduras)	un	1.00		
					$ -
				COSTO DIRECTO SUMINISTRO	
				COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + INSTALACIÓN	
				TOTAL COSTO DIRECTO	
					Total
				Administración	
				Imprevistos	
				Utilidad	
				Subtotal Suministros	
				IVA sobre la Utilidad	19%
				TOTAL	$ -

Observaciones: Las cantidades y condiciones aquí enunciadas son aproximadas, en el terreno se deberá ajustarse la realidad de localización y replanteo para cumplimiento de los diferentes entregables a desarrollar y de ser necesario ajustando las cantidades aquí descritas, de acuerdo con la experiencia del contratista a ejecutar las obras.

Presupuesto suministro e instalación del sifón

Es importante tener en cuenta que el proyecto ha tenido un adicional y mayores cantidades por las cuales se ha realizado una solicitud del adicional, y a causa de todos los contratiempos habidos y el tema del sifón ha retardado los procesos de aprobación de este trámite, además de que se ha realizado varias entregas para este trámite y ha sido necesario hacer cambios, adicionar documentación y corregir según los planteamientos de Vallecaucana de Aguas y a la fecha no se ha dado la respuesta afirmativa y de una u otra manera afecta la ejecución de algunas actividades que competen.

Atentamente

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
CÉDULA: 66.774.037
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Rep. Legal

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Respuesta solicitud de información sifón de acueducto Papayal - 2GOP851502024

1 mensaje

aquaoccidente, co.tecnica_cert <co.tecnica_cert.aquaoccidente@veolia.com> 10 de diciembre de 2024, 13:42
Para: gerencia@consitecingenieria.com
Cc: correo@certificado.lleida.net

Cordial saludo,

La Gerencia Operativa de AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P., envía documento con consecutivo 2GOP851502024 y su respectivo anexo.

*****NO RESPONDER - Mensaje Generado Automáticamente*****

El buzón de correo electrónico co.tecnica cert.aquaoccidente@veolia.com, está dispuesto exclusivamente para el envío de comunicaciones de AQUAOCCIDENTE SA ESP

Si usted tiene alguna inquietud sobre el documento anexo, debe escribir al correo co.recepcion.aquaoccidente@veolia.com

---

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

---

2 adjuntos

Hojas de cálculo de Google.pdf
36K

Respuesta sifón Papayal.pdf
182K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Respuesta solicitud de información sifón de acueducto Papayal - 2GOP851502024 (EMAIL CERTIFICADO de co.tecnica_cert.aquaoccidente@veolia.com)

1 mensaje

EMAIL CERTIFICADO de aquaoccidente, co.tecnica_cert <453278@mailcert.lleida.net> 10 de diciembre de 2024, 13:42
Responder a: "aquaoccidente, co.tecnica_cert" <co.tecnica_cert.aquaoccidente@veolia.com>
Para: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo,

La Gerencia Operativa de AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P., envía documento con consecutivo 2GOP851502024 y su respectivo anexo.

*****NO RESPONDER - Mensaje Generado Automáticamente*****

El buzón de correo electrónico co.tecnica cert.aquaoccidente@veolia.com, está dispuesto exclusivamente para el envío de comunicaciones de AQUAOCCIDENTE SA ESP

Si usted tiene alguna inquietud sobre el documento anexo, debe escribir al correo co.recepcion.aquaoccidente@veolia.com

---

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

2 adjuntos

Hojas de cálculo de Google.pdf
36K

Respuesta sifón Papayal.pdf
182K

CONSITEC INGENIERIA

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Respuesta radicado

1 mensaje

Ayala Peñaranda, Miguel Eduardo <mayala@aquaoccidente.com> 10 de diciembre de 2024, 14:34
Para: nri@eva.gov.co, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, "gerencia@consitecingenieria.com" <gerencia@consitecingenieria.com>

Buenas tardes.
Comparto el envío de la respuesta oficial con respecto al Sifón de acueducto.

--

AQUA OCCIDENTE

Miguel Eduardo Ayala P.
Ingeniero Interventor
6022688088 (356)
www.aquaoccidente.com

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

ACUSO DE ENVIO RESPUESTA SIFON PAPAYAL.pdf
586K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Solicitud de tiempo por 30 días del contrato No. 2000.13.05.002.-2023

2 mensajes

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 10 de diciembre de 2024, 16:26
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, gerencia@consitecingenieria.com, SISO Consitec Ingenieria <sisoma@grupoconsitec.com>, juanfeosorio@hotmail.com

Buenas tardes

Ingenieros

Cordial saludo

Adjunto envío documento de solicitud de prorroga contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, cuyo objeto es "Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de palmira, valle del cauca."

Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier inquietud

prorroga diciembre VF.pdf
316K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 10 de diciembre de 2024, 16:32
Para: JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, miguel rodriguez <marodriguezcr7@gmail.com>, Consitec Ingenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Obra Papayal

1 mensaje

Neira Viviana Restrepo. Salazar <nri@eva.gov.co> 10 de diciembre de 2024, 17:40
Para: uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>, Carolina Reina <caroreinab@gmail.com>
Cc: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>, auxiliaringenieria <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>

Muy buen día.

Se revisa el documento enviado por la ingeniera Carolina, favor completar.

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Justificación adición Papayal.docx
15K

Solicitud Prórroga Papayal -2025

De: Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: 12/11/2024 11:26
Para: gerencia@consitecingenieria.com, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

Ingeniera
Isabel Cristina Posso Muñoz
Rp Legal
Consitec Ingeniería

Cordial saludo

Adjunto se envía la solicitud de prórroga del contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, para el 19 de febrero de 2025, con su debida justificación.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

Adjuntos (1 archivo, 411.9 KB)
- 2024-045 Solicitud Prórroga 2025.pdf (411.9 KB)

Corrección anexo 8, anexo 9, anexo 11 y anexo 14

De: ERIKA OLAYA <erika.olaya0711@gmail.com>
Fecha: 12/11/2024 21:42
Para: Auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, Gerencia@consitecingenieria.com

ANEXO 9 BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx

ANEXO 11.xlsx

ANEXO 9 BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx

Adjuntos (7 archivos, 4.3 MB)
- ANEXO 8 final.docx (89.1 KB)
- ANEXO 8 final.pdf (155.2 KB)
- ANEXO 14. INFORME ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO 2000.13.05.002.-2023 DICIEMBRE.pdf (1.4 MB)
- ANEXO 11-2.pdf (508.9 KB)
- ANEXO 11-1.pdf (510.4 KB)
- ANEXO 9.pdf (682.0 KB)
- ANEXO 11.pdf (1.0 MB)

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Aceptado: Comité y socialización Papayal jue 26 de dic de 2024 2pm - 5pm (COT) (gerencia@consitecingenieria.com)

1 mensaje

María Cristina Buelvas Mestra <maria.buelvas@palmira.gov.co> 11 de diciembre de 2024, 10:54
Responder a: María Cristina Buelvas Mestra <maria.buelvas@palmira.gov.co>
Para: gerencia@consitecingenieria.com

María Cristina Buelvas Mestra ha aceptado esta invitación.

Cuándo

jueves 26 de dic de 2024 · 2pm – 5pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados

gerencia@consitecingenieria.com- organizador
auxiliaringenieria@grupoconsitec.com
María Cristina Buelvas Mestra
marodriguezcr7@gmail.com
juanfosorio93@gmail.com
comercial@consitecingenieria.com
uniontemporalpapayal@gmail.com
nri@eva.gov.co

Ver toda la información de los invitados

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

invite.ics
1K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Solicitud Prórroga Papayal -2025

2 mensajes

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 13:27
Para: gerencia@consitecingenieria.com, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

Ingeniera
Isabel Cristina Posso Muñoz
Rp Legal
Consitec Ingeniería

Cordial saludo

Adjunto se envía la solicitud de prórroga del contrato de obra número 2000.13.05.002.-2023, para el 19 de febrero de 2025, con su debida justificación.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente;

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

2024-045 Solicitud Prórroga 2025.pdf
301K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 11 de diciembre de 2024, 11:37
Para: Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, miguel rodriguez <marodriguezcr7@gmail.com>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico
[El texto citado está oculto]

2024-045 Solicitud Prórroga 2025.pdf
301K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Aceptado: Comité y socialización Papayal jue 26 de dic de 2024 2pm - 5pm (COT) (gerencia@consitecingenieria.com)

1 mensaje

nri@eva.gov.co (Google Calendar) <calendar-notification@google.com> 11 de diciembre de 2024, 15:59
Responder a: nri@eva.gov.co
Para: gerencia@consitecingenieria.com

nri@eva.gov.co ha aceptado esta invitación.

Cuándo

jueves 26 de dic de 2024 · 2pm – 5pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados

gerencia@consitecingenieria.com- organizador
auxiliaringenieria@grupoconsitec.com
maria.buelvas@palmira.gov.co
marodriguezcr7@gmail.com
juanfosorio93@gmail.com
comercial@consitecingenieria.com
uniontemporalpapayal@gmail.com
nri@eva.gov.co

Ver toda la información de los invitados

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

invite.ics
1K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Corrección anexo 8, anexo 9, anexo 11 y anexo 14

2 mensajes

ERIKA OLAYA <erika.olaya0711@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 21:42
Para: Auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, Gerencia@consitecingenieria.com

ANEXO 9 BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx

ANEXO 11.xlsx

ANEXO 9 BALANCE-MEMORIA-APU NP.xlsx

7 adjuntos

ANEXO 8 final.docx
66K

ANEXO 8 final.pdf
114K

ANEXO 14. INFORME ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO 2000.13.05.002.-2023 DICIEMBRE.pdf
1068K

ANEXO 11-2.pdf
372K

ANEXO 11-1.pdf
374K

ANEXO 9.pdf
499K

ANEXO 11.pdf
760K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 11 de diciembre de 2024, 21:43
Para: Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>, Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>, miguel rodriguez <marodriguezcr7@gmail.com>

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

CONSITEC INGENIERIA

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **ERIKA OLAYA** <erika.olaya0711@gmail.com>
Fecha: El mié, 11 dic. 2024 a la(s) 9:42 p.m.
Asunto: Corrección anexo 8, anexo 9, anexo 11 y anexo 14
Para: <Auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, <Gerencia@consitecingenieria.com>
[El texto citado está oculto]

---

7 adjuntos

- **ANEXO 8 final.docx**
  66K
- **ANEXO 8 final.pdf**
  114K
- **ANEXO 14. INFORME ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO 2000.13.05.002.-2023 DICIEMBRE.pdf**
  1068K
- **ANEXO 11-2.pdf**
  372K
- **ANEXO 11-1.pdf**
  374K
- **ANEXO 9.pdf**
  499K
- **ANEXO 11.pdf**
  760K

UNION TEMPORAL PAPAYAL
NIT. 901.776.660-1
CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023

UTP-2024-046

Jueves, 12 de diciembre de 2024

Ing.
Isabel Posso
Interventoria
Contrato de obra pública 2000.13.05.002-2023 Vallecaucana de Aguas

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Informes de obra No. 6

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite informe de obra No. 6 para el periodo comprendido entre el 26 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2024 con sus respectivos soportes

Anexos

a) INF-TEC-06 Informe Técnico
b) INF- SST- 06 Informe Seguridad y Salud en el Trabajo
c) INF-AMB-06 Informe de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental
d) INF-PGS-06 Informe de Gestión Social

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Rdo
Ivan Felipe O.
12-12-2024
4:15 pm

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
CÉDULA: 66.774.037
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Rep. Legal

CONSITEC INGENIERIA

NIT. 900.738.802-3

- ANEXO 6.5 Predios, servidumbres y Permisos de intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.
- ANEXO 6.6 Recurso Humano.
- ANEXO 6.7 Maquinaria y Equipo.
- ANEXO 6.8 Registro Fotográfico.
- ANEXO 6.9 Buen manejo del anticipo.
- ANEXO 6.10 Informe del Contratista (Informe técnico obra, informe SST obra, informe ambiental obra, informe social obra).
- ANEXO 6.11 Ficha de seguimiento ambiental (Informe gestión y seguimiento ambiental de interventoría).
- ANEXO 6.12 Ficha de seguimiento SGSST (Informe SST interventoría).
- Adjunto CD con la versión digital del informe.

Agradezco la atención a la presente.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

Isabel Cristina Posso M.

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Representante Legal

Proyecto: FPCC
Reviso: ICPM

Anexo: 2 carpetas y (2) CD

Copia: Ing. Moisés Cepeda Restrepo– Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira.
Archivo

RECIBIDO SIN VERIFICACION

DIC-2-2024
10:19am

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
FECHA DIC-2-2024
HORA 10:19am

CI_INT_PPY-017-2024

Santiago de Cali, 29 de noviembre de 2024

VA1000 0740120675-2024

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero
Director técnico
Avenida 8 Norte N° 24 AN-139
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **ENTREGA DOCUMENTOS SOPORTE SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL Y REFORMULACIÓN, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA.**

Cordial saludo,

De acuerdo con los compromisos contractuales de la interventoría y en atención a la solicitud realizada por la supervisión del proyecto, se hace entrega de los documentos soporte para la solicitud de adición presupuestal y reformulación del proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA.

A continuación, se menciona los documentos:

- Balance de obra N°1 del proyecto CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.
- Memoria de cantidades de obra proyecto CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.
- Análisis comparativo viabilización Vs Reformulación.
- Análisis comparativo de ítems viabilización Vs Reformulación.

CONSITEC INGENIERIA

- Cuadro resumen reformulación.
- Planos actualizados.
- Propuesta económica de la Interventoría – complementaria Balance de obra N°1, necesario para culminar el objeto contractual correspondiente al "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA"., por valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($33.742.890,00) M/CTE, correspondiente a cincuenta y cinco (55) días calendario de ampliación del contrato de obra.
- Oficio Funcionalidad de plan de obras.
- Estudio de Suelos y Geotecnia, según título H norma NSR-10, proyecto "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA", junio de 2024.
- Planos estructurales de muros de contención y memorias de cálculo.
- Anexos y certificaciones requeridas

Quedamos atentos a cualquier solicitud respecto a la presente para resolver a la mayor prontitud posible.

Atentamente,

Isabel Cristina Posso M

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Representante Legal

Proyecto: FPCC
Revisó: ICPM

Anexo: CD

Copia: Ing. Moisés Cepeda Restrepo– Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira.
Archivo

CONSITEC INGENIERIA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
NIT 900933403-1
FECHA 05/12/2024
HORA 3:37pm

RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA DIC 05/DE-2024
HORA 3:37pm

CI_INT_PPY-020-2024

VA 1000-0702-0732-2024

Santiago de Cali, 5 de diciembre de 2024

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Moisés Cepeda Restrepo
Gerente
Avenida 8 Norte N° 24 AN-139
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL INTERVENTORÍA N°2**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la cláusula 8. FORMA DE PAGO del contrato de la referencia y actas parciales de obra N°2, N°3, N°4 y N°5 del contrato de obra N°2000.12.05.002-2023 cuyo objeto es "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA", presentadas por la UNIÓN TEMPORAL PAPAYA el 21 de agosto, 18 de octubre, 18 de noviembre y 4 de diciembre de 2024 respectivamente, a continuación se remiten los documentos requeridos por la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP para el trámite del pago del acta de recibo parcial de interventoria N°2 para su información y fines pertinentes.

1. Acta de avance y recibo parcial de interventoria N°2
2. Prefactura

Calle 13C #75-95 C43 Cali VC / Carrera 12 # 5-65 Piso 2 Guadalajara de Buga VC
Telefono: 6026933535 / Celular: 3137219635 – 3137218443
Correo electronico: gerencia@consitecingeniería.com

CONSITEC INGENIERIA

3. Certificación bancaria.
4. Certificación pagos parafiscales

Agradezco la atención a la presente.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Atentamente,

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Representante Legal

Proyectó: ICPM
Revisó: MHD

Copia: Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero – director técnico Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira.
Archivo

ACTA No. 02

CONTRATO No.	2000.13.12.001-2024
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE ENERO DE 2024
RESOLUCIÓN CESION No.	2000.45.03.162-2024
FECHA RESOLUCIÓN:	24 DE JUNIO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°.LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA-MUNICIPIO DE RESTREPO- VALLE DEL CAUCA" y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYA–L / MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
VALOR CONTRATO:	TOTAL: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 337.233.433) M/CTE. FRENTE PALMIRA: ($225.160.777) FRENTE RESTREPO: ($112.072.656).
ANTICIPO:	$0
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	$0
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE FEBRERO DE 2024
VALOR TOTAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 337.233.433) M/CTE.
PLAZO:	13 MESES
PLAZO TOTAL:	13 MESES
PORCENTAJE EJECUTADO:	88.75%
FECHA DE TERMINACION:	14 DE MARZO DE 2025

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

En Santiago de Cali, el día 4 de diciembre de 2024, en las instalaciones de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, se reunieron: **ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.557.759 en representación de **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS** en calidad de Contratista, y **MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.619.188 en representación de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P** calidad de SUPERVISOR del Contrato N°2000.13.12.001-2024, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de SUPERVISOR del Contrato No. 2000.13.12.001-2024, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de las obras realizadas conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 26 de junio de 2024 y el 03 de diciembre de 2024, equivalentes al 51.31% de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.

2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 26/06/24 hasta 25/11/24. (Ver anexo).

3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución
Acta Pago parcial N°01	14/08/2024	$ 84.300.192	37.44%
Acta Pago parcial N°02	04/12/2024	$115.529.997	51.31%
TOTALES		**$199.830.189**	**88.75%**

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

5. El contratista aporta certificado de pago de seguridad social y aporte parafiscales expedido por el representante legal y el revisor fiscal.

6. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago, por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($115.529.997) M/CTE** a la Empresa **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS.**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 4 de diciembre de 2024.

Isabel Cristina Posso M

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS	**MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO**
Contratista	Supervisor del Contrato

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

GRUPO CONSITEC INGENIERIA S A S
NIT 900.738.803-3
Carrera 4 # 13-31 oficina 302
Tel: (Celular) 3137219635 - (602) 6833535
Yumbo - Colombia
gerencia@consitecingenieria.com

No. FE 20

Señores	Vallecaucana de Aguas S.A. ESP		
NIT	900.333.452-1	**Teléfono**	(602) 66538 - Ext. 000
Dirección	Avenida 8 norte 24 AN 147	**Ciudad**	Yumbo - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-12-06	2025-01-06

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial N°2 contrato interventoria N°2000.13.12.001-2024 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES PARA EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROLDE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.	1.00	115,529,997.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento quince millones quinientos veintinueve mil novecientos noventa y siete pesos m/cte

Total Bruto	97,084,031.09
IVA 19%	18,445,965.91
Total a Pagar	115,529,997.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-06 por $ 115,529,997.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Palmira, 2 de diciembre de 2024

Señor

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT No. 900738802 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Numero Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	06600096717	2023/04/28	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

CONSITEC
INGENIERIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Yo **ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía N°**38.557.759** de Cali (V), en mi calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS** sociedad constituida mediante matrícula N°02463001 otorgada en Bogotá D.C. el día 9 de junio de 2014 y actual matrícula N°1223235-16 del 14 de junio de 2024 en el ciudad de Cali (V) por cambio de domicilio de la empresa, manifiesto bajo gravedad de juramento que la entidad **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS**, ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud – EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, las Cajas de Compensación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Cali (V) a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2024.

Isabel Cristina Posso M.

Isabel Cristina Posso M.
C.C. 38.557.759 de Cali (V)
Representante Legal

Miguel Andrés Escobar
Contador Público Titulado
T.P. 174707-T.

OFICIOS CI_INT_PPY-019-2024 Y CI_INT_PPY-021-2024

De: "Auxiliar de Ingenieria Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 12/09/2024 09:09
Para: uniontemporalpapayal@gmail.com
Cc: mzm@eva.gov.co, nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Señores
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Atn. Sra. Elia Deigenitris Ordoñez
Representante Legal
Correo electrónico: uniontemporalpapayal@gmail.com

Adjunto archivos con los oficios CI_INT_PPY-019-2024 con asunto RENDIMIENTO DE OBRA Y POSIBLE CONTINGENCIA y CI_INT_PPY-021-2024 con asunto ENTREGA INFORMACION PENDIENTE, INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES, para su conocimiento y fines pertinentes.

Adjuntos (2 archivos, 3.6 MB)
- 19. rendimiento obra_MH_OK.pdf (2.3 MB)
- 21. Info Hojas de vida_Mh_OK.docx.pdf (1.4 MB)

OFICIO CI_INT_PPY-022-2024 PÓLIZAS ACTUALIZADAS CO PAPAYAL PALMIRA

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 12/11/2024 09:42
Para: mzm@eva.gov.co
Cc: nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Miguel Edinson Zuluaga Montero
Director técnico

Adjunto archivo con el oficio CI_INT_PPY-022-2024 con asunto ENTREGA PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA, para su conocimiento y fines pertinentes.

Adjuntos (1 archivo, 3.7 MB)
- 22. 09_12_2024_Entrega polizas obra.pdf (3.7 MB)

OFICIO CI_INT_PPY-023-2024 SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA PROYECTO PAPAYAL PALMIRA

De: "Auxiliar de Ingenieria Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 12/11/2024 17:35
Para: mzm@eva.gov.co
Cc: nri@eva.gov.co
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. **MOISÉS CEPEDA RESTREPO**
Gerente

Adjunto archivo con el oficio CI_INT_PPY-023-2024 con asunto SOLICITUD PRORROGA, donde se exponen las diversas circunstancias que no permitieron culminar el contrato de obra en el plazo contractual, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Adjuntos (1 archivo, 2.0 MB)
- 23. 11_12_2024_sol. prorroga II_ICPM_OK.pdf (2.0 MB)

Formatos solicitud adicional y reformulación - Papayal

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 12/16/2024 11:39
Para: nri@eva.gov.co

Cordial saludo.

De acuerdo a su solicitud, adjunto envío los formatos solicitados.

Cordialmente,

Juan Felipe Osorio Rios
Profesional de apoyo - Grupo Consitec Ingenieria SAS

Adjuntos (4 archivos, 12.6 MB)
- ANEXO 8cor.docx (87.2 KB)
- 23. 11_12_2024_sol. prorroga II_ICPM_OK.docx (96.1 KB)
- Anexo 14 ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO 2000.13.05.002.-2023 DICIEMBRE (1).docx (12.3 MB)
- 16. Oficio 16 sol._adicional_Palmira.docx (96.3 KB)

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	Diciembre de 2024
MATERIAL:	VARIOS
CANTIDAD PARA PRUEBA:	18
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	RESISITENCIA A LA COMPRESIÓN DE CONCRETO y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO, CALIDAD DE MALLA ELECTROSOLDADA, CALIDAD TB ALC NOVAFORT 58 315MM(12) 6M, CALIDAD TB ALC NOVAFORT 58 400MM(16) 6M Y CALIDAD TB ALC NOVAFORT 58 355MM(14) 6M
LOCALIZACION:	CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL
LABORATORIO:	Geotecnicas Guapacha S.A.S, Sidoc, Pavco
NORMA - ESPECIFICACION:	INV-E 410, NTC 5806, NTC 3722-3

ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1	Resistencia a la compresión	4501psi	Rc> 3000 psi	S	Ensayo a los 7 días (8 de noviembre de 2024)	
2		4581psi	Rc> 3000 psi	S		
3		4542 psi	Rc> 3000 psi	S		
4	Resistencia a la compresión	5590 psi	Rc> 3000 psi	S	Ensayo a los 14 días (15 de noviembre de 2024)	
5		5594 psi	Rc> 3000 psi	S		
6		9603 psi	Rc> 3000 psi	S		
7	Resistencia a la compresión	5650 psi	Rc> 3000 psi	S	Ensayo a los 28 días (29 de noviembre de 2024)	
8		5430 psi	Rc> 3000 psi	S		
9		5250 psi	Rc> 3000 psi	S		
10	Calidad Malla electrosoldada	longitudinal: 0,44 Transversal: 0,45	mayor a 0,36	S	altura promedio resalte (mm)	
11		longitudinal: 6,25 Transversal: 6,25	4,62<Esp<7,24	S	Esp. Promedio de Resalte (mm)	
12		longitudinal: 4,00 Transversal: 4,00	3,50<Esp<5,50	S	Esp. Longitudinal de los resaltes (No Resaltes)	
13		longitudinal: 52 Transversal: 52	45°-70°	S	Angulo Resalto	
14		longitudinal: 31 Transversal: 31	>25%	S	Area superf. Total grafilada (%)	
15		longitudinal: 3 Transversal: 3	2	S	Lineas de resalte	
16		longitudinal: 715 Transversal: 702	>585 Mpa	S	Resistencia a la tracción (Ensayo de doblado)	
17		longitudinal: 675 Transversal: 660	>515 Mpa	S	Fluencia (Ensayo de doblado)	
18		longitudinal: 696 Transversal: 674	>550 Mpa	S	Resistencia a la tracción	
19		longitudinal: 485 Transversal: 485	>485 Mpa	S	Fluencia	
20		18,493 N	> 12,122 N	S	Resistencia al corte en la soldadura	
21		longitudinal: 15,1 cm Transversal: 15,2 cm	>15 cm	S	Separación Grafiles (Tolerancia +/- 0,63 cm)	

22		longitudinal: 7,3 cm Transversal: 5 cm	Longitudinal 7,5 cm Transversal 5 cm	S	Longitud de pelos (Tolerancia +/- 1,3 cm)	
23			Sin agrietamiento	S	Ensayo de doblado (90°)	
24	Calidad TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M	314,67 mm	313,2 mm - 316 mm	S	Diámetro Exterior Promedio	
25		285,52 mm	270 mm - 291,6 mm	S	Diámetro Interior Promedio	
26		2,55 mm	1,90mm - 8 mm	S	Espesor de Pared Interno -P	
27			Min:30% (carga creciente) y sin grietas	S	ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS	
28				S	HERMETICIDAD DE LA UNIÓN	
29				S	INSPECCIÓN VISUAL	
30	Calidad TB ALC NOVAFORT S8 355MM(14) 6M	354,48 mm	353 mm - 357 mm	S	Diámetro Exterior Promedio	
31		325,87 mm	325,5 mm - 327,5 mm	S	Diámetro Interior Promedio	
32		2,25 mm	2,00 mm - 8,00 mm	S	Espesor de Pared Interno -P	
33			Min:30% (carga creciente) y sin grietas	S	ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS	
34				S	HERMETICIDAD DE LA UNIÓN	
35				S	INSPECCIÓN VISUAL	
36	TB ALC NOVAFORT S8 400MM(16) 6M	400,60 mm	397,6 mm - 401,2 mm	S	Diámetro Exterior Promedio	
37		364,83 mm	340 mm - 368,80 mm	S	Diámetro Interior Promedio	
38		3,76 mm	2,30 mm - 8,00 mm	S	Espesor de Pared Interno -P	
39			Min:30% (carga creciente) y sin grietas	S	ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS	
40				S	HERMETICIDAD DE LA UNIÓN	
41				S	INSPECCIÓN VISUAL	
42	Toma de muestras de concreto				Se toma 9 muestras de cilindros en fudición de cámaras (19 de diciembre de 2024)	

Firma

Nombre: Elia Deigendris Ordoñez
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Marco Hoyos Osorio
REPRESENTANTE CONSITEC INGENIERÍA INTERVENTORIA

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES

I. LICENCIAS AMBIENTALES

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
1	Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados / Ante la CVC	APROBADO - 0722-00260 del 5 de abril de 2024 /Vigencia 12 meses (5 abril de 2025)
2	Oficio UTP-2024-025 Solicitud de asignación de áreas para siembra por compensación forestal	Oficio dirigido a la Directora de Gestión de Medio Ambiente de la Alcaldía de Palmira para solicitar apoyo para la identificación y selección de áreas disponibles en el municipio para realizar la siembra por compensación.
3	TRD - 2024-330.11.28.31 de fecha 14 de agosto del 2024. Respuesta solitud de asignación de áreas para siembras por compensación forestal	Oficio enviado por la Dirección de Gestion del Medio Ambiente, dando respuesta a la solicitud de asignación de áreas para siembra por compensación forestal, informando que actualmente la Alcaldía de Palmira no tiene identificadas áreas potenciales para la reposición y/o propuesta de compensación solicitada. Por lo que recomiendan seguir las directrices establecidas en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	N/A	N/A
2		
3		

III.CONCESION DE AGUAS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	N/A	N/A
2		
3		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Version: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCION
1	Informe de gestión social mensual N°9 firmado por la residente social Elizabeth Bravo Naranjo de la interventoria GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.	Se detalla el acompañamiento y supervisión por parte de la interventoria a las actividades de gestion social en el periodo entre el 26 de noviembre y 25 de diciembre de 2024

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	Informe de gestion social mensual N° 9 periodo del 26 de noviembre y 25 de diciembre de 2024 de la interventoria GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.	Se adjunta documento y anexos
2		
3		
4		

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA N°9
GESTIÓN SOCIAL
PERIODO: NOVIEMBRE 26 A DICIEMBRE 25 DE 2024

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13. 05.002-2023

CONSITEC INGENIERIA SA

R.L. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

RL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA VALLE DEL CAUCA

Presentado a:

Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor

Ing. NEIRA RESTREPO - Apoyo a la supervisión

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

DICIEMBRE 2024

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. GESTION SOCIAL 4
2.1. Programa de información y divulgación 4
2.2. Programa Participación comunitaria 4
2.3. Programa conservación de hojas de vida 5
2.4. Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público. 5
3. OBSERVACIONES 7
4. CONCLUSIONES 7
5. RECOMENDACIONES 7

LISTADO DE FOTOS

Foto. 1 Cartelera informativa y valla del proyecto 4
Foto. 2 Punto PAC y valla informativa 5
Foto. 3 Buzón de sugerencia y volante divulgado para recorrido veeduría 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Control hojas de vida 5
Tabla 2. Control personal adjunto en obra 6
Tabla 3. Control personal adjunto en obra 6

1. INTRODUCCION

La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos de obra. Ésta permite que las comunidades cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social para el mejoramiento de los proyectos, motivo por lo que el contratista de obra debe tener un programa de participación ciudadana y programa de conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL, con el fin de que se construya una vinculación entre la comunidad y el ejecutor, durante el inicio de las actividades físicas del contrato entrego a la interventoría el informe de gestión social, el cual realizará mensualmente para revisión de la interventoría, finalmente estos serán entregados como anexo en los informes mensuales de interventoría a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

La empresa Consitec Ingeniería SAS quien ejecuta la interventoría del contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA se encarga de realizar el control a cada una de las etapas constructivas de manera que se puedan evidenciar acciones en pro del cuidado de la comunidad y el personal que trabaja en estos espacios y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generen cambios positivos, finalmente, contribuyan a la conservación de las vidas y la integridad física.

En el presente documento se relacionan las actividades que el contratista de obra ha desarrollado como parte del cumplimiento del programa de gestión social durante el periodo de este informe entre el 26 de noviembre y 25 de diciembre de 2024. Además, tiene como objetivo ilustrar las actividades efectuadas por la interventoría para garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas definidos por el contratista para la gestión social.

2. GESTION SOCIAL

Para dar cumplimiento al programa la interventoria verifica las actividades que cumple la profesional del área social del contratista Unión Temporal PAPAYAL en obra y en las áreas aproximadas al proyecto.

A continuación, se relaciona los aspectos de gestión social que son efectuados por el contratista de obra, supervisados por la interventoria.

2.1. . Programa de información y divulgación

El contratista realizó la entrega de volante con el fin de informar el avance de obra a la comunidad, en el cual se consigna los avances técnicos, ambientales, sociales y de seguridad en el trabajo de la obra. La interventoría revisó y aprobó el volante por medio de correo electrónico volante N° 9.

Además, el contratista realizo seguimientos en los comités técnicos cumpliendo con lo programado y en el plan de trabajo, la información aprobada y entregada por el contratista a la comunidad se encuentra publicada en la cartelera ubicada en el punto PAC.

Foto. 1 Cartelera informativa y valla del proyecto.



Fuente: Consitec ingeniería.

2.2. Programa Participación comunitaria

Respecto a este programa, el contratista de obra estableció un PAC – Punto de atención a la comunidad, ubicado cerca del área de influencia en el barrio Urbanización PAPAYAL en la dirección calle 27 # 13-06, donde además cuenta con una linea de atención al usuario con los siguientes números de teléfono: 3007500720–3242147813, esto es con el fin de brindar mayor información a la comunidad, los horarios de atención son de 8:00 a.m. a 12:00m y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. los lunes, martes y jueves, por esta razón el contratista ubico el PAC estratégicamente en la zona de influencia directa del proyecto para facilitar y garantizar que la comunidad participe de manera activa y puedan dar a conocer sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

La interventoria confirma que en el PAC no se recibieron PQRS, ni derechos de petición, ni tampoco sugerencias en el buzón por parte de la comunidad; también se confirma que la valla, el pendón y el buzón de sugerencias se encuentran en buen estado.

Foto. 2 Punto PAC y valla informativa



Fuente: Consitec ingeniería

Foto. 3 Buzón de sugerencia y volante divulgado para recorrido veeduría



Fuente: Consitec ingeniería

2.3. Programa conservación de hojas de vida

La interventoria informa que en el seguimiento que se realiza al programa en el area social,en el punto PAC no se recibieron hojas de vida.

Tabla 1. Control hojas de vida.

PERIODO	PERSONAL	No DE TRABAJADORES
26 de noviembre al 25 de diciembre de 2024	Personal de 18 a 40 años	0
	Personal de 41 a 60 años	0
	Personal mujeres	0

2.4. Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

Las caracteristicas del patrimonio edificado de propiedad privada, cuyo deterioro es un problema que puede afectar el proyecto que se está ejecutando en el municipio de Palmira Valle del Cauca, justifica su importancia como elementos de identidad social y como generadores de beneficios

económicos, para que el estado intervenga en la conservación de sus inmuebles; por tal motivo durante la ejecución del contrato de obra, el contratista está en la obligación de realizar unas actas de vecindad a las viviendas del sector donde se revise y verifique el estado físico de los predios para así corroborar el estado de los inmuebles y evitar generar daños al momento de la construcción del proyecto.

De acuerdo con lo anterior y con la información suministrada se realizarán seguimientos en las zonas que estén junto al área de influencia del proyecto para evitar PQRS por daños a las propiedades, si los predios presentan modificaciones en sus fachadas, se consignara estos cambios en un acta de vecindad, actualizando esta información con su respectivo registro fotográfico, de tal manera que al finalizar el proyecto se recopilará nuevamente la información para dar cierre a las actas de vecindad.

2.5. Mano de obra

En este programa se fomenta y fortalece la vinculación laboral del personal del área de influencia del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la región en disminución del desempleo, y en generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra.

La interventoría verifica y confirma el número de trabajadores que está laborando en la obra en este periodo que comprende del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2024.

Tabla 2. Control personal adjunto en obra

PERIODO	PERSONAL	No DE TRABAJADORES
26 de noviembre al 25 de diciembre de 2024	Mano de obra Calificada	12
	Mano de obra no Calificada	7

Tabla 3. Control personal adjunto en obra

PERIODO	PERSONAL	No DE TRABAJADORES
26 de noviembre al 25 de diciembre de 2024	Mano de obra personal Palmira	2
	Mano de obra calificada de otros municipios	5
	Mano de obra no calificada de Palmira	6
	Mano de obra no calificada otros municipios	5

El contratista en su informe no relaciona el personal indirecto, pero si cumple con la entrega de las planillas de seguridad para su revisión y verificación en campo por parte de la interventoría

Con la información mencionada en la tabla se referencia que el proyecto cuenta con un total de 18 trabajadores a la fecha del periodo de este informe que es del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2024.

3. OBSERVACIONES

Se le solicita al contratista entregar los informes de gestión social los días 28 de cada mes para su revisión y aprobación antes de entregarlo de manera física.

4. CONCLUSIONES

- Según las verificaciones por parte de la interventoría se da el visto bueno de la información recibida y verificada en el programa de gestión social.

5. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda al contratista, Anexar copias o formato de conservación de las hojas de vida que se reciben en el PAC.

Para constancia se firma en Palmira Valle del Cauca a los cinco (5) días del mes de enero de 2025.

Elaboró
Elizabeth Bravo Naranjo
Profesional Social

Aprobó
Ing. Isabel Cristina Posso Muñoz
Directora de Interventoría

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS

I. PREDIOS

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	N/A	N/A	N/A
2			

II. SERVIDUMBRES

No.	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	N/A	N/A	N/A
2			

III. PERMISOS

No.	ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS (Propietario predio manzana 1 lote 27 urbanización la Riviera y Contratista)	El Contratista se puso en contacto con el propietario del predio manzana 1 lote 27 urbanización la Riviera para el almacenamiento de material de excavación, por lo que el propietario informa que no tiene inconveniente con realizar el acopio de material en su predio, dejandose constancia en el acta de vecindad de este predio.	Realizado

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	JAMES CASQUETE GARCIA	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA	COORDINAR Y APROBAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE AFECTEN A LA OBRA CON RESPECTO A CONTRATISTAS, MATERIALES, EQUIPOS, SERVICIOS Y PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO Y LAS RESPECTIVAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE CONTRATOS. REVISAR EL INFORME DE CANTIDADES, CONTROLA Y LIQUIDAR FACTURAS DE CONTRATISTAS. PRESENTAR ACTAS DE MANERA OPORTUNA. COORDINAR ACTIVIDADES DEL PERSONAL A CARGO.
2	CAROLINA REINA BOLAÑOS	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ANTES DE COMENZAR LA OBRA. ASISTIR A COMITES DE OBRA. VERIFICAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. BUSCAR PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DEL AGUA EN LA OBRA.
3	EDGAR CIRILO BANGUERA	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	ELABORACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA EN CAMPO, REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. ASISTIR A COMITES DE OBRA. COORDINAR CON FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS. COMPROBACIÓN Y MEDIDAS DE OBRA REPORTADAS POR EL MAESTRO DE OBRA. CHEQUEO Y CUMPLIMIENTOS DE TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
4	DAVID FELIPE VALDEZ	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN. ENTREGAR DATOS A TIEMPO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, NIVELACIONES Y DEMÁS INFORMACIÓN SOLICITADA. VERIFICAR EL ESTADO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS.
5	ONEIDA QUIÑONES VERA	TRABAJADORA SOCIAL	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	PREVENIR Y ANTICIPAR LAS POSIBLES CAUSAS DE CONFLICTOS TANTO INDIVIDUALES COMO COLECTIVOS DENTRO DE LOS FRENTES DE LA OBRA. ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE TENGA OBJETIVOS CONCRETOS Y HAGA EXPLICITO EL PROCESO DE ANÁLISIS, ASÍ COMO LAS POSIBILIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y EVOLUCIÓN. IMPLEMENTAR TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE PERMITEN EVALUAR E INTERVENIR EN LOS PROBLEMAS O SITUACIONES DENTRO DEL FRENTE DE OBRA.
6	JENNY DAYANA CERON BEJARANO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINAR LA ACCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE. MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO CON EL PERSONAL VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN PARA FACILITAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SUS SOLICITUDES. COORDINAR LAS REUNIONES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.
7	ANA MILETH TOBAR ARBELAEZ	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINAR LA ACCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE. MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO CON EL PERSONAL VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN PARA FACILITAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SUS SOLICITUDES. COORDINAR LAS REUNIONES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA				
No.	NOMBRE	FORMACIÓN ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	INGENIERA CIVIL	INGENIERA DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EL DIRECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA SE ENCARGA DEBE CONTROLAR, REVISAR Y SUPERVISAR TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, DE FORMA EFECTIVA, CON EL FIN DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES Y LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS, PRESUPUESTALES, SOCIALES, AMBIENTALES HACIENDO SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS. APROBAR O RECHAZAR PROCEDIMIENTOS O ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN, DAR RECOMENDACIONES E IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO SE DEBEN ACOMETER LOS TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA.
2	DIANA SORAYA SANCHES FERRER	INGENIERO SANITARIA	INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	COORDINAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y ACORDADAS POR VALLECAUCANA. COORDINAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS SE REALICEN CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y NORMAS VIGENTES. COORDINAR, SUPERVISAR Y PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTARAN CADA UNO DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA, BUSCANDO CUMPLIMIENTO, CELERIDAD Y CALIDAD EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR. BRINDAR SOLUCIONES TÉCNICAS A INCONVENIENTES SURGIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE MEMORIAS DE DISEÑO Y PLANOS TÉCNICOS Y VELAR POR SU CORRECTA EJECUCIÓN.
3	ALEJANDRO BERMUDEZ LOPEZ	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	HACER UN SEGUIMIENTO DETALLADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS PARA CADA MEDIDA DE MANEJO Y REPORTAR INCONFORMIDADES. PREVENIR LA GENERACIÓN DE IMPACTOS HACIENDO CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA CADA PROGRAMA Y MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL PRESENTADA EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
4	SINDY PATRICIA ARISTIZABAL	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EL EL PLAN DE TRABAJO. SEGUIMIENTO A LAS PLANILLAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL MES A MES. REVISIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJO Y SU DEBIDO DILIGENCIAMIENTO, REVISIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COPAST (SI APLICA), REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES INCLUIDOS PARA LA OBRA, REVISIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
5	ELIZABETH BRAVO NARANJO	PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	SUPERVISAR REVISAR Y APROBAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL QUE REALICE EL CONTRATISTA DE LA OBRA. ASISTENCIA A COMITES DE OBRA. REALIZAR COMITÉ SOCIAL DONDE SE REVISE LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO.
6	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARISTIZABAL	TECNOLÓGO TOPOGRAFIA	INGENIERO TOPOGRAFO	VERIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA, REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN LOS PLANOS APROBADOS. CONCILIACIÓN DE CANTIDADES CON EL CONTRATISTA PARA SU DEBÍA APROBACION Y POSTERIOR PAGO
7	FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	INSPECTOR DE OBRA	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, DOCUMENTACIÓN DE AVANCES Y REQUERIMIENTOS DE LA OBRA. INFORMAR OPORTUNAMENTE AL RESIDENTE DE ACTIVIDADES QUE NO ESTÉN CUMPLIENDO Y HACER SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO.

Firma
Nombre: ELIA DE GENTRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma
Nombre: MARCO HOYOS OSORIO
REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACION
1	MINICARGADOR	CATERPILLAR	2010	SI	Zona de intervencion del proyecto	regado de grava para filtro	N/A
2							
3							

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

CONTRATISTA

Equipo	Descripcion	Precision	Certificado Calibración No.	Fecha de calibracion	Vigencia certi.	No. Serie / ID
Durante el periodo correspondiente a este informe no se realizaron actividades que requieran el uso de equipos de medición.						

CERTIFICADOS DE VERIFICACION EQUIPOS DE TOPOGRAFIA VIGENTES HASTA

INTERVENTORIA

ITEM	VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA
1	CAMONETA WAGON	AUDI	2021	KPX513
2	MOTO	BAJAJ	DOMINAR 400 2022	XBX50F
3	MOTO	YAMAHA	XTZ 150 2023	TEU49G
4	MOTO	VICTORY ADVANCE R 125	2022	BFY45G

CONTRATISTA

Firma

Nombre: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: MARCO HOYOS OSORIO

REPRESENTANTE LEGAL CONSITEC INGENIERÍA INTERVENTORÍA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité técnico N°14



Comité técnico N°15



Comité técnico N°15



Instalación de cámaras de almacenamiento de aguas lluvias y relleno superior con grava



Conexión de tubería y accesorio para empalme entre cámarasy el sistema de almacenamiento de aguas lluvias



Instalación de geotextil sobre grava y posterior relleno con material de sitio.

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Demolición de pavimento



Demolición de pavimento



Excavación para instalación de tubería



Excavación para instalación de tubería



instalación de tubería para conexión de cámaras y sumideros



Fundición de cámara en vía para conexión de tuberías de sumideros y cámaras conjuntas

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

CONTRATO No. :	2000.13.05.002-2023	
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	
VALOR DEL CONTRATO:	$	2.690.950.820,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
INTERVENTOR:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	
PLAZO:	5 MESES	
VALOR ANTICIPO :	30% $	807.285.246,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 442.069.401,01		$ 442.069.401,01	$ 442.069.401,01	$ -
2	OBRAS CIVILES	$ 321.783.899,05		$ 321.783.899,05	$ 321.783.899,05	$ -
3	GASTOS BANCARIOS GMF	$ 3.067.683,94		$ 3.067.683,94	$ 3.067.683,94	$ -
4	IMPUESTO POR ESTAMPILLA	$ 40.364.262,00		$ 40.364.262,00	$ 40.364.262,00	$ -
	TOTALES	**$ 807.285.246,00**	**$ -**	**$ 807.285.246,00**	**$ 807.285.246,00**	**$ -**

Firma

Nombre: Elia Deigenitris Ordoñez
REPRESENTANTE DEL

Firma:

Nombre: Marco Hoyos Osorio
REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
