"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	x

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**			1						
1.2	**Periodo del informe**	**Del**	30	05	2025	**Al**	18	07	2025	
1.3	**Contrato #**	FGN-RNOCC-0032 DE 2025	**Fecha**	22	05	2025	**Tipo de Contrato**	COMPRAVENTA		
1.4	**Objeto**									
CONTRATO DE COMPRAVENTA CON INSTALACION MONOFASICA A 200 VOLTIOS DE UPS DE 6 KVA PARA LA SEDE DE ALEJANDRIA ANTIOQUIA Y PARA LAS SEDES DE SAHAGUN Y CHINU CORDOBA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.										
1.5	**Nombre del contratista**									
INVERSIONES VASQUEZ Y ASOCIADOS S.A.S "V2M"										
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**			
901.924.018-6						Inversionesvasquezasociados.sas@gmail.com				
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**			
Calle 151 # 11-32 Bogotá						6015013868				
1.10	**Fecha de Inicio**		30	05	2025					
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	x		Registro Presupuestal	x						
Aprobación Garantía	x		Suscripción del Contrato	x						
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica	x	No Aplica		Fecha	29	07	2025	

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** *(Agregar las filas que se requieran)*		
JAIRO ALONSO DUQUE LOPEZ			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ADMINISTRACION DE SEDES		N/A	
2.4	Correo electrónico	Jairo.duquel@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO			
3.1	Valor inicial del contrato			
Es hasta por la suma de	$84.046.368,00			Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	NO	X

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A		$
N/A		$
TOTAL		$

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
18625	09/05/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
171625	27	05	2025

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha			

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
18/07/2025	$ 84.046.368,00	0	84.046.368,00	0,00

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A						

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	%100

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	%100

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet - Su impresión o descarga no controlada Copia No Controlada

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
APORTES	87845829 DE JULIO DE 2025

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**18**	**07**	**2025**

GIOVANNA A DAZA QUINTANA CC 52.198.556 TP # 118375 T

5.	**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X			
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Este documento es Copia fiel del original reposado en la Entidad. Sin impresión o descarga no tiene validez una Copia No Controlada

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI	x	NO		N/A	
Tipo y detalle del informe:	Se anexa los recibos de las ups de cada sitio donde fue instalada					

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	x	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista entrego, instalo y dejo funcionando los equipos con el recibido correspondiente

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Ups 40 kva cti montería serial 31003058e**7147200002 (Córdoba)**	un	1	1
2	Ups 30 kva caivas montería serial 110032996e**73342500003 (Córdoba)**	un	1	1
3	Ups 6kva chinú serial 250306-**21540011** y ups 6kva sahagun serial 250306-**21540039 (cordoba)**	un	2	2
4	Ups 6kva Alejandría serial 241211-**87670132 (Antioquia)**	un	1	1

(*Agregar las casillas que sean requeridas SI no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga constituye una Copia No Controlada

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*						
Malo		Regular		Bueno	x	N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista instalo según lo contractual y dejo claro si quedaban pendientes no contractuales

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Se recibe factura #5 del 18/07/2025 por valor de $ 2.750.899,20 de ups instalada en Alejandría Antioquia, se recibe factura # 4 del 18/07/2025 por valor de $ 81.295.488,80 de ups instaladas en Sahagún, chinú, cti monteria y Caivas Montería del departamento de Córdoba de las cuales todas quedaron funcionando, la de chinú quedo funcionando pero no soportando la carga debido a distancias mayores no contractuales la cual se resolverá en otro contrato de acometidas eléctricas. Las ups de la sede caivas y cti monteria quedaron funcionando pero con la anotación de la necesidad de aumento de acometidas según especificaciones del contratista para temas de garantías.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
Jairo Alonso Duque Lopez	71.687.520

Ciudad	Medellín	fecha	18	07	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Jairo Alonso Duque Lopez		18/07/2025
Revisó			

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Energia y Tecnologia

ACTA DE ENTREGA -REMISIÓN

EN LA CIUDAD DE ALEJANDRIA - ANTIOQUIA, SE REUNIERON EL SEÑOR DANIEL GERARDO CIPRIANI CRUZ, EN REPRESENTACION DE EL CONTRATISTA, Y EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE, EN REPRESENTACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, CON EL FIN DE HACER ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTEMPLADOS EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA PROCESO No. No. FGN-RNOCC-MC-0041- 2025. , SE FIRMA EN ALEJANDRIA - ANTOQUIA A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025,

No	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	SERIAL
1	UPS 3KVA - INCLUYE BANCO DE BATERIAS	POWEST	3KVA	241211-87670132
2	TARJETA SNMP	POWEST	NET AGENT A 10/100/1000	3927571635

DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR LOS EQUIPOS QUE LA ENTIDAD REQUIERA SE ENTREGAN CON LA RESPECTIVAS CONEXIONES ELECTRICAS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

APROBO:

NOMBRE: DANIEL GERARDO CIPRIANI CRUZ
V2M

FIRMA


RECIBIO:

NOMBRE: Maria Eugenia Gutierrez Vargas
FISCALIA GENERAL DE LA NACION


FIRMA

Powered by CamScanner


SEDE ALEJANDRIA UPS 3 KVA

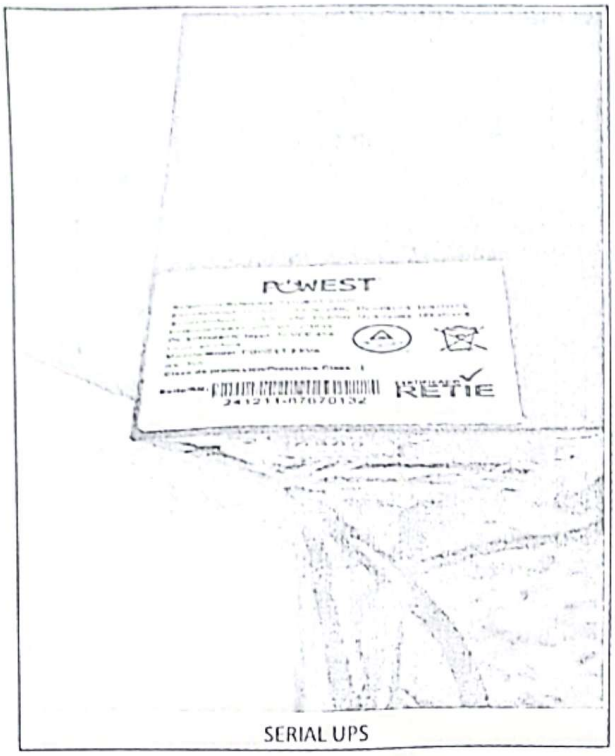


SERIAL UPS

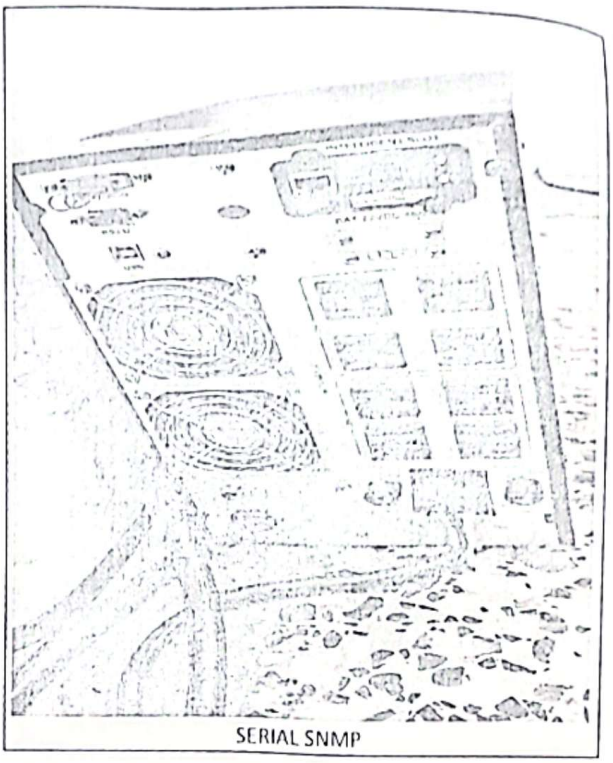

SERIAL SNMP

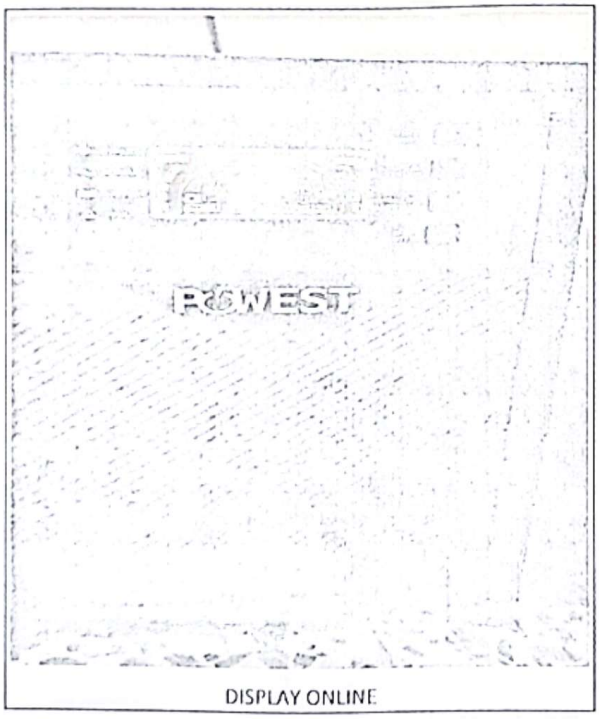

DISPLAY ONLINE

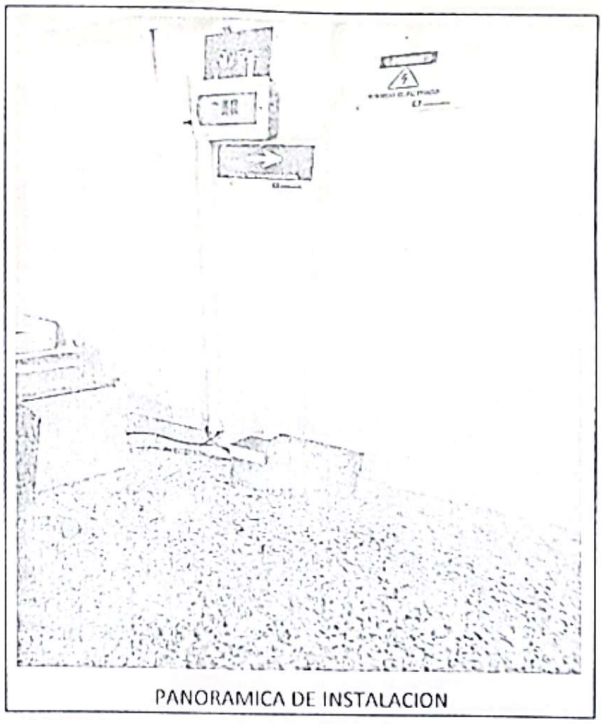

PANORAMICA DE INSTALACION

Powered by CamScanner

Energia y Tecnologia

ACTA DE ENTREGA -REMISIÓN

EN LA CIUDAD DE SAHAGUN - CORDOBA, SE REUNIERON EL SEÑOR DANIEL GERARDO CIPRIANI CRUZ, EN REPRESENTACION DE EL CONTRATISTA, Y EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE, EN REPRESENTACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, CON EL FIN DE HACER ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTEMPLADOS EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA PROCESO No. No. FGN-RNOCC-MC-0041- 2025. , SE FIRMA EN ALEJANDRIA - ANTOQUIA A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025,

No	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	SERIAL
1	UPS 6KVA - INCLUYE BANCO DE BATERIAS	POWEST	6KVA	250306-21540039
2	TARJETA SNMP	POWEST	NET AGENT A 10/100/1000	3927571050

DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR LOS EQUIPOS QUE LA ENTIDAD REQUIERA SE ENTREGAN CON LA RESPECTIVAS CONEXIONES ELECTRICAS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

APROBO:

NOMBRE: DANIEL GERARDO CIPRIANI CRUZ
V2M

FIRMA

RECIBIO:


NOMBRE:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FIRMA


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner


SEDE SAHAGUN UPS 6 KVA

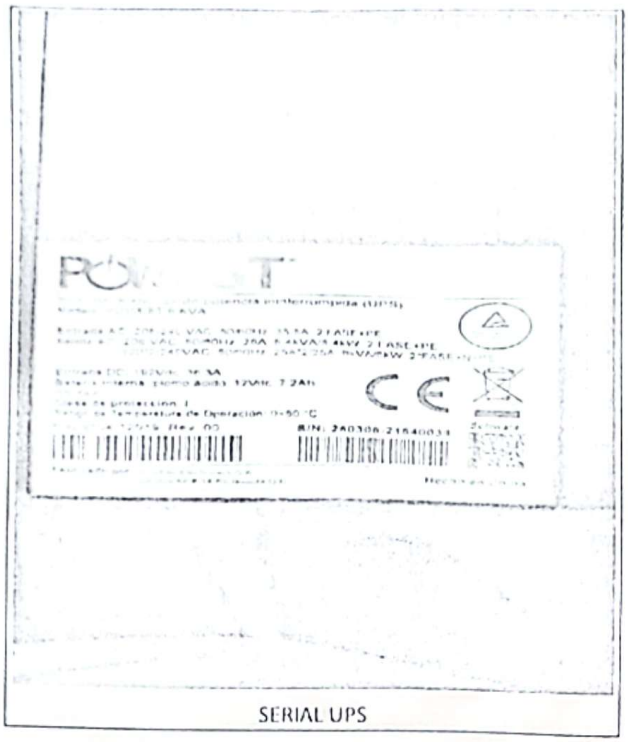


SERIAL UPS

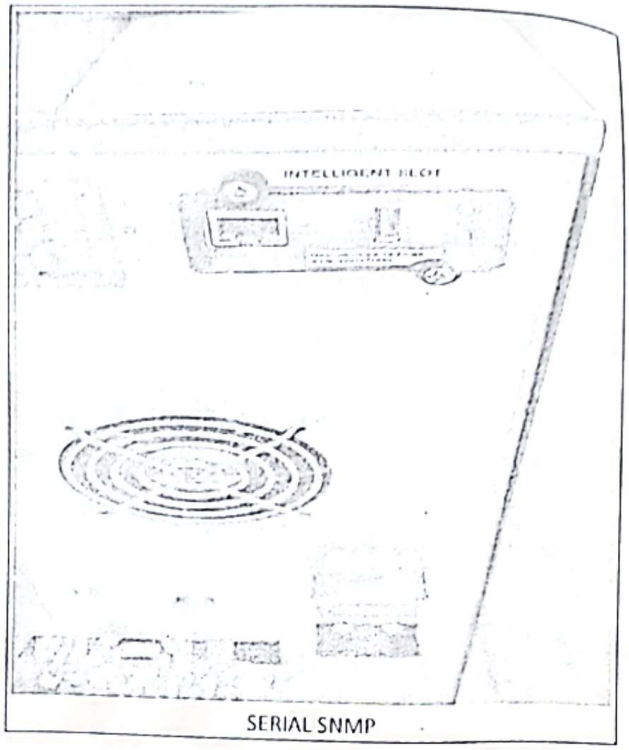

SERIAL SNMP

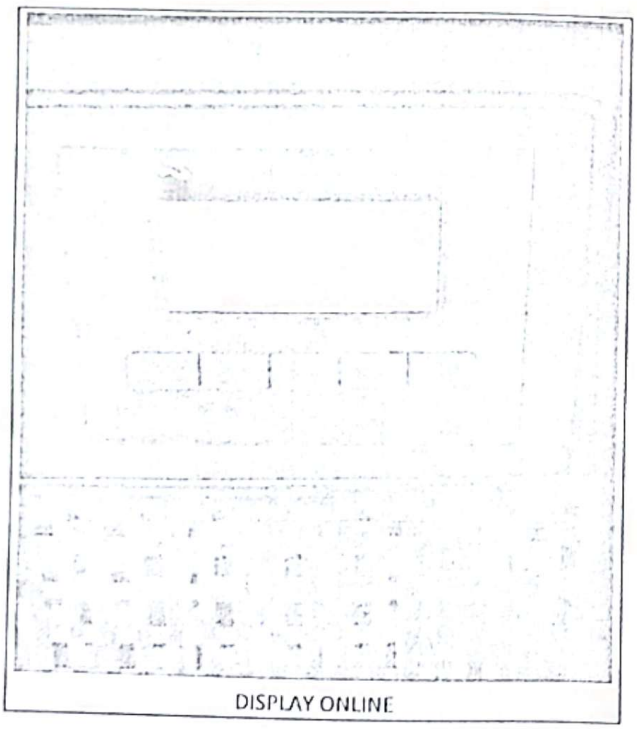

DISPLAY ONLINE

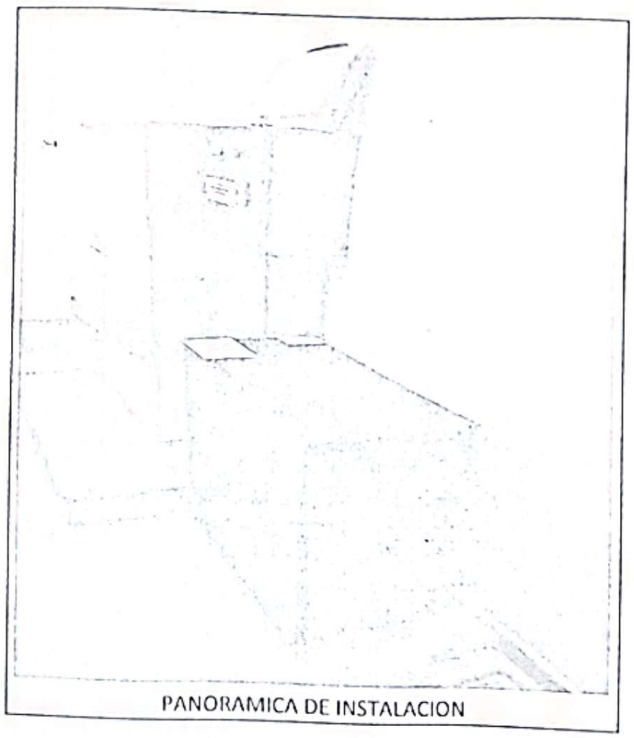

PANORAMICA DE INSTALACION

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA -REMISIÓN

EN LA CIUDAD DE CHINU - CORDOBA, SE REUNIERON EL SEÑOR DANIEL GERARDO CIPRIANI CRUZ, EN REPRESENTACION DE EL CONTRATISTA, Y EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE, EN REPRESENTACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, CON EL FIN DE HACER ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTEMPLADOS EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA PROCESO No. No. FGN-RNOCC-MC-0041- 2025. , SE FIRMA EN CHINU - CORDOBA A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025,

No	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	SERIAL
1	UPS 6KVA - INCLUYE BANCO DE BATERIAS	POWEST	6KVA	250306-21540011
2	TARJETA SNMP	POWEST	NET AGENT A 10/100/1000	3927572542

DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR LOS EQUIPOS QUE LA ENTIDAD REQUIERA SE ENTREGAN CON LA RESPECTIVAS CONEXIONES ELECTRICAS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

APROBO:

NOMBRE: DANIEL GERARDO CIPRIANI CRUZ
V2M

FIRMA


RECIBIO:

NOMBRE: Diana Bello Ramos.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION


FIRMA

Powered by CamScanner


SEDE CHINU UPS 6 KVA

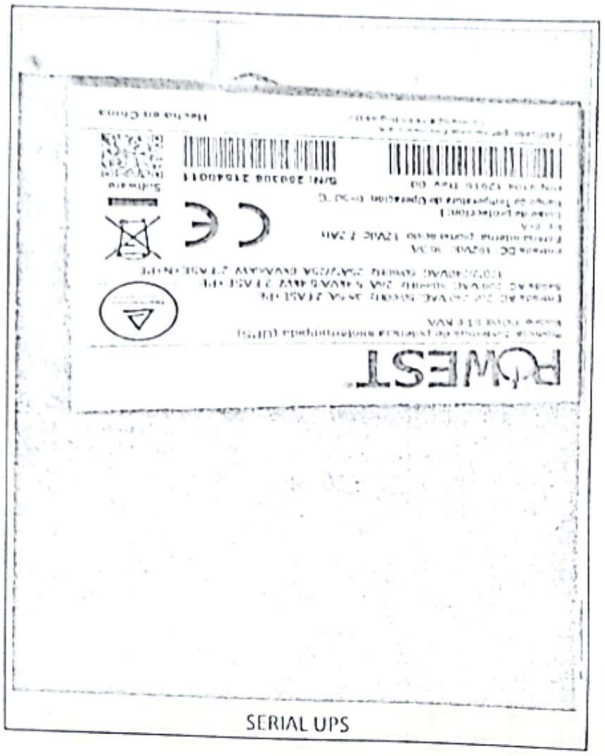


SERIAL UPS

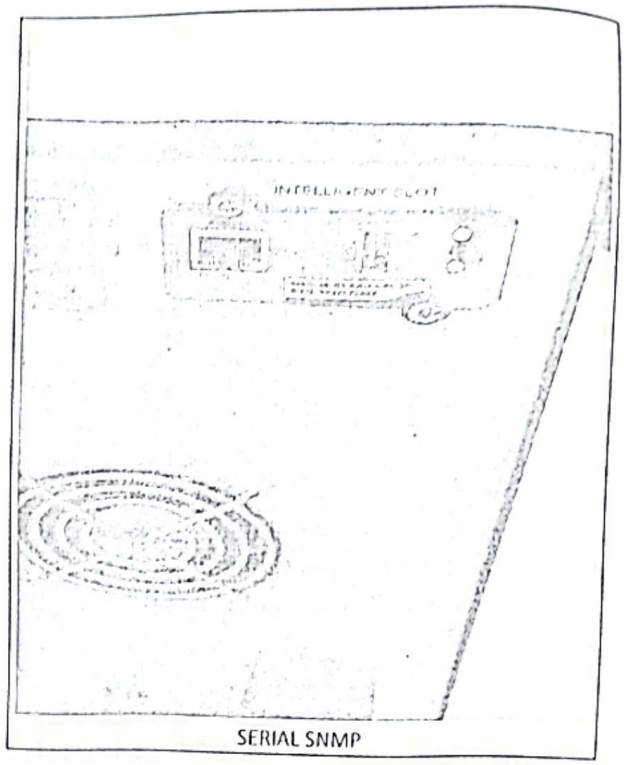

SERIAL SNMP

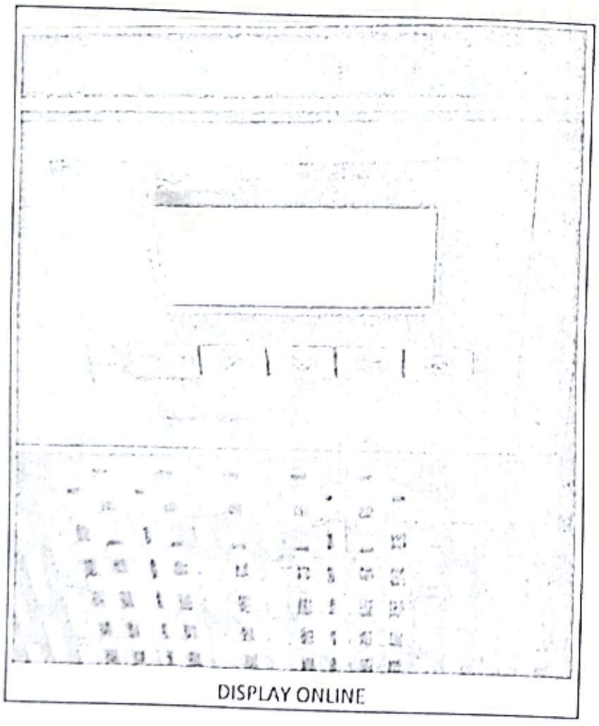

DISPLAY ONLINE

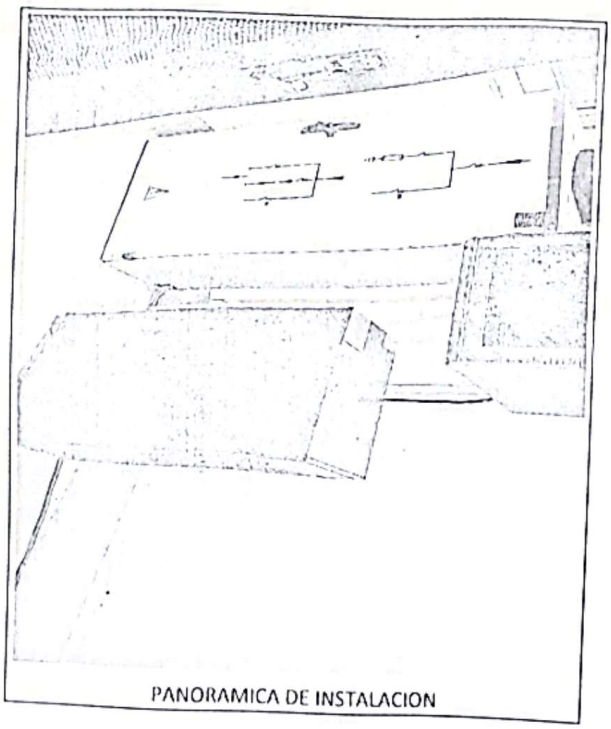

PANORAMICA DE INSTALACION

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA -REMISIÓN

EN LA CIUDAD DE MONTERIA - CORDOBA, SE REUNIERON EL SEÑOR DANIEL GERARDO CIPRIANI CRUZ, EN REPRESENTACION DE EL CONTRATISTA, Y EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE, EN REPRESENTACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, CON EL FIN DE HACER ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTEMPLADOS EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA PROCESO No. No. FGN-RNOCC-MC-0041- 2025. , SE FIRMA EN MONTERIA - CORDOBA A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025,

No	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	SERIAL
1	SEDE CAIVAS UPS 30KVA - INCLUYE BANCO DE BATERIAS	POWEST	30VA	110032996E73342500003
2	SEDE CAIVAS TARJETA SNMP	POWEST	NET AGENT A 10/100/1000	3927571047
3	SEDE CTI UPS 40KVA - INCLUYE BANCO DE BATERIAS	POWEST	40KVA	310030584e7147200002
4	SEDE CTI TARJETA SNMP	POWEST	NET AGENT A 10/100/1000	3927571634

DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR LOS EQUIPOS QUE LA ENTIDAD REQUIERA SE ENTREGAN CON LA RESPECTIVAS CONEXIONES ELECTRICAS QUE GARANTIZAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

APROBO:

NOMBRE: DANIEL GERARDO CIPRIANI CRUZ
V2M

FIRMA

RECIBIO:

NOMBRE: YESID MIGUEL BOLAÑOS ESTEBAN
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FIRMA

Powered by CamScanner

FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN

Nombre. INVERSIONAS VASQUEZ Y ASOCIADOS
C.c. o Nit. 901.924.018-6
Direccion: CALLE 151 No. 11-32
Telefono: 321-5013868
Fecha: 18/05/2025

Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental

Cuadro Para Prepar Oferta

Item	Descripcion	Und	Cant	Valor Unitario	IVA	Subtotal IVA Incluido	Total
1	CORDOBA						
	UPS DE 40 KVA 220 TRIFASICA SEDE CTI MONTERIA						
1.1	UPS de 40 kva trifasica, incluye transpórte respuesto entregada e instalación en sitio con banco de baterias externo minimo 8kw/h de las siguientes caracteristicas: ups trifasica entrada 166-260 salida 208/120vac on line doble conversión, pantalla tactil que muestre toda la informacion de la ups como voltajes de entrada, salida, consumo estado alarmas historial de eventos. inversor pwm de alta frecuencia igbt, factor de potencia 0,99, supresor de sobretension tvss, conexion tipo bornera entrada dual, bypass de estado solido,trasferencia automatica 0s, tarjeta de red SNMP incluiye cables de instalacion flexible acorde a los requerimientos tecnicos del equipo a una distancia de 3 metros hasta los tableros de entrada y salida y bypass existente asi como de los terminales en cobre plata, con ponchadora hidraulica.	Glb	1	$ 33.163.200,00	$ 6.301.008,00	$ 39.464.208,00	$ 39.464.208,00
	UPS DE 30 KVA 220 TRIFASICA CAIVAS MONTERIA						
1.2	UPS de 30 kva trifasica, incluye transpórte respuesto entregada e instalación en sitiocon banco de baterias externo minimo 8kw/h de las siguientes caracteristicas: ups trifasica entrada 166-260 salida 208/120vac on line doble conversión, pantalla tactil que muestre toda la informacion de la ups como voltajes de entrada, salida, consumo estado alarmas historial de eventos. inversor pwm de alta frecuencia igbt, factor de potencia 0,99, supresor de sobretension tvss, conexion tipo bornera entrada dual, bypass de estado solido,trasferencia automatica 0s, tarjeta de red SNMP incluye. Bypass manual, cables flexible para la instalacion acorde a los requerimientos tecnicos del equipo a una distancia de 3 metros hasta los tableros de entrada y salida existente y al bypass suministrado asi como de los terminales en cobre plata terminados con ponchadora hidraulica	Glb	1	$ 23.956.800,00	$ 4.551.792,00	$ 28.508.592,00	$ 28.508.592,00
	UPS DE TORRE BIFASICA 6 KVA 220 BIFASICA SEDE SAHAGUN Y CHINU						

Powered by CamScanner

1.3	UPS bifasica de 6 KVA on line de doble conversion tecnologia pwm de alta frecuencia igbt, trasformador de aislamiento original en la ups bypass de estado solido con trasferencia automatica display que muestre todos los parametros como voltaje de entrada y salida consumo estado historial de eventos alimentacion 160-260v voltaje de salida 110v-0 - 110v con respecto a neutra con trasformador de aislamiento original dentro del equipo , conexiones tipo bornera 0,99 de factor de potencia a la entradas , arranque en frio en dc, auto run bypass de estado solido con trasferencia automatica, bypass manual tiempo de trasferencia a red de 0 seg protocolo SNMP incluye tarjeta de red , USB pantalla LCD con menu interactivo, potencia minima de baterias 1728w/h la instalacion va con alimentacion desde tablero existente hasta ups en cable encauchetado 4#6 a 3 metros de distancia y desde ups hasta bypass y luego a tablero regulado. incluye cables terminales, bypass y protecciones	Glb	2	$ 5.597.760,00	$ 1.063.574,40	$ 6.661.334,40	$ 13.322.668,80
2	**ANTIOQUIA**						
	UPS DE TORRE DE 3 KVA 110V PARA SEDE DE ALEJANDRIA						
2.1	UPS 110 V de 3 KVA on line de doble conversion tecnologia pwm de alta frecuencia igbt alimentacion 110 voltaje de salida 110v con respecto a neutra , 0,9 de factor de potencia, entrada de voltaje 85-150v,minima potencia de baterias 648w/h , arranque en frio en dc, bypass de estado solido con trasferencia automatica, tiempo de trasferencia a red de 0 seg protocolo SNMP, USB pantalla LCD con menu interactivo entrada en cable original con nema L5-30P macho y hembra de pared y 6 salidas enchufable.	Glb	1	$ 2.311.680,00	$ 439.219,20	$ 2.750.899,20	$ 2.750.899,20
	TOTAL					$	84.046.368,00

Powered by CamScanner
