DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	23/5/2024	**CIUDAD**	**Sabanalarga**
SECCIONAL	**BARRANQUILLA**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	15	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 ☐	18000 ■ 24000 ☐
	SERIE CONDENSADOR	2225230300143	
	SERIE MANEJADORA	103223070034	

INSTALACION E INSPECCION										
TIEMPO VACIO				Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**				N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**				N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**				N/A

TECNICO	Saul Villanueva
FIRMA	

ENCARGADO	Alfredo Hadechni
FIRMA CONFORMIDAD	



IMAGEN 1. SOLEDAD



IMAGEN 2. SOLEDAD



IMAGEN 3. SOLEDAD



IMAGEN 4. SOLEDAD

DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	16/05/2024	**CIUDAD**	SOLEDAD ATLANTICO
SECCIONAL	Soledad	BARRANQUILLA	
SERVICIO	INSTALACIÓN [X]	DESINTALACIÓN [X]	MANTENIMIENTO [ ]

ACTIVIDADES REALIZADAS
- se llega a sitio. - se saca de la caja la menajedora y la condensadora - se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. - Se realiza instalacion de cables n 7 desde el tablero electrico hasta el punto del aire. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.

EQUIPO

DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	2	Metros		
MARCA	YORK Inverter	YORK		
BTU	12000 [ ]	18000 [X]	24000 [ ]	
SERIE CONDENSADORA	YHJE18XJ6DTJ0 - X - 000002032230700022-			
SERIE MANEJADORA	YHJE18XJ6DTJ - RX 000001032230700014-			

INSTALACION E INSPECCION

TIEMPO VACIO	60	Minutos			INDICADOR MANOMETRO	145			PSI
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	SAUL VILLANUEVA
FIRMA	Villanueva


ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	Operadores Edt.

EVIDENCIAS DE LOS SERIALES DEL AIRE

SERIAL DE LA CONDESADORA



SERIAL DE LA MANEJADORA

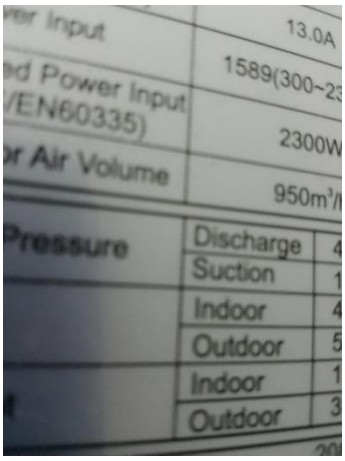



EVIDENCIA DE LA TUBERIA Y EVIDENCIAS DE CONDENSADORA



EQUIPO ENCENDIDO OPERATIVO

