DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	11/7/2024	**CIUDAD**	**HONDA**
SECCIONAL	**IBAGUE**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** X **DESINTALACIÓN** **MANTENIMIENTO**		

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
Instalación de evaporadora, condensadora, tuberia de cobre cable de fuerza y comunicación, braker, bomba de condensado, recubrimiento con cinta de vinilo y rubatex, pruebas de funcionalidad.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	56	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 18000 X 24000	
	SERIE CONDENSADORA	026002441230800233	
	SERIE MANEJADORA	026001441230800105	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	60 Minutos				INDICADOR MANOMETRO	130 a 115 PSI			
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**			N/A

TECNICO	Diego Avila
FIRMA	

ENCARGADO	Anderson Parra
FIRMA CONFORMIDAD	

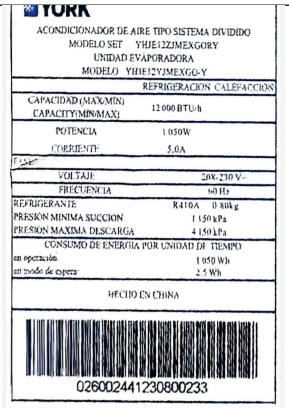


IMAGEN 1. Honda

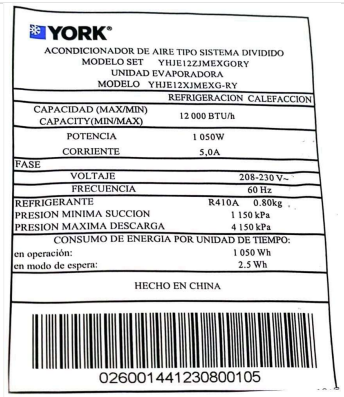


IMAGEN 2. Honda



IMAGEN 3. Honda



IMAGEN 4. Honda

DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A - 49 PBX 368 6101 - 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	[illegible]	**CIUDAD**	**HONDA TOLIMA**
SECCIONAL	**TOLIMA**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ☒	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
- se llega a sitio. - se saca de la caja la menajedora y la condensadora - se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la canaleta para los cables y tuberías. - Se realiza instalacion de cables n 10 desde el tablero electrico hasta el punto del aire. -se instala la conexiones de las tuberias. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	56	Metros
	MARCA	YORK	
	BTU	12000 ☐	18000 ☒ 24000 ☐
	SERIE CONDENSADORA	026002441230800233.	
	SERIE MANEJADORA	026001441230800105.	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	60		Minutos		INDICADOR MANOMETRO	130 a 115			PSI
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	[illegible]	ENCARGADO	ANDERSON PARRA
FIRMA	[illegible]	FIRMA CONFORMIDAD	[illegible]

Powered by CamScanner
