DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	11/7/2024	**CIUDAD**	**LERIDA**
SECCIONAL	**IBAGUE**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** X **DESINTALACIÓN** **MANTENIMIENTO**		

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
Instalación de evaporadora, condensadora, tuberia de cobre cable de fuerza y comunicación, braker, bomba de condensado, recubrimiento con cinta de vinilo y rubatex, pruebas de funcionalidad.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	6 Metros	
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000	18000	24000 X
	SERIE CONDENSADORA	2226230300034	
	SERIE MANEJADORA	1226230300035	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	20 Minutos				INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**			N/A

TECNICO	Diego Avila
FIRMA	

ENCARGADO	Juan Gabriel Millan
FIRMA CONFORMIDAD	

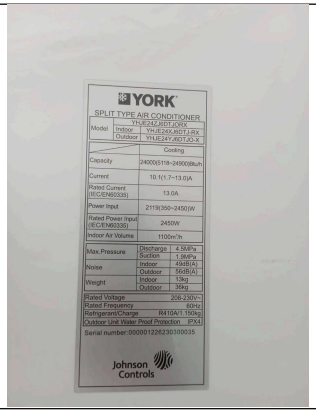


IMAGEN 1. Lérida

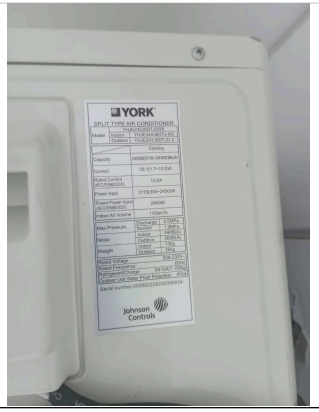


IMAGEN 2. Lérida



IMAGEN 3. Lérida



IMAGEN 4. Lérida

DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	5/10/2024	**CIUDAD**	**LERIDA**
SECCIONAL	**IBAGUE**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo. -Inducción de manejo del aire acondicionado y sugerencias técnicas	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	6	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 ☐	18000 ☐	24000 ■
	SERIE CONDENSADORA	000002226230300034	
	SERIE MANEJADORA	000001226230300035	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	
FIRMA	

ENCARGADO	Juan G. Millan
FIRMA CONFORMIDAD	
