DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

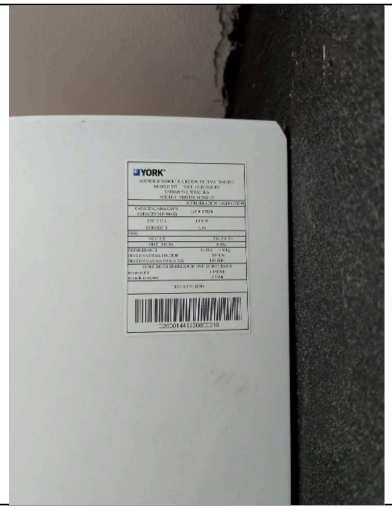
FECHA	30/5/2024	**CIUDAD**	**PURIFICACION**
SECCIONAL	**IBAGUE**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
se instala la plancha de consola en la pared. -se instala la caneleta para los cables y tuberias. -se instala la conexiones de las tuberias. --se realizan la instalacion de las bases de la condensadora. -se instala la condensadora -se realiza acople de tuercas de tuberias, se piden presion. -se realizan tiempo de vacio de 60 minutos y se deja el aire Operativo.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	2	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 ■	18000 ☐ 24000 ☐
	SERIE CONDENSADOR	026002441230800076	
	SERIE MANEJADORA	026001441230800216	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	**Bien**			N/A

TECNICO	Diego Avila
FIRMA	

ENCARGADO	Alfonso Galindo
FIRMA CONFORMIDAD	

		
IMAGEN 1. PURIFICACION	IMAGEN 2. PURIFICACION	IMAGEN 3. PURIFICACION
		
IMAGEN 4. PURIFICACION		

DISICO S.A.
INGENIERIA
CARRERA 25 No. 24A - 40 PBX 368 6100 - 368 7334 FAX: 269 2670
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asistencia Integral en Confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	30 MAYO DE 2024	CIUDAD	PURIFICACIÓN
SECCIONAL	IBAGUE - TOLIMA		
SERVICIO	INSTALACIÓN [X]	DESINTALACIÓN [ ]	MANTENIMIENTO [ ]

ACTIVIDADES REALIZADAS	EQUIPO			
Instalación de aire Acondicionado de 12000 BTU marca YORK. El equipo se deja funcionando en perfecto estado en el cuarto eléctrico de la UPS.	DISTANCIA ENTRE LA	2	Metros	
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.		
	BTU	12000 [X]	18000 [ ]	24000 [ ]
	SERIE CONDENSADORA	02600 Z44 1230800076		
	SERIE MANEJADORA	026001441230800216		

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	30	Minutos			INDICADOR MANOMETRO	150			PSI
SOLDADURA	OK	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	OK			N/A
AISLAMIENTO	OK	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	OK			N/A
FUNCIONAMIENTO	OK	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO	OK			N/A

TECNICO FIRMA	Diego Avila	ENCARGADO FIRMA CONFORMIDAD	Alfonso Castro M

Powered by CamScanner
