DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	26/6/2024	**CIUDAD**	**LA UNION**
SECCIONAL	**NARIÑO**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** X **DESINTALACIÓN** **MANTENIMIENTO**		

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**			
Instalación del equipo, base, tubería, drenaje, refrigerante, cableado fuerza y cableado control.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	6 Metros		
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.		
	BTU	12000 X	18000	24000
	SERIE CONDENSADORA	026002441230800210		
	SERIE MANEJADORA	02600144123080046		

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	30 Minutos				INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**			N/A

TECNICO	Jamilton Andres Florez
FIRMA	

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	



YORK


ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SISTEMA DIVIDIDO
MODELO SET YHJE12ZJMEXGORY
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO YHJE12YJMEXGO-Y

	REFRIGERACION	CALEFACCION
CAPACIDAD (MAX/MIN) CAPACITY(MIN/MAX)	12 000 BTU/h	
POTENCIA	1 050W	
CORRIENTE	5,0A	
FASE		
VOLTAJE	208-230 V~	
FRECUENCIA	60 Hz	
REFRIGERANTE	R410A 0.80kg	
PRESION MINIMA SUCCION	1 150 kPa	
PRESION MAXIMA DESCARGA	4 150 kPa	
CONSUMO DE ENERGIA POR UNIDAD DE TIEMPO:		
en operación:	1 050 Wh	
en modo de espera:	2.5 Wh	

HECHO EN CHINA

02600244123080021O

IMAGEN 1. La Unión

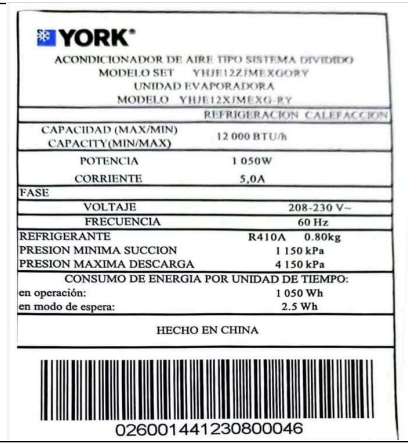

YORK

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SISTEMA DIVIDIDO
MODELO SET YHJE12ZJMEXGORY
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO YHJE12XJMEXG-RY

	REFRIGERACION	CALEFACCION
CAPACIDAD (MAX/MIN) CAPACITY(MIN/MAX)	12 000 BTU/h	
POTENCIA	1 050W	
CORRIENTE	5,0A	
FASE		
VOLTAJE	208-230 V~	
FRECUENCIA	60 Hz	
REFRIGERANTE	R410A 0.80kg	
PRESION MINIMA SUCCION	1 150 kPa	
PRESION MAXIMA DESCARGA	4 150 kPa	
CONSUMO DE ENERGIA POR UNIDAD DE TIEMPO:		
en operación:	1 050 Wh	
en modo de espera:	2.5 Wh	

HECHO EN CHINA

02600144123080004 6

IMAGEN 2. La Unión



IMAGEN 3. La Unión



IMAGEN 4. La Unión

DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

SERGEMAQ

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	26/06/2024.	CIUDAD	LA UNION NARIÑO.
SECCIONAL			
SERVICIO	✓ INSTALACIÓN	☐ DESINTALACIÓN	☐ MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS	EQUIPO				
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	6 MT.	Metros		
	MARCA	YORK			
	BTU	☐	✓ 12000	☐ 18000	☐ 24000
	SERIE CONDENSADORA	026002491230800210.			
	SERIE MANEJADORA	026001491230800046.			

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	30 MINUTOS.			Minutos	INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	Bien ✓	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien ✓	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien ✓	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien ✓	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien ✓	Regular	Mal	N/A	CONDENSADORA	Bien ✓	Regular	Mal	N/A

TECNICO	JAMILTON ANDRES FLOREZ
FIRMA	

ENCARGADO	Jairo V. Solarte P.
FIRMA CONFORMIDAD	
