GLOBAL VISION INGENIERÍA Y SERVICIOS

ACTIVIDADES DE CORRECTIVOS CONTRATO C.E.P.S. 080 DE 2024.

Rama Judicial – Edificio Palacio De Justicia De Buenaventura.

El día 05 de diciembre, se realizó la instalación de equipos de CCTV según informe presentado.

De acuerdo con cotización presentada, se procede a instalar cámara PTZ exterior, 1 rollo de cable utp exterior, conectores rj45, 1 tubo emt, conectores, accesorios.

Se cambian cables y se hacen pruebas de conexión punto a punto.

Se retiran 2 cámaras ptz perímetro 2piso, con tarjetas quemadas por la humedad.


Las cámaras encienden, pero no conectan a la red, el cable utp se encontraba aterrizado por la humedad fue lo que produjo el daño en el equipo.





Cámara ptz 2piso entrada edificio, se cambia cable utp y se hacen pruebas de conexión punto a punto.

Cámara con fallas de conexión constante, se procede a retirar para revisión y posible reparación.

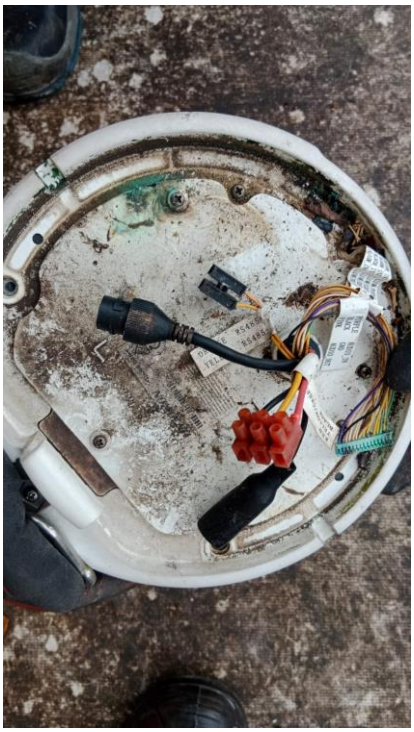

Cámara sótano se hace traslado o cambio de posición mirando puerta hierro.








Instalación de cámara ptz nueva en perímetro 2piso, se cambia cable utp y se hacen pruebas de conexión punto a punto. Se hace configuración del equipo y funciona correctamente, pero no se puede agregar al NVR por que se desconoce la contraseña.






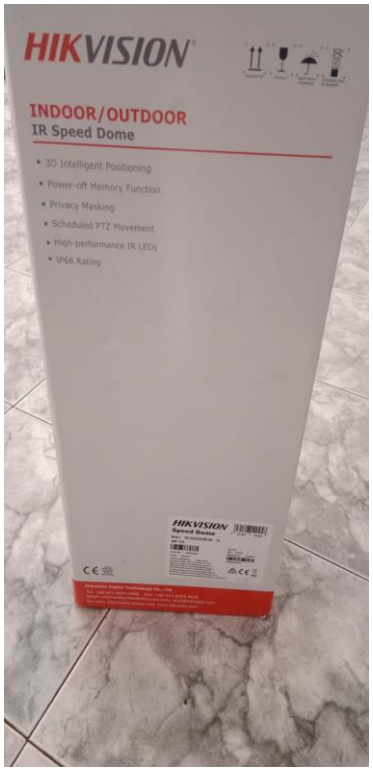


Cada una de las actividades se llevó a cabo sin contratiempos, verificando constantemente que las condiciones de trabajo inicial no cambiaran.

Todas las áreas donde se realizó los correctivos de las cámaras del sistema de seguridad CCTV, se han dejado en condiciones de orden y aseo óptimos, acorde a las condiciones iniciales encontradas.

Es recomendable de acuerdo al sitio, realizar mantenimiento preventivo general del sistema, por lo menos una vez al año, para mantener los equipos en óptimas condiciones y mantener la vida útil de los mismos.





Franky Dey Bastidas	**Jorge Andrés Herrera Giraldo**
Ingeniero de Sistemas	Ingeniero Eléctrico
Global Visión Ingeniería y Servicios	Global Visión Ingeniería y Servicios
