GLOBAL VISION INGENIERÍA Y SERVICIOS

ACTIVIDADES DE CORRECTIVOS CONTRATO C.E.P.S. 080 DE 2024.

Rama Judicial – Edificio Palacio De Justicia De Buga.

El día 03 de diciembre, se realizó la instalación de equipos de CCTV según informe presentado**.**

De acuerdo con cotización consecutivo 10334 presentada, un DVR 16canales, un disco duro 4tb, 9 fuentes 12v, 9 pares video balun.


un rack de comunicaciones y una regleta eléctrica que suministra la oficina de sistemas de administración judicial Cali.

Se procede hacer la instalación e identificación del cableado a las 9 cámaras existentes.


Se encuentran cables con humedad y sulfatados, que a grandes distancias no marca continuidad y se debe hacer el cambio del cable para tener transmisión de video.

Del sistema de CCTV más actual que está conformado por 9 cámaras, solo funcionan 5.

Las 4 cámaras restantes se les debe cambiar el cableado deteriorado por la humedad.

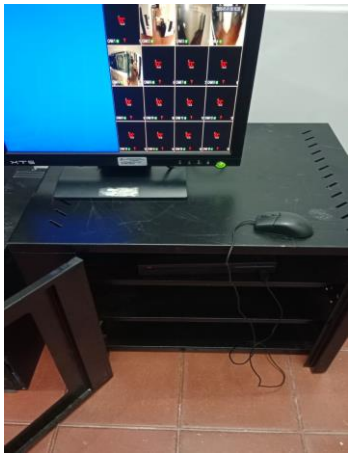


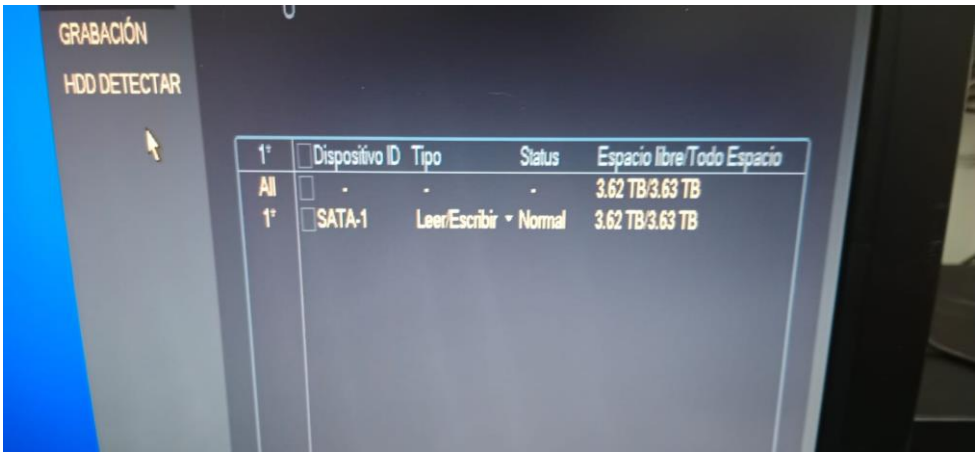

RACK COMUNICACIONES-DVR-PANTALLA-REGLETA ELECTRICA.



DISCO DURO 4TB.

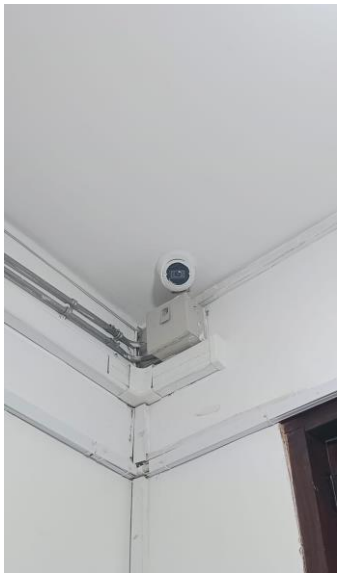









CAMARAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

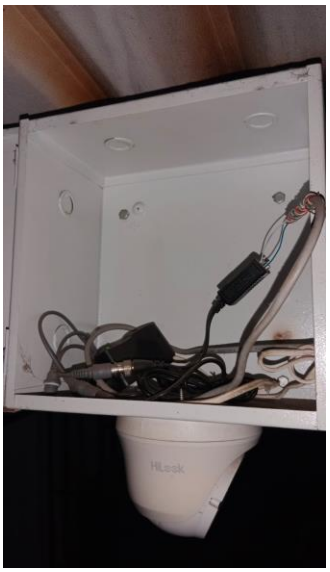


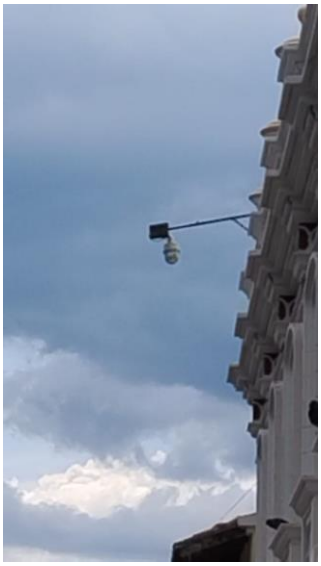
Cámaras no funcionan por cable con humedad, distancias largas sin continuidad.

Cada una de las actividades se llevó a cabo sin contratiempos, verificando constantemente que las condiciones de trabajo inicial no cambiaran.

Todas las áreas donde se realizó los correctivos de las cámaras del sistema de seguridad CCTV, se han dejado en condiciones de orden y aseo óptimos, acorde a las condiciones iniciales encontradas.

Es recomendable de acuerdo al sitio, realizar mantenimiento preventivo general del sistema, por lo menos una vez al año, para mantener los equipos en óptimas condiciones y mantener la vida útil de los mismos.





Franky Dey Bastidas	**Jorge Andrés Herrera Giraldo**
Ingeniero de Sistemas	Ingeniero Eléctrico
Global Visión Ingeniería y Servicios	Global Visión Ingeniería y Servicios
