GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 02	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	viernes, 11 de julio de 2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	LP-SI-014-2024	Número Radicado Interno del Contrato:	21042025-0831
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.925.183-8	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	2024003170015
CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA	5004	NOMBRE DE LA VIA	ASIA - TRES PUERTAS (SECTORES: ASIA - LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS - TRES PUERTAS) MUNICIPIO DE SAN JOSE
Actividad Económica	4290	Tipo de Contrato	OBRA CIVIL
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 2.783.138.891	$ -	$ 556.627.778

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 2.783.138.891	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	30/04/2025
	Fecha de Terminación de ejecución	29/12/2025
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500027950 SGR-10525	$ 189.631.320	$ 37.926.264,00	$ 151.705.056	2-0378
			$ -	
VALOR ACTA	$ 189.631.320	37.926.264,00 $	$ 151.705.056	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Contrato:			$ 2.783.138.891	Valor del Anticipo:			$ 556.627.778
Adición del Contrato 1			$ -				
Adición del Contrato 1			$ -				
Valor Acta Nro. 1	$	158.315.667		Amortización Acta 1	$	31.663.133	
Valor Acta Nro. 2	$	189.631.320		Amortización Acta 2	$	37.926.264	
Valor Acta Nro. 3				Amortización Acta 3			
Valor Acta Nro. 4				Amortización Acta 4			
Valor Acta Nro. 5				Amortización Acta 5			
Valor Acta Nro. 6				Amortización Acta 6			
Saldo del Contrato:	$	2.435.191.904		Saldo por Amortizar:	$	487.038.381	
SUMAS IGUALES	$	2.783.138.891	$ 2.783.138.891	**SUMAS IGUALES**	$	556.627.778	$ 556.627.778

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: CAROLINA DUQUE TOBON

Supervisor (a)

Firma

Nombre MARIA CLARA POTES MAZUERA

CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS

Interventor (a) - (SI APLICA)

CONSORCIO FG SAN JOSE

Nit: 901925183-8

CALLE 62 23-61 OF 501
Tel: - Cels.: 3184008882 - Manizales - Colombia
E-mail: sergioestradamorales@gmail.com

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE MANIZALES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN RESOLUCION 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FVE2

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764092013886 de 15.Abr.2025 hasta 15.Abr.2027 Rango del FVE1 al FVE50

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/07/2025 08:41:20.946

CUFE: 3ce02a4a3cc2acc8354af16d5b258797aa106feea8d8fb1104f722ebc839201ce4dc2c81ef83fbe47ccb55442ed955bf

Cliente: DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 11 / 2025
08:41:07 a. m.

NIT: 890801052	DV: 1	Cel.	Tel. 6068982444
Razón Ccial:			
Dirección: CRA 21 CALLE 22 23			
Ciudad: Manizales		Email: atencionalcuidadano@caldas.gov.co	

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.10 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) AIU_A	ADMINISTRACION 29%	1		39,053,426		0%	0	39,053,426
2) AIU_I	PGIO	1		9,177,561		0%	0	9,177,561
3) AIU_U	UTILIDAD 5%	1		6,733,349		0%	0	6,733,349
4) COSTO_DIVA0	ACTA DE OBRA 02 SEGÚN CONTRATO 21042025-0831, OBJETO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS"	1		134,666,984		0%	0	134,666,984

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Bruto:	189,631,320
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	189,631,320
+Impuestos:	0
Subtotal:	189,631,320
-Retenciones:	0
TOTAL	**189,631,320**

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	189,631,320	0

NOTA
ACTA DE OBRA 02 SEGÚN CONTRATO 21042025-0831

Administracion	39,053,426
Imprevistos	9,177,561
Utilidad	6,733,349

Firma Digital :

Consultar en la DIAN

Recibido: 11/07/2025 08:41:22 a. m.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 11/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO FG SAN JOSE** con **NIT 901.925.183-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 087000098720

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-02, 04:13:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS, **Numéro Planilla:** 78899342

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 02/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO FG SAN JOSE		
Documento	NI901925183	**Dirección**	CL 62 #23 - 61 OF 501
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8885768
TIpo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	ESTRADA MORALES SERGIO	**Identificación**	CC 1053849308
Total Afiliados	31	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	Ret P	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Días Pen	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1007601275	FABIAN MURILLO VIVAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1007868932	LUIS MIGUEL JULIO FUENTES	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	0,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1010132447	DEIVIS DON CORDOBA CORDOBA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.900
CC 10260154	CARLOS ALBERTO PINEDA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.150.000	$ 86.000	0,960	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CC 1057788363	KEVIN ANTONIO ARROYAVE VERA	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 616.850	$ 98.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 616.850	$ 24.700	0,960	$ 616.850	$ 43.000	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CC 1058819178	VICTOR ALEXANDER GONZALEZ BEDOYA	01	00													L				0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 511.000	$ 81.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 511.000	$ 20.500	0,000	$ 511.000	$ 0	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 511.000	$ 20.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.000
CC 1058819178	VICTOR ALEXANDER GONZALEZ BEDOYA	01	00	X																0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 146.000	$ 23.400	(EPS005) SALUD TOTAL EPS	$ 146.000	$ 5.900	0,960	$ 146.000	$ 10.200	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 146.000	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.400
CC 1058812007	JULIAN STIVEN HINCAPIE AMARILES	01	00																	5	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 237.250	$ 9.500	0,000	$ 237.250	$ 0	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
CC 1058812007	JULIAN STIVEN HINCAPIE AMARILES	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 94.900	$ 3.800	0,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.300
CC 1058813256	DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES	01	00	X																0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 854.100	$ 136.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 854.100	$ 34.200	0,960	$ 854.100	$ 60.000	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.600
CC 1058813380	JHON SEBASTIAN TORRES HANAGUA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.430.914	$ 229.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.430.914	$ 57.300	0,960	$ 1.430.914	$ 99.600	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.430.914	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.200
CC 1058813428	CARLOS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.734.891	$ 277.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.734.891	$ 69.400	0,960	$ 1.734.891	$ 120.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.734.891	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.200
CC 1058909846	FREDY ANDRADES MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1058920654	ANGEL DAVID GIL ZUÑIGA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1077429418	JHON JAIRO PALACIOS CORTES	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.138.600	$ 182.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.138.600	$ 45.600	0,960	$ 1.138.600	$ 79.300	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.138.600	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1088389606	CRISTIAN CAMILO OSORIO AMARILES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.430.914	$ 229.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.430.914	$ 57.300	0,960	$ 1.430.914	$ 99.600	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.430.914	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.200
CC 1088398191	JOSE FERMAN ALZATE GIL	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	0,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1121888890	JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1136890	EUTIMIO ENOR MOSQUERA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 02/07/2025 | Empresa NI901925183 CONSORCIO FG SAN JOSE | Planilla Nro: 78899342 | Periodo Cotización: junio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	INT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 11809502	MANUEL ANTERO PALACIOS ANDRADES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 11809631	BENEDITO MURILLO PALACIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 11809654	SIXTO MURILLO PALACIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 11809789	ABEL PINO PALACIOS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.497.000	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 16074783	JUAN DAVID LOPEZ OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.150.000	$ 86.000	0,522	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CC 4457308	FERNANDO VALENCIA MARTINEZ	01	00	X										X						0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1.008.313	$ 161.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.008.313	$ 40.400	0,522	$ 1.008.313	$ 70.300	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.117.053	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.700
CC 4568807	CARLOS MARIO ACEVEDO MARTINEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.340.000	$ 358.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.340.000	$ 93.600	0,522	$ 2.340.000	$ 156.000	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.340.000	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.600
CC 4581153	JESUS ORLANDO RIVERA VERA	01	05	X																0	0	5	5	5	(NIN AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 379.630	$ 15.200	0,522	$ 379.630	$ 26.500	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 384.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.300
CC 15082302	JOSE WILMAR HERNANDEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.150.000	$ 86.000	0,522	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CC 9609077	OSCAR DE JESUS RUIZ HENAO	01	00											X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.430.514	$ 229.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.430.514	$ 57.300	0,522	$ 1.430.514	$ 99.600	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.430.514	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.200
CC 9921071	HERNANDO DE JESUS ZAPATA CASTAÑO	01	00	X																0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 854.100	$ 136.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 854.100	$ 34.200	0,522	$ 854.100	$ 59.500	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.600
CC 9992409	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ FLOREZ	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.512.469	$ 242.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.512.469	$ 60.500	0,522	$ 1.512.469	$ 105.300	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.512.469	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.300
CC 9994474	OSCAR ALBERTO CHIQUITO HERNANDEZ	01	00											X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.734.891	$ 277.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.734.891	$ 69.400	0,522	$ 1.734.891	$ 120.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.734.891	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.200
CC 9996694	CESAR AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.025.000	$ 324.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.025.000	$ 81.000	0,522	$ 2.025.000	$ 141.000	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.025.000	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 41.357.706	$ 41.737.306	$ 41.737.306	$ 41.977.446	$ 6.618.200	$ 1.670.600	$ 2.854.200	$ 1.670.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.813.700	$ 0	$ 12.813.700

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CONTRATO 21042025-0831

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Sergio Estrada Morales identificado con **C.C. No. 1.053.849.308** en mi condición de representante legal del **CONSORCIO FG SAN JOSE** identificada con NIT **901.925.183-8**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 11 días del mes de julio de 2025.

FIRMA Sergio Estrada
Sergio Estrada Morales
CC No. 1.053.849.308
R. L. Consorcio FG San José
Contratista

FIRMA Maria Doris García P
Maria Doris García Pareja
CC No. 30.296.807
T.P. 31081-T
Contadora

CONTRATO 21042025-0831

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

German Salazar Mejia identificado con **C.C. No. 10.235.787** en mi condición de representante legal del **Salazar y Estrada Ingenieros SAS** identificada con NIT **900.434.286-7**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 11 días del mes de julio de 2025.

FIRMA _____
German Salazar Mejia
CC No. 10.235.787
R. L. Salazar y Estrada Ingenieros SAS
Contratista

FIRMA _____
Maria Doris García Pareja
CC No. 30.296.807
T.P. 31081-T
Contadora

CONTRATO 21042025-0831

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA NATURAL)

German Salazar Mejia identificado con **C.C. No. 10.235.787** en mi condición de consorciado persona natural, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 11 días del mes de julio de 2025.

FIRMA _____
German Salazar Mejía
CC No. 10.235.787
Contratista

FIRMA _____
Maria Doris García Pareja
CC No. 30.296.807
T.P. 31081-T
Contadora

CONTRATO 21042025-0831

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Sergio Estrada Morales identificado con **CC No. 1.053.849.308** en mi condición de representante legal de **SEMPRO SAS** identificada con NIT **901.391.413-3**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Blanca Melva Leyva Chica identificado con **CC No. 30.297.261**, y con tarjeta profesional No. **29930-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEMPRO SAS** identificada con NIT **901.391.413-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Manizales**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 11 días del mes de julio de 2025.

FIRMA Sergio Estrada

Sergio Estrada Morales
CC No. 1.053.849.308
R. L. SEMPRO SAS
Contratista

FIRMA Melva Leyva Chica

Blanca Melva Leyva Chica
CC No. 30.297.261
T.P. 29930-T
Contadora



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

31081-T

MARIA DORIS
GARCIA PAREJA
C.C. 30296807
RESOLUCION INSCRIPCION 2089 FECHA 19/12/1991
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE MANIZALES

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 38629



81462

DUPLICADO

Esta tarjeta es el unico documento de identidad como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
30.296.807
GARCIA PAREJA
MARIA DORIS



19-ABR-1964
FILADELFIA
(CALDAS)
1.65 O+ F
12-DIC-1983 MANIZALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BC06A0F02965690A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DORIS GARCIA PAREJA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30296807 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 31081-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.297.261
LEIVA CHICA
APELLIDOS
BLANCA MELVA
NOMBRES
Melva Leiva Chica
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1966
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 A+ F
ESTATURA G.S. R.H. SEXO
20-ABR-1984 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

29930-T

BLANCA MELVA
LEIVA CHICA
C.C. 30.297.261
RESOLUCION INSCRIPCION 924-T FECHA 8-VIII-91
UNIVERSIDAD-FUNDEMA



Presidente

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 6 B C A 2 0 7 C 9 1 A 3 1 B 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA MELVA LEYVA CHICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30297261 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 29930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141166376163

(415)7707212489984(8020) 000014116637616 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 5 1 8 3	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO FG SAN JOSE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CL 62 23 61 OF 501

42. Correo electrónico sergioestradamorales@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 4 0 0 8 8 8 2	6 0 6 8 8 8 5 7 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 3 0 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESTRADA MORALES SERGIO

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-03-2025 06:25:38PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166376163

{415}7707212489984{8020} 000014116637616 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 5 1 8 3	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 1 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 3 0 7
81. Hasta	2 0 2 6 1 1 0 6

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166376163

(415)7707212489984(8020) 000014116637616 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 5 1 8 3	8	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 1 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 5 3 8 4 9 3 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESTRADA	MORALES	SERGIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 1 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 3 5 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	MEJIA	GERMAN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166376163

(415)7707212489984(8020) 000014116637616 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 5 1 8 3	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 9 1 4 1 3	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SEMPRO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 1 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 3 4 2 8 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 5 0 1 1 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 3 5 7 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALAZAR	MEJIA	GERMAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 1 1 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE OBRA NRO DOS (02) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 21042025-0831
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 21042025-0831

Secretaría : **INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de obra **9-jul-25**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	21042025-0831	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500027950			
NIT ó RUT:	901.925.183-8			
Contratista:	CONSORCIO FG SAN JOSE			
Representante Legal:	SERGIO ESTRADA MORALES			
Valor del Contrato ($):	$ 2.783.138.891,00	Aporte Departamento	$ 2.783.138.891,00	
Valor Adicion	$ 0,00	Aporte otras entidades	$ 0,00	
Objeto del contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	4500027950	FONDO	2-0378	0
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES			
Fecha de iniciacion	30/04/2025		Fecha de Suspensión 1	
Fecha de Reiniciación 1			Nueva fecha de terminación	29/12/2025
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			
Interventor Externo	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 16.492,00	$ 0,00
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 73.493,00	$ 0,00
220.1	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	0,00	$ 189.219,00	$ 0,00
320.3.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SBG-38, clase C)	m3	10,60	$ 213.050,00	$ 2.258.330,00
330.3.2	BASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	0,00	$ 208.115,00	$ 0,00
420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	0,00	$ 5.701,00	$ 0,00
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	0,00	$ 1.271.009,00	$ 0,00
500.1.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT3)	m3	0,00	$ 1.111.036,00	$ 0,00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	52,70	$ 113.309,00	$ 5.971.384,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)	m3	23,40	$ 143.831,00	$ 3.365.645,00
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	9,00	$ 123.322,00	$ 1.109.898,00
630.4.1	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	$ 1.050.088,00	$ 0,00
640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0,00	$ 6.938,00	$ 0,00
640.2	MALLA DE REFUERZO fy = ____ MPa (Analizado para malla de refuerzo Fy = 420 Mpa)	kg	0,00	$ 9.073,00	$ 0,00
311.1	AFIRMADO	m3	0,00	$ 184.360,00	$ 0,00
663.1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ____, NORMA___, DE DIÁMETRO INTERNO___ mm (Analizado para tubería de plastico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)	m	18,00	$ 1.252.757,00	$ 22.549.626,00
801.8P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	m	0,00	$ 102.679,00	$ 0,00
670.5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA)	m3	0,00	$ 611.214,00	$ 0,00
600.1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MANUAL)	m3	0,00	$ 102.981,00	$ 0,00
210 C.1	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA HASTA 8 m	m3	0,00	$ 140.061,00	$ 0,00
210 C.3	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA 8-12m CONDICIONES SECAS	m3	0,00	$ 291.127,00	$ 0,00
210 C.2	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO HASTA 8 m	m3	0,00	$ 167.459,00	$ 0,00
210 C.4	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 8-12 mts CONDICIONES SECAS	m3	0,00	$ 265.848,00	$ 0,00
630.3.1	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	$ 786.662,00	$ 0,00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE OBRA NRO DOS (02) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 21042025-0831
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 21042025-0831

Secretaría : **INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de obra **9-jul-25**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	21042025-0831	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500027950			
NIT ó RUT:	901.925.183-8			
Contratista:	CONSORCIO FG SAN JOSE			
Representante Legal:	SERGIO ESTRADA MORALES			
Valor del Contrato ($):	$ 2.783.138.891,00	Aporte Departamento	$ 2.783.138.891,00	
Valor Adicion	$ 0,00	Aporte otras entidades	$ 0,00	
Objeto del contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	4500027950	FONDO	2-0378	0
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES			
Fecha de iniciacion	30/04/2025	Fecha de Suspensión 1		
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación		29/12/2025
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			
Interventor Externo	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS			

630.4.1	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	67,30	$ 1.050.088,00	$ 70.670.922,00
630.6	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	2,50	$ 618.575,00	$ 1.546.438,00
610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	0,00	$ 189.867,00	$ 0,00
640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	10.519,10	$ 6.938,00	$ 72.981.516,00
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	$ 144.307,00	$ 0,00
660.1.3	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 3"	m	0,00	$ 28.559,00	$ 0,00
660.1.2	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 4"	m	0,00	$ 28.559,00	$ 0,00
801.8P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	m	0,00	$ 102.679,00	$ 0,00
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT-2500 O SIMILAR (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab minima de 700 n)	m2	0,00	$ 17.860,00	$ 0,00
625.1.3 A	ANCLAJE TIPO ACTIVO DE 32T	ml	0,00	$ 684.910,00	$ 0,00
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	0,00	$ 3.567,00	$ 0,00
701.1.1	TACHA REFLECTIVA	u	0,00	$ 12.338,00	$ 0,00
670.5P	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO (Analizado para un concreto ciclopeo de 21 MPA)	u	0,00	$ 541.547,00	$ 0,00
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3/km	0,00	$ 1.516,00	$ 0,00
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 180.453.759,00**

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL OBRAS	**0,00**

PGIO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
PGIO-1	KIT DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL	UNIDAD	0,00	$ 100.000,00	$ 0,00
PGIO-2	PUNTOS ECOLOGICOS PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	UNIDAD	0,00	$ 500.000,00	$ 0,00
PGIO-3	ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES	UNIDAD	0,00	$ 200.000,00	$ 0,00
PGIO-4	LAVADO DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	0,00	$ 200.000,00	$ 0,00
PGIO-5	CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES Y ESCOMBROS	UNIDAD/MES	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
PGIO-6	CAPACITACION AMBIENTAL	UNIDAD	2,00	$ 200.000,00	$ 400.000,00

LOPTT

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE OBRA NRO DOS (02) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 21042025-0831
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 21042025-0831

Secretaria : **INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de obra **9-jul-25**

Concepto	Descripción				
No. Radicado Contrato de Obra	21042025-0831	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP:	4500027950				
NIT ó RUT:	901.925.183-8				
Contratista:	CONSORCIO FG SAN JOSE				
Representante Legal:	SERGIO ESTRADA MORALES				
Valor del Contrato ($):	$ 2.783.138.891,00	Aporte Departamento	$ 2.783.138.891,00		
Valor Adicion	$ 0,00	Aporte otras entidades	$ 0,00		
Objeto del contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS				
Compromiso Presupuestal:	4500027950	FONDO	2-0378	0	
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES				
Fecha de iniciacion	30/04/2025		Fecha de Suspensión 1		
Fecha de Reiniciación 1			Nueva fecha de terminación	29/12/2025	
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON				
Interventor Externo	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS				

PGIO-7	INFORMACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO	UNIDAD	0,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00
PGIO-8	ALQUILES BAÑO DE LA ZONA	UNIDAD/MES	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
PGIO-9	KIT DE ASEO	UNIDAD	0,00	$ 250.000,00	$ 0,00
PGIO-10	GENERACION DE INFORMES, EJE AMBIENTAL	MENSUAL	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
PGIO-11	BRIDAGA DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	MENSUAL	1,00	$ 1.174.387,50	$ 1.174.388,00
PGIO-12	GENERACION DE INFORMES EJE CALIDAD	MENSUAL	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
PGIO-13	KIT ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	UNIDAD	4,00	$ 100.000,00	$ 400.000,00
PGIO-14	KIT DE EMERGENCIAS	UNIDAD	0,00	$ 1.622.400,00	$ 0,00
PGIO-15	KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS	UNIDAD	0,00	$ 870.000,00	$ 0,00
PGIO-16	KIT PARA TRABAJOS EN CONFINADOS	UNIDAD	0,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00
PGIO-17	KIT PARA TRABAJO CON SOLDADURA	UNIDAD	0,00	$ 340.472,00	$ 0,00
PGIO-18	SEÑALIZACIÓN SST	UNIDAD	0,00	$ 175.400,00	$ 0,00
PGIO-19	GENERACION DE INFORMES EJE SST	MENSUAL	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
PGIO-20	BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	100,00	$ 15.000,00	$ 1.500.000,00
PGIO-21	SEÑAL PROVISIONAL VIAL	UNIDAD	0,00	$ 250.000,00	$ 0,00
PGIO-22	TECHADO EN PLASTICO Y GUADUA PARA CAISSONS Y EXCAVACIONES	M2	0,00	$ 20.000,00	$ 0,00
PGIO-23	DESVIO DE AGUA LLUVIA CON COSTALES	ML	80,00	$ 18.000,00	$ 1.440.000,00
				TOTAL PGIO	**$ 7.114.388,00**
				ADMINISTRACION 29%	**$ 2.063.173,00**
				TOTAL PGIO	**$ 9.177.561,00**

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		2.783.138.891,00
Valor adición No. 1		0
Valor Acta No. 1:	158.315.667,00	
Valor Acta No. 2:	189.631.320,00	
Valor Acta No. 3:		
Valor Acta No. 4:		
Valor Acta No. 5:		
Valor Acta No. 6:		
Saldo del contrato	2.435.191.904,00	
Sumas Iguales	2.783.138.891,00	2.783.138.891,00

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE OBRA NRO DOS (02) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 21042025-0831 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 21042025-0831

Secretaria : **INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de obra **9-jul-25**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	21042025-0831	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500027950			
NIT ó RUT:	901.925.183-8			
Contratista:	CONSORCIO FG SAN JOSE			
Representante Legal:	SERGIO ESTRADA MORALES			
Valor del Contrato ($):	$ 2.783.138.891,00	Aporte Departamento	$ 2.783.138.891,00	
Valor Adicion	$ 0,00	Aporte otras entidades	$ 0,00	
Objeto del contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	4500027950	FONDO	2-0378	0
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES			
Fecha de iniciacion	30/04/2025	Fecha de Suspensión 1		
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación		29/12/2025
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			
Interventor Externo	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS			

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		556.627.778,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	31.663.133,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	37.926.264,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:		
Amortización del Anticipo Acta 4:		
Amortización del Anticipo Acta 5:		
Amortización del Anticipo Acta 6:		
Saldo por amortizar:	487.038.381,00	
Sumas Iguales:	556.627.778,00	556.627.778,00

SE HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO FG SAN JOSE, representado legalmente por el ingeniero SERGIO ESTRADA MORALES, ejecuta parcialmente para el Departamento de Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la Se constató el cumplimiento del pago de:

Estampilla Prodesarrollo ☑ Estampilla Universidad ☑
Estampilla Pro-Hospital Deptal Santa Sofia ☑

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Ordenador del Gasto
EL DEPARTAMENTO

SERGIO ESTRADA MORALES
CONSORCIO FG SAN JOSE
El Contratista

ING. CAROLINA DUQUE TOBON
Supervisor

MARIA CLARA POTES MAZUERA
CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA DE OBRA NRO. DOS (02) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 21042025-0831
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 21042025-0831

Secretaría : **INFRAESTRUCTURA**
Fecha Preacta de obra **9-jul-25**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	21042025-0831	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500027950			
NIT ó RUT:	901.925.183-8			
Contratista:	CONSORCIO FG SAN JOSE			
Representante Legal:	SERGIO ESTRADA MORALES			
Valor del Contrato ($):	$ 2.783.138.891,00	Aporte Departamento	$ 2.783.138.891,00	
Valor Adicion	$ 0,00	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	4500027950	FONDO	2-0378	
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES			
Fecha de iniciacion	30/04/2025	Fecha de Suspensión 1		
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	29/12/2025	
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			
Interventor Externo	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	
220.1	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	0,00	
320.3.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SBG-38, clase C)	m3	10,60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
330.3.2	BASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	0,00	
420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	0,00	
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	0,00	
500.1.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT3)	m3	0,00	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	52,70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)	m3	23,40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	9,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
630.4.1	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	
640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0,00	
640.2	MALLA DE REFUERZO fy = ____ MPa (Analizado para malla de refuerzo Fy = 420 Mpa)	kg	0,00	
311.1	AFIRMADO	m3	0,00	
663.1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ____, NORMA___, DE DIÁMETRO INTERNO___ mm (Analizado para tubería de plastico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)	m	18,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
601.8P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	m	0,00	
670.5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA)	m3	0,00	
600.1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MANUAL)	m3	0,00	
210 C.1	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA HASTA 8 m	m3	0,00	
210 C.3	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA 8-12m CONDICIONES SECAS	m3	0,00	
210 C.2	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO HASTA 8 m	m3	0,00	
210 C.4	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 8-12 mts CONDICIONES SECAS	m3	0,00	

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA DE OBRA NRO. DOS (02) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 21042025-0831
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 21042025-0831

Secretaria : INFRAESTRUCTURA
Fecha Preacta de obra 9-jul-25

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	21042025-0831	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500027950			
NIT ó RUT:	901.925.183-8			
Contratista:	CONSORCIO FG SAN JOSE			
Representante Legal:	SERGIO ESTRADA MORALES			
Valor del Contrato ($):	$ 2.783.138.891,00	Aporte Departamento	$ 2.783.138.891,00	
Valor Adicion	$ 0,00	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	4500027950	FONDO	2-0378	
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES			
Fecha de iniciacion	30/04/2025	Fecha de Suspensión 1		
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	29/12/2025	
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			
Interventor Externo	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS			

630.3.1	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	
630.4.1	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	67,30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
630.6	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	2,50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	0,00	
640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	10.519,10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	
663.1.3P	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 3"	m	0,00	
663.1.2P	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 4"	m	0,00	
801.8P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	m	0,00	
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT-2500 O SIMILAR (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	0,00	
623.1.3A	ANCLAJE TIPO ACTIVO DE 32T	ml	0,00	
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	0,00	
701.1.1	TACHA REFLECTIVA	u	0,00	
670.5P	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO (Analizado para un concreto ciclopeo de 21 MPA)	u	0,00	
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3/km	0,00	

PGIO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
PGIO-1	KIT DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL	UNIDAD	0,00	
PGIO-2	PUNTOS ECOLOGICOS PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS	UNIDAD	0,00	
PGIO-3	ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES	UNIDAD	0,00	
PGIO-4	LAVADO DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	0,00	
PGIO-5	CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES Y ESCOMBROS	UNIDAD/MES	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGIO-6	CAPACITACION AMBIENTAL	UNIDAD	2,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGIO-7	INFORMACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO	UNIDAD	0,00	
PGIO-8	ALQUILES BAÑO DE LA ZONA	UNIDAD/MES	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA DE OBRA NRO. DOS (02) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 21042025-0831
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 21042025-0831

Secretaría : **INFRAESTRUCTURA**
Fecha Preacta de obra **9-jul-25**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	21042025-0831	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500027950			
NIT ó RUT:	901.925.183-8			
Contratista:	CONSORCIO FG SAN JOSE			
Representante Legal:	SERGIO ESTRADA MORALES			
Valor del Contrato ($):	$ 2.783.138.891,00	Aporte Departamento	$ 2.783.138.891,00	
Valor Adicion	$ 0,00	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	4500027950	FONDO	2-0378	
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES			
Fecha de iniciacion	30/04/2025	Fecha de Suspensión 1		
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	29/12/2025	
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			
Interventor Externo	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS			

PGIO-9	KIT DE ASEO	UNIDAD	0,00	
PGIO-10	GENERACION DE INFORMES, EJE AMBIENTAL	MENSUAL	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGIO-11	BRIDAGA DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	MENSUAL	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGIO-12	GENERACION DE INFORMES EJE CALIDAD	MENSUAL	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGIO-13	KIT ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	UNIDAD	4,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGIO-14	KIT DE EMERGENCIAS	UNIDAD	0,00	
PGIO-15	KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS	UNIDAD	0,00	
PGIO-16	KIT PARA TRABAJOS EN CONFINADOS	UNIDAD	0,00	
PGIO-17	KIT PARA TRABAJO CON SOLDADURA	UNIDAD	0,00	
PGIO-18	SEÑALIZACIÓN SST	UNIDAD	0,00	
PGIO-19	GENERACION DE INFORMES EJE SST	MENSUAL	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGIO-20	BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE	ML	100,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGIO-21	SEÑAL PROVISIONAL VIAL	UNIDAD	0,00	
PGIO-22	TECHADO EN PLASTICO Y GUADUA PARA CAISSONS Y EXCAVACIONES	M2	0,00	
PGIO-23	DESVIO DE AGUA LLUVIA CON COSTALES	ML	80,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

MARIA CLARA POTES MAZUERA
CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS
INTERVENTOR EXTERNO

SERGIO ESTRADA MORALES
CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATISTA

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ITEM	320.3.2	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	SUBBASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SBG-38, clase C)

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
			Transversal 1, instalacion de tuberia de 36"		10.00	1.40	14.00	0.4	1	5.60	5.60
			Transversal 2, instalacion de tuberia de 36"		9.00	1.40	12.60	0.40	1	5.04	10.64
									TOTAL		10.60

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 091037-0507947 CND

JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P 17202-23036 CLD

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS


REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0631	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0632	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	320.3.2	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	SUBBASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SBG-38, clase C)



INSTALACION DE SUB BASE EN TRANSVERSAL

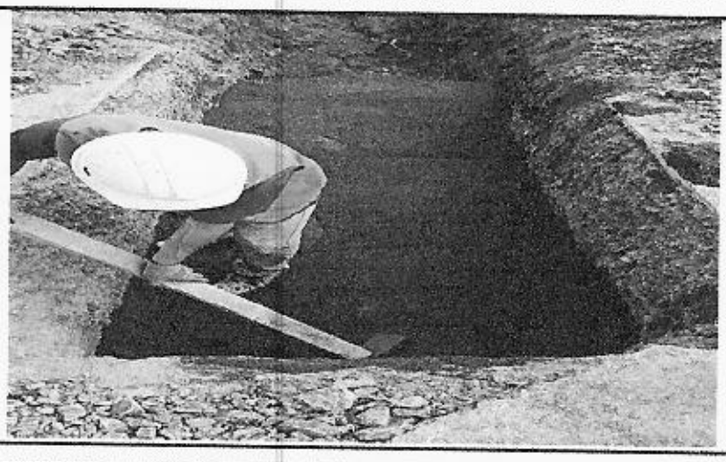

INSTALACION DE SUB BASE EN TRANSVERSAL

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	633.1.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
			Transversal 1, instalacion de tuberia de 36"		10.00	1.40	14.00	2	1	28.00	28.00
			Descuento de tubería de 24"		9.00		0.33		-1	-2.99	25.01
			Transversal 2, instalacion de tubera de 36"		9.00	1.40	12.60	2.20	1	27.72	52.73

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	600.1,1	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR




EXCAVACION TRANSVERSAL



EXCAVACION TRANSVERSAL



EXCAVACION TRANSVERSAL

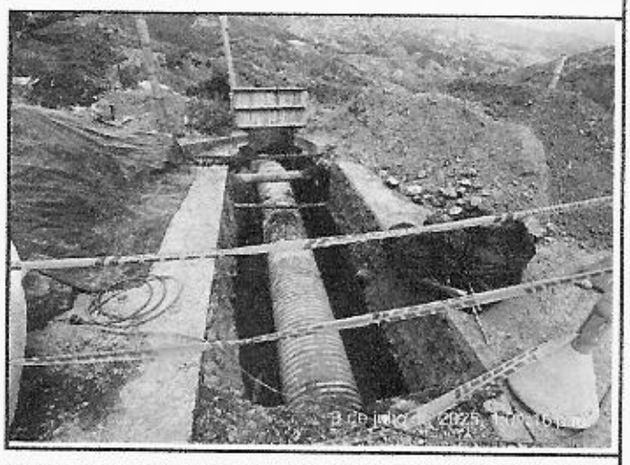

EXCAVACION TRANSVERSAL

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0532	INTERVENTORIA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	610.10	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
			Linea Transversal 1, instalacion de tuberia de 36"		10.00	1.40	14.00	1.45	1	20.30	20.30
			Linea Transversal 2, instalacion de tuberia de 36"		9.00	1.40	12.60	1.60	1	20.16	40.46
					9.00		0.85		-2	-17.11	23.35
									TOTAL		23.40

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 091037-0507947 CND

JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P 17202-23036 CLD


CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS


REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	610,10	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)

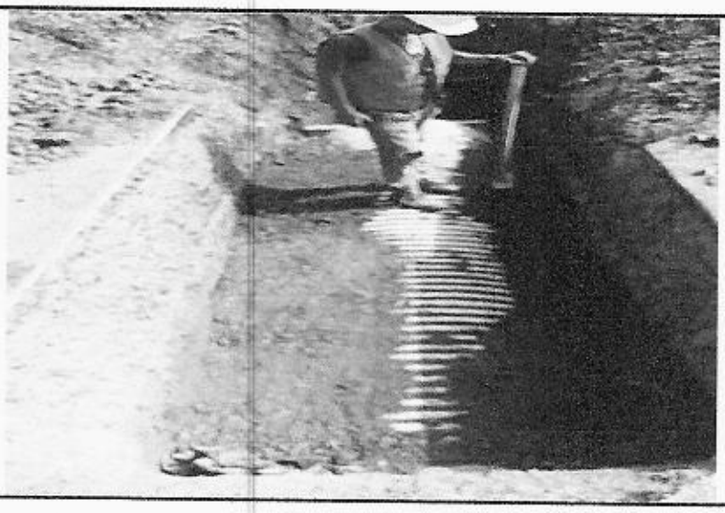

RELLENO PARA TRANSVERSAL

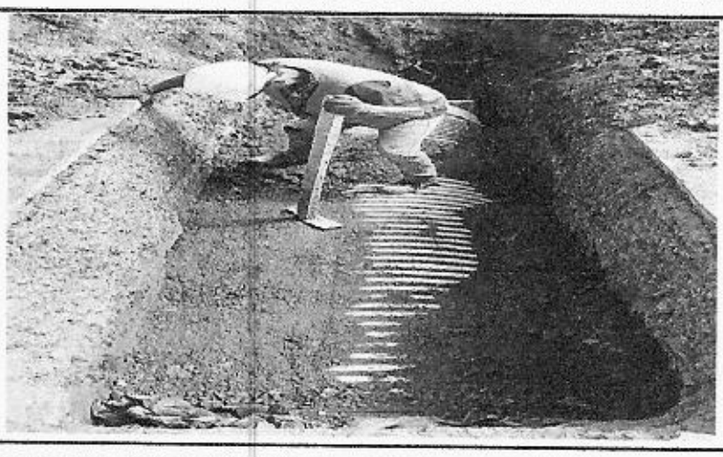

RELLENO PARA TRANSVERSAL

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORIA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	201.15	UNIDAD DE MEDIDA	ML	DESCRIPCIÓN	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
			Remoción tubería transversal 1 de 24" a 36"		9.00				1	9.00	9.00
					TOTAL					9.00	

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 091037-0507947 CND


JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P 17202-23036 CLD

CONSORCIO FG SAN JOSE	OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS


REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0631	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0632	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	201,15	UNIDAD DE MEDIDA	ML	DESCRIPCIÓN	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

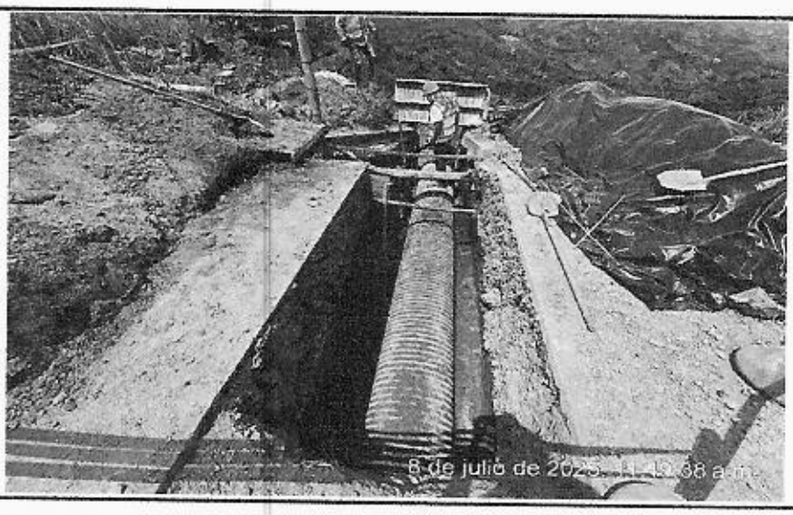

REMOCION DE TUBERIA DE 24"

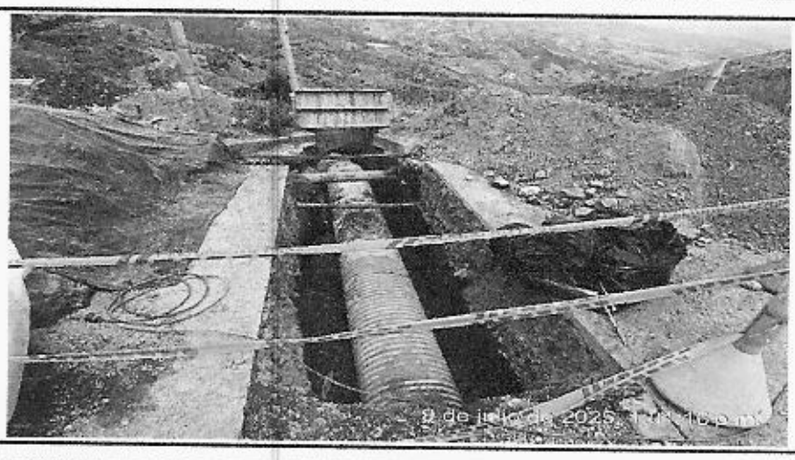

REMOCION DE TUBERIA DE 24"

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	22042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	663,1	UNIDAD DE MEDIDA	ML	DESCRIPCIÓN	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ____, NORMA___, DE DIÁMETRO INTERNO___ mm (Analizado para tubería de plastico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
6/07/2025			Instalacion de Tuberia de 36" Transversales		18.00				1	18.00	18.00
							TOTAL			18.00	

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 091037-0507947 CND

JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P 17202-23036 CLD

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS


REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS


ÍTEM	663,1	UNIDAD DE MEDIDA	ML	DESCRIPCIÓN	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ____, NORMA___, DE DIÁMETRO INTERNO___ mm (Analizado para tubería de plastico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)




INSTALACION DE TUBERIA DE 36"

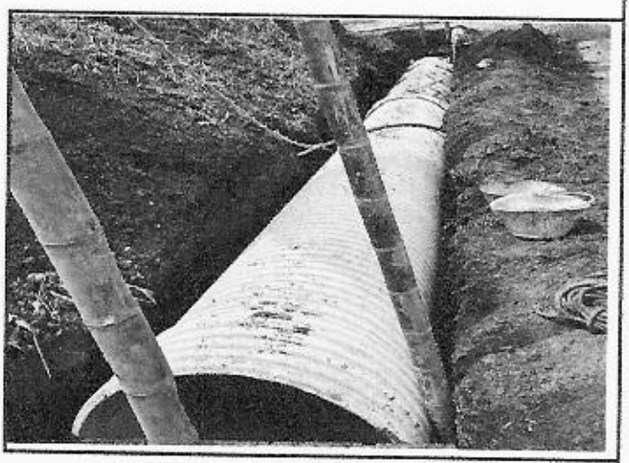

INSTALACION DE TUBERIA DE 36"

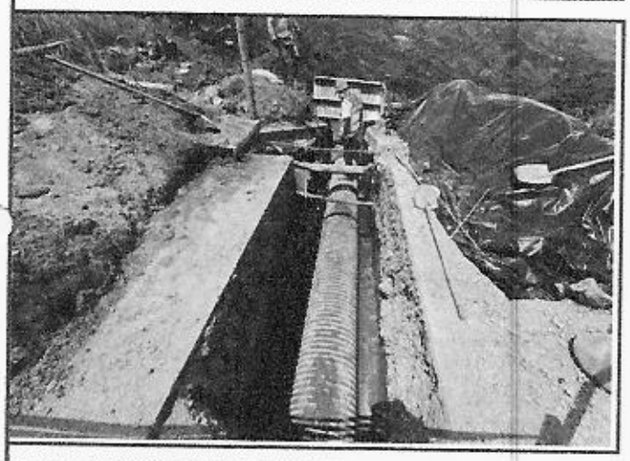

INSTALACION DE TUBERIA DE 36"

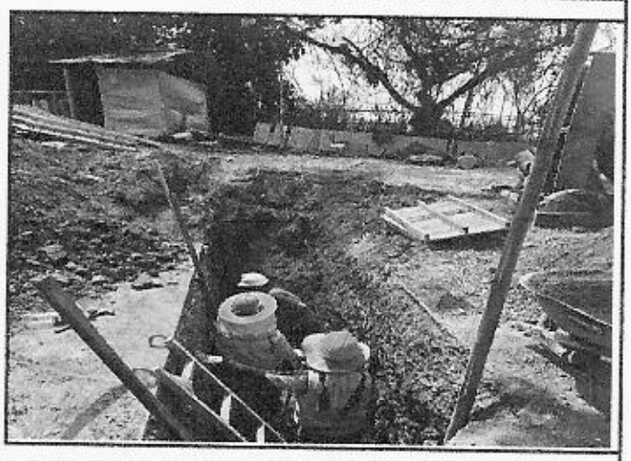

INSTALACION DE TUBERIA DE 36"

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No:	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO VP PUNTOS CRITICOS

ITEM	630.4.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 3		1.00		0.38			0.38	0.38
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	0.76
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	1.14
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	1.52
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	1.90
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	2.28
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	2.66
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	3.04
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 11		1.00		0.38			0.38	3.42
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 12		1.00		0.38			0.38	3.80
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 13		0.70		0.38			0.27	4.07
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 2		1.00		0.38			0.38	4.45
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 3		1.00		0.38			0.38	4.83
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	5.21
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	5.59
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	5.97
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	6.35
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	6.73
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	7.11
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 11		1.00		0.38			0.38	7.49
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 12		1.00		0.38			0.38	7.87
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 3		1.00		0.38			0.38	8.25
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	8.6
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	9.01
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	9.4
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	9.77
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	10.2
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	10.53
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	10.9
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 11		1.00		0.38			0.38	11.29
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 12		0.40		0.38			0.15	11.4
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 3		1.00		0.38			0.38	11.82
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	12.2
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	12.6
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	13.0
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	13.3
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	13.7
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	14.1
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	14.5
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 11		1.00		0.38			0.38	14.9
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 12		0.50		0.38			0.19	15.1
6/07/2025			Caisson #6 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	15.43
6/07/2025			Caisson #6 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	15.81
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 3		1.00		0.38			0.38	16.19
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	16.57
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	16.95
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	17.33
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	17.71
6/07/2025			Caisson #8 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	18.09
6/07/2025			Caisson #8 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	18.47
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	18.85
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	19.23
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	19.61
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	19.99
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	20.37
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	20.75
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	21.13
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	21.51
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	21.9
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	22.27
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	22.65
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	23.03
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	23.41
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	23.79
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 11		0.20		0.38			0.08	23.87
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	24.25
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	24.63
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	25.01
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	25.39
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	25.77

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042026-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042026-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ITEM	630.4.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	26.15
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	26.53
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	26.9
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	27.28
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	27.67
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	28.05
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	28.43
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	28.81
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	29.19
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	29.57
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	29.95
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	30.3
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	30.7
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	31.1
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	31.5
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	31.9
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 11		0.40		0.38			0.15	32.0
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	32.38
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	32.76
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	33.14
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	33.52
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	33.90
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	34.28
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	34.66
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 11		0.80		0.38			0.30	34.96
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 4		1.00		0.38			0.38	35.34
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	35.72
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	36.10
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	36.48
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	36.86
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	37.24
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	37.62
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 11		0.80		0.38			0.30	37.92
6/07/2025			Caisson #16 ,anillo # 5		1.00		0.38			0.38	38.3
6/07/2025			Caisson #16 ,anillo # 6		1.00		0.38			0.38	38.68
6/07/2025			Caisson #16 ,anillo # 7		1.00		0.38			0.38	39.06
6/07/2025			Caisson #16 ,anillo # 8		1.00		0.38			0.38	39.44
6/07/2025			Caisson #16 ,anillo # 9		1.00		0.38			0.38	39.82
6/07/2025			Caisson #16 ,anillo # 10		1.00		0.38			0.38	40.20
6/07/2025			Caisson #16 ,anillo # 11		1.00		0.38			0.38	40.58
6/07/2025			Caisson #16 ,anillo # 12		0.45		0.38			0.17	40.75
6/07/2025			Caisson #1 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	41.13
6/07/2025			Caisson #1 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	41.51
6/07/2025			Caisson #1 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	41.89
6/07/2025			Caisson #1 ,anillo # 4 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	42.27
6/07/2025			Caisson #1 ,anillo # 5 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	42.65
6/07/2025			Caisson #1 ,anillo # 6 costado izquierdo		0.60		0.38			0.23	42.88
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	43.26
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	43.64
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	44.02
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 4 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	44.40
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 5 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	44.78
6/07/2025			Caisson #2 ,anillo # 6 costado izquierdo		0.70		0.38			0.27	45.05
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	45.43
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	45.81
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	46.19
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 4 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	46.57
6/07/2025			Caisson #3 ,anillo # 5 costado izquierdo		0.50		0.38			0.19	46.76
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	47.14
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	47.52
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	47.90
6/07/2025			Caisson #4 ,anillo # 4 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	48.28
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	48.66
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	49.04
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	49.42
6/07/2025			Caisson #5 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.40		0.38			0.15	49.57
6/07/2025			Caisson #6 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	49.95
6/07/2025			Caisson #6 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	50.33
6/07/2025			Caisson #6 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	50.71
6/07/2025			Caisson #6 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.85		0.38			0.32	51.03
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	51.41
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	51.79
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	52.17
6/07/2025			Caisson #7 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.20		0.38			0.08	52.25

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	210412025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	220412025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	630.4.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Longi.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
6/07/2025			Caisson #8 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	52.63
6/07/2025			Caisson #8 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	53.01
6/07/2025			Caisson #8 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	53.39
6/07/2025			Caisson #8 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.40		0.38			0.15	53.54
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	53.92
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	54.30
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	54.68
6/07/2025			Caisson #9 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.80		0.38			0.30	54.98
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	55.36
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	55.74
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	56.12
6/07/2025			Caisson #10 ,anillo # 4 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	56.50
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	56.88
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	57.26
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	57.64
6/07/2025			Caisson #11 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.60		0.38			0.23	57.87
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	58.25
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	58.63
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	59.01
6/07/2025			Caisson #12 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.53		0.38			0.20	59.21
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	59.59
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	59.97
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	60.35
6/07/2025			Caisson #13 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.40		0.38			0.15	60.50
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	60.88
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	61.26
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	61.64
6/07/2025			Caisson #14 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.48		0.38			0.18	61.82
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 1 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	62.20
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 2 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	62.58
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 3 costado izquierdo		1.00		0.38			0.38	62.96
6/07/2025			Caisson #15 ,anillo # 4 costado izquierdo		0.45		0.38			0.17	63.13
6/07/2025			Alcantarilla N.4; Piso		1.80	1.50	2.40	0.2	1	0.48	63.61
6/07/2025			Alcantarilla N.4; Paredes		1.10	1.20	1.32	2.4	4	1.90	65.51
6/07/2025			Alcantarilla N.5; Piso		1.80	1.50	2.40	0.2	1	0.48	65.99
6/07/2025			Alcantarilla N.5; Paredes		1.10	1.20	1.32	1.6	4	1.27	67.26
									TOTAL		67.26

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 091037-0507947 CND

JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P 17202-23036 CLD


CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS


REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS


ÍTEM	630.4.1	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)

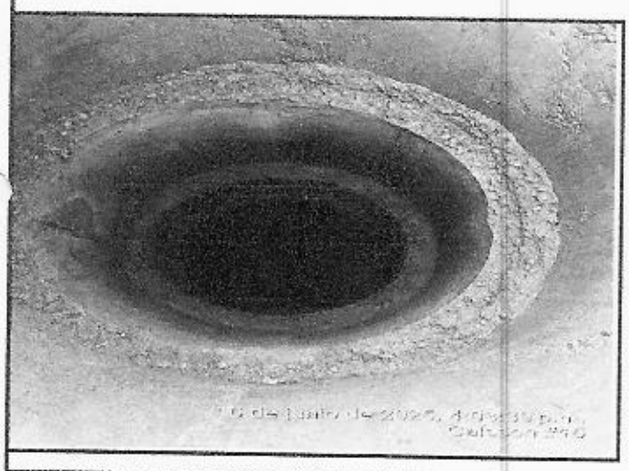


VACIADO DE CONCRETO EN ANILLOS CAISSON

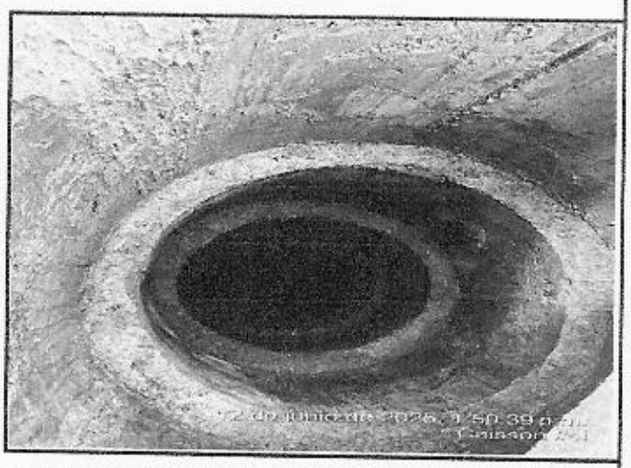

VACIADO DE CONCRETO EN ANILLOS CAISSON

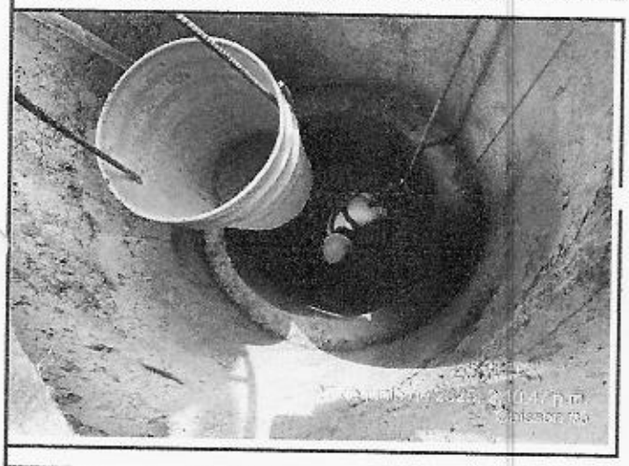

VACIADO DE CONCRETO EN ANILLOS CAISSON

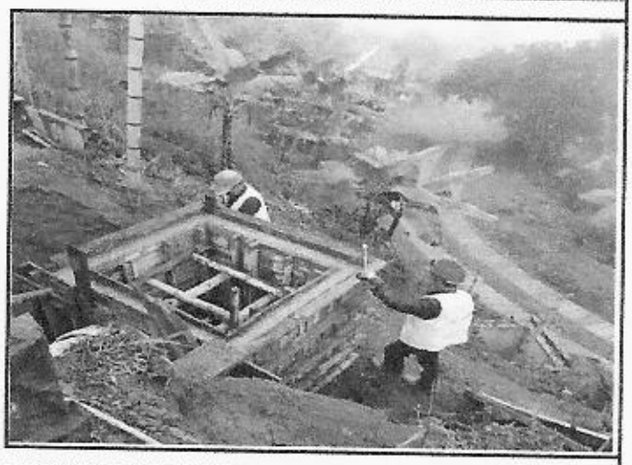

VACIADO DE CONCRETO EN CAMARA

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	630.6	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Área	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
			Solera Viga costado izquierdo		52.00	1.20	62.40	0.05	1	3.12	3.12
							0.79	0.05	-15	-0.59	2.53
											2.53
									TOTAL		2.53

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 091037-0607547 CND

JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P 17202-230362 CLD


CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS


REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	630,6	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)

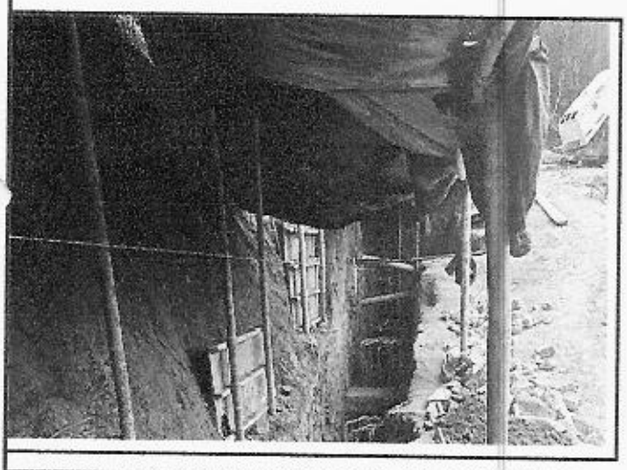

SOLADO DE LIMPIEZA PARA VIGA CABEZAL

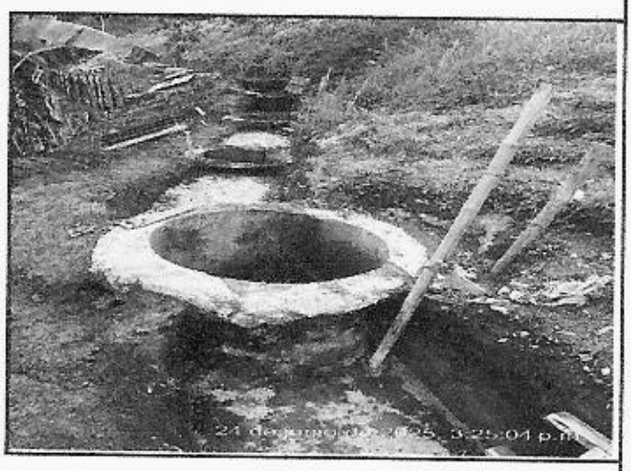

SOLADO DE LIMPIEZA PARA VIGA CABEZAL



SOLADO DE LIMPIEZA PARA VIGA CABEZAL



SOLADO DE LIMPIEZA PARA VIGA CABEZAL

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	640.10	UNIDAD DE MEDIDA	Kg	DESCRIPCIÓN	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)

Fecha	Abscisas de ejecución	Descripción	Observaciones	Barra	Peso/ml	Long	Cantidad	Peso Total	Total	Acumul.
6/07/2025		Acero caisson #11 longitudinal		7	3.045	11.00	16	535.920	535.92	535.92
6/07/2025		Acero caisson #11 flejes		4	1.00	3.6	74	266.958	266.96	804.88
6/07/2025		Acero caisson #12 longitudinal		7	3.045	11.00	16	535.920	535.92	1,340.80
6/07/2025		Acero caisson #12 flejes		4	1.00	3.6	74	266.958	266.96	1,609.75
6/07/2025		Acero caisson #13 longitudinal		7	3.045	11.00	16	535.920	535.92	2,145.68
6/07/2025		Acero caisson #13 flejes		4	1.00	3.6	74	266.958	266.96	2,414.63
6/07/2025		Acero caisson #14 longitudinal		7	3.045	11.00	16	535.920	535.92	2,950.55
6/07/2025		Acero caisson #14 flejes		4	1.00	3.6	74	266.958	266.96	3,218.51
6/07/2025		Acero caisson #15 longitudinal		7	3.045	11.00	16	535.920	535.92	3,755.43
6/07/2025		Acero caisson #15 flejes		4	1.00	3.6	74	266.958	266.96	4,024.39
6/07/2025		Acero caisson #16 longitudinal		7	3.045	11.00	16	535.920	535.92	4,560.31
6/07/2025		Acero caisson #16 flejes		4	1.00	3.6	74	266.958	266.96	4,829.27
6/07/2025		Acero caisson #1 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	5,033.89
6/07/2025		Acero caisson #1 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	5,193.60
6/07/2025		Acero caisson #2 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	5,398.23
6/07/2025		Acero caisson #2 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	5,557.94
6/07/2025		Acero caisson #3 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	5,762.58
6/07/2025		Acero caisson #3 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	5,922.27
6/07/2025		Acero caisson #4 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	6,126.90
6/07/2025		Acero caisson #4 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	6,286.61
6/07/2025		Acero caisson #5 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	6,491.23
6/07/2025		Acero caisson #5 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	6,650.94
6/07/2025		Acero caisson #6 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	6,855.55
6/07/2025		Acero caisson #6 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	7,015.27
6/07/2025		Acero caisson #7 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	7,219.90
6/07/2025		Acero caisson #7 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	7,379.61
6/07/2025		Acero caisson #8 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	7,584.23
6/07/2025		Acero caisson #8 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	7,743.94
6/07/2025		Acero caisson #9 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	7,948.57
6/07/2025		Acero caisson #9 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	8,108.28
6/07/2025		Acero caisson #10 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	8,312.90
6/07/2025		Acero caisson #10 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	8,472.61
6/07/2025		Acero caisson #11 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	8,677.23
6/07/2025		Acero caisson #11 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	8,836.94
6/07/2025		Acero caisson #12 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	9,041.57
6/07/2025		Acero caisson #12 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	9,201.28
6/07/2025		Acero caisson #13 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	9,405.90
6/07/2025		Acero caisson #13 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	9,565.61
6/07/2025		Acero caisson #14 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	9,770.24
6/07/2025		Acero caisson #14 flejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	159.710	159.71	9,929.95

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-C031	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	640.10	UNIDAD DE MEDIDA	Kg	DESCRIPCIÓN	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)

Fecha	Abscisas de ejecución		Descripción	Observaciones	Barra	Peso/ml	Long	Cantidad	Peso Total	Total	Acumul.
8/07/2025			Acero caisson #15 longitudinal;Costazo izquierdo		7	3.045	4.20	16	204.624	204.62	10,134.57
8/07/2025			Acero caisson #15 tiejes;Costazo izquierdo		4	1.00	3.6	44	158.710	158.71	10,294.28
			Camara de alcantarillado N.4		2	0.56	4.40	6	14.784	14.78	10,309.0655
					2	0.56	3.80	8	17.024	17.02	10,326.09
					3	0.56	5.00	9	25.200	25.20	10,351.29
					3	0.56	1.70	8	7.616	7.62	10,358.91
					3	0.56	6.00	4	13.440	13.44	10,372.35
					3	0.56	4.30	8	19.264	19.26	10,391.61
			Camara de alcantarillado N.5		3	0.56	4.55	8	20.384	20.38	10,411.9926
					3	0.56	2.85	8	12.768	12.77	10,424.78
					3	0.56	6.00	5	16.800	16.80	10,441.9615
					3	0.56	2.00	8	8.960	8.98	10,450.52
			Camara de alcantarillado N.3		3	0.56	3.80	16	34.048	34.05	10,484.5698
					3	0.56	1.60	16	14.336	14.34	10,498.91
					3	0.56	4.50	8	20.160	20.16	10,519.0856
									TOTAL		10,519.10

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 091037-0507847 CND

JUAN ALBERTO ZULUAGA NUÑOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P 17202-23036 CLD

CONSORCIO FG SAN JOSE	OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS


REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	640,10	UNIDAD DE MEDIDA	M3	DESCRIPCIÓN	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)



ACERO DE CAISSON

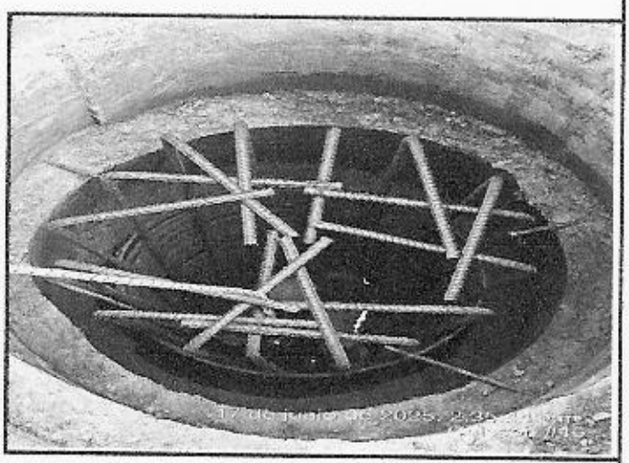

ACERO DE CAISSON



ACERO DE CAISSON



ACERO DE CAMARA

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

PREACTA DE OBRA N° 2 - PGIO

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	PGIO	UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN	

Fecha			Descripción		Cantidad		Total
30/06/2025		UNIDAD	KIT DE SENALIZACIÓN AMBIENTAL		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD	PUNTOS ECOLOGICOS PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD	ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD	LAVADO DE HERRAMIENTAS		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD/MES	CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES Y ESCOMBROS		1.00		1
30/06/2025		UNIDAD	CAPACITACION AMBIENTAL		2.00		2
30/06/2025		UNIDAD	INFORMACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD/MES	ALQUILES BAÑO DE LA ZONA		1.00		1
30/06/2025		UNIDAD	KIT DE ASEO		0.00		0
30/06/2025		MENSUAL	GENERACION DE INFORMES, EJE AMBIENTAL		1.00		1
30/06/2025		MENSUAL	BRIDAGA DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		1.00		1
30/06/2025		MENSUAL	GENERACION DE INFORMES EJE CALIDAD		1.00		1
30/06/2025		UNIDAD	KIT ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL		4.00		4
30/06/2025		UNIDAD	KIT DE EMERGENCIAS		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD	KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD	KIT PARA TRABAJOS EN CONFINADOS		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD	KIT PARA TRABAJO CON SOLDADURA		0.00		0
30/06/2025		UNIDAD	SEÑALIZACIÓN SST		0.00		0
30/06/2025		MENSUAL	GENERACION DE INFORMES EJE SST		1.00		1
30/06/2025		ML	BARRERA CON BOMBONES PLASTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD		100.00		100
30/06/2025		UNIDAD	SEÑAL PROVISIONAL VIAL		0.00		0
30/06/2025		M2	TECHADO EN PLASTICO Y GUADUA PARA CAISSONS Y EXCAVACIONES		0.00		0
30/06/2025		ML	DESVIO DE AGUA LLUVIA CON COSTALES		80.00		80
				TOTAL			192.00

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P 091037-0507947 CND

JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P 17202-23036 CLD

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS


REGISTRO FOTOGRÁFICO PGIO N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	PGIO	UNIDAD DE MEDIDA	0	DESCRIPCIÓN	




MANEJO DE AGUAS

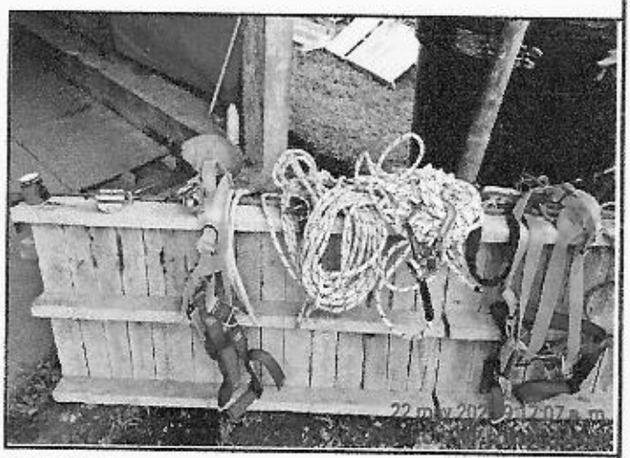


KIT DE TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS



SEÑALIZACION

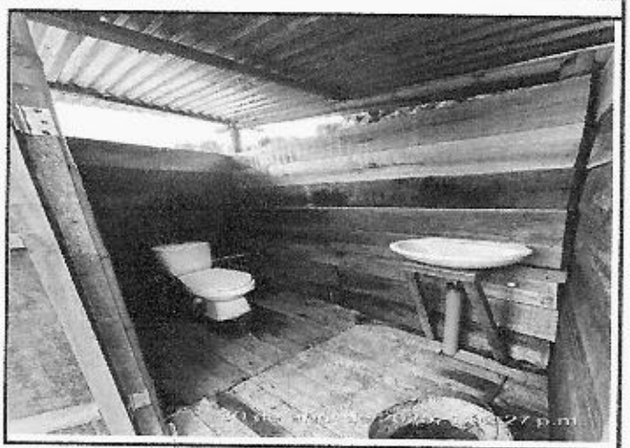

BAÑO

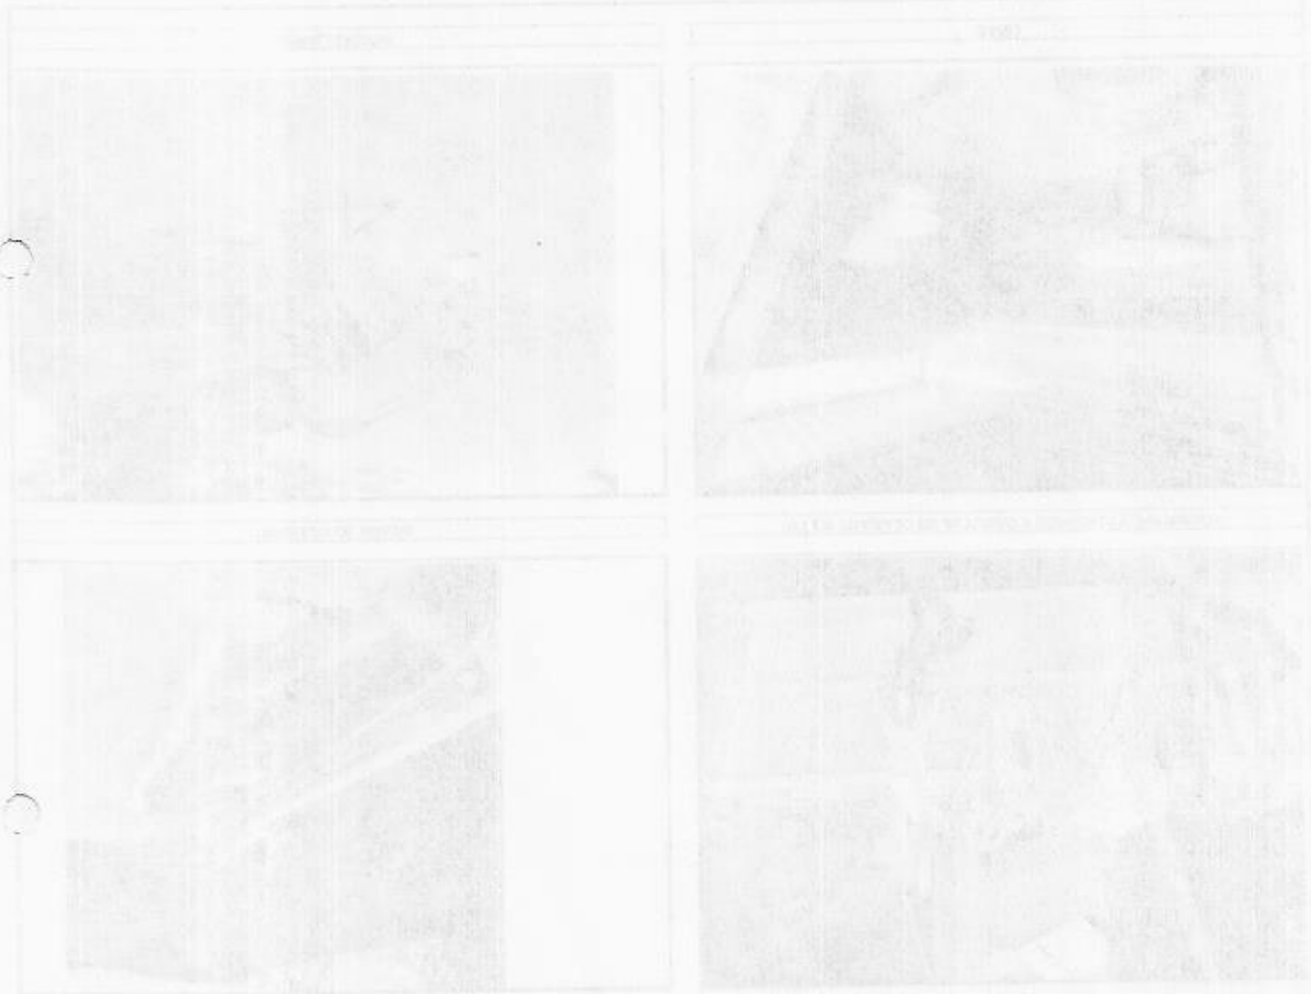

CONSORCIO FG SAN JOSE

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PGIO N° 2

CONTRATO DE OBRA No	21042025-0831	CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	22042025-0832	INTERVENTORÍA	CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS

ÍTEM	PGIO	UNIDAD DE MEDIDA	0	DESCRIPCIÓN	




TECHADO EN PLASTICO Y GUADUA PARA CAISSONS Y EXCAVACIONES



PUNTO ECOLOGICO CAMPAMENTO



ENTREGA EPP'S

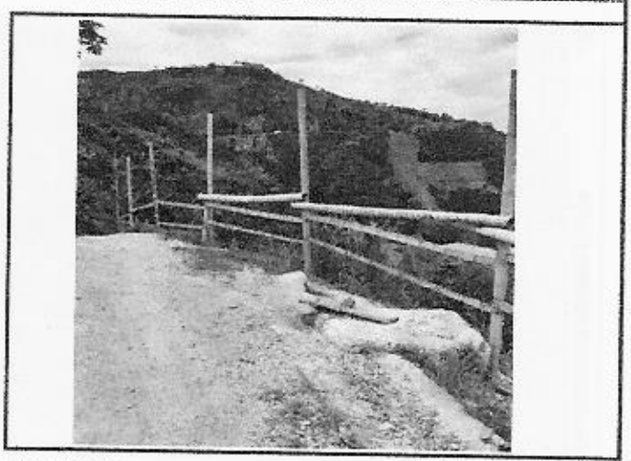

SEÑALIZACION

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 20/01/2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE INTERVENTORIA 02 PARCIAL

CONTRATO	21042025-0831	RADICADO JURID. NRO:	21042025-0831		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES			MODIFICATORIO 01	N/A
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE A.U	$ 2.076.969.322	VALOR A.U.	$ 706.169.569	REAJUSTES	
VALOR TOTAL	$ 2.783.138.891				

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	910,00	15.007.720	0,54	-0,31	379,50	6.258.714	0,22
EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	390,00	28.662.270	1,03	-1,03	0,00	0	0,00
TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	93,00	17.597.367	0,63	-0,63	0,00	0	0,00
SUBBASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SBG-38, clase C)	665,00	141.678.250	5,09	-5,01	10,60	2.258.330	0,08
BASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	291,00	60.561.465	2,18	-2,18	0,00	0	0,00
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	1.680,00	9.577.680	0,34	-0,34	0,00	0	0,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	179,00	227.510.611	8,17	-8,17	0,00	0	0,00
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT3)	104,00	115.547.744	4,15	-4,15	0,00	0	0,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	625,00	70.818.125	2,54	-2,07	117,10	13.268.484	0,48
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)	156,00	22.437.636	0,81	-0,10	137,60	19.791.145	0,71
REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	44,00	5.426.168	0,19	0,00	45,00	5.549.490	0,20
TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	187,00	196.366.456	7,06	-7,06	0,00	0	0,00
ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	4.242,00	29.430.996	1,06	-1,06	0,00	0	0,00
MALLA DE REFUERZO fy = ____ MPa (Analizado para malla de refuerzo Fy = 420 Mpa)	1.708,00	15.496.684	0,56	-0,56	0,00	0	0,00
AFIRMADO	87,00	16.039.320	0,58	-0,58	0,00	0	0,00
TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ____, NORMA___, DE DIÁMETRO INTERNO___ mm (Analizado para tuberia de plastico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)	54,00	67.648.878	2,43	0,00	54,00	67.648.878	2,43
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	1.348,00	138.411.292	4,97	-4,97	0,00	0	0,00
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA)	30,00	18.336.420	0,66	-0,66	0,00	0	0,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MANUAL)	844,00	86.915.964	3,12	-3,12	0,00	0	0,00
EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA HASTA 8 m	143,00	20.028.723	0,72	-0,72	0,00	0	0,00
EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA 8-12m CONDICIONES SECAS	13,00	3.784.651	0,14	-0,14	0,00	0	0,00
EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO HASTA 8 m	95,00	15.908.605	0,57	-0,20	61,60	10.315.474	0,37
EXCAVACIÓN PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 8-12 mts CONDICIONES SECAS	9,00	2.392.632	0,09	-0,09	0,00	0	0,00
TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	444,00	349.277.928	12,55	-12,55	0,00	0	0,00
TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	74,00	77.706.512	2,79	0,41	84,80	89.047.462	3,20
TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	4,00	2.474.300	0,09	-0,03	2,50	1.546.438	0,06
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	650,00	123.413.550	4,43	-4,43	0,00	0	0,00
ACERO DE REFUERZO fy = _____MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	44.407,00	308.095.766	11,07	-8,12	11.837,20	82.126.494	2,95
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	54,00	7.792.578	0,28	-0,28	0,00	0	0,00
TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 3"	64,00	1.827.776	0,07	-0,07	0,00	0	0,00
TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 4"	48,00	1.370.832	0,05	-0,05	0,00	0	0,00
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	50,00	5.133.950	0,18	-0,18	0,00	0	0,00

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 20/01/2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE INTERVENTORIA 02 PARCIAL

CONTRATO	21042025-0831		RADICADO JURID. NRO:		21042025-0831		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE						
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS						
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES					MODIFICATORIO 01	N/A
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE A.U	**$ 2.076.969.322**		VALOR A.U.	**$ 706.169.569**		REAJUSTES	
VALOR TOTAL	**$ 2.783.138.891**						

GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT-2500 O SIMILAR (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	446,00	7.965.560	0,29	-0,29	0,00	0	0,00
ANCLAJE TIPO ACTIVO DE 32T	659,00	451.355.690	16,22	-16,22	0,00	0	0,00
LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	840,00	2.996.280	0,11	-0,11	0,00	0	0,00
TACHA REFLECTIVA	105,00	1.295.490	0,05	-0,05	0,00	0	0,00
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO (Analizado para un concreto ciclopeo de 21 MPA)	10,00	5.415.470	0,19	-0,19	0,00	0	0,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	19.505,00	29.569.580	1,06	-1,06	0,00	0	0,00
VALOR COSTO DIRECTO		**$ 2.701.276.919**	**97.06**			**$ 297.810.909**	**10.70**
VALOR PGIO (B)		**$ 81.861.972**	**2.94**			**$ 50.136.078**	**1.80**
VALOR TOTAL		**$ 2.783.138.891**	**100.00**			**$ 347.946.987**	**12.50**

NOTA: En la columna diferencia, las cantidades negativas corresponden al porcentaje de menor cantidad de obra y las positivas a las mayores cantidades de obra y a la obra adicional no prevista.

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO FG SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.783.138.891
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 2.783.138.891
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
MODIFICATORIO 01 (PLAZO)	N/A
FECHA INICIACION	30/04/2025
FECHA TERMINACION	29/12/2025

INTERVENTORIA
LA INTERVENTORIA ES REALIZADA POR EL CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS (INTERVENTOR EXTERNO). LA SUPERVISION, POR PARTE DE LA ING. CAROLINA DUQUE TOBON., PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO A LA S.INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción de la Actividad: Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales (-) Excavaciones Varias Sin Clasificar (-) Relleno Para Estructuras Con Suelo (-) Remoción De Alcantarillas (-) Concreto Resistencia 21mpa (D) (-) Tubería De Plastico Tipo Pvc Norma Ntc-5055 De Diametro 900 Mm (-) Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa (-) Excavación para caisson en Conglomerado hasta 8 Metros.

Con una inversion de $189.631.320 equivalente al 6,81% del valor del contrato incluido AU del 34%.

MARIA CLARA ROTES MAZUERA
CONSORCIO NP PUNTOS CRITICOS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 20/01/2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA 9-jul-25

ACTA NRO. DOS (02) — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO 21042025-0831 **CONSULTORIA** [ ] **OBRA:** [X]

NRO CONTRATO RADICADO: 21042025-0831

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS
INTERVENTOR	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de proteccion personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construccion cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora	X			
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavacion y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por mas de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintetica o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recoleccion periodica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintetica o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolucion de la liga asfaltica se realiza con calentadores portatiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias electricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metalicas o geotextil	X			
Las baterias de las maquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra	X			
Se utilizan compresores neumaticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizo en zonas publicas		X		
Las labores de reparacion y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados		X		
Se usan baños portatiles		X		
Se entrega volantes informativos para la comunidad	X			
Se tiene el manual de minimas implicaciones ambientales en la obra	X			
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de particulas de cemento)	X			
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire	X			
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición	X			
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

MARÍA CLARA POTES MAZUERA
CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 20/01/2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	9-jul-25

Descripción de la Actividad: Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales (-) Excavaciones Varias Sin Clasificar (-) Relleno Para Estructuras Con Suelo (-) Remoción De Alcantarillas (-) Concreto Resistencia 21mpa (D) (-) Tubería De Plastico Tipo Pvc Norma Ntc-5055 De Diametro 900 Mm (-) Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa (-) Excavación para caisson en Conglomerado hasta 8 Metros.

Con una inversion de $189.631.320 equivalente al 6,81% del valor del contrato incluido AU del 34%.

CONTRATO	21042025-0831	CONSULTORIA		OBRA:	X

Nº CONTRATO RADICADO:	21042025-0831
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS
INTERVENTOR EXT.	CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS

FIANZAS (POLIZAS) 21-40-101219435 Y 21-44-101425927	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)	$ 427.050.000,00	29/04/2025 HASTA 29/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 427.050.000,00	29/04/2025 HASTA 29/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 427.050.000,00	29/04/2025 HASTA 29/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 556.627.778,20	29/04/2025 HASTA 29/04/2026	SEGUROS DEL ESTADO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	$ 556.627.778,20	29/04/2025 HASTA 29/04/2026	SEGUROS DEL ESTADO
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 556.627.778,20	29/04/2025 HASTA 29/12/2028	SEGUROS DEL ESTADO
ESTABILIDAD	$ 834.941.667,30	29/12/2025 HASTA 29/12/2029	SEGUROS DEL ESTADO

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS NRO.	X	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF		PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)		INF. FOTOGRAFICO	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASI COMO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ANEXARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
01 AL 30	JUNIO	LLUVIOSO	LLUVIAS INTERMITENTES DURANTE EL DÍA

OBSERVACIONES	INTERVENTOR (EXTERNO) CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS

CONSORCIO
FG SAN JOSE

CONSORCIO FG SAN JOSE

INFORME DE OBRA N.2

CONTRATO No 21042025-0835



01 A 30 DE JUNIO DE 2025

CONSORCIO FG SAN JOSE

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN 3
CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO 5
1.1 Objetivos 5
1.1.1 Objetivo principal 5
1.1.2 Objetivos específicos 5
1.2 Descripción del proyecto 6
1.2.1 Localización del proyecto 8
1.2.2 Estado inicial de la vía 9
1.2.3 Características técnicas del proyecto 9
1.3 Información Contrato de Obra 11
1.4 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes. 11
1.4.1 Actividades de construcción semanales. 12
1.4.2 Actividades de control de calidad 14
1.5 Información financiera del contratista 14
1.5.1 Avance financiero contrato de obra 14
1.5.3 Estado actual del contrato de obra 17

CONSORCIO
FG SAN JOSE

INTRODUCCIÓN

El 30 de abril de 2025, se lleva a cabo la firma del contrato 21042025-0831, celebrado entre La Gobernación de Caldas y Consorcio FG SAN JOSE, cuyo objeto es el "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS.".

A fin de realizar el adecuado seguimiento y control al contrato de obra anteriormente citado, se suscribe el contrato 22042025-0832 también el día 30 de abril de 2025 con el Consorcio NP PUNTOS CRITICOS cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2024, QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN A VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS.".

Mensualmente esta Interventoría se obliga a presentar a la entidad Contratante, el resumen de avance de obra y las actividades ejecutadas por el Contratista en el proyecto con la descripción de los inconvenientes, pormenores y metas alcanzadas del periodo, a fin de mantener informada a la entidad coordinadora y contratante de todas las decisiones que se han venido tomado en los comités técnicos de obra durante el desarrollo del proyecto.

El presente informe corresponde a las actividades realizadas a partir del 01 al 30 de junio de 2025.

San José es un municipio situado al sur occidente del departamento de Caldas, sobre la serranía de Belalcázar, cruzado por la cordillera occidental entre los valles del Risaralda por el occidente y el cañón del Cauca por el oriente Limita al norte con el municipio de Risaralda, al sur con Belalcázar, al oriente con Risaralda y al occidente, con el municipio de Viterbo.

Actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población de Caldas con el Municipio de Manizales capital del Departamento, debido a que las vías están en mal estado, intransitables por las fuertes lluvias y la topografía, lo anterior más exactamente entre la vereda el bosque (San José – Viterbo). Hay situaciones que aportan al deterioro, como las condiciones geográficas y climatológicas del sector, o la falta de mantenimiento.

Cómo parte de lo anteriormente descrito y en concordancia con las políticas de desarrollo nacionales, la Gobernación del Departamento de Caldas, en busca de mejorar las condiciones físicas y operativas de la red vial del departamento y con el fin de mejorar la competitividad de la región, realizó los estudios y diseños para la

estabilización del punto crítico denominado El Bosque, localizado en la vía Margaritas – Asia K8+500, en el Municipio de San José, Caldas.

Lo anterior aumenta los tiempos de viaje y baja comercialización de productos del sector. A su vez, se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos, se presenta un aumento en los costos de transporte de carga y de pasajeros, se incrementan los precios de los productos de la región. Las familias tienen que invertir más dinero en transporte y canasta familiar.

Por otra parte, es importante resaltar que el mal estado de las vías también trae como consecuencia el daño de los vehículos que se trasladan por estas, lo que conduce a un incremento en los costos de mantenimiento de los vehículos.

CONSORCIO
FG SAN JOSE

CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo principal

Analizar las características geotécnicas de los suelos presentes en el punto crítico en estudio, con el fin de especificar y dimensionar las obras de contención, retención o correctivas que deban implementarse con el fin de atender la problemática detectada.

1.1.2 Objetivos específicos

- Realizar un reconocimiento del punto crítico y su evolución con el paso del tiempo desde que se detectó el avance del proceso erosivo presente en la zona.

- Efectuar un trabajo de campo que permita la correcta identificación de los suelos y formaciones rocosas correspondientes al sitio, así como los horizontes de meteorización y la evolución de las deformaciones, correlacionando la información con la obtenida por los trabajos de prospección geotécnica llevados a cabo por la Secretaría de Infraestructura del departamento en el año 2021.

- Identificar las necesidades del sitio desde el punto de vista de la recuperación del ancho de banca de la vía, para implantar correctamente una obra de contención que permita la recuperación de la misma en cuanto a sustento y ancho de carriles.

- Realizar los análisis de estabilidad necesarios para poder definir correctamente las características de la obra de contención requerida.

- Suministrar recomendaciones generales relacionadas con la ejecución de las obras geotécnicas propuestas.

CONSORCIO
FG SAN JOSE

1.2 Descripción del proyecto

El punto crítico corresponde a un proceso erosivo que causó desprendimiento, transporte y disposición de suelos y rocas al lado de la banca vial existente, la cual durante la evolución del proceso fue perdiendo ancho de sección de manera acelerada y progresiva. Hasta la intervención realizada en 2022 con la construcción de las medidas de mitigación del riesgo, en el área se evidenciaba que el agua de escorrentía discurría libre por las laderas ubicadas a ambos lados de la vía y por la banca misma. No existían obras de drenaje y el problema se acentuaba por la presencia de numerosas mangueras de polietileno correspondientes a instalaciones de agua vecinales.

En la ladera derecha se puede apreciar el efecto de los procesos erosivos severos como surcos y cárcavas, cuya evolución se vio favorecida por las altas pendientes del sector y por la presencia de depósitos superficiales muy vulnerables a la erosión hídrica.



Foto 1.Ortofoto del punto crítico, levantamiento realizado en enero de 2021. Fuente: Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas.

En la anterior foto es evidente el daño debido a la falta de conducción de aguas a nivel de la banca de la vía, dado que este sitio presenta características de vaguada, en donde las aguas de ambos sentidos de la vía convergen por ser topográficamente un punto más bajo. Adicionalmente, en las visitas de seguimiento realizadas, se detectaron taponadas las obras de drenaje transversal ubicadas en los alrededores del punto crítico.

En el año 2021 se propuso por parte del equipo estructurador de proyectos la implementación de obras de mitigación para el control y manejo de las aguas de escorrentía, teniendo como objetivo principal el evitar que dichas aguas siguieran escurriéndose por la cárcava principal del punto crítico. Como primera medida, se solicitó limpiar y habilitar las alcantarillas aledañas al sector.

Se propuso igualmente la construcción de obras de drenaje transversal a ambos costados de la cárcava principal, con el fin de captar las aguas de escorrentía hacia la ladera izquierda (en sentido Crucero – Asia), así como la recuperación de la alcantarilla actualmente taponada en inmediaciones de la vía veredal en placa huellas que da acceso a las fincas de la ladera izquierda. De igual manera, se contempló la construcción de canales en concreto al igual que enrocados, para hacer una correcta entrega de las aguas captadas hasta el drenaje más cercano.

La muestra de manera esquemática la ubicación de las intervenciones propuestas, en conjunto con los profesionales especialistas en hidráulica e hidrología del equipo estructurador de proyectos de la Gobernación. Estas intervenciones se realizaron a finales del año 2022 e inicios de 2023, por lo que ha sido posible verificar su funcionamiento después de unos meses de finalizadas las obras y la respuesta de los sectores más afectados por la evolución de la cárcava principal. En visita realizada en el mes de agosto de 2023 se pudo observar que las aguas de escorrentía efectivamente están siendo captadas por las dos obras de drenaje transversal construidas a ambos costados del escarpe, las cuales están ordenando las aguas y conduciéndolas hasta la ladera izquierda tal como se propuso. De esta manera, se puede observar como en el escarpe principal se ha instaurado con bastante rapidez el crecimiento de vegetación nativa y se ha hecho evidente que la movilización de material superficial por procesos erosivos se detuvo en gran medida.

CONSORCIO
FG SAN JOSE

1.2.1 Localización del proyecto

El sitio en estudio se encuentra ubicado sobre la vía que une los sectores de Las Margaritas – El Crucero – Asia K8+ 500, Departamento de Caldas. Las coordenadas aproximadas para la localización del punto corresponden a 5°3'50.27" N; 75°48'45.20" O.



Imagen 1. ***Ubicación del Municipio de San José dentro del Departamento de Caldas e igualmente del punto crítico objeto de estudio (Fuente: Wikipedia y google earth)***

CONSORCIO
FG SAN JOSE

1.2.2 Estado inicial de la vía

Se presentaba dificultad en la intercomunicación terrestre entre las cabeceras municipales de San José y Viterbo, debido a que la vía se encuentra con unos puntos críticos en mal estado y presentan deterioro de la superficie de rodadura.

Las problemáticas anteriores, generaban aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de productos en los municipios, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socioeconómico de la zona.

Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

1.2.3 Características técnicas del proyecto

Obras de estabilización:

El planteamiento general para la atención del punto crítico en estudio y la recuperación de la banca vial consiste en la construcción de un muro en concreto reforzado apoyado sobre cimentación profunda, emplazado en la zona del escarpe principal (costado norte de la ladera). Este tipo de muro está diseñado para resistir las fuerzas laterales del suelo y el agua para transmitirlas a un sistema de viga cabezal + cimentación profunda, que para este caso consistirá en caisson excavados de 1,0 m de diámetro y 9 m de profundidad. La viga cabezal tendrá una sección de 0.8 m de alto por 1.2 m de ancho. El muro tendrá una longitud total de 48 m con módulos de 6 y 9 m de longitud, con alturas de vástago entre 4.5 y 6.2 m.

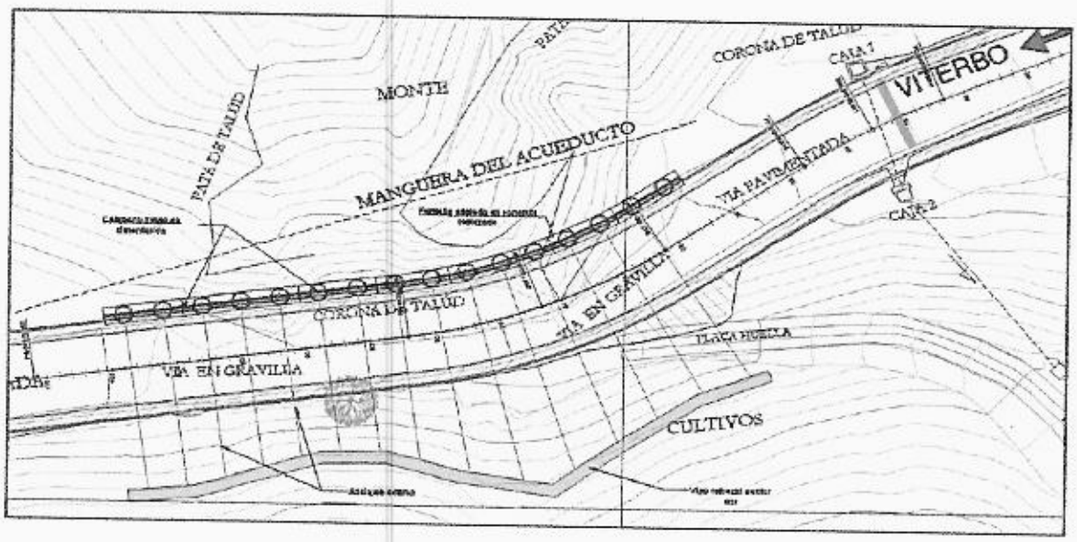


Imagen 2. Vista en planta de la obra propuesta. Al norte (parte superior del plano) se ubica el muro en concreto apoyado sobre caisson y al sur (parte inferior del plano) se ubica la viga cabezal en concreto que recibe el extremo de los anclajes

Perfil de la vía:

- ✓ Mejoramiento de perfil longitudinal, peraltes y sección transversal.
- ✓ Ancho de calzada: 6.00 m
- ✓ cuneta corrida a ambos lados: 1.00
- ✓ Estructura de pavimento flexible:

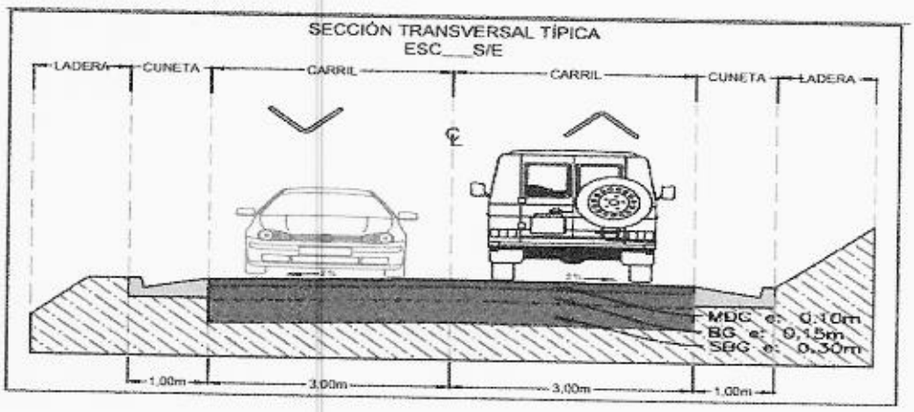


Imagen 3. Estructura de Pavimento

CONSORCIO FG SAN JOSE

1.3 Información Contrato de Obra

Proceso

CONTRATO N.:	21042025-0831.
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN A VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS.".
CONTRATISTA:	Consorcio FG SAN JOSE.
VALOR CONTRATO:	$2.783.138.891.
PLAZO:	8 meses.
FECHA INICIO:	30 de abril de 2025.
FECHA TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2025.

1.4 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes.

El contratista contó con 3 frentes de trabajo distribuidos el punto crítico del proyecto, enfocándose en las siguientes actividades:

- Excavación de caisson.
- Instalación de acero caisson.
- Vaciado de concreto caisson.
- Vaciado de cámaras de alcantarillado
- Realce canal de descole.

CONSORCIO
FG SAN JOSE

1.4.1 Actividades de construcción semanales.

Se realizaron las siguientes actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2025.

Actividades Semana 06 (01 al 08 de junio de 2025).

- Excavación para caisson en roca.
- Vaciado de concreto de 21 Mpa para anillos de caisson.
- Instalación de acero de refuerzo para castillo caisson.
- Vaciado de pantallas para canal de descole.
- Vaciado de concreto reforzado cámara de alcantarillado.
- Construcción de trinchos en guadua al costado izquierdo del tramo.
- Lleno en instalación de tubería de 36" alcantarillado.

Actividades Semana 07 (09 al 15 de junio de 2025).

- Excavación para caisson en roca.
- Vaciado de concreto de 21 Mpa para anillos de caisson.
- Instalación de acero de refuerzo para castillo caisson.
- Vaciado de pantallas para canal de descole.
- Vaciado de concreto reforzado cámara de alcantarillado.
- Lleno en instalación de tubería de 36" alcantarillado.
- Construcción de trinchos en guadua al costado izquierdo del tramo.
- Remoción de derrumbe al costado derecho del tramo.
- Instalación de malla gallinero y champeado de mortero en el talud para estabilización del mismo.

CONSORCIO FG SAN JOSE

Actividades Semana 08 (16 al 22 de junio de 2025).

- Excavación para caisson en roca.
- Vaciado de concreto de 21 Mpa para anillos de caisson.
- Instalación de acero de refuerzo para castillo caisson.
- Vaciado de pantallas para canal de descole.
- Vaciado de concreto reforzado cámara de alcantarillado.
- Remoción de derrumbe al costado derecho del tramo.
- Instalación de malla gallinero y champeado de mortero en el talud para estabilización del mismo.
- Excavación y nivelación de terreno para viga cabezal.

Actividades Semana 09 (23 al 30 de junio de 2025).

- Excavación para caisson en roca.
- Vaciado de concreto de 21 Mpa para anillos de caisson.
- Instalación de acero de refuerzo para castillo caisson.
- Vaciado de concreto para núcleo de caisson.
- Vaciado de pantallas para canal de descole.
- Vaciado de concreto reforzado cámara de alcantarillado.
- Instalación de malla gallinero y champeado de mortero en el talud para estabilización del mismo.
- Excavación y nivelación de terreno para viga cabezal.

CONSORCIO FG SAN JOSE

1.4.2 Actividades de control de calidad

Para el presente periodo se realizó la construcción de anillos y núcleo de caisson de concreto, para lo cual ha sido necesaria la realización de muestras de concreto cilíndricas para realizar ensayos a compresión de las estructuras construidas, también se realizó la caracterización y clasificación a los materiales granulares empleados.


1.5 Información financiera del contratista

1.5.1 Avance financiero contrato de obra

A la fecha del presente informe, el Contratista de Obra no ha presentado Actas de Obra.

	SEMANA 6 2/06/2025 8/06/2025	SEMANA 7 9/06/2025 15/06/2025	SEMANA 8 16/06/2025 22/06/2025	SEMANA 9 23/06/2025 29/06/2025
PROGRAMADO	$105,380,588	$129,942,458	$154,504,327	$179,066,197
EJECUTADO ACUMULADO	$131,139,678	$203,381,548	$238,821,829	$281,930,631
EJECUTADO	$29,976,294	$72,241,870	$35,440,281	$43,108,802
PORCENTAJE (Programado)	3.90%	4.81%	5.72%	6.63%
PORCENTAJE (Ejecutado)	4.85%	7.53%	8.84%	10.44%
DIFERENCIA	0.95%	2.72%	3.12%	3.81%

CONSORCIO
FG SAN JOSE

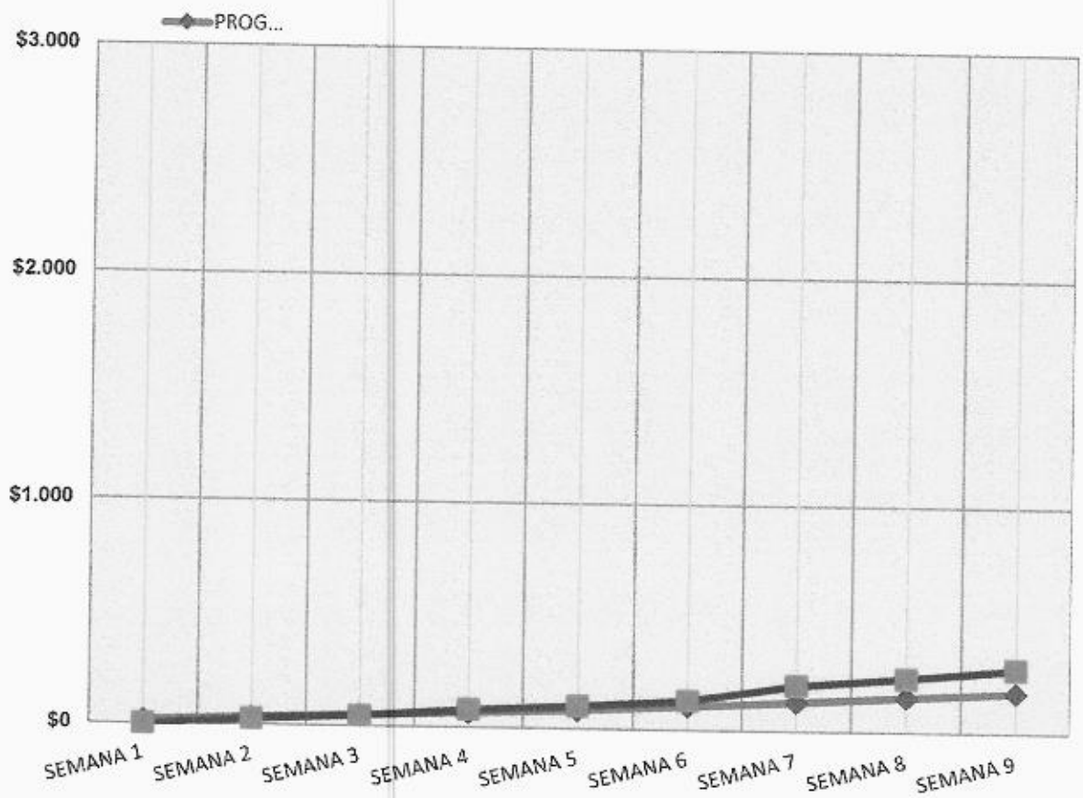

Grafica 1. Inversión Semanal Programada y ejecutada.

CONSORCIO FG SAN JOSE

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	210.2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	918.00	$ 16,492.00	$ 16,492.00	$ 15,007,720.00	630.00	10,389,960.00
2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	390.00	$ 73,493.00	$ 73,493.00	$ 28,662,270.00	0.00	0.00
3	220.1	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	93.00	$ 169,219.00	$ 169,219.00	$ 17,597,367.00	0.00	0.00
4	320.3.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (Analizado para tipo de gradación SBG-38, clase C)	m3	865.00	$ 168,302.64	$ 213,950.00	$ 141,878,250.00	0.00	0.00
5	330.3.2	BASE GRANULAR CLASE C (Analizado para tipo NT1, de gradación BG 37, clase C)	m3	291.00	$ 155,303.70	$ 208,115.00	$ 60,561,465.00	0.00	0.00
6	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-07	m2	1,930.00	$ 4,264.46	$ 5,701.00	$ 9,677,930.00	0.00	0.00
7	450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	179.00	$ 948,914.18	$ 1,271,000.00	$ 227,510,611.00	0.00	0.00
8	500.1.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT3)	m3	104.00	$ 829,131.34	$ 1,111,936.00	$ 115,643,744.00	0.00	0.00
9	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	625.00	$ 84,555.96	$ 113,309.00	$ 70,818,125.00	64.46	7,297,099.60
10	600.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	146.00	$ 107,330.57	$ 143,831.00	$ 22,437,636.00	114.20	16,425,900.20
11	201.1.5	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	44.00	$ 92,631.34	$ 123,322.00	$ 5,426,168.00	36.00	4,439,592.00
12	630.4.1	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	197.00	$ 783,647.76	$ 1,050,088.00	$ 196,366,456.00	6.00	5,250,440.00
13	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	4,242.00	$ 6,177.81	$ 6,935.00	$ 29,420,936.00	280.00	1,941,800.00
14	640.2	MALLA DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para malla de refuerzo Fy = 420 Mpa)	kg	1,708.00	$ 6,770.00	$ 9,073.00	$ 15,496,684.00	0.00	0.00
15	311.1	ADOBADO	m3	87.00	$ 147,982.09	$ 194,360.00	$ 16,039,320.00	0.00	0.00
16	660.1	TUBERÍA de PLASTICO TIPO _____ NORMA____ DE DIAMETRO INTERNO ____ mm (Analizado para tubería de plastico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)	m	64.00	$ 934,803.28	$ 1,262,757.00	$ 67,848,578.00	36.00	45,059,252.00
17	501.0P	JUNTA DE CONSTRUCCION	m	1,340.00	$ 75,920.12	$ 102,579.00	$ 138,411,282.00	0.00	0.00
18	670.5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA)	m3	30.00	$ 458,129.85	$ 611,214.00	$ 18,336,420.00	0.00	0.00
19	600.1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MANUAL)	m3	844.00	$ 76,851.49	$ 102,081.00	$ 86,164,164.00	22.60	2,307,072.60
20	210.C.1	EXCAVACION PARA CAISSONS SIN TIERRA HASTA 6 m	m3	140.00	$ 104,523.13	$ 140,961.00	$ 20,028,723.00	77.20	10,882,345.04
21	210.C.3	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA 6-12m CONDICIONES SECAS	m3	13.00	$ 217,258.96	$ 291,127.00	$ 3,784,651.00	0.00	0.00
22	210.C.2	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO HASTA 6 m	m3	96.00	$ 124,969.40	$ 167,468.00	$ 15,998,886.00	126.64	21,100,251.95
23	210.C.4	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 6-12 mts CONDICIONES SECAS	m3	9.00	$ 195,394.00	$ 265,648.00	$ 2,392,632.00	36.86	9,884,591.36
24	630.3.1	TIPO DE CONCRETO _____ (Analizado para concreto preformado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	444.00	$ 587,051.19	$ 785,652.00	$ 349,277,928.00	25.92	20,360,279.04
25	630.4.1	TIPO DE CONCRETO _____ (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	74.00	$ 783,647.76	$ 1,050,088.00	$ 77,706,512.00	70.09	73,597,727.92
26	630.6	TIPO DE CONCRETO _____ (Analizado para concreto liviano reresistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	4.00	$ 461,623.13	$ 615,575.00	$ 2,474,300.00	0.00	0.00
27	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	650.00	$ 141,591.79	$ 189,867.00	$ 123,413,550.00	0.00	0.00
28	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	Kg	44,407.00	$ 6,177.81	$ 6,935.00	$ 308,009,765.00	7,800.00	52,728,900.00
29	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	84.00	$ 107,697.79	$ 144,307.00	$ 7,752,576.00	0.00	0.00
30	663.1.3P	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 8"	m	64.00	$ 21,312.60	$ 28,560.00	$ 1,827,776.00	0.00	0.00
31	663.1.2P	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 4"	m	48.00	$ 21,312.09	$ 26,539.00	$ 1,370,832.00	0.00	0.00
32	501.5P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	m	90.00	$ 76,526.12	$ 102,579.00	$ 9,133,950.00	0.00	0.00
33	679.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT-2500 O SIMILAR (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión cmo mínimo de 700 n)	m2	446.00	$ 13,328.58	$ 17,800.00	$ 7,965,980.00	0.00	0.00
34	661.1.1A	ANCLAJE TIPO ACTIVO DE 30T	ml	539.00	$ 511,126.67	$ 684,910.00	$ 451,366,660.00	0.00	0.00
35	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	840.00	$ 2,891.94	$ 3,587.00	$ 2,998,200.00	0.00	0.00
36	701.1.1	TACHA REFLECTIVA	u	105.00	$ 9,207.46	$ 12,330.00	$ 1,295,490.00	0.00	0.00
37	670.5P	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO (Analizado para un concreto ciclopeo de 21 MPA)	u	10.00	$ 404,126.65	$ 541,547.00	$ 5,415,470.00	0.00	0.00
38	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y	m3km	19,505.00	$ 1,131.34	$ 1,516.00	$ 29,569,580.00	0.00	0.00
ITEMS NO PREVISTOS								0.00	0.00
39		ROCERIA Y LIMPIEZA	m2		$ 1,925.00	$ 2,843.50		0.00	0.00
							$ 0.00	480.00	940,613.00

Tabla 3. Costo Total ejecutado.



CONSORCIO
FG SAN JOSE

1.5.3 Estado actual del contrato de obra


Valor ejecutado a la fecha es de: $ 281.930.631,00

Plazo ejecutado de 2 mes equivale al 10,44% del total.


1.14.3 Registro fotográfico
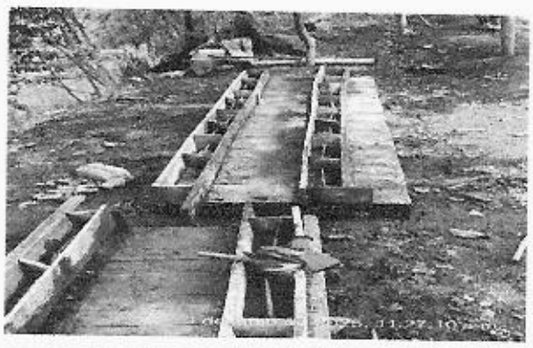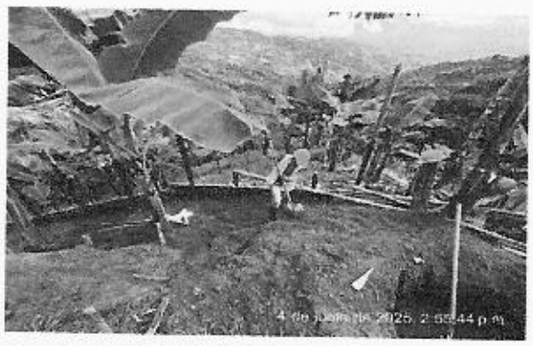
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Excavación caisson</td><td>Formaleta pantalla deflectoras prefabricadas</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vaciado de concreto para pantallas deflectoras</td><td>Armado de trinchos en guadua</td></tr>
</table>

CONSORCIO
FG SAN JOSE

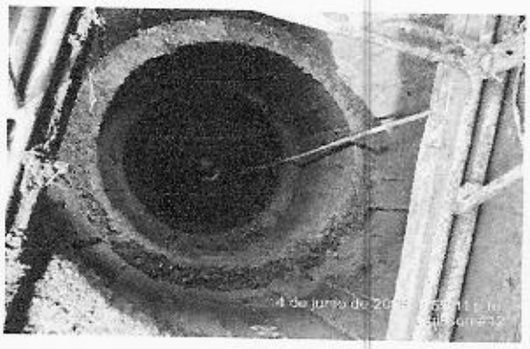

Excavación y vaciado de concreto anillos caisson

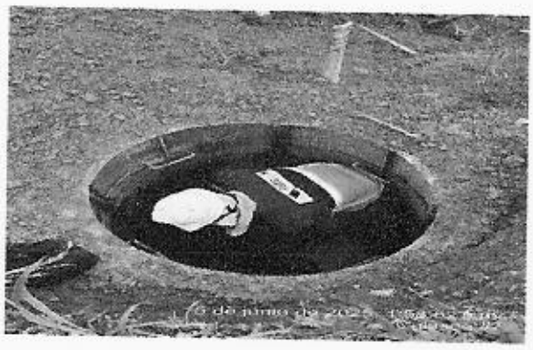

Excavación caisson



Vaciado de concreto cámara de alcantarillado



Armado de acero de refuerzo para caisson



Armado de acero de refuerzo para cámara de alcantarillado



Armado de trinchos en guadua



Instalación de malla gallinero y champeado de mortero en talud



Instalación de acero de refuerzo núcleo caisson



Remoción de derrumbe costado izquierdo



Remoción de derrumbe costado izquierdo




Vaciado de concreto núcleo caisson



Vaciado de concreto núcleo caisson

CONSORCIO
FG SAN JOSE

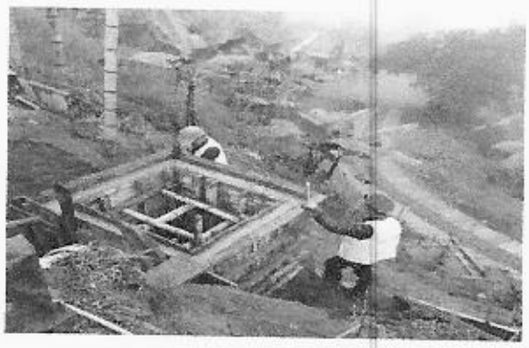	
Excavación y vaciado de concreto en anillos caisson	Instalación formaleta para vaciado de cámara alcantarillado
	
Vaciado de concreto cámara de alcantarillado	Excavación, demolición y nivelación para base viga cabezal

Sergio Estrada

CONSORCIO FG SAN JOSE
R. L. Sergio Estrada M

31/05/2025.
Clima: Dia soleado.
Personal en obra:
Ingeniero Residente (1).
Maestro de obra (1)
oficial (3)
Ayudantes de obra (13)
Profesional SST (1).
Actividades realizadas: excavacion y vaciado de concreto en los anillos de los caisson # (1)y (2) al costado izquierdo. Armado de acero de refuerzo para caisson.

Ing. Residente Contratista.

03/06/2025.
Clima: Dia soleado.
Personal en obra:
Ingeniero Residente (1)
Maestro de obra (1).
oficial (3).
Ayudantes de obra (13)
Profesional SST (1).
Actividades realizadas: excavación y vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 2 y 3 al costado izquierdo y caisson # 12 al costado derecho. Lleno con material seleccionado para dejar tuberia de 36" instalada. Construccion de tanchos en la zona de viga al costado izquierdo del tramo. Armado de acero de refuerzo para castillos de caisson. Vaciado de puntales para corral de ducale el cree SST realiza charla de seguridad "los trabajadores que pierden antes accidentes", ademas realize inspección de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Ing. Residente Contratista.

04/06/2025.
Clima: Dia soleado.
Personal en obra:
Ingeniero Residente (1).
Maestro de obra (1)
Oficial (3).
Ayudantes de obra (15)
Profesional SST (1).
Actividades realizadas: excavacion y vaciado de concreto en los anillos de los caisson #3, 4, 5 y 6 al costado izquierdo y caisson #12 al costado derecho. Llene con material seleccionado para tapar tuberia de 36" instalado. Instalación de acero para vaciado de camara de alcantarillado. Construcción de trinchos en la zona de viga al costado izquierdo del tramo. Vaciado de pantallas para canal de descole.
El area SST realiza charla de seguridad "no tolleranes de confianza" y realiza inspeccion a las areas de trabajo y equipos a utilizar.
Jeison Castañeda.
Ing. Residente contratista

07/06/2025.
clima: lluvia leve 7:00 - 9:30am.
Personal en obra:
Ingeniero Residente (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (3).
Ayudantes de obra: (15)
Profesional SST. (1).
Actividades realizadas: Excavacion y vaciado de concreto en los anillos de los caisson #9, 10, 11 y 12 al costado izquierdo y caisson #12 al costado derecho. Vaciado de concreto para camara de alcantarillado. Construccion de trinchos en la zona de viga al costado izquierdo del tramo. Instalación de pantallas en canal de descole.
El area SST realiza inspeccion a las areas de trabajo y equipos.
Jeison Castañeda
Ing. Residente contratista.

NKB

06/06/2025

Clima: Lluvia fuerte 4:00 - 5:00 pm.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1)

Maestro de obra (1).

Oficial (3).

Ayudante de obra (15)

Profesional SST (1).

Actividades realizadas: Excavación y vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 9, 10, 11 y 12 al costado izquierdo y Caisson # 12 al costado derecho. Se realiza vaciado de concreto para cámara de alcantarillado. Se continua con la construcción de trincho en la zona de viga al costado izquierdo del tramo. Instalación de puntales en el canal de descole. El area SST realiza inspección de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Jesus Castañeda.
Ing. Residente Contratista

07/06/2025.

Clima: Dia soleado.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1)

Maestro de obra (1).

Oficial (3).

Ayudante de obra (15)

Profesional SST. (1).

Actividades realizadas: Excavación y vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 12, 13, 14 y 15 al costado izquierdo. y caisson # 12 al costado derecho. Se continua con la construcción de trincho en la zona de viga al costado izquierdo. El area SST realiza charla de seguridad "orden y aseo". Ademas realize inspección de areas de trabajo. y equipos a utilizar.

Jesus Castañeda.
Ing Residente Contratista

09/06/2025

Clima: Dia soleado, lluvia leve de 6:300 - 8:00 am.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1)

Maestro de obra (1).

Oficial (3).

Ayudante de obra (16)

Profesional SST. (1).

Actividades realizadas: Excavación y Vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 9, 12 y 15 el costado izquierdo y caisson # 14, 19 y 20 el costado derecho. Instalación de acero para camara de desenterrillado. Vaciado de pantallas para canal de descole El area SST realiza charla de seguridad "Por que tenemos un sistema de gestión en SST"; ademas realiza inspección de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Jesus Castañeda.
Ing. Residente Cumbalista.

10/06/2025.

clima: lluvia fuerte de 7:00 a 9:00 am.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1).

Maestro de obra (1).

Oficial (3).

Ayudante de obra (16).

Profesional SST. (1).

Actividades realizadas: Excavación y vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 1, 6 y 7 al costado izquierdo. Instalación de acero y vaciado de Solado para camara de desenterrillado. Instalación de pantallas para canal de descole Se realiza armado de acero para nucleo de caisson. Llegan a obra 19 m³ de arena y 19 m³ de triturado. El area SST realiza inspección de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Jesus Castañeda.
Ing. Residente Cumbalista.

NKB

11/06/2025.

Clima: Lluvia fuerte de 7:00 - 8:20 am.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1)

Maestro de obra (1)

Oficial (3)

Ayudante de obra (16)

Profesional SST (1).

Actividades realizadas: Excavación y Vaciado de concreto en los anillos de los caissons # 2, 3 y 9 al costado izquierdo. Instalación de acero y Formaleta para camara de alcantarillado. Armado de acero para nucleo de caisson. Remocion de derrumbe al costado derecho entre los caissons # 5 al 9. Remocion de derrumbe y re armado de trinchos al costado izquierdo. Es importante mencionar que durante una fuerte lluvia a las madrugadas de este dia se generan derrumbes en ambos costados del tramo que se esta interviniendo. El area SST realiza inspeccion de areas de trabajo y equipos a utilizar

Ing. Residente Contratista.

12/06/2025.

Clima: Dia nublado y lluvia de 7:00 a 9:00 am.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1).

Maestro de obra (1).

Oficial (3).

Ayudante de obra (16)

Profesional SST (1)

Actividades realizadas: Excavacion y Vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 7 al costado izquierdo y caisson # 16, 3, 2 al costado derecho. Vaciado de Concreto para camara de alcantarillado. Armado de acero para nucleo de caisson. Remoción de derrumbe al costado derecho entre los caisson # 5 al 9. Remoción de derrumbe y rearmado de trinchos al costado izquierdo. Llega en obra 7 m³ de arena y 7 m³ de triturado.

Ing. Residente Contratista.

13/06/2025.

Clima: Fuerte lluvia 7:00 - 9:00 am y 1:00 - 5:00 pm.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1).

Maestro de obra (1).

Oficial (3).

Ayudante de obra (16).

Profesional SST (1).

Actividades realizadas: Excavacion y vaciado de concreto en las cunetas de el cajon #3 y cajon # 16, 3 y 2 al costado derecho. Armado de acero para nucleo de cajon. Remoción de derrumbe al costado derecho entre los cajon #5 al 9. Instalación de malla gallinero y chanpiado con concreto para estabilizar talud. Remoción de derrumbe y reormado de trinchos al costado izquierdo. el area SST realizo inspección de areas de trabajo y equipo a utilizar.

Ing. residente contratista

14/06/2025.

Clima:

Personal en obra:

Ingeniero residente (1).

Maestro de obra (1).

Oficial (3)

Ayudante de obra (16).

Profesional SST. (1)

Actividades realizadas: excavación y vaciado de concreto en las cunetas de los cajon #16, 2 y 3. al costado derecho. Armado de acero para nucleo de cajon. Remoción de derrumbe al costado derecho entre los cajon #5 al 9. Instalación de malla gallinero y chanpiado con concreto para estabilizar talud. Remoción de derrumbe y re ormado de trinchos al costado izquierdo. el area SST realizo inspección de areas de trabajo y equipo a utilizar.

Ing. residente contratista.

MKB

16/06/2025

Clima: Nuvia leve de 1:00 pm - 5:00 pm.

Personal en obra.

Ingeniero Residente (1)

Maestro de obra (1)

Oficial (3)

Ayudantes de obra (16)

Profesional SST (1)

Actividades realizadas: Excavacion y Vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 3, 14 y 15 al costado derecho. Armado de canillo de acero para nucleo de caisson. Remocion de derrumbe al costado derecho del tramo, instalacion de malla gallinero y champeado con mortero para estabilizar el talud Remocion de derrumbe y recurmet de trincheo al costado izquierdo del tramo. El area SST realiza charla de seguridad "los casi accidentes" y realiza inspeccion a las areas de trabajo y equipos a utilizar.

Juan Castañeda
Ing. Residente contratista.

17/06/2025.

Clima: Nuvia leve de 3:30 a 4:00 pm.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1).

Maestro de obra (1)

Oficial (3).

Ayudantes de obra (16).

Profesional SST. (1)

Actividades realizadas: Excavacion y Vaciado de concreto en los anillos de la caisson # 3, 14 y 15 al costado derecho, Instalación de acero en el caisson # 16. Vaciado d concreto en camaras de alcantarillado. Remoción de derrumbe al costado derecho del tramo. Instalación de malla gallinero y champeado con mortero en el talud para estabilizar. Remoción de derrumbe y recalmado de trincheo al costado izquierdo.

Juan Castañeda
Ing. Residente contratista

NKB

18/04/2023.

Clima: Seco.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1).

Maestro de obra (1)

oficial (3).

Ayudantes de obra (12).

Profesional SST (1).

Profesional social (1).

Actividades realizadas:

Se lleva a cabo visita de la profesional social, en la cual se realizan las siguientes actividades correspondientes a la implementación del plan de gestión social:

- Atención comunidad presencial área de influencia directa
- Revisión Buzón de Solicitudes con acompañamiento presidente de la veeduría, no se encontraron requerimientos diligenciados, tanto en el buzón como en los medios de atención recibidos (Línea de atención y Correo electrónico).
- Reunión integrantes veeduría ciudadana a recorrido de obra, pendiente acta de la actividad realizada.
- Se cuenta con la resolución de la conformación de la veeduría por parte de la personería del Municipio de San Jose.
- Se establece contacto Secretario de planeación para recepción de hojas de vida para vinculación laboral de personas de la zona, pendiente por enviar información desde la alcaldía Municipal.
- De acuerdo a los hechos establecidos se enviara Informe Mensual del área social.
- Se continua con la implementación de actividades de acuerdo al cronograma presentado.

Gladys Cantillo.
Social Interventoría.

Gestor Proyectos
Trabajadora Social.
Consorcio Fg. San Jose.

Excavacion y Vaciado de concreto en los anillos de los caissons #15, 14 y 3. Instalacion de acero en el caisson #12. Vaciado de concreto en cunetas de alcantarillado. Remocion de derrumbe del costado derecho e instalacion de malla gallinero y chapleado con mortero en el talud para estabilizacion. Remocion de derrumbe y re armado de tramcho al costado izquierdo del tramo. El area sst realizo inspeccion de areas de trabajo y equipo a utilizar.

Ing. Residente contratista

19/06/2025.

Clima: Dia seco

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1).

Maestro de obra (1)

Oficial (3)

Ayudantes de obra (10).

Personal sst (1)

Actividades realizadas: Excavacion y Vaciado de concreto en los anillos de los caisson #3, 14 y 15 al costado derecho, Armado de castillo en acero para nucleo de caisson. Vaciado de concreto en cunetas de alcantarillado. Remocion de derrumbe al costado derecho e instalacion de malla gallinero y chapleado con mortero en talud para estabilizacion. Remocion de derrumbe y reacomodo de tramcho al costado izquierdo. Se realizan 2 apiques para CBR en 320 metros a pavimentar. Llegan a obra 7 m³ de arena. El area sst realizo charla de seguridad "cuidese del otro colonia", ademas realizo inspeccion de areas de trabajo y equipo a utilizar.

Ing. Residente contratista

20/06/2025.

Clima: Dia seco.

Personal en obra.

Ingeniero Residente (1)

Maestro de obra (1)
oficial (3)
Ayudantes de obra (5).
Profesional SST (1).
Actividades realizadas: Excavación y Vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 3, 14 y 15 al costado derecho Armado de castillo en acero para nucleo de caisson. Demolición de derrumbe al costado derecho. Instalación de malla gallinero y chrompiado con madera en talud para estabilización. Excavación y nivelación de terreno para Viga cabezal al costado izquierdo. El area SST realiza inspeccion de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Jesus Castellanos
Ing. Residente contratista

29/06/2025
Cliente:
Personal en obra:
Ingeniero Residente (1).
Maestro de obra (1).
Oficial (3).
Ayudante de obra (16).
Profesional SST. (1).
Actividades realizadas: Excavación y Vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 3 y 4. al costado derecho. Instalación de acero de refuerzo para nucleo de caisson # 15. Vaciado de Concreto en Concreto de alcantarillado. excavación y nivelacion de terreno para viga cabezal al costado izquierdo. Vaciado de solado de limpieza para Viga cabezal al costado izquierdo. El area SST realiza inspección de areas de trabajo y equipos a utilizar. se realiza comité de obra # 8. y hacen presencia el equipo de interventoria y contratista.

Jesus Castellanos
Ing. Residente contratista

25/06/2025

Clima: Dia seco.

Personal en obra:

Ingeniero Residente. (1)

Maestro de obra (1)

Oficial (3)

Ayudantes de obra (22)

Profesional SST. (1)

Actividades realizadas: excavacion y Vaciado de Concreto en los anillos de los caisson # 3, 4 y 13 al costado derecho. Vaciado de nucleo de caisson con Concreto de 4000 psi en los caisson # 16, 15 y 2 al costado derecho. Vaciado de Concreto en Camaras de alcantarillados. Excavación y nivelación de terreno para viga cabezal, demolición de anillos al costado izquierdo. llegan a obra 14 m³ de arena y 25 m³ de concreto de 4000 psi. El area SST realizo charla Importancia del capacitt, realiza pausa activa. realiza inspección de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Jhon Valderrama.
Ing. Residente Contratista.

26/06/2025.

Clima: Dia Seco.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1)

Maestro de obra (1)

Oficial (3)

Ayudantes de obra (22).

Profesional SST. (1).

Actividades realizadas: Excavación y Vaciado de Concreto en los anillos de los caisson # 3, 4 y 13. Instalación de acero de refuerzo para camaras de alcantarillado. Demolición de anillos, Excavación y nivelación de terreno para viga Cabezal, al costado derecho e izquierdo. El area SST realizo inspeccion de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Jhon Valderrama.
Ing. Residente Contratista.

27/06/2025.

Clima: Dia seco.

Personal en obra:

Ingeniero Residente (1).

Maestro de obra (1).

Oficial (3).

Ayudantes de obra: (22).

Profesional SST (1).

Actividades realizadas: Excavacion y vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 1, 5, 10 y 13. Vaciado de concreto para camara de alcantarillado. Demolición de anillos de concreto, excavación y nivelación de terreno para Viga cabezal. El area SST realiza inspección de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Ing. Residente contratista.

28/06/2025.

Clima: Dia seco.

Personal en obra:

Ingeniero residente (1).

Maestro de obra (1)

Oficial (3).

Ayudantes de obra (22)

Profesional SST (1)

Actividades realizadas: excavacion y vaciado de concreto en los anillos de los caisson # 4, 5, 10 y 13. Instalación de acero de refuerzo para nucleos de caisson, en los caisson # 2 y 19 al costado derecho. y caisson # 15, 19, 13, 12 y 11 al costado izquierdo. Demolición de anillos de redce, excavación y nivelación de terreno para Viga cabezal. instalación de formaleta para Vaciado de camaras de alcantarillado. El area SST realiza inspección de areas de trabajo y equipos a utilizar.

Ing. Residente Contratista.

CONSORCIO FG SAN JOSE	CONSORCIO FG SAN JOSE
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 21042025-0831

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD ACTA DE OBRA No. 2

OBRA EJECUTADA EN JUNIO

COMPONETES:

DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO 3000 PSI
DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO 4000 PSI
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TUBERIA DE 36"
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CEMENTO ESTRUCTURAL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO Fy 4200 MPA
RESULTADOS ENSAYOS DE COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO
RESULTADOS ENSAYO CBR EN EL TERRENO

CONSORCIO FG SAN JOSE	CONSORCIO FG SAN JOSE
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

CONTRATO DE OBRA 21042025 - 0831.
GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONCRETO 3000 PSI


SAN JOSE

ACTA No. 2
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND - 3000PSI

PROYECTO: CAISSONS Y CANALES EN SAN JOSE
INTERESADO: CONSORCIO FG SAN JOSE
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN JOSE - CALDAS
PROCEDENCIA: ARENA Y TRITURADO DE AL BEM - LA VIRGINIA
FECHA: MAYO 22 DE 2025

Consuas INGENIERIA



AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

DATOS MATERIALES DE LA MEZCLA

Resistencia esperada en P.S.I.	3000PSI
Relación agua/cemento.	**0,53**
Contenido de cemento kg/m³ de concreto	315
Agua para agregados SSS Lts/m³ de concreto	**168**
Volumen absoluto de los agregados Lts/m³ de concreto	731,3
Peso seco de los agregados Kg/m³ de concreto	1858,2
Peso especifico bulk de la arena g/cm³	2,462
Peso especifico bulk de la grava g/cm³	2,669
Humedad de absorcion de la grava %	1,2
Humedad de absorcion de la arena %	4,2
Peso unitario del agr. grueso compacto Ton/m³	1,714
Peso unitario del agregado grueso suelto Ton/m³	1,640
Peso unitario del agregado fino compacto Ton/m³	1,631
Peso unitario del agregado fino suelto Ton/m³	1,500
Peso especifico del cemento Ton/m³	**3,100**

TAMICES		AGREGADOS		AJUSTE GRANULOMETRICO			
ABERTURA Pulg.	ABERTURA mm	GRAVILLA	ARENA	PROPORCION ARENA	PROPORCION GRAVA	MEZCLA DE AGREGADOS	GRANULOMETRIA IDEAL
		AL BEM					
		PORCENTAJE QUE PASA.		%	%		
				0,40	**0,60**		
2 1/2	62,500						
2	50,000						
1 1/2	37,500						
1	25,000	100,0	100,0	40,0	60,0	100,0	**100,0**
3/4	19,000	97,0	100,0	40,0	58,2	98,2	**94,0**
1/2	12,500	64,7	100,0	40,0	38,8	78,8	**78,3**
3/8	9,500	46,7	99,8	39,9	28,0	68,0	**68,8**
4	4,750	15,3	96,7	38,7	9,2	47,9	**50,4**
8	2,375	4,0	92,1	36,9	2,4	39,2	**36,9**
16	1,190	2,6	87,6	35,0	1,6	36,6	**27,0**
30	0,595	2,2	78,1	31,2	1,3	32,5	**19,8**
50	0,300	1,8	9,5	3,8	1,1	4,9	**14,5**
100	0,150	1,5	3,7	1,5	0,9	2,4	**10,6**
200	0,075	1,3	2,2	0,9	0,8	1,7	
Módulo		7,3	3,3			4,703	4,783

*** Los resultados y la presente dosificación de concreto corresponden a las muestras ensayadas*

PROPORCIONES DE LA MEZCLA - 3000PSI

Materiales	Proporcion de los agregados	Volumen/m³ Dm³	Peso/m³ Kg	Proporciones en Volumen	Proporciones en Peso
Agua		168,0	168,0	**0,53**	***0,53***
Cemento		101,7	315,2	**1,00**	***1,00***
Arena	0,400	292,5	743,3	**2,04**	***2,36***
Triturado	0,600	438,8	1114,9	**2,80**	***3,54***

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

ENSAYOS DE LABORATORIO PARA AGREGADOS PETREOS

PROYECTO: CAISSONS Y CANALES EN SAN JOSE
INTERESADO: CONSORCIO FG SAN JOSE
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN JOSE - CALDAS
PROCEDENCIA: ARENA Y TRITURADO DE AL BEM - LA VIRGINIA
FECHA: MAYO 22 DE 2025

Consuas INGENIERIA

GRAVILLA TRITURADA CLASIFICADA DE LA VIRGINIA - AL BEM

PESO ESPECIFICO y ABSORCION

Determinación	1	2	3
Peso sat.sup.seco (gr)	1677,60	1648,30	1603,20
Peso en inmersion (gr)	1057,00	1037,00	1011,00
Peso seco (gr)	1659,10	1628,40	1586,30
Grav. Esp. Bulk aparente	2,756	2,753	2,757
Gravedad Esp. Bulk	2,673	2,664	2,679
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2,703	2,696	2,707
ABSORCION (%)	1,1	1,2	1,1

MASA UNITARIA SUELTA

Determinación	1	2
Vol. recip. (cm3)	***14957,0***	***14957,0***
Peso suelto (gm)	24544,5	24515,0
M.U.S. (gm/cm3)	1,641	1,639

MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)

Determinación	1	2
Peso compacto(gm)	25636,3	25621,3
M.U.C. (gm/cm3)	1,714	1,713

ANALISIS GRANULOMETRICO

Peso seco inicial (g): ***5204,0***
Peso final fracciones (g): 5136,5

Tamiz	Peso ret.	% retenido	% ret. acum.	% pasa
2 1/2"				
2"				
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	155,0	3,0	3,0	97,0
1/2"	1682,0	32,3	35,3	64,7
3/8"	937,5	18,0	53,3	46,7
No. 4	1631,0	31,3	84,7	**15,3**
No. 8	592,5	11,4	96,0	4,0
No. 16	68,5	1,3	97,4	2,6
No. 30	24,4	0,5	97,8	2,2
No. 50	18,2	0,3	98,2	1,8
No. 100	15,0	0,3	98,5	1,5
No. 200	12,4	0,2	98,7	**1,3**
Pasa T- 200	67,5	1,3	100,0	0,0

AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

D60	11,50
D30	6,90
D10	3,90
Cu	***2,9***
Cc	***1,1***

OBSERVACIONES: Gravilla triturada de rio, forma subangulosa de las partículas.

RESUMEN DE ENSAYOS DE LA GRAVA

Grav. Esp. Bulk aparente gr/cm³	2,754
Gravedad especifica bulk gr/cm³	2,669
Gravedad Esp. Bulk s.s.s. gr/cm³	2,700
ABSORCION (%)	1,2
Masa Unitaria Suelta (ton/m³)	1,640
Masa Unitaria Compacta (ton/m³)	1,714
CLASIFICACION S.U.C.S.	**GP**

ARENA DE RIO, LA VIRGINIA (RISARALDA) AL BEM

ANALISIS GRANULOMETRICO

Peso seco inicial (g): ***3542,0***
Peso final fracciones (g): 3463,2

Tamiz	Peso ret.	% retenido	% ret. acum.	% pasa
1 1/2"				
1"				
3/4"				
1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/8"	5,4	0,2	0,2	99,8
No. 4	112,0	3,2	3,3	**96,7**
No. 8	160,8	4,5	7,9	92,1
No. 16	161,5	4,6	12,4	87,6
No. 30	337,0	9,5	21,9	78,1
No. 50	2430,0	68,6	90,5	9,5
No. 100	202,5	5,7	96,3	3,7
No. 200	54,0	1,5	97,8	**2,2**
Pasa T- 200	78,8	2,2	100,0	0,0

MASA UNITARIA SUELTA

DETERMINACION	1	2
Vol. recip. (cm3)	***14957,0***	***14957,0***
Peso suelto (gm)	22437,0	22443,0
M.U.S. (gm/cm3)	1,500	1,501

MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)

DETERMINACION	1	2
Peso compacto(gm)	24408,0	24396,0
M.U.C. (gm/cm3)	1,632	1,631

D60	0,490
D30	0,380
D10	0,310
Cu	***1,6***
Cc	***1,0***

PESO ESPECIFICO y ABSORCION

Determinación	1	2	3
Matraz (No.)	**1**	**2**	**3**
P sss. (gm)	375,30	365,30	370,40
P fws. (gm)	868,50	864,10	880,40
Temperatura (C)	18,5	18,6	18,6
P fw. (gm)	658,80	641,10	654,40
P seco (gm)	361,20	350,40	355,30
Grav. Esp. Bulk aparente	2,747	2,750	2,748
Gravedad Esp. Bulk	2,464	2,462	2,461
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2,567	2,567	2,565
ABSORCION (%)	4,2	4,3	4,2

EQUIVALENTE DE ARENA

Determinación	1	2
Lectura de arcilla	12,8	12,8
Lectura de arena	9,7	9,6
Equiv. De arena %	75,8	75,0
Equivalente de arena promedio %		75,4

OBSERVACIONES: Arena de rio semilimpia y fina

*Los resultados corresponden a la muestras ensayadas


Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnologo 19515-00093 Unicauca

RESUMEN DE ENSAYOS DE LA ARENA

MODULO DE FINURA	2,32
TAMAÑO MAXIMO	3/8"
Grav. Esp. Bulk aparente gr/cm³	2,748
Gravedad especifica bulk gr/cm³	2,462
Gravedad Esp. Bulk s.s.s. gr/cm³	2,566
ABSORCION (%)	4,2
Masa Unitaria Suelta (ton/m³)	1,500
Masa Unitaria Compacta (ton/m³)	1,631
CLASIFICACION S.U.C.S.	**SP**

GRAFICAS GRANULOMETRICAS

PROYECTO: CAISSONS Y CANALES EN SAN JOSE
INTERESADO: CONSORCIO FG SAN JOSE
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN JOSE - CALDAS
PROCEDENCIA: ARENA Y TRITURADO DE AL BEM - LA VIRGINIA
FECHA: MAYO 22 DE 2025

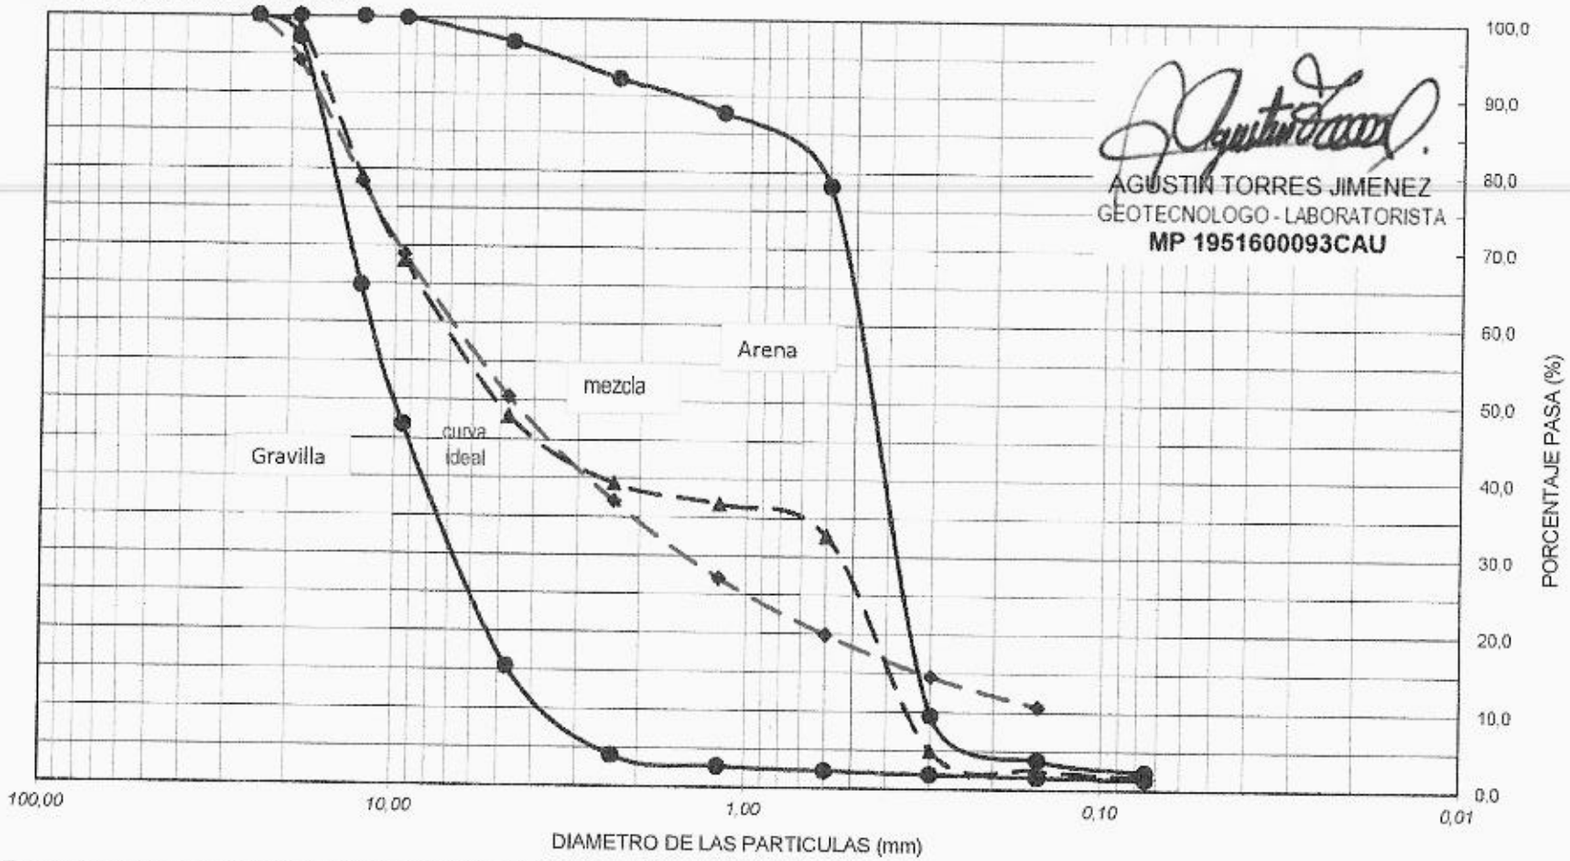

AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND

PROYECTO: CAISSONS Y CANALES EN SAN JOSE
INTERESADO: CONSORCIO FG SAN JOSE
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN JOSE - CALDAS
PROCEDENCIA: ARENA Y TRITURADO DE AL BEM - LA VIRGINIA
FECHA: MAYO 22 DE 2025

MEZCLA PARA: *3000PSI*

CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m³ Kg	Masa unitaria de los agregados	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	168,0	Ton/m³	**168,0 Litros**
Cemento **	315,2		**315,2 Kg.**
Arena	743,3	1,500	**0,4954 m³**
Triturado	1114,9	1,640	**0,6798 m³**

Consumo de cemento Portland en bultos de 42,5Kg/m³ de concreto **7,42**

PROPORCIONES EN PESO DE LOS MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO PORTLAND

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales	
Agua	*0,53*	(20-22)	Litros
Cemento	*1,00*	42,5	Kg (1 bulto)
Arena	*2,36*	100	Kg
Triturado	*3,54*	150	Kg

AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

CUBICACION DE LOS MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm³	Proporciones al Volumen	No.Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	---	*0,53*	**(20-22)**	Litros
Cemento	32,7	*1,00*	**1**	Bulto de 42,5Kg
Arena	66,8	*2,04*	**2**	40cm x 40cm x **20,9** cm de alto
Triturado	91,7	*2,80*	**2**	40cm x 40cm x **28,6** cm de alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm³	Proporciones al Volumen	No.Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	---	*0,53*	**(20-22)**	Litros
Cemento	32,7	*1,00*	**-**	Bulto de 42,5Kg
Arena	66,8	*2,04*	**3**	Cuñetes rasos
Triturado	91,7	*2,80*	**4 1/2**	Cuñetes rasos

Volumen medido del cuñete de pintura : 20.6Lt

CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm³	Proporciones al Volumen	No.Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	---	*0,53*	**(20-22)**	Litros
Cemento	32,7	*1,00*	**-**	Bulto de 42,5Kg
Arena	66,8	*2,04*	**8**	Baldados
Triturado	91,7	*2,80*	**11**	Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en la construcción de volumen=8,5Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : **CEMEX U.E. DE 42,5Kg**

La cantidad de agua se toma **siempre con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre humedad libre de los agregados petreos. El agua de la mezcla está calculada para un **Slump de hasta 2 pulgadas**

Para un Slump de mas de 3 pulgadas se recomienda utilizar aditivo

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

CONSORCIO FG SAN JOSE	CONSORCIO FG SAN JOSE
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

CONTRATO DE OBRA 21042025 - 0831.
GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONCRETO 4000 PSI


SAN JOSE

ACTA No. 2
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND - 4000PSI

PROYECTO: CAISSONS Y CANALES EN SAN JOSE
INTERESADO: CONSORCIO FG SAN JOSE
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN JOSE - CALDAS
PROCEDENCIA: ARENA Y TRITURADO DE AL BEM - LA VIRGINIA
FECHA: MAYO 22 DE 2025

Consuas INGENIERIA



AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

DATOS MATERIALES DE LA MEZCLA

Resistencia esperada en P.S.I.	4000PSI
Relación agua/cemento.	**0,45**
Contenido de cemento kg/m³ de concreto	377
Agua para agregados SSS Lts/m³ de concreto	**170**
Volumen absoluto de los agregados Lts/m³ de concreto	709,4
Peso seco de los agregados Kg/m³ de concreto	1802,5
Peso especifico bulk de la arena g/cm³	2,462
Peso especifico bulk de la grava g/cm³	2,669
Humedad de absorcion de la grava %	1,2
Humedad de absorcion de la arena %	4,2
Peso unitario del agr. grueso compacto Ton/m³	1,714
Peso unitario del agregado grueso suelto Ton/m³	1,640
Peso unitario del agregado fino compacto Ton/m³	1,631
Peso unitario del agregado fino suelto Ton/m³	1,500
Peso especifico del cemento Ton/m³	**3,100**

TAMICES		AGREGADOS		AJUSTE GRANULOMETRICO			
ABERTURA Pulg.	ABERTURA mm	GRAVILLA	ARENA	PROPORCION ARENA	PROPORCION GRAVA	MEZCLA DE AGREGADOS	GRANULOMETRIA IDEAL
		AL BEM					
		PORCENTAJE QUE PASA.		%	%		
				0,40	**0,60**		
2 1/2	62,500						
2	50,000						
1 1/2	37,500						
1	25,000	100,0	100,0	40,0	60,0	100,0	**100,0**
3/4	19,000	97,0	100,0	40,0	58,2	98,2	**94,0**
1/2	12,500	64,7	100,0	40,0	38,8	78,8	**78,3**
3/8	9,500	46,7	99,8	39,9	28,0	68,0	**68,8**
4	4,750	15,3	96,7	38,7	9,2	47,9	**50,4**
8	2,375	4,0	92,1	36,9	2,4	39,2	**36,9**
16	1,190	2,6	87,6	35,0	1,6	36,6	**27,0**
30	0,595	2,2	78,1	31,2	1,3	32,5	**19,8**
50	0,300	1,8	9,5	3,8	1,1	4,9	**14,5**
100	0,150	1,5	3,7	1,5	0,9	2,4	**10,6**
200	0,075	1,3	2,2	0,9	0,8	1,7	
Módulo		7,3	3,3			4,703	4,763

*** Los resultados y la presente dosificación de concreto corresponden a las muestras ensayadas*

PROPORCIONES DE LA MEZCLA - 4000PSI

Materiales	Proporcion de los agregados	Volumen/m³ Dm³	Peso/m³ Kg	Proporciones en Volumen	Proporciones en Peso
Agua		170,0	170,0	**0,45**	***0,45***
Cemento		121,6	376,9	**1,00**	***1,00***
Arena	0,400	283,8	721,0	**1,66**	***1,91***
Triturado	0,600	425,6	1081,5	**2,27**	***2,87***

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND

PROYECTO: CAISSONS Y CANALES EN SAN JOSE
INTERESADO: CONSORCIO FG SAN JOSE
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN JOSE - CALDAS
PROCEDENCIA: ARENA Y TRITURADO DE AL BEM - LA VIRGINIA
FECHA: MAYO 22 DE 2025

MEZCLA PARA: ***4000PSI***

CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m³ Kg	Masa unitaria de los agregados	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	170,0	Ton/m³	**170,0 Litros**
Cemento **	376,9		**376,9 Kg.**
Arena	721,0	1,500	**0,4806 m³**
Triturado	1081,5	1,640	**0,6594 m³**

Consumo de cemento Portland en bultos de 42,5Kg/m³ de concreto **8,87**

PROPORCIONES EN PESO DE LOS MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO PORTLAND

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales	
Agua	*0,45*	(17-19)	Litros
Cemento	*1,00*	42,5	Kg (1 bulto)
Arena	*1,91*	81	Kg
Triturado	*2,87*	122	Kg

AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

CUBICACION DE LOS MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm³	Proporciones al Volumen	No.Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	---	*0,45*	**(17-19)**	Litros
Cemento	32,7	*1,00*	**1**	Bulto de 42,5Kg
Arena	54,2	*1,66*	**2**	40cm x 40cm x **16,9** cm de alto
Triturado	74,4	*2,27*	**2**	40cm x 40cm x **23,2** cm de alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm³	Proporciones al Volumen	No.Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	---	*0,45*	**(17-19)**	Litros
Cemento	32,7	*1,00*	**-**	Bulto de 42,5Kg
Arena	54,2	*1,66*	**2 1/2**	Cuñetes rasos
Triturado	74,4	*2,27*	**3 1/2**	Cuñetes rasos

Volumen medido del cuñete de pintura : 20.6Lt

CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm³	Proporciones al Volumen	No.Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	---	*0,45*	**(17-19)**	Litros
Cemento	32,7	*1,00*	**-**	Bulto de 42,5Kg
Arena	54,2	*1,66*	**6 1/2**	Baldados
Triturado	74,4	*2,27*	**8 1/2**	Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en la construcción de volumen=8,5Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : **CEMEX U.E. DE 42,5Kg**

La cantidad de agua se toma **siempre con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre humedad libre de los agregados petreos. El agua de la mezcla está calculada para un **Slump de hasta 2 pulgadas**

Para un Slump de mas de 3 pulgadas se recomienda utilizar aditivo

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

CONSORCIO FG SAN JOSE	CONSORCIO FG SAN JOSE
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

CONTRATO DE OBRA 21042025 - 0831.
GOBERNACIÓN DE CALDAS

TUBERIA ALCANTARILLADO DE 36"

SAN JOSE

ACTA No. 2
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA - ACCESORIOS PARA TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO

Fabricado por **PVC GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín Km. 2 - 600 metros vía parcelas Cota, Cundinamarca, Colombia**

Manufactured by **PVC GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellín Km. 2 - 600 metros vía parcelas Cota, Cundinamarca, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5055 (2018)

Tubos y accesorios de Poli(cloruro de vinilo) (PVC) perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno

Poly(vinyl chloride) (PVC) profile gravity sewer pipe and fittings based on controlled inside diameter

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC -CER495354
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2016-09-23	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2017-07-19
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2022-04-08	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2028-04-07

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC

ANSI ACCREDITED

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-67R

CONSORCIO FG SAN JOSE	CONSORCIO FG SAN JOSE
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

CONTRATO DE OBRA 21042025 - 0831.
GOBERNACIÓN DE CALDAS

CEMENTO ESTRUCTURAL

SAN JOSE

ACTA No. 2
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 05-jun-25
Número de Reporte: IBG-UG-21-2025
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo UG

Fecha inicial* 18-may-25 ····· Fecha final* 24-may-25

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	10.7 MPa	No especificado
3 días	NTC 220	18.8 MPa	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	22.0 MPa	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	25.3 MPa	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	5.79 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	445 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	232 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 163 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 7.6%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia

CONSORCIO FG SAN JOSE	CONSORCIO FG SAN JOSE
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

CONTRATO DE OBRA 21042025 - 0831.
GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACERO Fy 4200 MPA

SAN JOSE

ACTA No. 2
DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **HOMECENTER VENTA EMPRESA MANIZALES**
Dirección: **AV LA SULTANA CON CR 18 MANIZALES**
Teléfono: **5460000**

Fecha Impresión **25/06/24**
No. Remisión: **187190151**
Página: **1 de 5**

Informe N°: **99052**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011799711	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.92	0.18	0.019	0.015	0.46	0.149	0.052	0.152	0.004
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923704	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.018	0.011	0.44	0.155	0.053	0.148	0.003
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923711	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.019	0.011	0.44	0.155	0.053	0.148	0.003
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923712	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.018	0.011	0.44	0.155	0.053	0.148	0.003
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923714	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.018	0.011	0.44	0.155	0.053	0.148	0.003
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920316	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.89	0.17	0.016	0.016	0.46	0.258	0.075	0.139	0.003
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920318	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.89	0.17	0.016	0.016	0.46	0.258	0.075	0.139	0.003

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **HOMECENTER VENTA EMPRESA MANIZALES**
Dirección: **AV LA SULTANA CON CR 18 MANIZALES**
Teléfono: **5460000**

Fecha Impresión: **25/06/24**
No. Remisión: **187190151**
Página: **2 de 5**

Informe N°: **99052**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Mo
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014626	A011789711	NTC 2289 GR60	Ternium	0.026
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923704	NTC 2289 GR60	Ternium	0.010
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923711	NTC 2289 GR60	Ternium	0.010
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923712	NTC 2289 GR60	Ternium	0.010
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923714	NTC 2289 GR60	Ternium	0.010
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920316	NTC 2289 GR60	Ternium	0.016
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014626	A01_920318	NTC 2289 GR60	Ternium	0.016

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **HOMECENTER VENTA EMPRESA MANIZALES**
Dirección: **AV LA SULTANA CON CR 18 MANIZALES**
Teléfono: **5460000**

Fecha Impresión **25/06/24**
No. Remisión: **187190151**
Página: **3 de 5**

Informe N°: **99052**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA,PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF
						MPa	MPa	%		
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011798711	NTC 2289 GR60	Ternium	472	629	18	SinGrieta	1,33
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923704	NTC 2289 GR60	Ternium	468	612	16	SinGrieta	1,31
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923711	NTC 2289 GR60	Ternium	468	612	16	SinGrieta	1,31
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923712	NTC 2289 GR60	Ternium	468	612	16	SinGrieta	1,31
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923714	NTC 2289 GR60	Ternium	468	612	16	SinGrieta	1,31
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920316	NTC 2289 GR60	Ternium	524	671	18	SinGrieta	1,28
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920318	NTC 2289 GR60	Ternium	524	671	18	SinGrieta	1,28

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **HOMECENTER VENTA EMPRESA MANIZALES**
Dirección: **AV LA SULTANA CON CR 18 MANIZALES**
Teléfono: **5460000**

Fecha Impresión **25/06/24**
No. Remisión: **187190151**
Página: **4 de 5**

Informe N°: **99052**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011799711	NTC 2289 GR60	Ternium	2.958	1.34	5.6	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923704	NTC 2289 GR60	Ternium	2.962	1.41	5.7	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923711	NTC 2289 GR60	Ternium	2.962	1.41	5.7	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923712	NTC 2289 GR60	Ternium	2.962	1.41	5.7	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923714	NTC 2289 GR60	Ternium	2.962	1.41	5.7	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920316	NTC 2289 GR60	Ternium	3.036	1.41	5.5	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920318	NTC 2289 GR60	Ternium	3.036	1.41	5.5	14.7

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **HOMECENTER VENTA EMPRESA MANIZALES**
Dirección: **AV LA SULTANA CON CR 18 MANIZALES**
Teléfono: **5460000**

Fecha Impresión **25/06/24**
No. Remisión: **187190151**
Página: **5 de 5**

Informe N°: **99052**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011799711	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923704	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923711	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923712	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A011923714	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920316	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	6000014625	A01_920318	NTC 2289 GR60	Ternium	60

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **HOMECENTER VENTA EMPRESA MANIZALES**
Dirección: **AV LA SULTANA CON CR 18 MANIZALES**
Teléfono: **5460000**

Fecha Impresión **25/06/24**
No. Remisión: **187190703**
Página: **1 de 2**

Informe N°: **99055**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PROD	FABRICANTE
C9005640	ROLLO COMPACTO COR 1/2" NTC2289/G60	BNSG014444	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

PROPIEDADES QUIMICAS

% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V
0.27	1.02	0.23	0.022	0.025	0.47	0.169	0.060	0.17	0.002

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PROD	FABRICANTE
C9005640	ROLLO COMPACTO COR 1/2" NTC2289/G60	BNSG014444	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

PROPIEDADES QUIMICAS

% Mo
0.011

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PROD	FABRICANTE
C9005640	ROLLO COMPACTO COR 1/2" NTC2289/G60	BNSG014444	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

PROPIEDADES FISICAS

Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
474	681	15.0	SinGrieta	1.46

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **HOMECENTER VENTA EMPRESA MANIZALES**
Dirección: **AV LA SULTANA CON CR 18 MANIZALES**
Teléfono: **5460000**
Fecha Impresión **25/06/24**
No. Remisión: **187190703**
Página: **2 de 2**
Informe N°: **99055**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm
C9005640	ROLLO COMPACTO COR 1/2" NTC2289/G60	BNSG014444	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.954	0.70	2.4	8.2

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °
C9005640	ROLLO COMPACTO COR 1/2" NTC2289/G60	BNSG014444	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

CONSORCIO FG SAN JOSE	CONSORCIO FG SAN JOSE
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

CONTRATO DE OBRA 21042025 - 0831.
GOBERNACIÓN DE CALDAS

ENSAYOS DE COMPRESION A CILINDROS DE CONCRETO

SAN JOSE

ACTA No. 2
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Consuas	RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FO-GS-04 Fecha V: 21-ABR-17 Versión: 01 Página 1 de 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS

INTERESADO: CONSORCIO FG SAN JOSE

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ - CALDAS

JUNIO 20 Y 26 DE 2025

NÚMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	ASENTAMIENTO Pulg	AREA cm2	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL Kg/cm2	MPa	P.S.I.	% RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
4	6/06/2025	20/06/2025	14	Camara alcantarillado 5	3.000 PSI	3		83,4	20,6	**280,3**	342,9	33,62	**4898**	*5682*
1	29/05/2025	26/06/2025	28	Anillo #3 caisson 4,6	3.000 PSI	4		83,6	20,5	**332,2**	405,0	39,72	**5786**	
2	29/05/2025	26/06/2025	28	Anillo #3 caisson 4,6	3.000 PSI	4		82,0	20,5	**327,9**	407,5	39,97	**5822**	
7	12/06/2025	26/06/2025	14	Camara alcantarillado 5	3.000 PSI	4		82,0	20,4	**259,6**	322,7	31,65	**4610**	*5348*

Uso de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

OBSERVACIONES: CONCRETO HECHO EN OBRA

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero de 2025 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó

Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

CONSORCIO FG SAN JOSE	CONSORCIO FG SAN JOSE
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS

CONTRATO DE OBRA 21042025 - 0831.
GOBERNACIÓN DE CALDAS

ENSAYOS DE CBR

SAN JOSE

ACTA No. 2
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO, DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No. 200 MEDIANTE LAVADO Y LIMITES DE ATTERBERG NORMAS INVIAS 125,126, 213- 214- 2017	CÓDIGO	FOR-001
		VERSIÓN	1
		FECHA	17/02/2021

COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL : MATERIAL GRANUALR EXISTENTE
FUENTE DE MATERIALES APIQUES 1 Y 2
FECHA DE ENSAYO : 20 de junio de 2025

DETERMINACION GRANULOMETRIA DE MATERIAL EXISTENTE

Masa seca inicial (g)		8955,0	Masa seca lavada (g)		8338,8	ARRMADO	
Tamiz (Inch)	Tamiz (mm)	Retenina (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa	Minimo	Maximo
3"	75,0		0,0	0,0	100,0	100	100
2 1/2"	70,0	823,6	9,2	9,2	90,8	100	100
2"	50,0	912,6	10,2	19,4	80,6	100	100
1 ½"	37,5	614,3	6,9	26,2	73,8	100	100
1"	25,0	1121,3	12,5	38,8	61,2	100	100
3/4"	19,0	1148,9	12,8	51,6	48,4	80	100
3/8"	9,5	1518,0	17,0	68,6	31,4	60	85
Nº4	4,75	866,2	9,7	78,2	21,8	40	65
Nº10	2,00	590,2	6,6	84,8	15,2	30	50
Nº40	0,425	439,8	4,9	89,7	10,3	13	30
Nº200	0,075	302,9	3,4	93,1	6,9	8	18
FONDO							
Peso final g		8337,8					


DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO NORMA INV.E-125-13


Determinacion	1	2	3	-	-
N° recipiente	1	2	3	-	-
N. de golpes	15	25	35	-	-
Recipiente + M humedo .g	16,52	17,00	18,29	-	-
Masa del recipiente + material seco .g	13,56	14,16	15,36	-	-
Masa del recipiente .g	6,39	6,38	6,32	-	-
Contenido de agua .%	40,89	36,50	32,41	-	-

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO NORMA INV.E-126-13

Determinacion	1	2
N° recipiente	1	2
Masa del recipiente .g	16,99	17,12
Recipiente + material Humedo	14,39	14,51
Recipiente + material Seco	6,26	6,31
Contenido de agua, %	**31,85**	**31,83**

HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216 - 13		
Recipiente N°		3
Suelo Húmedo (g)		542,3
Masa Rec. + Suelo Seco (g)		602,8
Masa Recipiente (g)		
Humedad		6,6

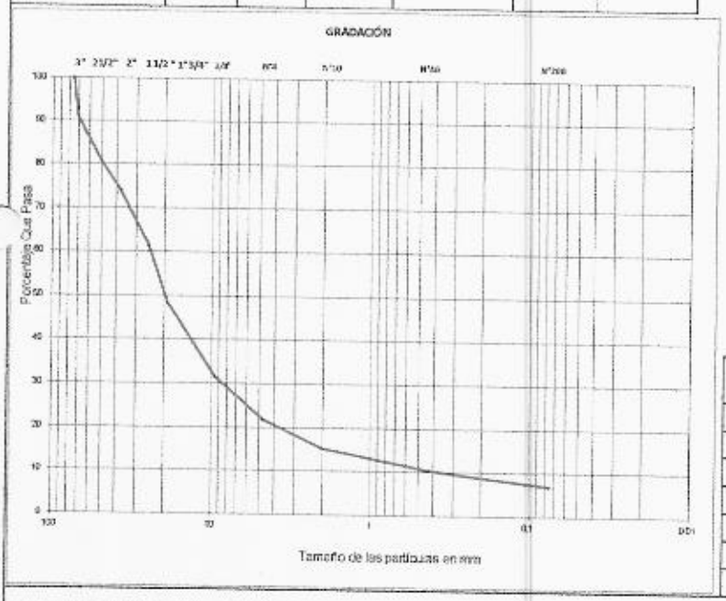

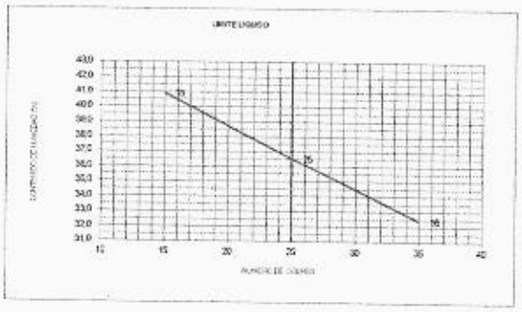

RESULTADOS

LIMITE LIQUIDO	NL	36,6
LIMITE PLASTICO	NP	31,8
INDICE DE PLASTICIDAD	NP	4,76
HUMEDAD NATURAL (%)	-	6,6
GRAVAS (%) TAMIZ N° 4	-	68,6
ARENAS (%)	-	21,2
Pasa Tamiz N° 200 (%)	-	10,3

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar De laboratorio	Cargo: Trigo. en Obras Civiles - Laboratorista

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DEZLENABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INVIAS INV E 211-2013	CÓDIGO	FOR-025
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2021

COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL : MATERIAL GRANUALR EXISTENTE
FUENTE DE MATERIALES : APIQUES 1 Y 2
FECHA DE ENSAYO : 20 de junio de 2025

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	5000	4997,6	25,4%	0,05%
1 1/2"	3/4"	Nº 4	3000	2997,3	12,4%	0,09%
3/4"	3/8"	Nº 4	2000	1997,9	17,5%	0,10%
3/8"	Nº 4	Nº 8	1000	996,0	10,2%	0,40%
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20				
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						0,08%

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma:	Firma:
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. De Laboratorio	Cargo: Tnlgo en Obras Civiles - Laboratorista

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DEZLENABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INVIAS INV E 211-2013	CÓDIGO	FOR-025
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2021

COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL : MATERIAL GRANUALR EXISTENTE
FUENTE DE MATERIALES : APIQUES 1 Y 2
FECHA DE ENSAYO : 20 de junio de 2025

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4				
1 1/2"	3/4"	Nº 4				
3/4"	3/8"	Nº 4				
3/8"	Nº 4	Nº 8				
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	50,0	48,7	17,1%	2,5%
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						0,44%

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. De Laboratorio	Cargo: Tnlgo. en Obras Civiles - Laboratorista

LABORATORIO DE ENSAYAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS MENORES DE 1 1/2" Y MAYORES DE 3/4" POR MEDIO DE LA MÁQUINA LOS ÁNGELES NORMA INVIAS INV E 218/219-2013

FOR-004
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN
20/01/2021

COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE

MATERIAL : MATERIAL GRANUALR EXISTENTE

FUENTE DE MATERIALES : APIQUES 1 Y 2

FECHA DE ENSAYO : 20 de junio de 2025

Tipo de Granulometría	A
Peso Total Muestra Seca Final (g)	3682
Peso Total Muestra Seca Inicial (g)	5000
Desgaste (%)	26,4

GRANULOMETRIAS DE LAS MUESTRA DE AGREGADO PARA ENSAYO

Tabla 1. Gradaciones de muestras de ensayo

Tamaño del tamiz, mm (abertura cuadrada)		Masa de los tamaños indicados, g			
Pasa	Retenido en	Gradación			
		A	B	C	D
37,5	25,0	1 250 ± 25	-	-	-
25,0	19,0	1 250 ± 25	-	-	-
19,0	12,5	1 250 ± 10	2 500 ± 10	-	-
12,5	9,5	1 250 ± 10	2 500 ± 10	-	-
9,5	6,3	-	-	2 500 ± 10	-
6,3	4,75	-	-	2 500 ± 10	-
4,75	2,36	-	-	-	5 000 ± 10
Total		5 000 ± 10	5 000 ± 10	5 000 ± 10	5 000 ± 10

Granulometría de ensayo	Número de esferas	Peso Total g
A	12	5000 ± 25
B	11	4584 ± 25
C	8	3330 ± 20
D	6	2500 ± 15


Observaciones: 500 REVOLUCIONES

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre :Alexander Lopez	Nombre:Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. De Laboratorio	Cargo: Tnlgo. en Obras Civiles - Laboratorista

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	RELACIONES DE HUMEDAD- PESO UNITARIO SECO DE LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION) NORMA INVIAS -142	CODIGO	FOR-006
		VERSION	1
		FECHA	17/02/2021

COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL : MATERIAL GRANUALR EXISTENTE
FUENTE DE MATERIALES APIQUES 1 Y 2
FECHA DE ENSAYO : 20 de junio de 2025

PRUEBA	1	2	3	4
DETERMINACION DE HUMEDAD				
Recipiente Número	1	2	3	4
M1= Masa Recipiente + masa humeda (g):	502,6	456,3	500,0	500,0
M2= Masa Recipiente + masa seca (g):	488,6	427,3	462,3	451,7
M3= Masa Recipiente (g):	0,0	0,0	0,0	0,0
Humedad (%):	2,9	6,8	8,3	10,7
DETERMINACION DE LA DENSIDAD				
Numero de golpes por capa:	56	56	56	56
Numero de capas:	5	5	5	5
Masa suelo inicial (g):	6000	6000	6000	6000
Agua adicional (cm³)	0	120	240	360
Molde Número	1	1	1	1
M4=Masa molde y base + suelo compactado (g):	9718	10290	10359	10185
M5= Masa del molde (g):	5583	5583	5583	5583
M6= Masa humeda compacta (g):	4135	4707	4776	4602
Humedad (%):	2,9	6,8	8,3	10,7
M7= Masa seca (g):	4020	4408	4411	4157
V=Volumen del molde (cm³)	2123	2123	2123	2123
Densidad seca (g/cm³) (M7/V)	1,893	2,076	2,078	1,958
Densidad seca (kg/m³):	1893	2078	2078	1958

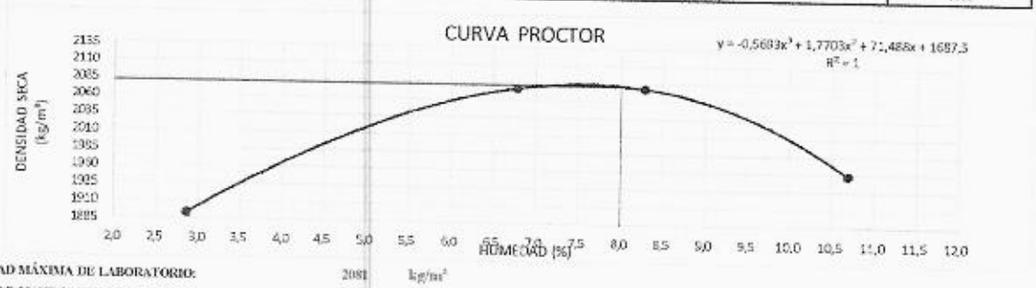

DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO: 2081 kg/m³
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO: 2,081 g/cm³
HUMEDAD ÓPTIMA: 8,0 %

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Laboratorista

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	ENSAYO DE CBR INV E 148-13	Código:	FOR-007
		Versión:	1
		Fecha:	17/02/2021


COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL : MATERIAL GRANUALR EXISTENTE
FUENTE DE MATERIALES : AP QUES 1 Y 2
FECHA DE ENSAYO : 20 de junio de 2025

RESULTADOS

Índice de Grupo			Metodo de Compactación		MANUAL	Densidad Maxima Seca - Laboratorio	kg/m3	2.081
Clasificación Sistema ASSHTO			Condición de Ensayo			Humedad Optima	%	8,0
Clasificación Sistema USCS			Tiempo de Inmersión	h	96,00	Densidad al 98% - Laboratorio	kg/m3	2.039
Índice de Plasticidad	%	NP	Peso De Sobrecarga Utilizada	kg		Densidad al 95% - Laboratorio	kg/m3	1.977
CBR Corregido Al 100%		47	CBR Corregido Al 98%		43,5	CBR Corregido Al 95%		38,6

DATOS

PENETRACIÓN		CARGA ESTANDAR	MOLDE N°	1			MOLDE N°	2			MOLDE N°	3		
			56 GOLPES				25 GOLPES				10 GOLPES			
(Pulg)	(mm)	kg	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %
0	0				0				0				0	
0,025	0,64		1,971	201	10,2		1,025	105	5,3		0,320	33	1,7	
0,050	1,27		3,319	338	17,2		2,512	256	13,0		1,045	107	5,4	
0,075	1,91		5,314	542	27,6		3,045	311	15,8		1,246	127	6,5	
0,100	2,54	70,31	6,316	644	32,8	47	3,866	394	20,1	29	1,863	190	9,7	14
0,125	3,18		7,022	716	36,5		4,116	420	21,4		2,106	215	10,9	
0,150	3,81		7,704	786	40,0		4,538	463	23,6		2,163	221	11,2	
0,200	5,08	105,46	8,121	828	42,2	40	4,723	482	24,5	23	2,374	242	12,3	12
0,300	7,62		8,885	906	46,2		5,161	526	26,8		2,667	272	13,9	
0,400	10,16		9,222	940	47,9		5,526	563	28,7		3,118	318	16,2	
0,500	12,70		9,714	991	50,5		6,118	624	31,8		3,726	380	19,4	

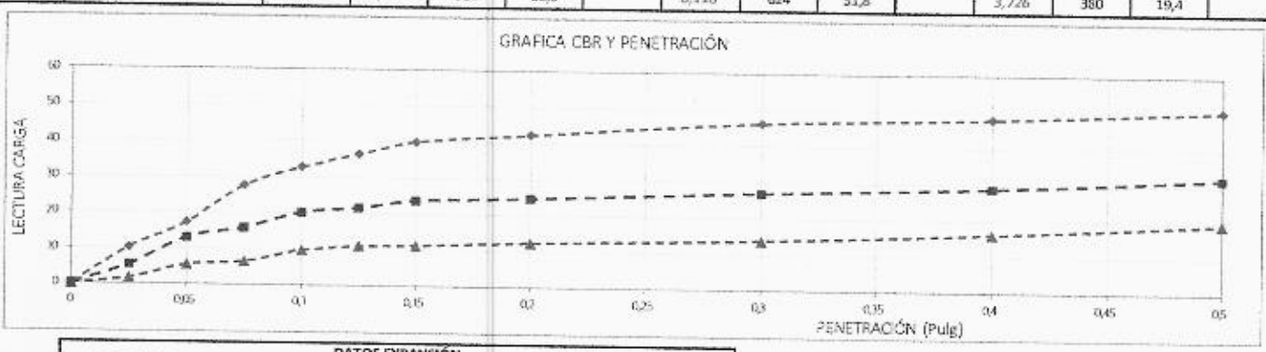

DATOS EXPANSIÓN						
Altura de la Muestra (mm)					114	
	56 GOLPES		25 GOLPES		10 GOLPES	
	(mm)	(%)	(mm)	(%)	(mm)	(%)
INICIAL	0,00		0,00		0,00	
24 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
72 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
96 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EXP. TOTAL %		0,00%		0,00%		0,00%

Porcentaje de Expansión del CBR Al 100%	0,00%
Porcentaje de Expansión del CBR Al 98%	0,00%
Porcentaje de Expansión del CBR Al 95%	0,00%

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Laboratorista


LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	ENSAYO DE CBR INV E 148-13	Código:	FOR-027
		Versión:	1
		Fecha:	17/02/2020
		Página	2 de 2


COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL : MATERIAL GRANUALR EXISTENTE
FUENTE DE MATERIALES APIQUES 1 Y 2
FECHA DE ENSAYO: 20 de junio de 2025

DATOS DE DENSIDADES

ENSAYO		PROCTOR				CBR		
MOLDE N°		1	2	3	4	1	2	3
N° DE GOLPES		56	56	56	56	56	25	10
Peso molde + suelo compactado	gr	9718	10290	10359	10185	13278	12840	12798
Peso molde	gr	5583	5583	5583	5583	8130	8389	8693
Peso suelo compactado	gr	4135	4707	4776	4602	5148	4451	4105
Volumen de molde	cc	2123	2123	2123	2123	2286,4	2226,6	2286,4
Densidad húmeda	kg/m3	1948	2217	2250	2168	2252	1999	1795
Densidad seca	kg/m3	1893	2076	2078	1958	2081	1846	1658
HUMEDAD	%	2,9	6,8	8,3	10,7	8,2	8,3	8,3
CBR corregido 0,1"	%	-	-	-	-	47	29	14
CBR corregido 0,2"	%	-	-	-	-	40	23	12

GRAFICAS

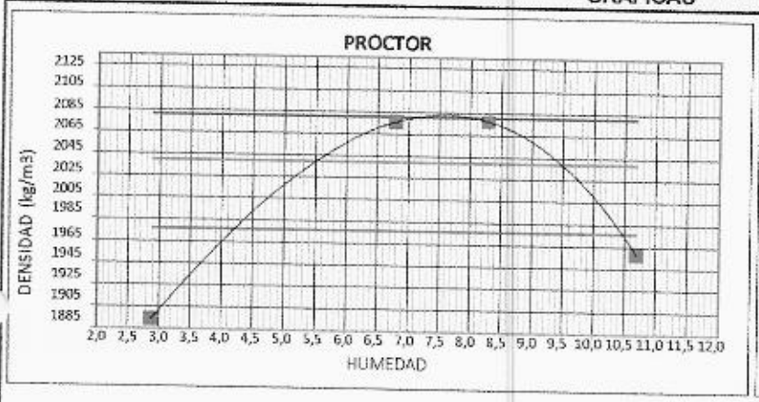

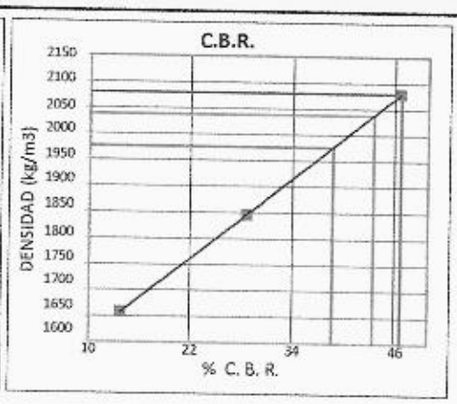


ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar.de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Laboratorista

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION

APIQUE N° 1

COMPAÑIA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL: APIQUE N° 1
FUENTE DE MATERIALES : APIQUE N° 1 VIA VITERBO - SAN JOSE
FECHA DE ENSAYO : 20/06/2025

PRFUNDIDAD m	DESCRIPCION DEL MATERIAL
0,00 A 0,50	MATERIAL GRANULAR CON SOBRE TAMAÑOS DE 3"
0,50 A 0,70	SUELO LIMO ARCILLOSO CAFÉ CLARO TOMA DE CBR
0,70 A 100	SUELO LIMO ARCILLOSO CAFÉ CLARO



Elaboro: Alexander Lopez
Auxi . De Laboratorio

Reviso y Aprobo: Jose Norbey Rivera
Tnlgo.En Obras Civiles - Laboratorista

La Virginia - Risaralda
Tel: 3113725717-3117535823 seensayos@gmail.com

SE ENSAYOS LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	ENSAYO DE CBR INV E 148-13	Código:	FOR-007
		Versión:	1
		Fecha:	17/02/2021

COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL : CBR INALTERADO
FUENTE DE MATERIALES : APIQUE N° 1 VIA VITERBO - SAN JOSE
FECHA DE ENSAYO : 20 de junio de 2025

RESULTADOS

DATOS

PENETRACIÓN		CARGA ESTANDAR	MOLDE N°		1		MOLDE N°		2		MOLDE N°		3	
			APIQUE #1											
(Pulg)	(mm)	kg	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	MATERIAL GRANULAR CON SOBRE	CBR CORR. %	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %
0	0				0									
0,025	0,64		0,950	97	4,9									
0,050	1,27		1,188	121	6,2									
0,075	1,91		1,300	133	6,8									
0,100	2,54	70,31	1,367	139	7,1	10								
0,125	3,18		1,420	145	7,4									
0,150	3,81		1,438	147	7,5									
0,200	5,08	105,46	1,503	153	7,8	7								
0,300	7,62		1,638	167	8,5									
0,400	10,16		1,729	176	9,0									
0,500	12,70		1,788	182	9,3									

GRAFICA CBR Y PENETRACIÓN



DATOS EXPANSIÓN						
Altura de la Muestra (mm)				114		
	CBR 1					
	(mm)	(%)	(mm)	(%)	(mm)	(%)
INICIAL	0,00		0,00		0,00	
24 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
72 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
96 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EXP. TOTAL %		0,00%		0,00%		0,00%


ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Laboratonsta

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION

APIQUE N° 2

COMPAÑIA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL: APIQUE N° 2
FUENTE DE MATERIALES : APIQUE N° 2 VIA VITERBO - SAN JOSE
FECHA DE ENSAYO : 20/06/2025

PRFUNDIDAD m	DESCRIPCION DEL MATERIAL
0,00 A 0,40	MATERIAL GRANULAR CON SOBRE TAMAÑOS DE 3"
0,40 A 0,60	SUELO LIMO ARCILLOSO CAFÉ CLARO TOMA DE CBR
0,60 A 100	SUELO LIMO ARCILLOSO CAFÉ CLARO



Elaboro: Alexander Lopez
Auxi . De Laboratorio

Reviso y Aprobo: Jose Norbey Rivera
Tnlgo.En Obras Civiles - Laboratorista

La Virginia - Risaralda
Tel: 3113725717-3117535823 seensayos@gmail.com


LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	ENSAYO DE CBR INV E 148-13	Código:	FOR-007
		Versión:	1
		Fecha:	17/02/2021

COMPAÑÍA : CONSORCIO FG SAN JOSE
MATERIAL : CBR INALTERADO
FUENTE DE MATERIALES : APIQUE N° 2 VIA VITERBO - SAN JOSE
FECHA DE ENSAYO : 20 de junio de 2025

RESULTADOS

DATOS

PENETRACIÓN		CARGA ESTANDAR	MOLDE N°		1		MOLDE N°		2		MOLDE N°		3	
			APIQUE # 2											
(Pulg)	(mm)	kg	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	MATERIAL GRANULAR CON SOBRE	CBR CORR. %	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %
0	0				0									
0,025	0,64		0,887	90	4,6									
0,050	1,27		1,039	106	5,4									
0,075	1,91		1,163	119	6,0									
0,100	2,54	70,31	1,244	127	6,5	9								
0,125	3,18		1,346	137	7,0									
0,150	3,81		1,419	145	7,4									
0,200	5,08	105,46	1,508	154	7,8	7								
0,300	7,62		1,601	163	8,3									
0,400	10,16		1,754	179	9,1									
0,500	12,70		1,946	198	10,1									

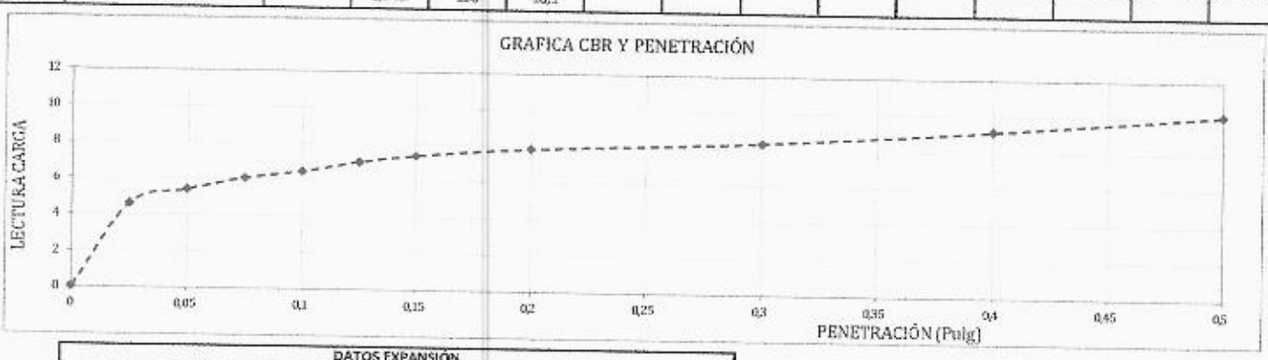

DATOS EXPANSIÓN						
Altura de la Muestra (mm)				114		
	CBR 2					
	(mm)	(%)	(mm)	(%)	(mm)	(%)
INICIAL	0,00		0,00		0,00	
24 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
72 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
96 Horas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EXP. TOTAL %		0,00%		0,00%		0,00%

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Laboratorista

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO NO. 21042025-0831

" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS"

CONTRATISTA:

CONSORCIO FG SAN JOSÉ

RESIDENTE AMBIENTAL:

JOHN SEBASTIÁN BAVATIVA RAMÍREZ

PERIODO:

1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

INTRODUCCION:

A través del presente informe se describen las actividades de gestión ambiental desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de junio del 2025 en la ejecución del contrato de obra pública " Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la vereda El Bosque en el municipio de San José Caldas". Dichas actividades se desarrollan con base en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA formulado para el proyecto, por lo cual se indicará las actividades desarrolladas en cada programa de manejo ambiental con sus respectivos soportes (anexos) que, permitan identificar y verificar el cumplimiento de las estrategias de prevención, corrección, mitigación y o compensación de los impactos ambientales generados en la etapa de ejecución del proyecto.

OBJETIVOS:

- Describir las actividades de gestión ambiental desarrolladas durante el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2025 en la ejecución del contrato de obra pública "Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la vereda El Bosque en el municipio de San José Caldas".
- Detallar las actividades realizadas en cada programa de manejo ambiental, con base en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) formulado para el proyecto.
- Identificar y verificar el cumplimiento de las estrategias de prevención, corrección, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales generados durante la etapa de ejecución del proyecto.

1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Dentro del programa de conformación del grupo de gestión ambiental se desarrollaron las actividades relacionadas con la formulación e implementación del PAGA, el desarrollo de informes y la atención de solicitudes emitidas por la interventoría o las entidades competentes para tal fin, así como a las solicitudes de la ciudadanía en materia ambiental.

- Se ajusto el informe mensual No. 1 de acuerdo con las observaciones emitidas por parte de la interventoria para su aprobación.

- Desarrollo del informe mensual de gestión ambiental No. 2, en el cual se describen las actividades de implementación del PAGA dentro del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de junio del 2025.


SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{PAGA\ Aprobado}{PAGA\ radicado} * 100$	$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$	Se radica PAGA a interventoría el cual es aprobado. Informe No.1
$\frac{Informes\ presentados}{Informes\ requeridos} * 100$	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	Informe mensual No. 1 mayo y No. 2 junio

2. CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

- Se realizo capacitación de gestión ambiental al personal de obra en el frente de obra ubicado en la vereda El Bosque del municipio de San José, Caldas, el 19 de junio de 2025 donde se abarco el tema de "Manejo Integral de Residuos Sólidos" en donde se suministró información general para el adecuado manejo de residuos sólidos convencionales, especiales (sacos de cemento vacíos), RESPEL y RCD. *Anexo 1. Registro de Asistencia a Capacitaciones*



Fotografía 1. Capacitación

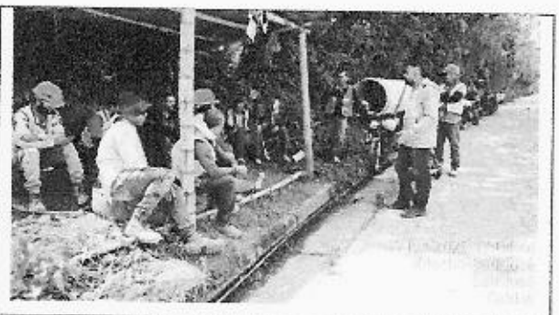

Fotografía 2. Capacitación

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{No.\ Asistentes\ a\ capacitación}{No.\ Trabajadores} * 100$	$\frac{13}{13} * 100 = 100\%$	El 19 de mayo de 2025, fecha de la capacitación se

		contaba con 13 trabajadores en obra.
$\frac{Capacitaciones\ Ejecutadas}{Capacitaciones\ Programadas} * 100$	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	Se han realizado dos capacitaciones, correspondiente a los meses de mayo y junio

3. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

En el programa de cumplimientos legales, se relacionan los permisos ambientales o documentos legales que avalan el desarrollo de las actividades constructivas en cuanto el requerimiento de uso de recursos naturales, intervención de espacios públicos o áreas de interés ambiental, entre otros.

- De acuerdo con la solicitud de registro como generadores de RCD radicada ante CORPOCALDAS por medio del oficio 2025-EI-00010401 (radicación interna de CORPOCALDAS), se emite respuesta mediante oficio 2025-IE-00018999 del 9 de junio de 2025 a través del cual se recibe el programa de manejo Ambiental de RCD y se asigna el código de registro GEN-RCD-115. Igualmente se establecen las fechas máximas de entrega del reporte de implementación parcial de programa de manejo ambiental de RCD, el cual define como próxima fecha de entrega el 13 de agosto de 2025. *Anexo 2. Oficio 2025-IE-00018999.*

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{Permisos\ tramitados}{Permisos\ requeridos} * 100$	$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$	Aprobación del registro como generadores de RCD.

4. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Los materiales de construcción, Arena y Triturado son suministrados por la empresa Asfaltos y Construcciones BEM S.A.S (Cantera Santa Marta), de la cual se anexaron los documentos ambientales en el Informe Mensual No. 1 correspondiente al mes de mayo, sin embargo, durante el mes de junio se contrata el suministro de material con una segunda cantera llamada Agregados y Construcciones La Fortuna S.A.S de la cual se

cuenta con los documentos ambientales anexados al presente informe. *Anexo 3. Plan de Manejo Ambiental Cantera La Fortuna; Anexo 4. RUCOM Cantera La Fortuna.*

- Como medida preventiva en cuanto al manejo de materiales de construcción, se planifico la adquisición de materiales de acuerdo con las cantidades requeridas para las actividades programadas de manera semanal con el fin de no saturar los espacios de almacenamiento de materiales y se realiza el cubrimiento con plástico del material para así evitar pérdidas de material por efectos ambientales como la dispersión de material por acción del viento o arrastre del mismo por acción de la escorrentía.
- Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y 30 de junio del 2025 se requirió el uso de los siguientes materiales y sus respectivas cantidades:
    - Arena: 14 m^3
    - Triturado: 14 m^3
- Se anexan los vales de recepción de materiales correspondientes al mes de junio. *Anexo 5. Vales de ingreso de materiales.*
- Los sacos de cemento son suministrados por Cemex y se garantiza el almacenamiento seguro de estos a través del aislamiento del suelo por medio de estibas y ubicado en un lugar cubierto y techado.




Fotografía 3. Cubrimiento de material



Fotografía 4. Almacenamiento de Cemento



Fotografía 5. Almacenamiento de Guadua y Madera

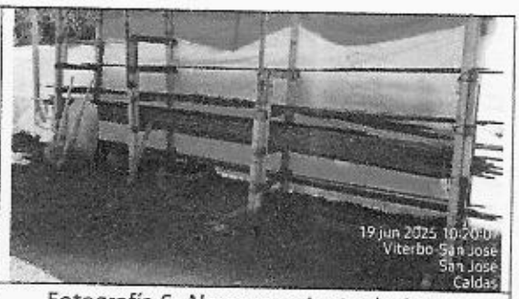


Fotografía 6. Almacenamiento de Acero

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{Canteras\ con\ permisos}{Permisos\ de\ canteras\ requeridos} * 100$	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	Documentos ambientales Cantera Santa Marta y Cantera La Fortuna
$\frac{Medidas\ de\ gestión\ ejecutadas}{Medidas\ de\ gestión\ requeridas} * 100$	$\frac{3}{3} * 100 = 67\%$	Salvoconductos de madera, planificación y control de materiales ingresados a obra. Almacenamiento seguro de materiales de construcción.

5. SEÑALIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

- Se verifica el estado de señalización en obra correspondiente a puntos ecológicos, rotulación de caneca de ACPM y rotulación de RESPEL, encontrando deterioro parcial en la señalización del punto ecológico del campamento, el cual deberá ser reemplazado.

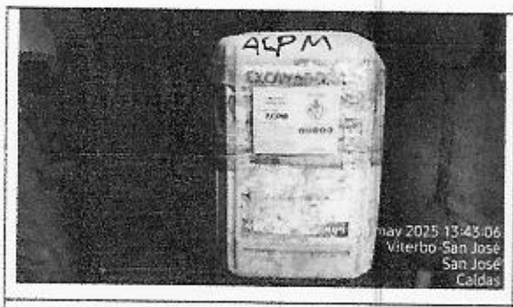	
Fotografía 7. Rotulación ACPM	Fotografía 8. Señalización Punto Ecológico Campamento deteriorada
	
Fotografía 9. Señalización Punto Ecológico frente de obra en buen estado	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{Señalización\ Instalada}{Señalización\ Propuesta} * 100$	$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$	Señalización Puntos ecológicos, baño, Galón de ACPM y valla informativa


6. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS

- En el periodo comprendido entre el 1 de junio y 30 de junio de 2025 no se ha realizado disposición final de RCD.
- Cabe mencionar que el 13 de agosto de 2025 se debe presentar el primer informe parcial de implementación del programa de manejo ambiental de RCD para el periodo correspondiente al 30 de abril de 2025 y 29 de julio de 2025.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{RCD\ Dispuesto\ en\ escombrera}{RCD\ Generado\ en\ obra} * 100$	$\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	Hasta la fecha no se cuantifica ni se realiza disposición final de RCD
$\frac{RCD\ reutilizado\ o\ aprovechado}{RCD\ Generado\ en\ obra} * 100$	$\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	Hasta la fecha no se cuantifica ni se realiza aprovechamiento de RCD

7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

- Para el manejo de los residuos sólidos convencionales se instalaron dos puntos ecológicos, uno de ellos ubicado en el frente de obra del proyecto y otro ubicado en el campamento temporal de obra.
- Partiendo del supuesto de que por persona se generan 1 kg de residuos sólidos diarios, se cuantifico las cantidades aproximadas de residuos generados de manera mensual en obra de acuerdo con la cantidad de personal operando, generando para el periodo comprendido entre 1 de junio y 30 de junio de 2025 una cantidad aproximada de 338 Kg de residuos sólidos.
- La disposición final de los residuos sólidos convencionales se realizará por medio del servicio público de aseo prestado por la empresa EMAS S.A.E.S.P. en el municipio de San José, Caldas.
- Se realiza la entrega de 300 sacos de cemento vacíos a la empresa Cemex a través de logística inversa para el aprovechamiento y gestión por parte de este proveedor.

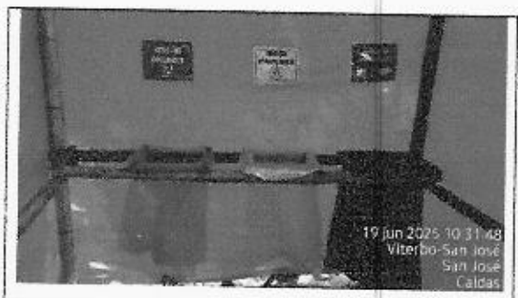

Fotografía 10. Punto Ecológico Frente de obra



Fotografía 11. Punto Ecológico Campamento



Fotografía 12. Recolección residuos EMAS



Fotografía 13. Entrega Sacos de cemento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{Puntos\ Ecologicos\ Instalados}{Puntos\ Ecologicos\ requeridos} * 100$	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	Punto Ecológico Campamento y punto ecológico frente de obra
$\frac{RESPEL\ Disposición\ Final}{RESPEL\ Generado\ en\ obra} * 100$	$\frac{0}{0{,}1} * 100 = 0\%$	Se generan RESPEL con peso inferior a 100 gramos, los cuales se almacenan para su posterior disposición.

8. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES

- Para el manejo de aguas residuales de origen doméstico, se cuenta con la instalación de una batería sanitaria ubicada en el campamento de obra la cual se encuentra conectada al pozo séptico de la Institución Educativa La Libertad sede El Bosque.

- En cuanto a las aguas residuales no domésticas se corrigen actividades de preparación de concreto para reducir el vertimiento de concreto sobre el suelo, por medio de la adecuación de plástico como impermeabilizante del suelo en el are de preparación de concreto.
- Se instala bordillo para el manejo de la escorrentía en el perímetro de la vía en la zona de construcción del muro de contención.



Fotografía 14. Aislamiento preparación de concreto



Fotografía 15. Aislamiento preparación de concreto.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{Monitoreos\ realizados}{Monitoreos\ requeridos} * 100$	$\frac{3}{3} * 100 = 100\%$	Seguimiento estado del baño, corrección preparación de concreto, Instalación bordillos.

9. PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS O SENSIBLES


- Como medida para la protección de ecosistemas estratégicos o sensibles se realiza la protección de las laderas intervenidas con la construcción de trinchos que permiten la contención de deslizamiento y prevenir daño sobre los cultivos de los predios colindantes con el proyecto.

	
Fotografía 16. Trincho	Fotografía 17. Trincho

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{Area\ sensible\ delimitada}{Area\ sensible\ identificada} * 100$	$\frac{325}{325} * 100 = 100\%$	325 m^2 área correspondiente al talud

10. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL

- Se obtienen las actas de entorno a través de las cuales se autoriza el uso del espacio para la instalación del campamento de obra temporal en la IE La Libertad sede El Bosque y predios ubicados dentro del área de intervención del proyecto autorizando la ejecución de actividades pertinentes dentro de dichos predios. *Anexo 6. Actas de entorno inicial.*

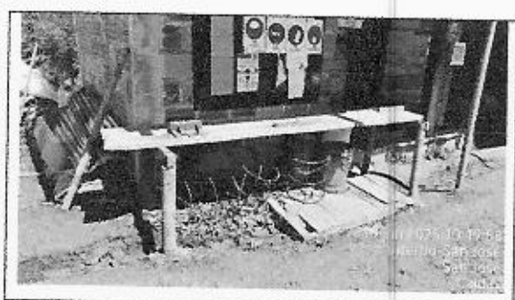	
Fotografía 19. Herrería	Fotografía 20. Acopio

	
Fotografía 21. Acopio	Fotografía 22. Acopio

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{No.\,Actividades\ realizadas}{No.\,Actividades\ requeridas} * 100$	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	Actividades de orden y aseo que incluyen adecuación visible de extintor, camilla, botiquín y orden de puntos de acopio. Actas de entorno inicial

11. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

- Para el desarrollo del presente proyecto se utiliza herramienta menor como concretadora, plantas eléctricas y martillo neumático.
- El día 27 de junio de 2025 ingresa a obra Mini Excavadora marca Kobelco de la cual se anexan los siguientes documentos: *Anexo 7. Tarjeta de propiedad; Anexo 8. Ficha Técnica Mini Excavadora; Anexo 9. Mantenimiento Mini Excavadora; Anexo 10. Seguro todo riesgo Mini Excavadora.*

	
Fotografía 20. Concretadoras	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
$\frac{No.Vehiculos\ Autorizados}{No.Vehiculos\ requeridos} * 100$	$\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	No se ha requerido el uso de vehículos
$\frac{No.Maquinaria\ Autorizados}{No.Maquinaria\ requeridos} * 100$	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	Mini Excavadora Kobelco, concretadora.

CONCLUSIONES:

- Durante el periodo reportado (1 de junio al 30 de junio de 2025), se ha avanzado en la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) para el proyecto "Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la vereda El Bosque en el municipio de San José Caldas".
- Se han llevado a cabo capacitaciones en gestión ambiental para el personal de obra, abarcando temas cruciales como el manejo adecuado de residuos.
- El proyecto cumple con los requerimientos legales en materia ambiental, como el registro ante Corpocaldas como gran generador de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
- Se implementan medidas preventivas en el manejo de materiales de construcción, planificando su adquisición para evitar saturación de espacios y pérdidas por factores ambientales.
- Remplazar la señalización deteriorada del punto ecológico del campamento temporal de obra.
- Para el manejo de aguas residuales domésticas, se cuenta con una batería sanitaria conectada al pozo séptico de la Institución Educativa La Libertad. También se han corregido actividades para reducir el vertimiento de concreto y se ha instalado bordillo para el manejo de escorrentía.

John Sebastián Bavativa – Ing. Ambiental
Consorcio FG San José
MP 17238-322166 CLD

CONSORCIO
FG SAN JOSE

INFORME DE GESTION CONSORCIO FG SAN JOSE No 2



OBJETO: Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la vereda Bosque del municipio de San José de Caldas

JUNIO DEL 2025

Capítulo 4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y todos sus componentes abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo inadecuadas.
El CONSORCIO FG SAN JOSE se enfoca en el proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua de los procesos preventivos para evitar accidentes y enfermedades laborales y de promoción de la salud, para que de la empresa goce de un ambiente sano y productivo, lo cual incluye la política, la organización, la visión y la misión en cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo.
Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Afiliación a la ARL, EPS y fondo de pensión.
- Exámenes de ingreso.
- Exámenes de egreso.
- Inducción SST de ingreso – re inducción (socialización de normas, políticas y reglamento de trabajo).
- Capacitaciones de promoción y prevención.
- Punto de emergencia.
- Entrega de EPP
- Inspecciones.
- Revisión de operacionales
- Reunión COPAST
- Elaboración de procedimientos seguros & ATS
- Calistenia – Pausas activas.
- Reunión Comité de convivencia laboral
- Elaboración de procedimientos seguros & ATS
- Señalización y cerramientos de obra.
- Reporte de ausentismo
- Elaboración ATS

La contratación de mano de obra durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 30 de junio del 2025 por parte del contratista CONSORCIO FG SAN JOSE :

INGRESOS		TOTAL
CONTRATISTA	1 al 30 de junio del 2025	08
PERSONAL CONTRATISTA TOTAL		39
RETIROS		
RETIROS CONTRATISTA	1 al 30 de junio del 2025	2
PERSONAL CONTRATISTA TOTAL		2

Tabla 21. Ingresos y retiros. Fuente: Propia

CONSORCIO
FG SAN JOSE

4.1 Cumplimiento Plan de Trabajo

- **Afiliación a la ARL, EPS y fondo de pensión**

A la fecha todo el personal se encuentra con pagos de Seguridad Social al día. **EPS** (Salud), **ARL** (Aseguradora de Riesgos Laborales), **AFP** (Fondo de Pensiones y Cesantías). Para un total de 29 personas directas para un total de 29 trabajadores.


Anexo 1. ARL, EPS, Fondo de pensiones Contratista –Anexo 2. Afiliaciones de personal Contratista

PAGADO 11/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO FG SAN JOSE		
Documento	N8901925183	Dirección	CL 62 #21 - 81 OF 501
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8885768
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MANIZALES	Departamento	CALDAS
Representante Legal	ESTRADA MORALES SERGIO	Identificación	CC 10538493OR
Total Afiliados	29	ARP	ARL SURA


II. DETALLE DEL APORTANTE




Página 1 de 2

Pagado: 11/06/2025 Empresa N8901925183 CONSORCIO FG SAN JOSE Planilla Nro: 78338672 Periodo Cotización: mayo de 2025 Periodo Servicio: junio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE



II. TOTALES



- **Exámenes de ingreso.**

Los exámenes de ingreso permiten analizar el estado de salud del trabajador en el momento del iniciar con su labor especifica, con el fin de orientar su ubicación frente a los factores de riesgo existentes en el puesto de trabajo. Para este ejercicio se están realizando los exámenes de ingreso con el Dr. Oscar Albero Barreto León, Médico General Especialista En Seguridad Y Salud En El Trabajo durante este periodo se han realizado 08 exámenes de ingreso al personal directo con él, encontrando que todos son aptos para el cargo a desempeñar.

EXÁMENES DE INGRESO CONTRATISTA	
Consulta Médica, Oscar Alberto Barreto León medicina laboral	08

Tabla 22. Exámenes de ingreso Contratista. Fuente: Propia.

CONSOLIDADO EXÁMENES DE INGRESO CONTRATISTA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN	
Consulta Médica, Oscar Alberto Barreto León medicina laboral	08

Tabla 23. Consolidados exámenes de ingreso contratista durante el tiempo de ejecución del proyecto. Fuente propia

Tabla 24 Consolidados exámenes de ingreso interventoría durante el tiempo de ejecución del proyecto. Fuente propia

Anexo 3. Exámenes laborales de ingreso Contratista.

- **Examen de egreso.**

Los exámenes de egreso tendrán énfasis en los factores de riesgo a los cuales estuvo expuesto y en las lesiones que pudo haber sufrido en caso de accidente.

Para la realización del examen de egreso se le entregará una carta al trabajador donde se le informa el derecho de realizarse dicho examen sobre los 5 días hábiles después del su retiro. Todo lo anterior según el código sustantivo de trabajo Art 57 numeral 7.

Durante este mes se presentaron 2 retiros por parte del contratista. De igual manera para este período se logra generar paz y salvo pendientes de los trabajadores retirados.

Anexo 4. Examen de egreso Contratista

- **Inducción SST de ingreso – re inducción**

De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 obliga a las empresas a implementar dentro de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST), la realización de inducción y reinducción a los trabajadores en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, se realizaron durante el periodo 22 inducciones en SST con sus respectivas evaluaciones para verificar que la información trasmitida haya quedado clara.

- Reglamento de higiene y seguridad
- Socialización Reglamento interno de trabajo
- Política en Seguridad y salud en trabajo
- Política en alcohol, drogas y tabaquismo
- Política del uso de elementos de protección personal
- Notificación de factores de riesgo en los procesos de la obra, su control y prevención.
- Obligaciones del empleador
- Obligaciones del trabajador
- Procedimiento en caso de incidente accidente de trabajo
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité de convivencia laboral
- Socialización del plan de emergencia
- Trabajos de Alto riesgo
- Sistema general de seguridad social (EPS, AFP, AR, CAJA DE COMPENSACION)
- Orden y aseo en los puestos de trabajo

Anexo 5. Soportes de inducción Contratista.





- **Capacitación de promoción y prevención**


Con el propósito de dar cumplimiento al plan de capacitación establecido se realizaron las siguientes capacitaciones y campañas de promoción a la salud, dirigidas a todos los colaboradores tanto desde la interventoría, como en el contratista:

FECHA	TEMA	ASISTENTES
3/06/2025	Capacitación pensar antes de actuar.	35
4/06/2025	Exceso de confianza	32
7/06/2025	Importancia del orden y aseo	30
09/06/2025	Importancia de implementar el SG-SST.	15
13/06/2025	Riesgos por las condiciones ambientales	15
13/06/2025	Inducción SG-SST personal nuevo.	8
16/05/2025	Incidentes laborales	15
19/06/2025	Riesgos físicos-radiaciones ionizantes	15
29/05/2025	Trabaje seguro peligros en la vía	15

Tabla 25. Capacitaciones Contratista –

Cabe resaltar que desde la interventoría se genera acompañamiento en el desarrollo de dichas actividades, para el cumplimiento de las mismas.

Anexo 6. Capacitaciones - Charlas

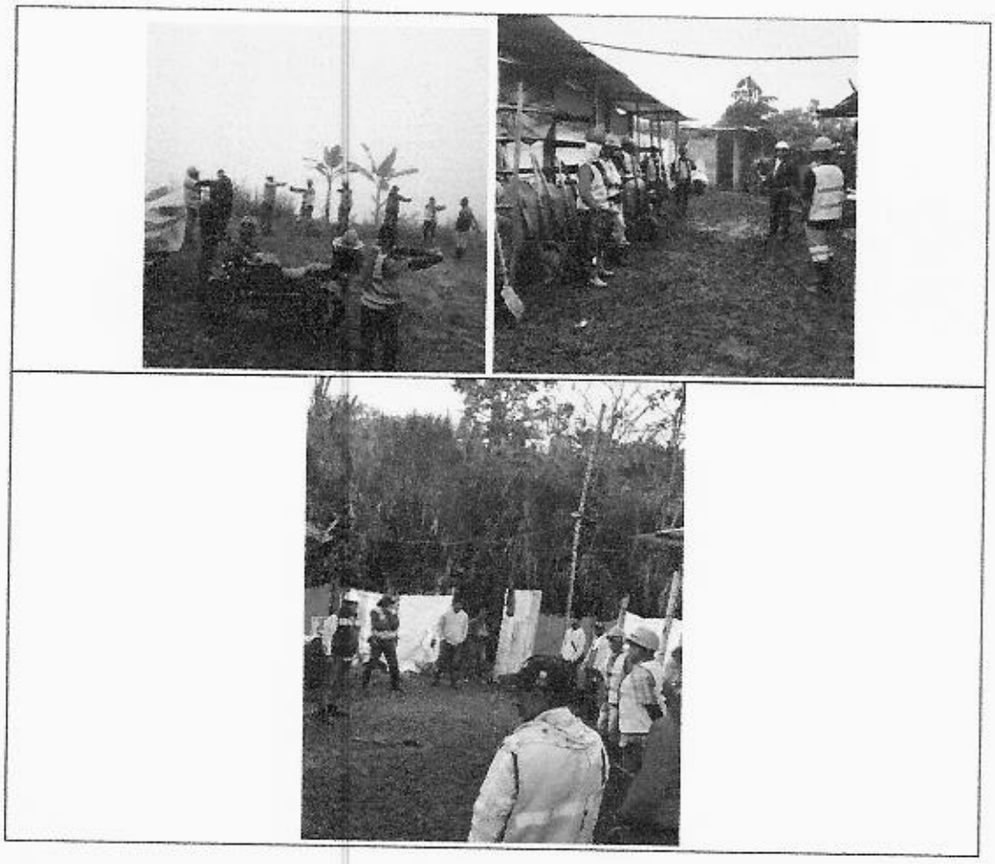

- **Plan de Emergencia**

Con el objetivo de brindar atención inmediata ante un evento que se pudiera presentar ante una emergencia, por tanto, para el periodo analizado se realizó por parte del contratista la conformación de su brigada de emergencia teniendo en cuenta que para este mes se da inicio las excavaciones en espacios confinados y es fundamental tener en cuenta este proceso.

Se evidencia que a la fecha cuentan con 1 botiquín, extintor y camilla en el almacén se asegura que estos elementos se encuentre ubicado los elementos de primeros auxilios en un lugar visible y de fácil acceso ante una emergencia.

Se cuenta con:

- Tabla rígida,
- Un extintor de 10 lb
- Botiquín.

Adicional se realiza nuevamente seguimiento - inspección al botiquín de la oficina de interventoría.




- **Entrega de Elementos de Protección Personal**

Con el objetivo de prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en los trabajadores del CONSORCIO FG CALDAS teniendo en cuenta la matriz de EPP, el cargo y sus actividades, se ha realizado las respectivas entregas de elementos de protección personal a los trabajadores nuevos que han ingresado a la obra en este periodo, como al antiguo en reposición.

Desde la interventoría se ha supervisado el adecuado uso y mantenimiento de estos elementos sobre los colaboradores durante sus labores. Cabe resaltar que se continúa haciendo sensibilización al personal en el uso adecuado de los EPP, como en la entrega de elementos necesarios para desarrollar la labor sin ningún riesgo.

Anexo 7. Formato de Entrega de EPP Contratista – Interventoría.

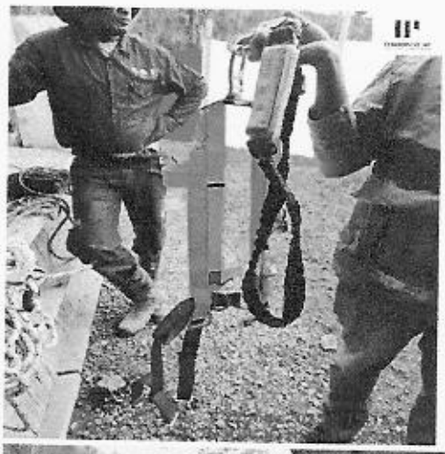


- **Inspecciones de seguridad.**

Durante este periodo se han realizaron las siguientes inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto al contratista como interventoría, con el fin de identificar y controlar las condiciones y actos inseguros que puedan generar daños o lesiones a los trabajadores o equipos de la empresa.

- Inspección orden y aseo-mezcladora-rotomartillo-EPP-EPCC-herramientas.
- Recorridos en obra verificando condiciones de seguridad
- Señalización
- Inspección de seguridad.
- Preoperacionales

Anexo 8. Inspecciones




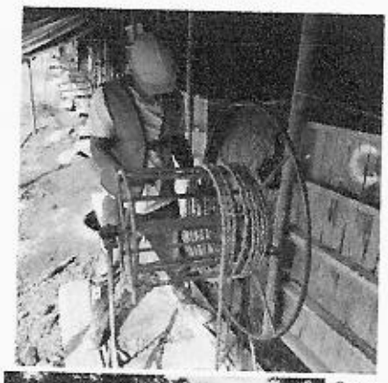







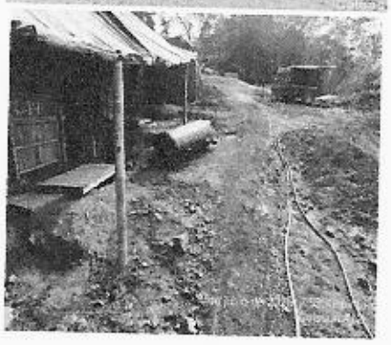





- **COPASST**

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituye un medio importante para promocionar la Seguridad y Salud en todos los niveles, busca acuerdos con las directivas y responsables del sistema en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. Resolución 2013 de 1986.
Dando cumplimiento a la normatividad vigente desde el contratista se convoca al personal para realizar nombramiento del COPPASST, donde tratan temas de interés para el consorcio. Desde la interventoría se participa en la convocatoria y elección comité.

COPASST

Anexo 9. COPASST Contratista – Interventoría.

- **Calistenia – Pausas Activas**

En el periodo analizado se realizaron pausas activas por parte de interventoría, mediante breves descansos durante la jornada laboral, estiramiento y/o actividades lúdicas, con el objeto de recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. Cabe resaltar que se continúa resaltando por parte de interventoría al área SST del contratista en el desarrollo de calistenia para su equipo de trabajo.



Anexo 10. Asistencia Pausas activas - Interventoría.

- **Comité de convivencia laboral.**

De acuerdo con el numeral 1° del artículo 9° de la ley 1010 del 23 de enero de 2006 "Ley de acoso laboral" y el artículo 14 de la resolución número 2646 del 17 de julio de 2008. Durante este mes se convoca para su nombramiento.

- **Elaboración de procedimientos seguros & Análisis de riesgo para el oficio (ARO)**

Durante el periodo del 1 al 30 de junio del 2025 se realizaron permisos de trabajo desde el contratista, autorizando las actividades a ejecutar en el presente proyecto. Se realizan ARO de las actividades de obra semanalmente por parte del CONSORCIO FG SAN JOSE, en este caso para este mes se establecen procedimientos seguros para trabajo en alturas y espacios confinados además de manejo de mezcladora, vibrador, amarre de hierro y asfalto. Desde la interventoría se realiza verificación de que las actividades que se estén desarrollando y se ejecuten de manera adecuada y segura.

Anexo 11. Procedimientos de actividades de obra y su socialización – ARO

- **Señalización y cerramiento de obra.**

Con el fin de reducir el riesgo de accidentes laborales, permitir una pronta y adecuada reacción de conductores, hacer más ágil el tránsito de los usuarios y garantizar la seguridad

de los trabajadores, en la obra se mantiene una constante inspección y llamado al cumplimiento de señalización y demarcación, colocando, reubicando y reemplazando según la necesidad. A la fecha se ha realizado seguimiento por parte de la interventoría en el cumplimiento de este aspecto, realizando las recomendaciones pertinentes de manera verbal y/o vía WhatsApp según el caso. Se cuenta con señalización preventiva con cintas de precaución en actividades de excavación, demarcación y debida señalización para los cerramientos de muros y maquinaria pesada, rocería donde se da uso a los conos reflectivos.









- **Reporte de ausentismo.**

El ausentismo es catalogado como toda ausencia o abandono del puesto de trabajo por parte de un empleado, en pocas palabras es cuando el trabajador deja de presentarse a sus labores cotidianas suministrando algún pretexto o excusa la cual puede no tener validez alguna.

En este orden de ideas se realiza seguimiento al contratista en sus indicadores semanales, adicional del acompañamiento en campo, donde se observa que el contratista durante el periodo del 1 al 30 de junio presentó 1 ausentismos con motivo por 1 accidente de trabajo que genero 3 días de incapacidad.

Por parte de interventoría en este mes no se presenta ausentismo del personal.

AT – Accidente de trabajo

EG – Enfermedad general

IJ - Injustificada

PP – Permiso personal

C - Compensatorio

OC – Otra causa

CONTRATISTA							
PERIODO	AT	EG	IJ	PP	C	OC	TOTALES
junio 1 al 30 de 2025	5	0	0	1	0	0	5
INTERVENTORÍA							
PERIODO	AT	EG	IJ	PP	C	OC	TOTALES
junio 1 al 30 de 2025	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 26. Reporte de ausentismo Contratista – Interventoría

Anexo 12. Matriz de ausentismo.

- **Accidente de trabajo.**

El mes pasado se presentó un accidente de trabajo por parte del señor Fabian Murillo Vivas con el cargo de ayudante de obra por parte del CONSORCIO SAN JOSE, el señor se encontraba excavando con la barra y choco su dedo con una tapa metálica sufriendo una cortada en el dedo índice derecho a la altura de la segunda falange

Anexo 13. FURAT

CONSORCIO
FG SAN JOSE

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | SURA

EPS a la que está afiliado
MEDIMÁ EPS S.A.

Código EPS
857

ARL a la que está afiliado
ARL SURA

Código ARL
46

AFP a la que está afiliado PORVENIR

Código AFP 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativo de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCUELAS, PISCINAS Y OBRAS, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

Nombre o razón social
CONSORCIO FG SAN JOSE

Tipo de identificación (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) MI ( ) PA Número 901025183

Dirección
CL 62 # 23 - 61 OFI 501

Teléfono
3104088582

Fax

Correo electrónico
CHAMICALE2K@GMAIL.COM

Departamento
CALDAS

Municipio
MANIZALES

Zona ( ) U (•) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE

Código de la actividad económica del centro de trabajo 4290801

Dirección
CL 62 # 23 - 61 OFI 501

Teléfono
3104088582

Fax
8885788

Departamento
CALDAS

Municipio
MANIZALES

Zona (•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendiz ( ) Independiente Código

Primer apellido
RINCON

Segundo apellido
MARULES

Nombres
JULIAN STIVEN

Tipo de identificación ( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) MI ( ) PA

Número
1058912987

Fecha de nacimiento
24/12/2003

Sexo (•) M ( ) F

Dirección
CR 1 A # 18 A - 74

Teléfono
3234441798

Fax
8885788

Departamento
CALDAS

Municipio
SAN JOSE

Zona (•) U ( ) R

Cargo
OBRERO DE CONSTRUCCION

Ocupación habitual
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES

Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
0 0

Fecha de ingreso a la empresa
24/08/2025

Salario u honorarios (mensual)
1423500

Jornada de trabajo habitual (•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixta ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente
24/09/2025 12:35:00

Estaba dentro de la empresa?
Si

Día de la semana en el que ocurrió el accidente
Martes

Jornada en que sucede (•) Normal ( ) Extra

¿Estaba realizando su labor habitual? (•) Si ( ) No

¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador? ( ) Si (•) No

Departamento del accidente
CALDAS

Municipio del accidente
SAN JOSE

Zona donde ocurrió el accidente ( ) U (•) R

Total tiempo laborado previo al accidente
5 5

Tipo de accidente ( ) Violencia ( ) Trámite ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO
FG SAN JOSE

Lugar donde ocurrió el accidente — (•) Dentro de la empresa — ( ) Fuera de la empresa

Indique cual sitio
- ( ) Almacenes o depósitos
- (•) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- ( ) Comedores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
- ( ) Oficinas
- ( ) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado
- (•) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- ( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- ( ) Torax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- ( ) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- ( ) Pies
- ( ) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión
- ( ) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o enucleación
- (•) Herida
- ( ) Trauma superficial
- ( ) Golpe (contusión o aplastamiento)
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, de clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)
- ( ) Máquinas y/o equipos
- (•) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- ( ) Herramientas, implementos o utensilios
- ( ) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- ( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, fluidos, gases, en el exterior, interior o subterráneos)
- ( ) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- ( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente
- ( ) Caída de personas
- ( ) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamiento
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o explosiones
- (•) Golpes por o contra objetos
- ( ) Otro

Descripción del accidente

EL SEÑOR SE ENCONTRABA AYUDANDO A BAJAR UN HIERRO DEL CAMION Y UN COMPAÑERO DE TRABAJO MANDO UNA BARRA HACIA ATRAS SIN MIRAR QUE EL ESTABA SUBIENDO AL PLANCHON Y LE DIO UN GOLPE EN LA CEJA

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? (•) Si ( ) No

Apellidos y nombres: JHON SEBASTIAN TORRES PANAGUA — Documento de identidad: (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No. 1068913380
Cargo: AYUDANTE

Apellidos y nombres: — Documento de identidad: ( ) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No.
Cargo:

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres: RAMIREZ CESAR — Documento de identidad: (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No. 3094539
Cargo: AUXILIAR SST

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL sura
24-06-2025 14:17:23

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente
Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 24-06-2025 14:17:28

ARL SURA S.A.


Reporte de presunto accidente de trabajo Página 2 de 2

CONSORCIO
FG SAN JOSE

FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO PARA EMPRESAS AFILIADAS A ARL-SURA RESOLUCION 1401 DE 2007

ARL SURA

Versión 2 - 20/12/2013

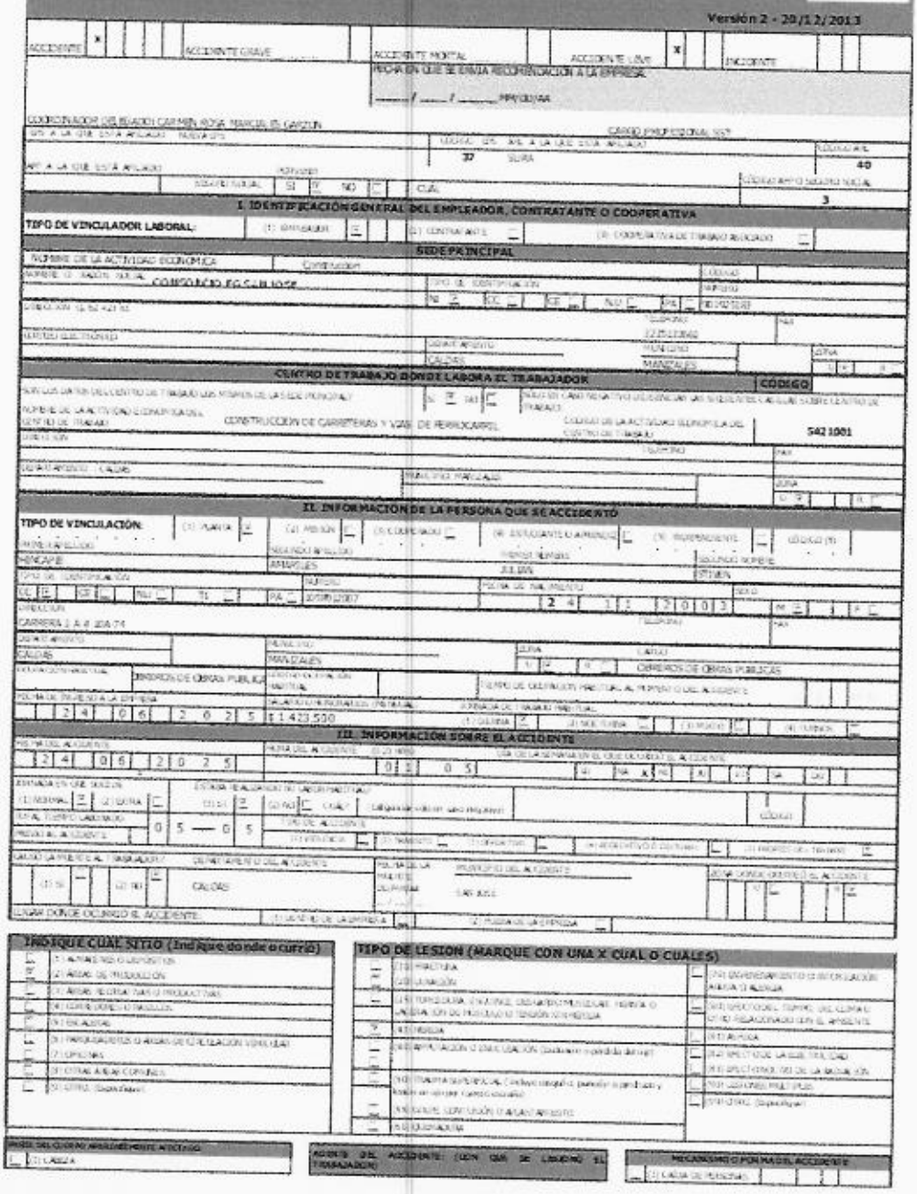

ACCIDENTE: X | ACCIDENTE GRAVE | ACCIDENTE MORTAL | ACCIDENTE LEVE: X | INCIDENTE

FECHA EN QUE SE ENVIA RECOMENDACION A LA EMPRESA: ____/____/____ (AAAA/MM/DD)

COORDINADOR DEL REGISTRO: CARMEN ROSA MARCIAL EL GANZUN — CARGO EMPLEADO: SST

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO: NUEVA EPS — CODIGO EPS A LA QUE ESTA AFILIADO: 37 SURA — ESTRATO: 40

ARL A LA QUE ESTA AFILIADO: — ASEGURA: SI X NO — CUAL: — CENTRO DE TRABAJO SEGUN ARL: 3

I. IDENTIFICACION GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULADOR LABORAL: (1) EMPLEADOR X | (2) CONTRATANTE | (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccion

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO FG SAN JOSE — TIPO DE IDENTIFICACION: NIT X — CIUDAD:

DIRECCION: CL 52 #21-52 — DEPTO:

TELEFONO DE TRABAJO: — CORREO ELECTRONICO: — FAX:

ZONA: URBANA — MUNICIPIO: — OTRA:

CALDAS — MANIZALES

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR — CODIGO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL — CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: 5421001

DIRECCION: — CIUDAD: — FAX:

CALDAS — MANIZALES — OTRA:

II. INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

TIPO DE VINCULACION: (1) PLANTA | (2) MISION | (3) COOPERADO | (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ | (5) INDEPENDIENTE | (6) OTRO (¿?)

PRIMER APELLIDO: ARANGUES — SEGUNDO APELLIDO: — PRIMER NOMBRE: JULIAN — SEGUNDO NOMBRE: — ESTADO:

TIPO DE IDENTIFICACION: CC — NUMERO: 1053812007 — FECHA DE NACIMIENTO: 24 / 12 / 2010 — SEXO: M

DIRECCION: CARRERA 1 A # 20A 74 — CIUDAD: — FAX:

CALDAS — MANIZALES — ZONA: URBANA — CARGO: OBREROS DE OBRAS PUBLICAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: OBREROS DE OBRA PUBLICA — TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO — CARGO DE OCUPACION HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA: 24 / 06 / 2025 — SALARIO MENSUAL: $1.423.500 — JORNADA DE TRABAJO HABITUAL: (1) DIURNA X | (2) NOCTURNA | (3) MIXTO | (4) OTROS

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE: 24 / 06 / 2025 — HORA DEL ACCIDENTE: 05:00 — HORA DE LA NOTIFICACION EN EL QUE OCURRIO EL ACCIDENTE: 05 — AM X — PM — NO APLICA

ESTADO EN EL QUE SUCEDIO: (1) NORMAL X | (2) OTRA — ESTADO EN EL QUE SUCEDIO EL ACCIDENTE: (1) NORMAL | (2) OTRA | (3) NO X | (4) CUAL: — CODIGO:

TIEMPO LABORADO: 05 — 05 — DIA DE ACCIDENTE: — TIPO DE ACCIDENTE: (1) TRABAJO | (2) TRAYECTO | (3) ACTIVIDAD DE DISFRUTE | (4) PROPIO DE TRABAJO

CAUSO LA MUERTE AL TRABAJADOR? (1) SI — (2) NO — DEPARTAMENTO DONDE ACCIDENTE: CALDAS — MUNICIPIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE: — ZONA DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE:

LUGAR DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA | (2) FUERA DE LA EMPRESA

INDIQUE CUAL SITIO (Indique donde ocurrió)

(1) ALMACENES O DEPOSITOS
(2) AREAS DE PRODUCCION
(3) AREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS
(4) CORREDORES O PASILLOS
(5) ESCALERAS
(6) PARQUEADEROS O AREAS DE CIRCULACION VEHICULAR
(7) OFICINAS
(8) OTRAS AREAS CERRADAS
(9) OTROS (Cuales?)

TIPO DE LESION (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES)

(1) FRACTURA
(2) LUXACION
(3) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRAMIENTO MUSCULAR, HERNIA O LACERACION DE MUSCULO O TENSION MUSCULAR
(4) HERIDA
(5) AMPUTACION O DESCUALIFICACION (Cualquier miembro del cuerpo)
(6) TRAUMA SUPERFICIAL (Golpes, rasguños, quemaduras, picaduras y torceduras de carácter superficial)
(7) CONMOCION O TRAUMA INTERNO
(8) ENVENENAMIENTO
(9) INFECCIONES
(10) APLASTAMIENTO DE DEDOS O MANOS
(11) EFECTOS DEL TIEMPO, DEL CLIMA O DEL AMBIENTE EN EL TRABAJO
(12) ASFIXIA
(13) LESIONES MULTIPLES
(14) OTRAS (Cuales?)

PARTE DEL CUERPO MAS GRAVEMENTE AFECTADO: (1) CABEZA

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUE SE LESIONO EL TRABAJADOR)

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE: (1) CAIDA DE PERSONAS

CONSORCIO
FG SAN JOSE

1	1 GOLPEADO
2	2 CAIDO
3	3 ATRAPADO (Entre objetos, Debajo de objetos, Entre objetos en movimiento)
4	4 GOLPEADO
5	5 GOLPEADO
6	6 SOBREESFUERZO
7	7 EXPOSICION A TEMPERATURAS EXTREMAS
8	8 CONTACTO
9	9 EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS
10	10 CONTACTO ELECTRICO
11	11 ACCIDENTE DE TRANSITO
12	12 OTRO (Especifique)

1	1 MAQUINARIA Y EQUIPOS
2	2 MEDIOS DE TRANSPORTE
3	3 HERRAMIENTAS
4	4 MATERIAL O SUSTANCIA PELIGROSA (INCLUYENDO RESIDUOS)
5	5 PARTE DEL CUERPO HUMANO
6	6 OTRAS FORMAS
7	7 AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de trabajo y áreas donde se realiza el trabajo, Incluye condiciones ambientales)
8	8 SIN INFORMACION SUFICIENTE
9	9 NO APLICA (Para enfermedad común)
10	10 AGENTES NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

1	1 CAIDA DE PERSONAS
2	2 CAIDA DE OBJETOS
3	3 PISADAS, GOLPES O CHOQUES
4	4 ATRAPAMIENTO
5	5 SOBREESFUERZOS, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
6	6 EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURAS EXTREMAS
7	7 EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA LUZ (RADIACIÓN)
8	8 EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS (INCLUYENDO RESPIRACIÓN)
9	9 CONTACTO ELECTRICO
10	10 OTRO (Especifique)

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Según versión del trabajador el día martes, 24/06/2025 en el frente de trabajo san jose de caldas, a las 01:05 p.m el trabajador se encontraba subiendo al plancho a descargar un hierro del camión, de repente otro compañero sin percatarse movió una barra hacia atras,golpeandolo la ceja y produciendo herida del parpado y la region periocular.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	
CARGO	
FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CC ☐ CE ☐ NIT ☐ TI ☐ PA ☐ No.: 1058913390
CARGO	
FIRMA	

PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	
CARGO	
PROFESIONAL SST	
FIRMA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC ☐ CE ☐ NIT ☐ TI ☐ PA ☐ No.
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME AL EMPLEADOR	2 6 0 6 2 0 2 5

VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ÁRBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)



VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el arbol colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS INMEDIATAS		CAUSAS BASICAS	
CONDICIÓN SUBESTANDAR	ACTOS SUBESTANDAR	FACTORES DE TRABAJO	FACTORES PERSONALES
Colocación inadecuado contra movimientos inesperados	Soltar herramientas sin dar aviso o advertir	Planificación insuficiente del trabajo	Ningun factor personal

IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE CAUSAS	TIPO DE CONTROL (Señalar con una X en donde aplica)			FECHA EJECUCION DD/MM/AA	FECHA VERIFICACION DD/MM/AA	EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA		AREA O PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICACION DE LA EMPRESA
	FUENTE	MEDIO	PERSONA			SI	NO	
Realizar una inducción de manera antes de iniciar cualquier tarea			x	4/07/2025				SST
Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos asociados con la caidas y el uso correcto de herramientas y equipos			x	4/07/2025				SST
Colocar señalizacion			x	4/07/2025				

Introducción de procedimientos de trabajo seguro, herramientas, cuidado de herramientas					4/07/2025			

II. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION	FECHA DD/MM/AA	HORA /	FIRMA DOC IDENTIF
Luis Enrique Alonso	RTE. COBRO	Caldas	San Jose				
Jorvan Castañeda	JEFE INMEDIATO	Caldas	San Jose				
Carmen Rosa Marciales Garzon	COORDINADOR SG	Caldas	San Jose				
	PERSONAL ENCARGADO DEL DISEÑO DE NORMAS, PROCESOS Y/O MANTENIMIENTO						
	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA USUARIA O CLIENTE						

REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Estrada Morales — **FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:** 1037...

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Carmen Rosa Marciales Garzon — **LICENCIA NO** 7428 — **EXPEDIDA POR:** SS — **FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:** 51...

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO ES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA. LA ARL-SURA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DATOS QUE ALLÍ APARECEN.

FECHA DE ENVÍO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES A LA DIRECCION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
(ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR LA ARL) __MM__/ DD___ / AA___

Carmen Rosa Marciales G.
51'843.051 Bta

Responsable: Carmen Rosa Marciales Garzón
Profesional SG-SST- Lic.74428 renovación02/2020.

INFORME GESTIÓN SOCIAL No 2

PERIODO COMPRENDIO:

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No 21042025-0831

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN A VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO FG SAN JOSE

PROFESIONAL SOCIAL
BEATRIZ RIOS OSORIO

MANIZALES
2025

INTRODUCCIÓN

Se suscribe el contrato de obra **No 21042025-0831;** cuyo objeto "*construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la vereda el Bosque en el municipio de San José caldas,* entre la gobernación de caldas y el consorcio FG San José.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se lleva a cabo la implementación del Plan *de Gestión Social en* Obra compuesto por cinco programas: atención a la comunidad; Información y divulgación, manejo de infraestructura de predio y de servicios públicos y contratación mano de obra, el cual tiene como objetivo: Establecer canales de comunicación que permitan transmitir la información clara, oportuna y confiable, igualmente brindar atención a las comunidades del Área de Influencia Directa en el frente de trabajo que componen el proyecto.

El documento en curso contiene la descripción de las actividades desarrolladas correspondientes a los diferentes programas del plan de Gestión Social del proyecto en ejecución; dando cumplimiento a los requerimientos establecidos para el contrato de obra número No 21042025-0831.


De acuerdo a la fecha estipulada para el presente informe; del ***01 al 30 de junio del año 2025,*** se presentan las evidencias de las actividades implementadas por la profesional social para cada uno de los programas estipulados.

1. GENARALIDADES DEL PROYECTO

Contrato No.	21042025-0831
Objeto del Contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN A VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS.
Localización	Municipio de San José, vía San José - Viterbo Vereda el Bosque.
Alcance	Punto Crítico Km K8+500 del sector El Crucero - Ásia
Contratista	Consorcio FG San José
Plazo estimado total	8 meses
Fecha de Iniciación Contrato	30 de abril 2025
Fecha de terminación Contrato	29 de diciembre 2025

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del Contrato No 21042025-0831 se llevará a cabo en el departamento de Caldas, Municipio de San José vereda El Bosque, específicamente, vía San José - Viterbo Km K8+500 del sector El Crucero - Ási

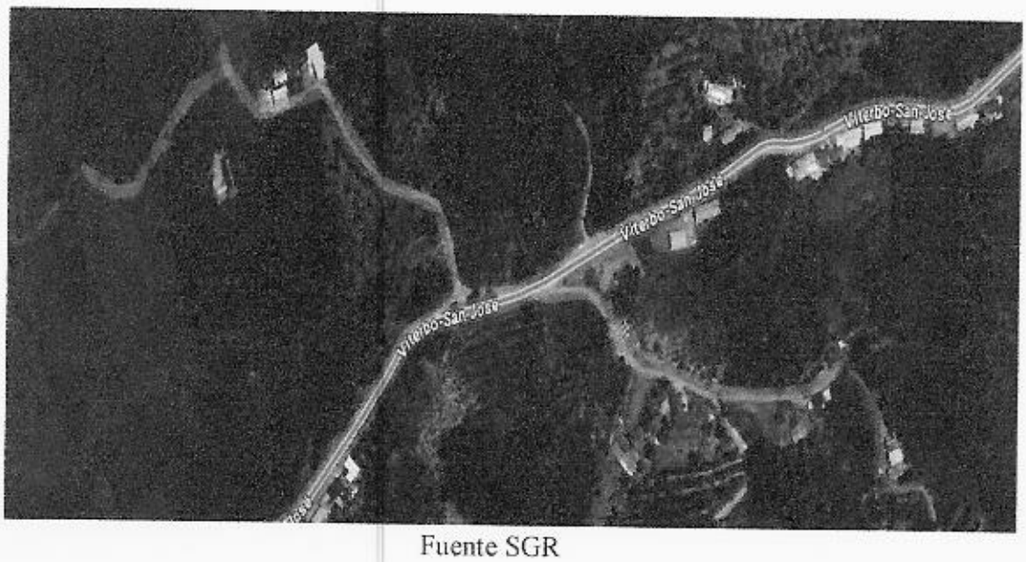

Fuente SGR

A continuación, se realiza la descripción de las actividades implementadas correspondientes a cada una de los programas del plan de gestión social estipulado para la ejecución del proyecto de acuerdo al periodo reportado del 01 al 30 de junio del 2025.

3. PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

3.1 Punto Atención Comunidad.

Se establece el punto de atención a la comunidad en la caseta comunal contiguo a I.E La Libertad Sede El Bosque, Vereda el Bosque.
Este espacio se establece con el propósito de tramitar requerimientos y/o solicitud de información.
Se establece un día de la tercera semana de cada mes para brindar atención por parte de la profesional social de manera presencial, cabe resaltar que la profesional social igualmente realiza recorrido por la zona en pro de atender solicitudes y/o brindar información a la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

De acuerdo al cronograma de actividades presentado, se brindó atención presencial por parte de la profesional social en campo el día miércoles 18 de junio, durante la visita se realiza recorrido, se atiende la comunidad del área de influencia directa del proyecto y se realiza reunión con los representantes de la veeduría ciudadana.

3.2 Recepción PQRS

Una vez definido el punto de atención a la comunidad para el proyecto en ejecución, se lleva a cabo la instalación del buzón de PQRS para recepción y tramite de requerimientos tales como peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, lo anterior de manera fisica, cabe resaltar que se cuenta con otro medio de recepción de requerimientos tales como línea de atención- y plataforma WhatsApp 3122759821 y correo electrónico: consorciofgobra@gmail.com.

Para la fecha de corte del presente informe se cuenta con 1 PQRS tramitadas por la comunidad del área de influencia directa del proyecto la cual se realiza el proceso y cierre correspondiente.

A continuación, información del requerimiento en trámite.

FECHA	PETICIONARIO	TIPO	TRAMITE
26/05/2025 29/06/2025	Sol maría Bermúdez Piedrahita **Dirección:** Finca Samaria Vereda El Bosque, Municipio San José Caldas. **Contacto**: 3234723199	SOLICITUD	Se establece contacto con el propietario/encargado del predio Finca Samaria. Se lleva a cabo recorrido inicial por sector a intervenir Finca Samaria personal contratista y propietaria. Se firmar documento acta de otorgamiento de consentimiento y autorización de ocupación.

De acuerdo a lo anterior se anexa el soporte del acta de otorgamiento de consentimiento y autorización entre el contratista y propietaria finca samaria. ***Anexo 1 acta de otorgamiento de consentimiento y autorización de ocupación***.

Durante el periodo reportado se lleva a cabo la revisión y/o verificación del buzón de solicitudes con acompañamiento de la presidente de la veeduría ciudadana, no se encontraron requerimientos diligenciados durante la apertura del mismo.

Registro fotográfico





4. PROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades correspondientes al ítem en mención, una vez se lleven a cabo actividades de dicho se evidenciarán en el informe correspondiente.

5. PROGRAMA MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIO Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Durante el periodo reportado del presente informe el equipo de profesionales del contratista área técnica y social realizaron el levantamiento de actas de vecindad y entorno de la zona de acuerdo a lo estipulado.

A continuación, en las siguientes tablas se relaciona la información de los predios visitados para el levantamiento de acta de vecindad y entorno:

Información actas de vecindad

No	NOMBRE PROPIETARIO/ ENCARGADO	TELEFONO	NOMBRE DEL PREDIO	OBSERVACIONES
1	María Elvia zapata	3122915922	Casa No 2 placas huellas.	Entregada a la Interventoría
2	Christian Camilo Chiquito Ardila	3118561034	Casa No 1 placas huellas. (casa prefabricada)	Entregada a la Interventoría
3	Leidy Olivia Hernández	3146167703	Casa Holanda (sobre la vía)	Entregada a la Interventoria
4	Yenny Mercado	3113269778	Casa 15-27 (sobre la vía)	Entregada a la Interventoría
5	Luz Elena Pavas	3107415620	Casa azul (sobre la vía)	Entregada a la Interventoría
6	Yesica Alejandra Berrio	3105229720	Casa verde (sobre la vía)	Entregada a la Interventoría
7	Rubén Darío Montoya	3123813164	Casa la Holanda (sobre la vía)	Entregada a la Interventoria
8	Luz Mery Zuluaga	3136505214	Casa obra gris (sobre la vía)	Entregada a la Interventoría
9	Julián Ramirez		Casa Naranja (sobre la vía)	Entregada a la Interventoría
10	Yury Paola Cifuentes	3043364069	Casa Roja (sobre la vía)	Entregada a la Interventoría
11	Luz Omaira Ardila	3207453601	Casa Las Palmas	Entregada a la Interventoria

Información acta de entorno- vía

No	NOMBRE PROPIETARIO/ ENCARGADO	NOMBRE DEL PREDIO	OBSERVACIONES
12	Departamento de Caldas	Vía tramo Vereda El Bosque	Entregada a la Interventoría
13	Municipio de san José	Placa Huellas	Entregada a la Interventoría
14	Ricardo Antonio Patiño Aguirre Rector	Caseta Comunal	Entregada a la Interventoria
15	Carlos Hernández	Lote contiguo IE Vereda el Bosque	Entregada a la Interventoría

Durante el recorrido realizado se diligenciaron los Formatos Acta de vecindad y acta de entorno estipulados por la entidad, en este se consignó las acondiciones de cada uno de los predios, se realizó la descripción de acuerdo al formato establecido y se tomó el registro fotográfico correspondiente.

una vez diligenciados los formatos y levantado el registro fotográfico de las actas de vecindad mencionadas se envían a la interventoría junto con el registro fotográfico.

Anexo 2 Actas de vecindad predios vereda el Bosque

Anexo 3 Actas entorno Vereda el Bosque

6. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL:

El día 12 de junio del 2025 se recibe vía correo electrónico respuesta por parte de la personería municipal de San José, documento correspondiente a:

INSCRIPCIÓN VEEDURIA CIUDADANA ***Anexo 4 Evidencias Inscripción veeduría ciudadana***

Resolución de No. 36 - 06 de junio de 2025. ***Anexo 5 Resolución constitución veeduria.***

El día 18 de junio del 2025 se lleva acabó primer reunión y recorrido de obra con los integrantes de la veeduría ciudadana, representantes interventoría y contratista. ***Anexo 6 Reunión y recorrido No 1 veeduría ciudadana.***

Registro Fotográfico









7. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

El ingreso de personal para la vinculación laboral se realiza de acuerdo a la necesidad y la dinámica de la obra, el personal vinculado para el periodo reportado corresponde a 30 personas, se lleva a cabo la vinculación laboral correspondiente a mano de obra no calificada de 25 personas y 5 personas de mano de obra calificada.

De acuerdo a lo anterior, se vincularon 13 personas del área de influencia directa del proyecto municipio de San José - vereda el Bosque, de los cuales 11 pertenecen a la mano de obra no calificada y 2 para la mano de obra calificada.

A continuación, la siguiente tabla da cuenta de la información relacionada:

PERSONAL	CANTIDAD	%
N. TOTAL DE PERSONAL VINCULADO	30	100%
MANO DE OBRA DIRECTA	13	43%
MANO DE OBRA INDIRECTA	17	57%
MANO DE OBRA CALIFICADA	5	17%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	25	83%
POBLACIÓN VULNERABLE	1	3%

Se continua con la recepción de las hojas de vida a través de la alcaldía municipal, punto de atención y correo electrónico.

8. CONCLUCIONES.

- la implementación de las actividades para la obra en ejecución correspondientes al plan de gestión social, permitirán mitigar los impactos generados a nivel social durante la etapa de inicio en la cual se encuentra el desarrollo del proyecto.
- La atención hacia la comunidad por parte del equipo de trabajo tanto de la firma contratista como de la interventoría facilitara el manejo de conflictos y negativas, todo lo anterior con el propósito de reducir la ansiedad, las falsas expectativas y la especulación frente a las actividades realizadas; lo anterior ha permitido mantener a la comunidad enterada desde la entrega de información clara, oportuna y confiable acerca del proyecto
- la ejecución de las actividades correspondientes al plan de gestión social en el área de influencia del proyecto, ha permitido el acercamiento directo con la población logrando así mayor adaptación de la comunidad frente al desarrollo del proceso constructivo y con el equipo de trabajo.
- En pro de fomentar la participación ciudadana y la apropiación de los eventos a desarrollar, se crea la veeduría ciudadana para el proyecto en ejecución, los integrantes de la veeduría contaran con espacios de comunicación asertiva, oportuna, precisa y veraz, durante el proceso constructivo del proyecto, con lo anterior evitando malos entendidos, comentarios falsos, información errónea frente a las actividades desarrolladas.
- El equipo interdisciplinario del Consorcio FG San José atenderá en todos los momentos del proceso aquellos aspectos que afecten de forma directa e indirecta a la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto.
- La profesional social llevara a cabo el reporte de las actividades realizadas diferentes a los programas ya expuestos y las evidencias correspondientes a las gestiones realizada.

Beatriz Ríos Osorio
Trabajadora social
Consorcio FG San José

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: VEREDA EL BOSQUE - Tel 3206326670 - Cel no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 4.548.807	BÁSICO: 32.240.000	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

CARLOS MARIO ACEVEDO MARTINEZ

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		44,800
SALARIO ORDINARIO		1,120,000	DESCUENTO AFP		44,800
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,220,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		89,600

TOTAL A PAGAR CARLOS MARIO: $1,130,400

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			CARLOS ACEVEDO C.C. No 4548807

	CONSORCIO FG SAN JOSE	CÓDIGO: 10011
	Nit. 901925183-6 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	NO.INTERNO 1001

DIRECCIÓN:	CALLE 10 No. 5-50 SALAMINA - Tel. 3229489364 - Cel. no tiene - Manizales				
CÉDULA	121 939 830	BÁSICO	$2.000.000	CUENTA	91204181662
EPS:	NUEVA EPS			AFP:	PROTECCION
				CENTRO:	N4

LIQUIDACION NOMINA

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ

Desde 01/06/2025 - Hasta 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		60,000
SALARIO ORDINARIO		1.500,000	DESCUENTO AFP		60,000
SUBSIDIO MOVILIZACION		200,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		120,000
SUBSIDIO DE ALIMENTACION		450,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		2.150,000			

TOTAL A PAGAR JERSON ANDRES: $2,030,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			CC No 1121939830

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: CALLE 65 102 C 83 - Tel: 3145057855 - Cel: no tiene. - Medellin			
CÉDULA: 11,806,769	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: EPS SURA		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

ABEL PINO PALACIOS

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR ABEL : $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			x ABEL PINO PALACIOS C.C. No. 11806769

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	**CÓDIGO:** 10011 **No.INTERNO:** 10011

DIRECCIÓN: VEREDA EL BSOQIE - Tel: 3125444535 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1.058.912.256	**BÁSICO:** $1.423.500	**CUENTA:** no tiene	**CENTRO:** NA
EPS: NUEVA EPS		**AFP:** COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
DIAS LABORADOS	3		DESCUENTO EPS		5,694
SALARIO ORDINARIO		142,350	DESCUENTO AFP		5,694
AUXILIO DE TRANSPORTE		20,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		**162,350**	**TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)**		**11,388**

TOTAL A PAGAR DANIEL FELIPE: $150,962

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			X C.C. No 1058912256

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: VEREDA MATEGUADUA CASA A 128 - Tel: 3147484145 - Cel: no tiene. - Manizales			
CÉDULA: 16,074,783	BÁSICO: $2,150,000	CUENTA: 488447820686	CENTRO: NA
EPS: EPS SURA		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

JUAN DAVID LOPEZ OSORIO

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		43,000
SALARIO ORDINARIO		1,075,000	DESCUENTO AFP		43,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		86,000
SUBSIDIO MOVILIZACION		50,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,225,000			

TOTAL A PAGAR JUAN DAVID: $1,139,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Juan David F. C.C. No. 1607 0783

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: LA HABANA MZNA 1 CASA 6 - Tel: 3206310608 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 9,800.077	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

OSCAR DE JESUS RUIZ HENAO

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,767
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,767
HORA EXTRA DIURNAS 125%	1	7,414	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		57,534
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		819,164			

TOTAL A PAGAR OSCAR DE JESUS: $761,630

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			x OSCAR RUIZ C.C. No. 9-800.077

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: CALLE 52 3710 - Tel: 3104578776 - Cel: no tiene. - Manizales			
CÉDULA: 75,092 302	BÁSICO: $2.150.000	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

JOSE WILMAR HERNANDEZ SANCHEZ

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		43,000
SALARIO ORDINARIO		1,075,000	DESCUENTO AFP		43,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		86,000
SUBSIDIO MOVILIZACION		50,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,225,000			

TOTAL A PAGAR JOSE WILMAR: $1,139,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario

Jose Wilmar Hernandez S

C.C. No. 75.092.302

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011
DIRECCIÓN: SAN JOSE VILLALUZ - Tel: 3146585929 - Cel: no tiene. - San Jose		
CÉDULA: 1,058,913,390	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene / CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PROTECCION

LIQUIDACION NOMINA

JHON SEBASTIAN TORRES PANIAGUA

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,767
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,767
HORA EXTRA DIURNAS 125%	1	7,414	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		57,534
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		819,164			

TOTAL A PAGAR JHON SEBASTIAN: $761,630

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			x Jhon Sebastian Torres P. C.C. No. 1058913390

	CONSORCIO FG SAN JOSE	CÓDIGO: 10011
	Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	No.INTERNO: 10011

DIRECCION	[illegible]				
CÉDULA	1[illegible]428416	BÁSICO	[illegible]	CUENTA	[illegible]
EPS:	SALUD TOTAL S A			AFP:	PROTECCION

CENTRO

LIQUIDACION NOMINA

JHON JAIRO PALACIOS COPETE

Desde 01/06/2025 - Hasta 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	6		DESCUENTO EPS		11.388
SALARIO ORDINARIO		284.700	DESCUENTO AFP		11.388
AUXILIO DE TRANSPORTE		40.000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		22,776
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		324,700			
DIAS LABORADOS	6		DESCUENTO EPS		11.388
SALARIO ORDINARIO		284.700	DESCUENTO AFP		11.388
AUXILIO DE TRANSPORTE		40.000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		22,776
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		324,700			

TOTAL A PAGAR JHON JAIRO: $301,924

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1044428416

	CONSORCIO FG SAN JOSE	CÓDIGO: 10011
	Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: vcereda el bsoque - Tel. 3127557094 - Cel. no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 9.921.071	BÁSICO 31.423.500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	

LIQUIDACION NOMINA

HERNANDO DE JESUS ZAPATA CASTAÑO

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	3		DESCUENTO EPS		5.694
SALARIO ORDINARIO		142.350	DESCUENTO AFP		5.694
AUXILIO DE TRANSPORTE		20.000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		162,350	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		11,388

TOTAL A PAGAR HERNANDO DE JESUS: $150,962

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			X Hernando Zapata C. C.C. No. 01.921.071

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: CALLE 31 CASA 95 BARRIO GALAN - Tel: 3143102385 - Cel: no tiene - Manizales			
CÉDULA: 10.260.194	BÁSICO: $2.150.000	CUENTA: 05900068320	CENTRO: NA
EPS: E.P.S SANITAS		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

CARLOS ALBERTO PINEDA GONZALES

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		43,000
SALARIO ORDINARIO		1,075,000	DESCUENTO AFP		43,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		86,000
SUBSIDIO MOVILIZACION		50,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,225,000			

TOTAL A PAGAR CARLOS ALBERTO: $1,139,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			xCarlos Alberto pineda C.C. No. 10260194

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit. 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	**CÓDIGO:** 10011 No.INTERNO: 1001*

DIRECCION:	SAN JOSE DE CALDAS - Tel. 3114321407 - Cel. no tiene. - San Jose		
CÉDULA	- 85[illegible]199	**BASICO** 31.423.500	**CUENTA:** no tiene / **CENTRO:** N/A
EPS:	SALUD TOTAL S.A.	**AFP:**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

LIQUIDACION NOMINA

JESUS ORLANDO SERNA VERA

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
DIAS LABORADOS	8		DESCUENTO EPS		15.184
SALARIO ORDINARIO		379.600	DESCUENTO AFP		15.184
AUXILIO DE TRANSPORTE		53.333			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		**432.933**	**TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)**		**30,368**

TOTAL A PAGAR JESUS ORLANDO: $402,565

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011
DIRECCIÓN: cra 49 b 107 203 - Tel: 3105436933 - Cel: no tiene. - San Jose		
CÉDULA: 1.010.102.447	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene / CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: PORVENIR

LIQUIDACION NOMINA

DEVINSON CORDOBA CORDOBA

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR DEVINSON CORDOBA: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Devinson C.C. No. 1010102447

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO. 10011

DIRECCIÓN: CALLE 65 B 112 C 283 - Tel: 3117574212 - Cel: no tiene - Medellin			
CÉDULA: 1.007.601.275	BÁSICO: $1.423.500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S A		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

FABIAN MURILLO VIVAS

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	12		DESCUENTO EPS		22,776
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	3		DESCUENTO AFP		22,776
SALARIO ORDINARIO		569,400	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		45,552
AUXILIO DE TRANSPORTE		80,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		649,400			

TOTAL A PAGAR FABIAN : $603,848

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C No 1.007.601.275

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: FINCA LA HOLANDA VEREDA EL BOSQUE - Tel: 3113051091 - Cel: no tiene. - Manizales			
CÉDULA: 9.994.639	BÁSICO: 51.800.000	CUENTA: 71997204101	CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

CESAR AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		42,000
SALARIO ORDINARIO		900,000	DESCUENTO AFP		42,000
HORA EXTRA DIURNAS 125%	16	150,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		84,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
SUBSIDIO MOVILIZACION		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,250,000			

TOTAL A PAGAR CESAR AUGUSTO: $1,166,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 9994639

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: CALLE 65 B 112 C 283 - Tel: 3245156278 - Cel no tiene. - Medellin			
CÉDULA: 11,804,854	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: EPS SURA		AFP: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	

LIQUIDACION NOMINA

SIXTO MURILLO PALACIOS

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	12		DESCUENTO EPS		22,776
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	3		DESCUENTO AFP		22,776
SALARIO ORDINARIO		569,400	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		45,552
AUXILIO DE TRANSPORTE		80,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		649,400			

TOTAL A PAGAR SIXTO : $603,848

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario

SIXTO MURILLO PALACIOS

C.C. No. 11804854

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: cra 18 b 62 170 - Tel: 3127152345 - Cel: no tiene. - Medellin			
CÉDULA: 1,076,320,654	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

ANGEL DAVID GIL ZUÑIGA

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940

TOTAL A PAGAR ANGEL DAVID: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1076326654

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: CALLE 64 AD 106 -161 - Tel: 3113161447 - Cel: no tiene. - Medellin			
CÉDULA: 11,801,602	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

MANUEL ANTERO PALACIOS ANDRADES

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940

TOTAL A PAGAR MANUEL ANTERO: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 11801602

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	**CÓDIGO:** 10011 **No.INTERNO:** 10011

DIRECCIÓN: CRA 18 B 62 158 - Tel. 3127152341 - Cel. no tiene. - Manizales			
CÉDULA: 1 075 020 465	**BÁSICO:** $1.423.500	**CUENTA:** no tiene	**CENTRO:** NA
EPS:		**AFP:**	

LIQUIDACION NOMINA

FREDY ANDRESDES MOSQUERA

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
DIAS LABORADOS	10		DESCUENTO EPS		18,980
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	5		DESCUENTO AFP		18,980
SALARIO ORDINARIO		474,500	**TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)**		**37,960**
AUXILIO DE TRANSPORTE		66,667			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		**541,167**			

TOTAL A PAGAR FREDY : $503,207

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Fredy Andresdes C.C. No. 1075020465

	CONSORCIO FG SAN JOSE	CÓDIGO: 10011
	Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN:	VEREDA EL BOSQUE - Tel: 3221546441 - Cel: no tiene - San Jose				
CÉDULA:	11.636.950	BÁSICO: $1.423.500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA	
EPS:	EPS SURA		AFP: COLFONDOS		

LIQUIDACION NOMINA

EUTIMIO ENOR MOSQUERA SERNA

Desde 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940

TOTAL A PAGAR EUTIMIO ENOR: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Eutimio C.C. No. 11636950

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: vereda el bosque - Tel. 3127381812 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 11,802,631	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: 001
EPS: EPS SURA		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

BENEDITO PALACIOS MURILLO

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR BENEDITO : $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Benedito C.C. No 11802631

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: VEREDA EL BOSQUE- SAN JOSE CALDAS - Tel: 3116040742 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1,058,913,428	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: 3116040742	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

CARLOS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		33,808
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		33,808
HORA EXTRA DIURNAS 125%	18	133,453	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		67,616
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		945,203			

TOTAL A PAGAR CARLOS ALBERTO: $877,587

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			carlos López C.C. No

	CONSORCIO FG SAN JOSE	CÓDIGO: 10011
	Nit: 901925183-6 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	No.INTERNO. 10011

DIRECCIÓN:	EL CRUCERO FINCA LA DIVIA - Tel. 3206326670 - Cel. no tiene - San Jose				
CÉDULA:	9.992.409	BÁSICO:	$1.423.500	CUENTA: 322595256?	CENTRO: NA
EPS:	SALUD TOTAL S.A			AFP:	

LIQUIDACION NOMINA

JAVIER DE JESUS HERNANDEZ FLOREZ

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		32,029
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		32,029
HORA EXTRA DIURNAS 125%	12	88,969	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		64,058
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		900,719			

TOTAL A PAGAR JAVIER DE JESUS: $836,661

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Javier Hernandez C.C. No. 9992409

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: **10011** No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN:	VEREDA EL BOSQUE- SAN JOSE CALDAS - Tel: 3227169080 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA:	9.994.474	BÁSICO: $1'423.500	CUENTA: 009600318472	CENTRO: NA
EPS:	SALUD TOTAL S.A.		AFP: COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

GOAR ALBERTO CHIQUITO HERNANDEZ

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		**811,750**	**TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)**		**56,940**

TOTAL A PAGAR GOAR ALBERTO: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			x Goar Alberto Chiquito C.C. No. 9'994.474

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10011 No.INTERNO: 10011

DIRECCIÓN: SAN JOSE DE CALDAS - Tel: 3146678369 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1,088,538,606	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

CRISTIAN CAMILO OSORIO AMARILES

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,767
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,767
HORA EXTRA DIURNAS 125%	1	7,414	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		57,534
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		819,164			

TOTAL A PAGAR CRISTIAN CAMILO: $761,630

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Cristian Camilo Osorio Amarilles C.C. No. 1088538606

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882		**CÓDIGO:** 10011 **No.INTERNO:** 10011
DIRECCIÓN: CRA 18 CALLE 17 # 7-07 LA ESTRADA - Tel: 3176143798 - Cel: no tiene. - Manizales			
CÉDULA: 4,457,320	**BÁSICO:** $1,423,500	**CUENTA:** 05910714513	**CENTRO:** NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		**AFP:** PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

JOSE FERNANDO VALENCIA

Desde: 01/06/2025 - Hasta: 15/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
DIAS LABORADOS	15	711,750	DESCUENTO EPS		40,333
SALARIO ORDINARIO			DESCUENTO AFP		40,333
HORA EXTRA DIURNAS 125%	40	296,563	**TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)**		**80,666**
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
SUBSIDIO MOVILIZACION		50,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		**1,158,313**			

TOTAL A PAGAR JOSE FERNANDO: $1,077,647

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario Fernando Valencia

1057370

C.C. No. _____

San Jose, 29 de abril del 2025

Señores
CONSORCIO FG SAN JOSE

Cordial Saludo

Yo **CARLOS MARIO ACEVEDO MARTINEZ** identificado con C.C 4.548.807 autorizo al CONSORCIO FG SAN JOSE con Nit 901.925.183-8 a consignar el valor por concepto de mi liquidación a la cuenta NEQUI No 3206326670 perteneciente a la Sra. YINETH ACEVEDO con C.C 25.249.156

Atentamente

carlos acevedo
CARLOS MARIO ACEVEDO MARTINEZ
Ayudante
C.C 4.548.807

San Jose, 16 de junio del 2025

Señores
CONSORCIO FG SAN JOSE

Cordial Saludo

Yo **JHON JAIRO PALACIOS COPETE** identificado con C.C 1.077.428.416 autorizo al CONSORCIO FG SAN JOSE con Nit 901.925.183-8 a consignar el valor por concepto de mi nomina a la cuenta NEQUI No. 3005088814 perteneciente a la Sra. BLEIDYS JOHANA SIMANCAS TORREGLOSA con C.C 1.047.390.034

Atentamente

JHON JAIRO PALACIOS COPETE
Ayudante
C.C 1.077.428.416

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/06/2025 12:26:58

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO FG SAN JOSE
Usuario: **SERGIO ESTRADA MORALES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8720

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 20.821.171,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 16/06/2025
Hora: 12:26:48

Número de documento: 66686957

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6933	1010102447	DEVINSON CORDOBA CORDOBA	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6670	25249156	CARMEN YINETH ACEVEDO HENAO	$ 1.130.400,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2567	9992409	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ FLOR	$ 836.661,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8814	1077428415	JHON JAIRO PALACIOS COPETE	$ 301.924,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5642	1058913390	JHON SEBASTIAN TORREZ PANIAGUA	$ 761.630,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3944	75082302	JOSE WILMAR HERNANDEZ SANCHEZ	$ 1.139.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0608	9800077	OSCAR DE JESUS RUIZ	$ 761.630,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3209	1058913428	CARLOS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	$ 877.587,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8369	1088538606	CRISTIAN CAMILO OSORIO AMARILE	$ 761.630,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0506	9921071	HERNANDO ZAPATA CASTAÑO	$ 754.810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIDODIARIO	*******5546	1121939830	JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ	$ 150.962,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0686	16074783	JUAN DAVID LOPEZ OSORIO	$ 2.030.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4798	11804854	SIXTO MURILLO PALACIOS	$ 1.139.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2928	11801602	MANUEL ANTERO PALACIOS ANDRADE	$ 603.848,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4513	4457320	JOSE FERNANDO VALENCIA	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7551	4551159	JESUS ORLANDO SERNA VERA	$ 1.077.647,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4101	9994639	CESAR AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO	$ 402.565,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4986	1058912256	DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES	$ 1.166.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2792	11030950	EUTIMIO ENOR MOSQUERA SERNA	$ 150.962,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1199	1007601275	FABIAN MURILLO VIVAS	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0039	1075020465	FREDY ANDRADES MOSQUERA	$ 603.848,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1991	11806769	ABEL PINO PALACIOS	$ 503.207,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6590	1076320654	ANGEL DAVID GIL ZUÑIGA	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6482	11802631	BENEDITO MURILLO PALACIOS	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8320	10260194	CARLOS ALBERTO PINEDA GONZALEZ	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
					$ 1.139.000,00	Enviado a Otro Banco	

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: VEREDA EL BSOQIE - Tel: 3125444535 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1,058,912,256	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR DANIEL FELIPE: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1058912256

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: SAN JOSE VILLALUZ - Tel: 3146585929 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1.058.913.390	BÁSICO: $1.423.500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

JHON SEBASTIAN TORRES PANIAGUA

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR JHON SEBASTIAN: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Jhon Sebastian Torres P. C.C. No. 1058913390

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: SAN JOSE DE CALDAS - Tel: 3146678369 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1.088.538.606	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

CRISTIAN CAMILO OSORIO AMARILES

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR CRISTIAN CAMILO: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario

Cristian Camilo Osorio A.

C.C. No. 1088538606

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: CALLE 65 B 112 C 283 - Tel: 3117574212 - Cel: no tiene. - Medellin			
CÉDULA: 1,007,601,275	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

FABIAN MURILLO VIVAS

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	12		DESCUENTO EPS		22,776
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	3		DESCUENTO AFP		22,776
SALARIO ORDINARIO		569,400	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		45,552
AUXILIO DE TRANSPORTE		80,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		649,400			

TOTAL A PAGAR FABIAN : $603,848

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1007601275

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: VEREDA EL BOSQUE - Tel: 3221546441 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 11,636,950	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: EPS SURA		AFP: COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

EUTIMIO ENOR MOSQUERA SERNA

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR EUTIMIO ENOR: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Eutimio Mosquera C.C. No. 11636950

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: MZNA 11 CASA 3 MONSERRATE - Tel: 3221547789 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1,057,759,363	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

KEVIN ANTONIO ARROYAVE VERA

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	12		DESCUENTO EPS		22,776
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	1		DESCUENTO AFP		22,776
SALARIO ORDINARIO		569,400	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		45,552
AUXILIO DE TRANSPORTE		80,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		649,400			

TOTAL A PAGAR KEVIN ANTONIO: $603,848

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Kevin Arroyave V. C.C No. 1057593763

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: vereda el bosque - Tel: 3127381812 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 11.802.631	**BÁSICO:** $1,423,500	**CUENTA:** no tiene	**CENTRO:** 001
EPS: EPS SURA		**AFP:** PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

BENEDITO PALACIOS MURILLO

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	**TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)**		**56,940**
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		**811,750**			

TOTAL A PAGAR BENEDITO : $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Benedito C.C. No 11802631

CÓDIGO:	10013
No.INTERNO:	10013
CENTRO:	NA
	PENSIONES COLPENSIONES

E S		
	CANT	VALOR
		22,776
		22,776
IDO)		45,552

0 : $603,848

nvi/10
at 854

	CONSORCIO FG SAN JOSE **Nit: 901925183-8** **CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882**	**CÓDIGO: 10013** **No.INTERNO: 10013**

DIRECCIÓN: cra 18 b 62 170 - Tel: 3127152345 - Cel: no tiene. - Medellin			
CÉDULA: 1,076,320,654	**BÁSICO:** $1,423,500	**CUENTA:** no tiene	**CENTRO:** NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		**AFP:** COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

ANGEL DAVID GIL ZUÑIGA

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	**TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)**		**56,940**
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		**811,750**			

TOTAL A PAGAR ANGEL DAVID: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No.

1076320654

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN:	VEREDA EL BOSQUE - Tel: 3206326670 - Cel: no tiene. - San Jose				
CÉDULA:	4,548,807	BÁSICO: $2,240,000	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA	
EPS:	SALUD TOTAL S.A.		AFP: PORVENIR		

LIQUIDACION NOMINA

CARLOS MARIO ACEVEDO MARTINEZ

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		44,800
SALARIO ORDINARIO		1,120,000	DESCUENTO AFP		44,800
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		89,600
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,220,000			

TOTAL A PAGAR CARLOS MARIO: $1,130,400

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			carlos acevedo C.C. No 4549902

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: CALLE 10 No. 5-59 SALAMINA - Tel: 3229469364 - Cel: no tiene - Manizales			
CÉDULA: 1,121,939,830	BÁSICO: $3,000,000	CUENTA: 91204181662	CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		60,000
SALARIO ORDINARIO		1,500,000	DESCUENTO AFP		60,000
SUBSIDIO DE ALIMENTACION		450,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		120,000
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,950,000			

TOTAL A PAGAR JERSON ANDRES: $1,830,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1121939430

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: VEREDA EL BOSQUE- SAN JOSE CALDAS - Tel. 3116040742 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1,058,913,428	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: 3116040742	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

CARLOS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		35,588
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		35,588
HORA EXTRA DIURNAS 125%	24	177,938	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		71,176
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		989,688			

TOTAL A PAGAR CARLOS ALBERTO: $918,512

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			xcarlos lópez C.C. No. 1058913428

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: LA HABANA MZNA 1 CASA 6 - Tel: 3206310808 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 9,800,077	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

OSCAR DE JESUS RUIZ HENAO

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR OSCAR DE JESUS: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario

OSCAR RUIZ

C.C. No. 9-800-077

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013
DIRECCIÓN: CRA 18 B 62 158 - Tel: 3127152341 - Cel: no tiene. - Manizales		
CÉDULA: 1,075,020,465	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene / CENTRO: NA
EPS:		AFP:

LIQUIDACION NOMINA

FREDY ANDRESDES MOSQUERA

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR FREDY : $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			FREDY ANDRES DES MOSQUERA C.C. No. 1075020465

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: VEREDA EL BOSQUE- SAN JOSE CALDAS - Tel: 3227169080 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 9,994,474	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: 009600318472	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

GOAR ALBERTO CHIQUITO HERNANDEZ

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		40,926
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		40,926
HORA EXTRA DIURNAS 125%	42	311,391	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		81,852
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,123,141			

TOTAL A PAGAR GOAR ALBERTO: $1,041,289

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Goar A. Chiquito C.C. No. 9'994.474

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: CALLE 31 CASA 95 BARRIO GALAN - Tel: 3143102385 - Cel: no tiene. - Manizales			
CÉDULA: 10,260,194	BÁSICO: $2,150,000	CUENTA: 05900068320	CENTRO: NA
EPS: E.P.S SANITAS		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

CARLOS ALBERTO PINEDA GONZALES

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		43,000
SALARIO ORDINARIO		1,075,000	DESCUENTO AFP		43,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		86,000
SUBSIDIO MOVILIZACION		50,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,225,000			

TOTAL A PAGAR CARLOS ALBERTO: $1,139,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Carlos Alberto pineda G. C.C. No. 10260194

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: VEREDA EL BOSQUE - Tel: 31472299116 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1,058,912,007	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

JULIAN STIVEN HINCAPIE AMARILES

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	7		DESCUENTO EPS		13,286
SALARIO ORDINARIO		332,150	DESCUENTO AFP		13,286
AUXILIO DE TRANSPORTE		46,667	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		26,572
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		378,817			

TOTAL A PAGAR JULIAN STIVEN: $352,245

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1058912007

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: vcereda el bsoqie - Tel: 3127557084 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 9,921,071	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: NUEVA EPS		AFP: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	

LIQUIDACION NOMINA

HERNANDO DE JESUS ZAPATA CASTAÑO

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR HERNANDO DE JESUS: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Hernando Zapata C. C.C. No. 9.921.071

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: CALLE 52 3710 - Tel: 3104578776 - Cel: no tiene. - Manizales			
CÉDULA: 75.082.302	BÁSICO: $2,150,000	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

JOSE WILMAR HERNANDEZ SANCHEZ

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		43,000
SALARIO ORDINARIO		1,075,000	DESCUENTO AFP		43,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		86,000
SUBSIDIO DE ALIMENTACION		50,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,225,000			

TOTAL A PAGAR JOSE WILMAR: $1,139,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Jose wilmar hernandez C.C. No. 75.082.302

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: PLUMON ALTO MZNA 5 CASA 19 - Tel 3046702484 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 1,077,428,416	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

JHON JAIRO PALACIOS COPETE

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR JHON JAIRO: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1077428416

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: CALLE 64 AD 106 -161 - Tel: 3113161447 - Cel: no tiene. - Medellin			
CÉDULA: 11,801,602	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: no tiene	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP: PORVENIR	

LIQUIDACION NOMINA

MANUEL ANTERO PALACIOS ANDRADES

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR MANUEL ANTERO: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 11801602

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	**CÓDIGO:** 10013 **No.INTERNO:** 10013

DIRECCIÓN: FINCA LA HOLANDA VEREDA EL BOSQUE - Tel: 3113051091 - Cel: no tiene. - Manizales			
CÉDULA: 9.994.639	**BÁSICO:** $1,800,000	**CUENTA:** 71997204101	**CENTRO:** NA
EPS: NUEVA EPS		**AFP:** COLFONDOS	

LIQUIDACION NOMINA

CESAR AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		39,000
SALARIO ORDINARIO		900,000	DESCUENTO AFP		39,000
HORA EXTRA DIURNAS 125%	8	75,000	**TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)**		**78,000**
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000			
SUBSIDIO MOVILIZACION		300,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,375,000			

TOTAL A PAGAR CESAR AUGUSTO: $1,297,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 9994639

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: VEREDA MATEGUADUA CASA A 128 - Tel: 3147484145 - Cel: no bene. - Manizales			
CÉDULA: 16,074,783	BÁSICO: $2,150,000	CUENTA: 488447820686	CENTRO: NA
EPS: EPS SURA		AFP: PROTECCION	

LIQUIDACION NOMINA

JUAN DAVID LOPEZ OSORIO

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		43,000
SALARIO ORDINARIO		1,075,000	DESCUENTO AFP		43,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		86,000
SUBSIDIO DE ALIMENTACION		50,000			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		1,225,000			

TOTAL A PAGAR JUAN DAVID: $1,139,000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 16074783

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10013 No.INTERNO: 10013

DIRECCIÓN: EL CRUCERO FINCA LA DIVIA - Tel: 3205326870 - Cel: no tiene. - San Jose			
CÉDULA: 9.992.409	BÁSICO: $1,423,500	CUENTA: 3225952567	CENTRO: NA
EPS: SALUD TOTAL S.A.		AFP:	

LIQUIDACION NOMINA

JAVIER DE JESUS HERNANDEZ FLOREZ

Desde: 16/06/2025 - Hasta: 30/06/2025

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		28,470
SALARIO ORDINARIO		711,750	DESCUENTO AFP		28,470
AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		56,940
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		811,750			

TOTAL A PAGAR JAVIER DE JESUS: $754,810

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Javier Hernandez C.C. No. 9992.409

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/07/2025 12:47:24

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO FG SAN JOSE
Usuario: SERGIO ESTRADA MORALES
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8720

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 22.468.657,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 01/07/2025
Hora: 12:47:13

Número de documento: 66996701

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6933	1010102447	DEVINSON CORDOBA CORDOBA	$ 503.207,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2567	9992409	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ FLOR	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5642	1058913390	JHON SEBASTIAN TORREZ PANIAGUA	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3944	75082302	JOSE WILNAR HERNANDEZ SANCHEZ	$ 1.139.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0608	9800077	OSCAR DE JESUS RUIZ	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9080	9994474	GOAR ALBERTO CHIQUITO HERNANDE	$ 1.041.289,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	******0506	9921071	HERNANDO DE JESUS ZAPATA CASTA	$ 754.810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	******5546	1121939830	JERSON ANDRES CASTANEDA DIAZ	$ 1.830.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2484	1077428416	JHON JAIRO PALACIOS COPETE	$ 754.810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0686	16074783	JUAN DAVID LOPEZ OSORIO	$ 1.139.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1249	1058912007	JULIAN STIVEN HINCAPIE AMARILE	$ 352.245,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3209	1058913428	CARLOS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	$ 918.512,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5096	4548807	CARLOS MARIO ACEVEDO MARTINEZ	$ 1.130.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8369	1088538606	CRISTIAN CAMILO OSORIO AMARILE	$ 754.810,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2792	11636950	EUTIMIO EMOR MOSQUERA SERNA	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1199	1007601275	FABIAN MURILLO VIVAS	$ 603.848,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0039	1075020465	FREDY ANDRADES MOSQUERA	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1991	11806760	ABEL PINO PALACIOS	$ 503.207,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6590	1076320654	ANGEL DAVID GIL ZUNIGA	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6482	11802631	BENEDITO MURILLO PALACIOS	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8320	10260194	CARLOS ALBERTO PEREDA GONZALEZ	$ 1.139.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4101	9994639	CESAR AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO	$ 1.297.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4986	1058912256	DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9522	9921934	Leonardo Fabio Garda	$ 603.848,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2928	11801602	MANUEL ANTERO PALACIOS ANDRADE	$ 754.810,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4708	11804854	SIXTO MURILLO PALACIOS	$ 603.848,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9251	1058819176	VICTOR ALEXANDER GONZALEZ BEDO	$ 806.733,00	Enviado a Otro Banco	

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	CARLOS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	**Cédula:**	1058913428
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	3116040742
Dirección:	VEREDA EL BOSQUE- SAN JOSE CALDAS - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON		1,602,073			
DIAS PARA PRIMA	70				
PRIM DE SERVICIOS		350,403			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS CARLOS ALBERTO: $350,403

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Carlos López C.C. No. 1058913428

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: OSCAR DE JESUS RUIZ HENAO	**Cédula:** 9800077
Cargo: Ayudanles Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**
Dirección: LA HABANA MZNA 1 CASA 6 - Cel.	**Municipio:** San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1.450.976			
DIAS PARA PRIMA	34				
PRIMA DE SERVICIOS		155.926			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS OSCAR DE JESUS: $155,926

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			OSCAR RUIZ C.C. No. 9-800-077

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	JOSE WILMAR HERNANDEZ SANCHEZ	**Cédula:**	75082302
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	CALLE 52 3710 - Cel.	**Municipio:**	Manizales

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		2,175,595			
DIAS PARA PRIMA	42				
PRIMA DE SERVICIOS		277,153			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS JOSE WILMAR: $277,153

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			José Wilmar Hernandez C.C. No. 75.082.302

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	JHON JAIRO PALACIOS COPETE	**Cédula:**	1077428416
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	PLUMON ALTO MZNA 5 CASA 19 - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1.423,500			
DIAS PARA PRIMA	21				
PRIMA DE SERVICIOS		94,704			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS JHON JAIRO: $94,704

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario

C.C. No. 1077428416

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	MANUEL ANTERO PALACIOS ANDRADES	**Cédula:**	11801602
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	CALLE 64 AD 106 -161 - Cel.	**Municipio:**	Medellin

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	42				
PRIMA DE SERVICIOS		189,408			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS MANUEL ANTERO: $189,408

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 11801602

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	CESAR AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO	**Cédula:**	9994639
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	71997204101
Dirección:	FINCA LA HOLANDA VEREDA EL BOSQUE - Cel.	**Municipio:**	Manizales

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,950,670			
DIAS PARA PRIMA	56				
PRIMA DE SERVICIOS		334,549			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS CESAR AUGUSTO: $334,549

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 9994639

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	JUAN DAVID LOPEZ OSORIO	**Cédula:**	16074783
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	488447820686
Dirección:	VEREDA MATEGUADUA CASA A 128 - Cel.	**Municipio:**	Manizales

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		2.165,580			
DIAS PARA PRIMA	69				
PRIMA DE SERVICIOS		453,403			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS JUAN DAVID: $453,403

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Juan David L. C.C. No. 16074783.

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES	**Cédula:**	1058912256
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	VEREDA EL BSOQIE - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	18				
PRIMA DE SERVICIOS		81,175			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS DANIEL FELIPE: $81,175

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1058912256

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	CARLOS ALBERTO PINEDA GONZALES	**Cédula:**	10260194
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	05900068320
Dirección:	CALLE 3 1 CASA 95 BARRIO GALAN - Cel.	**Municipio:**	Manizales

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SA ARIO Y OTROS CON		2,165,357			
DIAS PARA PRIMA	70				
PRIMA DE SERVICIOS		459,931			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS CARLOS ALBERTO: $459,931

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Carlos Alberto Pineda C.C. No. 10260194

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	JHON SEBASTIAN TORRES PANIAGUA	**Cédula:**	1058913390
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	SAN JOSE VILLALUZ - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,450,976			
DIAS PARA PRIMA	34				
PRIMA DE SERVICIOS		155,926			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS JHON SEBASTIAN: $155,926

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Jhon Sebastian Torres P. C.C. No. 1058913390

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	CRISTIAN CAMILO OSORIO AMARILES	**Cédula:**	1088538606
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	SAN JOSE DE CALDAS - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON		1,450,976			
DIAS PARA PRIMA	34				
PRIMA DE SERVICIOS		155,926			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS CRISTIAN CAMILO: $155,926

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Cristian Camilo Osorio C.C. No. 1088538606

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	FABIAN MURILLO VIVAS	**Cédula:**	1007601275
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	CALLE 65 B 112 C 283 - Cel.	**Municipio:**	Medellin

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	42				
PRIMA DE SERVICIOS		189,408			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS FABIAN : $189,408

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1007601275

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	FREDY ANDRESDES MOSQUERA	**Cédula:**	1075020465
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	CRA 18 B 62 158 - Cel.	**Municipio:**	Manizales

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	42				
PRIMA DE SERVICIOS		189,408			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS FREDY : $189,408

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Fredy Andres Mosquera C.C. No. 1075020465

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CODIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ FLOREZ	**Cédula:**	9992409
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	3225952567
Dirección:	EL CRUCERO FINCA LA DIVIA - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON		1,486,108			
DIAS PARA PRIMA	54				
PRIMA DE SERVICIOS		252,916			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS JAVIER DE JESUS: $252,916

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			javier hernandez C.C. No. 9992409

DATOS DEL EMPLEA

Nombre: EUTIMIO EN
Cargo: Ayudantes Y
Dirección: VEREDA EL

CONCEPTO
BASE PARA PRIMA (SALARI
DIAS PARA PRIMA
PRIMA DE SERVICIOS

Elaborado

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	JULIAN STIVEN HINCAPIE AMARILES	**Cédula:**	1058912007
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	VEREDA EL BOSQUE - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1.423,500			
DIAS PARA PRIMA	7				
PRIMA DE SERVICIOS		31,568			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS JULIAN STIVEN: $31,568

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1058912007

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	HERNANDO DE JESUS ZAPATA CASTAÑO	**Cédula:**	9921071
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	vcereda el bsoqie - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	18				
PRIMA DE SERVICIOS		81,175			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS HERNANDO DE JESUS: $81,175

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Hernando. Zapata. C. C.C. No. 9.921.071

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: EUTIMIO ENOR MOSQUERA SERNA	**Cédula:** 11636950
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**
Dirección: VEREDA EL BOSQUE - Cel.	**Municipio:** San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	30				
PRIMA DE SERVICIOS		135,292			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS EUTIMIO ENOR: $135,292

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Eutimio Mosquera C.C. No. 11636950

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	KEVIN ANTONIO ARROYAVE VERA	**Cédula:**	1057759363
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	MZNA 11 CASA 3 MONSERRATE - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	13				
PRIMA DE SERVICIOS		58,626			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS KEVIN ANTONIO: $58,626

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			KEVIN ARROYAVE V. C.C. No. 1057759363

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	BENEDITO PALACIOS MURILLO	**Cédula:** 11802631
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**
Dirección:	vereda el bosque - Cel.	**Municipio:** San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON		1.423.500			
DIAS PARA PRIMA	30				
PRIMA DE SERVICIOS		135.292			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS BENEDITO : $135,292

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			Benedito C.C. No. 11802631

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	CARLOS MARIO ACEVEDO MARTINEZ	**Cédula:**	4548807
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	
Dirección:	VEREDA EL BOSQUE - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		2,240,000			
DIAS PARA PRIMA	30				
PRIMA DE SERVICIOS		203,333			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS CARLOS MARIO: $203,333

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			carlos acevedo C.C. No. 4548807

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	GOAR ALBERTO CHIQUITO HERNANDEZ	**Cédula:**	9994474
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	009600318472
Dirección:	VEREDA EL BOSQUE- SAN JOSE CALDAS - Cel.	**Municipio:**	San Jose

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,433,967			
DIAS PARA PRIMA	68				
PRIMA DE SERVICIOS		308,638			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS GOAR ALBERTO: $308,638

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario Goar Alberto Chiquito

C.C. No. 9994474

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre:	JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ	**Cédula:**	1121939830
Cargo:	Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**	91204181662
Dirección:	CALLE 10 No. 5-59 SALAMINA - Cel.	**Municipio:**	Manizales

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		3,000,000			
DIAS PARA PRIMA	70				
PRIMA DE SERVICIOS		583,333			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS JERSON ANDRES: $583,333

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario

C.C. No. 1121939830

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: ANGEL DAVID GIL ZUÑIGA	**Cédula:** 1076320654
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**
Dirección: cra 18 b 62 170 - Cel.	**Municipio:** Medellin

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	42				
PRIMA DE SERVICIOS		189,408			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS ANGEL DAVID: $189,408

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Beneficiario
			C.C. No. 1076320654

	CONSORCIO FG SAN JOSE Nit: 901925183-8 CALLE 62 23-61 OF 501 - TEL. - CEL.3184008882	CÓDIGO: 10014 No.INTERNO: 10014

LIQUIDACION SEMESTRAL PRIMA DE SERVICIOS

Período Desde: 01-01-2025 **Hasta:** 06-30-2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: SIXTO MURILLO PALACIOS	**Cédula:** 11804854
Cargo: Ayudantes Y Obreros De Construccion Y Otros Oficios	**Cuenta:**
Dirección: CALLE 65 B 112 C 283 - Cel.	**Municipio:** Medellin

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CON:		1,423,500			
DIAS PARA PRIMA	42				
PRIMA DE SERVICIOS		189,408			

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS SIXTO : $189,408

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario

S. XTO MURILLO

C.C. No. 11804854
