GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**2**	FECHA:	**25**	de	**JULIO**	de	**2025**			
PERIODO: DEL	**20**	de	**MAYO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**JULIO**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**							

OBJETO:

CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

Departamento de Boyacá, Provincia centro, Municipio de Tunja, casco urbano, calle 59 entre Av. Universitaria y carrera 2 Este (Antigua via a Paipa).

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACION DE BOYACA	**MUNICIPIO DE TUNJA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO	**LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA**
Teléfono: 7 420150 Dirección **CLL 20 # 9-90 Tunja (Boy)**	Teléfono: 7 420150 Dirección **CLL 20 # 9-90 Tunja (Boy)**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 1/04/2025	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 4.835.148.229,44	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.835.148.229,44**

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: PROYECTO BPIN No. 2024 00415 0443 - A1

El municipio de Tunja celebró previamente los contratos de obra e interventoria Nos.1557 de 2023 y 1639 de 2023 respectivamente, para la "Construcción y mejoramiento del tramo vial de la calle 59 entre la vía antigua a Paipa (Carrera 2a Este y la Avenida Universitaria". Previa suscripción del convenio No.1940 de 2025, el estado y alcance de los contratos citados contempla" la construcción de la calzada Norte con obras de espacio público y puente vehicular 1 sobre el rio Jordán, la construcción de la calzada sur entre el K0+000 (sector Carrera 2 y el cruce Férreo K0+075), la construcción de la infraestructura del puente vehicular 2 en la calzada sur (Cimentación y Vigas de Cimentación) y la construcción del cruce férreo. Dichas actividades son financiadas con recursos del municipio y Otros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero).

Con la anterior aclaración y de acuerdo al proyecto de inversión BPIN No. 2024 0415 0443 -A1, se resume el alcance del convenio 1940/2025 mediante la construcción de las siguientes obras en la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30 m de luz sobre el rio Jordán, señalización vertical y horizontal, pozos y sumideros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	LP-AMT-0012023	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=2751294&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2fIndex%3fallWords2Search%3d1557%2bde%2b2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	1/02/2023	
Estudios Previos	1/02/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	1/02/2023	
Acto de adjudicación	17/06/2023	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	CM-AMT0022023	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=2792507&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2fIndex%3fallWords2Search%3d1639%2bde%2b2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	30/03/2023	
Estudios Previos	30/03/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	30/03/2023	
Acto de adjudicación	17/06/2023	

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
ALCALDIA DE TUNJA NIT 891.800.846-1	**$ 9.031.645.799,00**
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO HAYUELOS - NIT. 901.725.176-8	**LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS C.C. 9.523864**
Teléfono: 3192451875 Dirección: Calle 57 # 3 56	Teléfono: 3192451875 Dirección: Calle 57 # 3 56

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:	
ALCALDIA DE TUNJA NIT 891.800.846-1	**$**	**714.000.000,00**
OBJETO:		
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA"		
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO TUNJA JI 2 - NIT: 901728023-3	**JORGE E PARRA SALINAS C.C. 79.262.203**	
Teléfono: (601)6129434 Dirección: Cll 125 # 20 70 Of. 602	Teléfono: (601)6129434 Dirección: Cll 125 # 20 70 Of. 602	

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO	CONTRATO DE OBRA	CTO. INTERVENTORÍA
	dd mm aaaa	dd mm aaaa	dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	20 5 2025	17 7 2023	17 7 2023
PLAZO INICIAL	6 Meses	5 Meses y 14 Dias	5 Meses y 14 Dias
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	19 11 2025	31 12 2023	31 12 2023
ADICIONES EN PLAZO	N/A	15 meses y 16 dias	15 meses y 16 dias
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	19 11 2025	18 9 2025	18 9 2025

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**59,4%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**32,8%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**59,4%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**49,6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,6%**

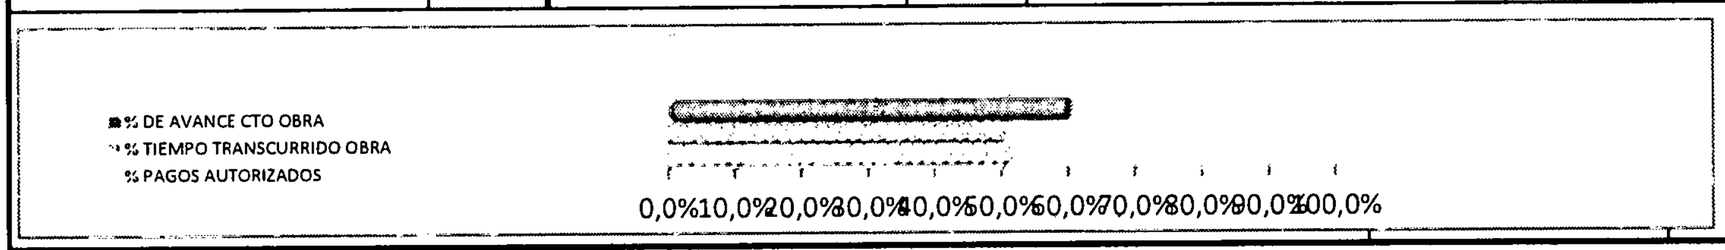

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**59,4%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**49,6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**41,2%**

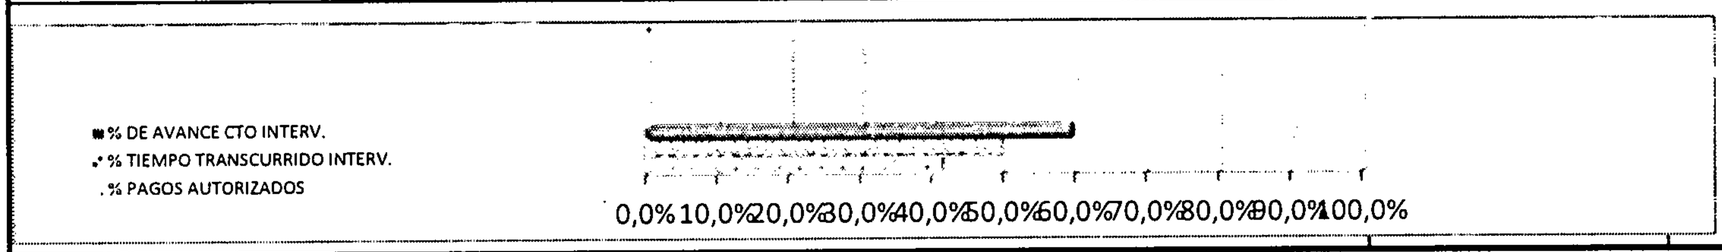

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Para el presente periodo se realizaron actividades de:
- Excavación De Cortes, Canales Y Prestamos en material común
- Mejoramiento de la Subrasante con Pedraplén Compacto
- Suministro, extendido y compactación de material seleccionado para afirmado hasta un diámetro de 2" y un índice plástico igual o menor a 9% y compacto al 95% del Proctor.
- Plataforma conformada, compactada y creada sobre la cual se plantea armar la superestructura previa al lanzamiento del puente
- Suministro, Transporte, Fabricación, Ensamblaje y Montaje De Estructura Metálica – Tanto fabricación en taller como el montaje en campo y su posicionamiento final.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	20 5 2025	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	17 7 2023	Ver Secop
Acta de suspensión N° 1	3 9 2024	
Acta de ampliación N° 1 de suspensión N° 1	18 9 2024	
Acta de ampliación N° 2 de suspensión N° 1	3 10 2024	
Acta de reinicio N° 1	17 10 2024	
Acta de Suspensión N°2	8 11 2024	
Ampliación No 1 Suspensión No 2	6 12 2024	
Ampliación No 2 Suspensión No 2	21 1 2025	
Acta de Reinicio 2	3 2 2025	
Suspensión No 3	4 2 2025	
Acta de Reinicio 3	28 2 2025	
Modificación No 1 (Rec. Alcaldía)	19 12 2023	
Modificación No 2 (Rec. Alcaldía)	18 10 2024	
Modificación No 3 (Rec. Gobernación/Alcaldia)	3 2 2025	
Modificatorio No 4 (Rec. Gobernación/Alcaldia)	8 5 2025	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	17 7 2023	
Acta de suspensión N° 1	3 9 2024	
Acta de ampliación N° 1 de suspensión N° 1	18 9 2024	
Acta de ampliación N° 2 de suspensión N° 1	3 10 2024	
Acta de reinicio N° 1	17 10 2024	
Acta de Suspensión N°2	8 11 2024	
Ampliación No 1 Suspensión No 2	6 12 2024	
Ampliación No 2 Suspensión No 2	21 1 2025	
Acta De Reinicio 2	3 2 2025	
Suspensión No 3	4 2 2025	
Acta De Reinicio 3	28 2 2025	

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	3002310	ANEXO No.	13	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS S.A	FECHA APROB.	dd 11 mm 7 aa 2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd mm aaaa	VIG. HASTA dd mm aaaa	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	17 7 2023	18 3 2026	$ 2.825.789.562,00
Salarios y Prestaciones	17 7 2023	18 9 2028	$ 2.825.789.562,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	27 2 2025	27 2 2030	$ 2.825.789.562,00
Nota: Póliza pendiente para aprobación por parte de la entidad.			

No PÓLIZA	1008211	ANEXO No.	13	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS S.A	FECHA APROB.	dd 4 mm 6 aa 2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd mm aaaa	VIG. HASTA dd mm aaaa	SUMA ASEGURADA
Predios Labores y Operaciones	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
Daño Emergente	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
Lucro Cesante	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
RC Extracontractual Derivada	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
Cobertura Perjuicios Extrapatrimoniales	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
Cobertura RC Contratistas y Subcontratistas	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
Cobertura Patronal	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
Cobertura RC Vehículos Propios y NO prop.	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
Gastos Médicos	7 7 2023	18 9 2025	$ 213.525.000,00
Gastos Judiciales y de Defensa	7 7 2023	18 9 2025	$ 711.750.000,00
Nota: Póliza pendiente para aprobación por parte de la entidad.			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	M 100 202732	ANEXO No.	20	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd 11 mm 7 aa 2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd mm aaaa	VIG. HASTA dd mm aaaa	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	18 10 2024	18 9 2026	$ 225.929.091,60
Prestaciones sociales	18 10 2024	18 3 2029	$ 225.929.091,60
Calidad del Servicios	18 3 2026	18 3 2031	$ 225.929.091,60
Nota: Póliza pendiente para aprobación por parte de la entidad.			

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE OBRA			
1	Adicional N° 1 Valor	$ 323.123.318,00	Fuente Municipio (25-Sep-2024)
2	Adicional N° 2 Valor	$ 4.518.872.292,37	Fuente Departamento (08-May-2024)
		$ 255.306.400,63	Fuente Municipio (08-May-2024)
3	Prórroga 1		5 meses y 16 dias (20-Dic-2023)
4	Prórroga 2		1 mes (04-Jun-2024)
5	Prórroga 3		1 mes (16-Jul-2024)
6	Prórroga 4		1 mes (16-Ago-2024)
7	Prórroga 5		15 dias (18-Oct-2024)
8	Prórroga 6		6 meses 15 dias (28-Feb-2025)
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 5.097.302.011,00	15 meses y 16 dias
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adicional N° 1 Valor	$ 81.452.949,00	
2	Adicional N° 2 Valor	$ 334.192.509,00	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 415.645.458,00	15 meses y 16 dias

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	882-000060-82	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS – MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1940 DE 2025				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
Desembolso No 1. (Previa firma acta de inicio)	50%	4 6 2025	$ 2.417.574.114,72
Desembolso No 2.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONTRATO DE OBRA			
DESCRIPCIÓN		FECHA	VALOR
Anticipo (N/A)			
Acta Parcial No. 1 (En trámite)		7 7 2025	$ 2.285.934.007,20
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN		FECHA	VALOR
Anticipo (N/A)			
Acta Parcial No.			
Acta Parcial No. 1 (En trámite)		7 7 2025	$ 130.413.127,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
a) Obras calzada sur (eje 1)	
1. ESPACIO PÚBLICO (CICLOVIA Y SENDERO PEATONAL - K0+000 AL K0+190)	Sin Actividad
2. PAVIMENTACIÓN CALZADA VEHICULAR SUR (K0+070 AL K0+190)	
2.02 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	K0+085 a K0+132 Calzada Sur
2.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	K0+085 a K0+132 Calzada Sur
5.04 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	K0+000 a K0+210 Calzada Sur
5.05 PEDRAPLEN COMPACTO	K0+085 a K0+126 Calzada Sur
3. LOSAS DE ACCESO Y SUPERESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR L= 30M	
8.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Viga maestra, vigas tranversales y longitudinales, platinas y conectores (90.000 Kg) Calzada Sur. El marco metálico se ensambló, se realizaron las soldaduras correspondientes y se posicionó sobre los apoyos, se instalaron los neoprenos, actualmente se inició la instalación de la lámina colaborante (Metal Deck) y conectores del puente. En obra se encuentra el acero para el armado de refuerzo de la losa.
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	Sin Actividad
5. PRUEBA DE CARGA.	Sin Actividad

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	
1. TECNICAS	
Control de Materiales	CUMPLE
Control de Maquinaria	CUMPLE
Verificación de los procesos constructivos	CUMPLE
Validación de ensayos	CUMPLE
Inspección en excavaciones y rellenos	CUMPLE
2. ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL	CUMPLE
Control de personal de obra e interventoria	CUMPLE
Control de documentación de maquinaria y equipos	CUMPLE
Control de insumos (Combustible, Agua, etc.)	CUMPLE
Control de balances financieros	CUMPLE
Control de cantidades, balance de obra.	CUMPLE
Acompañamiento a la administración para los actos administrativos y legales.	CUMPLE
Verificación en campo del cumplimiento del PMA vigente.	CUMPLE
Acompañamiento al contratista para trámites CORPOBOYACÁ.	CUMPLE
Control en la ejecución de los recursos	CUMPLE
Acompañamiento al contratista y a la administración gestiones ante Comunidad.	CUMPLE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta comité No. 01 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	13	5	2025	Etapa previa iniciación de convenio
Acta comité No. 02 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	16	7	2025	Se realizó comité de obra con presencia de funcionarios de la gobernación (Ing. Leonardo Alvarez, Ing. Juan Pablo Alba), Secretaría de Infraestructura y el personal de obra e interventoría en el sitio de los trabajos.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe No. 0							Documentación previa para inicio del convenio
Informe mensual No. 1	20	5	2025	19	6	2025	Etapa de ejecución
Informe mensual No. 2	20	5	2025	19	7	2025	Etapa de ejecución

OBSERVACIONES:

1. El presente informe No. 1 recopila las actividades de ejecución de los contratos de obra e interventoria, enmarcadas en desarrollo del convenio suscrito con el departamento, por lo cual los porcentajes de avance relacionados corresponden a las actividades contempladas exclusivamente en el presupuesto del convenio.
2. Al presente informe se adjunta: Los soportes de ejecución y seguimiento de los recursos del convenio incorporados a los contratos de obra e interventoría, soportes de rendimientos financieros, certificación de la correcta ejecución de los recursos asignados al convenio.
3. Se realizaron comités de obra con presencia de funcionarios de la gobernación (Ing. Leonardo Alvarez, Ing. Juan Pablo Alba) y el personal de obra e interventoria.
4. Se posicionó la estructura metálica, se inicia la etapa de construcción del tablero del puente.

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	T1 P14
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	Ver Secop
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoria para el contrato de obra	N.A.	Ver Secop
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	SI	Ver Secop
Copia del Contrato de obra e interventoria	SI	Ver Secop
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	Ver Secop
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	SI	Ver Secop
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoria	SI	Ver Secop

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	Ver Secop
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	N/A
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	T4 P24
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	T3 P1
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	T6 P43
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	T2 P323
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	T3 P15
Bitácora de obra	SI	T6 P1
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	N/A
Amortización del anticipo	N.A.	N/A
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	N/A
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	Inf No. 0
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	T2 P323
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	T4 P40
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	T3 P2
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	T3 P4
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	T3 P4
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	T3 P7
Generales		
Registro fotográfico	SI	T4 P1
Correspondencia enviada y recibida	SI	Ver Secop
Registro de instalación Valla informativa	YA SE RADICO	Inf No. 0
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	T4 P26
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoria	SI	T6 P44
Control de pólizas y garantias (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	T6 P49
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	Ver Secop
El personal de interventoria cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	SI	T6 P48
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	NO	N/A
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	NO	N/A
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	N/A
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	T3 P2
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI	Ver Secop
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	T3 P2
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoria	SI	T3 P1
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	T3 P4
Generales		
Registro fotográfico	SI	T4 P1
Correspondencia enviada y recibida	SI	Ver Secop

* Se refiere a requisitos minimos del informe de interventoria al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO)

Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Alcalde Municipal

NOMBRE: MIKHAIL KRASNOV

FIRMA:

Secretaria Infraestructura

NOMBRE: LINA MARIA BAUTISTA

Proyectó: Ing. Jaime Tovar
