GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**2**	FECHA:	**29**	de	**JULIO**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**20**	de **JUNIO**	de	**2025**	AL	**19**	de **JULIO**	de **2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**					

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Departamento de Boyacá, Provincia centro, Municipio de Tunja, casco urbano, calle 59 entre Av. Universitaria y carrera 2 Este (Antigua via a Paipa)

INFORMACION GENERAL

ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACION DE BOYACA	**MUNICIPIO DE TUNJA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO	**LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA**
Teléfono: 7 420150 Dirección CLL 20 # 9-90 Tunja (Boy)	Teléfono: 7405770 Ext 1100 Dirección Cll 19 # 9 -95 Ed. Municipal
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 1/04/2025	-

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
$ 4.835.148.229,44	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.835.148.229,44**

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: PROYECTO BPIN No. 2024 00415 0443 - A1

El municipio de Tunja celebró previamente los contratos de obra e interventoria Nos. 1557 de 2023 y 1639 de 2023 respectivamente, para la "Construcción y mejoramiento del tramo vial de la calle 59 entre la vía antigua a Paipa (Carrera 2 a Este) y la Avenida Universitaria". Previa suscripción del convenio No. 1940 de 2025, el estado y alcance de los contratos citados contempla "la construcción de la calzada Norte con obras de espacio público y puente vehicular 1 sobre el rio jordán, la construcción de la calzada sur entre el K0+000 (sector Carrera 2 y el cruce Férreo K0+075), la construcción de la infraestructura del puente vehicular 2 en la calzada sur (Cimentación y Vigas de Cimentación) y la construcción del cruce férreo. Dichas actividades son financiadas con recursos del municipio y Otros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al presente informe cero)

Con la anterior aclaración y de acuerdo al proyecto de inversión BPIN No. 2024 0415 0443 - A1, se resume el alcance del convenio 1940/2025 mediante la construcción de las siguientes obras en la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30m de luz sobre le rio Jordán, señalización vertical y horizontal, pozos y sumideros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. LP-AMT-0012023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	1/02/2023
Estudios Previos	1/02/2023
Proyecto de pliego de condiciones	NO APLICA
Pliego de condiciones definitivos	1/02/2023
Acto de adjudicación	17/06/2023

INFORME No:	2	FECHA:	29	de	JULIO	de	2025	

PERIODO: DEL	20	de	JUNIO	de	2025	AL	19	de	JULIO	de	2025

CONVENIO No:	1940	DE	2025		

Link del proceso:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3905187&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CM-AMT0022023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	30/03/2023
Estudios Previos	30/03/2023
Proyecto de pliego de condiciones	NO APLICA
Pliego de condiciones definitivos	30/03/2023
Acto de adjudicación	17/06/2023

Link del proceso:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4241140&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR INICIAL:	ADICIONALES MPIO/OTROS:	ADICIONAL CNV GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL:
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA NIT 891.800.846-1	$ 9.031.645.799,00	$ 578.429.718,63	**$ 4.518.872.292,37**	$ 14.128.947.810,00

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA No. 1557 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA".

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO HAYUELOS - NIT. 901.725.176-8	**LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS - C.C. 9.523864**
Teléfono: 3192451875 Dirección Km 2 vía Cajicá-Chía Ed. Belenus Of 504	Teléfono: 3192451875 Dirección jpena@femeingenieria.com

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR INICIAL:	ADICIONALES MPIO/OTROS:	ADICIONAL CONVENIO	VALOR TOTAL:
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA NIT 891.800.846-1	$ 714.000.000,00	$ 99.369.520,93	**$ 316.275.937,07**	$ 1.129.645.458,00

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1639 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA"

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO TUNJA JI 2 - NIT: 901728023-3	**JORGE E PARRA SALINAS - C.C. 79.262.203**
Teléfono: (601)6129434 Dirección: Cll 125 # 20 70 Of. 602 BOGOTÀ	Teléfono: (601)6129434 Dirección: jpsingenieria@gmail.com.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019


INFORME No:	2	FECHA:	29	de	JULIO	de	2025	
PERIODO: DEL	20	de	JUNIO	de	2025	AL	19	de	JULIO	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025					

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	20	5	2025	17	7	2023	17	7	2023
PLAZO INICIAL	6 MESES			05 MESES, 14 DIAS			05 MESES, 14 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	19	11	2025	31	12	2023	31	12	2023
ADICIONES EN PLAZO	-			15 meses y 16 dias			15 meses y 16 dias		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	19	11	2025	18	9	2025	18	9	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	59,4%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	32,8%	% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO PRINCIPAL CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

De acuerdo al informe No. 2 (acumulado) con corte al 19/07/2025, presentado por el municipio mediante oficio 1.10-3 107 allegado por correo electrónico de fecha 28/07/2025, y según informe de interventoria No. 20 con corte a 16/07/2025, se reporta avance fisico del 59,4% representado en: Excavaciones, Mejoramiento de la Subrasante con Pedraplén Compacto, Suministro, extendido y compactación de afirmado, Suministro, transporte, fabricación, ensamble y montaje de estructura metálica (puente vehicular)

Se realizó visita de campo por parte de la supervisión del convenio, para verificación de avance físico, estado de las obras, y aclaración de no conformidades del informe mensual 1 presentado por el municipio. (ver actas de comité 2 y 3 de fechas 16 y 21 de julio de 2025)

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	20	5	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	06 meses

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**2**	FECHA:	**29**	de	**JULIO**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**20**	de	**JUNIO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**JULIO**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**					

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	882-000060-82	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1940 DE 2025				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
DESEMBOLSO INICIAL (Comprobante Egreso No. 8314)	50%	4	6	2025	$ 2.417.574.114,72
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 2.417.574.114,72**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN			LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
A - ETAPA PRECONTRACTUAL DE OBRA (previa suscripción de convenio)			Proceso Secop: LP-AMT-0012023
B - ETAPA PRECONTRACTUAL DE INTERVENTORIA (previa suscripción de convenio)			Proceso Secop: CM-AMT0022023
C - EJECUCIÓN DE OBRA			
DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD FUNCIONAL Obras calzada sur (eje 1)	AVANCE APROX	%	
1. PAVIMENTACIÓN CALZADA VEHICULAR SUR (K0+070 AL K0+190)			
PRELIMINARES			
Excavación de cortes, canales y prestamos en material común a maquina incluye cargue y acarreo libre de 5 km	(149,48/563) m3	27%	
AFIRMADOS, SUBBASES, BASES		0%	
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para afirmado hasta un diámetro de 2" y un índice plástico igual o menor a 9% y compacto al 95% del proctor (incluye al 5km)	(509,4/1143) m3	45%	K0+085 - K0+132
Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	(11738,76/35160) m3-km	33%	K0+085 - K0+132
CARPETA ASFALTICA		0%	
Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H	(0/1708) m2	0%	
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL			
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
Cerramiento en vara rolliza y lona h=2m.distancia entre postes 3m	(321/388) m	83%	K0+000 - K0+210
Pedraplén compacto	(85,84/276) m	31%	K0+085 - K0+126
2. ESPACIO PÚBLICO (CICLOVIA Y SENDERO PEATONAL - K0+000 AL K0+190)			
PRELIMINARES			
AFIRMADOS, SUBBASES, BASES			
CARPETA ASFALTICA			
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL			
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
3. LOSAS DE ACCESO Y SUPERESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR L= 30M			
PUENTE - CONCRETOS			
PUENTE - SUPERESTRUCTURA			

INFORME No:	**2**	FECHA:	**29**	de	**JULIO**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**JUNIO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**JULIO**	de	**2025**

CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**

Suministro Figurada y Amarre de acero de 60000 psi 420 Mpa	(5000/16059) Kg	31%	
Suministro, transporte, fabricación, ensamblaje y montaje de estructura metálica	(94000/117060) Kg	80%	
PUENTE - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL			
5. PRUEBA DE CARGA			
D - EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA			
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA	2		84 corte a 20/07, 85 corte a 28/07
INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA	2		INFORMES No. 19 Y 20
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA			
SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE, SOCIAL			

Nota: Se relaciona avance de actividades enmarcadas en el convenio, de acuerdo al informe No. 2 (acumulado) presentado por el municipio e informe mensual de interventoria No. 20 corte a 16/07/2025 (balance de obra TOMO 3 pag.90-91)

SOLICITUDES PRESENTADAS

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
21/04/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000559-INFDDIV. SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIACIÓN DE CONVENIO	Oficio 1.10-3.3 408 de fecha 29/04/2025 con radicado interno No. E-2025-025371-VU, allegado por correo electrónico
21/04/2025	SUPERVISOR - SEC.CONTRATACION	RAD. S-2025-000560-INFDDIV. SOLICITUD ACLARACIÓN CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA - SUPERVISIÓN	-
2/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. SU OFICIO No. 1.10-3.3 408 DE FECHA 29/04/2025…	Oficio 1.10-3.030 de fecha 09/05/2025 allegado por correo electrónico
9/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. SU OFICIO No. 1.10-3.030 DE FECHA 09/05/2025	Oficio 1.10-3.039 de fecha 19/05/2025 allegado por correo electrónico (Radicación final de documentos para iniciación de convenio)
22/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000720-INFDDIV. LINEAMIENTOS PARA TRAMITE DE RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO	Oficio ATU2025EE026211 de fecha 27/05/2025 - DOCUMENTOS DESEMBOLSO 50%
22/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000722-INFDDIV. ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES.	-
23/05/2025	SUPERVISOR - SEC.CONTRATACION/Procesos de Selección	Correo electronico. ACTA DE INICIACIÓN DE CONVENIO E INFORME DE SUPERVISIÓN No. 0	-
27/05/2025	SUPERVISOR - TESORERIA/Central de Cuentas	Correo electronico. DESEMBOLSO INICIAL (50%), CONVENIO N° 1940 DE 2025	-

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**2**	FECHA:	**29**	de	**JULIO**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**20** de **JUNIO** de **2025**	AL	**19**	de	**JULIO**	de	**2025**	
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**					

19/06/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000936-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 1 DEL PERIODO 20/05/2025 AL 19/06/2025. DE INFORMES MENSUALES.	Correo electronico de fecha 02/07/2025 - Envío de Informe No.1 Convenio 1940 Gobernación
3/07/2025	SUPERVISOR - TESORERIA	Correo electronico. Solicitud de información cuenta bancaria para devolución de rendimientos financieros	Correo electronico de fecha 03/07/2025 - Certificación cuenta - Traslado al municipio
4/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 079. Actualización de certificación cuenta bancaria para devolución de rendimientos financieros	Correo electronico de fecha 07/07/2025 - Traslado a Tesorería
7/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-001016-INFDDIV. Su correo electrónico de fecha 02/07/2025 – INFORME MENSUAL No. 1 DE INFORMES MENSUALES. (observaciones)	Oficio 1.10-3.087 de fecha 09/07/2025 allegado por correo electrónico
14/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. Su oficio 1.10-3 087 de fecha 09/07/2025…	-
14/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. CONVOCATORIA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EL DIA 16/07/2025	-
23/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 130. Envío informe semanal No. 84	-
25/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 107. Envío informe mensual No. 2	-
28/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 147. Envío informe semanal No. 85	-

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta comité No. 01 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	13	5	2025	Etapa previa iniciación de convenio
Acta comité No. 02 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	16	7	2025	Etapa ejecución
Acta comité No. 03 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	21	7	2025	Etapa ejecución

GOBERNACIÓN DE Boyacá		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**2**	FECHA:	**29**	de	**JULIO**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**20**	de	**JUNIO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**JULIO**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**					

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME N° 01	20	5	2025	19	6	2025	Informe mensual Avance 47.3%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos (NO CONFORMIDADES PENDIENTES POR SUBSANAR EN PROXIMO INFORME)
INFORME N° 02	20	5	2025	19	7	2025	Informe acumulado Avance 59,4%. Formato A-AD-GC-F-045 y anexos

OBSERVACIONES:

1. El municipio de Tunja celebró previamente los contratos de obra e interventoria Nos. 1557 de 2023 y 1639 de 2023 respectivamente, para la "Construcción y mejoramiento del tramo vial de la calle 59 entre la vía antigua a Paipa (Carrera 2 a Este) y la Avenida Universitaria". Previa suscripción del convenio No. 1940 de 2025, el estado y alcance de los contratos citados contempla "la construcción de la calzada Norte con obras de espacio público y puente vehicular 1 sobre el rio jordán, la construcción de la calzada sur entre el K0+000 (sector Carrera 2 y el cruce Férreo K0+075), la construcción de la infraestructura del puente vehicular 2 en la calzada sur (Cimentación y Vigas de Cimentación) y la construcción del cruce férreo. Dichas actividades son financiadas con recursos del municipio y Otros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

2. Con la anterior aclaración y de acuerdo al proyecto de inversión BPIN No. 2024 0415 0443 - A1, se resume el alcance del convenio 1940/2025 mediante la construcción de las siguientes obras en la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30m de luz sobre le rio Jordán, señalización vertical y horizontal, pozos y sumideros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

3. El avance y detalle de la información registrada en el presente informe se encuentra soportado en informe del convenio No. 2 (acumulado) presentado por el municipio y sus correspondientes anexos (informes mensuales de interventoria No. 19 y 20, informes semanales, soportes de seguimiento y ejecución contratos de obra, certificaciones de cumplimiento).

4. Al presente informe se adjunta: actas de comitè 2 y 3, correspondencia enviada y recibida.

ENLACE SECOP (PROCESO CD-GB-1896-2025): https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7883552&isFromPublicArea=True&isModal=False

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	NO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	NO	
Acto administrativo mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	SI	
Copia del Contrato de obra e interventoría	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	NO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	NO	

GOBERNACIÓN DE Boyacá		VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	2	FECHA:	29	de	JULIO	de	2025	
PERIODO: DEL	20	de	JUNIO	de	2025	AL	19	de	JULIO	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025					

Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	
Acta de socialización del contrato de obra	NO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio	SI	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Bitácora de obra	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	SI	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	
Informes laboratorio, pruebas y ensayos realizados para verificar cumplimiento de normas y especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento fichas ambientales)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	SI	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio	SI	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**2**	FECHA:	**29**	de	**JULIO**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**20** de **JUNIO** de **2025**	AL	**19**	de	**JULIO**	de	**2025**	
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**					

El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	**SI**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras	**SI**	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**SI**	
Informes laboratorio, pruebas y ensayos realizados para verificar cumplimiento de normas y especificaciones técnicas	**SI**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Supervisor Departamento

NOMBRE: **Ing. JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO**

ANEXO	INFORME SUPERVISIÓN No	PERIODO		CONVENIO No
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	2	20/06/2025	19/07/2025	1940/2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1.10-3 147

Tunja, 28 de julio de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 85 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 85 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	28	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

SEMANA No. 85 Del 21 DE JULIO DE 2025 Hasta 27 DE JULIO DE 2025

Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato 587 Días Tiempo para la finalización del contrato 53 Días

Nombre del Supervisor: Ing. Jaime Arturo Tovar Rodríguez

Cargo: SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO			EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada(%)	3,00%	89,01%	Obra Ejecutada (%)	1,10%	91,04%
Valor Obra Programada	$ 423.868.434,30	$ 12.576.176.445,68	Valor Obra Ejecutada	$ 155.423.192,00	$ 12.862.786.510,41
Diferencia Semanal		1,90%	Diferencia Acumulada		-2,03%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Constructor	CONSORCIO HAYUELOS	Interventor	CONSORCIO TUNJA JI 2
Contrato N°	1557 DE 2023	Contrato N°	1639 DE 2023
Valor Inicial	$ 9.031.645.799,00	Valor Inicial	$ 714.000.000,00
Valor adición N°1	$ 323.123.318,00	Valor adición N°1	$ 81.452.949,00
Valor adición N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor adición N°2	$ 334.192.509,00
Valor Actualizado	$ 14.128.947.810,00	Valor Actualizado	$ 1.129.645.458,00
Plazo Inicial	5.48 Meses	Plazo Inicial	5.48 Meses
Fecha de Inicio	17/07/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023	Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023
Prorroga 1	1/01/2024	Prorroga 1	1/01/2024
Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses	Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses
Prorroga 2	28/05/2024	Prorroga 2	28/05/2024
Tiempo Prorroga 2	1 Mes	Tiempo Prorroga 2	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024
Prorroga 3	10/06/2024	Prorroga 3	10/06/2024
Tiempo Prorroga 3	1 Mes	Tiempo Prorroga 3	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024
Prorroga 4	15/08/2024	Prorroga 4	15/08/2024
Tiempo Prorroga 4	1 Mes	Tiempo Prorroga 4	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024
Suspensión 1	3/09/2024	Suspensión 1	3/09/2024
Tiempo Suspensión 1	15 Días	Tiempo Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024	Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024
Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024	Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 17/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 1	HASTA 17/10/2024
Acta de Reinicio N°1	17/10/2024	Acta de Reinicio N°1	17/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	28	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Valor Adicional N°1	$	323.123.318,00	Valor Adicional N°1	$	81.452.949,00
Prorroga 5		17/10/2024	Prorroga 5		17/10/2024
Tiempo Prorroga 5		15 Días	Tiempo Prorroga 5		15 Días
Suspensión 2		8/11/2024	Suspensión 2		8/11/2024
Tiempo Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024	Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025
Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025	Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025
Acta de Reinicio N°2		3/02/2025	Acta de Reinicio N°2		3/02/2025
Suspensión 3		4/02/2025	Suspensión 3		4/02/2025
Tiempo Suspensión 3		25 Días	Tiempo Suspensión 3		25 Días
Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025	Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025
Acta de Reinicio N°3		28/02/2025	Acta de Reinicio N°3		28/02/2025
Prorroga 6		28/02/2025	Prorroga 6		28/02/2025
Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses	Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses
Valor Adicional N°2	$	4.774.178.693,00	Valor Adicional N°2	$	334.192.509,00
Fecha de Terminación Final		HASTA 18/09/2025	Fecha de Terminación Final		HASTA 18/09/2025
Anticipo		N/A	Anticipo		N/A
% Avance del Anticipo		N/A	% Avance del Anticipo		N/A
Acta Parcial N° 1	$	1.807.173.935,00	Acta Parcial N° 1	$	142.866.784,00
Acta Parcial N° 2	$	3.276.730.721,00	Acta Parcial N° 2	$	259.043.123,00
Acta Parcial N° 3	$	1.235.393.508,00	Acta Parcial N° 3	$	97.664.477,00
Acta Parcial N° 4	$	890.165.121,00	Acta Parcial N° 4	$	70.372.323,00
Acta Parcial N° 5	$	968.072.877,00	Acta Parcial N° 5	$	76.531.321,00
Acta Parcial N° 6	$	879.018.416,00	Acta Parcial N° 6	$	69.429.626,00
Valor Actas Parciales	$	9.056.554.578,00	Valor Actas Parciales	$	715.907.654,00
Saldo	$	5.072.393.232,00	Saldo	$	413.737.804,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 85

Lunes 21/07/2025: Continúan las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Inician las actividades de amarre de acero de refuerzo para el espaldar del estribo norte del puente en el Eje 1.

Martes 22/07/2025: Continúan las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Inician las actividades de amarre de acero de refuerzo para el espaldar del estribo norte del puente en el Eje 1. Suministro de piezas prefabricadas de concreto a obra. (Bordillos para espacio publico).

Miércoles 23/07/2025: Continúan las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Inician las actividades de amarre de acero de refuerzo para el espaldar del estribo norte del puente en el Eje 1. Excavación para instalación de piezas prefabricadas de concreto en el espacio publico del Eje 1. (Bordillos)

Jueves 24/07/2025: Continúan las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Inician las actividades de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaleta para el espaldar del estribo norte del puente en el Eje 1. Excavación para instalación de piezas prefabricadas de concreto en el espacio publico del Eje 1. (Bordillos)

Viernes 25/07/2025: Culminan las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Inician las actividades de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaleta para el espaldar del estribo norte del puente en el Eje 1.

Sábado 26/07/2025: Continúan actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Inician las actividades de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaleta para el espaldar del estribo norte del puente en el Eje 1.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	28	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CANTIDADES SEMANA N° 85

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA					SEMANA 85		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECCIÓN 01 - CONSTRUCCIÓN CALLE 59						**$ 16.114.280,00**		**$ 167.755.291,20**
EXPLANACIONES								
2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 14.486,00	0,00	$ -	556,00	$ 8.054.216,00
Subtotal						$ -		**$ 8.054.216,00**
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES								
6	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	$ 91.500,00	90,00	$ 8.235.000,00	694,00	$ 63.501.000,00
9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	0,00	$ -	16.554,00	$ 33.108.000,00
Subtotal						**$ 8.235.000,00**		**$ 96.609.000,00**
CARPETA ASFALTICA								
10	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	$ 4.265,00	0,00	$ -	205,00	$ 874.325,00
Subtotal						$ -		**$ 874.325,00**
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL								
21	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	22,00	$ 1.980.000,00	22,00	$ 1.980.000,00
22	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	17,00	$ 1.530.000,00	17,00	$ 1.530.000,00
24	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	$ 54.616,00	80,00	$ 4.369.280,00	80,00	$ 4.369.280,00
Subtotal						**$ 7.879.280,00**		**$ 7.879.280,00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-4_01	**REF 3.13.19**	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	$ 39.106,00	0,00	$ -	321,00	$ 12.553.026,00
NP-5_01	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 155.207,00	0,00	$ -	267,00	$ 41.440.269,00
107	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	0,00	$ -	7,20	$ 345.175,20
Subtotal						$ -		**$ 54.338.470,20**
SECCIÓN 02 - CONSTRUCCION PUENTES						**$ 139.308.912,00**		**$ 3.687.702.927,00**
SUPERESTRUCTURA								
38	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	0,00	$ -	5.500,00	$ 44.660.000,00
39	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	$ 29.000,00	4.484,00	$ 130.036.000,00	117.000,00	$ 3.393.000.000,00
Subtotal						**$ 130.036.000,00**		**$ 3.437.660.000,00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-48_02	**REF 3.13.43 3.12.06 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	UND	$ 1.516.178,00	0,00	$ -	4,00	$ 6.064.712,00
NP-50_02	**REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT**	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	LT	$ 31.111,00	0,00	$ -	65,00	$ 2.022.215,00
VAR.1	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE LUZ 30M	KG	$ 2.068,00	4.484,00	$ 9.272.912,00	117.000,00	$ 241.956.000,00
Subtotal						**$ 9.272.912,00**		**$ 250.042.927,00**
			SUBTOTAL OBRAS			**$ 155.423.192,00**		**$ 3.855.458.218,20**

ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (OBRA)	$ 146.150.280,00	80%	**$ 3.613.502.218,20**
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (INTERVENTORIA)		80%	**$ 252.909.072,49**
TOTAL ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025		80%	**$ 3.866.411.290,69**
TOTAL RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025			**$ 4.835.148.229,44**
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (OBRA)			$ 4.518.872.292,37
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (INTERVENTORIA)			$ 316.275.937,07
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA ADICION N°3	$ 9.272.912,00		**$ 241.956.000,00**
TOTAL RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			**$ 273.222.972,56**
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (OBRA) ADICION N°3			$ 255.306.400,63
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			$ 17.916.571,93
TOTAL ADICION N°3 (OBRA)			**$ 4.774.178.693,00**
TOTAL ADICION N°3 (INTERVENTORIA)			**$ 334.192.509,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA			**$ 14.128.947.810,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			**$ 1.129.645.458,00**

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	28	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Lunes 28/07/2025: Realizar vaciado de Concreto primera parte de espaldar estribo norte Eje 1. Continuar con las actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Iniciar actividades de amarre de acero de refuerzo para la placa del puente.

Martes 29/07/2025: Continuar con las actividades de de amarre de acero de refuerzo para la placa del puente. Continuar con las actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo.

Miércoles 30/07/2025: Continuar con las actividades de de amarre de acero de refuerzo para la placa del puente. Iniciar con las actividades de instalación de prefabricados de concreto del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo.

Jueves 31/07/2025: Continuar con las actividades de de amarre de acero de refuerzo para la placa del puente. Iniciar con las actividades de instalación de prefabricados de concreto del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo.

Viernes 01/08/2025: Continuar con las actividades de de amarre de acero de refuerzo para la placa del puente. Iniciar con las actividades de instalación de prefabricados de concreto del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo.

Sábado 02/08/2025: Continuar con las actividades de de amarre de acero de refuerzo para la placa del puente. Iniciar con las actividades de instalación de prefabricados de concreto del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA N° 85

SUMINISTRO E INSTALACION LAMINAS DE METALDECK Y CONECTORES DE LA ESTRUCTURA METALICA








AMARRE DE ACERO DE REFUERZO E INSTALACION DE FORMALETAS PARA ESPALDAR ESTRIBO NORTE EJE 1



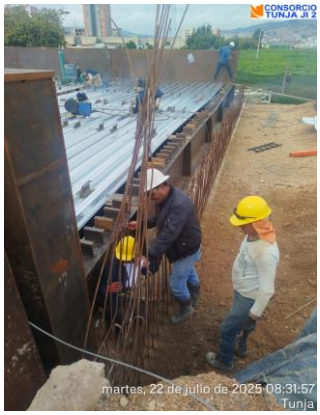



ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	28	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CONFORMACION ESPACIO PUBLICO EJE 1 COSTADO DERECHO, ENTRE CRA 2A Y CRUCE FERREO







SUMINISTRO Y EXCAVACION PARA INSTALACION DE BORDILLOS ESPACIO PUBLICIO EJE 1







Elaboró ING RICHARD A. ACOSTA T.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: ING CESAR A. PALACIOS W.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1.10-3 107

Tunja, 25 de julio de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío Informe Mensual No. 2 del Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe No. 2, correspondiente al seguimiento técnico y administrativo del convenio interinstitucional del asunto, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Mayor de Tunja, cuyo objeto es la terminación de las obras de infraestructura vial en la calle 59 de esta ciudad. El presente informe contiene el estado actual de ejecución, actividades desarrolladas, avances físicos y financieros, así como el seguimiento de la documentación pertinente para el adecuado desarrollo del proyecto.

Para acceder a la documentación de los contratos en Secop II, por favor siga estas recomendaciones:

Dado que en ocasiones los links no funcionan, se colocaron los nombres exactos de los procesos en el archivo del informe en excel, para ser copiados en la celda correspondiente a Datos de Proceso en la página Secop II, cambiando la fecha de publicación hacia 2020 y el boton Buscar, debe llevarlo al proceso.



Enseguida cambiar el año de publicación a 2020, para este caso



NIT.891800846-1
Carrera 9 # 19-56 Casa del Fundador Tunja - Boyacá
Tel: 7405770 atencionalciudadano@tunja.gov.co
www.tunja-boyaca.gov.co

Luego hay que entrar al detalle del proceso:



Buscar resultados (Buscar resultados por *Filtrando en:* Recientes)

Borrar búsqueda Guardar búsqueda

	País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	
☆	COLOMBIA	MUNICIPIO DE TUNJA/	LP-AMT-0012023 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA -	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	14/03/2023 9:43:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/04/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Se debe entrar al apartado de Selección de la siguiente manera:



Selección — Volver al principio

Selección e información de contratación

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección		Valor	Estado de la selección
CO1.AWD.1597302	8/06/2023 7:14 PM		9.031.645.799 COP	Activo
Informe de evaluación	21/04/2023 8:24 PM	Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar		
Informe de evaluación	18/05/2023 7:09 PM	Descargar		
Informe de evaluación	7/06/2023 10:09 PM	Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar		
Informe de selección	8/06/2023 7:14 PM	Descargar		

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos	
CONSORCIO HAYUELOS	9.031.645.799 COP	Descargar Descargar	Ver contrato

Finalmente entrando a "Ver contrato", se desplegarán todos los documentos del contrato en ejecución, incluyendo las actas de pago.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

Outlook

Informe No. 2 Convenio 1940 de 2025 Gob. Boyacá / Alc. Tunja

Desde Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>
Fecha Lun 28/07/2025 14:14
Para JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
CC Apoyo_Infraestructura_JT <apoyo.infraestructura.jt@gmail.com>

4 archivos adjuntos (3 MB)

AADGCF045INFORMEALCONVENIOPORPARTEDELMUNICIPIOV0T02_1 (1).xls; AADGCF045INFORMEALCONVENIOPORPARTEDELMUNICIPIOV0T02_1_Signed.pdf; S-2025-000722-INFDDIV-INDICE_2.pdf; 110-3 107_Oficio_Inf_Gob_01_03_250725_081705.pdf;

Estimado Ing. Alba, buenas tardes

Remitimos Informe No. 2 del Convenio 1940-2025 cuyo objeto es CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

En el adjunto se encuentran 5 tomos con los anexos solicitados tanto en el informe como en el oficio S-2025-000722-INFDDIV.

Se anexa a este correo el Oficio Remisorio 1.10-3 107, el Formato_A-AD-GC-F-045 tanto en PDF como el archivo raíz de excel.

Por favor confirme el recibido de este mensaje y déjenos saber sus comentarios.

Inf_2_Tomo_1.pdf

Inf_2_Tomo_2.pdf

Inf_2_Tomo_3.pdf

Inf_2_Tomo_4.pdf

Inf_2_Tomo_5.pdf

Cordialmente.

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial

Alcaldía Mayor de
Tunja

1.10-3 130

Tunja, 23 de julio de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 84 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 84 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	21	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

SEMANA No. 84 Del 14 DE JULIO DE 2025 Hasta 20 DE JULIO DE 2025

Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato 580 Días Tiempo para la finalización del contrato 60 Días

Nombre del Supervisor: Ing. Jaime Arturo Tovar Rodríguez

Cargo: SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO			EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada(%)	2,80%	86,01%	Obra Ejecutada (%)	4,10%	89,94%
Valor Obra Programada	$ 395.610.538,68	$ 12.152.308.011,38	Valor Obra Ejecutada	$ 578.996.087,20	$ 12.707.363.318,41
Diferencia Semanal		-1,30%	Diferencia Acumulada		-3,93%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Constructor	CONSORCIO HAYUELOS	Interventor	CONSORCIO TUNJA JI 2
Contrato N°	1557 DE 2023	Contrato N°	1639 DE 2023
Valor Inicial	$ 9.031.645.799,00	Valor Inicial	$ 714.000.000,00
Valor adición N°1	$ 323.123.318,00	Valor adición N°1	$ 81.452.949,00
Valor adición N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor adición N°2	$ 334.192.509,00
Valor Actualizado	$ 14.128.947.810,00	Valor Actualizado	$ 1.129.645.458,00
Plazo Inicial	5.48 Meses	Plazo Inicial	5.48 Meses
Fecha de Inicio	17/07/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023	Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023
Prorroga 1	1/01/2024	Prorroga 1	1/01/2024
Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses	Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses
Prorroga 2	28/05/2024	Prorroga 2	28/05/2024
Tiempo Prorroga 2	1 Mes	Tiempo Prorroga 2	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024
Prorroga 3	10/06/2024	Prorroga 3	10/06/2024
Tiempo Prorroga 3	1 Mes	Tiempo Prorroga 3	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024
Prorroga 4	15/08/2024	Prorroga 4	15/08/2024
Tiempo Prorroga 4	1 Mes	Tiempo Prorroga 4	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024
Suspensión 1	3/09/2024	Suspensión 1	3/09/2024
Tiempo Suspensión 1	15 Días	Tiempo Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024	Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024
Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024	Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 17/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 1	HASTA 17/10/2024
Acta de Reinicio N°1	17/10/2024	Acta de Reinicio N°1	17/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	21	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Valor Adicional N°1	$	323.123.318,00	Valor Adicional N°1	$	81.452.949,00
Prorroga 5		17/10/2024	Prorroga 5		17/10/2024
Tiempo Prorroga 5		15 Días	Tiempo Prorroga 5		15 Días
Suspensión 2		8/11/2024	Suspensión 2		8/11/2024
Tiempo Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024	Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025
Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025	Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025
Acta de Reinicio N°2		3/02/2025	Acta de Reinicio N°2		3/02/2025
Suspensión 3		4/02/2025	Suspensión 3		4/02/2025
Tiempo Suspensión 3		25 Días	Tiempo Suspensión 3		25 Días
Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025	Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025
Acta de Reinicio N°3		28/02/2025	Acta de Reinicio N°3		28/02/2025
Prorroga 6		28/02/2025	Prorroga 6		28/02/2025
Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses	Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses
Valor Adicional N°2	$	4.774.178.693,00	Valor Adicional N°2	$	334.192.509,00
Fecha de Terminación Final		HASTA 18/09/2025	Fecha de Terminación Final		HASTA 18/09/2025
Anticipo		N/A	Anticipo		N/A
% Avance del Anticipo		N/A	% Avance del Anticipo		N/A
Acta Parcial N° 1	$	1.807.173.935,00	Acta Parcial N° 1	$	142.866.784,00
Acta Parcial N° 2	$	3.276.730.721,00	Acta Parcial N° 2	$	259.043.123,00
Acta Parcial N° 3	$	1.235.393.508,00	Acta Parcial N° 3	$	97.664.477,00
Acta Parcial N° 4	$	890.165.121,00	Acta Parcial N° 4	$	70.372.323,00
Acta Parcial N° 5	$	968.072.877,00	Acta Parcial N° 5	$	76.531.321,00
Acta Parcial N° 6	$	879.018.416,00	Acta Parcial N° 6	$	69.429.626,00
Valor Actas Parciales	$	9.056.554.578,00	Valor Actas Parciales	$	715.907.654,00
Saldo	$	5.072.393.232,00	Saldo	$	413.737.804,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 84

Lunes 14/07/2025: Continúan las actividades de desplazamiento de la estructura metálica del puente a su sitio de disposición final.

Martes 15/07/2025: Concluyen las actividades de desplazamiento de la estructura metálica del puente a su sitio de disposición final. Inician actividades de excavación mecánica para la conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Inician actividades de construcción del muro de contención paralelo al puente de 35 mts en el costado derecho.

Miércoles 16/07/2025: Inician las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan actividades de excavación mecánica para la conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continúan las actividades de construcción del muro de contención paralelo al puente de 35 mts en el costado derecho. Se recibe visita a la Obra por parte del Secretario de Infraestructura, la Supervisión de la Gobernación de Boyacá y la Supervisión de la Alcaldía de Tunja. Llegan a obra las laminas de Metaldeck para la estructura de la placa del puente.

Jueves 17/07/2025: Continúan las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continúan las actividades de construcción del muro de contención paralelo al puente de 35 mts en el costado derecho.

Viernes 18/07/2025: Continúan las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continúan las actividades de construcción del muro de contención paralelo al puente de 35 mts en el costado derecho.

Sábado 19/07/2025: Continúan las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continúan las actividades de construcción del muro de contención paralelo al puente de 35 mts en el costado derecho.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	21	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CANTIDADES SEMANA N° 84

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA					SEMANA 84		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECCIÓN 01 - CONSTRUCCIÓN CALLE 59						**$ 9.647.375,20**		**$ 151.641.011,20**
EXPLANACIONES								
2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 14.486,00	200,00	$ 2.897.200,00	556,00	$ 8.054.216,00
Subtotal						**$ 2.897.200,00**		**$ 8.054.216,00**
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES								
6	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	$ 91.500,00	70,00	$ 6.405.000,00	604,00	$ 55.266.000,00
9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	0,00	$ -	16.554,00	$ 33.108.000,00
Subtotal						**$ 6.405.000,00**		**$ 88.374.000,00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-4_01	**REF 3.13.19**	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	$ 39.106,00	0,00	$ -	321,00	$ 12.553.026,00
NP-5_01	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 155.207,00	0,00	$ -	267,00	$ 41.440.269,00
107	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	7,20	$ 345.175,20	7,20	$ 345.175,20
Subtotal						**$ 345.175,20**		**$ 54.338.470,20**
SECCIÓN 02 - CONSTRUCCION PUENTES						**$ 569.348.712,00**		**$ 3.548.394.015,00**
SUPERESTRUCTURA								
38	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	500,00	$ 4.060.000,00	5.500,00	$ 44.660.000,00
39	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	$ 29.000,00	18.000,00	$ 522.000.000,00	112.516,00	$ 3.262.964.000,00
Subtotal						**$ 526.060.000,00**		**$ 3.307.624.000,00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-48_02	**REF 3.13.43 3.12.06 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	UND	$ 1.516.178,00	4,00	$ 6.064.712,00	4,00	$ 6.064.712,00
NP-50_02	**REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT**	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	LT	$ 31.111,00	0,00	$ -	65,00	$ 2.022.215,00
VAR. 1	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE LUZ 30M	KG	$ 2.068,00	18.000,00	$ 37.224.000,00	112.516,00	$ 232.683.088,00
Subtotal						**$ 43.288.712,00**		**$ 240.770.015,00**
			SUBTOTAL OBRAS			**$ 578.996.087,20**		**$ 3.700.035.026,20**

ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (OBRA)	$ 541.772.087,20	**77%**	**$ 3.467.351.938,20**
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (INTERVENTORIA)		**77%**	**$ 242.680.012,28**
TOTAL ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025		**77%**	**$ 3.710.031.950,48**
TOTAL RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025			**$ 4.835.148.229,44**
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (OBRA)			$ 4.518.872.292,37
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (INTERVENTORIA)			$ 316.275.937,07
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA ADICION N°3	$ 37.224.000,00		**$ 232.683.088,00**
TOTAL RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			**$ 273.222.972,56**
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (OBRA) ADICION N°3			$ 255.306.400,63
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			$ 17.916.571,93
TOTAL ADICION N°3 (OBRA)			**$ 4.774.178.693,00**
TOTAL ADICION N°3 (INTERVENTORIA)			**$ 334.192.509,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA			**$ 14.128.947.810,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			**$ 1.129.645.458,00**

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	21	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Lunes 21/07/2025: Continuar con las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continuar con las actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuar las actividades de construcción del muro de contención paralelo al puente de 35 mts en el costado derecho.

Martes 22/07/2025: Continuar con las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continuar con las actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuar las actividades de construcción del muro de contención paralelo al puente de 35 mts en el costado derecho.

Miércoles 23/07/2025: Continuar con las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continuar con las actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuar las actividades de construcción del muro de contención paralelo al puente de 35 mts en el costado derecho.

Jueves 24/07/2025: Dar por terminadas las actividades de instalación de las laminas de Metaldeck sobre la estructura metálica del puente. Continuar con las actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo.

Viernes 25/07/2025: Continuar con las actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Iniciar con las actividades de amarre de acero de refuerzo en la parte de los espaldares faltantes en los estribos del puente.

Sábado 26/07/2025: Continuar con las actividades de conformación del espacio público en el Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuar con las actividades de amarre de acero de refuerzo en la parte de los espaldares faltantes en los estribos del puente.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA N° 84

DESPLAZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE A SU SITIO FINAL







SUMINISTRO E INSTALACION LAMINAS DE METALDECK







ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	21	7	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CONFORMACION ESPACIO PUBLICO EJE 1 COSTADO DERECHO, ENTRE CRA 2A Y CRUCE FERREO







CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARALELO AL PUENTE DE 35 M







Elaboró ING RICHARD A. ACOSTA T.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: ING CESAR A. PALACIOS W.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja, 15 de julio de 2025

ATU2025ER036655
ATU2025EE035506

Señores
GOBERNACION DE BOYACA
contactenos@boyaca.gov.co
Tunja, Boyacá

Asunto: Respuesta a oficio S-2025-001016-INFDDIV del 07-Jul-2025

Este requerimiento se respondido mediante ATU2025ER036620 el día 15/Jul/2025.

Se anexó el Oficio Remisorio 1.10-3 087, el Formato_A-AD-GC-F-045 tanto en PDF firmado como el archivo raíz de excel, el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°19 y La certificación de la correcta ejecución de los recursos asignados al Convenio No. 1940-2025 debidamente firmada.

Atentamente,



LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Proyectó: JAIME ARTURO TOVAR RODRIGUEZ
Revisó: LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA

Anexos: 110-3 087_Oficio_Inf_Gob_01_02-1_250709_165500.pdf

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja, 16 de julio de 2025

ATU2025ER036620
ATU2025EE035502

Señores
GOBERNACION DE BOYACA
contactenos@boyaca.gov.co
Tunja, Boyacá

Asunto: Respuesta a oficio S-2025-001016-INFDDIV del 07-Jul-2025

Radicado: ATU2025ER036620

Referencia: Respuesta a oficio S-2025-001016-INFDDIV del 07-Jul-2025

Este oficio fue respondido en el correo de fecha 09-Jul-2025 con el oficio remisorio 1.10-3 087. Donde se envía la atención a observaciones del informe No. 1 del Convenio 1940-2025 cuyo objeto es CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

En el adjunto se encuentran 6 tomos con los anexos solicitados tanto en el informe como en el oficio S-2025-000722-INFDDIV.

Se anexó el Oficio Remisorio 1.10-3 087, el Formato_A-AD-GC-F-045 tanto en PDF firmado como el archivo raíz de excel, el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°19 y La certificación de la correcta ejecución de los recursos asignados al Convenio No. 1940-2025 debidamente firmada.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Proyectó: JAIME ARTURO TOVAR RODRIGUEZ
Revisó: LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA

Anexos: 110-3 087_Oficio_Inf_Gob_01_02-1_250709_165500.pdf

ANEXO	INFORME SUPERVISIÓN No	PERIODO		CONVENIO No
ACTAS DE COMITÉ	2	20/06/2025	19/07/2025	1940/2025

ACTAS DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE JULIO DE 2025
CONVENIO N°	1940 DE 2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:
No aplica

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
No aplica	No aplica

DESARROLLO DEL COMITÉ

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	RESPONSABLE
002	Obra calle 59	16/07/2025	7:30am	9:00am	Secretaria de Infraestructura GB

OBJETIVOS:

- Conocer estado de avance físico de las actividades contempladas en el convenio.
- Realizar reconocimiento e inspección visual de las obras
- Revisar los términos de subsanación de las observaciones realizadas hasta la fecha por la supervisión del Departamento, para atención de los requerimientos S-2025-000772-INFDDIV de fecha 22/05/2025, S-2025-001016-INFDDIV de fecha 07/07/2025 y oficio remitido por correo electrónico de fechas 14/07/2025, relacionados con la presentación de informes mensuales del convenio.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes
2. Información estado de avance físico de actividades del convenio
3. Recorrido de campo
4. Aclaración de no conformidades del informe mensual 1 presentado por el municipio

CONTENIDO:

Se realiza una breve presentación de los asistentes a la reunión, destacando la participación del Ing. Leonardo Álvarez Fonseca/Secretario de Infraestructura Pública del Departamento, y el Ing. Jaime Tovar, nuevo profesional de apoyo a la supervisión por parte de la Alcaldía.

Estado de avance físico de actividades del convenio

El supervisor del departamento precisa el alcance de las actividades del convenio, financiadas con recursos del Departamento, las cuales corresponden a la construcción de las siguientes obras de la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30m de luz sobre le rio Jordán, señalización vertical y horizontal de la calzada vehicular y ciclovia, y los pozos y sumideros de la calzada sur.

La Interventoría informa, que actualmente el estado de los contratos es EN EJECUCIÓN, se presenta un avance físico general del contrato de obra correspondiente a 86% respecto de un porcentaje programado del 83%, y la fecha de terminación actual es el día 18/09/2025. Aclara, que concretamente las actividades enmarcadas en el convenio suscrito con el Departamento, presentan a la fecha un avance aproximado del 73%, representado en: excavaciones (150m3), afirmado (510m3), y transporte de afirmado (11.740 m3-Km), cerramiento (321m), pedraplen (86m3), acero refuerzo 60000PSI - 420Mpa (5.000Kg), estructura metálica (94.000Kg), apoyos elastómeros (4und), y mortero grouting anclajes y rellenos (65Lt). Destaca el avance en el ítem de estructura metálica y la proyección en trámite de acta parcial de obra, para gestión de cuenta por parte del municipio ante el Departamento. Finalmente, manifiesta que se han realizado las revisiones y controles técnicos necesarios, verificando el cumplimiento de especificaciones de materiales y procedimientos constructivos, acorde a los planos y normas vigentes.

El contratista expresa que a pesar de las dificultades por la presencia de lluvias especialmente en la jornada de la tarde, se ha logrado cumplir la ruta crítica de la programación de obra y prácticamente el avance en la estructura metálica del puente a la fecha alcanza un 80%. Una vez culminado el hito correspondiente al puente vehicular, se realizará reposición y reconformación de la capa granular de afirmado instalada, para garantizar condiciones adecuadas previa construcción de la estructura del pavimento. Manifiesta su disposición y actitud proactiva para los requerimientos que le competan respecto a la gestión documental de informes.

El secretario de infraestructura destaca la importancia de garantizar la terminación y recibo de las obras en el término actual del convenio, en condiciones integrales de funcionalidad, calidad y durabilidad. Igualmente resalta la necesidad de acatar las instrucciones de la supervisión por parte del Departamento, en particular la adecuada presentación de informes por parte del municipio, facilitando de esta manera el seguimiento del convenio y el desarrollo de los procedimientos administrativos para el flujo oportuno de recursos.

Recorrido de Campo.

Se hace el recorrido e inspección visual en obra, verificando el avance según lo informado por contratista e interventoría, se observan condiciones adecuadas de ejecución, disponibilidad de materiales, maquinaria, equipos, y personal, campamento, señalización informativa y preventiva.

No conformidades del informe mensual 1 presentado por el municipio

Ante la persistencia de no conformidades en la presentación de informes por parte del municipio, el supervisor del Departamento realiza aclaraciones relevantes sobre las observaciones realizadas hasta la fecha, destacando la necesidad de cumplir los tiempos de radicación para validación y cargue de información en SECOP II, el correcto diligenciamiento del formato A-AD-GC-F-045, adjuntando los soportes y evidencias requeridos, de la ejecución y seguimiento de los contratos de obra e interventoría, con enfoque explícito en el desarrollo de las actividades incluidas en el alcance del convenio. Para tal fin, reitera que es fundamental que el desarrollo técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal de los contratos de obra e interventoría suscritos por el municipio, permita identificar claramente la ejecución de los recursos del convenio, por lo cual recomienda a la interventoría particularizar y precisar en los informes, actas, y documentos de seguimiento, las actividades enmarcadas en el convenio No. 1940/2025.

Se acuerda realizar reunión específica para revisión completa y pormenorizada de cada uno de los requisitos y condiciones de presentación del informe mensual por parte del municipio al Departamento, el día lunes 21/07/2025 a las 2:00pm en instalaciones de la Gobernación o Alcaldía, según disponibilidad de espacio.





Finalmente, la supervisión del Departamento REQUIERE al municipio la remisión de copia de informes semanales de interventoría, el primer día hábil de cada semana al correo juan.alba@boyaca.gov.co, a partir del día lunes 21/07/2025 y hasta la terminación de las obras, que incluya como mínimo: Información básica de los contratos de obra e interventoría (No. Contrato, Valor actual, Contratista, Interventor/Supervisor, Fecha terminación actual), descripción semana del informe (Número, periodo de corte), control de ejecución, seguimiento de la programación de obra, detalle de avance de actividades del convenio (en la semana, acumuladas, y programadas semana siguiente), Observaciones y aclaraciones, y registro fotográfico representativo.

Se anexa a la presente un registro fotográfico de la visita de campo.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	Previa convocatoria

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Reunión para revisión detallada de requisitos de presentación informes.	21/07/2025 (2:00 p.m)	Supervisores Gobernación – Municipio, Interventoría, Contratista
Presentación copia de informes semanales	21/07/2025	Supervisor Municipio

PARTICIPANTES			
NOMBRE	**CARGO**	**CELULAR**	**FIRMA**
Javier Mauricio Rodríguez	Residente de Obra – Consorcio Hayuelos – Cto 1557 de 2023	3192451875	
Richard Alexander Acosta	Residente de Interventoría – Consorcio Tunja JI2 – Cto 1639 de 2023	3105506097	
Jaime Tovar	Profesional de Apoyo a la Supervisión – Sec. Infraestructura Tunja	3103105035	
Juan Pablo Alba Figueredo	Supervisor/Secretaria Infraestructura Pública – Gobernación de Boyacá	3112683221	
José Leonardo Alvarez Fonseca	Secretario Infraestructura Pública – Gobernación de Boyacá		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Fotos 1 y 2. Estado actual obras calle 59, calzada Norte entre Av. Universitaria y Conj. Residencial Hayuelos (Excavaciones, maquinaria, equipo y personal en obra)

REGISTRO FOTOGRAFICO







Fotos 3 y 4. Estado actual obras calle 59, calzada Norte entre Av. Universitaria y Conj. Residencial Hayuelos (Afirmado, cerramiento, campamento, material acopiado en obra)

REGISTRO FOTOGRAFICO




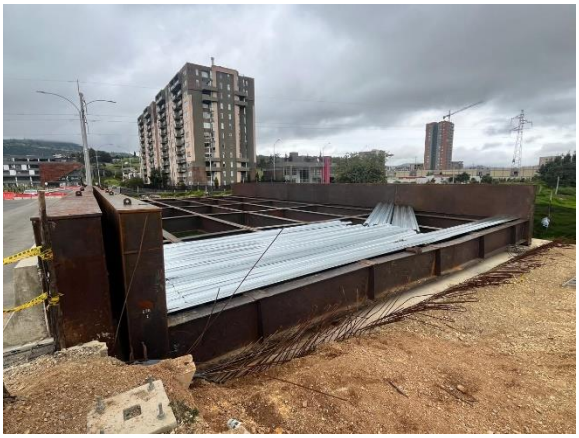

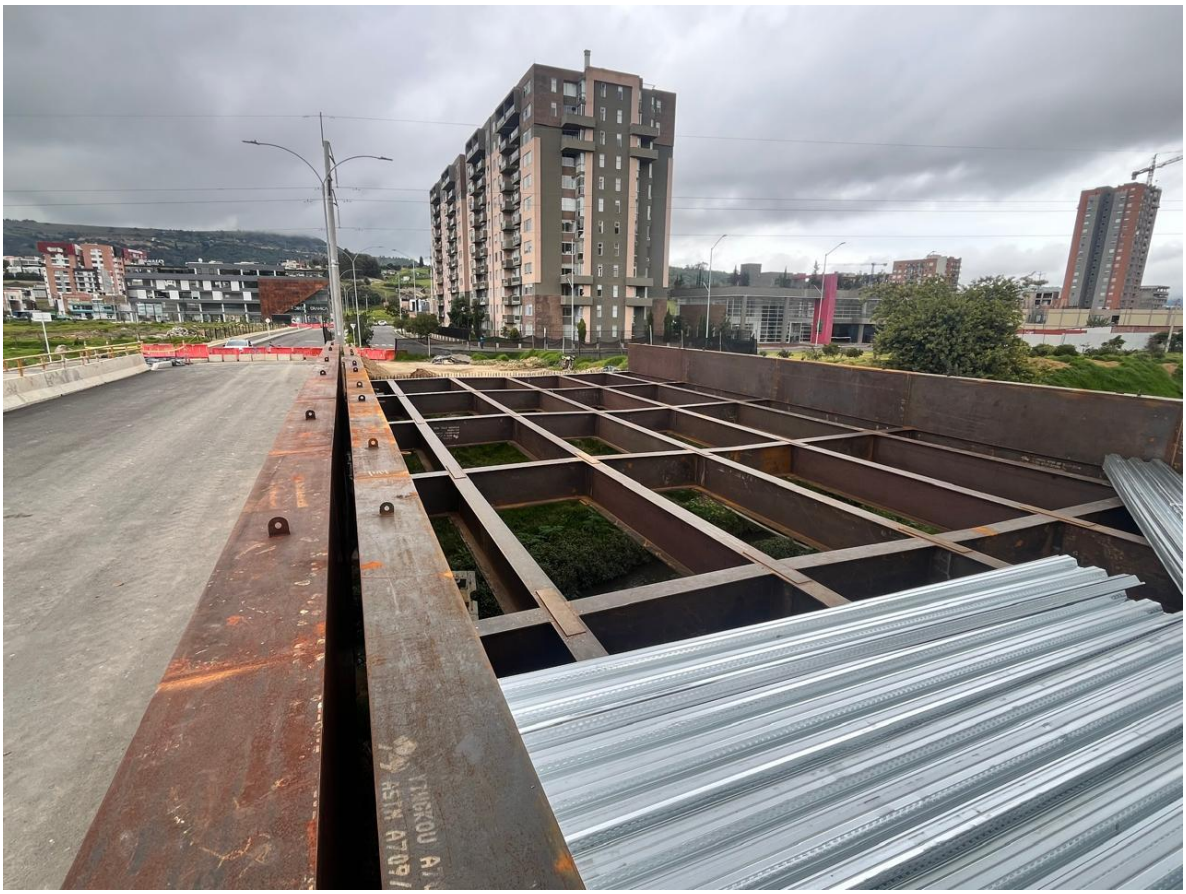

Fotos 5 a 7. Estado actual obras calle 59, calzada Norte entre Av. Universitaria y Conj. Residencial Hayuelos (Estructura metálica puente vehicular)

REGISTRO FOTOGRAFICO

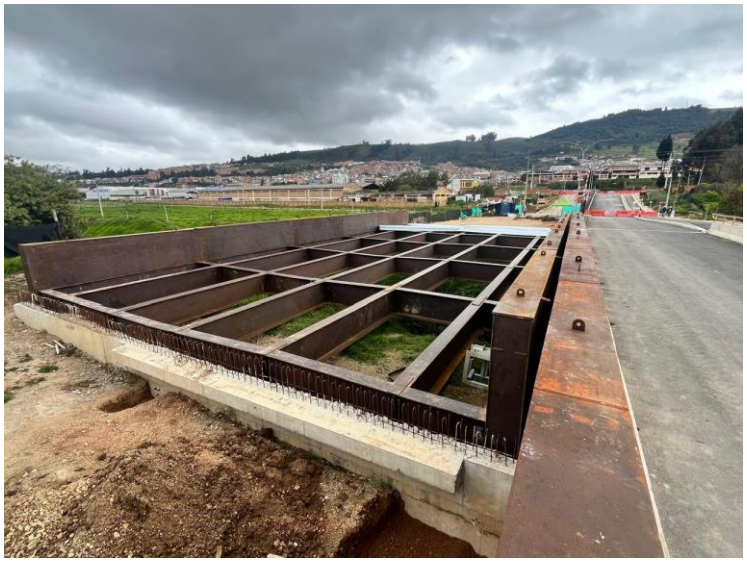









Fotos 8 a 12. Estado actual obras calle 59, calzada Norte entre Av. Universitaria y Conj. Residencial Hayuelos
(Estructura metálica puente vehicular – Participación y asistencia)

FECHA PRESENTE ACTA:	21 DE JULIO DE 2025
CONVENIO N°	1940 DE 2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:
No aplica

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
Reunión para revisión detallada de requisitos de presentación informes.	Realizada

DESARROLLO DEL COMITÉ

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	RESPONSABLE
003	Gobernación Boyacá, Palacio de La Torre, Secretaria Infraestructura	21/07/2025	2:00pm	3:30pm	Secretaria de Infraestructura GB

OBJETIVOS:

- Revisión y aclaración de lineamientos y requisitos para presentación de informes de convenio.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión lineamientos previos
2. Aclaración de observaciones y no conformidades informe No. 1

CONTENIDO:


De acuerdo a los compromisos del acta anterior, se llevó a cabo reunión específica para revisión completa y pormenorizada de cada uno de los requisitos y condiciones de presentación del informe mensual por parte del municipio al Departamento, y se aclaran las observaciones realizadas por la supervisión sobre el

informe mensual 1 presentado por el municipio.	
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	Previa convocatoria

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Presentación copia de informes semanales de interventoría	21/07/2025	Supervisor Municipio
Presentación de informes mensual acumulado No. 2 con corte a 19/07/2025	25/07/2025	Supervisor Municipio

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
Javier Mauricio Rodríguez	Residente de Obra – Consorcio Hayuelos – Cto 1557 de 2023	3192451875	
Richard Alexander Acosta	Residente de Interventoría – Consorcio Tunja JI2 – Cto 1639 de 2023	3105506097	
Jaime Tovar	Profesional de Apoyo a la Supervisión – Sec. Infraestructura Tunja	3103105035	
Juan Pablo Alba Figueredo	Supervisor/Secretaria Infraestructura Pública – Gobernación de Boyacá	3112683221	
