CONTRATO No. 552 DE 2024 (120683)

"*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*"

INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 5
Del 19 de junio al 30 de junio de 2025

ELABORO:	REVISO:	APROBÓ:
ING. ANDRÉS ECHANDIA	ING. JUAN FELIPE DELGADO	ING. JORGE GOMEZ FALLA
		
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Residente Técnico	CARGO: Director de Obra	CARGO: Director de Interventoría

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES 5
2. INFORMACIÓN GENERAL 7
2.1 Contrato 7
3. CONTROL LEGAL 8
3.1 Pólizas 9
4. INFORMACIÓN FINANCIERA 10
4.1 Estado de avance financiero del proyecto 10
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 11
6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 17
6.1 Etapa de diagnóstico 17
6.2 Etapa de Estudios y diseños 17
6.3 Dificultades y/o novedades Técnicas 17
6.4 solicitud de PMT 18
6.5 ESP 18
6.6 Comités de obra 19
6.7 ACTIVIDADES DE OBRA 19
6.7.1 Alfonso López (13001165) 19
6.7.2 Nicolas de Federman (13000284) 20
7 ENSAYOS DE LABORATORIO 21
8 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 21
8.1 Correspondencia enviada 21
8.7 Correspondencia recibida 22
9 CONCLUSIONES 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información de interventoría 7
Tabla 2 Información del contratista 8
Tabla 3 Pólizas 9
Tabla 4 Avance financiero 11
Tabla 5 Listado contractual de segmentos 12
Tabla 6 Segmentos excluidos 15
Tabla 7 Segmentos priorizados 16
Tabla 8 Segmentos adicionales 16
Tabla 9 PMT Aprobados 18
Tabla 10 Comités semanales 19
Tabla 11 Correspondencia enviada 21
Tabla 12 Correspondencia recibida 22

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1-Avance financiero 11
Imagen 2-CIV 13001165 20

ANEXOS

Anexo No. 1-Acta de inicio y modificatorio N°1 9
Anexo No. 2-Pólizas 10
Anexo No. 3- Cronograma 17
Anexo No. 4- Actas de comité 19
Anexo No. 5- Bitácoras 21
Anexo No. 6- Resultados de laboratorio 21
Anexo No. 7- Correspondencia 22

INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo suscribió con la firma Contratista **CONSORCIO TEUSAVIAL** el contrato No.552 de 2024 (120683) resultado de la Licitación Pública FDLT-LP-385-2024, cuyo objeto es "*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*"

En el presente informe se presentan las actividades preliminares ejecutadas por el Contratista en el desarrollo del contrato No.552 de 2024 (120683), en el período comprendido del 19 de junio al 30 de junio de 2025.

1. GENERALIDADES

En el ámbito del mejoramiento y construcción de la infraestructura vial de la Ciudad de Bogotá y en atención a la inversión asignada en la localidad de Teusaquillo para la intervención de la malla vial intermedia y local y de acuerdo a la Licitación Pública No. FDLT-LP-385-2024(120683), la Alcaldesa local de Teusaquillo en uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,1474 de 2011, 1882 de2018, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y de más normas concordantes y que el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia prevé como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Es competencia del jefe de la Entidad o su delegado ordenar la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos. Que el Decreto 101 de 2010, delegó en los alcaldes Locales la realización de procesos que requiera la entidad, comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hace parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto.

Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta las solicitudes y/o requerimientos por parte de los ciudadanos, con el fin de que se obtuviera un plan integro a lo largo de la localidad de Teusaquillo.

Las actividades diarias y cotidianas que realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a la situación de la infraestructura vial y espacio público,

donde se dimensionan oportunidades de desarrollo de la democracia, donde el factor movilidad al interior de la Localidad tiene gran incidencia en cada uno de los intereses comunes y particulares de la población, además el fortalecimiento y mejoramiento de la misma, nos conduce a una transformación social encaminada a fortalecer los vínculos económicos, sociales y productivos, donde los habitantes tendrán una mayor reducción del tiempo promedio que utilizan en sus actividades por facilidad de comunicación vial.

En desarrollo del contrato se ejecutarán los segmentos incluidos en el listado de vías, andenes y ciclo-rutas, los cuales serán objeto de acciones de mantenimiento rehabilitación y reconstrucción según el caso, para garantizar la movilidad y accesibilidad de los segmentos, teniendo en cuenta los recursos asignados, de tal manera que la priorización que se realice, permita obtener un índice significativo de cobertura.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Contrato

INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
CONTRATO:	CIN-577-2024
OBJETO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
PLAZO	8 meses
FECHA DE INICIO	22 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	21 de septiembre de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 579.973.941,00

Tabla 1 Información de interventoría

CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO:	COP-552-2024(120683)
OBJETO:	*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"*
PLAZO	8 meses
FECHA DE INICIO	22 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN	21 de septiembre de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.457.427.612

Tabla 2 Información del contratista

3. CONTROL LEGAL

1. Mediante Contrato de obra No. 552 de 2024 (120683), se adjudicó al CONSORCIO TEUSAVIAL; quien cumplió con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo.
2. se firmó acta de inicio el veintidós (22) de enero de dos mil veinticinco (2025) y la duración del contrato es de ocho (8) meses.
3. Se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1373 del 27 de noviembre de 2024.

4. Modificatorio Nº1 del 13 de mayo de 2025, relacionada con la inclusión de ítems no previstos.

Anexo No. 1-Acta de inicio y modificatorio N°1

En el anexo N°1 se relacionan el acta de inicio y modificatorio N°1 del contrato de obra No. 552 de 2024 (120683).

3.1 Pólizas

Mediante comunicación TEUSAVIAL-552-008 del 3 de febrero de 2025, se remitió a la interventoría las pólizas actualizadas con acta de inicio así:

POLIZA		AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
TIPO	No.		Desde	Hasta	
RCE	M-100062000	Predios, Labores y Operaciones	22/01/2025	11/10/2025	$569.400.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	22/01/2025	11/10/2025	$569.400.000,00
		Vehículos propios y No propios	22/01/2025	11/10/2025	$569.400.000,00
		Patronal	22/01/2025	11/10/2025	$569.400.000,00
CUMPLIMIENTO	M-100252076	Cumplimiento del contrato	22/01/2025	25/04/2026	$ 1.091.485.522,40
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	22/01/2025	11/10/2028	$ 545.742.761,20
		Estabilidad y calidad de la obra	11/10/2025	11/10/2030	$ 1.637.228.283,60

Tabla 3 Pólizas

Anexo No. 2-Pólizas

En el anexo No. 2 se relacionan las garantías que el Contratista constituyó en cumplimiento del Contrato 552 de 2024 (120683).

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de avance financiero del proyecto

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula octava, la entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

Pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales de acuerdo al avance de obra aprobados por la Interventoría de acuerdo al plan de trabajo presentado en los diagnósticos, y pagado a los precios unitarios ofertados). De cada acta se descontará el cinco por ciento (5%) adicional por retención en garantía, es decir de cada acta se pagará el 95% del valor ejecutado.

De acuerdo con el acta de pago No. 5 a continuación se presenta el avance de financiero del proyecto al corte del 30 de junio de 2025:

ACTA DE PAGO	TOTAL, A FACTURAR	SALDO	% AVANCE
Acta de pago No. 1	$ 68.822.694	$ 5.388.604.918	1.26%
Acta de pago No. 2	$ 125.110.127	$ 5.263.494.791	2.29%
Acta de pago No. 3	$ 532.006.298	$ 4.731.488.493	9.75%
Acta de pago No. 4	$ 1.123.943.250	$ 3.607.545.243	20.59%

Acta de pago No. 5	$ 559.817.126	$ 3.047.728.117	10.26%

Tabla 4 Avance financiero

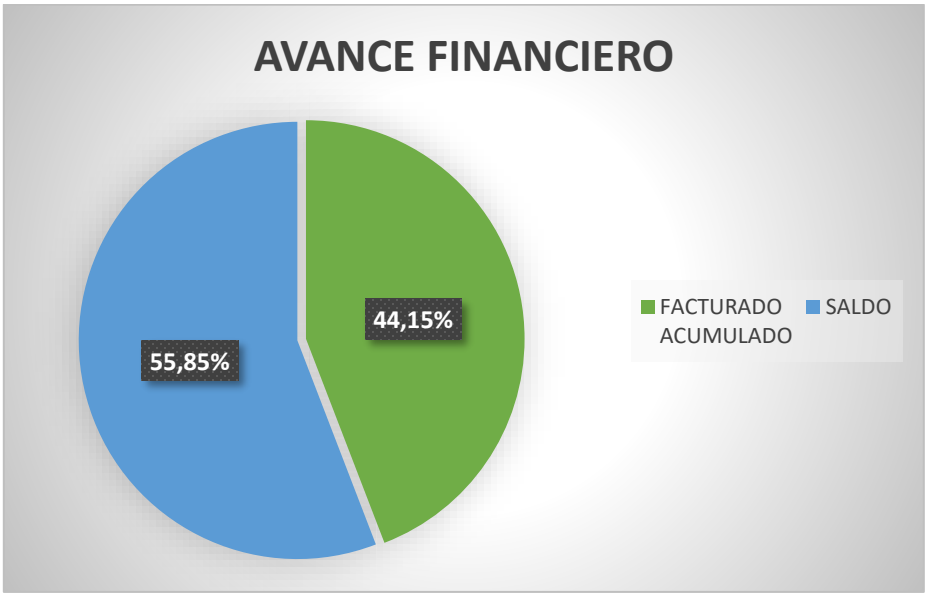


Imagen 1-Avance financiero

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Las vías objeto del contrato se ejecutarán dentro de la localidad 13 de Teusaquillo, de acuerdo al siguiente listado de vías a intervenir:

Ítem	Barrio	CIV	PK ID	Localización	Desde	Hasta	Elemento a intervenir
1	TEUSAQUILLO	13002387	180524	KR 24	SE	AC 34	CALZADA
2	SAN LUIS	13000593	180374	KR 18	CL 58B	CL 59	CALZADA Y CICLORUTA

3	SAN LUIS	13000686	180372	KR 18	CL 58	CL 58A	CALZADA Y CICLORUTA
4	SAN LUIS	13000794	180311	KR 16	AC 57	CL 58	CALZADA Y CICLORUTA
5	ALFONSO LOPEZ	13001165	180680	KR 27	CL 50	CL 51	CALZADA
6	LA MAGDALENA	13002083	180923	CL 38	KR17A	KR 17	CALZADA
7	NICOLAS DE FEDERMAN	13000284	181670	KR 47	CL 58A	CL 59	CALZADA
8	NICOLAS DE FEDERMAN	13000343	181669	KR 47	CL 58	CL 58A	CALZADA
9	NICOLAS DE FEDERMAN	13000476	181609	KRA 36A	CL 57A	CL 57B	CALZADA
10	CAMPIN	13000846	180728	TV 28	KR 28	DG61B	CALZADA
11	GALERIAS	13000875	181292	CL 53B	KR 27	TV 27A	CALZADA
12	NICOLAS DE FEDERMAN	13000864	182302	CL 53A	KR 35	KR 36	CALZADA
13	SAN LUIS	13000336	181454	DG 61B	KR 19A	KR 20	CALZADA
14	CHAPINERO OCCIDENTAL	13000826	507256	AC 57	AK14	KR 14A	ANDEN
15	CHAPINERO OCCIDENTAL	13000814	65904	KR14A	AC57	CL58	ANDEN

Tabla 5 Listado contractual de segmentos

En concordancia con lo anterior, se realizaron las respectivas visitas a cada uno de los CIV's con el FDLT, interventoría y contratista, en los diferentes comités se efectuaron análisis de los cuales se generaron la exclusión de los CIV's, relacionados a continuación:

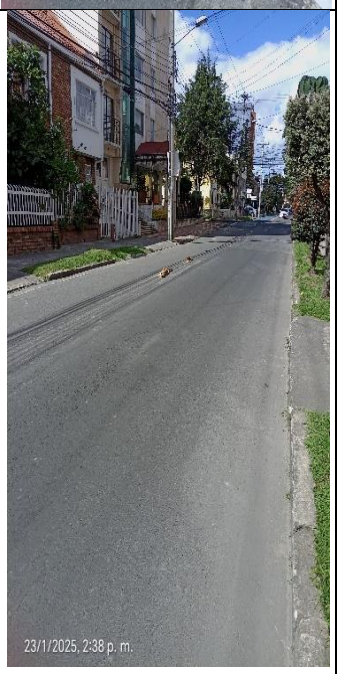No.	Barrio	CIV	Localización	Desde	Hasta	Observación	Registro fotográfico
1	SAN LUIS	13000593	KR 18	CL 58B	CL 59	En visita con EAAB, este CIV tiene red matriz de 24" y colector en ladrillo, lo que requiere tramitar permisos de intervención ante la entidad, por otra parte, los diagnósticos indica que requiere de mantenimiento periódico ya que tiene intervención por reciente(1año) de mantenimiento.	
2	SAN LUIS	13000686	KR 18	CL 58	CL 58A	En visita con EAAB, este CIV tiene red matriz de 24" y colector en ladrillo, lo que requiere tramitar permisos de intervención ante la entidad, por otra parte, los diagnósticos indica que requiere de mantenimiento periódico ya que tiene intervención por reciente(1año) de mantenimiento. Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	

3	CAMPIN	13000846	TV 28	KR 28	DG61B	Los diagnósticos indican que el CIV requiere de mantenimiento periódico, adicional a esto es necesario realizar coordinación con el Concesionario del Campin para intervención y para PMT desvíos de rutas del SITP, por otra parte, la EAAB se indica que tiene colector de 1m de diámetro con profundidad aprox de 4.40m y red combinada de 12" a 1.50m. Caracterizado por ser bien mueble de patrimonio cultural, requiere trámite ante el IDPC. ; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	
4	LA MAGDALENA	13002083	CL 38	KRA 17 A	KR 17	Caracterizado por ser bien mueble de patrimonio cultural, requiere trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	

5	TEUSAQUILLO	13002387	KRA 24	AC 34	SE	Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	
6	SAN LUIS	13000794	KRA 16	AC 57	CL 58	El tramo vial actualmente cuenta con PMT aprobado para actividades de Demarcación a cargo de Metro Línea 1. Debe realizarse coordinación previa, ya que puede ser ruta de Desvío de la PLMB. Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	

Tabla 6 Segmentos excluidos

La meta física del contrato se definió una vez se realizaron las respectivas visitas a cada uno de los CIV's con el FDLT, interventoría y contratista, una vez cuente con los estudios y diseños y el respectivo presupuesto de todos los segmentos viales priorizados por el FDLT los cuales pueden ser susceptibles a cambios dependiendo si se presentan trabajos adicionales que afecten el presupuesto inicial estimado o la priorización de nuevos segmentos viales, como lo son:

N°	Barrio	CIV	PK ID	Localización	Desde	Hasta	Elemento a intervenir

1	ALFONSO LOPEZ	13001165	180680	KR 27	CL 50	CL 51	CALZADA
2	NICOLAS DE FEDERMAN	13000284	181670	KR 47	CL 58A	CL 59	CALZADA
3	NICOLAS DE FEDERMAN	13002498	472601	KR 47	CL 58A	CL 58A	CALZADA
4	NICOLAS DE FEDERMAN	13000343	181669	KR 47	CL 58	CL 58A	CALZADA
5	NICOLAS DE FEDERMAN	13000476	181609	KRA 36A	CL 57A	CL 57B	CALZADA
6	GALERIAS	13000875	181292	CL 53B	KR 27	TV 27A	CALZADA
7	NICOLAS DE FEDERMAN	13000864	182302	CL 53A	KR 35	KR 36	CALZADA
8	SAN LUIS	13000336	181454	DG 61B	KR 19A	KR 20	CALZADA
9	CHAPINERO OCCIDENTAL	13000826	507256	AC 57	AK14	KR 14A	ANDEN
10	CHAPINERO OCCIDENTAL	13000814	65904	KR14A	AC57	CL58	ANDEN

Tabla 7 Segmentos priorizados

Segmento vial adicionado 13002498 por conectividad vial entre los segmentos 13000343 y 13000284.

N°	**Barrio**	**CIV**	**PK ID**	**Localización**	**Desde**	**Hasta**	**Elemento a intervenir**
3	NICOLAS DE FEDERMAN	13002498	472601	KR 47	CL 58A	CL 58A	CALZADA

Tabla 8 Segmentos adicionales

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6.1 Etapa de diagnóstico

Se culmino esta etapa con la presentación de los diagnósticos de las vías del listado contractual y acta parcial de los mismos.

6.2 Etapa de Estudios y diseños

Se culmino esta etapa con la presentación de los diseños y presupuesto de las vías del listado contractual y acta parcial de los mismos.

Anexo No. 3- Cronograma

En el anexo No.3, se presenta cronograma de actividades para las actividades de la etapa de ejecución de obra.

6.3 Dificultades y/o novedades Técnicas

1. Se presentaron lluvias de alta intensidad para el periodo, lo que provoca demoras en los procesos de excavaciones que se adelantan en los CIV´s 13001165 y 13000284.

2. Se encontró ductos de red de alta tensión en el CIV 13001165 de Alfonso López; estos ductos se encuentran superficiales; ya que quedan aproximadamente a 6cm de la base de asfalto, por tanto, se establece comunicación telefónica con funcionarios de la empresa de ENEL, sin obtener respuesta. Debido a lo anterior, se escala caso con el FDLT, para que se logre coordinar con la ESP un contacto y se indique el manejo y/o

realicen la profundización de estos ductos para que no afecte la estructura de pavimento.

6.4 solicitud de PMT

Para el presente informe, se aprobó por parte de la SDM los siguientes PMT`s:

CIV	COI	BARRIO	PMT		TRAMO	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA	
			VIA	ANDEN			INCIO	TERMINA
13000438	25	NICOLAS DE FEDERMAN	X		6	19/06/2025	20/06/2025	24/07/2025

Tabla 9 PMT Aprobados

6.5 ESP

6.5.3.1 EAAB

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

6.5.3.2 ETB

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

6.5.3.3 Vanti

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

6.5.3.4 CODENSA-ENEL

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

6.6 Comités de obra

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités semanales en los cuales se revisaron las solicitudes de PMT y la programación de inicio para el CIV 13000438 de Nicolas de Federman.

COMITÉ No.	FECHA
22	11-06-2025
23	18-06-2025
24	25-06-2025

Tabla 10 Comités semanales

Anexo No. 4- Actas de comité

En el anexo No 5. Se adjunta copia de las Actas de Comité.

6.7 ACTIVIDADES DE OBRA

Se presentan actividades de los tramos relacionados a continuación, con su respectivo registro fotográfico:

6.7.1 Alfonso López (13001165)

Ubicación: Carrera 27 entre calle 50 y calle 51



Imagen 2-CIV 13001165

- Instalación de tubería residual
- Relleno de redes con triturado
- Relleno de redes con B-200
- Excavación manual
- Conformación de cárcamos

6.7.2 Nicolas de Federman (13000284)

Ubicación: Carrera 47 entre calle 58A y calle 59



Imagen 7-CIV 13002468

- Excavación mecánica
- Instalación de tubería residual
- Relleno de redes con triturado
- Relleno de redes con B-200
- Excavación manual
- Construcción de pozo

Anexo No. 5- Bitácoras

En el anexo No. 6. Se adjunta la copia de las bitácoras de obra del periodo.

7 ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo No. 6- Resultados de laboratorio

En el anexo No. 7. Se evidencian los resultados de ensayos realizados durante el periodo.

8 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

8.1 Correspondencia enviada

N° RADICADO	ASUNTO	ENVIO FÍSICO/DIGITAL
TEUSAVIAL-552-071	Entrega de informe técnico y acta de pago Nº4	Digital
TEUSAVIAL-552-072	Entrega de diagnósticos realizados para acciones de movilidad	Digital

Tabla 11 Correspondencia enviada

8.7 Correspondencia recibida

N° RADICADO	ASUNTO	RECIBIDO FÍSICO/DIGITAL
CIT_FDLT_577_2024_095	INFORMES SST No. 4 DE OBRA-CONTRATO 552 DE 2024	Digital

Tabla 12 Correspondencia recibida

Anexo No. 7- Correspondencia

En el anexo No. 8 Se evidencia la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

9 CONCLUSIONES

- ✓ Se genera un avance financiero del 44.15% y avance de obra del 60%.
- ✓ Se identifica red de alta tensión de ENEL, por lo cual se hace necesario establecer comunicación para dar manejo a la red en el CIV 13001165 y se está a la espera de una respuesta por parte de la entidad.
- ✓ Se presentaron observaciones de los tramites de PMT en curso en los que se requiere acta de coordinación de metro línea 1, para los segmentos 13000826,13000985 y 13002468 y acta de coordinación de zonas de parqueo del CIV 13001214.
- ✓ Se culminan trabajos en los tres primeros segmentos de Nicolas de Federman CIV`s 13000343,13000864 y 13000476.

ANEXO N°1

Acta de inicio

y Modificatorio

N°1

ACTA DE INICIO

Contrato No.:	552-2024 COP (120683)
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA
Objeto:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES",.
Nombre del Contratista:	CONSORCIO TEUSAVIAL
Identificación del Contratista:	NIT 901.902.101-5,
Representante Legal	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA CC 79.947.081
Plazo de ejecución:	OCHO (08) MESES
Valor del Contrato:	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($5.457.427.612),
No. Certificado de Registro Presupuestal:	1604 (O23011604490000002154) del 30/12/2024
No. Póliza:	Garantía Cumplimiento M-100252076 ANEXO 0 DE SEGUROS MUNDIAL – del 9 de enero de 2025 / Responsabilidad Extracontractual 100062000 ANEXO 0 DE SEGUROS MUNDIAL – del 9 de Enero de 2025
Fecha de inicio:	22 de enero de 2025
Fecha prevista de terminación:	21 de septiembre de 2025

Entre los suscritos **MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI**, identificado con cédula de ciudadanía número 52.818.473 de Bogotá en su calidad de alcaldesa Local de Teusaquillo en representación legal del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y **JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.947.081, en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO TEUSAVIAL** identificado con 901.902.101-5 para dar inicio a la ejecución del contrato de obra No. 552-2024 COP (120683). Lo anterior es avalado por **JORGE GÓMEZ FALLA** identificada con cedula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, en calidad de interventor

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

Por la Alcaldesa Local de Teusaquillo

MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Contratista,

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
CC 79.947.081 RL CONSORCIO TEUSAVIAL

Interventor,

JORGE GÓMEZ FALLA
C.C. 72.007.216 en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
NIT 901.902.462-9

Contrato No.:	552-2024 COP (120683)
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Objeto:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES
Nombre del Contratista:	CONSORCIO TEUSAVIAL
Identificación del Contratista:	NIT 901.902.101-5,
Representante Legal	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA CC 79.947.081
Plazo de ejecución:	OCHO (08) MESES
Valor del Contrato:	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($5.457.427.612),
Fecha de inicio:	22 de enero de 2025
Fecha prevista de terminación:	21 de septiembre de 2025

Entre los suscritos a saber **MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI** identificada con cédula de ciudadanía No. **52.818.473**, en calidad de Alcaldesa Local de Teusaquillo y representante legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO** NIT 899.999.061-9, nombrada mediante decreto No 238 de 17 de julio de 2024 posesionada mediante Acta No 253 de 18 de julio de 2024, facultada por el Decreto 374 de 2019, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará EL FONDO y, por la otra CONSORCIO TEUSAVIAL representado legalmente por JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA identificado con cedula No 79.947.081, integrado por INGEVOLCO SAS identificado con Nit 900.316.090-5 con un porcentaje de participación del 50% e INVERSIONES HINDEL SAS identificado con Nit 901.033.708-6, y que por ende se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido modificar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones.

Que mediante Resolución No. 224 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2024 la Entidad adjudicó el contrato de obra pública al oferente CONSORCIO TEUSAVIAL según orden de elegibilidad establecido dentro del proceso FDLT-LP-385-2024 (120683)

Que el objeto del contrato se encuentra dirigido a: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES “.”

Que el plazo acordado para la ejecución del contrato se estableció en Ocho (8) Meses. Contados a partir del acta de inicio y el cumplimiento previo de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones

1- Que, el valor del Contrato ascendió a la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($5.457.427.612),** con cargo al rubro "TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO" con imputación presupuestal O23011604490000002154 – Certificado de Registro Presupuestal No. 1604 del 30 de diciembre de 2024.

2- Que mediante escrito de 29 de abril de 2025 la interventoría del contrato de obra; CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG (577-2024 CIN (121141), remitió al contratista la aprobación del acta de fijación, justificacion y análisis de precios no previstos del contrato de obra No 552-2024.

3- Que mediante correo electrónico de 29 de abril de 2025 dirigido al área de infraestructura por parte de la interventoría del contrato de obra No 552-2024 COP (120683), solicitó a la entidad la inclusión de ítems no previstos remitiendo junto con ello el análisis de mercado de los precios unitarios.

4- Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha 30 de abril de 2025, el área de infraestructura solicitó al área de contratación, la modificación contractual relacionada con la inclusión de ítems no previstos de conformidad a lo solicitado y avalado por la interventoría del contrato de obra.

5- El contrato de obra No **552-2024 COP (120683)** establece como obligaciones de la ejecución cargo del contratista lo siguiente;

"20) En caso de requerirse Ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios debidamente justificados dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su identificación."

6. Que la interventoría del Contrato de Obra sustentó la solicitud modificación contractual, señalando que la misma resulta necesaria para la correcta ejecución del contrato de obra No 552-2024 COP (120683), con lo cual se da solución de forma completa y segura a los problemas de la malla vial de los segmentos viales, debido a los conceptos técnicos emitidos por parte de empresas de servicios públicos como la empresa de acueducto de Bogotá, en la cual se exige la reposición de redes de acueducto y alcantarillado de los segmentos viales identificados con los CIV 13001165, 13000284, 13002498, 13000343, 13000476, 13000875, 13000864 y 13000336.
7. Que la solicitud de modificación contractual junto con la solicitud de la interventoría anteriormente referidas justifica la modificación No. 1 al contrato No **552-2024 COP (120683)** y forman parte integral de la presente modificación contractual.
8. Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente.
9. Que, con fundamento en lo expuesto, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el formulario no 1 de la lista de cantidades y precios del presupuesto oficial del contrato de obra pública No **552-2024 COP (120683)** incluyendo los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	JUSTIFICACIÓN
NP-01	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 153.530	ITEM NECESARIO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ANDEN, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES (DECRETO 507 DE 2023).
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	CAPA GRANULAR NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES (DECRETO 507 DE 2023).
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforación y accesorios suministro e inyección de cal comercial al 6%)	ML	$ 161.190	ITEM NECESARIO PARA ESTABILIZACIÓN CON CAL LA SUBRASANTE, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036.
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	CAPA GRANULAR NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036.

NP-05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	$ 1.512.758	CAPA DE ASFALTO NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES. (DECRETO 442 DE 2015).
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	CAPA DE ASFALTO NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES.
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	CAPA DE ASFALTO NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES.
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	ITEM NECESARIO PARA RELLENO Y CONFINAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS.
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 382.656	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO

				CON LA NORMA NP-027 DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.
NP-10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 466.487	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO CON LA NORMA NP-027 DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.
NP-11	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 675.290	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO CON LA NORMA NP-027 DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.
NP-12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 782.148	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO CON LA NORMA NP-027 DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	ITEM NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEL DISEÑO PRESENTADO POR EL ESPECIALISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036.
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO CON LA NORMA NP-027 DE

				TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.
NP-15	CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 130.641	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO CON LA NORMA NP-027 DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.
NP-16	CONEXIONES KIT SILLA Y 315x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 231.580	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO CON LA NORMA NP-027 DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.
NP-17	CAJA DE INSPECCION DE 80x80	UN	$ 456.898	ITEM NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE ALTURA VARIABLE/CIVS PRIORIZADOS 13000284,13002498,13001165,13000343, 13000476,13000875,13000864,13000336.
NP-18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80x80 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 160.203	ITEM NECESARIO PARA LA IMPLMENTACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE INSPECCION/CIVS PRIORIZADOS 13000284,13002498,13001165,13000343, 13000476,13000875,13000864,13000336.
NP-19	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 350.860	ITEM NECESARIO PARA LA IMPLMENTACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE INSPECCION/CIVS PRIORIZADOS 13000284,13002498,13001165,13000343, 13000476,13000875,13000864,13000336.
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 136.110	ITEM NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE INPSECCION, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CAÑUELA NO ESTA INLCUIDO EN EL ITEM CONTRACTUAL DE LA CAJA/CIVS PRIORIZADOS

				13000284,13002498,13001165,13000343, 13000476,13000875,13000864,13000336.
NP-21	CONEXIONES KIT SILLA Y 450 a 200	UN	$ 433.211	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO CON LA NORMA NP-027 DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.188	ITEM NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE INPSECCION, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CAÑUELA NO ESTA INLCUIDO EN EL ITEM CONTRACTUAL DEL POZO.
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	ITEM NECESARIO PARA LA RECOLECCION Y DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS Y SUPERFICIALES SOBRE LA VIA (NS-047 EAAB), EL CUAL ESTA APROBADO POR EL ACUEDUCTO Y ES DE FACIL IMPLEMENTACIÓN AL TIPO DE VIAS PRESENTES EN EL CONTRATO. NS-047 DE LA EAAB.
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	ITEM NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN DE ACCESO A RAMPAS VEHICULARES, EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN LOS ITEMS CONTRACTUALES/CIVS PRIORIZADOS 13000284,13002498,13001165,13000343, 13000476,13000875,13000864,13000336.
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	ITEM INCLUIDO TENIENDO EN CUENTA LA ACTIVIDAD DE FRESADO PARA DISPONER EN SITIO PROVISIONAL DE ACOPIO/CIVS PRIORIZADOS 13000284,13002498,13001165,13000343, 13000476,13000875,13000864,13000336.
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	ITEM NECESARIO PARA LA CIMENTACION, CONFINAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES; YA QUE ITEM CONTRACTUAL ES SOLO DE 3/4"/CIVS PRIORIZADOS 13000284,13002498,13001165,13000343, 13000476,13000875,13000864,13000336.

NP-27	DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 596.585	ITEM NECESARIO PARA LOS POZOS EXISTENTES; YA QUE SE REALIZARÁ LA RENOVACIÓN DE LA RED, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE ITEM NO ESTA INLCUIDO EN EL LISTADO CONTRACTUAL.
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	ITEM NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA ZANJA DE EXCAVACIÓN PARA LA INTALACIÓN DE TUBERÍA; YA QUE EN LA MAYORIA DE LOS SEGMENTOS SE REALIZARÁ LA RENOVACIÓN DE LAS REDES.
NP-29	INSTALACIÒN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÒN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	ITEM NECESARIO PARA LA INSTALACIÒN DEL MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE Y EL CUAL NO ESTA INCLUIDO EN EL LISTADO CONTRACTUAL Y SE RQUIERE PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES (DECRETO 507 DE 2023) Y DE DISEÑOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO CIT_FDLT_577_2024_036.
NP-30	CARCAMO EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED)-TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI	ML	$ 371.652	ITEM NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS; YA QUE ESTE NO ESTA INCLUIDO EN LOS ITEMS CONTRACTUALES
NP-31	CONEXIONES KIT SILLA YEE 27"x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 853.076	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE Y SIGUIENDO LAS PAUTAS EMITIDAS POR LA EAAB DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025.CUMPLIENDO CON LA NORMA NP-027 DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE LA EAAB-ESP.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato de Obra No. 552-2024 COP (120683), se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA TERCERA: La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

FIRMADO EN PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
JORGE GÓMEZ FALLA
577-2024 CIN (121141)

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO TEUSAVIAL
RL JUAN FELIPE DELGADO V
552-2024 COP (120683

MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Proyectó	Alain Camilo Lopez Angel– Abogado(a) de apoyo Contratación FDLT	Aprobado Plataforma Transaccional
Revisó	Nataly Naranjo Barrera- Abogada Despacho FDLT	

ANEXO N°2

Pólizas

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.05 09:06:45 -05:00

Código de Seguridad: 2+A061CRISjiilR/Fl/MYA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100252076	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14951632	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/01/2025	24:00 Horas Del	11/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO TEUSAVIAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.902.101-5
DIRECCIÓN	AV CARRERA 9#113-52 OFICINA 906	**TELÉFONO**	6559899
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 71 NO 73 A - 44	**TELÉFONO**	4432490
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 71 NO 73 A - 44	**TELÉFONO**	4432490

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA FECHA DEL ACTA DE INICIO 22 DE ENERO DEL 2025

-LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 552-2024 COP (120683), CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/01/2025	24:00 Horas Del 25/04/2026	1.091.485.522,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/01/2025	24:00 Horas Del 11/10/2028	545.742.761,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2025	24:00 Horas Del 11/10/2030	1.637.228.283,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.274.456.567,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HOWDEN WACOLDA S.A.CORREDORES DE SEGUROS	CORREDORES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100252076	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14951632	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/01/2025	24:00 Horas Del	11/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO TEUSAVIAL CONFORMADO POR:

-INGEVOLCO SAS IDENTIFICADO CON NIT: 900.316.090-5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:50%
-INVERSIONES HINDEL SAS IDENTIFICADO CON NIT: 901.033.708-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:50%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

FILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIPF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100252076** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO TEUSAVIAL** Asegurado o Beneficiario: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL / FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL** , expedida por la Compañía en **05/02/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **05** días del mes **FEBRERO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.05 09:09:56 -05:00

Código de Seguridad: 4RPYNPdOYGdyT+joJ2+ypg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100062000	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14951635	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/01/2025	24:00 Horas Del	11/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO TEUSAVIAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.902.101-5
DIRECCIÓN	AV CARRERA 9#113-52 OFICINA 906	TELÉFONO	6559899
ASEGURADO	CONSORCIO TEUSAVIAL	No. DOC. IDENTIDAD	901.902.101-5
DIRECCIÓN	AV CARRERA 9#113-52 OFICINA 906	TELÉFONO	6559899
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA FECHA DEL ACTA DE INICIO 22 DE ENERO DEL 2025

-LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 552-2024 COP (120683), CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9. COMO ASEGURADO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HOWDEN WACOLDA S.A.CORREDORES DE SEGUROS	CORREDORES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100062000	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14951635	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/01/2025	24:00 Horas Del	11/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9.

BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

* LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA)CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE.

* TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO TEUSAVIAL CONFORMADO POR:

-INGEVOLCO SAS IDENTIFICADO CON NIT: 900.316.090-5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:50%
-INVERSIONES HINDEL SAS IDENTIFICADO CON NIT: 901.033.708-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:50%

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

FILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - A4F

ANEXO N°3


CRONOGRAMA

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CRONOGRAMA PRELIMINAR COP-552-2024(120683)**	**166 días**	**mié 22/01/25**	**lun 22/09/25**
2		**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**23 días**	**mié 22/01/25**	**vie 21/02/25**
13		**ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO**	**33 días**	**mié 5/02/25**	**vie 21/03/25**
27		**ETAPA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN**	**149 días**	**vie 14/02/25**	**lun 22/09/25**
28		Actas de vecindad	148 días	vie 14/02/25	lun 22/09/25
29		Implementación plan de gestión social	145 días	mié 19/02/25	lun 22/09/25
30		Componente social y SST	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25
31		Componente ambiental	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25
32		componente plan de manejo de transito	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25
33		**Calzada**	**138 días**	**mar 25/02/25**	**mar 16/09/25**
34		**CIV 13000343**	**70 días**	**mar 25/02/25**	**vie 6/06/25**
55		**CIV 13002498**	**29 días**	**mar 10/06/25**	**mar 22/07/25**
73		**CIV 13000284**	**40 días**	**lun 21/07/25**	**mar 16/09/25**
91		**CIV 13000864**	**42 días**	**lun 14/04/25**	**vie 13/06/25**
109		**CIV 13000476**	**44 días**	**lun 21/04/25**	**vie 20/06/25**
130		**CIV 13001165**	**46 días**	**lun 9/06/25**	**jue 14/08/25**
151		**CIV 13000875**	**51 días**	**mié 18/06/25**	**mar 2/09/25**
172		**CIV 13000336**	**55 días**	**mar 24/06/25**	**jue 11/09/25**
193		**Andenes**	**29 días**	**mar 1/07/25**	**lun 11/08/25**
217		**Acciones de movilidad**	**62 días**	**vie 16/05/25**	**jue 14/08/25**

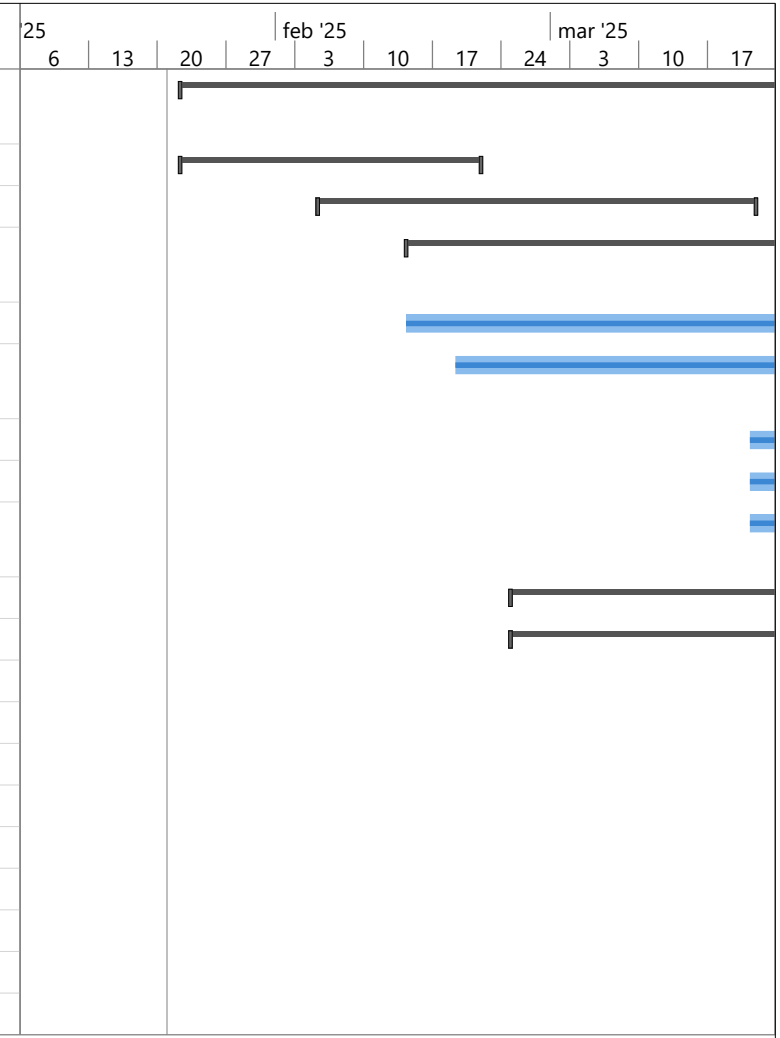


Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: vie 11/07/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

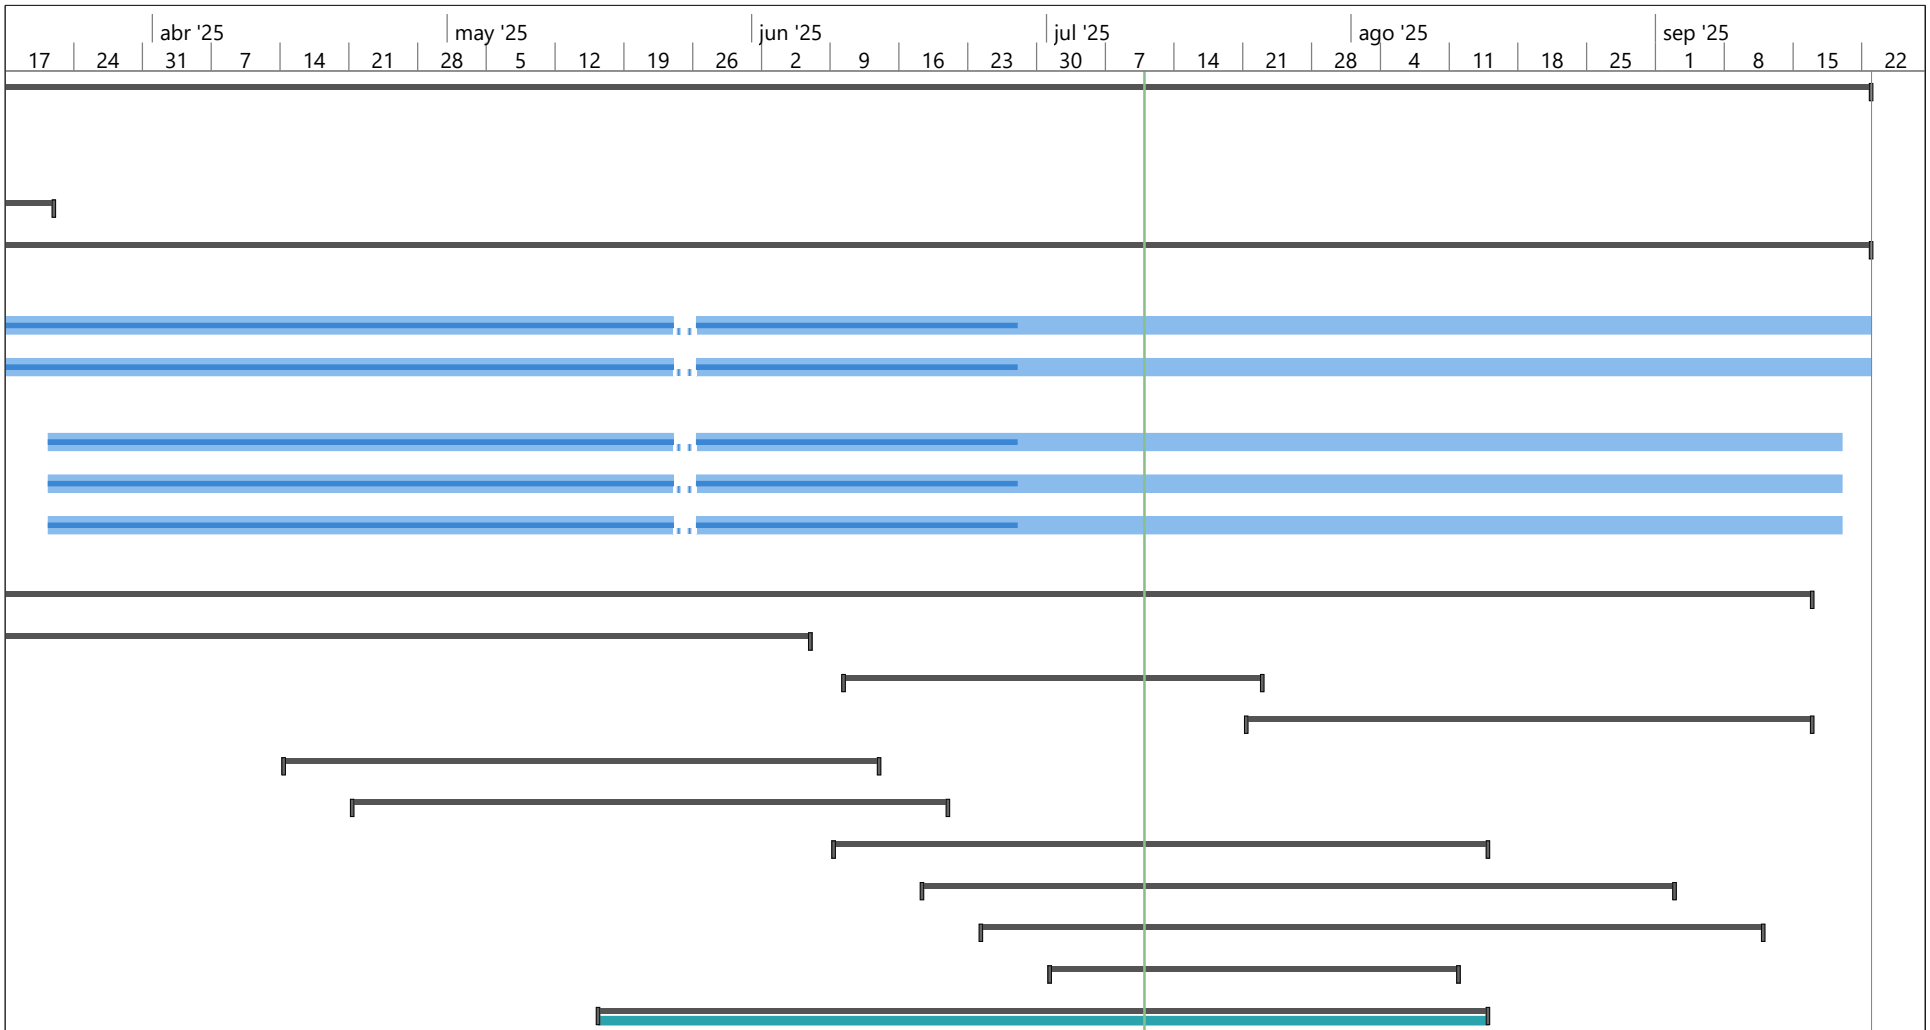

Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: vie 11/07/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

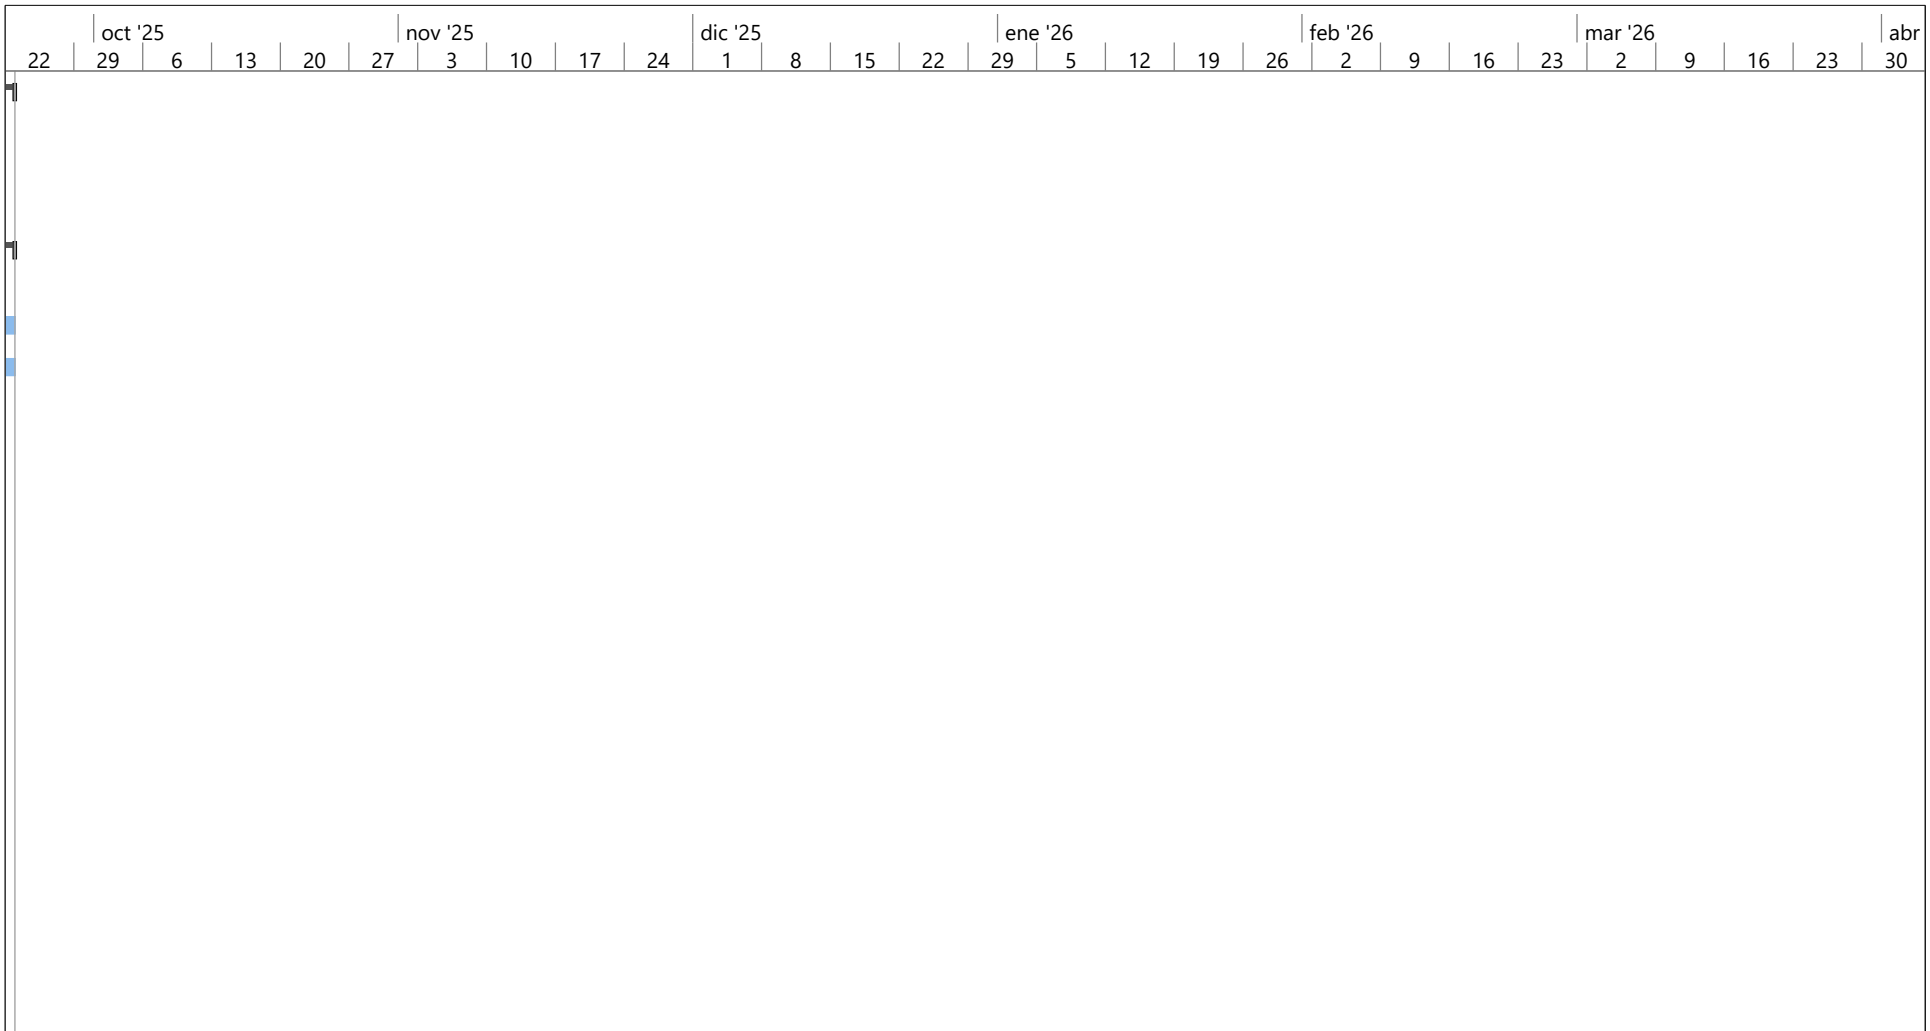

Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: vie 11/07/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

ANEXO N°4

Actas de comité

JGF	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	25/04/2025	

1. TEMA DE LA REUNIÓN	EMPRESA	DURACIÓN	Acta No.
COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CTOSS2-2024			

AREA	LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
TECNICA.	ALCALDIA	INFRAESTRUCTURA.	11-06-2025	3:00	

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
		Informe acciones de movil	CONTRATISTA	11-06-2025	12-06-2025

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PMT.

PMT N.8 CIV 13000438 C11 57B ENTRE CR 36A Y 30M1 EN RADICACIÓN.

A SDM.

PMT N.7

CIV's 13000744 - 13001214 pendiente atención observaciones por parte del CONTRATISTA

PMT N.6

CIV 13000336. pendiente atención observaciones por parte del CONTRATISTA.

CIV 13000875 Esta pendiente aprobación por parte del SDM.

- SE SOLICITA al CONTRATISTA presentar presupuesto de acciones de movilidad incluido. bahics Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3 más los CIV 13001214 ; 13001326, más arreglo CIV's 13000985 y 13027468. y fechas aproximadas proyectada para intervención ya que se estan recibiendo. pour por parte de la comunidad respecto al al arreglo de estas intervenciones.
- se realiza recorrido con la EAAB los dias 5 de junio de 2025 a los tramos 13001165 y 13000878.

donde se autorizo pozo antes de cruce cr 27 con cll51 y verificacion en cumare el pozo y red de aguas lluvia en cll 53A con cr 27.

Tramo 1 CIV 13000343 se finalizo el primer segmento a nivel de carpeta asfaltica.

Tramo 2 CIV 1300 0864 El contratista informo que el dia lunes 16 de junio de 2025 realizara toma densidad para liberar e instalación de mezclas asfalticas

Tramo 3 CIV 13000476. el contratista informa que el dia 13 de junio de 2024 se instalaria mezclas asfalticas.

Tramo 4. CIV 13001165. se dio inicio el 9 de junio de 2025 con demolición y retiro carpeta asfaltica, excavación de calzada y cambio de tuberia red. de sanitaria.

AMBIENTAL

- La Interventoria solicita al contratista dar Odotización de donde fue depositado el material de la excavación de movilidad ejecutada el sabado en la cr15 entre cll 54A hasta cll 55BIS. esto porque se requiera que el contratista informa con anticipación el lugar donde llevara este tipo de material, esto con el fin de hacer la verificación de cumplimiento con los documentos. ante

(2)

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Secretaria ambiental,
La interventoria solicita que para la presentación de Solicitud de certificación para presentación de Informe ambiental a la supervisión solicita al contratista presentar informe por el profesional forestal con el fin de tener justificación de manera descriptiva. esto con el fin de dejar trabajadas a los individuos arboreos colindantes a las obras ajuntas el profesional forestal Solicita al FDLT SC de una poder para poder presentar ante SDA y Jardin botanico.
La supervisión solicita al contratista tener el dia de mañana 12 de junio de 2025 para tramitar poder.

SST.
La interventoria informa que el contratista ya hizo entrega de informe por parte del contratista y ya se observo por parte de INTERVENTORIA.
No se presentan accidente e incidente durante el periodo del presente informe.

Social
Se informa con agrado de vecinda barrio san luis.
CIU 13006 336
Se envio informe aprobado por parte de interventor por revision por parte de la profesional FDLT.
Se instala punto satelite barrio san luis.
Se realiza comite social con contratista interventoria.
Se informa que todo las actividades corresponde a obra ejecutada.

9			
10			
11			
12			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Andrés Eduardo Díaz R		Ing. Res.	Cons Tesavial.
Marcela Arevalo	Marcela Arevalo	Ing. Junior	Consorcio Tesavial.
Angela Quiroga	Angela Quiroga	Res Social	Consorcio Tesavial.
Camilo Durán		R. Amb	C Tesavial
Yesca Quiroga		Resid. SST A	C. interteusquillo J6
Juan Camilo Anaya P.		Infraestructura FDLT	FDLT
Carlos Durán		Apoyo Sup.	FDLT
Tatiana Valdelamar		Residente SST	Consorcio Tesavial
Juan David Castañeda Pineda		Residente Forestal	Consorcio tesavial
		LIDER INFRAESTRUCTURA	FDLT.
		Residente SST	Consorcio Interteusquillo J6.
Nicolas Silva		Social / Infr. FDLT.	FDLT.
Daniela Bermudez M	Daniela B	Equipo Infraestructura FDLT	FDLT

ACTA DILIGENCIADA POR: _____ FECHA DE PROXIMA REUNION: _____

Nota: en caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Andrea Borrero	Mileth Escalante / Maryuri Torres	Jorge Gómez
Cargo: Coordinadora de Talento Humano	Cargo: Coordinadora / Profesional de Gestión Integral	Cargo: Gerente

JGF	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	FR-TTH-001	
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.
		01	25/04/2025	

1. TEMA DE LA REUNIÓN	EMPRESA	DURACIÓN	Acta No.
COMITE SEGUIMIENTO CTO 552-2024	FDLT.	2 Horas	25

AREA	LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
TECNICA	ALCALDIA TEUSAQUILLO	INFRAESTRUCTURA FDLT.	18-06-2025	8:00	10:00

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
		ENTREGA INFORME ACCIONES MOVILIDAD	CONTRATISTA	11-06-2025	13-06-2025


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Area Social

- LAS VALLAS moviles han sido instaladas en los frentes de obras
- El Punto PAC se encuentra dotado y en funcionamiento
- El Informe mensual fue enviado a la supervisión para revisión y aprobación
- Se realiza recorrido social entre pares contratista e interventoria por los frentes de obra, revisión documental y social de predios
- La Acta de vecindad fueron revisadas por el area social y firmadas por el area tecnica de interventoria.
- Se recibio observaciones por parte de la profesional de la alcaldia, las cuales fueron atendidas por el contratista enviadas a la interventoria. Para revision y remitir a FDLT para aprobación.

Area SSTMA.

- Para este Primer Semestre el contratista no Reporto a la Alcaldia local de Teusaquillo el empleo de guantes de caucho ante

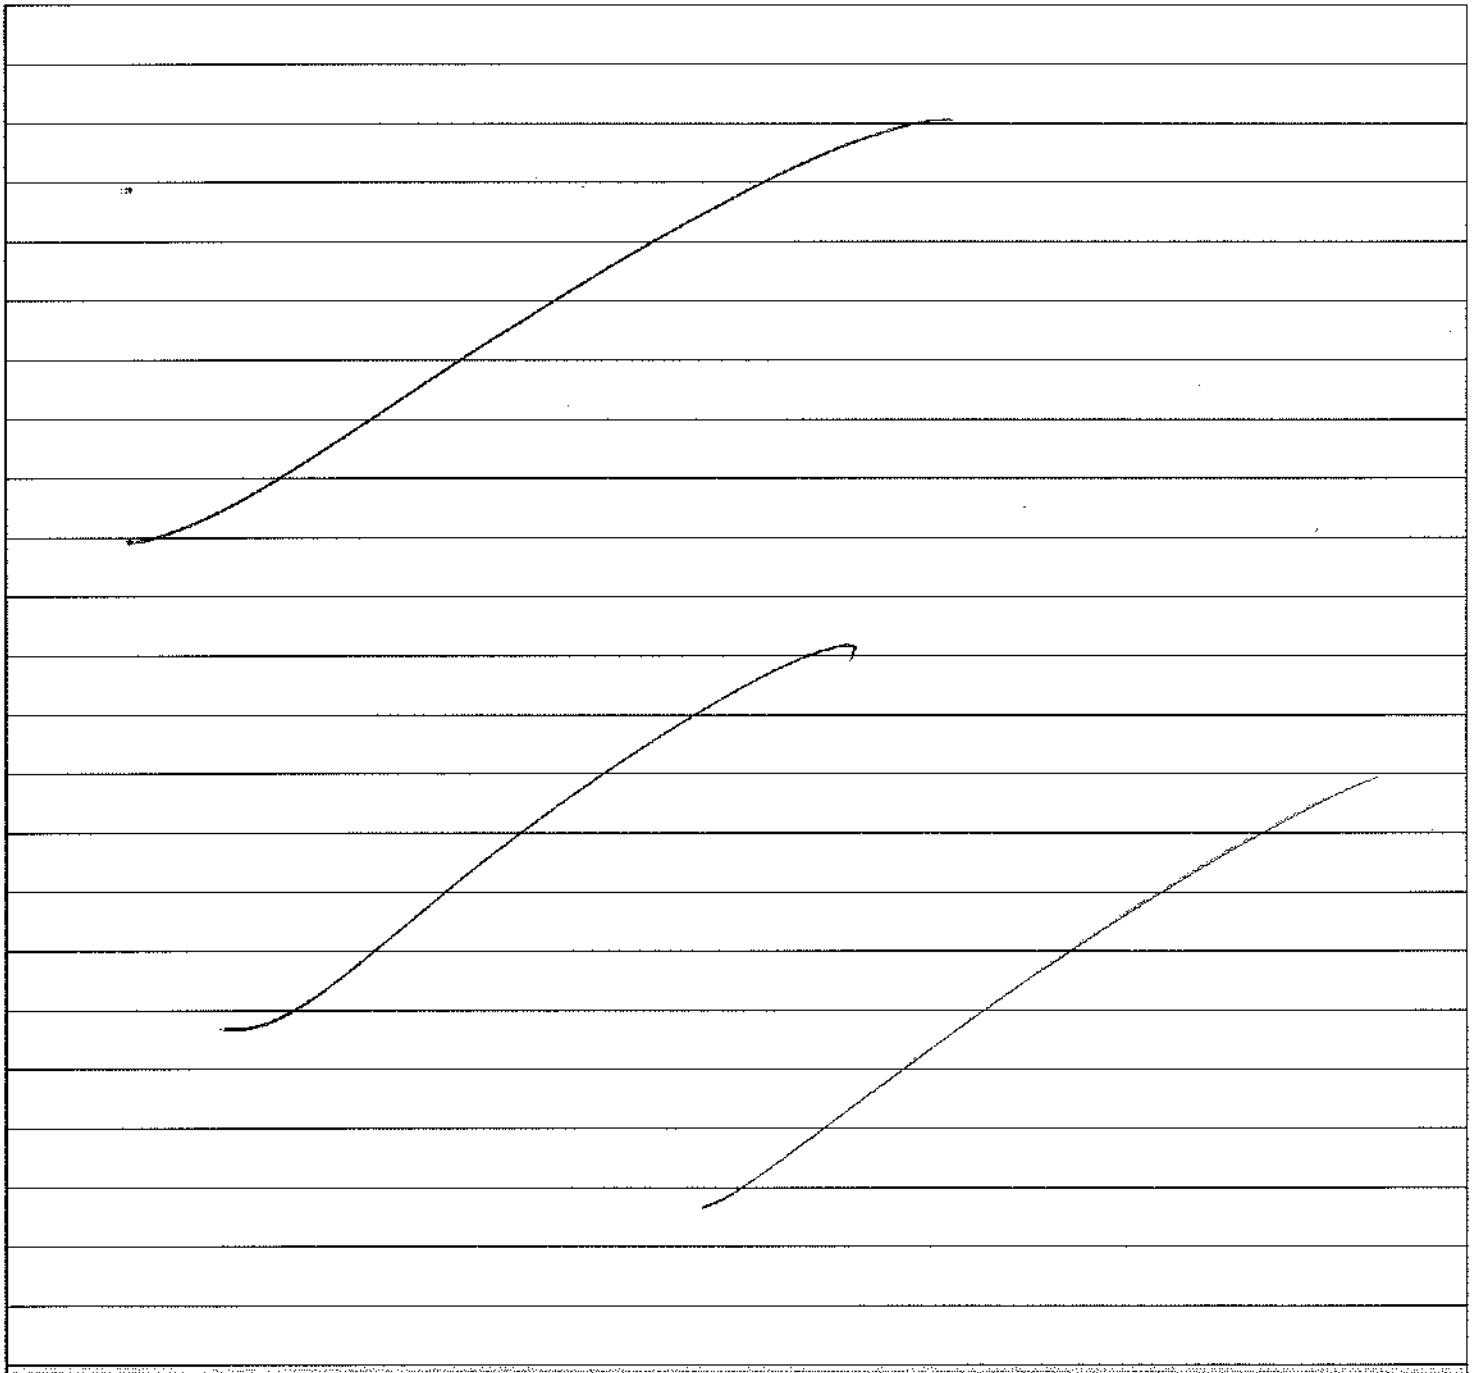

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1	Recorrido a CIU's para Intervención		
2	de Acciones. Movilidad	Alcaldía - CODT - IDU	25-06-2025.
3	solicitar. pmt's Cr 15 y Cr 33A.	Competencia	26-06-2025.
4			
5			
6			
7			
8			

secretaría distrital de ambiente.

- El día 17 de junio de 2025 el contratista llevó a cabo la radicación del informe ambiental y subsanación del SST.
- Se informa que se llevó a cabo recorrido conjunto entre representante de FDLT e ingeniero forestal de contratista y residentes ambientales para revisión del estado de los individuos arbóreos aledaños a los CW's a intervenir, y los pasos a seguir para interponer una PQR o derecho de petición ante la SDA de manera preventiva por las actividades a desarrollar en los CW asignados al contrato
- En lo referente a personal a la fecha el contratista cuenta con 54 trabajadores permanentes y 17 trabajadores rotativos para un total de 71 trabajadores
- No se presenta accidente e insidente durante este periodo.
- Se realizan recomendaciones para zonas de excavaciones con enlodados
- Se solicita al contratista informar el manejo de residuos especiales entre (bolsas de cemento), ya que se evidencia que ha ingresado material y se debe presentar la certificación del gestor de estos residuos especiales

PMT

- Solicita el contratista solicitar PMT para intervención por acceso de movilidad Cll 22 Bis Cr 48 hasta Cr 50
- Se propone realizar recorrido conjunto FDLT + contratista e Interventoría para el día 25-06-2025

Tramos.

- Los Tramos 1, 2 y 3 están ejecutados al 100%
- Se deja inicio el tramo N.4 el cual lleva un 20% en ejecución

9			
10			
11			
12			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Diana Silva		T.S. Impresos / A. Dt	Alcaldía Local de Teusaq
Mariela Arevalo		Ing. Junior	Consorcio Transversal -
Juan David Castiblanco P		R. Forestal	Consorcio Transvial
Adriana V Diaz Zafra		Coordinador Proyectos	Interventoría Tq.
Juan Camilo Amaya P.		FDLT - Ing.	FDLT
Daniela Bernardet Nocnera		FDLT - Apoyo	FDLT
Carlos A. Duran		Apoyo Tecnico	FDLT
Camilo Duran		R. Ambiental	C. Transvial
Tatiana Valencia M		Residente SST	Consorcio Transvial
Angela Quiroga		Residente Social	C. Transversal
Freddy Perdomo		Interventoria	C. Inter Teusaquillo

ACTA DILIGENCIADA POR: Freddy Perdomo FECHA DE PROXIMA REUNION: 25-06-2025

Nota: en caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Andrea Borrero	Mileth Escalante / Maryuri Torres	Jorge Gómez
Cargo: Coordinadora de Talento Humano	Cargo: Coordinadora / Profesional de Gestión Integral	Cargo: Gerente

JGF	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	25/04/2025	

1. TEMA DE LA REUNIÓN	EMPRESA	DURACIÓN	Acta No.
COMITE SEGUIMIENTO CTO 552 - 2024.	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JGF	2H 30min.	26

AREA	LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
PROYECTOS	OBRA.	INFRAESTRUCTURA.	25/06/2025	9:30	12:00

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
	25	solicitud recorrido SDIA	FDLT	25-06-2025	25-06-2025

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SOCIAL.

- Se realiza recorridos Alfonso Lopez,
- Cierre de Actas de vecindad. Nicolas de Falaminen
- Se solicita al contratista que antes de realizar socializaciones este tipo de actividad se debe avalar por la parte tecnica esta con no genera falsas expectativas con la comunidad.
- Se aprueba el Informe Mensual, los valientes son aprovechados que se viene tomando la misma metodologia con que fue aprobada inicialmente. es lo que informa la profesional del FDLT.

SST

- La contratista informa que el dia 24-06-2025 se presento accidente con operador. por mal procedimiento el cual produce leves dano a piel y una incapacidad de 3 dias
- El contratista informa que ya fue tomado las medidas para el manejo de actividades con excavadora

- se realizan charlas de reforzamiento de AUTOcuidado y que se debe prever cualquier error que pueda lesionar al individuo.
AMBIENTAL
- se realiza mantenimiento a cerramientos
- se esta a la espera de certificación de materiales para cruzar y subir a la plataforma de la Secretaria con fecha de mayo.
- El profesional forestal del contratista informa que realiza derecho de peticion ante la SDA. esto con el fin de dejar antecedente a la solicitud, el supervisor solicita al contratista que apenas cuente con radicado los copie con el fin de enterarse y poder hacer seguimiento. por parte del profesional del FDLT.

TECNICO
TRAMO 4 CR 27 ENTRE CL 130 HASTA CL 131 CIV
- El contratista informa que ya realizo mas del 90% de renovacion de la red con sus domiciliarc
- se realizara cercano de proteccion a todas la conexiones y red principal
- el contratista informa que se encuentran cruce la red la cual hacen requerir visita para saber como proteger su red debido a que quedara enredada con por debajo de la retante existente.

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1	Recorrido con SDA	FDLT-CONTRATISTA-INTER	26-06-2027
2	Solicitud PTA zona Bahia Acosta	CONTRATISTA	26-06-2027
3			
4			
5			
6			
7			
8			

- Tramo 5 Cr47 Cll59 Hasta Cll58A

- El contratista informa que lleva el 30% de renovación de red sanitaria y un 10% de agua Nueva, se viene realizando excavación de via de manera parcial esto por manejo y precaución que no se presenta afectación por lluvia a la subrasante.
- La Interventoria informa que para protección de la abertura siguiendo lo indicado en los planos de EAAB.
- Se solicita al contratista solicitar pmt para zona de acopio esto son RCD.
- El contratista tuvieron que viene haciendo los arreglo en espacio publico del Tramo I

- Tramo 3
- El contratista informa que deben realizar el arreglo de la diagonal una vez se tengan el concepto del Especialista de pavimento ya que no se puede intervenir la misma superficial respecto al arreglo en espacio publico el contratista informe que se tomara guia la cartilla del espacio publico con la que se guia el IDU.

- Se realiza programacion con la fiscalizadora de SDM para el dia 26-06-2024 9:00 am recorrida calle 53B con Cr 23 para despejar los dudas para aprobacion de PMT.

9			
10			
11			
12			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Luz Estebar	Luz Estebar	Prof. Social Inter.	Inter Tesaquillo.
Angela Quiroga	Angela Quiroga	Res Social Contratista	C. Tesaual.
Adriana V. Diaz Z.		Coordinación Interent.	Intertesaquillo JC.
Tatiana Valdeleón		Residente SST,	C Tesaual
Camilo Duran		R. Ambienta	C. Tesaual
Sebastian Marquez		Inspector T	C. Tesaual
Daniela Benavides M	Daniela BM	FDLT - Apoyo Técnico	FDLT
Diana Carolina Silva		Social infraestructura	FDLT
Juan Camilo Arayap		FDLT - Apoyo Tecnico	FDLT
Carlos Duran		Apoyo SST	Alcaldia Tesaquillo
Yeidy Pedraza		Residente Inf.	Intertesaquillo JC

ACTA DILIGENCIADA POR: Yeidy Pedraza **FECHA DE PROXIMA REUNION:** 8-07-2025

Nota: en caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR:
Andrea Barrero	Mileth Escalante / Maryuri Torres	Jorge Gómez
Cargo: Coordinadora de Talento Humano	Cargo: Coordinadora / Profesional de Gestión Integral	Cargo: Gerente

ANEXO N°5

Bitácoras

CONSORCIO TEUSAVIAL.
COP-552-2024 (120693)

CIV 13000284

INTERVENTORIA:
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO J6
CIN-577-2024.

CIV 13000284 Clima: 7:00 am - 4:30 pm 09-06-2
soleado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Operador Retroexcavadora (1)

Durante la jornada se realizo excavacion del trauma y Fractura de carpeta asfaltica. Durante la jornada no se presentan incidentes.

2025-06-20 El dia de hoy en la realizacion de excavaciones Mecanicas. accidentalmente Se Se presento una afectación involuntaria a una tuberia de la red de agua potable por equipo de maquinaria, Siendo las 13:47 por Parte del Contratista reporta a Entidad encargada (Acueducto) el Cual llega a el Punto de Sobre la 16:13 para dar Solución a el daño Ocacionado. Civ 13000284.

Brenda Castillo.
2025-06-20.

ANDRES FELIPE [illegible]
Residente Tecnical.

CIV 13000284 clima: 7:00 am - 4:30 pm 10-06
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Boral (2)
Tubero (2)

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesaval.

CIV13000284 Clima: 7:00am - 4:30 pm 11-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Raspa (2)
Trabajo (2)
Topografia (2)

Durante la jornada se encuentran las redes del costado norte, y se inician actividades de excavación de casa. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesaval.

CIV13000284 clima: 7:00am - 4:30 pm 12-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Raspa (2)
Trabajo (2)
Topografia (1)
operador Retro (1)

Durante la jornada se realizan actividades de excavación para botar

CW 13000284 Clima: 7:00 a.m - 4:30 p.m 13-06
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Topografía (2)
Ayudante (2)
Operador retro (1)
BOBC (2)
Tractor (2)

Durante la jornada se realiza excavación e instalación de tubería red sanitaria. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical

CW13000284 Clima: 7:00 a.m - 4:30 p.m 14-06
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
ayudante (2)
Topog auxiliar (2)
(Ayudante) BOBC (2)
Operador retro (2)
Tractor (2)
operador mini (1)

Durante la jornada se realizan actividades de instalación red sanitaria. No se presentan incidentes.

CW13000284 clima: 7:00 am - 4:30 pm 26-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector Obra (1)
Topografia (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Boal (2)
Operador mini (1)
Operador Retro (1)
Trafico (2)

Durante la jornada se realizaron trabajos de excavación e instalación de tubería red sanitaria. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CW13000284 clima: 7:00 am - 4:30 pm 17-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Boal (2)
Trafico (2)
Operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se realizan actividades de excavación e instalación de tubería red sanitaria y sus respectivos de domiciliarios

CUN13000284 clima: 7:00am - 4:30pm 19-05-2
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Boral (2)
Talpro (1)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Operador mini (1)
Operador retro (1)

Durante la jornada se realizan actividades de conexión de domiciliarias y de instalación de red principal sanitaria. No se presentan incidentes.

ANDRES EDWARDO
Residente Terracol

CUN13000284 clima: 7:00 am - 4:30 pm 20-0
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Boral (2)
Talpro (2)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se realizan actividades de conexión de domiciliarias y de instalación de red principal sanitaria. No se presentan incidentes

CU13000284 clima: 7:00 am - 4:30 pm 20-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
BOAL (2)
Tránsito (2)
oficial (1)
ayudantes (2)
Operador mini (1)
Operador retro (1)

Durante la jornada se continua con actividades de instalación de tubería red sanitaria. se presenta rotura de tubería agua potable 3" la cual no aparecia en planos, se realiza cierre y reparación.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CU13000284 clima: 7:00 am - 10:30 am 21-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
BOAL (2)
Tránsito (2)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se continua con actividades de excavación e instala

CIV 13000284 clima: 7:00 am - 4:30 pm 24-06-2
Nueva modificación

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)
BOBL (2)
operador mini (1)
Operador Retro (1)
Inspico (1)

Debido a las lluvias no se logro avanzar en instalación de cej
No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnico

CIV 13000284 Clima: 7:00 am - 4:30 pm 25-06-2
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)
BOBL (2)
operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se continua con excavación e instalación de red sanitaria. No hay incidentes

ANDRES ECHANDIA

13000284 7:00am - 4:30 pm 26-06-25

nublado

Personal en obra

Inspector obra (1)
Topografía (2)
Optical (1)
Ayudantes (2)
BOAC (2)
Tarsco (2)
Operador mini (1)
Operador retro (1)

Durante la jornada se continua con instalación de red sanitaria. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

13000284 7:00am - 11:30am 27-06-25

lluvias moderadas

Personal en obra 11:30am - 4:30 pm

nublado

Inspector obra (1)
Topografía (2)
Optical (1)
Ayudantes (2)
BOAC (2)
Tarsco (2)
Operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se continua con instalación de red sanitaria. No se presentan incidentes.

7300029Y 7:00am - 10:30 am 28-06-2

soleada

Personal en obra

Inspector obra	(1)
Topografía	(2)
Capataz	(1)
Ayudantes	(2)
Perfil	(2)
Tubico	(2)
Operador min.	(1)
Operador Retro	(1)

Durante la jornada se saca material de excavación y se deja canalizada la red sanitaria a Pozo intermedio. No hay incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

14-06-25 Por Parte de Interventoria Se Sugiere Seguir Compliendo Con el Plan de Inspección de ensayos. Correspondiente Para Cada Civ teniendo en Cuenta las especificaciones y normatividad del proyecto

Además de dar Conocimiento que para tramo 1 Civ 13000343 Se tiene Pendiente liberacion de densidades para Capa de MD-25 y MD-19 y Para tramo 3 13000476 Pendiente liberación de densidades Para Capa de rodadura MD-19

Nota: Para realización de llenos observados en tramo 5 Civ 13000284 se Sugiere Complir Con plande Inspección de ensayo, liberando Con Cada Capa Con las densidades Correspondientes en los llenos de tubería, de el Cual no se observa dicho Complimiento.

Brenda Castillo 2025-06-11

ANDRES ESTRADA
Residente Terracol.

205-06-16 Recorrido Verificación toma de Arbolado. Civ (13000284)

Se lleva a cabo recorrido entre representante de Alcaldía de Tasaquillo ing. Amb. Juan David Bocca, Ing. Carlos Duran, representante Contratista ingeniero forestal Juan Castañeda, Camilo Duran. y interventoria Ing. Amb. Yesica Quintero. para revisión del estado de los arboles aledaños a los civ. intervenidos:
Civ: 13000284 : se encuentra 2 araucarias las cuales presentan riesgo de Volcamiento debido a sus caracteristicas fisicas de copa y poste como: copa asimetrica, ramas sobreextendidas, pendulares poste inclinado y torcido, tambien se identifica un arbol de especie laurel huesito que presenta caracteristicas de copa asimetrica rama sobreextendido pendulares

accion de movilidad en la bahia. Se continua haciendo recorrido sin embargo. es necesario que la alcaldia expida un poder para realizar cualquier tipo de tramite ante la SDA para efectuar una PQR o Derecho de peticion por manejo preventivo silvicultural.

Carlos David

Juan David Becerra
P. Ambiental contratista

Yesica Quiroga
Resid. Amb. interv.
contatista

Juan David Castañeda Pineda
P. Forestal Contratista

16/06/2025. De interventoria
Se realiza recorrido de verificacion estado. fisico y sanitario de los individuos ubicados en el CIV. 13000875. encontrando. 4 unidades que presentan ramas sobreextendidas, pendulares y emplazamiento se evidencia daño del anden. donde se ubican. En el CIV. 1300875 se encuentra un pino Candelabro que presenta ramas sobreextendidas y secas generando interferencia con cableado electrico. por ultimo se verifica los individuos del CIV. 13000336 donde se ubican. sobre el separador tres falsos pimientos que presentan aparentemente una muerte descendente, ramas sobreextendidas, pendulare, mutilados, secas poste torcido inclinado, se. recomienda. endoterapia (tratamiento integral).

16/06/2025 De interventoria.
Se solicita al contratista llevar a cabo jornada de aseo y orden, adecuacion de accesos en el CIV 13000284. mantenimiento de señalizacion y cerramiento., asi mismo verificar en este CIV. los entibados de las excavaciones debido a inestabilidad del terreno por excavaciones y manejo del agua.

ANDRES ESTUPIÑAN
Residente Terravial.

Jessica Quiceno
Residente SST TVA interv.

2025-06-20 Se reitera a el Contratista tener en cuenta plan de inspección de ensayos en llenos de tobera con profundidad de mas de 60 cm.

CIV 13000343 Clima: 7:00am - 10:30 am nublado 31-05-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
BOA (2)
TANDEM (2)
Operador mini (1)
operador retro (1)

Durante la jornada se realizan actividades de cerco y compactación. no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ESTUPIÑAN

CN n3000343 Clima: 7:00 am - 1:00 pm Lluvia moderada 03/05-25
1:00 pm - 4:30 pm nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
BOAL (2)
Topógrafo (2)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Operador mini (1)
Operador vibro (1)

Durante la jornada se continuó con actividades de cerco de base estabilizada con cemento y nivelación de bordillos faltantes durante la jornada no se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CN n3000343 Clima: 7:00 am - 4:30 pm 04-05-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
BOAL (2)
Topografía (2)
Trabajo (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Operador mini (2)
Operador vibro (1)

Durante la jornada se continúa con actividades de cerco,

CW 13000343 Clima: 7:00 am - 4:30 pm 05-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)
BOBL (2)
Topico (2)
Operador vibro (1)
Operador mini (1)

Durante la jornada se continua con instalación de base estabilizada y cerco de via, se deja la pista lista para toma de densidades. no se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CW 13000343 clima: 7:00 am - 4:30 pm 06-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector Obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Topografia (2)
BOBL (2)
Topico (2)

Durante la jornada se toman densidades a la base, dando resultados admisibles liberando el tramo para instalación de asfalto. No se presentan incidentes.

CW 13000343 clima: 7:00 am - 2:00pm 07-06-2
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Ayudantes (1)
Oficial (1)
Cuadrilla asfalto (6)
Boal (2)
Tanco (2)
Operadores maquinaria (3)

Durante la jornada se realiza instalación de asfalto tal como lo dispuesto en los diseños. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CW 13000343 clima: 7:00am - 4:30 pm 09-06-2
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Ayudante (2)
Oficial (1)
Boal (2)

Durante la jornada se realizan remates en cunetas y bordillo no se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial

CU-13000343 clima: 7:00 am - 4:30 pm 10-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)

Durante la jornada se realizan remates de espacio público. No hubo incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Technical.

CU-13000343 clima: 7:00 am - 4:30 pm 11-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)

Durante la jornada se realizan remates de bordillos. No hubo incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Technical.

CU-13000343 clima: 7:00 am - 4:30 pm 12-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)

CUN3000343 clima: 7:00 am - 4:30 pm 1306
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Ayudante (1)
Oficial (1)

Durante la jornada se continua con remates. No hay incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Terrenal.

CUN3000343 clima: 7:00am-10:30am 14-ob
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Ayudante (1)
Oficial (1)

Durante la jornada se termina de hacer remates en el tramo

ANDRES ECHANDIA
Residente Terrenal.

Civ 13000364 Clima 7:00am - 11:00 am 30-05-25
lluvia Puente
11:00am - 4:30pm
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Boal (1)
Turco (1)
Topografia (2)
Operador Loco (1)
Operador Bocat (1)

Durante la jornada se realiza compactacion de base, conformacion de cunetas, y se saca el Pulso del costado oriental, en el cual se cambian material de subrasante y se estabiliza. Durante la jornada no se presentan Incidentes,

ANDRES ESTRADA
Residente Tecnical.

14-06-25 Por Parte de Interventoria se Sugiere Seguir Compliendo Con el Plan de Inspección de ensayo Pares pendiente para Cada Civ Teniendo en Cuenta las especificaciones y normatividad del Proyecto.

Ademas de dar Conocimiento que para tramo 1 Civ 13000343. se tiene Pendiente liberación de densidades Para Capa de MD-25 y MD-19 y Para tramo 3 13000476. Pendiente liberacion de densidades para Capa rodadura MD-19

Nota: Finalizada Nivelacion (seriado) de Base estabizada para tramo 2 Civ 13000864 tener en Cuenta densidades dela misma, manera Para llenos de cada Civ del proyecto

CW13000864 clima: 7:00 am - 10:30 am 31-05-25
lluvia moderada

Personal en obra
Inspector (1)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Boal (2)
Trafico (2)
Topografia (2)

Durante la jornada se realizan actividades de entrega de material de base y compactación. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnico.

CW13000864 clima: 7:00 am - 4:30 pm 03/06/25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (3)
Ayudante (1)
Boal (2)
Trafico (2)
Topografia (2)

Durante la jornada se realiza excavación de bordillos existentes y excavación del mismo. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnico.

Ayudante (2)
Topografía (2)
BOAL (2)
Tarsco (2)

Durante la jornada se continuan actividades de demolición de sardinel, y excavación para instalación de los muros. No se presentan incidentes.

ANDRES ESTHANDIA
Residente Tesorial.

CIV 13000 864 clima: 7:00 am - 10:00 am 05-06-25
nubosidad moderada
Personal en obra 10:00 am - 4:30 pm nublado
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (1)
BOAL (2)
Tarsco (2)
Topografía (2)

Durante la jornada se saca línea para bordillo y se continua con la demolición del existente. No se presentan incidentes.

ANDRES ESTHANDIA
Residente Tesorial.

CIV 13000 864 clima: 7:00 am - 4:30 pm 06-06-25
Inspector obra (1) nublado
Oficial (2)
Ayudante (1)

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CLV 13000864 clima: 7:00 am ; 10:30 am 07-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Topografia (2)
BOAL (2)
Trapisco (2)

Durante la jornada se continua con instalacion de sardinel.
Durante la jornada no se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CLV 13000864 clima: 7:00 am - 4:30 pm 09-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (4)
Ayudante (3)
Topografia (2)
BOAL (1)
Trapisco (2)

Durante la jornada se continua con instalacion de sardinel. no
se presentan incidentes

CU 13000864 clima: 7:00 am - 4:38 Pm 10-06-25
soleado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (3)
Topografia (2)

Durante la jornada se realiza instalacion de sardinel, y embobedillado de estos. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CU 13000864 clima: 7:00am - 4:30 Pm 11-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (5)
Topografia (2)
BOAL (2)

Durante la jornada se realiza instalación de bordillo, y tareas de terminacion del mismo. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CU 13000864 clima: 7:00am - 4:30 Pm 12-06-25
nublado

Personal en obra

Durante la jornada se realizan actividades de instalación de bordillo. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial

CLV A3000986U clima: 7:00AM - 4:30PM 13-06-25
nublado

Personal en obra

Inspector obra	(1)
Topografía	(2)
BOAC	(2)
Tapico	(2)
Operador mini	(1)
Oficial	(2)
Ayudante	(2)

Durante la jornada se inician con actividades de cerco de base estabilizada con cemento. No se presentan incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CLV A3000986U clima: 7:00AM - 4:30 PM 14-06-25
nublado

Personal en obra

Inspector obra	(1)
Topografía	(2)
BOAC	(2)
Tapico	(2)
Operador mini	(1)

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

13000864 clima: 7:00am - 2:30pm 15-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
Boal (2)
Tecnico (2)
Oficial (3)
Ayudantes (3)
Operador vibro (1)
Operador mini (1)

Durante la jornada se realizan actividades de cerco y compactacion de base estabilizada con cemento. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CU 13000864 clima: 7:00 am - 4:30 pm 16-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
Boal (2)
Tecnico (2)
Oficial (2)
Ayudantes (2)

aplicación de asfalto. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANOA
Residente Tesorial.

Clu n3000gbu clima: 7:00 am - 4:30 pm 17-06-2
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (3)
Oficial (1)
Ayudante (1)
cuadrilla asfalto (6)
Boral (2)
Tanker (2)

Durante la jornada se instala asfalto en capa base de mo·25. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANOA
Residente Tesorial.

Clu n3000gbu clima: 7:00 am - 4:30 pm 19-06-23
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Oficial (1)
Ayudante (1)
cuadrilla asfalto (6)
Boral (2)
Tanker (2)

CU 13000 864 Clima: 7:00 am - 4:30 pm 19-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (n)
oficial (n)
Ayudante (n)

Durante la jornada se inician con actividades de cerates. No hay incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CU 13000 864 clima: 7:00 am - 4:30 pm 20.06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (n)
oficial (n)
Ayudante (n)

Durante la jornada se continua con cerates, no se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CU 13000 864 clima: 7:00 am - 10:30 am 21-06-25

Personal en obra
Inspector obra (n)
oficial (n)
Ayudante (n)

CU-13-0008-24 clima: 7:00 am - 4:30 pm 24-06-25
lluvia moderada

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)

Debido a las lluvias no se avanza mucho en la continuación de tareas de remates en el turno. No se presentan incidentes.

ANDRES ECHANOCA
Residente Tecnical.

CU-13-0008-24 clima: 7:00 am - 4:30 pm 25-06-25
Soleado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudantes (1)

Durante la jornada se continuan con remates. No hay incidentes.

ANDRES ECHANOCA
Residente Tecnical.

CU-13-0008-24 clima: 7:00 am - 4:30 pm 26-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)

CU 13000864 clima: 7:00am - 4:30 PM 27-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (1)
ayudante (1)

Durante la jornada se empezaron con actividades de remates de rampas y accesos.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

13000864 clima: 9:00am - 10:30 am 28-06-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (1)
Ayudante (1)

Durante la jornada se culmina con actividades de remates de accesos.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CU 13000476 clima: 7:00am - 10:30am lluvia 30-05-25
10:30am - 4:30pm moderada
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (1)
BOAC (7)
Tapiado (7)
Oficial (1)
Ayudante (7)
Operador Bobcat (1)

Durante la jornada se inicia instalación de bordillo costado oriental y se verifica alineamiento. No se presentan incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

Interventoría

CU 13000476 clima: 7:00am - 4:30 pm 03-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (1)
BOAI (2)
Tapiado (4)
Oficial (1)

Durante la jornada se continúa con la instalación de bordillo. No hay incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CW13000476 clima: 7:00am - 4:30pm 04-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (2)
BOAL (2)
Tapiero (2)
Operador mini (1)

Durante la jornada se continuo con trabajos de bordillos y nivelación de pozo. No hay incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CW13000476 Clima: 7:00am - 4:30pm 05-06-25
Nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
BOAL (2)
Tapiero (2)
Operador mini (1)
Operador vibro (1)

Durante la jornada se realizo cerco de base estabilizada con cemento. No hay incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CW 13000476 clima: 7:00 am - 4:30 pm 06-06-25
nubes dispersas

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Oficial (2)
Ayudantes (2)
BOBC (2)
Tractor (2)
Operador mini (1)
Operador vibro (1)

Durante la jornada se continua con actividades de cercado de base. No hay incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tensavial.

CW13000476 clima: 7:00 am - 4:30 pm 07-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (2)
BOBC (1)
Tractor (2)
Operador mini (1)
Operador vibro (1)

Durante la jornada se continua con cercado de base y remates en bordillos. No hay incidentes.

CIV 13000476 clima: 7:00am - 4:30pm 09-06-2
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (2)
Ayudante (2)
Boff (2)
Tapisero (2)
Durante la jornada se realizan remates en bordillos donde se presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnoaval.

CIV 13000476 clima: 7:00am - 4:30pm 10-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (2)
Ayudante (2)
Boff (2)
Tapiero (2)
operador mini (1)
operador vibro (1)

Durante la jornada se continua con cerco de base y remates de bordillo. No hay incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnoaval.

CW13000476 clima: 7:00 am - 4:30 pm 11-06-25
Mañana dispersa

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (2)
Ayudante (2)
Topico (2)
Operador mini (1)
Boss (2)

Durante la jornada se realizan tareas de cercos en base estabilizada. No hay incidentes.

ANDREJ ECHANOVA
Residente Tecnico.

CW13000476 clima: 7:00 am - 4:30 pm 12-06-25
Mañana nublada

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (2)
Ayudante (2)
Topico (2)
Operador mini (1)
BOBC (2)

Durante la jornada se deja todo en la base, a espera de imprimación y aplicación de asfalto

ANDREJ ECHANOVA
Residente Tecnico.

CUN3000476 clima: 7:00am-4:30pm 13-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (1)
ayudantes (1)
cuadrilla asfalto (6)
BOBCAT (2)
TAMPICO (2)

Durante la jornada se imprima y se aplica asfalto, así mismo se toman densidades las cuales cumplen con los parámetros admisibles para mp-25. No presentan incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecsaval.

CUN3000476 clima: 7:00am-10:30am 14.06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (2)
Ayudante (1)

Durante la jornada se realizan remates de cunetas y drenes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecsaval.

CW 13000476 clima: 7:00 am - 4:30 pm 16-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector (1)
Oficial (2)
Ayudante (1)

Durante la jornada se continua con remates de cintas y anclajes.
No hubo incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CW 13000476 clima: 7:00 am - 4:30 pm 17-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
oficial (2)
Ayudante (1)

Durante la jornada se continua con remates de cintas y
anclajes. No hubo incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CW 13000476 clima: 7:00 am - 4:30 pm 18-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Ayudante (2)

CUN3000476 Clima: 7:00 am - 4:30 pm 19-06-15
Lluvioso Seco

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)

Durante la jornada se realizan los ultimos ajustes y reparaciones pendientes de canpas.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnico.

CONSORCIO TEUSAVIAL
COP-552-2024 (120683)

CIV: 13001165

CIV 13001165 clima. 7:00am. 4:30pm 09-06-25
Nublado leve

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Boal (2)
Tarros (2)
Operador Retro (1)
Operador Excavadora (1)

Durante la jornada se realiza cercamiento y se inician actividades de Excavación y excavación de cajeo. No hay incidentes.

CIV 13001165 clima: 7:00am - 4:30pm 10-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Boal (2)
Tarros (2)
Operador Retro (1)
Operador mini (1)

Durante la jornada se continua con actividades de excavación de cajeo y de zona de cargue quedo hasta ahí los incidentes

CU 1300-1165 clima: 7:00 am - 4:30 pm 11-06-

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
Boal (2)
Trafico (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)
operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se continua excavación de casa y retiro de material de excavación. No se presentan incidentes.

CU 1300-1165 clima: 7:00 am - 4:30 pm 12-0

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
Boal (2)
Trafico (2)
oficial (1)
BOAL (2)
Ayudante (2)
operador Retro (1)
Operador mini (1)

Durante la jornada se inicia instalación de sol contratado

25 CLV13001165 Clima: 7:00am - 4:30 pm 13-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (1)
Operario (1)
Ayudante (2)
Boot (2)
Tubero (2)
Operador retro (1)
Operador mini (1)

Durante la jornada se continua con trabajos de excavación, e instalación de cna combinada con sus respectivas conexiones domiciliarias.

25 CLV13001165 Clima: 7:00am - 10:30am 14-06-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (1)
Operario (1)
Ayudantes (2)
Boot (2)
Tubero (2)
Operador mini (1)
Operador retro (1)

Durante la jornada se instala tubería combinada, así mismo se realizan las

CLV1300176G Clima: 7:00am - 4:30 pm 16-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Boaf (2)
Tubero (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se instalo tubería combinada. No se presentaron incidentes.

CLV1300176G Clima 7:00am - 4:30pm 17-06-25
soleado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Boaf (2)
Tubero (4)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se realizo excavación e instalación de red combinada
no se presentaron incidentes

CU-1300M65 Clima: 7:00am - 12:00pm 19-06-25
lluvia moderada

Personal en obra 12:00pm - 4:30 pm
nublado
Inspector obra (1)
Topografia (2)
SOAL (2)
Trabajo (2)
Operario (1)
Ayudantes (2)
Operador mini (1)
Operador retro (1)

Durante la jornada se realizó colocación de domiciliarias y red combinada. No se presentan inconvenientes.

CU-1300M65 clima: 7:00 am - 4:30 pm 19-06-25
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
SOAL (2)
Trabajo (2)
Operario (1)
Ayudante (2)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se realiza colocación de domiciliarias e instalación de red combinada.

CUN3001165 7:00 am - 11:30 am 20-06-

Soleado

Personal en obra

Inspector obra	(1)
Topografía	(2)
SOAL	(2)
Trabajo	(2)
Oficial	(1)
Ayudante	(2)
Operador Retro	(1)

Durante la jornada se avanza con cierre de vía, instalación de red combinada y conexión de domiciliarias. No hay incidentes.

CUN3001165 7:00 am - 10:30 am 21-06-

nublado

Inspector obra	(1)
Topografía	(2)
SOAL	(2)
Trabajo	(2)
Oficial	(2)
Ayudante	(1)
Operador Retro	(1)

Durante la jornada se continua con trabajos de instalación de red combinada. No hay incidentes.

CIU 1300-1165 clima: 7:00 am - 4:30 pm 26-06-
Soleado

Personal en Obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Boal (2)
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Tarrero (2)
Operador mini (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se realizan trabajos de construcción de muros de cerramos para red combinada y para pluvial no se presentan incidentes.

CIU 1300-1165 clima: 7:00 am - 4:30 pm 27-0
nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Boal (2)
Tarrero (2)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Operador Retro (1)

Durante la jornada se continuan con actividades de cercamiento

CU 13001165 clima: 7:00 am - 10:30 am 28-06-25
nublado

Personal en obra

Inspector de cu (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)
Topografía (2)
Bodi (1)
Tapia (1)
Operador retro (1)

Durante la jornada se realizan actividades de construcción de caja mcs. No se presentan incidentes.

ANEXO N°6

Resultados de laboratorio

PRUEBAS GEOTECNICAS

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS

CÓDIGO:	LB-PR-01-FT-39
VERSIÓN:	4
FECHA ELABORACIÓN:	2022-03-02

NORMA DE REFERENCIA	NORMA INV E 732, 733, 734, 735, 744, 748, 782


CODIGO DE CLIENTE	2040	COMPAÑÍA	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTACTO	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	DIRECCIÓN	AK 9 # 113 - 52 OF.906
OBRA	COP 552-2024	INFORME PG Nº	2237-24
LOCALIZACIÓN	CIV 13000476	FECHA INFORME	2025-06-26

TIPO DE MEZCLA	MD-19	CANTERA / PLANTA	N/E
TEMP. DE LLEGADA C°	23° C	FECHA DE TOMA	2025-06-13
OT No.	777-24	FECHA ENSAYO	2025-06-26

EXTRACCIÓN (INVE 732 "Método A")	
W_1 Masa inicial de la muestra (g)	1500,6
W_2: Masa del agua en la muestra (g)	0,2
W_3: Masa del agregado mineral extraído (g)	1417,8
W_4: Masa del material retenido en filtro (g)	3,79
Contenido de asfalto (%)	5,3

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS (RICE) INV E - 735:2013	
Prueba N°	1
A: Masa en el aire de la muestra seca (g)	2500
D: Masa de la placa de vidrio más el frasco lleno con agua a 25° C (g)	6825
E: Masa del frasco con la placa, el agua y la muestra a 25°C (g)	8271
Gmn: Gravedad especifica teórica máxima de la mezcla	2,372
Peso esp. agregados (g/cm^3)	2,736

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS I.N.V. E-782-13					
Peso 1 (g)		1380,2	Peso 2 (g)		1377,0
Tamiz		Peso Retenido (g)	% Retenido	% Retenido acum.	% pasa
Pulgada	mm				
1 1/2"	38,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	30,4	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	19,0	32,2	2,3	2,3	97,7
1/2"	12,7	142,0	10,3	12,6	87,4
3/8"	9,5	148,2	10,7	23,4	76,6
No. 4	4,8	316,4	22,9	46,3	53,7
No. 10	2,0	293,2	21,2	67,5	32,5
No. 40	0,4	330,8	24,0	91,5	8,5
No. 80	0,18	81,0	5,9	97,4	2,6
No. 200	0,07	32,0	2,3	99,7	0,3
FONDO		1,2	-	-	-

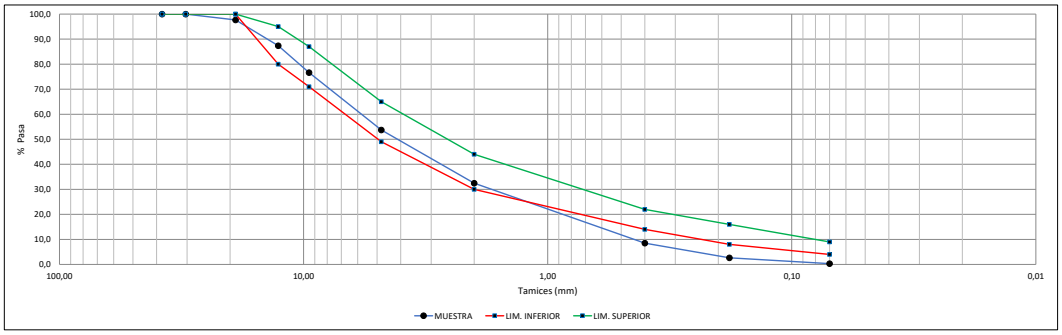

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS - INV E 733:2013				
Briqueta N°	1	2	3	4
Espesor briqueta (mm)	64,4	64,9	64,7	64,3
A - Masa del especimen seco en el aire (g)	1168	1167	1168	1172
B - Masa en el aire del especimen SSS (g)	1171	1172	1172	1175
C - Masa del especimen sumergido en agua (g)	645	657	652	662
Volumen briqueta (cm3)	520,2	524,2	522,6	519,4
Gravedad especifica bulk-Gmb	2,221	2,266	2,246	2,285
Densidad (g/cm3)	2,214	2,259	2,239	2,278
%Va - Porcentaje de vacios con aire	6,4	4,5	5,3	3,7
%VAM - Porcentaje de vacios en el agregado mineral	15,9	15,9	15,9	15,9

ESTABILIDAD Y FLUJO INV E-748-2013				
Equipo utilizado	7			
Factor de correlación	0,98	0,97	0,97	0,98
Lectura de la máquina (kN)	15,36	16,59	17,12	17,53
Estabilidad medida (N)	15360	16590	17120	17530
Estabilidad medida (kgf)	1566	1692	1746	1788
Estabilidad corregida (kN)	15,05	16,05	16,65	17,22
Estabilidad corregida (N)	15053	16051	16649	17223
FLUJO (mm)	4,03	3,62	4,44	3,22

VALORES PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA					
Golpes/cara	75	Estabilidad (kN)	16,24	Flujo (mm)	3,83
%Va	5,0	%VAM	15,9		

OBSERVACIONES	

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARK MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

PRUEBAS GEOTECNICAS

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS

CÓDIGO:	LB-PR-01-FT-39
VERSIÓN:	4
FECHA ELABORACIÓN:	2022-03-02

NORMA DE REFERENCIA	NORMA INV E 732, 733, 734, 735, 744, 748, 782


CODIGO DE CLIENTE	2040	COMPAÑÍA	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTACTO	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	DIRECCIÓN	AK 9 # 113 - 52 OF.906
OBRA	COP 552-2024	INFORME PG Nº	2338-24
LOCALIZACIÓN	CIV 13000476	FECHA INFORME	2025-06-26

TIPO DE MEZCLA	MD-25	CANTERA / PLANTA	N/E
TEMP. DE LLEGADA C°	23° C	FECHA DE TOMA	2025-06-13
OT No.	778-25	FECHA ENSAYO	2025-06-26

EXTRACCIÓN (INVE 732 "Método A")	
W_1 Masa inicial de la muestra (g)	1502,2
W_2: Masa del agua en la muestra (g)	0,2
W_3: Masa del agregado mineral extraído (g)	1416,8
W_4: Masa del material retenido en filtro (g)	3,97
Contenido de asfalto (%)	5,4

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS (RICE) INV E - 735:2013	
Prueba N°	1
A: Masa en el aire de la muestra seca (g)	2500
D: Masa de la placa de vidrio más el frasco lleno con agua a 25° C (g)	6825
E: Masa del frasco con la placa, el agua y la muestra a 25°C (g)	8271
Gmn: Gravedad especifica teórica máxima de la mezcla	2,372
Peso esp. agregados (g/cm^3)	2,736

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS I.N.V. E-782-13					
Peso 1 (g)		1348,2	Peso 2 (g)		1343,6
Tamiz		Peso Retenido (g)	% Retenido	% Retenido acum.	% pasa
Pulgada	mm				
1 1/2"	38,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	30,4	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	19,0	31,2	2,3	2,3	97,7
1/2"	12,7	226,4	16,8	19,1	80,9
3/8"	9,5	134,6	10,0	29,1	70,9
No. 4	4,8	247,6	18,4	47,5	52,5
No. 10	2,0	241,2	17,9	65,3	34,7
No. 40	0,4	350,2	26,0	91,3	8,7
No. 80	0,18	82,6	6,1	97,4	2,6
No. 200	0,07	29,6	2,2	99,6	0,4
FONDO		0,2	-	-	-

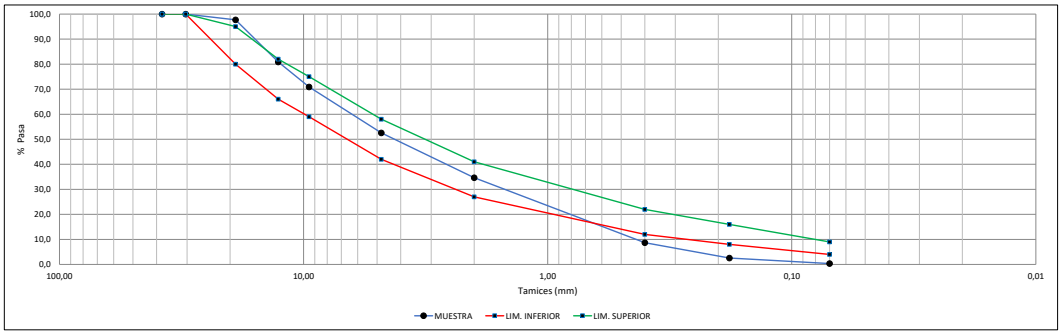

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS - INV E 733:2013				
Briqueta N°	1	2	3	4
Espesor briqueta (mm)	63,0	63,2	63,9	63,8
A - Masa del especimen seco en el aire (g)	1171	1167	1168	1169
B - Masa en el aire del especimen SSS (g)	1174	1170	1172	1171
C - Masa del especimen sumergido en agua (g)	655	654	653	655
Volumen briqueta (cm3)	508,9	510,5	516,1	515,3
Gravedad especifica bulk-Gmb	2,256	2,262	2,250	2,266
Densidad (g/cm3)	2,249	2,255	2,244	2,259
%Va - Porcentaje de vacios con aire	4,9	4,6	5,1	4,5
%VAM - Porcentaje de vacios en el agregado mineral	15,9	15,9	15,9	15,9

ESTABILIDAD Y FLUJO INV E-748-2013				
Equipo utilizado	7			
Factor de correlación	1,02	1,01	0,99	1,00
Lectura de la máquina (kN)	17,08	17,93	16,94	17,24
Estabilidad medida (N)	17080	17930	16940	17240
Estabilidad medida (kgf)	1742	1828	1727	1758
Estabilidad corregida (kN)	17,34	18,11	16,81	17,15
Estabilidad corregida (N)	17336	18109	16813	17154
FLUJO (mm)	3,5	4,1	3,9	4

VALORES PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA					
Golpes/cara	75	Estabilidad (kN)	17,35	Flujo (mm)	3,88
%Va	4,8	%VAM	15,9		

OBSERVACIONES	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
	
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARK MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENCIA

PRUEBAS GEOTECNICAS	ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS	CÓDIGO:	LB-PR-01-FT-39
		VERSIÓN:	4
		FECHA ELABORACIÓN:	2022-03-02

NORMA DE REFERENCIA	NORMA INV E 732, 733, 734, 735, 744, 748, 782


CODIGO DE CLIENTE	2040	COMPAÑÍA	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTACTO	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	DIRECCIÓN	AK 9 # 113 - 52 OF.906
OBRA	COP 552-2024	INFORME PG Nº	2339-24
LOCALIZACIÓN	CIV 13000864	FECHA INFORME	2025-06-26

TIPO DE MEZCLA	MD-25	CANTERA / PLANTA	N/E
TEMP. DE LLEGADA C°	23° C	FECHA DE TOMA	2025-06-13
OT No.	779-25	FECHA ENSAYO	2025-06-26

EXTRACCIÓN (INVE 732 "Método A")	
W_1 Masa inicial de la muestra (g)	1502,2
W_2: Masa del agua en la muestra (g)	0,2
W_3: Masa del agregado mineral extraído (g)	1416,8
W_4: Masa del material retenido en filtro (g)	3,97
Contenido de asfalto (%)	5,4

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS (RICE) INV E - 735:2013	
Prueba N°	1
A: Masa en el aire de la muestra seca (g)	2500
D: Masa de la placa de vidrio más el frasco lleno con agua a 25° C (g)	6825
E: Masa del frasco con la placa, el agua y la muestra a 25°C (g)	8271
Gmn: Gravedad especifica teórica máxima de la mezcla	2,372
Peso esp. agregados (g/cm³)	2,762

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS I.N.V. E-782-13					
Peso 1 (g)		1430,0	Peso 2 (g)		1425,4
Tamiz		Peso Retenido (g)	% Retenido	% Retenido acum.	% pasa
Pulgada	mm				
1 1/2"	38,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	30,4	20,2	1,4	1,4	98,6
3/4"	19,0	185,4	13,0	14,4	85,6
1/2"	12,7	81,4	5,7	20,1	79,9
3/8"	9,5	144,0	10,1	30,1	69,9
No. 4	4,8	258,6	18,1	48,2	51,8
No. 10	2,0	348,4	24,4	72,6	27,4
No. 40	0,4	128,8	9,0	81,6	18,4
No. 80	0,18	82,0	5,7	87,3	12,7
No. 200	0,07	36,4	2,5	89,9	10,1
FONDO		0,2	-	-	-

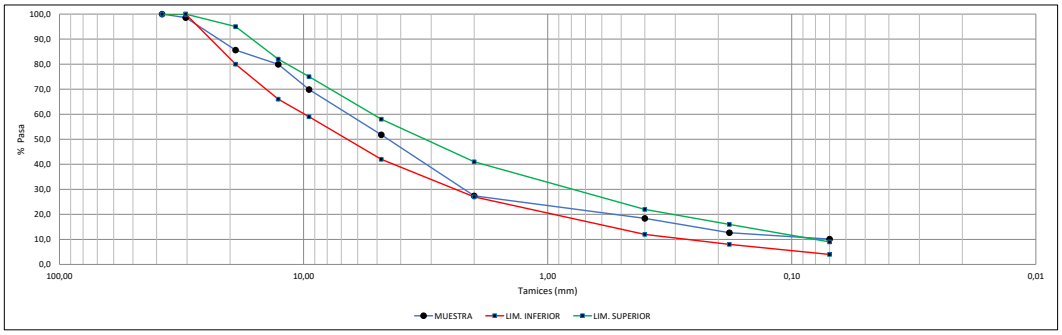

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS - INV E 733:2013				
Briqueta N°	1	2	3	4
Espesor briqueta (mm)	63,1	64	63,8	63,6
A - Masa del especimen seco en el aire (g)	1167,4	1169,6	1165,8	1169,8
B - Masa en el aire del especimen SSS (g)	1169,2	1171,8	1168,4	1171,4
C - Masa del especimen sumergido en agua (g)	657	644	655	653
Volumen briqueta (cm3)	509,7	516,9	515,3	513,7
Gravedad especifica bulk-Gmb	2,279	2,216	2,271	2,257
Densidad (g/cm3)	2,272	2,209	2,264	2,250
%Va - Porcentaje de vacios con aire	3,9	6,6	4,3	4,9
%VAM - Porcentaje de vacios en el agregado mineral	15,9	15,9	15,9	15,9

ESTABILIDAD Y FLUJO INV E-748-2013				
Equipo utilizado	7			
Factor de correlación	1,01	0,99	1,00	1,00
Lectura de la máquina (kN)	16,9	18,7	17,3	16,5
Estabilidad medida (N)	16900	18700	17300	16500
Estabilidad medida (kgf)	1723	1907	1764	1683
Estabilidad corregida (kN)	17,11	18,51	17,21	16,50
Estabilidad corregida (N)	17111	18513	17214	16500
FLUJO (mm)	3,8	3,5	3,7	3,8

VALORES PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA					
Golpes/cara	75	Estabilidad (kN)	17,33	Flujo (mm)	3,70
%Va	4,9	%VAM	15,9		

OBSERVACIONES	

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARK MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

PRUEBAS GEOTECNICAS

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS

CÓDIGO:	LB-PR-01-FT-39
VERSIÓN:	4
FECHA ELABORACIÓN:	2022-03-02

NORMA DE REFERENCIA	NORMA INV E 732, 733, 734, 735, 744, 748, 782


CODIGO DE CLIENTE	2040	COMPAÑÍA	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTACTO	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	DIRECCIÓN	AK 9 # 113 - 52 OF.906
OBRA	COP 552-2024	INFORME PG Nº	2340-24
LOCALIZACIÓN	CIV 13000864	FECHA INFORME	2025-06-26

TIPO DE MEZCLA	MD-19	CANTERA / PLANTA	N/E
TEMP. DE LLEGADA C°	23° C	FECHA DE TOMA	2025-06-13
OT No.	788-24	FECHA ENSAYO	2025-06-26

EXTRACCIÓN (INVE 732 "Método A")	
W_1 Masa inicial de la muestra (g)	1502,4
W_2: Masa del agua en la muestra (g)	0,1
W_3: Masa del agregado mineral extraído (g)	1418,6
W_4: Masa del material retenido en filtro (g)	1,74
Contenido de asfalto (%)	5,5

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS (RICE) INV E - 735:2013	
Prueba N°	1
A: Masa en el aire de la muestra seca (g)	2500
D: Masa de la placa de vidrio más el frasco lleno con agua a 25° C (g)	6825
E: Masa del frasco con la placa, el agua y la muestra a 25°C (g)	8271
Gmn: Gravedad especifica teórica máxima de la mezcla	2,372
Peso esp. agregados (g/cm^3)	2,736

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS I.N.V. E-782-13					
Peso 1 (g)		1380,2	Peso 2 (g)		1377,0
Tamiz		Peso Retenido (g)	% Retenido	% Retenido acum.	% pasa
Pulgada	mm				
1 1/2"	38,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	30,4	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	19,0	32,2	2,3	2,3	97,7
1/2"	12,7	142,0	10,3	12,6	87,4
3/8"	9,5	148,2	10,7	23,4	76,6
No. 4	4,8	316,4	22,9	46,3	53,7
No. 10	2,0	293,2	21,2	67,5	32,5
No. 40	0,4	330,8	24,0	91,5	8,5
No. 80	0,18	81,0	5,9	97,4	2,6
No. 200	0,07	32,0	2,3	99,7	0,3
FONDO		1,2	-	-	-

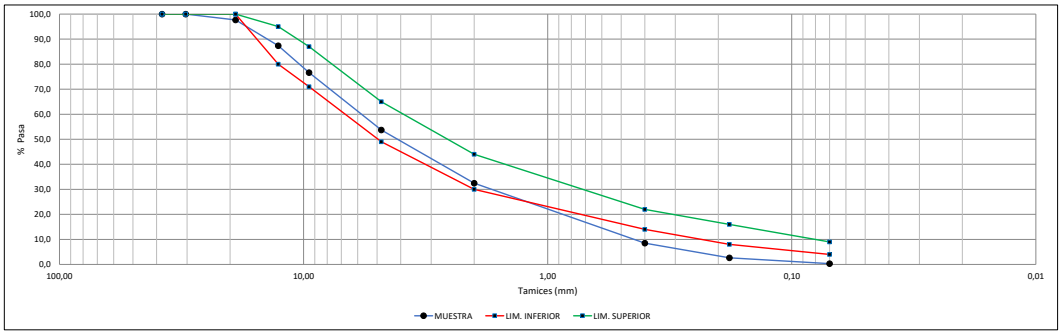

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS - INV E 733:2013				
Briqueta N°	1	2	3	4
Espesor briqueta (mm)	63,5	63,8	64,2	63,2
A - Masa del especimen seco en el aire (g)	1167,4	1170,2	1169,6	1168,8
B - Masa en el aire del especimen SSS (g)	1169,8	1172,6	1171,8	1170,4
C - Masa del especimen sumergido en agua (g)	647	655	659	652
Volumen briqueta (cm3)	512,9	515,3	518,5	510,5
Gravedad especifica bulk-Gmb	2,233	2,261	2,281	2,255
Densidad (g/cm3)	2,226	2,254	2,274	2,248
%Va - Porcentaje de vacios con aire	5,9	4,7	3,8	4,9
%VAM - Porcentaje de vacios en el agregado mineral	15,3	15,3	15,3	15,3

ESTABILIDAD Y FLUJO INV E-748-2013				
Equipo utilizado	7			
Factor de correlación	1,00	1,00	0,99	1,01
Lectura de la máquina (kN)	16,5	17,38	18,34	17,4
Estabilidad medida (N)	16500	17380	18340	17400
Estabilidad medida (kgf)	1683	1772	1870	1774
Estabilidad corregida (kN)	16,54	17,29	18,06	17,57
Estabilidad corregida (N)	16541	17293	18065	17574
FLUJO (mm)	3,8	3,6	4,5	3,5

VALORES PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA					
Golpes/cara	75	Estabilidad (kN)	17,37	Flujo (mm)	3,85
%Va	4,8	%VAM	15,3		

OBSERVACIONES	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
	
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARK MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENCIA

ANEXO N°7

Correspondencia enviada y recibida

Bogotá, 11 de junio de 2025

TEUSAVIAL-552-071

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: Entrega de informe técnico mensual N°4 y acta de pago N°4

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del informe técnico mensual N°4 y acta de pago N°4 con sus respectivos soportes.

Quedamos atentos a su revisión y aprobación.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL
Archivo: Digital al correo coordinacion.interteusaquillojg@gmail.com

CONSORCIO TEUSAVIAL

Bogotá, 13 de junio de 2025

TEUSAVIAL-552-072

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: Entrega de diagnósticos de segmentos para viabilidad de acciones de movilidad

Cordial Saludo,
Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega de los resultados de los diagnósticos de segmentos para viabilidad de acciones de movilidad, en el cual se emite concepto por parte del especialista sobre el tipo de intervención.

Quedamos atentos a su revisión.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL
Archivo: Digital al correo coordinacion.interteusaquillojg@gmail.com
