IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales



Imágenes Actuales



1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-807-2019 - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS VEREDAS ALTO FRUTAL, PUERTO QUINCHANA, BAJO FRUTAL, EL BARNIZ, EL JABÓN, EL ROSARIO, LA MURALLA, LA CHAQUIRA, LA TRIBUNA, LOS CAUCHOS, NAZARETH, SAN LORENZO, SEVILLA, YARUMAL

Objeto:

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VEREDAS ALTO FRUTAL, PUERTO QUINCHANA, BAJO FRUTAL, EL BARNIZ, EL JABÓN, EL ROSARIO, LA MURALLA, LA CHAQUIRA, LA TRIBUNA, LOS CAUCHOS, NAZARETH, SAN LORENZO, SEVILLA, YARUMAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, EL CUAL SERÁ CONSTRUIDO POR EL OPERADOR DE RED BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA ENTREGA AL MINISTERIO Y EL CUAL ES FINANCIADO CON EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTEERCONECTADAS - FAER

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Faer
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS VEREDAS ALTO FRUTAL, PUERTO QUINCHANA, BAJO FRUTAL, EL BARNIZ, EL JABÓN, EL ROSARIO, LA MURALLA, LA CHAQUIRA, LA TRIBUNA, LOS CAUCHOS, NAZARETH, SAN LORENZO, SEVILLA, YARUMAL

1.4 Duración Proyecto:

Días:	2054
Desde:	16 de julio de 2020
Hasta:	28 de febrero de 2026

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Retirados	UND	1

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Nuevos	UND	1
Alcance	Empleos Directos	UND	1
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	550
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	550
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	550

The resource of this report item is not reachable.

UBICACIÓN DEL PROYECTO


Municipio
Huila, San Agustín
Tipo Origen
Municipal

Latitud	1,9166667
Longitud	-76,3333333
Dirección	
Huila - San Agustín	

VALORES DEL PROYECTO

Valor global	$ 5.426.814.830,00
Valor del proyecto	$ 5.426.814.830,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	$ 4.140.596.221,56
Valor por ejecutar	$ 1.286.218.608,44

AVANCE DEL PROYECTO

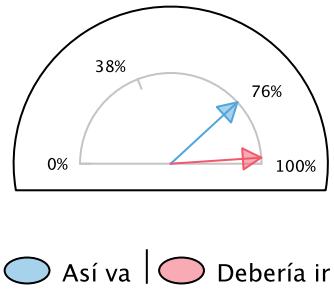

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS	
Número Contrato:	GGC-807-2019
Contrato:	GGC-807-2019
Objeto del Contrato:	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ? SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ?CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VEREDAS ALTO FRUTAL, PUERTO QUINCHANA, BAJO FRUTAL, EL BARNIZ, EL JABÓN, EL ROSARIO, LA MURALLA, LA CHAQUIRA, LA TRIBUNA, LOS CAUCHOS, NAZARETH, SAN LORENZO, SEVILLA, YARUMAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN?, EL CUAL SERÁ CONSTRUIDO POR EL OPERADOR DE RED BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA ENTREGA AL MINISTERIO Y EL CUAL ES FINANCIADO CON EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER.
Fecha Inicio:	16 jul. 2020
Fecha Fin:	15 jul. 2040
Duración (Días):	7304
Valor contrato:	$ 5.426.814.830,00
Valor asociado:	$ 5.426.814.830,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento
Cumplimiento	3002708	Previsora	25/07/2024

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
19 feb. 2025		$ 5.259.444.969,45	0,55%	76,30%	

Comentario: En el presente mes, se han subsanado algunas de las observaciones identificadas durante la visita del supervisor del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, aún se continúa trabajando para subsanar la totalidad de las observaciones pendientes.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Otros Trámites

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
El contrato a corte de diciembre de 2024 estaba de acuerdo al Otrosí No.7, mediante el cual se prorrogó la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación, hasta el día 3 de febrero de 2025. Sin embargo se realizo la solicitud de ampliación de 150 días al contrató marco.	

Ambiental

Logro	Dificultad
Para el presente mes no se presentaron dificultades ambientales la obra se ha culminado al 100%	

Financiero

Logro	Dificultad
	A la fecha el contrato cuenta con el 80 % de los recursos desembolsados los cuales ascienden a la suma de $ $4.341.451.864,60 y está pendiente el cuarto y quinto desembolso equivalente al 20% del valor del contrato equivalente a la suma de $ 1.085.362.966,40.

Jurídico

Logro	Dificultad
	El contratista de la obra se encuentra actualmente recopilando los soportes necesarios para proceder con la liquidación del contrato derivado del proyecto FAER GGC 807 2019.

Social

Logro	Dificultad
Para el presente mes no se presentaron dificultades sociales la obra se ha culminado al 100%	

Técnico


Logro	Dificultad
	En el presente mes, se han subsanado algunas de las observaciones identificadas durante la visita del supervisor del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, aún se continúa trabajando para subsanar la totalidad de las observaciones pendientes.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
20 ene. 2025		$ 5.221.974.105,15	1,00%	75,75%	

Comentario: En el presente mes, se han subsanado algunas de las observaciones identificadas durante la visita del supervisor del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, aún se continúa trabajando para subsanar la totalidad de las observaciones pendientes.

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Otros Trámites

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	Estamos a la espera de las correcciones a las observaciones del informe final por parte del contratista interventor con el fin de ser presentado nuevamente al Ministerio de Minas y Energía.

Ambiental

Logro	Dificultad
Para el presente mes no se presentaron dificultades ambientales la obra se ha culminado al 100%	

Financiero

Logro	Dificultad
	Hasta la fecha del informe presentado, no se ha efectuado el desembolso solicitado del contrato FAER GGC 807 2019.

Jurídico

Logro	Dificultad
	El contratista de la obra se encuentra actualmente recopilando los soportes necesarios para proceder con la liquidación del contrato derivado del proyecto FAER GGC 807 2019.


Social

Logro	Dificultad
Para el presente mes no se presentaron dificultades sociales la obra se ha culminado al 100%	

Técnico

Logro	Dificultad
Durante el mes de ejecución del presente informe, se realizó una visita técnica por parte del supervisor del Ministerio de Minas y Energía, en la cual surgieron algunas observaciones.	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
21 dic. 2024		$ 5.342.799.696,70	0,75%	74,75%	

Comentario: En noviembre de 2024, se remitieron al ente certificador RETIE una serie de subsanaciones, pero hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta favorable al respecto.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Otros Trámites

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	Estamos a la espera de las correcciones a las observaciones del informe final por parte del contratista interventor con el fin de ser presentado nuevamente al Ministerio de Minas y Energía.

Ambiental

Logro	Dificultad
Para el presente mes no se presentaron dificultades ambientales la obra se ha culminado al 100%	

Financiero

Logro	Dificultad
A la fecha el contrato cuenta con el 80 % de los recursos desembolsados los cuales ascienden a la suma de $ $4.341.451.864,60 y está pendiente el cuarto y quinto desembolso equivalente al 20% del valor del contrato equivalente a la suma de $ 1.085.362.966,40.	

Jurídico

Logro	Dificultad
El contrato a corte de noviembre de 2024 estaba de acuerdo al Otrosí No.7, mediante el cual se prorrogó la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación, hasta el día 3 de febrero de 2025.	

Social

Logro	Dificultad
	Se siguen presentando dificultades para obtener la documentación de algunos beneficios debido a la dificulta para localizarlos. Se sigue trabajando en estrategias para facilitar el proceso de recopilación de documentos de los últimos usuarios con ayuda de la comunidad.

Técnico

Logro	Dificultad
	En noviembre de 2024, se remitieron al ente certificador RETIE una serie de subsanaciones, pero hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta favorable al respecto.


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
21 nov. 2024		$ 5.285.516.651,27	4,50%	74,00%	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Comentario: Se han presentado dificultades para obtener la documentación de algunos beneficios debido a la dificulta para localizarlos. Se está trabajando en estrategias para facilitar el proceso de recopilación de documentos de los últimos usuarios con ayuda de la comunidad.

Avance



Factor Atraso

Otros Trámites

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
El contrato de obra derivado del proyecto FAER GGC 807 2019 ya alcanzo el 100% de avance físico.	

Ambiental

Logro	Dificultad
Para el presente mes no se presentaron dificultades ambientales la obra se ha culminado al 100%	

Financiero

Logro	Dificultad
A la fecha el contrato cuenta con el 80 % de los recursos desembolsados los cuales ascienden a la suma de $ $4.341.451.864,60 y está pendiente el cuarto y quinto desembolso equivalente al 20% del valor del contrato equivalente a la suma de $ 1.085.362.966,40.	

Jurídico

Logro	Dificultad
El contrato a corte de octubre de 2024 estaba de acuerdo al Otrosí No.7, mediante el cual se prorrogó la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación, hasta el día 3 de febrero de 2025.	

Social

Logro	Dificultad
	Se han presentado dificultades para obtener la documentación de algunos beneficios debido a la dificulta para localizarlos. Se está trabajando en estrategias para facilitar el proceso de recopilación de documentos de los últimos usuarios con ayuda de la comunidad.

Técnico

Logro	Dificultad
Se están elaborando los planos record para la solicitud de placas de codificación de apoyos de media y baja tensión y transformadores, Según los requisitos establecidos por la Electrificadora del Huila.	


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
6 oct. 2024	 Trabajo en oficina – Actividades Administrativas	$ 5.426.814.830,00	1,50%	69,50%	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Comentario: Se reviso las nuevas novedades reportadas por el inspector RETIE.

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Planos

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
Se continuo con el inventario final de los materiales y equipos utilizados en la construcción del proyecto, un paso necesario para la elaboración del acta de recibo final. Se aclara que en esta etapa se verifica la construcción de obra de un usuario adicional, por lo que se definen 576 usuarios a beneficiar por el contrato de obra 423 de 2020.	

Ambiental

Logro	Dificultad
Para el presente mes no se presentaron dificultades ambientales la obra se ha culminado al 100%	

Financiero

Logro	Dificultad
A la fecha el contrato cuenta con el 80 % de los recursos desembolsados los cuales ascienden a la suma de $ $4.341.451.864,60 y está pendiente el cuarto y quinto desembolso equivalente al 20% del valor del contrato equivalente a la suma de $ 1.085.362.966,40.	

Jurídico

Logro	Dificultad
El contrato a corte de septiembre de 2024 estaba de acuerdo al Otrosí No.6 del 9 de junio de 2024, mediante el cual se prorrogó la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación, hasta el día 6 de octubre de 2024.	

Social

Logro	Dificultad
	Se han presentado dificultades para obtener la documentación de algunos beneficios debido a la dificulta para localizarlos. Se está trabajando en estrategias para facilitar el proceso de recopilación de documentos de los últimos usuarios con ayuda de la comunidad.

Técnico


Logro	Dificultad
Se están elaborando los planos record para la solicitud de placas de codificación de apoyos de media y baja tensión y transformadores, Según los requisitos establecidos por la Electrificadora del Huila.	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
22 sept. 2024		$ 5.380.385.414,23	0,50%	68,00%	

Comentario: Se reviso novedades reportadas por el inspector RETIE.

Avance



Factor Atraso

Planos

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
Se continuo con el inventario final de los materiales y equipos utilizados en la construcción del proyecto, un paso necesario para la elaboración del acta de recibo final. Se aclara que en esta etapa se verifica la construcción de obra de un usuario adicional, por lo que se definen 576 usuarios a beneficiar por el contrato de obra 423 de 2020.	

Ambiental

Logro	Dificultad
Para el presente mes no se presentaron dificultades ambientales la obra se ha culminado al 100%	

Financiero

Logro	Dificultad
A la fecha el contrato cuenta con el 80 % de los recursos desembolsados los cuales ascienden a la suma de $ $4.341.451.864,60 y está pendiente el cuarto y quinto desembolso equivalente al 20% del valor del contrato equivalente a la suma de $ 1.085.362.966,40.	

Jurídico

Logro	Dificultad
El contrato a corte de agosto de 2024 estaba de acuerdo al Otrosí No.6 del 9 de junio de 2024, mediante el cual se prorrogó la fecha de finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación, hasta el día 6 de octubre de 2024	

Social

Logro	Dificultad
	Se han presentado dificultades para obtener la documentación de algunos beneficios debido a la dificulta para localizarlos. Se esta trabajando en estrategias para facilitar el proceso de recopilación de documentos de los últimos usuarios con ayuda de la comunidad.

Técnico

Logro	Dificultad
Se están elaborando los planos record para la solicitud de placas de codificación de apoyos de media y baja tensión y transformadores, Según los requisitos establecidos por la Electrificadora del Huila.	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
23 ago. 2024		$ 5.280.893.809,02	2,10%	67,50%	

Comentario: Planos RECORD: Se están elaborando los planos record para la solicitud de placas de codificación de apoyos de media, baja tensión y transformadores, según los requisitos establecidos por la Electrificadora del Huila. Estos planos son importantes para la gestión y mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Otros Trámites

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	Dificultades en la entrega de documentos: Se han encontrado dificultades para obtener la documentación de algunos beneficiarios debido a la dificultad para localizarlos. Se está trabajando en estrategias para facilitar el proceso de recopilación de documentos de los ultimo usuarios con ayuda de la comunidad

Ambiental

Logro	Dificultad
	Durante el mes de julio se presentaron un total de 23 días con precipitaciones, un 40% de nubosidad y solo 5 días de sol, este seguimiento el contratista lo realiza con el fin de tener conocimiento del estado de las vías y como se ven afectadas con esta variabilidad climática.

Financiero

Logro	Dificultad
Actualmente esta pendiente el desembolso del 20 % final de contrato interadministrativo.	

Jurídico

Logro	Dificultad
El contrato FAER GGC 807 de 2019, suscrito entre la Nación-Ministerio de Minas y Energía y la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., se encuentra vigente.	

Social

Logro	Dificultad
Se realizaron reuniones con las comunidades de El Barniz, Bajo Frutal, Puerto Quinchana, en aras de recolectar documentación para la legalización de acometidas, también se realizaron aclaraciones del alcance del proyecto con la ayuda del personal de la ORSA de ElectroHuila S.A. E.S.P.	

Técnico


Logro	Dificultad
Verificación de las redes: En el mes de julio se realizaron visitas a las redes construidas con el objetivo de que el organismo certificador del RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) emita los dictámenes correspondientes. Este proceso es fundamental para garantizar que las redes cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos.	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
24 jul. 2024		$ 5.181.402.203,80	1,73%	65,40%	

Comentario: Durante el mes de junio de 2024, el avance de la construcción se ve con el inicio del tendido de redes en las vereda Yarumal, al igual se realizaron una serie de actividades: Construcción e instalación de templetes, Instalación de herrajes para estructuras en media tensión, construcción de acometidas, regado y tensionado de conductores en media tensión y montaje de transformadores.

Avance



Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos

Ambiental

Logro	Dificultad
	En el presente mes de junio de 2024 se presentaron 21días de lluvia los cuales dificultaron las labores y la nubosidad que también imposibilita el tendido de redes en el sector.

Técnico

Logro	Dificultad
Durante el mes de junio de 2024, el avance en la construcción se ve con el inicio del tendido de redes en la vereda Yarumal, al igual que se ha culminado la construcción de las acometidas del proyecto (575)	


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
9 jun. 2024		$ 5.081.910.598,58	0,68%	63,67%	

Comentario: En el mes de mayo del 2024 se obtuvo un avance de obra del 96,2%, en donde se desarrollaron actividades de campo en las en la vereda Yumaral, las actividades desarrolladas fueron: construcción e instalación de templetes, instalación de herrajes para estructuras en media tensión, construcción de acometidas, regado y tensionado de conductores de media tensión y montaje de transformadores.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	El diez (10) de mayo de 2024 el equipo de supervisión por parte de ElectroHuila S.A. E.S.P. se realizo solicitud de modificación No 6 al contrato FAER GGC 807 - 2019.

Ambiental

Logro	Dificultad
	En el mes de mayo identificando presencia de lluvia, nubosidad y sol, con una variabilidad climática durante el desarrollo de las obras, realizaron registro con el fin de controlar y verificar que el comportamiento del clima no afecte la operación de las actividades y velar por las condiciones viales, puesto que en temporada de lluvia se convierten de difícil acceso. Teniendo en cuenta lo mencionado se deja evidencia que durante este mes las precipitaciones fueron más altas, lo que impide en algunas veredas el desarrollo óptimo de las activades debido al difícil acceso a las zonas de trabajo, no obstante, cada cuadrilla realizo lo necesario para llevar a cabo las labores, por lo tanto, las cuadrillas en terreno reportan un promedio de 14 días con intensas lluvias, así como un aproximado de 9 días con lloviznas intermitentes para un total de 23 con lluvia días del mes de mayo se presentó precipitación esto se registra en el reporte del clima presentado por el contratista.

Financiero

Logro	Dificultad

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avances Cualitativos

Financiero

Mayo 2024. El Encargo Fiduciario cuenta con un saldo inicial para el mes de mayo de 2024 $638.107.434,60, durante este mes no se presentaron desembolsos por parte del MME, a corte del presente mes los aportes realizados al Fideicomiso ascienden a $4.341.451.864,60. En la cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N° 442550406 se generaron rendimientos del mes de marzo y mayo de 2024 por valor de $ 347.202,00. Para este periodo no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto, se registran “otros ingresos” por valor de $2.831.899,00 correspondiente a cxc a cargo del fideicomitente. El 14 de mayo se realiza giro de rendimientos correspondiente al mes de abril de 2024 por $ 895.610. Para el presente mes se generó cobro de Retención en la fuente por valor de $24.304,00, se generó cobro de GMF por valor de $82.154,00 correspondiente a GMF de retención en la fuente, giro de rendimientos y desembolsos. El saldo final del Fideicomiso a corte del 31 de mayo de 2024 asciende a la suma de $617.821.418,60. El saldo disponible después de descontar la Rete garantía $518.079.661,60. Al cierre del periodo se registran cuentas por cobrar al Fideicomitente por concepto de costos y gastos el valor total de $1.452.436,00 que corresponde a $932.262,00 la devolución de GMF no procedente de cobro por parte del Banco de Bogotá, y por valor de $520.174,00 al Fideicomitente por concepto de costos y gastos del cual se solicitará la devolución. Se registran cuentas por pagar por valor de $101.194.193,00 correspondiente a retención en garantía del tercero ING SAS.	

Jurídico

Logro	Dificultad
	Actualmente esta en proceso los trámites pertinentes de expedición de las garantías pendiente del proyecto de referencia, una vez se tenga serán remitidas al Ministerio de Minas y Energía.

Social

Logro	Dificultad
se realizaron reuniones en las diferentes veredas y en esta ocasión se ha contado con la presencia de Personal de la ORSA de Electrohuila la cual ha verificado el suministro de documentos por parte de los beneficiaros, pero aún se carece de la documentación completa con las comundiades de: Alto Frutal, Bajo Frutal y Tribuna, Los cauchos, La Muralla, San Lorenzo y Quinchana – Yarumal	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
25 may. 2024		$ 5.228.797.789,66	6,79%	62,99%	

Comentario: En el mes de abril del 2024 se obtuvo un avance de obra del 92,1%, en donde se desarrollaron actividades de campo en las en las veredas, Bajo Frutal, Tribuna, Los Cauchos, Puerto Quinchana Y Yumaral, las actividades desarrolladas fueron: construcción e instalación de templetes, instalación de herrajes para estructuras en media tensión, construcción de acometidas, regado y tensionado de conductores de media tensión y montaje de transformadores.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	a fecha 30 de abril de 2024, el avance del proyecto se registra en 92,1% encontrándose por debajo del avance proyectado en un 0,9% dicho atraso se presenta por temas relacionados con las lluvias que para el presente mes de análisis lo que genera un atraso en el cumplimento de las actividades relacionadas en el cronograma de trabajo.

Ambiental

Logro	Dificultad
	En el mes de abril identificando presencia de lluvia, nubosidad y sol, con una variabilidad climática durante el desarrollo de las obras, realizaron registro con el fin de controlar y verificar que el comportamiento del clima no afecte la operación de las actividades y velar por las condiciones viales, puesto que en temporada de lluvia se convierten de difícil acceso. Teniendo en cuenta lo mencionado se deja evidencia que durante este mes las precipitaciones fueron más altas, lo que impide en algunas veredas el desarrollo óptimo de las activades debido al difícil acceso a las zonas de trabajo, no obstante, cada cuadrilla realizo lo necesario para llevar a cabo las labores, por lo tanto, las cuadrillas en terreno reportan un promedio de 14 días con intensas lluvias, así como un aproximado de 5 días con lloviznas intermitentes.

Técnico

Logro	Dificultad
En el mes de Marzo de 2024 se tuvo un avance de obra del 92,1% en las veredas, Bajo Frutal, Tribuna, Los Cauchos, Puerto Quinchana Y Yumaral, en donde se realizaron la construcción e instalación de templetes, instalación de herrajes para estructuras en media tensión, construcción de acometidas, regado y tensionado de conductores de media tensión y montaje de transformadores.	


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
25 abr. 2024		$ 4.955.304.689,03	1,44%	56,19%	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Comentario: En el mes de marzo del 2024 se obtuvo un avance de obra del 89 %, en donde se desarrollaron actividades de campo en las en las veredas Alto Frutal, Bajo Frutal, Tribuna, Los Cauchos, Puerto Quinchana Y Yumaral, las actividades desarrolladas fueron: construcción e instalación de templetes, instalación de herrajes para estructuras en media tensión, construcción de acometidas, regado y tensionado de conductores de media tensión y montaje de transformadores.

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	a fecha 31 de marzo de 2024, el avance del proyecto se registra en 89% encontrándose por debajo del avance proyectado en un 4% dicho atraso se presenta en el cronograma interno de Electrohuila S.A. E.S.P. por temas relacionados con las lluvias que para el presente mes de análisis corresponden 7 días en donde se registran precipitaciones lo que genera un atraso en el cumplimento de las actividades relacionadas en el cronograma de trabajo.

Ambiental

Logro	Dificultad
	En el mes de marzo de 2024 se presentaron en 7 días del mes, lluvias y/o lloviznas en la zona de influencia del proyecto, los cuales dificultaron el desarrollo habitual de las labores de construcción, no solo por las lluvias en si, si no por la afectación en el normal desplazamiento de los vehículos en las zonas rurales del municipio de San Agustin.

Técnico

Logro	Dificultad
Para este periodo ingresan material eléctrico para redes y acometidas al proyecto, lo cual, venía siendo una dificulta recurrente para meses anteriores	


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
26 mar. 2024		$ 4.750.687.080,68	0,99%	54,75%	

Comentario: En el mes de febrero del 2024 se obtuvo un avance de obra del 83 %, en donde se desarrollaron actividades de campo en las en las veredas La Chaquira, La Muralla, Bajo Frutal en labores de redes y en las veredas Nazareth, Rosario, El Barniz, Los Cauchos en construcción de acometidas.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos

Administrativo


Logro	Dificultad
	Se presenta un atraso en la ejecución del cronograma del Ministerio de Minas y Energía, este atraso se debe a las dificultades que se han presentado en la ejecución del contrato de obra derivado.

Ambiental

Logro	Dificultad
	En el mes de febrero de 2024 se presentaron en 11 días del mes, lluvias y/o lloviznas en la zona de influencia del proyecto, los cuales dificultaron el desarrollo habitual de las labores de construcción, no solo por las lluvia en si, si no por la afectación en el normal desplazamiento de los vehículos en las zonas rurales del municipio de San Agustin.

Técnico

Logro	Dificultad
En el mes de Enero de 2024 se tuvo un avance de obra del 83% en las veredas la Chaquira, La Muralla, en donde se realizaron la construcción e instalación de templetes, instalación de herrajes para estructura en baja y media tension, tendido y tensionado de conductores, construcción de acometidas. Para este periodo ingresan materiales eléctricos para redes y acometidas al proyecto, lo cual, venia siendo una dificulta recurrente para meses anteriores.	


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
25 feb. 2024		$ 4.483.794.548,06	1,45%	53,76%	

Comentario: En el mes de Enero del 2024 se obtuvo un avance de obra del 79.18 %, en donde se desarrollaron actividades de campo en las en las veredas La Chaquira, El Jabón, La Muralla, Nazareth y Sevilla. A su vez el día 22 de enero del 2024 mediante documento No. 200-2024-S-0003 enviado por el contratista Obra remite a la interventoría formalmente las situaciones que han generado atraso en la ejecución del contrato y solicitando adición de ampliación de tiempo al contrato de obra No 423-2020 con el fin de llevar a cabo el desarrollo del objeto del contrato. La empresa contratista Interventoría analiza cada una de las situaciones que afectaron el normal desarrollo del proyecto, el día 24 de enero de 2024, se remite oficio No. EH-326 radicado interno No 01-GG-001686-E-2024, con destino a la supervisión del contrato, donde avala la solicitud de prorroga No 04 del contrato de obra 423-2020, de la misma manera solicita prorroga para el contrato 288-2020, con el fin de continuar con las labores de ejecución del proyecto.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	Retraso en el suministro de los materiales debido a la temporada de decembrina donde el proveedor de medidores manifestó que presento retrasos para la revisión y calibración de los mismos por lo cual solo hasta el 11 de enero de 2024 fue posible empezar a entregarlos, a su vez, el difícil acceso a ciertas veredas ya que las vías son terciarias y otras sin acceso vehicular con lo cual ha hecho que los proveedores presentes dificultades logísticas a la hora de entregar el materia en la zona.

Ambiental

Logro	Dificultad
	En el mes de Enero de 2024 se presentaron en 6 días del mes, lluvias y/o lloviznas en la zona de influencia del proyecto, lo cual generó un atraso en las actividades de obra.

Financiero

Logro	Dificultad
	No se adjunta información financiera puesto que por parte de la fiducia no ha llegado información.

Técnico

Logro	Dificultad
En el mes de Enero de 2024 se tuvo un avance de obra del 79,18% en las veredas la Chaquira, El Jabón, La Muralla, Sevilla y Nazareth, en donde se realizaron la construcción e instalación de templetes, tendido y tensionado de conductores ACSR para redes de baja tensión, construcción de acometidas y montaje de transformador.	El avance obtenido en el presente mes ha sido reducido teniendo en cuenta que el reinicio de actividades con normalidad en los proveedores sucedio a partir de la segunda semana de enero, por lo tanto las dos primeras semanas del mes hubo baja disponibilidad de materiales para un optimo desarrollo de las actividades.


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
26 ene. 2024		$ 4.274.728.730,84	0,00%	52,31%	

Comentario: En el mes de diciembre del 2023 se obtuvo un avance de obra del 76.13%, en donde se desarrollaron actividades de campo en las en las veredas Puerto Quinchana, La Chaquira y San Lorenzo.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos

Ambiental

Logro	Dificultad
	En el mes de diciembre se presentaron en 14 días del mes, lluvias y/o lloviznas en la zona de influencia del proyecto, lo cual generó un atraso en las actividades de obra.

Financiero

Logro	Dificultad
	No se adjunta información financiera puesto que por parte de la fiducia no ha llegado información.

Técnico

Logro	Dificultad
En el mes de diciembre se obtuvo un avance de obra del 76.13% en las veredas Puerto Quinchana, La Chaquira y San Lorenzo, en donde se realizaron la construcción e instalación de templetes, instalación de herrajes para estructuras en baja tensión y en media tensión, tendido y tensionado de conductores ACSR para redes de media y baja tensión y construcción de acometidas.	el avance obtenido en el presente mes ha sido reducido teniendo en cuenta que se han reportado falencias en el ingreso de personal operativo nuevo al contrato, por otra parte, la gestión de las ordenes de comprar conforme a las actas No. 2 y 3 han sufrido un atraso en relación a la entrega de materiales por parte de los proveedores, eventos que han generado demoras directas sobre el avance de la obra.


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
27 dic. 2023		$ 4.141.282.464,51	2,04%	52,31%	

Comentario: En el mes de noviembre del 2023 se obtuvo un avance de obra del 75.02%, en donde se desarrollaron actividades de campo en las veredas Bajo Frutal y La Tribuna. Adicional, se recibieron el segundo y tercer desembolso por parte del Ministerio de Minas y Energía.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Escasez De Insumos Y Deficiente Maquinaria
Otros Trámites

Avances Cualitativos

Financiero

Logro	Dificultad
El Encargo Fiduciario cuenta con un saldo inicial para el mes de noviembre de 2023 $408.413.264,50 durante este mes se presentaron desembolsos por parte del MME por valor de $1.628.044.449,10, a corte del presente mes los aportes realizados al Fideicomiso ascienden a $4.341.451.864,60. En la cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N° 442550406 se generaron rendimientos por valor de $1.411.500,00. Para este periodo no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto, no se registran “otros ingresos”. Se generó cobro de Retención en la fuente por $98.805,00, y cobro de GMF por valor de $4.003.567,00 correspondiente a GMF de retención en la fuente, giro de rendimientos y desembolsos. El saldo final del Fideicomiso a corte del 30 de noviembre de 2023 asciende a la suma de $ 1.295.168.207,60. El saldo disponible después de descontar la Rete garantía $ 1.194.321.216,60. Al cierre del periodo se registran cuentas por cobrar al Fideicomitente por concepto de costos y gastos el valor total de $1.041.646,00 que corresponde a $733.085,00 a cargo del Fideicomitente y la devolución de GMF no procedente de cobro por parte del Banco de Bogotá, por valor de $308.561. Se registran cuentas por pagar correspondiente a la retención en garantía por valor de $100.846.991,00 del tercero ING SAS.	

Técnico

Logro	Dificultad
Se adelantaron actividades de campo como la construcción e instalación de templetes, instalación de herrajes para estructuras en baja tensión y en media tensión y tendido y tensionado de conductores ACSR para redes de media y baja tensión en las veredas Bajo Frutal y la Tribuna.	No cuenta con el material en campo para el inicio de obra en las otras veredas.


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
27 nov. 2023		$ 4.059.961.219,43	1,00%	50,27%	

Comentario: Durante el mes de octubre, se adelantaron actividades en campo como instalación de templetes, montaje de transformadores, instalación de cerrajería en estructuras de Media y Baja tensión y tendido de conductores en las veredas Bajo Frutal y La Tribuna. Se envío a la interventoría el otrosí 5 del contrato interadministrativo que fue aprobado con un tiempo de 75 días, con el fin de ajustar los tiempos del plan de mejora.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Atraso De Los Pagos
Escasez De Insumos Y Deficiente Maquinaria
Lluvias

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	Por parte de la División de Financiera, no ha podido generar el pago de las actas parciales 2 y 3.

Financiero

Logro	Dificultad
Se generó cobro de Retención en la fuente por $ 50.617,00, y cobro de GMF por valor de $ 203,00 correspondiente a GMF de retención en la fuente, giro de rendimientos y desembolsos. El saldo final del Fideicomiso a corte del 31 de octubre de 2023 asciende a la suma de $ 408.413.264,50. El saldo disponible después de descontar la Rete garantía $ 307.566.273,50. Al cierre del periodo se registran cuentas por cobrar al Fideicomitente por concepto de costos y gastos el valor total de $ $942.638,00 que corresponde a $ $634.077 a cargo del Fideicomitente y la devolución de GMF no procedente de cobro por parte del Banco de Bogotá, por valor de $308.561.	Se registran cuentas por pagar por valor de $102.001.688,00 correspondiente a rendimientos generados del mes de septiembre y octubre de 2023 por valor de $1.154.697,00 y la retención en garantía por valor de $ 100.846.991,00 del tercero ING SAS.

Técnico

Logro	Dificultad
En el mes de octubre se obtuvo un avance de obra del 69.37% en las veredas Bajo Frutal y La Tribuna, en donde se realizaron acarreo de materiales, vestida y armada de estructuras, tendido y tensionado de red ACSR No 1/0 y cable de guarda, instalación de templetes de MT y en BT se hicieron hincado de postes, vestida y armada de estructuras, tendido y tensionado de red ACSR No 4 ACSR No 2, instalación de templetes y transformadores.	


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
28 oct. 2023		$ 4.039.661.413,33	1,03%	49,26%	

Comentario: En el mes de septiembre, se solicitó la prórroga otrosí 5 del contrato interadministrativo FAER 807 de 2019. Esta administración ha venido gestionando con el Ministerio Minas y Energía el segundo desembolso para proceder a efectuar el pago del Acta Parcial 2 y 3.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Insolvencia

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
Se envió al Ministerio de Minas y Energía el Plan de acción presentado por el contratista y avalado por la interventoría, el cual solicitan 90 días adicionales para poder lograr los resultados	Se encuentra en trámite la emisión de las certificaciones de usuarios NO INTERCONECTADOS al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de los 107 usuarios.

Financiero

Logro	Dificultad
El Encargo Fiduciario cuenta con un saldo inicial para el mes de septiembre de 2023 $ 510.012.724,70, durante este mes no se presentaron desembolsos por parte del MME, a corte del presente mes los aportes realizados al Fideicomiso ascienden a $2.713.407.415,50. En la cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N° 442550406 se generaron rendimientos por valor de $ 431.473,00. Para este periodo no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto, no se registran “otros ingresos”. El día 21 de septiembre de 2023 se realizó el giro de rendimientos del mes de agosto de 2023 por $ 507.188,00. se generó cobro de Retención en la fuente por $ 30.215,00, y cobro de GMF por valor de $ 378.960,00 correspondiente a GMF de retención en la fuente, giro de rendimientos y desembolsos. El saldo final del Fideicomiso a corte del 30 de septiembre de 2023 asciende a la suma de $ 407.740.860,50. El saldo disponible después de descontar la Rete garantía $ 409.165.733,70. Al cierre del periodo se registran cuentas por cobrar al Fideicomitente por concepto de costos y gastos el valor total de $ $892.021,00 que corresponde a $ $583.460 a cargo del Fideicomitente y la devolución de GMF no procedente de cobro por parte del Banco de Bogotá, por valor de $ 308.561. Se registran cuentas por pagar por valor de $ 101.278.464,00 correspondiente a rendimientos generados del mes de septiembre de 2023 y la retención en garantía por valor de $ 100.846.991,00 del tercero ING SAS.	

Técnico

Logro	Dificultad
Durante el mes de septiembre, se realizaron labores de hincado de postes para red de baja tensión y media tensión, vestida de estructuras de BT y MT,tendido y tensionado de conductores de redes de Media y Baja tensión, armado e instalación de templetes en las veredas: Alto Frutal, Bajo Frutal y La Tribuna, obteniendo un avance de obra del 68.28%.	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
28 sept. 2023		$ 4.074.559.331,38	0,54%	48,23%	

Comentario: Durante el mes de agosto, se continúan labores en campo como hincado de postes de red de baja tensión, vestidas de estructuras, tendido y tensionado de conductores de redes de media y baja tensión, armado e instalación de templetes en las veredas Alto Frutal y Bajo frutal. Adicionalmente, la supervisión se encuentra gestionando el certificado de NO INTERCONECTADOS al Sistema Interconectado Nacional (SIN) para los 107 usuarios. Por último, se realizó el día 23 de agosto de 2023, reunión con el contratista, interventoría, supervisor MME y Electrohuila con el fin de dar seguimiento al avance de las actividades. En la reunión se habló de los soportes para la solicitud de ampliación del contrato interadministrativo, enviar unas órdenes de compra de materiales por parte del contratista y remitir el nuevo plan de acción.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Atraso De Los Pagos

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	El acta parcial 2 remitida por el contratista, fue devuelta con observaciones por parte del área de servicios administrativos al contratista, dado que los valores no eran correctos.

Financiero

Logro	Dificultad
El Encargo Fiduciario cuenta con un saldo inicial para el mes de agosto de 2023 $ 510.036.251,70, durante este mes no se presentaron desembolsos por parte del MME, a corte del presente mes los aportes realizados al Fideicomiso ascienden a $2.713.407.415,50. En la cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N° 442550406 se generaron rendimientos por valor de $ 507.188,00. Para este periodo no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto, no se registran “otros ingresos”. El día 22 de agosto de 2023 se realizó el giro de rendimientos del mes de julio de 2023 por $ 493.100,00. se generó cobro de Retención en la fuente por $ 35.501,00, y cobro de GMF por valor de $ 2.114,00 correspondiente a GMF de retención en la fuente, giro de rendimientos y desembolsos. El saldo final del Fideicomiso a corte del 31 de agosto de 2023 asciende a la suma de $ 510.012.724,70. El saldo disponible después de descontar la Rete garantía $ 409.165.733,70. Al cierre del periodo se registran cuentas por cobrar al Fideicomitente por concepto de costos y gastos el valor total de $ 782.910,00 que corresponde a $ 505.888 a cargo del Fideicomitente y la devolución de GMF no procedente de cobro por parte del Banco de Bogotá, por valor de $ 277.022. Se registran cuentas por pagar por valor de $ 101.340.091,00 correspondiente a rendimientos generados del mes de julio de 2023 y la retención en garantía por valor de $ 100.846.991,00 del tercero ING SAS.	

Técnico

Logro	Dificultad
Durante el mes de agosto, se continúan labores en campo como hincado de postes de red de baja tensión, vestidas de estructuras, tendido y tensionado de conductores de redes de media y baja tensión, armado e instalación de templetes en las veredas Alto Frutal y Bajo frutal	Durante el desarrollo de las actividades del mes de agosto se tuvo un avance del 65.58%, un avance un poco sustancial debido a la disponibilidad de material por falta de recurso económicos sustentado por el contratista, dado que no se ha realizado el pago parcial del Acta Parcial 2.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
29 ago. 2023		$ 4.045.141.115,61	0,20%	47,69%	

Comentario: La supervisión Electrohuila S.A E.S.P recibe la autorización del permiso de aprovechamiento forestal para la vereda Yarumal. El contratista en el informe notifica un avance del 64.40%.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos

Ambiental

Logro	Dificultad
El día 17 de julio se envía a la interventoría la autorización de permisos ambientales para la vereda Yarumal.	

Financiero

Logro	Dificultad
El Encargo Fiduciario cuenta con un saldo inicial para el mes de julio de 2023 $ 602.475.208,50, durante este mes no se presentaron desembolsos por parte del MME, a corte del presente mes los aportes realizados al Fideicomiso ascienden a $2.713.407.415,50. En la cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N° 442550406 se generaron rendimientos por valor de $ 493.100,00. Para este periodo no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto, no se registran “otros ingresos”. El día 21 de julio de 2023 se realizó el giro de rendimientos del mes de junio de 2023 por $ 509.573,00. En cuanto a pagos a terceros se efectuaron 3 cumplimientos bancarios por valor total de $92.000.083,80, se generó cobro de Retención en la fuente por $ 34.520,00, y cobro de GMF por valor de $ 370.176,00 correspondiente a GMF de retención en la fuente, giro de rendimientos y desembolsos. El saldo final del Fideicomiso a corte del 31 de julio de 2023 asciende a la suma de $ 510.036.251,70. El saldo disponible después de descontar la Rete garantía $ 409.189.260,70. Al cierre del periodo se registran cuentas por cobrar al Fideicomitente por concepto de costos y gastos el valor total de $ 745.295,00 que corresponde a $ 468.273 a cargo del Fideicomitente y la devolución de gmf no procedente de cobro por parte del Banco de Bogotá, por valor de $ 277.022. Se registran cuentas por pagar por valor de $ 101.340.091,00 correspondiente a rendimientos generados del mes de julio de 2023 y la retención en garantía por valor de $ 100.846.991,00 del tercero ING SAS.	

Jurídico

Logro	Dificultad
Las garantías para el proyecto siguen vigentes de acuerdo con la firma del otro si, número uno (4).	

Social

Logro	Dificultad

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avances Cualitativos

Social

Los días 13 y 19 de julio de 2023, se realizan socialización a las comunidades de las veredas Alto Frutal y Bajo Frutal respectivamente, donde se espera incluir usuarios como posibles nuevos, en la socialización se les dan a conocer los criterios mínimos de las viviendas para poder ser considerados como posibles usuarios nuevos, además se le solicita la documentación según la supervisión.	

Técnico

Logro	Dificultad
Durante el mes de julio, la contratista continua con la ejecución de la obra realizando labores de hincado de postes, vestidas de estructuras, tendido y tensionado de conductores de redes de media y baja tensión, armado e instalación de templetes en las veredas: Alto Frutal. Adicionalmente, el contratista realizó visitas a campo para encontrar usuarios nuevos potenciales. Por último, el 24 de julio de 2023 se radica el certificado de avance de obra del 62.49% para realizar la solicitud de desembolso ante el MME.	Durante el desarrollo de las actividades del mes de julio, se puede dar constancia de presenticas de lluvias en las veredas que se ejecuta el proyecto, esta novedad influye directamente en el desarrollo de las actividades del contratista ya que obliga a suspender actividades de campo hasta tanto no mejores el clima de en la zona.


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
30 jun. 2023		$ 3.995.201.101,84	1,51%	47,49%	

Comentario: La supervisión Electrohuila S.A E.S.P continua con el seguimiento para la autorización del permiso de aprovechamiento forestal para la vereda Yarumal.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Licencias Ambientales

Avances Cualitativos

Ambiental

Logro	Dificultad
Se realiza inspección al punto ecológico de la oficina administrativa de la interventoría, además, se realizó control de vegetación a 3 especies no incluidas en la vereda La Muralla, especies Cachingo, Arrayan Polibifurcado, Aguacatillo, dado que en el tendido de las redes estos hacen interferencia a la actividad. Por otra parte, se manifestó un nivel medio en la cuenca del Río Magdalena pero no hubo incrementos de caudal significativos que afectará la movilidad del personal, tampoco se presentó deslizamientos ni incendios, por lo que en el mes de junio no se presentaron incidentes ambientales en el desarrollo del proyecto.	

Financiero

Logro	Dificultad
El Encargo Fiduciario cuenta con un saldo inicial para el mes de junio de 2023 $ 602.318.559,50, durante este mes no se presentaron desembolsos por parte del MME, a corte del presente mes los aportes realizados al Fideicomiso ascienden a $2.713.407.415,50. En la cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N° 442550406 se generaron rendimientos por valor de $ 509,573. Para este periodo no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto, se registran “otros ingresos” por concepto de costos y gastos a cargo del fideicomitente por valor de $177.743,00. El día 21 de junio de 2023 se realizó el giro de rendimientos del mes de mayo de 2023 por $ 492.886,00, se generó cobro de Retención en la fuente por $ 35.666,00, y cobro de GMF por valor de $2.115,00 correspondiente a GMF de retención en la fuente, giro de rendimientos y desembolsos. El saldo final del Fideicomiso a corte de junio de 2023 asciende a la suma de $ 602.475.208,50. El saldo disponible después de descontar la Rete garantía $ 501.628.217,50. Al cierre del periodo se registran cuentas por cobrar al Fideicomitente por concepto de costos y gastos el valor total de $ 320.780,00 que corresponde a $ 43.758 a cargo del Fideicomitente y la devolución de gmf no procedente de cobro por parte del Banco de Bogotá, por valor de $ 277.022. Se registran cuentas por pagar por valor de $ 509.573,00 correspondiente a rendimientos generados del mes de mayo de 2023 y la retención en garantía por valor de $ 501.628.217,50 del tercero ING SAS.	

Jurídico

Logro	Dificultad

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avances Cualitativos

Jurídico

Las garantías para el proyecto siguen vigentes de acuerdo con la firma del otro si, número uno (3).	

Social

Logro	Dificultad
	El día 05 de junio de 2023, se ha notificado los desistimientos de los usuarios que no cumplen con las condiciones mínimas, la interventoría recibe el documento y realiza la revisión de los soportes y el no cumplimiento de los criterios mínimas de las viviendas relacionadas en los anexos del documento.

Técnico

Logro	Dificultad
El Día 05 De Junio De 2023 El Contratista Radicó Mediante Oficio 100-2023-S0119, Los Soportes De Desistimientos De Los Usuarios Que No Cumplen Con Las Condiciones Mínimas, La Interventoria Se Encuentra En Revisión De Documentos Y Validación Sobre El Cumplimiento De Los Criterios Mínimosde Las Viviendas. Por Otra Parte, La Interventiría Adelanta Un Proceso De Revisión De Información Y Ejecución Con El Fin De Conocer El Avance Del Proyecto El Cual Se Encuentra En El 62.49%, De Todas Formas, Se Le Recalca al Contratista El Atraso De Las Actividades En Ejecución Vs Las Proyectadas. El 28 De Junio De 2023, El Contratista Radica El Plan De Acción Y Solicitud De Ampliación Para El Cumplimiento De Ejecución, La Interventoría Una Vez Revisó, Radicó A Electrohuila S.A E.S.P, El Cual Tuvo Observaciones Por Lo Que En El Mes De Junio No Se Ha Podido Solucionar Las Novedades Emitidas Por La Supervisión.	Las actividades de ejecución de la obra continúan realizándose según las condiciones climáticas de la zona lo permitan, ya que hay actividades que se ven afectadas por el clima que se presentan durante días de las semanas.


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
31 may. 2023		$ 3.970.231.094,95	2,62%	45,98%	

Comentario: A pesar de la temporada de lluvias que se dieron en este mes, se logró un avance de obra del 57.11%, sin embargo, se está trabajando en un plan de acción para subsanar el atraso de las obras que se identifican a la fecha. Por otro lado, en el mes de mayo de 2023, se ha realizado una gestión de replanteo fuerte con respecto a los 107 usuarios contractuales que desistieron. Gestión que ha sido eficiente, dado que se desarrollan dos actividades en paralelo que son usuarios que desistieron vs usuarios nuevos potenciales que cumplan con los mínimos requisitos contractuales para ser beneficiario del proyecto.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Actas De Vecindad
Atraso De Los Pagos
Derrumbe

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
Recolectar la documentación técnica y legal de los 107 usuarios que desistieron del proyecto y de los posibles usuarios nuevos.	

Ambiental

Logro	Dificultad
El 02 de mayo se realizó la inspección de actividades de poda, tala, manejo de epifitas en la vereda Alto Frutal, donde fue eficiente la ejecución dado que a la fecha no se ha detectado más la necesidad de esta actividad. El día 04 de mayo se realizó inspección en el punto ecológico de la oficina administrativa del contratista en donde cumplió todo lo evaluado. Por otra parte, se realizó controles a 2 especies en la vereda Nazareth que no fueron detectadas en su momento, especies que interferían con las redes.	

Financiero

Logro	Dificultad

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avances Cualitativos

Financiero

El Encargo Fiduciario cuenta con un saldo inicial para el mes de mayo de 2023 $ 602.636.232,50, durante este mes no se presentaron desembolsos por parte del MME, a corte del presente mes los aportes realizados al Fideicomiso ascienden a $2.713.407.415,50. En la cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N° 442550406 se generaron rendimientos por valor de $ 492.886,00. Para este periodo no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto, tampoco se registran “otros ingresos” por concepto de costos y gastos a cargo del fideicomitente. El día 17 de mayo de 2023 se realizó el giro de rendimientos del mes de abril de 2023 por $ 772.838,00, se generó cobro de Retención en la fuente por $34.492,00, y cobro de GMF por valor de $3.229,00 correspondiente a GMF de retención en la fuente, giro de rendimientos y desembolsos. El saldo final del Fideicomiso a corte de mayo de 2023 asciende a la suma de $ 602.318.559,50. El saldo disponible después de descontar la Rete garantía $ 501.471.568,50. Al cierre del periodo se registran cuentas por cobrar al Fideicomitente por concepto de costos y gastos el valor total de $462.857,00 que corresponde a $185.835 a cargo del Fideicomitente y la devolución de gmf no procedente de cobro por parte del Banco de Bogotá, por valor de $ 277.022. Se registran cuentas por pagar por valor de $ 492.886,00 correspondiente a rendimientos generados del mes de mayo de 2023 y la retención en garantía por valor de $ 100.846.991,00 del tercero ING SAS.	

Jurídico

Logro	Dificultad
Las garantías para el proyecto siguen vigentes de acuerdo con la firma del otro si, número uno (2).	

Social

Logro	Dificultad
Durante los días 29,30 y 31 de mayo de 2023, se realizó visita a campo para realizar el replanteo de los 107 usuarios nuevos potenciales que se consideran, con el fin de suplir la cantidad de beneficiarios relacionados inicialmente en el proyecto.	

Técnico

Logro	Dificultad

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
		Avances Cualitativos			
		Técnico			
		El contratista de obra continúa con la ejecución de la obra en las siguientes veredas El Jabón, La Chaquira, Bajo Frutal, Alto Frutal, La Muralla, Quinchana, Barniz, Sevilla y San Lorenzo, en las veredas anteriores, se han realizado labores como hincados de postes, vestidas de estructuras, tendido y tensionado de conductores de redes de Media y Baja Tensión, armado e instalación de templetes. Por otro lado, en la vereda Los Cauchos, Rosario y Nazareth se realizó visita a los usuarios que desistieron y a los usuarios nuevos potenciales. Por último, en la vereda Yarumal, se realizó acompañamiento a la CAM para evaluar el inventario forestal de la vereda y emitir el permiso forestal de acuerdo al criterio de la CAM.		


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
1 may. 2023		$ 3.945.261.088,06	2,32%	43,36%	

Comentario: Para el mes de abril del 2023 se continuo con las labores en campo interviniendo las veredas La Muralla, San Lorenzo, El Barniz, Los Cauchos, Alto Frutal, Bajo Frutal, Nazareth y Sevilla. En cada una de ellas se realizaron actividades de excavaciones para hincado de postes, instalación de viguetas, así como vestida de apoyos de baja tensión e instalación de templetes. También se realizó tendido de conductor para media y baja tensión. Se evidenció que para este mes el rendimiento de las cuadrillas bajo con respecto al mes anterior debido principalmente a las lluvias constantes en la región del municipio de San Agustín que provocó suspensión de actividades parciales en todos los frentes de trabajo preservando así la integridad de los colaboradores del proyecto. Sin embargo y pese a esta situación, se concentraron las actividades en trabajo en labores que no implicaran trabajos a la intemperie (construcción de instalaciones internas, armado de templetes, etc.) Finalmente se trabajo en este mes con una serie de usuarios los cuales pertenecen al proyecto de acuerdo a la etapa de formulación pero que durante la labor de replanteo, se encontraron diferentes novedades que no concuerdan con el anexo No 4 del contrato interadministrativo (criterios de validación de usuarios) y que se refiere específicamente a usuarios cuyas viviendas no son de uso permanente, sino que funcionan como segunda vivienda destinadas para bodega de insumos agrícolas y algunas veces destinadas como beneficiaderos. Al cierre de este informe se sigue trabajando en la identificación de estos usuarios para concretar el número a retirar mediante acta de desistimiento y así mismo, recoger información nueva de posibles usuarios potenciales para el reemplazo de los retirados.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Atraso De Los Pagos
Lluvias
Reasentamiento Temporal O Permanente

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
Durante el mes de abril del 2023, se realizaron ajustes para que se pueda garantizar la continuidad y conclusión del proyecto y que este no sufra más percances.	Ninguna hasta la fecha.

Ambiental

Logro	Dificultad
Hasta la fecha no ha tenido la necesidad de realizar podas ni talas de especies nativas de la zona que impidan una correcta construcción de redes de media y baja tensión. Para posibles cimentaciones, se continúa teniendo cuidado en no contaminar la capa vegetal con residuos sólidos o residuos de concreto, utilizando de manera correcta los elementos proporcionados para la realización de estas labores. Se continua con la separación de residuos sólidos según su condición y se está desplazando hasta la zona urbana del municipio de San Agustín para su apropiada disposición final por parte de la empresa de aseo de la zona.	Ninguna hasta la fecha

Financiero

Logro	Dificultad
El día 4 de abril de 2023 la interventoría del proyecto mediante radicado 01-DSA-006976-E-2023 envía soportes de documentación para acta parcial No 2 cuyo valor corresponde a un 10,52% del valor del contrato de suministro por servicios.	Ninguna hasta la fecha

Jurídico

Logro	Dificultad
Se reciben pólizas ajustadas por parte de la interventoría el día 22 de marzo de 2023 mediante oficio EH-266 y respuesta con número de radicado 01-DSA-004983-S2023. Dichas pólizas son aprobadas por parte de E.H el día 5 de abril de 2023.	Ninguna hasta la fecha

Social

Logro	Dificultad
Se continua con las capacitaciones e informando a los usuarios del proyecto el avance del mismo. Se siguen atendiendo PQRS por parte del componente social de ELECTROHUILA y se está terminando de perfilar información social del proyecto para realizar la transferencia a todas las personas beneficiadas con la obra	Ninguna hasta la fecha

Técnico

Logro	Dificultad

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avances Cualitativos


Técnico

A pesar de algunas dificultades, el comportamiento sigue siendo bueno con respecto a ingreso de material y rendimientos en instalaciones.	Ninguna hasta la fecha

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
1 abr. 2023		$ 3.920.291.081,18	0,00%	41,03%	

Comentario: En el mes de marzo del 2023 se realiza el desembolso a la cuenta de cobro presentada por el contratista de obra INGSA. Se informa de la visita a campo por parte de la Contraloría General de la Nación y el Ministerio de Minas y Energía. Para este mes el contratista de interventoría no presento informe de avance.

Avance

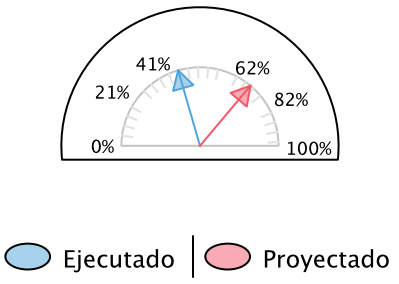

Factor Atraso

Licencias Ambientales

Avances Cualitativos

Logro	Dificultad


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
2 mar. 2023		$ 3.895.321.074,29	1,70%	41,03%	

Comentario: En el mes de febrero del 2023 el contratista de interventoría reportó un avance de obra del 43.97%. Se informó que en este sector se presentaron precipitaciones que afectaron el avance de la obra. De igual forma se inician los procesos internos administrativos para prorrogar los plazos del contrato de obra 423-2020 y el contrato de interventoría 288.-2020 conforme al último otrosí suscrito con el Ministerio de Minas y Energía.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Lluvias

Avances Cualitativos


Administrativo

Logro	Dificultad
	En el mes de febrero el contratista de obra presenta un avance del 43,97%. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitará al contratista de interventoría presentar el seguimiento y control al plan de acción generado por el contratista de obra para cumplir con los tiempos de la obra.

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
31 ene. 2023		$ 4.096.800.375,76	4,42%	39,33%	

Comentario: En el mes de enero del 2023, el contratista de interventoría (Seinsur S.A.S) presentó una solicitud de ampliación de tiempo para los contratos derivados N° 423-2020 (Obra) y 288-2020(Interventoría), esta solicitud viene soportada en los atrasos que se presentaron en el proyecto debido a las constantes lluvias, derrumbes y demás tramites ambientales que impidieron el ideal desarrollo del proyecto. Por consiguiente, ElectrHuila como Operador de Red y administrador del proyecto presenta ante el Ministerio de Minas y Energía una solicitud de ampliación de tiempo, es decir la solicitud de modificación N° 4 al contrato FAER GGC 807-2019. De igual forma cabe resaltar que el contrato se encuentra en ejecución, el interventor manifiesta mediante el informe mensual del respectivo mes que el proyecto se encuentra en un avance del 40%

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Licencias Ambientales

Lluvias

Avances Cualitativos

Logro	Dificultad


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
1 ene. 2023		$ 3.986.363.980,06	5,84%	34,92%	

Comentario: En el mes de diciembre del 2022 se adelantaron actividades de construcción de redes de media y baja tensión en las veredas Quinchana, Nazareth, El Rosario, Alto Frutal, La Muralla, La Tribuna, Los Cauchos. El contratista de obra presenta un avance del 34.53%, presentando un atraso del 39.47% con respecto al cronograma planteado, teniendo en cuenta lo anterior la supervisión de ElectroHuila remite el documento 01-DIP-032710-S-2022, dado el evidente atraso que tiene la obra.

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Lluvias
Permisos

Avances Cualitativos


Administrativo

Logro	Dificultad
	En el mes de diciembre del 2022 se presentaron lluvias que impidieron el ideal desarrollo de las actividades del personal contratista, disminuyendo el porcentaje de avance de la obra.

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
2 dic. 2022		$ 3.885.867.409,14	6,08%	29,08%	

Comentario: En el mes de noviembre del 2022, la supervisión de ElectroHuila realiza un requerimiento al contratista de interventoria (SEINSUR S.A..S) en el cual solicita la entrega de los informes de los meses de septiembre y octubre con el documento N° 01-DIP-028501-S-2022, dada la necesidad de conocer el avance de la obra. Cabe resaltar que según reporte del contratista de interventoria en su informe mensual del mes de noviembre, el contrato de obra presenta un avance del 29,69%, de acuerdo a lo reportado el contratista de obra se encuentra desarrollando actividades de construcción de redes de media y baja tensión en las siguientes veredas El Rosario, Nazareth, Sevilla, El Barniz, Bajo Frutal, El Jabón, La Chaquira

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Derrumbe

Avances Cualitativos

Ambiental

Logro	Dificultad
En el mes de noviembre se adelantaron visitas a la vereda Yarumal con el propósito de realizar el inventario forestal de la vereda y solicitar el permiso de aprovechamiento forestal ante la CAM	

Técnico


Logro	Dificultad
En la ultima semana del mes de noviembre se adelanto una visita técnica por parte del personal de supervisión, en esta visita se evidencio el avance de las obra y el trabajo del contratista de obra e interventoria en las Veredas verificadas; San Lorenzo, el jabón, Alto y Bajo frutal, El Rosario, Nazareth y Sevilla.	

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
2 nov. 2022		$ 3.792.020.611,31	0,00%	23,00%	

Comentario: En el mes de octubre el contratista de interventoría no entrego informes de avance por consiguiente mediante radicado N° 01-DIP-028501-S-2022 se solicita que la firma SEINSUR S.A.S presente los informes pendientes. En ese orden de ideas no se cuenta con el reporte del porcentaje de avance de la obra.

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

Licencias Ambientales

Avances Cualitativos

Logro	Dificultad


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
3 oct. 2022		$ 3.751.521.993,18	5,30%	23,00%	

Comentario: En el mes de septiembre el contratista de obra Ingsa, cuenta con un avance del 13.38%, este porcentaje es preocupante, teniendo en cuenta que para este mes se esperaba un avance del 21%. También se resalta que el MME realizo una visita a campo, en donde se verifico el avance de la obra .

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance

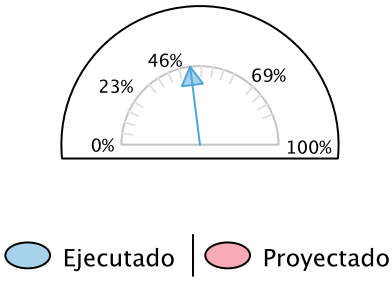

Factor Atraso

Licencias Ambientales
Lluvias

Avances Cualitativos

Técnico

Logro	Dificultad
En el mes de septiembre se realiza una visita en campo por parte del MME y el Operador de Red, en esta visita se establece que la obra se encuentra en ejecución, en la visita se evidencia que en campo el contratista cuenta con material en campo y personal que esta realizando actividades de instalación de posteria y tendido de redes de media tensión.	Sin embargo, el avance de obra no es el esperado, considerando que presentan un avance del 13.38% cuando en realidad deberían estar en un 21.19%.


Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
3 sept. 2022		$ 3.711.023.375,04	0,00%	17,70%	

Comentario: Información No Disponible

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Factor Atraso

Lluvias
Otros Trámites

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
	En el mes de Agosto se remite al contratista de interventoría el documento con radicdo N° 01-DIP-020256-S-2022, en el cual se solicita la entrega de los informes del mes de junio y julio, debido a que en estos meses no se reporta avance de obra.

Ambiental

Logro	Dificultad
	En el mes de agosto se socializa con la interventoría la posibilidad de gestionar con la alcaldía de San Agustín un informe o respuesta, en donde se menciona el por qué no se entregó dentro del inventario forestal el levantamiento de la vereda Yarumales. Por este motivo en esta vereda actualmente no se cuenta con los permisos de aprovechamiento forestal y por consiguiente el contratista no puede adelantar actividades de construcción.

Financiero

Logro	Dificultad
El 4 de agosto se reporta un rendimiento de 2,196,720 como soporte se anexa el soporte del giro del rendimiento financiero.	

Jurídico

Logro	Dificultad
En el mes de agosto se tratan los temas relacionados con los tiempos contractuales del proyecto, es por esto, que se plantea la posibilidad de solicitar una ampliación a los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que el contratista está iniciando las actividades de construcción de la obra y debido a la magnitud del proyecto no es posible terminar las actividades en campo en el tiempo contractual.,	

Técnico

Logro	Dificultad
	Debido a la falta de información en cuanto al avance de la obra, en el mes de septiembre se programara una visita técnica al proyecto, con el propósito de verificar el avance de la misma.

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
5 jul. 2022		$ 3.630.026.138,77	17,70%	17,70%	


4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo
Comentario: En el mes de Junio se realizan los tramites administrativos para legalizar con pólizas el reinicio de los contratos de obra e interventoría, derivados del FAER GGC 807-2019					

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

Fecha	Imagen	Proyectado (acumulado)	Ejecutado reportado	Ejecutado acumulado	Semáforo

Avance



Ejecutado | Proyectado

Factor Atraso

No Aplica

Avances Cualitativos

Administrativo

Logro	Dificultad
* La suspensión N° 1 se suscribe el 22 de agosto del 2021.(debido a que no se contaba con los permisos de aprovechamiento forestal del la obra). *El otrosí N° 2 se suscribe el 24 de noviembre del 2021. en el cual se realiza una modificación al contrato aplicando el valor liquido cero. * La suspensión N° 2 se suscribe el 31 de diciembre del 2021. Teniendo en cuenta que aun no se contaba con el permiso ambiental. * El otrosí N° 3 se suscribe el 30 de mayo del 2022. En esta fecha se reinicia el contrato y se modifican los plazos del contrato. De igual forma se suspendieron los contratos de obra N° 423-2020 e interventoría N° 288-2020, en agosto del 2021 y se reinician el 31 de mayo del 2022.	

Social

Logro	Dificultad
En el mes de Junio del 2022 se realizan las respectivas socializaciones del proyecto con la comunidad, informando del inicio de las actividades constructivas.	

Técnico

Logro	Dificultad
Revisión de estado del proyecto.	Conforme se reinician los contratos derivados de interventría y obra, también se inician labores en campo. Es importante resaltar que en el aspecto técnico se identifican diferentes novedades en campo, dada la complejidad del proyecto y las diferentes gestiones requeridas en su etapa precontractual, se suspendieron actividades por aproximadamente un año, generando con esto variaciones en el replanteo originalmente entregado por el contratista de obra y la interventoría. Se han identificado usuarios ya energizados, se requiere de reubicación de estructuras, existen variaciones en las cantidades inicialmente contempladas. Teniendo en cuenta esto, se retrasan las actividades constructivas debido a la reevaluación y validación de la red de media y baja tensión. Es de resaltar que el replanteo del proyecto fue presentado en junio del 2021, en ese orden de ideas, conforme a las verificaciones que adelanta el contratista de obra se evidencia variación en cuanto a usuarios, trazado de línea y materiales no contemplados inicialmente. Cabe destacar que las circunstancias que dieron lugar a estas variaciones estas justificadas en las gestiones adelantadas para obtener los permisos ambientales necesarios para el ideal desarrollo del proyecto.

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance
Suscripción del Encargo Fiduciario.	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Suscripción del contrato de interventoría de acuerdo con lo establecido en el literal n) del contrato interadministrativo	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Realización de socialización y verificación de usuarios.	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %


5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance
Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	und	1	$ 54.268.148	1 %	100 %
Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	und	1	$ 90.627.808	1,67 %	100 %
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	und	1	$ 90.627.808	1,67 %	100 %
Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	und	1	$ 90.085.126	1,66 %	100 %
Verificación del replanteo	und	1	$ 271.340.742	5 %	100 %
Construcción de redes MT	und	1	$ 542.681.483	10 %	100 %
Construcción de redes B.T	und	1	$ 542.681.483	10 %	100 %
Montaje de transformadores	und	1	$ 542.681.483	10 %	100 %
Instalación de acometidas de usuarios	und	1	$ 271.340.742	5 %	100 %
Certificación RETIE	und	1	$ 271.340.742	5 %	97 %
Energización de los usuarios	und	1	$ 271.340.742	5 %	0 %
Acta de recibo de obras	und	1	$ 271.340.742	5 %	100 %
Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	und	1	$ 542.681.483	10 %	80 %
Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	und	1	$ 271.340.742	5 %	100 %
Acta de recibo de infraestructura y entrega de redes e inventarios entre el MINISTERIO y el ADMINISTRADOR para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	und	1	$ 271.340.742	5 %	0 %

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance
Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	und	1	$ 271.340.742	5 %	0 %

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

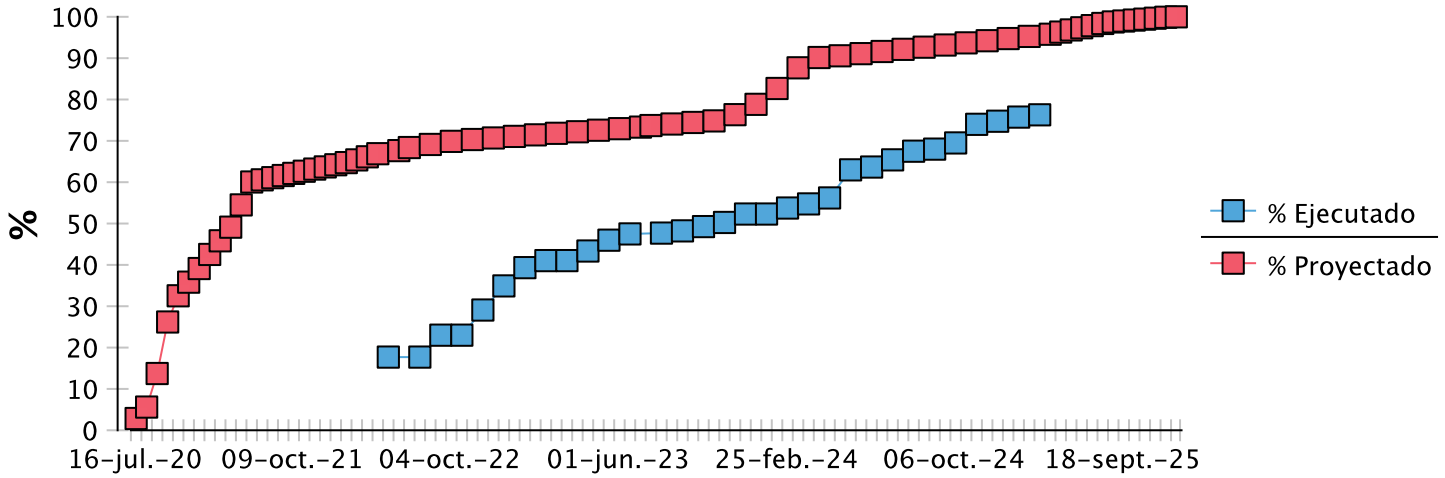

EJECUTADO

Fecha	%Total
5 jul. 2022	17,7 %
3 sept. 2022	17,7 %
3 oct. 2022	23 %
2 nov. 2022	23 %
2 dic. 2022	29,08 %
1 ene. 2023	34,92 %
31 ene. 2023	39,33 %
2 mar. 2023	41,03 %
1 abr. 2023	41,03 %
1 may. 2023	43,36 %
31 may. 2023	45,98 %
30 jun. 2023	47,49 %
29 ago. 2023	47,69 %
28 sept. 2023	48,23 %
28 oct. 2023	49,26 %

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
16 jul. 2020	2,85 %
15 ago. 2020	5,61 %
14 sept. 2020	13,72 %
14 oct. 2020	26,19 %
13 nov. 2020	32,53 %
13 dic. 2020	35,82 %
12 ene. 2021	39,12 %
11 feb. 2021	42,53 %
13 mar. 2021	45,82 %
12 abr. 2021	49,12 %
12 may. 2021	54,51 %
11 jun. 2021	60,05 %
11 jul. 2021	60,57 %
10 ago. 2021	61,09 %
9 sept. 2021	61,61 %

EJECUTADO

Fecha	%Total
27 nov. 2023	50,27 %
27 dic. 2023	52,31 %
26 ene. 2024	52,31 %
25 feb. 2024	53,76 %
26 mar. 2024	54,75 %
25 abr. 2024	56,19 %
25 may. 2024	62,99 %
9 jun. 2024	63,67 %
24 jul. 2024	65,4 %
23 ago. 2024	67,5 %
22 sept. 2024	68 %
6 oct. 2024	69,5 %
21 nov. 2024	74 %
21 dic. 2024	74,75 %
20 ene. 2025	75,75 %
19 feb. 2025	76,3 %

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
9 oct. 2021	62,14 %
8 nov. 2021	62,66 %
8 dic. 2021	63,18 %
7 ene. 2022	63,7 %
6 feb. 2022	64,22 %
8 mar. 2022	64,74 %
7 abr. 2022	65,4 %
7 may. 2022	66,14 %
6 jun. 2022	66,89 %
6 jul. 2022	67,64 %
5 ago. 2022	68,38 %
4 sept. 2022	69,13 %
4 oct. 2022	69,88 %
3 nov. 2022	70,32 %
3 dic. 2022	70,7 %
2 ene. 2023	71,07 %
1 feb. 2023	71,45 %
3 mar. 2023	71,82 %
2 abr. 2023	72,2 %
2 may. 2023	72,57 %
1 jun. 2023	72,95 %
1 jul. 2023	73,32 %
31 jul. 2023	73,7 %
30 ago. 2023	74,07 %
29 sept. 2023	74,45 %
29 oct. 2023	74,82 %
28 nov. 2023	76,33 %
28 dic. 2023	78,83 %
27 ene. 2024	82,67 %
26 feb. 2024	87,67 %
27 mar. 2024	90,16 %
26 abr. 2024	90,57 %
26 may. 2024	91,09 %
25 jun. 2024	91,61 %

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
25 jul. 2024	92,14 %
24 ago. 2024	92,66 %
23 sept. 2024	93,18 %
23 oct. 2024	93,7 %
22 nov. 2024	94,22 %
22 dic. 2024	94,74 %
21 ene. 2025	95,26 %
20 feb. 2025	95,79 %
22 mar. 2025	96,31 %
21 abr. 2025	96,83 %
21 may. 2025	97,35 %
20 jun. 2025	97,87 %
20 jul. 2025	98,39 %
19 ago. 2025	98,76 %
18 sept. 2025	98,98 %
18 oct. 2025	99,21 %
17 nov. 2025	99,44 %
17 dic. 2025	99,67 %
16 ene. 2026	99,89 %
15 feb. 2026	100 %
