ANEXO 7. INFORME AMBIENTAL No. 5

INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 05

21 DE JUNIO A 20 DE JULIO DE 2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATO No. FDLRUU- COP-747-2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."

CONSORCIO PARQUES VERDES

VERSIÓN 01

JULIO DE 2025

Realizó	Revisó	Aprobó
Ing. Juan Carlos Romero *Residente Ambiental* ***CONSORCIO PARQUES VERDES***	*Director de obra* ***CONSORCIO PARQUES VERDES***	*Residente Ambiental* ***CONSORCIO INTER RUU PARQUES***

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
1.1.1. Objetivo General 3
1.1.2. Objetivos Específicos 3
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
1.1.3. Ubicación de los CIV intervenidos 5
4. ALCANCE 5
5. GESTIÓN AMBIENTAL 5
5.1.1 Personal mínimo requerido 5
5.1.2 Permisos y Tramites ambientales. 6
5.2 Programa manejo de campamentos y acopios 7
5.3 Cronograma de actividades 7
5.4 Programa de manejo integral y disposición final de RCD 8
5.4.1 Meta de aprovechamiento RCD 9
4.6 Programa control de emisiones atmosféricas. 10
5.7 Programa manejo Integral de Cuerpos de Agua y sumideros 12
5.8 Capacitaciones e inducciones ambientales 13
6. FICHA E1: SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD 14
7. COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 14
8. CONCLUSIONES 15

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información del Contrato de Obra No.747 de 2024 4
Tabla 2. Direcciones de áreas de influencia directa 4
Tabla 3. Permisos y Trámites 4
Tabla 4. Relación RCD generado 5
Tabla 5. Aprovechamiento por periodo 6
Tabla 6. Aprovechamiento por periodo 6
Tabla 7. Indicador manejo de maquinaria, equipos y vehículos 8
Tabla 8. Relación documentación de vehículos 8
Tabla 9 Relación maquinaria pesada 9
Tabla 10. Relación sumideros 9
Tabla 11. Indicadores manejo integral de cuerpos de agua 9
Tabla 12. Indicador charlas y capacitaciones ambientales 10

	INFORME AMBIENTAL No 05	Rev.01
CONSORCIO PARQUES VERDES	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."*	Fecha 21/07/2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene en detalle la descripción de las actividades de gestión ambiental desarrolladas en el Contrato No. 747-2024 con el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."* para el periodo comprendido entre el 20 de junio al 21 de julio de 2025, de acuerdo con lo mencionado en los pliegos y demás documentos contractuales del proyecto.

2. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo General

Describir las actividades y presentar los registros de la gestión ambiental, que se desarrolló durante el periodo comprendido entre el 20 de junio al 21 de julio de 2025, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones, apéndice ambiental y demás apartes contractuales del contrato No. 747-2024

1.1.2. Objetivos Específicos

- Exponer las actividades realizadas en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental.
- Cumplir con los requisitos legales aplicables a la ejecución del contrato en materia ambiental.
- Presentar las cantidades generadas de RCD y de materiales de obra ingresados durante el periodo para establecer el porcentaje de cumplimiento y de aprovechamiento y circularidad.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la Tabla 1, se relaciona la información general del contrato a que hace referencia el presente informe.

Tabla 1. Información del Contrato de Obra 747-2024

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES
NIT CONTRATISTA	91905021-8
DIRECCIÓN	Carrera 14 No.19-39
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290: Construcción de obras de ingeniería civil
REPRESENTANTE LEGAL	VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	. FDLRUU- COP-747-2024
OBJETO	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."*
ARL	Sura
RIESGO	I, II, III, IV, V.
MODALIDAD DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
LOCALIDADES	RAFAEL URIBE URIBE
TIPO DE USO	ESPACIO PÚBLICO
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO DE LA OBRA	10 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRESUPUESTO	$ 2.616.903.493
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES

Fuente: Contrato No. 747-2024

1.1.3. Ubicación de los CIV intervenidos

Tabla 2. Direcciones de áreas de Influencia directa

ITEM	CÓDIGO PARQUE	UPZ	NOMBRE DEL PARQUE	DIRECCIÓN
1	18-138	39	URBANIZACIÓN QUIROGA VII	Calle 32B sur con los costados sur y norte de la carrera 22.
2	18-042	39	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA IV, V Y VI	Carrera 19A 31- 21 sur.
3	18-180	54	URBANIZACIÓN ZARAZOTA I	Calle 48H sur 9 -11

4. ALCANCE

El documento tiene alcance sobre todas las actividades ambientales involucradas en la ejecución del Contrato de Obra No. 747-2024, durante las actividades desarrolladas en el periodo que describe el presente informe mensual, las cuales son abordas desde el principio de cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia ambiental, mediante la puesta del PMA propuesto por el Consorcio Parques Verdes, para la prevención, mitigación y corrección de impactos ambientales.

5. GESTIÓN AMBIENTAL

5.1.1 Personal mínimo requerido

Tabla 3. Personal contratado

CARGO	CARGO
Director de Obra	Camilo Falla
Residente de Obra	Jaime Sarmiento
Inspector de Obra	David Santiago Varón
Residente SST	Jhon Alexander Peña
Residente Ambiental	Juan Carlos Romero
Profesional Social	Alexandra Beltrán

Fuente: Propia

5.1.2 Permisos y Tramites ambientales.

El Consorcio Parques Verdes, realizó la identificación de los permisos y tramites que deberá de gestionar en caso de que aplique, y/o revisará el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos ambientales que apliquen en la ejecución de las actividades contempladas en el objeto del contrato de obra No.747-2024 convenido con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.

En la siguiente Tabla 1 se relacionan los permisos ambientales y silviculturales ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA por medio de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.

Tabla 1. Permisos y Trámites

PERMISO AMBIENTAL	TRAMITA FDLRUU	TRAMITA CONTRATISTA
Registro del proyecto ante la SDA PIN	SI	27066
Permisos Ambientales o mineros y/o certificación de la autoridad ambiental competente para proveedores y escombreras y/o Registro vigente en el directorio de proveedores y escombreras del IDU	N.A.	SE SOLICITÓ AL PROVEEDOR PARA VERIFICACIÓN
Aprobación del diseño paisajístico por la entidad competente	Depende de actividades iniciales	GESTIONA EN CASO DE REQUERIRSE
*Permiso de Aprovechamiento Silvicultural. Permiso o autorización de tala, trasplante o reubicación del arbolado urbano	Depende de actividades iniciales	GESTIONA EN CASO DE REQUERIRSE
Permiso de ocupación de cauce, depósito de agua o zona de ronda, lineamiento para el manejo de ZMPA y corredores ecológicos	N.A.	N.A.
Permiso de endurecimiento de zonas verdes	Depende de actividades iniciales	GESTIONA EN CASO DE REQUERIRSE

PERMISO AMBIENTAL	TRAMITA FDLRUU	TRAMITA CONTRATISTA
*Salvoconductos para la movilización de la madera provenientes de los tratamientos realizados a la vegetación	Depende de actividades iniciales	GESTIONA EN CASO DE REQUERIRSE
Permiso de vertimientos (del proveedor seleccionado para mantenimiento y suministro de unidades sanitarias)	NO	GESTIONA EN CASO DE REQUERIRSE
Permiso de Trabajo Nocturno Permiso para operación de equipos de construcción generadores de ruido ambiental en horarios restringidos, ante la Alcaldía Local de los frentes específicos	NO	GESTIONA EN CASO DE REQUERIRSE
Registro como generadores de RESPEL y Acopiadores de aceites usados	N.A.	-El proyecto no va a generar más de 10 kilogramos por mes de residuos peligrosos, por ende, no aplica el registro de acuerdo con Decreto 4741 de 2005, articulo 28, parágrafo 1.

5.2 Programa manejo de campamentos y acopios

Durante este periodo, se continuó con el alquiler de un espacio adecuado como sitio de acopio cerca al parque Quiroga 042, equipado con implementos de emergencia y mantenimiento de higiene completo, incluyendo baño y lavamanos. Este lugar cuenta con un área de almacenamiento de materiales y herramientas menores.
También se realizó el alquiler de una bodega en parque Zarazota y otra en parque Quiroga 138 para el almacenamiento de materiales.

5.3 Cronograma de actividades

Se presenta en el anexo 4 el cronograma que contempla las actividades de carácter ambiental realizadas, sin embargo, se hace la salvedad que dicha programación

estará sujeta a las variaciones de la obra, y requerimientos adicionales por parte del FDLRUU y/o Interventoría.

5.4 Programa de manejo integral y disposición final de RCD

Durante el mes de mayo se generaron un total 90 m^3 de residuos de excavación, los cuales fueron enviados para disposición.

Tabla 2. Relación RCD generado

DISPOSICIÓN A GESTORES				
MES	**GESTOR**	**TIPO DE RCD**	**M3**	**PESO (Ton)**
Abril	Maquinas Amarillas	Excavación	15	38,48
	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
Total mes			30	
Mayo	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
Total mes			90	
Junio	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
	Maquinas Amarillas	Excavación	15	
	Ingeomineria	Excavación	15	
	Ingeomineria	Excavación	15	
	Ingeomineria	Excavación	15	
	Ingeomineria	Excavación	15	
	Ingeomineria	Excavación	15	
Total mes			105	

Fuente: Consorcio Parques Verdes

Los valores en toneladas serán incluidos cuando el gestor certifique las cantidades. Los valores en m^3 fueron tomados de los soportes de disposición.

5.4.1 Meta de aprovechamiento RCD

Tabla 3. Aprovechamiento mes de junio

Aprovechamiento RCD en TON		
Periodo	**Total RCD-Excavación**	**Cantidad de RCD aprovechado**
Abril	0	0
	0%	
Mayo	0	0
	0,00%	
Junio	0	0
	0,00%	
Promedio	**0**	**0**
	0%	

Fuente: Consorcio Parques Verdes

El promedio de aprovechamiento hasta el mes de junio de 2025 es igual a cero, esto debido a que la totalidad de los RCD corresponden a residuos de excavación, el cual, según el Art. 44 del Decreto 507 de 2023, no se tienen en cuenta para el cálculo de esta meta ni los productos de excavación ni los sobrantes de la adecuación del terreno.

4.4.2 Aprovechamiento INSITU

Conforme a las actividades realizadas, aun no se han desarrollado actividades de aprovechamiento IN SITU.

4.4.3 Meta de circularidad

En cumplimiento de la meta de circularidad establecida en el Decreto 507 del año 2023, se incorporaron 60.9 toneladas de material valorizado en la obra durante el mes de junio de 2025.

Tabla 4. Aprovechamiento mes de junio

META CIRCULARIDAD		
Periodo	**Material reciclado (ton)**	**Material total (ton)**
Abril	20,3	41,5
	49%	
Mayo	20,3	33,1
	61,32%	
Junio	60,9	85,46
	71,26%	
Promedio	**101,5**	**160,06**
	63%	

Fuente: Consorcio Parques Verdes

4.5 Reporte mensual de RCD generado

Durante el mes de julio se presentará a Interventoría el reporte correspondiente al mes de junio de 2025, los anexos del Decreto 507 de 2023 y certificados serán cargados al aplicativo web de la SDA por el Fondo de Desarrollo Local de la Localidad Rafael Uribe Uribe.

4.6 Programa control de emisiones atmosféricas.

Durante este periodo para la mitigación de emisiones atmosféricas, se llevó a cabo la revisión del cumplimiento de la técnico-mecánica de los vehículos utilizados para el transporte del material y RCD, y los vehículos utilizados para el transporte del personal contratista. Esto con el fin de mitigar el deterioro de la calidad del aire durante la ejecución de estas actividades, teniendo en cuenta la NTC 5375, que Establece los requisitos para la Revisión Técnico Mecánica en los CDA para los vehículos automotores, entre otros, en cuanto a emisiones contaminantes. Los gases evaluados en la técnico-mecánica son:

- Dióxido de carbono (CO^2): Se produce al quemar combustibles que contienen carbono, por ejemplo, la gasolina y el gasoil. No es un gas tóxico, pero reduce el estrato de la atmósfera que protege contra los rayos UV.
- Monóxido de Carbono (CO): Se produce por la combustión incompleta de combustibles con carbono. Es altamente tóxico.

- Óxidos Nítricos (NOx): Combinación de nitrógeno y oxígeno. Se produce gracias a una alta presión, alta temperatura y exceso de oxígeno durante la combustión del motor. Afecta principalmente el sistema respiratorio de los seres vivos.
- Hidrocarburos (HC): Surge de los restos no quemados de combustible. Algunos son cancerígenos.
- Material particulado (MP): Son partículas generadas en los motores diésel en forma de hollín o cenizas. Pueden causar deficiencias cardíacas y/o pulmonares.

Tabla 5. Indicador manejo de maquinaria, equipos y vehículos

$\frac{\#\ \text{de vehiculos con tecnico mecanica vigente}}{\#\text{total de vehiculos en obra}} * 100$	$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$	El porcentaje del manejo de maquinaria equipos y vehículos en la obra es del 100%, indicador que es aceptable ya que al controlar la vigencia de la técnico-mecánica de los vehículos se evidencia el control de emisiones atmosféricas que se generan durante el proyecto.

Fuente: Consorcio Parques Verdes

4.6.1 Programa de maquinaria, equipos y vehículos

Durante este período, se utilizaron dos vehículos de maquinaria pesada: dos mini cargadores. Además, se empleo un vehiculo tipo camion para el transporte de materiales y de RCD. Es importante destacar que todos los vehículos, cuentan con PIN (volquetas), SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes. Para más detalles sobre la documentación de los vehículos, consulte el Anexo 7.

Tabla 6. Relación documentacion de vehículos

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	SOAT (VIGENCIA HASTA)	TECNO MECÁNICA (VIGENCIA HASTA)
Camión	SRL286	2007	27/07/2025	16/06/2026

Fuente: Consorcio Parques Verdes

Tabla 7. Relación maquinaria pesada

EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO FABRICACIÓN	ULTIMO MANTENIMIENTO
Minicargador	Bobcat	S570	2020	22/04/2025
Minicargador	Bobcat	S650	2017	22/04/2025

Fuente: Consorcio Parques Verdes

5.7 Programa manejo Integral de Cuerpos de Agua y sumideros

Durante el presente periodo se realizó la inspección y mantenimiento de los sumideros existentes en Zarazota y Quiroga 138.

Tabla 8. Relación sumideros

Parque	Fecha de instalación	Coordenadas
Quiroga 042	02/04/2025	N 4°42´2.952"-74°6´27.486¨W
Quiroga 138	20/05/2025	N 4°34´47.0136"-74°6´56.502¨W
Quiroga 138	20/05/2025	N 4°34´56.6436"-74°7´0.9012¨W
Quiroga 138	20/05/2025	N 4°34´62.5432"-74°6´0.8010¨W
Quiroga 138	20/05/2025	N 4°34´69.6325"-74°7´45.203¨W
Quiroga 138	20/05/2025	N 4°34´55.6324"-74°7´0.9864¨W
Zarazota	05/06/2025	N 4°33´37.2852"-74°6´56.6784¨W
Zarazota	05/06/2025	N 4°33´37.2276"-74°6´56.9628¨W
Zarazota	05/06/2025	N 4°33´37.2276"-74°6´56.9628¨W
Zarazota	05/06/2025	N 4°33´36.774"-74°6´56.96¨W
Zarazota	05/06/2025	N 4°33´36.774"-74°6´56.96¨W

Fuente: Consorcio Parques Verdes

Tabla 9. Indicadores manejo integral de cuerpos de agua

$\frac{Cantidad\ de\ sumideros\ protegidos}{total\ sumideros\ por\ porteger} * 100$	$\frac{11}{11} * 100$ =100%	El porcentaje del manejo integral de cuerpos de agua es del 100%, indicador que es aceptable ya que se cumple con lo establecido.

Fuente: Consorcio Parques Verdes

5.8 Capacitaciones e inducciones ambientales

Como parte del fortalecimiento de la gestión ambiental en el proyecto, se realizaron capacitaciones ambientales para el personal de obra. Estas capacitaciones buscan cumplir con lo establecido en el plan de manejo ambiental y prevenir incidentes ambientales durante el desarrollo de las actividades constructivas. Durante este período, el tema de la capacitación fue sobre **"Protección de sumideros"** Consulte el Anexo 2 para el listado de asistencia a las capacitaciones

De igual manera durante los recorridos que se llevan a cabo cada semana, se hacen pequeñas charlas a los colaboradores, sobre la correcta separación en la fuente de todos los residuos generados en obra, correcto acopio, orden y aseo y dependiendo las falencias que se identifiquen se refuerza el tema y se les hace las respectivas recomendaciones. Dando cumplimiento al PMA se relacionan los indicadores presentados en la siguiente tabla, así:

Tabla 10. Indicador charlas y capacitaciones ambientales

$\frac{\text{No. de capacitaciones realizadas x mes}}{\text{No. de capacitaciones programadas x mes}} * 100$	$\frac{1}{1} * 100$ =100%	Se realizó una capacitación en el mes dando así cumplimiento al cronograma y en observancia del 100% de capacitaciones ambientales.

Fuente: Consorcio Parques Verdes

6. SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD

El Plan de Manejo de Transito esta enfocado a mantener las condiciones de seguridad peatonal y vehicular en la zona a intervenir reduciendo inconvenientes que pueda generar el desarrollo de las actividades.

A continuación, se presenta la relación de los PMT aprobados e instalados.

Tabla 4. Relación de PMT Y COI Aprobados por SDM

ITEM	UBICACIÓN	COI APROBACIÓN	DESDE	HASTA
6846-6847	QUIROGA 042	COI No 11	14/03/2025	12/06/2025
6850-6851	QUIROGA 138	COI No 11	14/03/2025	12/06/2025
6848-6849	ZARAZOTA	COI No 11	14/03/2025	12/06/2025

7. COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

En el contrato de obra No.747-2024 dentro del diagnóstico inicial de reconocimiento de los parques públicos a intervenir no se requiere implementación de medida arqueológica para dar correspondencia al programa de arqueología preventiva (PAP).

8. CONCLUSIONES

- Se realizan jornadas de sensibilización con respecto a temas ambientales al personal operativo.
- Se envían 105 m^3 de RCD a disposición final durante el mes de junio.
- Se da cumplimiento a todas las exigencias ambientales y/o observaciones realizadas por la interventoría en los tiempos requeridos.
- Se llevó a cabo seguimiento a cada componente del MAO con el fin de prevenir, mitigar y controlar los aspectos ambientales identificados en el presente periodo.
- Se reporta el ingreso de material valorizado.
- Hasta el momento la meta de aprovechamiento es igual a cero, debido a que la totalidad de los RCD son producto de excavación.
- Se da cumplimiento a la meta de circularidad con un promedio de 71.26 % de material valorizado utilizado en obra.

ANEXOS

Anexo 1	Registro fotográfico
Anexo 2	Listado de asistencia capacitaciones
Anexo 3	Cronograma de actividades
Anexo 4	Control de transporte de RCD
Anexo 5	Remisiones de gestión de RCD
Anexo 6	Remision de Material Valorizado
Anexo 7	Documento Vehiculos
Anexo 8	Recibos materiales petreos

ANEXO 1.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME AMBIENTAL NO.5

21 de junio al 20 de julio de 2025

CONTRATO DE OBRA No. FDLRUU- COP-747-2024


"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."

Parque Quiroga -042

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inspección del estado de zonas verdes</td>
<td>Inspección de estado de individuos arbóreos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Baño para personal de obra</td>
<td>Bodega para acopio de materiales y herramienta menor</td>
</tr>
</table>




Inspección de individuos arbóreos

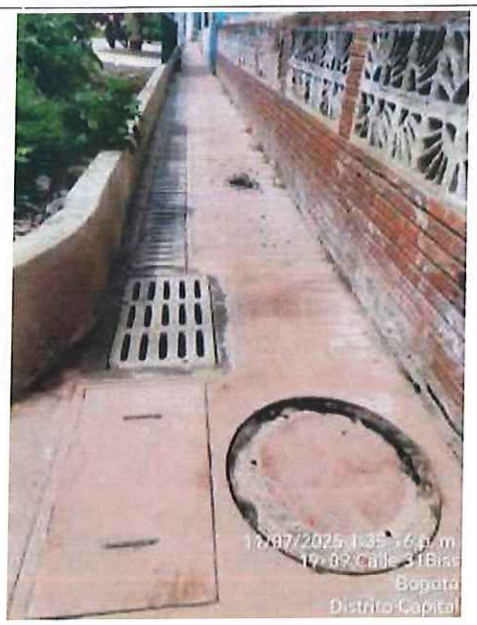


Sumidero y cárcamos

Parque Quiroga -138



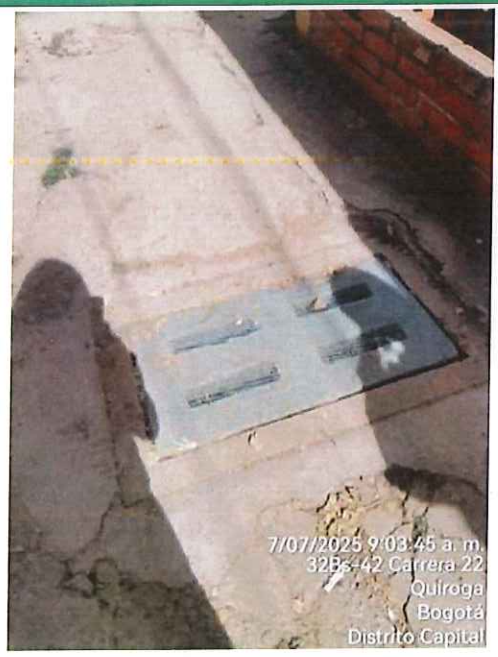


Inspeccion y mantenimiento de sumideros

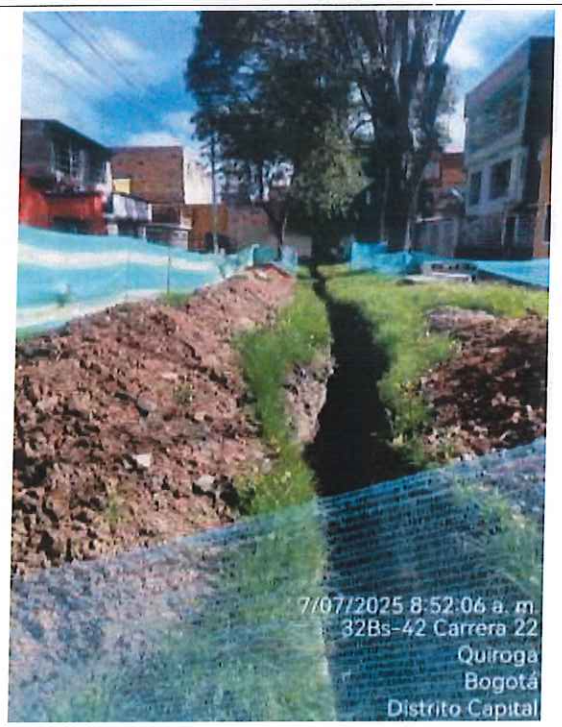

Cerramiento de area de obra



Baño para personal de obra

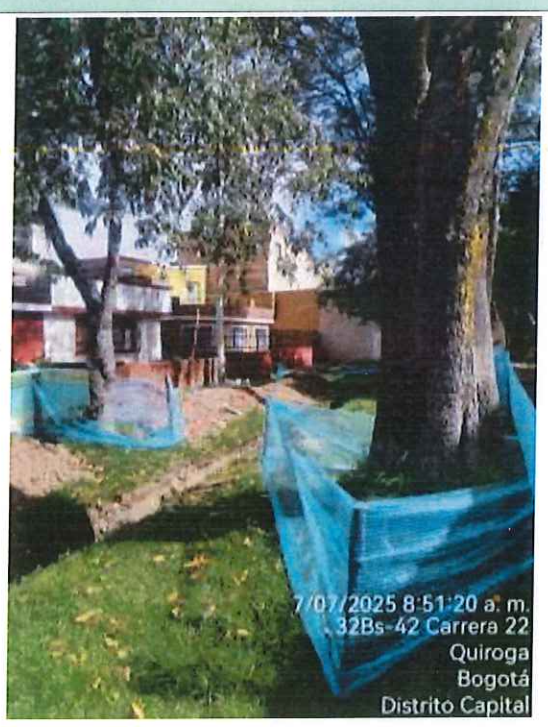

Proteccion de individuos arboreos




Bodega para acopio de materiales

Parque Zarazota





Cerramiento area de obra

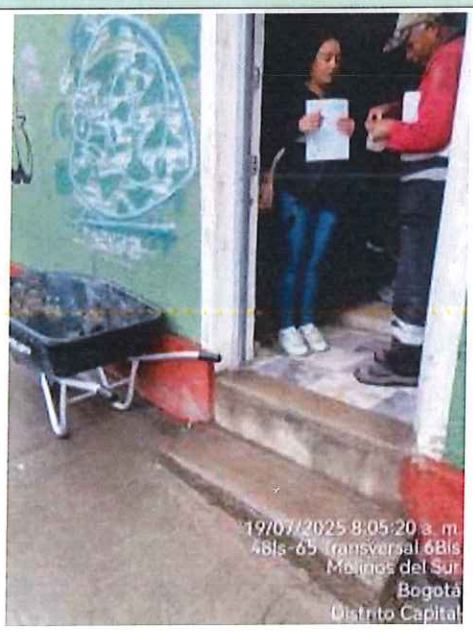

Bodega para acopio de materiales y herramienta menor

ANEXO 2.

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES	Version 1 Enero/2025 SST-FOT-004

FECHA: Julio 15 de 2025. DURACIÓN:

Tema Capacitación: "Protección de Sumideros"
-Importancia de realizar mantenimiento a los sumideros identificados en obra.

CAPACITADOR: Patricia Supelano. CARGO: Auxiliar Ambientales

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jose Danici Gomez conde	WHR	ayudante	J.D.L.G.C
2	[illegible]	WHR	oficial	
3	Jose luis Hernandez	WHR	oficial	
4	Luis Alejandro Tuiran	JJB	Ayudante	Luis A. Tuiran
5	Diego Fernando Giron	JJB	oficial	
6	JONATHAN ESTUPIÑAN	JJB	OFICIAL	
7	Brayan Herrera.	JJB	oficial	
8	Diosdado Balaus.	JJB	OFS	
9	Juan Camilo Bāsta	JJB	oficial	Juan Basta
10	ERLIN MANUEL	WHR	ayudante	ERLIN
11	ROLLER ROYETT	WHR	Ayudante	
12	Edgar Peña	WHR	Ayudante.	
13	JHON ESTUPIÑAN	WHR	oficial	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

ANEXO 3.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSORCIO PARQUES VERDES	CONSORCIO PARQUES VERDES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATO No. FDLRUU- COP-747-2024	CODIGO: GG-GA-PMA VERSION: 0,0 FECHA APROBACION:

P PROGRAMADO E EJECUTADO

ACTIVIDAD	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Señalizacion de Frentes de obra y sitios temporales	P				E																																			
Proteccion de especies arboreas	P				E																																			
Demarcacion de areas en obra	P				E																																			
Proteccion de sumideros identificados	P				E																																			
Ubicación de puntos de acopio de RCD	P				E																																			
Ubicación de acopio de residuos organicos e inorganicos	P				E																																			
Monitoreo del nivel de ruido																												P												
Monitoreo de polvos y gases compuestos																								P																
Manejo integral de materiales de construccion				P				E				P				E				P				E				P												
Almacenamiento y Gestion de RCD				P				E								E												P												
Almacenamiento y Gestion de residuos peligrosos				P								E								E								P												
Verificacion de extintor y botiquin	P				E				P				E				P				E				P															
Mantenimiento de sumideros					P				E				P				E				P				E															
Rotulacion de sust. peligrosas	P																			E																				
Mantenimiento de proteccion arborea					P				E				P				E				P				E															
Capacitaciones tema ambiental			P		E				P				E				P				E				P															
Monitoreo de agua	P					P				P				P				P					P																	
Implementacion de letreros ambientales	P																																							
Registro documental del cumplimiento de medidas del PMA	P			P			P				P				P				P				P																	
Implementacion de senderos peatonales	P																																							
Reporte y control de materiales de obra		P			P				P				P				P					P			P															
Socializacion PMA y RCD	P					P				P				P				P								P														
Cumplimiento de procedimiento de vehiculos							P										P																							
Medidas de compensacion																																								
Restablecimiento de zonas y limpieza general																												P												
Diligenciamiento de formatos PMA	P				P				P				P				P				P				P															
Verificacion del kit de emergencias de derrame de combustibles	P				P				P				P				P				P				P															
Monitoreo red de alcantarillado	P									P								P					P																	

ANEXO 4.

CONTROL DE TRANSPORTE DE RCD

CONSORCIO PARQUES VERDES	CONTROL TRANSPORTE RCD					
FECHA	GESTOR EXTERNO	ORIGEN	No. PLACA	No. PIN	TIPO RCD	VOLUMEN (m^3)
2/04/2025	Maquinas Amarillas	Parque Quiroga 042	SQB000	2805	Excavacion	15
23/04/2025	Maquinas Amarillas	Parque Quiroga 042	SRL286	0	Excavacion	15
8/05/2025	Maquinas Amarillas	Parque Quiroga 042	SXY899	18749	Excavacion	15
8/05/2025	Maquinas Amarillas	Parque Quiroga 042	SXY899	18749	Excavacion	15
17/05/2025	Maquinas Amarillas	Parque Quiroga 042	SRL286	0	Excavacion	15
21/05/2025	Maquinas Amarillas	Parque Quiroga 042	SRL286	0	Excavacion	15
22/05/2025	Maquinas Amarillas	Parque Quiroga 042	SRL286	0	Excavacion	15
24/05/2025	Maquinas Amarillas	Parque Quiroga 042	SRL286	0	Excavacion	15
4/06/2025	Maquinas Amarillas	Zarazota	SRL286	0	Excavacion	15
9/06/2025	Ingeomineria	Zarazota	SRL286	0	Excavacion	15
10/06/2025	Ingeomineria	Zarazota	SRL286	0	Excavacion	15
16/06/2025	Ingeomineria	Zarazota	SRL286	0	Excavacion	15
16/06/2025	Ingeomineria	Zarazota	SRL286	0	Excavacion	15
19/06/2025	Maquinas Amarillas	Zarazota	SRL286	0	Excavacion	15

ANEXO 5.

REMISIONES DE GESTIÓN DE RCD

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-183961
Fecha: 2025-06-19 14:17:23
Cajero: Luis
Placa: SRL286 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 4
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... $ 100.000

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-180053
Fecha: 2025-06-04 08:10:49
Cajero: Luis
Placa: SRL286 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 2
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

INGEOMINERIA

SAN ANTONIO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Licencias y registros: RESOLUCIÓN 0835 DEL 16 DE JUNIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU N° 654-2022

Comprobante ingreso
67346
vale por 1 viaje

Fecha:	16/06/2025
Hora	10:35
Placa Vehiculo	SRL286
PIN	14542
Empresa Generadora	PARTICULAR
Origen Material	BOCHICA
vale Externo	-
Tipo Material	EXCAVACION
Tipo Vehiculol	DOBLE
Factura POS	647

- FPOS 647 TRANS 1421

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
CAJA
Resolución 1110 [illegible] de 2017 de ANLA

PATIO
INGEOMINERIA
NIT 901.000.046-7

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
PORTERIA

INGEOMINERIA

SAN ANTONIO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Licencias y registros: RESOLUCIÓN 0816 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU N° 654 -2022

Comprobante de ingreso

67707

vale por 1 viaje

Fecha:	19/06/2025
Hora	11:35
Placa Vehiculo	SRL286
PIN	14542
Empresa Generadora	PARTICULAR
Origen Material	BOCHICA
vale Externo	-
Tipo Material	EXCAVACION
Tipo Vehiculol	DOBLE
Factura POS	0

- TRANSF 1424 - FPOS 650

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
CAJA
Resolución 1110 del 12 de Septiembre de 2017 de ANLA

PATIO

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
PORTERIA

INGEOMINERIA

SAN ANTONIO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Licencias y registros: RESOLUCIÓN 0816 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU N° 654 -2022

Comprobante de ingreso

67423

vale por 1 viaje

Fecha:	16/06/2025
Hora	16:00
Placa Vehiculo	SRL286
PIN	14542
Empresa Generadora	PARTICULAR
Origen Material	BOCHICA
vale Externo	-
Tipo Material	EXCAVACION
Tipo Vehiculol	DOBLE
Factura POS	649

- TRANS 1422 FPOS 649

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
CAJA
Resolución 1110 del 12 de Septiembre de 2017 de ANLA

PATIO

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
PORTERIA

171

INGEOMINERIA

SAN ANTONIO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Licencias y registros: RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU N° 654-2022

Comprob[illegible]e Ingres

66870

vale por 1 viaje

Fecha:	9/06/2025
Hora	15:08
Placa Vehiculo	SRL286
PIN	14542
Empresa Generadora	PARTICULAR
Origen Material	BOCHICA
vale Externo	-
Tipo Material	TIERRA NEGRA
Tipo Vehiculol	DOBLE
Factura POS	642

- FPOS 642

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
CAJA
Resolución 1110 del 12 de Septiembre de 2017 de ANLA

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
PORTERIA

INGEOMINERIA

SAN ANTONIO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Licencias y registros: RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU N° 654-2022

Comprob[illegible]e Ingres

66870

vale por 1 viaje

Fecha:	9/06/2025
Hora	15:08
Placa Vehiculo	SRL286
PIN	14542
Empresa Generadora	PARTICULAR
Origen Material	BOCHICA
vale Externo	-
Tipo Material	TIERRA NEGRA
Tipo Vehiculol	DOBLE
Factura POS	642

- FPOS 642

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
CAJA
Resolución 1110 del 12 de Septiembre de 2017 de ANLA

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
PORTERIA

ANEXO 6.

REMISIÓN DE MATERIAL VALORIZADO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030350
Fecha: 19/06/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS
Contacto:	WHR URBANISMOS SAS
Nit o C.C.:	900931521 Código: 900931521
Dirección:	CL 80 SUR 42 69
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador
-
Placa: Guía: Cajas: 0
Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		PV-00003878

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,000
			Total	14,000

Observación:
PLACA SRL286 FRENTE BOCHICA SIN VALE; PESO NETO 20.30 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
CTA. SUR
ajperilla
ELABORADO
19 JUN 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030398
Fecha: 25/06/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS
Contacto:	WHR URBANISMOS SAS
Nit o C.C.:	900931521 Código: 900931521
Dirección:	CL 80 SUR 42 69
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador
-
Placa: Guía: Cajas: 0
Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		PV-00003884

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,000
			Total	14,000

Observación:
PLACA SRL286 FRENTE QUIROGA SIN VALE; PESO NETO 20.30 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
CTA. SUR
ajperilla
ELABORADO
25 JUN 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO

174

REMISION MANUAL	
Numero:	RM443
Fecha:	9/06/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	WHR URBANISMOS SAS	P.V. Nro:	
Nit o CC:	900931521	Frente:	MOLINOS

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
14,00	20,30

Transportador:

Placa: SLR286

OTRO ¿Cuál?

Observaciones: CONTADO (726.000)

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

09 JUN 2025

Elaborado

Nombre y firma

HORA

NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTE...

Recibido

Nombre y firma

ANEXO 7.

DOCUMENTO VEHICULOS

CAMIÓN PLACA SRL286

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030106660

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SRL286	MACK	CV713	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.000	AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	20000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6E19015552M60540185	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	1M2AG11C67M039284	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TALERO CASTAÑEDA HENRY EDUARDO	C.C. 79669915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE: I

FECHA IMPORT.

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/05/2006	26/09/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

PB-0222

LT08000101804

177

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181801415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2025/06/16

Fecha de vencimiento: 2026/06/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRL286

CLASE: CAMION

MARCA: MACK

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12000

NRO. MOTOR: 6E19015552M60540185

NRO. CHASIS: 1M2AG11C67M039284

VIN:

LÍNEA: CV713

COLOR: AMARILLO

NOMBRE PROPIETARIO: HENRY E. TALERO C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

178

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024 07 27	2024 07 28		2025 07 27	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TONELADAS	MODELO
9310006686402	SRL286	CAMION	PÚBLICO	12000	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	MACK	4 - VOLCO

LÍNEA VEHÍCULO	
CV713	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
6E19015552M60540185	1M2AG11C67M039284	1M2AG11C67M039284	20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	3118276128	CC	79669915	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310006686402	BOGOTA

TARIFA	VALOR SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
330	$1,162,400.00	$604,400.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,768,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARADOS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para los siguientes tarifas: 030, 210, 220, 240, 290, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 1549 de 2023
[2]Para los demás tarifas en cifradas en UVT.

El SOAT digital, [illegible] fácil portabilidad y practicidad, [illegible] para todas las personas.



MINI CARGADOR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 128579

MC667379	BOBCAT	S650	2017
CONSTRUCCION	CARGADOR		
BLANCO Y NARANJA	AL820241	NEUMATICOS	
3788 Kg	1830	3470	



CORA LTDA

NIT 8.901.415.093

STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

12-09-2023	08-03-2024	
IMPORTACIÓN	46202300048558/7	11/09/2023

TM03000064485

MAQUINAS BLANCAS G&L SAS
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA



REPORTE DE MANTENIMIENTO EQUPOS

Fecha Mantenimiento Abril 22 2025

Datos de la Maquina	Nombre Del Operador:	Jhysmarth Leao Estupiñan Hernandez
	Horometro Mantenimiento:	Hrs:2836***
	Tipo de maquina:	Minicargador Bobcat S650: **SERIE: BB16J04830**
	Empresa:	MAQUINAS BLANCAS G&L G2 SAS
Descripcion del Mantenimiento	Ubicación:	Calle 54 C # 82 B Bis 69 Bodega:250
	Descripción:	Mantenimiento Preventivo Cambio De Aceite Cambio De Filtros De Aire Cambio De Filtros De Combustible Cambio De Filtros De Aceite Cambio De Filtros De Trampa Cambio Aceite De Cadenas
Residuos Peligrosos Generados	Caracterización:	Aceite Usado Filtros Metalicos Material impregnado de hidrocarburo
	Cantidad:	2 Filtros Aire 1 Filtro Aceite 1 Filtro Combustible Primario 2 Filtro Trampa 3 Galones De Aceite Usado
	Disposición:	Ecolcim SAS
	Próximo Mantenimiento:	Hrs:3086**
Responsable.		**Inspección**
Cargo.		**EQUIPO DE MANTENIMIENTO**
Gerente		**MAQUINAS BLANCAS G&L SAS**

Info.maquinasblancas@gmail.com

WHR URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

El señor WILSON HERNANDEZ REVUELTAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 91.363.748 de Landazuri, como representante legal de la empresa WHR UBANISMOS S.A.S. se compromete a realizar los mantenimientos preventivos según el manual de operaciones y según tiempo establecidos por el fabricante en el equipo MINI CARGADOR BOBCAT S650.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

ANEXO 8.

RECIBOS DE MATERIALES PETREOS

RECIBO

No. 1821

6625

302 225 6611 danielgs1115@gmail.com

ESPECIFICACIONES

OBRA: Parque Zarzal

METROS: 8 m3

PLACA: AJB 975

MATERIAL: Arena de Rio

SI APLICA:

- TRASCIEGO: ☐
- CON PALEROS: ☐

OBSERVACIONES

RECIBO: _____

C.C. _____

SERVIMOS CON CALIDAD Y COMPLIMIENTO

RECIBO

No. 1821

6625

302 225 6611 danielgs1115@gmail.com

ESPECIFICACIONES

OBRA: Parque Zarzal

METROS: 8 m3

PLACA: AJB 975

MATERIAL: Arena de Rio

SI APLICA:

- TRASCIEGO: ☐
- CON PALEROS: ☐

OBSERVACIONES

RECIBO: _____

C.C. _____

SERVIMOS CON CALIDAD Y COMPLIMIENTO
