PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	ITEM	1.01	ESTUCO MUROS	UNIDAD			Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARIA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Registro fotográfico				Dimensiones						



NIVEL	COD	ZONA	ESPACIO	LONGITUD (M)	ALTO (M)	UNIDAD	AREA	Observaciones
SOTANO	1	AREA DE COCINA Y ADM	COCINA LAVADO ALMACEN	113.23	3.10	M2	351.00	
	2	SERVICIOS Y DEPOSITOS	DEPOSITOS ASEO BASURAS DEP CADAVERES AREA POLIVALENTE	147.10	3.10	M2	456.00	
	3	ARCHIVOS Y BODEGAS	ARCHIVO BODEGAS Y EQUIPO ASEO	97.42	3.10	M2	302.00	
	4	SISTEMAS Y PLANTAS	CUARTO ELECTRICO ESTACION ELECTRICA PLANTA Y MAQUINAS	11.29	3.10	M2	35.00	
	5	PARQUEO	PARQUEO	219.41	3.10	M2	680.17	
PRIMER PISO	1	AREA DE LABORATORIOS	LABORATORIOS NEVERAS LABORATORIOS ADM LABORATORIOS MUESTRAS Y TOMA MUESTRAS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES DEPOSITOS /ASEO/LAVADO	141.7	3.18	M2	450.75	3264.62
	2	AREA DE FARMACIA	AREA ESPANTERIA FARMACIA ADM FARMACIA BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	133.2	3.18	M2	423.45	
	3	HALL DE ACCESO Y SERVICIOS DIRECTOS	DESCANSO INTERNOS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	56.4	3.18	M2	179.22	
	4	AREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	ECOGRAFO CONSULTORIO ECOGRAFO CARDIOLOGIA CONSULTORIO CARDIOLOGIA RAYOS X T.A.C BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	185.3	3.18	M2	589.32	
	5	AREA DE OBSERVACIÓN	OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA OBSERVACIÓN PEDIATRIA CENTRAL ENFERMERIA CUBICULOS AISLAMIENTO DIR URGENCIA BAÑOS DEPOSITOS /ASEO/LAVADO PASILLOS Y CIRCULACIONES	161.3	3.18	M2	512.98	
	6	CONSULTORIOS Y MONITOREO	CONSULTORIOS SALA EDA PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS DIGITACION SALA ERA MONITOREO GINECOOBSTETRICIA REANIMACIÓN LAVADO DE PACIENTES DEPOSITOS /ASEO/LAVADO BAÑOS	159.5	3.18	M2	507.13	
	7	AREA DE URGENCIAS	CONSULTORIOS TRIAGE ZONA DE CAMILLAS SALA DE ESPERA BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	87.6	3.18	M2	278.56	
	8	CAFETERIA Y AUDITORIO	AUDITORIO CAFETERIA COCINETA BAÑOS	101.6	3.18	M2	323.21	
SEGUNDO PISO	1	UCI NEONATAL	INTENSIVOS E INTERMEDIOS AREA DE DESCANSO INSUMOS / DEPOSITOS / ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	224.0	3.18	M2	712.34	3110.52
	2	UCI A.R.O	CUARTOS A.R.O INSUMOS / DEPOSITOS / FELTROS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	212.0	3.18	M2	674.12	
	3	HALL CENTRAL Y COORDINACIÓN	COORDINACION Y PERSONAL DEPOSITOS /INSUMOS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	50.1	3.18	M2	159.19	
	4	AREA DE PARTOS	TRABAJO DE PARTOS RECUPERACION VESTIERES /ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	104.3	3.18	M2	331.56	
	5	AREA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE FARMACIA	ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN VESTIERES / DEPOSITOS / ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	123.3	3.18	M2	392.23	
	6	AREA DE RECUPERACION QUIRURGICA	AREA RECUPERACION ALISTADO PACIENTES BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	79.1	3.18	M2	251.67	
	7	AREA DE PROCEDIMIENTOS	SALAS DE PARTOS QUIROFANOS EQUIPOS Y DEPOSITOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	185.3	3.18	M2	589.41	
TERCER PISO	1	HABITACIONES	HABITACIONES	506.6	2.78	M2	1408.40	3706.98
	2	HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS	DEPOSITOS / ACCESOS FAMILIARES	185.6	2.78	M2	516.01	
	3	AREA DE AMPLIACIÓN	ORATORIO AMPLIACION	301.2	2.78	M2	837.45	
	4	AREA DE AMPLIACIÓN	AMPLIACION	340.0	2.78	M2	945.12	
CUARTO PISO	1	SECTOR DE HABITACIONES	HABITACIONES BAÑOS	506.6	2.78	M2	1408.40	2206.80
	2	HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS	IAMI Y COORNACION	287.2	2.78	M2	798.40	

OBSERVACIONES:

TOTAL 14,113.09 Metro Cuadrado

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

1.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	1.02	ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0,6 M	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
			SOTANO			
	2.7			20	54	Archivo y bodega
	2.5			3	7.5	Pasillo trabajo limpio trabajo sucio
	2.5			2	5	Pasillo a Hall
	2.5			5	12.5	Almacen deposito
	2.5			14	35	Cocina
	2.5			12	30	Pasillo morgue
	2.5			4	10	Dep cadaveres
	2.5			3	7.5	Aseo
	2.5			3	7.5	mantenimiento
	2.5			4	10	Biomedico
	2.5			4	10	Basuras2
	2.5			2	5	Basuras 3
	2.5			2	5	Basuras 1
	2.5			7	17.5	Lavanderia
		2.7	0.6	1	6.6	
		1.2	0.4	1	3.2	
		1.2	0.4	1	3.2	
		1.16	0.4	1	3.12	
		2	0.38	1	4.76	
		1.18	0.38	1	3.12	
		1.98	0.38	1	4.72	Ventaneria externa
		1.15	0.38	1	3.06	
		1.98	0.38	1	4.72	
		1.2	0.38	1	3.16	
		1.98	0.38	1	4.72	
		1.18	0.38	1	3.12	
		1.18	0.38	1	3.12	
		1.2	0.4	1	3.2	
		2	0.4	1	4.8	
		0.54	1	1	3.08	
		2	0.4	1	4.8	Ventaneria interna
		2	0.4	1	4.8	
		2	0.4	1	4.8	
		2	0.4	1	4.8	
		1.2	2.1	1	5.4	
		1.2	2.1	1	5.4	
		1.2	2.1	1	5.4	
		1.2	2.1	1	5.4	
		1.2	2.1	1	5.4	
		1	2.1	1	5.2	
		1	2.1	1	5.2	
		1	2.1	1	5.2	
		1	2.1	1	5.2	
		1	2.1	1	5.2	
		2.2	2.1	1	6.4	
		1.2	2.1	1	5.4	
		0.8	2.1	1	5	
		0.8	2.1	1	5	
		1.5	2.1	1	5.7	
		1.38	2.1	1	5.58	
		0.8	2.1	1	5	Puertas
		1.4	2.1	1	5.6	
		1.5	2.1	1	5.7	
		0.85	2.1	1	5.05	
		2.24	2.1	1	6.44	
		0.8	2.1	1	5	
		1.4	2.1	1	5.6	
		0.7	2.1	1	4.9	
		0.7	2.1	1	4.9	
		0.9	2.1	1	5.1	
		1.8	2.1	1	6	
		0.9	2.1	1	5.1	
		1.6	2.1	1	5.8	
		0.9	2.1	1	5.1	
		1.4	2.1	1	5.6	
		1.14	2.1	1	5.34	
		4.6	2.68	1	9.96	
			TOTAL SOTANO		479.67	
			PISO 1			
	2.6			222	577.2	Bordes de muros y columnas
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		2.65	2.5	1	10.3	
		1.3	1.3	1	5.2	
		0.95	0.95	1	3.8	
		3.01	2.4	1	10.82	
		3.01	2.4	1	10.82	
		3.03	2.4	1	10.86	
		3	2.4	1	10.8	
		3.01	2.4	1	10.82	
		3.06	2.4	1	10.92	
		3.81	2.38	1	12.38	
		3.85	2.4	1	12.5	
		3.85	2.4	1	12.5	
		1.2	1.75	1	5.9	
		1.2	2.1	1	6.6	
		1.2	2.1	1	6.6	
		1.16	1.76	1	5.84	
		0.8	1.5	1	4.6	
		1.5	1.5	1	6	Marcos Ventaneria externa
		1.3	1.47	1	5.54	
		1.34	1.5	1	5.68	
		0.95	0.92	1	3.74	
		1.3	0.96	1	4.52	
		1.3	0.95	1	4.5	
		2.45	0.5	1	5.9	
		2.24	0.5	1	5.48	
		2.24	0.5	1	5.48	
		2.24	0.5	1	5.48	
		0.5	0.5	1	2	
		0.5	0.5	1	2	
		1.22	0.55	1	3.54	
		1.3	1.3	1	5.2	
		1.3	1.3	1	5.2	

	0.91	1.3	1	4.42	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.68	1.3	1	3.96	
	0.5	1.3	1	3.6	
	1.02	0.95	1	3.94	
	1.3	1.3	1	5.2	
	2.74	1.4	1	8.28	
	1.1	0.94	1	4.08	
	0.65	0.5	1	2.3	
	0.65	1	1	3.3	
	2.13	1	1	6.26	
	1	1.04	1	4.08	
	0.95	0.66	1	3.22	
	0.95	1.04	1	3.98	
	1.85	1.52	1	6.74	
	0.95	1.04	1	3.98	Marcos Ventaneria interna
	2.8	2.64	1	10.88	
	1.41	1	1	4.82	
	0.98	0.4	1	2.76	
	1.98	0.4	1	4.76	
	1	1.04	1	4.08	
	1.98	0.4	1	4.76	
	0.96	0.4	1	2.72	
	0.7	0.98	1	3.36	
	1.12	1.72	1	5.68	
	6.45	5.96	1	24.82	
	6.45	2.72	1	18.34	
	2.54	2.6	1	10.28	
	2.29	2.6	1	9.78	
	2.17	2.6	1	9.54	Marcos Puertas ventana
	3.8	1.95	1	11.5	
	2.1	1.95	1	8.1	
	3.06	2.4	1	10.92	
	1.59	2.6	1	8.38	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	1.1	2.1	1	5.3	
	1	2.1	1	5.2	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.8	2.1	1	5	
	1	2.1	1	5.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.8	2.1	1	5	
	0.95	2.1	1	5.15	
	1	2.1	1	5.2	
	1	2.1	1	5.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.8	2.1	1	5	
	1.3	2.5	1	6.3	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.8	2.1	1	5	
	1	2.1	1	5.2	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.8	2.1	1	6	
	0.85	2.1	1	5.05	
	0.85	2.1	1	5.05	
	0.85	2.1	1	5.05	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.3	2.1	1	5.5	
	2	2.1	1	6.2	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	1.7	2.1	1	5.9	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.77	2.1	1	4.97	
	0.8	2.1	1	5	
	1.7	2.1	1	5.9	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	Marcos de puertas
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	1.7	2.1	1	5.9	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.7	2.1	1	5.9	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.3	2.1	1	5.5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.7	2.1	1	5.9	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.8	2.1	1	5	
	1.7	2.1	1	5.9	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1	2.1	1	5.2	
	1.7	2.6	1	6.9	
	1	2.1	1	5.2	
	0.8	2.1	1	5	
	1	2.1	1	5.2	
	1.7	2.1	1	5.9	

	1	2.1	1	5.2	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1	2.1	1	5.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.3	2.1	1	5.5	
TOTAL PISO 1				**1568.75**	
PISO 2					
2.6			148	384.8	Bordes de muros y columnas
	0.48	0.48	1	1.92	
	1.2	1.3	1	5	
	0.98	0.8	1	3.56	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.92	1.1	1	4.04	
	0.9	1.1	1	4	
	1.3	1.1	1	4.8	
	1.3	1.1	1	4.8	
	1.3	1.29	1	5.18	
	1.3	1.28	1	5.16	
	0.93	0.265	1	2.39	
	1.9	0.7	1	5.2	
	1.9	0.7	1	5.2	
	1.3	1.28	1	5.16	
	1.3	1.29	1	5.18	
	1.4	1.29	1	5.38	
	1	0.7	1	3.4	
	1.04	1.29	1	4.66	
	0.94	1.28	1	4.44	
	1.3	1.28	1	5.16	
	1.89	1.27	1	6.32	
	0.98	0.95	1	3.86	
	2.87	0.69	1	7.12	
	3.04	0.69	1	7.46	Marcos ventaneria externa
	1.16	0.69	1	3.7	
	1.33	0.68	1	4.02	
	3.25	0.68	1	7.86	
	3.06	0.68	1	7.48	
	3.04	0.68	1	7.44	
	3.1	0.68	1	7.56	
	2.5	0.68	1	6.36	
	3.52	0.5	1	8.04	
	3.52	0.5	1	8.04	
	3.28	0.5	1	7.56	
	4.07	0.5	1	9.14	
	0.94	0.94	1	3.76	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.74	0.96	1	3.4	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	0.81	1	4.22	
	1.3	0.81	1	4.22	
	0.94	0.75	1	3.38	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.7	1	1	3.4	
	1.48	0.99	1	4.94	
	1	1.03	1	4.06	Marcos Ventaneria interna
	1	1.03	1	4.06	
	1	1.03	1	4.06	
	1.48	0.98	1	4.92	
	2.7	2.6	1	7.9	
	1	2.6	1	6.2	
	1.89	2.6	1	7.09	
	3.23	2.6	1	8.43	
	3.75	2.6	1	8.95	
	2.87	1.92	1	6.71	
	3.61	2.6	1	8.81	
	1.73	2.6	1	6.93	
	2.02	1.92	1	5.86	Marcos puertas ventana
	1.73	2.6	1	6.93	
	3.61	2.6	1	8.81	
	1.94	1.92	1	5.78	
	1.53	2.6	1	6.73	
	1.02	1.92	1	4.86	
	1.53	2.6	1	6.73	
	2.2	2.6	1	7.4	
	1.07	2.6	1	6.27	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1	2.1	1	5.2	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1.8	2.1	1	6	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.35	2.1	1	5.55	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1.35	2.1	1	5.55	
	0.8	2.1	1	5	
	2	2.1	1	6.2	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1	2.1	1	5.2	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.8	2.1	1	5	
	2	2.1	1	6.2	
	0.9	2.1	1	5.1	
	2	2.1	1	6.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.8	2.1	1	5	

	0.8	2.1	1	5	
	1.1	2.1	1	5.3	
	1.1	2.1	1	5.3	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	1	2.1	1	5.2	
	1	2.1	1	5.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1	2.1	1	5.2	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.6	2.1	1	4.8	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	2	2.1	1	6.2	Marcos puertas
	1	2.1	1	5.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1	2.1	1	5.2	
	1.7	2.1	1	5.9	
	2	2.1	1	6.2	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.6	2.1	1	4.8	
	1.7	2.1	1	5.9	
	0.8	2.1	1	5	
	1	2.1	1	5.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	1.7	2.1	1	5.9	
	1.7	2.1	1	5.9	
	1	2.1	1	5.2	
	1.98	2.1	1	6.18	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.98	2.1	1	6.18	
	1.7	2.1	1	5.9	
	1.7	2.1	1	5.9	
	1.7	2.1	1	5.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.9	2.1	1	6.1	
	1	2.1	1	5.2	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	2	2.1	1	6.2	
	2	2.1	1	6.2	
	2	2.1	1	6.2	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1.7	2.1	1	5.9	
TOTAL PISO 2				**1361.56**	
PISO 3					
2.6			148	384.8	Bordes de muros y columnas
	4.8	2.28	1	14.16	
	2.28	2.26	1	9.08	
	4.8	1.35	1	12.3	
	3.34	1.35	1	9.38	
	2.55	2.24	1	9.58	
	3.02	2.24	1	10.52	
	1.3	1.35	1	5.3	
	1.9	1.35	1	6.5	
	0.8	0.7	1	3	
	0.8	0.7	1	3	
	0.705	0.68	1	2.77	
	1.16	0.68	1	3.68	
	0.8	0.7	1	3	
	0.8	0.7	1	3	
	0.8	0.7	1	3	
	0.8	0.7	1	3	
	3.05	0.7	1	7.5	
	3.05	0.7	1	7.5	
	3.05	0.7	1	7.5	
	3.05	0.7	1	7.5	
	3.05	0.7	1	7.5	
	1	0.99	1	3.98	
	0.98	0.7	1	3.36	
	1.24	1.89	1	6.26	
	5.38	1.89	1	14.54	
	1.4	1.89	1	6.58	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	Marcos ventanria externa
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.2	1.19	1	4.78	
	1.2	1.19	1	4.78	
	0.74	1.21	1	3.9	

	2	1.18	1	6.36	
	1.8	1.18	1	5.96	
	1.82	0.7	1	5.04	
	0.87	2	1	5.74	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	2.5	0.7	1	6.4	
	2.5	0.7	1	6.4	
	2.5	0.7	1	6.4	
	2.5	0.7	1	6.4	
	2.5	0.7	1	6.4	
	1.5	1.04	1	5.08	
	1.2	1.2	1	4.8	
	0.9	1.5	1	4.8	
	0.9	1.5	1	4.8	
	0.9	1.5	1	4.8	
	0.9	1.5	1	4.8	
	0.9	1.5	1	4.8	
	0.9	1.5	1	4.8	
	0.9	1.5	1	4.8	
	1.96	1.7	1	7.32	Marcos ventaneria interna
	1.74	1.7	1	6.88	
	1.54	1.7	1	6.48	
	2.49	1.7	1	8.38	
	1.57	1.7	1	6.54	
	1.73	1.7	1	6.86	
	1.58	1.7	1	6.56	
	1.82	1.7	1	7.04	
	1.98	1.7	1	7.36	
	2.48	0.7	1	6.36	
	3.2	2.25	1	7.7	
	2.95	2.8	1	8.55	
	2.18	2.8	1	7.78	
	2.15	2.8	1	7.75	
	2.3	2.8	1	7.9	
	2.4	2.8	1	8	
	3.6	2.8	1	9.2	
	1.14	2.8	1	6.74	
	2.22	2.8	1	7.82	
	2.22	2.8	1	7.82	
	2.22	2.8	1	7.82	
	2.24	2.8	1	7.84	
	2.26	2.8	1	7.86	
	1.6	2.8	1	7.2	Marcos puerta ventana
	2	2.1	1	6.2	
	2	2.1	1	6.2	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	0.85	2	1	4.85	
	2	2.1	1	6.2	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	1.3	2.1	1	5.5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	1.3	2.1	1	5.5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	2	2.1	1	6.2	
	0.8	2.1	1	5	Marcos puertas
	0.8	2.1	1	5	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.8	2.1	1	5	

	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.7	2.1	1	5.9	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	2	2.1	1	6.2	
	2.17	2.1	1	6.37	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1	2.1	1	5.2	
	0.88	2.1	1	5.08	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.8	2.1	1	5	
	1.47	2.1	1	5.67	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	1.9	2.1	1	6.1	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.3	2.1	1	5.5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.7	2.1	1	4.9	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.82	2.1	1	5.02	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	2	2.1	1	6.2	
	2	2.1	1	6.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	2	2.1	1	6.2	
	0.9	2.1	1	5.1	
TOTAL PISO 3				**1604.39**	
PISO 4					
2.6			114	296.4	Bordes de muros y columnas
	1	1	1	4	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	6.35	1.46	1	15.62	
	3.34	1.46	1	9.6	
	0.78	1.46	1	4.48	
	1.76	1.46	1	6.44	
	1.2	1.3	1	5	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.24	1.89	1	6.26	Marcos ventaneria externa
	5.38	1.89	1	14.54	
	1.4	1.89	1	6.58	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.64	1.05	1	5.38	Marco Ventana interna
	2	2.1	1	6.2	Marcos puerta ventana
	2	2.1	1	6.2	
	2	2.1	1	6.2	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	1.3	2.1	1	5.5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	1.3	2.1	1	5.5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.8	2.1	1	5	
	0.7	2.1	1	4.9	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	

	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	Marcos puertas
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.2	2.1	1	5.4	
	0.9	2.1	1	5.1	
	2	2.1	1	6.2	
	0.8	2.1	1	5	
	0.8	2.1	1	5	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.75	2.1	1	4.95	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1.7	2.1	1	5.9	
	0.8	2.1	1	5	
	0.9	2.1	1	5.1	
	0.9	2.1	1	5.1	
	1	2.1	1	5.2	
	1.2	2.1	1	5.4	
	TOTAL PISO 4			**879.2**	
				0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **5,893.57** **Metro lineal**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

1.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	1.03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	SOTANO					
	2.7			19	51.3	Archivo y bodega
	2.5			12	30	Pasillo trabajo limpio trabajo sucio
	2.5			2	5	
	2.3			4	9.2	Pasillo hall
	2			2	4	
	2.5			3	7.5	alamcen deposito
	2.5			4	10	estar
	2.5			12	30	Cocina
	2.5			6	15	Pasillo morgue
	2.5			8	20	
	2.5			3	7.5	Dep cadaveres
	2.5			2	5	aseo
	2.5			4	10	Taller mantenimeinto
	2.5			4	10	Biomedico
	2.5			2	5	Basuras 2
	2.5			1	2.5	basuras 3
	2.5			1	2.5	Basuras 1
	2.5			4	10	lavnderia
	2.8			68	190.4	parqueadero
		2.7	0.6	1	6.6	
		1.2	0.4	1	3.2	
		1.2	0.4	1	3.2	
		1.16	0.4	1	3.12	
		2	0.38	1	4.76	
		1.18	0.38	1	3.12	
		1.98	0.38	1	4.72	Ventaneria externa
		1.15	0.38	1	3.06	
		1.98	0.38	1	4.72	
		1.2	0.38	1	3.16	
		1.98	0.38	1	4.72	
		1.18	0.38	1	3.12	
		1.18	0.38	1	3.12	
		1.2	0.4	2	6.4	
		2	0.4	2	9.6	
		0.54	1	2	6.16	
		2	0.4	2	9.6	Ventaneria interna
		2	0.4	2	9.6	
		2	0.4	2	9.6	
		2	0.4	2	9.6	
		1.2	2.1	2	13.2	
		1.2	2.1	2	13.2	
		1.2	2.1	2	13.2	
		1.2	2.1	2	13.2	
		1.2	2.1	2	13.2	
		1	2.1	2	12.4	
		1	2.1	2	12.4	
		1	2.1	2	12.4	
		1	2.1	2	12.4	
		1	2.1	2	12.4	
		2.2	2.1	2	17.2	
		1.2	2.1	2	13.2	
		0.8	2.1	2	11.6	
		0.8	2.1	2	11.6	
		1.5	2.1	2	14.4	
		1.38	2.1	2	13.92	
		0.8	2.1	2	11.6	Puertas
		1.4	2.1	2	14	
		1.5	2.1	2	14.4	
		0.85	2.1	2	11.8	
		2.24	2.1	2	17.36	
		0.8	2.1	2	11.6	
		1.4	2.1	2	14	
		0.7	2.1	2	11.2	
		0.7	2.1	2	11.2	
		0.9	2.1	2	12	
		1.8	2.1	2	15.6	
		0.9	2.1	2	12	
		1.6	2.1	2	14.8	
		0.9	2.1	2	12	
		1.4	2.1	2	14	
		1.14	2.1	2	12.96	
		4.6	2.68	2	29.12	
	TOTAL SOTANO				**985.64**	
	PISO 1					
	2.6			148	384.8	Bordes de muros y columnas
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		1.27	1.3	1	5.14	
		2.65	2.5	1	10.3	
		1.3	1.3	1	5.2	
		0.95	0.95	1	3.8	
		3.01	2.4	1	10.82	
		3.01	2.4	1	10.82	
		3.03	2.4	1	10.86	
		3	2.4	1	10.8	
		3.01	2.4	1	10.82	
		3.06	2.4	1	10.92	
		3.81	2.38	1	12.38	
		3.85	2.4	1	12.5	
		3.85	2.4	1	12.5	
		1.2	1.75	1	5.9	
		1.2	2.1	1	6.6	
		1.2	2.1	1	6.6	
		1.16	1.76	1	5.84	
		0.8	1.5	1	4.6	Marcos Ventaneria externa
		1.5	1.5	1	6	
		1.3	1.47	1	5.54	
		1.34	1.5	1	5.68	
		0.95	0.92	1	3.74	
		1.3	0.96	1	4.52	
		1.3	0.95	1	4.5	
		2.45	0.5	1	5.9	
		2.24	0.5	1	5.48	
		2.24	0.5	1	5.48	
		2.24	0.5	1	5.48	

	0.5	0.5	1	2	
	0.5	0.5	1	2	
	1.22	0.55	1	3.54	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.91	1.3	1	4.42	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.68	1.3	1	3.96	
	0.5	1.3	1	3.6	
	1.02	0.95	1	3.94	
	1.3	1.3	1	5.2	
	2.74	1.4	2	16.56	
	1.1	0.94	2	8.16	
	0.65	0.5	2	4.6	
	0.65	1	2	6.6	
	2.13	1	2	12.52	
	1	1.04	2	8.16	
	0.95	0.66	2	6.44	
	0.95	1.04	2	7.96	
	1.85	1.52	2	13.48	
	0.95	1.04	2	7.96	Marcos Ventaneria interna
	2.8	2.64	2	21.76	
	1.41	1	2	9.64	
	0.98	0.4	2	5.52	
	1.98	0.4	2	9.52	
	1	1.04	2	8.16	
	1.98	0.4	2	9.52	
	0.96	0.4	2	5.44	
	0.7	0.98	2	6.72	
	1.12	1.72	2	11.36	
	6.45	5.96	2	49.64	
	6.45	2.72	2	36.68	
	2.54	2.6	2	20.56	
	2.29	2.6	2	19.56	
	2.17	2.6	2	19.08	Marcos Puertas ventana
	3.8	1.95	2	23	
	2.1	1.95	2	16.2	
	3.06	2.4	2	21.84	
	1.59	2.6	2	16.76	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	1.1	2.1	2	10.6	
	1	2.1	2	10.4	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.8	2.1	2	10	
	1	2.1	2	10.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.8	2.1	2	10	
	0.95	2.1	2	10.3	
	1	2.1	2	10.4	
	1	2.1	2	10.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.8	2.1	2	10	
	1.3	2.5	2	12.6	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.8	2.1	2	10	
	1	2.1	2	10.4	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.8	2.1	2	12	
	0.85	2.1	2	10.1	
	0.85	2.1	2	10.1	
	0.85	2.1	2	10.1	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.3	2.1	2	11	
	2	2.1	2	12.4	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	1.7	2.1	2	11.8	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.77	2.1	2	9.94	
	0.8	2.1	2	10	
	1.7	2.1	2	11.8	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	Marcos de puertas
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	1.7	2.1	2	11.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.7	2.1	2	11.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.3	2.1	2	11	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.7	2.1	2	11.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.8	2.1	2	10	
	1.7	2.1	2	11.8	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1	2.1	2	10.4	

	1.7	2.6	2	13.8	
	1	2.1	2	10.4	
	0.8	2.1	2	10	
	1	2.1	2	10.4	
	1.7	2.1	2	11.8	
	1	2.1	2	10.4	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1	2.1	2	10.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.3	2.1	2	11	
	TOTAL PISO 1			**2078.82**	
	PISO 2				
2.6			148	384.8	Bordes de muros y columnas
	0.48	0.48	1	1.92	
	1.2	1.3	1	5	
	0.98	0.8	1	3.56	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.92	1.1	1	4.04	
	0.9	1.1	1	4	
	1.3	1.1	1	4.8	
	1.3	1.1	1	4.8	
	1.3	1.29	1	5.18	
	1.3	1.28	1	5.16	
	0.93	0.265	1	2.39	
	1.9	0.7	1	5.2	
	1.9	0.7	1	5.2	
	1.3	1.28	1	5.16	
	1.3	1.29	1	5.18	
	1.4	1.29	1	5.38	
	1	0.7	1	3.4	
	1.04	1.29	1	4.66	
	0.94	1.28	1	4.44	
	1.3	1.28	1	5.16	
	1.89	1.27	1	6.32	
	0.98	0.95	1	3.86	
	2.87	0.69	1	7.12	
	3.04	0.69	1	7.46	Marcos ventaneria externa
	1.16	0.69	1	3.7	
	1.33	0.68	1	4.02	
	3.25	0.68	1	7.86	
	3.06	0.68	1	7.48	
	3.04	0.68	1	7.44	
	3.1	0.68	1	7.56	
	2.5	0.68	1	6.36	
	3.52	0.5	1	8.04	
	3.52	0.5	1	8.04	
	3.28	0.5	1	7.56	
	4.07	0.5	1	9.14	
	0.94	0.94	1	3.76	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.74	0.96	1	3.4	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	0.81	1	4.22	
	1.3	0.81	1	4.22	
	0.94	0.75	1	3.38	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.7	1	2	6.8	
	1.48	0.99	2	9.88	
	1	1.03	2	8.12	Marcos Ventaneria interna
	1	1.03	2	8.12	
	1	1.03	2	8.12	
	1.48	0.98	2	9.84	
	2.7	2.6	2	15.8	
	1	2.6	2	12.4	
	1.89	2.6	2	14.18	
	3.23	2.6	2	16.86	
	3.75	2.6	2	17.9	
	2.87	1.92	2	13.42	
	3.61	2.6	2	17.62	
	1.73	2.6	2	13.86	
	2.02	1.92	2	11.72	Marcos puertas ventana
	1.73	2.6	2	13.86	
	3.61	2.6	2	17.62	
	1.94	1.92	2	11.56	
	1.53	2.6	2	13.46	
	1.02	1.92	2	9.72	
	1.53	2.6	2	13.46	
	2.2	2.6	2	14.8	
	1.07	2.6	2	12.54	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1	2.1	2	10.4	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1.8	2.1	2	12	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.35	2.1	2	11.1	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1.35	2.1	2	11.1	
	0.8	2.1	2	10	
	2	2.1	2	12.4	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1	2.1	2	10.4	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.8	2.1	2	10	
	2	2.1	2	12.4	

	0.9	2.1	2	10.2	
	2	2.1	2	12.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	1.1	2.1	2	10.6	
	1.1	2.1	2	10.6	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	1	2.1	2	10.4	
	1	2.1	2	10.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1	2.1	2	10.4	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.6	2.1	2	9.6	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	2	2.1	2	12.4	Marcos puertas
	1	2.1	2	10.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1	2.1	2	10.4	
	1.7	2.1	2	11.8	
	2	2.1	2	12.4	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.6	2.1	2	9.6	
	1.7	2.1	2	11.8	
	0.8	2.1	2	10	
	1	2.1	2	10.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	1.7	2.1	2	11.8	
	1.7	2.1	2	11.8	
	1	2.1	2	10.4	
	1.98	2.1	2	12.36	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.98	2.1	2	12.36	
	1.7	2.1	2	11.8	
	1.7	2.1	2	11.8	
	1.7	2.1	2	11.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.9	2.1	2	12.2	
	1	2.1	2	10.4	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	2	2.1	2	12.4	
	2	2.1	2	12.4	
	2	2.1	2	12.4	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1.7	2.1	2	11.8	
TOTAL PISO 2				**2085.95**	
PISO 3					
2.6			148	384.8	Bordes de muros y columnas
	4.8	2.28	1	14.16	
	2.28	2.26	1	9.08	
	4.8	1.35	1	12.3	
	3.34	1.35	1	9.38	
	2.55	2.24	1	9.58	
	3.02	2.24	1	10.52	
	1.3	1.35	1	5.3	
	1.9	1.35	1	6.5	
	0.8	0.7	1	3	
	0.8	0.7	1	3	
	0.705	0.68	1	2.77	
	1.16	0.68	1	3.68	
	0.8	0.7	1	3	
	0.8	0.7	1	3	
	0.8	0.7	1	3	
	0.8	0.7	1	3	
	3.05	0.7	1	7.5	
	3.05	0.7	1	7.5	
	3.05	0.7	1	7.5	
	3.05	0.7	1	7.5	
	3.05	0.7	1	7.5	
	1	0.99	1	3.98	
	0.98	0.7	1	3.36	
	1.24	1.89	1	6.26	
	5.38	1.89	1	14.54	
	1.4	1.89	1	6.58	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	Marcos ventanria externa
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	

	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.2	1.19	1	4.78	
	1.2	1.19	1	4.78	
	0.74	1.21	1	3.9	
	2	1.18	1	6.36	
	1.8	1.18	1	5.96	
	1.82	0.7	1	5.04	
	0.87	2	1	5.74	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	1.2	1.18	1	4.76	
	2.5	0.7	1	6.4	
	2.5	0.7	1	6.4	
	2.5	0.7	1	6.4	
	2.5	0.7	1	6.4	
	2.5	0.7	1	6.4	
	1.5	1.04	2	10.16	
	1.2	1.2	2	9.6	
	0.9	1.5	2	9.6	
	0.9	1.5	2	9.6	
	0.9	1.5	2	9.6	
	0.9	1.5	2	9.6	
	0.9	1.5	2	9.6	
	0.9	1.5	2	9.6	
	0.9	1.5	2	9.6	
	1.96	1.7	2	14.64	Marcos ventaneria interna
	1.74	1.7	2	13.76	
	1.54	1.7	2	12.96	
	2.49	1.7	2	16.76	
	1.57	1.7	2	13.08	
	1.73	1.7	2	13.72	
	1.58	1.7	2	13.12	
	1.82	1.7	2	14.08	
	1.98	1.7	2	14.72	
	2.48	0.7	2	12.72	
	3.2	2.25	2	15.4	
	2.95	2.8	2	17.1	
	2.18	2.8	2	15.56	
	2.15	2.8	2	15.5	
	2.3	2.8	2	15.8	
	2.4	2.8	2	16	
	3.6	2.8	2	18.4	
	1.14	2.8	2	13.48	
	2.22	2.8	2	15.64	
	2.22	2.8	2	15.64	
	2.22	2.8	2	15.64	
	2.24	2.8	2	15.68	
	2.26	2.8	2	15.72	
	1.6	2.8	2	14.4	Marcos puerta ventana
	2	2.1	2	12.4	
	2	2.1	2	12.4	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	0.85	2	2	9.7	
	2	2.1	2	12.4	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	1.3	2.1	2	11	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	1.3	2.1	2	11	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	2	2.1	2	12.4	

	0.8	2.1	2	10	Marcos puertas
	0.8	2.1	2	10	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.7	2.1	2	11.8	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	2	2.1	2	12.4	
	2.17	2.1	2	12.74	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1	2.1	2	10.4	
	0.88	2.1	2	10.16	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.8	2.1	2	10	
	1.47	2.1	2	11.34	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	1.9	2.1	2	12.2	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.3	2.1	2	11	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.7	2.1	2	9.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.82	2.1	2	10.04	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	2	2.1	2	12.4	
	2	2.1	2	12.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	2	2.1	2	12.4	
	0.9	2.1	2	10.2	
TOTAL PISO 3				**2490.17**	
PISO 4					
2.6			114	296.4	Bordes de muros y columnas
	1	1	1	4	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	6.35	1.46	1	15.62	
	3.34	1.46	1	9.6	
	0.78	1.46	1	4.48	
	1.76	1.46	1	6.44	
	1.2	1.3	1	5	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.3	1.5	1	5.6	
	1.24	1.89	1	6.26	Marcos ventaneria externa
	5.38	1.89	1	14.54	
	1.4	1.89	1	6.58	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	1.3	1.3	1	5.2	
	0.95	0.45	1	2.8	
	1.64	1.05	2	10.76	Marco Ventana interna
	2	2.1	2	12.4	Marcos puerta ventana
	2	2.1	2	12.4	
	2	2.1	2	12.4	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	1.3	2.1	2	11	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	1.3	2.1	2	11	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.8	2.1	2	10	
	0.7	2.1	2	9.8	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	

	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	Marcos puertas
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.2	2.1	2	10.8	
	0.9	2.1	2	10.2	
	2	2.1	2	12.4	
	0.8	2.1	2	10	
	0.8	2.1	2	10	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.75	2.1	2	9.9	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1.7	2.1	2	11.8	
	0.8	2.1	2	10	
	0.9	2.1	2	10.2	
	0.9	2.1	2	10.2	
	1	2.1	2	10.4	
	1.2	2.1	2	10.8	
	TOTAL PISO 3			**1264.68**	

OBSERVACIONES:

TOTAL **8,905.26** **Metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	ITEM	1.04

Registro fotográfico



	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Dimensiones								
NIVEL	COD	ZONA	ESPACIO	LONGITUD (M)	ALTO (M)	UNIDAD	AREA	Observaciones
SOTANO	3	ARCHIVOS Y BODEGAS	ARCHIVO	97.42	3.10	M2	302.00	
			BODEGAS Y EQUIPO					
			ASEO					
	4	SISTEMAS Y PLANTAS	CUERTO ELECTRICO	11.29	3.10	M2	35.00	
			ESTACION ELECTRICA					
			PLANTA Y MAQUINAS					
	5	PARQUEO	PARQUEO	219.41	3.10	M2	680.17	
PRIMER PISO	3	HALL DE ACCESO Y SERVICIOS DIRECTOS	DESCANSO INTERNOS	56.35849057	3.18	M2	179.22	
			BAÑOS					
			PASILLOS Y CIRCULACIONES					
	6	CONSULTORIOS Y MONITOREO	CONSULTORIOS	159.4748428	3.18	M2	507.13	
			SALA EDA					
			PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS					
			DIGITACION					
			SALA ERA					
			MONITOREO GINECOBSTETRICIA					
			REANIMACION					
			LAVADO DE PACIENTES					
			DEPOSITOS /ASEO/LAVADO					
			BAÑOS					
	8	CAFETERIA Y AUDITORIO	AUDITORIO	101.6383648	3.18	M2	323.21	
			CAFETERIA					
			COCINETA					
			BAÑOS					
SEGUNDO PISO	3	HALL CENTRAL Y COORDINACIÓN	COORDINACION Y PERSONAL	50.06	3.18	M2	159.19	
			DEPOSITOS /INSUMOS					
			BAÑOS					
			PASILLOS Y CIRCULACIONES					
TERCER PISO	1	HABITACIONES	HABITACIONES	506.62	2.78	M2	1408.40	
	2	HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS	DEPOSITOS / ACCESOS FAMILIARES	185.62	2.78	M2	516.01	
			ORATORIO					
	3	AREA DE AMPLIACIÓN	AMPLIACION	301.24	2.78	M2	837.45	
	4	AREA DE AMPLIACIÓN	AMPLIACION	339.97	2.78	M2	945.12	
CUARTO PISO	1	SECTOR DE HABITACIONES	HABITACIONES	506.62	2.78	M2	1408.40	
			BAÑOS			M2		
	2	HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS	UMI Y COGNACION	287.19	2.78	M2	798.40	

OBSERVACIONES:

TOTAL	8,099.70	Metro Cuadrado


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	ITEM	1.05

Registro fotográfico

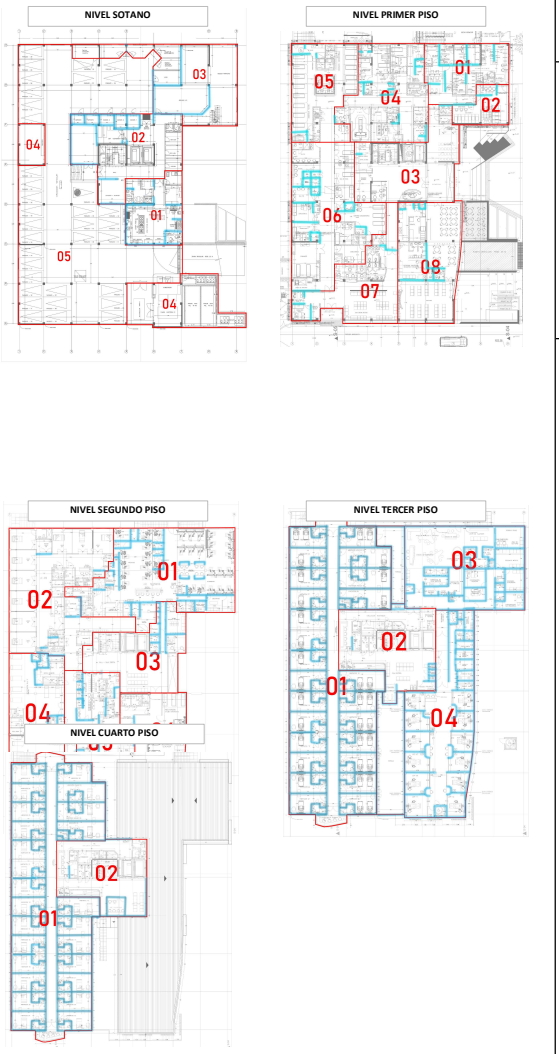

	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

				Dimensiones				
NIVEL	COD	ZONA	ESPACIO	LONGITUD (M)	ALTO (M)	UNIDAD	AREA	Observaciones
SOTANO	1	AREA DE COCINA Y ADM	COCINA LAVADO ALMACEN DEPOSITOS	113.23	3.10	M2	351.00	
	2	SERVICIOS Y DEPOSITOS	ASEO BASURAS DEP CADAVERES AREA POLIVALENTE	147.10	3.10	M2	456.00	
PRIMER PISO	1	AREA DE LABORATORIOS	LABORATORIOS NEVERAS LABORATORIOS ADM LABORATORIOS MUESTRAS Y TOMA MUESTRAS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES DEPOSITOS /ASEO/LAVADO	141.75	3.18	M2	450.75	
	2	AREA DE FARMACIA	AREA ESTANTERIA FARMACIA ADM FARMACIA BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	133.1603774	3.18	M2	423.45	
	4	AREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	ECOGRAFO CONSULTORIO ECOGRAFO CARDEOLOGIA CONSULTORIO CARDEOLOGIA RAYOS X T.A.C BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	185.3207547	3.18	M2	589.32	
	5	AREA DE OBSERVACIÓN	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA OBSERVACION PEDIATRIA CENTRAL ENFERMERIA CUBICULO AISLAMIENTO DIR URGENCIA BAÑOS DEPOSITOS /ASEO/LAVADO PASILLOS Y CIRCULACIONES	161.3144654	3.18	M2	512.98	
	7	AREA DE URGENCIAS	CONSULTORIOS TRIAGE ZONA DE CAMILLAS SALA DE ESPERA BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	87.59748428	3.18	M2	278.56	
SEGUNDO PISO	1	UCI NEONATAL	INTENSIVOS E INTERMEDIOS AREA DE DESCANSO INSUMOS / DEPOSITOS / ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	224.01	3.18	M2	712.34	
	2	UCI A.R.O	CUARTOS A.R.O INSUMOS / DEPOSITOS / FILTROS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	211.99	3.18	M2	674.12	
	4	AREA DE PARTOS	TRABAJO DE PARTOS RECUPERACION VESTIERES /ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	104.26	3.18	M2	331.56	
	5	AREA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE FARMACIA	ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN VESTIERES / DEPOSITOS / ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	123.34	3.18	M2	392.23	
	6	AREA DE RECUPERACION QUIRURGICA	AREA RECUPERACION AUSTADO PACIENTES BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	79.14	3.18	M2	251.67	
	7	AREA DE PROCEDIMIENTOS	SALAS DE PARTOS QUIROFANOS EQUIPOS Y DEPOSITOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	185.35	3.18	M2	589.41	

OBSERVACIONES:

		TOTAL	6,013.39 Metro Cuadrado


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	ITEM	1.06


Registro fotográfico




FACHADA OCCIDENTAL



FACHADA ORIENTAL



FACHADA NORTE



FACHADA SUR

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones				
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	m2	Observaciones
FACHADA OCCIDENTAL					
60.90	-	11.90	1.00	724.71	Fachada occidental
-	1.27	1.30	6.00	9.91	Descuento ventanas primer nivel fachada occidental
-	2.65	2.50	1.00	6.63	
-	1.30	1.30	1.00	1.69	
-	0.95	0.95	1.00	0.90	
-	3.01	2.40	3.00	21.67	
-	3.03	2.40	1.00	7.27	
-	3.00	2.40	1.00	7.20	
-	3.06	2.40	1.00	7.34	
-	6.45	5.95	1.00	38.38	Descuento puerta vidrira principal fachada occidental nivel 1
-	3.06	2.40	1.00	7.34	Descuento puerta vidriera fachada occidental nivel 1
-	1.30	1.28	1.00	1.66	Descuento ventaneria segundo nivel
-	1.30	1.29	1.00	1.68	
-	1.40	1.29	1.00	1.81	
-	1.00	0.70	1.00	0.70	
-	1.04	1.29	1.00	1.34	
-	0.94	1.28	1.00	1.20	
-	1.30	1.28	1.00	1.66	
-	1.89	1.27	1.00	2.40	
-	0.98	0.95	1.00	0.93	
-	2.87	0.69	1.00	1.98	
-	3.04	0.69	1.00	2.10	
-	1.16	0.69	1.00	0.80	
-	1.33	0.68	1.00	0.90	
-	3.25	0.68	1.00	2.21	
-	3.06	0.68	1.00	2.08	
-	3.04	0.68	1.00	2.07	
-	3.10	0.68	1.00	2.11	
-	2.50	0.68	1.00	1.70	
-	3.34	1.35	1.00	4.51	Descuento ventaneria tercer nivel
-	2.55	2.24	1.00	5.71	
-	3.02	2.24	1.00	6.76	
-	1.30	1.35	1.00	1.76	
-	1.90	1.35	1.00	2.57	
-	0.80	0.70	6.00	3.36	
-	0.71	0.68	1.00	0.48	
-	1.16	0.68	1.00	0.79	
-	3.05	0.70	5.00	10.68	
-	1.00	0.99	1.00	0.99	
	0.50	2.40	7.00	8.40	Descuento por fajas de columna pagadas por ml
	0.40	0.68	4.00	1.09	Descuento por fajas de machones divisorios de mamposteria seoundo nivel
	0.40	0.68	4.00	1.09	Descuento por fajas de machones divisorios de mamposteria tercer nivel
	0.25	1.30	7.00	2.28	Decuento por fajas de ventaneria de segundo y tercer nivel entre ejes F y H
FACHADA NORTE					
5.40	-	11.90	1.00	64.26	Fachada norte entre ejes 5 y 7
19.50	-	14.60	1.00	284.70	Fachada norte entre ejes 1 y 5
8.30	-	1.36	2.00	22.58	Valcones fachada norte
-	3.81	2.38	1.00	9.07	Descuento ventaneria primer nivel fachada norte
-	3.85	2.40	2.00	18.48	
-	1.20	1.75	1.00	2.10	
-	1.20	2.10	2.00	5.04	
-	1.16	1.76	1.00	2.04	
-	1.64	2.40	1.00	3.93	Descuento puerta acceso lateral nivel 1 fachada norte
-	3.52	0.50	2.00	3.52	Descuento ventanas segundo nivel fachada norte
-	3.28	0.50	1.00	1.64	
-	4.07	0.50	1.00	2.04	
-	0.94	0.94	1.00	0.88	Descuento ventanas tercer nivel fachada norte
-	1.24	1.89	1.00	2.34	
-	5.38	1.89	1.00	10.17	
-	1.40	1.89	1.00	2.65	
-	1.24	1.89	1.00	2.34	Descuento ventanas cuarto nivel fachada norte
-	5.38	5.38	1.00	28.94	
-	1.40	1.40	1.00	1.96	
0.60		8.50	1.00	5.10	Descuento por fajas de columna pagadas por ml
FACHADA ORIENTAL					
48.70	-	15.40	1.00	749.98	Fachada oriental
-	0.80	1.50	1.00	1.20	Descuento de ventaneria fachada oriental primer nivel
-	1.50	1.50	1.00	2.25	
-	1.30	1.47	1.00	1.91	
-	1.34	1.50	1.00	2.01	
-	0.95	0.92	1.00	0.87	
-	1.30	0.96	1.00	1.25	
-	1.30	0.95	1.00	1.24	
-	2.45	0.50	1.00	1.23	
-	2.24	0.50	3.00	3.36	Descuento de ventaneria fachada oriental segundo nivel
-	1.30	1.30	8.00	13.52	
-	0.74	0.96	1.00	0.71	
-	1.30	0.81	2.00	2.11	
-	0.94	0.75	1.00	0.71	Descuento de ventaneria fachada oriental tercer nivel
-	0.95	0.45	4.00	1.71	
-	1.30	1.30	10.00	16.90	
	0.95	0.45	4.00	1.71	Descuento de ventaneria fachada oriental Cuarto nivel
	1.30	1.30	10.00	16.90	
	0.60	15.40	3.00	27.72	Descuento por fajas de columnas pagadas por ml
FACHADA SUR					
19.30	-	14.75	1.00	284.68	Fachada sur entre ejes 1 y 5
20.60	-	11.90	1.00	245.14	Fachada sur entre ejes 5 y 9
8.30	-	1.36	2.00	22.58	Valcones fachada sur
-	0.50	0.50	2.00	0.50	Descuento ventaneria primer nivel
-	1.30	1.30	6.00	10.14	
-	1.22	0.55	1.00	0.67	
-	0.91	1.30	1.00	1.18	
-	0.68	1.30	1.00	0.88	
-	0.50	1.30	1.00	0.65	
-	1.02	0.95	1.00	0.97	
	0.48	0.48	1.00	0.23	Descuento ventaneria segundo nivel
	1.20	1.30	1.00	1.56	
	0.98	0.80	1.00	0.78	
	1.30	1.30	1.00	1.69	
	0.92	1.10	1.00	1.01	
	0.90	1.10	1.00	0.99	
	1.30	1.10	2.00	2.86	
	1.30	1.29	1.00	1.68	
	1.30	1.28	1.00	1.66	
	0.93	0.27	1.00	0.25	
	1.90	0.70	2.00	2.66	
	4.28	2.28	1.00	9.76	Descuento ventaneria tercer nivel
	2.28	2.26	1.00	5.15	
	4.80	1.35	1.00	6.48	
	2.00	2.10	1.00	4.20	Descuento puerta Balcon tercer nivel
	2.00	2.10	1.00	4.20	Descuento puerta balcon cuarto nivel
BALCON NORTE					
20.70	-	7.25	1.00	150.08	Fachada oriental balcon norte
20.80	-	4.40	1.00	91.52	Facha occidental balcon norte
-	2.50	0.70	5.00	8.75	Descuento por ventaneria fachada occidental balcon norte
-	1.20	1.18	6.00	8.50	Descuento por ventaneria fachada oriental balcon norte
-	0.87	2.00	1.00	1.74	
-	0.85	2.00	6.00	10.20	Descuento por puertas fachada oriental balcon norte
BALCON SUR					
14.00		7.25	1.00	101.50	Fachada oriental balcon sur
14.00		4.40	1.00	61.60	Facha occidental balcon sur
-	2.00	1.18	1.00	2.36	Descuento por ventaneria balcon sur fachada occidental
-	1.80	1.18	1.00	2.12	
-	1.20	1.19	2.00	2.86	Descuento por ventaneria balcon sur fachada oriental
-	0.74	1.21	1.00	0.90	
CUARTO DE CALDERAS Y CONTROL ELECTRICO					
10.50	-	4.20	1.00	44.10	cuarto de maquinas terraza fachada norte
-	1.20	2.10	1.00	2.52	Descuento puertas cuarto de maquinas terraza fachada norte
-	0.90	2.10	1.00	1.89	
-	0.96	0.96	1.00	0.92	Descuento ventanacuarto de maquinas terraza fachada norte
10.50	-	4.20	1.00	44.10	cuarto de maquinas terraza fachada sur
7.40	-	4.20	1.00	31.08	cuarto de maquinas terraza fachada oriental
7.40	-	4.20	1.00	31.08	cuarto de maquinas terraza fachada oxidental

OBSERVACIONES:


TOTAL	2,463.10	Metro Cuadrado

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	ITEM	1.07
Registro fotográfico			




FACHADA OCCIDENTAL



FACHADA ORIENTAL



FACHADA NORTE



FACHADA SUR

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0,6 M		UNIDAD	Metro Lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones				ML	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
FACHADA OCCIDENTAL					
-	-	2.40	22.00	52.80	Fajas columnas fachada oriental varias caras entre ejes A y F
-	3.01	-	6.00	18.06	Marco superior ventanas fachada oriental entre ejes A y F
-	1.27	1.30	6.00	30.84	Marco ventanas fachada occidental entre ejes F y H
-	2.65	2.50	1.00	10.30	
-	1.30	1.30	1.00	5.20	Marco ventanas fachada occidental entre ejes 7 y 9
-	0.95	0.95	1.00	3.80	
-	1.30	1.28	1.00	5.16	
-	1.30	1.29	1.00	5.18	
-	1.40	1.29	1.00	5.38	
-	1.00	0.70	1.00	3.40	
-	1.04	1.29	1.00	4.66	
-	0.94	1.28	1.00	4.44	
-	1.30	1.28	1.00	5.16	
-	1.89	1.27	1.00	6.32	
-	0.98	0.95	1.00	3.86	Marco ventas segundo nivel fachada occidental
-	2.87	0.69	1.00	7.12	
-	3.04	0.69	1.00	7.46	
-	1.16	0.69	1.00	3.70	
-	1.33	0.68	1.00	4.02	
-	3.25	0.68	1.00	7.86	
-	3.06	0.68	1.00	7.48	
-	3.04	0.68	1.00	7.44	
-	3.10	0.68	1.00	7.56	
-	2.50	0.68	1.00	1.70	
-		0.68	4.00	2.72	Faja de machones divisorios de columnas 1 cara segundo nivel
-	3.34	1.35	1.00	9.38	
-	2.55	2.24	1.00	9.58	
-	3.02	2.24	1.00	10.52	
-	1.30	1.35	1.00	5.30	
-	1.90	1.35	1.00	6.50	Marcos de ventanas de tercer nivel
-	0.80	0.70	6.00	18.00	
-	0.71	0.68	1.00	2.77	
-	1.16	0.68	1.00	3.68	
-	3.05	0.70	5.00	37.50	
-	1.00	0.99	1.00	3.98	
-	-	0.68	4.00	2.72	Faja de machones divisorios de columnas 1 cara tercer nivel
-	-	1.30	7.00	9.10	Fajas de ventanas divisorias
46.61	-	-	7.00	326.27	Dilataciones horizontales tipo 1
14.22	-	-	8.00	113.76	Dilataciones horizontales tipo 2
	-	4.40	23.00	101.20	Dilataciones verticales tipo 1
	-	8.10	8.00	64.80	Dilataciones verticales tipo 2
FACHADA NORTE					
	3.81	2.38	1.00	12.38	
	3.85	2.40	2.00	25.00	Marcos de ventaneria primer nivel entre ejes 1 y 7
	1.20	1.75	1.00	5.90	
	1.20	2.10	2.00	13.20	
	1.16	1.76	1.00	5.84	
		2.40	4.00	9.60	Fajas de columna 1 cara en primer nivel
	1.64	2.40	1.00	8.07	marco puerta acceso lateral nivel 1 fachada norte
	3.52	0.50	2.00	16.08	
	3.28	0.50	1.00	7.56	marco de ventanas segundo nivel fachada norte
	4.07	0.50	1.00	9.14	
	0.94	0.94	1.00	3.76	
	1.24	1.89	1.00	6.26	marco de ventanas tercer nivel fachada norte
	5.38	1.89	1.00	14.54	
	1.40	1.89	1.00	6.58	
	1.24	1.89	1.00	6.26	
	5.38	1.38	1.00	21.52	marco ventanas cuarto nivel fachada norte
	1.40	1.40	1.00	5.60	
14.90	-	-	8.00	119.20	Dilataciones horizontales tipo 1
10.45	-	-	7.00	73.15	Dilataciones horizontales tipo 2
	-	4.40	4.00	17.60	Dilataciones verticales tipo 2
FACHADA ORIENTAL					
	0.80	1.50	1.00	4.60	
	1.50	1.50	1.00	6.00	
	1.30	1.47	1.00	5.54	
	1.34	1.50	1.00	5.68	
	0.95	0.92	1.00	3.74	Marcos de ventaneria fachada oriental primer nivel
	1.30	0.96	1.00	4.52	
	1.30	0.95	1.00	4.50	
	2.45	0.50	1.00	5.90	
	2.24	0.50	3.00	16.44	
	1.30	1.30	8.00	41.60	
	0.74	0.96	1.00	3.40	Marcos de ventaneria fachada oriental segundo nivel
	1.30	0.81	2.00	8.44	
	0.94	0.75	1.00	3.38	
	0.95	0.45	4.00	11.20	Marcos de ventaneria fachada oriental tercer nivel
	1.30	1.30	10.00	52.00	
	0.95	0.45	4.00	11.20	Marcos de ventaneria fachada oriental Cuarto nivel
	1.30	1.30	10.00	52.00	
		14.75	6.00	177.00	2 columnas a 3 cararas
		14.75	2.00	59.00	1 columna a 2 caras
48.70			9.00	438.30	Dilataciones horizontales
FACHADA SUR					
	0.50	0.50	2.00	4.00	
	1.30	1.30	6.00	31.20	
	1.22	0.55	1.00	3.54	
	0.91	1.30	1.00	4.42	Marcos ventaneria primer nivel
	0.68	1.30	1.00	3.96	
	0.50	1.30	1.00	3.60	
	1.02	0.95	1.00	3.94	
	0.48	0.48	1.00	1.92	
	1.20	1.30	1.00	5.00	
	0.98	0.80	1.00	3.56	
	1.30	1.30	1.00	5.20	
	0.92	1.10	1.00	4.04	
	0.90	1.10	1.00	4.00	Marcos ventaneria segundo nivel
	1.30	1.10	2.00	9.60	
	1.30	1.29	1.00	5.18	
	1.30	1.28	1.00	5.16	
	0.93	0.27	1.00	2.39	
	1.90	0.70	2.00	10.40	
	4.28	2.28	1.00	13.12	
	2.28	2.26	1.00	9.08	Marcos ventaneria tercer nivel
	4.80	1.35	1.00	12.30	
	-	7.50	6.00	45.00	2 columnas a 3 caras fachada sur
	-	14.75	6.00	88.50	3 columnas a 2 caras
	-	14.75	2.00	29.50	1 columna a dos caras
20.32	-	-	8.00	162.56	Dilataciones horizontales tipo 1
14.85	-	-	9.00	133.65	Dilataciones horizontales tipo 2
-	-	7.50	2.00	15.00	Dilataciones verticales tipo 1
BALCON NORTE					
	2.50	0.70	5.00	32.00	Marcos de ventaneria fachada occidental balcon norte
	1.20	1.18	6.00	28.56	Marcos de ventaneria fachada oriental balcon norte
	0.87	2.00	1.00	5.74	
	0.85	2.00	6.00	34.20	Marcos por puertas fachada oriental balcon norte
		8.50	3.00	25.50	Faja de 1 columna a 3 caras
21.50			2.00	43.00	Dilataciones horizontales costado occidental
		4.40	12.00	52.80	Dilataciones verticales costado occidental
47.00			4.00	188.00	Dilataciones horizontales costado oriental
		7.25	4.00	29.00	Dilataciones verticales costado oriental
BALCON SUR					
	2.00	1.18	1.00	6.36	Marcos de ventaneria balcon sur fachada occidental
	1.80	1.18	1.00	5.96	
	1.20	1.19	2.00	9.56	Marcos de por ventaneria balcon sur fachada oriental
	0.74	1.21	1.00	3.90	
13.00			2.00	26.00	Dilataciones horizontales costado occidental
		4.40	12.00	52.80	Dilataciones verticales costado occidental
17.45			4.00	69.80	Dilataciones horizontales costado oriental
		7.25	2.00	14.50	Dilataciones verticales costado oriental
				-	

OBSERVACIONES:

			TOTAL	3,495.86	Metro Lineal


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	ITEM	2.01

Registro fotográfico

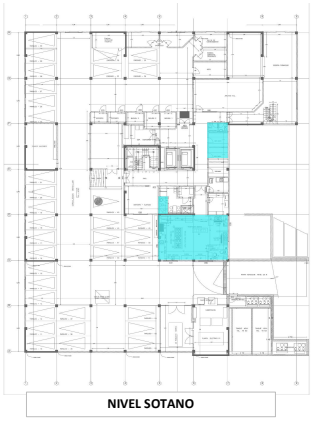

NIVEL SOTANO

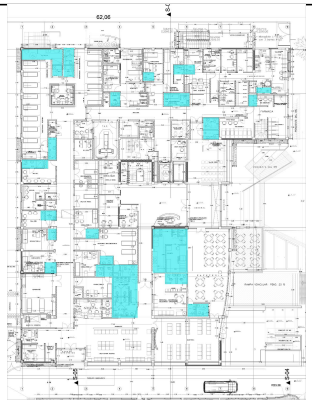

NIVEL PRIMER PISO



NIVEL SEGUNDO PISO



NIVEL TERCER PISO



NIVEL CUARTO PISO

ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Dimensiones							
PISO	AREA	UNIDAD	LONGITUD (M)	ALTO (M)	CANTIDAD	AREA	Observaciones
SOTANO	BAÑOS	M2	12.1	2.1	25.4	128.36	
	ZONAS HUMEDAS	M2	30.3	2.1	63.56		
	SALPICADEROS	M2	18.8	2.1	39.4		
PISO 1	BAÑOS	M2	187.6	2.1	394	568.00	
	ZONAS HUMEDAS	M2	56.7	2.1	119		
	SALPICADEROS	M2	26.2	2.1	55		
PISO 2	BAÑOS	M2	139.5	2.1	293	633.42	
	ZONAS HUMEDAS	M2	145.2	2.1	305		
	SALPICADEROS	M2	16.9	2.1	35.42		
PISO 3	BAÑOS	M2	58.6	2.1	123	323.20	
	ZONAS HUMEDAS	M2	70.5	2.1	148		
	SALPICADEROS	M2	24.9	2.1	52.2		
PISO 4	BAÑOS	M2	0.0	2.1	0	56.00	
	ZONAS HUMEDAS	M2	24.8	2.1	52		
	SALPICADEROS	M2	1.9	2.1	4		

OBSERVACIONES:

TOTAL 1,708.98 Metro Cuadrado

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	ITEM	2.02		REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS"	UNIDAD	Metro Lineal	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Registro fotográfico					Dimensiones				
				NIVEL	COD	ZONA	ESPACIO	UNIDAD	AREA	Observaciones
				SOTANO	1	AREA DE COCINA Y ADM	COCINA LAVADO ALMACEN	ML	25.00	
					2	SERVICIOS Y DEPOSITOS	DEPOSITOS ASEO BASURAS DEP CADAVERES AREA POLIVALENTE	ML		
					3	ARCHIVOS Y BODEGAS	ARCHIVO BODEGAS Y EQUIPO ASEO	ML		
					4	SISTEMAS Y PLANTAS	CUERTO ELECTRICO ESTACION ELECTRICA PLANTA Y MAQUINAS	ML		
					5	PARQUEO	PARQUEO	ML		
				PRIMER PISO	1	AREA DE LABORATORIOS	LABORATORIOS NEVERAS LABONATORIOS ADM LABORATORIOS MUESTRAS Y TOMA MUESTRAS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES DEPOSITOS /ASEO/LAVADO	ML	300.00	
					2	AREA DE FARMACIA	AREA ESTANTERIA FARMACIA ADM FARMACIA BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					3	HALL DE ACCESO Y SERVICIOS DIRECTOS	DESCANSO INTERNOS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					4	AREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	ECOGRAFO CONSULTORIO ECOGRAFO CARDEOLOGIA CONSULTORIO CARDEOLOGIA RAYOS X T.A.C BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					5	AREA DE OBSERVACIÓN	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA OBSERVACION PEDIATRIA CENTRAL ENFERMERIA CUBICULO AISLAMIENTO DIR URGENCIA BAÑOS DEPOSITOS /ASEO/LAVADO PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					6	CONSULTORIOS Y MONITOREO	CONSULTORIOS SALA EDA PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS DIGITACION SALA ERA MONITOREO GINECOBSTETRICIA REANIMACION LAVADO DE PACIENTES DEPOSITOS /ASEO/LAVADO BAÑOS	ML		
					7	AREA DE URGENCIAS	CONSULTORIOS TRIAGE ZONA DE CAMILLAS SALA DE ESPERA BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					8	CAFETERIA Y AUDITORIO	AUDITORIO CAFETERIA COCINETA BAÑOS	ML		
				SEGUNDO PISO	1	UCI NEONATAL	INTENSIVOS E INTERMEDIOS AREA DE DESCANSO INSUMOS / DEPOSITOS / ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML	385.00	
					2	UCI A.R.O	CUARTOS A.R.O INSUMOS / DEPOSITOS / FILTROS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					3	HALL CENTRAL Y COORDINACIÓN	COORDINACION Y PERSONAL DEPOSITOS /INSUMOS BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					4	AREA DE PARTOS	TRABAJO DE PARTOS RECUPERACION VESTIERES /ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					5	AREA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE FARMACIA	ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN VESTIERES / DEPOSITOS / ASEO BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					6	AREA DE RECUPERACION QUIRURJICA	AREA RECUPERACION ALISTADO PACIENTES BAÑOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
					7	AREA DE PROCEDIMIENTOS	SALAS DE PARTOS QUIROFANOS EQUIPOS Y DEPOSITOS PASILLOS Y CIRCULACIONES	ML		
				TERCER PISO	1	HABITACIONES	HABITACIONES	ML	480.00	
					2	HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS	DEPOSITOS / ACCESOS FAMILIARES ORATORIO	ML		
					3	AREA DE AMPLIACIÓN	AMPLIACION	ML		
					4	AREA DE AMPLIACIÓN	AMPLIACION	ML		
				CUARTO PISO	1	SECTOR DE HABITACIONES	HABITACIONES BAÑOS	ML ML	10.00	
					2	HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS	IAMI Y CODINACION	ML		


NIVEL SOTANO



NIVEL PRIMER PISO




NIVEL SEGUNDO PISO

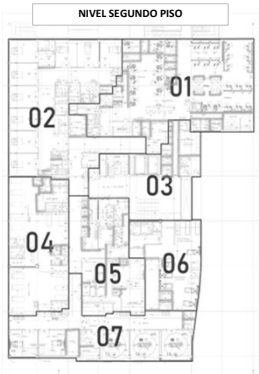

NIVEL TERCER PISO



NIVEL CUARTO PISO

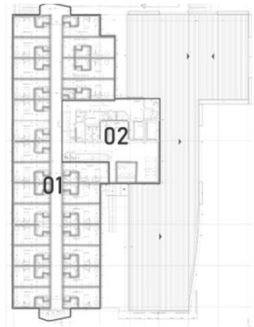

OBSERVACIONES:

TOTAL 1,200.00 Metro Lineal

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	ITEM	2.03


Registro fotográfico



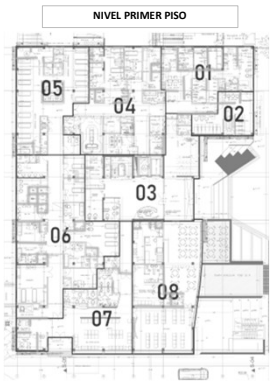

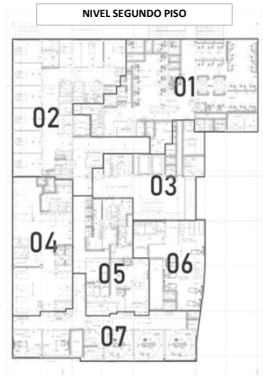



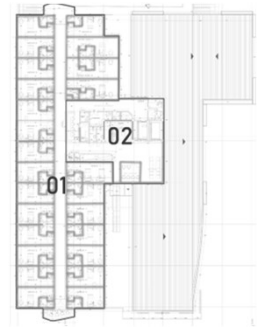

	DILATACION BRONCE	UNIDAD	Metro Lineal	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
		Dimensiones			
NIVEL	COD	ZONA	ESPACIO	UNIDAD	AREA	Observaciones
SOTANO	1	AREA DE COCINA Y ADM	COCINA	ML	15.00	
			LAVADO			
			ALMACEN			
	2	SERVICIOS Y DEPOSITOS	DEPOSITOS	ML		
			ASEO			
			BASURAS			
			DEP CADAVERES			
			AREA POLIVALENTE			
	3	ARCHIVOS Y BODEGAS	ARCHIVO	ML		
			BODEGAS Y EQUIPO			
			ASEO			
	4	SISTEMAS Y PLANTAS	CUERTO ELECTRICO	ML		
			ESTACION ELECTRICA			
			PLANTA Y MAQUINAS			
	5	PARQUEO	PARQUEO	ML		
PRIMER PISO	1	AREA DE LABORATORIOS	LABORATORIOS	ML	210.00	
			NEVERAS LABONATORIOS			
			ADM LABORATORIOS			
			MUESTRAS Y TOMA MUESTRAS			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
			DEPOSITOS /ASEO/LAVADO			
	2	AREA DE FARMACIA	AREA. ESTANTERIA FARMACIA	ML		
			ADM FARMACIA			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	3	HALL DE ACCESO Y SERVICIOS DIRECTOS	DESCANSO INTERNOS	ML		
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	4	AREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	ECOGRAFO	ML		
			CONSULTORIO ECOGRAFO			
			CARDEOLOGIA			
			CONSULTORIO CARDEOLOGIA			
			RAYOS X			
			T.A.C			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	5	AREA DE OBSERVACIÓN	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA	ML		
			OBSERVACION PEDIATRIA			
			CENTRAL ENFERMERIA			
			CUBICULO AISLAMIENTO			
			DIR URGENCIA			
			BAÑOS			
			DEPOSITOS /ASEO/LAVADO			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	6	CONSULTORIOS Y MONITOREO	CONSULTORIOS	ML		
			SALA EDA			
			PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS			
			DIGITACION			
			SALA ERA			
			MONITOREO GINECOBSTETRICIA			
			REANIMACION			
			LAVADO DE PACIENTES			
			DEPOSITOS /ASEO/LAVADO			
			BAÑOS			
	7	AREA DE URGENCIAS	CONSULTORIOS TRIAGE	ML		
			ZONA DE CAMILLAS			
			SALA DE ESPERA			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	8	CAFETERIA Y AUDITORIO	AUDITORIO	ML		
			CAFETERIA			
			COCINETA			
			BAÑOS			
SEGUNDO PISO	1	UCI NEONATAL	INTENSIVOS E INTERMEDIOS	ML	350.00	
			AREA DE DESCANSO			
			INSUMOS / DEPOSITOS / ASEO			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	2	UCI A.R.O	CUARTOS A.R.O	ML		
			INSUMOS / DEPOSITOS / FILTROS			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	3	HALL CENTRAL Y COORDINACIÓN	COORDINACION Y PERSONAL	ML		
			DEPOSITOS /INSUMOS			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	4	AREA DE PARTOS	TRABAJO DE PARTOS	ML		
			RECUPERACION			
			VESTIERES /ASEO			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	5	AREA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE FARMACIA	ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN	ML		
			VESTIERES / DEPOSITOS / ASEO			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	6	AREA DE RECUPERACION QUIRURJICA	AREA RECUPERACION	ML		
			ALISTADO PACIENTES			
			BAÑOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
	7	AREA DE PROCEDIMIENTOS	SALAS DE PARTOS	ML		
			QUIROFANOS			
			EQUIPOS Y DEPOSITOS			
			PASILLOS Y CIRCULACIONES			
TERCER PISO	1	HABITACIONES	HABITACIONES	ML	400.25	
	2	HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS	DEPOSITOS / ACCESOS FAMILIARES	ML		
			ORATORIO	ML		
	3	AREA DE AMPLIACIÓN	AMPLIACION	ML		
	4	AREA DE AMPLIACIÓN	AMPLIACION	ML		
CUARTO PISO	1	SECTOR DE HABITACIONES	HABITACIONES	ML	5.00	
			BAÑOS	ML		
	2	HALL CENTRAL Y SERVICIOS DIRECTOS	IAMI Y CODINACION	ML		

OBSERVACIONES:

		TOTAL	980.25 Metro Lineal

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

3.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	3.01	MORTERO AUTONIVELANTE	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	4.05	4.54	1	18.387		SALA DE PARTOS 1
	0.2	0.2	-1	-0.04		DESCUENTO
	0.35	0.27	-1	-0.0945		
	4.52	4.12	1	18.6224		SALA DE PARTOS 2
	4.62	4.57	1	21.1134		QUIEROFANO 1
	0.85	0.1	-1	-0.085		DESCUENTO
	0.87	0.12	-1	-0.1044		
	4.61	4.57	1	21.0677		QUIEROFANO 2
	0.6	0.1	-1	-0.06		DESCUENTO
	4.54	4.75	1	21.565		QUIEROFANO 3
	0.2	0.65	-1	-0.13		DESCUENTO
	0.82	0.2	-1	-0.164		
				37		PREPARACION PARTO

OBSERVACIONES:

		TOTAL	137.08	Metro Cuadrado

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
3.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico				Dimensiones			Total (m)	Observaciones
				L (m)	A (m)	h (m) Cantidad		
					SOTANO			
				57.6		1	57.6	COCINA Y PASILLO A DEPARTAMENTO DE CADAVERES
				27.3		1	27.3	
				24.79		1	24.79	PASILLO PRINCIPAL INGRESO A ASCENSORES
				6.87		1	6.87	DEPOSITO 1
				7.31		1	7.31	DEPOSITO 2
				8.23		1	8.23	BASURAS 1
				8.81		1	8.81	BASURAS 2
				7.59		1	7.59	BASURAS 3
				10.31		1	10.31	DEPOSITO ALMACEN
				14.97		1	14.97	PASILLO HALL
				10.34		1	10.34	
				0.9		-7	-6.3	DESCUENTO PUERTAS
				TOTAL SOTANO			177.8	
					PISO 1			
				81.07		1	81.07	OBSERVACION PEDIATRIA, TRABAJO SUCIO, TRABAJO LIMPIO, BAÑO DISCAPACITADOS Y BAÑO FAMILIAR.
				24		1	24	CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION PEDIATRIA
				16.12		1	16.12	OBSERVACIÓN GINECOPSTETRICIA
				56.89		1	56.89	PROCEDIMIENTOS, CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y ADMISIONES
				5.3		1	5.3	CUARTO DE ASEO
				54.74		1	54.74	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA MAMOGRAFO Y ECOGRAFO
				11.93		1	11.93	PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
				60.91		1	60.91	LABORATORIO, TOMA DE MUESTRAS, VESTIER Y ÁREA ADMINISTRATIVA
				82.83		1	82.83	LABORATORIO NEVERA, TRANSFUNCIONAL, EQUIPOS Y DEPOSITO
				46.94		1	46.94	FARMACIA ÁREA ADMINSITRATIVA Y ESTANTERIA
				37.87		1	37.87	SALA ESPERA, CONTROL IMAGENOLOGIA Y BAÑOS
				27.52		1	27.52	SALA DE LECTURA IMAGENOLOGIA Y COSTADO DERECHO SALA DE ESPERA
				16.29		1	16.29	OFICINA RADIOLOGIA
				31.6		1	31.6	RAYOS X Y PASILLO
				12.07		1	12.07	MAMOGRAFO Y VESTIER
				25.77		1	25.77	TAC
				10.99		1	10.99	DIRECCIÓN URGENCIAS
				9.09		1	9.09	RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS
				23.54		1	23.54	SALA EDA
				23.98		1	23.98	DIGITACIÓN
				10.28		1	10.28	ROPA SUCIA Y EQUIPOS
				13.15		1	13.15	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
				13.1		1	13.1	SALA DE YESOS
				18.96		1	18.96	SALA EDA
				20.24		1	20.24	CONSULTORIO 5
				19.92		1	19.92	CONSULTORIO 2
				35.86		1	35.86	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
				16.11		1	16.11	CONSULTORIO 1
				18.1		1	18.1	CONSULTORIO 4
				21.16		1	21.16	CONSULTORIO 3
				21.56		1	21.56	REANIMACIÓN
				14.02		1	14.02	LAVADO PERO PACIENTES
				34.73		1	34.73	CONSULTORIOS TRIAJE Y CAMILLAS
				19.85		1	19.85	SALA ESPERA ADULTOS COSTADO IZQUIERDO
				9.66		1	9.66	SALA ESPERA ADULTOS COSTADO DERECHO
				20.67		1	20.67	ADMISIONES URGENCIAS
				34.82		1	34.82	BAÑOS SALA DE ESPERA ADULTOS
				37.83		1	37.83	PERSONAL ASISTENCIAL URGENCIAS
				28.4		1	28.4	AUDITORIO
				76.99		1	76.99	CAFETERIA Y COCINETA
				16.58		1	16.58	HALL CENTRAL
				55.46		1	55.46	DESCANSO INTERNO Y CENTRAL DE SONIDO
				5.11		1	5.11	ASEO PASILLO CONSULTORIOS
				40.26		1	40.26	PASILLO CONSULTORIOS
				35.53		1	35.53	PASILLO LABORATORIOS
				25.15		1	25.15	PASILLO DE AUDITORIO A HALL CENTRAL
				TOTAL PISO 1			1323.0	
					PISO 2			
				194.19		1	194.19	UCI ADULTOS.
				113.42		1	113.42	LACTARIO, EXTRACCIÓ, AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL,TRABAJO LIPIO, SUCIO Y BAÑOS.
				63.47		1	63.47	CENTRALES DE ENFERMERIA, ROPA SUCIA, ROPA LIPIA Y BAÑOS DE UCI ADULTOS
				118.07		1	118.07	PREPARACION DE PAETOS Y TRABAJO DE PARTOS INCLUYE BAÑOS
				155.27		1	155.27	PASILLO CENTRAL, PASILLO QUIROFANOS Y ACESO A RECUPERACION QUIERURGIA
				15.23		1	15.23	
				26.32		1	26.32	FARMACIA
				12.88		1	12.88	DESCANSO
				29.22		1	29.22	AUTOCLAVE
				27.08		1	27.08	FILTRO A UCI ADULTOS
				5.02		1	5.02	
				75.23		1	75.23	COORDINACION UCI NEONATAL, VESTIER ASISTENCIA Y BAÑOS CONTIGUOS A UCI NEONATAL
				15.36		1	15.36	
				23.79		1	23.79	HALL
				79.96		1	79.96	RECUPERACIÓN QUIERURGICA Y AMBULATORIA
				77.89		1	77.89	VESTIER MUJERES Y VESTIER HOMBRES
				70.99		1	70.99	UCI NEONATAL CUIDADOS INTENSIVOS

50.85			1	50.85	UCI NEONATAL CUIDADOS INTERMEDIOS
9.18			1	9.18	PASILLO CENTRAL COSTADO DERECHO
43.4			1	43.4	TRABAJO DE PARTO
	TOTAL PISO 2		**1206.8**		
		PISO 3			
131.79			1	131.79	PASILLO PRINCIPAL Y BALCONES
1.2			-25	-30	DESCUENTO PUERTAS
14.27			1	14.27	HORATORIO
78.28			1	78.28	CIRCULACION RESTRINGIDA ENFERMERIA, DESCANSO VESTIER, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJO SUCIO
25.4			1	25.4	SALA DE ESTAR
22.73			1	22.73	HABITACION 302 INCLUYE BAÑO
22.98			1	22.98	HABITACION 301 INCLUYE BAÑO
22.71			1	22.71	HABITACION 307 INCLUYE BAÑO
28.1			1	28.1	HABITACION 308 INCLUYE BAÑO
22.71			1	22.71	HABITACION 310 INCLUYE BAÑO
22.21			1	22.21	HABITACION 311 INCLUYE BAÑO
22.64			1	22.64	HABITACION 316 INCLUYE BAÑO
22.21			1	22.21	HABITACION 318 INCLUYE BAÑO
23.06			1	23.06	HABITACION 325 INCLUYE BAÑO
22.42			1	22.42	HABITACION 324 INCLUYE BAÑO
26.71			1	26.71	PERIMETRO LUDOTECA
27.4			1	27.4	ESTAR TELEVISIONN Y TERRAZA LUDOTECA
44.46			1	44.46	BAÑOS Y CUARTO DE ASEO LUDOTECA
16.46			1	16.46	EXTRACCION DE LECHE MATERNA
28.16			1	28.16	DEPOSITO DE INSUMOS Y PREPARACION DE FORMULAS
8.23			1	8.23	CUARTO DE ASEO PASILLO
16.18			1	16.18	INFORMACION FAMILIARES
12.48			1	12.48	COORDINACION PEDIATRIA
19.23			1	19.23	DESCANSO MEDICO Y TRAMO PASILLO
17.52			1	17.52	DESCANSO DE ENFERMERIA Y ESTACIÓN DE CAFÉ
13.57			1	13.57	BAÑOS DESCANSO
15.05			1	15.05	COORDINACIÓN UCI PEDIATRIA
6.3			1	6.3	PASILLO LATERAL A CORRDINACION
78.2			1	78.2	ACCESO ASITENCIAL, BAÑOS, ROPA LIMPIA, CUARTO ESTERIL, EQUIPOS, TRABAJO SUCIO Y TRABAJO LIMPIO
6.99			1	6.99	RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
97.63			1	97.63	UCI PEDIATRICA COSTADO OCCIDENTAL
80.08			1	80.08	UCI PEDIATRICA COSTADO ORIENTAL
	TOTAL PISO 3		**966.2**		
		PISO 4			
131.49			1	131.49	PASILLO PRINCIPAL Y BALCONES
1.2			-25	-30	DESCUENTO PUERTAS
81.83			1	81.83	CIRCULACION RESTRINGIDA ENFERMERIA, DESCANSO VESTIER, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJO SUCIO
21.07			1	21.07	HALL
22.73			1	22.73	HABITACION 402 INCLUYE BAÑO
22.01			1	22.01	HABITACION 401 INCLUYE BAÑO
22.71			1	22.71	HABITACION 407 INCLUYE BAÑO
28.1			1	28.1	HABITACION 408 INCLUYE BAÑO
22.71			1	22.71	HABITACION 410 INCLUYE BAÑO
22.21			1	22.21	HABITACION 411 INCLUYE BAÑO
22.64			1	22.64	HABITACION 416 INCLUYE BAÑO
22.21			1	22.21	HABITACION 418 INCLUYE BAÑO
23.06			1	23.06	HABITACION 425 INCLUYE BAÑO
22.42			1	22.42	HABITACION 424 INCLUYE BAÑO
	TOTAL PISO 4		**435.2**		

OBSERVACIONES:

TOTAL **4,108.94** **Metro lineal**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS	ITEM	3.03	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE)	UNIDAD	Metro Lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones					AREA TOTAL (ML)	Observaciones
PISO	DIMESION	LONGITUD	UNIDAD	CANTIDAD		
PRIMER NIVEL		0.8	ML	18	14.40	
		0.9	ML	22	19.80	
		1	ML	31	31.00	
		1.2	ML	18	21.60	
		2	ML	19	38.00	
SEGUNDO NIVEL		0.8	ML	15	12.00	
		0.9	ML	18	16.20	
		1	ML	33	33.00	
		1.2	ML	25	30.00	
		2	ML	12	24.00	
TERCER NIVEL		0.8	ML	15	12.00	
		0.9	ML	12	10.80	
		1	ML	16	16.00	
		1.2	ML	20	24.00	
		2	ML	10	20.00	
CUARTO NIVEL		0.8	ML	0	0.00	
		0.9	ML	2	1.80	
		1	ML	7	7.00	
		1.2	ML	9	10.80	
		2.5	ML	2	4.91	
				TOTAL	347.31	Metro Lineal

OBSERVACIONES:

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ								
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS	ITEM	3.04	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO		UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico				MEDIDAS				TOTAL	Observaciones
				Long.	Ancho	Cantidad	Area		
				SOTANO					
				6.96	9.98	1	69.4608	69.46	COCINA
				2.6	4.34	1	11.284	11.28	CONSULTORIO DIETAS
				1.74	2.02	1	3.5148	3.51	SALA DE ESTAR
				1.83	1	1	1.83	1.83	
				4.2	1.6	1	6.72	6.72	PASILLO SALA DE ESTAR
				2.1	0.4	1	0.84	0.84	
				4.39	1.81	1	7.9459	7.95	PASILLO CONSULTORIO DIETAS
				12.34	2.34	1	28.8756	28.88	
				2.17	2.21	1	4.7957	4.80	PASILLO ASCENSORES
				1.26	0.45	1	0.567	0.57	
				2.2	1.08	1	2.376	2.38	CUARTO BAJO ESCALERAS
				4.07	4.84	1	19.6988	19.70	DEPOSITO ALMACEN
				0.8	0.15	1	0.12	0.12	BOCA PUERTA DEPOSITO
				3.88	1.8	1	6.984	6.98	PASILLO ROPA LIMPIA
				2.45	6.74	1	16.513	16.51	
				0.84	1.47	1	1.2348	1.23	PASILLO DEPOSITO DE CADAVERES
				1.37	2.14	1	2.9318	2.93	
				2.75	2.12	1	5.83	5.83	PASILLO IGRESO ARCHIVO
				2.88	1.55	1	4.464	4.46	
				3.94	9.85	1	38.809	38.81	ARCHIVO
				7.98	5.04	1	40.2192	40.22	
				10	1.76	1	17.6	17.60	
				11.98	5.04	1	60.3792	60.38	BODEGA FARMACIA
				1.6	1.62	1	1.296	1.30	
				4.83	2.49	1	12.0267	12.03	CUARTO ASEO
				1.6	2.6	1	4.16	4.16	DEPOSITO 1
				1.62	2.4	1	3.888	3.89	DEPOSITO 2
				7.2	5.52	1	39.744	39.74	LAVANDERIA
				PISO 1					
				7.03	2.36	1	16.5908	16.59	LABORATORIO
				2	0.15	1	0.3	0.30	LABORATORIO
				5.88	2.36	1	13.8768	13.88	LABORATORIO
				1.65	1.1	1	1.815	1.82	LABORATORIO
				0.8	0.15	1	0.12	0.12	LABORATORIO
				3.48	2.19	1	7.6212	7.62	LABORATORIO
				3.9	1.62	1	6.318	6.32	LABORATORIO
				3.59	2.19	1	7.8621	7.86	LABORATORIO
				3.89	2.32	1	9.0248	9.02	LABORATORIO
				6.79	1.19	1	8.0801	8.08	PASILLO LABORATORIO
				4.06	1.21	1	4.9126	4.91	PASILLO LABORATORIO
				3.66	2.54	1	9.2964	9.30	RECEPCION MUESTRAS
				3.62	1.08	1	3.9096	3.91	TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
				1.62	2.44	1	3.9528	3.95	TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
				3.76	3.01	1	11.3176	11.32	TOMA MUESTRA
				2.9	1.89	1	5.481	5.48	RECIBO Y TOMA MUESTRAS
				4.96	3.06	1	15.1776	15.18	FARMACIA
				1.92	1.79	1	3.4368	3.44	FARMACIA
				6.94	4.89	1	33.9366	33.94	FARMACIA
				1.63	2.22	1	3.6186	3.62	ADMINISTRATIVA
				15.73	2	1	31.46	31.46	PASILLO
				4.27	1.6	1	6.832	6.83	PASILLO
				2.42	1.91	1	4.6222	4.62	SALA PROCEDIMIENTOS
				2.8	2.67	1	7.476	7.48	SALA LECTURA
				6.75	2.91	1	19.6425	19.64	ECOGRAFO
				5.17	2.93	1	15.1481	15.15	CONSULTORIO ECOGRAFO
				3.73	2.16	1	8.0568	8.06	ESPERA
				1.57	0.46	1	0.7222	0.72	ESPERA
				3.26	2.68	1	8.7368	8.74	OFICINA RADIOLOGIA
				5.28	3.39	1	17.8992	17.90	RAYOS X
				1.43	2.02	1	2.8886	2.89	DISPARO
				4.91	2.41	1	11.8331	11.83	PASILLO RX
				1.53	1.88	1	2.8764	2.88	PASILLO RX
				2.03	0.88	1	1.7864	1.79	VESTIER
				2.36	2.76	1	6.5136	6.51	MAMOGRAFO
				5.08	3.14	1	15.9512	15.95	PROCEDIMIENTOS
				3.43	3.6	1	12.348	12.35	ADMISIONES
				1.98	0.51	1	1.0098	1.01	ADMISIONES
				4.06	2.5	1	10.15	10.15	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
				5.86	3.4	1	19.924	19.92	T.A.C
				2.83	2.61	1	7.3863	7.39	DISPARO
				4.76	4.72	1	22.4672	22.47	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
				4.22	3.99	1	16.8378	16.84	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
				3	2.86	1	8.58	8.58	CENTRAL ENFERMERA
				5.12	2	1	10.24	10.24	PASILLO
				3.16	1.42	1	4.4872	4.49	PASILLO
				15.24	3.78	1	57.6072	57.61	OBSERVACION PEDIATRICA
				32.04	2.56	1	82.0224	82.02	PASILLO EMERGENCIA
				1.34	1.08	1	1.4472	1.45	RESIDUOS ORDINARIOS
				1	1.13	1	1.13	1.13	RESIDUOS PELIGROSOS
				2.68	3.06	1	8.2008	8.20	DIRECCION URGENCIAS
				3.5	1.75	1	6.125	6.13	SALA ERA
				3.23	2.24	1	7.2352	7.24	SALA ERA
				3.55	3.52	1	12.496	12.50	PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
				1.19	5.25	1	6.2475	6.25	DIGITACION
				2.65	1.99	1	5.2735	5.27	DIGITACION
				1.42	1.31	1	1.8602	1.86	INSUMOS FARMACIA
				1.43	0.43	1	0.6149	0.61	EQUIPOS
				3.49	4.33	1	15.1117	15.11	SALA YESOS
				2.65	3.46	1	9.169	9.17	SALA ERA
				1.85	1.16	1	2.146	2.15	SALA ERA
				3.77	1.84	1	6.9368	6.94	CONSULTORIO 5
				2.08	2.27	1	4.7216	4.72	CONSULTORIO 5
				3.85	1.74	1	6.699	6.70	MONITOREO GINECOBSTETRICIA
				5.58	5.48	1	30.5784	30.58	MONITOREO GINECOBSTETRICIA
				5.09	1.52	1	7.7368	7.74	CONSULTORIO 2
				3.67	1.72	1	6.3124	6.31	CONSULTORIO 2
				4.98	1.6	1	7.968	7.97	CONSULTORIO 1
				3.28	1.92	1	6.2976	6.30	CONSULTORIO 1
				3.93	1.64	1	6.4452	6.45	CONSULTORIO 4
				5.74	3.17	1	18.1958	18.20	CONSULTORIO 3
				6.16	5.06	1	31.1696	31.17	REANIMACION
				1.16	0.3	1	0.348	0.35	REANIMACION
				5.81	2.91	1	16.9071	16.91	ADMISIONES URGENCIAS
				0.88	1.5	1	1.32	1.32	ACCESO LAVADO PACIENTES
				2.26	2.09	1	4.7234	4.72	CONSULTORIO TRIAGE 2
				2.76	3.33	1	9.1908	9.19	CONSULTORIO TRIAGE 1
				2.93	1.48	1	4.3364	4.34	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
				2.05	2.81	1	5.7605	5.76	PASILLO TRIAGE
				2.93	1.8	1	5.274	5.27	CUARTO EQUIPOS
				2.95	3.25	1	9.5875	9.59	CENTRAL DE CABLEADO
				0.93	2.22	1	2.0646	2.06	RACK
				5.13	2.76	1	14.1588	14.16	DESCANSO INTERNOS
				1.39	0.34	1	0.4726	0.47	DESCANSO INTERNOS
				3.63	2.65	1	9.6195	9.62	FACTURACION Y ADMISIONES
				2.55	3	1	7.65	7.65	HALL
				12.37	6.43	1	79.5391	79.54	HALL
				4.54	5.81	1	26.3774	26.38	SALA DE ESPERA
				1.81	4.63	1	8.3803	8.38	PASILLO
				3.68	1.15	1	4.232	4.23	ADMISIONES
				6.45	1.6	1	10.32	10.32	ACCESO PRINCIPAL
				11.6	6.34	1	73.544	73.54	CAFETERIA
				2.26	2.15	1	4.859	4.86	CAFETERIA
				2.98	4.24	1	12.6352	12.64	CAFETERIA
				4.9	2.55	1	12.495	12.50	CAFETERIA
				4.4	1.67	1	7.348	7.35	CAFETERIA
				6.44	5.11	1	32.9084	32.91	SALA DE ESTAR
				9.97	7.15	1	71.2855	71.29	AUDITORIO
				12.39	1.91	1	23.6649	23.66	PASILLOS
				2.21	1.91	1	4.2211	4.22	PASILLOS
				9.84	6.7	1	65.928	65.93	SALA ESPERA ADULTOS
				4.32	2.63	1	11.3616	11.36	SALA ESPERA ADULTOS
				1.12	1.7	1	1.904	1.90	SALA ESPERA ADULTOS
				2.23	4.12	1	9.1876	9.19	ACCESO EMERGENCIAS
				3.83	1.1	1	4.213	4.21	ACCESO A BAÑOS
				1.1	0.95	1	1.045	1.05	CUARTO EN MONITOREO GINECOBSTETRICIA
				1.6	0.52	2	1.664	1.66	ACCESO ASCENSOR
				PISO 2					
				4.69	2	1	9.38	9.38	PASILLO INGRESO NEONATAL
				2.34	3.1	1	7.254	7.25	TRABAJOS ESTERIL
				2.52	1.93	1	4.8636	4.86	FILTRO VISITANTES
				10.36	2.2	1	22.792	22.79	PASILLO ASCENSOR
				2.31	3.4	1	7.854	7.85	LACTARIO
				1.6	1.3	1	2.08	2.08	BODEGA LACTARIO
				2.76	3.23	1	8.9148	8.91	ESTRACCION
				25	1.98	1	49.5	49.50	PASILLO PUERTA QUIROFANOS
				2.17	2.42	1	5.2514	5.25	
				15.33	2.69	1	41.2377	41.24	PASILLO UCI ADULTOS
				2.78	1.95	1	5.421	5.42	
				9.25	2.28	1	21.09	21.09	
				19.79	4.68	1	92.6172	92.62	UCI ADULTOS
				9.81	4	1	39.24	39.24	UCI ADULTOS FONDO
				2.02	3.03	1	6.1206	6.12	CENTRAL ENFERMERIA UCI
				2.74	1.1	1	3.014	3.01	FILTRO ACCESO FAMILIA
				2.14	1.11	1	2.3754	2.38	INFORMACION FAMILARES




SOTANO



PRIMER PISO

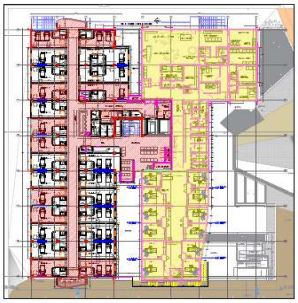


TERCER PISO

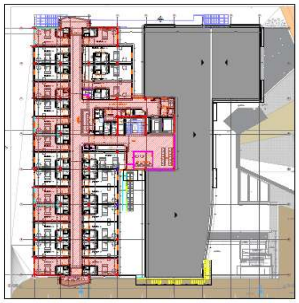

CUARTO PISO



SEGUNDO PISO

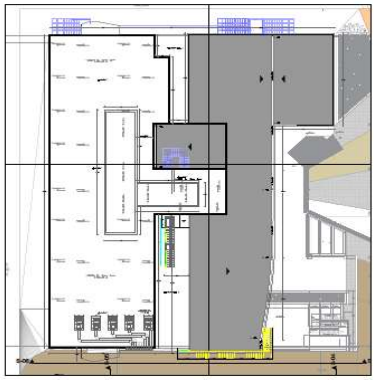

QUINTO PISO

QUINTO PISO

3.05	1.155	1	3.52275	3.52	CENTRAL ENFERMERIA 2
1.34	1.44	1	1.9296	1.93	DEPOSITO DE INSUMOS
1.18	2	1	2.36	2.36	EQUIPOS
0.77	1.13	1	0.8701	0.87	RACK
2.75	2.27	1	6.2425	6.24	DESCANSO
1.29	1.56	1	2.0124	2.01	RECEPCIÓN
1.71	1.31	1	2.2401	2.24	RACK
2.68	1.27	1	3.4036	3.40	PASILLO ACCESO
2.94	0.8	1	2.352	2.35	FILTRO PERSONAL
1.63	2.74	1	4.4662	4.47	
5.38	2.41	1	12.9658	12.97	VESTIER PASILLO
1.43	2.28	1	3.2604	3.26	VESTIER
13.66	9.62	1	131.4092	131.41	RECUPERACION PARTOS
4.3	2.38	1	10.234	10.23	CENTRAL DE ENFERMERIA
28.21	2	1	56.42	56.42	PASILLO QUIEROFANOS
0.25	2.42	1	0.605	0.61	
10.89	2.17	1	23.6313	23.63	PASILLO AUTOCLAVE
3.9	2.05	1	7.995	8.00	EQUIPOS
2.43	2.97	1	7.2171	7.22	DESCANSO
2.21	3.61	1	7.9781	7.98	DESCANSO
5	1.76	1	8.8	8.80	FARMACIA
1.17	1.8	1	2.106	2.11	BODEGA
0.8	0.2	1	0.16	0.16	
5.17	1	1	5.17	5.17	
5.65	0.92	1	5.198	5.20	PASILLO FARMACIA
2.56	1.16	1	2.9696	2.97	
3.5	3.72	1	13.02	13.02	DESCANSO
3.86	1.1	1	4.246	4.25	PASILLO DESCANSO
8.02	2.38	1	19.0876	19.09	VESTIER MUJERES
1.19	0.9	1	1.071	1.07	
2.45	2.64	1	6.468	6.47	VESTIER HOMBRES
1.21	0.35	1	0.4235	0.42	
4.32	2.14	1	9.2448	9.24	
5.02	8.53	1	42.8206	42.82	AUTOCLAVE
0.78	0.74	1	0.5772	0.58	
3.55	2.39	1	8.4845	8.48	
2.76	1.39	1	3.8364	3.84	RECUPERACION PACIENTES
0.34	1.24	1	0.4216	0.42	
5.86	2	1	11.72	11.72	PASILLO AUTOCLAVE
1.59	2	1	3.18	3.18	
4.07	5.86	1	23.8502	23.85	PREPARACIO CIRUGIA
6.56	4.67	1	30.6352	30.64	RECUPERACION QUIRURGICA
4.11	6	1	24.66	24.66	
1.44	1.5	1	2.16	2.16	BODEGA
6.55	8.92	1	58.426	58.43	HALL
3.05	6.29	1	19.1845	19.18	
1.23	1.33	1	1.6359	1.64	HALL
4.59	0.91	1	4.1769	4.18	INGRESO AUTOCLAVE POR HALL
1.82	1.73	1	3.1486	3.15	INSUMOS
8.8	0.9	1	7.92	7.92	PASILLO
3	3.23	1	9.69	9.69	COORDINACION UCI NEONATAL
3.37	3.59	1	12.0983	12.10	VESTIER PERSONAL ASISTENCIA
1.75	1.72	1	3.01	3.01	INSUMOS TERAPIA
2.78	4.85	1	13.483	13.48	DESCANSO
		PISO 3			
4.57	2.13	1	9.7341	9.73	ORATORIO
9	6.61	1	59.49	59.49	HALL ORATORIO
7.43	2	1	14.86	14.86	PASILLO INGRESO
13.54	1.8	1	24.372	24.37	
2.24	1.68	1	3.7632	3.76	PASILLO SCIRCULACIÓN RESTRINGIDA
0.8	0.9	0.5	0.36	0.36	
4.3	0.3	1	1.29	1.29	
2.5	3.52	1	8.8	8.80	DESCANSO VESTIER
2.14	0.92	1	1.9688	1.97	DEPOSITO INSUMOS
2.25	2.39	1	5.3775	5.38	PROCEDIMIENTOS
1.43	1.23	1	1.7589	1.76	
4.7	2.07	1	9.729	9.73	CENTRAL DE ENFERMERIA
47.44	1.99	1	94.4056	94.41	PASILLO PRINCIPAL
3.46	3.27	1	11.3142	11.31	HABITACIÓN 301
2.61	1.65	1	4.3065	4.31	
3.32	3.29	1	10.9228	10.92	
0.84	0.3	1	0.252	0.25	HABITACÓN 302
2.65	1.65	1	4.3725	4.37	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 303
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
1.85	3.3	1	6.105	6.11	
2.75	1.35	1	3.7125	3.71	HABITACIÓN 304
4	3.3	1	13.2	13.20	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 305
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
1.85	3.3	1	6.105	6.11	
2.75	1.35	1	3.7125	3.71	HABITACIÓN 306
4	3.3	1	13.2	13.20	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 307
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.4	3.84	1	13.056	13.06	HABITACIÓN 308
4.74	1.57	1	7.4418	7.44	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 309
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
2.41	1.52	1	3.6632	3.66	
3.21	3.41	1	10.9461	10.95	HABITACIÓN 310
0.33	1.65	1	0.5445	0.54	
2.43	1.47	1	3.5721	3.57	
3.51	3.15	1	11.0565	11.06	HABITACIÓN 311
0.33	1.56	1	0.5148	0.51	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 312
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.37	4.97	1	16.7489	16.75	HABITACIÓN 313
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 314
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 315
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.55	1.48	1	3.774	3.77	
3.29	3.28	1	10.7912	10.79	HABITACIÓN 316
0.33	1.58	1	0.5214	0.52	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 317
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.6	1.47	1	3.822	3.82	
3.4	3.05	1	10.37	10.37	HABITACIÓN 318
0.33	1.55	1	0.5115	0.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 319
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 320
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 321
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 322
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 323
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.51	1.56	1	3.9156	3.92	
0.33	1.67	1	0.5511	0.55	HABITACIÓN 324
3.34	3.48	1	11.6232	11.62	
2.5	1.62	1	4.05	4.05	
3.45	3.53	1	12.1785	12.18	HABITACIÓN 325
0.33	1.72	1	0.5676	0.57	
1.2	2	1	2.4	2.40	BALCON NORTE
1.34	5.13	1	6.8742	6.87	
5.13	1.8	1	9.234	9.23	BALCON SUR
1.84	1.2	25	55.2	55.20	BAÑOS HABITACIONES
		PISO 4			
5.15	1.53	1	7.8795	7.88	BALCON SUR
47.37	2	1	94.74	94.74	PASILLO HABITACIONES
2	1.14	1	2.28	2.28	BALCON NORTE
1.62	5.12	1	8.2944	8.29	
3.46	3.27	1	11.3142	11.31	HABITACIÓN 401
2.61	1.65	1	4.3065	4.31	
3.32	3.29	1	10.9228	10.92	
0.84	0.3	1	0.252	0.25	HABITACÓN 402
2.65	1.65	1	4.3725	4.37	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 403
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
1.85	3.3	1	6.105	6.11	
2.75	1.35	1	3.7125	3.71	HABITACIÓN 404
4	3.3	1	13.2	13.20	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 405
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
1.85	3.3	1	6.105	6.11	
2.75	1.35	1	3.7125	3.71	HABITACIÓN 406
4	3.3	1	13.2	13.20	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	

1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 407
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.4	3.84	1	13.056	13.06	HABITACIÓN 408
4.74	1.57	1	7.4418	7.44	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 409
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
2.41	1.52	1	3.6632	3.66	
3.21	3.41	1	10.9461	10.95	HABITACIÓN 410
0.33	1.65	1	0.5445	0.54	
2.43	1.47	1	3.5721	3.57	
3.51	3.15	1	11.0565	11.06	HABITACIÓN 411
0.33	1.56	1	0.5148	0.51	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 412
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.37	4.97	1	16.7489	16.75	HABITACIÓN 413
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 414
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 415
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.55	1.48	1	3.774	3.77	
3.29	3.28	1	10.7912	10.79	HABITACIÓN 416
0.33	1.58	1	0.5214	0.52	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 417
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.6	1.47	1	3.822	3.82	
3.4	3.05	1	10.37	10.37	HABITACIÓN 418
0.33	1.55	1	0.5115	0.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 419
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 420
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 421
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 422
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 423
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.51	1.56	1	3.9156	3.92	
0.33	1.67	1	0.5511	0.55	HABITACIÓN 424
3.34	3.48	1	11.6232	11.62	
2.5	1.62	1	4.05	4.05	
3.45	3.53	1	12.1785	12.18	HABITACIÓN 425
0.33	1.72	1	0.5676	0.57	
13.63	1.78	1	24.2614	24.26	
4.39	0.27	1	1.1853	1.19	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1.49	2.44	1	3.6356	3.64	
0.8	0.8	0.5	0.32	0.32	
3.53	2.5	1	8.825	8.83	DESCANSO Y VESTIER
2.32	2.24	1	5.1968	5.20	PROCEDIMIENTOS
1.48	1.28	1	1.8944	1.89	
4.88	2.1	1	10.248	10.25	CENTRAL DE ENFERMERIA
7.5	2	1	15	15.00	PASILLO INGRESO
8.95	6.77	1	60.5915	60.59	HALL
1.84	1.2	25	55.2	55.20	BAÑOS HABITACIONES

OBSERVACIONES:

TOTAL **4,184.07** **Metro Cuadrado**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS	ITEM	3.05	BANDAS ANTIDESLIZANTES	UNIDAD	Metro Lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones					AREA TOTAL	Observaciones
PISO	UBICACIÓN	Longitud	UNIDAD	CANTIDAD	(ML)	
SOTANO	ESCALERAS	1.25	ML	18	22.50	
PRIMER NIVEL	ESCALERAS	1.25	ML	18	22.50	
SEGUNDO NIVEL	ESCALERAS	1.25	ML	18	22.50	
TERCER NIVEL	ESCALERAS	1.25	ML	18	22.50	
CUARTO NIVEL	ESCALERAS	1.25	ML	18	22.50	
ESCALERAS EXTERNAS		11.25	ML	5	56.25	

OBSERVACIONES:

TOTAL 168.75 Metro Lineal

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS	ITEM	3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO CONDUCTIVO (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC)	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



SEGUNDO PISO

MEDIDAS				TOTAL	Observaciones
Long.	Ancho	Cantidad	Area		
PISO 2					
4.05	4.54	1	18.387	18.39	SALA DE PARTOS 1
0.2	0.2	-1	-0.04	-0.04	DESCUENTO
0.35	0.27	-1	-0.0945	-0.09	
4.52	4.12	1	18.6224	18.62	SALA DE PARTOS 2
4.62	4.57	1	21.1134	21.11	QUIEROFANO 1
0.85	0.1	-1	-0.085	-0.09	DESCUENTO
0.87	0.12	-1	-0.1044	-0.10	
4.61	4.57	1	21.0677	21.07	QUIEROFANO 2
0.6	0.1	-1	-0.06	-0.06	DESCUENTO
4.54	4.75	1	21.565	21.57	QUIEROFANO 3
0.2	0.65	-1	-0.13	-0.13	DESCUENTO
0.82	0.2	-1	-0.164	-0.16	
			37	37.00	PREPARACION PARTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	137.08	Metro Cuadrado

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS	ITEM	3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL MEDIACAÑA CURVO EN PVC	UNIDAD	Metro Lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



TERCER PISO



SEGUNDO PISO

Dimensiones					AREA TOTAL	Observaciones
PISO	UBICACIÓN	Longitud	UNIDAD	CANTIDAD	(ML)	
PRIMER NIVEL	RAYOX Y	23	ML	2	46.00	
	T.A.C.	18.2	ML	2	36.40	
SEGUNDO NIVEL	TRABAJO DE PARTO	31.35	ML	2	62.70	
	U.R.O	125.5	ML	2	251.00	
	UCI NEONATAL	132.7	ML	2	265.40	
TERCER NIVEL	LUDOTECA Y AREA PEDIATRICA	291	ML	2	582.00	
	AREA DE SERVICIOS Y ASISTENCIAL	113	ML	2	226.00	
	UCI P	201.97	ML	2	403.94	
	% para reparaciones	93.77	ML	2	187.54	

OBSERVACIONES:

TOTAL	2,060.98	Metro Lineal

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.01	DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones						VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD			
SOTANO	M2			0			
PISO 1	M2	17.33	1.80	31.2		31.20	
PISO 2	M2	12.67	1.80	22.8		22.80	
PISO 3	M2	10.19	1.80	18.35		18.35	
PISO 4	M2			0			

OBSERVACIONES:

TOTAL 72.35 M2

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


5.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.02	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Metro lineal	25.2		25.20	
PISO 1	Metro lineal	19.95		19.95	
PISO 2	Metro lineal			0.00	
PISO 3	Metro lineal	2.47		2.47	
PISO 4	Metro lineal	2.47		2.47	

OBSERVACIONES:

TOTAL	50.09	Metro lineal


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.03	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA.	UNIDAD	metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

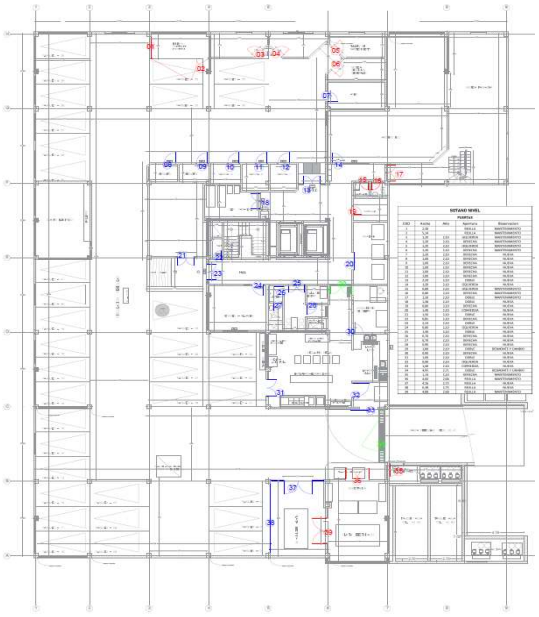



SOTANO NIVEL

PUERTAS


ID	ANCHO	ALTO		VALOR	Observaciones
Dimensiones					


COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
7	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
8	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
9	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
10	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
11	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
12	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
13	2.20	2.10	DOBLE	4.62	NUEVA
14	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	NUEVA
18	1.38	2.10	DOBLE	2.90	NUEVA
19	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
20	1.40	2.10	CORREDIZA	2.94	NUEVA
21	1.50	2.10	DOBLE	3.15	NUEVA
22	0.85	2.10	DERECHA	1.79	NUEVA
23	2.24	2.10	DOBLE	4.70	NUEVA
24	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
25	1.40	2.10	DOBLE	2.94	NUEVA
26	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
27	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
28	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
29	1.80	2.10	DOBLE	3.78	NUEVA
30	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
31	1.60	2.10	DOBLE	3.36	NUEVA
32	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
33	1.40	2.10	CORREDIZA	2.94	NUEVA
34	4.95	2.71	DOBLE	13.41	NUEVA
37	4.16	2.75	REJILLA	11.44	NUEVA
38	6.38	2.75	REJILLA	17.55	NUEVA


PRIMER NIVEL

PUERTAS

COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
1	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
2	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
3	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
4	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
5	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
6	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
7	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
8	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
9	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
10	1.10	2.10	DERECHA	2.31	NUEVA
11	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
12	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
13	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
14	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
15	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
16	0.75	2.10	IZQUIERDA	1.58	NUEVA
17	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
18	0.95	2.10	IZQUIERDA	2.00	NUEVA
19	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	NUEVA
20	1.00	2.10	CORREDIZA	2.10	NUEVA
21	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
22	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
23	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
24	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
25	1.30	2.50	DERECHA	3.25	NUEVA
26	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
27	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
28	1.00	2.10	CORREDIZA	2.10	NUEVA
29	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
33	0.85	2.10	IZQUIERDA	1.79	NUEVA
35	1.30	2.10	CORREDIZA	2.73	NUEVA
36	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA

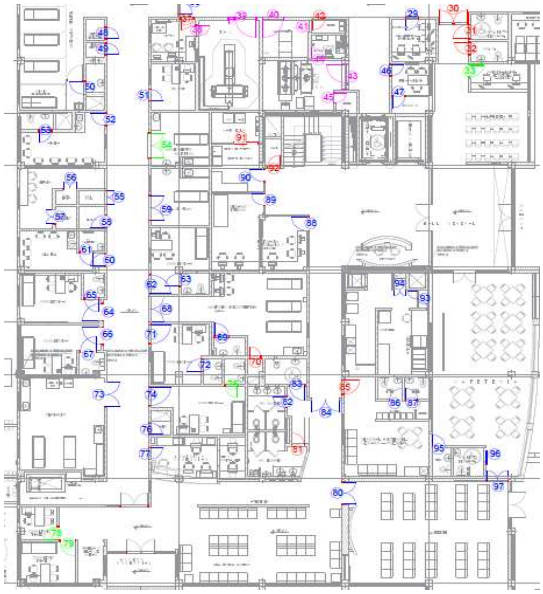



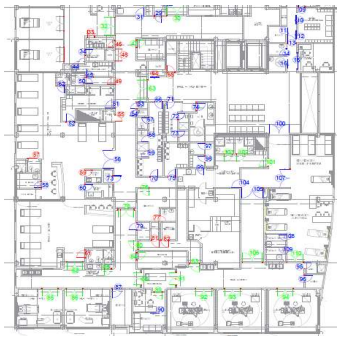


46	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
47	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
48	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
49	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
50	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
51	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
52	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
53	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
54	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
55	0.90	2.10	DOBLE	1.89	NUEVA
56	0.80	2.10	DOBLE	1.68	NUEVA
57	0.90	2.10	DOBLE	1.89	NUEVA
58	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
59	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
60	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
61	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
62	1.30	2.10	DERECHA	2.73	NUEVA
63	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
64	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	NUEVA
65	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
66	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
67	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
68	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
69	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
71	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	NUEVA
72	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
73	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
74	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	NUEVA
76	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
77	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
80	1.70	2.60	DOBLE	4.42	NUEVA
82	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
83	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	NUEVA
84	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
86	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
87	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
88	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
89	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
90	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
93	1.20	2.10	DOBLE	2.52	NUEVA
94	0.75	2.10	DOBLE	1.58	NUEVA
95	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
96	0.90	2.10	CORREDIZA	1.89	NUEVA
97	1.30	2.10	DOBLE	2.73	NUEVA


SEGUNDO NIVEL

PUERTAS


COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
1	0.75	2.10	CORREDIZA	1.58	NUEVA
2	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
3	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
4	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
5	0.75	2.10	DERECHA	1.58	NUEVA
6	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
7	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
8	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	NUEVA
9	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
10	0.80	2.10	CORREDIZA	1.68	NUEVA
11	0.80	2.10	CORREDIZA	1.68	NUEVA
12	0.80	2.10	CORREDIZA	1.68	NUEVA
13	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
14	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
15	1.80	2.10	CORREDIZA	3.78	NUEVA
16	0.90	2.10	CORREDIZA	1.89	NUEVA
17	1.35	2.10	CORREDIZA	2.84	NUEVA
18	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
19	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
20	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
21	1.35	2.10	CORREDIZA	2.84	NUEVA
22	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
24	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
27	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
28	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
29	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
30	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
31	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
32	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
34	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA

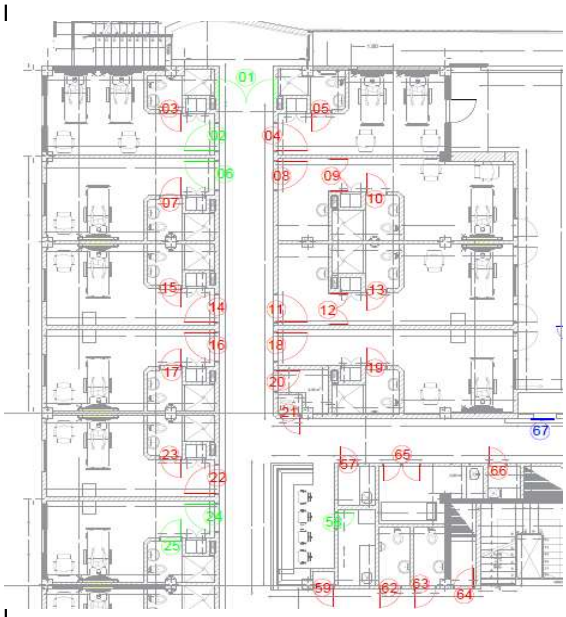

40	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
41	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
43	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
44	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
45	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
47	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	NUEVA
50	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
51	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	NUEVA
52	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
53	0.60	2.10	IZQUIERDA	1.26	NUEVA
54	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
56	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
57	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	NUEVA
58	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
60	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
66	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
67	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
68	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
69	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
70	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
71	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
72	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
73	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
74	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
75	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
76	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
79	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
83	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
84	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
85	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
86	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
87	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
88	1.00	2.10	DERECHA	2.10	NUEVA
89	1.98	2.10	DOBLE	4.16	NUEVA
90	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
91	0.90	2.10	CORREDIZA	1.89	NUEVA
92	1.98	2.10	DOBLE	4.16	NUEVA
93	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
94	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
95	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA
96	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
97	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
98	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
99	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
100	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
101	1.90	2.10	DOBLE	3.99	NUEVA
102	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	NUEVA
103	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
104	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
105	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
106	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
107	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
108	2.00	2.10	DERECHA	4.20	NUEVA
109	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
110	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
111	1.70	2.10	DOBLE	3.57	NUEVA

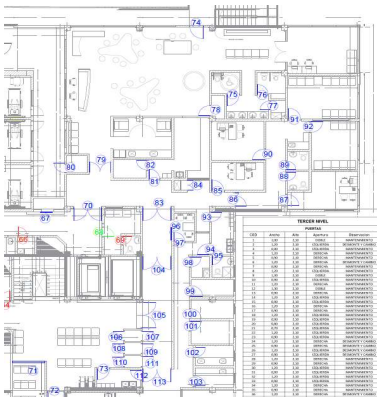

TERCER NIVEL					
PUERTAS					
COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
2	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	NUEVA
6	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
24	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
25	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
26	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	NUEVA
27	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
36	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
37	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
42	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	NUEVA
43	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
54	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	NUEVA
58	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
67	0.80	2.10	CORREDIZA	1.68	NUEVA
68	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
70	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
71	2.17	2.10	CORREDIZA	4.56	NUEVA
72	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
73	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
74	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	NUEVA
75	0.88	2.10	DERECHA	1.85	NUEVA

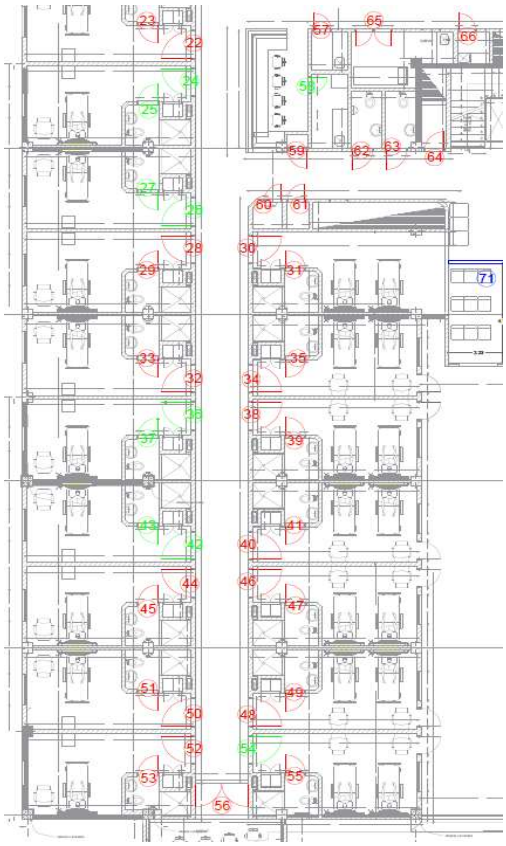

76	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
77	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
78	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
79	1.47	2.10	DOBLE	3.09	NUEVA
80	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
81	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
82	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
83	1.90	2.10	DOBLE	3.99	NUEVA
84	0.75	2.10	DOBLE	1.58	NUEVA
85	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
86	1.30	2.10	DOBLE	2.73	NUEVA
87	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
88	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	NUEVA
89	0.70	2.10	DERECHA	1.47	NUEVA
90	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
91	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
92	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
93	0.82	2.10	IZQUIERDA	1.72	NUEVA
94	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
95	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
96	0.90	2.10	CORREDIZA	1.89	NUEVA
97	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
98	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
99	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
100	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
101	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
102	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
103	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
104	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
105	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
106	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
107	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
108	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
109	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
110	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
111	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
112	0.80	2.10	DERECHA	1.68	NUEVA
113	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
114	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA

CUARTO NIVEL

PUERTAS

COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
1	2.00	2.10	DOBLE	4.20	NUEVA
16	1.20	2.10	DERECHA	2.52	NUEVA
27	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
43	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	NUEVA
58	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	NUEVA
67	0.90	2.10	DERECHA	1.89	NUEVA
69	1	2.1	IZQUIERDA	2.1	NUEVA
70	1.2	2.1	DERECHA	2.52	NUEVA

OBSERVACIONES:


TOTAL	**591.07**	**metro cuadrado**	

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
4.00	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	4.04	VENTANA EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA. NO INCLUYE VIDRIO, ESTE SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

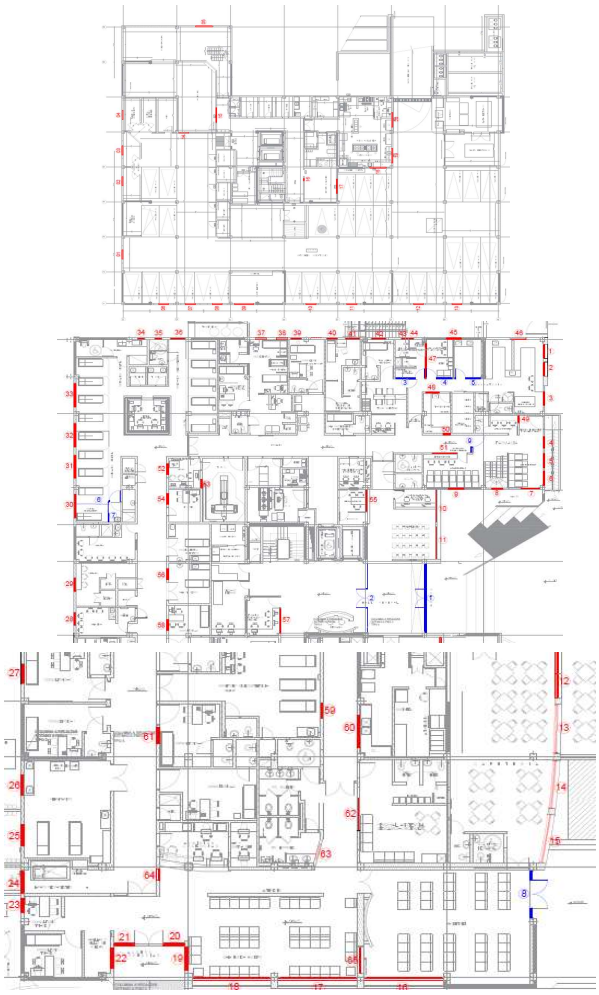

Dimensiones				VALOR	Observaciones
COD	Ancho	Alto	Tipo		

NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	2.7	0.6	Ventana con Rejilla	1.62	Nueva

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
14	1.2	0.4	Fija	0.48	Nueva
15	2	0.4	Fija	0.8	Nueva
17	2	0.4	Fija	0.8	Nueva
18	2	0.4	Fija	0.8	Nueva
19	2	0.4	Fija	0.8	Nueva
20	2	0.4	Fija	0.8	Nueva

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
2	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
3	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
4	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
5	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
6	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
7	2.65	2.5	Fija	6.625	Nueva
8	1.3	1.3	Fija	1.69	Nueva
9	0.95	0.95	Fija	0.9025	Nueva
10	3.01	2.4	Fija	7.224	Nueva
11	3.01	2.4	Fija	7.224	Nueva
12	3.03	2.4	Fija	7.272	Nueva
13	3	2.4	Fija	7.2	Nueva
14	3.01	2.4	Fija	7.224	Nueva
15	3.06	2.4	Fija	7.344	Nueva
16	3.81	2.38	Fija	9.0678	Nueva
17	3.85	2.4	Fija	9.24	Nueva
18	3.85	2.4	Fija	9.24	Nueva
19	1.2	1.75	Fija	2.1	Nueva
20	1.2	2.1	Fija	2.52	Nueva
21	1.2	2.1	Fija	2.52	Nueva
22	1.16	1.76	Fija	2.0416	Nueva
23	0.8	1.5	Fija	1.2	Nueva
24	1.5	1.5	Fija	2.25	Nueva
36	1.22	0.55	Fija	0.671	Nueva
37	1.3	1.3	Batiente	1.69	Nueva
41	1.3	1.3	Fija	1.69	Nueva
43	0.68	1.3	Fija	0.884	Nueva
44	0.5	1.3	Fija	0.65	Nueva
45	1.02	0.95	Fija	0.969	Nueva
46	1.3	1.3	Fija	1.69	Nueva

PRIMER NIVEL


VENTANERIA INTERNA


COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
47	2.74	1.4	Fija	3.836	Nueva
49	0.65	0.5	Fija	0.325	Nueva
50	0.65	1	Fija	0.65	Nueva
51	2.13	1	Batiente	2.13	Nueva
52	1	1.04	Fija	1.04	Nueva
54	0.95	1.04	Fija	0.988	Nueva
55	1.85	1.52	Fija	2.812	Nueva
58	1.41	1	Fija	1.41	Nueva
64	0.7	0.98	Fija	0.686	Nueva
65	1.12	1.72	Fija	1.9264	Nueva


PRIMER NIVEL


PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	6.45	5.96	Puerta Ventana	38.442	Nueva
2	6.45	2.72	Puerta Ventana	17.544	Nueva
3	2.54	2.6	Puerta Ventana	6.604	Nueva
4	2.29	2.6	Puerta Ventana	5.954	Nueva
5	2.17	2.6	Puerta Ventana	5.642	Nueva
6	3.8	1.95	Puerta Ventana	7.41	Nueva
7	2.1	1.95	Puerta Ventana	4.095	Nueva
8	3.06	2.4	Puerta Ventana	7.344	Nueva
9	1.59	2.6	Puerta Ventana	4.134	Nueva

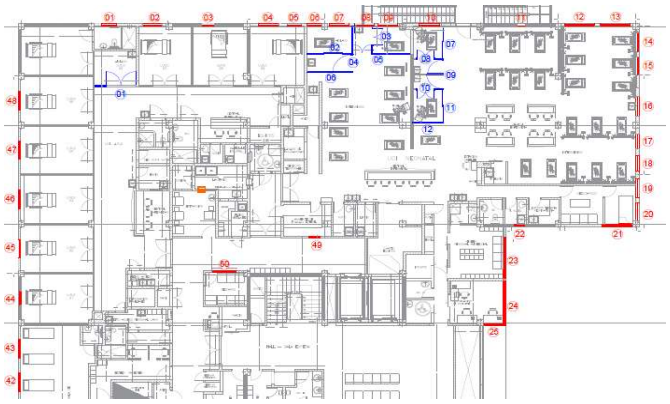

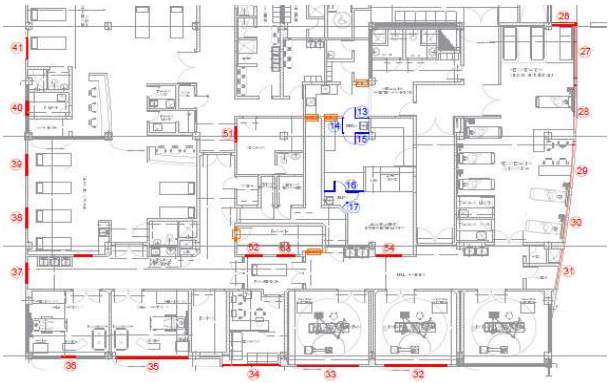

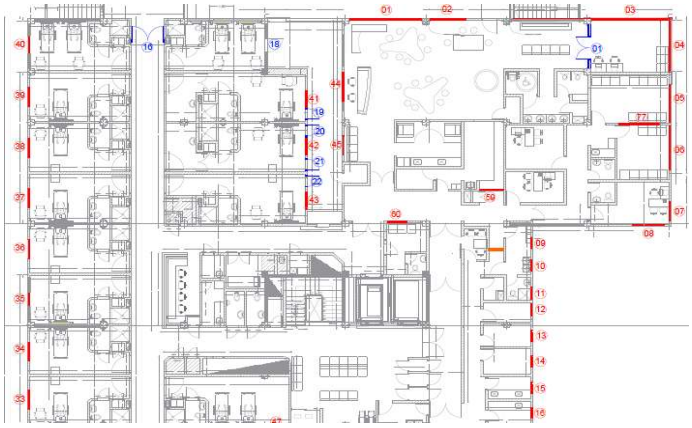

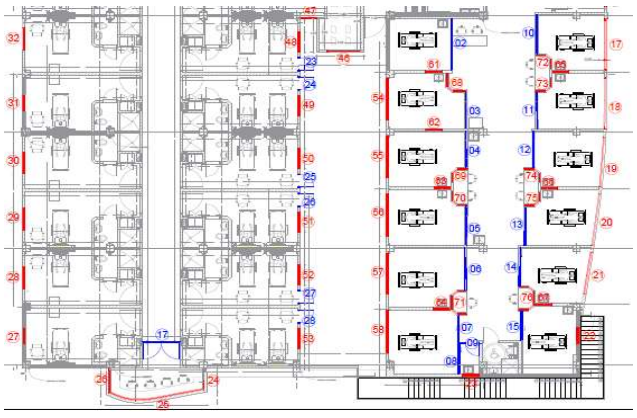

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
9	1.3	1.29	Fija	1.677	Nueva
10	1.3	1.28	Fija	1.664	Nueva
11	0.93	0.265	Fija	0.24645	Nueva
12	1.9	0.7	Fija	1.33	Nueva
13	1.9	0.7	Fija	1.33	Nueva
14	1.3	1.28	Fija	1.664	Nueva
15	1.3	1.29	Fija	1.677	Nueva
16	1.4	1.29	Fija	1.806	Nueva
17	1	0.7	Fija	0.7	Nueva
18	1.04	1.29	Fija	1.3416	Nueva
19	0.94	1.28	Fija	1.2032	Nueva
20	1.3	1.28	Fija	1.664	Nueva
21	1.89	1.27	Fija	2.4003	Nueva
22	0.98	0.95	Fija	0.931	Nueva
23	2.87	0.69	Fija y Batiente	1.9803	Nueva
24	3.04	0.69	Fija y Batiente	2.0976	Nueva
25	1.16	0.69	Fija y Batiente	0.8004	Nueva
26	1.33	0.68	Fija y Batiente	0.9044	Nueva
27	3.25	0.68	Fija y Batiente	2.21	Nueva
28	3.06	0.68	Fija	2.0808	Nueva
29	3.04	0.68	Fija	2.0672	Nueva
30	3.1	0.68	Fija	2.108	Nueva
31	2.5	0.68	Fija	1.7	Nueva
32	3.52	0.5	Fija	1.76	Nueva
33	3.52	0.5	Fija	1.76	Nueva
34	3.28	0.5	Fija	1.64	Nueva
35	4.07	0.5	Fija	2.035	Nueva
36	0.94	0.94	Fija	0.8836	Nueva
39	1.3	1.3	Batiente	1.69	Nueva

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

SEGUNDO NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	2.7	2.6	Puerta Ventana	7.02	Nueva
2	1	2.6	Puerta Ventana	2.6	Nueva
3	1.89	2.6	Puerta Ventana	4.914	Nueva
4	3.23	2.6	Puerta Ventana	8.398	Nueva
5	3.75	2.6	Puerta Ventana	9.75	Nueva
6	2.87	1.92	Puerta Ventana	5.5104	Nueva
7	3.61	2.6	Puerta Ventana	9.386	Nueva
8	1.73	2.6	Puerta Ventana	4.498	Nueva
9	2.02	1.92	Puerta Ventana	3.8784	Nueva
10	1.73	2.6	Puerta Ventana	4.498	Nueva
11	3.61	2.6	Puerta Ventana	9.386	Nueva
12	1.94	1.92	Puerta Ventana	3.7248	Nueva
13	1.53	2.6	Puerta Ventana	3.978	Nueva
14	1.02	1.92	Puerta Ventana	1.9584	Nueva
15	1.53	2.6	Puerta Ventana	3.978	Nueva
16	2.2	2.6	Puerta Ventana	5.72	Nueva
17	1.07	2.6	Puerta Ventana	2.782	Nueva

TERCER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	4.8	2.28	Fija	10.944	Nueva
2	2.28	2.26	Fija	5.1528	Nueva
3	4.8	1.35	Fija	6.48	Nueva
4	3.34	1.35	Fija	4.509	Nueva
5	2.55	2.24	Fija	5.712	Nueva
6	3.02	2.24	Fija	6.7648	Nueva
7	1.3	1.35	Fija	1.755	Nueva
8	1.9	1.35	Fija	2.565	Nueva
9	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
10	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
11	0.705	0.68	Fija	0.4794	Nueva
12	1.16	0.68	Fija	0.7888	Nueva
13	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
14	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
15	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
16	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
17	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
18	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
19	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
20	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
21	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
22	1	0.99	Fija	0.99	Nueva
23	0.98	0.7	Fija	0.686	Nueva
24	1.24	1.89	Fija	2.3436	Nueva
25	5.38	1.89	Corrediza y fija	10.1682	Nueva
26	1.4	1.89	Fija	2.646	Nueva
27	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
31	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
35	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
40	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
43	0.74	1.21	Batiente y Fija	0.8954	Nueva
44	2	1.18	Fija	2.36	Nueva
45	1.8	1.18	Fija	2.124	Nueva
46	1.82	0.7	Fija	1.274	Nueva
47	0.87	2	Batiente y Fija	1.74	Nueva
54	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva
55	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva
56	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva
57	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva
58	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva

TERCER NIVEL


VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
59	1.5	1.04	Fija	1.56	Nueva
60	1.2	1.2	Fija	1.44	Nueva
61	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
62	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
63	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
64	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
65	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
66	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
67	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
68	1.96	1.7	Fija	3.332	Nueva
69	1.74	1.7	Fija	2.958	Nueva
70	1.54	1.7	Fija	2.618	Nueva
71	2.49	1.7	Fija	4.233	Nueva
72	1.57	1.7	Fija	2.669	Nueva
73	1.73	1.7	Fija	2.941	Nueva
74	1.58	1.7	Fija	2.686	Nueva
75	1.82	1.7	Fija	3.094	Nueva
76	1.98	1.7	Fija	3.366	Nueva
77	2.48	0.7	Fija	1.736	Nueva

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	3.2	2.25	Puerta Ventana	7.2	Nueva
2	2.95	2.8	Puerta Ventana	8.26	Nueva
3	2.18	2.8	Puerta Ventana	6.104	Nueva
4	2.15	2.8	Puerta Ventana	6.02	Nueva
5	2.3	2.8	Puerta Ventana	6.44	Nueva
6	2.4	2.8	Puerta Ventana	6.72	Nueva
7 y 8	3.6	2.8	Puerta Ventana	10.08	Nueva
9	1.14	2.8	Puerta Ventana	3.192	Nueva
10	2.22	2.8	Puerta Ventana	6.216	Nueva
11	2.22	2.8	Puerta Ventana	6.216	Nueva
12	2.22	2.8	Puerta Ventana	6.216	Nueva
13	2.24	2.8	Puerta Ventana	6.272	Nueva

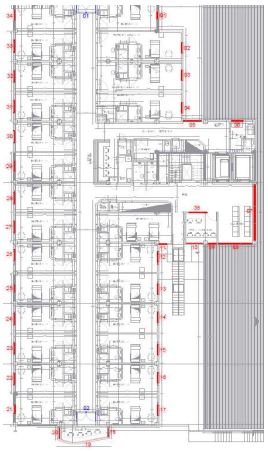

14	2.26	2.8	Puerta Ventana	6.328	Nueva
15	1.6	2.8	Puerta Ventana	4.48	Nueva
16	2	2.1	Puerta Ventana	4.2	Nueva
17	2	2.1	Puerta Ventana	4.2	Nueva
22	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	Nueva
28	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	Nueva

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	1	1	Batiente y Fija	1	Nueva
7	6.35	1.46	Batiente y Fija	9.271	Nueva
8	3.34	1.46	Batiente y Fija	4.8764	Nueva
9	0.78	1.46	Fija	1.1388	Nueva
10	1.76	1.46	Batiente y Fija	2.5696	Nueva
11	1.2	1.3	Batiente y Fija	1.56	Nueva
18	1.24	1.89	Fija	2.3436	Nueva
19	5.38	1.89	Corrediza y fija	10.1682	Nueva
20	1.4	1.89	Fija	2.646	Nueva
21	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
25	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
29	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
34	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
35	1.64	1.05	Fija y Batiente	1.722	Nueva

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

OBSERVACIONES:

TOTAL	**644.94**	**Metro Cuadrado**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	DE LA UNIDA	MANTENIMIENTO PUERTA EXISTENTE EN PVC	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



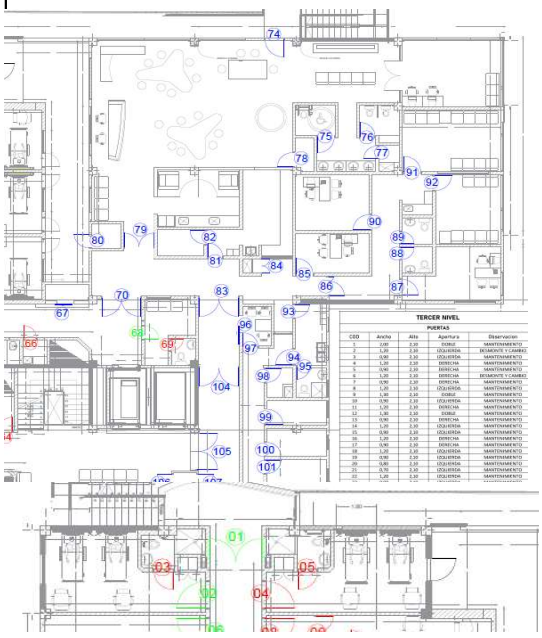

SOTANO NIVEL

PUERTAS

COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
1	2.30	2.10	REJILLA	4.83	MANTENIMIENTO
2	5.14	2.10	REJILLA	10.79	MANTENIMIENTO
3	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
4	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
5	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
6	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
15	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
16	0.80	2.10	DERECHA	1.68	MANTENIMIENTO
17	1.50	2.10	DOBLE	3.15	MANTENIMIENTO
35	1.14	2.10	DERECHA	2.39	MANTENIMIENTO
36	4.60	2.68	REJILLA	12.33	MANTENIMIENTO
39	4.88	2.68	REJILLA	13.08	MANTENIMIENTO

PRIMER NIVEL

PUERTAS

COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
30	1.80	2.10	DOBLE	3.78	MANTENIMIENTO
31	0.85	2.10	IZQUIERDA	1.79	MANTENIMIENTO
32	0.85	2.10	DERECHA	1.79	MANTENIMIENTO
34	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
37	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
42	0.80	2.10	DERECHA	1.68	MANTENIMIENTO
70	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	MANTENIMIENTO
81	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	MANTENIMIENTO
85	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	MANTENIMIENTO
91	1.52	2.10	CORREDIZA	3.19	MANTENIMIENTO
92	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO

SEGUNDO NIVEL


PUERTAS

COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
23	2.00	2.10	DOBLE	4.20	MANTENIMIENTO
25	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	MANTENIMIENTO
26	0.70	2.10	DERECHA	1.47	MANTENIMIENTO
33	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
35	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
36	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
37	1.10	2.10	IZQUIERDA	2.31	MANTENIMIENTO
38	1.10	2.10	IZQUIERDA	2.31	MANTENIMIENTO
39	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
42	0.80	2.10	DERECHA	1.68	MANTENIMIENTO
46	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
48	1.00	2.10	DERECHA	2.10	MANTENIMIENTO
49	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
55	0.70	2.10	DERECHA	1.47	MANTENIMIENTO
59	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
61	1.00	2.10	IZQUIERDA	2.10	MANTENIMIENTO
64	0.90	2.10	CORREDIZA	1.89	MANTENIMIENTO
65	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
77	0.60	2.10	DERECHA	1.26	MANTENIMIENTO
81	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
82	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO

TERCER NIVEL

PUERTAS

COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
1	2.00	2.10	DOBLE	4.20	MANTENIMIENTO
3	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
4	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
5	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
7	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
8	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
9	1.30	2.10	DOBLE	2.73	MANTENIMIENTO
10	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
11	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
12	1.30	2.10	DOBLE	2.73	MANTENIMIENTO
13	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
14	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
15	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
16	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
17	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
18	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
19	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
20	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
21	0.70	2.10	IZQUIERDA	1.47	MANTENIMIENTO
22	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
23	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
28	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
29	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
30	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
31	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
32	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
33	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
34	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
35	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
38	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
39	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
40	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
41	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
44	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
45	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
46	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
47	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
48	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
49	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
50	1.20	2.10	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
51	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
52	1.20	2.10	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO

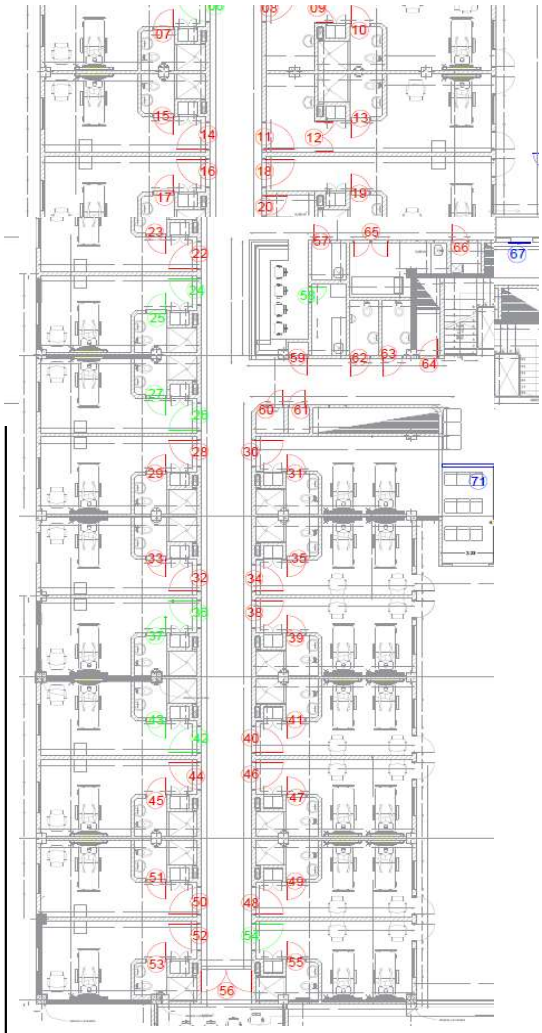

53	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
55	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
56	2.00	2.10	DOBLE	4.20	MANTENIMIENTO
57	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
59	0.75	2.10	IZQUIERDA	1.58	MANTENIMIENTO
60	0.75	2.10	DERECHA	1.58	MANTENIMIENTO
61	0.80	2.10	DERECHA	1.68	MANTENIMIENTO
62	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
63	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
64	0.90	2.10	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
65	1.70	2.10	DOBLE	3.57	MANTENIMIENTO
66	0.80	2.10	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
69	0.90	2.10	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO

CUARTO NIVEL

PUERTAS

COD	Ancho	Alto	Apertura	Area	Observacion
2	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
3	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
4	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
5	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
6	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
7	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
8	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
9	1.3	2.1	DOBLE	2.73	MANTENIMIENTO
10	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
11	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
12	1.3	2.1	DOBLE	2.73	MANTENIMIENTO
13	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
14	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
15	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
17	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
18	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
19	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
20	0.8	2.1	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
21	0.7	2.1	IZQUIERDA	1.47	MANTENIMIENTO
22	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
23	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
24	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
25	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
26	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
28	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
29	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
30	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
31	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
32	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
33	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
34	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
35	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
36	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
37	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
38	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
39	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
40	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
41	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
42	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
44	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
45	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
46	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
47	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
48	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
49	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
50	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
51	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
52	1.2	2.1	DERECHA	2.52	MANTENIMIENTO
53	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
54	1.2	2.1	IZQUIERDA	2.52	MANTENIMIENTO
55	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO
56	2	2.1	DOBLE	4.20	MANTENIMIENTO
57	0.8	2.1	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
59	0.75	2.1	IZQUIERDA	1.58	MANTENIMIENTO
60	0.75	2.1	DERECHA	1.58	MANTENIMIENTO
61	0.8	2.1	DERECHA	1.68	MANTENIMIENTO
62	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
63	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
64	0.9	2.1	DERECHA	1.89	MANTENIMIENTO
65	1.7	2.1	DOBLE	3.57	MANTENIMIENTO
66	0.8	2.1	IZQUIERDA	1.68	MANTENIMIENTO
68	0.9	2.1	IZQUIERDA	1.89	MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	**380.73**	**Metro cuadrado**	


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	4.06	MANTENIMIENTO VENTANA EXISTENTE EN PVC	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

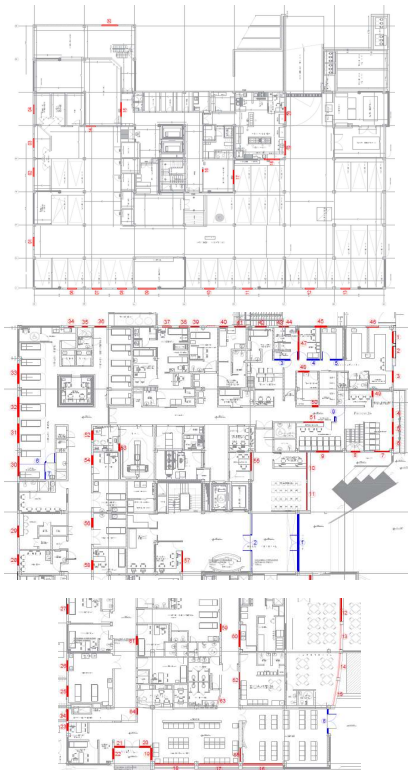

Dimensiones				VALOR	Observaciones
COD	Ancho	Alto	Tipo		

NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
2	1.2	0.4	Ventana con Rejilla	0.48	MANTENIMIENTO
3	1.2	0.4	Ventana con Rejilla	0.48	MANTENIMIENTO
4	1.16	0.4	Ventana con Rejilla	0.464	MANTENIMIENTO
5	2	0.38	Ventana con Rejilla	0.76	MANTENIMIENTO
6	1.18	0.38	Ventana con Rejilla	0.4484	MANTENIMIENTO
7	1.98	0.38	Ventana con Rejilla	0.7524	MANTENIMIENTO
8	1.15	0.38	Ventana con Rejilla	0.437	MANTENIMIENTO
9	1.98	0.38	Ventana con Rejilla	0.7524	MANTENIMIENTO
10	1.2	0.38	Ventana con Rejilla	0.456	MANTENIMIENTO
11	1.98	0.38	Ventana con Rejilla	0.7524	MANTENIMIENTO
12	1.18	0.38	Ventana con Rejilla	0.4484	MANTENIMIENTO
13	1.18	0.38	Ventana con Rejilla	0.4484	MANTENIMIENTO

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
16	0.54	1	Fija	0.54	MANTENIMIENTO

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
25	1.3	1.47	Fija	1.911	MANTENIMIENTO
26	1.34	1.5	Fija	2.01	MANTENIMIENTO
27	0.95	0.92	Fija	0.874	MANTENIMIENTO
28	1.3	0.96	Fija	1.248	MANTENIMIENTO
29	1.3	0.95	Fija	1.235	MANTENIMIENTO
30	2.45	0.5	Fija	1.225	MANTENIMIENTO
31	2.24	0.5	Fija	1.12	MANTENIMIENTO
32	2.24	0.5	Fija	1.12	MANTENIMIENTO
33	2.24	0.5	Fija	1.12	MANTENIMIENTO
34	0.5	0.5	Fija	0.25	MANTENIMIENTO
35	0.5	0.5	Fija	0.25	MANTENIMIENTO
38	1.3	1.3	Batiente	1.69	MANTENIMIENTO
39	0.91	1.3	Fija	1.183	MANTENIMIENTO
40	1.3	1.3	Batiente	1.69	MANTENIMIENTO
42	1.3	1.3	Batiente	1.69	MANTENIMIENTO

PRIMER NIVEL


VENTANERIA INTERNA


COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
48	1.1	0.94	Fija	1.034	MANTENIMIENTO
53	0.95	0.66	Fija	0.627	MANTENIMIENTO
56	0.95	1.04	Fija	0.988	MANTENIMIENTO
57	2.8	2.64	Fija	7.392	MANTENIMIENTO
59	0.98	0.4	Fija	0.392	MANTENIMIENTO
60	1.98	0.4	Fija	0.792	MANTENIMIENTO
61	1	1.04	Fija	1.04	MANTENIMIENTO
62	1.98	0.4	Fija	0.792	MANTENIMIENTO
63	0.96	0.4	Fija	0.384	MANTENIMIENTO

PRIMER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

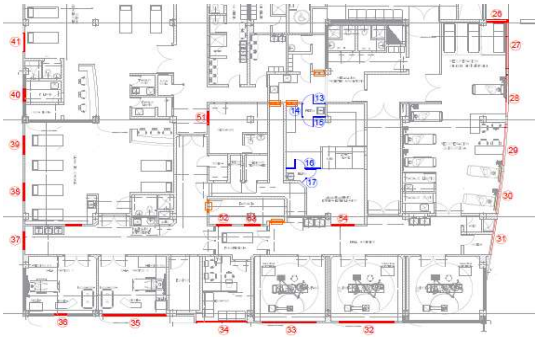

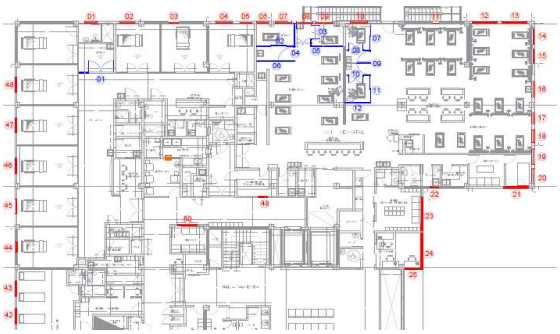

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	0.48	0.48	Fija	0.2304	MANTENIMIENTO
2	1.2	1.3	Fija	1.56	MANTENIMIENTO
3	0.98	0.8	Fija	0.784	MANTENIMIENTO
4	1.3	1.3	Fija	1.69	MANTENIMIENTO
5	0.92	1.1	Fija	1.012	MANTENIMIENTO
6	0.9	1.1	Fija	0.99	MANTENIMIENTO
7	1.3	1.1	Fija	1.43	MANTENIMIENTO
8	1.3	1.1	Fija	1.43	MANTENIMIENTO
37	1.3	1.3	Batiente	1.69	MANTENIMIENTO
38	1.3	1.3	Batiente	1.69	MANTENIMIENTO
40	0.74	0.96	Batiente	0.7104	MANTENIMIENTO
41	1.3	1.3	Batiente	1.69	MANTENIMIENTO
42	1.3	0.81	Batiente	1.053	MANTENIMIENTO
43	1.3	0.81	Batiente	1.053	MANTENIMIENTO
44	0.94	0.75	Fija	0.705	MANTENIMIENTO
45	1.3	1.3	Fija	1.69	MANTENIMIENTO
46	1.3	1.3	Fija	1.69	MANTENIMIENTO
47	1.3	1.3	Fija	1.69	MANTENIMIENTO
48	1.3	1.3	Fija	1.69	MANTENIMIENTO

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
49	0.7	1	Fijo	0.7	MANTENIMIENTO
50	1.48	0.99	Fijo	1.4652	MANTENIMIENTO
51	1	1.03	Fijo	1.03	MANTENIMIENTO
52	1	1.03	Fijo	1.03	MANTENIMIENTO
53	1	1.03	Fijo	1.03	MANTENIMIENTO
54	1.48	0.98	Fijo y Batiente	1.4504	MANTENIMIENTO

SEGUNDO NIVEL


PUERTA VENTANA


COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

TERCER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
28	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
29	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
30	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
32	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
33	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
34	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
36	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
37	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
38	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
39	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
41	1.2	1.19	Batiente y Fija	1.428	MANTENIMIENTO
42	1.2	1.19	Batiente y Fija	1.428	MANTENIMIENTO

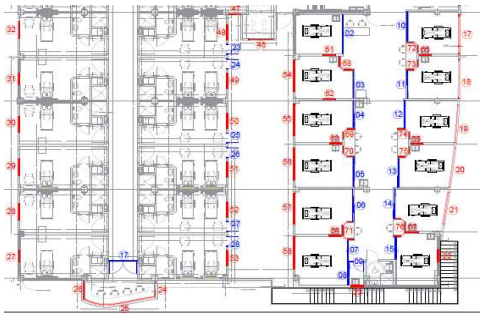

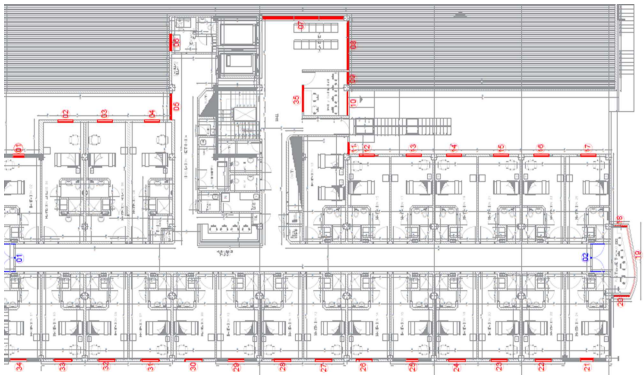

48	1.2	1.18	Batiente y Fija	1.416	MANTENIMIENTO
49	1.2	1.18	Batiente y Fija	1.416	MANTENIMIENTO
50	1.2	1.18	Batiente y Fija	1.416	MANTENIMIENTO
51	1.2	1.18	Batiente y Fija	1.416	MANTENIMIENTO
52	1.2	1.18	Batiente y Fija	1.416	MANTENIMIENTO
53	1.2	1.18	Batiente y Fija	1.416	MANTENIMIENTO

TERCER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
18	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO
19	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO
20	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO
21	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO
23	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO
24	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO
25	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO
26	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO
27	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	MANTENIMIENTO

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
2	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
3	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
4	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
5	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
6	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
12	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
13	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
14	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
15	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
16	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
17	1.3	1.5	Batiente y Fija	1.95	MANTENIMIENTO
22	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
23	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
24	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
26	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
27	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
28	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
30	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
31	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
32	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO
33	1.3	1.3	Batiente y Fija	1.69	MANTENIMIENTO

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	2	2.1	Puerta Ventana	4.2	MANTENIMIENTO
2	2	2.1	Puerta Ventana	4.2	MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:


TOTAL **160.76** **Metro Cuadrado**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.07	VIDRIO 4 MM	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

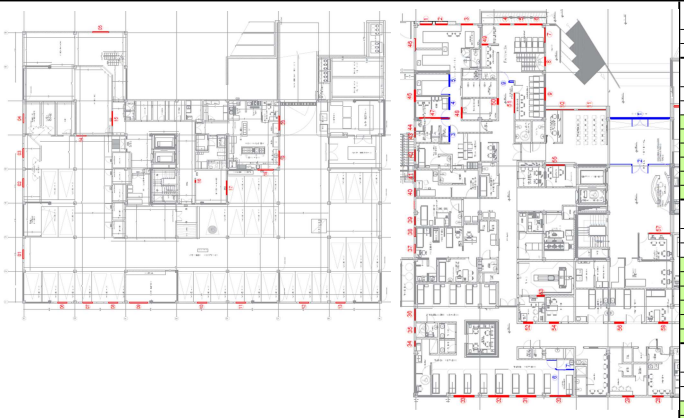

Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			

NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
14	1.2	0.4	Fija	0.48	Nueva
15	2	0.4	Fija	0.8	Nueva
17	2	0.4	Fija	0.8	Nueva
18	2	0.4	Fija	0.8	Nueva
19	2	0.4	Fija	0.8	Nueva
20	2	0.4	Fija	0.8	Nueva

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
9	0.95	0.95	Fija	0.9025	Nueva
27	0.95	0.92	Fija	0.874	Nueva
36	1.22	0.55	Fija	0.671	Nueva
43	0.68	1.3	Fija	0.884	Nueva
44	0.5	1.3	Fija	0.65	Nueva
45	1.02	0.95	Fija	0.969	Nueva

PRIMER NIVEL


VENTANERIA INTERNA


COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
49	0.65	0.5	Fija	0.325	Nueva
50	0.65	1	Fija	0.65	Nueva
54	0.95	1.04	Fija	0.988	Nueva
60	1.98	0.4	Fija	0.792	Nueva
62	1.98	0.4	Fija	0.792	Nueva
64	0.7	0.98	Fija	0.686	Nueva

PRIMER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

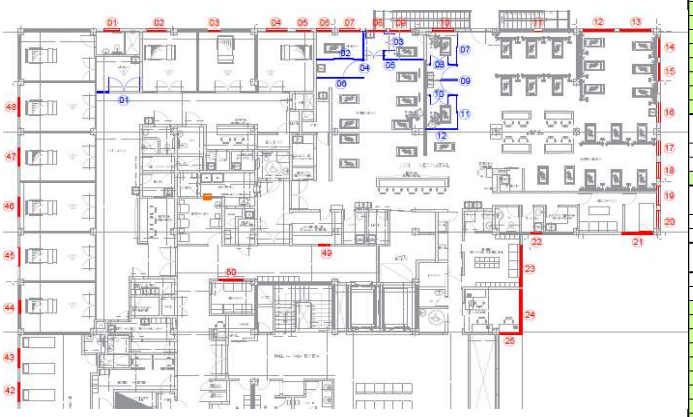

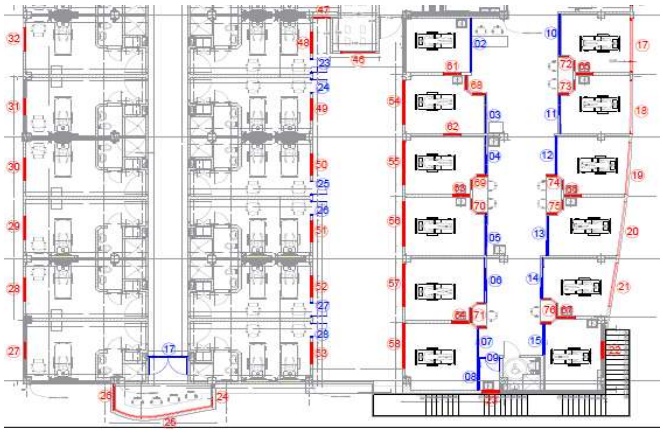

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
6	0.9	1.1	Fija	0.99	Nueva
11	0.93	0.265	Fija	0.24645	Nueva
17	1	0.7	Fija	0.7	Nueva
22	0.98	0.95	Fija	0.931	Nueva
25	1.16	0.69	Fija y Batiente	0.8004	Nueva
26	1.33	0.68	Fija y Batiente	0.9044	Nueva
36	0.94	0.94	Fija	0.8836	Nueva
44	0.94	0.75	Fija	0.705	Nueva

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
49	0.7	1	Fijo	0.7	Nueva

SEGUNDO NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

TERCER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
9	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
10	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
11	0.705	0.68	Fija	0.4794	Nueva
12	1.16	0.68	Fija	0.7888	Nueva
13	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
14	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
15	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
16	0.8	0.7	Fija	0.56	Nueva
22	1	0.99	Fija	0.99	Nueva
23	0.98	0.7	Fija	0.686	Nueva
27	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
31	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
35	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
40	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
43	0.74	1.21	Batiente y Fija	0.8954	Nueva

TERCER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
21	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
25	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
29	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva
34	0.95	0.45	Batiente y Fija	0.4275	Nueva

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

OBSERVACIONES:


TOTAL 31.14 M2

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.08	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 4+4 MM	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

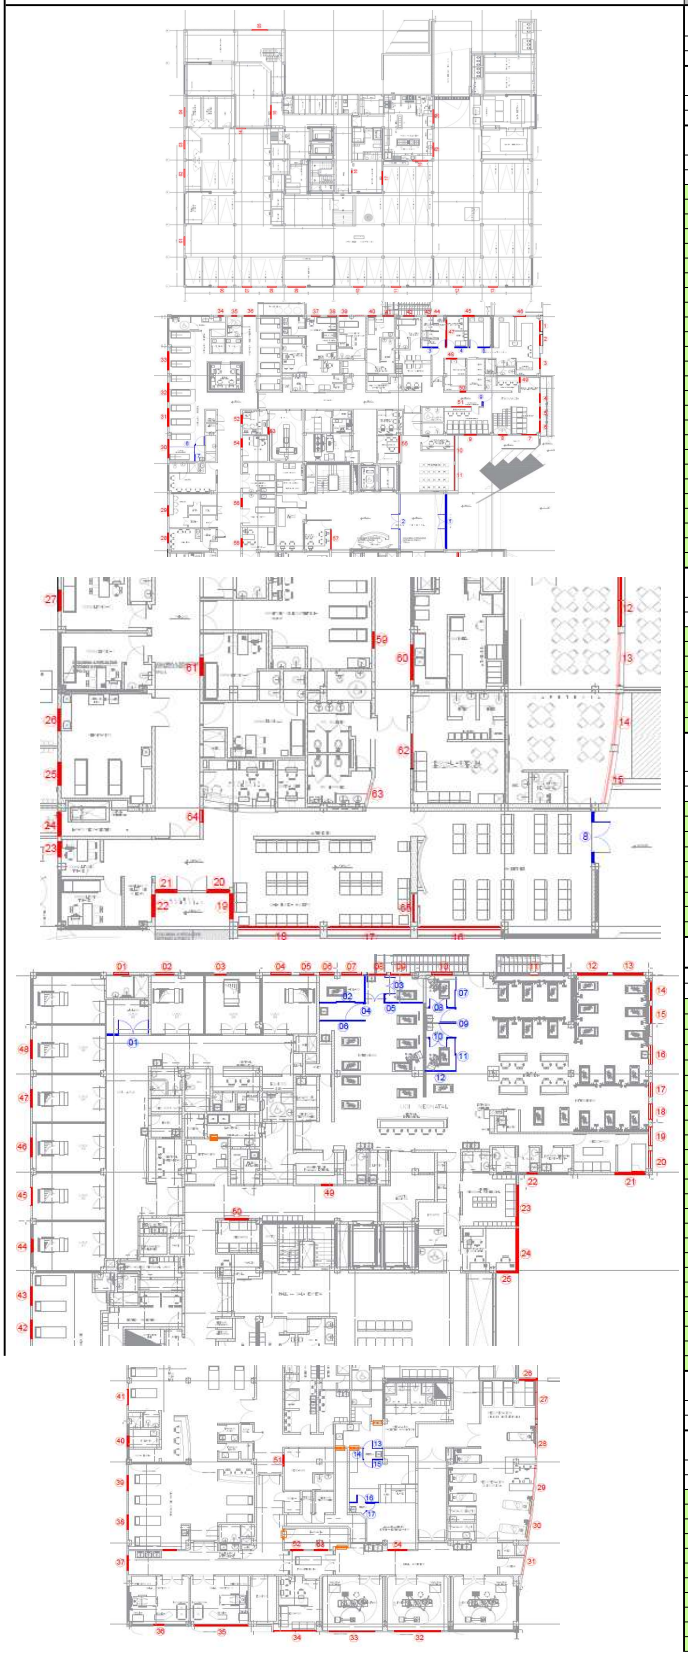

Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			

NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
2	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
3	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
4	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
5	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
6	1.27	1.3	Batiente	1.651	Nueva
7	2.65	2.5	Fija	6.625	Nueva
8	1.3	1.3	Fija	1.69	Nueva
10	3.01	2.4	Fija	7.224	Nueva
11	3.01	2.4	Fija	7.224	Nueva
12	3.03	2.4	Fija	7.272	Nueva
13	3	2.4	Fija	7.2	Nueva
14	3.01	2.4	Fija	7.224	Nueva
15	3.06	2.4	Fija	7.344	Nueva
16	3.81	2.38	Fija	9.0678	Nueva
17	3.85	2.4	Fija	9.24	Nueva
18	3.85	2.4	Fija	9.24	Nueva
19	1.2	1.75	Fija	2.1	Nueva
20	1.2	2.1	Fija	2.52	Nueva
21	1.2	2.1	Fija	2.52	Nueva
22	1.16	1.76	Fija	2.0416	Nueva
23	0.8	1.5	Fija	1.2	Nueva
24	1.5	1.5	Fija	2.25	Nueva
37	1.3	1.3	Batiente	1.69	Nueva
41	1.3	1.3	Fija	1.69	Nueva
46	1.3	1.3	Fija	1.69	Nueva

PRIMER NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
47	2.74	1.4	Fija	3.836	Nueva
51	2.13	1	Batiente	2.13	Nueva
52	1	1.04	Fija	1.04	Nueva
55	1.85	1.52	Fija	2.812	Nueva
57	2.8	2.64	Fija	7.392	Nueva
58	1.41	1	Fija	1.41	Nueva
65	1.12	1.72	Fija	1.9264	Nueva

PRIMER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	6.45	5.96	Puerta Ventana	38.442	Nueva
2	6.45	2.72	Puerta Ventana	17.544	Nueva
3	2.54	2.6	Puerta Ventana	6.604	Nueva
4	2.29	2.6	Puerta Ventana	5.954	Nueva
5	2.17	2.6	Puerta Ventana	5.642	Nueva
6	3.8	1.95	Puerta Ventana	7.41	Nueva
7	2.1	1.95	Puerta Ventana	4.095	Nueva
8	3.06	2.4	Puerta Ventana	7.344	Nueva
9	1.59	2.6	Puerta Ventana	4.134	Nueva

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
7	1.3	1.1	Fija	1.43	Nueva
8	1.3	1.1	Fija	1.43	Nueva
9	1.3	1.29	Fija	1.677	Nueva
10	1.3	1.28	Fija	1.664	Nueva
12	1.9	0.7	Fija	1.33	Nueva
13	1.9	0.7	Fija	1.33	Nueva
14	1.3	1.28	Fija	1.664	Nueva
15	1.3	1.29	Fija	1.677	Nueva
16	1.4	1.29	Fija	1.806	Nueva
18	1.04	1.29	Fija	1.3416	Nueva
19	0.94	1.28	Fija	1.2032	Nueva
20	1.3	1.28	Fija	1.664	Nueva
21	1.89	1.27	Fija	2.4003	Nueva
23	2.87	0.69	Fija y Batiente	1.9803	Nueva
24	3.04	0.69	Fija y Batiente	2.0976	Nueva
27	3.25	0.68	Fija y Batiente	2.21	Nueva
28	3.06	0.68	Fija	2.0808	Nueva
29	3.04	0.68	Fija	2.0672	Nueva
30	3.1	0.68	Fija	2.108	Nueva
31	2.5	0.68	Fija	1.7	Nueva
32	3.52	0.5	Fija	1.76	Nueva
33	3.52	0.5	Fija	1.76	Nueva
34	3.28	0.5	Fija	1.64	Nueva
35	4.07	0.5	Fija	2.035	Nueva
39	1.3	1.3	Batiente	1.69	Nueva

SEGUNDO NIVEL


VENTANERIA INTERNA


COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

SEGUNDO NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	2.7	2.6	Puerta Ventana	7.02	Nueva
2	1	2.6	Puerta Ventana	2.6	Nueva
3	1.89	2.6	Puerta Ventana	4.914	Nueva
4	3.23	2.6	Puerta Ventana	8.398	Nueva
5	3.75	2.6	Puerta Ventana	9.75	Nueva
6	2.87	1.92	Puerta Ventana	5.5104	Nueva
7	3.61	2.6	Puerta Ventana	9.386	Nueva
8	1.73	2.6	Puerta Ventana	4.498	Nueva
9	2.02	1.92	Puerta Ventana	3.8784	Nueva
10	1.73	2.6	Puerta Ventana	4.498	Nueva
11	3.61	2.6	Puerta Ventana	9.386	Nueva

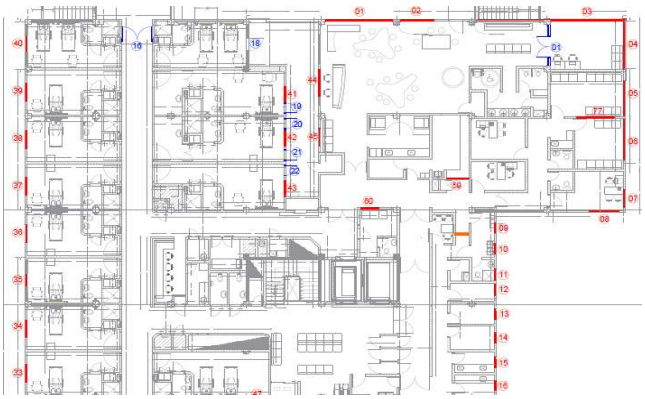

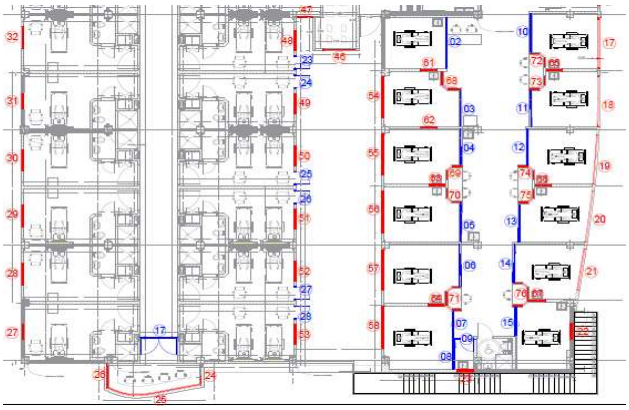

12	1.94	1.92	Puerta Ventana	3.7248	Nueva
13	1.53	2.6	Puerta Ventana	3.978	Nueva
14	1.02	1.92	Puerta Ventana	1.9584	Nueva
15	1.53	2.6	Puerta Ventana	3.978	Nueva
16	2.2	2.6	Puerta Ventana	5.72	Nueva
17	1.07	2.6	Puerta Ventana	2.782	Nueva

TERCER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	4.8	2.28	Fija	10.944	Nueva
2	2.28	2.26	Fija	5.1528	Nueva
3	4.8	1.35	Fija	6.48	Nueva
4	3.34	1.35	Fija	4.509	Nueva
5	2.55	2.24	Fija	5.712	Nueva
6	3.02	2.24	Fija	6.7648	Nueva
7	1.3	1.35	Fija	1.755	Nueva
8	1.9	1.35	Fija	2.565	Nueva
17	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
18	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
19	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
20	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
21	3.05	0.7	Fija	2.135	Nueva
24	1.24	1.89	Fija	2.3436	Nueva
25	5.38	1.89	Corrediza y fija	10.1682	Nueva
26	1.4	1.89	Fija	2.646	Nueva
44	2	1.18	Fija	2.36	Nueva
45	1.8	1.18	Fija	2.124	Nueva
46	1.82	0.7	Fija	1.274	Nueva
47	0.87	2	Batiente y Fija	1.74	Nueva
54	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva
55	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva
56	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva
57	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva
58	2.5	0.7	Fija	1.75	Nueva

TERCER NIVEL


VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
59	1.5	1.04	Fija	1.56	Nueva
60	1.2	1.2	Fija	1.44	Nueva
61	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
62	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
63	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
64	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
65	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
66	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
67	0.9	1.5	Fija	1.35	Nueva
68	1.96	1.7	Fija	3.332	Nueva
69	1.74	1.7	Fija	2.958	Nueva
70	1.54	1.7	Fija	2.618	Nueva
71	2.49	1.7	Fija	4.233	Nueva
72	1.57	1.7	Fija	2.669	Nueva
73	1.73	1.7	Fija	2.941	Nueva
74	1.58	1.7	Fija	2.686	Nueva
75	1.82	1.7	Fija	3.094	Nueva
76	1.98	1.7	Fija	3.366	Nueva
77	2.48	0.7	Fija	1.736	Nueva

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	3.2	2.25	Puerta Ventana	7.2	Nueva

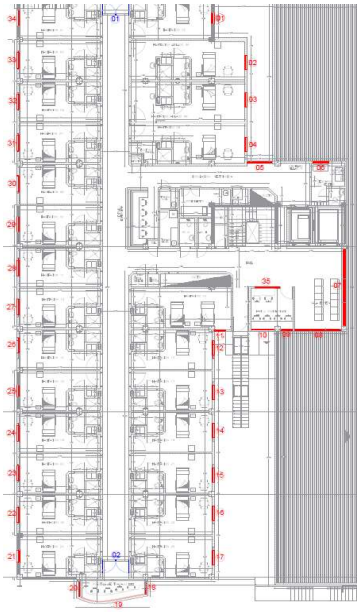

2	2.95	2.8	Puerta Ventana	8.26	Nueva
3	2.18	2.8	Puerta Ventana	6.104	Nueva
4	2.15	2.8	Puerta Ventana	6.02	Nueva
5	2.3	2.8	Puerta Ventana	6.44	Nueva
6	2.4	2.8	Puerta Ventana	6.72	Nueva
7 y 8	3.6	2.8	Puerta Ventana	10.08	Nueva
9	1.14	2.8	Puerta Ventana	3.192	Nueva
10	2.22	2.8	Puerta Ventana	6.216	Nueva
11	2.22	2.8	Puerta Ventana	6.216	Nueva
12	2.22	2.8	Puerta Ventana	6.216	Nueva
13	2.24	2.8	Puerta Ventana	6.272	Nueva
14	2.26	2.8	Puerta Ventana	6.328	Nueva
15	1.6	2.8	Puerta Ventana	4.48	Nueva
16	2	2.1	Puerta Ventana	4.2	Nueva
17	2	2.1	Puerta Ventana	4.2	Nueva
22	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	Nueva
28	0.85	2	Puerta Ventana	1.7	Nueva

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	1	1	Batiente y Fija	1	Nueva
7	6.35	1.46	Batiente y Fija	9.271	Nueva
8	3.34	1.46	Batiente y Fija	4.8764	Nueva
9	0.78	1.46	Fija	1.1388	Nueva
10	1.76	1.46	Batiente y Fija	2.5696	Nueva
11	1.2	1.3	Batiente y Fija	1.56	Nueva
18	1.24	1.89	Fija	2.3436	Nueva
19	5.38	1.89	Corrediza y fija	10.1682	Nueva
20	1.4	1.89	Fija	2.646	Nueva

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
35	1.64	1.05	Fija y Batiente	1.722	Nueva

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion

OBSERVACIONES:

TOTAL **627.29** **M2**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.09	CERRADURA ALCOBA	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



	Dimensiones			VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad			0.00	
PISO 1	Unidad	151.6		151.60	
PISO 2	Unidad	151.7		151.70	
PISO 3	Unidad	151.7		151.70	
PISO 4	Unidad			0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL 455.00 Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.10	CERRADURA BAÑO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad			0.00	
PISO 1	Unidad	17		17.00	
PISO 2	Unidad	13		13.00	
PISO 3	Unidad	20		20.00	
PISO 4	Unidad			0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	50.00	Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.11	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad			0.00	
PISO 1	Unidad	10		10.00	
PISO 2	Unidad	10		10.00	
PISO 3	Unidad	10		10.00	
PISO 4	Unidad			0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	30.00	Unidad


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.12	SELLADO DEL MARCOS VENTANERIA CON FONDO DE JUNTA CON ESPUMA Y ACABADO DE JUNTA CON MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO	UNIDAD	metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

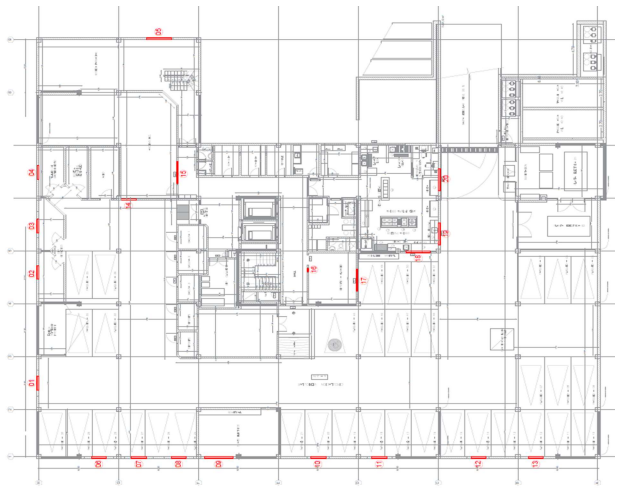

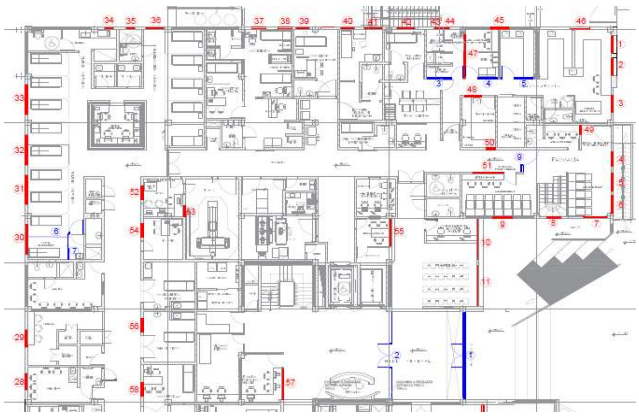

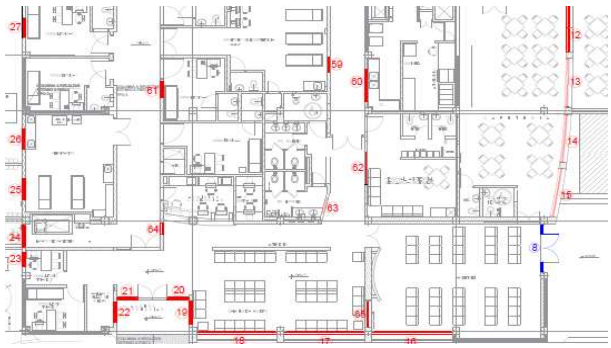

Dimensiones				VALOR	Observaciones
ID	ANCHO	ALTO			

NIVEL SOTANO

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	2.7	0.6	Ventana con Rejilla	6.6	Nueva
2	1.2	0.4	Ventana con Rejilla		Limpieza
3	1.2	0.4	Ventana con Rejilla		Limpieza
4	1.16	0.4	Ventana con Rejilla		Limpieza
5	2	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza
6	1.18	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza
7	1.98	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza
8	1.15	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza
9	1.98	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza
10	1.2	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza
11	1.98	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza
12	1.18	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza
13	1.18	0.38	Ventana con Rejilla		Limpieza

NIVEL SOTANO

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
14	1.2	0.4	Fija	3.2	Nueva
15	2	0.4	Fija	4.8	Nueva
16	0.54	1	Fija		Limpieza
17	2	0.4	Fija	4.8	Nueva
18	2	0.4	Fija	4.8	Nueva
19	2	0.4	Fija	4.8	Nueva
20	2	0.4	Fija	4.8	Nueva

PRIMER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	1.27	1.3	Batiente	5.14	Nueva
2	1.27	1.3	Batiente	5.14	Nueva
3	1.27	1.3	Batiente	5.14	Nueva
4	1.27	1.3	Batiente	5.14	Nueva
5	1.27	1.3	Batiente	5.14	Nueva
6	1.27	1.3	Batiente	5.14	Nueva
7	2.65	2.5	Fija	10.3	Nueva
8	1.3	1.3	Fija	5.2	Nueva
9	0.95	0.95	Fija	3.8	Nueva
10	3.01	2.4	Fija	10.82	Nueva
11	3.01	2.4	Fija	10.82	Nueva
12	3.03	2.4	Fija	10.86	Nueva
13	3	2.4	Fija	10.8	Nueva
14	3.01	2.4	Fija	10.82	Nueva
15	3.06	2.4	Fija	10.92	Nueva
16	3.81	2.38	Fija	12.38	Nueva
17	3.85	2.4	Fija	12.5	Nueva
18	3.85	2.4	Fija	12.5	Nueva
19	1.2	1.75	Fija	5.9	Nueva
20	1.2	2.1	Fija	6.6	Nueva
21	1.2	2.1	Fija	6.6	Nueva
22	1.16	1.76	Fija	5.84	Nueva
23	0.8	1.5	Fija	4.6	Nueva
24	1.5	1.5	Fija	6	Nueva
25	1.3	1.47	Fija		Limpieza
26	1.34	1.5	Fija		Limpieza
27	0.95	0.92	Fija		Limpieza/Cambio Vidrios
28	1.3	0.96	Fija		Limpieza
29	1.3	0.95	Fija		Limpieza
30	2.45	0.5	Fija		Limpieza
31	2.24	0.5	Fija		Limpieza
32	2.24	0.5	Fija		Limpieza
33	2.24	0.5	Fija		Limpieza
34	0.5	0.5	Fija		Limpieza
35	0.5	0.5	Fija		Limpieza
36	1.22	0.55	Fija	3.54	Nueva
37	1.3	1.3	Batiente	5.2	Nueva
38	1.3	1.3	Batiente		Limpieza
39	0.91	1.3	Fija		Limpieza
40	1.3	1.3	Batiente		Limpieza
41	1.3	1.3	Fija	5.2	Nueva
42	1.3	1.3	Batiente		Limpieza
43	0.68	1.3	Fija	3.96	Nueva
44	0.5	1.3	Fija	3.6	Nueva
45	1.02	0.95	Fija	3.94	Nueva
46	1.3	1.3	Fija	5.2	Nueva

PRIMER NIVEL


VENTANERIA INTERNA


COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
47	2.74	1.4	Fija	8.28	Nueva
48	1.1	0.94	Fija		Limpieza
49	0.65	0.5	Fija	2.3	Nueva
50	0.65	1	Fija	3.3	Nueva
51	2.13	1	Batiente	6.26	Nueva
52	1	1.04	Fija	4.08	Nueva
53	0.95	0.66	Fija		Limpieza
54	0.95	1.04	Fija	3.98	Nueva
55	1.85	1.52	Fija	6.74	Nueva
56	0.95	1.04	Fija		Limpieza
57	2.8	2.64	Fija		Limpieza/Cambio de Vidrio
58	1.41	1	Fija	4.82	Nueva
59	0.98	0.4	Fija		Limpieza
60	1.98	0.4	Fija		Limpieza/Cambio de Vidrio
61	1	1.04	Fija		Limpieza
62	1.98	0.4	Fija		Limpieza/Cambio de Vidrio
63	0.96	0.4	Fija		Limpieza
64	0.7	0.98	Fija	3.36	Nueva
65	1.12	1.72	Fija	5.68	Nueva


PRIMER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	6.45	5.96	Puerta Ventana	24.82	Nueva
2	6.45	2.72	Puerta Ventana	18.34	Nueva
3	2.54	2.6	Puerta Ventana	10.28	Nueva
4	2.29	2.6	Puerta Ventana	9.78	Nueva
5	2.17	2.6	Puerta Ventana	9.54	Nueva
6	3.8	1.95	Puerta Ventana	11.5	Nueva
7	2.1	1.95	Puerta Ventana	8.1	Nueva
8	3.06	2.4	Puerta Ventana	10.92	Nueva
9	1.59	2.6	Puerta Ventana	8.38	Nueva

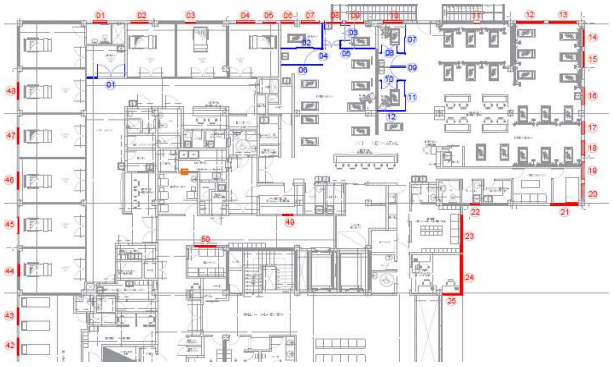

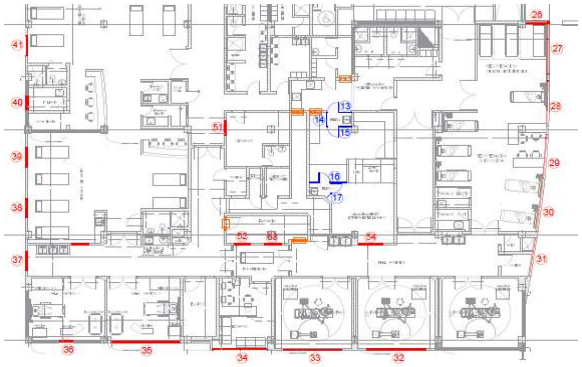

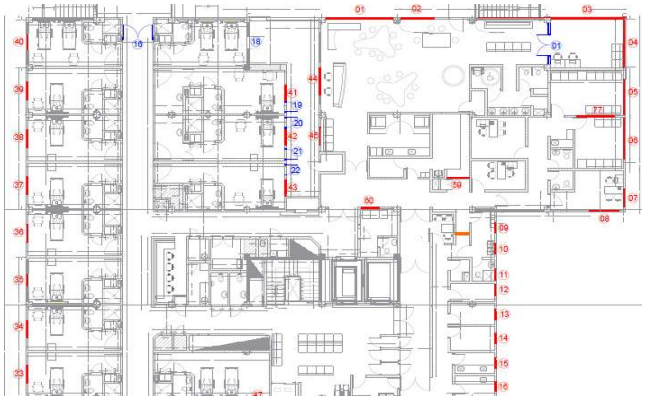

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	0.48	0.48	Fija		Limpieza
2	1.2	1.3	Fija		Limpieza
3	0.98	0.8	Fija		Limpieza
4	1.3	1.3	Fija		Limpieza
5	0.92	1.1	Fija		Limpieza
6	0.9	1.1	Fija		Limpieza/Cambio de Vidrio
7	1.3	1.1	Fija		Limpieza/Cambio de Vidrio
8	1.3	1.1	Fija		Limpieza/Cambio de Vidrio
9	1.3	1.29	Fija	5.18	Nueva
10	1.3	1.28	Fija	5.16	Nueva
11	0.93	0.265	Fija	2.39	Nueva
12	1.9	0.7	Fija	5.2	Nueva
13	1.9	0.7	Fija	5.2	Nueva
14	1.3	1.28	Fija	5.16	Nueva
15	1.3	1.29	Fija	5.18	Nueva
16	1.4	1.29	Fija	5.38	Nueva
17	1	0.7	Fija	3.4	Nueva
18	1.04	1.29	Fija	4.66	Nueva
19	0.94	1.28	Fija	4.44	Nueva
20	1.3	1.28	Fija	5.16	Nueva
21	1.89	1.27	Fija	6.32	Nueva
22	0.98	0.95	Fija	3.86	Nueva
23	2.87	0.69	Fija y Batiente	7.12	Nueva
24	3.04	0.69	Fija y Batiente	7.46	Nueva
25	1.16	0.69	Fija y Batiente	3.7	Nueva
26	1.33	0.68	Fija y Batiente	4.02	Nueva
27	3.25	0.68	Fija y Batiente	7.86	Nueva
28	3.06	0.68	Fija	7.48	Nueva
29	3.04	0.68	Fija	7.44	Nueva
30	3.1	0.68	Fija	7.56	Nueva
31	2.5	0.68	Fija	6.36	Nueva
32	3.52	0.5	Fija	8.04	Nueva
33	3.52	0.5	Fija	8.04	Nueva
34	3.28	0.5	Fija	7.56	Nueva
35	4.07	0.5	Fija	9.14	Nueva
36	0.94	0.94	Fija	3.76	Nueva
37	1.3	1.3	Batiente		Limpieza
38	1.3	1.3	Batiente		Limpieza
39	1.3	1.3	Batiente	5.2	Nueva
40	0.74	0.96	Batiente		Limpieza
41	1.3	1.3	Batiente		Limpieza
42	1.3	0.81	Batiente		Limpieza
43	1.3	0.81	Batiente		Limpieza
44	0.94	0.75	Fija		Limpieza/Cambio de Vidrio
45	1.3	1.3	Fija		Limpieza
46	1.3	1.3	Fija		Limpieza
47	1.3	1.3	Fija		Limpieza
48	1.3	1.3	Fija		Limpieza

SEGUNDO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
49	0.7	1	Fijo		Limpieza/Cambio de Vidrio
50	1.48	0.99	Fijo		Limpieza
51	1	1.03	Fijo		Nueva
52	1	1.03	Fijo		Nueva
53	1	1.03	Fijo		Nueva
54	1.48	0.98	Fijo y Batiente		Nueva

SEGUNDO NIVEL


PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	2.7	2.6	Puerta Ventana	10.6	Nueva
2	1	2.6	Puerta Ventana	7.2	Nueva
3	1.89	2.6	Puerta Ventana	8.98	Nueva
4	3.23	2.6	Puerta Ventana	11.66	Nueva
5	3.75	2.6	Puerta Ventana	12.7	Nueva
6	2.87	1.92	Puerta Ventana	9.58	Nueva
7	3.61	2.6	Puerta Ventana	12.42	Nueva
8	1.73	2.6	Puerta Ventana	8.66	Nueva
9	2.02	1.92	Puerta Ventana	7.88	Nueva
10	1.73	2.6	Puerta Ventana	8.66	Nueva
11	3.61	2.6	Puerta Ventana	12.42	Nueva
12	1.94	1.92	Puerta Ventana	7.72	Nueva
13	1.53	2.6	Puerta Ventana	8.26	Nueva
14	1.02	1.92	Puerta Ventana	5.88	Nueva
15	1.53	2.6	Puerta Ventana	8.26	Nueva
16	2.2	2.6	Puerta Ventana	9.6	Nueva
17	1.07	2.6	Puerta Ventana	7.34	Nueva

TERCER NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	4.8	2.28	Fija	14.16	Nueva
2	2.28	2.26	Fija	9.08	Nueva
3	4.8	1.35	Fija	12.3	Nueva
4	3.34	1.35	Fija	9.38	Nueva
5	2.55	2.24	Fija	9.58	Nueva
6	3.02	2.24	Fija	10.52	Nueva
7	1.3	1.35	Fija	5.3	Nueva
8	1.9	1.35	Fija	6.5	Nueva
9	0.8	0.7	Fija	3	Nueva
10	0.8	0.7	Fija	3	Nueva
11	0.705	0.68	Fija	2.77	Nueva
12	1.16	0.68	Fija	3.68	Nueva
13	0.8	0.7	Fija	3	Nueva
14	0.8	0.7	Fija	3	Nueva
15	0.8	0.7	Fija	3	Nueva
16	0.8	0.7	Fija	3	Nueva
17	3.05	0.7	Fija	7.5	Nueva
18	3.05	0.7	Fija	7.5	Nueva
19	3.05	0.7	Fija	7.5	Nueva
20	3.05	0.7	Fija	7.5	Nueva
21	3.05	0.7	Fija	7.5	Nueva
22	1	0.99	Fija	3.98	Nueva
23	0.98	0.7	Fija	3.36	Nueva
24	1.24	1.89	Fija	6.26	Nueva
25	5.38	1.89	Corrediza y fija	14.54	Nueva
26	1.4	1.89	Fija	6.58	Nueva
27	0.95	0.45	Batiente y Fija	2.8	Nueva
28	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
29	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
30	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
31	0.95	0.45	Batiente y Fija	2.8	Nueva
32	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
33	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
34	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
35	0.95	0.45	Batiente y Fija	2.8	Nueva
36	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
37	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
38	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
39	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
40	0.95	0.45	Batiente y Fija	2.8	Nueva
41	1.2	1.19	Batiente y Fija		Limpieza
42	1.2	1.19	Batiente y Fija		Limpieza

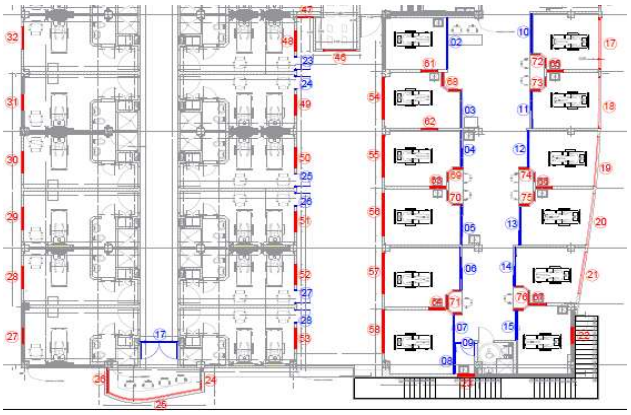

43	0.74	1.21	Batiente y Fija	3.9	Nueva
44	2	1.18	Fija	6.36	Nueva
45	1.8	1.18	Fija	5.96	Nueva
46	1.82	0.7	Fija	5.04	Nueva
47	0.87	2	Batiente y Fija	5.74	Nueva
48	1.2	1.18	Batiente y Fija		Limpieza
49	1.2	1.18	Batiente y Fija		Limpieza
50	1.2	1.18	Batiente y Fija		Limpieza
51	1.2	1.18	Batiente y Fija		Limpieza
52	1.2	1.18	Batiente y Fija		Limpieza
53	1.2	1.18	Batiente y Fija		Limpieza
54	2.5	0.7	Fija	6.4	Nueva
55	2.5	0.7	Fija	6.4	Nueva
56	2.5	0.7	Fija	6.4	Nueva
57	2.5	0.7	Fija	6.4	Nueva
58	2.5	0.7	Fija	6.4	Nueva

TERCER NIVEL


VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
59	1.5	1.04	Fija	5.08	Nueva
60	1.2	1.2	Fija	4.8	Nueva
61	0.9	1.5	Fija	4.8	Nueva
62	0.9	1.5	Fija	4.8	Nueva
63	0.9	1.5	Fija	4.8	Nueva
64	0.9	1.5	Fija	4.8	Nueva
65	0.9	1.5	Fija	4.8	Nueva
66	0.9	1.5	Fija	4.8	Nueva
67	0.9	1.5	Fija	4.8	Nueva
68	1.96	1.7	Fija	7.32	Nueva
69	1.74	1.7	Fija	6.88	Nueva
70	1.54	1.7	Fija	6.48	Nueva
71	2.49	1.7	Fija	8.38	Nueva
72	1.57	1.7	Fija	6.54	Nueva
73	1.73	1.7	Fija	6.86	Nueva
74	1.58	1.7	Fija	6.56	Nueva
75	1.82	1.7	Fija	7.04	Nueva
76	1.98	1.7	Fija	7.36	Nueva
77	2.48	0.7	Fija	6.36	Nueva

TERCER NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	3.2	2.25	Puerta Ventana	10.9	Nueva
2	2.95	2.8	Puerta Ventana	11.5	Nueva
3	2.18	2.8	Puerta Ventana	9.96	Nueva
4	2.15	2.8	Puerta Ventana	9.9	Nueva
5	2.3	2.8	Puerta Ventana	10.2	Nueva
6	2.4	2.8	Puerta Ventana	10.4	Nueva
7 y 8	3.6	2.8	Puerta Ventana	12.8	Nueva

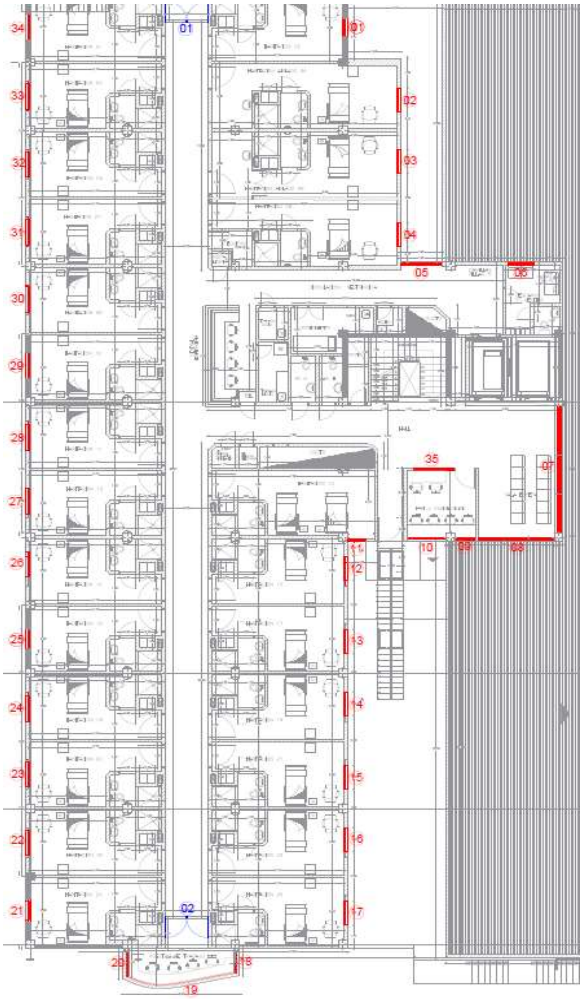

9	1.14	2.8	Puerta Ventana	7.88	Nueva
10	2.22	2.8	Puerta Ventana	10.04	Nueva
11	2.22	2.8	Puerta Ventana	10.04	Nueva
12	2.22	2.8	Puerta Ventana	10.04	Nueva
13	2.24	2.8	Puerta Ventana	10.08	Nueva
14	2.26	2.8	Puerta Ventana	10.12	Nueva
15	1.6	2.8	Puerta Ventana	8.8	Nueva
16	2	2.1	Puerta Ventana	8.2	Nueva
17	2	2.1	Puerta Ventana	8.2	Nueva
18	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
19	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
20	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
21	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
22	0.85	2	Puerta Ventana	5.7	Nueva
23	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
24	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
25	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
26	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
27	0.85	2	Puerta Ventana		Limpieza
28	0.85	2	Puerta Ventana	5.7	Nueva

CUARTO NIVEL

VENTANERIA EXTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	1	1	Batiente y Fija	4	Nueva
2	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
3	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
4	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
5	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
6	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
7	6.35	1.46	Batiente y Fija	15.62	Nueva
8	3.34	1.46	Batiente y Fija	9.6	Nueva
9	0.78	1.46	Fija	4.48	Nueva
10	1.76	1.46	Batiente y Fija	6.44	Nueva
11	1.2	1.3	Batiente y Fija	5	Nueva
12	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
13	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
14	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
15	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
16	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
17	1.3	1.5	Batiente y Fija		Limpieza
18	1.24	1.89	Fija	6.26	Nueva
19	5.38	1.89	Corrediza y fija	14.54	Nueva
20	1.4	1.89	Fija	6.58	Nueva
21	0.95	0.45	Batiente y Fija	2.8	Nueva
22	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
23	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
24	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
25	0.95	0.45	Batiente y Fija	2.8	Nueva
26	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
27	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
28	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
29	0.95	0.45	Batiente y Fija	2.8	Nueva
30	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
31	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
32	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
33	1.3	1.3	Batiente y Fija		Limpieza
34	0.95	0.45	Batiente y Fija	2.8	Nueva

CUARTO NIVEL

VENTANERIA INTERNA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
35	1.64	1.05	Fija y Batiente	5.38	Nueva

CUARTO NIVEL

PUERTA VENTANA

COD	Ancho	Alto	Tipo	Area	Observacion
1	2	2.1	Puerta Ventana		Limpieza
2	2	2.1	Puerta Ventana		Limpieza

OBSERVACIONES:

TOTAL **1,354.76** **metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	4.13	SUMINISTRO GUARDA CAMILLA PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INCLUYE PUNTERA DE REMATE	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Metro lineal			0.00	
PISO 1	Metro lineal	21.5		21.50	
PISO 2	Metro lineal	97.5		97.50	
PISO 3	Metro lineal	85.8		85.80	
PISO 4	Metro lineal			0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL 204.80 **Metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

5.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	ITEM	5.01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad	2		2.00	
PISO 1	Unidad	37		37.00	
PISO 2	Unidad	37		37.00	
PISO 3	Unidad	36		36.00	
PISO 4	Unidad	0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL 112.00 Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


5.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	ITEM	5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad	2		2.00	
PISO 1	Unidad	48		48.00	
PISO 2	Unidad	48		48.00	
PISO 3	Unidad	46		46.00	
PISO 4	Unidad			0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL 144.00 **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


5.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	ITEM	5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad			0.00	
PISO 1	Unidad	2		2.00	
PISO 2	Unidad	2		2.00	
PISO 3	Unidad	1		1.00	
PISO 4	Unidad			0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	5.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.01

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



OBSERVACIONES:

TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ETC)	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones			VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD		
SOTANO	Metro lineal	271	271.00	
PISO 1	Metro lineal	585	585.00	
PISO 2	Metro lineal	710	710.00	
PISO 3	Metro lineal	675	675.00	
PISO 4	Metro lineal	345	345.00	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.02

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



SALIDA APARATO DE DETECCIÓN		UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad	55		55.00	
PISO 1	Unidad	88		88.00	
PISO 2	Unidad	125		125.00	
PISO 3	Unidad	110		110.00	
PISO 4	Unidad	54		54.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL **432.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.03

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



CABLE FPLP		UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Metro lineal	450		450.00	
PISO 1	Metro lineal	1256		1256.00	
PISO 2	Metro lineal	1491		1491.00	
PISO 3	Metro lineal	1418		1418.00	
PISO 4	Metro lineal	724		724.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL 5,339.00 **Metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.04

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



OBSERVACIONES:

BOCINA CON ESTROBO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones			VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD		
SOTANO	Unidad	4	4.00	
PISO 1	Unidad	6	6.00	
PISO 2	Unidad	6	6.00	
PISO 3	Unidad	5	5.00	
PISO 4	Unidad	3	3.00	

TOTAL	24.00	Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.05	DETECTOR DE HUMO FOTNPLECTRICO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad	30		30.00	
PISO 1	Unidad	71		71.00	
PISO 2	Unidad	109		109.00	
PISO 3	Unidad	96		96.00	
PISO 4	Unidad	44		44.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	350.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.06

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



OBSERVACIONES:

DETECTOR TERMICO		UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad	3		3.00	
PISO 1	Unidad	1		1.00	
PISO 2	Unidad	0		0.00	
PISO 3	Unidad	0		0.00	
PISO 4	Unidad	0		0.00	

TOTAL	4.00	Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.07	ESTACION MANUAL DE ALARMA	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad	4		4.00	
PISO 1	Unidad	6		6.00	
PISO 2	Unidad	6		6.00	
PISO 3	Unidad	5		5.00	
PISO 4	Unidad	3		3.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	24.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.08

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



OBSERVACIONES:

MODULO DE MONITOREO		UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad	14		14.00	
PISO 1	Unidad	4		4.00	
PISO 2	Unidad	4		4.00	
PISO 3	Unidad	4		4.00	
PISO 4	Unidad	4		4.00	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION	ITEM	6.09

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



OBSERVACIONES:

PANEL DE CONTROL		UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Unidad	1		1.00	
PISO 1	Unidad	0		0.00	
PISO 2	Unidad	0		0.00	
PISO 3	Unidad	0		0.00	
PISO 4	Unidad	0		0.00	

TOTAL	1.00	Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.01	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
			SOTANO			
					0	
			PISO 1			
			OXIGENO			
	2.93			9	26.37	Observacion pediatria
	1.3			9	11.7	Bajante a toma observación pediatria
	2.86			5	14.3	Observacion ginecopstetricia
	1.3			5	6.5	Bajantes a toma observación ginecopstetricia
	2.12			2	4.24	Procedimientos
	1.3			2	2.6	Bajantes a procedimientos
	4.03			1	4.03	Sala de procedimientos imagenolosgia
	1.3			1	1.3	Bajante a sala de procedimientos imagenologia
	8.85			1	8.85	RX
	1.3			1	1.3	Bajante a RX
	5.66			1	5.66	TAC
	1.3			1	1.3	Bajante a TAC
	5.1			1	5.1	Procedimientos acepticos
	5.64			1	5.64	Sala de yesos
	14.04			1	14.04	Reanimación
	1.3			2	2.6	Bajantes reanimación
	6.16			1	6.16	Triaje 1 y 2
	1.3			2	2.6	Bajantes triaje 1 y 2
	10.74			1	10.74	Monitoreo ginecopstetricia
	1.3			3	3.9	Bajantes monitoreo ginecopstetricia
	10.79			1	10.79	Sala ERA
	1.3			5	6.5	Bajantes sala ERA
					0	
					0	
			PISO 2			
			OXIGENO			
	5.8			4	23.2	UARO 1-2-3-4
	1.3			4	5.2	Bajante uaro 1-2-3-4
	5.56			1	5.56	UARO 5
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 5
	9.88			1	9.88	UARO 6
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 6
	4.83			1	4.83	UARO 7
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 7
	4.88			1	4.88	UARO 8
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 8
	5.82			1	5.82	UARO 9
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 9
	3.22			4	12.88	Intensivos neonatal
	2.98			2	5.96	
	2.38			2	4.76	
	5.45			1	5.45	
	2.93			1	2.93	
	1			8	8	
	1.3			18	23.4	Bjantes Intensivos neonatal
	1.85			2	3.7	Intermedios Neonatal
	2.82			2	5.64	
	5.01			2	10.02	
	1.97			1	1.97	
	2.1			1	2.1	
	1.7			1	1.7	
	1.84			2	3.68	
	1.72			1	1.72	
	0.78			6	4.68	
	6.87			1	6.87	
	1.94			5	9.7	
	1.6			6	9.6	
	1.92			6	11.52	
	1.46			9	13.14	
	10.7			1	10.7	
	1.3			46	59.8	Bjantes intermedios Neonatal
	10.56			1	10.56	Recuperación partos
	2.7			4	10.8	
	2.65			2	5.3	
	1.3			7	9.1	Bajantes recuperacion partos
	5.04			2	10.08	Trabajo de partos
	2.93			1	2.93	
	2.71			1	2.71	
	4.6			2	9.2	
	1.3			6	7.8	Bajantes trabajo de partos
	5.86			1	5.86	Sala de partos 1
	1.3			1	1.3	Bajante sala de partos 1
	5.15			1	5.15	Sala de partos 2
	1.3			1	1.3	Bajante sala de partos 2
	6.21			1	6.21	Quirofano 1
	1.1			1	1.1	
	1.3			2	2.6	Bajante quirofano 1
	5.64			1	5.64	Quirofano 2
	1.25			1	1.25	
	1.3			2	2.6	Bajante quirofano 2
	5.95			1	5.95	Quirofano 3
	1.25			1	1.25	
	1.3			2	2.6	Bajante quirofano 3
	2.95			2	5.9	Recuperacion de cirugia
	2.53			1	2.53	
	2.59			3	7.77	
	2.65			1	2.65	
	2.3			1	2.3	
	2.1			1	2.1	
	1.3			9	11.7	Bajantes recuperacion de cirugia
					0	
					0	
			AIRE MEDICINAL			
	5.56			1	5.56	Intensivos neonatal
	4.06			1	4.06	
	2.17			1	2.17	
	3.03			1	3.03	
	1.79			1	1.79	
	1.19			3	3.57	
	3.33			1	3.33	
	3.52			1	3.52	
	1.62			1	1.62	
	4.42			2	8.84	
	1.3			13	16.9	Bajantes intensivos Neonatal

1.38			3	4.14	
0.99			3	2.97	
1.75			3	5.25	
1.8			3	5.4	Intermedios neonatal
2.11			3	6.33	
1.66			4	6.64	
11.38			1	11.38	
1.3			20	26	Bajantes intermedios neonatal
5.89			1	5.89	Quirofano 1
1.3			1	1.3	
1.3			1	1.3	Bajante quirofano 1
5.63			1	5.63	Quirofano 2
1.44			1	1.44	
1.3			1	1.3	Bajante quirofano 2
5.93			1	5.93	Quirofano 3
1.44			1	1.44	
1.3			1	1.3	Bajante quirofano 3
		NITROGENO			
1.3			3	3.9	Bajantes a quirofanos 1, 2 y 3
		CO2			
13			3	39	Bajantes a quirofanos 1, 2 y 3
				0	
		PISO 3			
		OXIGENO			
9.04			1	9.04	Habitacion 301
6.57			1	6.57	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 301
6.26			1	6.26	Habitacion 302
8.22			1	8.22	
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 302
8.1			1	8.1	Habitacion 303
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 303
10.27			1	10.27	Habitacion 304
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 304
7.96			1	7.96	Habitacion 305
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 305
10.2			1	10.2	Habitacion 306
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 306
8.08			1	8.08	Habitacion 307
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 307
10.28			1	10.28	Habitacion 308
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 308
7.57			1	7.57	Habitacion 309
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 309
7.85			1	7.85	Habitacion 310
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 310
7.56			1	7.56	Habitacion 311
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 311
7.56			1	7.56	Habitacion 312
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 312
6.57			1	6.57	Habitacion 313
8.62			1	8.62	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 313
7.56			1	7.56	Habitacion 314
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 314
6.37			1	6.37	Habitacion 315
8.42			1	8.42	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 315
7.56			1	7.56	Habitacion 316
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 316
8.41			1	8.41	Habitacion 317
6.37			1	6.37	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 317
7.57			1	7.57	Habitacion 318
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 318
6.47			1	6.47	Habitacion 319
8.51			1	8.51	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 319
7.56			1	7.56	Habitacion 320
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 320
8.4			1	8.4	Habitacion 321
6.36			1	6.36	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 321
7.56			1	7.56	Habitacion 322
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 322
6.3			1	6.3	Habitacion 323
8.46			1	8.46	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 323
7.48			1	7.48	Habitacion 324
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 324
8.56			1	8.56	Habitacion 325
6.4			1	6.4	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 325
6.66			1	6.66	UCI peadiatrica asilado 1
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica aislado 1
4.96			1	4.96	UCI peadrica 2
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 2
6.66			1	6.66	UCI peadrica 3
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 3
4.97			1	4.97	UCI peadrica 4
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 4
6.59			1	6.59	UCI peadrica 5
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 5
4.97			1	4.97	UCI peadrica 6
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 6
6.64			1	6.64	UCI peadrica 7
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 7
4.33			1	4.33	UCI peadrica 8
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 8
6.36			1	6.36	UCI peadrica 9
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 9
3.88			1	3.88	UCI peadrica 10
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 10
6.36			1	6.36	UCI peadrica 11
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 11
4.75			1	4.75	UCI peadrica 12
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 12
				0	
		AIRE MEDICINAL			
6.35			1	6.35	UCI peadiatrica asilado 1
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica aislado 1
5.16			1	5.16	UCI peadrica 2
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 2
6.35			1	6.35	UCI peadrica 3
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 3
5.17			1	5.17	UCI peadrica 4
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 4
6.5			1	6.5	UCI peadrica 5
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 5
5.17			1	5.17	UCI peadrica 6
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 6

6.34			1	6.34	UCI peadrica 7
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 7
4.53			1	4.53	UCI peadrica 8
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 8
6.26			1	6.26	UCI peadrica 9
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 9
4.07			1	4.07	UCI peadrica 10
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 10
6.26			1	6.26	UCI peadrica 11
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 11
5.06			1	5.06	UCI peadrica 12
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 12
				0	
PISO 4					
OXIGENO					
763			1	763	Habitacion 401
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 401
6.68			1	6.68	Habitacion 402
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 402
7.72			1	7.72	Habitacion 403
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 403
8.22			1	8.22	Habitacion 404
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 404
7.52			1	7.52	Habitacion 405
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 405
8.22			1	8.22	Habitacion 406
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 406
7.74			1	7.74	Habitacion 407
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 407
8.22			1	8.22	Habitacion 408
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 408
7.54			1	7.54	Habitacion 409
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 409
7.68			1	7.68	Habitacion 410
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 410
7.27			1	7.27	Habitacion 411
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 411
8.67			1	8.67	Habitacion 412
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 412
7.97			1	7.97	Habitacion 413
1.72			1	1.72	
1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 413
7.5			1	7.5	Habitacion 414
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 414
6.56			1	6.56	Habitacion 415
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 415
7.7			1	7.7	Habitacion 416
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 416
6.7			1	6.7	Habitacion 417
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 417
7.51			1	7.51	Habitacion 418
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 418
6.56			1	6.56	Habitacion 419
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 419
7.68			1	7.68	Habitacion 420
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 420
6.69			1	6.69	Habitacion 421
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 421
7.47			1	7.47	Habitacion 422
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 422
6.56			1	6.56	Habitacion 423
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 423
7.82			1	7.82	Habitacion 424
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 424
6.91			1	6.91	Habitacion 425
1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 425
42.93			1	42.93	Red de distribuion costado norte
				0	Red de distribucion costado Sur
				0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **2,273.22** **Metro lineal**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.02	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 3/4". INCLUYE ACCESORIOS.	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
			SOTANO			
			NITROGENO			
	19.01			1	19.01	Red central de cuarto de gases a witron
	6			1	6	Witron a primer nivel
			CO2			
	19.41			1	19.41	Red central de cuarto de gases a witron
	6			1	6	Witron a primer nivel
					0	
			PRIMER NIVEL			
			NITROGENO			
	57.3			1	57.3	Red central
	2.8			1	2.8	Witron a primer nivel
	6.65			1	6.65	
	7.65			1	7.65	
	11.11			1	11.11	De alarmas aereas a cajas de corte en observacion
	10.91			1	10.91	pediatrica
	8.26			1	8.26	
	7.66			1	7.66	
			CO2			
	58.1			1	58.1	Red central
	2.8			1	2.8	Witron a primer nivel
					0	
			VACIO			
	2.69			9	24.21	Observación pediatria
	1.3			9	11.7	Bajante toma
	3.12			5	15.6	Observacion ginecopstetricia
	1.3			5	6.5	Bajante toma
	2.38			2	4.76	procedimientos
	1.3			2	2.6	Bajante toma
	3.7			1	3.7	sala procedimientos imagenologia
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	4.92			1	4.92	procedimeintos asepticos
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	2.83			3	8.49	Monitoreo ginecopstetricia
	1.3			3	3.9	Bajante toma
	4.39			2	8.78	Reanimación
				2		Bajante toma
			SEGUNDO NIVEL			
			AIRE MEDICINAL			
	62.83			1	62.83	Red central a quierofanos
	10.49			1	10.49	Red intensivos neonatal
	24.92			1	24.92	
	16.54			1	16.54	Red intermedios neonatal
	4.92			1	4.92	
	1.35			2	2.7	Ramal a caja de corte quirofanos
			NITROGENO			
	33.92			1	33.92	Red principal desde witron
	8.8			1	8.8	De alarma aerea a caja de corte en recuperacion partos
	9.78			1	9.78	
	6.72			1	6.72	
	6.37			1	6.37	
	6.02			1	6.02	
	9			1	9	
	9.25			1	9.25	De alarmas aereas a cajas de corte en UCI neonatal
	9.5			1	9.5	
	4.55			1	4.55	
	4.95			1	4.95	
	5.35			1	5.35	
	10.92			1	10.92	
	10.79			1	10.79	
	2.86			1	2.86	
	2.76			1	2.76	
	12.82			1	12.82	
	12.57			1	12.57	De alarmas aereas a cajas de corte en zona de quierofanos
	16.98			2	33.96	
	14.36			5	71.8	
	3.25			1	3.25	
	6.97			1	6.97	
	6.35			1	6.35	Quirofano 1
	7.16			1	7.16	Quirofano 2
	7.38			1	7.38	Quirofano 3
					0	
			CO2			
	33.57			1	33.57	Red principal desde witron
	5.86			1	5.86	Quirofano 1
	6.67			1	6.67	Quirofano 2
	6.88			1	6.88	Quirofano 3
					0	
			VACIO			
	34.83			1	34.83	UARO 1 Y 9
	1.3			2	2.6	Bajante toma
	5.61			3	16.83	UARO 2, 3 Y 4
	1.3			3	3.9	Bajante toma
	6.44			1	6.44	UARO 5
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	10.16			1	10.16	UARO Aislada
	5.11			1	5.11	UARO 7
	4.7			1	4.7	UARO 8
	4.17			1	4.17	Intensivos neonatal
	5.66			1	5.66	
	3.94			1	3.94	
	1.98			1	1.98	
	2.84			1	2.84	
	3.03			1	3.03	
	3.94			1	3.94	Intensivos neonatal
	1.84			1	1.84	
	1.84			1	1.84	
	3.23			1	3.23	
	1.4			2	2.8	
	1.44			1	1.44	
	1.3			12	15.6	Bajante toma
	1.02			2	2.04	
	1.15			1	1.15	
	2.02			3	6.06	
	1.56			3	4.68	
	2.3			1	2.3	Intermedios Neoanatal
	2.01			2	4.02	

2.33			3	6.99	
1.88			4	7.52	
12.1			1	12.1	
1.3			20	26	Bajante toma
2.52			4	10.08	Recuperación partos
10.83			1	10.83	
2.86			2	5.72	
1.3			7	9.1	Bajante toma
5.25			2	10.5	Trabajo de partos
3.13			1	3.13	
16.59			1	16.59	
4.47			2	8.94	
1.3			6	7.8	Bajante toma
4.56			1	4.56	Sala de partos 1
5.81			1	5.81	Sala de partos 2
1.3			5	6.5	Bjantes tomas de salas de parto y quierofanos
1.89			1	1.89	Recuperación de cirugia
2.1			1	2.1	
3.17			2	6.34	
2.75			1	2.75	
2.45			1	2.45	
2.81			3	8.43	
TERCER NIVEL					
NITROGENO					
3.53			1	3.53	De alarmas aereas a cajas de corte en central de enfermeria
3.93			1	3.93	
8.87			1	8.87	
9.02			1	9.02	
11.66			1	11.66	
11.26			1	11.26	
OXIGENO					
12.92			1	12.92	Procedimeintos
1.3			1	1.3	Bajante toma
21.5			1	21.5	Red a ludoteca y puntos de toma
5.7			2	11.4	
1.3			2	2.6	Bajantes tomas
				0	
VACIO					
6.23			1	6.23	Habitacion 301
8.68			1	8.68	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
6.58			1	6.58	Habitacion 302
8.56			1	8.56	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
7.74			1	7.74	Habitacion 303
1.3			1	1.3	Bajante toma
10.72			1	10.72	Habitacion 304
1.3			1	1.3	Bajante toma
7.59			1	7.59	Habitacion 305
1.3			1	1.3	Bajante toma
10.63			1	10.63	Habitacion 306
1.3			1	1.3	Bajante toma
7.72			1	7.72	Habitacion 307
1.3			1	1.3	Bajante toma
10.63			1	10.63	Habitacion 308
1.3			1	1.3	Bajante toma
7.1			1	7.1	Habitacion 309
1.3			1	1.3	Bajante toma
7.49			1	7.49	Habitacion 310
1.3			1	1.3	Bajante toma
7.19			1	7.19	Habitacion 311
1.3			1	1.3	Bajante toma
7.19			1	7.19	Habitacion 312
1.3			1	1.3	Bajante toma
6.85			1	6.85	Habitacion 313
8.9			1	8.9	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
7.19			1	7.19	Habitacion 314
1.3			1	1.3	Bajante toma
6.66			1	6.66	Habitacion 315
8.7			1	8.7	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
7.19			1	7.19	Habitacion 316
1.3			1	1.3	Bajante toma
8.69			1	8.69	Habitacion 317
6.66			1	6.66	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
7.19			1	7.19	Habitacion 318
1.3			1	1.3	Bajante toma
6.75			1	6.75	Habitacion 319
8.79			1	8.79	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
7.19			1	7.19	Habitacion 320
1.3			1	1.3	Bajante toma
8.68			1	8.68	Habitacion 321
6.64			1	6.64	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
7.19			1	7.19	Habitacion 322
1.3			1	1.3	Bajante toma
6.7			1	6.7	Habitacion 323
8.86			1	8.86	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
7.11			1	7.11	Habitacion 324
1.3			1	1.3	Bajante toma
8.96			1	8.96	Habitacion 325
6.79			1	6.79	
1.3			2	2.6	Bajantes de tomas
AIRE MEDICINAL					
22.25			1	22.25	red de distribucion UCI pediatrica
15.44			1	15.44	Red central de witron a caja de distribución
				0	
CUARTO NIVEL					
NITROGENO					
8			1	8	De alarmas aereas a valbulas de corte en central de enfermeria
7.9			1	7.9	
12.06			1	12.06	
11.9			1	11.9	
				0	
VACIO					
6.84			1	6.84	Habitacion 401
1.3			1	1.3	Bajante toma
7.11			1	7.11	Habitacion 402
1.3			1	1.3	Bajante toma
6.93			1	6.93	Habitacion 403
1.3			1	1.3	Bajante toma
8.95			1	8.95	Habitacion 404
1.3			1	1.3	Bajante toma
6.74			1	6.74	Habitacion 405
1.3			1	1.3	Bajante toma
8.65			1	8.65	Habitacion 406
1.3			1	1.3	Bajante toma

	6.95			1	6.95	Habitacion 407
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	8.65			1	8.65	Habitacion 408
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.75			1	6.75	Habitacion 409
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.9			1	6.9	Habitacion 410
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.6			1	6.6	Habitacion 411
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.73			1	6.73	Habitacion 412
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	8.25			1	8.25	Habitacion 413
	2.01			1	2.01	
	1.3			2	2.6	Bajante toma
	6.71			1	6.71	Habitacion 414
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.84			1	6.84	Habitacion 415
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.92			1	6.92	Habitacion 416
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.97			1	6.97	Habitacion 417
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.72			1	6.72	Habitacion 418
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.84			1	6.84	Habitacion 419
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.89			1	6.89	Habitacion 420
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.97			1	6.97	Habitacion 421
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.69			1	6.69	Habitacion 422
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	6.84			1	6.84	Habitacion 423
	1.3			1	1.3	Bajante toma
	7.03			1	7.03	Habitacion 424
	1.13			1	1.13	Bajante toma
	7.18			1	7.18	Habitacion 425
	1.3				1.3	Bajante toma
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **1,834.93** **Metro lineal**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ITEM**	7.03	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1". INCLUYE ACCESORIOS.	**UNIDAD**	Metro lineal	**UBICACIÓN**	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	SOTANO					
	OXIGENO					
					0	
					0	
					0	
	PRIMER NIVEL					
	OXIGENO					
	2.8			1	2.8	Witron a segundo nivel
	29.68			1	29.68	Red central pasillo reanimación
	8.35			1	8.35	Red monitoreo ginecopstetricia
	8.93			1	8.93	
	14.54			1	14.54	
	21.03			1	21.03	De red central a observacion Ginecopstetricia
	14.32			1	14.32	Red a observacion pediatrica
	7.64			1	7.64	
	9.01			1	9.01	Red procedimientos
					0	
	DSEGUNDO NIVEL					
	OXIGENO					
	3.57			1	3.57	Red central UARO
	23.19			1	23.19	
	10.04			1	10.04	Red intensivos neonatal
	24.11			1	24.11	Red intermedios neonatal
	15.86			1	15.86	
	21.62			1	21.62	De red central a caja de corte triple en UCI neonatal
	28.79			1	28.79	Red central a quirofanos y sals de partos
	27.84			1	27.84	
	14.13			1	14.13	Red central preparacion partos
	14.63			1	14.63	Red rcuperación partos
	13.29			1	13.29	Red recuperacion de cirugia ambulatoria
					0	
	TERCER NIVEL NIVEL					
	OXIGENO					
	2.8			1	2.8	Witron de piso 2 a piso 3
	15.42			1	15.42	Red a UCI Pediatrica
	24.64			1	24.64	
	6.36			1	6.36	Red a caja de corte doble en central de enfermeria
	9.21			1	9.21	Red a caja de corte de habitaciones 6 y 7
	10.1			1	10.1	Red a habitaciones 1 y 2
	28.5			1	28.5	Red de habitaciones costado occcidental
	21.37			1	21.37	Red de habitaciones costado oriental
	TERCER NIVEL NIVEL					
	OXIGENO					
	45.01			1	45.01	Red de distribucion costado sur
	42.93			1	42.93	Red de distribucion costado norte
	6.77			1	6.77	De witron a red central
	2.8			1	2.8	Witron de tercer a cuarto nivel
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **529.28** **Metro lineal**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.04	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	SOTANO					
	AIRE MEDICINAL					
	20.22			1	20.22	Red principal de cuarto de gases a witron
	6			1	6	Witron a primer nivel
	OXIGENO					
	90.11			1	90.11	De Tanque criogenico a witron
					0	
	PRIMER NIVEL					
	AIRE MEDICINAL					
	59.7			1	59.7	Red principal de witron a primer nivel a witron de segundo nivel
	2.8			1	2.8	witron a segundo nivel
					0	
	DSEGUNDO NIVEL					
	AIRE MEDICINAL					
	5.29			1	5.29	De witron a distribucion de red
	5.07			1	5.07	
					0	
	TERCER NIVEL NIVEL					
	AIRE MEDICINAL					
	2.8			1	2.8	Witron de segundo a tercer nivel
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **191.99** **Metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.05	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - O2	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico



Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	**SOTANO**
-	-	-	18	18.0	**NIVEL 1**
-	-	-	49	49.0	**NIVEL2**
-	-	-	42	42.0	**NIVEL 3**
-	-	-	13	13.0	**NIVEL 4**

OBSERVACIONES:

TOTAL	122.00	Unidad


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.06	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - VAC	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

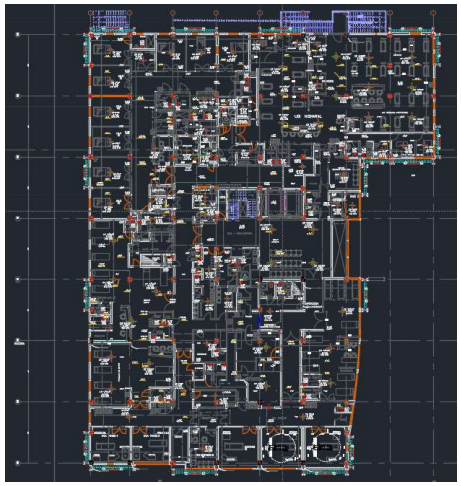

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	**SOTANO**
-	-	-	21	21.0	**NIVEL 1**
-	-	-	56	56.0	**NIVEL2**
-	-	-	49	49.0	**NIVEL 3**
-	-	-	14	14.0	**NIVEL 4**

OBSERVACIONES:

TOTAL	140.00	Unidad


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.07	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - AIR	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

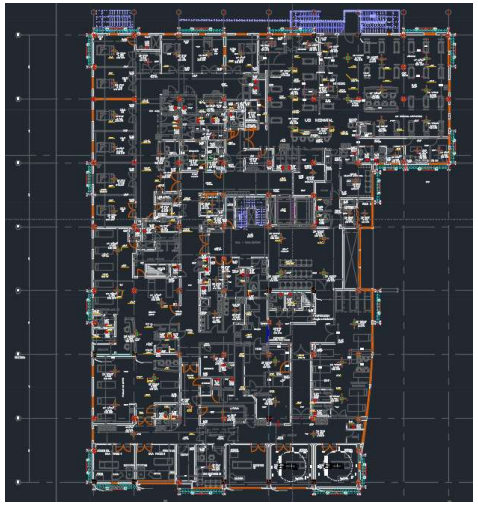

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	SOTANO
-	-	-	16	16.0	NIVEL 1
-	-	-	45	45.0	NIVEL2
-	-	-	39	39.0	NIVEL 3
-	-	-	12	12.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	112.00	Unidad


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.08	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 1 GAS INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

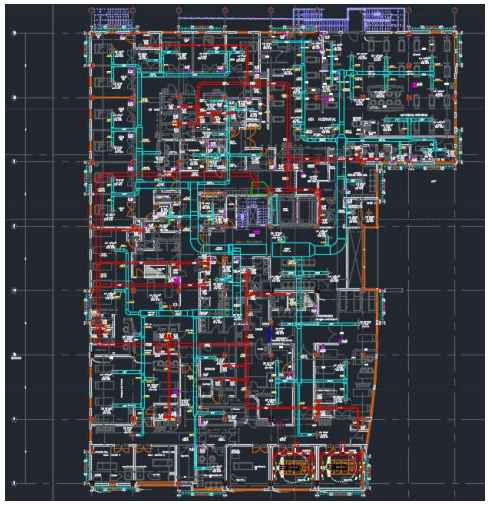

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	SOTANO
-	-	-	1	1.0	NIVEL 1
-	-	-	2	2.0	NIVEL2
-	-	-	2	2.0	NIVEL 3
-	-	-	1	1.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	6.00	Unidad


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.09	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 3 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

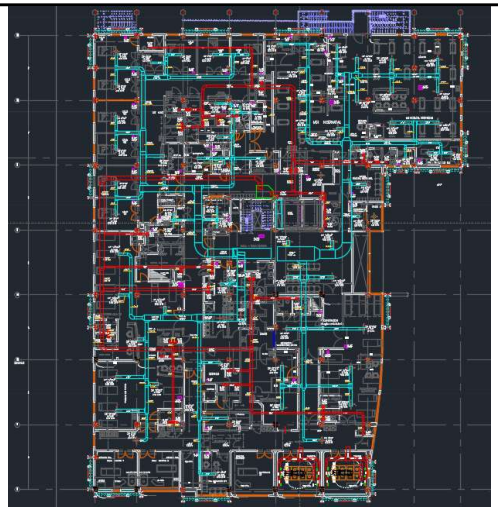

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	SOTANO
-	-	-	3	3.0	NIVEL 1
-	-	-	4	4.0	NIVEL2
-	-	-	4	4.0	NIVEL 3
-	-	-	3	3.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	14.00	Unidad


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.10	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 6 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

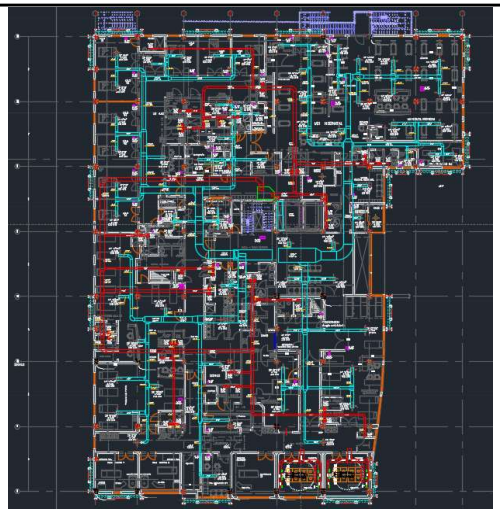

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	SOTANO
-	-	-	0	0.0	NIVEL 1
-	-	-	0	0.0	NIVEL2
-	-	-	3	3.0	NIVEL 3
-	-	-	0	0.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	3.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.12	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS EN SS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-3/4". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				1	1	Quirofano 1
				1	1	Quirofano 2
				1	1	Quirofano 3
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **3.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.13	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"- 1/2"-1". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	PISO 2					
				3	3	UCI NEONATAL
					0	
	PISO 3					
				1	1	UCI PEDIATRICA
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **4.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.14	CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA CO2 Y N2O (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6788 Y UN REGULADOR DE LINEA CONCOA 6798 CON BY-PASS)	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				1	1	En sotano aire medicinal
				1	1	En sotano nitrogeno
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **2.00** **Unidad**


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.15	CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA O2 Y AIRE DE ALTO FLUJO >45 NM3/HR (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6716 Y UN REGULADOR DE LÍNEA CONCOA 6794 Ó REGO 1784 CON BY-PASS)	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

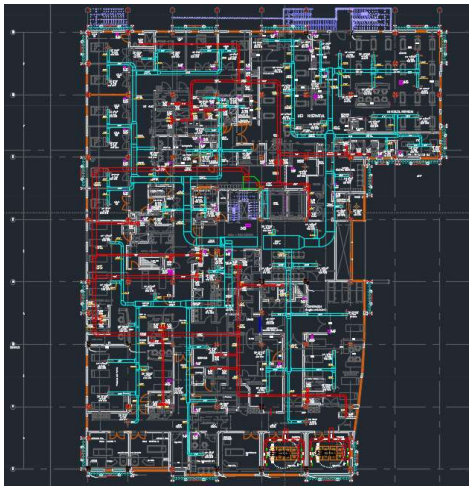

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	SOTANO
-	-	-	1	1.0	NIVEL 1
-	-	-	0	0.0	NIVEL2
-	-	-	0	0.0	NIVEL 3
-	-	-	0	0.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	1.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONFALTO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.16	ESTRUCTURA PARA MANIFOLD 2X2 CON SOPORTES, VÁLVULAS DE CORTE DE ALTA PRESIÓN POR CILINDRO Y MANGUERAS IMPORTADAS. PARA INSTALAR A MURO.	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				1	1	nitrogeno
				1	1	Gas medisinal
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **2.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.17	RACOR DISS PARA QUIROFANO PISO 2	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				5	5	Oxigeno, vacio y gas medisinal
				5	5	Oxigeno, vacio y gas medisinal
				5	5	Oxigeno, vacio y gas medisinal
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **15.00** **Unidad**


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.18	RACOR DISS PARA UCI PISO 2	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

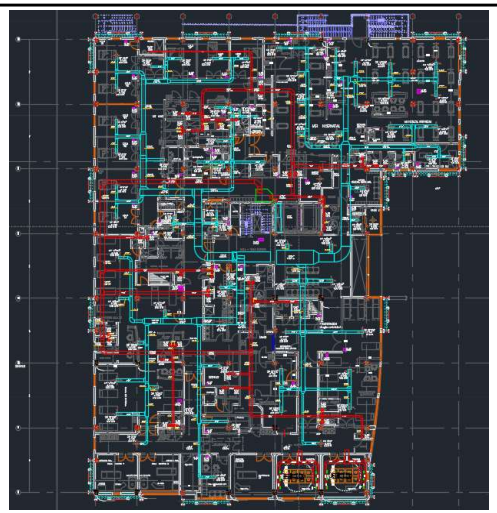

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	SOTANO
-	-	-	0	0.0	NIVEL 1
-	-	-	186	186.0	NIVEL2
-	-	-	0	0.0	NIVEL 3
-	-	-	0	0.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	186.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.19	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS GENTEC 3816E- AGS, INCLUYE CAJA EN A. INOX. PARA MONTAJE EN PARED	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				1	1	Quirofano 1
				1	1	Quirofano 2
				1	1	Quirofano 3
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **3.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.20	SISTEMA PULMÓN MEDICINAL (INTERCONEXIÓN SISTEMA PRINCIPAL Y SISTEMA BACKUP) - PLANO DAE-1154. INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				1	1	Sistema de respaldo en sotano aire medicinal
				1	1	Sistema de respaldo para oxigeno
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **2.00** **Unidad**


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	ITEM	7.21	TOMA PANEL CONNECT II SERIE 400 VACÍO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

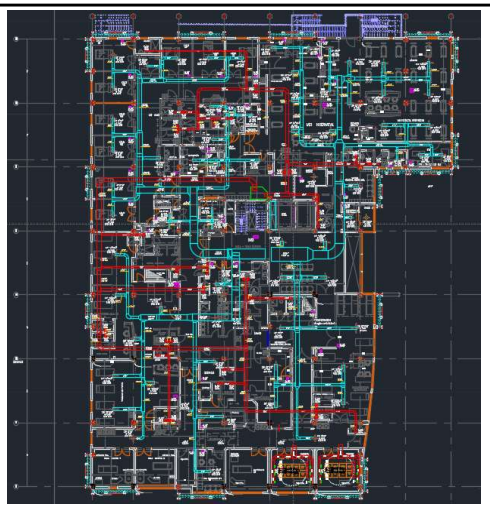

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-	0	0.00	SOTANO
-	-	-	0	0.0	NIVEL 1
-	-	-	18	18.0	NIVEL2
-	-	-	0	0.0	NIVEL 3
-	-	-	0	0.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	18.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ITEM**	7.22	UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 3/4" PARA TANQUE, TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL SAM CON FILTROS EN Y Y REGULADORES REGO ALTO FLUJO	**UNIDAD**	Unidad	**UBICACIÓN**	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				1	1	Aire medicinal
				1	1	Oxigeno
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **2.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.23	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				PISO 1		
				1	1	oxigeno cerca a witron a segundo nivel
				PISO 2		
				1	1	oxigeno cerca a witron a tercer nivel
				PISO 3		
				1	1	oxigeno cerca a witron a cuarto nivel
				PISO 4		
				1	1	oxigeno cerca a witron
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	4.00	Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.24	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
		PISO 1				
		OXIGENO				
				9	9	Bajante a toma observación pediatria
				5	5	Bajantes a toma observación ginecopstetricia
				2	2	Bajantes a procedimientos
				1	1	Bajante a sala de procedimientos imagenologia
				1	1	Bajante a RX
				1	1	Bajante a TAC
				2	2	Bajantes reanimación
				2	2	Bajantes triaje 1 y 2
				3	3	Bajantes monitoreo ginecopstetricia
				5	5	Bajantes sala ERA
					0	
		PISO 2				
		OXIGENO				
				4	4	Bajante uaro 1-2-3-4
				1	1	Bajante UARO 5
				1	1	Bajante UARO 6
				1	1	Bajante UARO 7
				1	1	Bajante UARO 8
				1	1	Bajante UARO 9
				18	18	Bjantes Intensivos neonatal
				46	46	Bjantes intermedios Neonatal
				7	7	Bajantes recuperacion partos
				6	6	Bajantes trabajo de partos
				1	1	Bajante sala de partos 1
				1	1	Bajante sala de partos 2
				2	2	Bajante quirofano 1
				2	2	Bajante quirofano 2
				2	2	Bajante quirofano 3
				9	9	Bajantes recuperacion de cirugia
		AIRE MEDICINAL				
				13	13	Bajantes intensivos Neonatal
				20	20	Bajantes intermedios neonatal
				1	1	Bajante quirofano 1
				1	1	Bajante quirofano 2
				1	1	Bajante quirofano 3
					0	
		PISO 3				
		OXIGENO				
				2	2	Bajantes habitacion 301
				1	1	Bajantes habitacion 302
				1	1	Bajantes habitacion 303
				1	1	Bajantes habitacion 304
				1	1	Bajantes habitacion 305
				1	1	Bajantes habitacion 306
				1	1	Bajantes habitacion 307
				1	1	Bajantes habitacion 308
				1	1	Bajantes habitacion 309
				1	1	Bajantes habitacion 310
				1	1	Bajantes habitacion 311
				1	1	Bajantes habitacion 312
				2	2	Bajantes habitacion 313
				1	1	Bajantes habitacion 314
				2	2	Bajantes habitacion 315
				1	1	Bajantes habitacion 316
				2	2	Bajantes habitacion 317
				1	1	Bajantes habitacion 318
				2	2	Bajantes habitacion 319
				1	1	Bajantes habitacion 320
				2	2	Bajantes habitacion 321
				1	1	Bajantes habitacion 322
				2	2	Bajantes habitacion 323
				1	1	Bajantes habitacion 324
				2	2	Bajantes habitacion 325
				1	1	Bajante UCI pediatrica aislado 1
				1	1	Bajante UCI pediatrica 2
				1	1	Bajante UCI pediatrica 3
				1	1	Bajante UCI pediatrica 4
				1	1	Bajante UCI pediatrica 5
				1	1	Bajante UCI pediatrica 6
				1	1	Bajante UCI pediatrica 7
				1	1	Bajante UCI pediatrica 8
				1	1	Bajante UCI pediatrica 9
				1	1	Bajante UCI pediatrica 10
				1	1	Bajante UCI pediatrica 11
				1	1	Bajante UCI pediatrica 12
		AIRE MEDICINAL				
				1	1	Bajante UCI pediatrica aislado 1
				1	1	Bajante UCI pediatrica 2
				1	1	Bajante UCI pediatrica 3
				1	1	Bajante UCI pediatrica 4
				1	1	Bajante UCI pediatrica 5
				1	1	Bajante UCI pediatrica 6
				1	1	Bajante UCI pediatrica 7
				1	1	Bajante UCI pediatrica 8
				1	1	Bajante UCI pediatrica 9
				1	1	Bajante UCI pediatrica 10
				1	1	Bajante UCI pediatrica 11
				1	1	Bajante UCI pediatrica 12
					0	
		PISO 4				
		OXIGENO				
				1	1	Habitacion 401
				1	1	Habitacion 402
				1	1	Habitacion 403
				1	1	Habitacion 404
				1	1	Habitacion 405
				1	1	Habitacion 406
				1	1	Habitacion 407
				1	1	Habitacion 408
				1	1	Habitacion 409
				1	1	Habitacion 410
				1	1	Habitacion 411
				1	1	Habitacion 412
				1	1	Habitacion 413
				2	2	Habitacion 413
				1	1	Habitacion 414
				1	1	Habitacion 415
				1	1	Habitacion 416
				1	1	Habitacion 417
				1	1	Habitacion 418
				1	1	Habitacion 419
				1	1	Habitacion 420

				1	1	Habitacion 421
				1	1	Habitacion 422
				1	1	Habitacion 423
				1	1	Habitacion 424
				1	1	Habitacion 425

OBSERVACIONES:

TOTAL **254.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.25	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	PISO 2					
				1	1	Valvla de corte en ered central
	PISO 3					
				1	1	Valvula de corte a UCI pediatrica
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL 2.00 Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
7.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	7.26	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 3/4". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	PISO 1					
				6	6	Nitrgeno
	PISO 2					
				1	1	Co2
				23	23	Nitrogeno
	PISO 3					
				6	6	Nitrogeno
	PISO 4					
				4	4	NItrogeno
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	40.00	Unidad


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

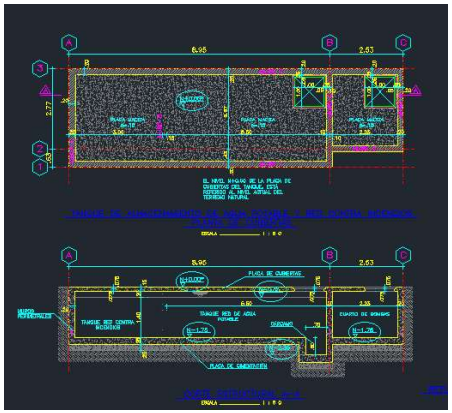

Dimensiones				Area (m2)	Ubicación
Longitud	Altura	Area m2	Cantidad		
8	15	120	1	120.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	120.00	Metro Cuadrado


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.02	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

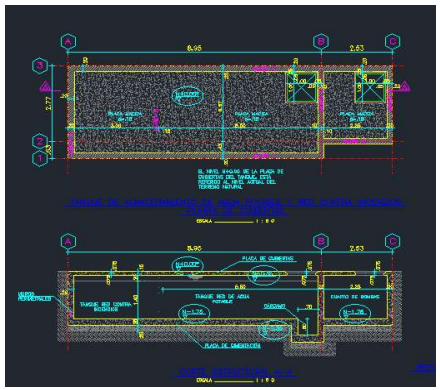

Dimensiones				Volumen (m3)	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
6.4	2.8	13.2	1	236.5	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	236.54	metro cubico


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

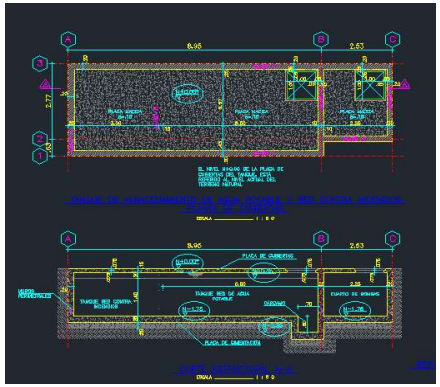

Dimensiones				Volumen (m3)	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
6.4	0.6	3.5	1	13.6	
6.4	0.5	13.2	1	42.2	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL							55.83	metro cubico


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

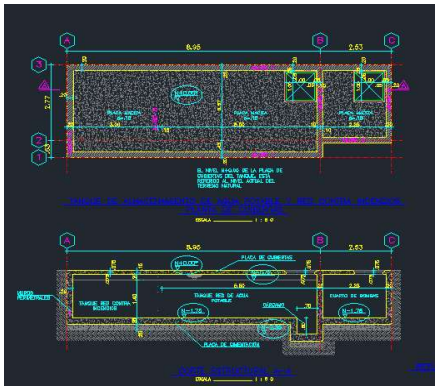

Dimensiones				Volumen (m3)	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
6.4	0.2	0.7	1	0.9	
6.4	0.2	13.2	1	16.9	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL							17.79	metro cubico


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.05	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	UNIDAD	M3-km	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

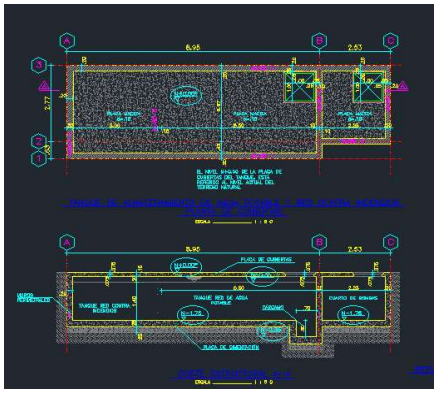

Dimensiones				m3-km	Ubicación
m3	Dosificacion	Km	M3		
					ARENA
19.36	0.508	16.8	12.79	214.8	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
18.3	0.508	16.8	12.09	203.0	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS
			0.00	0.0	**TRITURADO**
19.36	0.713	16.8	17.94	301.5	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
18.3	0.713	16.8	16.96	285.0	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	1,004.27	M3-km


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	UNIDAD	M3-km	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

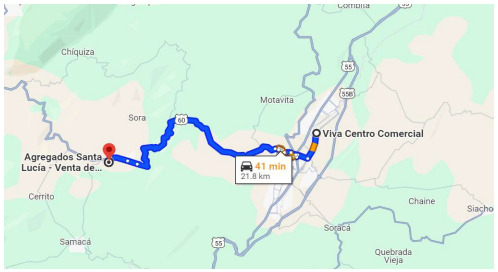

Dimensiones				m3-km	Ubicación
Longitud	Altura	m3	km		
		236.54	16.8	3973.9	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM
		17.79	16.8	298.9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
		17.79	16.8	298.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

OBSERVACIONES:

TOTAL				4,571.62	M3-km


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.07	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	UNIDAD	metro cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

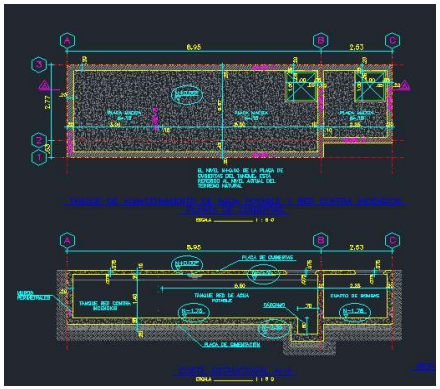

Dimensiones				Area (m2)	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
6.4	2.8		2	35.8	
13.2	2.8		2	73.9	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL				109.76	metro cuadrado


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.08	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPA (2000PSI)	UNIDAD	metro cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

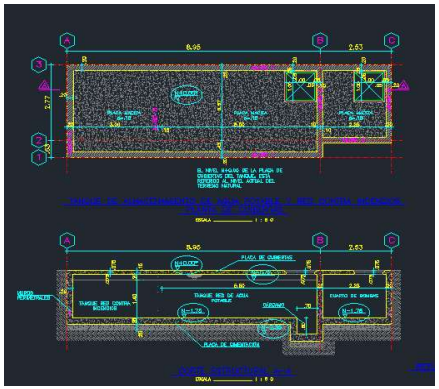

Dimensiones				Area (m2)	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
6.4	13.2		1	84.5	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL							84.48	metro cuadrado


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.09	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

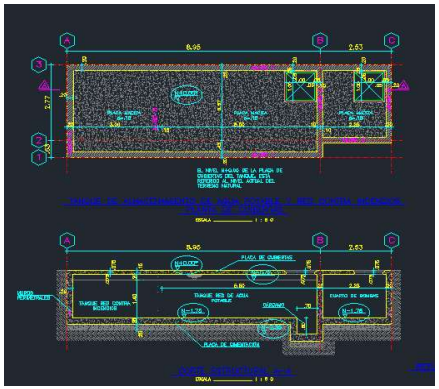

Dimensiones				Volumen (m3)	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
11	0.25	4.4	1	12.1	Inferior
11	0.15	4.4	1	7.3	Superior
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL					19.36	metro cubico


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.10	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

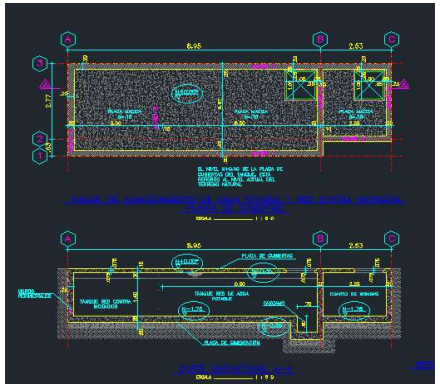

Dimensiones				Volumen (m3)	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
11	2.6	0.2	2	11.4	Inferior
4.4	2.6	0.2	3	6.9	Superior
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL					18.30	metro cubico

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

Elemento/Diámetro	1/2"	3/8"
REFUERZO M1	1,216.70	
REFUERZO M2	1,574.50	
REFUERZO M3 Y MA	739.50	
REFUERZO MB	262.40	
REFUERZO MC	262.40	
REFUERZO MD	190.80	
REFUERZO ME	238.60	
REFUERZO PLACA C	2,003.90	
REFUERZO PLACA D		1,048.30
REFUERZO CONECT		631.70
ALAMBRE NEGRO		
SUMAS	6,488.80	1,680.00

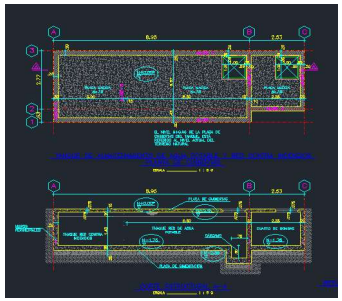

Dimensiones				Kilogramo	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
				1216.7	M1
				1574.5	M2
				739.5	M3 Y MA
				262.4	MB
				262.4	MC
				190.8	**MD**
				238.0	ME
				2003.9	PLACA
				1048.30	PLACA
				631.70	CONECTORES

OBSERVACIONES:

TOTAL				8,168.20	Kilogramo


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

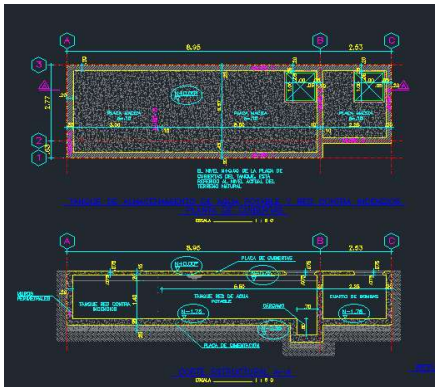

Dimensiones				Metro lineal	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
11			4	44.0	
4.4			6	26.4	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL				70.40	Metro lineal


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

9.00	TANQUE DE ALMACENIAMIENTO	ITEM	8.13	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y OBRAS HIDRAHULICAS TIPO SIKATOP SEAL 107 O SIMILAR	UNIDAD	metro cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

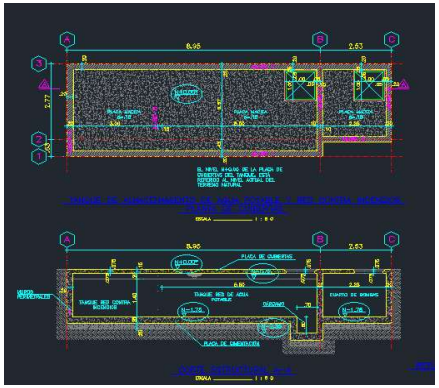

Dimensiones				Volumen (m3)	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad		
11	2.6		2	57.2	
4.4	2.6		4	45.8	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	
				0.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL				102.96	metro cuadrado

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	metro cubico	0		0.00	
PISO 1	metro cubico	69.45		69.45	
PISO 2	metro cubico	0		0.00	
PISO 3	metro cubico	0		0.00	
PISO 4	metro cubico	0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	69.45	metro cubico

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.02	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	metro cubico	0		0.00	
PISO 1	metro cubico	65.89		65.89	
PISO 2	metro cubico	0		0.00	
PISO 3	metro cubico	0		0.00	
PISO 4	metro cubico	0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	65.89	metro cubico

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.03	ANDEN ADOQUIN DE GRES	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Metro Cuadrado	0		0.00	
PISO 1	Metro Cuadrado	350		350.00	
PISO 2	Metro Cuadrado	0		0.00	
PISO 3	Metro Cuadrado	0		0.00	
PISO 4	Metro Cuadrado	0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL 350.00 **Metro Cuadrado**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.04	ASEO GENERAL ENTREGA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	MEDIDAS				TOTAL	Observaciones
	Long.	Ancho	Cantidad	Area		
	SOTANO					
	6.96	9.98	1	69.4608	69.46	COCINA
	2.6	4.34	1	11.284	11.28	CONSULTORIO DIETAS
	1.74	2.02	1	3.5148	3.51	SALA DE ESTAR
	1.83	1	1	1.83	1.83	PASILLO SALA DE ESTAR
	4.2	1.6	1	6.72	6.72	
	2.1	0.4	1	0.84	0.84	
	4.39	1.81	1	7.9459	7.95	PASILLO CONSULTORIO DIETAS
	12.34	2.34	1	28.8756	28.88	PASILLO ASCENSORES
	2.17	2.21	1	4.7957	4.80	
	1.26	0.45	1	0.567	0.57	
	2.2	1.08	1	2.376	2.38	CUARTO BAJO ESCALERAS
	4.07	4.84	1	19.6988	19.70	DEPOSITO ALMACEN
	0.8	0.15	1	0.12	0.12	BOCA PUERTA DEPOSITO
	3.88	1.8	1	6.984	6.98	PASILLO ROPA LIMPIA
	2.45	6.74	1	16.513	16.51	PASILLO DEPOSITO DE CADAVERES
	0.84	1.47	1	1.2348	1.23	
	1.37	2.14	1	2.9318	2.93	
	2.75	2.12	1	5.83	5.83	PASILLO IGRESO ARCHIVO
	2.88	1.55	1	4.464	4.46	
	3.94	9.85	1	38.809	38.81	ARCHIVO
	7.98	5.04	1	40.2192	40.22	
	10	1.76	1	17.6	17.60	BODEGA FARMACIA
	11.98	5.04	1	60.3792	60.38	
	1.6	1.62	1	1.296	1.30	
	4.83	2.49	1	12.0267	12.03	CUARTO ASEO
	1.6	2.6	1	4.16	4.16	DEPOSITO 1
	1.62	2.4	1	3.888	3.89	DEPOSITO 2
	7.2	5.52	1	39.744	39.74	LAVANDERIA
	PISO 1					
	7.03	2.36	1	16.5908	16.59	LABORATORIO
	2	0.15	1	0.3	0.30	LABORATORIO
	5.88	2.36	1	13.8768	13.88	LABORATORIO
	1.65	1.1	1	1.815	1.82	LABORATORIO
	0.8	0.15	1	0.12	0.12	LABORATORIO
	3.48	2.19	1	7.6212	7.62	LABORATORIO
	3.9	1.62	1	6.318	6.32	LABORATORIO
	3.59	2.19	1	7.8621	7.86	LABORATORIO
	3.89	2.32	1	9.0248	9.02	LABORATORIO
	6.79	1.19	1	8.0801	8.08	PASILLO LABORATORIO
	4.06	1.21	1	4.9126	4.91	PASILLO LABORATORIO
	3.66	2.54	1	9.2964	9.30	RECEPCION MUESTRAS
	3.62	1.08	1	3.9096	3.91	TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
	1.62	2.44	1	3.9528	3.95	TOMA MUESTRAS GINECOLOGICAS
	3.76	3.01	1	11.3176	11.32	TOMA MUESTRA
	2.9	1.89	1	5.481	5.48	RECIBO Y TOMA MUESTRAS
	4.96	3.06	1	15.1776	15.18	FARMACIA
	1.92	1.79	1	3.4368	3.44	FARMACIA
	6.94	4.89	1	33.9366	33.94	FARMACIA
	1.63	2.22	1	3.6186	3.62	ADMINISTRATIVA
	15.73	2	1	31.46	31.46	PASILLO
	4.27	1.6	1	6.832	6.83	PASILLO
	2.42	1.91	1	4.6222	4.62	SALA PROCEDIMIENTOS
	2.8	2.67	1	7.476	7.48	SALA LECTURA
	6.75	2.91	1	19.6425	19.64	ECOGRAFO
	5.17	2.93	1	15.1481	15.15	CONSULTORIO ECOGRAFO
	3.73	2.16	1	8.0568	8.06	ESPERA
	1.57	0.46	1	0.7222	0.72	ESPERA
	3.26	2.68	1	8.7368	8.74	OFICINA RADIOLOGIA
	5.28	3.39	1	17.8992	17.90	RAYOS X
	1.43	2.02	1	2.8886	2.89	DISPARO
	4.91	2.41	1	11.8331	11.83	PASILLO RX
	1.53	1.88	1	2.8764	2.88	PASILLO RX
	2.03	0.88	1	1.7864	1.79	VESTIER
	2.36	2.76	1	6.5136	6.51	MAMOGRAFO
	5.08	3.14	1	15.9512	15.95	PROCEDIMIENTOS
	3.43	3.6	1	12.348	12.35	ADMISIONES
	1.98	0.51	1	1.0098	1.01	ADMISIONES
	4.06	2.5	1	10.15	10.15	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
	5.86	3.4	1	19.924	19.92	T.A.C
	2.83	2.61	1	7.3863	7.39	DISPARO
	4.76	4.72	1	22.4672	22.47	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
	4.22	3.99	1	16.8378	16.84	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA
	3	2.86	1	8.58	8.58	CENTRAL ENFERMERA
	5.12	2	1	10.24	10.24	PASILLO
	3.16	1.42	1	4.4872	4.49	PASILLO
	15.24	3.78	1	57.6072	57.61	OBSERVACION PEDIATRICA
	32.04	2.56	1	82.0224	82.02	PASILLO EMERGENCIA
	1.34	1.08	1	1.4472	1.45	RESIDUOS ORDINARIOS
	1	1.13	1	1.13	1.13	RESIDUOS PELIGROSOS
	2.68	3.06	1	8.2008	8.20	DIRECCION URGENCIAS
	3.5	1.75	1	6.125	6.13	SALA ERA
	3.23	2.24	1	7.2352	7.24	SALA ERA
	3.55	3.52	1	12.496	12.50	PROCEDIMIENTOS ASCEPTICOS
	1.19	5.25	1	6.2475	6.25	DIGITACION
	2.65	1.99	1	5.2735	5.27	DIGITACION
	1.42	1.31	1	1.8602	1.86	INSUMOS FARMACIA
	1.43	0.43	1	0.6149	0.61	EQUIPOS
	3.49	4.33	1	15.1117	15.11	SALA YESOS
	2.65	3.46	1	9.169	9.17	SALA ERA
	1.85	1.16	1	2.146	2.15	SALA ERA
	3.77	1.84	1	6.9368	6.94	CONSULTORIO 5
	2.08	2.27	1	4.7216	4.72	CONSULTORIO 5
	3.85	1.74	1	6.699	6.70	MONITOREO GINECOBSTETRICIA
	5.58	5.48	1	30.5784	30.58	MONITOREO GINECOBSTETRICIA
	5.09	1.52	1	7.7368	7.74	CONSULTORIO 2
	3.67	1.72	1	6.3124	6.31	CONSULTORIO 2
	4.98	1.6	1	7.968	7.97	CONSULTORIO 1
	3.28	1.92	1	6.2976	6.30	CONSULTORIO 1
	3.93	1.64	1	6.4452	6.45	CONSULTORIO 4
	5.74	3.17	1	18.1958	18.20	CONSULTORIO 3
	6.16	5.06	1	31.1696	31.17	REANIMACION
	1.16	0.3	1	0.348	0.35	REANIMACION
	5.81	2.91	1	16.9071	16.91	ADMISIONES URGENCIAS
	0.88	1.5	1	1.32	1.32	ACCESO LAVADO PACIENTES
	2.26	2.09	1	4.7234	4.72	CONSULTORIO TRIAGE 2
	2.76	3.33	1	9.1908	9.19	CONSULTORIO TRIAGE 1
	2.93	1.48	1	4.3364	4.34	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
	2.05	2.81	1	5.7605	5.76	PASILLO TRIAGE
	2.93	1.8	1	5.274	5.27	CUARTO EQUIPOS
	2.95	3.25	1	9.5875	9.59	CENTRAL DE CABLEADO
	0.93	2.22	1	2.0646	2.06	RACK
	5.13	2.76	1	14.1588	14.16	DESCANSO INTERNOS
	1.39	0.34	1	0.4726	0.47	DESCANSO INTERNOS
	3.63	2.65	1	9.6195	9.62	FACTURACION Y ADMISIONES
	2.55	3	1	7.65	7.65	HALL
	12.37	6.43	1	79.5391	79.54	HALL
	4.54	5.81	1	26.3774	26.38	SALA DE ESPERA
	1.81	4.63	1	8.3803	8.38	PASILLO
	3.68	1.15	1	4.232	4.23	ADMISIONES
	6.45	1.6	1	10.32	10.32	ACCESO PRINCIPAL
	11.6	6.34	1	73.544	73.54	CAFETERIA
	2.26	2.15	1	4.859	4.86	CAFETERIA
	2.98	4.24	1	12.6352	12.64	CAFETERIA
	4.9	2.55	1	12.495	12.50	CAFETERIA
	4.4	1.67	1	7.348	7.35	CAFETERIA
	6.44	5.11	1	32.9084	32.91	SALA DE ESTAR
	9.97	7.15	1	71.2855	71.29	AUDITORIO
	12.39	1.91	1	23.6649	23.66	PASILLOS
	2.21	1.91	1	4.2211	4.22	PASILLOS
	9.84	6.7	1	65.928	65.93	SALA ESPERA ADULTOS

4.32	2.63	1	11.3616	11.36	SALA ESPERA ADULTOS
1.12	1.7	1	1.904	1.90	SALA ESPERA ADULTOS
2.23	4.12	1	9.1876	9.19	ACCESO EMERGENCIAS
3.83	1.1	1	4.213	4.21	ACCESO A BAÑOS
1.1	0.95	1	1.045	1.05	CUARTO EN MONITOREO GINECOBSTETRICIA
1.6	0.52	2	1.664	1.66	ACCESO ASCENSOR
PISO 2					
4.69	2	1	9.38	9.38	PASILLO INGRESO NEONATAL
2.34	3.1	1	7.254	7.25	TRABAJOS ESTERIL
2.52	1.93	1	4.8636	4.86	FILTRO VISITANTES
10.36	2.2	1	22.792	22.79	PASILLO ASCENSOR
2.31	3.4	1	7.854	7.85	LACTARIO
1.6	1.3	1	2.08	2.08	BODEGA LACTARIO
2.76	3.23	1	8.9148	8.91	ESTRACCION
25	1.98	1	49.5	49.50	PASILLO PUERTA QUIROFANOS
2.17	2.42	1	5.2514	5.25	PASILLO UCI ADULTOS
15.33	2.69	1	41.2377	41.24	
2.78	1.95	1	5.421	5.42	
9.25	2.28	1	21.09	21.09	
19.79	4.68	1	92.6172	92.62	UCI ADULTOS
9.81	4	1	39.24	39.24	UCI ADULTOS FONDO
2.02	3.03	1	6.1206	6.12	CENTRAL ENFERMERIA UCI
2.74	1.1	1	3.014	3.01	FILTRO ACCESO FAMILIA
2.14	1.11	1	2.3754	2.38	INFORMACION FAMILARES
3.05	1.155	1	3.52275	3.52	CENTRAL ENFERMERIA 2
1.34	1.44	1	1.9296	1.93	DEPOSITO DE INSUMOS
1.18	2	1	2.36	2.36	EQUIPOS
0.77	1.13	1	0.8701	0.87	RACK
2.75	2.27	1	6.2425	6.24	DESCANSO
1.29	1.56	1	2.0124	2.01	RECEPCIÓN
1.71	1.31	1	2.2401	2.24	RACK
2.68	1.27	1	3.4036	3.40	PASILLO ACCESO
2.94	0.8	1	2.352	2.35	FILTRO PERSONAL
1.63	2.74	1	4.4662	4.47	
5.38	2.41	1	12.9658	12.97	VESTIER PASILLO
1.43	2.28	1	3.2604	3.26	VESTIER
13.66	9.62	1	131.4092	131.41	RECUPERACION PARTOS
4.3	2.38	1	10.234	10.23	CENTRAL DE ENFERMERIA
28.21	2	1	56.42	56.42	PASILLO QUIEROFANOS
0.25	2.42	1	0.605	0.61	
10.89	2.17	1	23.6313	23.63	PASILLO AUTOCLAVE
3.9	2.05	1	7.995	8.00	EQUIPOS
2.43	2.97	1	7.2171	7.22	DESCANSO
2.21	3.61	1	7.9781	7.98	DESCANSO
5	1.76	1	8.8	8.80	FARMACIA
1.17	1.8	1	2.106	2.11	BODEGA
0.8	0.2	1	0.16	0.16	
5.17	1	1	5.17	5.17	PASILLO FARMACIA
5.65	0.92	1	5.198	5.20	
2.56	1.16	1	2.9696	2.97	
3.5	3.72	1	13.02	13.02	DESCANSO
3.86	1.1	1	4.246	4.25	PASILLO DESCANSO
8.02	2.38	1	19.0876	19.09	VESTIER MUJERES
1.19	0.9	1	1.071	1.07	VESTIER HOMBRES
2.45	2.64	1	6.468	6.47	
1.21	0.35	1	0.4235	0.42	
4.32	2.14	1	9.2448	9.24	
5.02	8.53	1	42.8206	42.82	AUTOCLAVE
0.78	0.74	1	0.5772	0.58	
3.55	2.39	1	8.4845	8.48	RECUPERACION PACIENTES
2.76	1.39	1	3.8364	3.84	
0.34	1.24	1	0.4216	0.42	
5.86	2	1	11.72	11.72	PASILLO AUTOCLAVE
1.59	2	1	3.18	3.18	
4.07	5.86	1	23.8502	23.85	PREPARACIO CIRUGIA
6.56	4.67	1	30.6352	30.64	RECUPERACION QUIRURGICA
4.11	6	1	24.66	24.66	
1.44	1.5	1	2.16	2.16	BODEGA
6.55	8.92	1	58.426	58.43	HALL
3.05	6.29	1	19.1845	19.18	
1.23	1.33	1	1.6359	1.64	HALL
4.59	0.91	1	4.1769	4.18	INGRESO AUTOCLAVE POR HALL
1.82	1.73	1	3.1486	3.15	INSUMOS
8.8	0.9	1	7.92	7.92	PASILLO
3	3.23	1	9.69	9.69	COORDINACION UCI NEONATAL
3.37	3.59	1	12.0983	12.10	VESTIER PERSONAL ASISTENCIA
1.75	1.72	1	3.01	3.01	INSUMOS TERAPIA
2.78	4.85	1	13.483	13.48	DESCANSO
PISO 3					
4.57	2.13	1	9.7341	9.73	ORATORIO
9	6.61	1	59.49	59.49	HALL ORATORIO
7.43	2	1	14.86	14.86	PASILLO INGRESO
13.54	1.8	1	24.372	24.37	PASILLO SCIRCULACIÓN RESTRINGIDA
2.24	1.68	1	3.7632	3.76	
0.8	0.9	0.5	0.36	0.36	
4.3	0.3	1	1.29	1.29	
2.5	3.52	1	8.8	8.80	DESCANSO VESTIER
2.14	0.92	1	1.9688	1.97	DEPOSITO INSUMOS
2.25	2.39	1	5.3775	5.38	PROCEDIMIENTOS
1.43	1.23	1	1.7589	1.76	
4.7	2.07	1	9.729	9.73	CENTRAL DE ENFERMERIA
47.44	1.99	1	94.4056	94.41	PASILLO PRINCIPAL
3.46	3.27	1	11.3142	11.31	HABITACIÓN 301
2.61	1.65	1	4.3065	4.31	
3.32	3.29	1	10.9228	10.92	HABITACÓN 302
0.84	0.3	1	0.252	0.25	
2.65	1.65	1	4.3725	4.37	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	HABITACIÓN 303
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
1.85	3.3	1	6.105	6.11	HABITACIÓN 304
2.75	1.35	1	3.7125	3.71	
4	3.3	1	13.2	13.20	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	HABITACIÓN 305
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
1.85	3.3	1	6.105	6.11	HABITACIÓN 306
2.75	1.35	1	3.7125	3.71	
4	3.3	1	13.2	13.20	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	HABITACIÓN 307
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.4	3.84	1	13.056	13.06	HABITACIÓN 308
4.74	1.57	1	7.4418	7.44	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	HABITACIÓN 309
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
2.41	1.52	1	3.6632	3.66	HABITACIÓN 310
3.21	3.41	1	10.9461	10.95	
0.33	1.65	1	0.5445	0.54	
2.43	1.47	1	3.5721	3.57	HABITACIÓN 311
3.51	3.15	1	11.0565	11.06	
0.33	1.56	1	0.5148	0.51	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	HABITACIÓN 312
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.37	4.97	1	16.7489	16.75	HABITACIÓN 313
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	HABITACIÓN 314
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 315
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.55	1.48	1	3.774	3.77	HABITACIÓN 316
3.29	3.28	1	10.7912	10.79	
0.33	1.58	1	0.5214	0.52	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 317
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.6	1.47	1	3.822	3.82	HABITACIÓN 318
3.4	3.05	1	10.37	10.37	
0.33	1.55	1	0.5115	0.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 319

1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 320
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 321
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 322
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 323
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.51	1.56	1	3.9156	3.92	
0.33	1.67	1	0.5511	0.55	HABITACIÓN 324
3.34	3.48	1	11.6232	11.62	
2.5	1.62	1	4.05	4.05	
3.45	3.53	1	12.1785	12.18	HABITACIÓN 325
0.33	1.72	1	0.5676	0.57	
1.2	2	1	2.4	2.40	BALCON NORTE
1.34	5.13	1	6.8742	6.87	
5.13	1.8	1	9.234	9.23	BALCON SUR
1.84	1.2	25	55.2	55.20	BAÑOS HABITACIONES
			PISO 4		
5.15	1.53	1	7.8795	7.88	BALCON SUR
47.37	2	1	94.74	94.74	PASILLO HABITACIONES
2	1.14	1	2.28	2.28	BALCON NORTE
1.62	5.12	1	8.2944	8.29	
3.46	3.27	1	11.3142	11.31	HABITACIÓN 401
2.61	1.65	1	4.3065	4.31	
3.32	3.29	1	10.9228	10.92	
0.84	0.3	1	0.252	0.25	HABITACÓN 402
2.65	1.65	1	4.3725	4.37	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 403
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
1.85	3.3	1	6.105	6.11	
2.75	1.35	1	3.7125	3.71	HABITACIÓN 404
4	3.3	1	13.2	13.20	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 405
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
1.85	3.3	1	6.105	6.11	
2.75	1.35	1	3.7125	3.71	HABITACIÓN 406
4	3.3	1	13.2	13.20	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 407
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.4	3.84	1	13.056	13.06	
4.74	1.57	1	7.4418	7.44	HABITACIÓN 408
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 409
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
2.41	1.52	1	3.6632	3.66	
3.21	3.41	1	10.9461	10.95	HABITACIÓN 410
0.33	1.65	1	0.5445	0.54	
2.43	1.47	1	3.5721	3.57	
3.51	3.15	1	11.0565	11.06	HABITACIÓN 411
0.33	1.56	1	0.5148	0.51	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 412
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.37	4.97	1	16.7489	16.75	HABITACIÓN 413
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 414
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 415
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.55	1.48	1	3.774	3.77	
3.29	3.28	1	10.7912	10.79	HABITACIÓN 416
0.33	1.58	1	0.5214	0.52	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 417
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.6	1.47	1	3.822	3.82	
3.4	3.05	1	10.37	10.37	HABITACIÓN 418
0.33	1.55	1	0.5115	0.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 419
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 420
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 421
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
3.3	3.49	1	11.517	11.52	
1.58	0.33	1	0.5214	0.52	HABITACIÓN 422
2.42	1.45	1	3.509	3.51	
3.3	3.55	1	11.715	11.72	HABITACIÓN 423
1.47	2.61	1	3.8367	3.84	
2.51	1.56	1	3.9156	3.92	
0.33	1.67	1	0.5511	0.55	HABITACIÓN 424
3.34	3.48	1	11.6232	11.62	
2.5	1.62	1	4.05	4.05	
3.45	3.53	1	12.1785	12.18	HABITACIÓN 425
0.33	1.72	1	0.5676	0.57	
13.63	1.78	1	24.2614	24.26	
4.39	0.27	1	1.1853	1.19	PASILLO CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
1.49	2.44	1	3.6356	3.64	
0.8	0.8	0.5	0.32	0.32	
3.53	2.5	1	8.825	8.83	DESCANSO Y VESTIER
2.32	2.24	1	5.1968	5.20	PROCEDIMIENTOS
1.48	1.28	1	1.8944	1.89	
4.88	2.1	1	10.248	10.25	CENTRAL DE ENFERMERIA
7.5	2	1	15	15.00	PASILLO INGRESO
8.95	6.77	1	60.5915	60.59	HALL
1.84	1.2	25	55.2	55.20	BAÑOS HABITACIONES
			PISO 2		
4.05	4.54	1	18.387	18.39	SALA DE PARTOS 1
4.52	4.12	1	18.6224	18.62	SALA DE PARTOS 2
4.62	4.57	1	21.1134	21.11	QUIEROFANO 1
4.61	4.57	1	21.0677	21.07	QUIEROFANO 2
4.54	4.75	1	21.565	21.57	QUIEROFANO 3
			PISO 2		
5.34	12.26	1	65.4684	65.47	PASILLO A DESCANSO
14.37	12.26	1	176.1762	176.18	CUIADOS INTERMEDIOS
5.84	12.25	1	71.54	71.54	CUIDADOS INTENSIVOS
2.52	2.75	1	6.93	6.93	
3.17	0.84	1	2.6628	2.66	PASILLO LAVADO ENCUBADORAS
1.53	2.14	1	3.2742	3.27	LAVADO ENCUBADORAS
5.01	3.58	1	17.9358	17.94	CUARTO DE EQUIPOS
0.99	4.55	1	4.5045	4.50	CUIDADOS INTENSIVOS
			PISO 3		
9.89	6.85	1	67.7465	67.75	LUDOTECA
4.72	0.16	-1	-0.7552	-0.76	DESCUENTO
4.79	3	1	14.37	14.37	INGRESO LUDOTECA
1.55	1.58	-1	-2.449	-2.45	DESCUENTO RACK
2.96	4	1	11.84	11.84	ESTRACCIÓN
1.63	0.86	1	1.4018	1.40	BODEGA
0.28	5.24	1	1.4672	1.47	ESTAR TV
3.53	4.91	1	17.3323	17.33	TERRAZA SOLAR
1.94	0.9	1	1.746	1.75	ACCESO BAÑOS
7.17	2	1	14.34	14.34	PASILLO A LUDOTECA
2.42	3.38	1	8.1796	8.18	DEPOSITO INSUMOS
1.58	1.38	1	2.1804	2.18	FILTRO INGRESO FORMULAS
4.46	2.53	1	11.2838	11.28	PREPARACIÓN FORMULAR
0.6	0.17	-1	-0.102	-0.10	DESCUENTO
7.93	1.2	1	9.516	9.52	PASILLO A COORDINACIÓN
5.44	1.33	1	7.2352	7.24	
2.16	3.06	1	6.6096	6.61	INFORMACIÓN FAMILIARES
2.93	4.82	1	14.1226	14.12	COORDINACIÓN UCI PEDIATRICA
1.57	1.63	-1	-2.5591	-2.56	DESCUENTO
3.6	3	1	10.8	10.80	COORDINACIÓN PEDIATRICA
3.77	3.16	1	11.9132	11.91	DESCANSO ENFERMEROS
3.28	4.78	1	15.6784	15.68	DESCANSO MEDICO

1.68	0.92	1	1.5456	1.55	TRANSFER MEDICO
0.65	0.92	1	0.598	0.60	
2.37	1	1	2.37	2.37	ACCESO ASISTENCIAL
10	1	1	10	10.00	PASILLO A CUARTO EQUIPOS
2.95	1.52	1	4.484	4.48	CUARTO ESTERIL
2.83	1.75	1	4.9525	4.95	CUARTO EQUIPOS
0.3	3.18	1	0.954	0.95	ADISIONAL PASILLO
14.43	2	1	28.86	28.86	PASILLO PRINCIPAL
11.45	3.03	1	34.6935	34.69	
5.17	0.15	1	0.7755	0.78	
11.55	3.29	1	37.9995	38.00	
2.63	0.15	1	0.3945	0.39	
11.47	3.29	1	37.7363	37.74	
4.69	0.15	1	0.7035	0.70	UCI PEDIATRICA
11	3.03	1	33.33	33.33	
1.7	0.15	1	0.255	0.26	
10.35	3.56	1	36.846	36.85	
4	0.15	1	0.6	0.60	
9.96	3.08	1	30.6768	30.68	
SOTANO					
9.98	48.5	1	484.03	484.03	Parqueaderos
27.6	10.57	1	291.732	291.73	Parqueaderos
12.2	15.48	1	188.856	188.86	Parqueaderos
12.92	9.8	1	126.616	126.62	Parqueaderos
320.97	2.1	1	674.03	674.03	BAÑOS
232.17	2.1	1	487.56	487.56	ZONAS HUMEDAS

OBSERVACIONES:

TOTAL **7,375.82** **Metro Cuadrado**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.05	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPA - (2500 PSI)	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Metro Cuadrado	0		0.00	
PISO 1	Metro Cuadrado	100	1.2	120.00	
PISO 2	Metro Cuadrado	0		0.00	
PISO 3	Metro Cuadrado	0		0.00	
PISO 4	Metro Cuadrado	0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	120.00	Metro Cuadrado

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.06	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
PISO 1					
exterior	Metro Cuadrado				
		4.58	44	201.52	
		4.38	47.8	209.36	
		70.82	22.4	1589.12	

OBSERVACIONES:

TOTAL	2,000.00	Metro Cuadrado

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.07	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico


SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Metro lineal	0		0.00	
PISO 1	Metro lineal	120		120.00	
PISO 2	Metro lineal	0		0.00	
PISO 3	Metro lineal	0		0.00	
PISO 4	Metro lineal	0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	120.00	Metro lineal

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.08	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Metro lineal	0		0.00	
PISO 1	Metro lineal	50		50.00	
PISO 2	Metro lineal	0		0.00	
PISO 3	Metro lineal	0		0.00	
PISO 4	Metro lineal	0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	50.00	Metro lineal

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.09	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



Dimensiones				VALOR	Observaciones
PISO	UNIDAD	CANTIDAD			
SOTANO	Metro lineal	0		0.00	
PISO 1	Metro lineal	20		20.00	
PISO 2	Metro lineal	0		0.00	
PISO 3	Metro lineal	0		0.00	
PISO 4	Metro lineal	0		0.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	20.00	Metro lineal

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


10.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	ITEM	9.10	CERRAMIENTO METALICO	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

SOTANO



PISO 1



PISO 2



PISO 3



PISO 4



	Dimensiones			VALOR	Observaciones
	LARGO	ALTO	CANTIDAD		
	46.80	2	1	93.60	LIMITE NORTE
		2	1	0.00	PRINCIPAL
		2	1	0.00	SUR
	67.20	2	1	134.40	OCCIDENTE

OBSERVACIONES:

TOTAL	228.00	Metro Cuadrado	

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

10.00	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
			SOTANO			
	4.05	1.2		1	4.86	BAÑO CONTIGUO A ALMACEN PISO
	0.49	0.17		-1	-0.0833	DESCUENTO
	0.1	0.35		-1	-0.035	
	1.67	1		1	1.67	PARQUEO Y LAVADO PISO
	1.32	1.12		1	1.4784	ASEO ARCHIVO PISO
	1.34	1.3		1	1.742	BAÑO ARCHIVO PISO
	4.6	3.24		1	14.904	DEPARTAMENTO DE CADAVERES PISO
	0.8	1.5		-1	-1.2	DESCUENTO
	2.61	2.1		1	5.481	BASURAS 1 PISO
	2.64	2.27		1	5.9928	BASURAS 2 PISO
	0.44	0.66		-1	-0.2904	DESCUENTO
	1.86	2.51		1	4.6686	BASURAS 3 PISO
	2.85	5.7		1	16.245	ROPA LIMPIA PISO
	0.2	0.4		-1	-0.08	DESCUENTO
	2.85	2.1		1	5.985	ROPA SUCIA PISO
	2.5	4.85		1	12.125	ASEO PISO
	0.25	0.25		-1	-0.0625	DESCUENTO
	0.65	0.65		1	0.4225	ASEO CONTIGUO A DEPOSITO DE CADAVERES
			SUBTOTAL		73.8231	
			PISO 1			
	2.11	2.83		1	5.9713	BAÑO HOMBRES SALA DE ESPERA
	0.9	1.9		1	1.71	
	2.9	2.13		1	6.177	BAÑO MUJERES PISO
	1.67	2.4		1	4.008	BAÑO DISCAPACITADOS PISO
	1.3	1.9		1	2.47	BAÑO DISCAPACTADOS CAFETERIA PISO
	1.2	1.9		1	2.28	BAÑO MIXTO CAFETERIA PISO
	1.47	1.42		1	2.0874	PERSONAL ASISTENCIA BAÑO VESTIER 1 PISO
	1.46	1.57		1	2.2922	PERSONAL ASISTENCIA BAÑO VESTIER 2 PISO
	2.25	1.32		1	2.97	BAÑO MIXTO SALA DE ESPERA PISO
	2.23	1.73		1	3.8579	BAÑO DISCAPACITADOS SALA ESPERA PISO
	1.62	1.26		1	2.0412	BAÑO AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA PISO
	1.95	1		1	1.95	BAÑO LABORATORIO PISO
	1.64	0.8		1	1.312	ASEO LABORATORIO PISO
	1.2	1.46		1	1.752	BAÑO TOMA DE MUESTRAS PISO
	1.18	1.6		1	1.888	BAÑO PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA PISO
	1.39	1.45		1	2.0155	BAÑO ECOGRAFO PISO
	1.15	1.37		1	1.5755	BAÑO CONSULTORIO MAMOGRAFIA PISO
	1.42	2		1	2.84	BAÑO CARDIOLOGIA ADMISIONES PISO
	0.43		0.43	-1	-0.1849	DESCUENTO
	1	2.2		1	2.2	TRABAJO SUCIO Y LIMPIO PISO
	2.2	0.9		1	1.98	CUARTO DE ASEO PISO
	2.14	1.62		1	3.4668	OBSERVACIÒN GINECOLOGICA BAÑO ADULTOS PISO
	0.21	1.38		-1	-0.2898	DESCUENTO
	1.44	1.75		1	2.52	TRABAJO SUCIO PISO
	1.76	1.76		1	3.0976	TRABAJO LIMPIO PISO
	4.42	1.6		1	7.072	BAÑO FAMILIAR PISO
	1.74	2.12		1	3.6888	
	0.2	0.97		-1	-0.194	DESCUENTO
	0.43	0.25		-1	-0.1075	
	0.7	0.15		-1	-0.105	
	0.3	0.3		-1	-0.09	
	1.1	2.48		1	2.728	BAÑO OBSERVACION PEDIATRICA PISO
	1.06	2.85		1	3.021	BAÑO SALA EDA PISO
	0.92	1.31		1	1.2052	ROPA LIMPIA DIGITACIÒN PISO
	1.53	1.44		1	2.2032	BAÑO SALA ERA PISO
	1.66	1.36		1	2.2576	BAÑO CONSULTORIO 5 PISO
	1.27	1.56		1	1.9812	BAÑO CONSULTORIO 2 PISO
	1.95	1.2		1	2.34	BAÑO MONITORIO GINECOPSTETRICIA PISO
	1.14	1.67		1	1.9038	BAÑO CONSULTORIO 4 PISO
	1.58	1.56		1	2.4648	BAÑO CONSULTORIO 1 PISO
	0.8	0.84		-1	-0.672	DESCUENTO
	1.7	1.12		1	1.904	BAÑO CONSULTORIO 3 PISO
	1.1	1.5		1	1.65	CUARTO DE ASEO PISO
	4.02	2.1		1	8.442	LAVADO PACIENTES PISO
	0.3	0.4		-1	-0.12	DESCUENTO PISO
	0.28	0.6		-1	-0.168	
					0	
			SUBTOTAL		103.3928	
			PISO 2			
	1.84	1.39		1	2.5576	Baños hall hombres piso
	2.32	1.29		1	2.9928	
	1.6	1.11		1	1.776	
	0.94	1.5		1	1.41	Zona humeda vestier hombre piso
	0.96	1.2		1	1.152	Sanitario vestier hombre piso
	1.2	1		1	1.2	vestier mujeres sanitario piso baño 1
	1.2	1		1	1.2	vestier mujeres sanitario piso baño 2
	1.43	1.25		1	1.7875	ducha piso
	1.57	1.32		1	2.0724	sanitario descanso piso
	1.4	1		1	1.4	pasillo quierofano ropa sucia piso
	1.27	1.32		1	1.6764	Baño 1 recuperacion partos piso
	2.01	1.3		1	2.613	Baño 2 recuperacion partos piso
	2.28	1.5		1	3.42	Trabajo limpio piso
	0.98	2.43		1	2.3814	ropa limpia piso
	1.65	1.4		1	2.31	Trabajo sucio piso
	2.86	1.41		1	4.0326	Trabajo limpio piso
	0.71	0.15		-1	-0.1065	descuento piso
	1.56	1.62		1	2.5272	Baño trabajo de parto piso
	1.12	1.01		1	1.1312	
	0.5	1.4		1	0.7	Prelavado instrumental piso
	1	0.9		1	0.9	Aseo piso contiguo a prelavado instrumental
	2	0.8		1	1.6	residuos temporales 1 piso
	1.97	1.45		1	2.8565	residuos temporales 2 piso
	0.78	0.27		-1	-0.2106	descuento piso
	1.33	2		1	2.66	Trabajo sucio piso
	2	1.33		1	2.66	Trabajo limpio piso

1.73	1.75		1	3.0275	Baño 1 preparaciòn pacientes ambulatorios piso
1.54	1.7		1	2.618	Baño 2 preparaciòn pacientes ambulatorios piso
1.97	3.63		1	7.1511	piso zona de lavado autoclave
1.34	1.47		1	1.9698	
1.48	1.2		1	1.776	Baño ingreso autoclave piso
1.24	0.6		1	0.744	Residuos ordinarios piso
1.26	0.7		1	0.882	Residuos peligrosos piso
1.3	1.25		1	1.625	Aseo pasillo quierofano piso
1.45	0.8		1	1.16	Filtro personal piso
2.2	1.28		1	2.816	Baño filtro UCI piso
0.9	0.51		1	0.459	
1.6	2.08		1	3.328	Trabajo limpio UCI adultos piso
2	1		1	2	Departamento de ropa sucia piso
2	1.86		1	3.72	Baño 1 UCI adultos piso
0.3	0.6		-1	-0.18	descuento piso
1.62	3		1	4.86	Baño 2 UCI adultos piso
1.34	1.45		1	1.943	Trabajo sucio piso
1.88	2		1	3.76	Baño discapacitados ingreso UCI piso
2.48	1.3		1	3.224	Trabajo sucio UCI neonatal piso
1.9	1.5		1	2.85	Baño descanso piso
2.33	1.34		1	3.1222	Trabajo limpio UCI neonatal piso
1.5	1.7		1	2.55	Baño vestier piso
0.45	1.52		1	0.684	Ropa sucia piso
0.6	1.74		1	1.044	Ropa limpia Piso
1.8	1.8		1	3.24	Baño coordinacion UCI pisos
1.8	1.8		1	3.24	Baño condiciones especiales piso
2.7	1.5		1	4.05	Baño Aislado UARO 6
1.35	1.1		1	1.485	Aseo UARO 9
1	1.25		1	1.25	Aseo contiguo a vestier pacientes
		SUBTOTAL		**119.0981**	
		PISO 3			
1.35	3.05		1	4.1175	Trabajo limpio piso
1.63	1.35		1	2.2005	Trabajo sucio piso
1.2	1.2		1	1.44	Aseo piso
1.44	1.16		1	1.6704	Baño vestier piso
0.28	0.22		-1	-0.0616	Descuento piso
1.1	1		1	1.1	Baño habitaciòn 301 piso
1.1	1		1	1.1	Baño habitaciòn 302 piso
0.32	0.4		-1	-0.128	Descuento piso
1.14	1		1	1.14	Baño habitaciòn 307 piso
1	1.14		1	1.14	Baño habitaciòn 308 piso
1.12	1		1	1.12	Baño habitaciòn 310 piso
1.16	1		1	1.16	Baño habitaciòn 311 piso
1.16	1		1	1.16	Baño habitaciòn 316 piso
1.13	1		1	1.13	Baño habitaciòn 318 piso
1.1	1.1		1	1.21	Baño habitaciòn 324 piso
1.1	1		1	1.1	Baño habitaciòn 325 piso
0.3	0.27		-1	-0.081	Descuento piso 325
1.91	1.6		1	3.056	Baño adultos ludoteca
1.95	1.55		1	3.0225	Baño niños ludoteca
2.9	1.8		1	5.22	Ingreso a baños ludoteca
1.4	1		1	1.4	Cuarto aseo ludoteca
0.25	0.25		-1	-0.0625	Descuento columna cuarto de aseo
0.95	0.76		1	0.722	Cuarto de aseo contiguo a preparacion de formulas
1.4	1.5		1	2.1	Baño contiguo a descanso enfermeria
1.4	1.5		1	2.1	Baño contiguo a coordinación UCI Pediatrica
1.5	1.58		1	2.37	Baño acceso asistencial
1.28	1.57		1	2.0096	Aseo acceso asistencial
2.93	1.32		1	3.8676	Ropa limpia ampliación
1.52	2.63		1	3.9976	Trabajo sucio ampliación
1.5	2.63		1	3.945	Trabajo limpio ampliación
0.85	1.12		1	0.952	Resiidos no peligrosos ingreso a ampliación
0.9	1.12		1	1.008	Residuos peligrosos ingreso a ampliación
0.9	1.12		1	1.008	Ropa sucia ingreso a ampliación
1.85	1.95		1	3.6075	Baño discapacitados UCI pediatrica
				0	
		SUBTOTAL		**60.8411**	
		PISO 4			
1.36	3		1	4.08	Trabajo limpio piso
1.6	1.35		1	2.16	Trabajo sucio piso
1.23	1.2		1	1.476	Aseo piso
1.45	1.14		1	1.653	Baño vestier piso
0.28	0.23		-1	-0.0644	Descuento piso
1.1	1		1	1.1	Baño habitaciòn 401 piso
1.1	1		1	1.1	Baño habitaciòn 402 piso
0.32	0.4		-1	-0.128	Descuento piso
1.14	1		1	1.14	Baño habitaciòn 407 piso
1	1.14		1	1.14	Baño habitaciòn 408 piso
1.12	1		1	1.12	Baño habitaciòn 410 piso
1.16	1		1	1.16	Baño habitaciòn 411 piso
1.16	1		1	1.16	Baño habitaciòn 416 piso
1.13	1		1	1.13	Baño habitaciòn 418 piso
1.1	1.1		1	1.21	Baño habitaciòn 424 piso
1.1	1		1	1.1	Baño habitaciòn 425 piso
0.3	0.27		-1	-0.081	Descuento piso 425
				0	
		SUBTOTAL		**20.4556**	

OBSERVACIONES:

TOTAL **377.61** **Metro cuadrado**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 2	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



SEGUNDO PISO

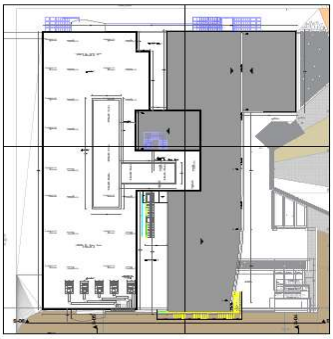

QUINTO PISO




SOTANO



PRIMER PISO



TERCER PISO



CUARTO PISO

Dimensiones				Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
5.34	12.26	1	65.4684		PASILLO A DESCANSO
14.37	12.26	1	176.1762		CUIADOS INTERMEDIOS
8.39	1.24	-1	-10.4036		DESCUENTO
0.4	0.4	-3	-0.48		
0.6	0.25	-1	-0.15		
3	0.15	-1	-0.45		
11.7	0.15	-1	-1.755		
15.2	0.15	-1	-2.28		
5.84	12.25	1	71.54		CUIDADOS INTENSIVOS
2.52	2.75	1	6.93		
3.17	0.84	1	2.6628		PASILLO LAVADO ENCUBADORAS
1.53	2.14	1	3.2742		LAVADO ENCUBADORAS
5.01	3.58	1	17.9358		CUARTO DE EQUIPOS
2.65	0.32	-1	-0.848		DESCUENTO
1.25	1.34	-1	-1.675		
0.28	0.22	-1	-0.0616		
0.6	0.6	-1	-0.36		
1	0.15	-1	-0.15		
0.99	4.55	1	4.5045		CUIDADOS INTENSIVOS
8.6	0.15	-1	-1.29		DESCUENTO
0.42	0.32	-1	-0.1344		
0.74	0.43	-1	-0.3182		
7.23	9.66	1	69.8418		TRABAJO DE PARTO
1.36	2.89	-1	-3.9304		DESCUENTO
3.64	0.15	-1	-0.546		
2.86	1.56	-1	-4.4616		
2.14	0.15	-1	-0.321		
0.25	0.74	-1	-0.185		
0.74	0.26	-1	-0.1924		
			PISO 3		
9.89	6.85	1	67.7465		LUDOTECA
4.72	0.16	-1	-0.7552		DESCUENTO
4.79	3	1	14.37		INGRESO LUDOTECA
1.55	1.58	-1	-2.449		DESCUENTO RACK
2.96	4	1	11.84		ESTRACCIÓN
1.63	0.86	1	1.4018		BODEGA
0.28	5.24	1	1.4672		ESTAR TV
3.53	4.91	1	17.3323		TERRAZA SOLAR
1.94	0.9	1	1.746		ACCESO BAÑOS
7.17	2	1	14.34		PASILLO A LUDOTECA
2.42	3.38	1	8.1796		DEPOSITO INSUMOS
1.58	1.38	1	2.1804		FILTRO INGRESO FORMULAS
4.46	2.53	1	11.2838		PREPARACIÓN FORMULAR
0.6	0.17	-1	-0.102		DESCUENTO
7.93	1.2	1	9.516		PASILLO A COORDINACIÓN
5.44	1.33	1	7.2352		
2.16	3.06	1	6.6096		INFORMACIÓN FAMILIARES
2.93	4.82	1	14.1226		COORDINACIÓN UCI PEDIATRICA
1.57	1.63	-1	-2.5591		DESCUENTO
3.6	3	1	10.8		COORDINACIÓN PEDIATRICA
3.77	3.16	1	11.9132		DESCANSO ENFERMEROS
3.28	4.78	1	15.6784		DESCANSO MEDICO
1.68	0.92	1	1.5456		TRANSFER MEDICO
0.65	0.92	1	0.598		
2.37	1	1	2.37		ACCESO ASISTENCIAL
10	1	1	10		PASILLO A CUARTO EQUIPOS
2.95	1.52	1	4.484		CUARTO ESTERIL
2.83	1.75	1	4.9525		CUARTO EQUIPOS
0.3	3.18	1	0.954		ADISIONAL PASILLO
14.43	2	1	28.86		PASILLO PRINCIPAL
11.45	3.03	1	34.6935		UCI PEDIATRICA
5.17	0.15	1	0.7755		
11.55	3.29	1	37.9995		
2.63	0.15	1	0.3945		
11.47	3.29	1	37.7363		
4.69	0.15	1	0.7035		
11	3.03	1	33.33		
1.7	0.15	1	0.255		
10.35	3.56	1	36.846		
4	0.15	1	0.6		
9.96	3.08	1	30.6768		
2	2	-1	-4		DESCUENTO
4.6	0.15	-1	-0.69		
7	0.15	-1	-1.05		
8.6	0.15	-1	-1.29		
			0		

OBSERVACIONES:

TOTAL	870.98	Metro cuadrado

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



SEGUNDO PISO

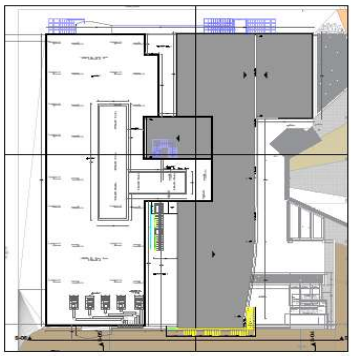

QUINTO PISO



SOTANO



PRIMER PISO



TERCER PISO



CUARTO PISO

Dimensiones				Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
5.34	12.26	1	65.4684		PASILLO A DESCANSO
14.37	12.26	1	176.1762		CUIADOS INTERMEDIOS
8.39	1.24	-1	-10.4036		DESCUENTO
0.4	0.4	-3	-0.48		
0.6	0.25	-1	-0.15		
3	0.15	-1	-0.45		
11.7	0.15	-1	-1.755		
15.2	0.15	-1	-2.28		
5.84	12.25	1	71.54		CUIDADOS INTENSIVOS
2.52	2.75	1	6.93		
3.17	0.84	1	2.6628		PASILLO LAVADO ENCUBADORAS
1.53	2.14	1	3.2742		LAVADO ENCUBADORAS
5.01	3.58	1	17.9358		CUARTO DE EQUIPOS
2.65	0.32	-1	-0.848		DESCUENTO
1.25	1.34	-1	-1.675		
0.28	0.22	-1	-0.0616		
0.6	0.6	-1	-0.36		
1	0.15	-1	-0.15		
0.99	4.55	1	4.5045		CUIDADOS INTENSIVOS
8.6	0.15	-1	-1.29		DESCUENTO
0.42	0.32	-1	-0.1344		
0.74	0.43	-1	-0.3182		
7.23	9.66	1	69.8418		TRABAJO DE PARTO
1.36	2.89	-1	-3.9304		DESCUENTO
3.64	0.15	-1	-0.546		
2.86	1.56	-1	-4.4616		
2.14	0.15	-1	-0.321		
0.25	0.74	-1	-0.185		
0.74	0.26	-1	-0.1924		
		PISO 3			
9.89	6.85	1	67.7465		LUDOTECA
4.72	0.16	-1	-0.7552		DESCUENTO
4.79	3	1	14.37		INGRESO LUDOTECA
1.55	1.58	-1	-2.449		DESCUENTO RACK
2.96	4	1	11.84		ESTRACCIÓN
1.63	0.86	1	1.4018		BODEGA
0.28	5.24	1	1.4672		ESTAR TV
3.53	4.91	1	17.3323		TERRAZA SOLAR
1.94	0.9	1	1.746		ACCESO BAÑOS
7.17	2	1	14.34		PASILLO A LUDOTECA
2.42	3.38	1	8.1796		DEPOSITO INSUMOS
1.58	1.38	1	2.1804		FILTRO INGRESO FORMULAS
4.46	2.53	1	11.2838		PREPARACIÓN FORMULAR
0.6	0.17	-1	-0.102		DESCUENTO
7.93	1.2	1	9.516		PASILLO A COORDINACIÓN
5.44	1.33	1	7.2352		
2.16	3.06	1	6.6096		INFORMACIÓN FAMILIARES
2.93	4.82	1	14.1226		COORDINACIÓN UCI PEDIATRICA
1.57	1.63	-1	-2.5591		DESCUENTO
3.6	3	1	10.8		COORDINACIÓN PEDIATRICA
3.77	3.16	1	11.9132		DESCANSO ENFERMEROS
3.28	4.78	1	15.6784		DESCANSO MEDICO
1.68	0.92	1	1.5456		TRANSFER MEDICO
0.65	0.92	1	0.598		
2.37	1	1	2.37		ACCESO ASISTENCIAL
10	1	1	10		PASILLO A CUARTO EQUIPOS
2.95	1.52	1	4.484		CUARTO ESTERIL
2.83	1.75	1	4.9525		CUARTO EQUIPOS
0.3	3.18	1	0.954		ADISIONAL PASILLO
14.43	2	1	28.86		PASILLO PRINCIPAL
11.45	3.03	1	34.6935		UCI PEDIATRICA
5.17	0.15	1	0.7755		
11.55	3.29	1	37.9995		
2.63	0.15	1	0.3945		
11.47	3.29	1	37.7363		
4.69	0.15	1	0.7035		
11	3.03	1	33.33		
1.7	0.15	1	0.255		
10.35	3.56	1	36.846		
4	0.15	1	0.6		
9.96	3.08	1	30.6768		
2	2	-1	-4		DESCUENTO
4.6	0.15	-1	-0.69		
7	0.15	-1	-1.05		
8.6	0.15	-1	-1.29		
			0		

OBSERVACIONES:

TOTAL **870.98** **Metro cuadrado**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO MOVILIDAD REDUCIDA	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	PRIMER PISO					
				1	1	Baño sala de espera (Movilidad reducida)
				1	1	Baño ginecopstetricia (Movilidad reducida)
				1	1	Baño familiar observación pediatria (Movilidad reducida)
				1	1	Baño sala esera adultos (Movilidad reducida)
	TOTAL				**4**	
	SEGUNDO PISO					
				1	1	Baño pasillo a UCI Neonatal (Movilidad reducida)
				1	1	Baño hall Hombres (Movilidad reducida)
	TOTAL				**2**	
	TERCER PISO					
				1	1	Baño ludoteca adultos (Movilidad reducida)
				1	1	Baño UCI pediatrica (Movilidad reducida)
	TOTAL				**2**	

OBSERVACIONES:

TOTAL	**8.00**	**Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	PRIMER PISO					
				2	2	Baño sala esera adultos caballeros (Normal)
				3	3	Baño sala esera adultos damas (Norrmal)
					0	
	TOTAL				5	
	SEGUNDO PISO					
				2	2	Baño hall Hombres (Movilidad reducida)
				3	3	Baño vestier mujeres
	TOTAL				5	

OBSERVACIONES:

TOTAL	10.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	TERCER PISO					
				58	58	Hospitalizacion
					0	
					0	
	TOTAL				58	
	CUARTO PISO					
				58	58	Hospitalizacion
					0	
	TOTAL				58	

OBSERVACIONES:

TOTAL	116.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 7	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	TERCER PISO					
				58	58	Hospitalizacion
					0	
					0	
	TOTAL				58	
	CUARTO PISO					
				58	58	Hospitalizacion
					0	
	TOTAL				58	

OBSERVACIONES:

TOTAL	116.00	Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	TERCER PISO					
				58	58	Hospitalizacion
					0	
					0	
	TOTAL				58	
	CUARTO PISO					
				58	58	Hospitalizacion
					0	
	TOTAL				58	

OBSERVACIONES:

TOTAL	116.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	9.6			1	9.6	Red de aguas lluvias
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	9.60	Metro lineal

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	20.8			1	20.8	Red de alcantarillado
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **20.80** **ML**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ITEM**	NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	**UNIDAD**	Metro lineal	**UBICACIÓN**	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	82.5			1	82.5	Red de aguas lluvias
	82.5			1	82.5	Red de alcantarillado
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **165.00** **Metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 12	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				3	3	Red de aguas lluvias
				4	4	Red de alcantarillado
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	7.00	Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				2	2	Red de aguas lluvias
				2	2	Red de alcantarillado
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **4.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 14	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				2	2	Red de aguas lluvias
				2	2	Red de alcantarillado
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **4.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	31		3.8	1	117.8	filtro tanque a 1,8 metros de altura y desarrollo en la base de 80 cm
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **117.80** **Metro cuadrado**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ITEM**	NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO.	**UNIDAD**	metro cubico	**UBICACIÓN**	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	**Dimensiones**				**Total (m)**	**Observaciones**
	L (m)	**A (m)**	**h (m)**	**Cantidad**		
	34	0.4	1.8	1	24.48	filtro tanque a 1,8 metros de altura y desarrollo en la base de 40 cm
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **24.48** **metro cubico**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ITEM**	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	**UNIDAD**	Metro lineal	**UBICACIÓN**	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	31			1	31	filtro tanque a 1,8 metros de altura y desarrollo en la base de 40 cm
	3			1	3	Longitud de descarga a caja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	**34.00**	**Metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 18	CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P 60C/40P	UNIDAD	Metro cubico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m2)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	10.7	7.2	0.45	1	34.668	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **34.67** **Metro cubico**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 19	PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m2)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
		1.25		19	23.75	De sotano a primer nivel
		1.25		21	26.25	De primer piso a segundo piso
		1.25		21	26.25	Desegundo piso a tercer piso
		1.25		20	25	De tercer piso a cuarto piso
		1.25		21	26.25	De cuarto piso a quinto piso
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	127.50	Metro lineal

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 20	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				PISO 1		
				OXIGENO		
	1.3			9	11.7	Bajante a toma observación pediatria
	1.3			5	6.5	Bajantes a toma observación ginecopstetricia
	1.3			2	2.6	Bajantes a procedimientos
	1.3			1	1.3	Bajante a sala de procedimientos imagenologia
	1.3			1	1.3	Bajante a RX
	1.3			1	1.3	Bajante a TAC
	1.3			2	2.6	Bajantes reanimación
	1.3			2	2.6	Bajantes triaje 1 y 2
	1.3			3	3.9	Bajantes monitoreo ginecopstetricia
	1.3			5	6.5	Bajantes sala ERA
				VACIO		
	1.3			9	11.7	Observación pediatria
	1.3			5	6.5	Observacion ginecopstetricia
	1.3			2	2.6	procedimientos
	1.3			1	1.3	sala procedimientos imagenologia
	1.3			1	1.3	procedimeintos asepticos
	1.3			3	3.9	Monitoreo ginecopstetricia
	1.3			2	2.6	Reanimación
	1.3			2	2.6	UARO 1 Y 9
	1.3			3	3.9	UARO 2, 3 Y 4
	1.3			1	1.3	UARO 5
	1.3			1	1.3	UARO Aislada
	1.3			1	1.3	UARO 7
	1.3			1	1.3	UARO 8
	1.3			12	15.6	Intensivos neonatal
	1.3			20	26	Intermedios Neoanatal
	1.3			7	9.1	Recuperacion partos
	1.3			6	7.8	Trabajo de partos
	1.3			5	6.5	Sala de partos y quierofanos
	1.3			9	11.7	Recuperación de cirugia
					0	
				PISO 2		
				OXIGENO		
	1.3			4	5.2	Bajante uaro 1-2-3-4
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 5
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 6
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 7
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 8
	1.3			1	1.3	Bajante UARO 9
	1.3			18	23.4	Bjantes Intensivos neonatal
	1.3			46	59.8	Bjantes intermedios Neonatal
	1.3			7	9.1	Bajantes recuperacion partos
	1.3			6	7.8	Bajantes trabajo de partos
	1.3			1	1.3	Bajante sala de partos 1
	1.3			1	1.3	Bajante sala de partos 2
	1.3			2	2.6	Bajante quirofano 1
	1.3			2	2.6	Bajante quirofano 2
	1.3			2	2.6	Bajante quirofano 3
	1.3			9	11.7	Bajantes recuperacion de cirugia
				VACIO		
	1.3			2	2.6	UARO 1 Y 9
	1.3			3	3.9	UARO 2, 3 Y 4
	1.3			1	1.3	UARO 5
	1.3			1	1.3	UARO Aislada
	1.3			1	1.3	UARO 7
	1.3			1	1.3	UARO 8
	1.3			12	15.6	Intensivos neonatal
	1.3			20	26	Intermedios Neoanatal
	1.3			7	9.1	Recuperacion partos
	1.3			6	7.8	Trabajo de partos
	1.3			5	6.5	Sala de partos y quierofanos
	1.3			9	11.7	Recuperación de cirugia
				AIRE MEDICINAL		
	1.3			13	16.9	Bajantes intensivos Neonatal
	1.3			20	26	Bajantes intermedios neonatal
	1.3			1	1.3	Bajante quirofano 1
	1.3			1	1.3	Bajante quirofano 2
	1.3			1	1.3	Bajante quirofano 3
					0	
				PISO 3		
				OXIGENO		
	1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 301
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 302
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 303
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 304
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 305
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 306
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 307
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 308
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 309
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 310
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 311
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 312
	1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 313
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 314
	1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 315
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 316
	1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 317
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 318
	1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 319
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 320
	1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 321
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 322
	1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 323
	1.3			1	1.3	Bajantes habitacion 324
	1.3			2	2.6	Bajantes habitacion 325
	1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica aislado 1
	1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 2
	1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 3
	1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 4

1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 5
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 6
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 7
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 8
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 9
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 10
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 11
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 12
AIRE MEDICINAL					
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica aislado 1
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 2
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 3
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 4
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 5
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 6
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 7
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 8
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 9
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 10
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 11
1.3			1	1.3	Bajante UCI pediatrica 12
VACIO					
1.3			2	2.6	Habitacion 301
1.3			2	2.6	Habitacion 302
1.3			1	1.3	Habitacion 303
1.3			1	1.3	Habitacion 304
1.3			1	1.3	Habitacion 305
1.3			1	1.3	Habitacion 306
1.3			1	1.3	Habitacion 307
1.3			1	1.3	Habitacion 308
1.3			1	1.3	Habitacion 309
1.3			1	1.3	Habitacion 310
1.3			1	1.3	Habitacion 311
1.3			1	1.3	Habitacion 312
1.3			2	2.6	Habitacion 313
1.3			1	1.3	Habitacion 314
1.3			2	2.6	Habitacion 315
1.3			1	1.3	Habitacion 316
1.3			2	2.6	Habitacion 317
1.3			1	1.3	Habitacion 318
1.3			2	2.6	Habitacion 319
1.3			1	1.3	Habitacion 320
1.3			2	2.6	Habitacion 321
1.3			1	1.3	Habitacion 322
1.3			2	2.6	Habitacion 323
1.3			1	1.3	Habitacion 324
1.3			2	2.6	Habitacion 325
1.3			12	15.6	UCI Pediatrica
				0	
PISO 4					
OXIGENO					
1.3			1	1.3	Habitacion 401
1.3			1	1.3	Habitacion 402
1.3			1	1.3	Habitacion 403
1.3			1	1.3	Habitacion 404
1.3			1	1.3	Habitacion 405
1.3			1	1.3	Habitacion 406
1.3			1	1.3	Habitacion 407
1.3			1	1.3	Habitacion 408
1.3			1	1.3	Habitacion 409
1.3			1	1.3	Habitacion 410
1.3			1	1.3	Habitacion 411
1.3			1	1.3	Habitacion 412
1.3			1	1.3	Habitacion 413
1.3			2	2.6	Habitacion 413
1.3			1	1.3	Habitacion 414
1.3			1	1.3	Habitacion 415
1.3			1	1.3	Habitacion 416
1.3			1	1.3	Habitacion 417
1.3			1	1.3	Habitacion 418
1.3			1	1.3	Habitacion 419
1.3			1	1.3	Habitacion 420
1.3			1	1.3	Habitacion 421
1.3			1	1.3	Habitacion 422
1.3			1	1.3	Habitacion 423
1.3			1	1.3	Habitacion 424
1.3			1	1.3	Habitacion 425
VACIO					
1.3			1	1.3	Habitacion 401
1.3			1	1.3	Habitacion 402
1.3			1	1.3	Habitacion 403
1.3			1	1.3	Habitacion 404
1.3			1	1.3	Habitacion 405
1.3			1	1.3	Habitacion 406
1.3			1	1.3	Habitacion 407
1.3			1	1.3	Habitacion 408
1.3			1	1.3	Habitacion 409
1.3			1	1.3	Habitacion 410
1.3			1	1.3	Habitacion 411
1.3			1	1.3	Habitacion 412
1.3			2	2.6	Habitacion 413
1.3			1	1.3	Habitacion 414
1.3			1	1.3	Habitacion 415
1.3			1	1.3	Habitacion 416
1.3			1	1.3	Habitacion 417
1.3			1	1.3	Habitacion 418
1.3			1	1.3	Habitacion 419
1.3			1	1.3	Habitacion 420
1.3			1	1.3	Habitacion 421
1.3			1	1.3	Habitacion 422
1.3			1	1.3	Habitacion 423
1.3			1	1.3	Habitacion 424
1.3			1	1.3	Habitacion 425
				0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **630.50** **Metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	#N/D	ITEM	NP 21	CORTE Y DEMOLICION MURO Y/O PISO EN BALDOSA DE GRANO PARA LA INSTALACION DE MEDIA CAÑA	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
			SOTANO			
	57.6			2	115.2	COCINA Y PASILLO A DEPARTAMENTO DE CADAVERES
	27.3			2	54.6	
	24.79			2	49.58	PASILLO PRINCIPAL INGRESO A ASCENSORES
	6.87			2	13.74	DEPOSITO 1
	7.31			2	14.62	DEPOSITO 2
	8.23			2	16.46	BASURAS 1
	8.81			2	17.62	BASURAS 2
	7.59			2	15.18	BASURAS 3
	10.31			2	20.62	DEPOSITO ALMACEN
	14.97			2	29.94	PASILLO HALL
	10.34			2	20.68	
	0.9			-14	-12.6	DESCUENTO PUERTAS
			TOTAL SOTANO	355.6		
			PISO 1			
	81.07			2	162.14	OBSERVACION PEDIATRIA, TRABAJO SUCIO, TRABAJO LIMPIO, BAÑO DISCAPACITADOS Y BAÑO FAMILIAR.
	24			2	48	CENTRAL DE ENFERMERIA OBSERVACION PEDIATRIA
	16.12			2	32.24	OBSERVACIÓN GINECOPSTETRICIA
	56.89			2	113.78	PROCEDIMIENTOS, CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y ADMISIONES
	5.3			2	10.6	CUARTO DE ASEO
	54.74			2	109.48	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA MAMOGRAFO Y ECOGRAFO
	11.93			2	23.86	PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA
	60.91			2	121.82	LABORATORIO, TOMA DE MUESTRAS, VESTIER Y ÁREA ADMINISTRATIVA
	82.83			2	165.66	LABORATORIO NEVERA, TRANSFUNCIONAL, EQUIPOS Y DEPOSITO
	46.94			2	93.88	FARMACIA ÁREA ADMINSITRATIVA Y ESTANTERIA
	37.87			2	75.74	SALA ESPERA, CONTROL IMAGENOLOGIA Y BAÑOS
	27.52			2	55.04	SALA DE LECTURA IMAGENOLOGIA Y COSTADO DERECHO SALA DE ESPERA
	16.29			2	32.58	OFICINA RADIOLOGIA
	31.6			2	63.2	RAYOS X Y PASILLO
	12.07			2	24.14	MAMOGRAFO Y VESTIER
	25.77			2	51.54	TAC
	10.99			2	21.98	DIRECCIÓN URGENCIAS
	9.09			2	18.18	RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS
	23.54			2	47.08	SALA EDA
	23.98			2	47.96	DIGITACIÓN
	10.28			2	20.56	ROPA SUCIA Y EQUIPOS
	13.15			2	26.3	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
	13.1			2	26.2	SALA DE YESOS
	18.96			2	37.92	SALA EDA
	20.24			2	40.48	CONSULTORIO 5
	19.92			2	39.84	CONSULTORIO 2
	35.86			2	71.72	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
	16.11			2	32.22	CONSULTORIO 1
	18.1			2	36.2	CONSULTORIO 4
	21.16			2	42.32	CONSULTORIO 3
	21.56			2	43.12	REANIMACIÓN
	14.02			2	28.04	LAVADO PERO PACIENTES
	34.73			2	69.46	CONSULTORIOS TRIAJE Y CAMILLAS
	19.85			2	39.7	SALA ESPERA ADULTOS COSTADO IZQUIERDO
	9.66			2	19.32	SALA ESPERA ADULTOS COSTADO DERECHO
	20.67			2	41.34	ADMISIONES URGENCIAS
	34.82			2	69.64	BAÑOS SALA DE ESPERA ADULTOS
	37.83			2	75.66	PERSONAL ASISTENCIAL URGENCIAS
	28.4			2	56.8	AUDITORIO
	76.99			2	153.98	CAFETERIA Y COCINETA
	16.58			2	33.16	HALL CENTRAL
	55.46			2	110.92	DESCANSO INTERNO Y CENTRAL DE SONIDO
	5.11			2	10.22	ASEO PASILLO CONSULTORIOS
	40.26			2	80.52	PASILLO CONSULTORIOS
	35.53			2	71.06	PASILLO LABORATORIOS
	25.15			2	50.3	PASILLO DE AUDITORIO A HALL CENTRAL
			TOTAL PISO 1	2645.9		
			PISO 2			
	194.19			2	388.38	UCI ADULTOS.
	113.42			2	226.84	LACTARIO, EXTRACCIÓ, AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL,TRABAJO LIPIO, SUCIO Y BAÑOS.
	63.47			2	126.94	CENTRALES DE ENFERMERIA, ROPA SUCIA, ROPA LIPIA Y BAÑOS DE UCI ADULTOS
	118.07			2	236.14	PREPARACION DE PAETOS Y TRABAJO DE PARTOS INCLUYE BAÑOS
	155.27			2	310.54	PASILLO CENTRAL, PASILLO QUIROFANOS Y ACESO A RECUPERACION QUIERURGIA
	15.23			2	30.46	

26.32			2	52.64	FARMACIA
12.88			2	25.76	DESCANSO
29.22			2	58.44	AUTOCLAVE
27.08			2	54.16	FILTRO A UCI ADULTOS
5.02			2	10.04	
75.23			2	150.46	COORDINACION UCI NEONATAL, VESTIER ASISTENCIA Y BAÑOS CONTIGUOS A UCI NEONATAL
15.36			2	30.72	
23.79			2	47.58	HALL
79.96			2	159.92	RECUPERACIÓN QUIERURGICA Y AMBULATORIA
77.89			2	155.78	VESTIER MUJERES Y VESTIER HOMBRES
	TOTAL PISO 2		**2064.8**		
		PISO 3			
131.79			2	263.58	PASILLO PRINCIPAL Y BALCONES
1.2			-50	-60	DESCUENTO PUERTAS
14.27			2	28.54	HORATORIO
78.28			2	156.56	CIRCULACION RESTRINGIDA ENFERMERIA, DESCANSO VESTIER, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJO SUCIO
25.4			2	50.8	SALA DE ESTAR
22.73			2	45.46	HABITACION 302 INCLUYE BAÑO
22.98			2	45.96	HABITACION 301 INCLUYE BAÑO
22.71			2	45.42	HABITACION 307 INCLUYE BAÑO
28.1			2	56.2	HABITACION 308 INCLUYE BAÑO
22.71			2	45.42	HABITACION 310 INCLUYE BAÑO
22.21			2	44.42	HABITACION 311 INCLUYE BAÑO
22.64			2	45.28	HABITACION 316 INCLUYE BAÑO
22.21			2	44.42	HABITACION 318 INCLUYE BAÑO
23.06			2	46.12	HABITACION 325 INCLUYE BAÑO
22.42			2	44.84	HABITACION 324 INCLUYE BAÑO
	TOTAL PISO 3		**903.0**		
		PISO 4			
131.49			2	262.98	PASILLO PRINCIPAL Y BALCONES
1.2			-50	-60	DESCUENTO PUERTAS
81.83			2	163.66	CIRCULACION RESTRINGIDA ENFERMERIA, DESCANSO VESTIER, PROCEDIMIENTOS Y TRABAJO SUCIO
21.07			2	42.14	HALL
22.73			2	45.46	HABITACION 402 INCLUYE BAÑO
22.01			2	44.02	HABITACION 401 INCLUYE BAÑO
22.71			2	45.42	HABITACION 407 INCLUYE BAÑO
28.1			2	56.2	HABITACION 408 INCLUYE BAÑO
22.71			2	45.42	HABITACION 410 INCLUYE BAÑO
22.21			2	44.42	HABITACION 411 INCLUYE BAÑO
22.64			2	45.28	HABITACION 416 INCLUYE BAÑO
22.21			2	44.42	HABITACION 418 INCLUYE BAÑO
23.06			2	46.12	HABITACION 425 INCLUYE BAÑO
22.42			2	44.84	HABITACION 424 INCLUYE BAÑO
	TOTAL PISO 4		**870.4**		

OBSERVACIONES:

TOTAL **6,839.74** **Metro lineal**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 22	CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM.	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	75		2.44	1	183.00	Fachada occidental
	26.3		2.44	1	64.17	Fachada norte
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **247.17** **Metro cuadrado**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 23	FAJA EN MURO UNA CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	107				107	Buitrones estructura metalica ampliacion
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	107.00	Metro lineal

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (Kg)	Observaciones
	PESO (Kg)	CANTIDAD	UNIDADES	CANTIDAD		
					1,413.34	**ESCALERA DE EVACUACION SOBRE ORATORIO**
	26.4	1	100%	8.9	234.96	VIGA IPE 220
	26.4	18	100%	1.2	569.72	PLATINA DE 1/2" PARA HUELLAS ANCHO 28 CM
	15.5	18	100%	1.2	335.73	PLATINA DE 1/2" PARA CONTRAHUELLA ANCHO 16.5 CM
	19.6	18	100%	0.18725	66.06	ANGULO EMPACHADO 4" X 1/4" SOPORTE PELDAÑOS
	9.4	1	100%	4.4	41.36	ANGULO EMPACHADO 2" X 1/4" SOPORTE PELDAÑOS
	97.4	1	100%	1.2	116.83	PLATINA DE 1/2" PARA DESCANSO ANCHO 1 METRO
	121.0	1	100%	0.084	10.16	PLATINA Y ANCLAJES
	121.0	2	100%	0.15	36.30	PLATINA Y ANCLAJES
	1.0	8	100%	0.136	1.09	PERNOS
	0.1	16	100%		1.12	TUERCAS
					42.40	**SOLDADURA**
					11,851.01	**ESCALERA DE EVACUACION SUR**
	43.96	6	100%	8.1	2,136.46	COLUMNAS PTS 200 X 200 X 7 mm ENTRE EJES 5 Y 8
	43.96	1	100%	14.68	645.33	VIGAS PTS 200X200X7mm DEL NIVEL 1 AL 2
	43.96	1	100%	14.68	645.33	VIGAS PTS 200X200X7mm DEL NIVEL 2 AL 3
	43.96	6	100%	2.23	588.18	DESCANSOS
	36.5	2	100%	9.95	726.35	GUALDERA DEL NIVEL 1 AL NIVEL 2
	36.5	2	100%	8.92	651.16	GUALDERA DEL NIVEL 2 AL NIVEL 3
	4.7	42	100%	2.9	572.46	NIVEL 1 AL NIVEL 3
	4.7	1	100%	9.48	44.56	ANGULO DE 2" X 1/4"
	4.7	1	100%	9.48	44.56	ANGULO DE 2" X 1/4"
	9.4	1	100%	6.84	64.30	DECK
	121.7	6	100%	0.16	116.83	PLATINA DE SOPORTE COLUMNAS
	121.7	4	100%	0.0625	30.43	PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE DESCANSOS DE ESCALERAS
	1.0	72	100%	0.136	9.79	PERNOS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS
	0.1	72	100%		5.04	TUERCAS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS
	9.4	2	100%	1.2	22.56	NIVEL 3
	36.1	3	100%	1.42	153.79	VIGA IPE 270 SOPORTE DE PASARELA EN NIVEL 3 EJES 3, 4 Y 5
	36.1	2	100%	1.42	102.52	VIGA IPE 270 PIE DE AMIGO SOPORTE DE PASARELA EN NIVEL 3 EJES 4 Y 5
	36.1	2	100%	2.49	179.78	VIGA IPE 270 SOPORTE ASCENSO A NIVEL 4 EJE 1
	43.96	1	100%	4	175.84	PTS DE 200X200X7 mm PIED DE AMIGO DEL NIVEL 2 AL NIVEL 3 SOBRE EJE 1
	43.96	2	100%	1.81	159.14	COLUMNAS PTS 200 X 200 X 7 mm PARA DESCANSO DE ACCESO A NIVEL 4
	43.96	1	100%	2	87.92	VIGA PTS 200 X 200 X 7 mm DE SOPORTE DE ACCESO A NIVEL 4
	9.4	34	100%	1.43	457.03	ANGULO DE SOPORTE EN T D 2" X 1/4" COMO SOPORTE DE PASARELA
	36.5	2	100%	13.72	1,001.56	GUALDERA DE PASARALES LAMINA DE 15 mm
	36.5	2	100%	8.42	614.66	GUALDERA DE NIVEL 3 A NIVEL 4
	4.7	19	100%	2.9	258.97	MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE PELDAÑOS EN ANGULO DE 2" X 1/4"
	4.7	1	100%	7.86	36.94	ANGULO DE 2" X 1/4"
	121.7	6	100%	0.2275	166.12	PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE PASARELA
	121.7	4	100%	0.14	68.15	PLATINAS DE SOPORTE ACCESO A NIVEL 4
	18.2	1.46	100%	39.37	2,085.27	LAMINA TIPO ALFAJOR DE 1/4" PARA PASARELA
					355.53	**SOLDADURA**
					2,838.56	**ESCALERA DE EVACUACION NORTE**
	36.5	1	100%	21.65	790.23	GUALDERA EXTERNA
	36.5	1	100%	18.91	690.22	GUALDERA INTERNA
	36.5	1	100%	1.2	43.80	GUALDERA DE CIERRE
	36.1	6	100%	1.2	259.92	VIGA IPE 270 SOPORTES DE ESCALERA
	36.1	4	100%	1.42	205.05	VIGA IPE 270 PIE DE AMIGO SOPORTE DE VIGAS
	4.75	35	100%	2.96	492.10	MARCO DE ENCAJONAMIENTO DE PELDAÑOS EN ANGULO DE 2" X 1/4"
	4.75	1	100%	7.86	37.34	DESCANSO 1
	4.75	1	100%	10.8	51.30	DESCANSO 2
	4.75	1	100%	7.4	35.15	DESCANSO 3
	4.75	1	100%	17.42	82.75	DESCANSO 4
	121.7	7	100%	0.16	136.30	PLATINA DE SOPORTE VIGAS DE DESCANSOS DE ESCALERAS
	1.0	70	100%	0.136	9.52	PERNOS DE PLATINAS EN VIGAS Y PIE DE AMIGOS
	0.1	70	100%		4.90	TUERCAS DE PLATINAS EN VIGAS Y COLUMNAS
					85.16	**SOLDADURA**

OBSERVACIONES:

TOTAL **16,586.00** **Kilogramo**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR.	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m2)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	SOTANO					
	1.26	2.7	N/A	1	3.402	DESPACHO DIETAS
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	DESPACHO DIETAS
	1.8	2.7	N/A	1	4.86	DESPACHO DIETAS
	2.16	2.7	N/A	1	5.832	CICULACION A ARCHIVO
	PRIMER PISO					
	0.73	2.7	N/A	1	1.971	HALL GENERAL
	1.37	2.7	N/A	1	3.699	HALL GENERAL
	1.2	2.7	N/A	1	3.24	AUTO SERVICIO
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	AUTO SERVICIO
	1.08	2.7	N/A	1	2.916	AUDITORIO
	0.73	2.7	N/A	1	1.971	SALA DE ESPERA ADULTOS
	1.62	2.7	N/A	1	4.374	SALA DE ESPERA ADULTOS
	0.46	2.7	N/A	1	1.242	REANIMACION
	0.68	2.7	N/A	1	1.836	DIJITACION
	0.43	2.7	N/A	1	1.161	DIJITACION
	0.89	2.7	N/A	1	2.403	SALA EDA
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	SALA EDA
	1.26	2.7	N/A	1	3.402	OBSERVACION GINECOSTETRICA
	1.56	2.7	N/A	1	4.212	RX
	0.57	2.7	N/A	1	1.539	RX
	1.01	2.7	N/A	1	2.727	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
	0.7	2.7	N/A	1	1.89	RESIDUOS RESICLABLES ORGANICOS
	SEGUNDO PISO					
	10.73	2.7	N/A	1	28.971	HALL GENERAL PANTALLA
	3.4	2.7	N/A	1	9.18	VESTIER HOMBRES PANTALLA
	3.4	2.7	N/A	1	9.18	VESTIER MUJERES PANTALLA
	0.8	2.7	N/A	1	2.16	QUIROFANO 2
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	QUIROFANO 2
	0.75	2.7	N/A	1	2.025	QUIROFANO 1
	0.7	2.7	N/A	1	1.89	QUIROFANO 1
	5.91	2.7	N/A	1	15.957	TRABAJO DE PARTO PANTALLA
	5.15	2.7	N/A	1	13.905	RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
	4.02	2.7	N/A	1	10.854	RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
	5.3	2.7	N/A	1	14.31	U.R.O 01 PANTALLA
	0.77	2.7	N/A	1	2.079	U.R.O 07
	2.44	2.7	N/A	1	6.588	FILTRO VESTIERES
	2.2	2.7	N/A	1	5.94	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
	2.48	2.7	N/A	1	6.696	CUARTO EQUIPOS
	1.01	2.7	N/A	1	2.727	AISLADO
	1.22	2.7	N/A	1	3.294	INTERMEDIOS
	TERCER PISO					
	2.6	2.7	N/A	1	7.02	SALA DE ESPERA
	2.94	2.7	N/A	1	7.938	U.C.I-P 01 PANTALLA
	1.66	2.7	N/A	1	4.482	U.C.I-P BAÑO PANTALLA
	4.78	2.7	N/A	1	12.906	ESTAR DE TELEVICION LUDOTECA PANTALLA
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION -02
	0.9	2.7	N/A	1	2.43	HABITACION-08
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-10
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION -11
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-16
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-24
	0.75	2.7	N/A	1	2.025	HABITACION-25
	CUARTO PISO					
	1.1	2.7	N/A	1	2.97	CICULACION RESTRINGIDA
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-02
	0.5	2.7	N/A	1	1.35	HABITACION-02
	1.07	2.7	N/A	1	2.889	HABITACION-08
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-10
	0.7	2.7	N/A	1	1.89	HABITACION-25
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **252.15** **Metro cuadrado**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 26	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m2)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	SOTANO					
	1.26	2.7	N/A	1	3.402	DESPACHO DIETAS
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	DESPACHO DIETAS
	1.8	2.7	N/A	1	4.86	DESPACHO DIETAS
	2.16	2.7	N/A	1	5.832	CICULACION A ARCHIVO
	PRIMER PISO					
	0.73	2.7	N/A	1	1.971	HALL GENERAL
	1.37	2.7	N/A	1	3.699	HALL GENERAL
	1.2	2.7	N/A	1	3.24	AUTO SERVICIO
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	AUTO SERVICIO
	1.08	2.7	N/A	1	2.916	AUDITORIO
	0.73	2.7	N/A	1	1.971	SALA DE ESPERA ADULTOS
	1.62	2.7	N/A	1	4.374	SALA DE ESPERA ADULTOS
	0.46	2.7	N/A	1	1.242	REANIMACION
	0.68	2.7	N/A	1	1.836	DIJITACION
	0.43	2.7	N/A	1	1.161	DIJITACION
	0.89	2.7	N/A	1	2.403	SALA EDA
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	SALA EDA
	1.26	2.7	N/A	1	3.402	OBSERVACION GINECOSTETRICA
	1.56	2.7	N/A	1	4.212	RX
	0.57	2.7	N/A	1	1.539	RX
	1.01	2.7	N/A	1	2.727	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
	0.7	2.7	N/A	1	1.89	RESIDUOS RESICLABLES ORGANICOS
	SEGUNDO PISO					
	10.73	2.7	N/A	1	28.971	HALL GENERAL PANTALLA
	3.4	2.7	N/A	1	9.18	VESTIER HOMBRES PANTALLA
	3.4	2.7	N/A	1	9.18	VESTIER MUJERES PANTALLA
	0.8	2.7	N/A	1	2.16	QUIROFANO 2
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	QUIROFANO 2
	0.75	2.7	N/A	1	2.025	QUIROFANO 1
	0.7	2.7	N/A	1	1.89	QUIROFANO 1
	5.91	2.7	N/A	1	15.957	TRABAJO DE PARTO PANTALLA
	5.15	2.7	N/A	1	13.905	RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
	4.02	2.7	N/A	1	10.854	RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
	5.3	2.7	N/A	1	14.31	U.R.O 01 PANTALLA
	0.77	2.7	N/A	1	2.079	U.R.O 07
	2.44	2.7	N/A	1	6.588	FILTRO VESTIERES
	2.2	2.7	N/A	1	5.94	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
	2.48	2.7	N/A	1	6.696	CUARTO EQUIPOS
	1.01	2.7	N/A	1	2.727	AISLADO
	1.22	2.7	N/A	1	3.294	INTERMEDIOS
	TERCER PISO					
	2.6	2.7	N/A	1	7.02	SALA DE ESPERA
	2.94	2.7	N/A	1	7.938	U.C.I-P 01 PANTALLA
	1.66	2.7	N/A	1	4.482	U.C.I-P BAÑO PANTALLA
	4.78	2.7	N/A	1	12.906	ESTAR DE TELEVICION LUDOTECA PANTALLA
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION -02
	0.9	2.7	N/A	1	2.43	HABITACION-08
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-10
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION -11
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-16
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-24
	0.75	2.7	N/A	1	2.025	HABITACION-25
	CUARTO PISO					
	1.1	2.7	N/A	1	2.97	CICULACION RESTRINGIDA
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-02
	0.5	2.7	N/A	1	1.35	HABITACION-02
	1.07	2.7	N/A	1	2.889	HABITACION-08
	0.6	2.7	N/A	1	1.62	HABITACION-10
	0.7	2.7	N/A	1	1.89	HABITACION-25
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **252.15** **Metro cuadrado**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 27	FAJA PAÑETE LISO MUROS 1:4	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m2)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	50			1	50	Columnas
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	50.00	Metro lineal

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 28	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m2)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
		0.7	2.1	2	2.94	Sotano
		0.8	2.1	12	20.16	Piso 2
		1.2	2.1	15	37.8	Piso 3 habitaciones
		0.8	2.1	15	25.2	Piso 3 Baños
		1.2	2.1	25	63	Piso 4 habitaciones
		0.8	2.1	23	38.64	Piso 4 baños
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	187.74	Metro cuadrado

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 29	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 2". INCLUYE ACCESORIOS.	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	SOTANO					
	VACIO					
	19.81			1	19.81	Red central de cuarto de estacion de vacio a witron de primer nivel
	6			1	6	Witron de sotano a primer nivel
					0	
	PRIMER NIVEL					
	VACIO					
	58.9			1	58.9	Red central
	21.28			1	21.28	Observacion ginecopstetricia
	23.93			1	23.93	Distribucion costado sur
	14.32			1	14.32	Observacion pediatrica
	7.49			1	7.49	
	31.54			1	31.54	Distribucion costado occidental
					0	
	SEGUNDO NIVEL					
	VACIO					
	4.92			1	4.92	De witron a red de distribucion
	5.54			1	5.54	
	27.02			1	27.02	Red central a quirofanos
	26.48			1	26.48	
	5.58			1	5.58	Quirofano 1
	5.66			1	5.66	Quirofano 2
	5.98			1	5.98	Quirofano 3
	13.08			1	13.08	Recuperacion de cirugia
	3.15			1	3.15	
	23.11			1	23.11	De caja de corte doble a caja de corte triple en uci neonatal
	25.49			1	25.49	Red central intensivos Neonatal
	10.94			1	10.94	
	17.25			1	17.25	Red central intermedios Neonatal
					0	
	TERCER NIVEL					
	VACIO					
	21.17			1	21.17	Red a UCI pediatrica
	20.51			1	20.51	
	29.04			1	29.04	Red e habitaciones costado norte
	9.36			1	9.36	Habitaciones costado sur
	10.43			1	10.43	
	2.8			1	2.8	witron de segundo a tercer nivel
	CUARTO NIVEL					
	VACIO					
	5.24			1	5.24	Red principal
	2.8			1	2.8	witron de tercer a cuarto nivel
	45.91			1	45.91	Red de habitaciones del costado sur
	45.04				45.04	Red de habitaciones del costado norte
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	**549.77**	**ML**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 30	ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 2 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	PISO 1					
				3	3	Central de enfermeria
	PISO 2					
				3	3	Farmacia
	PISO 3					
				3	3	Central de enfermeria
	PISO 4					
				2	2	Central de enfermeria
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **11.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 31	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
	PISO 1					
				1	1	Red de vacio
	PISO 2					
				1	1	Red de vacio
	PISO 3					
				1	1	Red de vacio
	PISO 4					
				1	1	Red de vacio
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **4.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ITEM**	NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 2G 1/2"-1/2" EN BRONCE	**UNIDAD**	Unidad	**UBICACIÓN**	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
			PISO 1			
				3	3	Pasillo a RX, observacion pediatria y pasillo consultorios.
			PISO 2			
				5	5	Recuperaciónn partos, salas de partos, UARO y recuperacion de cirugia,
			PISO 3			
				3	3	Ala sur, ala norte y conexión pediatria
			PISO 4			
				1	1	Sitema de ala sur de habitaciones
				1	1	Sitema de ala norte de habitaciones
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **13.00** **Unidad**


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8 "L"	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

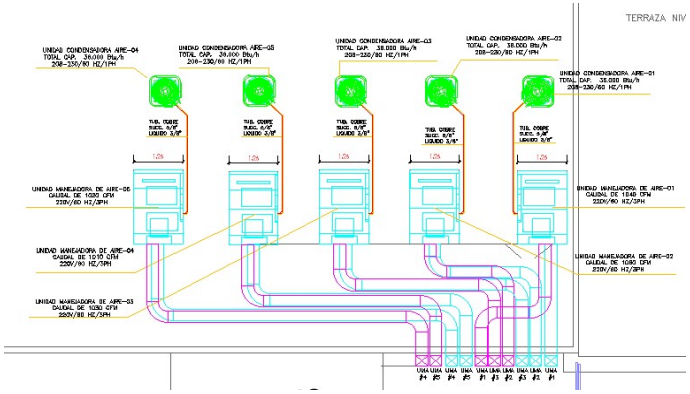

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Metro lineal	
-	-	-			NIVEL 5
5.2	-	-		5.2	EQUIPO 1
1.8	-	-		1.8	
1.6	-	-		1.6	
4	-	-		4.0	
5.2	-	-		5.2	EQUIPO 2
1.8	-	-		1.8	
1.6	-	-		1.6	
4	-	-		4.0	
5.2	-	-		5.2	EQUIPO 3
1.8	-	-		1.8	
4.8	-	-		4.8	
4	-	-		4.0	
5.2	-	-		5.2	EQUIPO 4
3.8	-	-		3.8	
3.8	-	-		3.8	
4	-	-		4.0	
5.2	-	-		5.2	EQUIPO 5
3.8	-	-		3.8	
3.8	-	-		3.8	
4	-	-		4.0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	74.60	Metro lineal


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 5/8 "L"	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

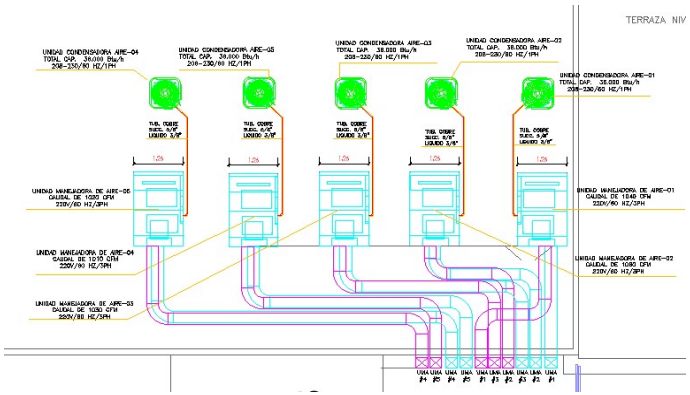

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Metro lineal	
-	-	-			NIVEL 5
6.8	-	-		6.8	EQUIPO 1
1	-	-		1.0	
3.2	-	-		3.2	
2	-	-		2.0	
6.8	-	-		6.8	EQUIPO 2
1	-	-		1.0	
3.2	-	-		3.2	
2	-	-		2.0	
6.8	-	-		6.8	EQUIPO 3
1	-	-		1.0	
3.2	-	-		3.2	
3.2	-	-		3.2	
6.8	-	-		6.8	EQUIPO 4
3.8	-	-		3.8	
3.2	-	-		3.2	
2.4	-	-		2.4	
6.8	-	-		6.8	EQUIPO 5
2.4	-	-		2.4	
3.2	-	-		3.2	
3.8	-	-		3.8	

OBSERVACIONES:

TOTAL	72.60	Metro lineal

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 35	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE SEGÚN DIMENSIONES. INCLUYE: SOPORTERIA (TIPO MÉNSULA, CUELGA, CORREA, VARILLA, O	UNIDAD	KG	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico



Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	KG	Cantidad	KG	
					UNIDADES VENTILADORAS
		313	1	313	UVS 01-03
		400	1	400	UVS 02-03
		191	1	191	UVS 03-03
		320	1	320	UVS 04-03
		264	1	264	UVS 05-03
		499	1	499	UVS 06-02
		423	1	423	UVS 07-02
		386	1	386	UVS 08-02
		619	1	619	UVS 09-02
		418	1	418	UVS 10-02
		725	1	725	UVS 02-11
		599	1	599	UVS 12-02
		374	1	374	UVS 13-02
		360	1	360	UVS 14-01
		487	1	487	UVS 15-01
		423	1	423	UVS 16-01
		452	1	452	UVS 01-17
		354	1	354	UVS 18-01
		310	1	310	UVS 19-01
		512	1	512	UVS 20-01
		365	1	365	UVS 21-01
		824	1	824	UVS 22-01
		673	1	673	UVS 23-01
		0			UNIDADES CONDENSADORAS
		312	5	1560	
		0			UNIDADES EXTRACCION SOTANO
		1427	1	1427	
		0			UNIDADES EXTRACCION
		366.5	8	2932	

OBSERVACIONES:

TOTAL	16,210.00 KG

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 36	CONDUCTOS FLEXIBLE SEGÚN DIMENSIONES. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico



Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	KG	Cantidad	Metro cuadrado	
		130	3	390	QUIROFANOS
		130	2	260	SALA DE PARTOS
				0	

OBSERVACIONES:

TOTAL	650.00 Metro cuadrado

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 6" X 6" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
			SOTANO			
					0	
					0	
			TOTAL SOTANO	0.0		
			PISO 1			
					0	
					0	
			TOTAL PISO 1	0.0		
			PISO 2			
				1	1	Insuos terapia respiratoria
				1	1	Información familiares
				1	1	Filtor acceso personal UARO
					0	
			TOTAL PISO 2	3.0		
			PISO 3			
				1	1	Oficina contigua a transfer medicamentos
					0	
			TOTAL PISO 3	1.0		
			PISO 4			
					0	
					0	
			TOTAL PISO 4	0.0		

OBSERVACIONES:

TOTAL 4.00 Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 38	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 8" X 8" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
			SOTANO			
				1	1	Economo y nutricionista
					0	
					0	
		TOTAL SOTANO		1.0		
			PISO 1			
				1	1	Toma de muestras
				1	1	Área administrativa laboratorio
				1	1	Sala de procedimientos imagenologia
				1	1	Recepcion y entrega de muestras
				1	1	Cubiculo de aislamiento observación pediatrica
				1	1	Sala de lectura imagenologia
				1	1	Oficina Radiologia
				2	2	Entrega de farmacia
				1	1	Referencia y contrareferencia
					0	
		TOTAL PISO 1		10.0		
			PISO 2			
				1	1	Aislado UARO
				4	4	UCI Neonatal
				2	2	Descanso
				1	1	Central de enfermeria
				1	1	Vestier personal asistencial
				1	1	coordinación UCI Neonatal
				1	1	Descanso
				2	2	Vestier mujeres
				2	2	Vestier hombres
					0	
					0	
		TOTAL PISO 2		15.0		
			PISO 3			
				1	1	Información familiares
				1	1	Coordinacion UCI pediatrica
				1	1	Aceso asistencial
					0	
					0	
		TOTAL PISO 3		3.0		
			PISO 4			
					0	
					0	
		TOTAL PISO 4		0.0		

OBSERVACIONES:

TOTAL **29.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 39	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 9" X 9" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
		SOTANO				
				2	2	Bodega de farmacia
					0	
					0	
		TOTAL SOTANO		2.0		
		PISO 1				
				5	5	Observacion pediatrica
				1	1	Consultorio cardiologia
				1	1	Consultotio disponible para ecografo
				3	3	Ecografo
				1	1	Toma de muestras
				5	5	Laboratorio
				2	2	Farmacia
				4	4	Sala de espera
				4	4	Imagenologia 4
				1	1	Procedimientos acepticos
				1	1	Sala de yesos
				1	1	Descanso internos
				1	1	Facturacion
				5	5	Consultorios
				1	1	Sala ERA
				2	2	Reanimación
				1	1	Adimisiones urgencias
				1	1	Triage 1
				7	7	Espera adultos
				6	6	Auditorio
				2	2	Personal asistencial
				2	2	Cocineta
		TOTAL PISO 1		57.0		
		PISO 2				
				1	1	Preparación ambulatoria
				2	2	Hall aseptico
				1	1	Farmacia
				2	2	Preavado instrumental
				1	1	Pasillo frente a bodega
				1	1	Descanso
				11	11	UARO
				1	1	Lactario
					0	
					0	
		TOTAL PISO 2		20.0		
		PISO 3				
				1	1	Descanso medico
				1	1	Descanso enfermeras
				1	1	coordinacion pediatria
				1	1	Preparacion de formulas
				1	1	Información familiares
				1	1	pasillo ropa limpia UCI P
				1	1	pasillo ropa sucia UCI P
				1	1	Pasillo principal a UCI P
				12	12	UCI P
					0	
		TOTAL PISO 3		20.0		
		PISO 4				
					0	
					0	
					0	
		TOTAL PISO 4		0.0		

OBSERVACIONES:

TOTAL	99.00	Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 40	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 12" X 12" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
		SOTANO				
				7	7	Bodega de farmacia
				4	4	Cocineta
					0	
		TOTAL SOTANO		11.0		
		PISO 1				
				5	5	Cafeteria
				2	2	Monitoreo ginecopstetricia
				1	1	Sala EDA
				5	5	Circulación hall central
				2	2	Observacion ginecopstetricia
				2	2	Procedimientos
					0	
		TOTAL PISO 1		17.0		
		PISO 2				
					1	Preparacion partos
					2	Trabajo partos
					4	Recuperación partos
					12	UCI neonatal
					4	Hall principal
					3	Recuperación de cirugia
					2	Esterilización
					0	
		TOTAL PISO 2		28.0		
		PISO 3				
				6	6	Ludoteca
				1	1	Extraccion leche materna
				3	3	UCI Pediatrica
					0	
		TOTAL PISO 3		10.0		
		PISO 4				
					0	
					0	
					0	
		TOTAL PISO 4		0.0		

OBSERVACIONES:

TOTAL 66.00 Unidad

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 6x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				5	5	PISO 1
				6	6	PISO 2
				5	5	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **16.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				19	19	SOTANO
				43	43	PISO 1
				41	41	PISO 2
				41	41	PISO 3
				30	30	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **174.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ITEM**	NP 43	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	**UNIDAD**	Unidad	**UBICACIÓN**	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				0	0	PISO 1
				5	5	PISO 2
				0	0	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **5.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10X6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				13	13	PISO 1
				11	11	PISO 2
				18	18	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **42.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				3	3	SOTANO
				0	0	PISO 1
				1	1	PISO 2
				0	0	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **4.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				3	3	PISO 1
				0	0	PISO 2
				2	2	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **5.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 47	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12X8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				1	1	PISO 1
				0	0	PISO 2
				1	1	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **2.00** **Unidad**

Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma:
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x12 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				0	0	PISO 1
				2	2	PISO 2
				0	0	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **2.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 14x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				3	4	PISO 1
				0	0	PISO 2
				0	0	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **4.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				12	12	SOTANO
				1	1	PISO 1
					0	PISO 2
					0	PISO 3
					0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **13.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 51	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x18 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				0	0	PISO 1
				4	4	PISO 2
				2	2	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **6.00** **Unidad**

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 20x16 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad		
				0	0	SOTANO
				1	1	PISO 1
				0	0	PISO 2
				0	0	PISO 3
				0	0	PISO 4
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

OBSERVACIONES:

TOTAL **1.00** **Unidad**


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 53	DIFUSOR FLUJO LAMINAR QUIROFANO CON PORTA FILTROTERMINAL DE 24"X24"	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

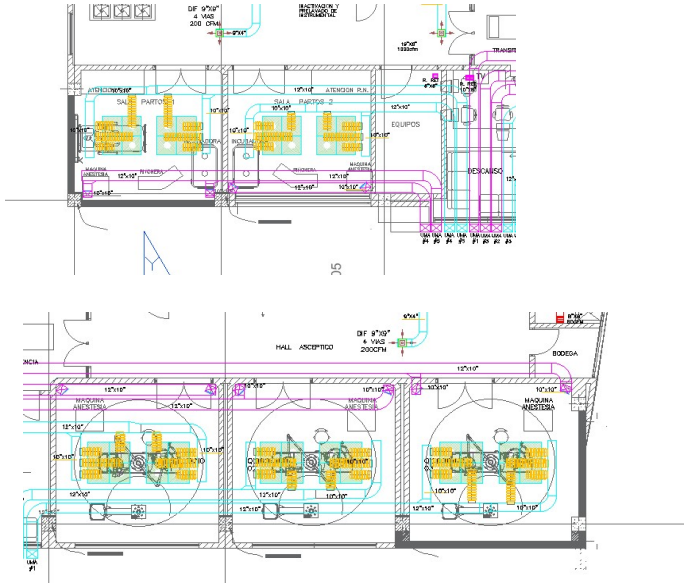

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-		0.00	SOTANO
-	-	-		0.0	NIVEL 1
-	-	-		40.0	NIVEL2
-	-	-		0.0	NIVEL 3
-	-	-		0.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	40.00	Unidad


Firma:
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma:
ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 54	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS HEPA TERMINALES 24" X 24" DE 3" DE ESPESOR	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

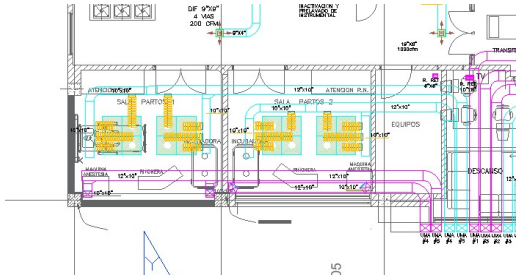

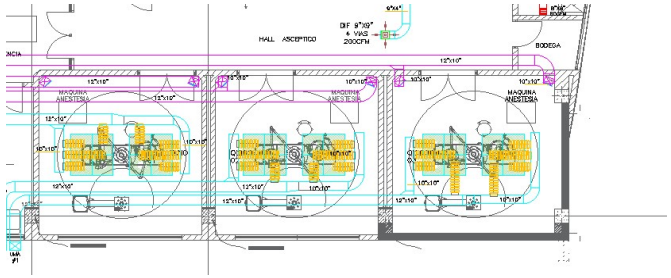

Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
-	-	-		0.00	SOTANO
-	-	-		0.0	NIVEL 1
-	-	-		40.0	NIVEL2
-	-	-		0.0	NIVEL 3
-	-	-		0.0	NIVEL 4

OBSERVACIONES:

TOTAL	40.00	Unidad


Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL

NP	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 55	BALANCEAMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: BARÓMETRO O ANEMÓMETRO, TOMA DE MEDIDAS, SUPERVISIÓN E INFORME.	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARÍA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Registro fotográfico

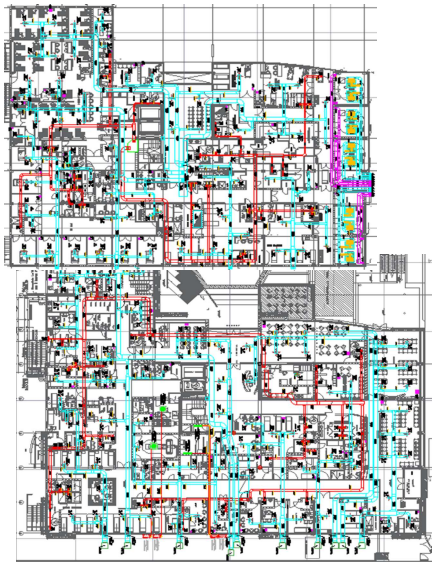



Dimensiones				TOTAL CANTIDAD	Ubicación
Longitud	Altura	Ancho	Cantidad	Unidad	
					UNIDADES DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 03-01) de aire de 2090 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 03-02) de aire de 2600 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 03-03) de aire de 1450 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 03-04) de aire de 2730 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 03-05) de aire de 1760 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 02-06) de aire de 2580 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 02-07) de aire de 2860 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 02-08) de aire de 2920 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 02-09) de aire de 2640 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 02-10) de aire de 2620 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 02-11) de aire de 2660 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 02-12) de aire de 2820 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 02-13) de aire de 2550 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-14) de aire de 2775 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-15) de aire de 2580 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-16) de aire de 2700 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-17) de aire de 2420 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-18) de aire de 2630 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-19) de aire de 2055 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-20) de aire de 2545 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-21) de aire de 2650 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-22) de aire de 2790 CFM.
			1	1.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de unidad ventiladora de suministro (UVS 01-23) de aire de 2520 CFM.
			5	5.0	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE # 01, CAUDAL DE 1040 CFM. AREA: QUIROFANOS
			2	2.0	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de equipo tipo CASSETTE de 24.000 BTU/h - inverter Ubicación: T.A.C - R.X
			1	1.0	MINISPLIT de 24.000 BTU/h - inverter. Ubicación: RACK 1 y 2
			1	1.0	Ventilador tipo axial Gama TAT tubo axial, marca S&P, modelo SP421316SCO623V0-19-TAT-710. 230V / 60 Hz/ 3 Ph. Para retornar 9.410 cfm
			1	1.0	Ventilador centrífugo de simple aspiración para los baños de piso 1, 208-230V/60 Hz / 3 ph. Caudal de 2.820 cfm.
			1	1.0	Ventilador centrífugo de simple aspiración para los baños de piso 2, 208-230V/60 Hz / 3 ph. Caudal de 3.090 cfm.
			1	1.0	Ventilador centrífugo de simple aspiración para los baños de piso 3, 208-230V/60 Hz / 3 ph. Caudal de 3.580 cfm.
			1	1.0	Ventilador centrífugo de simple aspiración para los baños de piso 4, 208-230V/60 Hz / 3 ph. Caudal de 3.580 cfm
			1	1.0	Ventilador centrífugo de simple aspiración para el piso 1. A 208-230V/60 Hz / 3 ph. Caudal de 15.600 cfm
			1	1.0	Ventilador centrífugo de simple aspiración marca S&P para el piso 2. A 208-230V/60 Hz / 3 ph. Caudal de 12.350 cfm
			1	1.0	Ventilador centrífugo de simple aspiración marca S&P para el piso 3. A 208-230V/60 Hz / 3 ph. Caudal de 6.900 cfm
			1	1.0	Ventilador centrífugo de simple aspiración marca S&P para el piso 4. A 208-230V/60 Hz / 3 ph. Caudal de 5.000 cfm
			2	2.0	Unidad ventiladora de extracción AISLADOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	42.00	Unidad

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI
