OBJETIVO DE LA REUNION:	**FECHA:**	**ACTA No.**
REALIZAR COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211- 2024.	08 DE MAYO DE 2025	7

LUGAR:	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
REUNION VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS	04:00 PM	04:30 PM

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a los compromisos del acta anterior.
2. seguimiento convenio SA-CDCVI – 211 – 2024.
3. Avance de cada una de las actividades correspondientes al mes de abril dentro del convenio SA-CDCVI – 211 – 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A través de la plataforma TEAMS se dieron cita las partes encargadas de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene por objeto: " AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO – CORPOGUAVIO Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.". A continuación, se relacionan los asistentes:

NOMBRES Y APELLIDO	CARGO	ENTIDAD
MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO	SUPERVISORA CONVENIO	CORPOGUAVIO
JOSÉ URBANO URREGO CORTES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO
JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
ABDON HERNAN MONCADA CASTAÑEDA	CONTRATISTA	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE

La Ing. Jessy Mosquera da inicio a la reunión a las 4:10 p.m., agradeciendo la presencia de todos los participantes y señalando el orden del día. A continuación, cede la palabra a los representantes de Corpoguavio para que informen sobre los avances y el estado actual del convenio SA-CDCVI-211-2024.

El ingeniero Jose Urrego realiza una presentacion de los avances alcanzados en el mes de abril dentro de cada una de las acciones planteadas en el convenio, en la informacion presentada se visualiza municipio, vereda, nombre del predio, propietario, area intervenida y las acciones adelantadas dentro de cada predio de acuerdo a lo planteado en cada una de las actividades dentro del convenio. Manifiesta que la actividad de nucleacion ya esta con un avance del 100% ya que se intervinieron las 18 hectareas planteadas inicialmente en el convenio.

Adicionalmente el ingeniero Jose Urrego indica que se realizó la construccion de 400 metros de cerca en la vereda periquito del municipio de Medina, indica que en el mes de marzo se construyeron 1600 metros de cerca, de acuerdo a este avance se tienen construidos 2000 metros de cerca de los 2700 metros planteados dentro del convenio, para un avance del 74%.

Posterior a esto la ingeniera Jessy Mosquera solicita que se programe visita de campo para los dias 21 y 22 de mayo en el municipio de Medina para lo cual Corpoguavio estuvo de acuerdo.

El ingeniero Jose Urrego continua con la presentación de los avances e indica que la actividad de revegetalización de las áreas afectadas por erosion hídrica tiene un avance del 33% correspondiente a 12 hectareas de las 36 planteadas.

Para la actividad de dispersion de semillas el ingeniero Jose Urrego indica que se realizará entre los meses de mayo y junio de acuerdo al cronograma acordado con el contratista.

Ademas la ingeniera Jessy Mosquera pregunta a cerca del porcentaje total de avance para lo que el ingeniero Jose Urrego indica que el porcentaje general de avance corresponde al 64%.

Adicionalmente, la ingeniera Jessy Mosquera pregunta a cerca de la tasa prodeporte e indica que se debe tener en cuenta independientemente de que se haga algún tipo de pago en el mes, siempre tiene que haber una declaración así sea en cero, si no se hizo ningún movimiento y que se debe radicar en secretaría de hacienda del departamento.

Por último, la ingeniera Jessy Mosquera informa que mensualmente se debe incluir en los informes los soportes de la presentación de la tasa prodeporte, los paraficales y los extractos de la cuenta del convenio.

Siendo las 4:30 pm la la ingeniera Jessy Mosquera da por terminada la reunion correspondiente al comité tecnico numero 7.

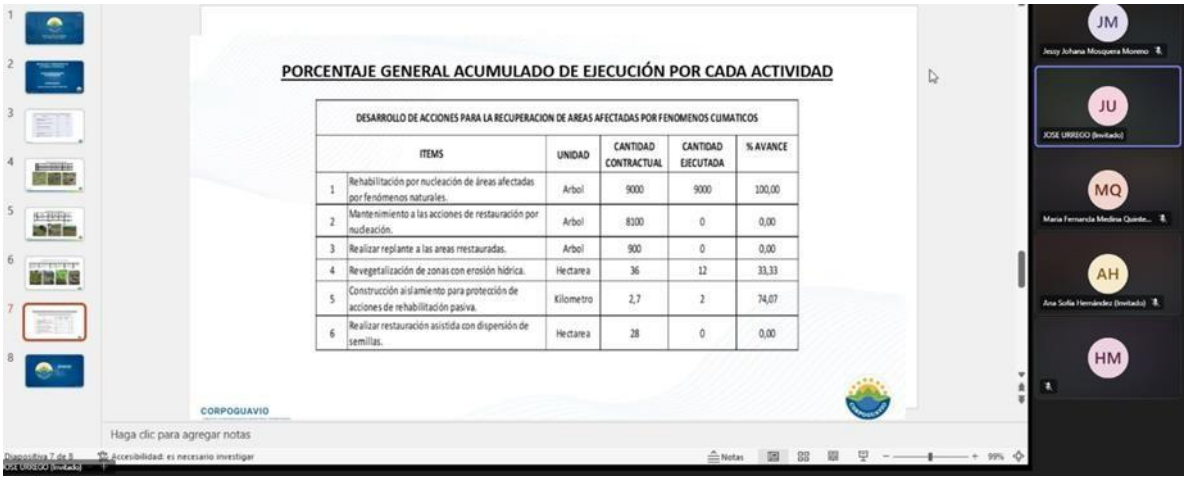
REGISTRO FOTOGRAFICO


JM
Jessy Johana Mosquera Moreno
JU
JOSE URREGO (Invitado)
MQ
Maria Fernanda Medina Quintero
HM
Participantes
RESTAURACION Y REHABILITACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. SA-CDCVI-211-2024
CONTRATO DERIVADO
Contrato de obra No. 02000-13-05-642-2024
www.corpoguavio.gov.co
Hernan Moncada
Jessy Johana Mosquera Moreno
Organizador
JOSE URREGO (Invitado)
Maria Fernanda Medina Quintero
Hollmyn Vivaldi Salamanca Mora
Ana Sofia Hernandez
YINA TATIANA BELTRAN HORMAZA
REDMI NOTE 12


INTERVENCION POR NUCLEACION
ITEM | USUARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | Ha
1 | GUILLERMO GARCÍA CARRION | MEDINA | VARITAL | JAGUITOS | 3
2 | RICARDO RODRÍGUEZ | MEDINA | PERIQUITO | LOS CUMAROS | 4
3 | FREDY MORENO FORERO | MEDINA | SAN ISIDRO | PRIMAVERA | 2
CORPOGUAVIO
Haga clic para agregar notas
JM
JU
MQ
HM


CONSTRUCCION AISLAMIENTO
ITEM | USUARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | Mts Lineales
1 | RICARDO MARTINEZ | MEDINA | PERIQUITO | LOS CUMAROS | 400
TOTAL | 400
CORPOGUAVIO


Revegetalización de zonas con erosión hídrica
ITEMS | USUARIO | MUNICIPIO | VEREDA | PREDIO | AREA Ha
REVEGETALIZACION DE ZONAS CON EROSION HIDRICA | RAFAEL BELTRAN | GACHETA | MOQUENTIVA | STA ROSA-LA VEGA | 12
CORPOGUAVIO
Haga clic para agregar notas


PORCENTAJE GENERAL ACUMULADO DE EJECUCIÓN POR CADA ACTIVIDAD
DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR FENOMENOS CLIMATICOS
ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD CONTRACTUAL | CANTIDAD EJECUTADA | % AVANCE
1 Rehabilitación por nucleación de áreas afectadas por fenómenos naturales. | Arbol | 9000 | 9000 | 100,00
2 Mantenimiento a las acciones de restauración por nucleación. | Arbol | 8100 | 0 | 0,00
3 Realizar replante a las areas rrestauradas. | Arbol | 900 | 0 | 0,00
4 Revegetalización de zonas con erosión hídrica. | Hectarea | 36 | 12 | 33,33
5 Construcción aislamiento para protección de acciones de rehabilitación pasiva. | Kilometro | 2,7 | 2 | 74,07
6 Realizar restauración asistida con dispersión de semillas. | Hectarea | 28 | 0 | 0,00
CORPOGUAVIO
Haga clic para agregar notas

CONCLUSIONES

El avance general de ejecución del convenio es del 64%.



Se acordó realizar una visita de campo los días 21 y 22 de mayo en el municipio de Medina, con la aceptación de Corpoguavio.

Se aprobó el informe mensual del mes de marzo del 2025

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Visita de seguimiento municipio de Medina	21 y 22 de mayo de 2025	Corpoguavio y Supervisión Convenio
Mensualmente se debe incluir en los informes los soportes de la presentación de la tasa prodeporte, los paraficales y los extractos de la cuenta del convenio.	Mensual	Corpoguavio

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO	SUPERVISORA CONVENIO	CORPOGUAVIO	
JOSÉ URBANO URREGO CORTES	PROFESIONAL TECNICO	CORPOGUAVIO	
JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE	
ABDON HERNAN MONCADA CASTAÑEDA	CONTRATISTA	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE	
ANA SOFIA HERNANDEZ	CONTRATISTA	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE	
