INFORME PERIÓDO DE SUPERVISIÓN
Fecha: 01 al 31 de marzo 2024

1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIRIO

1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	631 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/02/2024
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.715.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 6.715000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	27/02/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA TERMINACIÓN REAL	31/12/2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 06/02/2024 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 01/03/2024 A LA FECHA

DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. NFORMACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

3.1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

Nombre del Contrato	Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El Contratista realizará la interventoría integral de ocho (8) contratos clasificados en Contratos Tipo A: Contrato de rehabilitación mayor; Contratos Tipo B, Contrato de suministro y obra menor; Contratos Tipo C: Contrato de rehabilitación mayor con estrategia de aseguramiento y sostenibilidad: y Tipo D. Contrato de rehabilitación menor, con los siguientes objetos y valores.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relaciona el valor del contrato conforme se estipula en la sexta clausula;

Componente	PGN 2023	Total
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S El valor del contrato es por la suma de hasta SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.715.000.000) incluidos IVA y todos los costos y gastos en que debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, y los demás tributos que cause dicho contrato, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan para lo cual se afectará el	$ 6.715.000.000	$ 6.715.000.000

Componente	PGN 2023	Total
certificado de disponibilidad presupuestal 94124 del 06 de febrero de 2024		
Totales	$ 6.715.000.000	$ 6.715.000.000
%Participación	100%	100%

Según especificación del alcance del contrato No. 631-2024 en su segunda clausula, en el cual la interventoría debe realizar los procesos y actividades para el control y seguimiento del estado financiero de cada contrato vigilado: *"Gestión Financiera: El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento de hitos, las amortizaciones, las retenciones aplicables, entre otros",* a continuación se relaciona la información financiera de cada contrato con acta de inicio;

No.	Numero de Contrato	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO
1	CONTRATO No 632 DE 2024	VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P.,	$12.000.000.000	27/02/2024
2	CONTRATO No 605 DE 2024	WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL	$ 6.900.000.000	27/02/2024
3	CONTRATO No 656 DE 2024	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	$7.400.000.000	18/03/2024
4	CONTRATO No 600 DE 2024	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA	$7.000.000.000	26/02/2024
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024	ENCINA S.A.S.	$23.000.000.000	11/03/2024
7	CONTRATO No 608 DE 2024	FLESHMAN CONSTRUCTORES	$173.000.000	27/02/2024
			$56.473.000.000	

4.1. Disponibilidad Presupuestal contrato de Interventoría.

No. Resolución de asignación y fecha:	
Valor de Asignación Nación:	$ 6.715.000.000,00
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	94124 del 06 de febrero de 2024.
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	09878245175 – Cuenta corriente
Nombre entidad bancaria:	Bancolombia
Titular de la cuenta:	Proyectos y gestión del desarrollo SAS.

4.2. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:


En el mes de marzo no se han realizado desembolsos

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

En el mes marzo no se han realizado modificaciones contractuales.

6. MAPA DE ASIGNACIONES A CONTRATISTAS

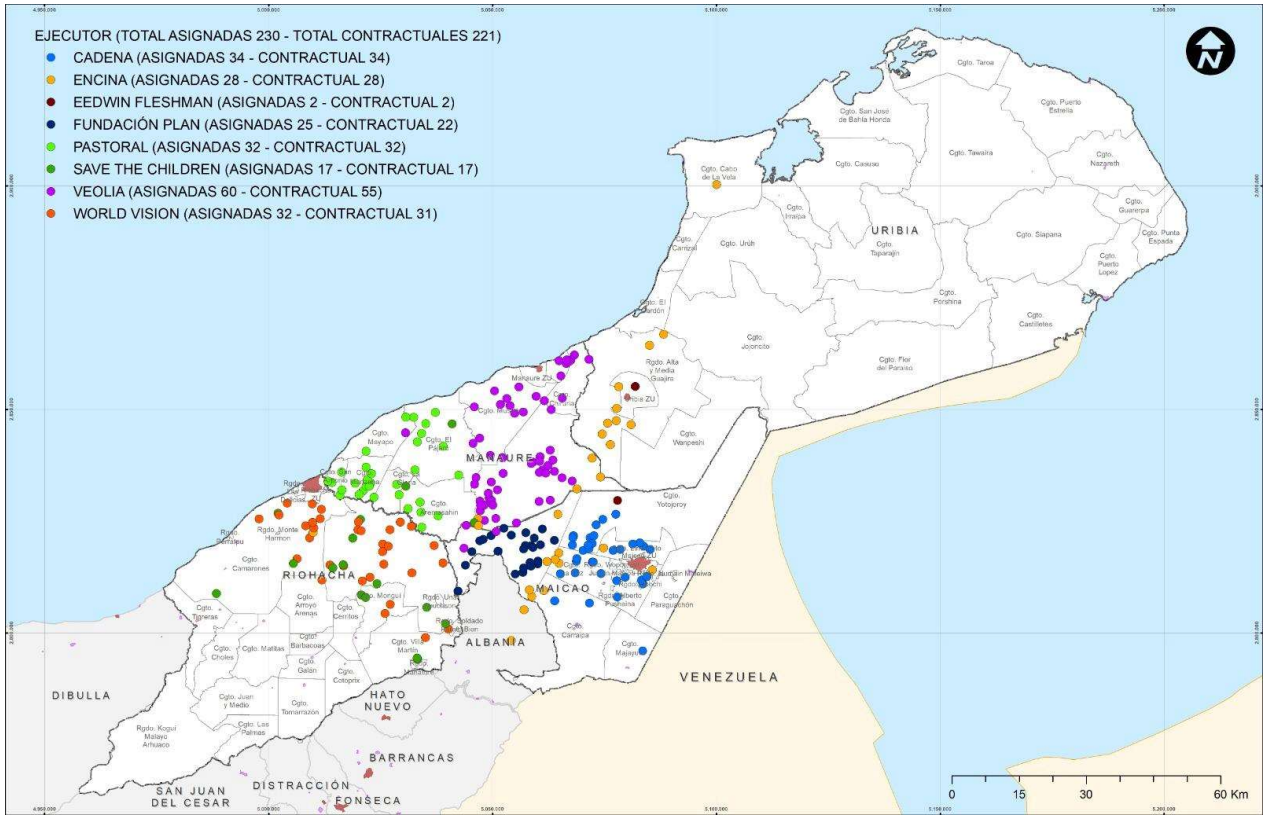


7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En virtud de la cláusula tercera del contrato No.631-2024, respecto a las obligaciones técnicas de la interventoría, ítem 3.2.1, numeral 24, en el cual refiere establecer el avance y resultados de las actividades ejecutadas por cada contratista en el desarrollo de las actividades, en el siguiente cuadro se relacionan los avances por cada contrato: (ANEXO 2)

CONTRATOS DIRECTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO
VEOLIA	0,24%	0,33%
WORLD VISION	3,80%	0,97%
FUNDACIÓN CADENA	0,00%	0,00%
PASTORAL SOCIAL	0,35%	0,52%
SAVE THE CHILDREN	0,00%	0,00%


ENCINA S.A.S.	0,00%	0,00%
FUNDACIÓN PLAN	0,00%	0,00%
FLESHMAN CONSTRUCTORES	4,25%	1,50%

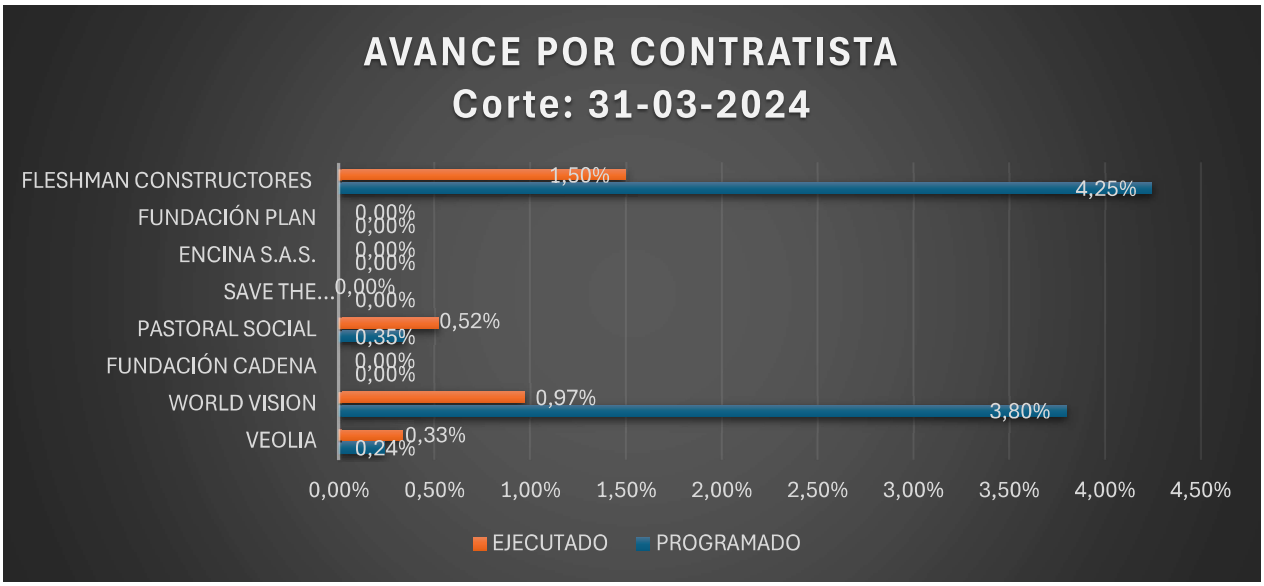

En el análisis del comportamiento de los contratos directos en los que la interventoría P&G ha realizado control y seguimiento a los contratistas muestran las siguientes tendencias:

VEOLIA: Se observa un porcentaje ejecutado mayor a lo programado debido a las 17 visitas de entrada social que iniciaron antes de las fechas programadas descritas en el cronograma, se espera continuar con ese mismo ritmo con los levantamientos técnicos y sociales.
WORLD VISION: Pese a que llevan 20 visitas de entrada social, de acuerdo al cronograma deberían estar adelantando los levantamientos técnicos y sociales, por tanto, se ha instado al contratista colocarse al día en lo correspondiente al cronograma aprobado.
FUNDACIÓN CADENA: Pese a la firma del acta de inicio a mediados de marzo, se encuentran en logística de contacto con las comunidades para dar inicio a las entradas y por tanto se observa los avances en 0,00%
SECRETARIADO DE PASTORAL: Se observa un porcentaje ejecutado mayor a lo programado debido a las 11 visitas de entrada social que iniciaron antes de las fechas programadas descritas en el cronograma, se espera continuar con ese mismo ritmo con los levantamientos técnicos y sociales.
SAVE THE CHILDREN: Se encuentra en etapa precontractual y por tanto se observa los avances en 0,00%

ENCINA: debido a presentar acta de inicio a mediados del mes, se observa los porcentajes en cero debido a las logísticas de contacto con las comunidades para eventualmente iniciar con las entradas de visita social.
FUNDACIÓN PLAN: Se encuentra en etapa precontractual y por tanto se observa los avances en 0,00%
FLESHMAN: La fecha de inicio acordada y consignada en el cronograma se estipulo para el 13 de marzo 2024, sin embargo, se observa un avance del 1,5%, debido a las evidencias de visitas en campo en el que las 2 comunidades ejecutaron actividades previas al contrato, por tanto, se está gestionando nuevos alcances.

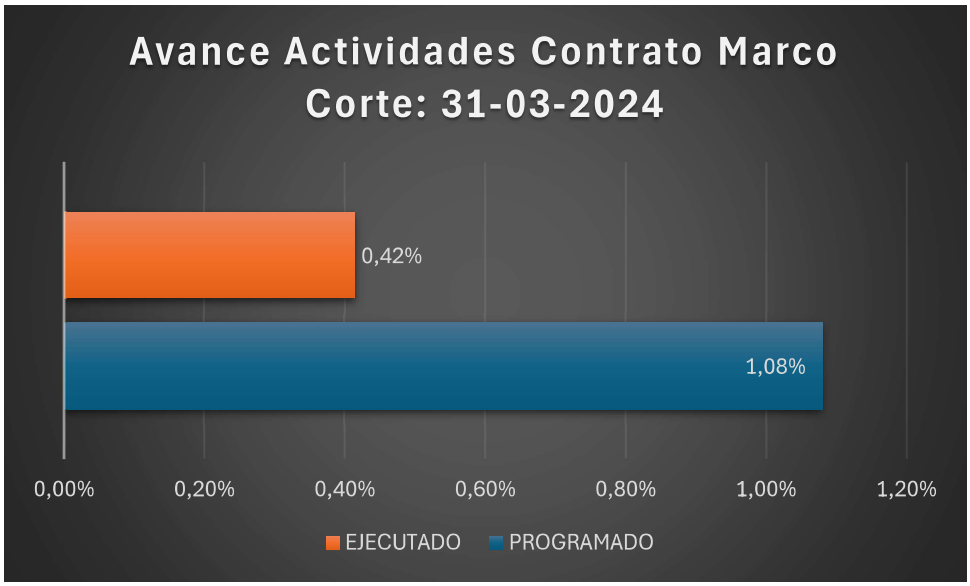

Tras un análisis detallado del desempeño en la ejecución de los contratos que contemplan un total 221 intervenciones bajo el seguimiento y control de la interventoría P&G especificado en el contrato 631 e 2024, se ha identificado un retraso significativo en el componente precontractual, arrojando un avance promedio de 0,42%, frente a un programado promedio de 1,08%, debido a los 2 contratos que aún se encuentran pendientes en suscripción de contrato y acta de inicio y logísticas previas de los dos contratitas para la entrada social.

Plan de acción: Suscripción para el próximo mes de los contratos y actas de inicio para los contratos con Save the Children y Fundación Plan e inicio de entrada a las comunidades por parte del contratista Encina y Fundación Cadena.

8. Conclusiones y/u observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

1. Introducción

En mi calidad de supervisora del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 631 DE 2024 **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.**, con el objeto de: "*Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos.",* me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 07 de febrero al 29 de febrero y del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024.

2. Avances mes de marzo de 2024

El 05, 12, 20 y 27 de marzo de 2024, en atención a la cláusula tercera del Contrato, del ítem 3.1 "Obligaciones generales", numeral 26 en el que se establece participar a través del representante legal o director en los comités de seguimiento, se realizaron los comités de seguimiento como control y seguimiento de avance del contrato de interventoría 631-2024.

Se presentan a continuación las gestiones realizadas para el desarrollo del Contrato en mención en relación con los comités de seguimiento (ANEXO 3):

Comité 05/03/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Remisión observaciones hojas de vida equipo transversal interventoría	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	6/03/2024
Remisión directorio Interventoría	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	07/03/2024
Lista de chequeo documentación cobros en la entidad contratante	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	6/03/2024
Envío formatos a implementar en los proyectos	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	6/03/2024

Revisión y subsanación flujo de facturación 2024	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Sin definir
Presentación de avances según formatos de la entidad contratante	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Comité semanal
Entrega hojas de vida interventoría pendientes	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	5/03/2024
Remisión cuadro con relación de personal interventoría, experiencia general y especifica.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Sin definir

Comité 12/03/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Solicitar plan de alistamiento contratos, según fechas de inicio de cada contrato	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Próximo comité
Presentación de certificados laborales sin lista de funciones para las hojas de vida.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Comité semanal
Cronograma de visitas por contratistas	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	14/03/2024
Presentación de avances según formatos de la entidad contratante	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Comité semanal
Entrega hojas de vida interventoría pendientes	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	14/03/2024
Control Supervisión NSR-10 Título I, Tabla I.4.2-2	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Etapa de diagnóstico y rehabilitación
Ajuste cronograma Encina	Contratista de obra, bajo la supervisión de la interventoría	Sin definir

Comité 20/03/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Correcciones a los planes de alistamiento de los contratos 632 de 2024 – VEOLIA, contrato 605 de	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	22/03/2024

2024 – World Visión y Contrato 600 de 2024 – Pastoral social.		
Entrega de plan de alistamiento contrato ENCINA	ENCINA	26/03/24
Respuesta a experiencia específica para residente Oscar Narváez	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	22/03/2024
Revisión de hoja de vida de Manuel Fernández (profesional financiero) y respuesta en referencia experiencia general	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	22/03/2024
Ajuste a plantilla de seguimiento suministrado por la entidad contratante e informe consolidado de los avances de los diferentes proyectos.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	22/03/24
Informe sobre la intervención de Fleshman en la comunidad de Yotojorotshi, soportes y actividades realizadas recomendación de interventoría.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	21/03/24
Solicitar reporte a World Visión sobre reformulación del alcance en la comunidad Lejano oriente.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	23/03/24

Comité 27/03/2024


MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Reunión con contratistas para revisar avances y planeación en el número de intervenciones	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio E Interventoría	01/04/2024
Entrega a MVCT planes de alistamiento subsanados	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Próxima Semana
Alcance a respuesta de revisión de hojas de vida de profesionales interventoría	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	27/03/2024
Informe contrato Fleshman	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	03/04/2024
Cuadros de avance y seguimiento	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Comité semanal
Concepto situaciones evidenciadas en comunidades World Visión	Proyectos y gestión del desarrollo SAS.	Próxima semana

El 07, 09, 16, 21, 22, 26 y 27 de marzo: De conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría No 631-2024, en el numeral 2, en el componente "*Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la*


INTERVENTORIA se obliga a", ítem 3.2.1 Obligaciones Técnica, de la cláusula tercera correspondiente a las obligaciones del contratista, en el cual refiere "*Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el (los) supervisor(es), atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen*.", se solicitó mediante el correo institucional a P&G las actas del 5, 12, 20, 27 de marzo para revisión, compromiso, requerimientos y firmas.




El 08, 12 y 15 de marzo: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, ítem 14: "*Asesorar y suministrar la información que requieran la MVCT, el Supervisor designado o las Entidades de control de manera oportuna*", mediante correo electrónico se gestiona y solicita a P&G los programas de visitas y cronogramas de ejecución de actividades.

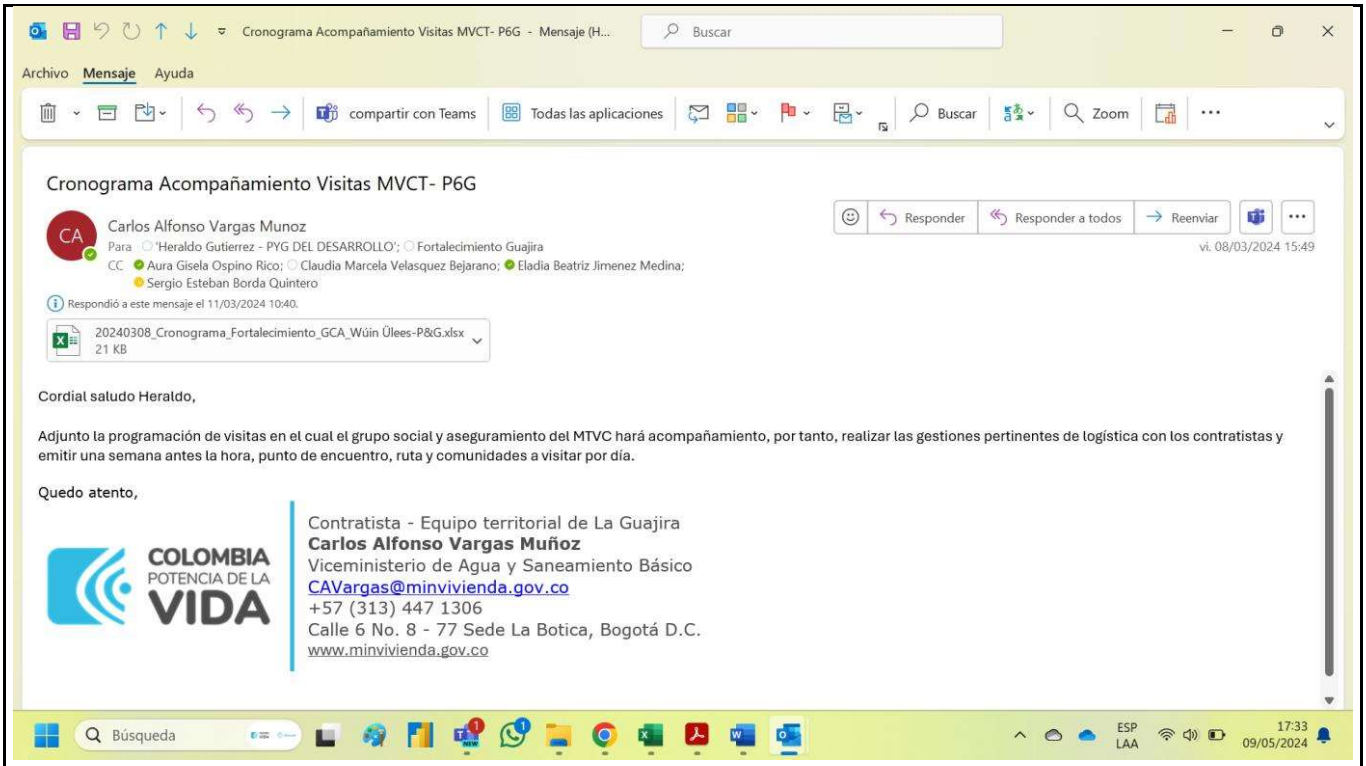

El 07 y 27 de marzo: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, componente "*Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA se obliga a*", ítem 45: "*Servir de conducto regular entre el MVCT y los contratistas en todo lo que respecta al desarrollo de las actividades de los contratos objeto de interventoría*", mediante correo electrónico se entrega a P&G el listados de asignaciones de comunidades a los contratistas.

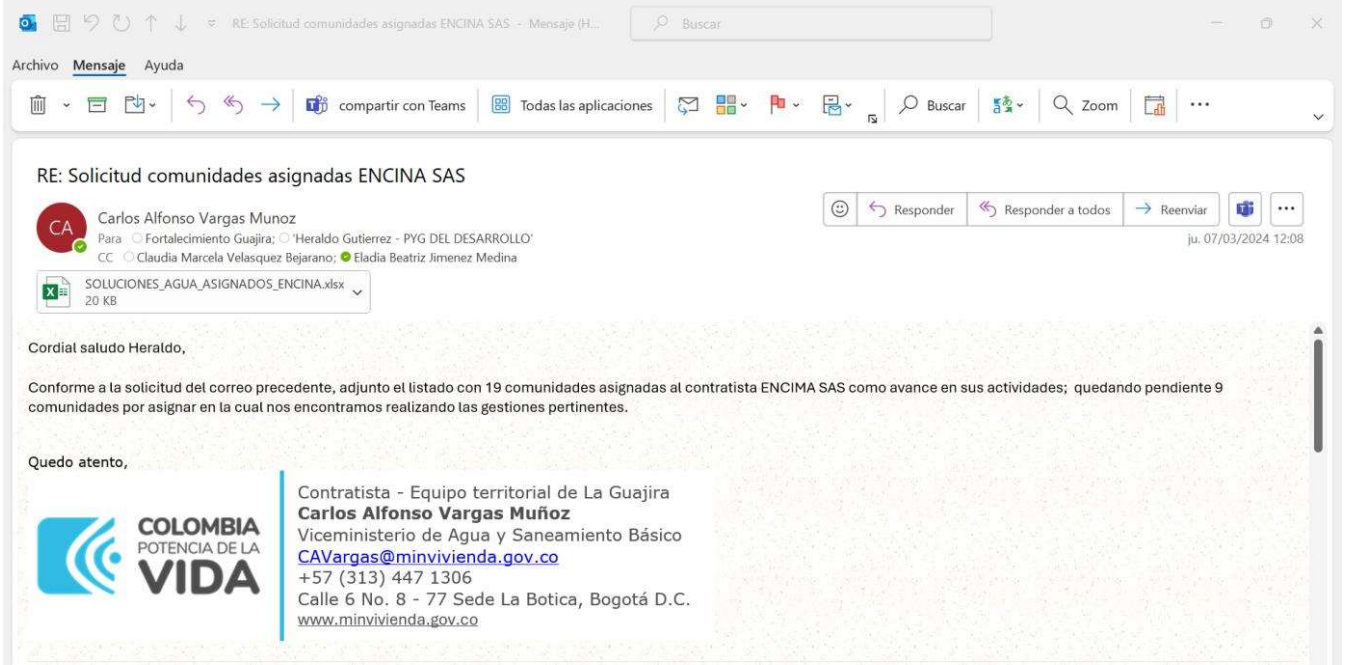


El 11 de marzo: en Aras del cumplimiento de la tercera cláusula del contrato "Obligaciones del contratista"*, ítem 3.2.2.4.* Obligaciones Sociales, Numeral 5; "Asegurar *el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y medición de impactos*"; se entregó los listados de número de contacto de las comunidades asignadas a P&G, con el fin de realizar las gestiones de acercamiento para las visitas sociales, diagnóstico y rehabilitación.

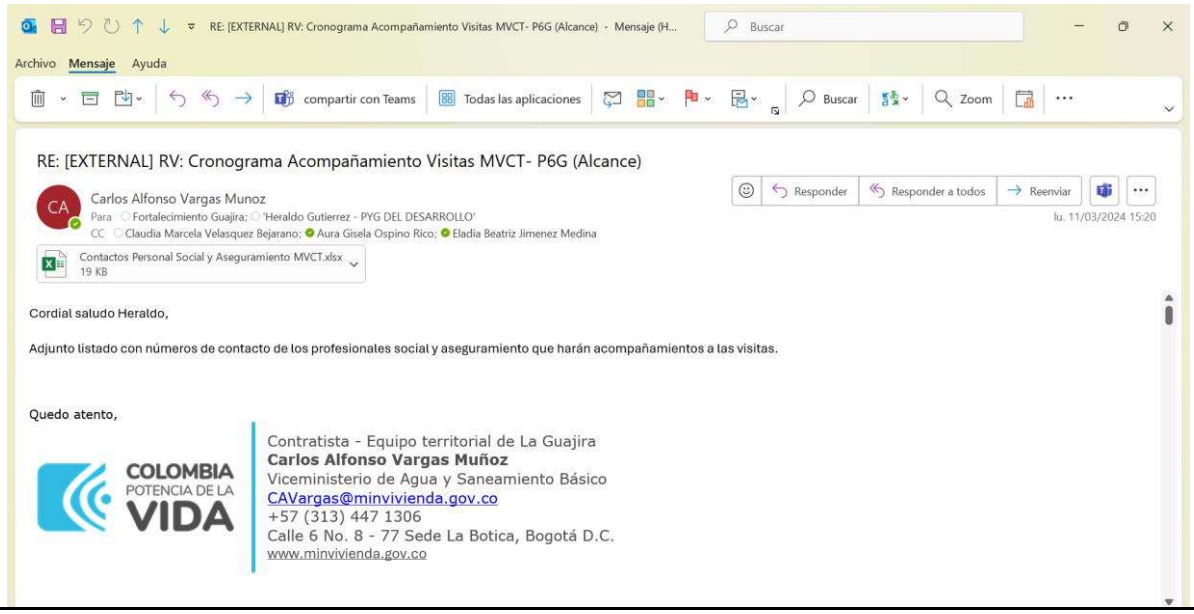

	
Visita integral (comunidad Atunalain)	Visita integral (comunidad Ishipa)
	
Visita integral (comunidad Anuachon juliakat)	Visita integral (comunidad Kashiroupa)
	
Visita integral (comunidad Kashumana 2)	Visita integral (comunidad Atunalain)

MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	COMUNIDAD	CONTRATISTA	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	FECHA VISITA INICIAL
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	AJUMANA	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	13/03/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	ALAMARKAT	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	05/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	CERRO PLANO	SAVE THE CHILDREN	Pozo	05/03/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	CIRUELO I	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	05/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	DIVIDIVI 1	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	20/03/2024
MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	ELEPELIO	ENCINA S.A.S. - SAVE THE CHILDREN	Molino de viento	20/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	GALILEA	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	21/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	GUADALUPE 2	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	21/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	GUAYABITO 1	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	21/03/2024
MAICAO	Cgto. Limoncito	Ishain	ENCINA S.A.S. - WORLD VISION	Molino de viento	19/03/2024
MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	JAIPIRIJUNAY	ENCINA S.A.S. - CERREJÓN	Molino de viento	18/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	JUPECHIMANA 1	WORLD VISION INTERNATIONAL	NR	21/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Villa Martín	JUPECHIMANA 2	WORLD VISION INTERNATIONAL	Molino de viento	07/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	KAMUCHASAIN	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo artesiano	20/03/2024
MAICAO	Rgdo. Alta y Media Guajira	KASPOLIMANA	ENCINA S.A.S. - CERREJÓN	Molino de viento	20/03/2024
URIBIA	Rgdo. Alta y Media Guajira	KATAYSUMANA SEC III	ENCINA S.A.S. - CERREJÓN	Pozo	18/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Villa Martín	KETPANA	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo artesiano	07/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	LA TOLDA	WORLD VISION INTERNATIONAL	Molino de viento	21/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Monguí	LEJANO ORIENTE	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	14/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	LOS OLIVOS 1	ENCINA S.A.S. - SAVE THE CHILDREN	Molino de viento	19/03/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	MAWUIPA	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo artesiano	06/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	MERIDAILY	WORLD VISION INTERNATIONAL	Molino de viento	20/03/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	PLAN BONITO	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	05/03/2024
RIOHACHA	Cgto. Camarones	SANTA LUCIA	WORLD VISION INTERNATIONAL	Molino de viento	20/03/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	TULUMANA	WORLD VISION INTERNATIONAL	Microacueducto	14/03/2024
MANAURE	Cgto. Aremasahin	Tutchonka	ENCINA S.A.S. - FAO	Pozo	18/03/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	URRAICHI	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	05/03/2024
MAICAO	Cgto. La Paz	Warawarao	ENCINA S.A.S. - CERREJÓN	Pozo	19/03/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	YUTAX	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	06/03/2024

El 3, 7 de marzo Partiendo de las "Obligaciones del Contratista" dispuesto en la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.2.1. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, ítem 8 en el cual refiere: "*Presentar al MVCT informes sobre el avance del (los) contratista(s) vigilados.*"; se solicita y recibe los cuadros de avances (%) emitidos semanalmente por los contratistas que han iniciado con las visitas sociales (ANEXO 2).

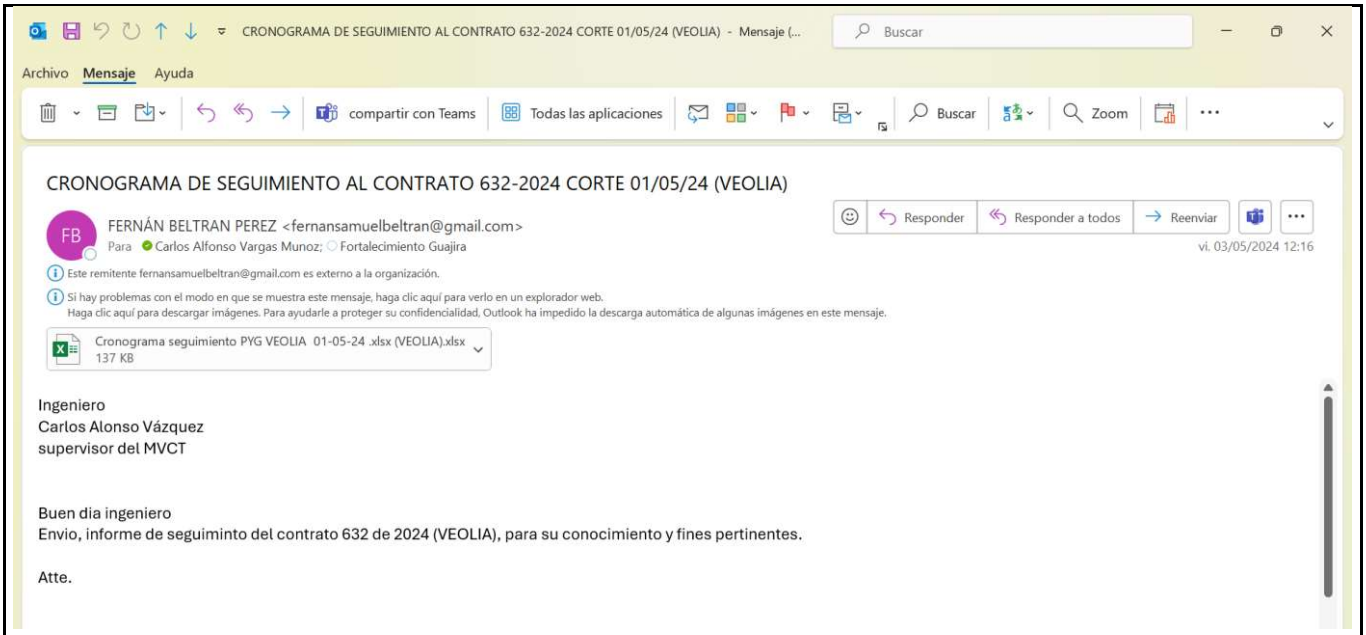

3. **Relación de comunicaciones** (ANEXO 4)

Radicado Emitido P&G	Referencia	Asunto	Remitente	Fecha Recibo/Emisió
P&G-IAG-631-003	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y L	Traslado comunicado 605_2024_001 "Recibido acta de inicio y base de datos de comunidades iniciales" remitido por WORLD VISION INTERNATIONAL	Heraldo Gutiérrez Villegas	28/02/2024
P&G-IAG-631-007	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Entrega de Hojas de Vida Equipo mínimo interventoría para revisión y aprobación.	Heraldo Gutiérrez Villegas	05/03/2024
P&G-IAG-631-008	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Respuesta comunicado 2024EE0013960 "Hojas de vida equipo de gestión Contrato de interventoría No. 631 de 2024	Heraldo Gutiérrez Villegas	15/03/2024
Radicado Emitido MVCT		**Asunto**	**Remitente**	**Fecha Envío**
2024IE0002138	Emisión Grupo Contratos MVCT	Actas de Inicio Plan Wüin Ülees (Agua Limpia). Esquema rehabilitaciones	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	11/03/2024
2024IE0002450	Emisión Grupo Contratos MVCT	Actas de Inicio Plan Wüin Ülees (Agua Limpia). Esquema rehabilitaciones	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	20/03/2024
2024IE0013960	Emitido a P&G	Hojas de Vida equipo de Gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	07/03/2024
2024IE0016610	Emitido a P&G	Hojas de Vida equipo de Gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	15/03/2024
2024IE0018801	Emitido a P&G	Listado de asignaciones Comunidades - Contrato de suministro e instalación No. 615-2023	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	21/03/2024
2024IE0019079	Emitido a P&G	Hojas de vida equipo de gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	03/04/2024

4. Actividades para realizar en el mes de abril de 2024

Se realizará la suscripción de los contratos y actas de inicio con Save the Children y Fundación Plan.

Se continuarán con las visitas de entrada social y realización de levantamientos técnicos como pruebas de bombeo y caracterizaciones de agua.

5. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

A la fecha no se ha realizado documentos contractuales de prórroga, suspensiones a los contratos directos

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso.
No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular asociados a la ejecución del presente contrato.

6. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P., CONTRATO No 632 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 12.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Giros realizados al Contrato	$0,00
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 12.000.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
6	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 12.000.000.000**

WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL CONTRATO No 605 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 6.900.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Giros realizados al Contrato	$0,00
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 6.900.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
6	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 6.900.000.000**

FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA CONTRATO No 656 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 7.400.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Giros realizados al Contrato	$0,00
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 6.900.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
6	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 7.400.000.000**

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA CONTRATO No 600 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 7.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Giros realizados al Contrato	$0,00
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 7.000.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
6	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 7.000.000.000**

	ENCINA S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024	
1	Aportes Nación – MVCT	$ 23.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Giros realizados al Contrato	$0,00
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 7.000.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
6	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 23.000.000.000**

	FLESHMAN CONSTRUCTORES CONTRATO No 608 DE 2024	
1	Aportes Nación – MVCT	$ 173.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Giros realizados al Contrato	$0,00
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 173.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
6	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 173.000.000**

La información de los numerales 1 fue tomada de la ejecución presupuestal MVCT de cada uno de los contratos

GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ
Supervisora
Contrato de Interventoría 631-2024

VoBo. Carlos Vargas – Profesional de Apoyo Técnico

VoBo. Claudia Velasquez – Gestora Guajira
